Tabla 9. registro fotográfico de Equipos de Topografía.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	
	
Descripción:Estación Total Hi Target	Descripción:Estación Total Hi Target
	
Descripción:Nivel Automático Hi Target.	Descripción:Nivel Automático Hi Target

3.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

Se presenta el registro del seguimiento en el formato establecido para tal fin, con el respectivo reporte de los materiales recibidos en el presente periodo. (***Anexo 8 Trazabilidad de los materiales)***

3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Se presentan a continuación todas las actividades realizadas en este periodo las cuales de efectuaron con todos los lineamientos técnicos y de calidad exigidos en el contrato como en las especiaciones técnicas del IDRD.

Se aclara que todas las actividades realizadas se han ejecutado bajo la supervisión de la interventoría y se han aplicado los controles establecidos en el plan de calidad; los procesos constructivos se han llevado acabo de acuerdo a os establecido en las especificaciones técnicas y la normatividad vigente NSR-10 entre otras, se han realizado los ensayos establecidos, y se gestiona la consecución de los certificados de calidad, aunque en este último en ocasiones nos demoran las entregas, se anexan las actas en puesta en servicio aunque están no corresponden a la entrega y recibo a satisfacción de las actividades realizadas en obra.
Como evidencia de que las cosas se efectúan de esta manera a se presentan las liberaciones respectivas en el anexo 7.***(Anexo 7 Liberaciones)***

3.5.1.ACTIVIDADES EJECUTADAS (EMERGENCIAS)

3.5.1.1. PARQUE EL VIRREY SUR

- Mantenimiento a registros de ½", ¾", 1 ½" y 2" pulgadas, en baños y zona de piscinas.
- Demolición y enchape en zona de registros.
- Limpieza de red sanitaria de baño en zona psicomotricidad
- Desmonte de fluxómetro tipo push del lavamanos.
- Instalación de fluxómetro tipo push del lavamanos
- Instalación grifería (árbol) de baño mujeres.
- Cambio de fluxómetros de duchas zona piscina
- Cambio de fluxómetros de sanitario zona piscina
- Retiro, suministro e instalación de llave fluxómetros en baño mujeres edificio de psicomotricidad y salón múltiple
- Cambio de árbol sanitario baño mujeres zona psicomotricidad y salón múltiple
- Sondeo y limpieza de tubería obstruida en baños zona psicomotricidad y salón múltiple
- Cambio de registro cuarto mantenimiento (cocina) zona administración

3.5.1.2. PARQUE GAITAN CORTES

- Se continua con la instalación de las lonas para la contención y estabilidad del terreno debajo del puente.
- Se finaliza la actividad de instalación de lonas bajo puente número 5 por pérdida de material por lluvias.
- Conexión de tubería de cañuelas a pozo de inspección e instalación de tubería de rebose de pozo.

1121

3.5.1.3. PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA

- Retiro, suministro e instalación de puerta ingreso en la recepción zona de administración.
- Reinstalación y mantenimiento brazo hidráulico puerta zona de recepción e ingreso administración.

3.5.1.4. PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER

- Instalación de techo en PVC zona administración e instalación de luminarias.

3.5.1.5. PARQUE SAN CRISTOBAL

- Raspado con espátula y retiro de pintura en muros zona baños mujeres piscina olímpica y baños hombres del Coliseo
- Aplicación de estuco en muros en zona de baños mujeres, piscina olímpica y baños hombres del Coliseo.
- Aplicación de pintura epóxica en muros de baños mujeres piscina olímpica y baños hombres del Coliseo.
- Reparación en tubería PVC-P 2" en zona baños piso 1 Cinema.
- Cambio de iluminación en senderos y baños del CEFE

3.5.1.6. PARQUE TIMIZA

- Demolición de muro en zona camerinos cancha de futbol.
- Demolición de enchape de piso en zona camerinos cancha de futbol.

3.5.1.7. PARQUE EL JAZMIN

- Demarcación con pintura para tráfico de la cancha de microfútbol.
- Demarcación con pintura para tráfico de la cancha de baloncesto.
- Demarcación con pintura para tráfico de la cancha de voleibol.
- Instalación de postes metálicos de 12 metros de altura.
- Instalación de tubería EMT 1"
- Conexión de tablero de baños

3.5.1.8. PARQUE URBANIZACIÓN BOCHICA

1942

- ❖ Demolición de muro en cerramiento zona cancha de futbol.
- ❖ Muro de mampostería en cerramiento zona cancha de futbol.
- ❖ Pañete de muro en cerramiento zona cancha de futbol.
- ❖ Desmonte, suministro e instalación de módulos en malla eslabonada en cerramiento en zona cancha de futbol.

3.5.1.9. PARQUE TABORA

- ❖ Sondeo y destape de red sanitaria de baños públicos, baños camerinos, baños de técnicos.
- ❖ Reinstalación de orinal baño camerinos.
- ❖ Destape y lavado de caja de inspección principal de 1x1.

3.5.1.10. PARQUE SAN ÁNDRES

- ❖ Aseo y retiro de mantos destruidos
- ❖ Limpieza de placas y bajantes
- ❖ Impermeabilización con manto cubiertas laterales del coliseo.
- ❖ Suministro e instalación de accesorios de bajantes de 4" rotos.

3.5.1.11. PARQUE SERENA

- Baños públicos.
- ❖ Suministro e instalación de llaves de push lavamanos.
- ❖ Suministro e instalación de sanitario tipo institucional
- ❖ Suministro e instalación de lavamanos completo, con llave de push y
- ❖ Suministro e instalación de push de sanitarios.
- ❖ Suministro e instalación de push orinal.

- Baño piscinas
- ❖ Suministro e instalación de push sanitario.

3.5.1.12. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUÁTICO)

- ❖ Destape de tubería de piscina de clavados.
- ❖ Suministro e instalación de lavamanos sobrepuesto.
- ❖ Arreglo de puerta de emergencia en la zona de piscinas.

1143

3.5.1.13. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)

- Retiro de estructura metálica afectada por la caída de árbol en zona de administración.
- Toma de medidas para la presentación de la propuesta de intervención.

3.5.1.14. PARQUE GIMNASIO DISTRITAL DEL NORTE

- Desmonte de reflectores 400w metal halide de la cancha sintética.
- Instalación de reflectores 400w metal halide de la cancha sintética.

3.5.1.15. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)

- Limpieza de pozo de inspección y caja de inspección.

3.5.1.16. PARQUE CIUDAD MONTES

- Durante el periodo de mayo de 2025 se atendió la emergencia con el retiro de escombros provenientes de la cubierta y se realiza reparación de la cubierta.

3.5.1.17. PARQUE PLAZA DE TOROS

- Retiro de cielo raso de la enfermería de toreros, dejando la madera a la vista y retirando los escombros.

3.5.1.18. PARQUE TIMIZA

- Mantenimiento de los arcos de fútbol, incluyendo cordones de soldadura.

3.5.1.19. PARQUE URBANIZACIÓN LA ESTANCIA

- Se realizó visita en donde se evidencia tubería de iluminación suelta en coliseo y también se evidencia corto en circuito de iluminación.

1144

3.5.1.20. PARQUE TERCER MILENIO

- Destape y limpieza de cajas eléctricas CS-274
- Ajuste de tablero eléctrico senderos
- Empalmes de derivación submarinos en cámaras de inspección
- Revisión de acometidas eléctricas de iluminación
- Revisión y cambio de contactores en tablero eléctrico.

3.5.1.20. PARQUE LA FRAGUA

- Destape de cajas y limpieza CS-274.
- Ajuste y mantenimiento de tablero general de distribución.
- Soldadura de cámaras de inspección.
- Cambio de kits y bombillas metal halide de 1000W.
- Cambio de contactor

3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

3.5.2.1. PARQUE NACIONAL (PM-02) ENRIQUE OLAYA HERRERA

- Instalación de tubería y accesorios PVC-P en sanitario zona baños calle 39 y calle 36 (hockey)
- Instalación de válvula antivandálica tipo push en sanitario zona baños calle 39 y calle 36 (hockey)
- Instalación de llaves tipo push para lavamanos en baños calle 36 (hockey)
- Resane en regatas en sanitarios zona baños calle 39 y calle 36 (hockey)
- Enchape de muros en sanitarios zona baños calle 39 y calle 36 (hockey)
- Reinstalación de sanitarios en zona baños calle 39
- Remates de soldadura y pintura en baranda M-83 zona patinódromo
- Cargue y retiro de material sobrante en punto de acopio calle 39
- Cargue y trasiego de baranda desmontada desde zona patinódromo hasta zona administración

3.5.2.2. PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER

1245

- Retiro total del cerramiento existente de altura de 2 m en malla eslabonada.
- Suministro e instalación del cerramiento nuevo en malla eslabonada de 2,5 m
- Suministro e instalación de tapete sintético zona placa
- Construcción de 2 cajas de inspección del cárcamo, con marco y tapa
- Pañete e instalación de marco en cárcamo.
- Desmonte e instalación de luminaria redonda led en camerinos.

3.5.2.3. PARQUE EL PORVENIR

- Desmonte y retiro de rejillas en cárcamos zona plazoletas y pista de patinaje
- Limpieza de cárcamos zona plazoletas
- Reinstalación de rejillas en cárcamos zona plazoletas y pista de patinaje
- Suministro e instalación de rejillas en zona plazoletas y pista de patinaje
- Afinado en pañete de muros en pozos de inspección zona módulos baños
- Desmonte de losetas gramoquin en contorno de módulos de baños
- Vaciado de concreto de limpieza en contorno de módulos de baños
- Muros (bordillos) en ladrillo recocido en contorno de módulos de baños
- Pañete de muros en contorno de módulos de baños.
- Desmonte de piso caucho en zona pista de trote.
- Excavación manual, trasiego y acopio de material en zona pista de trote
- Soldadura y reinstalación de estructura metálica en exterior de módulos de baños.
- Vaciado de concreto en placa de contrapiso en contorno de pozo de inspección sanitario zona módulos de baños.
- Instalación de pasos en varilla corrugada 3/4" en pozos de inspección sanitario y pluvial zona módulos baños.
- Instalación de tubería PVC-P y accesorios en punto medidor EAAB en zona módulos baños.
- Mantenimiento en cerramientos provisionales zona pista de trote.
- Desmonte y reinstalación de losetas gramoquin en zona módulos baños.
- Cargue, retiro y disposición final de RCD acopiado en zona módulos baños.

3.5.2.4. PARQUE VALLES DE CAFAM

- Desmonte, suministro e instalación de láminas de policarbonato en coliseo.
- Suministro e instalación de tapas de concreto cajas de inspección de agua lluvia del parque.
- Suministro e instalación de adoquín para finalizar actividades de mantenimiento de paños en senderos parque
- Instalación de concreto en cintas de ajuste en los paños intervenidos

1146

- Se finaliza actividades de fundición de concreto en cimentación de postes de iluminación e instalación de los mismos en senderos del parque.
- Mantenimiento estructura metálica de voleibol y microfútbol
- Mantenimiento de puerta ingreso del costado sur del Coliseo
- Retiro de adoquín en la zona árbol.
- Instalación de concreto de 3000 PSI en la viga de la zona árbol para delimitar zona blanda.
- Instalación de poste metálico de 9 metros de altura
- Instalación de luminarias solar de 40W.

3.5.2.5. PARQUE PATIO BONITO

- Raspado con espátula y retiro de pintura existente en muros, piso y techo de tanque de almacenamiento de agua potable.
- Impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable.
- Mantenimiento en tapa en escotilla de tanque de almacenamiento de agua potable.

3.5.2.6. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)

- Limpieza de canales
- Excavación mecánica
- Retiro y disposición de material.
- Demolición de viga existente.
- Nivelación de terreno.
- Suministro e instalación de material granular.
- Compactación de material granular.
- Armado y figurado de acero para viga y pilotines.
- Instalación de formaleta.
- Suministro e instalación de concreto para viga y pilotines.
- Suministro e instalación de parales metálicos de cerramiento.
- Elaboración de módulos en taller.
- Limpieza y mantenimiento vigas canales en la cubierta del palacio.

3.5.2.7. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)

- Desmonte de los cucharones de los toboganes de la zona de arenero.

1147

- Mantenimiento y reinstalación de los cucharones de los toboganes de la zona del arenero.
- Instalación de tobogán en la zona de arenero.
- Instalación de tapones de juegos.

3.5.2.8. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUÁTICO)

- Instalación de poste metálico de 9 mts de altura
- Instalación de luminarias solares de 40W. Se usa sistema de paneles solares, no requiere cableado.

3.5.2.9. PARQUE EL COUNTRY

- Instalación de tubería PVC sanitaria Ø 6" (Novafort).
- Instalación de tubería 3/4" para los bebederos.
- Apiques para localizar tubería de bebederos.
- Excavación para la instalación de filtros para bebederos.
- Instalación de filtros para bebederos.
- Excavación e instalación de tubo filtro arenero (zona de juegos).
- Instalación de filtros para zona de juegos y bebederos.
- Nivelación de terreno y configuración del terreno con material seleccionado.
- Descapote y alistamiento zona de bio saludables.
- Instalación de triturado y grava para relleno para zona de juegos y bebederos.
- Nivelación con vibro compactador tipo rana en la zona de juegos.
- Excavación para la instalación de juegos y resbaladero.
- Excavación para la instalación de filtros y cajas de inspección.
- Levantamiento de muros en mampostería en la zona de servicios.
- Demolición de mampostería y pañete.
- Pañete de muros en la zona de juegos.
- Instalación de concreto de 3000 PSI en placas para cajas de inspección.
- Instalación de concreto de 3000 PSI en media placa para la instalación de juego rana.
- Amarre de acero y fundida de viga de amarre.
- Instalación de geotextil NT1600 (no tejido) y geotextil NT 2400 (tejido).
- Costura de geotextil no tejido.
- Instalación de bases para la instalación de bio saludables.
- Retiro de equipos bio saludables para mantenimiento.
- Instalación de Juego circuito Red Muro de Escalar
- Instalación de caneca en acero inoxidable.
- Desmonte de cubierta con ayuda de andamios y normas de seguridad.

1948

- Pintura de perfiles.
- Instalación de sardineles prefabricados A-10 (a=0.20 h=0.50 L=0.8).
- Atraque de sardineles.
- Poda de césped.
- Afinado de mampostería en la zona de servicios.
- Instalación de tubería de filtro para arenero.
- Pulida de madera de piso en la cafetería.
- Demolición de placas y retiro de bebedero existente.
- Construcción de caja de inspección para bebederos.
- Descargue de 2 viajes de arena Peldar.

3.5.2.10. PARQUE BERLIN

- Desmonte de luminarias METAL HALIDE 1000W
- Instalación de luminarias LED 345 W
- Instalación de cajas de derivación de 18 circuitos en poste.
- Instalación de cadena galvanizada.
- Instalación de candados.

3.5.2.11. PARQUE TIMIZA

- Amarre de acero de refuerzo para pilotes y viga de cimentación zona sendero lago.
- Cerramiento provisional en postes de madera y lona en zona sendero lago.
- Suministro y acopio de material: Cemento gris, arena de rio, grava en zona sendero lago.
- Vaciado de concreto de resistencia 3000 PSI en pilotes y viga de cimentación en la zona sendero lago
- Trasiego manual y acopio de RCD.
- Desmonte de luminarias alumbrado público.
- Instalación de luminarias alumbrado público led.

3.5.2.12. PARQUE PALESTINA

- Trasiego y acopio de RCD en zona de juegos.
- Excavación manual, nivelación y compactación mecánica de material granular existente en zona de juegos.
- Protección provisional con polietileno de material granular en zona de juegos.

1147

- Retiro y disposición final de RCD en zona de juegos.
- Instalación de malla electrosoldada 4mm en zona de juegos.
- Vaciado de concreto en placa de contrapiso e=0,10 m en zona de juegos.
- Replanteo e instalación de juegos infantiles.
- ❖ Desmonte de reflectores 400w metal halide.
- ❖ Instalación de reflectores led 200w.

3.5.2.13. PARQUE CAYETANO CAÑIZALES

- Instalación de lámina de superboard en placa de entrepiso zona baño piso 1 del Coliseo mayor
- Pañete en techo de baño piso 1 del Coliseo mayor
- Pintura vinilo tipo 1 en techo de baño piso 1 del Coliseo mayor.

3.5.2.14. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)

- Mantenimiento de juegos en las zonas 2,3,4 y 5 (estructura metálica y estructura plástica)
- Lijado y retiro de pintura de juegos existentes.
- Suministro e instalación de anticorrosivo
- Suministro e instalación de pintura.
- Retiro de piso caucho de la zona 1 y 6.
- Desmonte de juegos existentes de la zona 1 y zona 6.

3.5.2.15. PARQUE SIMON BOLIVAR (PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)

- Desmonte de luminarias METAL HALIDE 1000W en la cancha sintética RUBGY.
- Instalación de luminarias METAL HALIDE 1000W en la cancha sintética RUBGY.

3.5.2.16. PARQUE VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR

- Desmonte de reflectores 1000w metal halide
- Instalación de reflectores 1000w metal halide
- Cambio de contactores Torre 1 de iluminación

1150

3.5.2.17. PARQUE URBANIZACIÓN EL TOBERIN

- Se inicia con el mantenimiento del cerramiento perimetral de la cancha sintética.
- Lijado y retiro de pintura de estructura metálica.
- Suministro e instalación de anticorrosivo.
- Suministro e instalación de pintura.
- Elaboración de módulos en taller para reemplazar los deteriorados

3.5.2.18. PARQUE EL RECREO

- Cerramiento provisional en postes de madera y lona en zona sendero cancha sintética futbol 8.
- Desmonte de losetas y adoquín en zona sendero cancha sintética futbol 8.
- Desmonte y reinstalación de bordillo en concreto zona sendero cancha sintética futbol.
- Raspado, trasiego y acopio de arena en capa de soporte zona sendero cancha sintética futbol 8.
- Suministro y acopio de material: Cemento gris, arena de peña, arena mixto zona sendero cancha sintética futbol 8.

3.5.2.19. PARQUE SANTA CLARA

- Instalación de postes metálicos H=12 m en zona cancha sintética futbol 8.
- Instalación de párales metálicos para prolongar cerramiento en malla eslabonada zona cancha sintética
- Suministro e instalación de malla nylon sobre malla contra impacto y malla eslabonada zona cancha sintética
- Instalación de postes metálicos de 12 mts de altura

3.5.2.20. PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO

- Ajuste y mantenimiento de tablero cancha sintética
- Desmonte y cambio de contactor tablero de distribución principal.
- Corte de peldaños mástiles de 18 m de altura
- Desmonte e instalación caja de derivación de 18 circuitos en poste.

1151

3.5.2.21. PARQUE TALLER (EL ENSUEÑO)

- Desmonte de luminarias METAL HALIDE 1000W
- Instalación de luminarias LED 345 W
- Instalación de cajas de derivación de 18 circuitos en poste.
- Instalación de cadena galvanizada.
- Instalación de candados.

3.5.2.22. PARQUE MODELIA SECTOR A

- Desmonte de luminarias METAL HALIDE 1000W de la cancha sintética F-5
- Instalación de luminarias LED 345 W
- Instalación de cajas de derivación de 18 circuitos en poste.
- Instalación de cadena galvanizada.
- Instalación de candados.

3.5.2.23. PARQUE SAN CRISTOBAL – CEFE

- Certificación de ascensor edificio CREA y pendiente mantenimiento y certificación ascensor zona piscina y gimnasio.
- Destape y limpieza de vías de inspección
- Ajuste de mantenimiento
- Revisión de acometida de senderos, cambio de empalmes submarinos
- Revisión de Luminarias de alumbrado público.

3.5.2.24. PARQUE CIUDAD MONTES

- Retiro de arena tipo Peldar, en zona de juegos infantiles
- Excavación manual para instalación de filtro perimetral zona de juegos infantiles
- Retiro de césped en el perímetro en cancha de voleibol playa.

3.5.2.25. PARQUE LA ANDREA

- Se finaliza la limpieza del canal galvanizado y de los bajantes.

- Instalación de flanche en el canal ubicado en la zona de ingreso del Coliseo.

3.5.2.26. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)

- Desmonte de luminarias METAL HALIDE 400W
- Instalación de luminarias LED 200W

3.5.2.27. PARQUE CIUDAD NUEVO MILENIO I ETAPA I

- Instalación de tablero general y control
- Instalación de cableado
- Sistema de puesta a tierra
- Marcación de circuitos
- Conexión de cajas de derivación
- Soldadura en cámaras de inspección

3.5.2.28. PARQUE VILLA NUEVA

- Visita Retie y Retilap

4. CONTROL DE LA GESTIÓN

4.1. CONTROL DE CAMBIOS

A corte del presente informe se presenta el Control de Cambios de Diseño No 1 correspondiente a la pérgola del Country. ***(Anexo 15 Control de cambios de Diseño).***

4.2. SALIDAS NO CONFORMES

En este periodo se hizo seguimiento a las SNC, que para el proyecto son 4 (Ver tabla No 10, se ha gestionado por parte de la gerencia la Salida No Conforme de los presuntos incumplimientos, esto sigue en manos de ellos. Cabe anotar la relevancia de esta salida no conforme, sin embargo, como es un tema de alto impacto para el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 está en tratamiento por parte de la gerencia y el área jurídica para la toma de la acción correctiva pertinente y su debida documentación.

1153

A continuación, se relacionan las Salidas no conformes generadas en el proyecto:

Tabla 10. Salidas No Conformes.

No.	DESCRIPCION	FECHA	PROCESO	TIPO DE ACCION	FUENTE	ESTADO	SEGUIMIENTO
1	Se está incumpliendo con los compromisos adquiridos en comité y por ende con los requisitos contractuales por parte con del Consorcio Belzcon IDRD I, lo cual se está evidenciando en los comités semanales celebrados con la Entidad y la Interventoría los días 26 de noviembre y 03 de diciembre de 2024.	03/12/2024	Gestión Estratégica	SNC	Interventoría	Abierta	En gestión
2	Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, ensayos de laboratorio, caracterizaciones de materiales granulares y diseño de mezclas.	13/01/2025	Calidad	SNC	Interventoría	Abierta	En gestión
3	Incumplimiento de las metas establecidas de los siguientes Indicadores de Gestión: -Índice de cumplimiento de entregables contractuales -Índice de cumplimiento del Plan de Inspección y ensayos: Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, fichas técnicas y frecuencia de ensayos establecida en el plan de inspección y ensayos. -Índice de mejora continua.	23/01/2025	Mejora continua	SNC	Interventoría	Abierta	En gestión

1154

4	Presunto Incumplimiento según lo establecido en los siguientes comunicados: IDRD-4080-G2-2024-025 del 24/12/2024 IDRD-4080-G2-2024-074 del 26/12/2024 IDRD-4080-G2-2024-094 del 30/12/2024 IDRD-4080-G2-2024-130 y IDRD-4080-G2-2024-133 del 17/01/2025 IDRD-4080-G2-2024-142 del 20/01/2025 IDRD-4080-G2-2024-179 y IDRD-4080-G2-2024-187 del 31/01/2025 IDRD-4080-G2-2024-200 del 04/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-203 y IDRD-4080-G2-2024-207 del 5/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-210 del 06/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-220 del 10/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-248 del 17/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-276 del 06/03/2025	24/12/2024	Técnico	SNC	Interventoría	Abierta	En gestión

Ver ***(Anexo 10 Salidas No Conformes)***

4.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Como está previsto desde el Plan de Calidad el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 cuida la propiedad del cliente perteneciente a los clientes o proveedores externos que están bajo su control por lo anterior se identifican, verifican, protegen y salvaguardan las propiedades de los clientes, como registro de ello se utiliza el formato dispuesto por el IDRD dejando las actas donde se evidencie.

En el presente periodo no se gestionaron actas en donde consta el tratamiento a la propiedad del cliente.

4.4. AUDITORIAS

Para el presente periodo se realiza la auditoria correspondiente al 30% de ejecución de obra, esta fue realizada el 23 de mayo, aún no se cuenta con el informe de auditoría, sin embargo, en reunión de cierre se nos informó de dos hallazgos:

1. No aplicación oportuna de la encuesta de satisfacción.

1155

2. Muestras de cilindros de concreto tomadas el 22 de mayo de 2025 sin un curado adecuado.

Durante la realización de la auditoría se visitaron los parques de Simón Bolívar y palacio de los deportes.

se anexan los documentos correspondientes, a la fecha de cierre del informe aún no se cuenta con el informe de auditoría.

Ver ***(Anexo 12 Auditoria)***

4.5. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

En el presente periodo se diseña la encuesta de satisfacción y se envía al IDRD para su respectivo diligenciamiento.

Ver ***(Anexo 13 Encuesta de Satisfacción)***

4.6. PQRFS

Para el presente periodo se generó PQRFS. el 19 de mayo la cual fue tratada adecuadamente y de manera efectiva desde el componente social y se cierra efectivamente el 6 de junio.

Ver ***(Anexo 14 PQRFS)***

5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

- Se realiza la auditoria correspondiente al 30% de ejecución.
-
- En el proyecto se siguen presentando varias inconsistencias en el cumplimiento de las actividades solicitadas por la Entidad y la Interventoría por lo cual se continúa trabajando la SNC de los presuntos incumplimientos.
- Se realizan recorridos y comités de obra en donde se trataron temas de tipo técnico y administrativo de manera eficaz.
- Se continua con la implementación de los formatos establecidos por el IDRD, para la gestión de la Calidad.

- El proyecto ha mejorado en el cumplimiento de los compromisos, sin embargo, sigue la constante en cuanto a la inoportunidad en el cumplimiento de estos, por lo cual se continua con el seguimiento por parte del componente de Calidad y con la implementación del plan de acción establecido en la acción correctiva.
- El área de Calidad reporta que se ha optimizado la gestión del área de compras en cuanto al reporte de materiales recibidos y la exigencia a los proveedores en cuanto a los certificados de calidad y fichas técnicas de los productos suministrados, con el apoyo de nuevos profesionales que se han apersonado del tema y que están subiendo información al DRIVE.
- Se continua con la implementación el Plan de Inspección de Ensayos presentado con el apoyo del laboratorio CONCRELAB.
- Hasta la fecha el proyecto continuó con el personal clave mínimo con el que dio inicio.
- Se ha reflejado una mejora en alcanzar las metas establecidas en los indicadores de gestión.

1157

ANEXOS

Anexo 1 Actas de comité y seguimiento a los compromisos

Anexo 2 Correspondencia

Anexo 3 Bitácora

Anexo 4 Listado Maestro de Documentos

Anexo 5 Plan de Adquisiciones

Anexo 6 Seguimiento al Plan de inspección y ensayos

- Anexo 6 Ensayos de laboratorio
- Anexo 6A Certificados de Calidad

Anexo 7 Control de Topografía

Anexo 8 Trazabilidad de los materiales

Anexo 9 Liberaciones

Anexo 10 Control Salidas No Conformes

Anexo 11 soporte de Indicadores

Anexo 12 Auditoria

Anexo 13 Encuesta de satisfacción

Anexo 14 PQRFS

Anexo 15 Control de Cambios de Diseño


TABLAS

Tabla 1. Esquema Básico de las localidades. 8
Tabla 2.Generalidades Contrato. 9
Tabla 3. Seguimiento a los indicadores. 11
Tabla 4. Recursos Humanos. 13
Tabla 5. Cuadro de Firmas. 14
Tabla 6. Actas Comité. 15
Tabla 7. Maquinaria y Equipos. 17
Tabla 8. Control Equipos Topografía. 19
Tabla 9. registro fotográfico de Equipos de Topografía. 20
Tabla 10. Salidas No Conformes. 34

1159

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización. 7
Ilustración 2. UPZ Bogotá. 8
Ilustración 3. Mapa ubicación de las localidades 9
Ilustración 4, indicadores de gestión. 10



Arq. Patricia Serrano Espinel
Profesional de la calidad
Consorcio Belzcon IDRD 1

1150

ANEXO 2

CORRESPONDENCIA ENVIADA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-S-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
BEL-MPI-ADM-233-25	2-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de certificados de disposición de materiales.	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-234-25	03-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respues a oficios IDRD-4080-G2-2024-355 y IDRD-1080-G2-2024-396 INFORME MENSUAL TECNICO No 5	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-235-25	04-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de informe mensual técnico No 6 V0	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-236-25	04-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Envió cronograma de obra V4, respuesta a comunicado IDRD-4080-G2-2024-368	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-237-25	05-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta a su comunicado IDRD-4080-G2-2024-412: Reiterada solicitud presentación Hoja de Vida Auditor y Plan de Auditoria	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI ADM-238-25	07-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance oficio No. IDRD-4080-G2-2024-227 Solicitud Cambio Hoja de Vida Inspector de obra.	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI ADM-239-25	07-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Subsanación informe de calidad # 5 marzo de 2025, en respuesta a su oficio IDRD-4080-G2-2024-410 - Revisión Informe de Calidad N°5 V.0	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-240-25	08-may-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de informe mensual tecnico No 5 V2 en fisico	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-241-25	08-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de plan de auditoria	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI ADM-242-25	08-may-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	ENTREGA INFORME #5 V.1 COMPONENTE DE CALIDAD A INTERVENTORÍA	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-243-25	10-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Aclaración a los Precios no Previsto No.1		G
BEL-MPI-ADM-244-25	12-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-424 REMISIÓN EXTRACTO Y FORMULARIO DE PAGO - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2025	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-245-25	12-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-429. REMISIÓN REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-246-25	13-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de orden de desembolso No. 25	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-247-25	13-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-432-REITERALA SOLICITUD DE REPORTE DE MATERIALES	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-248-25	13-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-420 INFORME MENSUAL TECNICO No 6	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-249-25	14-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	PROPUESTAS DE DISEÑO DE CAUCHO PARQUE SIMON BOLIVAR SECTOR CENTRAL	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-250-25	15-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-353 DOCUMENTACION DE PARQUE EL COUNTRY	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-251-25	15-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-459 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-252-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN FICHA TÉCNICA ARENA LAVADA Y CLASIFICADA	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-253-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-371 ENTREGA DE PAZ Y SALVOS	ENVIADO	AMCG
BEL-MPI-ADM-254-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-328 REQUERIMIENTO - DOCUEMNTOS SST DEL PERSONAL	ENVIADO	AMCG
BEL-MPI-ADM-255-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-439	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-256-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Remisión cronograma de visitas para certificación de ascensores	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-257-25	17-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-338. Plan De Ejecución De Obras	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-258-25	15-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-251-25 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-259-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta a oficios IDRD-4080-G2-2024-359 e IDRD-1080-G2-2024-443 APREMIO POR EL PRESUNTOINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-260-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-318 Informes de mantenimiento de ascensores por parte de OTIS en los meses de febrero, marzo y abril	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-261-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-435 RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-246-25 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-262-25	20-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de orden de desembolso No. 26	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-263-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega Presupuesto Invernadero – Parque Simón Bolivar Sector Central 13-089	ENVIADO	OC
BEL-MPI ADM-264-25	20-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-456 Radicación Soporte de Rendimientos Financieros Generados del Recurso del Anticipo – ABRIL 2025	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-265-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-447 Legalización Orden de Desembolso No. 8	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI ADM-266-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-448 Legalización Orden de Desembolso No. 9	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-267-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Presupuestos Parques Priorizados Versión 9 - IDRD	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-268-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-468 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-269-25	22-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN DISEÑO AJUSTADO DE LA PÉRGOLA DEL PARQUE EL COUNTRY	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-270-26	23-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance comunicado BEL-MPI-ADM-256-25 Remisión cronograma de visitas para certificación de ascensores	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-271-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-268-25 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-272-25	23-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-425 Estado Actual Juego Circuito Red Muro De Escalar Parque Country	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-273-25	26-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe componente de calidad No 6	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-274-25	27-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Sustento amortizacion anticipo periodo mayo 2025	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-275-25	27-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-462, segunda revisión Informe Técnico No 6	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-276-25	28-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta Pacial de Obra No.5	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-277-25	28-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN INFORME TÉCNICO No. 7 V0 - MAYO	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-278-25	29-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance oficio No. Alcance oficio No.IDRD-4080-G2-2024-457 Solicitud Cambio Hoja de Vida Inspector de obra Vida	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-279-25	30-may-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN DE INFORME #6 ÁREA AMBIENTAL FÍSICO.		AP

1962

ANEXO 2

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	BZC-FO-S-01-D Versión: 1 Página 1 de 1

CONTRATO	IDRD-SG-4060-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONSECUTIVO	FECHA ENVIÓ	MEDIO DE ENVIO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	ESTADO	ELABORÓ
BEL-MPI-ADM-233-25	2-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de certificados de disposición de materiales.	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-234-25	03-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respues a oficios IDRD-4080-G2-2024-355 y IDRD-1080-G2-2024-396 INFORME MENSUAL TECNICO No 5	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-235-25	04-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de informe mensual técnico No 6 V0	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-236-25	04-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Envió cronograma de obra V4, respuesta a comunicado IDRD-4080-G2-2024-358	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-237-25	05-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta a su comunicado IDRD-4080-G2-2024-412: Reiterada solicitud presentación Hoja de Vida Auditor y Plan de Auditoria	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-238-25	07-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance oficio No. IDRD-4080-G2-2024-227 Solicitud Cambio Hoja de Vida Inspector de obra.	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-239-25	07-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Subsanación informe de calidad # 5 marzo de 2025, en respuesta a su oficio IDRD-4080-G2-2024-410 - Revisión Informe de Calidad N°5 V.0	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-240-25	08-may-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de informe mensual tecnico No 5 V2 en fisico	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-241-25	08-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de plan de auditoria	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-242-25	08-may-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	ENTREGA INFORME #5 V.1 COMPONENTE DE CALIDAD A INTERVENTORÍA	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-243-25	10-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Aclaración a los Precios no Previsto No.1		G
BEL-MPI-ADM-244-25	12-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-424 REMISIÓN EXTRACTO Y FORMULARIO DE PAGO - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2025	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-245-25	12-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-429. REMISIÓN REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-246-25	13-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de orden de desembolso No. 25	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-247-25	13-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA IDRD-4080-G2-2024-432-REITERADA SOLICITUD DE REPORTE DE MATERIALES	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-248-25	13-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-420 INFORME MENSUAL TECNICO No 6	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-249-25	14-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	PROPUESTAS DE DISEÑO DE CAUCHO PARQUE SIMON BOLIVAR SECTOR CENTRAL	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-250-25	15-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-353 DOCUMENTACION DE PARQUE EL COUNTRY	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-251-25	15-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-459 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-252-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN FICHA TÉCNICA ARENA LAVADA Y CLASIFICADA	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-253-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-371 ENTREGA DE PAZ Y SALVOS	ENVIADO	AMCG
BEL-MPI-ADM-254-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-328 REQUERIMIENTO - DOCUEMNTOS SST DEL PERSONAL	ENVIADO	AMCG
BEL-MPI-ADM-255-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-439	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-256-25	16-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Remisión cronograma de visitas para certificación de ascensores	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-257-25	17-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-338. Plan De Ejecución De Obras	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-258-25	15-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-251-25 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-259-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta a oficios IDRD-4080-G2-2024-359 e IDRD-1080-G2-2024-443 APREMIO POR EL PRESUNTOINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-260-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-318 Informes de mantenimiento de ascensores por parte de OTIS en los meses de febrero, marzo y abril	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-261-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RESPUESTA A OFICIO IDRD-4080-G2-2024-435 RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-246-25 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-262-25	20-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega de orden de desembolso No. 26	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-263-25	19-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Entrega Presupuesto Invernadero – Parque Simón Bolivar Sector Central 13-089	ENVIADO	OC
BEL-MPI-ADM-264-25	20-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-456 Radicación Soporte de Rendimientos Financieros Generados del Recurso del Anticipo – ABRIL 2025	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-265-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-447 Legalización Orden de Desembolso No. 8	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-266-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-448 Legalización Orden de Desembolso No. 9	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-267-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Presupuestos Parques Priorizados Versión 9 - IDRD	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-268-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-468 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-269-25	22-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN DISEÑO AJUSTADO DE LA PÉRGOLA DEL PARQUE EL COUNTRY	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-270-26	23-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance comunicado BEL-MPI-ADM-256-25 Remisión cronograma de visitas para certificación de ascensores	ENVIADO	RCR
BEL-MPI-ADM-271-25	21-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-268-25 Acta de Actividades No Previstas No.2	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-272-25	23-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-425 Estado Actual Juego Circuito Red Muro De Escalar Parque Country	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-273-25	26-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Informe componente de calidad No 6	ENVIADO	SPSE
BEL-MPI-ADM-274-25	27-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Sustento amortizacion anticipo periodo mayo 2025	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-275-25	27-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-462, segunda revisión Informe Técnico No 6	ENVIADO	CP
BEL-MPI-ADM-276-25	28-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Acta Parcial de Obra No.5	ENVIADO	G
BEL-MPI-ADM-277-25	28-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	REMISIÓN INFORME TÉCNICO No. 7 V0 - MAYO	ENVIADO	PAOC
BEL-MPI-ADM-278-25	29-may-25	CORREO ELECTRONICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	Alcance oficio No. Alcance oficio No.IDRD-4080 G2-2024-457 Solicitud Cambio Hoja de Vida Inspector de obra Vida	ENVIADO	GPCC
BEL-MPI-ADM-279-25	30-may-25	FISICO	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024	RADICACIÓN DE INFORME #6 ÁREA AMBIENTAL FÍSICO.		AP

1164

ANEXO 4
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	02
		Fecha	5/05/2025

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
N/E	NTC ISO 9001	2015	23/09/2015	ICONTEC	N/A	N/A
N/E	CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	10	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE COMITÉ REUNIÓN	2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES	2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	FORMATO DE CUANTIFICACION	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	REGISTRO Y CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL	61	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS_	81	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	LISTA DE CHEQUEO ALMACENAMIENTO EN OBRA	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_CANTIDADES_DE_OBRA_	V2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_INICIO_DEL_CONTRATO_v82	V82	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_REUNIN-COMUNIDAD_v2	V2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	LISTADOASISTENCIAEQUIPOSOCIAL_V1	V1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	V40	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA VECINDAD	1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_CIERRE_DE_LA_INVERSIN_DEL_ANTICIPO_v2	V2	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_DE_CIERRE_DEL_EXPEDIENTE_CONTRACTUAL_v4	V40	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ACTA_ENTREGA_PARA_PUESTA_EN_SERVICIO_V1	V1	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	CONTRATO 4060 DE 2024	N/E	9/09/2024	IDRD	N/A	N/A
N/E	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES	N/E	N/E	IDRD	N/A	N/A
N/E	ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1	9/09/2024	IDRD	N/A	N/A
N/E	PRESUPUESTO	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 0	N/A	N/A
N/E	PROGRAMA DE OBRA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	PLAN DE GESTION DE RCD	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
N/E	SG-SST	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GES-01	PLAN DE CALIDAD	02	12/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GCO-01	PLAN DE ADQUISICIONES	01	29/11/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GC-01	CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GC-02	CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT - GES-01	MATRIZ LEGAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT - GES-02	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT- GCM -01	MATRIZ DE PRESERVACIÓN DE MATERIALES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-MC-01	MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-GT-01	METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-GT-02	MODIFICACIONES, AJUSTES Y COMPLEMENTOS A LOS DISEÑOS "MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS"	01	12/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
PR-MC-02	PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PR-MC-03	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GT-01	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	02	12/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PL-GT-02	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	01	29/11/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
PR-GCM-01	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS "PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE"	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GCM-01	ORDEN DE PEDIDO	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GCM-03	TRAZABILIDAD Y UBICACIÓN DE MATERIALES	01	29/11/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GCM-04	CONTROL DE MATERIALES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
FO-MC-01	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-02	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-03	PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-04	PLAN DE AUDITORIA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-05	INFORME DE AUDITORÍA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-MC-06	CALIFICACIÓN DE AUDITORES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
FO-GES-01	SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	N/A	N/A
FO-MC-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	02	5/05/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A
MT-MC-02	SEGUIMIENTO A LAS SALIDAS NO CONFORMES DEL CONTRATISTA EJECUTOR	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	N/A	N/A

1966

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	02
		Fecha	5/05/2025

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIÓN
N/A	PROGRAMACIÓN	01	12//02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 1 la cual fue entregada desde la entrega de documentación contractual en esta no se genera desglose por parque ya que no se habia priorizado la totalidad del presupuesto	La primera versión de la programación se entrega con la documentación contractual (ING NESTOR)
N/A	PROGRAMACIÓN	02	27/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 2 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 10.075.892.217.	se realiza mesa de trabajo con el profesional Carlos Figueroa revisión a V2 de programación
N/A	PROGRAMACIÓN	03	11//04/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 3 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 11.613.285.894,05.	observaciones a la programación enviada mediante oficio IDRD-4080-G2-2024-368
N/A	PROGRAMACIÓN	04	14//04/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Cronograma de obra versión 3 se incluyen parques priorizados con un presupuesto de $ 11.613.285.894,05 con la inclusión de Recursos de personal en obra.	Se realiza consulta en mesa de trabajo de presupuestos y se concilia la inclusión de recursos de mano de obra según rendimientos APU´s en los parques pendientes por ejecutar.
N/A	PRESUPUESTO	01	11/12/2024 19/12/2024 12/01/2025 17/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se presenta versión 1 a la interventoria desglosada de la siguiente manera: $ 1.254.609.215 $ 4.162.991.794 $ 7.587.391.496 $ 13.077.262.339	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoria
N/A	PRESUPUESTO	02	30/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se presenta versión 2 a la interventoria de la siguiente manera: $ 17.977.182.451	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoria
N/A	PRESUPUESTO	03	11/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Se presenta versión 3 a la interventoria de la siguiente manera: $ 15.812.803.155	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoria
N/A	PRESUPUESTO	04	11/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	Se presenta versión 4 a la interventoria de la siguiente manera: $ 6.104.509.647	Se presenta versión 4 a interventoria por un valor de: $16.673.710.493 esta, sin embargo el valor del presupuesto aprobado el 11 de febrero es de $6.104.509.647
N/A	PRESUPUESTO	05	28/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	Se realiza mesa de trabajo el 28/02/2024 en las instalaciones de la interventoria con presencia del apoyo a la supervisión la Arq. Angelica Romero donde se aprueba versión 5 con un presupuesto aprobado total de $ 10.075.892.217,00	Se presenta versión 5 a interventoria por un valor de: $18.025.519,139 el 22 de febrero de 2025, sin embargo el valor del presupuesto aprobado de $ 10.075.892.217,00
N/A	PRESUPUESTO	06	14/03/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 2	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envio de la versión 6 de presupuesto el día 11/03/2025, la interventoria realiza sus revisiones y por parte del apoyo a la supervisión la Arq. Angelica Romero se aprueba versión 6 con un total de $ 10.254.283.729 en día 14/03/2025	Se presenta versión 6 de presupuesto el día 11/03/2025, se aprueba versión 6 con un total de $ 10.254.283.729 en día 14/03/2025
N/A	PRESUPUESTO	07	28/03//2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 3	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 7 de presupuesto el día 22/03/2025 la interventoria realiza sus revisiones y por parte del apoyo a la supervisión la Arq. Iván Velásquez se aprueba versión 7 con un total de $ 11.613.285.895,00 – 28/03/2025	Se presenta versión 7 de presupuesto el día 22/03/2025, se aprueba versión 7 con un total de $ 11.613.285.895 en día 28/03/2025
N/A	PRESUPUESTO	08	27/04/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 4	De acuerdo a las nuevas priorizaciones y a las observaciones presentadas se realiza el envío de la versión 8 el día 27/04/2025 con un total de presupuesto aprobado de $ 12.679.492.218,00, como se pretende realizar la aprobación del 100% del presupuesto del contrato se genera un alcance a este presupuesto ya que existen actividades por incluir y otras por aprobar. Este presupuesto se encuentra en revisión por parte de la interventoria.	Esta versión no tiene aprobación por parte de la interventoria

1167

ANEXO 5

PLAN ADQUISICIONES

	PLAN DE ADQUISICIONES	Código:	PL-GCO-001
		Versión:	01
		Fecha	29/11/2024

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO ADOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD' GRUPO 2 - PARQUES
CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 26
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No. CONTRATO: 4600 DE 2024

PLAN DE ADQUISICION DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO
	PARQUES EN INTERVENCION CONTRATO 4														
1	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	01-031	Vecinal	6	PARQUE NACIONAL	05-015	Zonal	11	EL PORVENIR	07-091	Zonal	16	MILENTA TEJAR SAN ELISEBIO	15-099	Metropolitano
2	URBANIZACION EL TOBERIN	01-070	Vecinal	7	URBANIZACION MIRAVALLE	05-042	Zonal	12	VILLEMAR	09-013	Zonal	17	EL JAZMIN	15-104	Vecinal
3	DESARROLLO VERSENAL 8 SECTOR	01-139	Vecinal	9	CIUDADELA NUEVO USME	01-010	Vecinal	13	PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE	10-031	Zonal	18	PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)	15-119	Vecinal
4	URB CALLE 170	15-048	Vecinal	8	CIUDAD NUEVO MELIPAL	05-078	Zonal	14	ALCAZARES	12-017	Intercalo Deporti	19	DESARROLLO PALERMO SUR	15-031	Metropolitano
5	EL COUNTRY	01-005	Zonal	10	GRAN COLOMBIANO	07-049	Zonal	15	EL RENACIMIENTO	14-038	Metropolitano	20	PUEBLOS JORGE ELCABALLER	15-088	Zonal

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR	UND	CANT	FRENTE DONDE SE USARA	Proceso de selección y selección proveedor	Proveedor seleccionado	Llegada (con contratos, orden de servicio u orden de compra	Fecha programada de llegada a obra	Fecha de llegada a obra	Cumple SINO	OBSERVACIONES						
											ene-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-27	abr-27	may-27
1.0	*PRELIMINARES*																
1.1	Cerramento lona h=2,20 mts(Cal) **	mt	500	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO, URBANIZACION EL TOBERIN, DESARROLLO VERSENAL 8 SECTOR, URB CALLE 170, CIUDAD NUEVO MELIPAL, URBANIZACION MIRAVALLE, CIUDADELA NUEVO USME, CIUDAD NUEVO MELIPAL, GRAN COLOMBIANO, EL PORVENIR, VILLEMAR, PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE, ALCAZARES, EL RENACIMIENTO, MILENTA TEJAR SAN ELISEBIO, PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS), DESARROLLO PALERMO SUR, PUEBLOS JORGE ELCABALLER	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	21/1/2025	NA	NA	NA	OP 005	NA	OP 141 DEL 18-4-25 2 UND P, SIMON BOLIVAR entregada 22-04-25. OP 147 DEL 22-4-25 2 UND P, SIMON BOLIVAR entregada 24-04-25. OP 158 DEL 29-4-25 85 ROLLECOS P, SIMON BOLIVAR	NA
2.0	*AGREGADOS*																
2.1	Relleno Recebo Subbase granular (Compactacion)**	m3	120	EL RENACIMIENTO, PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE, EL PORVENIR, VILLEMAR, NUEVA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FONCA	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	22/01/2025	NA	NA	NA	NA	Llegaron 2 m3 el 22/1/2025.	NA	NA	NA	NA
	6-400	m3	41	PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	DIDACTA	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	23/01/2025	NA	NA	NA	NA	op 34 del 27 de enero de 2025, se compraron 41 m3	NA	NA	OP 192 DEL 2-6-25 41m3 P. PLANTA SIT	NA
					REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FONCA	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE, DICIEMBRE	29/11/2024 , 10/12/2024	NA	op 5 de 28 de noviembre de 2024 compra de 37 m3	op 18 17/12/2024, se compraron 22 m3	NA	NA	op 12/3/2025, se compraron 20 m3, parque NA	NA	NA	NA
	8-400	m3		PLANTA EL SALITRE, PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	DIDACTA	ORDEN DE SERVICIO	ENERO, FEBRERO	29/01/2025 , 20/02/2025	NA	NA	NA	op 34 del 27 de enero de 2025, se compraron 19 m3	op 24 20/02/2025, se compraron 68 m3	NA	NA	NA	NA
2.2	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion	m2	200	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SUSTRAMA GRETA	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	29/11/2024	NA	OP 06 DE 29 de nov de 2024	NA	NA	NA	NA	NA	OP 157 DEL 15-5-25 geotex h=100 x 1,53 m ancho para 12M P, CUNTRY
	Geotextil T-2100 Suministro e instalacion	m2		PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ALBATROS	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE A ENERO	2/1/2025	NA	OP 06 DE 29 de nov de 2024, se compra 1 rollo	NA	OP 47 27/01/2025, se compra 1 rollo de geotextil largo T2100 X416 mts	NA	NA	NA	OP 157 DEL 15-5-25 geotex h=100 x 1,53 m ancho para 12M P, CUNTRY, OP 158 geotex h=100 x 1,53 m ancho para 6M P, CUNTRY
2.3	ARENA PEDDAR (Sum+Instal) Para Playa	m3	220	Cantil, Ciudad Hunza	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FONCA	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	29/03/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ARENA DE PEÑA	m3		PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FERMEDESPOSITO S.A.S	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE Y ENERO	24/12/2024 , 21/1/2025	NA	NA	op 25 26/12/2024, se compraron 5 m3 El 24/12/2024 llegan 1 m3, El 27/12/2024 llegan 5 m3	El 09/1/2025 llegaron 1m3, 17/01/2025 llegaron 5 m3 y el 23/01/2025 3 m3	NA	NA	OP 176 DEL 21-5-25 4m3 P, NACIONAL, OP 180 DEL 3-6-25 1m3 P, TIMIZA	OP 160 DEL 6-5-25 1m3 P, CUNTRY, OP 180 DEL 3-6-25 1m3 P, BURGOS	
	ARENA DE RIO	m3		PARQUE TIMIZA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FERMEDESPOSITO S.A.S	ORDEN DE SERVICIO			NA	NA	NA	NA	NA	NA	OP 135 DEL 21-4-25 4m3 P, TIMIZA. OP 153 DEL 25-4-25 2m3 P, SANTA CLARA. OP 156 DEL 28-4-25 1m3 P, COMPLEJO ACUATICO	OP 184 DEL 15-05-25 15 LONAC P, BURGOS
2.4	Geotextil NT-1500** - Suministro + instalacion	m2	150	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SUSTRAMA GRETA	ORDEN DE SERVICIO	ABRIL	1/04/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.5	Capa Filtrante en Triturado 3/4"a1" + Cemacon	m3	110	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SUSTRAMA GRETA	ORDEN DE SERVICIO	ABRIL	1/04/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.6	Filtro geotron plano tubería 160 mm h=1,0 **	mt	60	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SUSTRAMA GRETA	ORDEN DE SERVICIO	ABRIL	1/04/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.7	RELLENO EN RAJON SUMINIST	m3	60	PTAR CALITRI	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FONCA	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE	24/12/2024	NA	NA	Op 24 del 24/12/2024 llego 24 m3	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.0	*CONCRETOS*																	
3.1	concreto de 3000 psi	m3	15	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	TOMAS DEL CEMENTO	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE A FEBRERO	29/11/2024 , 27/01/2025	NA	op 07 de 29 de nov de 2024	NA	op 37 del 27/01/2025, se compraron 24 m3	NA	OP 37 15-1-2025, 17 M3 P. NACIONAL	NA	OP 174 17-5-2025, 14,5 M3 P. PALESTINA
	Cemento gris x 50 kg	Und	50	PARQUE PERICACHO		HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	29/11/2024	NA	op 01 de 20 de nov de 2024, se compran 50 bultos	NA	NA	NA	NA	NA	OP 144 15-5-25 11 BULTOS CEMENTO P. CUNTRY, OP 146 15-5-25 7 BULTOS P. RECREO, OP 184 DEL 15-5-25 1 BULTO P. BURGOS, OP 186 DEL 15-5-25 4 BULTOS P. CUNTRY
			20	PARQUE NACIONAL		FERMEDESPOSITO S.A.S		DICIEMBRE	27/12/2024	NA	NA	op 25 de 26/12/2024, se compraron 20 bultos	NA	NA	OP 90 15-4-25 20 bultos cemento gris para el parque NACIONAL OP 176 DEL 21-5-25 20 BULTOS	OP 135 DEL 21-4-25 20 BULTOS CEMENTO P. TIMIZA. OP 153 DEL 25-4-25 20 BULTOS CEMENTO P. SANTA CLARA	NA
				PARQUES CERROTOR, TOBERIN, VERSENAL 170		EXITO		NOVIEMBRE A ENERO	29/11/2024	NA	op 03 28/11/2024, se compraron 20 bultos (Argos)	op 11 4/12/2024, se compraron 40 bultos (Argos)	op 46 30/01/2025, se compraron 14 bultos	NA	NA	OP 176 21-5-25 14 BULTOS CEMENTO P. CUPRESO ACUATICO	NA
	Mixto	m3		PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FERMEDESPOSITO S.A.S	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE	4/12/2024	NA	NA	op 12 del 4/12/2024 se compran 5 m3	NA	NA	NA	OP 127 DEL 7-4-25 3m3 P, NACIONAL	OP 183 DEL 13-05-25 1M P, COUNTRY, OP 184 DEL 15-05-25 1M P, RECREO
				PARQUE NACIONAL				DICIEMBRE	12/12/2024	NA	NA	op 15 del 12/12/2024 se compran 3 m3	NA	NA	NA	NA	NA
				PARQUES CERROTOR, TOBERIN, VERSENAL 170		EXITO		ENERO	29/01/2025	NA	NA	NA	op 46 del 30/01/2025 se compran 30 bultos de 40 kg	NA	NA	NA	NA
	GRAVA 1"	m3	2		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FERMEDESPOSITO S.A.S	ORDEN DE SERVICIO		5/01/2025							OP 135 DEL 21-4-25, 2 m3 GRAVA 1" P, TIMIZA. OP 153 2m3 P, SANTA CLARA. OP 156, 28-4-25 1m3 P, COMPLEJO ACUATICO	OP 183 DEL 13-05-25 3M P, COUNTRY. OP 184 DEL 15-05-25 15 LONAC P, BURGOS
4.0	*ACEROS*																	
4.1	malla electrosoldada 4 mm 20*20	m2	150	EL RENACIMIENTO, PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EXITO	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE	27/12/2024	NA	NA	Op 09 Se compran 12 und el 30/12/2024	NA	NA	NA	OP 191 DEL 29-5-25 10 UND P, PORTENIR	OP 171 DEL 14-5-25 10 UND P, PALESTINA
4.1				PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ALBATROS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	21/01/2025	NA	NA	NA	OP 47 27/01/2025, se compra 6 mallas	NA	NA	NA	NA
	VARILLA CORRUGAD DE 1/2" * 6 MTR	UNO	23		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FERRETERIA SANTA CRISTINA	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	21/01/2025							OP 129 DEL 8-4-25 58 UND P, TIMIZA	NA
	VARILLA CORRUGAD DE 3/8" * 6 MTR	UND	30		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ALTIMETROS ANDES LIMITADA SAS	ORDEN DE SERVICIO									OP 129 DEL 8-4-25 76 UND P, TIMIZA	OP 164 DEL 13-5-25 80UND P, COUNTRY, OP 195 DEL 26-05-25 14 UND P, COUNTRY
	ALAMBRE NEGRO	KG	25		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ALTIMETROS ANDES LIMITADA SAS	ORDEN DE SERVICIO									OP 129 DEL 8-4-25 25 KG P, TIMIZA	OP 195 DEL 26-05-25 2KG P, COUNTRY
5.0	*SEÑALIZACION*																	
5.1	SEÑAL IDGE 1 CARA	UND	50	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO, URBANIZACION EL TOBERIN, DESARROLLO VERSENAL 8 SECTOR, URB CALLE 170, CIUDAD NUEVO MELIPAL, URBANIZACION MIRAVALLE, CIUDADELA NUEVO USME, CIUDAD NUEVO MELIPAL, GRAN COLOMBIANO, EL PORVENIR, VILLEMAR, PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE, ALCAZARES, EL RENACIMIENTO, MILENTA TEJAR SAN ELISEBIO, PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS), DESARROLLO PALERMO SUR, PUEBLOS JORGE ELCABALLER	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO, ABRIL	19/03/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.2	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm^2 cara (Sum + Inst)	UNO	35	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO, URBANIZACION EL TOBERIN, DESARROLLO VERSENAL 8 SECTOR, URB CALLE 170, CIUDAD NUEVO MELIPAL, URBANIZACION MIRAVALLE, CIUDADELA NUEVO USME, CIUDAD NUEVO MELIPAL, GRAN COLOMBIANO, EL PORVENIR, VILLEMAR, PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE, ALCAZARES, EL RENACIMIENTO, MILENTA TEJAR SAN ELISEBIO, PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS), DESARROLLO PALERMO SUR, PUEBLOS JORGE ELCABALLER	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	21/1/2025	NA	LLEGARON EN ENERO A OBRA PARQUES CERROTOS, TOBERIN, VERSENAL, CALLE 170, SERVITA, FLORENCIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 25
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4069 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO				
5.3	SEÑAL SE-120 2 CARAS			UND	40	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO, URBANIZACION EL TOBERIN, DESARROLLO TERRENAL III SECTOR ANN D'ALLE 173 #2, COUNTRY PARQUE NACIONAL, URBANIZACION MIRA VALLE, CIUDADELA NUEVO USME, CIUDADELA NUEVO USME COLOMBIANO, EL PORTAL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE - DICIEMBRE		N/A	Legrem Señales SC 120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.4	SEÑAL SC-60 2 CARA			UND	40	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO, URBANIZACION EL TOBERIN, DESARROLLO TERRENAL III SECTOR ANN D'ALLE 173 #2, COUNTRY PARQUE NACIONAL, URBANIZACION MIRA VALLE, CIUDADELA NUEVO USME, CIUDADELA NUEVO USME COLOMBIANO, EL PORTAL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO - ABRIL		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.5	Señal Informativa 1 Cara			UND	25	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO, URBANIZACION EL TOBERIN, DESARROLLO TERRENAL III SECTOR ANN D'ALLE 173 #2, COUNTRY PARQUE NACIONAL, URBANIZACION MIRA VALLE, CIUDADELA NUEVO USME, CIUDADELA NUEVO USME COLOMBIANO, EL PORTAL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO - ABRIL		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.6	LAMINA SEÑAL 100x50			UND	16	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO, URBANIZACION EL TOBERIN, DESARROLLO TERRENAL III SECTOR ANN D'ALLE 173 #2, COUNTRY PARQUE NACIONAL, URBANIZACION MIRA VALLE, CIUDADELA NUEVO USME, CIUDADELA NUEVO USME COLOMBIANO, EL PORTAL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO - ABRIL		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.7	Arnes/bulldirect(Tubo+eslabon+Dado			UND	15	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO, URBANIZACION EL TOBERIN, DESARROLLO TERRENAL III SECTOR ANN D'ALLE 173 #2, COUNTRY PARQUE NACIONAL, URBANIZACION MIRA VALLE, CIUDADELA NUEVO USME, CIUDADELA NUEVO USME COLOMBIANO, EL PORTAL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO - ABRIL		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.0	MOBILIARIO																		
6.1	CANECAS ACERO INOXIDABLE			UND	25	PARQUE NACIONAL - SIMON BOLIVAR - FLORES	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO - ABRIL	10/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.2	Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi+Sum+ Instal.**			UND	8	EL CAMIN	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO - ABRIL	MARZO - ABRIL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.3	TEJA ETERNIT No. 6+tornillos+Sikaflex			UND	1	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ENERO DE 2025 - 1307	MARZO - ABRIL	MARZO - ABRIL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OTP PLAN 3-1 ORDEN DE COMPRA 117 DEL 27 MARZO	N/A	N/A
6.4	BANCA EN MADERA M-50			UND	65	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	HOMECENTER - DICOLLANTAS	2511-2024 - 3172-24 - 4172-24	N/A	op 4 de 28 del 27 nov de 2024 se compraron 30 bancas	El 03/12/2024 llegaron 4 und y el 9/12/2024 llegaron 10 und	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.5	ESTRUCTURA VOLEIBOL (SUM + INST)			UND	4	EL PORTAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO - ABRIL	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.6	RED DE VOLEIBOL (SUM + INST)			UND	4	EL PORTAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO - ABRIL	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	42. BARANDA CERRAMIENTO M+I EE			ML	209	NACIONAL, CAMELLO ACUATICO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	APACO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO - ABRIL	14/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA EN EJECUCION, PARQUE NAL NO SE INSTALAN MALLA	N/A	N/A
7.0	JUEGOS INFANTILES																		
7.1	Juego titanio Balancin sectorial 5-12 años			UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	N/A	FEBRERO - MARZO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA EN EJECUCION, PARQUE NAL NO SE INSTALAN MALLA	N/A	N/A
7.2	Juegocuerdas (pirámide) 2-6 años Cap: 22			UND	1	EL CAMPIN (ya aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	Factura proforma 2025-01 del 07/01/2025	FEBRERO - MARZO	17/1/2025	N/A	N/A	N/A	Llego a obra	N/A	N/A	N/A	N/A
7.3	Juego Torre desafiadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 5-12 años Cap 20 niños			UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	N/A	FEBRERO - MARZO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.4	Juego Musical Infantil Xilófono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños			UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	N/A	FEBRERO - MARZO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.5	Juego Musical Infantil Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 4 niños			UND	1	EL CAMPIN (ya aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	Factura proforma 2025-01 del 07/01/2025	FEBRERO - MARZO	17/1/2025	N/A	N/A	N/A	Llego a obra	N/A	N/A	N/A	N/A
7.6	Juego de balanzas y rotation 5-12 años			UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	N/A	MARZO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.7	Juego titanio 2 + años Capacidad 6 niños			UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	N/A	MARZO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.8	JuegoconcaballoRedHuroEscalarRodeodoro 2+12a?oCap:20N/			UND	1	EL CAMPIN (ya aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	Factura proforma 2025-01 del 07/01/2025	FEBRERO - MARZO	17/1/2025	N/A	N/A	N/A	Llego a obra	N/A	N/A	N/A	N/A
7.9	Juego titanio Balancin sectorial 5-12 años			UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	N/A	MARZO - ABRIL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	APROBADO 24 FEB	N/A	N/A
7.10	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE SU 1+a?osCap:5 niños P.M			UND	1	EL CAMPIN (ya aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	Factura proforma 2025-01 del 07/01/2025	FEBRERO - MARZO	17/1/2025	N/A	N/A	N/A	Llego a obra	N/A	N/A	N/A	N/A
7.11	JUEGO EXCAVADORA ARENA 2 + ARCO SANTA ANA			UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	N/A	MARZO - ABRIL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.12	Juego Animal 3D (EPDM) Forma mesquite 2 a 5 años			UND	1	EL CAMPIN (ya aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PALEPCO	Factura proforma 2025-01 del 07/01/2025	FEBRERO - MARZO	17/1/2025	N/A	N/A	N/A	Llego a obra	N/A	N/A	N/A	N/A
8.0	ELECTRICOS																		
8.1	BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst)			UND	40	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	OC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra enviar)	N/A	N/A	N/A
8.2	Sum+Instal Kit Luminaria1000W enhanced contents/ea			UND	40	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	OC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra enviar)	N/A	N/A	N/A
8.3	BOMBILLO AHORRADOR DE 32W (SUM+INST) **			UND	40	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	OC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra enviar)	N/A	N/A	N/A
8.4	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).			ml	100	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	OC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra enviar)	N/A	N/A	N/A
8.5	Cable Alumeso N°8 (Sum + Instalacion)			ml	100	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	OC 014 25/01/2025 se compraron 457 ML	N/A	OC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra enviar)	PARQUE NUEVO MILENIO SE INSTALAN 727 ML + PARQUE TEJAR NS 145 ML	N/A	N/A
8.6	Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP Cott+T+I			UND	40	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	OC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra enviar)	PARQUE TEJAR SE INSTALAN 1 UND	N/A	N/A
8.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2.4 m			UND	40	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	OC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra enviar)	PARQUE NUEVO MILENIO SE INSTALAN 10 UN	N/A	N/A
8.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE PROYECTOR DE 1000 HASTA 1500W PARA KIT METALAR			UND	40	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	OC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra enviar)	N/A	N/A	N/A
8.9	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).			ml	100	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	OC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra enviar)	N/A	N/A	N/A
8.10	Cable Alumeso 4/0 - AWG- 600V-75°C			ml	100	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	OC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra enviar)	PARQUE TEJAR SE INSTALAN 105 ML	N/A	N/A
8.11	Cable Alumino Aislado 1/0 THW (Suministro+Instalac)			ml	100	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	OC 005 24/01/2025 se compraron 250 ML	24/01/2025	PARQUE NUEVO MILENIO SE INSTALAN 95 ML	N/A	N/A
8.12	LUMINARIA LED 82W (SUM) 5700K = 117,880LM = IP65 = K20 (SUM+INS)			UND	40	PLAZA DE JORGE E CAVALIER, PARQUE INDUSTRIAL LUIS EDUARDO MEJIA, MILENIA TEJAR SAN JOSE DE CASTILLA, NUEVO USME, EUSEBIO, SUEL, VILLA DANUBIO AZUL DE TIBANDUTE, SALITRE, VILLA DANTE, EL REMANSO, ESTACION TEJAR, SAN EUSEBIO, EL ALPINO, PARQUE INDUSTRIAL, LUIS EDUARDO, LOS ANDES, EL PALOMAR, LA ISLA, EL JORGE, EL CANADIENSE, NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	OC 014 31/01/2025 se compraron 37 luminarias	N/A	OC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra enviar)	N/A	N/A	N/A
	LUMINARIAS LED 345W			UND	124	SAN ANDRES, VALLES DE CAFAM, LA GAITANA, NUEVO MILENIO, NUEVO MILENIO 2 Y NUEVO USME	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	14/3/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14 DE MARZO	PARQUE LA GAITANA SE INSTALAN 20 UN	N/A	N/A
	TUBERIA IM 3/4"			ML	64	NUEVO MILENIO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ABRIL	11/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26 DE MARZO	PARQUE NUEVO MILENIO SE INSTALAN 64 ML	N/A	N/A
	TUBERIA IM 1-1/2"			ML	64	NUEVO MILENIO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ABRIL	11/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26 DE MARZO	PARQUE NUEVO MILENIO SE INSTALAN 64 ML	N/A	N/A
	Cable Alumeso N°2/0 (Sum + Instalacion)			ml	376	TEJAR	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	4/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	Aplar	PARQUE TEJAR SE INSTALAN 279 ML	N/A	N/A

4430

CONTRATISTA: CONSORCIO BELICON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 25
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICION DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO				
	PANEL REDONDO				UND	80	SAN CRISTOBAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	VIAJES ABRIL	2545	N/A	N/A	N/A	N/A	22-ene	PARQUE SAN CRISTOBAL AC INSTALACION	N/A	N/A
	TABLERO GENERLA DE DISTRIBUCION				UND	1	CAFAM DE GAVILANES	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	UNICO	2705/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	27/01/2025	PARQUE CAFAMGDE GAVILANES	N/A	N/A
	LUMINARIAS LED 200W				UND	78	UDS. PALESTINA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	UNICO	14/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2025	PALESTINA UDS	N/A	N/A
1.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS																		
1,1	CAJA INSPECCION ABLABLAS				UND	6	EL REMANSO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SUMINISTRO DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO	PUNTO FIJO ENERO, MARZO A ABRIL	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9,20	Tubería PVC,S (mM"+Accesorios **				ml	100	EL REMANSO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SUMINISTRO DIRECTA	ORDEN DE SERVICIO	QUINCENAL - RESPECTO A MARZO A ABRIL	1/04/2025	N/A	N/A	CM 003 del 29/12/2024, se compraron accesorios. CM 005 del 27/12/2024, se compran varios accesorios. CM 004 del 31/12/2024, se compran varios accesorios.	Clf 004 del 05/01/2025, se compraron varios accesorios. Clf 004 del 07/01/2025, se compraron flotadores mecanicos. Clf 005 del 14/01/2025, se compraron codos y tubos. Clf 005 del 17/01/2025, se compraron varios accesorios. Clf 005 del 18/01/2025, se compraron sifon botella y desague sencillo. Clf 005 del 21/01/2025, se compraron varios accesorios. Clf 005 del 25/01/2025, se compraron varios accesorios. El 27/01/2025, se compraron varios accesorios.	Op 36 del 03/02/2025, se compraron varios accesorios. Op 051 y 062 del 18/12/2025, se compran varios accesorios.	OP 83 VALVE 3/4 PL TUBO WATTS PARQUE PORVENIR	N/A	N/A
9,30	TUBO PVC SANITARIO 4" ASML SINOPSA				ml	100	EL REMANSO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SUPERMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	1/04/2025	N/A	Op 003 EL 27/11/2024, se compro 1 tubo sanitario 6"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.0	MAMPOSTERIA																		
10,1	Muro ladrillo recocido Mart,1.4 **				m2	25	EL REMANSO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SUPERMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	MARZO A ABRIL	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 140 DEL 7/10/25 40 UNDS P. CDAPRO
10,2	Muro bloque No 5 Tabique pañetar				m2	25	EL REMANSO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EXITO	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	29/11/2024	N/A	op 3 29/11/2024, se compraron 110 und	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11.0	PISOS Y ACABADOS																		
11,1	Piso Salitosa Gran Marmol 33x33cm pulir, Un				m2	12	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	DHLOGISTICS COLTA	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE A ABRIL	24/12/2024	N/A	N/A	op 23 29/12/2024, se compraron 24 m2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11,2	GRAVILLA MONA LAVADA + Acabado - incluye dilatador en bronce				m2	12	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SUPERMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11,3	GRANITO BLANCO NEVA LAVADO anchio Hab 0,15 **				m2	12	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SUPERMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11,4	PISO DECK PLASTICO 40%MADER+60%PLASTI-TAB,140M				m2	5,18	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SC SUMINISTRO SAS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO + MARZO	14/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 49 19/02/2025, se compraron 5,18 m2 Deck Ecodeck WPC 25 X 14 CM y 2 CM de espesor trafico comercial TERA o CHOCOLATE.	N/A	N/A	N/A
11,5	LOSETA TIPO CONCRETO TIPO EDU A=20 (20x20x5) + CR.04**				m2	20	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EXITO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11,6	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm DUREPISO)				m2	60	EL PORVENIR PARQUE METROPOLITANO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	GALPATO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11,7	Piso Caucho reciclado 4cm (EPDM 1cm+SBR 3 cm				m2	60	EL PORVENIR PARQUE METROPOLITANO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	GALPATO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11,8	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm SUPERPISO)				m2	60	EL PORVENIR PARQUE METROPOLITANO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	GALPATO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Piso pared ceramico cerro blanco 20x28 cm				m2	2	PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EXITO	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO + MARZO	14/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 56 19/02/2025, se compraron 2 m2 de piso	N/A	N/A	N/A
12.0	ADOQUINES Y PREFABRICADOS																		
12,1	Bordillo en bordillo Mixto peraste h=0,25 m				ml	1500	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	LADRILLERA SAN JOAQUIN	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE A ENERO	29/11/24 + 12/12/24 + 3/01/25	N/A	op 8 29/11/2024, se compraron 3000 und	op 14 12/12/2024, se compraron 3000 und	op 26 07/01/2025, se compraron 3000 und	N/A	OP 91 3000 LADRILLOS PARQUE PORVENIR OP 110 DEL 21-01-25 HOMECENTER UNILADRILLO F. CUARTA OP 115 DEL 23-01-25 LADRILLOS PARQUE NACIONAL	OP 140 DEL 7/10/25 70 BLOQUETAS 1 L SDE MEDIACIDO 1 MEZCLA F. CUARTA OP 150 DEL 23-01-25 ADOQUIN P. TIBEA	N/A
12,2	REJILLA PEATONAL 40x40x8 CM				UND	350	PARQUE EL PORVENIR	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ARKA PREFABRICADOS	ORDEN DE SERVICIO	2/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 128 DEL 6-6-25 350 UND P. PORVENIR	N/A
12,3	REJILLA PEATONAL 50x50x8 CM				UND	30	PARQUE EL PORVENIR	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ARKA PREFABRICADOS	ORDEN DE SERVICIO	2/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 128 DEL 6-6-25 30 UND P. PORVENIR	N/A
13.0	ESTUCOS, PINTURA Y ENCHAPES																		
13,1	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **						PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	29/11/2024	N/A	op 2 de 29 de nov de 2024	N/A	N/A	N/A			
	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **				m2	450	PARQUE NACIONAL + CIUDAD DE LOS NIÑOS + SAN CARLOS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EXITO	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE A FEBRERO	03/12/2024 + 4/02/2025	N/A	N/A	op 13 5/12/2024, se compraron 1 cuñete de 5 galones de Koraza gris	N/A	op 44 4/02/2025, se compraron 4 canecas de 5 galones de Koraza gris color coloniall para el parque San Cristobal. Op 56 19/02/2025, se compraron 2 cuñetes de 5 galones de Koraza blanco,	op 97 4/7/2025 se compraron 2 CRUCELLO 2 GALONES, PARQUE EL PORVENIR	N/A	N/A
13,2	PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERIA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP				m2	200	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13,3	Demarcacion cancha pintura trafico e=0,1 sin micr				ml	150	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	TONO COLOR SAS	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE	2/12/2024	N/A	N/A	op 10 02/12/2024, se compraron 5 galones	N/A	N/A	OP 95 10-2-25 2 ML TUBO WATTS PARQUE PORVENIR	N/A	N/A
13,4	Pintura Baranda Mal40 (2 MANOS)				ml	150	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	MARZO A ABRIL	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Esmalte sintetico verde esmeralda x galon				Galon	2	PARQUE SAN CARLOS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EXITO	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO A ABRIL	14/02/2025	N/A	N/A	N/A	op 44 4/02/2025, se compraron 2 galones de esmalt verde esmeralda para el parque San Carlos	N/A	N/A	N/A
	VINILO T1 VINILICO BLANCO X GALON				Galon	5	PARQUE CIUDAD	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EXITO	ORDEN DE SERVICIO		14/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A				OP 140 7/10/25 5 GL VINILO T1 BLANCO P. CUARTA
	Estuco acrilico x 5 kilos				und	2	PARQUE SAN CARLOS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EXITO	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO A ABRIL	14/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 44 4/02/2025, llegaron 2 und de 5 kilos.	N/A	N/A	N/A
14.0	CARPINTERIA MADERA																		
14,1	Listones de Madera Chada de 9 x 4 cm				UND	6	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	DAR SAS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO A ABRIL	14/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
15.0	MALLAS Y CERRAMIENTO																		
15,1	Malla eslabonada rall 0+antitrepasion (instalacion)				m2	250	PLAZA JORGE ECHAVARRIA DESARROLLO PALERMO SUSUAR CALLE 17A DESARROLLO ORIENTAL B SECTOR ASENTAMIENTO EL TORZAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	VIAJES	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15,2	BARANDAS CERRAMIENTO Mal40				ml	300	PLAZA JORGE ECHAVARRIA DESARROLLO PALERMO SUSUAR CALLE 17A DESARROLLO ORIENTAL B SECTOR ASENTAMIENTO EL TORZAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	VIAJES	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15,3	CerramientoControlImpacto h=2,5 + Malla?nylon+Pilot				ml	200	PLAZA JORGE ECHAVARRIA DESARROLLO PALERMO SUSUAR CALLE 17A DESARROLLO ORIENTAL B SECTOR ASENTAMIENTO EL TORZAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	VIAJES	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16.0	JARDINERIA																		
16,1	Empradizacion zonas verdes				m2	150	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	DAR SAS	ORDEN DE SERVICIO	VIAJES ABRIL	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	GRAMA NEW GOLDEN II VERDE				m2	233	PLAZA JORGE ECHAVARRIA DESARROLLO PALERMO SUSUAR CALLE 17A DESARROLLO ORIENTAL B SECTOR ASENTAMIENTO EL TORZAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EXPERE	ORDEN DE SERVICIO									OP 137 DEL 6-6-25 232 m2 P. PIJAOS	N/A
17.0	APARATOS SANITARIOS Y ORFEBRES																		
17,1	TACA DE SANITARIO INST, DE FLUXOMETRO **				UND	20	PLAZA JORGE ECHAVARRIA DESARROLLO PALERMO SUSUAR CALLE 17A DESARROLLO ORIENTAL B SECTOR ASENTAMIENTO EL TORZAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	VIAJES ABRIL	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 105 DEL 15-4-25 10 FERRUCLAVO TIPO CRITINA CEFE SAN CRISTOBAL		
17,2	FLUXOMETRO SLOAN + Mantenimiento.				UND	20	PLAZA JORGE ECHAVARRIA DESARROLLO PALERMO SUSUAR CALLE 17A DESARROLLO ORIENTAL B SECTOR ASENTAMIENTO EL TORZAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO	14/02/25 + 24/2/25	N/A	N/A	N/A	N/A	SE INSTALARON 2 UNIDADES 1 EN PARQUE SAN CRISTOBAL 31/01/25, 1 EN ARBORICADORA ALTA, 4 UND EN SAUZALITO 24/2/2025.	N/A	N/A	N/A
17,3	Valvula Instlu. Grnal Antiv andalica (sum+Inst)				UND	20	PLAZA JORGE ECHAVARRIA DESARROLLO PALERMO SUSUAR CALLE 17A DESARROLLO ORIENTAL B SECTOR ASENTAMIENTO EL TORZAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE A MARZO	2/12/2025	N/A	N/A	op 32 21/12/2024, se compraron 4 und	N/A	N/A	OP 107 DEL 29-3-25, 2 GEL ORINAL SECO	N/A	OP 172 DEL 6-05-25 1 PUSH ORINAL PISADO P. LA SERENA
	Valvula Antiv andalica para sanitario tipo push				UND	1	PARQUE GILMA JIMENEZ - CEFE SAN CRISTOBAL - ARBOLICADORA ALTA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO A MARZO	29/12/2024 + 31/01/2025 + 6/03/2025	N/A	N/A	N/A	op 21 29/01/2025, se compraron 1 und para el CEFE San Cristobal Op 55 31/01/2025, se compraron 2 und para el parque Gilma Jimenez, Op 56 29/01/2025, se compraron 2 und para el parque Arbolizadora Alta	N/A	OP 174 DEL 26-5-25 1 UND PARQUE PIO	N/A	OP 193 DEL 3-6-25 1 UND P. VIRREY SUR
	Griferia institucional de mesa tipo Push para lavamanos				UND	6	PARQUE ARBOLICADORA ALTA - GILMA JIMENEZ	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO + MARZO	29/12/2024 + 31/01/2025 + 6/03/2025	N/A	N/A	N/A	op 41 29/01/2025, se compraron 6 und. Op 55 31/01/2025, se compraron 5 und para el parque Gilma Jimenez,	N/A	OP 182 DEL 17-3-25, 12 UND LLAVE PUSH PARQUE LOS NIÑOS, OP 114 DEL 23-3-25, 1 UND PARQUE PRO 115 DEL 27-3-25 PARQUE SAN ANDRES 12 UND	OP 123 DEL 3-4-25 1 UND P.PATIO BONITO; OP 149 DEL 23-4-25 1UND P. C. DE LOS NIÑOS; OP 152 DEL 25-4-25 1UND P. CIUDAD DE LOS NIÑOS; OP 157 DEL 29-4-25 1UND CEFE SAN CRISTOBAL	OP 157 DEL 6-5-25 1 UND CEFE SAN CRISTOBAL, OP 179 DEL 8-05-25 2 UND P. LA SERENA, OP 193 1 UND P. VIRREY SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 23
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4000 DE 2024

PLAN DE ADQUISICION DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO				
	Grifería para lavaplatos monocontrol				UND	1	PARQUE ARBOLEDA BAJA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	ORDEN DE SERVICIO - MARCO	24/FEBRERO - 7/FEBRERO	N/A	N/A	N/A	op 41 28/01/2025, se compraron 1 und	N/A	N/A	N/A	N/A
	Grifería Grosil (Conjunto válvula push lavamanos)				UND	2	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	ORDEN DE SERVICIO - MARCO	11/FEBRERO - 18/FEBRERO	N/A	N/A	N/A	N/A	op 53 11/02/2025, se compraron 2 und,	N/A	N/A	OP 179 DEL 5-9-25 1 LAVAMANOS PUSH PEDREGAL, LA SERENA
	Grifería Grosil válvula push sanitario				UNO	10	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	ORDEN DE SERVICIO - MARCO	11/FEBRERO - 18/FEBRERO	N/A	N/A	N/A	N/A	op 53 11/02/2025, se compraron 10 und,	N/A	N/A	OP 179 DEL 5-9-25 1 SANITARIO PARA VALVULA DESCARGA SANITARIO P. LA SERENA
	VIDRIOS LAMINADO 10 MM				M2	20,16		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	PROCTALMOS	ORDEN DE SERVICIO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 110 del 21 -3-2025: SE COMPRAN 14,85 M2 PARA CEFE SAN CRISTOBAL ; OP 94 DEL 19-3-25; 5,31 MTS2 PARQUE CEFE TUNAL	N/A	N/A
	ROLLO PLASTICO NEGRO				ROLLO	2		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMA	ORDEN DE SERVICIO	7/03/2025 ; 14/25 ; VIDRIO TUNAL LLEGO EL 31-3-2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	op 86 3/3/2025, se compraron 2 ROLLOS PLASTICO NEGRO; OP 96 12-3-25; OP 97 1 ROLLO VALLES DE CAFAM	OP 149 DEL 25-4-25 1 UND P.PALESTINA, OP 150 DEL 25-4-25 1 UND P.PORVENIR	N/A
	PINTURA ANTICORROSIVA				Galon	4		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EASY	ORDEN DE SERVICIO	26/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 73 3-3-2025, SE COMPRO 4 gal de anticorrosivo, 10 disco lija	N/A	N/A
	PINTURA TRAFICO				Galon	2		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EASY	ORDEN DE SERVICIO	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 78 3-3-2025, SE COMPRA 2 gal de pintura trafico	N/A	N/A
	DOTACION				GL	1		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMA	ORDEN DE SERVICIO	12/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 62, 3-3-2025, SE COMPRA botas, overoles, cascos, guantes, impermeables	N/A	N/A
	CARGUE POZO				UND	1		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	MEGA PREFABRICADO	ORDEN DE SERVICIO	15/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 92, PARQUE PORVENIR	N/A	N/A
	Accesorios PVC P (2) "				UND	14		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	26/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 105 DEL 26-3-25, ACCESORIOS PVC PRESION 2"	N/A	N/A
	CERRADURA TIPO OFICINA				UND	10		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	26/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 105 DEL 26-3-25, 10 CERRADURAS TIPO OFICINA, CEFE SAN CRISTOBAL	N/A	N/A
	TAZA DE SANITARIO INCT. DE FLUXOMETRO "				UND	1						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 178 DEL 5-9-25 1 TAZA ENTRADA POSTERIOR P. LA SERENA
	fluxometro tarjeta TOTTO				UND	1		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	26/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 106 DEL 26-3-25, 10 fluxometro reutelio	N/A	N/A
	GELES TIPO ORINAL ECCO				UND	2		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 107 DEL 26-3-25, 2 GEL ORINAL ECCO, ESTADIO OLAYA HERRERA	N/A	N/A
	ENCHAPE PARES				M2	7		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	DECORADOR Y ACABADOS CENTIMETROS	ORDEN DE SERVICIO	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 111 DEL 26-3-25, ENCHAPE PARQUE NAL	N/A	N/A
	MALLA NYLON CERRAMIENTO CANCHA				M2	272,8		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	TALLAS DEPORTIVAS S.A.S	ORDEN DE SERVICIO	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 113 DEL 26-3-2025; CERRAMIDNTO PARQUE SANTA CLARA	N/A	N/A
	ESTRUCTURA CANCHA BALONCESTO				UND	1		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ARMCO	ORDEN DE SERVICIO	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORDEN PRERSTACION: PARQUE NARANJOS	N/A	N/A
	VINILO ADHESIVO MODULOS				M2	45		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPACO	ORDEN DE SERVICIO	26/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ORDEN PRERSTACION; PARQUE MONISTAR	N/A	N/A
	UNION TIPO DRESSER METALICA PARA PVC DE 3"				UND	1		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 127 DEL 2-4-25 1 UNIDAD P. PALACIO DE LOS DEPORTES	N/A
	Transporte y suministro de agua potable en vehículos de capacidades de 13 m3 (Con una hora para el descargue)				M3	255		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO DE COLOMBIA SAS (DELCO)	ORDEN DE SERVICIO	15/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 124 DEL 8-4-25 255 m3 P.PATIO BONITO	N/A
	CARTUCHO SUPERIOR PARA DUCHA DOCOL				UND	1		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	9/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 132 DEL 9-4-25 1 UND P.PATIO BONITO; OP 136 DEL 14-4-25 1UND P. COMPLEJO ACUATICO	OP 181 DEL 9-09-25 2UND P. VIRREY SUR, OP 209 DEL 27-09-25 P. NACIONAL
	CODO 2" PRESION				UND	1		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	10/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 133 DEL 9-4-25 1 UND P. COMPLEJO ACUATICO	N/A
	UNION PRESION 2"				UND	2		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	10/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 133 DEL 9-4-25 2 UND P. COMPLEJO ACUATICO	N/A
	TUBO PRESION 2" X 1.50				UND	1		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	10/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 133 DEL 9-4-25 1 UND P. COMPLEJO ACUATICO	N/A
	LIMPIADOR REMOVEDOR 1/4				UND	1		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	10/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 133 DEL 9-4-25 1 UND P. COMPLEJO ACUATICO; OP 142 DEL 21-4-25 2 UND P. COUNTRY	N/A
	SOLDADURA PVC PEGA EN HUMEDO 1/02				UND	5		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	10/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 133 DEL 9-4-25 5 UND P. COMPLEJO ACUATICO; OP 142 DEL 21-4-25 LIQUIDA 14 2UND P. COUNTRY	N/A
	LAVAMANOS BAJO PONER 18"				UND	1		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	10/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 133 DEL 9-4-25 1 UND P. COMPLEJO ACUATICO	OP 178 DEL 5-09-25 1 LAVAMANOS SOBREPONER P. LA SERENA
	CODO PARA FLUXOMETRO SANITARIO ENTRADA SUPERIOR				UND	2		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	15/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 179 DEL 14-4-25 2 UND P. COMPLEJO ACUATICO	N/A	N/A
	BUJE PARA CONEXION A FLUXOMETRO SANITARIO				UND	2		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	15/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP 179 DEL 14-4-25 2 UND P. COMPLEJO ACUATICO	N/A	OP 220 DEL 24-25-2 UNIDAD SANITARIA SOLDADO A 1 DE COUNTRY, OP 179 DEL 5-09-25 CONEXION FLUXOMETRO COMPLETA SANITARIO P. NACIONAL
	TUBERIA DRENAJE 4" DRAINPIPE X 10 MTS				UND	20		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP NO DEL 2-4-25 20 UND P. COUNTRY	N/A
	TUBO SANITARIA 3" X 6 MTS				UND	1		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP NO DEL 2-4-25 1 UND P. COUNTRY	N/A
	VALVULA BOLA PCP ROSCADO 1/2				UND	4		REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP NO DEL 2-4-25 4 UND CODOS DE TUBOS 1/2 RZ PRESION DE 1/2 P. COUNTRY	N/A
	ACCESORIOS 2 1/2" TEE, UNION, BRUCE, TAPON, DEMIDOBO, TUBO PRESION				UND			REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGARTOS	ORDEN DE SERVICIO	22/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OP NO DEL 2-4-25 1 UNIDAD CEFE SAN CRISTOBAL, OP 91 DEL 21-4-25 CEFE SAN CRISTOBAL, OP 154 DEL 29-4-25 CEFE SAN CRISTOBAL	OP 170 DEL 5-9-25 1 BRUSHSTELLA 2 BRILLEX 1 MULTI ROCA 1 DRISOLUCION KG PLAST 1 VALVULAS 1 DRAINPIPE VENDOLLO TOT 1 BOSQUE, P. LA SERENA OP 179 DEL 5-09-25, 1 GARZA 1 VALVULAS ROSCA P. LA SERENA OP NO 2 CODO 2 UNDS 1 TUBO PRESION, VIRREY SUR OP 211 -2025 SANITARIO P. NACIONAL, OP 179 DEL 5-09-25 1 SANITARIO P. COUNTRY

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 26
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4066 DE 2024

PLAN DE ADQUISICION DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO				
	GRAMA PAISAJISMO				M2	222		REGIMEN DE COMPRAS SEMINAL	CUPEC	ORDEN DE SERVICIO	20/05/2025		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	OF. ST DEL BARRIO PARQUE PEQUEÑO
	CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO				UND	2		REGIMEN DE COMPRAS SEMINAL	IMPOSIFER	ORDEN DE SERVICIO	8/5/2025		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	OF. 170 DEL BARRIO LA TERESA, OF. 171 DEL BARRIO PARQUE TEMATICO, OF. 174 DEL BARRIO NACIONAL
	SNAFLEX BLANCO				UND	1		REGIMEN DE COMPRAS SEMINAL	IMPOSIFER	ORDEN DE SERVICIO	8/5/2025		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	OF. 170 DEL BARRIO LA TERESA
	MONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL MIRAGE METAL				UND	1		REGIMEN DE COMPRAS SEMINAL	IMPOSIFER	ORDEN DE SERVICIO			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	OF. 167 DEL BARRIO MONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL MIRAGE METAL CROMO LLAVE DOBLE FLEXIBLE P. CUARTO
	REGISTRO NAPOLI BRONCE 2.1/2"				UND	1		REGIMEN DE COMPRAS SEMINAL	IMPOSIFER	ORDEN DE SERVICIO			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	OF. 167 DEL BARRIO NAPOLI BRONCE 2.1/2"
	YESO Y CAOLIN 25 KG				UND	1		REGIMEN DE COMPRAS SEMINAL	IMPOSIFER	ORDEN DE SERVICIO			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	OF. 259 DEL BARRIO QUINTA PAREDES Y 2 MEDIO P. CUARTO

FECHA DE ELABORACION: 29/11/2024

FECHA DE REGIMENTO: 30/05/2025

Director de Obra
LIBERMAN NADINA COHEN

ANEXO 5

SOPORTES PLAN ADQUISICIONES

	ORDEN DE PEDIDO NO. 167	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 30 (DÍA) | 4 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DAVID PATIÑO

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PIJAOS)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 6"	UN	4	$ 5.500	$ 22.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 4.180
TOTAL				$ 26.180

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requieren ensayos de laboratorio a andenes en sub base granular en el Parque Pijaos

Firma Solicitante Director de Obra	David Ortiz S. Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 168	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 5 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
BOTON ANTIVANDALICO METALICO CROMADO	UN	3	$ 235.294,12	$ 705.882,36
VALVULA ANTIVANDALICA PARA SANITARIO	UN	3	$ 180.672,27	$ 542.016,81
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 237.101
TOTAL				$ 1.485.000,01

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	FORMA DE PAGO:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Firma Solicitante Director de Obra	David Ortiz S. Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 169	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 5 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE LA SERENA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO	UN	3	$ 226.890,76	$ 680.672,28
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 129.328
TOTAL				$ 810.000,01

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en el Parque La Serena

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1177

	ORDEN DE PEDIDO NO. 170	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 9 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL COUNTRY 01-1000)

FECHA DE ENTREGA: ____ (DÍA) ____ (MES) ____ (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SOLDADURA LIQUIDA 1/4	UND	1	$ 126.360,51	$ 126.360,51
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/4	UND	1	$ 60.928,58	$ 60.928,58
TUBERIA DRENAJE 4" DRAINPIPE UNION X 30 MTS	UND	2	$ 549.277,00	$ 1.098.554,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		ANTICIPO		-$ 412.200
		IVA	19%	$ 244.310
TOTAL				$ 1.117.953,23

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Materiales necesarios para ejecutar obra en el parque el Country

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1978

	ORDEN DE PEDIDO NO. 171	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 9 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL COUNTRY 01-1000)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TUBO PRESION 3/4	UND	18	$ 26.974,79	$ 485.546,22
TEE PRESION 3/4	UND	3	$ 1.776,48	$ 5.329,44
CODO PRESION 3/4"	UND	5	$ 1.276,48	$ 6.382,40
UNION 3/4" PRESION	UND	25	$ 803,37	$ 20.084,25
BUJE SOLDADO PRESION 3/4" X 1/2"	UND	4	$ 772,27	$ 3.089,08
VALVULA BOLA PCP ROSCADO 1/2	UND	1	$ 16.471,00	$ 16.471,00
ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	UND	5	$ 549,58	$ 2.747,90
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 102.534
TOTAL				$ 642.183,85

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Materiales necesarios para ejecutar obra en el parque el Country

David ortiz S.

Firma Solicitante
Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1979

	ORDEN DE PEDIDO NO. 174	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 21 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PALESTINA)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) | ( ) (MES) | ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210 kg/cm² 28 días Comun 6"). No. De despacho(s): 24263, 24266.	M3	14,5	$ 448.900	$ 6.509.050
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 1.236.720
TOTAL				$ 7.745.769,50

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	CONCREMOVIL SAS	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para conformación de estructura y construcción de placa de contrapiso en zona de juegos del Parque Palestina

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos
	David Ortiz S.	

1980

	ORDEN DE PEDIDO NO. 175	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 5 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PALESTINA)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIOTOTAL
MALLA ELECTR 4X4MM 15X15CM2.35X6MREYNA	UN	10	$ 84.516	$ 845.160
SVFLETEADICIONALX1000PESOS	UN	9	$ 1.090	$ 9.819
SVFLETEADICIONALX10.000PESOS	UN	3	$ 10.290	$ 30.870
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 885.840,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para conformación de estructura y construcción de placa de contrapiso en zona de juegos del Parque Palestina

Firma Solicitante Director de Obra	David Ortiz S. Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 176	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 5 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ANGELICA MARIA CUERVO GIL

AREA QUE SOLICITA: ÁREA SST FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: 10 (DÍA) | 05 (MES) | 2.025 (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
OVEROLES TIPO IDU TALLAS: 42:6, 40:6	SET	12	$ 97.000	$ 1.164.000
BOTAS MATERIAL TALLAS: 39:4, 40:41, 41:4	PAR	12	$ 74.500	$ 894.000
GUANTES DE VAQUETA CON REFUERZO	PAR	36	$ 10.500	$ 378.000
GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO:12 Y/U OSCURO:12	UND	24	$ 7.600	$ 182.400
GUATES NITRILO	PAR	18	$ 7.950	$ 143.100
GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 26	UND	24	$ 8.750	$ 210.000
MALLA POLISOMBRA VERDE / AZUL DE 2X100 MT	ROLLO	2	$ 390.000	$ 780.000
VARA ROLLIZADA	UND	20	$ 15.100	$ 302.000
				$ -
				$ -
				$ -
	UND			$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 4.053.500,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: KDMA FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090

CENTRO DE COSTOS: AREAS DE APOYO

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere dotacion en referencia para la ejecucion de las actividades de obra del contrato IDRD 4060 - 2024

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 178	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 6 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE LA SERENA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PUSH ORINAL PESADO	UN	1	$ 193.277,31	$ 193.277,31
CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO	UN	2	$ 226.890,76	$ 453.781,52
LLAVE LAVAMANOS PUSH PESADA	UN	2	$ 193.277,31	$ 386.554,62
SIFON BOTELLA	UN	1	$ 10.756,30	$ 10.756,30
GRIFLEX LVM/LVP 60CM	UN	2	$ 4.369,75	$ 8.739,50
REGULACION 1/2 PLAST LVM/LVP/SAN	UN	2	$ 15.000,00	$ 30.000,00
SIKAFLEX UNIVERSAL BLANCO	UN	1	$ 33.529,41	$ 33.529,41
DESAGUE SENCILLO CON REBOSE	UN	1	$ 11.344,54	$ 11.344,54
LAVAMANOS SOBREPONER	UN	1	$ 195.294,11	$ 195.294,11
TAZA ENTRADA POSTERIOR	UN	1	$ 789.075,64	$ 789.075,64
				$ -
		IVA	19%	$ 401.347,06
TOTAL				$ 2.513.700,01

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	FORMA DE PAGO:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en el Parque La Serena

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 179	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 7 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE LA SERENA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LLAVE LAVAMANOS PUSH PESADA	UN	1	$ 193.277,31	$ 193.277,31
GRIFLEX LVM/LVP 60CM	UN	1	$ 4.369,75	$ 4.369,75
REGULACION 1/2 PLAST LVM/LVP/SAN	UN	1	$ 13.949,58	$ 13.949,58
CARTUCHO PARA VALVULA DESCARGA SANITARIO	UN	1	$ 226.890,76	$ 226.890,76
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 83.313
TOTAL				$ 521.800,01

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en el Parque La Serena

Firma Solicitante Director de Obra

David ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1284

	ORDEN DE PEDIDO NO. 180	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 7 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ANGELICA MARIA CUERVO GIL

AREA QUE SOLICITA: ÁREA SST FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: 10 (DÍA) | 05 (MES) | 2.025 (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONO DE 50CM	UND	1	$ 82.000	$ 82.000
CARTE EN BANENER (PELIGRO CARGA LARGA Y ANCHA) CON	UND	1	$ 36.000	$ 36.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 118.000,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: KDMA FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090

CENTRO DE COSTOS: AREAS DE APOYO

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere dotacion en referencia para la ejecucion de las actividades de obra del contrato IDRD 4060 - 2024

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 181	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 9 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE VIRREY SUR)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CARTUCHO DUCHA MONOCONTROL SUPERIOR	UN	2	$ 424.369,75	$ 848.739,50
CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO	UN	1	$ 256.000,00	$ 256.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 209.900
TOTAL				$ 1.314.640,01

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en el Parque Virrey Sur

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos
	David Ortiz S.	

	ORDEN DE PEDIDO NO. 183	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 12 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL COUNTRY 01-1000)

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
METRO ARENA PEÑA	UND	1	$ 120.000,00	$ 120.000,00
GRAVILLA METRO	UND	20	$ 170.000,00	$ 3.400.000,00
ACARREO	UND	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
METRO ARENA MIXTO	UND	1	$ 170.000,00	$ 170.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 3.614.850,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: FERREDEPOSITO G Y G S.A.S **FORMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N°052416211

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Materiales necesarios para ejecutar obra en el parque el Country

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1187

	ORDEN DE PEDIDO NO. 184	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 12 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL RECREO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ARENA LAVADA DE PEÑA	M	15	$ 120.000	$ 1.800.000
CEMENTO GRIS x BULTO 50 KG	UN	7	$ 29.411,78	$ 205.882
ARENA MIXTO	M3	1	$ 170.000	$ 170.000
ACARREO	UN	1	$ 60.000	$ 60.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 39.118
TOTAL				$ 2.275.000,13

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: FERREDEPOSITO G Y G S.A.S **FORMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para conformación de sendero cancha sintética F8 del Parque El Recreo.

Firma Solicitante Director de Obra

David ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 185	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 13 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CEFE COMETAS)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Inspección ascensores NORMA NTC 5926-1:2012	UND	4	$ 250.000	$ 1.000.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 190.000
TOTAL				$ 1.190.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CERTINEXT S.A.S. FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL N° 24127984977

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere inspección en referencia para la certificacion de los 4 ascensores ubicados en el CEFE COMETAS

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1189

	ORDEN DE PEDIDO NO. 186	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 13 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CEFE FONTANAR DEL RIO)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Inspección ascensores NORMA NTC 5926-1:2012	UND	2	$ 250.000	$ 500.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 95.000
TOTAL				$ 595.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CERTINEXT S.A.S. **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL N° 24127984977

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere inspección en referencia para la certificacion de los 2 ascensores ubicados en el CEFE FONTANAR DEL RIO

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 187	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 13 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAN CRISTOBAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Inspección ascensores NORMA NTC 5926-1:2012	UND	2	$ 250.000	$ 500.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 95.000
TOTAL				$ 595.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CERTINEXT S.A.S. **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL N° 24127984977

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere inspección en referencia para la certificacion de los 2 ascensores ubicados en el CEFE San Cristóbal

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 188	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 13 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CEFE TUNAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Inspección ascensores NORMA NTC 5926-1:2012	UND	3	$ 250.000	$ 750.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 142.500
TOTAL				$ 892.500

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CERTINEXT S.A.S. FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL N° 24127984977

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere inspección en referencia para la certificacion de los 2 ascensores ubicados en el CEFE TUNAL

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 189	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 3 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ing. David Patiño

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CIUDAD MONTES)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ROLLO PLASTICO NEGRO CALIBRE 3X3X100MT	UND	1	$ 397.500	$ 397.500
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 397.500,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: KDMA

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para las actividades en ejecución en frente de obra.

Firma Solicitante Director de Obra

David ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 190	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 10 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL MIRAGE METAL	UND	1	$ 63.025,21	$ 63.025,21
CANASTILLA CROMO FLEXIBLE	UND	1	$ 31.932,77	$ 31.932,77
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 18.042
TOTAL				$ 113.000,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación:

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1194

	ORDEN DE PEDIDO NO. 191	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 13 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE BURGOS BRITALIA)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LONA GRAVILLA	UN	13	$ 8.000,00	$ 104.000,00
LONA ARENA RIO	UN	13	$ 8.000,00	$ 104.000,00
CEMENTO X 50 KL	UN	7	$ 29.411,78	$ 205.882,46
ACARREO	UN	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 39.118
TOTAL				$ 513.000,13

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	FERREDEPOSITO G Y G S.A.S	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211
CENTRO DE COSTOS	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia en el Parque Burgos Britalia

Firma Solicitante Director de Obra	David Ortiz S. Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 192	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 14 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE VIRREY SUR)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CODO PRESION 2.1/2"	UN	2	$ 42.225,22	$ 84.450,44
UNION PRESION 2 1/2"	UN	2	$ 21.341,18	$ 42.682,36
TUBO PRESION 2 1/2" X M	UN	1	$ 41.234,32	$ 41.234,32
REGISTRO NAPOLI BRONCE 2.1/2"	UN	1	$ 546.722,69	$ 546.722,69
ADAPTADOR MACHO PRESION 2.1/2"	UN	2	$ 19.042,86	$ 38.085,72
LLAVEMANTENIMIENTOPARA LAVAMANOS, ORINAIYDUCHA	UN	1	$ 235.294,12	$ 235.294,12
CODOPRESION 1/2"	UN	4	$ 797,48	$ 3.189,92
TEE1/2" PRESION	UN	1	$ 1.050,43	$ 1.050,43
UNIONDREESER3/4AC/AF	UN	2	$ 21.008,41	$ 42.016,82
		IVA	19%	$ 196.598,10
TOTAL				$ 1.231.324,92

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	FORMA DE PAGO:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en el Parque Virrey Sur

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 193	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 14 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: (DÍA) (MES) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LADRILLO RECOCIDO PEQUEÑO	UND	400	$ 790	$ 316.000,00
BLOQUE No. 5 ESTANDAR	UND	40	$ 1.150	$ 46.000,00
FLETE- CARGA VACIA	UND	1	$ 300.000	$ 300.000,00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 662.000,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: LADRILLERA SAN JOAQUIN SAS

FORMA DE PAGO: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°33717245627

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Pozos de inspección bebederos Parque El Country

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1197

	ORDEN DE PEDIDO NO. 194	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 14 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE BURGOS BRITALIA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LONA GRAVILLA	UN	15	$ 8.000,00	$ 120.000,00
LONA ARENA RIO	UN	15	$ 8.000,00	$ 120.000,00
CEMENTO X 50 KL	UN	8	$ 29.411,78	$ 235.294,24
ACARREO	UN	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 44.706
TOTAL				$ 580.000,15

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: FERREDEPOSITO G Y G S.A.S

FORMA DE PAGO: CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia en el Parque Burgos Britalia

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 195	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 15 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
FLETE ADICIONAL X 10.000 PESOS	UND	8	$ 10.290	$ 82.320,00
CEMENTO GRIS TP1CEMEX SUPERRESISTENTE50K	UND	4	$ 33.400	$ 133.600,00
BARRA CORRUGADA G-60 3/8 PG X 6MTS DIACO	UND	14	$ 14.200	$ 198.800,00
ALAMBRE RECOCIDO NEGRO C17X1KG	UND	2	$ 8.200	$ 16.400
MADERA SECA MSD 19X41X3200	UND	6	$ 10.850	$ 65.100
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 496.220,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	Cencosud Colombia S.A. (EASY)	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación:

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1194

	ORDEN DE PEDIDO NO. 196	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 15 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
METRO ARENA MIXTO	M3	4	$ 170.000	$ 680.000,00
ACARREO	M3	1	$ 60.000	$ 60.000,00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 740.000,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: FERREDEPOSITO G Y G S.A.S

FORMA DE PAGO: CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA N° 052416211

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Senderos peatonales zona de servicio Parque El Country

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos
	David ortiz S.	

1200

	ORDEN DE PEDIDO NO. 197	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 16 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ing. David Patiño

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CIUDAD MONTES)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) | ( ) (MES) | ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
geotextil nt 1600s 1 x 3.5 m ancho pavco	m	28	$ 12.900	$ 361.200
geotextil nt 1800 1 x 3.5 m ancho pavco	m	7	$ 22.013	$ 154.091
flete	UND	1	$ 7.900	$ 7.900
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 523.191,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: SODIMAC COLOMBIA S.A. (HOMECENTER) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para las actividades en ejecución en frente de obra.

David ortiz S.

Firma Solicitante Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 198	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 16 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
geotextil nt 1600s 1 x 3.5 m ancho pavco	M	12	$ 12.900	$ 154.800,00
FLETE	UND	1	$ 7.900	$ 7.900,00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 162.700,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: SODIMAC COLOMBIA S.A. **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Pozos de inspección bebederos Parque El Country

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 199	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 19 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. CLAUDIA PEDRAZA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PALACIO DE LOS DEPORTES)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena	UN	4	$ 45.000	$ 180.000
Desplazamiento para toma de muestras	UN	1	$ 31.650	$ 31.650
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 40.214
TOTAL				$ 251.864

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requieren ensayos de laboratorio a estructura cerramiento en el Palacio de los deportes

Firma Solicitante Director de Obra

David ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 200	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 10 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
caolin corona 25 kg	UND	2	$ 24.583	$ 49.166,00
yeso maravilla 25 kg	UND	1	$ 41.933	$ 41.933,00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 17.309
TOTAL				$ 108.407,81

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: SODIMAC COLOMBIA S.A. (HOMECENTER) FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación:

Firma Solicitante Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1 2 4

	ORDEN DE PEDIDO NO. 201	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 20 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AUDITORIA INTERNA	UND	1	$ 1.650.000	$ 1.650.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		ANTICIPO 30%		$ 495.000
TOTAL				$ 1.650.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	Ing. Laura Milena Ramírez Quimbayo	**FORMA DE PAGO:**	ANTICIPO 30% : **$495.000** CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 032-666635-51
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Auditoria interna

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1205

	ORDEN DE PEDIDO NO. 202	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 15 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MARCO Y TAPA 25*25 MED. INTERNA	UND	4	$ 100.000	$ 400.000,00
MARCO Y TAPA DE 40*40 MED. INTERNA	UND	4	$ 124.800	$ 499.200,00
MARCO Y TAPA CAJA 60*60 A.N. MED. INTERNA	UND	1	$ 166.400	$ 166.400
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 202.464
TOTAL				$ 1.268.064,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: PREFABRICADO JOVITA CASTRO SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 004870436765

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación:

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1246

	ORDEN DE PEDIDO NO. 203	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 15 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
BUJE SANITARIA SOLDADO 3 X 2	UND	4	$ 6.961	$ 27.845,40
CODO SANITARIA 3" CXC	UND	4	$ 9.493	$ 37.973,12
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 12.506
TOTAL				$ 78.324,04

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPORGRIFOS SAS	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación:

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1207

	ORDEN DE PEDIDO NO. 204	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 21 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FELIPE ARDILA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL COUNTRY 01-1000)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
geotextil nt 1600s 1 x 3.5 m ancho pavco	M	80	$ 11.509	$ 920.720
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 920.720

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: SODIMAC COLOMBIA S.A. (HOMECENTER) FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Materiales necesarios para ejecutar obra en el parque el Country

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1208

	ORDEN DE PEDIDO NO. 205	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 3 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ing. David Patiño

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CIUDAD MONTES)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
METRO GRAVILLA	UND	3	$ 180.000	$ 540.000
ACARREO	UND	1	$ 60.000	$ 60.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 600.000,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: FERREDEPOSITO G Y G S.A.S **FORMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para las actividades en ejecución en frente de obra.

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1204

	ORDEN DE PEDIDO NO. 206	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 23 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO	UN	1	$ 256.000,00	$ 256.000,00
CONEXION ENTRADA SUPERIOR COMPLETA SANITARIO	UN	1	$ 109.244,00	$ 109.244,00
TUBO PRESION 1.1/4" X METRO	UN	1	$ 10.752,11	$ 10.752,11
CODO PRESION 1.1/4"	UN	1	$ 4.791,60	$ 4.791,60
CARTUCHO COMPLETO PARA DUCHA ANTIVANDALICA	UN	1	$ 462.184,88	$ 462.184,88
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 160.165
TOTAL				$ 1.003.137,38

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención en el Parque Nscional

David Ortiz S.

Firma Solicitante
Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 207	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 21 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PENDON BANNER DE 2MT X 1 MT CON OJALES IMPRESIÓN A FULL COLOR	UND	5	$ 63.500	$ 317.500
				$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 317.500,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: KDMA SOLUCIONES INTEGRALES **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090

CENTRO DE COSTOS: AREAS DE APOYO

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para señalización de actividades en ejecución en frente de obra.

Firma Solicitante Director de Obra

David ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 208	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 22 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Arena L500 tipo Peldar para zona de juegos infantiles PARQUE COUNTRY	TON	170	$ 104.000	$ 17.680.000
Transporte en volqueta doble troque hasta el parque Country en bogota, aproximadamente 10 viajes de arena.	UND	10	$ 720.000	$ 7.200.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 3.359.200
TOTAL				$ 28.239.200

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S.A.S. - COMIND S.A.S **FORMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 0560466669999776

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para la zona de juegos infantiles de los parques relacionados.

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

1212

	ORDEN DE PEDIDO NO. 209	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 22 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SANTA CLARA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
laterales de 6m de alto por 36.80m total m2: 220,8	m2	220,8	$ 9.500	$ 2.097.600
laterales de 2.50m de alto por 20.80m total m2: 52 Calibre o grosor de la cuerda de 3 milímetros impermeabilizacion color negro cuadros de 13cm por 13cm	m2	52	$ 9.500	$ 494.000
Servicio de Instalación Andamios Certificados Perros y tensores Materiales Mano de obra	UND	1	$ 2.776.000	$ 2.776.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		SALDO 50%		$ 2.683.800
TOTAL				$ 2.683.800

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Mallas Deportivas GYO

FORMA DE PAGO: SALDO 50% $2.683.800 , CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA N° 22182427903

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia por solicitid de la interventoria para intervencion del Parque Santa Clara

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 210	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 22 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SALDO DE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BEBEDEROS M-110	UN	8	$ 1.300.000	$ 10.400.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		ABONO 60%		-$ 6.240.000
TOTAL				$ 4.160.000,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CITY PLAY SAS

FORMA DE PAGO: SALDO 40% CUENTA DE CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ N° 606181121

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Realizar pago del saldo correspondiente al 40% del valor de la oferta ($4,160,000)

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 211	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 26 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. CLAUDIA PEDRAZA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COUNTRY)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Restauracion y adecuacion de piso de madera, lijado, pulido y emboquillado en aserrin talco y sellantes, pulido liso y dos capas de polieretano brillante	UN	1	$ 3.600.000	$ 3.600.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 3.600.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: MAURICIO SANTAMARÍA **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 0550002300252547

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Mantenimiento piso café parque Counry, incluye mano de obra y materiales

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 212	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 26 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. CLAUDIA PEDRAZA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PALACIO DE LOS DEPORTES)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 6"	UN	8	$ 5.500	$ 44.000
Desplazamiento para recolección de muestras	UN	1	$ 31.650	$ 31.650
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 14.374
TOTAL				$ 90.024

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requieren ensayos de laboratorio a estructura cerramiento en el Palacio de los deportes

David ortiz S.

Firma Solicitante Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 213	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 27 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Arena L500 tipo Peldar para zona de juegos infantiles PARQUE SAN ANDRES	TON	68	$ 103.000	$ 7.004.000
Transporte en volqueta doble troque hasta el parque San Andres en bogota, aproximadamente 4 viajes de arena.	UND	4	$ 650.000	$ 2.600.000
Arena L500 tipo Peldar para zona de juegos infantiles PARQUE CIUDAD MONTES	TON	85	$ 103.000	$ 8.755.000
Transporte en volqueta doble troque hasta el parque Ciudad Montes en bogota, aproximadamente 5 viajes de arena.	UND	5	$ 520.000	$ 2.600.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 2.994.210
TOTAL				$ 23.953.210

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S.A.S. - COMIND S.A.S **FORMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 0560466669999776

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para la zona de juegos infantiles de los parques relacionados.

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 214	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 27 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PALESTINA)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 6"	UND	3	$ 5.500	$ 16.500,00
Desplazamiento para recolección de muestras	UND	1	$ 31.650	$ 31.650,00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 9.149
TOTAL				$ 57.298,50

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	CONCRELAB SAS	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requieren ensayos de laboratorio placa de contrapiso zona de juegos del Parque Palestina

Firma Solicitante
Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 215	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 27 (DÍA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE TIMIZA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 6"	UND	6	$ 5.500	$ 33.000,00
Desplazamiento para recolección de muestras	UND	1	$ 31.650	$ 31.650,00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 12.284
TOTAL				$ 76.933,50

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requieren ensayos de laboratorio pilotes y viga de cimentación zona sendero lago del Parque Timiza

Firma Solicitante Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

Copia para Cliente

GUIA DE DESPACHO Nº 1346908

Datos de la Guia de Despachos

Nº Orden de Entrega	1346908	**Fecha de Entrega**	19/05/2025
Estado	Orden Ent. Pagada		
Tienda	EASY NORTE		
Tipo Entrega	Despacho Domicilio (Fact. Inmed.)		

Datos Cliente

Razón Social	BELZCON SAS	**CC/NIT/RUT**	901252860
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas		
Nombre de Contacto	BELZCON SAS	**Teléfono Contacto**	8052552
Dirección de Servicio	AC 127 #11D-90||PARQUE COUNTRY (	**Departamento**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	**Barrio**	USAQUEN-USAQUEN
Teléfono de Servicio	318 6722575	**Indicaciones**	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COMPRADA	CANTIDAD ENTREGADA
2183532	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 PG X 6MTS DIACO	8.00	8.00 ✓
2252547001	VINILO T1 5GL VINILICO BLANCO	5.00	5.00 ✓
1197566	MESON RADIANTE 180X52 4G IZQ MONOCONTROL	1.00	1.00 ✓
1035302	CEMENTO GRIS TP1CEMEX SUPERRESISTENTE50K	11.00	11.00 ✓

PERSONA QUE DESPACHO: _____

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Tienda Easy

19 MAY 2025

PERSONA DE SEGURIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE: _____

PERSONA QUE RECIBE: _____

DETALLE DE QUIEN RECIBE: _____

OBSERVACIONES DE ENTREGA: _____

Vendedor Default Cliente Juridico

Powered by CamScanner

1220

Copia para Cliente

GUIA DE DESPACHO Nº 1347087

Datos de la Guia de Despachos

Nº Orden de Entrega	1347087	Fecha de Entrega	20/05/2025
Estado	Orden Ent. Pagada		
Tienda	BOSA		
Tipo Entrega	Despacho Domicilio (Fact. Inmed.)		

Datos Cliente

Razón Social	BELZCON SAS	CC/NIT/RUT	901252860
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas		
Nombre de Contacto	BELZCON SAS	Teléfono Contacto	8052552
Dirección de Servicio	CARRERA 95A - CALLE 54 SUR	Departamento	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	Barrio	BOSA-BOSA
Teléfono de Servicio	322 2280448	Indicaciones	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COMPRADA	CANTIDAD ENTREGADA
1444809	MALLA ELECTR 4X4MM 15X15CM 2.35X6M REYNA	30.00	30.00

PERSONA QUE DESPACHO:

PERSONA DE SEGURIDAD:

FIRMA DEL CLIENTE:

PERSONA QUE RECIBE:

DETALLE DE QUIEN RECIBE:

OBSERVACIONES DE ENTREGA:

Vendedor Default Cliente Juridico

CENCOSUD COLOMBIA S.A
EASY BOSA
20 MAY 2025
ENTREGADO

X

IMPOGRIFOS

IMPOGRIFOS SAS
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com

FORMATO DI
NO.002

CLIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**FECH**
DIRECCION	**PARQUE NACIONAL**	5/5/2

ITEM	CANTI
BOTON ANTIVANDALICO METALICO CROMADO	3
VALVULA ANTIVANDALICA SANITARIO	3

RECIBE :

1222

IMPOGRIFOS

IMPOGRIFOS SAS
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com


FORMATO DE ENTREGA
NO.00242946

CLIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	FECHA
DIRECCION	SERENA	5/5/2025

ITEM	CANTIDAD
CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO	3

6-5-25

RECIBE :



1223

CONCREMOVIL	CLIENTE: BELZCON SAS CL 105 46 26 P2 Bogotá D.C. 8052552	DIRECCIÓN DE ENTREGA: PARQUE PALESTINA PARQUE PALESTINA, CL 68 SUR #81C-09 .	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 17/05/2025 REMISIÓN: 24263

CANTIDAD	PRODUCTO
7,50	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.50 M3 DE SU ORDEN POR 14.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:48				
CONDUCTOR	Mixer	PRECINTO	OBSERVACIONES	
NELSON FABIAN LOPEZ SILVA	TRL-952	23840		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ _____

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ _____

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

1224

CONCREMOVIL	CLIENTE: BELZCON SAS CL 105 46 26 P2 Bogotá D.C. 8052552	DIRECCIÓN DE ENTREGA: PARQUE PALESTINA PARQUE PALESTINA, CL 68 SUR #81C-09	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 17/05/2025 REMISIÓN: 24266

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.50 M3 DE SU ORDEN POR 14.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:35	11:30	12:10		
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ANDERSON SMITH GACHA MOYA	WFC-056	23830		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y las características estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Santana — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

John Santana — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

1225

Copia para Cliente

GUIA DE DESPACHO Nº 1345511

Datos de la Guia de Despachos

Nº Orden de Entrega	1345511	Fecha de Entrega	12/05/2025
Estado	Orden Ent. Pagada		
Tienda	BOSA		
Tipo Entrega	Despacho Domicilio (Fact. Inmed.)		

Datos Cliente

Razón Social	BELZCON SAS	CC/NIT/RUT	901252860
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas		
Nombre de Contacto	BELZCON SAS	Teléfono Contacto	8052552
Dirección de Servicio	CALLE 68 SUR #81C-09	Departamento	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	Barrio	BOSA-BOSA
Teléfono de Servicio	322 2280448	Indicaciones	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COMPRADA	CANTIDAD ENTREGADA
1444809	MALLA ELECTR 4X4MM 15X15CM 2.35X6M REYNA	10.00	10.00

PERSONA QUE DESPACHO:

PERSONA DE SEGURIDAD: Adriana Molina

FIRMA DEL CLIENTE: Santana

PERSONA QUE RECIBE: - John Santana 1012428871

DETALLE DE QUIEN RECIBE:

OBSERVACIONES DE ENTREGA:

Vendedor Default Cliente Juridico

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.167-1 EASY BOSA 08 MAY 2025 ENTREGADO ESTIMADO CLIENTE FIRMAR VERIFICAR SUMA

322 2280448
Jhon Santana.
Calle 68 Sur # 81 c 09
Coliseo Bosa Palestina

1226

FERREDEPOSITO G Y G S.A.S
NIT 901.181.988-5
CRA 5 32 31
Tel: (57) 3214816882
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-386

Para	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Nit	901.886.663-3
Fecha	2025-05-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	METRO ARENA PEÑA	15.00	120,000.00	1,800,000.00
2	CEMENTO X 50 KL CEMEX	7.00	29,411.78	245,000.13
3	METRO ARENA MIXTO	1.00	170,000.00	170,000.00
4	ACARREO	1.00	60,000.00	60,000.00

Total Bruto	2,235,882.46
Subtotal	2,235,882.46
IVA 0%	0.00
IVA 19%	39,117.67
Total a Pagar	2,275,000.13

Se reciben 6 m³ arena Peña
7 bultos cemento
24 toneladas arena mixto
Santana

Adriana De La
larochela84@hotmail.com
(601) 5672958

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Copia para Cliente

GUIA DE DESPACHO Nº 1346908

Datos de la Guia de Despachos			
Nº Orden de Entrega	1346908	Fecha de Entrega	19/05/2025
Estado	Orden Ent. Pagada		
Tienda	EASY NORTE		
Tipo Entrega	Despacho Domicilio (Fact. Inmed.)		

Datos Cliente			
Razón Social	BELZCON SAS	CC/NIT/RUT	901252860
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas		
Nombre de Contacto	BELZCON SAS	Teléfono Contacto	8052552
Dirección de Servicio	AC 127 #11D-90||PARQUE COUNTRY (	Departamento	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	Barrio	USAQUEN-USAQUEN
Teléfono de Servicio	318 6722575	Indicaciones	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COMPRADA	CANTIDAD ENTREGADA
2183532	BARRA CORRUGADA G-60 3/8 PG X 6MTS DIACO	8.00	8.00 ✓
2252547001	VINILO T1 5GL VINILICO BLANCO	5.00	5.00 ✓
1197566	MESON RADIANTE 180X52 4G IZQ MONOCONTROL	1.00	1.00 ✓
1035302	CEMENTO GRIS TP1CEMEX SUPERRESISTENTE50K	11.00	11.00 ✓

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Tienda Easy Norte
19 MAY 2025

PERSONA QUE DESPACHO:

PERSONA DE SEGURIDAD:

FIRMA DEL CLIENTE:

PERSONA QUE RECIBE:

DETALLE DE QUIEN RECIBE:

OBSERVACIONES DE ENTREGA:

Vendedor Default Cliente Juridico

Powered by CamScanner

Copia para Cliente

GUIA DE DESPACHO Nº 1347087

Datos de la Guia de Despachos

Nº Orden de Entrega	1347087	Fecha de Entrega	20/05/2025
Estado	Orden Ent. Pagada		
Tienda	BOSA		
Tipo Entrega	Despacho Domicilio (Fact. Inmed.)		

Datos Cliente

Razón Social	BELZCON SAS	CC/NIT/RUT	901252860
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas		
Nombre de Contacto	BELZCON SAS	Teléfono Contacto	8052552
Dirección de Servicio	CARRERA 95A - CALLE 54 SUR	Departamento	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	Barrio	BOSA-BOSA
Teléfono de Servicio	322 2280448	Indicaciones	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COMPRADA	CANTIDAD ENTREGADA
1444809	MALLA ELECTR 4X4MM 15X15CM 2.35X6M REYNA	30.00	30.00

PERSONA QUE DESPACHO:

PERSONA DE SEGURIDAD:

FIRMA DEL CLIENTE:

PERSONA QUE RECIBE:

DETALLE DE QUIEN RECIBE:

OBSERVACIONES DE ENTREGA:

Vendedor Default Cliente Juridico

CENCOSUD COLOMBIA S.A
EASY BOSA

20 MAY 2025

ENTREGADO A SATISFACCIÓN
FIRMA Y NOMBRE LEGIBLE

X

Copia para Cliente

GUIA DE DESPACHO Nº 1347087

Datos de la Guia de Despachos

Nº Orden de Entrega	1347087	Fecha de Entrega	20/05/2025
Estado	Orden Ent. Pagada		
Tienda	BOSA		
Tipo Entrega	Despacho Domicilio (Fact. Inmed.)		

Datos Cliente

Razón Social	BELZCON SAS	CC/NIT/RUT	901252860
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas		
Nombre de Contacto	BELZCON SAS	Teléfono Contacto	8052552
Dirección de Servicio	CARRERA 95A - CALLE 54 SUR	Departamento	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	Barrio	BOSA-BOSA
Teléfono de Servicio	322 2280448	Indicaciones	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COMPRADA	CANTIDAD ENTREGADA
1444809	MALLA ELECTR 4X4MM 15X15CM 2.35X6M REYNA	30.00	30.00

PERSONA QUE DESPACHO:

PERSONA DE SEGURIDAD

FIRMA DEL CLIENTE:

PERSONA QUE RECIBE:

DETALLE DE QUIEN RECIBE:

OBSERVACIONES DE ENTREGA:

Vendedor Default Cliente Juridico

CENCOSUD COLOMBIA S.A
EASY BOSA
20 MAY 2025

X

IMPOGRIFOS

IMPOGRIFOS SAS
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com

FORMATO DI
NO.002

CLIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**FECH**
DIRECCION	**PARQUE NACIONAL**	5/5/2

ITEM	CANTI
BOTON ANTIVANDALICO METALICO CROMADO	3
VALVULA ANTIVANDALICA SANITARIO	3

RECIBE :

1231

IMPOGRIFOS

IMPOGRIFOS SAS
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com

FORMATO DE ENTREGA
NO.00242946

CLIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	
DIRECCION	SERENA	FECHA 5/5/2025

ITEM	CANTIDAD
CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO	3

6-5-25

RECIBE :

Representacion grafica de

1232

CONCREMOVIL	CLIENTE: BELZCON SAS CL 105 46 26 P2 Bogotá D.C. 8052552	DIRECCIÓN DE ENTREGA: PARQUE PALESTINA PARQUE PALESTINA, CL 68 SUR #81C-09	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCA FECHA: 17/05/2025 REMISIÓN: 24263

CANTIDAD	PRODUCTO
7,50	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.50 M3 DE SU ORDEN POR 14.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:48				
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
NELSON FABIAN LOPEZ SILVA	TRL-952	23840		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ _____

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ _____

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

1233

CONCREMOVIL

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ
BELZCON SAS CL 105 46 26 P2 Bogotá D.C. 8052552	PARQUE PALESTINA PARQUE PALESTINA, CL 68 SUR #81C-09	FECHA: 17/05/2025 REMISIÓN: 24266

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.50 M3 DE SU ORDEN POR 14.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:35	11:30	12:10		
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ANDERSON SMITH GACHA MOYA	WFC-056	23830		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1999 y con las características estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Santana — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

John Santana — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

1234

Copia para Cliente

GUIA DE DESPACHO Nº 1345511

Datos de la Guia de Despachos

Nº Orden de Entrega	1345511	Fecha de Entrega	12/05/2025
Estado	Orden Ent. Pagada		
Tienda	BOSA		
Tipo Entrega	Despacho Domicilio (Fact. Inmed.)		

Datos Cliente

Razón Social	BELZCON SAS	CC/NIT/RUT	901252860
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas		
Nombre de Contacto	BELZCON SAS	Teléfono Contacto	8052552
Dirección de Servicio	CALLE 68 SUR #81C-09	Departamento	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	Barrio	BOSA-BOSA
Teléfono de Servicio	322 2280448	Indicaciones	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COMPRADA	CANTIDAD ENTREGADA
1444809	MALLA ELECTR 4X4MM 15X15CM 2.35X6M REYNA	10.00	10.00

PERSONA QUE DESPACHO:

PERSONA DE SEGURIDAD: Adriana Molina

FIRMA DEL CLIENTE: Santana

PERSONA QUE RECIBE: - John Santana 1012420871

DETALLE DE QUIEN RECIBE:

OBSERVACIONES DE ENTREGA:

Vendedor Default Cliente Juridico

CENCOSUD COLOMBIA S.A
EASY BOSA
08 MAY 2025
ENTREGADO
ESTIMADO CLIENTE ASEGURESE DE
FIRMAR VERIFICAR SUMAS

322 2280448
Jhon Santana.
Calle 68 Sur # 81 c 09
Coliseo Bosa Palestina

FERREDEPOSITO G&G S.A.S.
FERREDEPOSITO G Y G S.A.S
NIT 901.181.988-5
CRA 5 32 31
Tel: (57) 3214816882
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-386

Para	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Nit	901.886.663-3
Fecha	2025-05-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	METRO ARENA PEÑA	15.00	120,000.00	1,800,000.00
2	CEMENTO X 50 KL CEMEX	7.00	29,411.78	245,000.13
3	METRO ARENA MIXTO	1.00	170,000.00	170,000.00
4	ACARREO	1.00	60,000.00	60,000.00

Total Bruto	2,235,882.46
Subtotal	2,235,882.46
IVA 0%	0.00
IVA 19%	39,117.67
Total a Pagar	2,275,000.13

Se reciben 6 m^3 arena Peña
7 bultos cemento
24 toneladas arena mixto
Santana

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Adriana De La
larochela84@hotmail.com
(601) 5672958

IMPOGRIFOS

IMPOGRIFOS SAS
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com

FORMATO DI
NO.002

CLIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**FECH**
DIRECCION	**PARQUE NACIONAL**	5/5/2

ITEM	CANTI
BOTON ANTIVANDALICO METALICO CROMADO	3
VALVULA ANTIVANDALICA SANITARIO	3

RECIBE :

1237

IMPOGRIFOS

IMPOGRIFOS SAS
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com


FORMATO DE ENTREGA
NO.00242946

CLIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	FECHA	
DIRECCION	SERENA	5/5/2025	

ITEM	CANTIDAD
CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO	3

6-5-25

RECIBE :



1238

CONCREMOVIL	CLIENTE: BELZCON SAS CL 105 46 26 P2 Bogotá D.C. 8052552	DIRECCIÓN DE ENTREGA: PARQUE PALESTINA PARQUE PALESTINA, CL 68 SUR #81C-09 .	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 17/05/2025 REMISIÓN: 24263

CANTIDAD	PRODUCTO
7,50	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.50 M3 DE SU ORDEN POR 14.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09.48				
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
NELSON FABIAN LOPEZ SILVA	TRL-952	23840		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ _____

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ _____

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

1254

CONCREMOVIL	CLIENTE: BELZCON SAS CL 105 46 26 P2 Bogotá D.C. 8052552	DIRECCIÓN DE ENTREGA: PARQUE PALESTINA PARQUE PALESTINA, CL 68 SUR #81C-09 ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 17/05/2025 REMISIÓN: 24266

CANTIDAD	PRODUCTO
7.00	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.50 M3 DE SU ORDEN POR 14.50 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACION DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:35	11:30	12:10		
CONDUCTOR	Mixer	PRECINTO	OBSERVACIONES	
ANDERSON SMITH GACHA MOYA	WFC-056	23830		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y las características estipuladas por el cliente

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Santana — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

John Santana — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Copia para Cliente

GUIA DE DESPACHO Nº 1345511

Datos de la Guia de Despachos

Nº Orden de Entrega	1345511	Fecha de Entrega	12/05/2025
Estado	Orden Ent. Pagada		
Tienda	BOSA		
Tipo Entrega	Despacho Domicilio (Fact. Inmed.)		

Datos Cliente

Razón Social	BELZCON SAS	CC/NIT/RUT	901252860
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas		
Nombre de Contacto	BELZCON SAS	Teléfono Contacto	8052552
Dirección de Servicio	CALLE 68 SUR #81C-09	Departamento	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	Barrio	BOSA-BOSA
Teléfono de Servicio	322 2280448	Indicaciones	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COMPRADA	CANTIDAD ENTREGADA
1444809	MALLA ELECTR 4X4MM 15X15CM 2.35X6M REYNA	10.00	10.00

PERSONA QUE DESPACHO:

PERSONA DE SEGURIDAD: Adriana Molina

FIRMA DEL CLIENTE: Santana

PERSONA QUE RECIBE: John Santana 1012420871

DETALLE DE QUIEN RECIBE:

OBSERVACIONES DE ENTREGA:

Vendedor Default Cliente Juridico

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 830.059.718-9 EASY BOSA
08 MAY 2025
ENTREGADO
ESTIMADO CLIENTE AGRADECEMOS FIRMAR VERIFICAR SU MERCANCIA

322 2280448
Jhon Santana.
Calle 68 Sur # 81 c 09
Coliseo Bosa Palestina

1241

FERREDEPOSITO G&G S.A.S.

FERREDEPOSITO G Y G S.A.S
NIT 901.181.988-5
CRA 5 32 31
Tel: (57) 3214816882
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-386

Para	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Nit	901.886.663-3
Fecha	2025-05-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	METRO ARENA PEÑA	15.00	120,000.00	1,800,000.00
2	CEMENTO X 50 KL CEMEX	7.00	29,411.78	245,000.13
3	METRO ARENA MIXTO	1.00	170,000.00	170,000.00
4	ACARREO	1.00	60,000.00	60,000.00

Total Bruto	2,235,882.46
Subtotal	2,235,882.46
IVA 0%	0.00
IVA 19%	39,117.67
Total a Pagar	2,275,000.13

Se reciben 6 m³ arena Peña
7 bultos cemento
24 tonas arena mixto
Santana

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Adriana De La
larochela84@hotmail.com
(601) 5672958

1242

ANEXO 7
CONTROL EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

JED INGENIERIA.
ING. JORGE ENRIQUE DIAZ PALACIOS.
NIT. 79´327.738-9
DIRECCION: CALLE 6 No. 3A-22 Este
TELEFONOS: 2461386 FAX 3280472
CELULAR: 315 0484858
Email: jedingcolombia@yahoo.es

MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE ESTACIONES TOTALES, TEODOLITOS, NIVELES Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFIA. DE LAS MARCAS TOPCON, PENTAX, FOIF Y SOUTH ENTRE OTRAS.



Bogotá D.C., marzo 22 de 2025

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ESTACIÓN

No.: 2742

EQUIPO: Estación **MARCA: Hi Target** **REF.: HTS-420R** **SERIAL: H236544**

CLIENTE: RM INGENIERIA SAS **DIRECCION:** DG 70 C SUR 78-37 Bogotá D.C.

Teléfono: **Celular:** 3204739137

Fax: **Email:** rmi.topografia@gmail.com

La revisión y calibración se efectúa siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.
DIAGNÓSTICO Y AJUSTE

Base nivelante	___2___	**Lente interno**	___6___
Tornillos nivelantes	___1___	**Base del retículo**	___3___
Movimiento horizontal	___2___	**Retículo**	___2___
Movimiento vertical	___2___	**Objetivo**	___3___
Displays	___3___	**Teclados**	___3___
Plomada Láser	___2___	**Verticalidad**	___2___
Plomada óptica	__NA__	**Compensador**	___2___
Nivel circular	___2___	**Batería**	___6___
Nivel tubular	___2___	**Cargador**	___NA___

1. Cambio de grasas 2. Ajuste 3. Limpieza 4. Reparación 5. Cambio 6. En buen estado (O.k.)
Otros:

Parámetro o componente	Error permitido	Ajuste
Plomada óptica o láser	1mm o menos	si__x__ no_____
Nivel tubular	¼ o menos de los límites	si__x__ no_____
	Extremos de la escala de nivel	
Nivel del circular	1/3 o menos de la escala del nivel	si__x__ no_____
Perpendicularidad de la línea de la Plomada	10" o menos	si____ no __x__
Doble centrado	10" o menos	si____ no__x__
Mira de colimación	20´	si____ no __x__
Excentricidad entre el standard Y el circulo de vertical	10" o menos	si ____ no __x_
Posición de instalación del circulo Vertical.	+ o – 3 grados desde el "O" Posición.	si ____ no__x___
Compensador	Punto cero + o – 30" exactitud + 00.03´00"	si_____no___x__

JED INGENIERIA.
ING. JORGE ENRIQUE DIAZ PALACIOS.
NIT. 79´327.738-9
DIRECCION: CALLE 6 No. 3A-22 Este
TELEFONOS: 2461386 FAX 3280472
CELULAR: 315 0484858
Email: jedingcolombia@yahoo.es

MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE ESTACIONES TOTALES, TEODOLITOS, NIVELES Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFIA. DE LAS MARCAS TOPCON, PENTAX, FOIF Y SOUTH ENTRE OTRAS.



TEST DE EXACTITUD ANGULO HORIZONTAL

Error antes de calibración ángulo Horizontal: 10"

REFERENCIA	A
P1	00.00´00"
P2	180.00´00"
ERROR	00.00´00"

TEST DE EXACTITUD ANGULO VERTICAL

Error antes de calibración ángulo Vertical: 20"

P1	90.00´00"
P2	270.00´00"
ERROR	00.00´00"

Error máximo permitido 10" respectivamente

TEST DE EXACTITUD DEL DISTANCIOMETRO

Pista patrón (m)	M1	M2	M3	M4	M5	Promedio	Error	Ajuste	Distancia final
5.080	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079	1mm	-------	5.079

Tolerancia permitida: : +/- (2mm + 2ppm)

Patrón utilizado: Colimador marca South LF-3C y pistas patronadas

Nota: Este equipo sale en óptimas condiciones operativas y de funcionamiento.

La validez de este certificado es de seis meses a partir de la fecha de expedición.
Fecha de Caducidad: septiembre 22 de 2025

Jorge Enrique Díaz

ING. JORGE DIAZ
Ingeniero Servicio Técnico

JED INGENIERIA.
ING. JORGE ENRIQUE DIAZ PALACIOS.
NIT. 79´327.738-9
DIRECCION: CALLE 6 No. 3A-22 Este
TELEFONOS:
CELULAR: 315 0484858
Email: jedingcolombia@yahoo.es

MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE ESTACIONES TOTALES, TEODOLITOS, NIVELES Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFIA. DE LAS MARCAS TOPCON, PENTAX, FOIF Y SOUTH ENTRE OTRAS.



Bogotá D.C., mayo 10 de 2025

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NIVELES

No.: 2805

EQUIPO: Nivel **MARCA: Hi Target** **REF.: HT32** **SERIAL: 332060172**

CLIENTE: RM INGENIERIA SAS **DIRECCION: DG 70 C SUR 78-37 Bogotá D.C.**

Teléfono: **CELULAR: 3204739137**

Este Certificado tiene 6 meses de vigencia a partir de su elaboración, bajo buen uso y guardando las precauciones propias para este clase de instrumentos.

La revisión y calibración se efectúa siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

DIAGNÒSTICO Y AJUSTE

Base nivelante	1
Tornillos nivelantes	2
Movimiento lento	o.k
Lente objetivo	o.k
Retícula	2
Compensador	o.k
Enfoque	o.k
Nivel circular	2
Lente interno	o.k

Otros:
1. Cambio de grasas 2.Ajuste 3. Limpieza 4. Reparación 5. Cambio 6. En buen estado (O.k.).

ERROR ANTES DE CALIBRACIÒN

Punto 1		Punto 2	
Lectura 1	164mm	Lectura 1	170mm
Lectura 2	162mm	Lectura 2	169mm
Error 1	2mm	Error 2	1mm

ERROR 2 – ERROR 1 = 1 mm

JED INGENIERIA.
ING. JORGE ENRIQUE DIAZ PALACIOS.
NIT. 79´327.738-9
DIRECCION: CALLE 6 No. 3A-22 Este
TELEFONOS: 2461386 FAX 3280472
CELULAR: 315 0484858
Email: jedingcolombia@yahoo.es

MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE ESTACIONES TOTALES, TEODOLITOS, NIVELES Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFIA. DE LAS MARCAS TOPCON, PENTAX, FOIF Y SOUTH ENTRE OTRAS.



Patròn utilizado: Colimador Marca South LF-3C

Parámetro o componente	Error permitido	Ajuste
Nivel del circular	1/3 o menos de la escala del nivel (3mm).	si____ no__x__
Distancia stadiamétrica	0.4% max 7"	si____ no__x__
Mira de colimación	20´	si____ no__x__
Exactitud del compensador	0.33"	si____ no__x__
Rango de compensación	+ o – 3 15"	si____ no__x__
Línea de visualización visual	+ o – 20" máximo	si____ no__x__
Excentricidad de la escala circular	0.25 de la graduación máxima	si____ no__x__
Precisión		

Nota: Los ajustes realizados al nivel están en el rango de error máximo permitido especificado por cada parámetro en el cuadro anterior dado por las especificaciones del fabricante.

Fecha de Caducidad: noviembre 10 de 2025

Jorge Enrique Díaz

ING. JORGE DIAZ
Ingeniero Servicio Técnico

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No.: IDRD SG 4060-2024 FECHA: 01 MAYO 2025

ESTACION TOPOGRAFICA


EQUIPO ESTACIÓN TOTAL HI TARGET HTS 420 R

PRECISIÓN 2"

CÓDIGO H 236544

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación? SI ☐ NO ☑

EN	HACIA	D OBSERVADO
1		
	3	00°00'00''
	2	91° 36' 21''
2		
	1	00°00'00''
	3	33 59 18
3		
	2	00°00'00''
	1	54 24 24
	S D DERECHO	

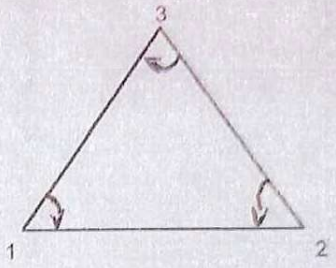

Sumatoria D observado	=	180° 00' 03"
n - 2	=	1
Diferencia	=	00 00 03"
e = a*n	=	6"

e: Error máximo permisible
a = Precisión del equipo
n= número de vertices
Distancia mínima 50 ml

APTO PARA TRABAJAR SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

El Equipo Se Encuentra en optimas condiciones para Trabajar

ELABORO: Firma Rodrigo Mosquera Ibañez

(Nombre) Rodrigo Mosquera Ibañez

(Cargo) Topografo

Nota: Estos chequeos deben realizarse máximo cada 15 días, si el equipo no se considera apto para trabajar, no puede ser usado en obra.

Rodrigo Mosquera Ibañez
Topografo Belzon SAS

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No.: IDRD SG 4060 - 2024 FECHA: 01 Mayo 2025

OBJETO: Control y Verificación Nivel optico Mecanicos


CONTRATISTA: Belzon SAS INTERVENTORIA: Consorcio Santa Teresa

PARQUE: Grupo 2: Mantenimiento y Adecuación, Reparación de infraestructura de parques

NIVEL AUTOMATICO

EQUIPO HI TARGET HT-32 CODIGO 332060172

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación? SI [X] NO [ ]

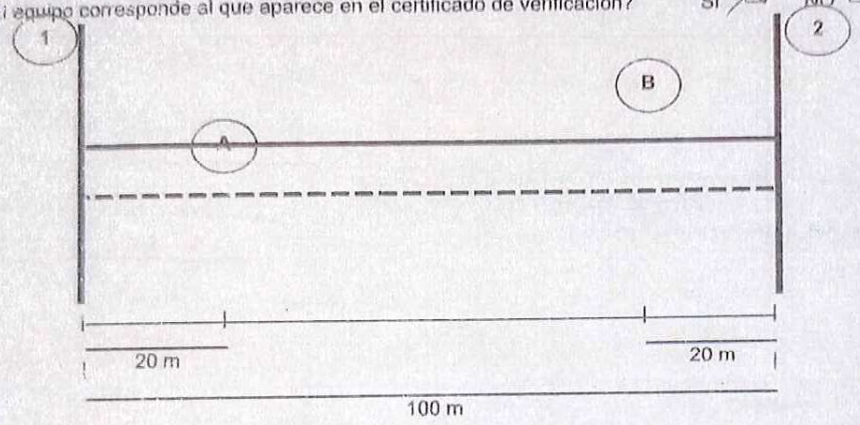

LECTURAS

A1= 1.563	mm	B1= 1.496	mm
A2= 1.679	mm	B2= 1.380	mm
A1 - A2= 0.116	mm	B1 - B2= 0.116	mm

DIFERENCIA DETECTADA 0,000 mm

APTO PARA TRABAJAR SI [X] NO [ ]

COMPROBACION DE MIRAS

EQUIPO HI TARGET HT-32

PRECISIÓN 0,001

CÓDIGO 332060172

MIRA	EQUIPO PATRONADO	DIFERENCIA
Si	Si	0,001

ESTADO ACTUAL

TIENE TODOS LOS CUERPOS	SI [X]	NO [ ]
DOBLADA	SI [ ]	NO [X]
LEGIBLE	SI [X]	NO [ ]

APTO PARA TRABAJAR SI [X] NO [ ]

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No.: IDRD SG 4060 · 2024 FECHA: 16 Mayo 2025

ESTACION TOPOGRAFICA


EQUIPO Estación Total Hi Target Hts - 420R

PRECISIÓN 2"

CÓDIGO H 236544

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación? SI [X] NO [ ]

EN	HACIA	D OBSERVADO
1		
	3	00°00'00"
	2	66° 32' 11"
2		
	1	00°00'00"
	3	82° 56' 23"
3		
	2	00°00'00"
	1	30° 31' 24"
	S D DERECHO	

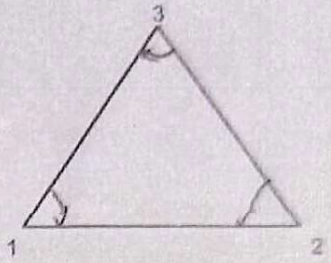

Sumatoria D observado	=	179° 59' 58"
n - 2	=	1
Diferencia	=	00° 00' 00"
e = a*n	=	6"

e: Error máximo permisible
a = Precisión del equipo
n= número de vertices
Distancia mínima 50 ml

APTO PARA TRABAJAR SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:
El Equipo se encuentra en perfectas condiciones para trabajar.

ELABORO: Firma Rodrigo Mosquera Ibañez.
(Nombre) Rodrigo Mosquera Ibañez.
(Cargo) Topografia.

Nota: Estos chequeos deben realizarse máximo cada 15 días, si el equipo no se considera apto para trabajar, no puede ser usado en obra.

1250

Rodrigo Mosquera Ibañez.
Topografo Belcon SAS

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No.: IDRD SG 4060 2024 FECHA: 16 Mayo 2025

OBJETO: Control y Verificación Nivel Optico Mecanico


CONTRATISTA: Belcon SAS INTERVENTORIA: Consorcio Santa Teresa

PARQUE: Grupo 2: Mantenimiento y Adecuación, Reparación de Infraestructura de los Parques

NIVEL AUTOMATICO

EQUIPO HI TARGET HT-32 CODIGO 332060172

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación? SI ☒ NO ☐

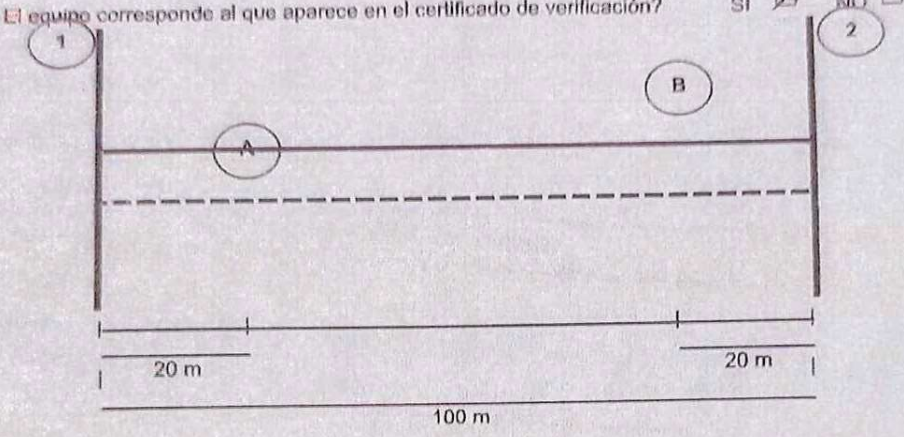

LECTURAS

A1= 1.719	mm	B1= 1.597	mm
A2= 1.533	mm	B2= 1.410	mm
A1 - A2= 0.186	mm	B1 - B2= 0.187	mm

DIFERENCIA DETECTADA 0,001 mm

APTO PARA TRABAJAR SI ☒ NO ☐

COMPROBACION DE MIRAS

EQUIPO HI TARGET HT-32

PRECISIÓN 0,001

CÓDIGO 332060172

MIRA	EQUIPO PATRONADO	DIFERENCIA
Si	Si	0,001
/	/	/

ESTADO ACTUAL

TIENE TODOS LOS CUERPOS	SI ☒	NO ☐
DOBLADA	SI ☐	NO ☒
LEGIBLE	SI ☒	NO ☐

APTO PARA TRABAJAR SI ☒ NO ☐

ANEXO 8

CONTROL DE MATERIALES

		FORMATO PARA CONTROL - INVENTARIO DE MATERIALES	CÓD	BZC-FO-5-13-A
	IDRD BOGOTÁ	NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO IDRD-SG-4060-2024	VERSIÓN	1

ARTICULO / DESCRIPCION	CATEGORIA	No DE ORDEN DE PEDIDO	FECHA DE INGRESO	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
REJILLA EN CONCRETO PARA CARCAMO 40x40x8 CM	Materiales	OP-128	2-may-2025	UN	350,00	$ -	$ -
REJILLA EN CONCRETO PARA CARCAMO 50x50x6 CM	Materiales	OP-128	2-may-2025	UN	30,00	$ -	$ -
POSTE METALICO H=12 M	Materiales	SUB-CONTRATISTA	8-may-2025	UN	9,00	$ -	$ -
LLAVE LAVAMANOS PUSH CUELLO	Materiales	OP-	8-may-2025	UN	1,00	$ -	$ -
CODO SANITARIO 3" CXC	Materiales	OP-	8-may-2025	UN	4,00	$ -	$ -
TUBO SANITARIO 3" X6 MTS	Materiales	OP-	8-may-2025	UN	14,00	$ -	$ -
VALVULA BOLA PCP ROCADO 1/2"	Materiales	OP-	8-may-2025	UN	4,00	$ -	$ -
TEE 1/2 PRESION	Materiales	OP-	8-may-2025	UN	2,00	$ -	$ -
CODO PRESION 1/2"	Materiales	OP-	8-may-2025	UN	4,00	$ -	$ -
SOLDADURA LIQUIDA 1/4	Materiales	OP-	8-may-2025	UN	2,00	$ -	$ -
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/4	Materiales	OP-	8-may-2025	UN	2,00	$ -	$ -
MALLA ELECTROSOLDADA 4X4 MM 15x15 CM	Materiales	OP-	9-may-2025	UN	10,00	$ -	$ -
LADRILLO TOLETE MACIZO	Materiales	OP-	12-may-2025	UN	600,00	$ -	$ -
BLOQUE ESTANDAR # 5	Materiales	OP-	12-may-2025	UN	500,00	$ -	$ -
CEMENTO GRIS x 50 KG	Materiales	OP-	13-may-2025	UN	65,00	$ -	$ -
GRAVA	Materiales	OP-	13-may-2025	M3	2,00	$ -	$ -
ARENA RIO	Materiales	OP-	13-may-2025	M3	4,00	$ -	$ -
CEMENTO GRIS x 50 KG	Materiales	OP-	16-may-2025	UN	7,00	$ -	$ -
ARENA PEÑA	Materiales	OP-	16-may-2025	M3	15,00	$ -	$ -
ARENA MIXTO	Materiales	OP-	16-may-2025	M3	1,00	$ -	$ -
CONCRETO BOMBEABLE 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 6"	Materiales	OP-	17-may-2025	M3	14,50	$ -	$ -
BARRA CORRUGADA G-60 3/8 PG X 6 MTS DIACO	Materiales	OP-	19-may-2025	UN	8,00	$ -	$ -
VINILO T1 5GL VINILICO BLANCO	Materiales	OP-	19-may-2025	UN	5,00	$ -	$ -
MESON RADIANTE 180X52 4G IZQ MONCCONTROL	Materiales	OP-	19-may-2025	UN	1,00	$ -	$ -
CEMENTO GRIS TP1CEMEX SUPERRESISTENTE 50K	Materiales	OP-	19-may-2025	UN	11,00	$ -	$ -
GEOTEXTIL NT 1600S 1 x 3.5M ANCHO PAVCO	Materiales	OP-	19-may-2025	ML	12,00	$ -	$ -
MALLA ELECTROSOLDADA 4X4 MM 15x15 CM	Materiales	OP-	20-may-2025	UN	30,00	$ -	$ -
GRAMA NEW GOLDEN II VERDE 30mm 3/8 1500g/m2 -N-	Materiales	Remision 35616, Cuper	20-may-2025	M2	464,00	$ -	$ -
TUBERIA DRENAJE 4" DRAINPIPE UNION X 30 MTS	Materiales	OP-	22-may-2025	UN	9,00	$ -	$ -
ALAMBRE RECOCIDO NEGRO C17X1KG	Materiales	OP-	23-may-2025	UN	2,00	$ -	$ -
BARRA CORRUGADA G-60 3/8 PG X 6 MTS DIACO	Materiales	OP-	23-may-2025	UN	14,00	$ -	$ -
CEMENTO GRIS TP1CEMEX SUPERRESISTENTE 50K	Materiales	OP-	23-may-2025	UN	4,00	$ -	$ -

PARQUE	PROVEEDOR
PARQUE PORVENIR	ARKA PREFABRICADOS
PARQUE PORVENIR	ARKA PREFABRICADOS
PARQUE SANTA CLARA	POSTES Y TAPAS SAS
PARQUE SAN CRISTOBAL (CEFE)	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE PALESTINA	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE EL COUNTRY	LADRILLERA SAN JUAQUIN
PARQUE EL COUNTRY	LADRILLERA SAN JUAQUIN
PARQUE TIMIZA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE TIMIZA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE TIMIZA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE EL RECREO	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE EL RECREO	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE EL RECREO	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE PALESTINA	CONCREMOVIL
PARQUE EL COUNTRY	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE EL COUNTRY	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE EL COUNTRY	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE EL COUNTRY	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE EL COUNTRY	HOMECENTER SODIMAC
PARQUE PORVENIR	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE PIJAOS	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE EL COUNTRY	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE EL COUNTRY	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE EL COUNTRY	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)

BUJE SANITARIO SOLDADO 3X2	Materiales	OP-	23-may-2025	UN	4,00	$ -	$ -	PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
CODO SANITARIO 3" CXC	Materiales	OP-	23-may-2025	UN	4,00	$ -	$ -	PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
MONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL MIRAGE	Materiales	OP-	23-may-2025	UN	1,00	$ -	$ -	PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
CANASTILLA CROMO FLEXIBLE	Materiales	OP-	23-may-2025	UN	1,00	$ -	$ -	PARQUE EL COUNTRY	IMPOGRIFOS SAS
JUEGO PROLUDIC REF: Z24-3810	Mobiliario de oficina	SUB-CONTRATISTA	26-may-2025	UN	1,00	$ -	$ -	PARQUE PALESTINA	BALERCO
JUEGO PROLUDIC DIABOLO REF: J38102-C	Mobiliario de oficina	SUB-CONTRATISTA	26-may-2025	UN	1,00	$ -	$ -	PARQUE PALESTINA	BALERCO
LADRILLO TOLETE RECOCIDO	Materiales	OP-	26-may-2025	UN	400,00	$ -	$ -	PARQUE EL COUNTRY	LADRILLERA SAN JOAQUIN SAS
BLOQUE ESTANDAR # 5	Materiales	OP-	26-may-2025	UN	40,00	$ -	$ -	PARQUE EL COUNTRY	LADRILLERA SAN JOAQUIN SAS
ARENA PELDAR	Materiales	OP-	27-may-2025	M3	12,00	$ -	$ -	PARQUE EL COUNTRY	COMIND S.A.S
ARENA PELDAR	Materiales	OP-	27-may-2025	M3	12,00	$ -	$ -	PARQUE EL COUNTRY	COMIND S.A.S
ARENA PELDAR	Materiales	OP-	29-may-2025	M3	12,00	$ -	$ -	PARQUE EL COUNTRY	COMIND S.A.S
ARENA PELDAR	Materiales	OP-	29-may-2025	M3	12,00	$ -	$ -	PARQUE EL COUNTRY	COMIND S.A.S
ADOQUIN 10x20x6 CM	Materiales	OP-	30-may-2025	UN	4000,00	$ -	$ -	PARQUE EL RECREO	LADRILLERA SAN JOAQUIN SAS

OBSERVACIONES ADICIONALES:

OP= ORDEN DE PEDIDO
CM= CAJA MENOR

Firma persona Responsable	Firma de aprobación Director de obra	Firma de aprobación de compras Director	Firma de aprobación Gerencia de proyectos

1254

ANEXO 9

FORMATO ACTIVIDADES LIBERADAS

FECHA	N° DE FOLIO	N° DE NOTA	ACTIVIDAD LIBERADA
6/05/2025	ANEXO 14 PARQUE PIJAOS	169	llegan 13 modelos de cerramientos los cuales son instalados en constado norte y lateral occidental.D3:D19
8/05/2025		171	Actividades de fabricación de cerramiento en bodega
10/05/2025		172	Se reinstala llantas para ingreso de volquetas, se revisa y replantea mampostería en zona de rampa, se retira capa vegetal donde debe ir la caneca de basura.
12/05/2025		173	Se realiza concreto de limpieza para realizar alzado de muros bajo cerramiento y se realiza la instalación de módulos en malla eslabonada en el costado occidental de la cancha.
12/05/2025		174	La interventoría hace observaciones recordando al contratista hacer prueba de tintas para el cerramiento instalado y amentar el ingreso de material y personal
13/05/2025		175	Se ejecuta trabajos de armado caja de inspección frente cárcamo ingreso cancha.
14/05/2025		176	Fabricación e instalación de módulos de cerramiento .
20/05/2025		184	Suministro de 3 rollos de grama new golden II equivalente a 232 m2
21/05/2025		186	Adecuación del ingreso a la cancha de fútbol, y aplicación de pintura de los módulos de cerramiento.
22/05/2025		188	Se realiza el cambio de 10 luminarias en la administración, se hace el traslado de la malla eslabonada para retiro y envío al estadio de techo.
23/05/2025		190	Se instala grama sintética en zona de la placa y acceso a administración
24/05/2025		191	Se instala marco de cárcamo y se remata cajas de inspección
26/05/2025		192	Se instalan 14 módulos en administración, se instalan láminas de PVC en techo zona externa administración y luminaria.
12/05/2025	ANEXO 15 - EL RECREO	12	Se realiza suministro e instalación de cerramiento provisional con postes de madera y lona verde, desmonte, trasiego y acopio de adoquín en zona sendero cancha sintética F8.
14/05/2025		16	Limpieza de adoquines desmontados en zona sendero cancha sintética F8
15/05/2025		18	Extendido de arena lavada, nivelación y compactación mecánica con rana.
20/05/2025		24	Modulación y reinstalación de adoquín en zona sendero cancha sintética fútbol.

5/05/2025	ANEXO 17- PATIO BONITO	128	Aplicación de primera capa de impermeabilizante kristol T1 en piso, muros y techo de tanque de almacenamiento agua potable
6/05/2025		130	Aplicación de segunda capa de impermeabilizante kristol T1 en piso, muros y techo de tanque de almacenamiento agua potable
9/05/2025		135	Desmonte de tapa existente en escotilla superior de tanque de almacenamiento de agua potable, pulida y retiro de pintura existente y corrosión.
19/05/2025		139	Mantenimiento de puerta de escotilla de tanque de almacenamiento de agua potable mediante aplicación de pintura, anticorrosivo y esmalte, color gris y verde.
2/05/2025	ANEXO 18- PORVENIR	68	Afinado de pañete interno de pozos de inspección, mampostería en contorno de módulos de baños para protección de tubería sanitaría, limpieza e instalación de rejillas 40x40 cm en cárcamos zona plazoleta pistas de atletismo, y desmonte de piso en caucho y excavación manual de filtro en gravilla zona pista de trote
3/05/2025		72	Limpieza y reinstalación de rejillas existentes en cárcamos zona plazoleta de eventos, limpieza e instalación de rejillas nuevas en trabajos faltantes (40x40x8) y (50x50x6) ; muros en mampostería en contorno de módulos de baños y pañete de los mismos.
6/05/2025		74	Instalación de módulos en estructura metálica en contorno de baños (puntos de soldadura)/ re instalación de rejillas en cárcamos zona pista de patinaje y gimnasios; instalación de rejillas para cárcamos nuevas 40x40x8cm en zona gimnasios.
		76	Excavación manual, trasiego y acopio de gravilla en pista de trote.
7/05/2025		78	Placa en concreto contorno del pozo de A.S. en zona de adoquín
10/05/2025		87	Instalación de pasos en pozos de inspección sanitario y pluvial; instalación de accesorios tubería PVC-P en zona acometida agua potable a petición del EAAB.
7/05/2025	ANEXO 19 . P. Nacional	363	Instalación de accesorios y tubería PVC-P y válvula tipo push en un sanitario baño mujeres calle 39
8/05/2025		366	Remates de soldadura y pintura en tramos, costado oriental en baranda M-83 zona patinodromo
12/05/2025		371	Resane en regatas de reparaciones hidráulicas en baños calle 39
21/05/2025		383	Demolición, enchape en muros, desmonte de sanitarios, valvula tipo push y lavamanos en baños mujeres, hombres y movilidad reducida zona calle 36.
19/05/2025	ANEXO 20- TIMIZA	95	Instalación de formaleta para fundir viga de la baranda, se librera plomos, niveles por parte de interventoría
21/05/2025		100	Fundición de pilotines y viga para el confinamiento del sendero peatonal, se verifica cumplimiento de diseño de mezclas, ensayos a 7 y 14 días

22/05/2025		101	Desmonte e instalación de formaleta en tramo faltante de la viga de cimentación
23/05/2025		105	Fundición de viga en concreto y pilotines, se toman 3 y 6 cilindros, para 7-14 y 28 días.
20/05/2025	ANEXO 22- E. OLAYA HERRERA	171	Replanteo e identificación actividades de urbanismo e instalación de módulo de baños en zona verde comprendida entre cancha de tenis y cancha sintética
27/05/2025		177	cerramiento de zona de trabajo
28/05/2025		178	descapote y excavación manual con el fin de nivelar y alcanzar terreno natural de base para estructura de la zona de adoquín.
23/05/2025	CIUDAD MONTES COD 16-112	100	Limpieza y retiro de escombros provenientes de la cubierta y la señalización del área de riesgo por un posible colapso o caída parcial de la cubierta del administración en teja de barro y estructura en madera.
17/05/2025	LA PALESTINA 07-459	36	Fundiciónd e la placa de concreto de 3000 PSI concreto premezclado, se realizan ensayos para resultados a 7-14 y 27 días
19/05/2025		36	Dilataciones en placa de concreto

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 21 días del mes de MAYO de 2025 se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 12-1008

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: COMPLEJO ACUÁTICO

DIRECCIÓN: CALLE 63 # 47-08 LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCION

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados.

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA SC 4060-2024 - CUYO OBJETO ES "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REMODELACION Y RECONSTRUCCION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR IDRD GRUPO 2

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	JULIO (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BELLCON IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) — CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SANTA TERESA 22 (Escriba el nombre o razón social del contratista) — CONTRATO No 4050 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA: CONSORCIO BELLCON IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1 * Se realizó arreglo de tubería que estaba averiada de acuerdo con la Emergencia
2 reportada el día viernes 16 de mayo de 2025 en el área de la piscina de clavados
3 dos.
4 * Ajuste de una puerta "salida de emergencia" - en área de clavados
5 * Suministro e instalación de un (1) lavamanos redondo ceramico "sobreponer"
6 en el baño del vestier de hombres del 1er piso.
7
8


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra. Toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

Powered by CamScanner

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1 PLANTA ARQUITECTÓNICA



2.2.2 DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CID	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4 DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACENAMIENTO (Si aplica) — Folios

Comentarios: N A

☐ ENTREGA DE PLANOS Y PAZ Y SALVOS DE SERVICIOS PUBLICOS (Adjuntar un documento por entidad)

EAAB N A ENEL N A VANTI N. A

UAESP ALUMBRADO N A UAESP PODA DE SPEE N. A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PARQUES

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

Comentarios

☐ Comentarios: MANUAL DE MANTENIMIENTO POLIZAS Y GARANTIAS
N.A.

☐ Comentarios: OTROS (indicar cuales)
N.A.

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
LUIS A. MEDRANO B	CONSORCIO SANTA TERESA	3142312278 28	
Claudia Pedraza.	Consorcio Bercon Sena1	3015599860	
JAIME CASTILLO.	ADMINISTRADOR PROFESIONAL IDRD	3105603310	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los

VEINTIUN (día en letras) 21 (día en números) días del mes de MAYO (mes en letras) de 2025 (Año)

Entrega

(Firma)
(Nombre) INC. LUIS MEDRANO B
CARGO RESIDENTE INTERVENTORIA
Area
Entidad

Recibe

(Firma)
(Nombre) Claudia Pedraza.
CARGO Ing. Residente de obra.
Area
Entidad Bercon

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogota, a los 21 días del mes de MAYO de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 12091

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: PRD - UCAD

DIRECCIÓN: CRA 60 # C3-75 LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024 CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2024. (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	JULIO (Mes)	DE	2025 (Año)	
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCAN IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			CONTRATO No 4060 (Número Contrato)	DE 2024. (Año)	
INTERVENTOR	CONSORCIO SANTA ROSEVA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)			CONTRATO No 4083 (Número de Contrato)	DE 2024. (Año)	
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	(Escriba el nombre o razón social del contratista)					

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Pañete impermeabilizado de cubierta Edificio #1 Consultorios
2. Limpieza de canales en Edificio #4 y #5 (Acondicionamiento y metodología)
3. Desmonte y retiro de manto en Edif. #1, #4 y #5; instalación de nuevo manto asfáltico.
4. Limpieza de bajantes de A. lluvias en Edif #1 Consultorios.
5. Sellado de fisuras y juntas con Emulsión asfáltica en Edif. #1 Consultorios (cubierta)
6. Pañete impermeabilizado en fachadas oriental, occidental y sur así como de los muros de cubierta en la parte inferior (1/2 caña) en Edificio #1 Consultorios
7. Rehabilitación de mortero en la zona de bajantes de A. lluvias Edificio #5 Aro Técnica y Metodología.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

Powered by CamScanner

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

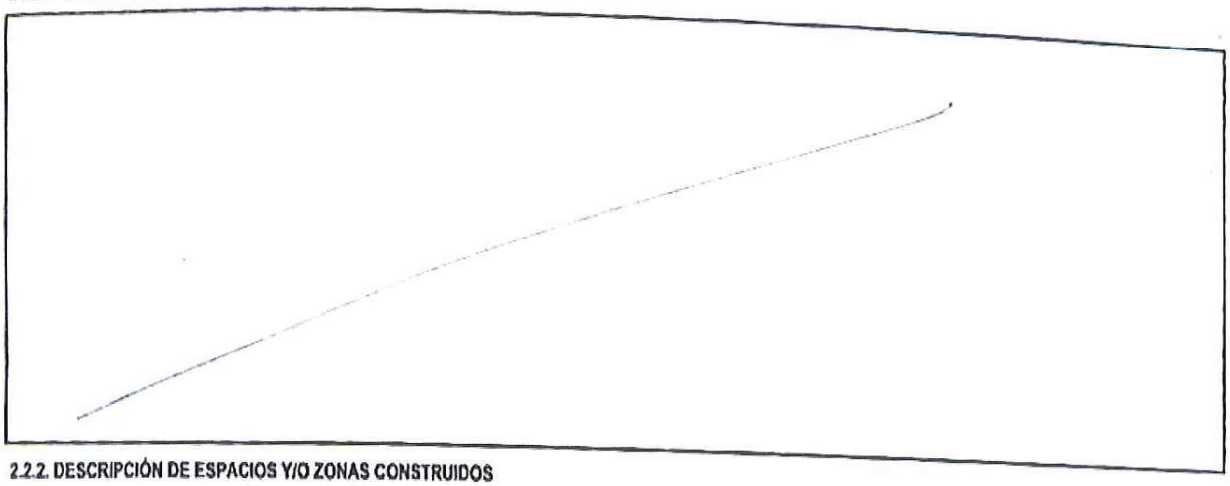

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

	INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica)	Folios:
Comentarios:	N.A	
	ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)	

E.A.A.B N.A ENEL N.A VANTI N.A

UAESP ALUMBRADO N.A UAESP PODA CESPED N.A

Comentarios

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

MANUAL DE MANTENIMIENTO. POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios N.A.

OTROS (indicar cuales)

Comentarios N.A.

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
CLAUDIA PEDRAZA	CONSORCIO BELLSON IDRD		
LUIS A. MEDRANO B.	CONSORCIO SANTA TERESA 28	3202213218	
Camilo Suárez	IDRD	3204746161	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

VEINTIUNO (día en letras) 21 (día en números) días del mes de MAYO (mes en letras) de 2025 (Año)

Entrega: LUIS A MEDRANO B, RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA TERESA 28

(Firma)

(Nombre) Claudia Pedraza.

CARGO Residente de Obra.

Area

Entidad CONSORCIO BELLSON IDRD

Recibe:

(Firma)

(Nombre) Camilo Suárez

CARGO Ad. Proyectos

Area Escenarios

Entidad IDRD

Powered by CamScanner

ANEXO 10

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES

CÓDIGO	MT-MC-01
VERSIÓN	01
FECHA	23/12/2024

SALIDAS NO CONFORMES COMPONENTE 1

#	COMPONENTE	Nº	QUIEN REPORTA LA SALIDA NO CONFORME	FECHA DE REPORTE	PROCESO	DESCRIPCION DE LA SALIDA NO CONFORME	INCUMPLIMIENTO IMPLICADO	ACCIÓN TOMADA	FECHA DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	FECHA DE CIERRE
1	Calidad	001	Interventoria	3/12/2024	Gestión estrategica	Se está incumpliendo con los compromisos adquiridos en comité y por ende con los requisitos contractuales por parte con del Consorcio Belzcon IDRD 1, lo cual se esta evidenciando en los comités semanales celebrados con la Entidad y la Interventoria los dias 26 de noviembre y 03 de diciembre de 2024.	Compromisos establecidos en comité	1.Revisar y cumplir los compromisos adquiridos a la fecha de toma de la acción correctiva. 2.Mesa de trabajo con el equipo de profesionales que hacen parte del Consorcio Belzcon IDRD 1, con el fin de establecer las directrices a seguir para controlar eficiente y eficazmente los compromisos adquiridos en comité. 3.Controlar los compromisos adquiridos, haciendo seguimiento y reportando semanalmente a la gerencia, de tal manera que en futuros comités se implemente y se tenga en cuenta todos los compromisos que se adquieren. 4.Velar y realizar el respectivo seguimiento de los compromisos adquiridos en cada comité por parte de cada componente los cuales tendrán la responsabilidad de asegurar que sea cumplido.	1.) 29/01/2025 2.) 15/01/2025 3.) Durante toda la ejecucion del proyecto los lunes de cada semana. 4.) Durante toda la ejecucion del proyecto los lunes de cada semana.	1.) Director de Obra 2.) Director de Obra y Profesional de Calidad 3.) Director de Obra 4.) Profesionales responsables de cada componente y/o especialidad.	Se dio inicio a la ejecución de las primeras actividades establecidas en el Plan de Acción.	Director de obra	N/A	N/A
2	Calidad	002	Interventoria	13/01/2025	Calidad y técnico	Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, ensayos de laboratorio, caracterizaciones de materiales granulares y diseño de mezclas.	Plan de Inspección y Ensayos	1.Enviar los materiales granulares a caracterizar 2.Enviar al laboratorio los materiales para el diseño de mezclas. 3.Consecucion de las caracterizaciones iniciales, pendientes incluidas las de los materiales reciclados. 4.Reunion con el equipo de trabajo para establecer directrices de control en las actividades propias de calidad. 5.Reuniones semanales periodicas. 6.Hablar con el area de compras para comunicar a todos los proveedores de la importancia de hacer entrega oportuna de los certificados de calidad. 7.Designar un responsable que apoye la gestión de la consecucion de los certificados de calidad. 8.Gestionar oportunamente la consecucion de los certificados de calidad de los materiales que se utilicen en el proyecto. 9.Divulgar el Plan de Inspección y Ensayos al equipo de trabajo y concientizarlos respecto a la importancia de cumplir con la periodicidad establecida para la realizacion de los ensayos. 10.Hacer seguimiento semanal al cumplimiento del plan de inspección y ensayos.	1. 31/01/2025 2. 31/01/2025 3. 31/01/2025 4. 15/01/2025 5. Una vez a la semana 6. 17/01/2025 7. 15/01/2025 8. Continuamente 9. 10/02/2025 10. Semanalmente	1.Director de Obra y Compras 2.Director de Obra y Compras 3.Profesional de Calidad 4.Profesional de Calidad y director de Obra 5.Profesional de Calidad y director de Obra 6.Profesional de Calidad y director de Obra 7.Director de Obra 8.Profesional de Calidad director de Obra y Compras 9.Profesional de Calidad y director de Obra 10.Residentes de obra Profesional de Calidad y director de Obra	Se dio inicio a la ejecución de las primeras actividades establecidas en el Plan de Acción.	Director de obra	N/A	N/A
3	Calidad	003	Interventoria	23/01/2025	Calidad y técnico	Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, ensayos de laboratorio, caracterizaciones de materiales granulares y diseño de mezclas.	Indicadores de gestión y Plan de Inspección y Ensayos	1-Reunión con el equipo de trabajo para establecer directrices de control. 2-Revisión en las reuniones semanales periódicas, de las causas que impiden cumplir oportunamente con los entregables. 3-Concientizar al equipo de trabajo respecto a la importancia de cumplir con la entrega oportuna de los entregables y con el Plan de Inspección y ensayos. 4-Hablar con el área de compras para comunicar a todos los proveedores de la importancia de hacer entrega oportuna de los certificados de calidad. 5-Divulgar al equipo de trabajo el Plan de Inspección y ensayos. 6-Seguimiento a las acciones tomadas.	1.24/01/2025 2.Lunes de cada semana 3.24/01/2025 4.24/01/2025 5.17/02/2025 6.Continuamente hasta finalizar el proyecto.	1.Director de Obra 2.Profesional de Calidad director de Obra 3.Profesional de Calidad director de Obra 4.Director de Obra 5.Director de Obra 6.Residentes de obra Profesional de Calidad director de Obra	Se dio inicio a la ejecución de las primeras actividades establecidas en el Plan de Acción.	Director de obra	N/A	N/A
4	Calidad	004	Interventoria	24/12/2024	Técnico	Presunto Incumplimiento según lo establecido en los siguientes comunicados. IDRD-4080-G2-2024-025 del 24/12/2024 IDRD-4080-G2-2024-074 del 26/12/2024 IDRD-4080-G2-2024-094 del 30/12/2024 IDRD-4080-G2-2024-130 y IDRD-4080-G2-2024-133 del 17/01/2025 IDRD-4080-G2-2024-142 del 20/01/2025 IDRD-4080-G2-2024-179 y IDRD-4080-G2-2024-187 del 31/01/2025 IDRD-4080-G2-2024-200 del 04/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-203 y IDRD-4080-G2-2024-207 del 5/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-210 del 06/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-220 del 10/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-248 del 17/02/2025 IDRD-4080-G2-2024-276 del 06/03/2025	Incumplimiento al contrato de obra	En gestión por parte de la gerencia y el área jurídica de CONSORCIO BELZCON IDRD 1	En gestión	En gestión	En gestión	Director de obra Abogado Gerente	N/A	N/A

Elaboró: Patricia Serrano Espinel	Revisó: Enrique Guzmán
Profesional de Calidad	Director de Obra

936

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

SOLICITUD No.	001	

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA [X] MEJORA [ ]

ORIGEN:

AUDITORÍA INTERNA	[ ]	AUDITORÍA EXTERNA	[ ]	QUEJAS Y RECLAMOS	[ ]
PETICIONES	[ ]	SALIDA NO CONFORME	[X]	TENDENCIA DEL SECTOR	[ ]
OTRO:	[ ]	Cuál:			

FECHA: 03/12/2024

PROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD CONSORCIO BELZCON IDRD I

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
(5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)

Se está incumpliendo con los compromisos adquiridos en comité y por ende con los requisitos contractuales por parte con del Consorcio Belzcon IDRD I, lo cual se esta evidenciando en los comités semanales celebrados con la Entidad y la Interventoría los días 26 de noviembre y 03 de diciembre de 2024.

CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)

-Revisar los compromisos adquiridos en los comités a la fecha de toma de la acción correctiva.
-Cumplir los compromisos adquiridos en los comités a la fecha de toma de la acción correctiva.

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 m's: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)

Falta de verificación y control de los compromisos establecidos por las partes interesadas.

PLAN DE ACCIÓN

No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	Revisar y cumplir los compromisos adquiridos a la fecha de toma de la acción correctiva.	DIRECTOR DE OBRA	28/01/2025
2.	Mesa de trabajo con el equipo de profesionales que hacen parte del Consorcio Belzcon IDRD 1, con el fin de establecer las directrices a	DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD	15/01/2025

	seguir para controlar eficiente y eficazmente los compromisos adquiridos en comité.		
3.	Controlar los compromisos adquiridos haciendo seguimiento y reportando semanalmente a la gerencia, de tal manera que en futuros comités se implemente y se tenga en cuenta todos los compromisos que se adquieren.	DIRECTOR DE OBRA	Durante toda la ejecución del proyecto los lunes de cada semana.
4.	Velar y realizar el respectivo seguimiento de los compromisos adquiridos en cada comité por parte de cada componente los cuales tendrán la responsabilidad de asegurar que sea cumplido.	PROFESIONALES RESPONSABLES DE CADA COMPONENTE Y/O ESPECIALIDAD	Durante toda la ejecución del proyecto los lunes de cada semana.

No.	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.	Se revisaron los compromisos adquiridos y se ha tratado en lo posible de que sean cumplidos, sin embargo, existen determinantes que han afectado el cumplimiento de algunos de ellos.	28/01/2025	x		
2.	Mesa de trabajo con el equipo de profesionales que hacen parte del Consorcio BELZCON IDRD 1, con el fin de establecer las directrices a seguir para controlar eficiente y eficazmente los compromisos adquiridos en comité.	15/01/2025	x		
3.	Controlar los compromisos adquiridos haciendo seguimiento y reportando semanalmente a la gerencia. De tal manera que en futuros comités se implemente y se tenga en cuenta todos los compromisos que se adquieren.	Durante toda la ejecución del proyecto los lunes de cada semana.		X Se ha efectuado de manera parcial	12 de mayo
4.	Velar y realizar el respectivo seguimiento de los compromisos adquiridos en cada comité por parte de cada componente los cuales tendrán la responsabilidad de asegurar que sea cumplido.	Durante toda la ejecución del proyecto los lunes de cada semana.		X Se ha efectuado de manera parcial	Continuamente

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO: No ha sido eficaz la acción correctiva.

RESPONSABLES: ENRIQUE GUZMAN Y PATRICIA SERRANO

FECHA DE CIERRE:

APROBÓ: ENRIQUE GUZMAN

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A. ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
		29	01	2024

LUGAR: Cruz Roja HORA DE INICIO: 8:30 AM HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Hector Bautista	Gerente	
Sergio Erazo	Director	
Patricia Zamora	Prof. Calidad	
Equipo de trabajo	Eq. Trabajo Int de Asistencia Aduana	

ORDEN DEL DIA

1. Revisión Pendientes
2. Socialización de Acción Correctiva
3. Oportunidad en la Ejecución de Ensayos
4. Asignar Engranaje de las Pesas y Obs. Contratos
5. Evaluación Equipo Técnico
6. Hoja de Pendientes

TEMAS TRATADOS

Hacen de 52-85 Pesas, Asignar el engranaje y que todos Engranen y Soluciones Diferencias 2 Equipos = 1 Ensayistas y 2 Auxiliares El Contrato Cartas Compras asiste y se sabe que todos los Proveedores Tienen Inducción, Contratos con Vencimiento, Papeles y Objeto Precio, Se presentan Entregas y Novedades, que se generan Inconvenientes, todo Tienen Cronograma todo, se Espera que empiecen Antes.
Se Organiza Por Subcontratistas, Abajando con el Frente de todos - Cadena y Contrato
- Tienen Antiguos de Pesas Normal → Hacen el Mantenimiento, Diseño de Hoja,
- El Cinco Ingresen a Procesamiento Despacho y Recibido
- Se Fijan un Turnico General los Viernes en la Tarde de Modo Virtual.
- Por Medio de Abajando se Coordinan la Contratación Apoyo de los Oficios
- Ingeniero Solicita se abanda de manera Oportuna los Salarios de todos los Profesionales y del Comprometido de Calidad.

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

Tema a tratar: Costos y Pagos.

- Pendientes - Semana 2 - Costos, Cotiz y Facturación Agosto hasta 6 Diciembre
- Se gestionará diseño de mezclas con laboratorio y se tramitan muestras en Bthe para el 12 que se realizan pendientes, se tramitara con comentarios para despacho, en cuanto a tema diseño de mezclas.
- Para el mes SIP se solicita remitir el listado de personal autorizado para verificación de documentación.
- Desde el componente ambiental se solicita citar entidad al retiro de ROD de predio Uberneal, Patio Bonito y el porvenir. De igual forma se solicita la entrega de individuos arboreos de los frentes de trabajo. Se solicita retirar el manejo de ROD en los frentes mientras se entrega el retiro. Está pendiente la señalización de áreas de acopio. Se tienen abiertas cantidades de materiales precargadas para generación de PIN ambientales. Se solicita al personal en obra remitir de manera semanal los vales de materiales y recambios para manejar control desde el área ambiental y tramitar certificaciones para informes. Se implementará matriz de control de entrada y salida de materiales y ROD, la cual reposará en Drive para alimentación y Consulta. Se brindan recomendaciones de seguridad para personal en obra.
- Desde el área de Calidad se establecen requerimientos como diseño de mezclas, caracterización de agregados, especificaciones de calidad de materiales, reporte de materiales demandados, certificado de calibración de equipos. Se solicita consultar con proveedor Concretos la asignación de consecutivos para correspondencia enviada y en el asunto registrar el oficio de interventoría que se está atendiendo con cada comunicación y actualizar en drive el log de la comunicación enviada. Se deberá reportar al área de calidad la cantidad de RCDs y estado actual de mes. finalmente se debe informar al área de calidad cualquier modificación de personal mínimo.
- Desde el componente tierras se socializará el procedimiento para manejo de solicitudes de materiales; se deberá traer el requerimiento a través del grupo con suficiente tiempo para trámite. Se dan directrices para manejo de cada item. Se solicita compartir listado de proveedores

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
- Terminar Seminario para Diligenciamiento de Compromisos	Pedro Suarez	Semestre
- Envio de Horarios recibidos todos los Lunes	Compras y Residentes	Semestre
- Hacer seguimiento a Horarios de Pendiente	Enrique y Pedro	Semestre
- Envio de Horarios definidos	Pendiente Enrique y Pedro	27 Enero
- Envio para hacer el Diseño de Mapas	Alejandra y Enrique	27 Enero
- Envio de Ensayos de Graficas	Alejandra y Enrique	27 Enero
- Comunicado a los Ind. Sabanas	Residentes	27 Enero
- Envio Correspondencia, se debe Subir la POA de las Oficinas	Todo el Equipo	Constante
Con sus Anexos al DRIVE - (Compromiso Contestivo cada Mes)		
- Envio Oportunamente de Muestras para Residente e Ingenieros Entregas de Cerveza y SUMA		

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo? SI ☐ NO ☐

Observaciones

- Programar el Proyecto de Mile Buenavista — Pedro y Enrique — 27 Ene.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman.

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	Pedro Suarez
CARGO		CARGO	Profesional de Calidad

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:

Powered by CamScanner

para información general, pac se aclara que el puente con los proveedores será la persona designada desde la oficina. (Alejandra Sánchez). Se socializan procedures y procedimiento para solicitud de materiales. Los personas a cargo del manejo de proveedores serán Jhon Carillo y Enrique Bayuán. Cualquier requerimiento deberá manejarse por medio del grupo. Se establecerá la posibilidad de asignar alguna persona que reciba una vez por semana para casos de repuestos en línea de semana. Área de compras solicita se emite la orden de solicitud de suministro para BARO BLOO y orden de trámite de diseño de materiales, así como lo requerido para la siguiente semana a Alejandra. para tramite interno con área de compras. Área SST solicita reporte de personal diario y comparto material a través del grupo. Se indica que informe 1 tanco ya fue radicado en físico y se dio trámite a este 1.
Se realiza revisión de check list de pendientes para verificación de cumplimiento.

- Se realiza una revisión General con todo el equipo de los Pendientes del Área Técnica y se asignan tareas y Responsables
- Se Socializa al Equipo de trabajo la Acción Correctiva tomada para dar Cumplimiento con los Compromisos adquiridos, y se coordina que se realizará la revisión Semanal Todos los Viernes.
- Se deja Matriz con todos los Pendientes y seguimientos Frecuentes de Cada Componente.
- Directrices Establecidas para la Mejor Continua
  1- Alejandra será el Punto con la Oficina, los especialistas, líderes de Componentes, Directivos, Residentes y todo el Equipo
  2- Los Informes serán entregados todos los 27 de c/Mes
  3- Se Establece un Grupo WhatsApp "Ordenes de Compra" - Para Seguimiento y Control de Ensayos seguidos y Materiales ingresados al Proyecto

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Mesa de trabajo - Maquina de Bacheo — RESPONSABLE DEL EVENTO: Enrique Guzman

FECHA: 24-01-25 — HORA INICIAL: 8:30 — HORA FINAL: — LUGAR: OFICINA BELZCOL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Patricia Serna	51923520	Profesional de Calidad	Belzcon		Belzcon	pattyserna@belzcol.com	3135123003
2	John Carlos Santana	1012420831	Res. Obra	Cons Belzcon IDRD	Santana	Belzcon	orionjs@hotmail.com	3222804148
3	JOHN L CARLOS L	79856871	CADENA OPER	BELZCOL		Belzcol	—	3202894067
4	José David Patiño Garzón	1074177715	Inspector Obra	Belzcon		Belzcon	—	3223150440
5	ENRIQUE GUZMAN	9533226	D. obra	Belzcon		Belzcon		3203430229
6	Alejandra Sanchez Velazco	1083931123	Administrativo	Belzcon		Belzcon	asanchez bzc@gmail.com	3203197435
7	NESTOR BARRERA	80190955	Ing. TECNI	BELZCON		BELZCON	NBARRERA_BZC@GMAIL.COM	3102197754
8	David Orlando Ortiz Sabogal	1024483111	Director de obras	Belzcon		Belzcon	dortiz.bzc@gmail.com	3208679193
9	Angélica María Cano Gil	52901081	C.SST.	Belzcon		Belzcon	aguerrabzc@gmail.com	3124716417
10	Paulina Garcia Fandiño	52900676	P. Social	CD Belzcon		Belzcon	gestiondocumental.idrd@gmail.com	3124277
11	ADRIAN BERON FAJARDO	1019011012	R. Social	D. Belzcon		C. Belzcon	ADRIAN.BZC@GMAIL.COM	3102069144
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales conforme lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, aplicables a los finalizados en estas señaladas. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: http://www.idrd.gov.co/transparencia/acceso-informacion-publica/normatividad/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL V3

Powered by CamScanner

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-1-03-B		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	11 (Día)	4 (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

LUGAR: OFICINA IDRD

COMITÉ: INTERNO

DEPENDENCIA: CONSORCIO BELZCON IDRD

CONVOCO: ING. ENRIQUE GUZMAN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
ING. ENRIQUE GUZMAN	Director de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. GUSTAVO VARGAS	Residente de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. JOHN SANTANA	Inspector de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ARQ. JOHN CUELLAR	Coordinador de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. CLAUDIA PEDRAZA	Residente de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. OSCAR CARDENAS	Ingeniero de programacion y	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. PAULA ORDOÑEZ	Residente administrativa	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. FELIPE ARDILA	Inspector de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ING. DAVID PATIÑO	Inspector de obra	Consorcio Belzcon IDRD 1	
PAULINA GARCIA	Profesional social	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ADRIANA PACHON	Ingeniera ambiental	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ANGELICA CUERVO	Profesional SST	Consorcio Belzcon IDRD 1	
ROSSY CATALINA RUBIO	Auxiliar de ingeniera	Consorcio Belzcon IDRD 1	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Tratar temas importantes y relevantes para el contrato

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Organización de recepción de material diario

Actualización de los presupuestos

Gestión de residuos

Desarrollo de obra parque porvenir

Consolidacion actas iniciales y actas de puesta en servicio y registro fotográfico

Requerimiento oportuno de material a traves de ordenes de pedido

Organización para comité de control interno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se aclara que se deben realizar los cortes de obra cada 15 dias. Además se debe realizar el presupuesto y memorias de cada actividad ejecutada inmediatamente despues de su finalización.

Se cometa sobre el segundo presunto incumplimiento y las activadedes previstas para iniciar ejecución, demolición y desmonte de juegos en el parque palestina, se inicia el adoquin en el parque recreo, el arenero en ciudad montes, y se tiene que verificar el subcontratista para iniciar ejecución en el parque la florida.

Se solicita revisar y socializar el corte de obra del subcontratista Luis Camargo, además se mencionan los problemas de personal de OMR tambien se menciona que la hidratación al personal se realizara con la caja menor.

Se menciona hacer gestion de residuos con consercol, ya que se encuentra aprovado por interventoria.

Se menciona que se debe reportar el avance de obra por cada item de cada parque.

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-1-03-B		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	11 (Día)	4 (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

LUGAR: OFICINA IDRD **COMITÉ:** INTERNO

DEPENDENCIA: CONSORCIO BELZCON IDRD **CONVOCO:** ING. ENRIQUE GUZMAN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
ENTREGA DE PRESUPUESTOS	12/04/2025	inspectores y residentes de obra
CARGAR AL DRIVE ACTAS	15/04/2025	inspectores y residentes de obra
CARGAR AL DRIVE REGISTRO FOTOGRÁFICO	15/04/2025	inspectores y residentes de obra
COLOCACION DE PENDONES	22/04/2025	inspectores y residentes de obra
PAZ Y SALVO ENERO Y FEBRERO CARLOS ARDILA	14/04/2025	inspectores y residentes de obra
CARGAR AL DRIVE LOS VALES QUE SE TENGAN DE MAQUINAS AMARILLAS	24/04/2025	inspectores y residentes de obra

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 25 (Día) 4 (Mes) 2025 (Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

Entregada firmada a:

MATRIZ DE TRABAJO- SOLUCIÓN DE PENDIENTES

No	PENDIENTE	PARQUE Y/ O FRENTE DE TRABAJO	REQUERIMIENTO DEL COMPONENTE	COMPONENTE QUE APORTA LO REQUERIDO	REPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO
1	Presentación y Volante de la convocatoria.	Country	Social	Social	Paulina García	24-ene	24-ene	CUMPLIDO
2	Pendones (pendientes de aprobación)	Todo el proyecto		Social	Paulina García	27-ene	31-ene	EN GESTIÓN
3	Envio para aprobacion volantes palerno sur	Palermo Sur		Social	Paulina García		17-ene	CUMPLIDO
4	Informes Mensuales No 3	Todo el proyecto		todos	Equipo de trabajo	24-ene	27-ene	EN GESTIÓN
5	Puntos de Hidratación	Parque Nacional	SST	SST	Angie	27-ene	27-ene	EN GESTIÓN
6	Kit de emergencias	Todo el proyecto		SST	Angie	27-ene	27-ene	EN GESTIÓN
7	Chaquetas	Todo el proyecto		SST	Angie	27-ene	27-ene	EN GESTIÓN
8	Permisos de trabajo en alturas	Todo el proyecto		SST	Angie	Pendiente	27-ene	EN GESTIÓN
9	Listado de personal por cada parque con cuadrillas y definir un equipo de emergencias 8 Respuesta oficio No 131 y No 144)	Todo el proyecto	Administrativo	Técnico	Alejandra Sánchez	24-ene	27-ene	EN GESTIÓN
10	**Retiros RCD URGENTE**	**Parque nacional, el porvenir y Patio Bonito.**	Ambiental	**Ambiental**	**Apoyo del área técnica y Profesional Ambiental**	**INMEDIATO**	**URGENTE**	EN GESTIÓN
11	Cerramientos de los Individuos arbóreos	Todo el proyecto		Ambiental	Residentes	27-ene	27-ene	EN GESTIÓN
12	PIN Ambiental (Volumenes a generar y meta de circularidad de materiales- cumplimiento dlel decreto 507)	Todo el proyecto		Técnico	Residentes	30-ene	15-feb	EN GESTIÓN
13	Reportar oportunamente los materiales que se retiran al componente ambiental.	Todo el proyecto		Técnico	Residentes o cuien este en la obra a cargo y reciba	Todo el tiempo	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
14	Certificaciones de los proveedores de materiales granulares y Concreteras asociados a cada parque (Residentes tan pronto reciban el vale anotar a cual parque correesponde)	Todo el proyecto		Proveedores y Residentes	Adriana	Todo el tiempo	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
15	Envio del registro fotografico	Todo el proyecto		Residentes e Inspectores	Adriana	Semanalmente	A fin de cada semana	EN GESTIÓN
16	Subsanación del informe mensual No 2	Todo el proyecto		Ambiental	Adriana	21-ene	23-ene	CUMPLIDO
17	Diseño de Mezclas	Todo el proyecto	Calidad	Técnico	Patricia Serrano	24-ene	3-feb	EN GESTIÓN
18	Caracterización de materiales Garnulares	Todo el proyecto		Técnico	Patricia Serrano	inmediato	URGENTE	EN GESTIÓN
19	Certificados de Calidad de materiales recibidos a la Fecha	Todo el proyecto		Compras y Residentes	Patricia Serrano	inmediato	URGENTE	EN GESTIÓN
20	Gestión de la consecución de los certificados de calidad que lleguen al proyecto	Todo el proyecto		Compras y Residentes	Patricia Serrano	Cada vez que sea suministrado	Cada vez que sea suministrado	EN GESTIÓN
21	Seguimiento a los compromisos semanales	Todo el proyecto		Todo el equipo de trabajo	Patricia Serrano	todos los viernes reunión virtual	todos los viernes reunión virtual	EN GESTIÓN
22	Reporte de materiales que llegan al proyecto	Todo el proyecto		Compras y Residentes 8 Jhon Santana y David Patiño)	Patricia Serrano	Todos los lunes de cada mes	Todos los lunes de cada mes	EN GESTIÓN
23	Verificación de equipos de topografia y mantener actualizados los certificados de calibración de los equipos	Todo el proyecto		Topografo	Patricia Serrano	los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
24	Actas de Comité	Todo el proyecto		Administración	Patricia Serrano	los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
25	Reporte de indicadores de lo ejecutado Vs el Proyectado tanto en fisico como en opresupuesto	Todo el proyecto		Técnico- Director y/oencargado de presupuestos	Patricia Serrano	los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
26	Reporte de las PQR	Todo el proyecto		Paulina García	Patricia Serrano	los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
27	Control de la correspondencia	Todo el proyecto		Alejandra	Patricia Serrano	los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
28	Reporte de cambios del personal minimo	Todo el proyecto		Alejandra	Patricia Serrano	cada vez que se requiera	cada vez que se requiera	EN GESTIÓN
29	Copia de la bitacora de obra	Todo el proyecto			Patricia Serrano	todos los 26 de cada mes	A fin de cada mes	EN GESTIÓN
30	Toma de muestras de adoquin	Parque Nacional		Residente y Compras	Patricia Serrano	22-ene	5-feb	GESTIONADO

31	Subsanación de Informe 2 Calidad	Todo el proyecto		Todo el equipo	Patricia Serrano	24-ene	27-ene	EN GESTIÓN
32	Ensayos pendientes de calidad	Todo el proyecto		Tecnica	Patricia Serrano	INMEDIATO	28-ene	EN GESTIÓN
33	Certificados de Calidad de Bombas	??		Compras	Patricia Serrano	20-ene	27-ene	EN GESTIÓN
34	Esclerometria a los dados de los postes	Porvenir		Tecnica	Patricia Serrano	24-ene	31-ene	EN GESTIÓN
35	Subsanación de Informe 2 Tecnico	Todo el proyecto	Técnico	Tecnica	Enrique Guzman		24-ene	CUMPLIDO
36	Subsanación de Informe 1 Tecnico	Todo el proyecto		Tecnica	Enrique Guzman			CUMPLIDO
37	Formato de solicitud de materiales bien especificado con tipo, marca, referencia, color y si es posible imagen, identificar a donde va a quedar almacenado	Todo el proyecto	Compras	Técnico y demas componentes	Enrique Guzman	cada vez que se requiera	cada vez que se requiera	GESTIONADO
38	Radicacion acta1	Todo el proyecto	Técnico	Técnico	Enrique Guzman	23-ene	23-ene	Se subsanaron las terceras observaciones
39	Envio de documentación faltante del personal mínimo	Todo el proyecto	Administrativo	Gestión Humana		27-ene	28-ene	EN GESTIÓN
40	Programacion y mantenimiento de ascensores shindler tunal	Tunal	Técnico	Compras	Enrique Guzman			EN GESTIÓN
41	Ingreso de personal para patio bonito							
42	Inicio de actividades en Juan amarillo ,tibanique y el toberin							
43	Visita diagnostoco la esperanza							
44	Presupuestos faltantes							
45	Aterrizar sociualizacion country							
46	Presupuestospor zonas y flujo de inversiób							
47	Apus							
48	NP version 1							
49	Subsanación del cronograma de visitas							
50	Instalación de señales en grancolombiano							
51	Diagnostico estructural de pista uds							se hizo se detecto que es fallo estructural
52	Nueva versión del cronograma electrico, desglozado todo, montarlo con base en los oresupuestos							
53	Propuesta de iluminación fotovoltaica-presupuesto, valles de cafam, palestina y porvenir							
54	Inicio de actividades en juan amarillo							
55	Inicio de actividades tibanica							
56	Visita parque la esperanza							
57	Presupuestos faltantes los ya visitados							
58	Reunion virtual de presupuesto 2 pm							
59	Matriz organizada y presupuestos organizados							
60	El recreo presupuesto con adoquines							

1234

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

SOLICITUD No.	002	

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA [X] MEJORA [ ]

ORIGEN:

AUDITORÍA INTERNA	[ ]	AUDITORÍA EXTERNA	[ ]	QUEJAS Y RECLAMOS	[ ]
PETICIONES	[ ]	SALIDA NO CONFORME	[X]	TENDENCIA DEL SECTOR	[ ]
OTRO:	[ ]	Cuál:			

FECHA: 13-01-2025

PROCESO: CALIDAD

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD CONSORCIO BELZCON IDRD I

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)
Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, ensayos de laboratorio, caracterizaciones de materiales granulares y diseño de mezclas.
CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)
Gestionar y entregar los certificados de calidad, ensayos de laboratorio, caracterizaciones de materiales granulares y diseño de mezclas que se encuentran pendientes a la fecha.

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 m's: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)
Causa Raíz: Falta de control en la ejecución de las actividades propias de calidad.
PLAN DE ACCIÓN

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	Enviar los materiales granulares a caracterizar	Director de Obra y Compras	31/01/2025
2.	Enviar al laboratorio los materiales para el diseño de mezclas.	Director de Obra y Compras	31/01/2025
3.	Consecución de las caracterizaciones iniciales, pendientes incluidas las de los materiales reciclados.	Profesional de Calidad	31/01/2025
4.	Reunión con el equipo de trabajo para establecer directrices de control en las actividades propias de calidad.	Profesional de Calidad y director de Obra	15/01/2025
5.	Reuniones semanales periódicas.	Profesional de Calidad y director de Obra	Una vez a la semana
6.	Hablar con el área de compras para comunicar a todos los proveedores de la importancia de hacer entrega oportuna de los certificados de calidad.	Profesional de Calidad y director de Obra	17/01/2025
7.	Designar un responsable que apoye la gestión de la consecución de los certificados de calidad.	Director de Obra	15/01/2025
8.	Gestionar oportunamente la consecución de los certificados de calidad de los materiales que se utilicen en el proyecto.	Profesional de Calidad director de Obra y Compras	Continuamente
9.	Divulgar el Plan de Inspección y Ensayos al equipo de trabajo y concientizarlos respecto a la importancia de cumplir con la periodicidad establecida para la realización de los ensayos.	Profesional de Calidad y director de Obra	10/02/2025
10.	Hacer seguimiento semanal al cumplimiento del plan de inspección y ensayos.	Residentes de obra Profesional de Calidad y director de Obra	Semanalmente

No.	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.	Se enviaron los materiales granulares a caracterizar se anexa remisión de 31 de enero y la caracterización de B600 Y B400	31/01/2025	X		
2.	Se enviaron los materiales al laboratorio para el diseño de mezclas el 3 de febrero, se adjunta remisión. Y se adjunta el diseño de mezclas del 18 de feb de 2025	31/01/2025	X		
3.	Se consiguen las caracterizaciones iniciales.	31/01/2025	X		

	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	Código:	FO-MC-02
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

4.	Reunión con el equipo de trabajo para establecer directrices de control en las actividades propias de calidad.	15/01/2025	X		
5.	Reuniones semanales periódicas.	Una vez a la semana	X		
6.	Hablar con el área de compras para comunicar a todos los proveedores de la importancia de hacer entrega oportuna de los certificados de calidad.	17/01/2025	X		
7.	Designar un responsable que apoye la gestión de la consecución de los certificados de calidad.	15/01/2025		X	Se asigna posteriormente a Rossy con el apoyo del área de compras.
8.	Gestionar oportunamente la consecución de los certificados de calidad de los materiales que se utilicen en el proyecto, sin embargo, en ocasiones se demora la entrega de los mismos.	Continuamente	X		
9.	Divulgar el Plan de Inspección y Ensayos al equipo de trabajo y concientizarlos respecto a la importancia de cumplir con la periodicidad establecida para la realización de los ensayos.	10/02/2025	X		
10.	Hacer seguimiento semanal al cumplimiento del plan de inspección y ensayos.	Semanalmente	X		

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO: Ha sido eficaz la acción correctiva, se ha dispuesto de personal de apoyo como Rossy y Paula que han aportado a la mejora del proceso, llevando la información de una manera organizada y de fácil acceso, utilizando la herramienta DRIVE para algunos temas de uso común del equipo de trabajo.

RESPONSABLE: Profesional de Calidad – Arq.Patricia Serrano Espinel

FECHA DE CIERRE:

APROBÓ: Director de Obra Enrique Guzmán

1280

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.		24	01	2024

LUGAR: Cruz Roja HORA DE INICIO: 8:30 AM HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Hector Bautista	Gerente	
Sergio Erazo	Director	
Patricia Zamora	Dir. Calidad	
Equipo de trabajo	Eq. Trabajo Int de Asistencia Adjunta	

ORDEN DEL DIA

1. Revisión Pendientes
2. Socialización de Acción Correctiva
3. Oportunidad en la Ejecución de Ensayos
4. Organizar Engranaje de los Pasos y Obj. Contables
5. Estructura Equipo Técnico
6. Hoja de Pendientes

TEMAS TRATADOS

Inicio de 52-83 Pasos, Organizar el engranaje y que todos trabajemos y Solucionar Diferencias 2 Equipos = 1 Emergencias y 2 Adjuntos El Contador Carlos Campos asiste y da a conocer que todos los Trabajadores tienen trabajo, Contamos con Abastecedor, Bogotá y Valle de Bogotá, Se presento una Contingencia y Novedad, que le generó Inconveniente, pero tomar e Aprendizaje todo, Se Informa que aprobaron Auditoria se Organiza Por Subcontratista, Abriendo con el Frente de todos - Cordoba y Cordoba

- Temas Antiguos de Pasos Nacional → Muestra de Laboratorio, Diseño de Hoja,
- El Cinco Ingresen a Procesamiento Despacho y Recibido
- Se Fijo un Examen General los Viernes en la Tarde de Modo Virtual.
- Por Medio de Alejandra se Coordinara la Contratación Apoyo de los Otros
- Empaque Solicita se abonde de manera Apropiada los Salvoconductos de todos los Profesionales y del Comprometido de Calidad.

Powered by CamScanner

V821

TEMAS TRATADOS

Inicio de obras Concha y Pozos.

- Predantes, Sanyer e Canto, Cruz y Inicio seguimiento Instal. de Señalización.
- Se gestionará diseño de mezclas con laboratorio y se tramitan muestras en sitio para ver si se realizó pendiente, se tramitara con anterioridad para dosificación tan pronto se tenga diseño de mezclas.
- Desde el área SST se solicita tomar el listado de personal y capacitación para verificación de documentación.
- Desde el componente ambiental se solicita dar entrada al retiro de RCD de predio Ubicación, Patio Bonito y El porvenir, de igual forma se solicita la ubicación de individuos arbóreos de los frentes de trabajo. Se solicita retirar el manejo de RCD en los frentes anteriores se anexa el retiro. Está pendiente la señalización de áreas de acopios. Se deben obtener cantidades de materiales precargadas para generación de PMA ambiental. Se solicita al personal en obra remitir de manera semanal los vales de materiales y recambios para manejar control desde el área ambiental y tramitar certificaciones para informes. Se implementará matriz de control de entrada y salida de materiales y RCD, la cual reposará en Drive para alimentación y Consulta. Se brindan recomendaciones de seguridad para personal en obra.
- Desde el área de Calidad se establecen requerimientos como diseño de mezclas, caracterización de agregados, especificaciones de calidad de materiales, reporte de materiales demandados, certificado de calibración de equipos. Se solicita consultar con Alejandro Sanchez la asignación de consecutivos para correspondencia entrada y en el cuanto registrar el oficio de interventoría que se está atendiendo con cada comunicación y actualizar en drive el log de la comunicación entrada. Se deberá reportar al área de calidad la cantidad de RCDs y estado actual de vías. finalmente se debe informar al área de calidad cualquier modificación de personal mínimo.
- Desde el componente técnico se socializará el procedimiento para manejo de solicitudes de permisos; se deberá hacer el requerimiento a través del grupo con suficiente tiempo para trámite. Se dan directrices para manejo de capa negra. Se solicita compartir listado de proveedores

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
- Realizar Seguimiento por Cumplimiento de Compromisos	Patricia Serrano	Semanalmente
- Envío de Informes Diarios de todas las áreas	Compras y Residentes	Semanalmente
- Hacer seguimiento a la Bodega de Pendientes	Enrique y Patricia	Semanalmente
- Solicitar la Visibilidad de Compras Disponibilidad de Stocks de Emergencia	Enrique y Nestor	27 Enero
- Enviar para hacer el Drive de Hojas de Vida	Alejandra y Enrique	27 Enero
- Enviar los Ensayos de Concretos	Alejandra y Enrique	27 Enero
- Seguimiento a los Ind. Diarios	Residentes	27 Enero
- Gral Correspondencia, se debe Subir el 90% de las Cuentas radicadas Con sus Anexos al Drive - Contratos Contractuales (Ejemplos)	Todo el Equipo	Contractual
- Tomar Capacitaciones de Nestor para Residente e Inspectores Contractual Ensayos de Concreto y Suelos		

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo? SI ☐ NO ☐

Observaciones

- Programar el Proveedor de M/c Soldaduras — Patricia y Enrique — 27 Ene

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	Patricia Serrano
CARGO		CARGO	Profesional de Calidad

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:

Powered by CamScanner

para información general, para de aclara que el puente con los proveedores será la persona asignada desde la oficina. (Alejandra Sanchez). Se socializan proveedores y procedimiento para solicitud de materiales. Las personas a cargo del manejo de proveedores serán Juan Cuellar y Enrique Guzmán. Cualquier requerimiento deberá manejarse por medio del grupo. Se estudiará la posibilidad de asignar alguna persona que trabaje unos pocos días para cubrir los reportes en fines de semana. Área de Compras solicita se envíe la orden de solicitud de trabajo para R2000 R6000 y viajes y orden de trámite de diseño de interfaces, así como lo requerido para la siguiente semana en Alejandría. para tramite interno con área de Compras. Área SST solicita reporte de personal diario y comparte modelo a través del grupo. Se indica que informe 1 técnico ya fue radicado en físico y se dio trámite a este 1.
Se realiza revisión de check list de pendientes para verificación de cumplimiento.

- Se realice una reunión General con todo el equipo de los Pendientes del Área Técnica y se asignan tareas y Responsables
- Se Socializa al Equipo de trabajo la Acción Correctiva tomada para dar Cumplimiento con los Compromisos adquiridos, y. Se coordina que se realizará la reunión Semanal Todos los Viernes.
- Se deja Matriz con todos los Pendientes y seguimientos Frecuentes de Cada Componente.
- Directrices Establecidas para la Hoja Continua
  1- Alejandra sera el Punto con la Oficina, los especialistas, Líderes de Componentes, Directivos, Residentes y todo el Equipo
  2- dos Informes serán entregados todos los 27 de c/Mes
  3- Se Establece un Grupo WhatSp "Ordenes de Compra" - Para Seguimiento y Control de Envíos seguros y Materiales Ingresados al Proyecto

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Mesa de trabajo - Mayores de Bacatá — RESPONSABLE DEL EVENTO: Fabiana Guzman

FECHA: 24-01-25 — HORA INICIAL: 8:30 — HORA FINAL: — LUGAR: OFICINA BELZCON

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Patricia Serna	51923170	Profesional de Calidad	Belzcon		Belzcon	pattyserna@belzcon.com	3135113093
2	John Carlos Santana	1012420831	Res. Obra	Cons. Belzcon IDRD		Belzcon	orionjc@hotmail.com	3222280448
3	JOHN L Cruz G.	79556721	Residente Obra	BELZCON		Belzcon	—	3106699697
4	José David Patiño Garzón	1074197115	Inspector Obra	Belzcon		Belzcon	—	3223750440
5	ENRIQUE CUZMAN	9533226	R. obra	Belzcon		Belzcon		3203430229
6	Alejandra Sanchez Velasco	1083931123	Administradora	Belzcon		Belzcon	asanchez.bzc@gmail.com	3203192435
7	NESTOR BARRERA	80190955	GER. TECNI	BELZCON		BELZCON	NBA-NSM.BZC	3102177754
8	David Orlando Ortiz Sabogal	1014113111	Director de Obras	Belzcon		Belzcon	dortiz.bzc@gmail.com	3006991193
9	Angélica María Cano Gil	52901081	C.SST.	Belzcon		Belzcon	aguamabzc@gmail.com	3124716417
10	Paulina García Francisco	52906630	R. Social	Rp Belzcon		Belzcon	gestiondocumental.belzcon@gmail.com	3209[illegible]
11	ADRIAN ERNESTO PARDO	1019011102	R. Social	R. Belzcon		C. Belzcon	ADRIAN.DZC@GMAIL.COM	3160069144
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, así como a las finalidades en estas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/acceso-informacion-publica/normatividad-politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL-V5

Powered by CamScanner

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-1-03-B		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	19 (Día)	feb (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON

COMITÉ: CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD

CONVOCO: PATRICIA SERRANO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Claudia Pedraza	Residente	BELZCON	
Jhon Cuellar	Residente	BELZCON	
Gustavo	Residente	BELZCON	
Enrique Guzman	Director de eobra	BELZCON	
Patricia Serrano	Profesional de Calidad	BELZCON	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Concientizar al personal técnico de la importancia de cumplir con el Plan de Insección y Ensayos

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Divulgación del Plan de Inspección y ensayos

Concientización de la importancia de aplicar el plan de insécción y ensayos en el proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día de hoy se reunenlos asistentes con el fin de efectuar la divulgación dell plan de inspecciónn y ensayos , el cual se da a aconocer al personal residentre del, proyecto por parte de la profesional de calidad y el director de obra

Sc menciona entre otros los ensayos, su frecuencia y la importancia de dar cuplimiento con estos.

Tambien se recomienda participar activamente cuando se tramiten materiales para la ejecución de las actividades, propender por que estos sean aportados con los certificcados de calidad de cada uno de estos productos.

Estar presentes en la toma de densidades y dar aviso con antelación ala interventoría de la fecha en que estas sean programadas

El Ing. Enrique informa al equipo de residentes que es de suma importancia dar cumplimiento con el Plan de Inspección y Ensayos presentado, debido a que entre otros asegura el cumplir ciento del Plan de Calidad y la normatividad aplicable al proyecto.

Belzcon Construcción Propositiva	**BELZCON SAS** **ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE
		FECHA	19 (Día)	feb (Mes) / 2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON **COMITÉ:** CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD **CONVOCO:** PATRICIA SERRANO

1287

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE
		FECHA	19 (Día)	feb (Mes) / 2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON **COMITÉ:** CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD **CONVOCO:** PATRICIA SERRANO

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Cumplir coon el plan de inspeccipon y ensayos	Continuamente	Equipo deTrabajo

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año)

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ			
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE
		FECHA	19 (Día)	feb (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON **COMITÉ:** CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD **CONVOCO:** PATRICIA SERRANO

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

Entregada firmada a: _____

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZC-FO-1-03-D		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	19 (Día)	feb (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON

COMITÉ: CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD

CONVOCO: PATRICIA SERRANO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Claudia Pedraza	Residente	BELZCON	
Jhon Cuellar	Residente	BELZCON	
Gustavo	Residente	BELZCON	
Enrique Guzman	Director dr eobra	BELZCON	
Patricia Serrano	Profesional de Calidad	BELZCON	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Concientizar al personal técnico de la importancia de cumplir con el Plan de Insección y Ensayos

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Divulgación del Plan de Inspección y ensayos

Concientización de la importancia de aplicar el plan de insécción y ensayos en el proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día de hoy se reunenlos asistentes con el fin de efectuar la divulgación dell plan de inspecciónn y ensayos , el cual se da a aconocer al personal residentre del, proyecto por parte de la profesional de calidad y el director de obra

Se menciona entre otros los ensayos, su frecuencia y la importancia de dar cuplimiento con estos.

Tambien se recomienda participar activamente cuando se tramiten materiales para la ejecución de las actividades, propender por que estos sean aportados con los certificcados de calidad de cada uno de estos productos.

Estar presentes en la toma de densidades y dar aviso con antelación ala interventoría de la fecha en que estas sean programadas

El Ing. Enrique informa al equipo de residentes que es de suma importancia dar cumplimiento con el Plan de Inspección y Ensayos presentado, debido a que entre otros asegura el cumplir ciento del Plan de Calidad y la normatividad aplicable al proyecto.

1290

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE
		FECHA	19 (Día)	feb (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON **COMITÉ:** CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD **CONVOCO:** PATRICIA SERRANO

1291

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO	BZCI-C-I-03-B		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	19 (Día)	feb (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON **COMITÉ:** CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD **CONVOCO:** PATRICIA SERRANO

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Cumplir coon el plan de inspeccipon y ensayos	Continuamente	Equipo deTrabajo

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año)

Belzcon Construcción Propositiva	BELZCON SAS ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	19 (Día)	feb (Mes)	2025 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 001 Calidad

LUGAR: OFICINA BELZCON **COMITÉ:** CALIDAD

DEPENDENCIA: TÉCNICA-CALIDAD **CONVOCO:** PATRICIA SERRANO

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

Entregada firmada a: _____

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 febrero 13

Ingeniero
DAVID ORTIZ
CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Obra: IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 PARQUE NACIONAL
Código de obra: 25604
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Ingeniero

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 0779-25-1 al DGP 0779-25-9 en los cuales se presentan los resultados de los ensayos relacionados a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación del límite líquido de los suelos.	INV E 125:2013
Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos.	INV E 126:2013
Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación).	INV E 142:2013
Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino.	INV E 213:2013
Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores de 37.5 mm (1 ½") por medio de la máquina de los ángeles.	INV E 218:2013
Resistencia a la degradación de los agregados gruesos de tamaños mayores de 19 mm (¾") por abrasión e impacto en la máquina de los ángeles.	INV E 219:2013

Muestra No.	Descripción del material
M1	B-600 Localización: Parque Nacional Procedencia: Cantera Dromos
M2	B-400 Localización: Parque Nacional Procedencia: Cantera Dromos

1294

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Muestra No.	Descripción del material
M3	Rajón Localización: Parque Nacional Procedencia: Cantera Dromos

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en las normas relacionadas; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente;

Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2025.02.13 15:35:38 -05'00'

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV. 142978 – OT. 75064
K. COY.

1295
