- Parque Palestina
- Parque la Serena
- Parque Servita
- Parque Urbanización Cedritos
- Parque urbanización Toberín
- Parque Desarrollo Verbenal
- Parque Cerros Santa Barbara
- Parque Urbanización Calle 170
- Parque el Country
- Parque Nacional
- Parque Independencia
- Parque Tercer Milenio
- Parque Plaza de Toros
- Parque San Cristóbal
- Parque Valles de Cafam
- Parque La Andrea
- Parque Urbanización Miravalle
- Parque Ciudad Nuevo Usme
- Parque Ciudad Nuevo Milenio
- Parque El Tunal
- Parque Naranjos
- Parque Desarrollo Gran colombiano
- Parque San José Maryland
- Parque el Recreo
- Parque Urbanización la Esperanza
- Parque Tibanica
- Parque Urbanización Chicalá
- Parque el Porvenir
- Parque Patio Bonito
- Parque Villa de los Sauces
- Parque Timiza
- Parque Cayetano Cañizales
- Parque Las Luces Villa Rica
- Parque las Margaritas
- Parque Estadio Techo
- Parque Villemar
- Parque Sauzalito
- Parque Urbanización la Europa
- Parque el Carmelo
- Parque Juan Amarillo
- Parque San Andrés

- Parque Urbanización Florencia
- Parque Simón Bolívar (UDS)
- Parque La Florida
- Parque Planta de tratamiento Salitre
- Parque los Cerezos
- Parque Berlín
- Parque Urbanización Lombardía
- Parque Urbanización Burgos Britalia
- Parque Prado Pinzón
- Parque las Cometas
- Parque la Gaitana
- Parque Tibabuyes
- Parque Fontanar del rio
- Parque Ciudadela Cafam
- Parque Alcázares
- Parque Simón Bolívar (Palacio de los Deportes)
- Parque Simón Bolívar (Complejo Acuático)
- Parque Santa Clara
- Parque Simón Bolívar (Sector Central)
- Parque Movistar Arenas
- Parque El Renacimiento
- Parque Santa Isabel
- Parque Villa Mayor
- Parque La Fragua
- Parque Tejar
- Parque Ciudad Montes
- Parque Gorgonzola
- Parque Urb. Pradera Sur
- Parque El Jazmín
- Parque Los Ejidos
- Parque Bosque San Carlos
- Parque Palermo Sur
- Parque Urb. Marruecos
- Parque Urb. Molinos I
- Parque Pijaos
- Parque Urb. Molinos II
- Parque Quiroga
- Parque Estadio Olaya Herrera
- Parque San José
- Parque Arborizadora Alta
- Parque Candelaria La Nueva

- Parque ilimani
- Parque El Taller (El Ensueño)
- Parque Alfonso López

4.13. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Durante el desarrollo del contrato se han detectado actividades complementarias o No previstas.

El día 13 de enero de 2025 se remite por medio de correo electrónico la primera acta de fijación de precios no previstos del contrato con 22 ítems para revisión por parte de la interventoría.

La interventoría solicita por medio de correo electrónico el archivo en Excel para realizar la debida revisión.

El día 15 de enero de 2025 se remite por parte del contratista el archivo en Excel de las actividades complementarias solicitado.

El día 22 de enero de 2025 se remite por parte de la interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-163** "Observaciones de análisis de precios unitarios no previstos."

El día 13 de febrero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-140-25** el contratista remite "Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-163 – Análisis de Precios Unitarios No Previstos".

El día 20 de febrero de 2025 se remite por parte de la interventoría comunicado IDRD-4080-G2-2024-254 "Respuesta a oficio **BEL-MPI-ADM-140-25**- análisis de precios unitarios no previstos"

El día 10 de marzo de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-283** "Solicitud análisis de precios unitarios no previstos subsanados"

El día 26 de marzo de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-324** "Reiteración solicitud análisis de precios unitarios no previstos subsanados".

El día 05 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-191-25** el contratista remite "Alcance al Comunicado **IDRD-4080-G2-2024-254/324** – Análisis de Precios Unitarios no Previstos No.1".

El día 14 de abril de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-367** "Observaciones análisis de precios unitarios no previsto"

El día 15 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-209-25** el contratista remite "Respuesta al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-367 – Acta de Análisis de Precios No Previstos No.1".

El día 23 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-217-25** el contratista remite "Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-214-25 Acta de Análisis de Precios No Previstos No.1".

El día 23 de abril de 2025 se remite por parte de interventoría comunicado **IDRD-4080-G2-2024-389** "Observaciones ítems no previstos".

El día 04 de junio de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-281-25** el contratista remite Alcance al Comunicado No.IDRD-4080-G2-2024-481 Acta de Actividades No Previstas No.2

El día 16 de junio de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-292-25** el contratista remite Alcance al Comunicado No.IDRD-4080-G2-2024-490 Acta de Actividades No Previstas No.2.

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DEL ANEXO TÉCNICO

Durante el periodo comprendido desde el 01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025 se realizó el seguimiento a los planes de la siguiente manera:

4.13.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO.

El día 21 de noviembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-003-24** remitió "la documentación Preliminar Anticipo del contrato de la referencia por parte del contratista".

El día 25 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-004** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-003-24 DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR ANTICIPO".

El día 26 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-006** se remitió por parte de la interventoría el "ALCANCE A OFICIO No. IDRD-44080-G2-2024-004 OBSERVACIONES A DOCUMENTACION PRELIMINAR DE ANTICIPO".

El día 26 de noviembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-012-24** remitió "Respuesta Comunicado IDRD-4080-G2-2024-004 y IDRD-4080-G2-2024-004 – Ajuste Plan de Inversión de Anticipo".

El día 27 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-012** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-012-24 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO AJUSTADO".

El día 27 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-013** se remitió por parte de la interventoría la "DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO".

El día 27de noviembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-015-24** remitió "Respuesta comunicado IDRD-4080-G2-2024-012 – Ajuste Plan de Inversión de Anticipo".

El día 28 de noviembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-015** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-015-24 REMISION PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.". la interventoría remite el **PLAN FIRMADO.**

El día 03 de diciembre de 2024 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-032-24** remitió "Alcance No. 1 Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-013 - Documentación requerida para el desembolso del anticipo".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio de los oficios **IDRD-4080-G2-2024-026 y IDRD-4080-G2-2024-095 (rad. 20242100441092)** se remitió por parte de la interventoría al Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD "Documentación para reembolso de anticipo".

El día 18 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-057** se remitió por parte de la interventoría "TARJETA DE FIRMAS FIDUCIA ANTICIPO".

El día 15 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-100-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 01".

El día 15 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-101-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 02".

El día 16 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-126** se remitió por parte de la interventoría "DEVOLUCIÓN ORDENES DE GIRO DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN No. 1 – ORDEN No. 2".

El día 20 de enero de 2025 el contratista de obra por medio de correo electrónico remite atención a las observaciones de las ordenes de desembolso del anticipo No 1 y No 2.

El día 21 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-152** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 2." del anticipo.

El día 21 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-155** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 1." del anticipo.

El día 23 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-102-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 03".

El día 23 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-104-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 04".

El día 27 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-098-24** remitió el "PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO".

El día 28 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-172-24** remitió la "RESPUESTA AL COMUNICADO BEL-MPI-ADM-104-24 ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 4".

El día 28 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-173-24** remitió la "RESPUESTA AL COMUNICADO BEL-MPI-ADM-102-24 ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 3".

El día 29 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-106-24** remitió el "FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-120-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 06".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-121-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 07".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-122-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 08".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-123-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 09".

El día 31 de enero de 2025 el contratista de obra por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-124-24** remitió la "orden de desembolso anticipo No 04".

El día 03 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-193** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 2." del anticipo.

El día 03 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-197** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 8." del anticipo.

El día 04 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-198** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 9." del anticipo.

El día 05 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-205** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 6." del anticipo.

El día 07 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-212** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 4." del anticipo.

El día 13 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-237** se remitió por parte de la interventoría la "SOLICITUD REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO".

El día 13 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-234** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 7." del anticipo.

El día 18 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-250** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-138-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 10" del anticipo.

El día 19 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-259** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-125-24 DEVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES ORDEN DE DESEMBOLSO No 11" del anticipo.

El día 19 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-255** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 3." del anticipo.

El día 20 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-263** se remitió por parte de la interventoría la aprobación de la "ORDEN DE DESEMBOLSO N° 5." del anticipo.

El día 21 de febrero de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-146-24** "DESEMBOLSOS ANTICIPO CONTRATO IDRD-SG-4060-2024."

El día 06 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-167-24** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO NO 14"

El día 06 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-168-24** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO NO 15"

El día 06 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-186-24** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO NO 13"

El día 06 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-281** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-167-24 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 14" del anticipo.

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-284** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-168-24 OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 15" del anticipo.

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-285** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-186-24 OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO.13" del anticipo.

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-286** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-269 - REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE DICIEMBRE DE 2024"

El día 10 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-287** se remitió por parte de la interventoría "REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE ENERO DE 2025"

El día 11 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-288** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 15." del anticipo.

El día 11 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-160-25** "RESPUESTA OFICIO IDRD-4080-G2-2024-286 – SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS – MES DICIEMBRE 2024"

El día 12 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-295** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN - RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-138-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 10." del anticipo.

El día 12 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-299** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDENES DE DESEMBOLSO N° 13 Y 14" del anticipo.

El día 17 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-169-25** "SOLICITUD PAGO ORDEN DE GIRO 6"

El día 19 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-310** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-0169-24 DEVOLUCIÓN ORDEN DE GIRO NO. 10 ABACO" del anticipo.

El día 21 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-316** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-187-24 - DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 16" del anticipo.

El día 21 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-317** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-186-24 - DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 11" del anticipo.

El día 26 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-325** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDENES DE DESEMBOLSO N° 11 Y 16." del anticipo.

El día 26 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-326** se remitió por parte de la interventoría "SOLICITUD LEGALIZACION ORDENES DE OPERACION" del anticipo.

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-332** se remitió por parte de la interventoría "REQUERIMIENTO PROYECCIÓN AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO".

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-333** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO".

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-334** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-287 - REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE ENERO DE 2025".

El día 28 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-335** se remitió por parte de la interventoría "REQUERIMIENTO REMISIÓN SOPORTE DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO - MES DE FEBRERO DE 2025".

El día 22 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-173-25** "ENTREGA PROYECCIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPO".

El día 31 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-180-25** "CAMBIO DE PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO".

El día 31 de marzo de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-158-25** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO No 17".

El día 01 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-178-25** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO No 18".

El día 02 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-346** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 17." del anticipo.

El día 14 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-203-25** "ENTREGA DE ORDEN DE SESEMBOLSO No 10".

El día 16 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-204-25** "ENTREGA DE ORDEN DE SESEMBOLSO No 20".

El día 16 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-378** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 10." del anticipo.

El día 16 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-210-25** "Respuesta al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-377 RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-205-25 DEVOLUCIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES ORDEN DE GIRO NO. 21".

El día 22 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-386** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 18." del anticipo.

El día 24 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-388** se remitió por parte de la interventoría "REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO N° 20." del anticipo.

El día 30 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-228-25** "ENTREGA DE ORDEN DE DESEMBOLSO No 23".

El día 30 de abril de 2025 el contratista de obra remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-230-25** con asunto Entrega de Orden de Desembolso No. 24.

El día 05 de mayo de 2025 el contratista remitió el oficio **BEL-MPI-ADM-231-25** con asunto Entrega de Orden de Desembolso No. 22, del anticipo. El cual fue revisado y aprobado por la interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-427 del 08 de mayo de 2025.

El día 13 mayo de 2025 el contratista remitió a la interventoría el oficio BEL-MPI-ADM-246-25 con asunto Entrega de orden de desembolso No. 25. El cual fue revisado y aprobado por la interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-427 del 08 de mayo de 2025.

El día 20 de mayo de 2025 el contratista remitió a la interventoría BEL-MPI-ADM-262-25 con asunto Entrega de orden de desembolso No. 26. El cual fue revisado y aprobado por la interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-474 del 26 de mayo de 2025.

A continuación, se relacionan las ordenes de anticipo aprobadas hasta la fecha de corte del presente informe:

ORDEN DE GIRO	COMUNICADO	FÉCHA	PROVEEDOR	VALOR	DESCUENTO	TOTAL	APROBACION	COMUNICADO	FECHA
No 1	BEL-MPI-ADM-100-24	15/01/2025	BALERCO S.A.S	$ 330.000.000,00	$ 9.040.336,00	$ 320.959.664,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-155	21/01/2025
No 2	BEL-MPI-ADM-101-24	15/01/2025	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	$ 100.000.000,00	$ -	$ 100.000.000,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-155	21/01/2025
No 3	BEL-MPI-ADM-102-24	23/01/2025	OMR S.A.S	$ 104.957.032,00	$ 3.318.677,00	$ 101.638.355,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-255	19/02/2025
No 4	BEL-MPI-ADM-104-24	23/01/2025	ILLUMINARC S.A.S	$ 300.000.000,00	$ 7.184.873,94	$ 292.815.126,06	SI	IDRD-4080-G2-2024-212	7/02/2025
No 5	BEL-MPI-ADM-132-24	18/02/2025	ILLUMINARC S.A.S	$ 641.615.372,00	$ 15.366.419,00	$ 626.248.953,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-263	20/02/2025
No 6	BEL-MPI-ADM-126-24	4/02/2025	ABACO JUEGOS Y PARQUES	$ 239.486.366,00	$ -	$ 239.486.366,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-205	5/02/2025
No 7	BEL-MPI-ADM-135-24	10/02/2025	STEEL CONCRETE	$ 37.873.575,00	$ 1.147.028,00	$ 36.726.547,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-234	13/02/2025
No 8	BEL-MPI-ADM-122-24	30/01/2025	METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A.S	$ 9.157.050,00	$ 277.328,00	$ 8.879.722,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-197	3/02/2025
No 9	BEL-MPI-ADM-123-24	30/01/2025	METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A.S	$ 17.873.800,00	$ 541.321,00	$ 17.332.479,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-198	4/02/2025
No 10	BEL-MPI-ADM-203-25	14/04/2025	STEEL CONCRETE	$ 50.000.000,00	$ 1.514.286,00	$ 48.485.714,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-378	16/04/2025
N0 11	BEL-MPI-ADM-186-24	20/06/2025	OMR S.A.S	$ 53.229.421,00	$ 1.456.357,00	$ 51.773.064,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-325	26/03/2025
N0 12	BEL-MPI-ADM-143-24	25/02/2025	IMPOGRIFOS SAS	$ 12.679.397,00	$ 384.005,00	$ 12.295.392,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-270	27/02/2025
N0 13	BEL-MPI-ADM-186-24	6/03/2025	BALERCO S.A.S	$ 301.000.000,00	$ -	$ 301.000.000,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-299	12/03/2025
N0 14	BEL-MPI-ADM-167-24	6/03/2025	BALERCO S.A.S	$ 255.850.000,00	$ 7.009.000,00	$ 248.841.000,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-299	12/03/2025
N0 15	BEL-MPI-ADM-168-24	6/03/2025	MULTISERVICIOS DE BOMBAS Y ACCESORIOS SAS	$ 10.236.975,00	$ -	$ 10.236.975,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-288	11/03/2025
N0 16	BEL-MPI-ADM-187-24	19/03/2025	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	$ 39.386.467,00	$ 1.077.614,00	$ 38.308.853,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-325	26/03/2025
N0 17	BEL-MPI-ADM-158-24	31/03/2025	IMPOGRIFOS SAS	$ 19.123.734,00	$ 579.176,00	$ 18.544.558,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-346	2/04/2025
N0 18	BEL-MPI-ADM-178-24	1/04/2025	DFL SAS	$ 193.649.950,00		$ 193.649.950,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-386	22/04/2025
N0 19	BEL-MPI-ADM-183-24	3/04/2025	JHC INGENIEROS S.A.S	$ 217.095.245,00		$ 217.095.245,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-362	08/04/2025
N0 20	BEL-MPI-ADM-204-25	16/04/2025	ILLUMINARC S.A.S	$ 279.407.486,00	$ 6.691.692,00	$ 272.715.794,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-388	24/04/2025
N0 21	BEL-MPI-ADM-210-25	16/04/2025	ARIN CONSTRUCTORES SAS	$ 27.213.747,00		$ 27.213.747,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-385	22/04/2025
N0 22	BEL-MPI-ADM-231-25	30/04/2025	LUIS ALFONSO CAMARGO QUINTANA	$ 62.248.410,00	$ 1.718.056,00	$ 60.530.354,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-427	09/05/2025
N0 23	BEL-MPI-ADM-228-25	30/04/2025	CARLOS ARDILA	$ 113.204.207,00	$ 3 .124.436,11	$ 110.079.770,89	SI	IDRD-4080-G2-2024-428	09/05/2025
N0 24	BEL-MPI-ADM-230-25	30/04/2025	BALERCO	$ 8.437.112	$ 2 31.134,00	$ 8.205.978,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-416	07/05/2025

N0 25	BEL-MPI-ADM-246-25	13/05/2025	STEEL CONCRET SC SAS	$ 25.060.869	686.541,00	$ 24.374.328,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-471	23/05/2025
N0 26	BEL-MPI-ADM-262-25	20/05/2025	ILLUMINARC SAS	$ 182.559.653	4.372.227,00	$ 178.187.426,00	SI	IDRD-4080-G2-2024-427	26/05/2025

Tabla 10 RELACION DE ORDENES DE GIRO PRESENTADAS

4.13.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD.

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-030-24** se remitió "REMISION PLAN DE CALIDAD CTO 4060 DE 2024".

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-027** se remitió por parte de la interventoría la "Respuesta BEL-MPI-ADM-030-24 - No aprobación del plan de calidad".

El día 10 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-0115** se remitió por parte de la interventoría la "No aprobación del plan de calidad".

El día 13 de enero de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-082-25** se remitió "REMISION SUBSANACION PLAN DE CALIDAD CTO 4060 DE 2024".

El día 14 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-121** se remitió por parte de la interventoría la "**APROBACIÓN** PLAN DE CALIDAD V2".

El día 05 de mayo de 2025 mediante comunicado BEL-MPI-ADM-237-25 dio respuesta a al comunicado IDRD-4080-G2-2024-412 remitiendo la hoja de vida del auditor y el Plan de Auditoria.

El día 08 de mayo de 2025 el contratista mediante comunicado BEL-MPI-ADM-241-25 hizo Entrega del plan de auditoría a la Interventoría.

Se realizó auditoría interna con acompañamiento de la interventoría el día viernes, 23 de mayo de 2025, a diferentes frentes de obra. Quedando pendiente el informe de la auditora.

El día 26 de mayo de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-237-25** el contratista remitió el Informe componente de calidad No 6 a la interventoría.

La interventoría a través del comunicado **IDRD-4080-G2-2024-482** con fecha 28 de mayo de 2025 emitió la Revisión Informe de Calidad N°6 V.0 con observaciones.

El Contratista atiende las observaciones y luego de la aprobación por parte de la interventoría mediante el comunicado **IDRD-4080-G2-2024-524** del 26 de junio de 2025, se radica a la oficina de la interventoría el informe mediante el comunicado **BEL-MPI-ADM-**

308-25 con fecha 27 de junio de 2025 y asunto RADICACIÓN DE INFORME DE CALIDAD #6 EN FÍSICO.

El día 29 de junio de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-311-25** se remitió "INFORME DE CALIDAD No 7" a la interventoría. Se encuentra en revisión.

INFORME DE CALIDAD N° 1	Radicado el día 27 diciembre de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-068-24**
	El día 03 enero 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-101**
	El día 12 enero 2025 se radica subsanación mediante oficio **BEL-MPI-ADM-081-25**
	El día 20 enero 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-138**
	El día 20 enero 2025 se radica respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-138 RADICACION EN FISICO INFORME 1 CALIDAD, mediante oficio **BEL-MPI-ADM-091-25**
INFORME DE CALIDAD N° 2	Radicado el día 13 enero de 2025 mediante correo electrónico
	El día 21 enero 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-154 REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 2 V.0**
	El día 03 de febrero por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-124-25** se radicó la atención de observaciones del informe, en su versión 1.
	El día 06 de febrero de 2024 por medio del **oficio IDRD-4080-G2-2024-209** la interventoría remite observaciones a la versión 1 del informe de calidad No 2.
	El día 06 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-277 Aprobación informes de calidad N° 2 V3.**
INFORME DE CALIDAD N° 3	El día 03 de febrero por medio de oficio **BEL-MPI-ADM-123-25** se radica la versión 0 del documento.
	El día 07 de febrero de 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-211**

	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 3 V.0
	El día 12 de febrero de 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-233 REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD N° 3 V.0**
	El día 06 de marzo de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-277 Aprobación informes de calidad N°3 V.2**
INFORME DE CALIDAD N° 4	El día 12 de marzo por medio de oficio **BEL-MPI-ADM-081-25** se radica la versión 0 del documento.
	El día 25 de marzo de 2025 se radica respuesta por parte de la interventoría mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-321 Respuesta BEL-MPI-ADM-081-25 - Revisión Informe Calidad N°4 V.0**
	El día 07 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-124-25** se da Subsanación informe de calidad # 4 febrero de 2025, en respuesta a su oficio BEL-MPI-ADM-192-25-REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME CALIDAD No 4 V.0
	El día 09 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-364 Respuesta comunicado BEL-MPI-ADM-124-25 INFORME CALIDAD 4 V.1**
	El día 10 de abril de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-200-25** se da Respuesta a su comunicado IDRD-4080-G2-2024-366.
	El día 16 de abril de 2025 mediante oficio **IDRD-4080-G2-2024-379** se da aprobación del informe de calidad N° 4 V.1
INFORME DE CALIDAD N° 5	El día 29 de abril de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-229-25** Entrega del Informe No 5 del Componente de Calidad.
	El día 05 de mayo de 2025 la interventoría mediante comunicado **IDRD-4080-G2-2024-410** remite observaciones al Informe d Calidad N°5 V.0

	El día 07 de mayo de 2025 se remite el comunicado **BEL-MPI-ADM-239-25** con asunto: Subsanación informe de calidad # 5 marzo de 2025, en respuesta a su oficio IDRD-4080-G2-2024-410 -Revisión Informe de Calidad N°5 V.0
	El día 08 de mayo de 2025 la interventoría remitió el comunicado **IDRD-4080-G2-2024-419** Aprobación Informe de Calidad N°5 V.1
INFORME DE CALIDAD N° 6	El día 26 de mayo de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-273-25** se hizo la Entrega del Informe No 6 del Componente de Calidad. Se encuentra en revisión por parte de Interventoría. La Interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G2-2024-524 del 26 de junio de 2025, da visto bueno al informe y el contratista lo remite en físico a la oficina de interventoría a través del oficio BEL-MPI-ADM-308-25 del 27 de junio de 2025
INFORME DE CALIDAD N° 7	El día 29 de junio se remite el informe No. 7 mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-311-25. El cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Tabla 11. SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD

4.13.3. SEGUIMIENTO A EL PLAN SOCIAL.

El día 25 de noviembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISIÓN PLAN SOCIAL CTO 4060 DE 2024".

El día 05 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "Se remite correo de validación de plan de gestión social por interventoría y entidad, Se solicita remitir en PDF para firmas de interventoría.".

El día 10 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-040-24** se remitió "REMISION PLAN SOCIAL CTO 4060 DE 2024".

El día 24 de enero de 2025 se remitió para aprobación del arte de los Pendones para revisión de Interventoría y trámite ante el IDRD el día 27 de enero se aprobó el material para impresión.

Aprobación de volantes el día 14 de enero en comité de seguimiento se solicitó la elaboración del volante de convocatoria a la reunión de finalización del parque desarrollo Palermo Sur el día 16 de enero se remite Interventoría para aprobación y este mismo día se solicita hacer ajustes los ajustes son remitidos el día 17 de enero, el día 20 de enero nuevamente se solicita ajustar datos contenidos en el volante y para la fecha de terminación del mes de enero el volante se encontraba en revisión con respecto al volante de convocatoria del parque el Country el día 17 de enero se solicitó la elaboración del volante el día 24 se remite volante para revisión y aprobación de Interventoría y a la fecha de finalización del mes de enero el volante se encontraba en revisión.

En lo referente a reuniones informativas el día 17 de enero de 2025 se solicitó la elaboración de la presentación de la reunión de inicio del parque el Country el día 24 de enero de 2025 se remitió la presentación para revisión por parte de Interventoría este mismo día se reciben observaciones para complemento por parte del componente técnico el día 27 de enero de 2025 se remitió la presentación ajustada y el día 28 de enero de 2025 se recibe la aprobación.

De igual forma se solicitó la elaboración de la presentación para la reunión de finalización del parque desarrollo Palermo Sur en comité celebrado el día 14 de enero de 20 25 el día 16 de enero de 2025 se remitió la presentación para revisión y se encuentra en trámite de aprobación por parte de Interventoría para la terminación del mes de enero de 2025.

En cuanto a atenciones ciudadanas no se registraron durante el mes de enero PQR decepcionadas a través de los canales de atención a la comunidad sin embargo el día 21 de enero se realizó recorridos por los Parques en ejecución para indicar a los trabajadores de obra la forma de direccionar las PQR a el sistema de atención al ciudadano establecido por el consorcio en total se realizó charla informativa con 10 trabajadores.

En cuanto al programa de apoyo a la contratación de mano de obra no calificada para el final del periodo se contó con un total de 50 personas vinculadas al contrato dando cumplimiento a los porcentajes de contratación con un 16% de población femenina un 55% de población en condición de vulnerabilidad y 44% de personal no calificado residente en las localidades intervenidas superando los porcentajes de contratación requeridos para el presente contrato.

Con respecto a los comités de seguimiento el componente social adelantaba acompañamiento de los comités citados por parte de la supervisión.

En relación con los informes mensuales se reporta que el día 30 de diciembre se presentó el informe de gestión Social número 2 vía correo electrónico para revisión y comentarios de Interventoría el día 7 de enero de 2025 se recibió aprobación del documento para radicación en físico para el trámite correspondiente.

Durante el mes de febrero de 2025 se gestionó la aprobación distribución de los volantes informativos para el levantamiento de actas de vecindad de primera segunda y tercera visita del parque el Country se distribuyeron dos volantes de primera visita el día 15 de febrero de 2025 vía correo electrónico, no fue necesario la distribución de los volantes de segunda y tercera visita de igual forma se distribuyó el volante de inicio de obra del parque el día 21 de febrero de 2025 remitiéndolo vía correo electrónico a las siete personas participantes y en la reunión de inicio celebrada en el parque el country.

Para este mismo periodo se realizó la instalación de los Pendones informativos según el arte aprobado en los Parques intervenidos por parte del consorcio.

Se adelantó la distribución del volante de convocatoria a la reunión de inicio del parque el Country entregando en total 19 piezas a los residentes del área de influencia directa a la administración del parque y a las asociaciones identificadas por parte de la administración. Esta actividad se realizó el día 6 de febrero de 2025.

Se realizó la distribución de volantes de convocatoria a la reunión informativa del parque el porvenir el día 24 de febrero de 2025 se distribuyeron 30 volantes informativos remitidos vía correo electrónico a la administración del parque y entregados predios a predio a los predios ubicados alrededor de la cancha de voleibol intervenida.

En lo referente a las reuniones de inicio el día 11 de febrero de 2025 se adelantó la socialización en el parque el Country contando con la participación de 10 personas residentes del sector representantes de organizaciones comunitarias y administración del parque.

Como reunión de finalización el día 25 de febrero de 2025 se celebró la entrega de la malla contra impactos construida en el parque el porvenir en este espacio se contó con la participación de 29 personas residentes de la comunidad representantes de escuelas deportivas y administración del parque.

En cuanto al programa de atención a la ciudadanía no se decepcionará un PQR a través de los canales dispuestos por el Consorcio para la atención a la comunidad sin embargo el día 10 de febrero de 20 25 se realizó recorrido por los frentes de obra adelantando charla informativa con los trabajadores sobre el protocolo de atención a la ciudadanía en total participar un seis trabajadores de igual forma se apoyó al IDRD en la atención de la respuesta al derecho de petición instaurado por los usuarios de natación práctica libre del parque patio bonito.

En cuanto al programa de acompañamiento social actividades técnicas se adelantó el levantamiento de dos actas de vecindad correspondientes al parque el Country y se apoyó al componente técnico en el levantamiento del acta de inspección preliminar e inventario de elementos existentes estos registros se encuentran en proceso de aprobación.

Respecto al programa de apoyo en la contratación de mano de obra no calificada se reportan para el mes de febrero un total de 55 personas contratadas dando cumplimiento a los porcentajes contractuales requeridos teniendo un 16.3% de población femenina contratada 44% de población en condición de vulnerabilidad contratado y 55% de personal mano de obra no calificada de las localidades intervenidas.

En cuanto al programa de sostenibilidad social desde la estrategia pedagógica durante el mes de febrero se gestionó la aprobación del plegable de sostenibilidad para el parque el porvenir el cual fue aprobado y distribuido durante la reunión de finalización celebrada el día 25 de febrero entregando en total 30 piezas.

Durante el periodo del **01 de junio de 2025 al 30 de junio** de 2025 se realizaron las siguientes actividades:

- Para el mes de junio, en cumplimiento del programa de información y divulgación se mantuvieron instalados los pendones informativos de los parques Palestina, Pijaos, Simón Bolívar, Timiza, Valles de Cafam, el Country, La Andrea, El Recreo, estadio Olaya Herrera, Porvenir y Quiroga. Desde el programa de participación y control se celebró reunión extraordinaria el 5 de junio de 2025, con dos representantes del comité de participación ciudadana del parque el Country con el fin de dar parte sobre el avance de obra y cierre a PQRS recibidas en el mes de mayo.
- Desde el programa de atención a la ciudadanía se dio seguimiento y cierre a la PQR número 2 radicada por la señora Amparo Morales.
- En el programa de acompañamiento a actividades técnicas, se apoyó al área técnica para el retiro de mobiliario infantil del parque, Simón Bolívar.
- Por el programa de apoyo a la contratación se dio cumplimiento con la vinculación del 9% de personal femenino, 8% de personal, vulnerable, 70% de personal no calificado y las localidades intervenidas y 5.5% de personal joven contratado.
- Por parte del programa de sostenibilidad social, se adelantaron, talleres de prevención de violencia de género, según programación en los parques Simón Bolívar, UDS, parque El Recreo, parque Porvenir, CEFE San Cristóbal, parque Pijaos y estadio Olaya Herrera.

En lo referente al seguimiento del componente Social participó en los comités semanales citados desde la supervisión.

INFORME SOCIAL N° 1	Radicado el día 13 diciembre de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-044-24**
	Radicación en físico el día 27 diciembre de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-067-24**
INFORME SOCIAL N° 2	Radicado el día 09 enero de 2025 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-079-25**

INFORME SOCIAL N° 3	Radicación en físico el día 11 de febrero de 2024 mediante oficio **BEL-MPI-ADM-134-25**
INFORME SOCIAL N°4	Radicado en su primera versión por medio de correo electrónico el día 28 de febrero de 2025 y aprobado este mismo día.
	El día 04 de marzo de 2025 se realizó un alcance en cuanto a personal y se recibe aprobación del informe este mismo día
	El día 04 de marzo de 2025 se recibió aprobación del documento para radicación en físico a la interventoría para el trámite correspondiente. El día 17 de marzo se entrega informe aprobado en físico a la interventoría.
INFORME SOCIAL N°5	El día 1 de abril de 2025 se remitió el informe social No. 5 vía correo electrónico, para revisión y comentarios de la interventoría. El día 2 de abril de 2025 se recibió aprobación del informe social, para radicación en físico a la interventoría para el trámite correspondiente con comunicado **BEL-MPI-ADM-218-25** el día 24 de abril de 2025.
INFORME SOCIAL N°6	Se emite el informe de gestión social, número seis, el día 25 de abril. Se reciben observaciones por parte de Interventoría requiriendo la actualización del personal contratado durante el periodo el día 28 de abril, el día 29 de abril, se remite la información actualizada Interventoría para revisión y aprobación, el día 30 de abril se recibe aprobación del informe para impresión y radicación oficial.
INFORME SOCIAL N°7	El día 11 de junio luego de la revisión y la aprobación por parte de interventoría se tramita el informe de manera física a las oficinas de la interventoría mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-287-25.
INFORME SOCIAL N°8	El informe se encuentra aprobado por parte de la profesional social de la interventoría. Está pendiente la radicación del informe en físico.

Tabla 12. SEGUIMIENTO PLAN SOCIAL

4.13.4. SEGUIMIENTO A EL PLAN AMBIENTAL Y PLAN RCD.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RCD

El día 27 de noviembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN AMBIENTAL RCD CTO 4060 DE 2024".

El día 01 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "Observaciones a él plan ambiental RCD.".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION AJUSTE PLAN AMBIENTAL RCD CTO 4060 DE 2024".

El día 12 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION AJUSTE PLAN AMBIENTAL RCD CTO 4060 DE 2024".

El día 11 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "**APROBACION** de él plan ambiental RCD V3.".

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El día 27 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN AMBIENTAL CTO 4060 DE 2024".

El día 31 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "Observaciones al plan ambiental."

Los días 10 y 28 de junio de 2025 se realizaron las actividades de capacitación de reinducción sistema de gestión ambiental

Los días 17 y 25 de junio de 2025 se realizaron las capacitaciones sobre el manejo de emergencias ambientales en obra.

Se contemplan las medidas para el control de las emisiones atmosféricas (material particulado) tales como: No se realizan quemas de residuos en ninguno de los frentes de obra, se realizan jornadas de orden y aseo permanentes en cada frente de obra y se realiza la limpieza de las vías de los frentes de obra y carpado de volquetas para disminuir los aportes de material particulado en la atmosfera.

Durante el periodo del informe no se realizó la instalación de campamentos de obra temporales, sin embargo, se realizó el uso de los puntos ecológicos de los parques

intervenidos para el manejo de los residuos, se realizó la protección y cerramiento de acopios, así como el orden y aseo de las áreas de trabajo.

INFORME AMBIENTAL N° 1	Radicado para revisión el día 29 noviembre de 2024
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 09 de diciembre de 2024
	Radicado para revisión el día12 diciembre de 2024
	APROBADO por parte de interventoría el día 24 de diciembre de 2024
INFORME AMBIENTAL N° 2	Radicado para revisión el día 14 enero de 2025
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 23 de enero de 2025
	Radicado para revisión subsanación el día 23 enero de 2025
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 25 de enero de 2025
INFORME AMBIENTAL N° 3	El día 03 de febrero de 2025 se radica por medio de correo electrónico para revisión.
	El día 13 de febrero de 2025 se reciben observaciones al informe por medio de correo electrónico.
	El día 17 de febrero de 2025 se atienden observaciones y se remiten por medio de correo electrónico para revisión.
	El día 20 de febrero de 2025 se recibe aprobación del informe.
	El día 25 de febrero de 2025 mediante oficio BEL-MPI-ADM-148-25 se **"Entrega informe físico ambiental 3"**
INFORME AMBIENTAL N° 4	El día 28 de febrero de 2025 se envía por medio de correo electrónico para revisión.
	El día 12 de marzo se recibe aprobación por parte de interventoría.
	El día 17 de marzo se entrega informe aprobado en físico a la interventoría.
INFORME AMBIENTAL N° 5	El día 03 de abril de 2025 por medio de correo electrónico se radico la primera versión del informe.

	Se aprueba por correo electrónico el día 21 de abril en versión 2. El día 24 de abril de 2025 por medio del comunicado **BEL-MPI-ADM-219-25** se radicó el informe fisco en la oficina de la interventoría.
INFORME AMBIENTAL N° 6	Se radicó en su primera versión por correo electrónico el día 02 de mayo de 2025. El cual fue aprobado por correo electrónico.
INFORME AMBIENTAL N° 7	Mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-312-25 del 01 de julio de 2025, se radica en forma física a la interventoría.

Tabla 13.SEGUIMIENTO A EL PLAN AMBIENTAL

4.13.5. SEGUIMIENTO A EL PLAN SST.

El día 17 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN SST CTO 4060 DE 2024".

El día 23 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION OBSERVACIONES PLAN SST CTO 4060 DE 2024".

El día 23 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió por parte de la interventoría la "**APROBACION** A EL PLAN".

INFORME SST N° 1	Radicado para revisión el día 26 noviembre de 2024
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 27 de diciembre de 2024
	Radicado para revisión el día29 noviembre de 2024
	APROBADO por parte de interventoría el día 29 de noviembre de 2024
INFORME SST N° 2	Radicado para revisión el día 30 diciembre de 2024
	Remisión de observaciones por parte de interventoría 08 de enero de 2025
	Radicado para revisión el día 08 ENERO de 2025
	Remisión de **APROBACION** por parte de interventoría 13 de enero de 2025

INFORME SST N° 3	Radicado para revisión el día 4 de febrero 2025
	Respuesta a observaciones 7 de febrero 2025
	Remisión de **APROBACION** por parte de interventoría 11 de febrero de 2025
INFORME SST N° 4	Radicado para revisión el día 3 de marzo 2025
	Pendiente a observaciones a la fecha de presentación del informe técnico No 4 V0
	Se da respuesta a oficio correspondiente a Requerimiento SST Palacio de los deportes - Trabajo en alturas el día 11 de febrero 2025
	Remisión de **APROBACION** por parte de interventoría 07 de marzo de 2025
	El día 17 de marzo se entrega informe aprobado en físico a la interventoría.
INFORME SST N° 5	El día 02 de abril de 2025 se radica en su primera versión, por medio de correo electrónico. El día 15 de abril de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-373** la interventoría da aprobación al informe. El día 24 de abril de 2025 por medio del comunicado **BEL-MPI-ADM-216-25** se radicó el informe fisco en las oficinas de la interventoría.
INFORME SST N° 6	El informe en su primera versión se radicó el día 29 de abril de 2025 por correo electrónico a la interventoría.
	La interventoría remitió observaciones a la primera versión del informe mediante correo electrónico el día 2 de mayo de 2025
	Se subsanaron las observaciones dadas el 09 de mayo de 2025 mediante correo electrónico.

	El día 15 de mayo de 2025 mediante el comunicado IDRD-4080-G2-2024-340 la interventoría remitió la APROBACIÓN INFORME SST N°6.
INFORME SST N° 7	El día 11 de junio luego de la revisión y aprobación de la interventoría se tramita el informe en físico mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-288-25.

Tabla 14. SEGUIMIENTO A EL PLAN SST

4.13.6. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS.

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-036-24** se remitió "Remisión Plan Hidrosanitario, Plan SUD´s, Plan Servicios públicos y energía".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-037** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-036-24 PLAN SUD´s".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN SUD´s COT 4060 DE 2024".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-060-24** se remitió "respuesta comunicado plan SUDS".

APROBACION El día 24 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-072** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-060-24 – PLAN SUD'S".

Dentro de la ejecución del contrato se han realizado visitas a diferentes estructuras de Ekomuros, con el fin de realizar el debido proceso para su mantenimiento en pro de cumplir con el objetivo del plan de sistemas urbanos de drenaje sostenible SUDS.

Parques visitados (Ekomuros):

- Parque Castilla
- Parque Nuevo Muzu
- Parque Valles de Cafam
- Parque La Andrea
- Parque Quiroga
- Parque La Fragua
- Parque Jazmín

4.13.7. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE TOPOGRAFIA

El día 29 de noviembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-017-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE TOPOGRAFIA".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-024** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-017-24 PLAN DE TOPOGRAFÍA".

El día 16 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-049-24** se remitió "respuesta plan de topografía".

APROBADO El día 21 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-064** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-049-24 – PLAN TOPOGRAFÍA".

Durante la ejecución del contrato hasta el periodo del presente informe no se han realizado levantamientos de topografía.

4.13.8. SEGUIMIENTO A EL PLAN PMT

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-027-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO A CTO 4060 de 2024".

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-030** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-027-24 - REMISIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO".

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-037-24** se remitió "Alcance No. 2 IDRD-4080-G2-2024-030 PMT".

El día 6 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN MANEJO PMT COT 4060 DE 2024".

APROBADO El día 21 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-062** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-037-24 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO".

A la fecha en el contrato no se han tramitado PMT´s ante la secretaria Distrital de movilidad.

4.13.9. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE GERENCIA, CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-025-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO 4060 de 2024",

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-031** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-025-24-REMISIÓN PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO".

El día 16 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-042-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE GERENCIA CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO 4060 de 2024".

El día 21 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-063** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-045 PLAN DE GERENCIA DE OBRA / CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-042-24** se remitió "REMISIÓN entrega atención de observaciones PLAN DE GERENCIA CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN CTO 4060 de 2024".

El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-098** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-064-24 PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 2 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-075-25** se remitió "Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-080 - **Radicación física** plan hidrosanitario y plan de construcción y coordinación logística".

El día 04 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-107** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-075-24 DEVOLUCIÓN PLAN DECONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 3 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-076-25** se remitió "Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-098 - Subsanación plan de construcción y coordinación logística".

El día 09 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-113** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA AL COMUNICADO BEL-MPI-ADM-076-24 SUBSANACIÓN PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 16 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-086-25** se remitió "**Radicación física** Plan de Calidad - Plan de Servicios Públicos - Plan de Manejo Ambiental - PLAN DDE CONBSTRUCCION Y COORDINACIÓN".

El día 17 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-133** se remitió por parte de la interventoría la "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 20 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-142** se remitió por parte de la interventoría la "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-133 - APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA".

El día 21 de enero de 2025 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-093-25** se remitió "**Respuesta a oficio IDRD-4080-G2-2024-142 – "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-133 - APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA**".

El día 31 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-187** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS – ENTREGA INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN".

El día 05 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-203** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS".

El día 05 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-207** se remitió por parte de la interventoría "APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - AUSENCIA DE PERSONAL EN PATIO BONITO".

El día 10 de febrero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-220** se remitió por parte de la interventoría "REITERACIÓN COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-207 - APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO - AUSENCIA DE PERSONAL EN PATIO BONITO".

El día 17 de mayo de 2025 el contratista remitió respuesta al oficio **IDRD-4080-G2-2024-338** mediante comunicado BEL-MPI-ADM-257-25 el que se envió el Plan De Ejecución De Obras.

El día 19 de mayo de 2025 el contratista remitió respuesta a los oficios **IDRD-4080-G2-2024-359** e **IDRD-4080-G2-2024-443** apremio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas, mediante el comunicado **BEL-MPI-ADM-259-25** por el cual se hace la entrega de información correspondiente al buen manejo e inversión del anticipo.

El día 27 de mayo de 2025 el contratista remitió a la interventoría el sustento sobre la amortización del anticipo del periodo de mayo mediante el comunicado **BEL-MPI-ADM-274-25.**

El día 10 de junio de 2025 el contratista remitió a la interventoría el oficio **BEL-MPI-ADM-280-25** mediante el cual se realiza la solicitud de prórroga al contrato IDRD-SG-4060-2024.

El día 11 de junio de 2025 el contratista dio respuesta al radicado IDRD No. **20258000158931** por medio del comunicado el **BEL-MPI-ADM-289-25.**

El día 19 de junio de 2025 el contratista presentó a la interventoría los Descargos – Proceso Administrativo Sancionatorio a través del comunicado **BEL-MPI-ADM-298-25.**

El día 26 de junio de 2025 el contratista dio respuesta al oficio **IDRD-4080-G2-2024-512** con asunto Traslado Comunicado 20256100174371 - Aceptación Propuesta De Adición Y Prorroga Al Contrato De Obra Pública 4060/2024 mediante comunicado **BEL-MPI-ADM-305-25.**

4.13.10. SEGUIMIENTO A EL PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-028-24** se remitió "REMISIÓN PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CTO 4060 de 2024".

El día 06 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-032** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-028-24-REMISIÓN PLAN DE PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES".

El día 16 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-046-24** se remitió "REMISIÓN PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALESCTO 4060 de 2024".

El día 18 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-055** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-046-24 PLAN ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-064-24** se remitió "REMISIÓN PLAN ESTRUCUTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALESCTO 4060 de 2024".

APROBADO El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-079** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-064-24 PLAN ESTRUCTURAL".

El día 27 de diciembre de 2024 el contratista remite por correo electrónico la propuesta e informe de visita de cubiertas tipo Pérgola en los Parques EL COUNTRY y SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) – PRD.

El día 04 de enero de 2025 se recibe comunicado **IDRD-4080-G2-2024-105** por parte de interventoría "REMISIÓN OBSERVACIONES PROPUESTA PÉRGOLA COUNTRY, CUBIERTA PRD NUEVA Y CUBIERTA PRD EXISTENTE"

El día 13 de enero por medio de correo electrónico se da "Alcance Comunicado IDRD-4080-G2-2024-105 – PROPUESTAS PÉRGOLA"

El día 15 de enero de 2025 se recibe comunicado IDRD-4080-G2-2024-122 por parte de interventoría "RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO DEL 13 DE ENERO DE 2025 - PROPUESTAS PÉRGOLAS"

El día 16 de enero de 2025 mediante correo electrónico se remitieron las memorias de Cálculo Estructura de Cubierta Parque el Country, el día 24 de enero de 2025 se realizan observaciones por parte de la interventoría por este mismo medio.

El día 23 de enero de 2025 se remite oficio BEL-MPI-ADM-096-25 "Atención a las observaciones al comunicado IDRD-4080-G2-2024-105 – Cubierta Pérgola".

El día 28 de enero de 2025 la interventoría por medio del comunicado IDRD-4080-G2-2024-175 da "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-096-25 – ALCANCE COMUNIDADO IDRD-4080-G2-2024-105 CUBIERTA PÉRGOLA"

El día 31 de enero de 2025 se remite por parte del contratista comunicado BEL-MPI-ADM-119-25 "Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-175 – Cubierta Pérgola".

El día 22 de mayo de 2025 el Consorcio Belzcon IDRD 1 remitió a la interventoría el diseño ajustado de la pérgola del parque El Country mediante el comunicado BEL-MPI-ADM-269-25.

Dentro del contrato hasta la fecha se ha implementado el plan estructural puesto que se han realizado dentro de la normativa vigente como, por ejemplo, elementos de la cartilla de diseño de espacio público y urbanismo, NSR-10 y NTC.

4.13.11. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE GEOTECNIA

El día 02 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-026-24** se remitió "REMISIÓN PLAN DE GEOTECNIA CTO 4060 de 2024

El día 09 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-034** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-026-24 REMISIÓN PLAN DE GEOTECNIA".

El día 09 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-038-24** se remitió "Respuesta comunicado IDRD-4080-G2-2024-012 – Ajuste Plan de Alcance No. 2 IDRD-4080-G2-2024-034 geotecnia".

El día 09 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-039** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-038-24 - PLAN DE GEOTECNIA".

El día 16 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-047-24** se remitió "Respuesta comunicado IDRD-4080-G2-2024-039 – Ajuste Plan de geotecnia".

APROBADO El día 18 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-053** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-047-24 PLAN DE GEOTECNIA".

El día 05 de febrero de 2025 por medio del comunicado BEL-MPI-ADM-126-25 el contratista presenta "Concepto de geotecnia de parques priorizados" (Parque Timiza, Quiroga, Simón Bolívar – UDS).

El día 10 de febrero de por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-225** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-126-25 CONCEPTO GEOTECNIA PARQUES PRIORIZADOS".

El día 04 de marzo de 2025 se realiza recorrido del área de geotecnia en los parques de Quiroga, tunal y Timiza, en el cual se establecen recomendaciones y compromisos.

El día 15 de abril de 2025 de por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-208-25** se remitió "concepto sobre visita Técnica en sitio (08 -552 Parque Gilma Jiménez – 07-165 Parque Palestina – 10-234 Parque San Andrés).

4.13.12. SEGUIMIENTO A EL PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-036-24** se remitió "Remisión Plan Hidrosanitario, Plan SUD´s, Plan Servicios públicos y energía".

El día 10 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-040** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-036-24 PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS".

APROBADO El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-081** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO PLAN DE SERVICIOS PÚBLICOS".

Dentro del contrato hasta la fecha del presente informe se ha tenido en cuenta la normativa vigente para cada una de las Empresas de servicios públicos, principalmente para la parte eléctrica, en cuanto a redes de acueducto la intervención realizada ha sido en la red menor (arreglo de fugas, daños, escapes de agua), de cada uno de los parques intervenidos.

4.13.13. SEGUIMIENTO A EL PLAN HIDROSANITARIO

El día 04 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-036** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-036-24 PLAN HIDROSANITARIO".

El día 20 de diciembre de 2024 por medio de correo electrónico se remitió "REMISION PLAN HIDROSANITARIO 4060 DE 2024".

El día 24 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-071** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-059-24 PLAN HIDROSANITARIO".

El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-078** se remitió por parte de la interventoría la "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-064-24 PLAN HIDROSANITARIO".

El día 30 de diciembre de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-072-24** se remitió "Respuesta oficio IDRD-4080-G2-2024-078 – Subsanación Plan Hidrosanitario"

El día 02 de enero de 2024 por medio del oficio **BEL-MPI-ADM-075-24** se remitió "Respuesta Oficio IDRD-4080-G2-2024-080 - **Radicación física plan hidrosanitario** y plan de construcción y coordinación logística".

El día 04 de enero de 2025 por medio del oficio **IDRD-4080-G2-2024-106** se remitió por parte de la interventoría "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-072-24 PLAN HIDROSANITARIO" en el cual se da APROBACION.

Durante la ejecución de actividades del contrato hasta la fecha del presente informe se han atendido las emergencias hidráulicas según el procedimiento establecido en el plan hidrosanitario, así mismo la atención de problemas hidráulicos que se han presentado hasta el momento.

4.14. ACTIVIDADES EJECUTADAS (EMERGENCIAS)

4.14.1. PARQUE LA PRIMAVERA

CODIGO: 08-722 UPZ: CALANDAIMA

Localización General del Parque

El Parque La Primavera se localiza entre las calles 4 y avenida calle 6 con carrera 89D en el sur occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona ocho del Distrito Capital Localidad de Kennedy

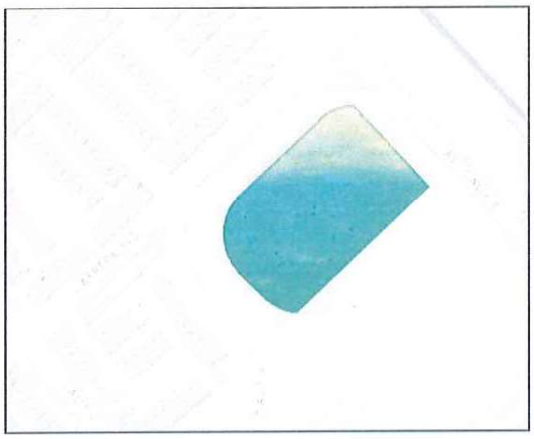


Ilustración 5 UBICACION DE PARQUE LA PRIMAVERA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó el suministro e instalación de una puerta en la entrada del parque de acuerdo con la solicitud de la Supervisión.
- Suministro e instalación de puerta de paso, acceso a la cancha, en tubo y malla.
- Dimensiones: 2.50 de alto, x 1.20 de ancho, pisoteada.

4.14.2. CEFE SAN CRISTOBAL

CODIGO: 04-127 UPZ: SOSIEGO

Localización General del Parque

El Parque San Cristóbal se localiza en la calle 17a Sur No 2A 50 E, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona cuatro del Distrito Capital Localidad de San Cristóbal.



Ilustración 6 UBICACON CEFE SAN CRISTOBAL

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó el mantenimiento de la red hídrica de 3" y 4", junto con la instalación de sus respectivos accesorios de la tubería hidráulica de presión.

4.14.3. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUÁTICO)

CODIGO: 12-1000 UPZ: PARQUE EL SALITRE

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolívar – Sector Complejo Acuático se localiza en la Avenida Calle 63 No. 45 - 10 Ubicado en el nor occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona doce del Distrito Capital Localidad de Barrios Unidos.

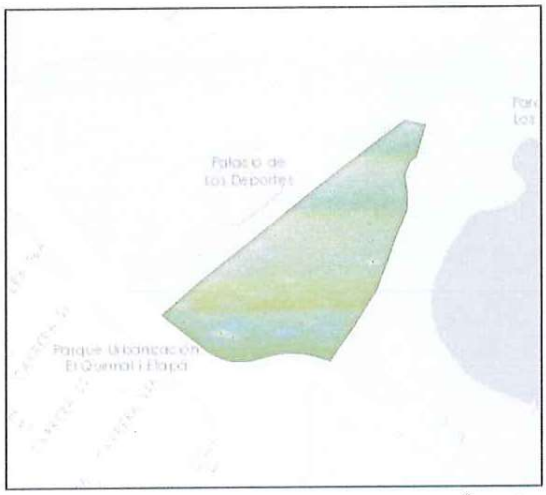


Ilustración 7 UBICACION COMPLEJO ACUÁTICO

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se atienden y corrigen las observaciones de la interventoría en baranda de cerramiento bicicleteros complejo acuático

4.14.4. PARQUE BERLÍN

CODIGO: 11-015 UPZ: TIBABUYES

Localización General del Parque

El Parque Berlín se localiza en la CALLE 139 N 145 84, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número once del Distrito Capital Localidad de Suba.

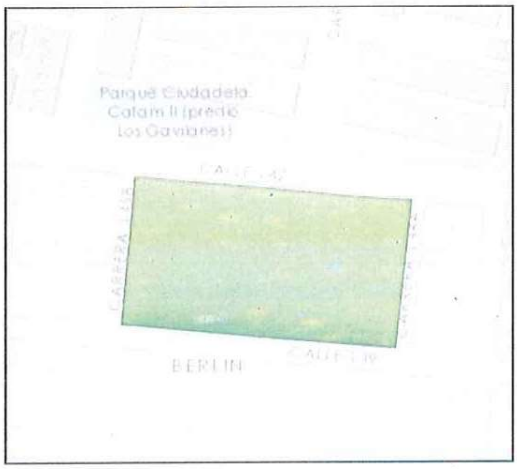


Ilustración 8 UBICACION PARQUE BERLÍN

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza la instalación de concreto de 3000 PSI en el cuarto eléctrico. Fundida de placa de contra piso de zona exterior cuarto de control eléctrico.
- Dimensiones: 5.0 x 2.50 x .10 de espesor.
- Se realiza jornada de aseo y limpieza de obra.

4.14.5. PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS

CODIGO: 11-204 UPZ: NIZA

Localización General del Parque

El Parque del Indio o de las Cometas se localiza en Cerros De Suba Cuchilla Ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona onceava del Distrito Capital Localidad de Suba

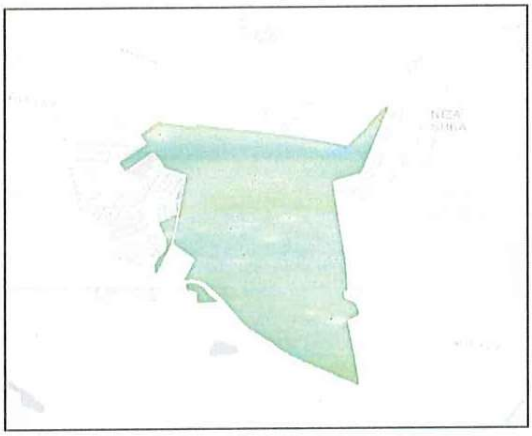


Ilustración 9 UBICACIÓN PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó visita al Centro de Felicidad Cometas.
- Se realizó revisión al tablero eléctrico.

4.15. ACTIVIDADES EJECUTADAS

4.15.1. PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA

CODIGO: 18-207 UPZ: QUIROGA

Localización General del Parque

El Parque Estadio Olaya Herrera se localiza en la CALLE 22 SUR N 21 09. Ubicado en la ciudad de Bogotá y hace parte de la zona número dieciocho del Distrito Capital Localidad de Rafael Uribe Uribe.

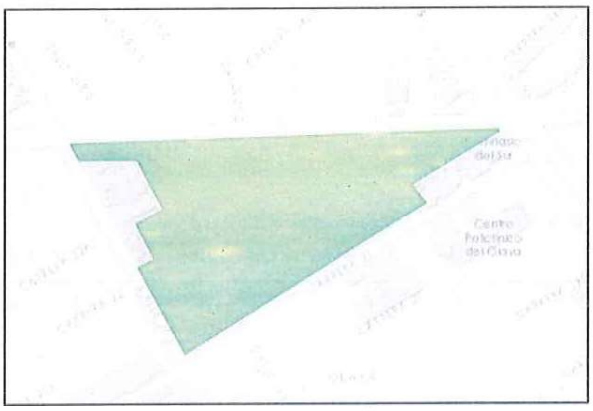


Ilustración 10 UBICACION PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Excavaciones terraza zona baños
- Lleno con material de excavación terraza zona camerinos
- Excavación manual pilotines cimentación estructura baños
- Excavación manual rampa acceso personal con movilidad reducida terraza baños
- Realce de cajas de inspección y pozo de red de agua lluvias

4.15.2. PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER

CODIGO: 18-090 UPZ: SAN JOSE

Localización General del Parque

El Parque Pijaos Jorge E. Cabalier se localiza en la Carrera 10 D N 34 50 Sur Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Decima del Distrito Capital Localidad de Rafael Uribe Uribe.

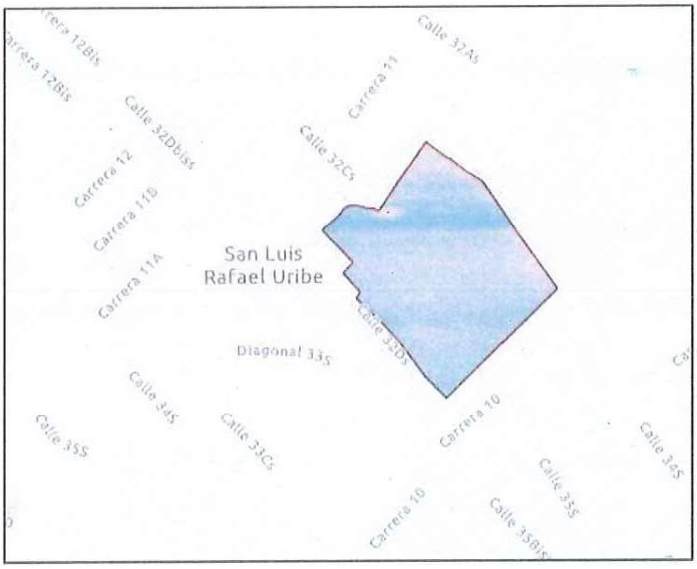


Ilustración 11. UBICACION PARQUE PIJAOS

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza el suministro e instalación de las puertas de acceso cancha sintética y zona shut de basuras.
- Se finalizan los trabajos de pintura módulos de cerramiento eslabonado.
- Se realiza la instalación de la malla de nylon en la zona de cancha sintética.
- Se realiza el suministro de banco de jugadores.

4.15.3. PARQUE EL PORVENIR

CODIGO: 07-391 UPZ: EL PORVENIR

Localización General del Parque

El Parque porvenir se localiza en la Carrera 100 -Calle 54d Sur Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Decima del Distrito Capital Localidad de BOSA.

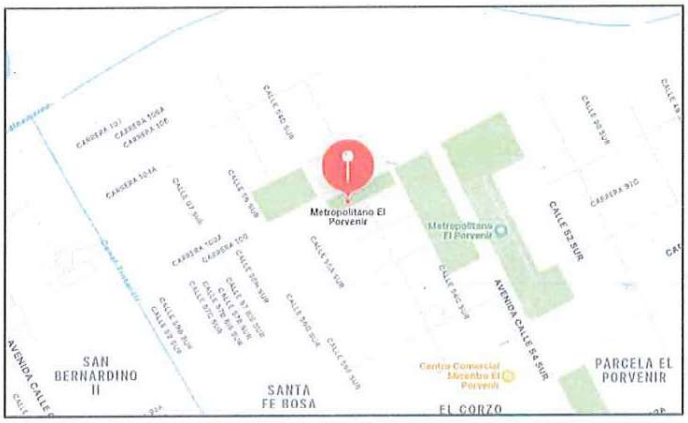


Ilustración 12. UBICACION PARQUE PORVENIR

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Suministro e instalación de accesorios PVC-P 1" en cuartos de equipos de bombeo zona módulos baños
- Desmonte de pasos en varilla, suministro e instalación de pasos plásticos en pozos de inspección zona módulos baños
- Excavación manual, trasiego y acopio de gravilla en zona pista de trote
- Suministro, trasiego manual, extendido, nivelación y compactación mecánica de material granular SBG-PEA en zona pista de trote
- Vaciado de 20 m3 de concreto 3000 PSI para placa de contrapiso en zona pista de trote.
- Retiro y disposición final de piso caucho (7 m3).
- Mantenimiento de cerramientos provisionales vandalizados.
- Corte con pulidora para juntas en zona pista de trote.

4.15.4. PARQUE VALLES DE CAFAM

CODIGO: 05-003 UPZ: COMUNEROS

Localización General del Parque

El Parque urbanización Valles de Cafam se localiza en la Calle 92 sur No 14D - 87 Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona quinta del Distrito Capital Localidad de Usme.



Ilustración 13 UBICACION DEL PARQUE VALLES DE CAFAM

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Suministro e instalación de malla tipo gallinero debajo policarbonato cubierta costado patinaje
- Suministro e instalación de llaves tipo pera para baños discapacitados, camerinos hombres, acceso al coliseo y administración

4.15.5. PARQUE QUIROGA

CODIGO: 18-205 UPZ: QUIROGA

Localización General del Parque

El Parque QUIROGA se localiza en la Calle 31 B Sur No. 22 25 en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona dieciocho del Distrito Capital Localidad de Rafael Uribe Uribe.

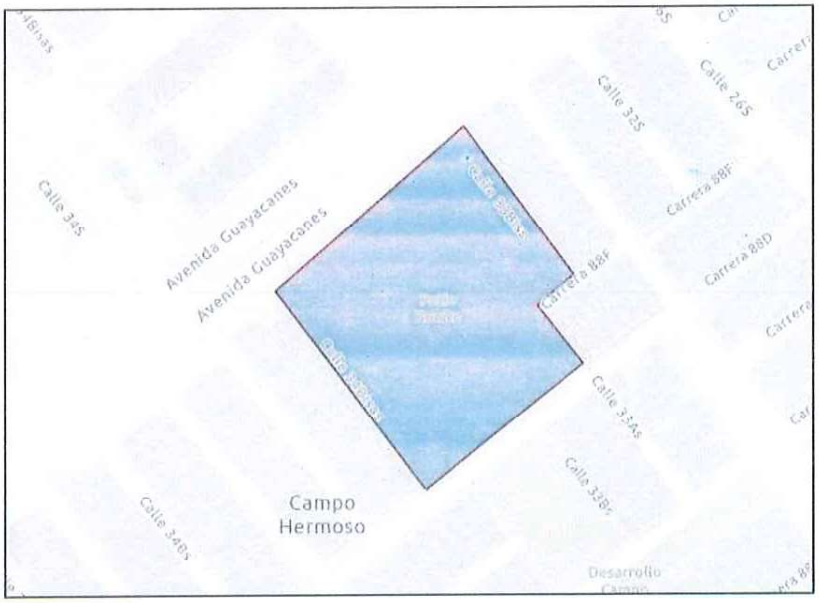


Ilustración 14. UBICACION PARQUE QUIROGA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Demolición de carpeta asfáltica cancha múltiple
- Excavación mecánica estructura cancha múltiple
- Suministro e instalación de subbase granular estructura cancha múltiple
- Suministro e instalación de base granular estructura cancha múltiple.
- Compactación de la base granular.
- Instalación de concreto de 3000 PSI de la viga para la instalación de la malla contra impacto.

4.15.6. PARQUE SIMON BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)

CODIGO: 12-125 UPZ: PARQUE EL SALITRE

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolívar – Palacio de los deportes se localiza en la Avenida calle 63 No 45 10 Ubicado en el nor occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona doce del Distrito Capital Localidad de Barrios Unidos.

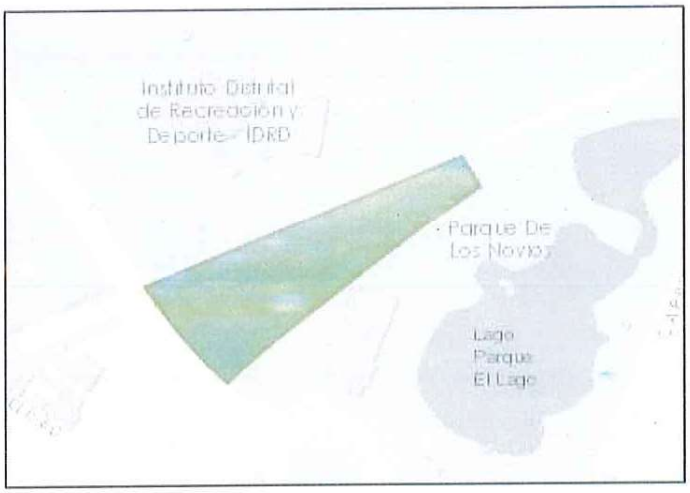


Ilustración 15 UBICACION DE PARQUE PALACIO DE LOS DEPORTES

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza y conformación de material de los costados de la viga de cerramiento.
- Toma de densidades de la capa única de la viga de cerramiento. Se realizaron 5 muestras.

4.15.7. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)

CODIGO: 12-041 UPZ: PARQUE EL SALITRE

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolívar – Parque Deportivo el Salitre se localiza en la Avenida Carrera 63 No 60 80 Ubicado en el nor occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona doce del Distrito Capital Localidad de Barrios Unidos.

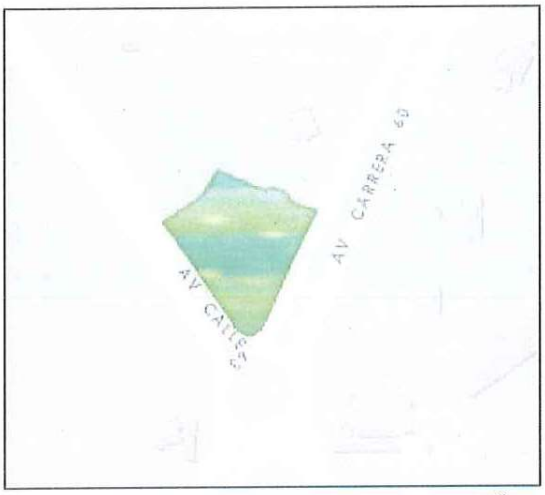


Ilustración 16 UBICACION PARQUE DE LOS NIÑOS

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación de tobogán y tapones de juegos.

4.15.8. PARQUE EL COUNTRY

CODIGO: 01-1000 UPZ: COUNTRY CLUB

Localización General del Parque

El Parque El Country se localiza en la Avenida Carrera 63 No 60 80 Ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número uno del Distrito Capital Localidad de Usaquén.



Ilustración 17 UBICACION PARQUE EL COUNTRY

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza la instalación de concreto 3000 PSI para pilotines del cerramiento y zona de juegos.
- Se realiza la instalación de concreto 3000 PSI en placas para la instalación de bebederos.
- Excavación para lavapiés y zapatas de pérgola.
- Nivelación de terreno en diferentes áreas.
- Levantamiento de muro en zona de lavapiés.
- Remates de filos, contra tejas y terminación de muros externos.
- Mampostería en zona de servicios.
- Pañete de muros externos.
- Instalación de enchape de cocina.
- Pintura de muros internos externos zona de servicios
- Pintura de elementos biosaludables y correas metálicas.
- Instalación de correas y ángulos metálicos para tejado.
- Descarga e instalación de tejas para la cubierta de zona de servicios.
- Pintura de correas y estructuras metálicas.
- Instalación de juego de rana.
- Instalación de elementos biosaludables.
- Instalación de la ruta de la vida.
- Instalación de baranda tipo M83 y pasamanos.
- Lleno con arena 500 (Peldar) para arenero de la zona de juegos.
- Instalación de puntos eléctricos.

- Instalación de tubería para red eléctrica y cometida.
- Instalación de cableado eléctrico.
- Instalación de cárcamo para lavapiés.
- Instalación de cintas y tapas para registros y cajas de inspección de bebederos.
- Instalación de césped.
- Acondicionamiento y remate de cajas de inspección.
- Recolección y disposición final de madera y chatarra.
- Aseo general del Parque El Country y zona de servicios.

4.15.9. PARQUE TIMIZA

CODIGO: 08-219 UPZ: TIMIZA

Localización General del Parque

El Parque Timiza se localiza en la Calle 40 H Sur No 70A 81, ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número ocho del Distrito Capital Localidad de Kennedy.



Ilustración 18 UBICACION PARQUE TIMIZA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Amarre de acero de refuerzo para pilotes y viga de cimentación zona sendero lago.

- Suministro e instalación de puerta de acceso a parque en zona plazoletas de comidas
- Suministro e instalación de reja bancaria en zona plazoleta de comidas
- Re instalación de adoquín en zona sendero lago
- Cintas de ajuste en concreto zona sendero lago
- Trasiego manual y acopio de RDC
- Suministro e instalación de adoquín de arcilla zona sendero lago
- Suministro e instalación de párales de baranda M-80 zona sendero lago

4.15.10. PARQUE PALESTINA

CODIGO: 07-165 UPZ: BOSA CENTRAL

Localización General del Parque

El Parque Palestina se localiza en la Calle 68 Sur No 81G-09, ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número siete del Distrito Capital Localidad de Bosa.

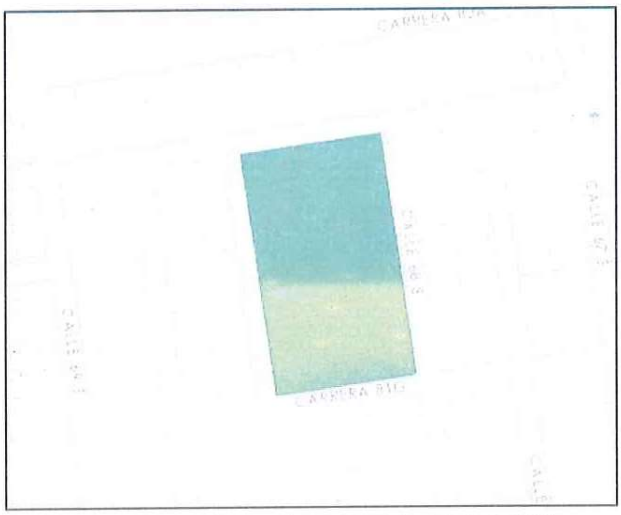


Ilustración 19 UBICACION PARQUE PALESTINA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Suministro e instalación de piso caucho reciclado (EDPM+SBR) espesor 3cm, 8cm y 11cm en zona de juegos
- Mantenimiento de equipos biosaludables en zona gimnasio
- Retiro y disposición final de juegos previamente desmontados
- Suministro e instalación de baranda M-83 en zona de juegos

4.15.11. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)

CODIGO: 13-089 UPZ: PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - CAN

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolívar (sector central) se localiza en la Avenida Carrera 68 No 53-36, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número trece del Distrito Capital Localidad de Teusaquillo.

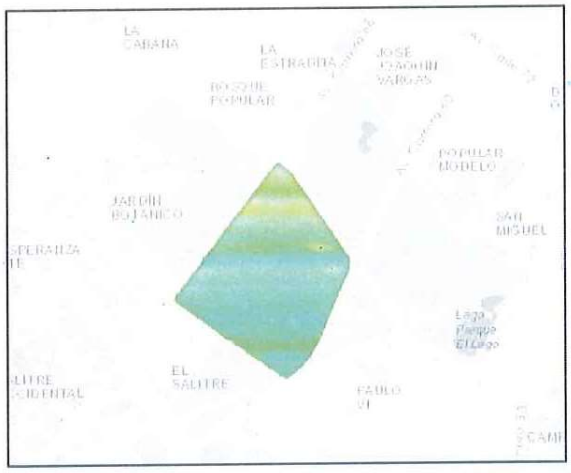


Ilustración 20 UBICACION PARQUE SIMON BOLIVAR - SECTOR CENTRAL

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Retiro de caucho existente de la zona 1 y zona 6.
- Retito de juegos existentes en la zona 1 y zona 6.
- Retiro y disposición de caucho de la zona 6 a sitio ambiental autorizado.
- Mantenimiento de juegos de la zona 2 a la 5.
- Replanteo de dados para juegos de la zona 1 y zona 6.
- Excavación de dados para juegos de la zona 1 y zona 6.
- Instalación de concreto para dados de la zona 1 y zona 6.
- Instalación de juegos de la zona 1 y zona 6.

4.15.12. PARQUE URBANIZACIÓN EL TOBERÍN

CODIGO: 01-079 UPZ: TOBERIN

Localización General del Parque

El Parque Urbanización el Toberín se localiza en la Carrera 16 C No 164-79, ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número uno del Distrito Capital Localidad de Usaquén.

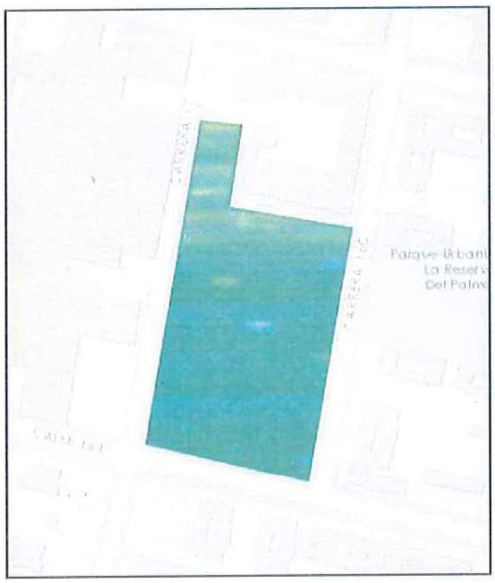


Ilustración 21 UBICACION PARQUE URBANIZACION EL TOBERIN

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de estructura metálica cerramiento perimetral de la cancha.
- Retiro de módulos de malla eslabonada.
- Instalación de módulos nuevos.
- Mantenimiento de estructura de módulos de cerramiento de cuarto eléctrico.


4.15.13. PARQUE EL RECREO

CODIGO: 07-260 UPZ: TINTAL SUR

Localización General del Parque

El Parque El Recreo se localiza en la Carrera 100 con Calle 20, ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número siete del Distrito Capital Localidad de Bosa.

Ilustración 22 UBICACION PARQUE EL RECREO

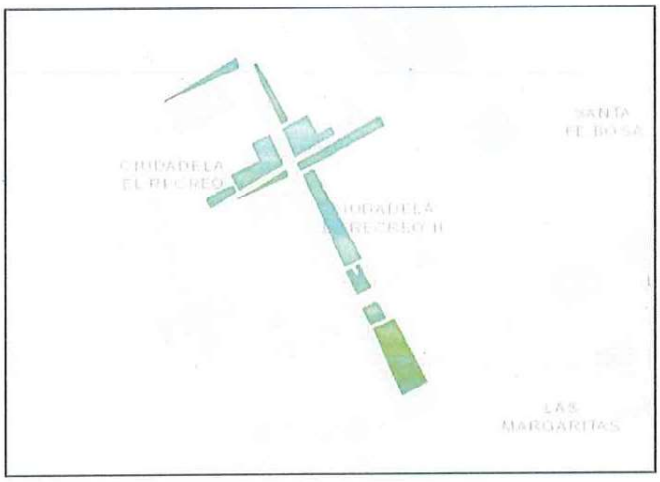

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Cerramiento provisional en postes de madera y lona
- Desmonte y reinstalación de bordillo de concreto zona sendero cancha sintética
- Nivelación y compactación de material granular en zona sendero cancha sintética
- Desmonte y reinstalación de loseta de concreto zona sendero cancha sintética
- Desmonte y reinstalación de adoquín de arcilla zona sendero cancha sintética
- Desmonte y acopio de adoquín de arcilla zona sendero cancha sintética
- Suministro e instalación de adoquín de arcilla zona sendero cancha sintética
- Cintas de ajuste en concreto zona sendero cancha sintética

4.15.14. PARQUE CIUDAD MONTES

CODIGO: 16-112 UPZ: CIUDAD MONTES

Localización General del Parque

El Parque Ciudad Montes se localiza en la Carrera 39 No. 10 - 75 SUR, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona dieciséis del Distrito Capital Localidad de Puente Aranda.

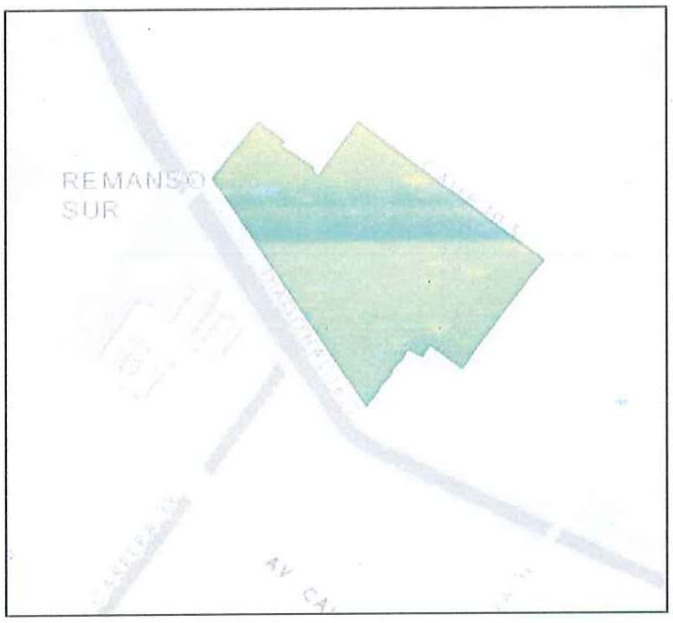


Ilustración 23 UBICACON PARQUE CIUDAD MONTES

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Retiro de arena existente para instalación de arena nueva tipo Peldar en zona de juegos infantiles.
- Suministro e instalación de arena tipo Peldar en zona de juego infantiles.
- Suministro e instalación de filtro perímetro zona de juegos infantiles.

4.15.15. PARQUE LA ANDREA

CODIGO: 16-112 UPZ: GRAN YOMASA

Localización General del Parque

El Parque La Andrea se localiza en la Calle 81 BIS SUR No. 8A - 24, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona cinco del Distrito Capital Localidad de Usme.

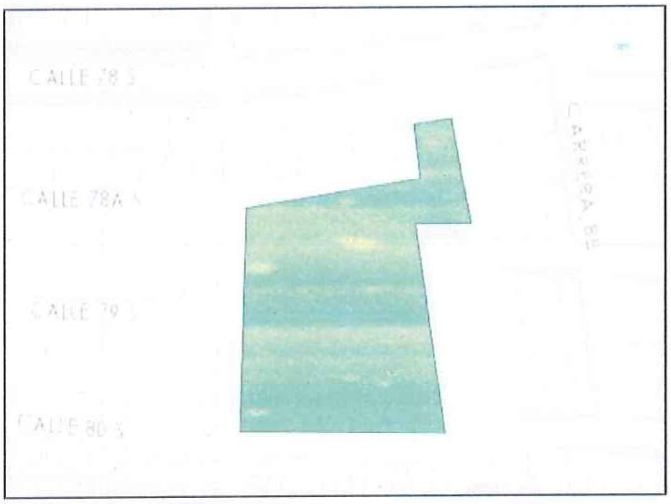


Ilustración 24 UBICACION PARQUE LA ANDREA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza la limpieza de viga canal galvanizado y bajantes del coliseo

4.15.16. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)

CODIGO: 10-290 UPZ: JARDÍN BOTÁNICO

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolívar (Sector Unidad Deportiva El Salitre) se localiza en la Avenida Calle 63 No. 68 45, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona décima del Distrito Capital Localidad de Engativá.

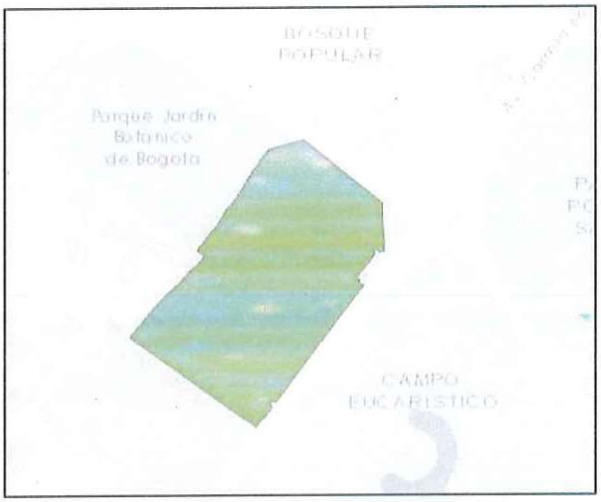


Ilustración 25 UBICACION PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)

- Arreglo de fuga. Cambio de rejilla de orinal baño hombres velódromo primer piso costado sur
- Arreglo de humedad de cuarto eléctrico (Retiro de pañete, arreglo de fuga, pañete, pintura) velódromo primer piso costado sur
- Instalación de tapón de lavamanos baño mujeres velódromo 1° piso costado sur
- Cambio de registro de 2" Baño hombre velódromo 2° piso costado sur
- Cambio de push Baño hombres 2° piso velódromo costado norte
- Limpieza de filtro de llaves lavamanos baño hombres 2° piso costado sur
- Cambio de cartucho de push de lavamanos baño mujeres 2° piso costado sur
- Destape de poceta 1° piso velódromo costado sur

4.15.17. PARQUE SAN ANDRÉS

CODIGO: 10-234 UPZ: BOLIVIA

Localización General del Parque

El Parque Tabora se localiza en la Calle 82 No. 100A - 91 Ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona décima del Distrito Capital Localidad de Engativá.

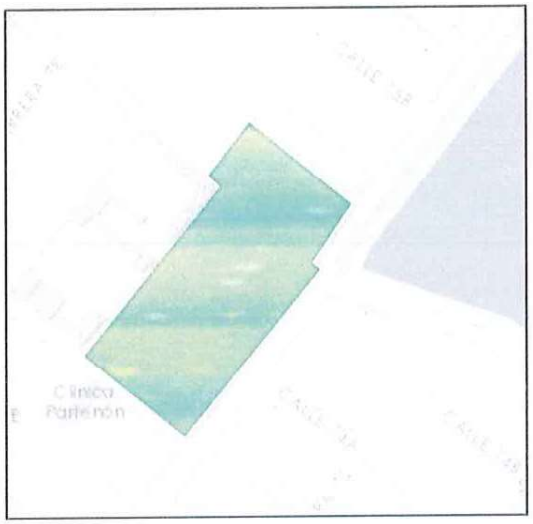


Ilustración 26 UBICACIÓN PARQUE SAN ANDRÉS

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Emboquillado y llenó de cintas dilatadores en pista de patinaje

5 PROGRAMACION DE OBRA

El día 12 de febrero de 2025 se realiza solicitud de programación por la interventoría mediane oficio IDRD-4080-G2-2024-228.

El día 27 de febrero de 2025 se realiza mesa de trabajo con el profesional Carlos Figueroa para revisión a la V2 de programación.

El día 17 de marzo de 2025 se realizan observaciones a la programación enviada por parte de la interventoría mediante oficio IDRD-4080-G2-2024-305.

El día 18 de marzo de 2025 la interventoría remite comunicado IDRD-4080-G2-2024-309 en el cual se dan observaciones a la programación enviada.

El día 09 de abril de 2025 por medio del comunicado BEL-MPI-ADM-177-25 el contratista radicó la programación V3.

El día 11 de abril de 2025 por medio del comunicado IDRD-4080-G2-2024-368 la interventoría realizó observaciones a la programación V3.

El día 14 de abril de 2025 se realiza mesa de trabajo y se realiza consulta y se concilia la inclusión de recursos de mano de obra según rendimientos APU´s en los parques pendientes por ejecutar.

El contratista se encuentra en la inclusión de los recursos dentro de la programación atendiendo las recomendaciones de la interventoría.

El contratista mediante comunicado BEL-MPI-ADM-236-25 del 04 de mayo de 2025 remitió a la interventoría el cronograma de obra V4 en respuesta al comunicado IDRD-4080-G2-2024-368.

El contratista mediante comunicado BEL-MPI-ADM-287-25 del 10 de junio de 2025 envió a la interventoría el cronograma de obra V5, respuesta a comunicado IDRD-4080-G2-2024-418.

6 PROBLEMAS PARA EJECUCION Y AVANCE

Durante el periodo del presente informe se han presentado lluvias, lo cual ha generado demoras en la ejecución de las actividades de los parques ejecutados en el periodo tanto en emergencias como en frentes de obra.

Las actividades con más afectación teniendo en cuenta lo anterior fueron:

- Arreglos, cambio e impermeabilización de cubiertas, muros exteriores
- Excavaciones
- Pinturas de estructuras exteriores
- Instalación de material granular
- Instalación de concreto.

Otro factor que ha dificultado el avance de la obra ha sido los tiempos de importación de los juegos infantiles y la fabricación de módulos.

7 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

7.1 ESTADO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	12.900.349.807,00
VALOR ACTA DE COBRO No.1	$	730.412.887,00

VALOR ACTA DE COBRO No.2	$	751.848.202,00
VALOR ACTA DE COBRO No.3	$	1.136.059.219,00
VALOR ACTA DE COBRO No.4	$	1.173.220.846,00
VALOR ACTA DE COBRO No.5	$	2.545.178.952,00
VALOR ACTA DE COBRO No.6	$	1.469.736.066,00
VALOR TOTAL PAGADO	$	7.806.456.172,00
VALOR POR EJECUTAR	$	5.093.893.635,00

Tabla 15. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor ejecutado: A continuación, se presenta resumen financiero de las actas de obras ejecutadas en este contrato a la fecha de corte del presente informe:

VALOR TOTAL	**$**	**7.806.456.172,00**

A.I.U.	**36,49%**	**TOTAL A.I.U.**	**$**	**1.469.736.066,00**
Anticipo	**40%**	**VALOR AMORTIZACION**	**$**	**366.591.205,00**
VALOR TOTAL			**$**	**1.103.144.861,00**

VALOR A PAGAR (Menos Amortización del Anticipo)	**$**	**1.103.144.861,00**

PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.1	**5,66 %**
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.2	**5,83 %**
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.3	**8,81 %**
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.4	**9,09 %**
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.5	**19,73 %**
PORCENTAJE DE EJECUCION EN ACTA No.6	**11,39 %**

7.2 ESTADO DEL ANTICIPO

El anticipo es para ser invertido exclusivamente en la compra o el arriendo de equipos, compra de materiales, transporte de equipos o de materiales y pago de mano de obra no calificada del proyecto; con el fin de garantizar la adquisición de manera oportuna de

insumos, materiales o equipos o elementos que requieran ser instalados o incorporados en el proyecto para su feliz término; por lo cual se cuenta con un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del total del contrato, el cual se amortizará con las actas parciales mensuales.

A la fecha del presente informe se presentaron 26 órdenes de anticipo en el cual se vieron representadas en Mano de Obra No calificada con el 10,34%, Compra de Materiales e insumos con el 84,66% e impuestos retenidos del 5%, conforme al plan de inversión del anticipo aprobado.

Actualmente, se encuentran en trámite de legalización de las facturas correspondientes a las órdenes de desembolso.

A continuación, se presenta el estado financiero del anticipo.

VALOR DEL CONTRATO	$	12.900.349.807,00
VALOR ANTICIPO 40%	$	3.753.289.748,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 1	$	188.665.649,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 2	$	122.821.127,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 3	$	223.438.152,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 4	$	352.000.000,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 5	$	1.400.000.000,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No. 6	$	366.591.205,00
VALOR PARA AMORTIZAR	$	1.103.144.861,00

Tabla 16. ESTADO FINANCIERO DEL ANTICIPO

8 AVANCE DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA

Durante este periodo de ejecución de los parques priorizados por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques:

- 01-1000 Parque El Country
- 01-079 Parque Urbanización el Toberín
- 01-131 Parque Urbanización el Cedrito
- 01-540 Parque Urbanización Calle 170
- 03-035 Parque Nacional (PM-2A) Enrique Olaya Herrera (Sector Histórico).
- 03-039 Parque independencia Centenario
- 04-103 Parque Gaitán Cortes
- 04-127 Parque San Cristóbal
- 05-003 Parque Valles de Cafam

- 05-004 Parque La Andrea
- 05-476 Parque Nuevo Milenio
- 06-063 Parque Tunal
- 07-035 Parque Naranjos
- 07-165 Parque Palestina
- 07-291 Parque El Porvenir
- 08-034 Parque Patio Bonito
- 08-219 Parque Timiza
- 08-241 Parque Cayetano Cañizales
- 08-552 Parque Las Margaritas Gilma Jiménez
- 09-092 Parque Modelia Sector A
- 10-223 Parque La serena
- 11-058 Parque Burgos Britalia
- 12-041 Parque simón Bolívar – (Sector Ciudad de los niños)
- 12-091 Parque simón Bolívar (sector parque deportivo el salitre)
- 12-125 Parque Simón Bolívar – (Sector Palacio de los deportes)
- 13-015 Parque Santa Clara
- 13-089 Parque Simón Bolívar – (Sector Central)
- 14-029 Parque Santa Isabel IV sector
- 14-030 Parque Eduardo Santos
- 15-040 Parque La Fragua
- 16-112 Parque Ciudad Montes
- 16-221 Parque Agua Viva
- 18-090 Parque Pijaos Jorge E. Cabalier
- 18-207 Parque Olaya Herrera
- 19-231 Parque La estancia

9 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Durante la ejecución de actividades en el periodo del presente informe como se mencionó anteriormente se presentaron demoras en la ejecución de las actividades por lluvias, por ende, se recomienda iniciar más frentes de trabajo con el fin de continuar con el avance de ejecución al contrato.

Algunas actividades criticas corresponden a la fabricación de módulos y la importación de los juegos infantiles, sin embargo, el contratista ha venido avanzando en otras actividades con mayor incidencia.

Se ha presentado avances significativos en parque como el Country, Palestina, Porvenir y Simón Bolívar Central.

Se continuará con el debido control de materiales y calidad de los mismos, con el fin de garantizar la ejecución adecuada del contrato.

El contratista acepta la adición solicitada, por valor de $ 2.924.350.500 pesos m/cte de acuerdo con lo manifestado por el IDRD mediante memorando 20256100174371; para la ejecución de las actividades previstas, se requiere una prórroga de cuatro (04) meses, contados a partir del día de la terminación del contrato 4060 de 2024, es decir, desde el 20 de julio hasta el 19 de noviembre de 2025,

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 4
ACTAS DE COMITÉ

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 24	DD	MM	AA
ACTA No.	COP 4060/24 Cto Int 4060/24	5	06	2025

LUGAR: Oficina interventoría HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 12:00m

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión compromisos pactados.	4. Componente Calidad
2. Seguimiento avance Financero	5. Componente SST
3. Componente Eléctrico	6. Componente Social / Ambiental.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión compromisos pactados:

1.1. CEFE San Cristóbal - PPTO Ascensores:

- El contratista allega en comité los informes de las visitas realizados por el ente certificador
- El ascensor 2 de CEFE San Cristóbal, requiere cambio de una bateria para poder obtener la certificación.
- Para los ascensores que no requieren correctivos se puede iniciar el trámite de la certificación.
- Se anexan al acta los informes correspondientes a los CEFE San Cristóbal, CEFE Fontanar, CEFE Cometas. Pendiente visita en Tunal.

1.2. Pyaos - Terminación:

No se cumplió el compromiso, a la fecha el frente de obra se encuentra en ejecución, pendiente pintura cerramiento de ingreso.

1.3. Pyaos - Acta de puesta en servicio:

Se programa para el próximo sábado.

- Se solicita la remisión de las actas de inicio por parque y terminación por parque, para el cargue en Secop 2.

TEMAS TRATADOS

1.4. Country - Terminación juegos:

- La arena se encuentra en instalación, se Finaliza instalación esta semana.
- El contratista manyiesta que está tomando medidas de contingencia para finalizar las obras
- Se solicita el cambio de la cubierta y acciones de orden y aseo en el frente de obra.
- Se prevé finalizar la próxima semana, previo al inicio de la feria Vassar.
- Se solicita confirmar el inicio de actividades eléctricas en el Parque Country.

1.5. Recreo - PPTO mantenimiento grecos:

- No se cumplió el compromiso, no se ha entregado el presupuesto, se remitirá el próximo lunes.
- Se solicita organizar los materiales en el frente de obra.

1.6. Quiroga - Inicio:

- Se inició la obra el día de ayer, se están realizando actividades de demolición.
- Se solicita verificar los niveles con topografía.
- Se solicita remitir el arte del sintético de la cancha.

1.7. Florida - Inicio:

No se cumplió el compromiso, no se ha dado inicio a la intervención.

1.8. Cometas - Inicio recepción:

El contratista informa que realizó replanteo para iniciar las actividades correspondientes el próximo martes.

1.9. Presupuesto emergencias Faltantes:

- No se cumplió el compromiso, se solicita remitir el balance actualizado con estas actividades.
- Se programa mesa de trabajo el martes a las 9:00 am.

1.10. Tibanica - Esperanza / Remates - Entrega:

Los remates quedaron mal realizados, se deben subsanar las observaciones a la pintura y la pieza en mal estado.

1.11. Cayetano Cañizares - Tanque / Puesta en Servicio:

- Pendiente mientras el contrato de equipos calibra la presión.
- El componente eléctrico se encuentra pendiente.

TEMAS TRATADOS

1.12. Acta NP 2:
El contratista remitió la subsanación el día de ayer para revisión

1.13. Acta NP 3 - Cotizaciones:
No ha sido entregada, se solicita de manera urgente la entrega de los documentos y se recuerda que el trámite administrativo tarda por lo menos un mes.

1.14. San Andrés - Poste abejas:
No se ha cumplido el compromiso, no se ha realizado la actividad.

1.15. San Andrés - Inicio:
Pendiente zona de arena y pista (resanes).

1.16. Berlin - Placa:
No se cumplió el compromiso, el contratista no ha fundido la placa.

1.17. Cafam Gavilanes - Placa / Cerramiento:
No se cumplió el compromiso, no se ha realizado la actividad.

1.18. Cafam Gavilanes - Eléctrico:
No se cumplió el compromiso, es necesario realizar el arreglo del cerramiento del cuarto eléctrico para iniciar la intervención.

1.19. Nacional - Puesta en Servicio:
No se cumplió el compromiso, no se ha subsanado el remate de la baranda por lo cual no se ha realizado el acta.

1.20. Nacional - Demarcación pista:
Pendiente definición de trazado.

1.21. Informe mensual ambiental # 6:
Se subsanaron las observaciones y se encuentra aprobado.

1.22. Informe mensual técnico # 6:
Se solicita radicar en físico el documento

1.23. Informes mensuales # 7:
- Ambiental: No entregado
- Social: Aprobado
- SST: En subsanación del contratista
- Calidad: No entregado
- Técnico: En subsanación del contratista.
- Calidad # 6: No se ha remitido subsanación por parte del contratista.

TEMAS TRATADOS

1.24. Social - Actas de vecindad Country:
Se cumplió el compromiso, se radicaron las actas en la entidad.

1.25. Social - Programación talleres prevención:
No se cumplió el compromiso, no se ha entregado la programación.

1.26. Legalización del antiupo:
El contratista manifiesta que allegará la primera parte el día de hoy y la próxima semana el restante.

1.27. Mesa de trabajo PPTO:
Se programa para el próximo martes.

1.28. Subsanación cronograma:
El contratista manifiesta que se encuentra subsanando lo correspondiente y remitirá el cronograma la próxima semana.

1.29. Olaya - Inicio:
- Se inició cerramiento perimetral
- Se solicita actualizar cantidades, implantar el módulo y remitir el presupuesto alcanzado.

1.30. Simón Bolivar - Propuesta juegos (piso):
Se encuentra aprobado el arte del piso de caucho.

1.31. Tobería - Instalación modulos:
Se finalizó el mantenimiento, empezaron a llegar algunos módulos para instalación, lo cual se coordinó con la administración.

* Se recuerda que el IDRD solicita que los juegos desmontados no van para disposición final sino van para bodega en Techo.
Se requiere allegar el acta de entrega en la bodega correspondiente.

* De Simón Bolivar, se solicita iniciar con el invernadero.
* Se solicita realizar las correcciones de pintura en el mantenimiento de los juegos.
* Se solicita presupuestar el servicio de Vactor para el pozo de los baños del Hanaí, en el Parque Simón Bolivar, se solicita realizar la actividad la próxima semana.

1.32. Valles de Cafam - Terminación:
Se finalizaron las actividades, se encuentra pendiente empradi-

zación y mallas bajo el acrílico.

1.33. La Andrea - Terminación:

- Se terminaron las intervenciones, pendiente acta de puesta en servicio

1.34. Palestina - Terminación:

- Se encuentra en ejecución, se va a inicia el piso de caucho negro
- Pendiente barandas
- Se estima terminación en 15 o 20 días.

1.35. Recreo - Terminación:

- Se encuentra en ejecución los senderos.

1.36. Porvenir - Terminación:

- Pendiente mantenimiento cerramiento de concha y la zona de la pista, el frente está sin personal en el momento.

1.37. Timiza - Terminación:

- Se encuentra en ejecución la baranda (Puerta cerramiento) Se define color gris.
- Se solicita informe de las afectaciones de los senderos junto al lago, con el presupuesto correspondiente.

1.38. Cayetano Cañizares:

Pendiente componente eléctrico.

1.39. Gilma Jimenez - Pista:

No se ha iniciado, el contratista manifiesta que realizara visita con el personal delegado la próxima semana.

* Se solicita georeferenciación solicitada desde el componente ambiental para Timiza.
* Se solicita informe final parque Nacional para cierre de concepto técnico de Patrimonio.

2. Seguimiento Avance Financiero:

% Programado: 80,08 %.
% Ejecutado: 55,65 %.
% Atraso: -24,44 %.

TEMAS TRATADOS

3. Componente eléctrico:
- En Complejo Acuático se solicita revisar si es necesario cortar el poste.
- En Valles de Cafam hay una garantía del piso de senderos (Palestina).
- Molinos - Pendiente instalación de rejilla.
- Cedritos - El mantenimiento eléctrico vale 12' aprox, Se autoriza por IDRD.
- Se adara que fue en Palestina dónde se rompieron los adoquines de senderos.
- Pendiente presupuestos acometidas UDS, no obstante, ya no aplica pues ya no hay recursos.
- Iluminación Squash - Ya no aplica, pues no hay recurso.
- Fontanar del Río: Pendiente cambio de dos contactores.
- Se solicita presupuesto de emergencias.
- Pendiente certificados de calidad de los postes.
- PRD pendiente instalación de bombillos para finalizar la intervención
- Se solicita revisar la iluminación (bombillos dañados) en Villa Mayor.

1. Componente calidad:
- Se envió solicitud de entrega de certificados y ensayos de materiales pendientes lo cuál no ha sido atendido, solicitamos entrega y trazabilidad de cumplimiento del plan de inspección y ensayo.
2. El plan de adquisiciones presentado no cuenta con soportes se requiere realizar seguimiento y presentar información completa.
- No se presenta listado semanal de materiales y lo reportado no cuenta con la totalidad de los materiales ingresados a obra caso: geotextil, arena sílice, adoquines, grava filtro, entre otros. Se requiere actualizar y presentar.
- No se han recibido resultados de laboratorio de arena sílice.
- No se han subsonado las observaciones al informe mensual # 6
- No se ha entregado el informe mensual # 7.

5. Componente SST:
- Se solicita realizar mantenimiento de cerramientos de obra, señalización y protección de acopios, es especial en el Parque Recreo y Porvenir.
- Se recuerda que todo el personal operativo debe contar con la dotación institucional sin excepción.

TEMAS TRATADOS

- Se recibió documentación de ingreso de personal, proveedores Carlos Ardila y Luis Camargo
- Se remitieron observaciones al informe mensual # 7. Pendiente subsanación.

Personal:

Palestina: 5 trabajadores
Country: 12 trabajadores
Palacio de los Deportes: 2 trabajadores
Simón Bolivar: 4 trabajadores
Olaya: 4 trabajadores
Total: 28 trabajadores. + 3 en Tobería = 31 trabajadores.

6. Componente Social:

- Se aprobó informe mensual
- Se remitieron actas de vecindad en Country
- Se programó atención a una usuaria el día de hoy en Parque Country

7. Componente Ambiental:

- Aprobado informe 6
- No recibido el informe # 7 del contratista
- Se requiere al contratista para adecuación de acopios inadecuados y trámite de los RCD en los frentes de obra.

COMPROMISOS			
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN	
CETE Tunal - Visita ascensores	Contratista	6-6-25	
Pijaos - Acta de puesta en Servicio	Contratista	7-6-25	
Country - Terminación juegos	Contratista	9-6-25.	
Country - Terminación	Contratista.	14-6-25	
Recreo - PPTO mantenimiento greens	Contratista	9-6-25	
Quiroga - Terminación	Contratista	19-7-25	
Florida - Inicio (Mobiliano)	Contratista	9-6-25	
Comelas - Inicio recepción	Contratista	11-6-25	
Presupuesto emergencias Faltantes	Contratista	9-6-25	
Mesa de trabajo presupuestos	Contratista	10-6-25	9:00 am.
Tibanica - Esperanza / Remates - entrega	Contratista	11-6-25	
Cayetano Cañizares - Tanque / Servicio	Contratista	Próx Semana	
Acta NP 3 - Cotizaciones	Contratista	6-6-25	
San Andrés - Abejas.	Contratista	Pendiente.	
San Andrés - Inicio	Contratista.	9-6-25.	
San Andrés - PPTO actualizado	Contratista	9-6-25.	
Berlín - Placa	Contratista	7-6-25	
Cafam Gavilanes - Placa	Contratista	7-6-25	
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN			
¿Se logró el objetivo?	SI [X]	NO [ ]	
Observaciones			
Cafam Gavilanes - Eléctrico	Contratista	13-6-25.	
Nacional - Puesta en Servicio	Contratista	30-6-25	
Informe mensual # 6 - Calidad (Sub).	Contratista	9-6-25	
Informe mensual # 7 - Calidad	Contratista.	10-6-25	

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algecinas	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algecinas.	
CARGO		CARGO	Inspectora Interv.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algecinas.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Informe mensual # 7 - Ambiental	Contratista	9-6-25
Informe mensual # 7 - SST (Sub)	Contratista	9-6-25.
Informe mensual # 7 - Técnico (Sub)	Contratista	10-6-25.
Social - Programación talleres violencia	Contratista.	9-6-25
Legalización del anticipo Parte 1	Contratista	5-6-25
Legalización del anticipo Parte 2	Contratista.	12-6-25
Subsanación cronograma	Contratista	9-6-25.
Olaya - ~~Visita~~ + Propuesta + PPTO.	Contratista	10-6-25
Simón Bolivar - Inicio Invernadero	Contratista	9-6-25
Simón Bolivar - Vactor	Contratista	7-6-25
Toberin - Instalación módulos	Contratista	7-6-25.
Toberin - Terminación modulos	Contratista	13-6-25.
Valles de Cafam - Terminación	Contratista	9-6-25
Andrea - Acta de puesta en Servicio	Contratista	9-6-25.
Palestina - Terminación	Contratista	18-6-25
Recreo - Terminación	Contratista	30-6-25.
Porvenir - Terminación	Contratista	30-6-25.
Timiza - Terminación	Contratista	30-6-25

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
Timiza - PPTO visita	Contratista	9-6-25.		
Gilma Jimenez -	Contratista	Pendiente		
Nacional - Informe Patrimonio	Contratista	11-06-25		
Ciudad Montes - Avance	Contratista	30-6-25.		
UDS - Baño Atletismo	Contratista	7-6-25.		

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento No. 29 COP 4060124 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoria

FECHA 05 06 25 HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 12:00 m LUGAR Interventoria - Soliun SAS.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	LUIS ALBERTO MEDRANO B	1921655	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 2025	proy1sts2@soliunsas.com	3202213228
2	Jeison Orlando Delgado	1018459148	Sst - Tec Interventoria	Interventoria		CST028	—	—
3	Jobh L. Cuellar G	79852621	Residente	Contratista		Consorcio Belcon	—	3203090267
4	Yenny Bibiana Reyes C	23782608	Ing. Elect.	Interventoria		CST028	—	3145722242
5	Ronald Lozano	5472831	Residente	Interventoria		CST028	—	3214200035
6	Oscar Omar Quintero Lozano	1024543412	Ing Presupuestos	Contratista		Consorcio Belcon	—	3115478834
7	GUSTAVO MANGOS S.	79.869.726	RESIDENTE	CONTRATISTA		CONSORCIO BELCON	—	—
8	JORGE MADEROS.	79424228	CONTRAT.	STP		IDRD		
9	ENRIQUE. GUZMAN	9533226	Dir. Obra	Contratista		CONSORCIO BELCON	—	3203450329
10	Claudia Pedraza	52879800	Residente	Contratista.		Consorcio Belcon	—	3015599368
11	ANTONIO ROJAS. L.	10100203390	CONTRATISTA	STP		IDRD	—	—
12	IVAN VELASQUEZ	80179639	APOYO SUPERVISOR	ESCENARIOS		IDRO		
13	Andres Felipe Jimenez	1014239649	Ing. Elect.	Contratista		Belcon	—	3012719891
14	Karen Adriana Algeciras Castro	1014266409	Inspectora	Interventoria	Karen A	CST 028	proyectos2@soliunsas.com	7653016
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL-V5

264

ONAC ACREDITADO ISO/IEC17020 : 2012 17-OIN-006	CERTINEXT	INFORME DE INSPECCIÓN ASCENSORES ELECTROMECANICOS E HIDRAHULICOS NTC 5926-1 VERSION 2012	Código	F-IN-01-04
			Versión	11
			Fecha	10/05/2023

NÚMERO DE OFERTA	27999	NÚMERO DE CIO	133336562

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente o Razón Social	CENTRO DE FELICIDAD SAN CRISTOBAL-2025		
Dirección	CL 17A SUR 2A - 60 ESTE CEFE SAN CRISTOBAL / BOGOTA	Nit. o Documento de Identidad	
Identificación del Equipo (Serial)	0906	Torre/Número de Ascensor/Bloque	ASCENSOR 1
Nombre Contacto	ROSSY CATALINA RUBIO		

DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO

Nombre de la Empresa	SCHINDLER	Fecha del Último Mantenimiento	
Nombre del Técnico	CRISTIAN BENÍTEZ		

DATOS DE INSTALACIÓN

Fecha de Puesta en Marcha	No Especificado	Fecha de Última Inspección	21/05/2025

DATOS DE INSPECCIÓN

Visita	59261 Primera Visita de Inspección
Nombre del Inspector	JULIAN VALERO
Fecha de Inspección	21/05/2025 Fecha de Emisión: 26/05/2025

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tipo de Acondicimiento	Capacidad Kg	Capacidad Personas	Número de Paradas
Eléctrico	675	9	3

RESUMEN DE HALLAZGOS

Cumple sin hallazgos	Cumple, sin defectos

TIPO DE HALLAZGO	CANT.	ACCIONES A TOMAR	FECHA LIMITE
Cantidad de items NO cumplidos LEVES	0	Son aquellos que no suponen peligro para la seguridad de las personas. El equipo queda en servicio se debe corregir los defectos lo antes posible antes de 180 dias	180 dias desde la fecha de la inspección
Cantidad de items NO cumplidos GRAVES	0	Son aquello defectos que no suponen un peligro inmediato para la seguridad de las personas. El equipo queda en servicio condicionado debiendose corregir los defectos dentro del plazo de 30 dias	30 dias desde la fecha de la inspección
Cantidad de items NO cumplidos MUY GRAVES	0	Es todo defecto que contituye un riesgo inminente para las personas o pueden ocasionar daños en la instalación. El ascensor se debe dejar fuera de funcionamiento hasta que se corrijan los defectos y se realice una nueva visita para verificar la correcta subsanación de los defector	0 dias desde la fecha de la inspección
TOTAL	0		

HALLAZGOS IDENTIFICADOS

DEFECTO	ESTADO	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
44. (MG) El freno detiene la cabina	Cumple		

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Comité de seguimiento No. 25 COP 1060/24 Cto Int 1080/24	12	06	2025

LUGAR: Oficina Interventoría HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 12:00 m

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión compromisos pactados	4. Acta Parcial
2. Componente Técnico	5. SST
3. Componente Eléctrico.	6. Avance Financiero

TEMAS TRATADOS

1. Revisión compromisos pactados:

1.1. Ascensores -Visita CEFE Tunal:

- Se cumplió el compromiso, se realizó la visita, todos los ascensores se pueden certificar
- Pendiente la de San Cristóbal que requiere mantenimiento correctivo.
- Se solicita radicar el acta de NP aprobada con los anexos finales.

12. Pijaos - Acta de Puesta en Servicio:

No se cumplió, pendiente instalación malla Nylon, subsanar soldaduras.

13. Country - Terminación juegos:

- No se ha finalizado, pendiente zona de lavapies y se está realizando la fabricación en taller de los módulos de cerramiento M-83.

Para el evento Vassar programado, se recomienda no retirar el cerramiento provisional dónde se está realizando la intervención,

- La zona de servicios también se debe finalizar antes de Vassar.
- Se está realizando la cimentación de la Pergola, la estructura se encuentra en fabricación.

-De las materas que se deben desplazar, si se presenta ruptura de las materas se debe trasladar la planta al interior del parque.

1.4. Recreo - mantenimiento grecos:

Se remitió el presupuesto y se priorizó la actividad en el balance del contrato.

1.5. Quiroga - Finalización:

- En ejecución, se encuentra a nivel de subbase granular, pendiente para toma de densidades.
- Se solicita por parte de IDRD la remisión del arte del piso sintético de la cancha.

1.6. Florida - Inicio (Mobiliario):

- No se cumplió el compromiso, no se inició la actividad se recomienda al contratista tomar las medidas necesarias para la ejecución de las obras dentro del plazo contractual.

1.7. Cometas - Inicio (recepción):

- No se cumplió el compromiso
- El contratista informa que la puerta de vidrio está en fabricación.

1.8. Mesa de trabajo presupuesto:

- Sólo se realizó la mesa de trabajo para el componente eléctrico, se cerraron todos los presupuestos de los frentes ejecutados.
- Se recuerda que las emergencias no se incluyen en el presupuesto de cada parque, se deben restar de la bolsa de presupuestos de emergencias.
- Se recuerda que las obras no autorizadas por la supervisión del contrato no se deben realizar, obras no incluidas en el balance del contrato no serán objeto de reconocimiento.
- Se autoriza la emergencia de Gaitana, se debe actualizar el balance.

1.9. Tibanica / Esperanza - Remates:

No se cumplió con el compromiso, no se ha realizado la actividad.

1.10. Cayetano Cañizares - Tanque:

Esta semana se calibran los equipos para poder realizar la actividad en el Tanque.

1.11. Acta NP 2

Se solicitó por parte de interventoria mesa de trabajo, no obstante, el

contratista manifestó no contar con el tiempo, Razón por la cual se remitieron observaciones mediante oficio. Se solicita subsanar.

1.12. Acta NP C10:

No se cumplió el compromiso, el contratista no ha remitido la documentación correspondiente.

1.13. San Andrés - Abejas:

- No se cumplió el compromiso, no se ha iniciado la actividad
- No se inició intervención en fisuras de la pista

1.14. San Andrés - PPTO Actualizado:

- Está pendiente el presupuesto aterrizado,

1.15. Berlín - Placa:

- Se cumplió el compromiso, se realizó la placa.

1.16. Cafam Gavilanes - Placa:

- No se cumplió el compromiso

1.17. Cafam Gavilanes - Cerramiento / Eléctrico:

- Se debe realizar el mantenimiento del cerramiento del cuadro eléctrico para poder iniciar el componente eléctrico.

1.18. Nacional - Puesta en Servicio:

- No se cumplió el compromiso, no se ha rematado la baranda

1.19. Informe mensual # 6 - Calidad

- No se cumplió el compromiso.

1.20. Informe mensual # 7 - Calidad:

- No se cumplió el compromiso,

1.21. Informe mensual # 7 - Ambiental:

- Se allegó la primera versión para revisión el 10 de junio

1.22. Informe mensual # 7 - SST:

- Se cumplió el compromiso, el informe se encuentra aprobado.

1.23. Informe mensual # 7 - Técnico:

- No se ha recibido la subsanación, el contratista informa que allegará la subsanación el día de mañana.

1.24. Social - Programación talleres de violencia de género:

- El contratista informa que se programaron talleres para el 13 y 14 de junio en los frentes de obra.

1.25. Legalización órdenes de giro anticipo:

TEMAS TRATADOS

Se recibió la información, se socializan observaciones, las cuales se remitirán por oficio.

1.26. Subsanación cronograma:

- Se allegó el cronograma y se encuentra en revisión

1.27. Olaya - Propuesta + PPTO:

- No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que radicará mañana.

1.28. Simón Bolivar - Inicio Invernadero:

- No se cumplió el compromiso.

1.29. Simón Bolivar - Vector:

- Se autoriza la actividad y se programa para la próxima semana.

1.30. Toberin - Instalación módulos cerramiento:

- Se inicia instalación el próximo martes, los módulos se fabricaron en taller.

1.31. Valles de Cafam - Terminación:

- Se cumplió el compromiso
- Se realizará recorrido de verificación, se solicita instalar cerraduras

1.32. La Andrea:

- Hoy se realiza el acta de puesta en servicio.

1.33. La Palestina - Terminación:

- En ejecución baranda y caucho.
- Se solicita el arte del piso sintético.

1.34. Recreo - terminación:

- Se encuentra en ejecución los senderos, pendiente iniciar grecos.
- Se solicita orden y aseo.

1.35. Porvenir - terminación

- En ejecución.

1.36. Timiza - baranda - Terminación:

- Pendiente terminar la baranda.

1.37. Timiza - PPTO Visita:

- Pendiente de acuerdo con el informe realizado.

1.38. Gilma Jimenez - Partidor BMX:

- No se cumplió el compromiso.

1.39. Parque Nacional - Informe Patrimonio:

TEMAS TRATADOS

- Se allegará el día de hoy por parte del contratista.

1.40. Ciudad Montes - Avance:

- Pendiente arena
- Pendiente terminar filtro.

1.41. UDS - Baño Atletismo:

- No se priorizó, no aplica.

2. Técnico:

- CEFE San Cristóbal: Se solicita nuevamente visita por fuga en Piso 2.
- Se solicita la remisión del acta de inicio y acta de terminación por parque.
- Se solicita radicar informes mensuales. y actas de NP.
- Se solicita el informe de las estructuras afectadas por el sismo del pasado domingo.

3. Componente Eléctrico:

- Se solicita hacer el ajuste de los postes en Complejo Acuático
- Pendiente Fontanar, Chicalá, Terminar UDS y PRD.

4. Se solicita la entrega del acta Parcial el 27 de junio, junto con los informes.

5. SST:

36 personas vinculadas.

6. Avance Financiero:

% Programado: 82,99 % Atraso: - 20,21 %

% Ejecutado: 62,78 %.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Valles de Cafam - Recorrido verificación	Contratista / Interv	17-06-25.
Certificados ascensores	Contratista	Pendiente.
Correctivo certificaciones San Cristobal.	Contratista	Pendiente.
Pijaos - Malla Nylon	Contratista	16-06-25
Pijaos - Acta de Puesta en Servicio	Contratista	17-06-25.
Country - Terminación Juegos	Contratista	14-06-25.
Country - Zona servicios - Terminación	Contratista	19-06-25.
Country - Terminación Pergola	Contratista	19-06-25.
Quiroga - Terminación	Contratista	19-07-25.
Florida - Inicio (Mobiliario)	Contratista	16-06-25.
Tibanica - Esperanza / Remates - Entrega	Contratista	16-06-25.
Cometas - Inicio recepción	Contratista	18-06-25.
Mesa de trabajo presupuestos	Contratista	17-06-25
Radicación ppto	Contratista	16-06-25
Cayetano Cañizares - Tanque / Servicio	Contratista	Próx Semana.
Subsanación Acta NP 2	Contratista	13-06-25.
Acta NP #3 - Cotizaciones.	Contratista	18-06-25.
San Andrés - Inicio < Abejas Pista.	Contratista	16-06-25.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
San Andrés - PPTO actualizado	Contratista		16-06-25.	
Cafam Gavilanes - Placa	Contratista		19-06-25	
Cafam Gavilanes - Cerramiento	Contratista			
Cafam Gavilanes - Eléctrico	Contratista		Próx Semana.	

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Nacional - Puesta en Servicio	Contratista	Próx Comité.
Informe mensual # 6 - Calidad	Contratista	
Informe mensual # 7 - Calidad	Contratista	
Informe mensual # 7 - Técnico (Sub).	Contratista	12-06-25.
Subsanación legalización del antiupo.	Contratista	Próx Comité.
Olaya - Propuesta + PPTO	Contratista	16-06-25.
Simón Bolivar - Inicio Invernadero	Contratista	
Simón Bolivar - Vactor	Contratista.	Próx Semana
Toberin - Terminación modulos	Contratista	17-06-25.
Andrea - Acta de puesta en Servicio	Contratista	12-06-25
Palestina - Terminación	Contratista	27-06-25
Recreo - Terminación	Contratista	30-6-25
Porvenir - Terminación	Contratista	30-6-25
Timiza - Terminación (baranda)	Contratista	30-6-25.
Timiza - PPTO visita	Contratista	12-6-25
Gilma Jimenez - Pista	Contratista.	18-6-25.
Nacional - Informe Patrimonio.	Contratista	12-6-25.
Ciudad Montes - Terminación	Contratista	30-6-25

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
Acta parcial # 6	Contratista	27-6-25.		
Informes mensuales # 8	Contratista	27-6-25.		
Palacio Deportes - Terminación	Contratista	30-6-25.		
Complejo Acuático - Remate cerramiento	Contratista	Pendiente.		

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento # 25 COP 4060/24 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoría

FECHA 12 06 25 HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 12:00 m LUGAR Oficina Interventoría.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	ENRIQUE GOZMAN	9533276	Dir. Obra	Contratista		BELTCON		3203430829
2	WAN VELASQUEZ	80117634	APOYO SUPERVISION IT	ESCENARIOS		IDRD		
3	LUIS ALBERTO MEDRANO	1933628	RESIDENTE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA	proyectos2@solucion521.com	320 22 22 27
4	Claudia Pedraza	52572800	Residente Obra.	Contratista.		Consorcio Beltcon	claudia.baez@gmail.com	3013774238
5	JOHAN L. CUADROS S	79352621	RESIDENTE OBRA	CONTRATISTA		BELTCON		3203869965
6	Oscar Orlando Cardenas Lozano	1.024.543.912	ING RESIDENTE PROFESIONAL	Contratista		BELTCON		311 313 5834
7	Yenny Pedro Reyes C.	23782668	Ing. Electricista	Interventor		CST28	proyectos2@solucion521.com	3144726912
8	Rolando Lozano	5470331	Residente	Interventoria		CST28	proyectos2@solucion521.com	3204200075
9	GUSTAVO VARGAS L.	79863776	RESIDENTE	CONTRATISTA		BELTCON	—	—
10	ANTONIO ROJAS L.	10100203910	CONTRATISTA	S.T.P.		IDRD	—	—
11	Jeison Orlando Delgado	1018459148	S.T. Interventoria	Interventoria		CST 028	—	—
12	Karen Adriana Algecuras Castro	1014266409	Inspectora	Interventoria		CST 028		
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No.	Acta comité de Seguimiento # 26 COP 4060/24 Cto Int 4080/24	24	06	2025

LUGAR: Oficina interventoria - Soliun HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 12:00 m

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión compromisos pactados
2. Componente técnico
3. Componente Eléctrico
4. Avance Financiero
5. Componente Social
6. Componente Calidad

TEMAS TRATADOS

1. Revisión compromisos pactados:

1.2. Recorrido de verificación Valles de Cafam:

Se realizó la visita, se solicita presupuestar y realizar mantenimiento de 10 mallas Fortinet en mal estado para finalizar la intervención en este frente de obra.

1.3. Certificaciones ascensores:

-El contratista allega certificaciones de ascensores de los CEFES, queda pendiente la certificación del ascensor 2 del CEFE San Cristóbal, el cual requiere el mantenimiento correctivo de la bateria, mantenimiento que se realizaria la próxima semana.

1.4. Mantenimiento ascensor CEFE San Cristóbal:

Se programa para la próxima semana.

1.5. Pijaos - Terminación Malla Nylon:

Se finalizó la instalación ayer.

1.6. Pijaos - Acta de puesta en servicio:

- Se programa realizar el acta mañana 25 de junio de 2025
- Se solicita aterrizar el presupuesto para realizar el acta de terminación.

TEMAS TRATADOS
1.7. Country - Terminación zona juegos infantiles:
Está pendiente la instalación de una señal, mañana se programa realización de puesta en servicio de ésta zona.
1.8. Country - Terminación zona de servicios:
. Para el guardaescobas se debe revisar si está incluido en el balance.
* Teniendo en cuenta que se reportó nuevamente emergencia en CEFE San Cristóbal, se solicita realizar visita con los especialistas hidraúlicos para realizar un informe de la situación actual, la idea es identificar las causas de los daños.
. Se solicita intervenir antes del viernes la zona de servicios de Country
1.9. Country - Pérgola:
- Se cuenta con fabricación en taller de la estructura, se realizará montaje el próximo miercoles 2 de julio, de acuerdo con lo informado por el contratista.
1.10. Quiroga - Terminación:
. Se informa que la semana pasada no hubo avance en este frente de obra, se retiró el personal y la maquinaria.
. Se solicita al contratista tomar las acciones correctivas frente a esta situación.
1.11. Florida - Inicio (mobiliario):
. No se cumplió el compromiso, el contratista no ha iniciado labores en este frente de obra.
. La interventoria solicita realizar visita a taller.
1.12. Tibanica / Esperanza - Remates:
No se cumplió el compromiso, el contratista no ha rematado las obras.
1.13. Cometas - Inicio recepción:
No se cumplió el compromiso, el contratista no ha iniciado.
1.14. Mesa de trabajo Presupuestos:
Se cumplió el compromiso, se realizó la mesa de trabajo correspondiente y se evidenció que quedan 30' disponibles para atención de emergencias, además, se reitera la necesidad de radicar las APU's

TEMAS TRATADOS
NP para el trámite administrativo correspondiente, se resalta que queda menos de 1 mes de contrato y el Consorcio Belzion no ha entregado la documentación.
-Se deben complementar las actas de inicio y terminación por parque.
- En Country se revisará por parte de IDRD las rejillas que se instalaron en las cajas de inspección del parque.
- Se programa visita a Simón Bolivar para verificar el tema del mantenimiento de los juegos existentes.
-Se requiere remitir acta NP 3 CIO y acta NP 4 Cotizaciones.
1.15. Cayetano Canizares -Eléctrico / Tanque:
- Las actividades eléctricas no se han iniciado.
- En cuánto a los tanques, se solicita revisar si el contrato de equipos subsanó lo correspondiente.
1.16. San Andrés - PPTO actualizado:
-Se amplió, se actualizó en incluyo en el balance.
- Se solicita revisar las filtraciones en el coliseo nuevamente.
- Está pendiente el suministro de arena.
- Está pendiente la entrega de los resultados de laboratorio de la arena sílice.
1.17. Cafam Gavilanes - Placa:
No se amplió el compromiso
1.18. Cafam Gavilanes - Cerramento / Eléctrico:
No se amplió con el mantenimiento del cerramiento, por lo cual el componente eléctrico no pudo iniciar
1.19. Parque Nacional - Puesta en servicio baranda:
No se amplió con el compromiso.
1.20. Informes mensuales # 6 (Calidad):
Se informa que el documento se allegó el dia de hoy para revisión.
1.21. Informes mensuales # 7:
- No se ha entregado el componente ambiental (subsanación)
- No se ha entregado la primera versión del componente de calidad
- El componente técnico se encuentra en subsanación del contratista
- Se recuerda que se deben entregar los informes completos para el trámite de la cuenta.

TEMAS TRATADOS
1.22. Subsanación legalización anticipo:
. El contratista allegó subsanación de observaciones el pasado viernes, documentación que se encuentra en revisión.
. Se solicita remitir el comprobante de pago de los rendimientos financieros del mes de mayo
1.23. Olaya - Propuesta + PPTO Actualizado:
. El contratista manifiesta que allega la información el día de hoy
. No se cumplió el compromiso.
1.24. Simón Bolivar - Inicio invernadero:
. No se inició por el evento Rock al Parque, se inicia la próxima semana.
1.25. Simón Bolivar - Vactor:
. Se cumplió el compromiso, se desocupó el tanque.
1.26. Toberin - Finalización módulos:
. Se finalizó el mantenimiento de los módulos
. Pendiente instalación canecas.
. Se programa acta de puesta en servicio de los módulos mañana.
1.27. La Andrea - Acta de Puesta en Servicio:
Se cumplió, se realizó el acta.
1.28. Palestina - Terminación:
. No se cumple con la fecha prevista, se solicita enviar el arte del Sintético de los bios, pendiente Finalización de baranda.
1.29. Recreo - Terminación:
. No se cumple con la fecha prevista
. Se encuentra en ejecución senderos, no iniciado grecos.
1.30. Porvenir - Terminación:
. No se cumple con la fecha de terminación prevista para el sendero
. El Acueducto no ha realizado la conexión del módulo.
1.31. Timiza - Terminación baranda:
No se cumplió el compromiso, el contratista no ha ejecutado la baranda.
1.32. Timiza - PPTO informe Lago:
No se ha entregado el documento
1.33. Gilma Jimenez: - Inicio Pista BMX:
No se cumplió el compromiso, el contratista no ha iniciado.
1.34. Informe Patrimonio - Parque Nacional:

TEMAS TRATADOS
Se cumplió el compromiso, se allegó el informe para trámite en IDRD.
1.35. Acta Parcial 6:
. Se debe entregar completa el 27 de junio para el trámite correspondiente.
· Son necesarios los informes 6, 7 y 8, para el trámite completo en la entidad.
1.36. Palacio de los Deportes – Terminación:
. La semana pasada no se contó con personal ni maquinaria en el frente de obra, por lo cual no se alcanza a finalizar en la fecha prevista.
1.37. Complejo Acuático – Remate baranda:
No se cumplió el compromiso.
1.38. Virrey – Juego vandalizado: Incluir en el presupuesto de emergencia.
Señal Salitre El Greco: Incluir en el presupuesto de emergencias.
Revisar juego vandalizado en Olaya, se encuentra en la administración el juego.
2. Componente Eléctrico:
- Complejo Acuático - El jueves o viernes se realiza lo del poste para bajar las luminarias.
- Palestina: Pendiente estabilidad piso senderos por peso de la maquinaria.
- PRD: Pendiente finalizar instalación de bombillos, la próxima semana.
- Cayetano: Pendiente tema eléctrico interno
- Chicalá: Está priorizado, pendiente ejecución.
- Cafam Gavilanes: Pendiente inicio
- Porvenir - Pendiente NP de iluminación solar.
- Villa Mayor - Pendiente visita.
· Se solicita la remisión de Planos Record y manuales de mantenimiento.
3. Componente técnico:
- Se solicita Plano récord y Manual de mantenimiento:
Pijaos, Nacional, Country, Valles de Cafam y demás frentes de obra representativos.
4. Avance Financiero:

TEMAS TRATADOS

·1. Programado: 88,80%.
·1. Ejecutado: 68,76%.
·1. Atraso: -20,01%.

- Se solicita actualizar el cronograma acorde con las observaciones realizadas a la V5, el cronograma no está aprobado, se requiere subsanación.

5. Componente Social:
- Se realiza el 19 de junio el taller de violencia de genero en el Parque Porvenir
- Se recuerda entrega de informes mensuales 8 el 27-06-25.

6. Componente Calidad:
- Se recibe el 24-06-25 por correo electrónico el informe # 6 V2, para revisión de interventoria.
- No se ha realizado la entrega de la primera versión del informe de calidad # 7, mes de mayo.
- Se recuerda entrega de informe # 8 para el 27-06-25.
- Se requiere nuevamente la entrega de certificados y ensayos de materiales ingresados que soporten la calidad de los materiales recibidos. En cumplimento del Plan de Inspección y Ensayo y el anexo correspondiente en el informe mensual.
- Se reitera solicitud de realización control de cambios Pérgola Country.

7. Componente Ambiental:
- Se solicita subsanar informe # 7
- Se verifica que se continúa con la implementación de medidas como el acopio y protección de RCD, protección de materiales, protección de arbolado y demás medidas formuladas para el contrato.

8. Componente SST:
- Se remite comunicado IDRD-4080-G2-2024-500, solicitando el ajuste de cerramientos de obra, retiro de RCD y jornada de orden y aseo en el Parque Country.

TEMAS TRATADOS
- Se remite comunicado IDRD-9080-G2-2024-521, recomendado al contratista de obra cumplir con los requerimientos normativos de la Resolución 4272 de 2021, sobre trabajo seguro en alturas. - Se reitera al contratista de obra el uso de dotación y EPP para el cumplimiento de trabajadores de la parte operativa.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Certificado ascensores San Cristobal	Contratista	Pendiente.
Pijaos - Puesta en servicio	Contratista	25-06-25
Country - Entrega zona de juegos	Contratista	25-06-25
Country - Terminación zona de servicios	Contratista	27-06-25
Country - Terminación Pérgola	Contratista	3-07-25
San Cristóbal - Compromiso informe hidraulico	Contratista	Pendiente.
Country - Actas de puesta en servicio	Contratista	3-07-25
Quiroga - Terminación	Contratista	19-07-25.
Florida - Inicio (mobiliario)	Contratista	25-06-25
Florida - Asadores - Terminación	Contratista	19-07-25
Tibanica - Esperanza / Remates - Entrega	Contratista	27-06-25
Cometas - Inicio recepción	Contratista	Próx Semana
Cometas - Visita taller	Contratista / Int	Pendiente
NP # 3 - CID	Contratista	26-06-25
Acta NP - Cotizaciones	Contratista	24-06-25
Visita - Simón Bolivar	Contratista	25-06-25 → 1-07-25 11:00 am
Cayetano Cañizares - Tanque / Servicio	Contratista	3-07-25
San Andrés - Abejas	Contratista	26-06-25
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	**SI** [X]	**NO** [ ]
Observaciones		
San Andrés - Arena	Contratista	3-07-25
San Andrés - Pista	Contratista	En ejecución
Cafam Gavilanes - Placa	Contratista	27-06-25
Cafam Gavilanes - Cerramiento	Contratista	27-06-25.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Cafam Gavilanes - Eléctrico	Contratista	2-7-25.
Nacional - Remate baranda y Puesta	en Serv. Contratista	28-06-25.
Informe mensual calidad # 7	Contratista	24-06-25.
Informe mensual ambiental # 7 (Sub)	Contratista	25-06-25.
Informes mensuales # 8	Contratista	27-06-25.
Olaya - Propuesta + PPTO	Contratista	24-06-25.
Simón Bolivar - Inicio Invernadero	Contratista	2-07-25.
Toberin - Terminación (Acta puesta en	Serv) Contratista	25-06-25.
Palestina - Terminación	Contratista	15-07-25.
Palestina - Arte piso sintético	Contratista	24-06-25
Pereo - Terminación	Contratista	19-07-25.
Porvenir - Terminación	Contratista	19-07-25.
Timiza - Terminación	Contratista.	
Timiza - PPTO Visita	Contratista	25-06-25
Gilma Jimenez - Pista (Inicio)	Contratista	Pendiente.
Ciudad Montes - Terminación	Contratista	30-06-25.
Acta parcial #6	Contratista	27-06-25
Palacio de los Deportes - Terminación	Contratista	05-07-25.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones		
Complejo Acuático - Remate Cerramiento	Contratista	24-06-25.
Chicalá - Acometidas	Contratista	1-07-25
Ensayos calidad	Contratista	27-06-25.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuas	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuas	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuas Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento COP 4060/24 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoria

FECHA 24 06 25 HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 12:00 m LUGAR Interventoria.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO
1	Claudia Pachota.	52379800	Residente de Obra.	Contratista.	Claudia	Beltrán	ingclaudiapachota@gmail.com	3015693682
2	Ronald Lozano	5470331	Residente	Interventoria		CST 28	Proyectos2@cstsolucionesas.com	3204200035
3	Oscar Camilo Ortegon Lozano	1022453912	presupuestos	Interventoria		Beltran		3115175834
4	Carlos Andrés Figueroa Ayala	1049629534	Director interventoría	Interventoría		CST 28	proyectos2@cstsolucionesas.com	3143773275
5	[illegible]	9533226	Director Obra	BELTRAN		BELTRAN		
6	IVAN VELASQUEZ	80117634	APOYO SUPERVISION	ESCENARIOS		IDRD	—	—
7	ANTONIO ROJAS.	1010020390	CONTRATISTA	STP	Antonio Rojas	IDRD.	—	—
8	Yenny Paola Reyes C	23782682	Ing. Electrica	Interventor		CST028		
9	JOHN L. CUELLAR S	79352621	Res. Obra	Beltran		Beltran		3203869087
10	Andres Felipe Jimenez U.	1014234649	Ing Electrical	Beltran		Beltran	—	3012411889
11	Jeison O. Delgado	1018459143	Sub-Tecnico Interventor	Interventoria		CST028	—	—
12	LUIS A. MEDRANO	1931.608	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CST 028	proyectos2@cstsoluciones.com	3142233734
13	Karen Adriana Algeuras Castro	1014266409	Inspectora	Interventoria	Karen A	CST 028	—	7653026
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 5
ACTAS PUESTA EN SERVICIO

BOGOTÁ

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

21	ABRIL	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 4060 (Número de Contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, Consultoría, Contratos)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	13-069	TEUSAQUILLO	AV. CRA 68 # 53-36	-	3 MESES	21 ABRIL 2025	19 JULIO 2025.

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el VEINTIUNO (Letras) 21 (Numéricos) días del mes de ABRIL (Letras) de 2025 (Año)

(Firma) _____
Contratista

(Firma) _____
Interventor

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ N.A. - (NO APLICA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

285

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 21 días del mes de MAYO de 2025, se reunieron los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 12-125

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: SIMON BOLIVAR (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)

DIRECCIÓN: AV. CALLE 63 N° 45-10 LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contrato No. IDRD-SG-4060-2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2024 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	JULIO (Mes)	DE	2025 (Año)	
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IPRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) — CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SANTA TERESA 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) — CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA: CONSORCIO BELZCON IPRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. ARREGLO DE FILTRACIONES POR GOTERAS DE LA CUBIERTA DEL PALACIO POR COSTADO OCCIDENTAL CUBIERTA
2. LIMPIEZA DE VIGA CANALES PERIMETRALES E IMPERMEABILIZACION DE LAS MISMAS (PALACIO)
3. MANTENIMIENTO DE CANALES INCLINADAS METALICAS DE LA CUBIERTA EN PALACIO.
4. CAMBIO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS Ø4" DE AQUELLAS QUE ESTABAN DETERIORADAS
5. EN COSTADO ORIENTAL, SE APARALON 3 GOTERAS PUNTUALES Y EN EL CABALLETE TAMBIEN
6. EN AREA ADMINISTRATIVA: ARREGLO PINTURA PARTE SUPERIOR EN FACHADA SUR Y FILTRACION
7. (CORRECCION) EN FACHADA NORTE / PINTURA MANTENIMIENTO DE CANAL ÁREA ADMINISTRATIVA
8. APLICACIÓN PINTURA EN OFICINA ALEDAÑA ADMINISTRACION.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

Powered by CamScanner

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

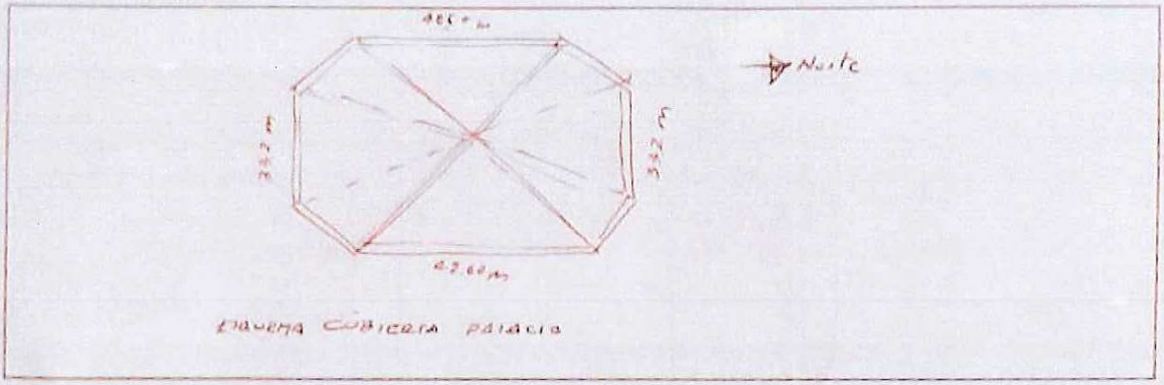

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CID	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: —

Comentarios: N A

ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B N A ENEL N A VANTI N A

UAESP ALUMBRADO N A UAESP PODA CESPED N A

Comentarios:

MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: N A

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

OTROS (indicar cuales)

Comentarios: N. A.

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
CLAUDIA PEDRAZA	CONSORCIO AELZCON IDRD 1	3015379365	
LUIS A. MEDRANO B.	CONSORCIO SANTA TERESA 28	3202213278	
Maricel Salinas Cantillo	IDRD	3125905431	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

VEINTIUN (día en letras) | 21 (día en números) días del mes de MAYO (mes en letras) de 2025 (Año)

Entrega:

LUIS A MEDRANO B.
CONSORCIO SANTA TERESA 28
(Firma)
(Nombre) RESIDENTE INTERVENTORIA
CARGO Claudia Pedraza.
Area Residente contratista.
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre) Maricel Salinas Cantillo
CARGO Administradora Profesional.
Area administracion de escenarios
Entidad IDRD.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 26 días del mes de Junio de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 18-090

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Parque estructurante Pijaos

DIRECCIÓN: Cr 10 # 34 Sur - 35 LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante sistema de precios unitarios y monto agotable el mantenimiento adecuacion, reparacion y recuperacion de parques y campos deportivos administrados por el IDRD

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) DE Julio (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO ____ (Día) DE ____ (Mes) DE ____ (Año)

CONTRATISTA Consorcio Belcon IDRD-1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA ____ (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Se realiza recorrido para hacer entrega de actividades en parque pijaos,
2. se suministra 2 bancos de jugadores, se revisa y entrega placa
3. de concreto zona calentamiento con instalacion de grama
4. sintetica incluido pasillo ingreso administracion y cancha sintetica
5. en zona occidental de zona sur a norte, instalacion de rejillas
6. en sifones en baño hombres y mujeres, tambien en cuarto personal
7. de aseo, e instalacion con suministro de tapa registros interviendos
8. construccion de rarcamo y cajas de inspeccion para limpieza del mismo.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

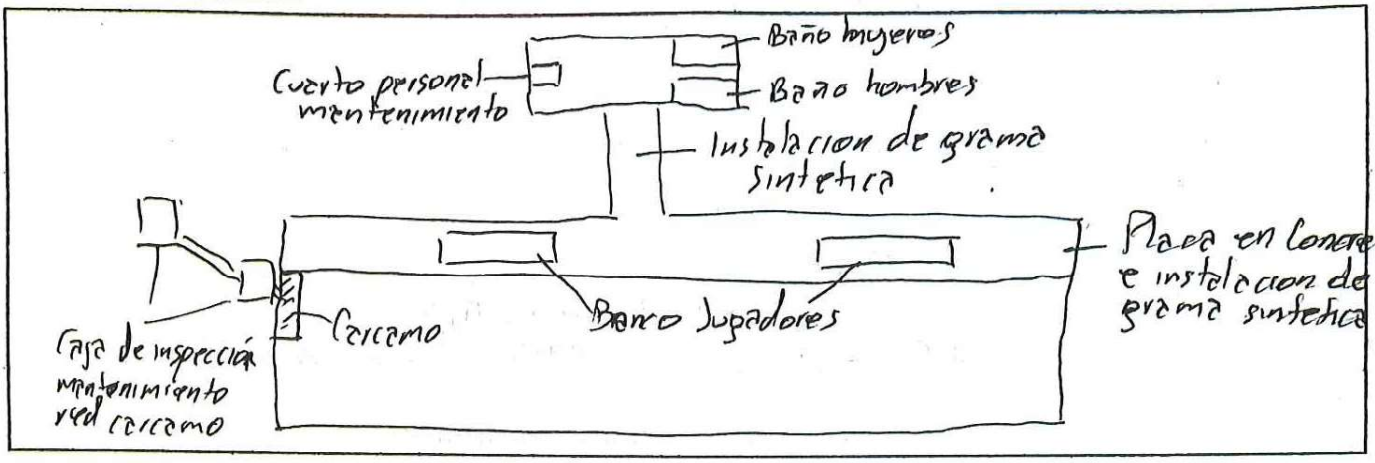

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios:

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPEI

Comentarios:

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios:

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

☐ OTROS (Indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Ronald Lozano	Interventoría.	3204700075	
J. David Patiño	Contratista	3223150440	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: veintiseis (día en letras) 26 (día en números) días del mes de Junio (mes en letras) de 2025 (Año)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 26 días del mes de Junio de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreacion y Deporte IDRD con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 16-112

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Ciudad Montes

DIRECCIÓN: Cll 10 sur # 38A-25 LOCALIDAD: Puente Aranda

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO
Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación, reparacion y recuperación de parques y campo deportivos administrado el IDRD

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 19 (Día) DE Julio (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO: (Día) DE (Mes) DE (Año)

CONTRATISTA: Consorcio Belzcon IDRD-1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: Consorcio Santa Terraza 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Se realiza revisión de las actividades realizadas en la zona de
2. juego infantil en la cual se retira la arena existentes, se
3. realiza exravacion e instalacion de filtro en el perimetro
4. de la zona de juegos y se conecta a la zona de lava pies,
5. y se suministro arena tipo peldar para nivelar a borde de
6. bordillo existente, se retira geotextil existente y se suministra nuevo
7. para garantizar trabajos ejecutados.
8.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

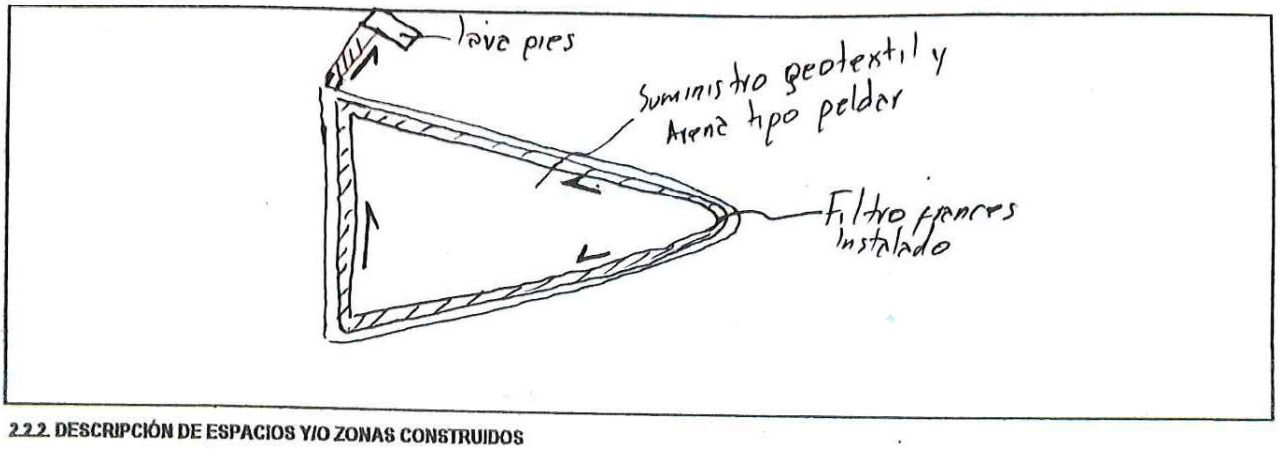

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios:

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPEI

Comentarios:

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios:

BOGOTÁ

Comentarios:	OTROS (Indicar cuales)

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Ronald Lozano	Interventoría	3204200975	
J. David Patiño G	Contratista	3223150440	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: Veintiseis (*día en letras*) 26 (*día en números*) días del mes de Junio (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Área
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Área
Entidad

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 26 días del mes de Junio de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreacion y Deporte IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: OS-004

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: La Andrea

DIRECCIÓN: Calle 80 sur # 1H Bis Este-10 **LOCALIDAD:** Usme

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuacion, reparacion y recuperación de parques y campo deportivos administrados por el IDRD

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) DE Julio (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO ____ (Día) DE ____ (Mes) DE ____ (Año)

CONTRATISTA Consorcio Belzcon IDRD -4 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4060 (Número Contrato) **DE** 2024 (Año)

INTERVENTOR Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4080 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA Consorcio Belzcon IDRD -4 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Se realiza recorrido para hacer entrega de actividades ejecutadas en el escenario, se
2. realizo limpieza de viga canal y bajantes en coliseo, pintura de baranda M-80 pista
3. de patinaje y M-83 zona juego infantil, se realiza mantenimiento de pintura
4. modelo M-5 (columpio), pintura de 4 Bicicleteros zona ingreso parque,
5. mantenimiento pintura baranda frente pista patinaje escalera ingreso
6. bodega, cambio de arbol sanitario cuarto bodega, mantenimiento
7. pintura puerta ingreso parque y limpieza de canal metalica
8.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

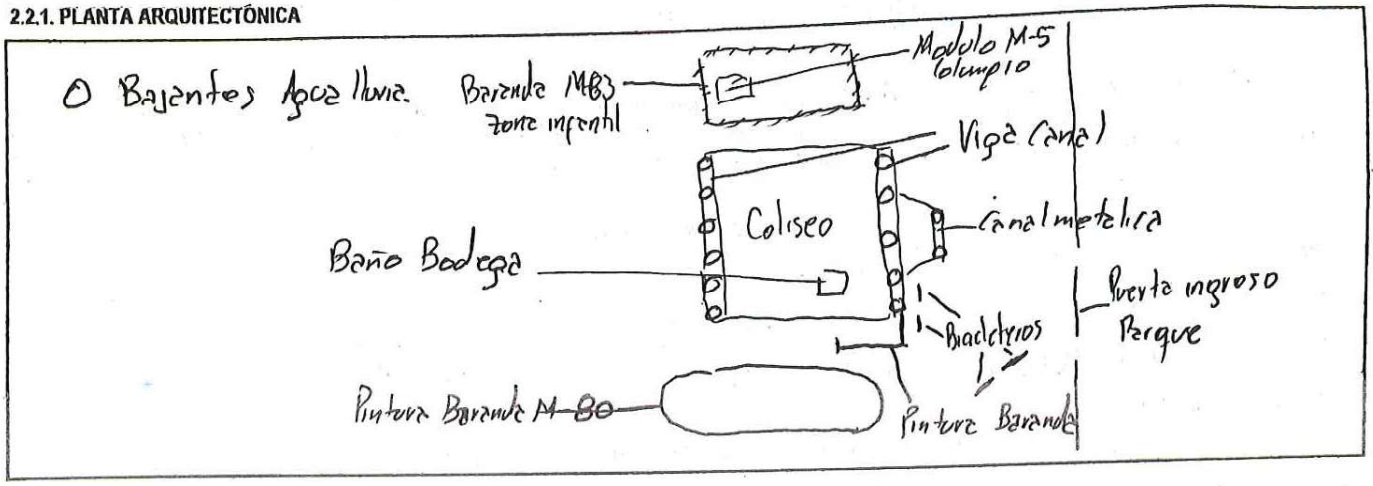

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: _____

Comentarios: _____

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPEI

Comentarios: _____

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: _____

BOGOTÁ

☐ OTROS (Indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
J. David Patiño G	Conductista	3223450440	
Sarabi Bozo	Entrevistadora	3204200075	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: veintiseis (26) días del mes de junio de 2025

(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 3 días del mes de Junio de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la Infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 08-241

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: CAYETANO CAÑIZARES

DIRECCIÓN: Av. CARRERA 80 HJ LOCALIDAD: 08. KENNEDY

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 19 (Día) DE Julio (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO: ____ (Día) DE ____ (Mes) DE ____ (Año)

CONTRATISTA: Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA: Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Desmonte de válvulas push (13 und lavamanos, 5 und sanitario, 1 und orinal)
2. Suministro e instalación de válvula push (13 und lavamanos, 5 und sanitario, 1 und orinal)
3. Desmonte y re instalación de sanitario (2 und)
4. Punto de reparación hidraulica PVC-P 3" (1 und)
5. Suministro e instalación de registro cortina 1-1/4" (2 und)
6. Desmonte, suministro e instalación de grifería para tanque sanitario (15 und)
7. Suministro e instalación de sifón para orinal (3 und)
8. Instalación de láminas en superboard, pañete y pintura de techo (1 und)


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.


2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

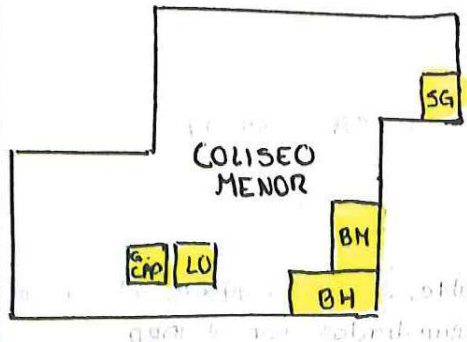

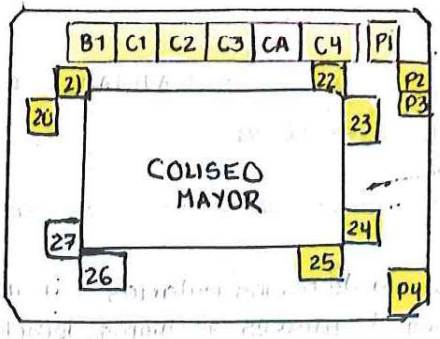

B1. Baño Piso 1
C1. Camerino 1
C2. Camerino 2
C3. Camerino 3
CA. Camer. Arbitros
C4. Camerino 4
P1. Pesas 1
P2. Pesas 2
P3. Pesas 3
P4. Pesas 4
20. Baño Hombres
21. Baño Mujeres
22. Baño Hombres
23. Baño Mujeres
24. Baño Hombres
25. Baño Mujeres
26. Baño Hombres
27. Baño mujeres

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: _____

Comentarios: _____

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO _____ UAESP PODA CESPED _____

Comentarios: _____

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: _____

☐ OTROS (Indicar cuales)

Comentarios: _____

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IDRD 1	3222280448	Santana
Ronald Lozano	Interventoría	3204720075	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: Tres (*día en letras*) 03 (*día en números*) días del mes de Junio (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 03 días del mes de Junio de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital Recreación y Deporte IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 16-204

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: EL JAZMÍN

DIRECCIÓN: AV. CARRERA 50 # 1D-28 LOCALIDAD: 16. PUENTE ARANDA

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)

CONTRATISTA: Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA: Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Demarcación pintura tráfica de dos (2) canchas de baloncesto, dos (2) canchas
2. de microfútbol, una (1) cancha múltiple y tres (3) canchas de Voleybol.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

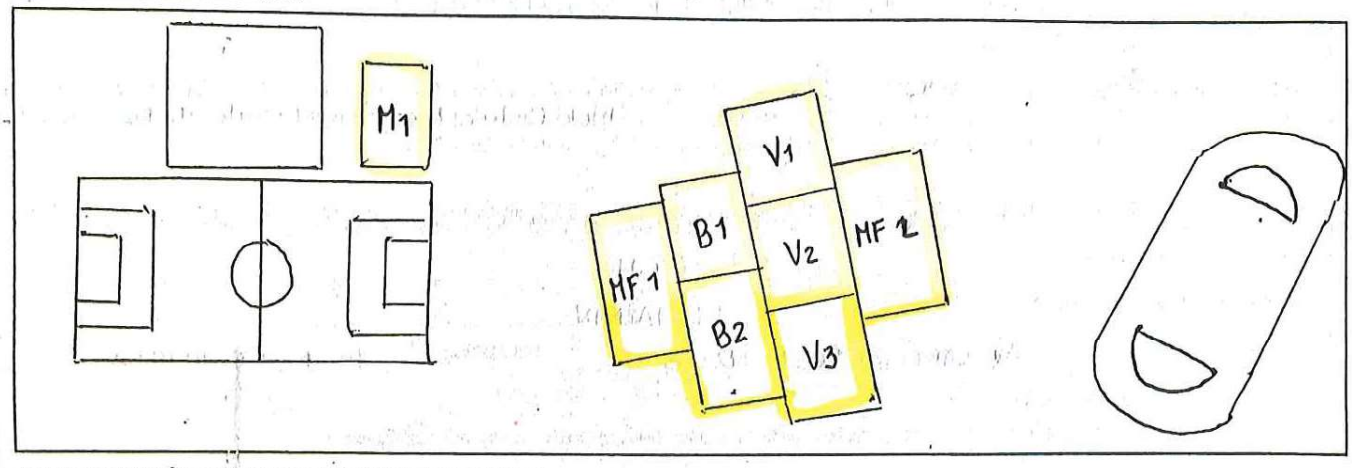

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL AREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: _____

Comentarios: _____

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO _____ UAESP PODA CESPED _____

Comentarios: _____

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: _____

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

☐ OTROS (indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IDRD 7	3222280448	Santana
Ronald bruno	enterorentana	3204700075	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Tres *(día en letras)* 03 *(día en números)* días del mes de Junio *(mes en letras)* de 2025 *(Año)*

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 04 días del mes de Junio de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 07-391

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: El Porvenir

DIRECCIÓN: AV. Calle 54 sur # 97-37 **LOCALIDAD:** Bosa

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) DE Julio (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO (Día) DE (Mes) DE (Año)

CONTRATISTA Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Desmonte, re ubicación y re instalación de rejillas existentes en cárcamos
2. Limpieza y retiro de RCD en cárcamos
3. Suministro e instalación de rejilla para cárcamos 40x40x8 cm y 50x50x6 cm
4.
5.
6.
7.
8.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

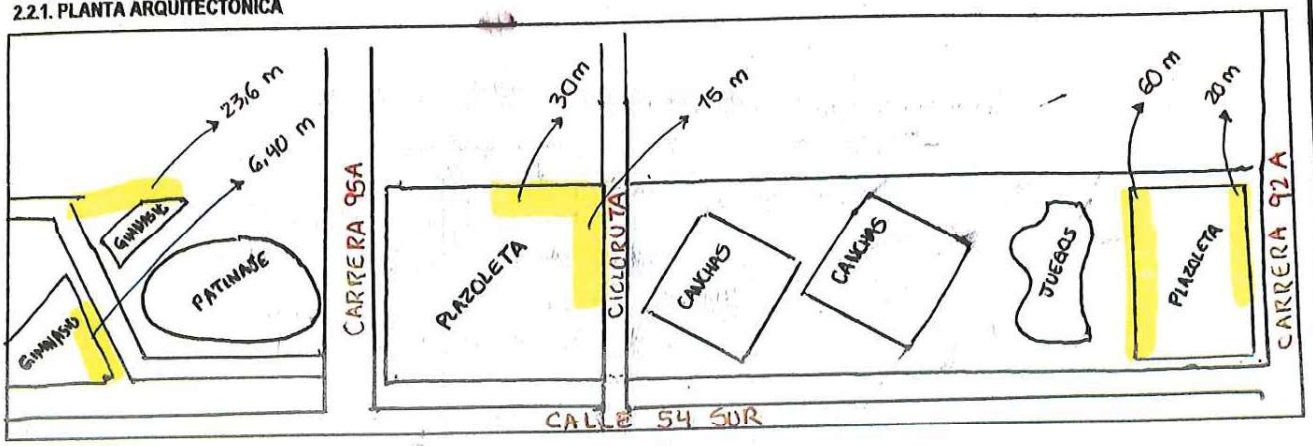

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios:

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPEI

Comentarios:

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

☐ OTROS (Indicar cuales)

Comentarios: _____

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IDRD 1	3222280448	Santana
Ronald Bozo	Interventoria	320-4700075	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: Cuatro (*día en letras*) 04 (*día en números*) días del mes de Junio (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma) _____
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma) _____
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 6 días del mes de Junio de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deportes IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 04-127

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: SAN CRISTOBAL (CEFE)

DIRECCIÓN: CALLE 17A SUR # 2A - 50 Este **LOCALIDAD:** 04. SAN CRISTOBAL

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) DE Julio (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO ____ (Día) DE ____ (Mes) DE ____ (Año)

CONTRATISTA Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4060 (Número Contrato) **DE** 2024 (Año)

INTERVENTOR Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4080 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Punto de reparación hidráulica tubería PVC-P 2" pasillo camerinos coliseo (2 und)
2. Punto de reparación hidraulica tubería PVC-P 1-1/2" baños mujeres coliseo piso 1 (2 und)
3. Punto de reparación hidráulica tubería PVC-P 3/4" baños hombres coliseo piso 1 (1 und)
4. Desmonte, suministro e instalación de llave lavamanos tipo push baño mueres coliseo piso 1 (2 und)
5. Desmonte, suministro e instalación de sanitario institucional baño hombres piso 2 (1 und)
6. Punto de reparación hidráulica tubería PVC-P 3" pasillo mesas ping pong (1 und)
7. Punto de reparación hidráulica tubería PVC-P 3" baños hombres piscina piso 1 (1und)
8. Punto de reparación hidráulica tubería PVC-P 3" sótano piscinas (1 und)

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

9. Punto de reparación hidráulica tubería PVC-P 2-1/2" sótano piscinas (4 und)
10. Punto de reparación hidraulica tubería PVC-P 1-1/4" baño mujeres piscina piso 1 (1und)


2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

11. Desmonte, suministro e instalación de cerraduras para puertas (9 und)

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

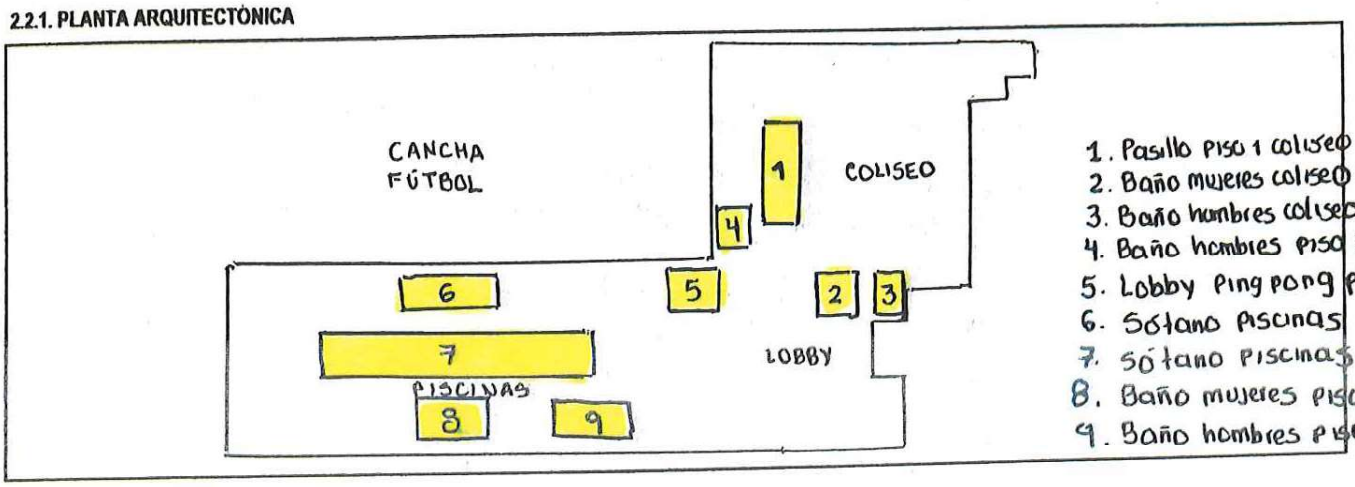

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios:

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPEI

Comentarios:

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios:

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

	OTROS (indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IDRD 1	3222280448	Santana
Ronald Lozano	Interventoría	3204700075	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: Seis (día en letras) 06 (día en números) días del mes de Junio (mes en letras) de 2025 (Año)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 04 días del mes de Junio de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deportes IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 13-015

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: SANTA CLARA

DIRECCIÓN: CARRERA 45 # 22-63 **LOCALIDAD:** 13. TEUSAQUILLO

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y compos deportivos administrados por el IDRD

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)	
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	
CONTRATISTA	Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)		**CONTRATO No**	4060 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)
INTERVENTOR	Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)		**CONTRATO No**	4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Excavación manual, suministro e instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto
2. en pilotes (50 x 50 x 1.30) m^3. (9 und)
3. Suministro e instalación de postes metálicos h=12.00 m con base. (9 und)
4. Suministro e instalación de tubos metálicos Ø 2-1/2" h=3.00 m. (5 und)
5. Suministro e instalación de malla nylon en cerramiento de cancha
6. sintética de fútbol
7.
8.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

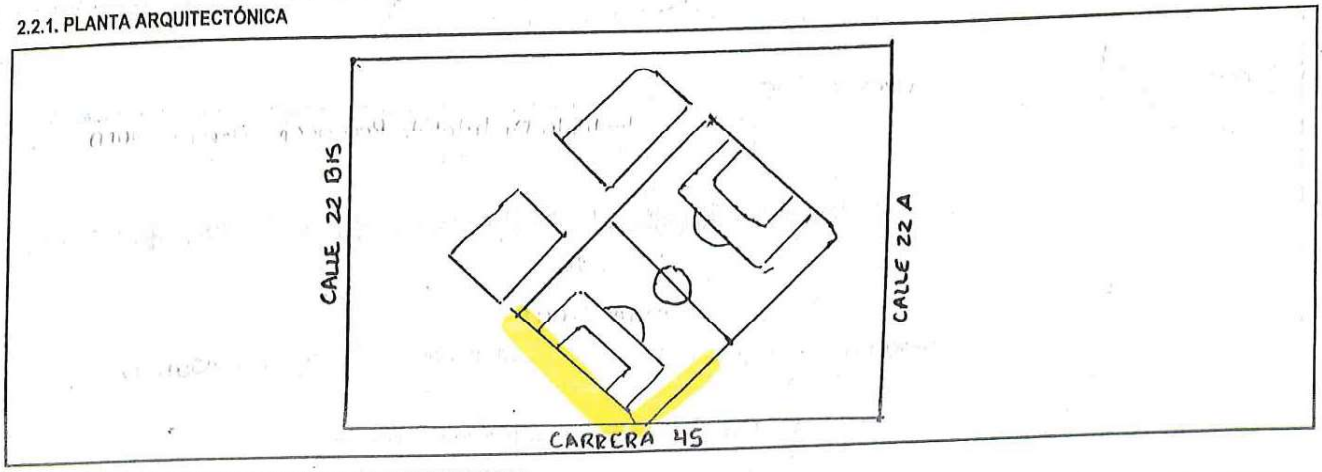

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	AREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (SI aplica) Folios: _____

Comentarios: _____

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO _____ UAESP PODA CESPED _____

Comentarios: _____

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: _____

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

☐ OTROS (indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IDRD 1	3222280448	Santana
Ronald Lozano	Interventoría	3204200075	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: Cuatro *(día en letras)* 04 *(día en números)* días del mes de Junio *(mes en letras)* de 2025 *(Año)*

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 06 días del mes de Junio de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 16-037

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: URBANIZACIÓN BOCHICA

DIRECCIÓN: **LOCALIDAD:** 16. PUENTE ARANDA

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)

CONTRATISTA Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4060 (Número Contrato) **DE** 2024 (Año)

INTERVENTOR Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) **CONTRATO No** 4080 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Demolición y desmonte de dos (2) módulos de cerramiento en malla eslabonada y
2. antepecho en mampostería
3. Construcción y pañete de muros antepecho en mampostería
4. Suministro e instalación de dos (2) módulos de cerramiento en malla eslabonada
5. en costado oriental de cancha de fútbol
6.
7.
8.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

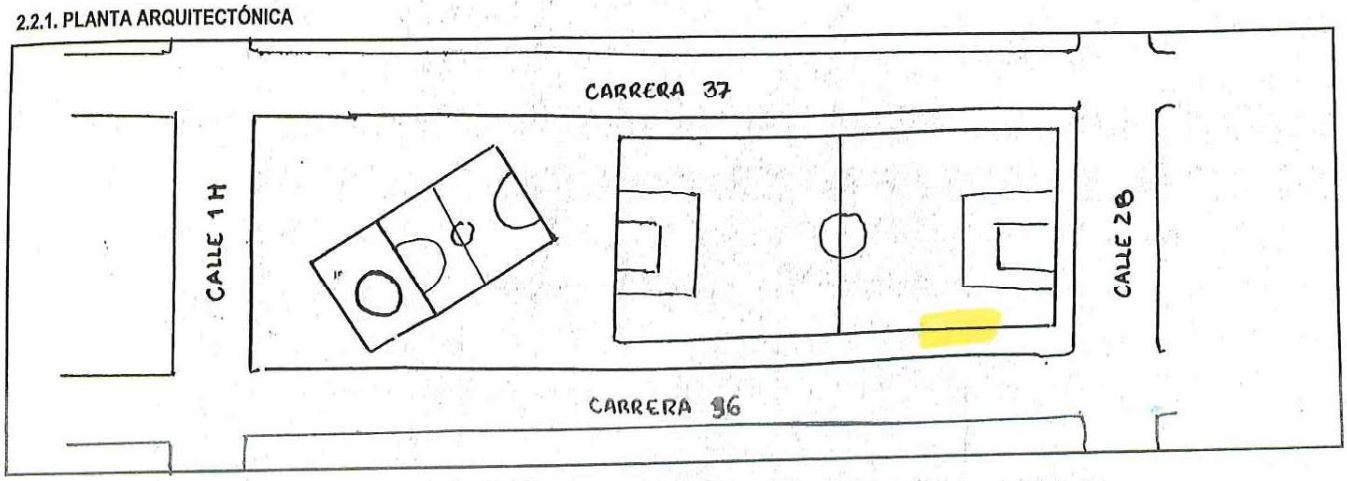

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: _____

Comentarios: _____

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO _____ UAESP PODA CESPED _____

Comentarios: _____

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: _____

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

☐ OTROS (Indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IDRD 1	3222280448	Santana
Ronald Lozano	Interventoria	3204700075	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: Seis (*día en letras*) 06 (*día en números*) días del mes de Junio (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

BOGOTÁ

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 26 días del mes de Junio de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreacion y Deporte IDRD con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 05-003

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Valles de Cafam

DIRECCIÓN: Calle 92 Sur # 14D - 87 LOCALIDAD: Usme

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación, reparacion y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 20 (Día) DE Noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 19 (Día) DE Julio (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO: ____ (Día) DE ____ (Mes) DE ____ (Año)

CONTRATISTA: Consorcio Belzcon IDRD - 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA: Consorcio Belzcon IDRD - 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Se realiza recorrido para hacer entrega de actividades en el escenario, se
2. realiza mantenimiento en senderos peatonales costado conjunto y detras
3. de la cancha de microfutbol y zona pobera, se realiza mantenimiento a
4. aparatos gluxometros en baños de camerinos hombres y mujeres y baños
5. hombres, mujeres y discapacitados en coliseo, se realiza limpieza de viga canal
6. y bajantes, cambio de chapas dañadas en camerino hombre, baños discapacitados
7. administracion e ingresos coliseo, cambio de policarbonato fachada coliseo
8. ampliacion de zona blanda ingreso parque, suministro e instalacion postes de luz
9. alimentados por paneles solares.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.


2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

19 Postes de Luz alimentados por paneles Solares.

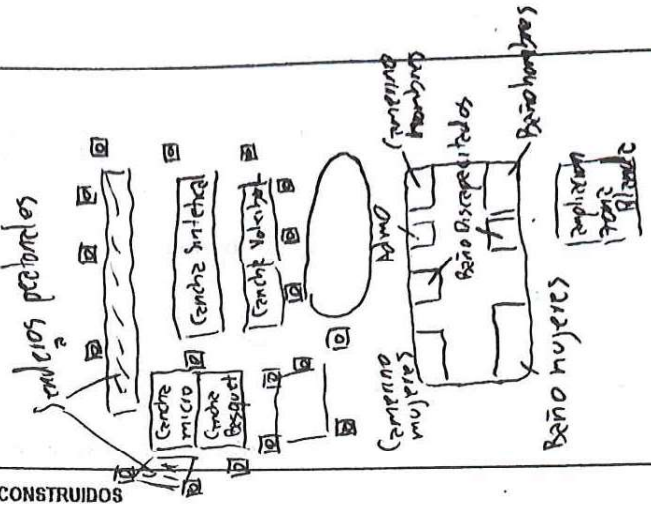

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios:

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO UAESP PODA CESPEI

Comentarios:

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios:

BOGOTÁ

	OTROS (Indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Ronald Lozano	Interventoria	320 4[illegible]7	
J. David Patiño G	Contratista	3223150940	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: veintiseis (26) días del mes de Junio de 2025

(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 26 días del mes de JUNIO de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 07-260

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: EL RECREO

DIRECCIÓN: CARRERA 100 - CALLE 20 LOCALIDAD: 07. BOSA

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación, reparación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)

CONTRATISTA: Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA: Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:


1. Desmonte y re instalación de bordillo en concreto A-80 (142,83 m)
2. Desmonte y re instalación de adoquín de arcilla (213,80 m²)
3. Desmonte y retiro de adoquín de arcilla (79,9 m²)
4. Desmonte y re instalación de loseta en concreto (92,48 m²)
5. Nivelación y compactación de la sub rasante (392,78 m²)
6. Cinta de ajuste en concreto (14,10 m)
7. Suministro e instalación de adoquín de arcilla 20x10x6 cm (79,9 m²)
8.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

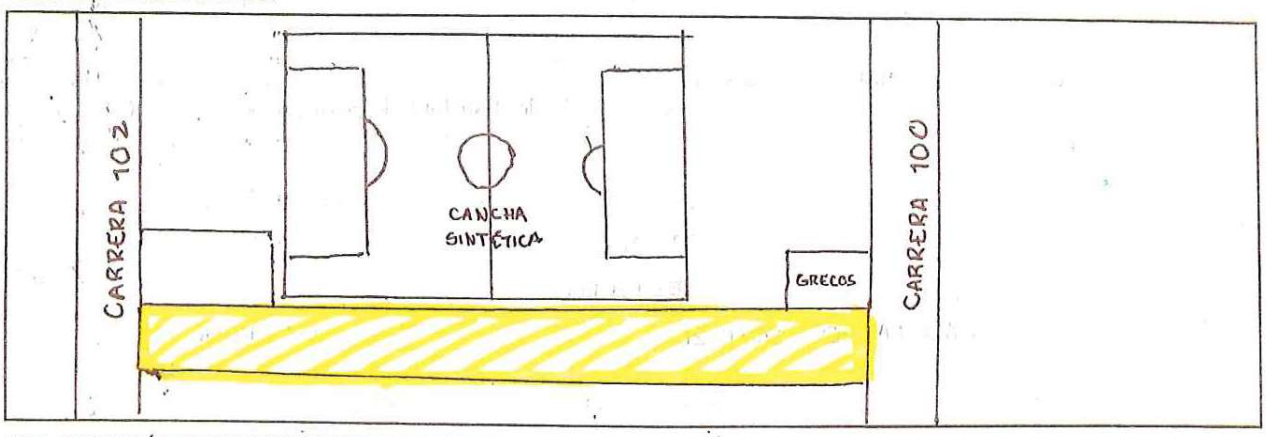

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	AREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL AREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: _____

Comentarios: _____

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO _____ UAESP PODA CESPED _____

Comentarios: _____

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: _____

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

☐ OTROS (Indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Belzcon IDRD 1	3222280448	Santana
Ronald Lozano	Interventoria	3124800075	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: Veintisiete (27) días del mes de Junio de 2025

(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 26 días del mes de Junio de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreacion y Deporte IDRD con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 18-090

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Parque estructurante Pijaos

DIRECCIÓN: Cr 10 # 34 Sur - 35 LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante sistema de precios unitarios y monto agotable el mantenimiento adecuacion, reparacion y recuperacion de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)

CONTRATISTA: Consorcio Belzcon IDRD-1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA: Consorcio Belzcon IDRD-1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Se realiza recorrido para hacer entrega de actividades en el cerramiento malla esla-
2. bonada costados norte-Sur y Occidente con instalacion de malla nylon, tambien instalacion
3. de malla eslabonada pasillo ingreso administracion a grama sintetica, mantenimiento de
4. baterias de baño hombres y mujeres donde se cambiaron push sanitarios e insta-
5. lacion de piezas de enchape faltante, cambio de registros de agua internos
6. y externos del escenario por mal funcionamiento, cambio de flotador en tanque
7. de almacenamiento por daño del existente y cambio de tuberia de suministro
8. de agua potable al tanque de almacenamiento por daño en tuberia y obras de cerramiento y cajas de inspeccion en zona ingreso cancha costado sur


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

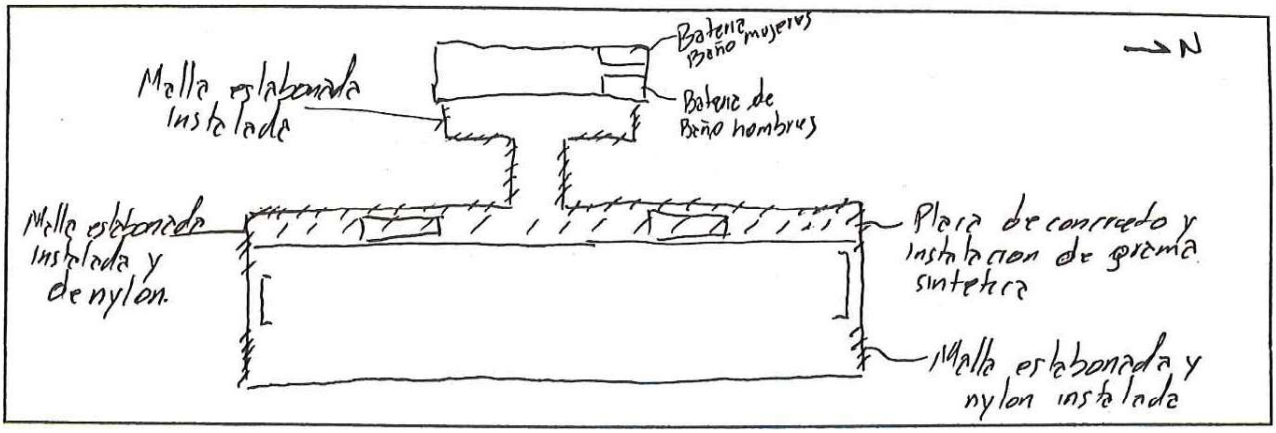

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: _____

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ **ENEL** _____ **VANTI** _____

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPEI**

Comentarios: _____

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: _____

BOGOTÁ

☐ OTROS (indicar cuales)

Comentarios:

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Ronald Bravo	Interventoría	3204700075	
J. David Patiño G.	Contratista	3223150440	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: veintiseis (*día en letras*) 26 (*día en números*) días del mes de Junio (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

CONSORCIO Belzcon
IDRD I

ANEXO 7
ENSAYOS

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-1194825-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** IDRD CONTRATO PUBLICO 4060 - 2024 EL COUNTRY
***DIRIGIDO A:** ROSSY CATALINA RUBIO
***DIRECCIÓN:** AV. CLL. 127 #11D-90

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-25
REFERENCIA: 04 - 26087
DIGITÓ: MARTINEZ COLMENARES LAURA VALENTINA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
524403	1	No especificado	Concreto	Zapatas Pérgola	2025-06-14	2025-06-16	2025-06-21	7	152	18.146	21,0	232,5	130,5	12,8	61,0	2-Cónica y dividida	
524403	1	No especificado	Concreto	Zapatas Pérgola	2025-06-14	2025-06-16	2025-06-21	7	151	17.908	21,0	226,3	128,5	12,6	60,0	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-912325-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** PALACIO DE LOS DEPORTES
***DIRIGIDO A:** ROSSY CATALINA RUBIO
***DIRECCIÓN:** AV CLL 63 # 45-1

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-05
REFERENCIA: 02 - 26242
DIGITÓ: SUSA MARIN DANNA ALEJANDRA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
516068	5	No especificado	Concreto	Viga Cerramiento	2025-05-24	2025-05-27	2025-05-31	7	151	17.908	21,0	288,6	164,2	16,1	76,7	2-Cónica y dividida	
516068	6	No especificado	Concreto	Viga Cerramiento	2025-05-24	2025-05-27	2025-05-31	7	152	18.146	21,0	295,6	166,2	16,3	77,6	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-979825-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** PALACIO DE LOS DEPORTES
***DIRIGIDO A:** ROSSY CATALINA RUBIO
***DIRECCIÓN:** AV CLL 63 # 45-1

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-11
REFERENCIA: 03 - 26242
DIGITÓ: SUSA MARIN DANNA ALEJANDRA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
511009	1	No especificado	Concreto	Viga cerramiento	2025-05-31	2025-06-05	2025-06-07	7	151	17.908	21,0	358,5	203,9	20,0	95,2	2-Cónica y dividida	
511009	1	No especificado	Concreto	Viga cerramiento	2025-05-31	2025-06-05	2025-06-07	7	152	18.146	21,0	361,9	202,9	19,9	94,8	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.5.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concretos y Prefabricados

328

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-1130225-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** PALACIO DE LOS DEPORTES
***DIRIGIDO A:** ROSSY CATALINA RUBIO
***DIRECCIÓN:** AV CLL 63 # 45-1

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-19
REFERENCIA: 04 - 26242
DIGITÓ: SUSA MARIN DANNA ALEJANDRA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
516068	3	No especificado	Concreto	Viga Cerramiento	2025-05-20	2025-05-27	2025-06-17	28	151	17.908	21,0	407,8	232,5	22,8	108,6	2-Cónica y dividida	
516068	4	No especificado	Concreto	Viga Cerramiento	2025-05-20	2025-05-27	2025-06-17	28	152	18.146	21,0	410,7	230,5	22,6	107,6	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concretos y Prefabricados

320

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-884125-BOG_CON-1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** PARQUE PALESTINA
***DIRIGIDO A:** ROSSY CATALINA RUBIO
***DIRECCIÓN:** CL 68 SUR 81 C - 09

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-03
REFERENCIA: 01 - 26317
DIGITÓ: BUITRAGO CRUZ GERALDINE
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
515941	M1	No especificado	Concreto	Zona de Juegos	2025-05-17	2025-05-28	2025-05-31	14	152	18.146	21,0	455,7	255,9	25,1	119,5	5-Fractura extremos	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concretos y Prefabricados

330

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-1059425-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** PARQUE PALESTINA
***DIRIGIDO A:** ROSSY CATALINA RUBIO
***DIRECCIÓN:** CL 68 SUR 81 C - 09

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-16
REFERENCIA: 02 - 26317
DIGITÓ: BUITRAGO CRUZ GERALDINE
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
515941	M1	No especificado	Concreto	Zona de Juegos	2025-05-17	2025-05-28	2025-06-14	28	151	17.908	21,0	529,7	301,8	29,6	141,0	5-Fractura extremos	
515941	M1	No especificado	Concreto	Zona de Juegos	2025-05-17	2025-05-28	2025-06-14	28	151	17.908	21,0	520,6	296,7	29,1	138,6	5-Fractura extremos	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concretos y Prefabricados

331

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-885825-BOG_CON-1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** PARQUE TIMIZA
***DIRIGIDO A:** ROSSY CATALINA RUBIO
***DIRECCIÓN:** CL 40 H SUR 72 R

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-03
REFERENCIA: 01 - 26318
DIGITÓ: MARTINEZ COLMENARES LAURA VALENTINA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
516183	1	No especificado	Concreto	Pilotes y viga cimentación sendero lago	2025-05-23	2025-05-29	2025-05-30	7	152	18.146	21,0	319,5	179,5	17,6	83,8	2-Cónica y dividida	
516183	2	No especificado	Concreto	Pilotes y viga cimentación sendero lago	2025-05-23	2025-05-29	2025-05-30	7	151	17.908	21,0	316,9	180,5	17,7	84,3	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Concretos y Prefabricados

332

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-950425-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** PARQUE TIMIZA
***DIRIGIDO A:** ROSSY CATALINA RUBIO
***DIRECCIÓN:** CL 40 H SUR 72 R

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-09
REFERENCIA: 02 - 26318
DIGITÓ: MARTINEZ COLMENARES LAURA VALENTINA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm^2)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm^2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
516183	3	No especificado	Concreto	Pilotes y viga cimentación sendero lago	2025-05-23	2025-05-29	2025-06-06	14	152	18.146	21,0	468,9	263,1	25,8	122,9	2-Cónica y dividida	
516183	4	No especificado	Concreto	Pilotes y viga cimentación sendero lago	2025-05-23	2025-05-29	2025-06-06	14	151	17.908	21,0	465,6	265,1	26,0	123,8	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

Nº DE INFORME: DCP1-1188525-BOG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***OBRA:** PARQUE TIMIZA
***DIRIGIDO A:** ROSSY CATALINA RUBIO
***DIRECCIÓN:** CL 40 H SUR 72 R

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-24
REFERENCIA: 03 - 26318
DIGITÓ: MARTINEZ COLMENARES LAURA VALENTINA
LABORATORISTA: VEGA ALEJANDRO



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro Nº	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
516183	5	No especificado	Concreto	Pilotes y viga cimentación sendero lago	2025-05-23	2025-05-29	2025-06-20	28	152	18.146	21,0	518,5	291,6	28,6	136,2	2-Cónica y dividida	
516183	6	No especificado	Concreto	Pilotes y viga cimentación sendero lago	2025-05-23	2025-05-29	2025-06-20	28	151	17.908	21,0	520,6	296,7	29,1	138,6	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.

Autorizado por:

Santiago Rodríguez
JEFE DE CONCRETOS Y PREFABRICADOS

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concretos y Prefabricados

324

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida).

INV E 164:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2607-25-1
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
***CÓDIGO DE OBRA:**	26242
***OBRA:**	PALACIO DE LOS DEPORTES
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	AV CLL 63 # 45-1
***DIRIGIDO A:**	ROSSY CATALINA RUBIO
SITIO DE ENSAYO:	ENSAYO EN CAMPO
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-06-03
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-09
ENSAYO EJECUTADO POR:	U. HERNÁNDEZ
ORDEN DE TRABAJO N°:	76849 - OV 156133
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (02)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con un asterisco (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

SebastianB.

Firmado digitalmente por JOAN SEBASTIAN BLANCO MEDINA
Fecha: 2025.06.09 09:29:21 -05'00'

Sebastián Blanco
Coordinador de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida). INV E 164:2013

CLIENTE:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-06-03	NÚMERO DE INFORME:	DGP-2607-25-1
OBRA:	PALACIO DE LOS DEPORTES - 26242	FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:	2025-06-09	PÁGINAS:	2 DE 2

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL ENSAYO					
Marca:	HUMBOLDT	**Modelo:**	5001-C	N° de serie:	5641
CONTEO ESTÁNDAR					
Humedad:	468	Densidad:	1044		

* Tipo de material	* Densidad máxima de laboratorio kg/m³
SBG PEA	1859

Ensayo No.	Tipo de Material	Localización	Método		Profundidad cm	Humedad %	Masa unitaria húmeda kg/m³	Masa unitaria seca kg/m³	Porcentaje de compactación %	Esquema de localización
			RD	TD						
1	SBG PEA	K0+030 CAPA ÚNICA VIGA CERRAMIENTO		X	15	14,7	2016	1758	94,5	
2	SBG PEA	K0+080 CAPA ÚNICA VIGA CERRAMIENTO		X	10	15,8	2058	1777	95,6	
3	SBG PEA	K0+120 CAPA ÚNICA VIGA CERRAMIENTO		X	10	11,8	2055	1838	98,9	
4	SBG PEA	K0+200 CAPA ÚNICA VIGA CERRAMIENTO		X	10	11,4	2066	1855	99,8	
5	SBG PEA	K0+240 CAPA ÚNICA VIGA CERRAMIENTO		X	10	12,0	2065	1844	99,2	

RD: Retrodispersión, **TD:**Transmisión directa

La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Digitó: T. PEDRAZA

OBSERVACIONES:

EL PESO UNITARIO SECO MÁXIMO DE LABORATORIO FUE SUMINISTRADO POR LA COMPAÑÍA CONTRATANTE.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

CONSORCIO Belzcoa
IDRD 1

ANEXO 8
REGISTRO FOTOGRAFIA EMERGENCIA


BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO Belzcoa
IDRD I

PARQUE CÓD.

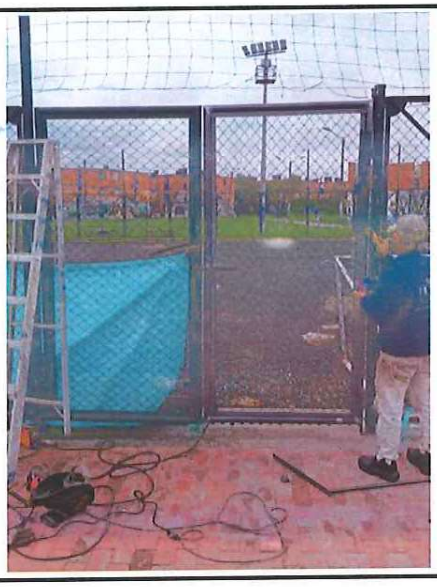



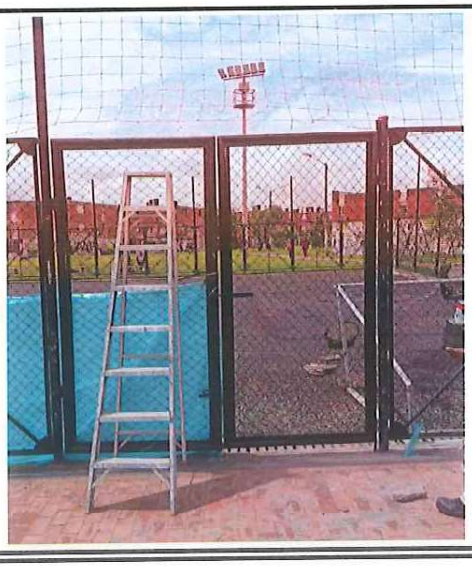

FOTOS
Se realizó el suministro e instalación de una puerta en la entrada del parque de acuerdo con la solicitud de la Supervisión.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte


REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO Belzona
IDRD 1

PARQUE SAN CRISTOBAL CÓD.04-127



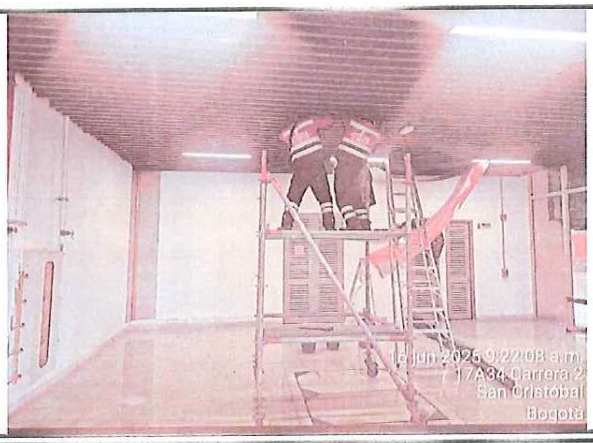

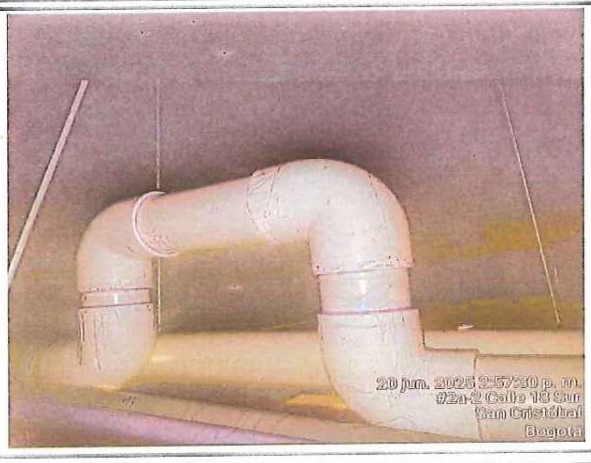







FOTOS
Se realizó el mantenimiento de la red hídrica de 3" y 4", junto con la instalación de sus respectivos accesorios de la tubería hidráulica de presión.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUÁTICO) CÓD. 12-1000









FOTOS

Se atienden y corrigen las observaciones de la interventoría en baranda de cerramiento bicicleteros complejo acuático

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO Belzoca
IDRD 1

PARQUE BERLÍN CÓD. 11-015





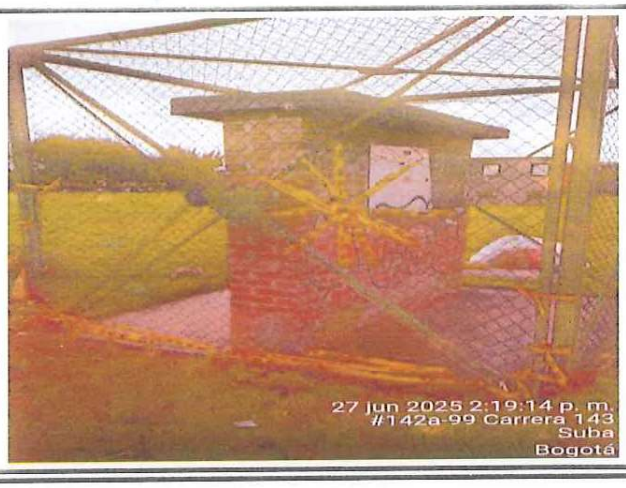




FOTOS
Se realiza la instalación de concreto de 3000 PSI en el cuarto eléctrico.
Se realiza jornada de aseo y limpieza de obra.


BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO Belzos IDRD 1

CEFE COMETAS CÓD. 11-204

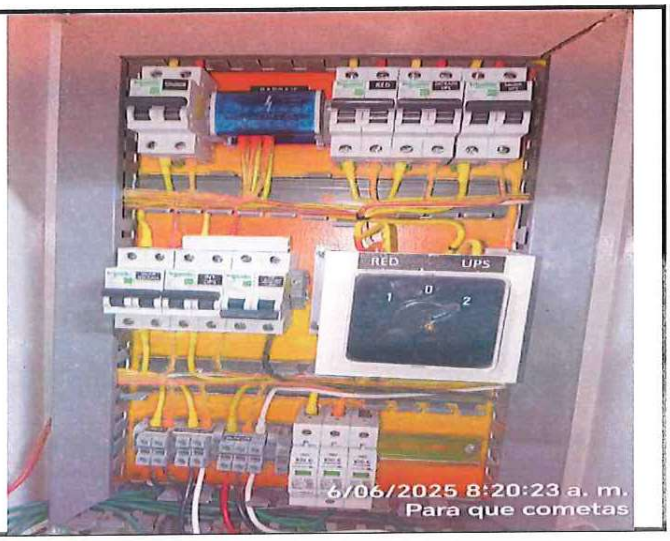





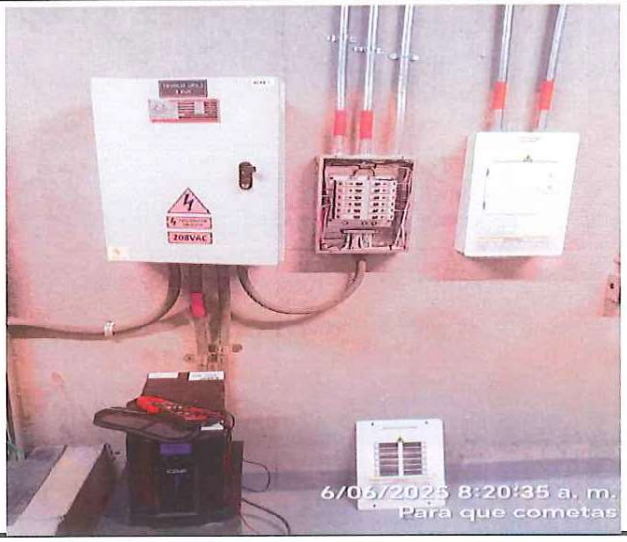

FOTOS
Revisión tableros eléctricos

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 9
REGISTRO FOTOGRÁFICO EJECUTADO

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO IDRD 1

PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA CÓD.18-207












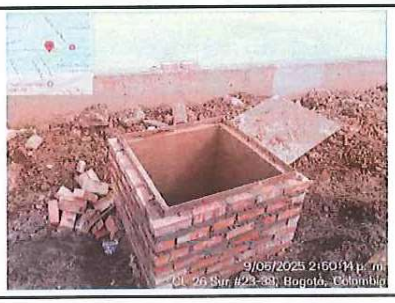






BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO PARQUES IDRD 1

PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA CÓD.18-207

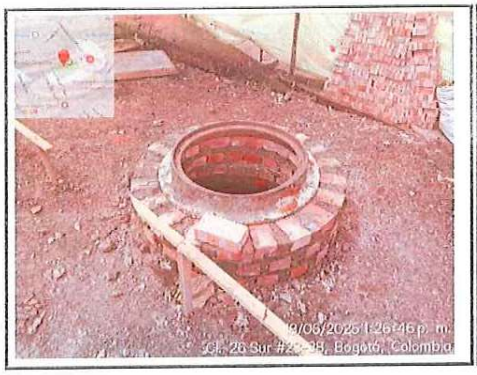



FOTOS
Excavaciones terraza zona baños
Lleno con material de excavación terraza zona camerinos
Excavación manual pilotines cimentación estructura baños
Excavación manual rampa acceso personal con movilidad reducida terraza baños
Realce de cajas de inspección y pozo de red de agua lluvias

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO IDRD

PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER CÓD. 18-090

















FOTOS:
Se realiza el suministro e instalación de las puertas de acceso cancha sintética y zona shut de basuras.
Se finalizan los trabajos de pintura módulos de cerramiento eslabonado.
Se realiza la instalación de la malla de nylon en la zona de cancha sintética.
Se realiza el suministro de banco de jugadores.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO Belzcon IDRD 1

PARQUE PORVENIR CÓD. 07-931

















BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO PARQUES IDRD 1

PARQUE PORVENIR CÓD. 07-931





FOTOS


Suministro e instalación de accesorios PVC-P 1" en cuartos de equipos de bombeo zona módulos baños
Desmonte de pasos en varilla, suministro e instalación de pasos plásticos en pozos de inspección zona módulos baños
Excavación manual, trasiego y acopio de gravilla en zona pista de trote
Suministro, trasiego manual, extendido, nivelación y compactación mecánica de material granular SBG-PEA en zona pista de trote
Vaciado de 20 m3 de concreto 3000 PSI para placa de contrapiso en zona pista de trote.
Retiro y disposición final de piso caucho (7 m3).
Mantenimiento de cerramientos provisionales vandalizados.
Corte con pulidora para juntas en zona pista de trote.


BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO Parques IDRD 1

PARQUE VALLES DE CAFAM CÓD. 05-003





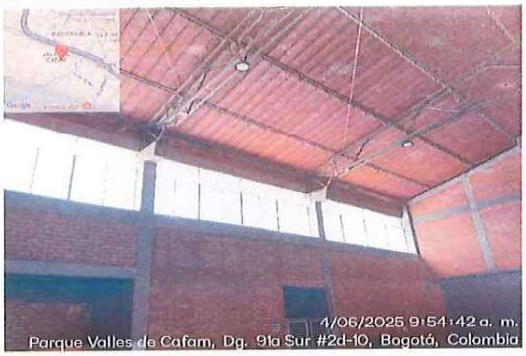

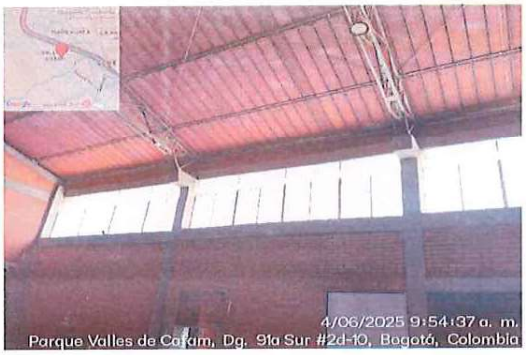





FOTOS
Suministro e instalación de malla tipo gallinero debajo policarbonato cubierta costado patinaje
Suministro e instalación de llaves tipo pera para baños discapacitados, camerinos hombres, acceso al coliseo y administración

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO Parques IDRD I

PARQUE QUIROGA CÓD. 18-205

















FOTOS
Demolición de carpeta asfáltica cancha múltiple
Excavación mecánica estructura cancha múltiple
Suministro e instalación de subbase granular estructura cancha múltiple
Suministro e instalación de base granular estructura cancha múltiple.
Compactación de la base granular.
Instalación de concreto de 3000 PSI de la viga para la instalación de la malla contra impacto.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO Parques IDRD 1

PARQUE SIMON BOLIVAR - PALACIO DE LOS DEPORTES CÓD.12-125


















FOTOS
Limpieza y conformación de material de los costados de la viga de cerramiento
Toma de densidades de la capa única de la viga de cerramiento. Se realizaron 5 muestras.

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO BELLAVISTA IDRD 1

PARQUE SIMON BOLIVAR - CIUDAD DE LOS NIÑOS CÓD.12-041



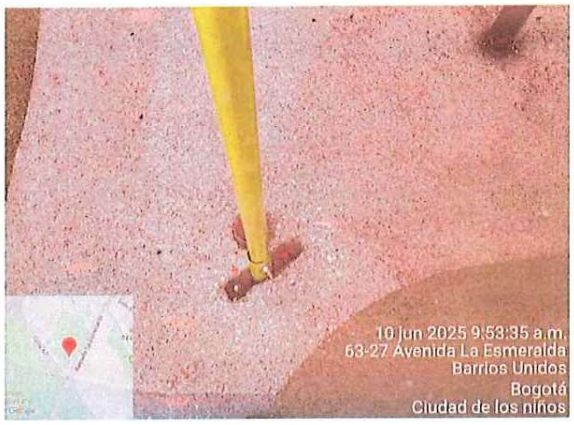





FOTOS


Instalación de tobogán y tapones de juegos.

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO IDRD 1

PARQUE EL COUNTRY CÓD.01-1000




INSTALACIÓN CABLEADO ELECTRICO

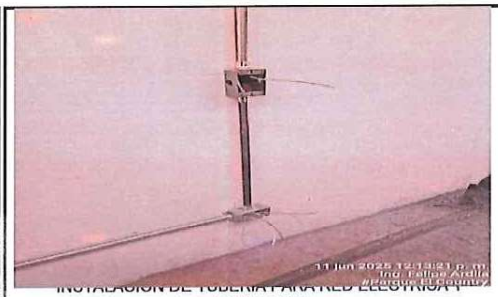


ACOMETIDA



CONCRETO CINTA PARA CAJA DE INSPECCIÓN ZONA DE JUEGOS

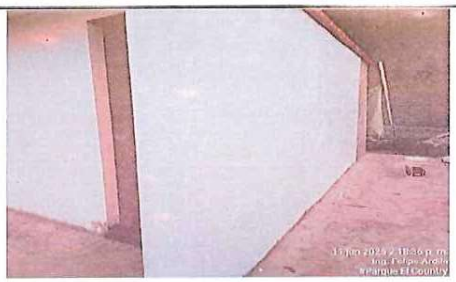

PINTURA Y REMATES ZONA DE SERVICIO

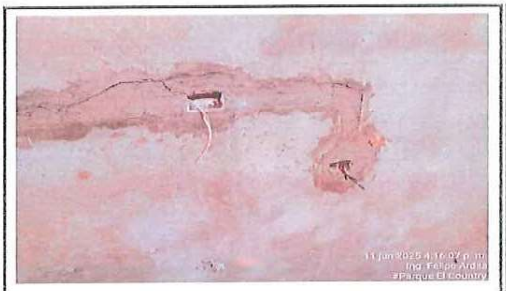

INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCCTRICOS



INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA NIVELACIÓN DE VÍA - ENTRADA VEHICULAR



INSTALACIÓN BARANDA M-83 Y PASAMANOS



INSTALACIÓN JUEGO RANA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO
IDRD 1

PARQUE EL COUNTRY CÓD.01-1000



EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE REJILLA DESAGÜE COCINA ZONA DE SERVICIOS



INSTALACIÓN ARENA PELDAR



REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS BIOSALUDABLES -



INSTALACIÓN BARANDA M-83 Y PASAMANOS



INSTALACIÓN DE CESPED ZONA DE JUEGOS




CAJA DE INSPECCION DE BEBEDERO



LEVANTAMIENTO MURO LAVAPIES



PERGÓLA

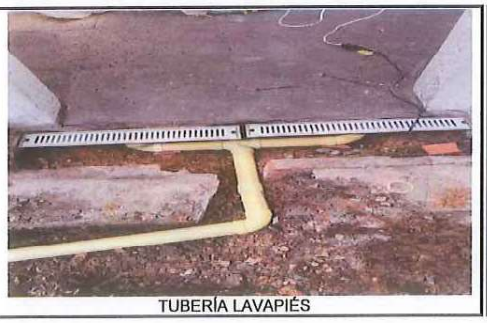

TUBERÍA LAVAPIÉS



REJILLA LAVAPIES Y PLACA EN CONCRETO

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4080 2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO IDRD 1

PARQUE EL COUNTRY CÓD.01-1000



ENCHAPE PISO ZONA DE SERVICIO



CARGUE Y RFETIRO DE RCD'S

FOTOS

- Se realiza la instalación de concreto 3000 PSI para pilotines del cerramiento y zona de juegos.
- Se realiza la instalación de concreto 3000 PSI en placas para la instalación de bebederos.
- Excavación para lavapiés y zapatas de pórgola.
- Nivelación de terreno en diferentes áreas.
- Levantamiento de muro en zona de lavapiés.
- Remates de filos, cenira tejas y terminación de muros externos.
- Mampostería en zona de servicios.
- Pañete de muros externos.
- Instalación de enchape de cocina.
- Pintura de muros internos externos zona de servicios
- Pintura de elementos biosaludables y correas metálicas.
- Instalación de correas y ángulos metálicos para tejado.
- Descarga e instalación de tejas para la cubierta de zona de servicios.
- Pintura de correas y estructuras metálicas.
- Instalación de juego de rana.
- Instalación de elementos biosaludables.
- Instalación de la ruta de la vida.
- Instalación de baranda tipo M83 y pasamanos.
- Lleno con arena 500 (Peldar) para arenero de la zona de juegos.
- Instalación de puntos eléctricos.
- Instalación de tubería para red eléctrica y cometida.
- Instalación de cableado eléctrico.
- Instalación de cárcamo para lavapiés.
- Instalación de cintas y tapas para registros y cajas de inspección de bebederos.
- Instalación de césped.
- Acondicionamiento y remate de cajas de inspección.
- Recolección y disposición final de madera y chatarra.
- Aseo general del Parque El Country y zona de servicios.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO BELZCON IDRD 1

PARQUE TIMIZA CÓD. 08-219

















REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".


PARQUE TIMIZA CÓD. 08-219









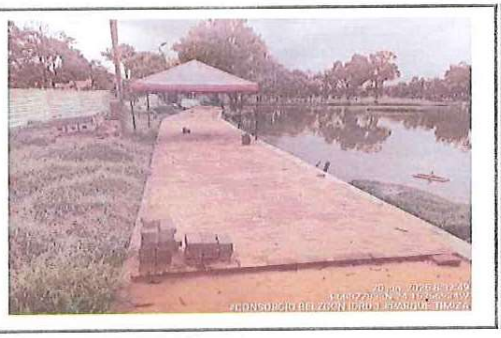



FOTOS

- ☐Suministro e instalación de puerta de acceso a parque en zona plazoletas de comidas
- ☐Suministro e instalación de reja bancaria en zona plazoleta de comidas
- ☐Re instalación de adoquín en zona sendero lago
- ☐Cintas de ajuste en concreto zona sendero lago
- ☐Trasiego manual y acopio de RDC
- ☐Suministro e instalación de adoquín de arcilla zona sendero lago
- ☐Suministro e instalación de párales de baranda M-80 zona sendero lago

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

PARQUE PALESTINA CÓD.07-165













BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO [illegible]
IDRD 1

PARQUE PALESTINA CÓD.07-165













FOTOS

- ☐Suministro e instalación de piso caucho reciclado (EDPM+SBR) espesor 3cm, 8cm y 11cm en zona de juegos
- ☐Mantenimiento de equipos biosaludables en zona gimnasio
- ☐Retiro y disposición final de juegos previamente desmontados
- ☐Suministro e instalación de baranda M-83 en zona de juegos

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO IDRD 1

PARQUE SIMON BOLIVAR - SECTOR CENTRAL CÓD.13-089


















BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO IDRD 1

PARQUE SIMON BOLIVAR - SECTOR CENTRAL CÓD.13-089

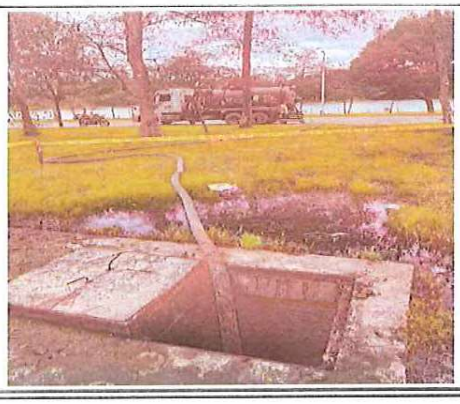



FOTOS

- ☐Retiro de caucho existente de la zona 1 y zona 6.
- ☐Retiro de juegos existentes en la zona 1 y zona 6.
- ☐Retiro y disposición de caucho de la zona 6 a sitio ambiental autorizado.
- ☐Mantenimiento de juegos de la zona 2 a la 5.
- ☐Replanteo de dados para juegos de la zona 1 y zona 6.
- ☐Excavación de dados para juegos de la zona 1 y zona 6.
- ☐Instalación de concreto para dados de la zona 1 y zona 6.
- ☐Instalación de juegos de la zona 1 y zona 6.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO
IDRD

PARQUE URBANIZACION EL TOBERIN CÓD.01-079









FOTOS

- **Mantenimiento de estructura metálica cerramiento perimetral de la cancha.**
- **Retiro de módulos de malla eslabonada.**
- **Instalación de módulos nuevos.**
- **Mantenimiento de estructura de módulos de cerramiento de cuarto eléctrico.**

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

PARQUE EL RECREO CÓD. 07-260













FOTOS

- ☐Cerramiento provisional en postes de madera y lona
- ☐Desmonte y reinstalación de bordillo de concreto zona sendero cancha sintética
- ☐Nivelación y compactación de material granular en zona sendero cancha sintética
- ☐Desmonte y reinstalación de loseta de concreto zona sendero cancha sintética
- ☐Desmonte y reinstalación de adoquín de arcilla zona sendero cancha sintética
- ☐Desmonte y acopio de adoquín de arcilla zona sendero cancha sintética
- ☐Suministro e instalación de adoquín de arcilla zona sendero cancha sintética
- ☐Cintas de ajuste en concreto zona sendero cancha sintética

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO IDRD 1


PARQUE CIUDAD MONTES CÓD. 16-112





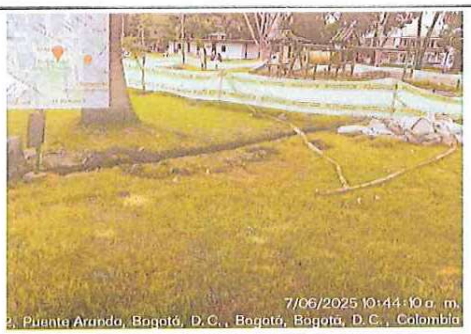



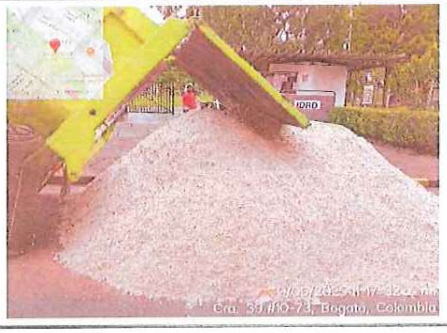







FOTOS

☐Retiro de arena existente para instalación de arena nueva tipo Peldar en zona de juegos infantiles.
☐Suministro e instalación de arena tipo Peldar en zona de juego infantiles.
☐Suministro e instalación de filtro perímetro zona de juegos infantiles.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte


REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO Pelzoo IDRD 1

PARQUE LA ANDREA **CÓD. 05-004**



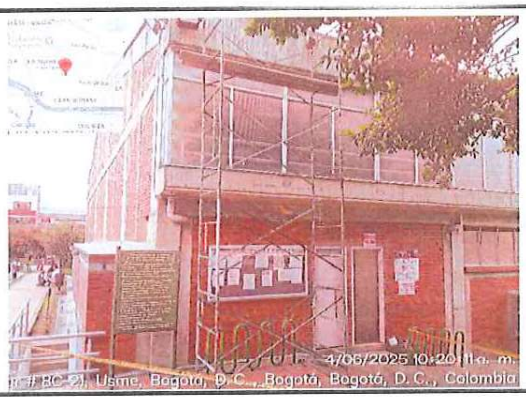



FOTOS

□Se realiza la limpieza de viga canal galvanizado y bajantes del coliseo

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO IDRD 1

PARQUE SIMON BOLIVAR (UNIDAD DEPORTIVO EL SALITRE) CÓD. 10-290














FOTOS

- ☐**Arreglo de fuga. Cambio de rejilla de orinal baño hombres velódromo primer piso costado sur**
- ☐**Arreglo de humedad de cuarto eléctrico (Retiro de pañete, arreglo de fuga, pañete, pintura) velódromo primer piso costado sur**
- ☐**Instalación de tapón de lavamanos baño mujeres velódromo 1° piso costado sur**
- ☐**Cambio de registro de 2" Baño hombre velódromo 2° piso costado sur**
- ☐**Cambio de push Baño hombres 2° piso velódromo costado norte**
- ☐**Limpieza de filtro de llaves lavamanos baño hombres 2° piso costado sur**
- ☐**Cambio de cartucho de push de lavamanos baño mujeres 2° piso costado sur**
- ☐**Destape de poceta 1° piso velódromo costado sur**


BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO IDRD 1

PARQUE SAN ANDRÉS CÓD.10-234

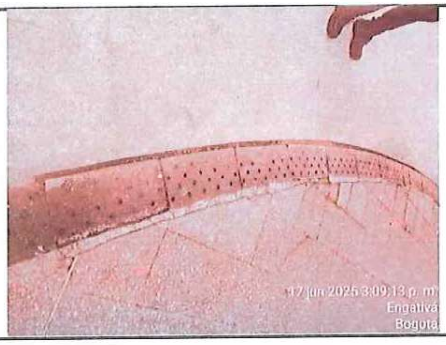





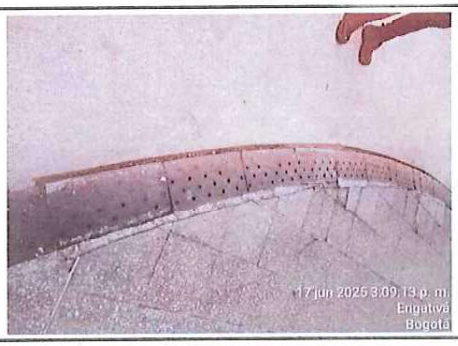

FOTOS

Emboquillado y llenó de cintas dilatadores en pista de patinaje


BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO
IDRD 1

CEFE COMETAS CÓD. 11-204

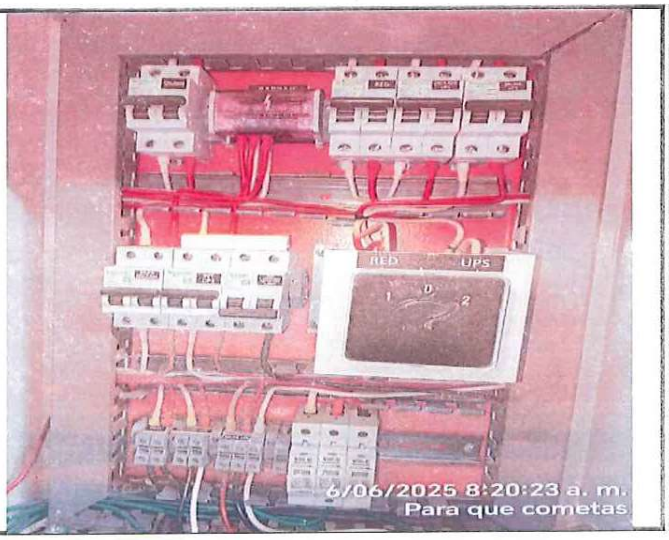







FOTOS
Revisión tableros eléctricos

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 13
BITÁCORA ESTADIO OLAYA HERRERA

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Contrato de obra # 4060 de 2024

Contratista: Consorcio Belzcon IDRD 1.

Objeto: " Contrato mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuacion, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"

Parque: Estadio Olaya Herrera cod: 18-207

contrato de interventoria # 4080 de 2024

Interventoria: Consorcio Santa Teresa 028

Powered by CamScanner

ser recomendado cumplir con calidad
los especificaciones técnicos, del anexo
técnico de la cartilla del mobiliario.

Ronald Bravo.

Nota 184 Sabado 31 de Mayo de 2025
clima: Soleado
Personal: 1 oficial + 1 ayudante
Se continua con la excavación manual para
la cimentación de los modulos de servicio
Ronald Bravo

Nota 185 Martes 03 de Junio de 2025
clima: Soleado
Personal 1 oficial + 1 ayudante
Se continuan con las actividades de exca-
vación manual en la cimentación de los
modulos de servicio
Ronald Bravo

Nota 186 Se recuerda al contratista realizar la
verificación de niveles y ubicación de ele-
mentos con topografia segun el plan de
topografia aprobado
Ronald Bra

Norma

Powered by CamScanner

Nota 187: Miercoles 4 de Junio 2025.
Clima. soleado.
Personal: 1 inspector, 1 maestro, 3 oficiales
1 oyodonde.

Ronald bravo

Nota 188: la supervisoria observando el avance de las obras de descapote y excavacion de la zona donde se va a instalar el modulo sanitario, le requiere al contratista entregar el diseño de la propuesta arquitectonica, hidrosanitaria, estructural, topografia, con el fin de llevar un adecuado control del proyecto, la supervisoria ha requerido desde el inicio de las obras está documentacion y a la fecha no ha sido entregada por el contratista, se le recuerda tener en cuenta los lineamientos del anexo tecnico de la cartilla del mobiliario, es responsabilidad del contratista sobre excavaciones o mayores cantidades que deste sin ser

Norma

Powered by CamScanner

revisados y aprobados los planos de diseño y esbocharles como el de topografia ya que sin estos insumos la antaventoria no tiene con que coprobarar si lo que se viene decotando esta acorde a los diseños.

Ronald Moreno

Nota 189: Jueces 5 de Junio 2025.
Asunto: soleado.
Personal: 1 inspector, 1 maestro, 3 oficiales, 1 ayudante.

Ronald Moreno

Nota 190: La antaventoria requiere al contratista suministrar a cada personal de obra los EPPS minimos requeridos en el pliego de condiciones, ya que al dechar se observan personal sin casco y sin CASCO, se recuerda que es obligacion del contratista cumplir a cabalidad los obligaciones especificos.

Ronald Moreno.

Nota 191: se acanza en la excavacion

Norma

Powered by CamScanner
