
Id	Texto1	Nombre de tarea	Texto10	Texto11	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**OBRA PLAZOLETA TELECOM**			**126 días**	**vie 26/12/25**	**jue 30/04/26**	
2	**1.0**	**PRELIMINARES**			**60 días**	**vie 26/12/25**	**lun 23/02/26**	
3	1.1	Suministro e instalacion de cerramiento en lamina de zinc, altura 2,40 mts	ML	66,00	5 días	vie 26/12/25	mar 30/12/25	
4	1.2	Cerramiento provisional perimetral de porteccion en polisombra, con altura de 2,00 mts.	ML	50,00	7 días	vie 26/12/25	jue 1/01/26	3CC
5	1.3	Suministro e instalacion de campamento de obra (15m²)	UND	1,00	15 días	mié 31/12/25	mié 14/01/26	3
6	1.4	Nivelación, replanteo y señalización	M²	2.210,00	10 días	mié 31/12/25	vie 9/01/26	3
7	1.5	Limpieza general incluye retiro material sobrante	M²	2.210,00	50 días	lun 5/01/26	lun 23/02/26	11CC
8	1.6	Comisión topografia incluye topografo, cadenero y estacion total	DIA	3,00	3 días	mié 31/12/25	vie 2/01/26	6CC
9	1.7	Acopio de material y retiro de escombro en volqueta.	M3	222,10	50 días	lun 5/01/26	lun 23/02/26	7CC
10	**2.0**	**ESTRUCTURA**			**90 días**	**lun 5/01/26**	**sáb 4/04/26**	
11	2.1	Demolicion de adoquin y plantilla espesor de (0,05 - 0,10 mts) Incluye media caña (Equipo: Rotomartillo)	ML	1.103,84	20 días	lun 5/01/26	sáb 24/01/26	6CC+5 días
12	2.2	Demolicion de piso en granito pulido y plantilla espesor de (0,05 - 0,10 mts) Incluye media caña (Equipo Rotomartillo)	ML	1.148,42	45 días	dom 25/01/26	mar 10/03/26	11
13	2.3	Solado en concreto 2500 psi de 0,05 mts. (Terraza y Plazoleta)	M3	112,55	50 días	dom 25/01/26	dom 15/03/26	11
14	2.4	Fundida de plantilla nivelatoria, con inclinacion para el drenaje agua en concreto de 3500 psi pulido, impermeabilizado esp: 10 cmts. no incluye acero de refuerzo. (Equipo: Mixer Manual)	M²	1353,00	40 días	jue 19/02/26	lun 30/03/26	16CC+10 días
15	2.5	Corte perimetral de plantilla en concreto.	ML	2.210,00	35 días	jue 19/02/26	mié 25/03/26	14CC
16	2.6	Suministro e impermeabilización, imprimate con emulsión asfáltica, manto edil con foil en aluminio 3mm de 10 mt. Incluye media caña 0,20 mts.	M²	1.253,00	45 días	lun 9/02/26	mié 25/03/26	13CC+15 días
17	2.7	Suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante para Concreto	M²	1.353,00	40 días	jue 19/02/26	lun 30/03/26	14CC
18	2.8	Suministro y aplicación de sikadur 32 en concreto antiguo para rehabilitación de elementos estructurales.	M²	350,00	40 días	jue 19/02/26	lun 30/03/26	14CC
19	2.9	Suministro e instalacion de macro fibra sintetica (Reemplazo de una malla electrosoldada)	KG.	112,00	40 días	jue 19/02/26	lun 30/03/26	14CC
20	2.10	Resane en mortero de reparación para elementos de concreto. incluye recubrimiento de protección del acero de refuerzo.	M²	120,00	35 días	lun 9/02/26	dom 15/03/26	16CC
21	2.11	Corte y refracion de gradas externas (salida de aguas pluviales)	ML	10,00	15 días	sáb 21/03/26	sáb 4/04/26	33
22	2.12	Construccion de registro en concreto resvestidos con gres de 60 x 60 cm para bajante de aguas pluviales	UND	4,00	15 días	sáb 21/03/26	sáb 4/04/26	21CC
23	**3.0**	**ACABADOS**			**38 días**	**dom 15/03/26**	**mar 21/04/26**	
24	3.1	Suministro e instalación de piso en tableta de granito gran formato de 50x50 (Pulido, sellado y Brillo Final) (Dilatado con platina en pvc)	M²	1.010,83	30 días	lun 23/03/26	mar 21/04/26	14CC+80%
25	3.2	Guarda escoba y/o bisel de granito pulido.	ML	302,21	30 días	lun 23/03/26	mar 21/04/26	24CC
26	3.4	Suministro e instalacion de piso tipo Loseta de cemento de 40 x 40.Con respectivo emboquillado.	M²	1.103,62	30 días	dom 15/03/26	lun 13/04/26	14CC+60%
27	3.5	Suministro de zocalo y esquineros 0.10 x 0.30 tipo cementogres.	ML	66,00	30 días	dom 15/03/26	lun 13/04/26	26CC
28	**4.0**	**HIDRAULICO, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE**			**64 días**	**lun 9/02/26**	**lun 13/04/26**	
29	4.1	Reparacion de fugas de agua potable.	UND	10,00	30 días	lun 9/02/26	mar 10/03/26	20CC
30	4.2	suministro e instalación de rejillas para cárcamos en acero inoxidable con varilla de media a cada 0,5 mts.	ML	82,86	30 días	dom 15/03/26	lun 13/04/26	26CC
31	4.3	Construccion de cárcamo de concreto impermeabilizado de 3500 psi h efectiva =1,0m ancho 0,5	ML	82,86	30 días	jue 19/02/26	vie 20/03/26	14CC
32	4.4	Resvestimiento de carcamo en gres prefabricado según indicaciones. (30 ancho x 20 prof)	ML	82,86	30 días	dom 15/03/26	lun 13/04/26	26CC
33	4.5	suministro e instalacion de tuberia novafor 6" con reducion 4" cons 04 inspecciones a cada 25 mts según propuesta para descarga de agua pluviales.	ML	50,00	30 días	jue 19/02/26	vie 20/03/26	31CC
34		**ITEM NO PREVISTO**			**58,5 días**	**mar 3/03/26**	**jue 30/04/26**	
35	NP-01	Desmonte de cielo raso a una altura > 3.00 metros < 5.00 metros, incluye retiro de material, incluye estructura de soporte.	M²	935,00	30 días	mar 3/03/26	jue 2/04/26	16CC+50%
36	NP-02	Escarificación de pintura sobre muros existentes.	M²	480,00	30 días	mar 3/03/26	jue 2/04/26	35CC
37	NP-03	Escarificación de elementos estructurales en concreto altura >3.00 metros <5.00 metros.	M²	361,00	30 días	mar 3/03/26	jue 2/04/26	35CC
38	NP-04	Escarificación de pañete en muros existentes.	M²	336,00	30 días	mar 3/03/26	jue 2/04/26	35CC
39	NP-05	Pañete exterior allanado con mortero 1:4 impermeabilizado.	M²	336,00	30 días	mié 18/03/26	vie 17/04/26	38CC+50%
40	NP-06	Reparación estructural para elementos de concreto (Losas, Vigas y Columnas). Con mortero de reparación de alta resistencia, con limpieza y recubrimiento para protección del acero de refuerzo existente.	M²	361,00	20 días	mié 18/03/26	mar 7/04/26	37CC+50%
41	NP-07	Estuco plástico sobre muro sobre pañete allanado incluye lijado.	M²	450,00	25 días	jue 2/04/26	lun 27/04/26	39CC+50%
42	NP-08	Pintura en vinilo para muro interior, a tres manos tipo viniltex.	M²	450,00	21 días	vie 10/04/26	jue 30/04/26	41CC+30%
43	NP-09	Suministro e instalación de cielo raso en P.V.C.	M²	800,00	21 días	vie 10/04/26	jue 30/04/26	42CC
44	NP-10	Mantenimiento de piso en ceramica existente	M²	561,00	30 días	sáb 28/03/26	lun 27/04/26	40CC+50%
45	NP-11	Suministro e instalacion de ceramica para piso existente	M²	374,00	30 días	sáb 28/03/26	lun 27/04/26	44CC

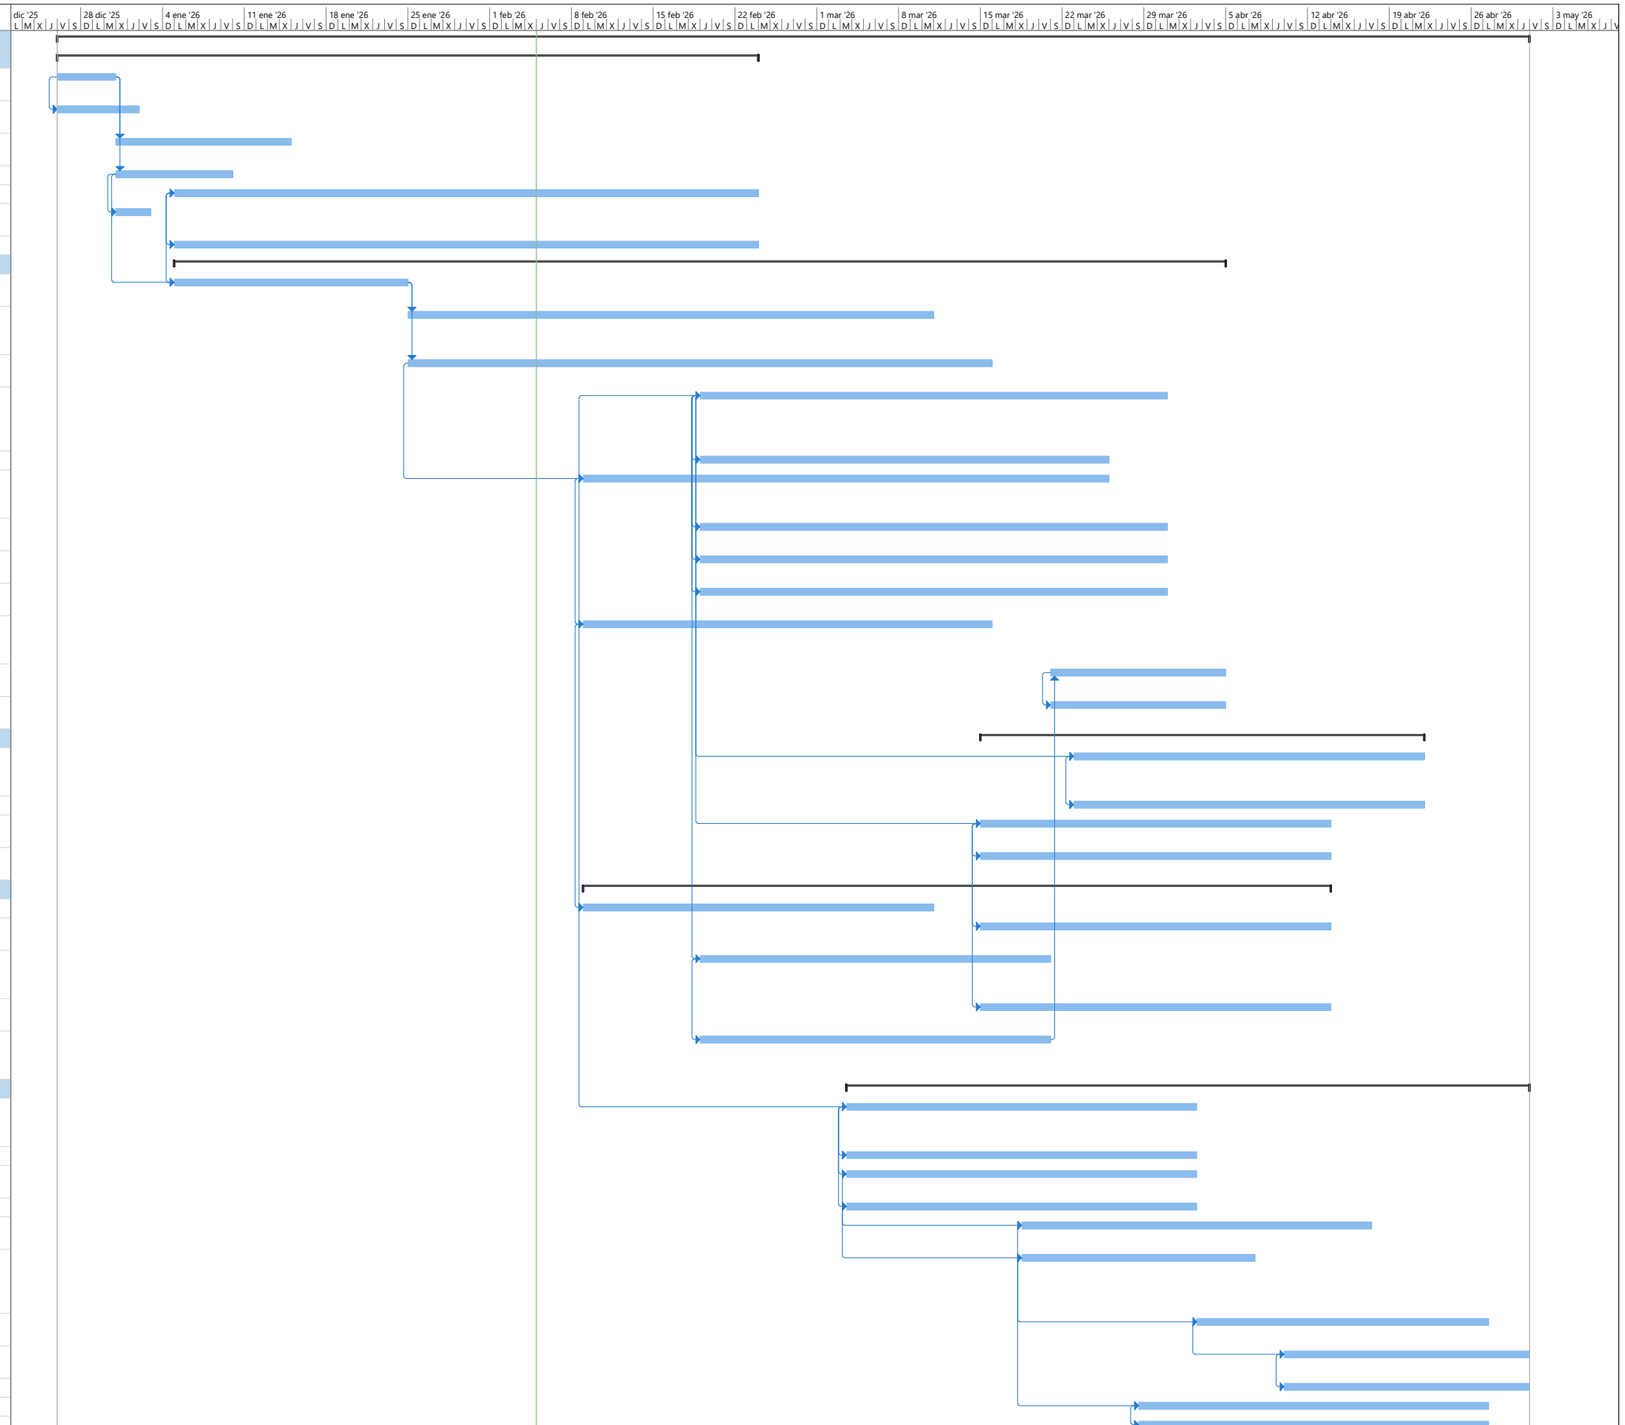

C8 CONSTRUCCIONES SAS

CECONSA SAS

Vo Bo SUPERVISOR
