	ORDEN DE PEDIDO NO. 286	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 21 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAN ANDRÉS)

FECHA DE ENTREGA ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
GEOTEXTIL NT 1600S 1 X 3.5 PAVCO M2	M	8	$ 15.126	$ 121.009
			IVA 19%	$ 22.992
TOTAL				$ 144.000,47

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: FERREDEPOSITO G Y G S.A.S **FORMA DE PAGO:** CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Material requerido para completar el geotextil en la zona infantil entregado el 17 de julio de 2025

Firma Solicitante Director de Obra

David Ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 287	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 21 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL RECREO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	7	$ 100.840	$ 705.882
CEMENTO X 50 KL CEMEX	UND	14	$ 29.412	$ 411.765
METRO MIXTO	M3	2	$ 151.261	$ 302.521
ACARREO	GLB	1	$ 60.000	$ 60.000
			IVA 19%	$ 269.832
TOTAL				$ 1.750.000,59

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: FERREDEPOSITO G Y G S.A.S FORMA DE PAGO: CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N° 052416211

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para conformación de senderos zonas gimnasio biosaludable y canchas de baloncesto del Parque El Recreo.

Firma Solicitante
Director de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 288	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 22 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE TIMIZA)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
BARRA CORRUGADA G-60 1/2 PG X 6MTS DIACO	UND	12	$ 23.100	$ 277.200
BARRA CORRUGADA G-60 3/8 PG X 6MTS DIACO	UND	13	$ 13.450	$ 174.850
CEMENTO GRIS TP1CEMEX SUPERRESISTENTE50K	UND	12	$ 33.400	$ 400.800
SV FLETE ADICIONAL X 100.000 PESOS	UND	1	$ 102.600	$ 102.600
SV FLETE ADICIONAL X 10.000 PESOS	UND	2	$ 10.290	$ 20.580
DESCUENTO				$ 12.680
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 963.350

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) FORMA DE PAGO: CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para viga de cimentación y malla en cerramiento junto a puerta de acceso a parque Timiza costado sur

Firma Solicitante
Residente de Obra

David ortiz S.
Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 289	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 28 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DAVID PATIÑO

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE ESADIO OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 6"	UN	6	$ 5.500	$ 33.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 6.270
TOTAL				$ 39.270

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere recolección y fallo de las muestras de concreto por temas de calidad de obra.
Ensayo de compresión para muestras de concreto para la conformación del concreto ciclópeo Cimentación modulo de camerinos

Firma Solicitante
Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 291	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 28 (DÍA) | 7 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DAVID PATIÑO

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE ESADIO OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto 6"	UN	6	$ 5.500	$ 33.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 6.270
TOTAL				$ 39.270

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Ensayo de compresión para muestras de concreto cimentación modulo de baños, pedestal y viga de cimentación

Firma Solicitante
Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-186000
Fecha: 2025-07-01 13:18:46
Cajero: Luis
Placa: AMA959 PIN Volqueta: 20229
CLIENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Recibo No. 0086 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: SENCILLO- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PORTE DE MATERIALES
NAL DE ESCOMBROS

Vale No. 0087

AMA 959

ún

ía

HORA SALIDA:

HORA LLEGADA:

ECEPCIÓN

954

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.458.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-186091
Fecha: 2025-07-02 07:38:16
Cajero: Luis
Placa: AMA959 PIN Volqueta: 20225
CLIENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Recibo No. 0087 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: SENCILLO- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

TRANSPORTE DE MATERIALES
CION FINAL DE ESCOMBROS

Vale No. 0086

laca AMA 959

Olaya

arillas

BIDO

ecebo común

600

ajón

rena de peña

rena de rio

Gravilla 1/2

Gravilla 3/4

Otro:

(m3): 7,0 m³

HORA SALIDA:

HORA LLEGADA:

FIRMA RECEPCIÓN

bre:

esa:

955

SECAM J.R. S.A.S

NIT. 830.507.163-0

DESPACHADO

SECAM JR
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO C
RES.0472-2017 MIN AMBIENT
DESARROLLO - CEL: 314 48

Recibo Número:3950

Placa: AMA859
Bruto: 14440
Tara: 6170
Neto: 8270
Precio: 0
Entrada: 7/07/2025 1:56:03 p. m.
Salida: 7/07/2025 2:24:24 p. m.
Empresa: INDEPENDIENTE
Producto: SUB BASE GRAN TIPO PE
Conductor: JOSE ARIZA
Origen: PARQUE AYALA
Nota: 8 M3

956

FERREDEPOSITO G Y G S.A.S
NIT 901.181.988-5
CRA 5 32 31
Tel: (57) 3214816882
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-493

Para	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Nit	901.886.663-3
Fecha	2025-07-07

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CEMENTO X 50 KL CEMEX	2.00	29,412.00	70,000.56
2	LONA ARENA MIXTO	10.00	6,722.70	80,000.13
3	ACARREO	1.00	60,000.00	60,000.00

Total Bruto	186,051.00
Subtotal	186,051.00
IVA 0%	0.00
IVA 19%	23,949.69
Total a Pagar	210,000.69

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Adriana De La
larochela84@hotmail.com
(601) 5672958

Contrato acoatico.

Recibido
Felipe Ardila
Inspector de obra

Powered by CamScanner

957



FERREDEPOSITO G Y G S.A.S
NIT 901.181.988-5
CRA 5 32 31
Tel: (57) 3214816882
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-492

Para	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Nit	901.886.663-3
Fecha	2025-07-07

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CEMENTO X 50 KL	3.00	29,411.80	105,000.13
2	LONA ARENA MIXTO	15.00	6,722.70	120,000.20
3	ACARREO	1.00	60,000.00	60,000.00

Total Bruto	249,075.90
Subtotal	249,075.90
IVA 0%	0.00
IVA 19%	35,924.43
Total a Pagar	285,000.33

Adriana De La
larochela84@hotmail.com
(601) 5672958

Ciudadelo Nuevos

Recibido
Felipe Ardila
Inspector de obra

Powered by CamScanner

958

IMPOGRIFOS

IMPOGRIFOS SAS
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com

FORMATO DE ENTREGA
NO.00242975

CLIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**FECHA**
DIRECCION	**AV CR 63#60-80 SIMON BOLIVAR**	8/7/2025

ITEM	CANTIDAD
CODO PRESION 2"	4
CODOM PRESION 1/2"	1
TEE PRESION 1/2"	1
UNION PRESION 1/2"	2

RECIBE :

Powered by CamScanner

959

IMPOGRIFOS

IMPOGRIFOS SAS
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com

FORMATO DE ENTREGA
NO.00242977

CLIENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**FECHA**
DIRECCION	UDS	9/7/2025

ITEM	CANTIDAD
FLUXOMETRO BAJO CONSUMO	4
SIFON PISO 10 X 10	1

RECIBE :

Powered by CamScanner

960

Concremóvil	CLIENTE: BELZCON SAS CL 105 46 26 P2 Bogotá D.C. 8052552	DIRECCIÓN DE ENTREGA: PARQUE EL PORVENIR PARQUE EL PORVENIR, .	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 4/07/2025 REMISIÓN: 24975

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
7,00	BOMBA ESTACIONARIA-(19%)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACION DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
07:49				
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JOSE_LUIS LUIS GONZALEZ MALDONADO	LLQ-327	23071		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ _____

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ _____

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

961

Concremóvil	CLIENTE: BELZCON SAS CL 105 46 26 P2 Bogotá D.C. 8052552	DIRECCIÓN DE ENTREGA: PARQUE EL PORVENIR PARQUE EL PORVENIR, ,	PLANTA: BOGOTÁ - CAZUCÁ FECHA: 4/07/2025 REMISIÓN: 24978

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	C-3000-4-28-6 (Bombeo Normal 210,00 kg/cm² 28 dias Comun 6 plg)
7,00	BOMBA ESTACIONARIA-(19%)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACION DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
09:21	10:30	10:35		
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JULIAN EDUARDO RAMIREZ SUAREZ	WOO-912	23072		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas vigentes establecidas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones. Hora y firma indicada:

Santana CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)	John Santana NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 [illegible] conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)	NOMBRE

962



IMPOGRIFOS SAS
NIT.901446623
CARERRA 58 # 97A - 26
3123592294
impogrifos@gmail.com

FORMATO D
NO.002

IENTE	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**FEC**
RECCION	**PARQUE COUNTRY**	8/7/

ITEM	CAN
NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 4"	
NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 20"	
NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 3"	
TEE GALVANIZADO 1/2"	
CODO GALVANIZADO 1/2"	
TAPON ROSCA INTERNA GALVANIZADO 1/2"	
CINTA TEFLON 3/4 MAESTRO	
VALVULA BOLA PCP ROSCADO 1/2"	
UNION GALVANIZADO 1/2"	
NIPLE GALVANIZADO 1/2"	
TAPA REGISTRO 20X20	

CONSTRUCCIONES DFL

REMISION

No
18

FECHA: 0 5 - 06 - 2025	**OFICINA:** BOGOTA (Cund))		
PLACA: BEQ388	**CONDUCTOR:** CESAR ANTONIO ANTOLINEZ		**CÉDULA:** 1.024.502.586
REMITENTE: CONSTRUCCIONES DFL SAS	**CIUDAD:** BOGOTA	**DIRECCIÓN:** CRA 71 C 53 A 10 SUR	**TEL:** 9457549
DESTINATARIO: CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CIUDAD:** BOGOTA	**DIRECCIÓN:** PARQUE PALESTINA	**TEL:**

CANTIDAD	CONTENIDO
5.270 KG	CAUCHO SBR NEGRO

Observaciones: Bogotá barrio Olarte cr 71 c 53 a 10 sur Tel:9457549 Celular:3134421809 Correo:	Entregado por: Firma y sello	Recibido por: Nombre: Celular: Cargo:

964

CONSTRUCCIONES DFL

REMISION

No
19

FECHA: 0 5 - 06 - 2025	**OFICINA:** BOGOTA (Cund))		
PLACA: BEQ388 **CONDUCTOR:** CESAR ANTONIO ANTOLINEZ			**CÉDULA:** 1.024.502.586
REMITENTE: CONSTRUCCIONES DFL SAS	**CIUDAD:** BOGOTA	**DIRECCIÓN:** CRA 71 C 53 A 10 SUR	**TEL:** 9457549
DESTINATARIO: CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CIUDAD:** BOGOTA	**DIRECCIÓN:** PARQUE PALESTINA	**TEL:**

CANTIDAD	CONTENIDO
1.200 KG	CAUCHO EPDM COLORES VARIOS
650KG	RESINA

Observaciones: Bogotá barrio Olarte cr 71 c 53 a 10 sur Tel:9457549 Celular:3134421809 Correo:	Entregado por: Firma y sello CONSTRUCCIONES DFL NIT. 900.814.668-3	Recibido por: Nombre: Celular: Cargo:

965

CONSTRUCCIONES DFL

REMISION

No 20

FECHA: 14 - 07 - 2025	**OFICINA:** BOGOTA (Cund))		
PLACA: BEQ388	**CONDUCTOR:** CESAR ANTONIO ANTOLINEZ		**CÉDULA:** 1.024.502.586
REMITENTE: CONSTRUCCIONES DFL SAS	**CIUDAD:** BOGOTA	**DIRECCIÓN:** CRA 71 C 53 A 10 SUR	**TEL:** 9457549
DESTINATARIO: CONSORCIO BELZCON IDRD 1	**CIUDAD:** BOGOTA	**DIRECCIÓN:** PISTA PORVENIR	**TEL:**

CANTIDAD	CONTENIDO
4.200 KG	CAUCHO SBR NEGRO
3.200KG	CAUCHO EPDM TERRACOTA
1.140KG	RESINA

Observaciones: Bogotá barrio Olarte cr 71 c 53 a 10 sur Tel:9457549 Celular:3134421809 Correo:	Entregado por: Firma y sello	Recibido por: Nombre: Celular: Cargo:

CONSTRUCCIONES DFL NIT: 900.814.668-8

CONSTRUCCIONES DFL

0083

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-183418
Fecha: 2025-06-17 16:02:18
Cajero: Luis
Placa: AMA959 PIN Volqueta: 20229
CLIENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Recibo No. 0083 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: SENCILLO- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
S Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS

Vale No. 0083

260

025 Placa AMA 959

Stadio Olaya II

s Amarillas

RECIBIDO

- Recebo común
- B-600
- Rajón
- Arena de peña
- Arena de rio
- Gravilla 1/2
- Gravilla 3/4
- Otro:

Cant (m3): 7.0 m3

HORA SALIDA:

HORA LLEGADA:

FIRMA RECEPCIÓN

Nombre:

Empresa:

2 104V-1

967

ANEXO 7
CONTROL EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

JED INGENIERIA.
ING. JORGE ENRIQUE DIAZ PALACIOS.
NIT. 79´327.738-9
DIRECCION: CALLE 6 No. 3A-22 Este
TELEFONOS: 2461386 FAX 3280472
CELULAR: 315 0484858
Email: jedingcolombia@yahoo.es

MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE ESTACIONES TOTALES, TEODOLITOS, NIVELES Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFIA. DE LAS MARCAS TOPCON, PENTAX, FOIF Y SOUTH ENTRE OTRAS.



Bogotá D.C., marzo 22 de 2025

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ESTACIÓN

No.: 2742

EQUIPO: Estación **MARCA: Hi Target** **REF.: HTS-420R** **SERIAL: H236544**

CLIENTE: RM INGENIERIA SAS **DIRECCION:** DG 70 C SUR 78-37 Bogotá D.C.

Teléfono: **Celular:** 3204739137

Fax: **Email:** rmi.topografia@gmail.com

La revisión y calibración se efectúa siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.
DIAGNÓSTICO Y AJUSTE

Base nivelante	___2___	**Lente interno**	___6___
Tornillos nivelantes	___1___	**Base del retículo**	___3___
Movimiento horizontal	___2___	**Retículo**	___2___
Movimiento vertical	___2___	**Objetivo**	___3___
Displays	___3___	**Teclados**	___3___
Plomada Láser	___2___	**Verticalidad**	___2___
Plomada óptica	__NA__	**Compensador**	___2___
Nivel circular	___2___	**Batería**	___6___
Nivel tubular	___2___	**Cargador**	___NA___

1. Cambio de grasas 2. Ajuste 3. Limpieza 4. Reparación 5. Cambio 6. En buen estado (O.k.)
Otros:

Parámetro o componente	**Error permitido**	**Ajuste**
Plomada óptica o láser	1mm o menos	si__x__ no_____
Nivel tubular	¼ o menos de los límites	si__x__ no_____
	Extremos de la escala de nivel	
Nivel del circular	1/3 o menos de la escala del nivel	si__x__ no_____
Perpendicularidad de la línea de la Plomada	10" o menos	si____ no __x__
Doble centrado	10" o menos	si____ no__x__
Mira de colimación	20´	si____ no __x__
Excentricidad entre el standard Y el circulo de vertical	10" o menos	si ____ no __x_
Posición de instalación del circulo Vertical.	+ o – 3 grados desde el "O" Posición.	si ____ no__x___
Compensador	Punto cero + o – 30" exactitud + 00.03´00"	si_____no___x__

JED INGENIERIA.
ING. JORGE ENRIQUE DIAZ PALACIOS.
NIT. 79´327.738-9
DIRECCION: CALLE 6 No. 3A-22 Este
TELEFONOS: 2461386 FAX 3280472
CELULAR: 315 0484858
Email: jedingcolombia@yahoo.es

MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE ESTACIONES TOTALES, TEODOLITOS, NIVELES Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFIA. DE LAS MARCAS TOPCON, PENTAX, FOIF Y SOUTH ENTRE OTRAS.



TEST DE EXACTITUD ANGULO HORIZONTAL

Error antes de calibración ángulo Horizontal: 10"

REFERENCIA	A
P1	00.00´00"
P2	180.00´00"
ERROR	00.00´00"

TEST DE EXACTITUD ANGULO VERTICAL

Error antes de calibración ángulo Vertical: 20"

P1	90.00´00"
P2	270.00´00"
ERROR	00.00´00"

Error máximo permitido 10" respectivamente

TEST DE EXACTITUD DEL DISTANCIOMETRO

Pista patrón (m)	M1	M2	M3	M4	M5	Promedio	Error	Ajuste	Distancia final
5.080	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079	1mm	-------	5.079

Tolerancia permitida: : +/- (2mm + 2ppm)

Patrón utilizado: Colimador marca South LF-3C y pistas patronadas

Nota: Este equipo sale en óptimas condiciones operativas y de funcionamiento.

La validez de este certificado es de seis meses a partir de la fecha de expedición.
Fecha de Caducidad: septiembre 22 de 2025

Jorge Enrique Díaz

ING. JORGE DIAZ
Ingeniero Servicio Técnico

JED INGENIERIA.
ING. JORGE ENRIQUE DIAZ PALACIOS.
NIT. 79´327.738-9
DIRECCION: CALLE 6 No. 3A-22 Este
TELEFONOS:
CELULAR: 315 0484858
Email: jedingcolombia@yahoo.es

MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE ESTACIONES TOTALES, TEODOLITOS, NIVELES Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFIA. DE LAS MARCAS TOPCON, PENTAX, FOIF Y SOUTH ENTRE OTRAS.



Bogotá D.C., mayo 10 de 2025

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NIVELES

No.: 2805

EQUIPO: Nivel **MARCA:** Hi Target **REF.:** HT32 **SERIAL:** 332060172

CLIENTE: RM INGENIERIA SAS **DIRECCION:** DG 70 C SUR 78-37 Bogotá D.C.

Teléfono: **CELULAR:** 3204739137

Este Certificado tiene 6 meses de vigencia a partir de su elaboración, bajo buen uso y guardando las precauciones propias para este clase de instrumentos.

La revisión y calibración se efectúa siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

DIAGNÒSTICO Y AJUSTE

Base nivelante	____1____
Tornillos nivelantes	____2____
Movimiento lento	___o.k___
Lente objetivo	___o.k___
Retícula	____2____
Compensador	___o.k___
Enfoque	___o.k___
Nivel circular	____2____
Lente interno	___o.k___

Otros:
1. Cambio de grasas 2.Ajuste 3. Limpieza 4. Reparación 5. Cambio 6. En buen estado (O.k.).

ERROR ANTES DE CALIBRACIÒN

Punto 1		Punto 2	
Lectura 1	164mm	Lectura 1	170mm
Lectura 2	162mm	Lectura 2	169mm
Error 1	2mm	Error 2	1mm

ERROR 2 – ERROR 1 = 1 mm

JED INGENIERIA.
ING. JORGE ENRIQUE DIAZ PALACIOS.
NIT. 79´327.738-9
DIRECCION: CALLE 6 No. 3A-22 Este
TELEFONOS: 2461386 FAX 3280472
CELULAR: 315 0484858
Email: jedingcolombia@yahoo.es

MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REPARACION DE ESTACIONES TOTALES, TEODOLITOS, NIVELES Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFIA. DE LAS MARCAS TOPCON, PENTAX, FOIF Y SOUTH ENTRE OTRAS.



Patròn utilizado: Colimador Marca South LF-3C

Parámetro o componente	Error permitido	Ajuste
Nivel del circular	1/3 o menos de la escala del nivel (3mm).	si____ no__x__
Distancia stadiamétrica	0.4% max 7"	si____ no__x__
Mira de colimación	20´	si____ no__x__
Exactitud del compensador	0.33"	si____ no__x__
Rango de compensación	+ o – 3 15"	si____ no__x__
Línea de visualización visual	+ o – 20" máximo	si____ no__x__
Excentricidad de la escala circular	0.25 de la graduación máxima	si____ no__x__
Precisión		

Nota: Los ajustes realizados al nivel están en el rango de error máximo permitido especificado por cada parámetro en el cuadro anterior dado por las especificaciones del fabricante.

Fecha de Caducidad: noviembre 10 de 2025

Jorge Enrique Díaz

ING. JORGE DIAZ
Ingeniero Servicio Técnico

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No.: IDRD SG 4060 - 2024 FECHA: 01 Julio 2025

ESTACION TOPOGRAFICA


EQUIPO Estación Total Hi Target HTS-420 R4

PRECISIÓN 2"

CÓDIGO H236544

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación? SI [X] NO [ ]

EN	HACIA	D OBSERVADO
1		
	3	00°00`00``
	2	63° 28' 50"
2		
	1	00°00`00``
	3	54° 55' 30"
3		
	2	00°00`00``
	1	61° 35' 22"
	S D DERECHO	



Sumatoria D observado	=	180 00 02
n - 2	=	1
Diferencia	=	00 00 02
e = a*n	=	6"

e: Error máximo permisible
a = Precisión del equipo
n= número de vertices
Distancia mínima 50 ml

APTO PARA TRABAJAR SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

El Equipo se Encuentra en optimas Condiciones de trabajo, se Recomienda calibración cada 6 meses.

ELABORO: Firma Rodrigo Mosquera Ibañez.
(Nombre) Rodrigo Mosquera Ibañez.
(Cargo) Topografo

Nota: Estos chequeos deben realizarse máximo cada 15 días, si el equipo no se considera apto para trabajar, no puede ser usado en obra.

Rodrigo Mosquera

Topografia: Bellzcon SAS

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No.: IDRD SG 4060-2024 FECHA: 01 Julio 2025

OBJETO: CONTROL Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA NIVEL


CONTRATISTA: BELLZCON SAS INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA

PARQUE: GRUPO 2 - Mantenimiento y Adecuación, Reparación, INFRAESTRUCTURA de los Parques.

NIVEL AUTOMATICO

EQUIPO HI TARGET HT-32 CODIGO 33206172

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación? SI [X] NO [ ]

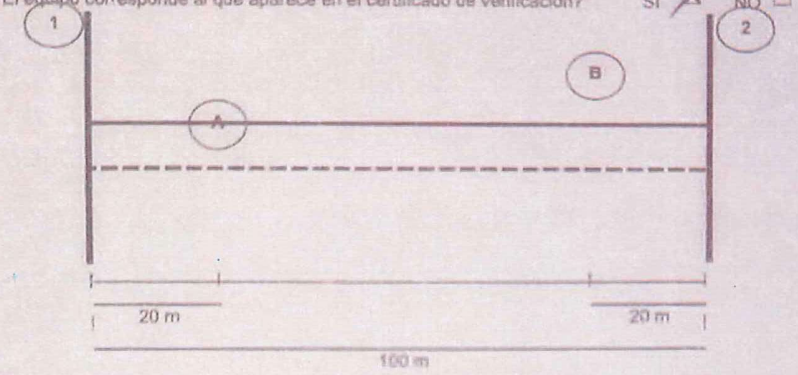

LECTURAS

A1= 1.364 mm		B1= 1.714 mm	
A2= 0.782 mm		B2= 1.133 mm	
A1 - A2= 0.582 mm		B1 - B2= 0.581 mm	

DIFERENCIA DETECTADA 0,001 mm

APTO PARA TRABAJAR SI [X] NO [ ]

COMPROBACION DE MIRAS

EQUIPO HI TARGET HT-32

PRECISIÓN 0,001 m

CÓDIGO 33206172

MIRA	EQUIPO PATRONADO	DIFERENCIA
1	Si	0,001
/	/	/

ESTADO ACTUAL

TIENE TODOS LOS CUERPOS	SI [X]	NO [ ]
DOBLADA	SI [ ]	NO [X]
LEGIBLE	SI [X]	NO [ ]

APTO PARA TRABAJAR SI [X] NO [ ]

Rodrigo Mosquera Ibañez C.
Topografia

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No.: IDRD SG 4060-2024 FECHA: 16 Julio 2025

ESTACION TOPOGRAFICA


EQUIPO ESTACIÓN HS TARGET HTS-402 PM

PRECISIÓN 2"

CÓDIGO H 236544

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación? SI [X] NO [ ]

EN	HACIA	D OBSERVADO
1		
	3	00°00'00"
	2	56° 35' 18"
2		
	1	00°00'00"
	3	69° 28' 50"
3		
	2	00°00'00"
	1	53° 55 50
	S D DERECHO	



Sumatoria D observado	=	179° 59' 58"
n - 2	=	1
Diferencia	=	00° 00' 02"
e = a*n	=	6"

e: Error máximo permisible
a = Precisión del equipo
n= número de vertices
Distancia mínima 50 ml

APTO PARA TRABAJAR SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

Se Recomienda Calibración del Equipo cada 6 meses,
El Equipo se encuentra en buenas Condiciones para trabajar

ELABORO: Firma Rodrigo Mosquera Ibañez
(Nombre) Rodrigo Mosquera Ibañez
(Cargo) Topografia

Nota: Estos chequeos deben realizarse máximo cada 15 días, si el equipo no se considera apto para trabajar, no puede ser usado en obra.

BOGOTÁ

CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No.: IDRD SG 4060-2024 FECHA: 16 de Julio 2025

OBJETO: Control y Verificación del Nivel Optimo Mecanico


CONTRATISTA: Belzcon SAS INTERVENTORIA:

PARQUE: Grupo 2 Mantenimiento Adecuación Reparación Infraestructura de los parques que integran el

NIVEL AUTOMATICO

EQUIPO HI TARGET HT-32 CODIGO 332060172

El equipo corresponde al que aparece en el certificado de verificación? SI ☐ NO ☐

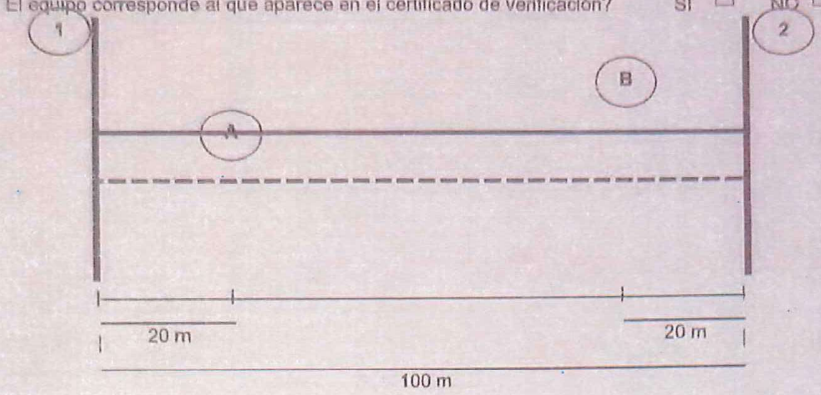

LECTURAS

A1= 1.160	mm	B1= 1.406	mm
A2= 1.071	mm	B2= 1.317	mm
A1 - A2= 0.089	mm	B1 - B2= 0,089	mm

DIFERENCIA DETECTADA 0,000 mm

APTO PARA TRABAJAR SI ☒ NO ☑

COMPROBACION DE MIRAS

EQUIPO HI TARGET HT-32

PRECISIÓN 1.00 mm

CÓDIGO 332060172

MIRA	EQUIPO PATRONADO	DIFERENCIA
1	Si	0,000
/	/	/

ESTADO ACTUAL

TIENE TODOS LOS CUERPOS	SI ☒	NO ☐
DOBLADA	SI ☐	NO ☒
LEGIBLE	SI ☒	NO ☐
APTO PARA TRABAJAR	SI ☒	NO ☐

Rodrigo Mosquera Ibañez
Topografia Belzcon

ANEXO 8

CONTROL DE MATERIALES

IDRD | BOGOTÁ	FORMATO PARA CONTROL - INVENTARIO DE MATERIALES	CÓD	BZC-FO-5-13-A
	NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO IDRD-SG-4060-2024	VERSIÓN	1

ARTICULO / DESCRIPCION	CATEGORIA	No DE ORDEN DE PEDIDO	FECHA DE INGRESO	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONCRETO BOMBEABLE 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 6"	Materiales	OP-	4-jul-2025	M3	14,00	$ -	$ -
ARENA PEÑA	Materiales	OP-	4-jul-2025	M3	7,00	$ -	$ -
ARENA MIXTO	Materiales	OP-	4-jul-2025	M3	2,00	$ -	$ -
ARENA PEÑA	Materiales	OP-	4-jul-2025	M3	7,00	$ -	$ -
CEMENTO GRIS x 50 KG	Materiales	OP-	9-jul-2025	UN	15,00	$ -	$ -
FLUXOMETRO PALANCA ENORME CON FITTINGS PARA CONECTAR	Materiales	OP-	9-jul-2025	UN	4,00	$ -	$ -
SIFON REJILLA CUADRADO	Materiales	OP-	9-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA	Materiales	CM-	9-jul-2025	GAL	1,50	$ -	$ -
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Materiales	CM-	9-jul-2025	GAL	1,00	$ -	$ -
PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA x AEROSOL	Materiales	CM-	9-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
PINTURA KORAZA COLOR BLANCO x 5 GAL	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	2,00	$ -	$ -
ESPATULA 4"	Equipo y/o herramienta	OP-	10-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
SUPERMASTICK x GAL	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
RODILLO 4"	Equipo y/o herramienta	OP-	10-jul-2025	UN	2,00	$ -	$ -
RODILLO 2"	Equipo y/o herramienta	OP-	10-jul-2025	UN	2,00	$ -	$ -
RODILLO 1"	Equipo y/o herramienta	OP-	10-jul-2025	UN	3,00	$ -	$ -
BROCHA 2"	Equipo y/o herramienta	OP-	10-jul-2025	UN	2,00	$ -	$ -
CERRADURA BOLA BAÑO	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	3,00	$ -	$ -
CERRADURA YALE SOBREPONER	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
ARENA PEÑA	Materiales	OP-	10-jul-2025	LONA	4,00	$ -	$ -
ARENA MIXTO	Materiales	OP-	10-jul-2025	LONA	24,00	$ -	$ -
CEMENTO GRIS x 50 KG	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	6,00	$ -	$ -
THINNER x GAL	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	4,00	$ -	$ -
VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH PARA SANITARIO	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	3,00	$ -	$ -
SIFON BOTELLA LAVAMANOS	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	8,00	$ -	$ -
BUJE SANITARIO SOLDADO 3"X2"	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	8,00	$ -	$ -
BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	8,00	$ -	$ -
ACOPLE LAVAMANOS / LAVAPLATOS 60CM	Materiales	OP-	10-jul-2025	UN	4,00	$ -	$ -
CODO PVC-P 4"	Materiales	OP-	11-jul-2025	UN	2,00	$ -	$ -
UNION DRESSER 4"	Materiales	OP-	11-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
TUBO PVC-P 4"	Materiales	OP-	11-jul-2025	M	1,00	$ -	$ -
UNION PVC-P 4"	Materiales	OP-	11-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
SOLDADURA PVC x 1/16 GAL	Materiales	OP-	11-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
LIMPIADOR PVC x 1/8 GAL	Materiales	OP-	11-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
CAUCHO SBR COLOR NEGRO	Materiales	SUB-CONTRATISTA	14-jul-2025	KG	4200,00	$ -	$ -
CAUCHO EPDM COLOR TERRACOTA	Materiales	SUB-CONTRATISTA	14-jul-2025	KG	3200,00	$ -	$ -
RESINA	Materiales	SUB-CONTRATISTA	14-jul-2025	KG	1140,00	$ -	$ -
CERAMICA PISO AQUA BLANCO 30x30 CM x CAJA 1,86 M2	Materiales	OP-	14-jul-2025	UN	5,00	$ -	$ -
CERAMICA PARED BERNA GRIS 30x45 CM x CAJA 1,89 M2	Materiales	OP-	14-jul-2025	UN	20,00	$ -	$ -

PARQUE	PROVEEDOR
PARQUE PORVENIR	CONCREMOVIL
PARQUE EL RECREO	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE EL RECREO	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE EL RECREO	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE EL RECREO	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE UDS	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE UDS	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE LA FLORIDA	TONOCOLOR SAS
PARQUE LA FLORIDA	TONOCOLOR SAS
PARQUE LA FLORIDA	TONOCOLOR SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE LA FLORIDA	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE LA FLORIDA	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE LA FLORIDA	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE LA FLORIDA	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE LA FLORIDA	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE LA FLORIDA	IMPOGRIFOS SAS
CANCHA TECHO	IMPOGRIFOS SAS
CANCHA TECHO	IMPOGRIFOS SAS
CANCHA TECHO	IMPOGRIFOS SAS
CANCHA TECHO	IMPOGRIFOS SAS
CANCHA TECHO	IMPOGRIFOS SAS
CANCHA TECHO	IMPOGRIFOS SAS
PARQUE PORVENIR	CONSTRUCCIONES DFL SAS
PARQUE PORVENIR	CONSTRUCCIONES DFL SAS
PARQUE PORVENIR	CONSTRUCCIONES DFL SAS
PARQUE LA FLORIDA	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE LA FLORIDA	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)

SANITARIO TAIRONA BLANCO	Materiales	OP-	14-jul-2025	UN	3,00	$ -	$ -
PEGACOR INTERIOR BLANCO x 25 KG	Materiales	OP-	14-jul-2025	UN	8,00	$ -	$ -
BOQUILLA CONCOLOR BLANCO x 5 KG	Materiales	OP-	14-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA	Materiales	CM-	15-jul-2025	GAL	0,50	$ -	$ -
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	Materiales	CM-	15-jul-2025	GAL	0,50	$ -	$ -
CEMENTO GRIS x 50 KG	Materiales	CM-	21-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
IMPERMEABILIZANTE KRISTOL T1	Materiales	SUB-CONTRATISTA	23-jul-2025	GAL	5,00	$ -	$ -
ARENA PEÑA	Materiales	OP-	23-jul-2025	M3	7,00	$ -	$ -
CEMENTO GRIS x 50 KG	Materiales	OP-	24-jul-2025	UN	14,00	$ -	$ -
ARENA RIO	Materiales	OP-	24-jul-2025	M3	1,00	$ -	$ -
GRAVA	Materiales	OP-	24-jul-2025	M3	1,00	$ -	$ -
CEMENTO GRIS x 50 KG	Materiales	CM-	25-jul-2025	UN	1,00	$ -	$ -
ARENA MIXTO	Materiales	CM-	25-jul-2025	LONA	2,00	$ -	$ -
PINTURA VINILO COLOR GRIS	Materiales	CM-	25-jul-2025	GAL	1,00	$ -	$ -
CEMENTO GRIS x 50 KG	Materiales	OP-	28-jul-2025	UN	12,00	$ -	$ -
VARILLA CORRUGADA 3/8" x 6M	Materiales	OP-	28-jul-2025	UN	13,00	$ -	$ -
VARILLA CORRUGADA 1/2" x 6M	Materiales	OP-	28-jul-2025	UN	12,00	$ -	$ -
ARENA PEÑA	Materiales	CM-	29-jul-2025	M3	2,00	$ -	$ -
		VALOR TOTAL DE INSUMOS EN OBRA				$	-

PARQUE LA FLORIDA	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE LA FLORIDA	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE LA FLORIDA	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE PALESTINA	FERREVIDRIOS ESCAVARO
PARQUE PALESTINA	FERREVIDRIOS ESCAVARO
PARQUE RECREO	SANDOVAL SANDOVAL MISAEL (FERRELECTRICOS JSJP)
PARQUE CAYETANO CAÑIZARES	ARIN CONSTRUCCIONES
PARQUE EL RECREO	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE EL RECREO	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE EL RECREO	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE EL RECREO	FERREDEPOSITO G Y G SAS
PARQUE PORVENIR	DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ (DEPOSITO Y FERRETERIA SANTA MARTA 1)
PARQUE PORVENIR	DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ (DEPOSITO Y FERRETERIA SANTA MARTA 1)
PARQUE PORVENIR	PINTU ACABADOS
PARQUE TIMIZA	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE TIMIZA	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE TIMIZA	CENCOSUD COLOMBIA SA (EASY)
PARQUE RECREO	DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ (DEPOSITO Y FERRETERIA SANTA MARTA 1)

OBSERVACIONES ADICIONALES:

OP= ORDEN DE PEDIDO
CM= CAJA MENOR

Firma persona Responsable	**Firma de aprobación Director de obra**	**Firma de aprobación de compras** David Ortiz S. **Director**	**Firma de aprobación Gerencia de proyectos**

btb

ANEXO 9

FORMATO ACTIVIDADES LIBERADAS

FECHA	# DE FOLIO BITACORA DE	# DE NOTA	ACTIVIDADES LIBERADAS JULIO 2025
ESTADIO OLAYA HERRERA			
1-Julio-25	79	230	Se avanzo con figurado y armado de acero de refuerzo de las vigas de cimentación de los módulos sanitarios y camerinos.
2-julio-25	80	232	Armado de acero de refuerzo de las vigas de cimentación según la instrucción dada por el especialista en la construcción de los módulos.
3-julio-25	81	235	por parte del contratista se recibe visita por parte del especialista en la construcción de modulo sanitario y definen la instalación de las redes hidrosanitarias se inicio con la excavación manual , armado de acero de refuerzo en vigas de cimentación.
4-julio-25	82	237	Se avanzo en la presentación de la tubería sanitaria del modulo sanitario.
5-julio-25	83	238	se realizo compactación de relleno con material local del área de módulos de camerinos.
7-julio-25	84	240	Actividades de simbrado de pilotes para posterior fundida de los mismos.
8-julio-25	85	248	El contratista avanzo en la instalación de redes sanitarias y red de agua potable , dejando el punto hidráulico en sitio , el cual se acomete desde la bodega mas cerca.
10-julio-25	87	252	se realiza la nivelación con subbase granular y la compactación en la zona de módulos de servicio.
11-julio-25	87	253	Instalación sanitaria para orinal de módulos.
	88	254	Continua instalación de subbase granular en la zona de modula de baños y rampa
12-julio-25		257	Se avanza en la excavación manual de las vigas de cimentación del modulo sanitario.
15-julio-25	89	261	Se avanza en la excavación de las vigas de cimentación del modulo sanitario , se requiere nuevamente pruebas de estanqueidad en la red sanitaria.
16-julio-25	90	263	Se realizo instalación de acero de refuerzo de los pedestales y de viga de cimentación , excavación manual de la cimentación en la zona de módulos de servicio.
17-julio-25	92	267	Se realizan ajustes y retiro de accesorios que se encontraban dentro de la viga , se sube el nivel de la tubería de 2"
18-julio-25	93	270	Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoría y se evidencia la continuación de la actividad de excavación manual de vigas y pedestales de cimentación de los módulos de servicio.

21-julio-25	95	274	se realiza verificación de niveles de excavación según las referencias instaladas por el contratista con manguera de niveles.
		276	Se continua con la excavación manual de vigas de cimentación e instalación de rajón 30 cm y retiro de escombros a acopio provisional.
			Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación de los módulos de servicio.
23-julio-25	97	281	Se realizo fundida de los dados donde van soportados los anclajes o soportes de los IPE del modulo sanitario
24-julio-25	98	283	Avanzo en la ejecución de la excavación manual de vigas en modulo de camerinos , se observo el trazado alineado conforme a los ejes estructurales definidos en cartilla del mobiliario.
PARQUE LAS MARGARITAS GILMA JIMENEZ			
18-julio-25	3	1	se da inicio a actividades en la pista de BMX inicio por el corte y demolición de la carpeta asfáltica en la zona identificada con fallo.
19-julio-25		2	Continua demolición de carpeta asfáltica en la zona de BMX
24-julio-25	7	9	se finalizo con demolición de asfalto en rampa de ingreso pista y rampa inició pista BMX , excavación manual para retirar base granular afectada para su remplazo.
PARQUE JULIO QUIROGA			
5-julio-25	27	59	Avance en las actividades priorizadas de la cancha múltiple donde se encuentra el material granular expuesto a intemperie.
23-julio-25	36	76	No se presenta avance en las obras priorizadas para el frente de obra.
PARQUE LA PALESTINA			
1-julio-25	39	95	Suministro e instalación de módulos de malla eslabonada en baranda M-83 en zona de juegos.
2-julio-25	40	98	actividades de la baranda M83 para iniciar con la aplicación del sintético y terminar el mantenimiento de los biosaludables.
4-julio-25	41	101	Se avanzo en la instalación de pasamanos y módulos eslabonados de la baranda en la zona de juegos infantiles , se verifica plomos de los parales y niveles del pasamanos.
9-julio-25	44	109	Se realiza limpieza de piso en zona de biosaludables suministro y acopio de material necesaria para el tratamiento de fisuras y recubrimiento sintético de la zona.
11-julio-25	46	115	se aplica la primera capa de base del sintético en piso de zona de biosaludable , se avanza con la soldadura de los muros y pasamanos de la baranda M83
12-julio-25	46	117	Se avanzo en la aplicación de la segunda capa de la base del sintético en zona de biosaludables , se avanza con la soldadura de los módulos de la baranda , se suministro los 4 módulos faltantes de la baranda M83 para su instalación.

14-julio-25	47	119	se realiza localización y replanteo del diseño aprobado por la supervisión , aplicación de la capa de pintura según diseño, se avanzo en la instalación y soldadura de los módulos y pasamanos de la baranda M83.
15-julio-25	48	121	suministro de las puertas de acceso a zona infantil , avance en la soldadura de módulos de baranda M83 se avanza con la segunda mano de pintura sintética en zona de biosaludables.
16-Julio-25	49	123	Retiro de la baranda y el material sobrante a sitio autorizado , se avanzo con la soldadura de la baranda M83
18-julio-25	50	127	Se avanzo en el masillado y anticorrosivo del pasamanos y puntos específicos de la baranda , se avanza con remates de soldadura en baranda.
19-julio-25	50	129	se avanzo en la aplicación y remates de pintura de M83.
21-julio-25	51	131	se avanza con remates de pintura en la baranda M83, se requiere realizar los detalles en biosaludables e instalar la señal informativa.
PARQUE PORVENIR			
4-julio-25	64	184	Se inicio la fundida de la placa de 10 cm en la pista de trote con concreto de 3000 psi.
10-julio-25	67	190	se realizo mantenimiento del cerramiento en poli sombra.
14-julio-25	69	194	suministro de lonas de granulo de caucho SBR y resina para la pista de trote, se inicio con la limpieza de la zona a intervenir y posteriormente iniciar con la aplicación de la resina e instalación del granulo de caucho SBR.
15-julio-25	70	195	Inicio instalación del piso caucho SBR 2cm en pista de trote una vez aplicado la resina y realizar limpieza en la zona
16-julio-25	71	198	Suministro de piso caucho EPDM para pista de trote de la misma manera se inicia con la actividad de instalación de piso caucho.
17-julio-25	72	200	Instalación de piso caucho EPDM en pista de trote.
18-julio-25	72	202	se finaliza la instalación del piso caucho EPDM en pista de trote , la interventoría recomienda realizar ajuste al cerramiento el ciertas partes en el piso.
22-julio-25	75	207	Se realiza desmonte de cerramiento provisional y limpieza del cárcamo en la longitud total de la pista de trote intervenida, se realizo acta de puesta en servicio de este espacio intervenido.
23-julio.25	75	209	se realizo traslado de material para cerramiento provisional en lona verde y postes de madera en contorno de pista de trote zona cancha sintética F8.
24-julio-25	77	213	Se culmina cerramiento provisional en postes de madera y lona verde en contorno de pista de trote , se inició desmonte de piso caucho existente y se instala pendón informativo.

PARQUE RECREO			
1-julio-25	27	93	reinstalación de bordillo lateral del sendero peatonal , emboquillado de este bordillo A 80
2-julio-25	28	95	Se inicio instalación de arena posterior ala instalación de adoquín en la zona del sendero.
3-julio-25		97	Se avanzo con la instalación y compactación de la cama de arena con compactador tipo rana , se avanzo con reinstalación de adoquín existente.
	29	99	Continua con la instalación y compactación de la cama de arena con compactador tipo rana , se avanzo con reinstalación de adoquín existente.
8- julio -25	32	106	se avanzo con nivelación, compactación y reinstalación de adoquín.
9-julio-25		108	instalación de adoquín y emboquillado del mismo en el sendero #2
10-julio-25	33	110	se avanza en la reinstalación de adoquín , una vez compactado la cama de arena , se avanzo con el emboquillado del adoquín.
12-Julio-25	34	114	continua la instalación del adoquín con su respectiva emboquillada.
14-julio-25	35	116	Se avanzo en la instalación y prolongación del cerramiento en poli sombra para continuar con el desmonte de adoquín, bordillo y cañuela , construcción de cintas de ajuste.
15-julio-25	36	118	Desmonte de adoquín para posterior nivelación y reinstalación en el sendero numero 2 , arreglo de cerramiento perimetral de obra.
16-julio-25		120	Se avanzo en desmonte de bordillo e instalación del mismo, una vez nivelado se avanzo con la emboquillada con arena del adoquín , desmonte de cañuela prefabricado.
22-julio-25	41	132	se continua actividades de re instalación de bordillo , compactación mecánica con rana en material granular existente , extendido y compactación de arena de soporte , reinstalación de adoquín en zona sendero # 2.
24-julio-25	43	138	se realiza suministro y acopio de material 7 m3 de arena lavada de peña , cemento y arena de rio.
		139	se continua con actividades de desmonte y reinstalación de bordillo y cuneta ; extendido, nivelación y compactación de arena de soporte ; modulación y reinstalación de adoquín en zona sendero # 2 (gimnasio biosaludable)

PARQUE TIMIZA			
1-julio-25	76	164	Inicio plan de contingencia con el ingreso de 4 ornamentadores para continuar con la instalación de baranda como contención del cerramiento que se viene construyendo , aplicación de anticorrosivo a las puertas de la plazoleta de comidas
4-julio-25	79	170	se avanzo con la construcción de la baranda , el contratista atiende la observación dada.
8-julio-25	82	176	se avanzo con la fabricación y construcción de la baranda contra el sendero y lago.
9-julio-25	83	179	se realizo el traslado de materiales a acopio y se realizan trabajos de soldadura en baranda del sendero junto al lago
10-julio-25	83	182	Avance en la baranda M80 y retiro de escombro.
11-julio-25	84	184	instalación de baranda M-80
15-julio-25	86	191	se avanzo en la aplicación de pintura de esmalte verde en baranda M-80 y retiro de escombros a sitio de acopio.
16-julio-25	87	193	Aplicación de pintura en la baranda M-83 del sendero junto al lago
18-julio-25	89	199	se avanza con detalle e instalación de piezas de adoquín en sendero
25-julio-25	94	209	se realizo remates en la aplicación de anticorrosivo en las puertas instaladas en las terrazas de la cafetería , se recomienda limpiar oxidación
28-julio-25	95	212	se realiza instalación de cerramiento provisional en postes de madera y lona verde.

ANEXO 11

SOPORTE DE INDICADORES


INDICADORES DE GESTIÓN

PROYECTO: **INFRAESTRUCTURA IDRD**

Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S.

formula: Tiempo real de ejecución de obra Vs tiempo proyectado de ejecución de obra.

PERIODO	% TIEMPO PROYECTADO	% TIEMPO EJECUTADO	RESULTADO	META	CUMPLE	ANÁLISIS
NOV 2024 (1)				100%	N/A	A corte del presente periodo se realizaron visitas técnicas de diagnóstico, por lo cual no aun no ha sido tiempo de ejecución de actividades
DIC 2024 (2)	22,00%	7,95%	36,14%	100%	SI	A corte del presente periodo se realizaron visitas técnicas de diagnóstico, adicionalmente se ejecutaron labores de demolición y mantenimiento del Parque Nacional los cuales obedecen al 100% de las labores planificadas Diciembre Ejecutado 7,95 - Programado 22,0
ENERO 2025 (3)	32,60%	11,95%	37,34%	100%	SI	A corte del presente periodo se realizaron visitas técnicas de diagnóstico, adicionalmente se ejecutaron labores de demolición y mantenimiento del Parque Nacional las cuales obedecen al 100% de las labores planificadas EneroEjecutado 11,95 - Programado 32,0
FEBRERO 2025 (4)	39,42%	15,64%	39,69%	100%	NO	Durante el presente periodo se ejecutaron actividades en los siguientes **parques priorizados por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los** siguientes parques: *01-031 Parque Nueva Urbanización Cedritos. *03-008 Parque Urbanización El Toberín. *03-055 Parque Nacional (PM-2A) Enrique Olaya Herrera (Sector Histórico) *10-531 Parque Planta de Tratamiento Salitre. *12-015 Parque Alcázares.16-416 Parque Industrial (Los Ejidos). *18-035 Parque Desarrollo Palermo Sur. Febrero Ejecutado 15,64 - Programado 39,42
MARZO 2025 (5)	53,94%	27,56%	51,09%	100%	NO	Durante el presente periodo han transcurrido 132 días los que representa el 54% y se han se ejecutado actividades en los siguientes parques priorizados **por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques:** COUNTRY 01-1000, PARQUE NACIONAL 03-035, SAN CRISTOBAL 04-127, VALLES DE CAFAM 05-003 URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 05-042, TUNAL 08-063, NARANJOS 07-035, TIBANICA 07-274 FORVENIR 07-391, PATIO BONITO 08-034, TIMZA 08-219, CAYETANO CAÑIZARES 08-241, LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552, CANCHA TECHO 08-554, VILLEMAR 08-613, SAN ANDRES 10-234, PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS 11-204, FONTANAR DEL RIO 11-368, SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS) 12-041, SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) 12-091, PALACIO DE LOS DEPORTES 12-125, MOVISTAR ARENA 13-129, MILENIA TEJAR SAN EUSEBIO 16-068, CIUDAD MONTES 16-112 BOSQUE SAN CARLOS 18-029, PUMAS JORGE E. CABALIER 16-050, QUIROGA 16-205, ESTADIO OLAYA HERRERA 16-207, Maya Ejecutado 53,94 - Programado 53,94
ABRIL 2025 (6)	68,48%	48,35%	70,63%	100%	NO	Durante el presente periodo han transcurrido 162 días los que representa el 67% y se han se ejecutado actividades en los siguientes parques priorizados **por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques:** NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO 01-031, URBANIZACION EL TOBERIN 01-079, DESARROLLO VERBENAL I 01-313, URBANIZACIÓN CALLE 170 / ALAMEDA 01-540, COUNTRY 01-1000, PARQUE NACIONAL 03-035, VALLES DE CAFAM 05-003, LA ANDREA 05-004, URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 05-042, NARANJOS 07-035, PALESTINA 07-165, EL RECREO 07-260, URBANIZACION LA ESPERANZA 07-273, TIBANICA 07-274, PORVENIR 07-391, PATIO BONITO 08-034, TIMZA 08-219, CAYETANO CAÑIZARES 08-241, LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552, SAN ANDRES 10-234, SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE) 10-290, SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS) 12-041, SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) 12-091, PALACIO DE LOS DEPORTES 12-125 SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO) 12-1000, SANTA CLARA 13-015, CIUDAD MONTES 16-112, PUMAS JORGE E. CABALIER 16-050, ESTADIO OLAYA HERRERA 16-207, Abril Ejecutado 48,35 - Programado 68,46
MAYO 2025 (7)	88,60%	55,65%	63,24%	100%	NO	Durante el presente periodo han transcurrido 193 días los que representa el 79% que equivale a lo programado por lo cual se cumple con el 100% Se han se ejecutado actividades en los siguientes parques priorizados por la **entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques:** NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO 01-031, URBANIZACION EL TOBERIN 01-079 , COUNTRY 01-1000, PARQUE NACIONAL 03-035, VALLES DE CAFAM 05-003, LA ANDREA 05-004, URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 05-042, NARANJOS 07-035, PALESTINA 07-165, EL RECREO 07-260, URBANIZACION LA ESPERANZA 07-273, TIBANICA 07-274, PORVENIR 07-391, PATIO BONITO 08-034, TIMZA 08-219, CAYETANO CAÑIZARES 08-241, LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552, SAN ANDRES 10-234, SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE) 10-290, , SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) 12-091, PALACIO DE LOS DEPORTES 12-125, SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO) 12-1000, SANTA CLARA 13-015, VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR 15-036, CIUDAD MONTES 16-112, PUMAS JORGE E. CABALIER 16-050, ESTADIO OLAYA HERRERA 16-207, EL TALLER (EL EDUEÑO) 19-348 Y las emergencias asignadas por la supervisión del contrato. Maya Ejecutado 55,65 - Programado 88,0
JUNIO 2025 (8)	91,70%	74,55%	81,30%	100%	NO	Durante el presente periodo han transcurrido 223 días los que representa el 92% y se han se ejecutado actividades en los siguientes parques priorizados **por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques:** URBANIZACION EL TOBERIN 01-079, , COUNTRY 01-1000, VALLES DE CAFAM 05-003, PALESTINA 07-165, EL RECREO 07-260, URBANIZACION LA ESPERANZA 07-273, TIBANICA 07-274, PORVENIR 07-391, TIMZA 08-219, CAYETANO CAÑIZARES 08-241, LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552, SAN ANDRES 10-234, SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE) 10-290, SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) 12-091, PALACIO DE LOS DEPORTES 12-125, SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) 13-069, SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO) 12-1000, SANTA CLARA 13-015, VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR 15-036, CIUDAD MONTES 16-112, PUMAS JORGE E. CABALIER 16-050, QUIROGA (16-205), ESTADIO OLAYA HERRERA 16-207 Y las emergencias asignadas Junio Programado 91,70% Ejecutado 74,55%
JULIO 2025 (9)	70,00%	62,55%	89,36%	100%	NO	Durante el presente periodo han transcurrido 255 días los que representa el 70% y se han se ejecutado actividades en los siguientes parques priorizados **por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques:** COUNTRY 01-1000, VALLES DE CAFAM 05-003, PALESTINA 07-165, EL RECREO 07-260, URBANIZACION LA ESPERANZA 07-273, PORVENIR 07-391, TIMZA 08-219, CAYETANO CAÑIZARES 08-241, LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552, SAN ANDRES 10-234, SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE) 10-290, SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) 12-091, PALACIO DE LOS DEPORTES 12-125, SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) 13-038, SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO) 12-1000, SANTA CLARA 13-015, VILLA MAYOR CEMENTERIO DEL SUR 15-036, CIUDAD MONTES 16-112, PUMAS JORGE E. CABALIER 16-050, QUIROGA (16-205), ESTADIO OLAYA HERRERA 16-207 Y las emergencias asignadas Julio Programado 70% y ejecutado: 62,55%

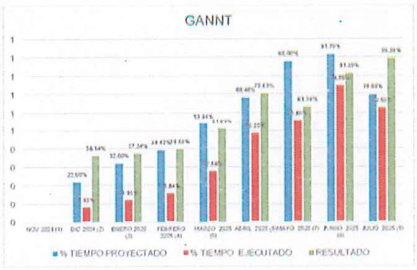


Índice de valor ganado.

Formula: Presupuesto ejecutado Vs presupuesto presentado.

PERIODO	% PRESUPUESTO PROYECTADO	% PRESUPUESTO EJECUTADO	RESULTADO	META	CUMPLE	ANÁLISIS
NOV 2024 (1)				100%	N/A	A corte del presente periodo no se proyectó ejecución presupuestal ya que corresponde a la programación únicamente realizar realizaron visitas técnicas de diagnóstico,
DIC 2024 (2)	22,00%	7,95%	36%	100%	SI	Ejecutado: $ 1.025.577.609,68 / Proyectado: $2.635.078.957,54 A corte del presente periodo se realizaron visitas técnicas de diagnóstico,
ENERO 2025 (3)	32,60%	11,95%	37%	100%	SI	Ejecutado: $ 1.541.691.801,9385 / Proyectado: $4.128.111.939,24
FEBRERO 2025 (4)	39,42%	15,64%	40%	100%	SI	Ejecutado: $ 2.017.614.709,9143 / Proyectado: $5.085.517.693,9104
MARZO 2025 (5)	53,93%	27,56%	51%	100%	NO	Ejecutado: $ 3.555.336.408,5092 / Proyectado: $6.957.156.650,9151
ABRIL 2025 (6)	68,48%	48,35%	71%	100%	NO	Ejecutado: $ 6.237.319.131,6845 / Proyectado: $8.831.579.477,5722




MAYO 2025 (7)	78,00%	55,65%	71%	100%	NO	Ejecutado: $ 7.179.044.687,5555 / Proyectado: $10.082.272.849,46
JUNIO 2025 (8)	91,70%	74,55%	81%	100%	NO	Ejecutado: $9.617.210.731,1165 / Proyectado: $11.829.620.773,019
JULIO 2025 (9)	70,00%	62,55%	89%	100%	NO	Ejecutado: $ 9.569.350.042,0265/ Proyectado: $11.077.290.314,9



Índice de cumplimiento de entregables contractuales.

Formula: No de entregables planificados Vs total de entregables radicados y aceptados sin observaciones.


PERIODO	ENTREGABLES PLANIFICADOS	ENTREGABLES ENTREGADOS	RESULTADO	META	CUMPLE	ANÁLISIS
NOV 2024 (1)				60%	N/A	Aún no aplica, empieza a medir a partir del próximo periodo.
DIC 2024 (2)	5,00	0	0%	60%	NO	Durante este periodo no se cumplió oportunamente con los entregables contractuales.
ENERO 2025 (3)	5,00	0	0%	60%	NO	Durante este periodo no se cumplió oportunamente con los entregables contractuales.
FEBRERO 2025 (4)	5,00	5,00	100%	60%	SI	Durante este periodo si se cumplió con la entrega oportuna de todos los entregables contractuales.
MARZO 2025 (5)	5,00	4,00	80%	60%	SI	Se cumple con la meta establecida, aunque durante este periodo no se cumplió con la entrega oportuna del informe del componente de calidad, de los 5 informes a ser entregados se entregaron oportunamente 4 los cuales a la fecha del cierre del presente informe se encuentran aprobados.
ABRIL 2025 (6)	5,00	4,00	80%	60%	SI	Se cumple con la meta establecida, aunque durante este periodo no se cumplió con la entrega oportuna del informe del componente de calidad, de los 5 informes a ser entregados se entregaron oportunamente 4 los cuales a la fecha del cierre del presente informe se encuentran aprobados.
MAYO 2025 (7)	5,00	4,00	80%	60%	SI	Se cumple con la meta establecida, aunque durante este periodo no se cumplió con la entrega oportuna del informe del componente de calidad, de los 5 informes a ser entregados se entregaron oportunamente 4 los cuales a la fecha del cierre del presente informe se encuentran aprobados.
JUNIO 2025 (8)	5,00	4,00	80%	60%	SI	Se cumple con la meta establecida, aunque durante este periodo no se cumplió con la entrega oportuna del informe del componente de calidad, de los 5 informes a ser entregados se entregaron oportunamente 4 los cuales a la fecha del cierre del presente informe se encuentran aprobados.
JULIO 2025 (9)	5,00	4,00	80%	60%	SI	Se cumple con la meta establecida, aunque durante este periodo no se cumplió con la entrega oportuna del informe del componente de calidad, de los 5 informes a ser entregados se entregaron oportunamente 4 los cuales a la fecha del cierre del presente informe se encuentran aprobados.



Índice de cumplimiento del plan de inspección y ensayos.

Formula: No de actividades del plan de inspección y ensayos ejecutadas Vs las actividades del plan de inspección y ensayos planificadas

PERIODO	# de actividades del PIYE planificadas	# de actividades del plan de inspección y ensayos ejecutadas	RESULTADO	META	CUMPLE	ANÁLISIS
NOV 2024 (1)			N/A	100%	N/A	Durante esta fase del proyecto aún no se encuentra aprobado el plan de calidad, ni se cuenta con el plan de inspección y ensayos
DIC 2024 (2)	9	6	66,66%	100%	NO	Durante este periodo se reportaron 9 actividades contempladas en el Plan de Inspección y Ensayos sugerido y para 6 de ellas se contó al cierre del presente informe con los certificados de calidad y ensayos requeridos, por lo cual no se cumple con la meta establecida.
ENERO 2025 (3)	9	6	66,66%	100%	NO	Durante este periodo se reportaron 9 actividades contempladas en el Plan de Inspección y Ensayos sugerido y para 6 de ellas se contó al cierre del presente informe con los certificados de calidad y ensayos requeridos, por lo cual no se cumple con la meta establecida
FEBRERO 2025 (4)	15	12	80,00%	100%	NO	Durante este periodo no se alcanza la meta debido a que no se ha obtenido oportunamente la elaboración de los ensayos de calidad correspondientes al acero y al cemento cabe anotar que la gestión en la consecución de los certificados de calidad y en la implementación del plan de acción de la acción correctiva toma se ha visto reflejado en el porcentaje alcanzado en este periodo.
MARZO 2025 (5)	14	10	71,43%	100%	NO	Durante este periodo de 14 actividades que tuvieron seguimiento en el plan de inspección y ensayos cumplieron 10, los otros 4 están en gestión. Los certificados de calidad pendientes son de varillas, mallas electrosoldadas cemento y geotextil.
ABRIL 2025 (6)	6	5	83,33%	100%	NO	Durante este periodo de 6 actividades que tuvieron seguimiento en el plan de inspección y ensayos cumplieron 5, debido a que no se entregó el certificado correspondiente al cemento
MAYO 2025 (7)	16	13	81,25%	100%	NO	Durante este periodo de 16 actividades que tuvieron seguimiento en el plan de inspección y ensayos cumplieron 13, debido a que no se entregó la documentación correspondiente.
JUNIO 2025 (8)	9	4	44,60%	100%	NO	Durante este periodo de 9 actividades que tuvieron seguimiento en el plan de inspección y ensayos cumplieron 4, debido a que no se entregó la documentación correspondiente Faltan certificadosde calidad de acero, ceramica, recubrimiento sintetico, meson de acero, y geotextil
JULIO 2025 (9)	9	4	89,60%	100%	NO	Durante este periodo de 9 actividades que tuvieron seguimiento en el plan de inspección y ensayos cumplieron 5, debido a que no se entregó la certificación del impermeabilizante.




Índice de Satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes.

Formula: No de encuestas de satisfacción con calificación buena Vs en total de encuestas de satisfacción

PERIODO	# de encuestas	# de encuestas con calificación buena	RESULTADO	META	CUMPLE	ANÁLISIS
NOV 2024 (1)	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	Aún no se han realizado encuestas de satisfacción
DIC 2024 (2)	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	Aún no se han realizado encuestas de satisfacción
ENERO 2025 (3)	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	Aún no se han realizado encuestas de satisfacción
FEBRERO 2025 (4)	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	Aún no se han realizado encuestas de satisfacción


MARZO 2025 (5)	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	Aún no se han realizado encuestas de satisfacción.
ABRIL 2025 (6)	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	Aún no se han realizado encuestas de satisfacción.
MAYO 2025 (7)	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	Aún no se han realizado encuestas de satisfacción, se planifican para el siguiente periodo.
JUNIO 2025 (8)	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	Aún no se cuenta con las respuestas de la encuesta de satisfacción por parte del IDRD.
JULIO 2025 (9)	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	Aún no se cuenta con las respuestas de la encuesta de satisfacción por parte del IDRD.



Índice de Satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes. PQRFS

Formula: No de PQRFS resueltas efectivamente Vs total de PQRFS recibidas.


PERIODO	# PQRFS recibidas en el periodo	PQRFS resueltas efectivamente	RESULTADO	META	CUMPLE	ANÁLISIS
NOV 2024 (1)				80%	N/A	Para el presente periodo no se generó PQRFS
DIC 2024 (2)				80%	N/A	Para el presente periodo no se generó PQRFS
ENERO 2025 (3)				80%	N/A	Para el presente periodo no se generó PQRFS
FEBRERO 2025 (4)				80%	N/A	Para el presente periodo CONSORCIO BELZCON IDRD, No recibió PQRFS, sin embargo, se apoyó al IDRD, en la gestión de 1 PQRFS que llegó a la entidad
MARZO 2025 (5)	1	1	100%	80%	N/A	Se recibe y se resuelve oportunamente la queja.
ABRIL 2025 (6)				80%	N/A	Para el presente periodo no se generó PQRFS
MAYO 2025 (7)	1	1	100%	80%	N/A	Para el presente periodo se generó PQRFS. El 19 e mayo y se cierraefectivamente el 6 de junio.
JUNIO 2025 (8)	1	1	100%	80%	N/A	Para el presente periodo no se generó PQRFS.
JULIO 2025 (9)	1	1	100%	100%	SI	Durante el periodo se surtió una PQRFS, la cual fue atendida oportunamente.

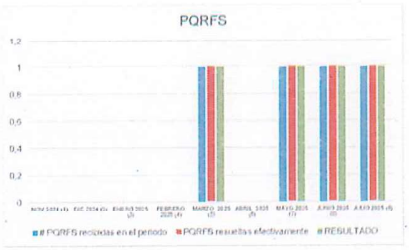

Índice de Salidas No Conformes

***Formula:* No. de salidas no conformes eficaces Vs el No de Salidas No Conformes.**

PERIODO	# de Salidas No Conformes	No. de salidas no conformes eficaces	RESULTADO	META	CUMPLE	ANÁLISIS
NOV 2024 (1)				80%	N/A	Durante el presente periodo, no se generaron salidas no conformes
DIC 2024 (2)	1	0	0%	80%	NO	Durante el presente periodo, se inició con la toma de la acción correctiva por la salida no conforme detectada el periodo anterior del incumplimiento de los compromisos establecidos en comité, aun no se ha visto la eficacia de la acción tomada.
ENERO 2025 (3)	1	0	0%	80%	NO	Durante el presente periodo, se inició con la toma de la acción correctiva por la salida no conforme detectada el periodo anterior del incumplimiento de los compromisos establecidos en comité, aun no se ha visto la eficacia de la acción tomada.
FEBRERO 2025 (4)	4	4	100%	80%	SI	Para el presente periodo, se incluye dentro de las SNC los presuntos incumplimientos, al respecto se está gestionado por parte de gerencia el tratamiento para tomar la acción correctiva Respecto al total de las 4 SNC generadas en el proyecto 4 han sido eficaces. Cabe anotar la relevancia de la SNC de presuntos incumplimientos, por lo cual el Consorcio liderado por el área de calidad dará celeridad a la toma de la acción correctiva
MARZO 2025 (5)				80%	N/A	Para el presente periodo, se hace seguimiento a las 4 SNC. La SNC respecto a los presuntos incumplimientos se está gestionando por parte de la gerencia, quienes han tomado las correctivas necesarias, una vez filtren la información propia para calidad se documentará la acción correctiva
ABRIL 2025 (6)	4	4	80%	80%	SI	Para el presente periodo, se hace seguimiento a las 4 SNC. La SNC respecto a los presuntos incumplimientos se está gestionando por parte de la gerencia, quienes han tomado las correctivas necesarias, sin embargo, consideraron después de analizar con el área jurídica que no se efectuará acción correctiva
MAYO 2025 (7)	4	3	75%	80%	NO	Para el presente periodo, se hace seguimiento a las 4 SNC. La SNC respecto a los presuntos incumplimientos se está gestionando por parte de la gerencia, quienes han tomado las correctivas necesarias, sin embargo, consideraron después de analizar con el área jurídica que no se efectuará acción correctiva
JUNIO 2025 (8)	5	4	80%	80%	SI	Para el presente periodo, se hace seguimiento a las 4 SNC. Se incluyen las No Conformidades hallazgo de la auditoria del 30% estas dieultimas acciones han sido eficaces.
JULIO 2025 (9)	5	4	80%	80%	SI	Para el presente periodo, se hace seguimiento a las 4 SNC. Se incluyen las No Conformidades hallazgo de la auditoria del 30% estas dieultimas acciones han sido eficaces.




Índice de mejora continua

Formula: No de indicadores de gestión que cumplieron con la meta Vs el total de indicadores.

PERIODO	# total de indicadores.	#de indicadores de gestión que cumplieron con la meta	RESULTADO	META	CUMPLE	ANÁLISIS
NOV 2024 (1)				80%	N/A	Siendo el inicio del proyecto, en este periodo de 10 días de noviembre, de los 7 indicadores, no aplicó ninguno al periodo

DIC 2024 (2)	5	3	60%	60%	NO	De los indicadores propuestos solo aplicaron al periodo 5, de los cuales 3 cumplieron con la meta y 2 no, por lo cual no se alcanzó la meta
ENERO 2025 (3)	5	3	60%	60%	NO	De los indicadores propuestos solo aplicaron al periodo 5, de los cuales 3 cumplieron con la meta y 2 no, por lo cual no se alcanzó la meta
FEBRERO 2025 (4)	5	3	60%	60%	SI	De los 5 indicadores propuestos que aplicaron a este 3periodo 3 no cumplieron con la meta establecida
MARZO 2025 (5)	4	1	25%	60%	NO	De los 4 indicadores propuestos que aplicaron a este periodo, solo 1 cumplió con la meta por lo cual se seguirá trabajando en el plan de acción propuesta en aras de mejorar los diferentes procesos
ABRIL 2025 (6)	4	1	25%	60%	NO	De los 4 indicadores propuestos que aplicaron a este periodo, solo 1 cumplió con la meta por lo cual se seguirá trabajando en el plan de acción propuesta en aras de mejorar los diferentes procesos
MAYO 2025 (7)	5	2	40%	60%	NO	De los5 indicadores propuestos que aplicaron a este periodo, solo 2 cumplieron con la meta por lo cual se seguirá trabajando en el plan de acción propuesta en aras de mejorar los diferentes procesos
JUNIO 2025 (8)	5	2	40%	60%	NO	De los5 indicadores propuestos que aplicaron a este periodo, solo 2 cumplieron con la meta por la cual se seguirá trabajando en el plan de acción propuesta en aras de mejorar los diferentes procesos
JULIO 2025 (9)	6	3	50%	50%	NO	De los 6 indicadores propuestos que aplicaron a este periodo, 3 no cumplieron con la meta por lo cual se seguirá trabajando en el plan de acción propuesta en aras de mejorar los diferentes procesos

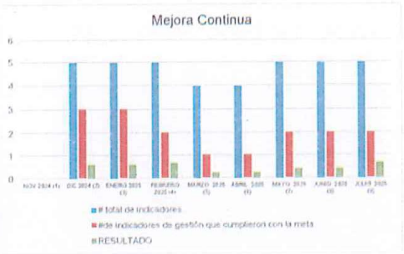

ANEXO 12

AUDITORIA

GESTIÓN DE AUDITORÍA

L a interventoría mediante oficio IDRD-4080-G2-2024-576, solicitó programar la auditoria del 7% de ejecución, la cual se programó para la semana del 8 al 12 de agosto, sin embargo, por motivos ajenos a nuestra voluntad, ésta tuvo que postergarse, y estamos en la consecución de un nuevo auditor.



IDRD PARQUES IDRD-4080-G2-2024-576 - Solicitud programacion auditoria 70% Recibidos ×

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 31 jul 2025, 1:04 p.m.
para Consorcio, Proyectos, mi

Buenas tardes

Enviamos comunicado del asunto para su conocimiento y trámite correspondiente

--
CORDIALMENTE

SOLIUN | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Tel. (031) 766 5000, Cel 304 8942384
Cra. 79 C # 49-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación co propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S. no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defec

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

IDRD-4080-G2-2024-576 - Solicitud programacion auditoria
235 KB

Consorcio Belzcon IDRD 1 <idrd4060.bzc@gmail.com> 1 ago 2025, 12:13 p.m.
para Proyectos, mi

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Ya se esta programado con la misma auditora fecha probable entre el 8 y el 12 de agosto.

***

--
CORDIALMENTE

CONSORCIO BELZCON IDRD 1
NIT: 901 606 663-3
DIRECCIÓN: CALLE 105 # 45-26
TELÉFONO: 7469359
CONTRATO N° IDRD-SG-4060-2024

	PROGRAMACIÓN AUDITORIAS	Código:	FO-MC-03
		Versión:	01
		Fecha	23/12/2024

PERÍODO:70%

Objetivo: Verificar y evaluar la implementación del plan de calidad con el fin de determinar la conformidad o no de los requisitos especificados de acuerdo con lo establecido en la norma NTC ISO 9001:2015 y en los requisitos contractuales; y así detectar falencias y generar las acciones que conlleven a la mejora continua asegurando la eficacia del Plan de Calidad aportado por CONSORCIO BELZCON IDRD 1.

PROCESO/ ACTIVIDAD	RESPONSABLE	AUDITORES	AUDITADOS	FECHA	EJECUTADA	
					SI	NO
PLAN DE CALIDAD "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".	ENRIQUE GUZMAN Y PATRICIA SERRANO ESPINEL	AUDITOR LIDER (En consecución)	EQUIPO CONSORCIO BELZCON IDRD 1	PRIMEA FECHA: 8 -12 DE AGOSTO NUEVA FECHA: POR DEFINIR		

Comentarios: _____

APROBADO POR:

FECHA: 31 DE JULIO DE 2025

493

ANEXO 13

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.

CONSORCIO Belzcon IDRD 1	**ENCUESTA DE SATISFACCIÒN** Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD". GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Por favor califique:

Excelente: 5
Suficiente: 3
Deficiente: 1

	ASPECTO A EVALUAR	EXCELENTE	SUFICIENTE	DEFICIENTE
1	El CONSORCIO BELZCON IDRD 1 ha cumplido con las expectativas			
2	Los tiempos de ejecución de las actividades has sido ...			
3	La calidad del servicio es:			
4	¿Cual el la percepción que tiene del equipos de profesionales del CONSORCIO BELZCON IDRD 1 ?			
5	¿Cómo califica el seguimiento y control ejercido sobre los componentes (Calidad-social-SST-ambiental) ?			
6	¿Los comités semanales le entregan una información clara y oportuna respecto a la evolución del proyecto?			
	La gestión administrativa del BELZCON IDRD 1es:			
		0	0	0
		0	0	0
	Puntaje obtenido			**0**

	Comentarios
	Encuestado Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

Fwd: Encuesta de satisfacción

Recibidos ×

Kike1968 Condia Guzman <kikecondia@gmail.com>
para mí

3:21 p.m. (hace 26 minutos)

Traducir al español

---------- Forwarded message ---------
De: **Kike1968 Condia Guzman** <kikecondia@gmail.com>
Date: vie, 27 jun 2025 a la(s) 3:19 p.m.
Subject: Encuesta de satisfacción
To: <ivan.velasquez@idrd.gov.co>

Arq Ivan buenas tardes

por medio del presente para solicitarle el favor y nos colabora con la siguiente encuesta, para evaluar la gestión del consorcio para el IDRD

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



996

ANEXO 14

P.Q.R.F.S.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FORMATO CONSOLIDADO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1	Contrato No.	4060 - 2024	Duración (Meses)	8	Fecha inicio:	20/11/2024	Fecha Finalización:	19/07/2025

Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL ICRD

Profesional Social	PAULINA GARCIA MANCIPE

CONSULTA No.	FECHA DE RECEPCION	NOMBRE DEL PETICIONARIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	TIPO DE CONSULTA				ESTADO		FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
					P	Q	R	S	C	A		
1	25/03/2025	MELISA MUTIS	3124475314	NO REPORTA				X	X		25/03/2025	SE ATIENDE LA SOLICITUD DE LA PETICIONARIA RELACIONADA CON LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL PARQUE EL COUNTRY Y SU DURACIÓN.
2	19/05/2025	AMPARO MORALES	314 3335897	amparomoralesdeteiada@yahoo.com				X	X		5/06/2025	SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE, QUIEN INDICA QUE LA SEÑORA MORALES SOLICITA UNA REUNIÓN CON EL CONTRATISTA PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO. SE INFORMA AL COMPONENTE TÉCNICO, ESTE INDICA QUE SE POSTERGUE EL ENCUENTRO PARA LUEGO DE LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES. SE CONTACTA A LA SEÑORA MORALES Y SE ESTABLECE COMO COMPROMISO INFORMAR UNA FECHA PARA ESTE ENCUENTRO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025. LA SEÑORA MORALES SOLICITA COPIA DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE INICIO, LA CUAL ES REMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO. SE CELEBRA REUNIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO CON LA PETICIONARIA Y UNA CIUDADANA REPRESENTANTE DE ASOCAROLINA, MIEMBRO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN Y SE PRESENTA EL ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES SOCIALIZADAS DURANTE LA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA.
3	21/07/2025	MELISA MUTIS	3124475314	NO REPORTA				X	X		22/07/2025	SE ESTABLECE CONTACTO TELEFÓNICO CON LA SEÑORA MUTIS Y SE LE INDICA QUE YA SE FIRMÓ ACTA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE Y SE DIO APERTURA PARA USO DEL ÁREA DE JUEGOS. DE LA MISMA FORMA SE INDICA QUE SE REALIZÓ LLAMADO DE ATENCIÓN AL PERSONAL DE OBRA. SE INVITA A LA CIUDADANA A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE FINALIZACIÓN.

Tipo de Atencion Ciudadana: (P) Pregunta; (Q) Queja; (R) Reclamo; (S) Solicitud de Información
Etado: (C) Cerrada (A) Abierta

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Técnico del Contratista	CLAUDIA PEDRAZA	25/07/2025	
Profesional Social del Contratista	PAULINA GARCIA	25/07/2025	
Residente Técnico de Interventoría	RONALD LOZANO	25/07/2025	
Profesional Social de Interventoría	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	25/07/2025	

487

FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

GESTIÓN SOCIAL

Atención Ciudadana No.	3

Fecha:	21/07/2025	Lugar:	Bogotá	No. Contrato:	4060-2024

Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1

Medio de Recepcción:	Escrita		Telefónica	X	Presencial	

Datos de Consultante

Nombres y Apellidos:	Melisa Mutis	Direccion:	No reporta
Localidad / Comuna:	Usaquén	Barrio:	La Carolina
Correo Electrónico:	No reporta	Teléfono:	3124475314

Descripción de la Consulta

La señora Melisa Mutis solicita información respecto a la entrega del parque para uso de los niños y refiere uso inadecuado de elementos instalados por parte del personal de obra.

Tipo de Consulta:	Pregunta		Queja		Reclamo	
	Solicitud de Información	X	Derecho de Petición			

Resumen de respuesta al ciudadano (Si es pregunta o solicitud de información)

Se establece contacto telefónico con la señora Mutis y se le indica que ya se firmó acta de puesta en funcionamiento con la administración del parque y se dio apertura para uso del área de juegos. De la misma forma se indica que se realizó llamado de atención al personal de obra. Se invita a la ciudadana a participar en la reunión de finalización.

Firma del Ciudadano	No aplica - atención telefónica

Atención (Preguntas, Quejas, Reclamos, Solicitudes de Informacion)

Seguimiento a la consulta (Si es Queja, Reclamo, Derecho de Petición)

Acciones a Seguir	Fecha Cumplimiento	Nombre responsable	Cargo del responsable
N/A	N/A	N/A	N/A

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Tecnico del Contratista	Claudia Pedraza	22/07/2025	
Profesional Social del Contratista	Paulina García	22/07/2025	
Residente Tecnico de Interventoria	Ronald Lozano	22/07/2025	
Profesional Social de Interventoria	María de Rosario Cárdenas	22/07/2025	
