JOVI + TECH


INFORME SEMANAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

OBJETO DEL CONTRATO	*INFORME NO*	*DEL*	*AL*
Fabricación e instalación de módulos para venta al usuario M-141	20	Lunes, 12 de Enero	Viernes, 16 de Enero

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					*ELEMENTOS CONTRATADOS*		
	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE	DÍAS DE DIFER.		FABRICACIÓN	INSTALACIÓN
DÍAS	195	138	57	3,9	CONTRATADOS	17	17
%	100%	71%	29%	2%	ENTREGADOS	10	10

CONTROL DE TIEMPO

CORTE	SEMANA	PLAN	REAL	DES
		%	%	
1	SEPTIEMBRE 1 - 5	6%	5%	-1%
2	SEPTIEMBRE 8 - 12	21%	15%	-6%
3	SEPTIEMBRE 15 - 19	23%	19%	-4%
4	SEPTIEMBRE 22 - 26	25%	21%	-4%
5	SEPT 29 - OCTUBRE 3	27%	24%	-3%
6	OCTUBRE 6 - 10	29%	27%	-2%
7	OCTUBRE 13 - 17	30%	30%	0%
8	OCTUBRE 20 - 24	32%	33%	1%
9	OCTUBRE 27 -31	36%	38%	2%
10	NOVIEMBRE 4 - 7	38%	40%	2%
11	NOVIEMBRE 10 - 14	40%	43%	3%
12	NOVIEMBRE 18 - 21	44%	50%	6%
13	NOVIEMBRE 24 - 28	47%	59%	12%
14	DICIEMBRE 1 - 5	50%	64%	14%
15	DICIEMBRE 9 - 12	55%	70%	15%
16	DICIEMBRE 15 - 19	58%	71%	13%
17	DICIEMBRE 22 - 23	61%	72%	11%
18	DIC 29 - ENERO 2	66%	73%	7%
19	ENERO 5 - 9	70%	75%	5%
20	ENERO 12 - 16	75%	77%	2%
21	ENERO 19 - 23	78%		
22	ENERO 26 - 30	80%		
23	FEBRERO 2 - 6	84%		
24	FEBRERO 9 - 13	90%		
25	FEBRERO 16 - 20	92%		
26	FEBRERO 23 - 27	96%		
27	MARZO 2 - 7	100%		
28	MARZO 9 - 13			

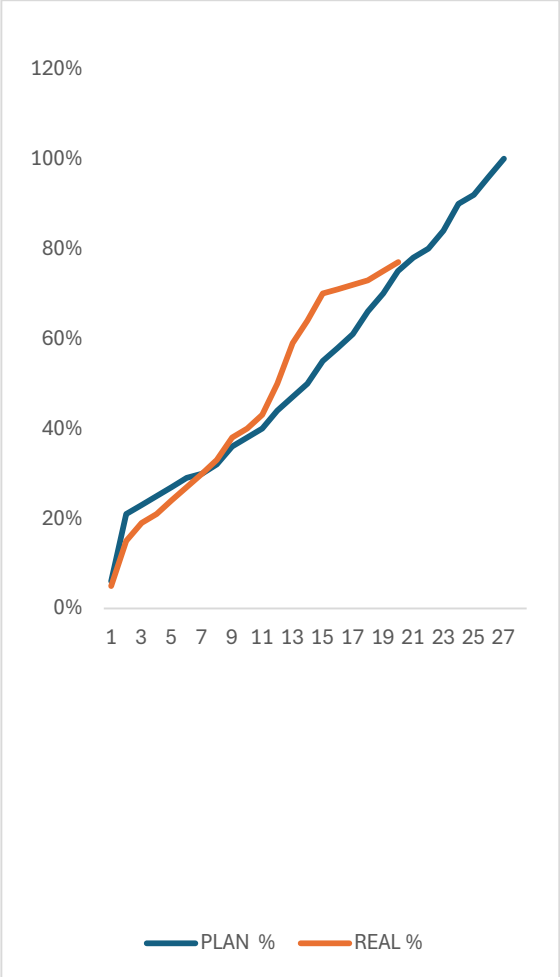


INFORME SEMANAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE		
SUMINISTRO	**97%** Cumple respecto a la programación	Se compran accesorios a medida que se van entregando módulos.
FABRICACIÓN	**76%** Continua fabricación en serie	Se llevo a cabo revisión de calidad y se organizo un plan de supervisión para implementar en las nuevas casetas y realizar mejoras en los modulos con observaciones.
INSTALACIÓN	**59%** 7 módulos faltantes por instalación	**2 puntos** pendientes de asignación 3 **PMT** aprobados 2 **PMT** en trámite de aprobación **10 módulos** ya instalados

DETALLE ENTREGAS MÓDULOS

# de entrega	PLAN	Fecha de entrega propuesta	REAL	Fecha de entrega real
1	1	15 de octubre, 2025	1	31 de octubre, 2025
2	3	25 de noviembre, 2025	3	1 de diciembre, 2025
3	2	15 de diciembre, 2025	2	22 de diciembre, 2025
4	4	19 de diciembre, 2025	4	9 de Enero, 2026
5	2	5 de febrero, 2026		
6	2	19 de febrero, 2026		
7	3	5 de Marzo, 2026		
TOTAL	17		10	

CRONOGRAMA

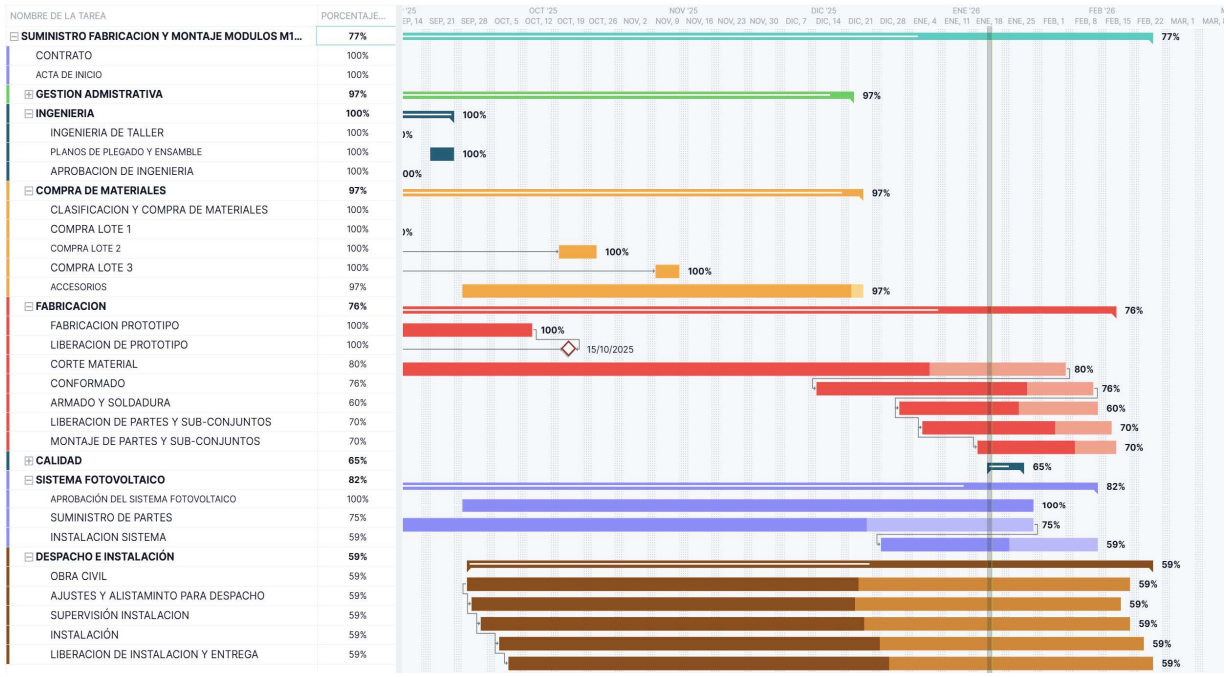

JOVI + TECH


INFORME SEMANAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

OBJETO DEL CONTRATO	*INFORME NO*	*DEL*	*AL*
Fabricación e instalación de módulos para venta al usuario M-141 + Adición cubiertas	2	Lunes, 12 de Enero	Viernes, 16 de Enero

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					*ELEMENTOS CONTRATADOS*		
	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE	DÍAS DE DIFER.		FABRICACIÓN	INSTALACIÓN
DÍAS	60	16	44	4,8	CONTRATADOS	17	17
%	100%	27%	73%	8%	ENTREGADOS	0	0

CONTROL DE TIEMPO

CORTE	SEMANA	PLAN %	REAL %	DES
1	ENERO 5 - 9	3%	8%	5%
2	ENERO 12 - 16	9%	17%	8%
3	ENERO 19 - 23	18%		
4	ENERO 26 - 30	24%		
5	FEBRERO 2 - 6	32%		
6	FEBRERO 9 - 13	45%		
7	FEBRERO 16 - 20	52%		
8	FEBRERO 23 - 27	68%		
9	MARZO 2 - 7	77%		
10	MARZO 9 - 13	100%		

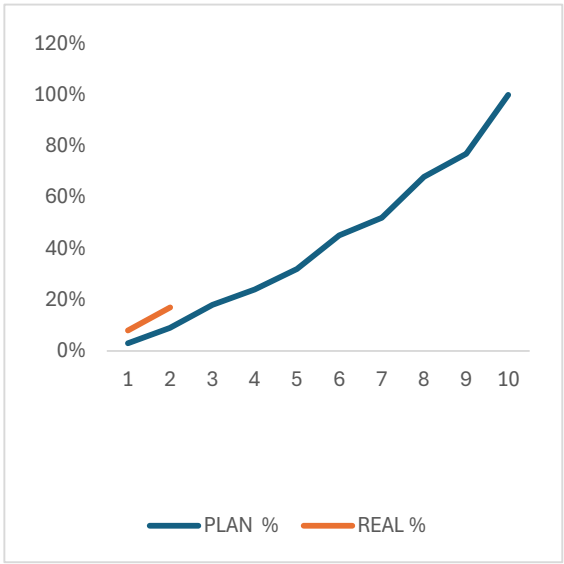

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE ADICION CUBIERTAS


SUMINISTRO	**14%** Acorde con el cronograma	Se mantiene plan de compras establecido en el cronograma
FABRICACIÓN	**3%** 70% avance de cabeza de serie 3% avance general	En proceso de armado y soldadura de cabeza de serie
INSTALACIÓN	**0%** 17 módulos faltantes por instalación	**2 puntos** pendientes de asignación **13 PMT** activos 2 **PMT** en proceso de aprobación

OTRAS ACTIVIDADES

JOVI + TECH

INFORME SEMANAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

CRONOGRAMA

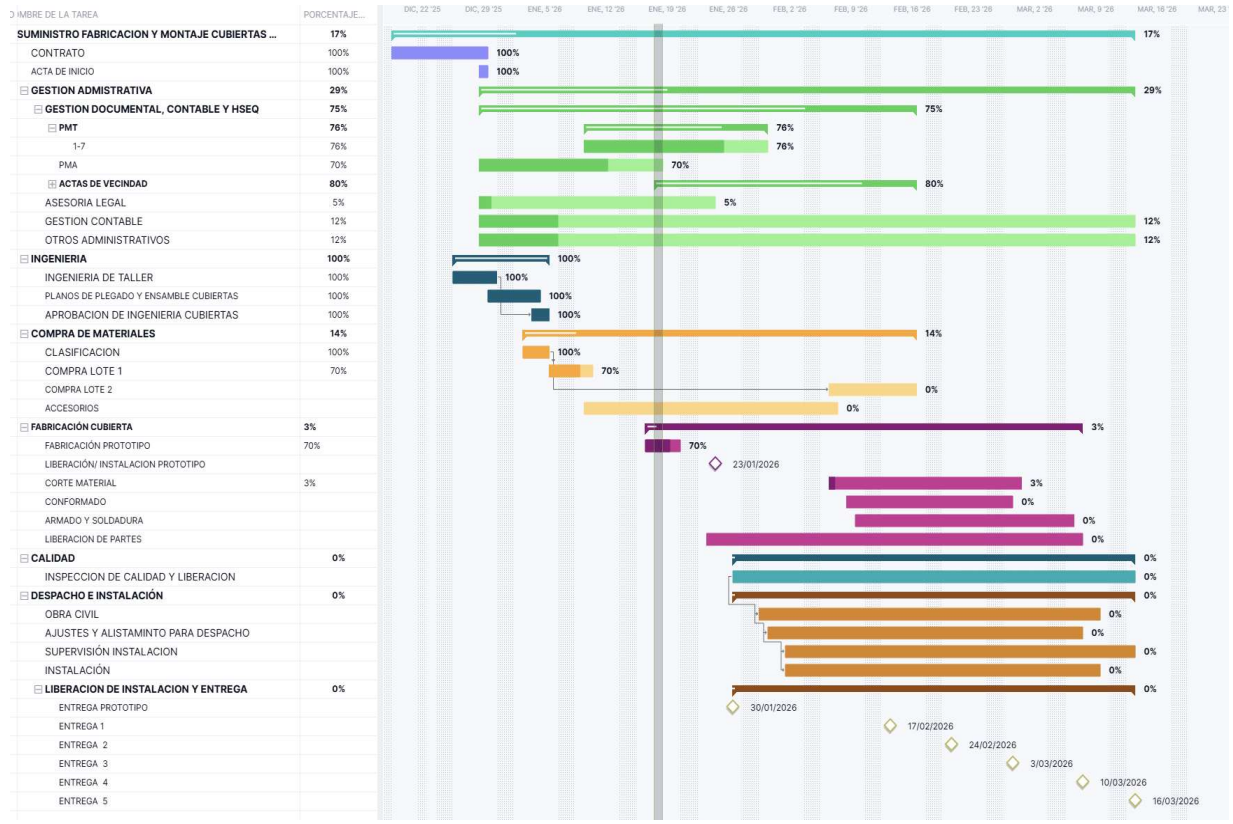

DETALLE ENTREGAS CUBIERTAS

# de entrega	PLAN	Fecha de entrega propuesta	REAL	Fecha de entrega real
1	1	29 de enero, 2026		
2	2	17 de febrero, 2026		
3	3	24 de febrero, 2026		
4	3	3 de Marzo, 2026		
5	4	10 de Marzo, 2026		
6	4	16 de Marzo, 2026		
TOTAL	17		0	


EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL DEL PROYECTO


# ENTREGA - (CANT)	FECHA	REAL	MONTO EJECUTADO	MONTO PAGADO	FECHA PAGO
1 (2)	oct-30	oct- 31 (1 Und)	$ 51.264.373,00	$ 43.489.350,00	26-nov-25
2 (3)	nov-11	nov-28 (3 Und)	$ 153.793.119,00	$ 143.820.990,00	22-dic-25
3 (4)	nov-25				
4 (4)	dic-12				
5 (4)	dic-22				


INFORME SEMANAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES


REGISTRO FOTOGRÁFICO











OTRAS ACTIVIDADES

Se realizó y puso en marcha el plan de calidad para mejoramiento de acabados en los módulos próximos a entregar y se organiza un plan de acción para mejoramiento de los módulos con observaciones.

NOTAS

LAURA BORDA	EDWIN ROJAS	HEMBERT PERDOMO
ELABORÓ	***RESPONSABLE UT JOVI TECH***	***RESPONSABLE IPES***
