Puerto Gaitán Meta
Paraíso Natural

FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO DE LIQUIDACION DE OBRA PÚBLICA
INF-FR-21 V04.
Vigencia desde 22/11/2021

CONTRATO DE OBRA No. 1451	DIA 10	MES DIC	2024
OBJETO: RESTAURACION DE 3 HECTAREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACION TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENTAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META			
CONTRATISTA : SERVICIOS E INGIENERIA M&M P.G. SAS	R/L.	ANA MILDRETH SOTO MEDINA	
INTERVENTORIA : N/A	R/L.	N/A	
SUPERVISOR : Sandra Milena Castañeda Pinilla - Secretaria Ecologica y Ambiental.			
FECHA DE COBRO	DIA 27	MES Dicimebre	AÑO: 2024
GFI	DAC X		

ITEM	FORMATO	DOCUMENTO/TRAMITE	DAC	GFI	DOCUMENTOS SI	DOCUMENTOS NO	DOCUMENTOS N/A	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	-	Solicitud de iniciar tramite liquidación	X	N/A				Supervisor	
2	-	Copia Minuta de Contrato y adiciones	N/A	X				Contratista	
3	-	Certificado Registro presupuestal	N/A	X				Contratista	
4	-	Factura	X	X				Contratista	
5	INF-FR-75	Informe final de liquidación de obra	X	N/A				Contratista, Interventor	
6	-	Certificacion Bancaria para pago por Trasferencia	N/A	X				Contratista	
7	-	Certificado de rendimientos financieros de la cuenta si tenia anticipo	N/A	N/A				Contratista	
8	-	Consignación de los intereses	N/A	N/A				Contratista	
9	INF-FR-55	Certificado Pago Seguridad Social (Interventoria a obra)	X	N/A				Interventor	
10		Certificado del revisor fiscal (incluir soportes del revisor) en caso de no tener revisor fiscal debe estar firmado solo por el R/L	X	X				Contratista	
11		Comprobantes pago seguridad social , planillas y parafiscales con pantallazos verificación en linea	X	N/A				Contratista, Interventor	
12	-	Certificados de parafiscales (pago Fic Sena icbf, caja compensación) o Cree	X	N/A				Contratista	
13	-	Certificado de Ministerio de trabajo	X	N/A				Contratista	
14	-	Certificado de Paz y salvo de los trabajadores y revisor fisca	X	N/A				Contratista	
15	-	Informe Acta de Liquidación del Anticipo (Fiducia)	N/A	N/A				Contratista, Interventor	
16	-	Acta de ingreso almacén	X	N/A				Contratista, Interventor	
17	INF-FR-12	Bitacora de obra original	X	N/A				Contratista, Interventor	
18	-	Manual de mantenimiento y/o recomendaciones para la operación y conservación de las obras y que entren en funcionamiento y/o para suscripción del recibo final.	N/A	N/A				Contratista, Interventor	
19	DAC-FR-51	Acta de Liquidación del Anticipo	N/A	N/A				Contratista, Interventor	
20	INF-FR-29	Acta de Liquidación de Imprevistos	X	N/A				Contratista, Interventor	
21	INF-FR-28	Acta para pago final	X	X				Contratista, Interventor	
22	DAC-FR-27	Aprobación Pólizas Recibo Final	X	N/A				Contratista	
23	-	Paz y Salvo Tributario	N/A	N/A				Contratista	
24	-	Cancelación de pasivos exigibles y/o reservas presupuestales (si se requiere)	N/A	N/A				Supervisor	
25	DAC-FR-41 - DAC-FR-46	Acta Liquidación de contrato de obra	X	X				Contratista Interventor o supervisor	

NOTA: Se advierte que la omisión de verificación real de la presente información constituye falsedad ideológica en documento, que puede servir de prueba, tipificada en la ley penal como delito, además de las sanciones administrativas y disciplinarias que con lleva.

SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA
SECRETARIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL
Supervisora

M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

Puerto Gaitán Meta, 27 de diciembre del 2024

SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA
Secretaria Ecológica y Ambiental
Supervisora

REF. "RESTAURACION DE 3 HECTAREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACION TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO MDE PUERTO GAITAN-META"

Asunto: SOLICITUD INICIO TRAMITE LIQUIDACION.

Cordial saludo doctora **SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**, en atención al contrato de obra No. 1451 del diez (10) de diciembre del 2024 con el objeto como se menciona en la referencia, solicito de su colaboración, para el inicio del trámite de recibo final del contrato en mención. Cabe resaltar que lo anterior debido a que se cumplió en su totalidad con cada de las especificaciones y cantidades.

Sin otro particular

Mildreth Soto M.

SERVICIOS E INGENIERA MCM PG SAS
901764884
R/L ANA MILDRETH SOTO MEDINA

Puerto Gaitán, 27 de diciembre de 2024.

Doctora,
ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
Directora del Departamento Administrativo
de Contratación Pública.
Puerto Gaitán-Meta.

REF. Tramite Liquidación

Asunto: **SOLICITUD INICIO TRAMITE LIQUIDACION**.

Cordial saludo

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente en atención al contrato de obra No. 1451 del diez (10) de Diciembre del 2024 cuyo objeto corresponde a: "**RESTAURACION DE 3 HECTAREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACION TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META**", solicito de su colaboración, para el inicio del trámite de liquidación del contrato en mención.

Cabe resaltar que lo anterior debido a que se cumplió en su totalidad con cada de las especificaciones y cantidades

Atentamente,

SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA
Secretaria Ecológica y Ambiental

Elaboró: Martin Sebastián Pérez Romero / CPS 1162 del 2024.
Revisó: Sandra Milena Castañeda Pinilla / Secretaria Ecológica y Ambiental.

"Para la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán, resulta de gran importancia conocer su opinión respecto de la calidad del servicio prestado. por ello le invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción al ciudadano. que encontrará escaneando el siguiente código QR"

Factura Electrónica De Venta No

MMPG No. 46

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066123707 que habilita desde MMPG 1 hasta MMPG 500000. Vence 2025-02-24

SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS

Nit 901764884

Régimen Simple
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8130 8.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
NIT	800079035 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 10 10 60	Puerto Gaitár	3203750721

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/01/2025	14/01/2025	HEIDY TATIANA DUQUE DAZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	330	Und.	40.000,00	0%	0,00	13.200.000,00
2	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	3.900	Und.	4.670,00	0%	0,00	18.213.000,00
3	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	17	Und.	20.857,00	0%	0,00	354.569,00
4	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	55	Und.	51.873,00	0%	0,00	2.853.015,00
5	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	15	Und.	32.080,00	0%	0,00	481.200,00
6	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	4	Und.	355.000,00	0%	0,00	1.420.000,00
7	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	18	Und.	70.000,00	0%	0,00	1.260.000,00
8	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	2.033	Und.	3.968,00	0%	0,00	8.066.944,00
9	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	1.300	Und.	9.800,00	0%	0,00	12.740.000,00
10	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	3	Und.	470.000,00	0%	0,00	1.410.000,00
11	Serv10	Servicio de cuadrilla ambiental	3	Und.	448.000,00	0%	0,00	1.344.000,00
12	41309502	Administración	1	Und.	15.949.109,28	0%	0,00	15.949.109,28
13	41309503	Imprevistos	1	Und.	612.932,99	0%	0,00	-612.932,99
14	41309504	Utilidad	1	Und.	2.453.709,12	0%	0,00	2.453.709,12

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**80.358.479,39**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**80.358.479,39**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**80.358.479,39**

Valor en Letras

OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 10:41:52

CRA 4 17A 27 BRR NUEVA JERUSALEN Teléfono 3144012401 Puerto Gaitán
Correo Electrónico gerenciamympgsas@hotmail.com

CUFE: 802d18def09e7b871163c8cc697cc8f8929ce3873f73d06544fb6b03cdb5c5687c6aa9ee59ab4d4b32cba4d7ca561368--Expedición:13/01/2025 12:27 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Puerto Gaitán META Paraíso Natural

FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA

INF-FR-75 V03

Vigente desde 22/11/2021

Ciudad y Fecha: 27/12/2024

Contrato de obra No.: 1451 DEL 2024

Objeto: RESTAURACION DE 3 HECTAREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACION TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META

Radicado No: 001 Fecha: 27 / 12 /2025

Periodo del informe: Desde: 13/ 12 / 2024 Hasta: 27 / 12 / 2024

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	***INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO***					
1,01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	SI	x			
2	***INFORMACION DEL CONTRATO***					
2,01	**Cuadro de trazabilidad:** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	SI	x			
3	***INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO***					
3,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	SI	x			
4	***INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO***					
4,01	Plan de inversión de anticipo				X	
4,02	Información de avance financiero de la obra				X	
4,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de obra.	SI	x			
4,04	Acta de desembolso del anticipo de obra (si aplica).				X	
4,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra .	SI	X			
4,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato con N° de rubro, fuente de financiación	SI	x			
4,07	Ordenes de pago efectuadas (Desembolso de anticipo y pagos parciales)				x	
5	***INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO***					
5,01	Grafico avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas. (financiera, por porcentajes)				X	
5,02	Cuadro de avance con acumulado mes a mes				X	
5,03	Control del estado del tiempo resumen (dia a dia mes reportado en el informe)				X	
6	***INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO***					
6,01	Cuadro de relación de personal de obra (profesional - operativo) propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) y organigrama de personal	SI	X			
6,02	Certificado del representante legal y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matricula y antecedentes de la junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	SI	X			
6,03	Paz y salvo de los trabajadores (retirados al corte)	SI	X			
7	***CUADRO DE LABORATORIOS TOMADOS EN EL PERIODO***				X	
8	***CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)***				X	
9	***INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO***					
9,01	Certificación del cumplimiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del proyecto (prediales, ambientales, de construcción en otros).				X	
9,02	Seguimiento a la disposición de materiales				X	
9,03	Registro fotográfico de actividades ambientales				X	
10	***ANEXOS***					
10,01	Actas de socialización (informes inicial)				X	
10,02	Actas de vecindad (de apertura y cierre - si aplica)				X	

Puerto Gaitán Meta Potencia Natural

FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA

INF-FR-75 V03

Vigente desde 22/11/2021

Ciudad y Fecha: 27/12/2024

Contrato de obra No.: 1451 DEL 2024

Objeto: RESTAURACION DE 3 HECTAREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACION TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META

Radicado No: 001 Fecha: 27 / 12 /2025

Periodo del informe: Desde: 13/ 12 / 2024 Hasta: 27 / 12 / 2024

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
10,03	Relación de comités de obra. (según orden cronológico y debidamente numeradas)	SI	X			
10,04	Registro fotográfico del acta de avance con acumulado mes a mes	SI	X			
10,05	Cartera topográfica de obra (si en el periodo se ejecutaron labores que requiera esta labor)				X	
10,06	Calidad de los materiales, ensayos de laboratorio y certificados de calidad, (anexar de acuerdo al tipo de obra y obligaciones legales , anexando certificados de los materiales y de calibración de equipos utilizados en los ensayos o levantamientos topográficos)				X	
10,07	Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)				X	
10,08	Informe de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en el cual se registre el seguimiento de las capacitaciones, entregas de EPP, protocolos de prevención y mitigación del COVID-19 y su seguimiento mediante registros (planillas, formatos, etc.) debidamente firmados por el profesional correspondiente				X	
10,09	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según aplique (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	SI	X			
10,1	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratados por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	SI	X			
10,11	Ordenes de operación de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de obra (si aplica)				X	
10,12	Aprobación del contrato fiduciario (si aplica)				X	
10,13	Informe del contrato fiduciario del anticipo del contrato de obra (si aplica)				X	
10,14	Anexos (cada ficha de PMA o PAGA genera una evidencia la cual debe venir relacionada en el informe de interventoria, así como del cumplimiento de los deberes derivados de los actos administrativos, registro fotográfico). firmado por el profesional (si aplica).				X	
11	***CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)***	SI	X			

Revisó y aprobó:

SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA
SECRETARIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
(Periodo 13 de diciembre de 2024 al 27 de diciembre de 2024)

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

INFORMACION BASICA

CONTRATO DE OBRA No.	**1451 del 2024**
OBJETO:	RESTAURACION DE 3 HECTAREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACION TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META
CONTRATISTA:	SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS
NIT:	901.764.884-0
REPRESENTANTE:	ANA MILDRETH SOTO MEDINA 30.982.985 de Puerto Gaitán-Meta
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	DIEZ (10) DE DICIEMBRE DEL 2024
TERMINO DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA INICIAL DE TERMINACION	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. ____	N/A
FECHA PRORROGA No. ____	N/A
FECHA TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. ____	N/A
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($ 80.358.973,70)
FECHA ADICION No. ____	N/A
VALOR ADICION No. ____	N/A
VALOR ACTUALIZADO	N/A

1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES

PRORROGA/ ADICION N°	MOTIVO	FECHA PRORROGA	PERIODO PRORROGA	NUEVA FECHA TERMINACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. INFORMACION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1-AC-1-3202 / 2024505680043/3202005	$ 80.358.973,7	DIS.2024003310	RES.2024003934
TOTALES	$ 80.358.973,7		

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			

BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	

2. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL NO.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
N/A	N/A
N/A	N/A

3. NFORMACION PRESUPUESTAL.

3.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP	RUBRO	FUENTE	DENOMINACION	VALOR
DiS. 2024003310	AC-1-3202-0900 32002005 202450680043	1095-1.2.3.4.02 – ICLD LEY 99 – DESTINO AMBIENTAL	Restauracion de ia biodiversidad y sus servicios ecosistematicos en el municipio de puerto faitan	$80.358.973,70

3.2. REGISTRO PRESUPUESTAL;

RP	RUBRO	FUENTE	DENOMINACION	VALOR
RES.2024003934 del 10 de diciembre dei 2024	AC-1-3202-0900 32002005 202450680043	1095-1.2.3.4.02 – ICLD LEY 99 – DESTINO AMBIENTAL	Restauracion de la biodiversidad y sus servicios ecosistematicos en el municipio de puerto faitan	$80.358.973,70

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

4. VERIFICACION DE POLIZAS

	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIOZA NO.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN SUSCRIPCION DEL CONTRATO	**Seguros del estado**		**30-44-101061382 Anexos 0**
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	10/12/2024	26/04/2025	$16.071.794,74
Pago de salarios y prestaciones sociales	10/12/2024	26/04/2027	$4.017.948,69
Calidad del servicio	10/12/2024	26/12/2025	$16.071.794,74
	COMPAÑÍA DE SEGUROS		**POLIZA NO.**
GARANTIA DE RESPOPNSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGÚN SUSCRIPCION DEL CONTRATO	**Seguros del estado**		**30-40-101022826 ANEXO 0**
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10/12/2024	**26/12/2024**	**$260.000.000**

FECHA DE APROBACION	ESTADO DE POLIZAS
13 de diciembre del 2024	**vigentes**

	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIOZA NO.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTA DE INICIO Y SEGÚN RECIBO FINAL DEL CONTRATO	**Seguros MUNDIAL**		**CV-100046979 Anexo 2 Certificado 24146461**
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	13/12/2024	28/04/2025	$16.071.794,74
Pago de salarios y prestaciones sociales	13/12/2024	28/12/2027	$4.017.948,69
Calidad del servicio	13/12/2024	28/04/2025	$16.071.794,74
	COMPAÑÍA DE SEGUROS		**POLIZA NO.**
GARANTIA DE RESPOPNSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGÚN ACTA DE INICIO Y SEGÚN RECIBO FINAL DEL CONTRATO	**Seguros MUNDIAL**		**CV-100012656 Anexo 2 Certificado 24146464**
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	13/12/2024	**28/12/2024**	**$260.000.000**

FECHA DE APROBACION	ESTADO DE POLIZAS

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

26 de marzo del 2024	aprobadas

MODIFICACION POLIZAS SEGÚN PRORROGA

MODIFICACION N.	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIOZA NO.
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE APROBACION		ESTADO DE LAS POLIZAS	
N/A		N/A	

MODIFICACION N.	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA N.
N/A	N/A	N/A

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
N/A	N/A

B. PERSONAL DE OBRA

A continuación se relaciona el personal que labora en la ejecución del contrato de OBRA, del cual se verifico el pago de seguridad social del periodo correspondiente:

ITEM	NOMBRES	CARGO
1	MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL	Ingeniera Forestal Residente
2	JOSE ANTONIO GARCIA MURILLO	Técnico
3	FREIMAN YESID GAMEZ SOLER	Operario
4	RICARDO GONZALEZ MOSQUERA	Operario
5	CRISTIAN ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS	Operario
6	YIMIR SILVA REYES	Operario

C. INFORME DE REVISION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y DISEÑOS (para el primer informe mensual) EN EL CASO DE CONVENIOS INCLUIR TAMBIEN LA VERIFICACION DE LOS ITEMS DEL CONTRATO DERIVADO VS LOS DEL CONVENIO

No aplica

D. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	N/A	$ 80.358.973,7
VALOR ADICIONES (Si aplica)	N/A	N/A
VALOR PAGOS REALIZADOS	0	0
VALOR A PAGAR ACTUALMENTE	$ 80.358.479,39	0
SALDO	$494,31	0
SUMAS IGUALES	$ 80.358.973,7	$ 80.358.973,7

E. AVANCE DE EJECUCION FISICO (obra).

Dentro de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido desde el 13 de diciembre de 2024 al 27 de diciembre del 2024, se cuenta con una ejecución del 100% de las actividades, las cuales fueron constatadas y verificadas por parte de la supervisión, de los cuales se pudo concluir el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas balo el contrato No 1451 de 2024:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	% DE EJECUCION
1	**CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS**			
1.1	Suministro e instalación de Poste de madera aserrada de Eucalipto, inmunizado por inmersión. Dimensiones 8-10 x 210 centímetros (Cada 3 metros)	und	330	100%
1.2	Suministro e instalación de alambre de púa Galvanizado calibre 12.5, rollo por 350 m lineales (240m x 4 líneas de alambrado)	Ml	3900	100%
2	**CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (Incluye control de insectos, control de enfermedades, etc)**			
2.1	Polvo Espolvoreable, ingredientes activos: Clorpiryfos, organofosforados, formulados para control de hormiga arriera en presentacion de bolsa de 1 kilogramo (5 gr por planta)	Kg	17	100%
3	**ABONO ORGANICO**			
3.1	Suministro y aplicación de abono de origen orgánico bio-solido, compostado pre húmico, con caracteristicas físicas, biológicas y químicas conocidas, productos registrados. (500 gr por árbol)	Bulto	55	100%
4	**CORRECTIVO DE ACIDEZ**			
4.1	Suministro y aplicación de mineral calcáreo compuesto de un carbonato doble de calcio y magnesio. Su color varia del blanco al gris pasando por ligeros tonos de amarillo en algunos casos Es una cal agrícola destinada a corregir la acidez en suelos, también es un fertilizante simple por su alto contenido de magnesio. (200gr por árbol)	Bulto	15	100%
5	**FERTILIZANTE**			
5.1	Suministro y aplicación de fertilizante edáfico compuesto NPK RELACION 18-18-18, sólido soluble triple quince. (40 gr por planta)	Bulto	4	100%
6	**HIDRORETENEDOR**			
6.1	Suministro y aplicación de acondicionador físico del suelo, para mejorar la capacidad de absorción, retención de agua y nutrientes del suelo, no contamina el suelo ni el agua, su pH es neutro. Al entrar en contacto con el agua puede llegar a absorber de 400 a 500 veces su peso y los cristales se convierten en un gel granulado que queda a disposición de las raíces de las plantas. (5gr por planta)	Kg	18	100%
7	**PLANTULAS (Palma de Moriche, Nacedero, Búcaro, Guásimo, Cedro Amargo, Guarataro)**			
7.1	Suministro y siembra de plántula presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de un kilo. Las plantulas deben tener una altura minima de 50 cm. y no mayor de 80 cm. (Especies nativas).	Unid	2033	100%
7.2	Suministro y siembra de plántula de moriche presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle de 20*15 cm, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma,	Unid	1300	100%

	con pan de tierra mínimo de 1 kilo. Las plántulas deben tener una altura entre 50 y 80 cm.			
8	**PLATEO y AHOYADO**			
8.1	Plateo y ahoyado	Ha	3	100%
9	**LIMPIEZA (Corte de vegetación (incluye guadañadora))**			
9.1	Corte de vegetación (incluye guadañadora)	Ha	3	100%

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

No.	OBLIGACIÓNES GENERALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Cumplir con el objeto contratado, en los términos y condiciones establecidos .	Se cumplió con el objeto contratado en su totalidad, respetando los términos y condiciones establecidos e n e l contrato. Cada actividad fue ejecutada de acuerdo con lo pactado, asegurando el cumplimiento de los plazos, la calidad requerida y la entrega de los resultados esperados, en conformidad con las especificaciones detalladas en el acuerdo contractual.
2	Garantizar y responder por la buena ejecución del Contrato	Se garantizó y respondió por la buena ejecución del contrato, asegurando que todas las actividades se llevaran a cabo conforme a lo establecido en los términos del contrato. Esto incluyó la implementación de medidas preventivas y correctivas para garantizar la calidad, el cumplimiento de los plazos y la satisfacción de los requisitos contractuales, asumiendo plena responsabilidad por cualquier incumplimiento o desviación que pudiera surgir durante la ejecución del proyecto.
3	Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo.	Se respondió por todas l as actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato, sin embargo, no hubo faltas relacionadas con la ejecución del mismo.
4	Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual.	S e suscribieron las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual, formalizando y documentando cada una de l as etapas y acuerdos alcanzados durante l a ejecución del contrato. Estas actas fueron firmadas de acuerdo con los procedimientos establecidos, asegurando la correcta constatación de los avances, la resolución de posibles incidencias v el cumplimiento de los términos acordados entre las partes.
5	Mantener actualizado el domicilio, hasta la finalización del contrato.	Se mantuvo actualizado el domicilio para notificaciones durante toda la vigencia del contrato, garantizando que cualquier comunicación oficial relacionada con el contrato llegara de manera oportuna y eficaz. Esta información fue actualizada conforme a los requerimientos del contrato asegurando la correcta recepción de todas las notificaciones hasta la finalización del mismo.

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

6	Asumir todos los costos que genere la legalización del presente contrato.	Se asumieron todos los costos asociados con la legalización del presente contrato, incluyendo los trámites administrativos, la elaboración de documentación requerida y cualquier otro gasto necesario para formalizar y poner en vigor el acuerdo, sin generar cargos adicionales a la Entidad Estatal.
7	Tener cuenta corriente o de ahorros de una entidad bancaria.	Se cumplió con la obligación de tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria, lo que permitió una gestión eficiente de los pagos y transacciones relacionados con el contrato, asegurando el cumplimiento de las disposiciones financieras establecidas e n e l mismo
8	Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato	Se informó de manera oportuna a los contratantes sobre cualquier novedad derivada del contrato, asegurando que todas las situaciones relevantes, cambios o inconvenientes fueran comunicados de inmediato. Esto permitió una gestión eficiente y la adopción de medidas correctivas o ajustes necesarios, manteniendo la transparencia y el cumplimiento de los objetivos del contrato.
9	Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales, SENA e ICBF, conforme a la normatividad vigente. El cumplimiento de este requisito, es condición indispensable para el trámite de los pagos. El contratista deberá presentarle a la supervisión del contrato, la documentación que acredite el cumplimiento del mismo.	Se cumplió con todas s u s obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales, SENA e ICBF. conforme a la normatividad vigente. Este cumplimiento se considera condición indispensable para el trámite de los pagos. Además, se presentó oportunamente a la supervisión del contrato la documentación que acreditó dicho cumpiimiento, garantizando que todas ias obligaciones legales y contractuales fueran atendidas debidamente.
10	Constituir las garantías exigidas, las cuales deberán ser aportadas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la celebración del contrato.	Se constituyeron las garantías exigidas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la celebración del contrato, cumpliendo con los requisitos establecidos. Las garantías fueron presentadas conforme a las especificaciones solicitadas, asegurando la ejecución adecuada del contrato y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
11	Mantener vigentes las garantías por el tiempo pactado en el contrato.	Se mantuvieron vigentes las garantías durante todo el período pactado en el contrato, asegurando su validez y cumplimiento hasta la finalización del mismo.
12	Cumplir con los requisitos de la ejecución del contrato consignados en el MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DOR-MN-04	Se cumplieron con todos los requisitos establecidos e n el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas DOR-MN-04 VERSIÓN 01, así como con los requisitos específicos para tareas de alto riesgo, contratistas permanentes o propietarios de edificaciones, según correspondiera. Anexar

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

	VERSIÓN 01. Así mismo, cumplir con los requisitos tareas de alto riesgo, requisitos contratistas permanentes o requisitos para propictarios de las edificaciones, en caso que aplique.	números de planilla y notificar los anexos de soporte de las planillas
13	Cumplir con los deberes de seguridad y salud en el trabajo para contratistas consignados en el MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DOR-MN-04 VERSIÓN 01, el cual puede ser consultado en la página web de la entidad.	Se cumplió con todos los deberes de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas DOR-MN-04 VERSIÓN 01, el cual fue consultado y seguido de acuerdo con las directrices proporcionadas e n la página web de la entidad.
14	Presentar al supervisor del contrato informes sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.	Se presentó de manera oportuna al supervisor del contrato los informes detallados sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo. Este informe incluye información sobre la ejecución de las tareas, el cumplimiento de los plazos establecidos, cualquier incidencia o novedad, y los resultados alcanzados en cada fase del proyecto, asegurando una comunicación fluida y un seguimiento adecuado del contrato
15	Informar inmediatamente a la administración en el evento que se evidencia irregularidades.	Se informó inmediatamente a la administración sobre cualquier irregularidad detectada durante la ejecución del contrato.
16	Atender a los requerimientos del Municipio, a través del supervisor del contrato.	Se atendió de manera oportuna y eficaz todos los requerimientos del Municipio a través del supervisor del contrato. Se garantizó la colaboración constante y la respuesta rápida a las solicitudes o indicaciones del supervisor, asegurando que todas las actividades se desarrollaran de acuerdo con las expectativas y necesidades del Municipio
17	Realizar las demás actividades encomendadas por el Municipio, a través del supervisor y relacionadas en forma directa con el objeto del contrato	Se realizaron todas las actividades adicionales encomendadas por el Municipio, a través del supervisor del contrato, q u e estuvieron directamente relacionadas con el objeto del mismo. Estas actividades se ejecutaron de manera diligente y conforme a los requisitos establecidos, asegurando el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y contribuyendo al éxito del proyecto
No	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1	Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Se ha dado cumplimiento total al objeto y alcance del contrato conforme a lo estipulado en el documento principal y sus anexos, asegurando que cada uno de los términos, condiciones y actividades requeridas se ejecutaron de manera efectiva y dentro de los plazos establecidos.

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

2	Realizar el aislamiento de las zonas a restaurar conforme las especificaciones técnicas.	Se llevó a cabo el aislamiento de las zonas restauradas siguiendo estrictamente las especificaciones técnicas establecidas. Esto incluyó la instalación de tinales y alambre de púas adecuados para proteger las áreas intervenidas, garantizar la regeneración y evitar el ingreso de ganado u otras actividades que pudieran afectar negativamente el proceso de restauración.
3	El contratista deberá realizar las actividades propias de la restauración conforme las especificaciones técnicas.	Se realizaron todas las actividades correspondientes al proceso de restauración conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Esto incluyó la preparación del terreno, la selección y plantación de especies nativas apropiadas para el ecosistema, el mantenimiento inicial de las áreas intervenidas, entre otras, además del seguimiento necesario para garantizar el éxito de la restauración.
4	Brindar la asistencia técnica al establecimiento y mantenimiento y monitoreo a la reforestación.	Se brindó asistencia técnica integral durante el establecimiento, mantenimiento y monitoreo de las actividades de reforestación.
5	Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Se cumplió a cabalidad con todas las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, garantizando que cada etapa del proyecto se ejecutara de acuerdo con los requisitos, términos y lineamientos definidos, asegurando transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo en todas las actividades realizadas.
6	Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	El objeto del contrato se desarrolló cumpliendo plenamente con las condiciones de calidad, oportunidad y las obligaciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. Todas las actividades fueron ejecutadas con altos estándares técnicos, dentro de los plazos estipulados, y respetando los compromisos adquiridos, lo que aseguró el logro de los objetivos del proyecto de manera eficiente y efectiva.
7	Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.	Se mantuvo una comunicación permanente y efectiva con el supervisor del contrato durante toda la ejecución del proyecto. Esto incluyo reuniones de seguimiento, resolución oportuna de inquietudes y la notificación inmediata de avances y eventualidades, asegurando una coordinación adecuada y el cumplimiento de las metas establecidas.
8	Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Se facilitó de manera continua la labor de seguimiento y control realizada por el supervisor del contrato, atendiendo oportunamente todas las observaciones y requerimientos formulados. Se proporcionó la documentación necesaria, acceso a las áreas de trabajo y respuestas claras y precisas, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los objetivos del contrato.
9		Se dispuso del personal idóneo, debidamente capacitado y con experiencia en las actividades

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	requeridas, así como de los recursos logísticos, materiales y equipos necesarios para desarrollar el contrato. Esto permitió cumplir con los plazos establecidos y garantizar la calidad esperada en cada una de las etapas del proyecto, asegurando el éxito de su ejecución.
10	Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	Se cumplió plenamente con las normas de gestión ambiental y las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo vigentes durante la ejecución del contrato. Todas las actividades se llevaron a cabo respetando los lineamientos ambientales y promoviendo un entorno seguro para el personal involucrado. Además, se atendieron todas las acciones requeridas y se presentaron las evidencias correspondientes de conformidad con los anexos del contrato, garantizando el cumplimiento normativo y contractual.
11	Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	Tras la buena comunicación se pudo informar de manera oportuna a la Entidad Estatal sobre cualquier situación que implicara una modificación en el estado de los riesgos existentes, conforme a lo establecido en el contrato, sin embargo no existieron cambios.
12	Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Se comunicaron de manera inmediata y detallada a la Entidad Estatal todas las circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier otro tipo que pudieran afectar la ejecución del contrato. Esta comunicación fue oportuna y transparente, permitiendo la adopción de medidas adecuadas para mitigar posibles impactos y garantizar el cumplimiento de los términos contractuales.
13	Presentar informe final con soporte fotográfico donde se evidencie el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la realización de los servicios logísticos y la entrega de elementos contratados.	Se presentó el informe final con soporte fotográfico, en el cual se evidenció el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. El informe incluyó detalles sobre la realización de los servicios logísticos, así como la entrega de los elementos contratados, con fotografías que respaldaron cada etapa del proceso y demostraron el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.
14	El contratista debe garantizas la entrega de los bienes que requieren entrada al almacén de la entidad	El contratista garantizó la entrega oportuna de los bienes que requieren ingreso al almacén de la entidad, cumpliendo con todos los procedimientos establecidos para su recepción y registro. Se aseguraron las condiciones de calidad y cantidad de los bienes entregados, conforme a las especificaciones contractuales, y se gestionó adecuadamente la documentación necesaria para su correcta entrada y control en el almacén.
15		El contratista cumplió con todas las demás obligaciones que demandaba el cabal cumplimiento

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

	las demás que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual.	del objeto contractual, asegurando la correcta ejecución de cada actividad y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos. Esto incluyó la atención a las necesidades adicionales que surgieron durante el desarrollo del proyecto, siempre alineadas con los objetivos y condiciones pactadas en el contrato.

F. RELACION DE DOCUMENTOS

No aplica

G. **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR**

- El presente informe describe las actividades realizadas por el contratista para la ejecución de acta de recibo final, en donde se refleja una ejecución del 100% de la obra, de acuerdo con las cantidades programadas, no obstante se ejecutó el 99.99% del presupuesto oficial.

- De acuerdo con lo anteriormente expuesto en el informe, se deja la trazabilidad que se obtiene como resultado: **RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META**.

- Se realizo el suministro y siembre de plántulas de las diferentes especies nativas del contrato, que cumplieron a cabalidad con la altura y condiciones de calidad, de igual manera se realizó la siembra de plántulas de moriche las cuales tenían un promedio de 60 cm.

- De acuerdo al contrato, el valor a cobrar es de **OCHETA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUECE CENTAVOS M/CTE ($80.358.479,39).**

- Se garantiza el desarrollo de las actividades realizadas, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato de obra 1451 del 10 de diciembre de 2024, cuyo objeto es "**RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META**".

SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA
Secretaria Ecológica y Ambiental
Supervisor

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

Anexo 1: INFORME FOTOGRAFICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS		
1.1	Suministro e instalación de Poste de madera aserrada de Eucalipto, inmunizado por inmersión. Dimensiones 8-10 x 210 centímetros (Cada 3 metros)	und	330







Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

1.2	Suministro e instalación de alambre de púa Galvanizado calibre 12.5, rollo por 350 m lineales. (240m x 4 líneas de alambrado)	Ml	3900



2	**CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (Incluye control de insectos, control de enfermedades, etc)**		
2.1	Polvo Espolvoreable, ingredientes activos: Clorphiryfos, organofosforados, formulados para control de hormiga arriera en presentacion de bolsa de 1 kilogramo (5 gr por planta)	Kg	17







Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

3	**ABONO ORGANICO**		
3.1	Suministro y aplicación de abono de origen orgánico bio-sólido, compostado pre húmico, con características físicas, biológicas y químicas conocidas, productos registrados. (500 gr por árbol)	Bulto	55





4	**CORRECTIVO DE ACIDEZ**		
4.1	Suministro y aplicación de mineral calcáreo compuesto de un carbonato doble de calcio y magnesio. Su color varia del blanco al gris pasando por ligeros tonos de amarillo en algunos casos Es una cal agrícola destinada a corregir la acidez en suelos, también es un fertiiizante simpie por su aito contenido de magnesio. (200gr por árbol)	Bulto	15





Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

5	**FERTILIZANTE**		
5.1	Suministro y aplicación de fertilizante edáfico compuesto NPK RELACION 18-18-18, sólido soluble triple quince. (40 gr por planta)	Bulto	4







6	**HIDRORETENEDOR**		
6.1	Suministro y aplicación de acondicionador físico del suelo, para mejorar la capacidad de absorción, retención de agua y nutrientes del suelo, no contamina el suelo ni el agua, su pH es neutro. Al entrar en contacto con el agua puede llegar a absorber de 400 a 500 veces su peso y los cristales se	Kg	18

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

convierten en un gel granulado que queda a disposición de las raíces de las plantas. (5gr por planta)








Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597


7	**PLANTULAS (Palma de Moriche, Nacedero, Búcaro, Guásimo, Cedro Amargo, Guarataro)**		
7.1	Suministro y siembra de plántula presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de un kilo. Las plántulas deben tener una altura mínima de 50 cm. y no mayor de 80 cm. (Especies nativas).	Unid	2033

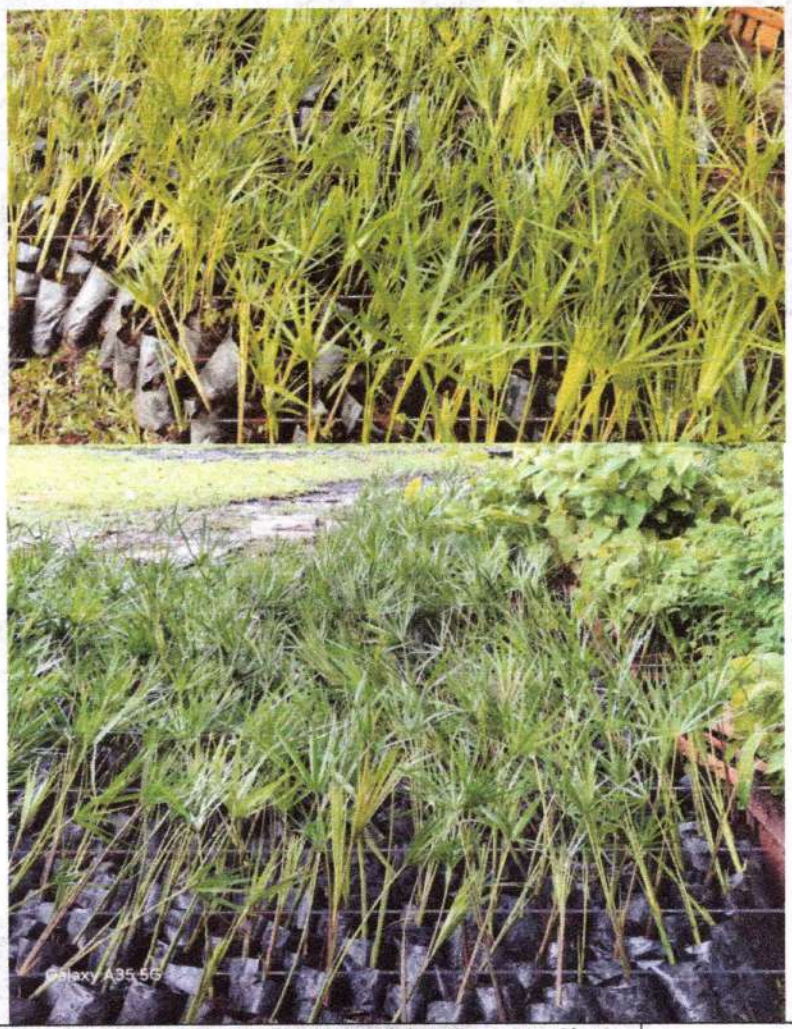

7.2	Suministro y siembra de plántula de moriche presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle de 20*15 cm, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de 1 kilo. Las plántulas deben tener una altura entre 50 y 80 cm.	Unid	1300

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597



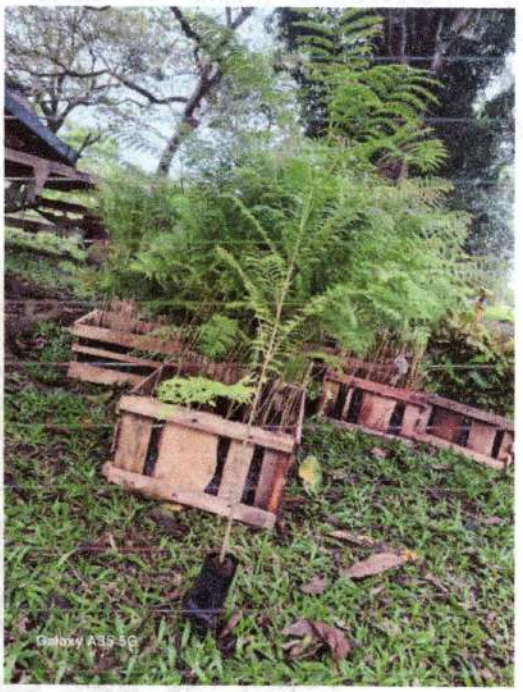



Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

8	**PLATEO y AHOYADO**		
8.1	Plateo y ahoyado	Ha	3





9	**LIMPIEZA (Corte de vegetación (incluye guadañadora))**		
9.1	Corte de vegetación (incluye guadañadora)	Ha	3



Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597



Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

M&M P.G SAS


NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

INFORME ACTA DE LIQUIDACION.

CONTRATO DE OBRA No. 1451 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTARTO: **"RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**

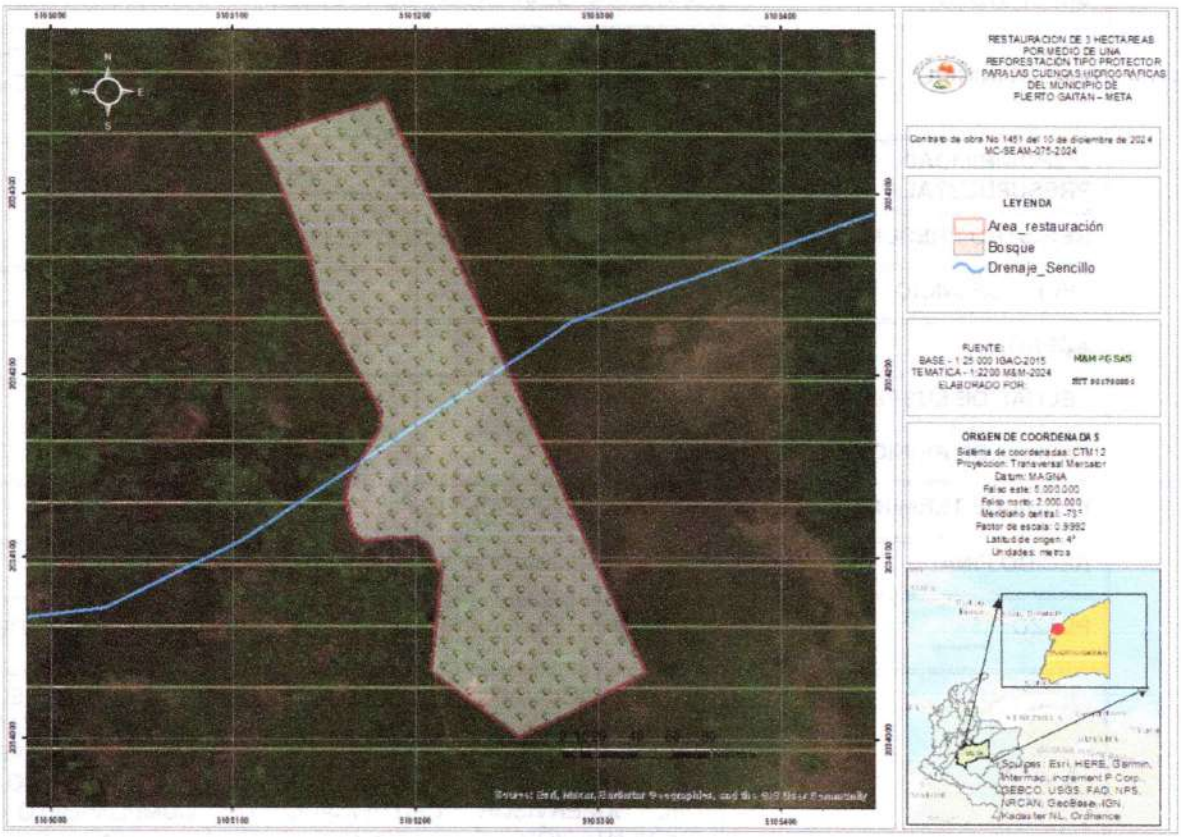

PERIODO ACTA DE LIQUIDACION


TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024 AL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

No. CONTRATO:	**001451**
OBJETO:	"RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".
CONTRATISTA:	SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS
SUPERVISOR:	SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA
VALOR INICIAL:	OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 80.358.973,7)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	DIS.2024003310 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RES.2024003934 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
ADENDA:	N/A
FECHAS DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHAS DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
RECIBO FINAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO:	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FORMA DE PAGO:	EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. EL TRÁMITE DE PAGO INICIARA CON LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL CONTRATISTA, VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y LA PRESENTACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE CUENTA DE COBRO ACOMPAÑADA DE LA COMPROBANTE DE PAGO A LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, SI HAY LUGAR A ELLO, TRATÁNDOSE DE PERSONA NATURAL Y/O PARA PERSONA JURÍDICA, DEBE ADJUNTAR CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL REVISOR FISCAL O CONTADOR QUE ASÍ LOS DECLARE, APORTANDO COPIA DE LAS PLANILLAS DE PAGO QUE ACREDITEN SU CUMPLIMIENTO, AL PAGO SE LE EFECTUARÁN LOS RESPECTIVOS DESCUENTOS POR IMPUESTOS DE LEY Y LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES.

2. LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Puerto Gaitán es un municipio colombiano del departamento Meta ubicado en la región del río Manacacias y es uno de los municipios con mayor área del departamento con 17.499 km². Puerto Gaitán está a 189 kilómetros al oriente de Villavicencio y es una de las regiones petroleras por excelencia. Fundado el 11 de febrero de 1932. Existe una carretera desde la capital departamental y un aeropuerto municipal.

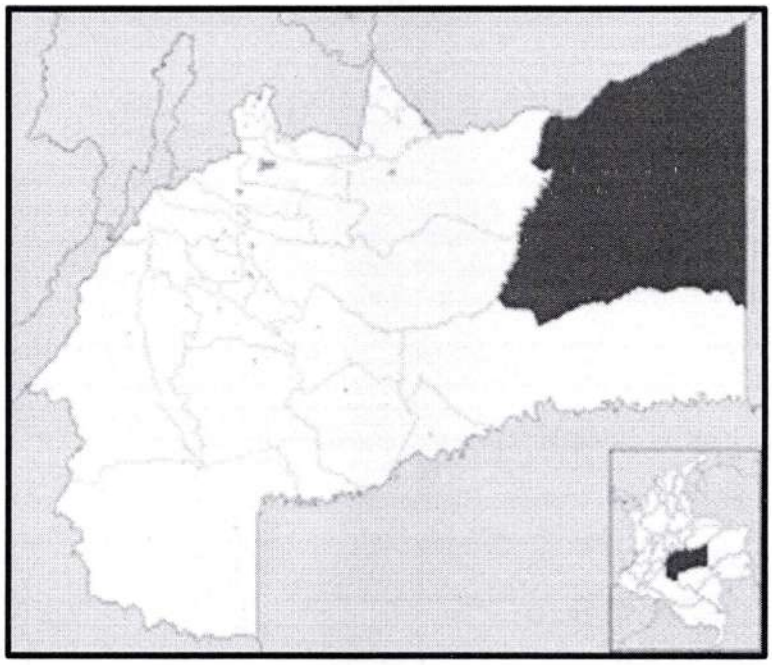

(ubicación zona de interés)

El contrato es desarrollado en la zona rural y urbana del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto tiene como objetivo principal el establecimiento de tres hectáreas de reforestación con fines de protección ambiental, enfocándose en la conservación y preservación de las fuentes hídricas de la región. Este esfuerzo se alinea con lo estipulado en la Ley 99 de 1993, que reconoce la responsabilidad del Estado en la gestión ambiental y la conservación de los recursos naturales. Dichas áreas de reforestación están diseñadas para garantizar la protección especial de los ecosistemas, promoviendo prácticas sostenibles que beneficien tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.

El agua, como recurso esencial para la vida, juega un papel fundamental en el desarrollo de los asentamientos humanos, el equilibrio ecológico y el sostenimiento de la biodiversidad. En este sentido, la riqueza hídrica y la diversidad de flora y fauna en la región representan un patrimonio que debe ser resguardado. En particular, el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, ha enfrentado un deterioro progresivo de sus ecosistemas debido a las actividades humanas, como el desarrollo sociocultural, la expansión agrícola y los cambios en el uso del suelo. Estas dinámicas han generado la imperiosa necesidad de implementar estrategias efectivas de reforestación que mitiguen los impactos negativos y aseguren la sostenibilidad de los recursos naturales.

El proyecto no solo busca establecer áreas de conservación, sino también restaurar ecosistemas degradados y proteger los cursos de agua que son vitales para la fauna, la flora y las comunidades humanas. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento del equilibrio ecológico y, a su vez,

promueven la sostenibilidad de los recursos hídricos, los cuales son esenciales para el desarrollo social, económico y cultural del municipio.

Además, el establecimiento de estas áreas de reforestación genera beneficios directos para la población tanto rural como urbana. Entre estos beneficios se destacan:

- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes al garantizar el acceso a fuentes de agua limpia.
- Reducción de la vulnerabilidad ambiental frente a fenómenos como la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad.
- Fortalecimiento de las prácticas de gestión ambiental comunitaria, fomentando una mayor participación ciudadana en la conservación de los recursos naturales.

Este esfuerzo también se traduce en oportunidades para el desarrollo integral del municipio, mediante la promoción de actividades económicas sostenibles y la mejora del entorno natural. En conjunto, estas acciones representan un compromiso claro con la sostenibilidad ambiental y social, reconociendo que la conservación de los recursos naturales es una herramienta clave para el progreso equilibrado y responsable de Puerto Gaitán.

En resumen, el proyecto no solo busca proteger el entorno natural, sino también sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de preservar los ecosistemas para garantizar un futuro sostenible. A través de estas iniciativas, se busca sentar las bases para un modelo de desarrollo que integre la protección ambiental con el bienestar social y económico de la región.

4. DETALLE DE PAGOS

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	N/A	**$ 80.358.973,7**
VALOR ADICIONES (Si aplica)	0	0
VALOR PAGOS REALIZADOS	0	0
VALOR A PAGAR ACTUALMENTE	**$ 80.358.479,39**	0
SALDO	**$494,31**	0
SUMAS IGUALES	**$ 80.358.973,7**	**$ 80.358.973,7**

5. PÓLIZAS Y SEGUROS.

Se presenta una tabla con la información correspondiente a la garantía única de cumplimiento entidad estatal, de acuerdo a los requerimientos del contrato.

	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIOZA NO.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN SUSCRIPCION DEL CONTRATO	**Seguros del estado**		**30-44-101061382 Anexos 0**
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	10/12/2024	26/04/2025	$16.071.794,74
Pago de salarios y prestaciones sociales	10/12/2024	26/04/2027	$4.017.948,69
Calidad del servicio	10/12/2024	26/12/2025	$16.071.794,74

	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
GARANTIA DE RESPOPNSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGÚN SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Seguros del estado		30-40-101022826 ANEXO 0
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10/12/2024	26/12/2024	$260.000.000

	INFORMACIÓN GARANTIAS		
No. DE POLIZA	TEMA Y VIGENCIA	ASEGURADORA	OBJETO DE LA PÓLIZA
CV-100046979 Anexo 2	Poliza de cumplimiento segúnrecibo final Desde el 13/12/2024 hasta el 28/12/2027	Seguros mundial	Con el presente anexo se realiza la actualizacion según acta de inicio de fecha 13/12/2024, y se realiza la actualizacion según acta de recibo final de obra de fecha 27/12/2024. Los demas terminos y condiciones no modificadas continuan vigentes. Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato N. 1452 del 2024, cuyo objeto es: restauracion de tres (03) hectareas por medio de una reforestacion tipo protector para las cuencas hidrograficas del municipio de puerto gaitan-meta.
CV-100012656. Anexo 2	Respensabilidad civil extracontractual según acta de recibo final. Desde el 12/12/2024 hasta el 28/12/2024.	Seguros mundial	Con el presente anexo se realiza la actualizacion según acta de inciio de fecha 13/12/2026, y se realiza la actualizacion según acta de recibo final de obra de fecha 27/12/2024. Los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes. Se amapara la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros imputable al contratista durante la ejecucion del contrato N. 1452 del 2024, cuyo objeto es: restauracion de tres (03) hectareas por medio de una reforestacion tipo protector para las cuencas hidrograficas del municipio de puerto gaitan-meta.

6. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

6.1 Obligaciones Específicas:

No.	OBLIGACIÓNES GENERALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Cumplir con el objeto contratado, en los términos y condiciones establecidos.	Se cumplió con el objeto contratado en su totalidad, respetando los términos y condiciones establecidos en el contrato. Cada actividad fue ejecutada de acuerdo con lo pactado, asegurando el cumplimiento de los

		plazos, la calidad requerida y la entrega de los resultados esperados, en conformidad con las especificaciones detalladas en el acuerdo contractual.
2	Garantizar y responder por la buena ejecución del Contrato	Se garantizó y respondió por la buena ejecución del contrato, asegurando que todas las actividades se llevaran a cabo conforme a lo establecido en los términos del contrato. Esto incluyó la implementación de medidas preventivas y correctivas para garantizar la calidad, el cumplimiento de los plazos y la satisfacción de los requisitos contractuales, asumiendo plena responsabilidad por cualquier incumplimiento o desviación que pudiera surgir durante la ejecución del proyecto.
3	Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo.	Se respondió por todas las actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato, sin embargo, no hubo faltas relacionadas con la ejecución del mismo.
4	Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual.	Se suscribieron las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual, formalizando y documentando cada una de las etapas y acuerdos alcanzados durante la ejecución del contrato. Estas actas fueron firmadas de acuerdo con los procedimientos establecidos, asegurando la correcta constatación de los avances, la resolución de posibles incidencias y el cumplimiento de los términos acordados entre las partes.
5	Mantener actualizado el domicilio, hasta la finalización del contrato.	Se mantuvo actualizado el domicilio para notificaciones durante toda la vigencia del contrato, garantizando que cualquier comunicación oficial relacionada con el contrato llegara de manera oportuna y eficaz. Esta información fue actualizada conforme a los requerimientos del contrato, asegurando la correcta recepción de todas las notificaciones hasta la finalización del mismo.
6	Asumir todos los costos que genere la legalización del presente contrato.	Se asumieron todos los costos asociados con la legalización del presente contrato, incluyendo los trámites administrativos, la elaboración de documentación requerida y cualquier otro gasto necesario para formalizar y poner en vigor el acuerdo, sin generar cargos adicionales a la Entidad Estatal.
7	Tener cuenta corriente o de ahorros de una entidad bancaria.	Se cumplió con la obligación de tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria, lo que permitió una gestión eficiente de los pagos y transacciones relacionados con el contrato, asegurando el cumplimiento de las disposiciones financieras establecidas en el mismo.
8	Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato	Se informó de manera oportuna a los contratantes sobre cualquier novedad derivada del contrato, asegurando que todas las situaciones relevantes, cambios o inconvenientes fueran comunicados de inmediato. Esto permitió una gestión eficiente y la

		adopción de medidas correctivas o ajustes necesarios, manteniendo la transparencia y el cumplimiento de los objetivos del contrato.
9	Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales, SENA e ICBF, conforme a la normatividad vigente. El cumplimiento de este requisito, es condición indispensable para el trámite de los pagos. El contratista deberá presentarle a la supervisión del contrato, la documentación que acredite el cumplimiento del mismo.	Se cumplió con todas sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales, SENA e ICBF, conforme a la normatividad vigente. Este cumplimiento se considera condición indispensable para el trámite de los pagos. Además, se presentó oportunamente a la supervisión del contrato la documentación que acreditó dicho cumplimiento, garantizando que todas las obligaciones legales y contractuales fueran atendidas debidamente.
10	Constituir las garantías exigidas, las cuales deberán ser aportadas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la celebración del contrato.	Se constituyeron las garantías exigidas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la celebración del contrato, cumpliendo con los requisitos establecidos. Las garantías fueron presentadas conforme a las especificaciones solicitadas, asegurando la ejecución adecuada del contrato y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
11	Mantener vigentes las garantías por el tiempo pactado en el contrato.	Se mantuvieron vigentes las garantías durante todo el período pactado en el contrato, asegurando su validez y cumplimiento hasta la finalización del mismo.
12	Cumplir con los requisitos de la ejecución del contrato consignados en el MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DOR-MN-04 VERSIÓN 01. Así mismo, cumplir con los requisitos tareas de alto riesgo, requisitos contratistas permanentes o requisitos para propietarios de las edificaciones, en caso que aplique.	Se cumplieron con todos los requisitos establecidos en el **Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas DOR-MN-04 VERSIÓN 01**, así como con los requisitos específicos para tareas de alto riesgo, contratistas permanentes o propietarios de edificaciones, según correspondiera.
13	Cumplir con los deberes de seguridad y salud en el trabajo para contratistas consignados en el MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DOR-MN-04 VERSIÓN 01, el cual puede ser consultado en la página web de la entidad.	Se cumplió con todos los deberes de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el **Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas DOR-MN-04 VERSIÓN 01**, el cual fue consultado y seguido de acuerdo con las directrices proporcionadas en la página web de la entidad.
14	Presentar al supervisor del contrato informes sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.	Se presentó de manera oportuna al supervisor del contrato los informes detallados sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo. Este informe incluye información sobre la ejecución de las tareas, el cumplimiento de los plazos establecidos, cualquier incidencia o novedad, y los resultados alcanzados en cada fase del proyecto, asegurando una comunicación fluida y un seguimiento adecuado del contrato.

15	Informar inmediatamente a la administración en el evento que se evidencia irregularidades.	Se informó inmediatamente a la administración sobre cualquier irregularidad detectada durante la ejecución del contrato.
16	Atender a los requerimientos del Municipio, a través del supervisor del contrato.	Se atendió de manera oportuna y eficaz todos los requerimientos del Municipio a través del supervisor del contrato. Se garantizó la colaboración constante y la respuesta rápida a las solicitudes o indicaciones del supervisor, asegurando que todas las actividades se desarrollaran de acuerdo con las expectativas y necesidades del Municipio.
17	Realizar las demás actividades encomendadas por el Municipio, a través del supervisor y relacionadas en forma directa con el objeto del contrato	Se realizaron todas las actividades adicionales encomendadas por el Municipio, a través del supervisor del contrato, que estuvieron directamente relacionadas con el objeto del mismo. Estas actividades se ejecutaron de manera diligente y conforme a los requisitos establecidos, asegurando el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y contribuyendo al éxito del proyecto.
No	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1	Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Se ha dado cumplimiento total al objeto y alcance del contrato conforme a lo estipulado en el documento principal y sus anexos, asegurando que cada uno de los términos, condiciones y actividades requeridas se ejecutaron de manera efectiva y dentro de los plazos establecidos.
2	Realizar el aislamiento de las zonas a restaurar conforme las especificaciones técnicas.	Se llevó a cabo el aislamiento de las zonas restauradas siguiendo estrictamente las especificaciones técnicas establecidas. Esto incluyó la instalación de tinales y alambre de púas adecuados para proteger las áreas intervenidas, garantizar la regeneración y evitar el ingreso de ganado u otras actividades que pudieran afectar negativamente el proceso de restauración.
3	El contratista deberá realizar las actividades propias de la restauración conforme las especificaciones técnicas.	Se realizaron todas las actividades correspondientes al proceso de restauración conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Esto incluyó la preparación del terreno, la selección y plantación de especies nativas apropiadas para el ecosistema, el establecimiento del cercado perimetral utilizando alambre de púas, entre otras, además del seguimiento necesario para garantizar el éxito de la restauración.
4	Brindar la asistencia técnica al establecimiento y mantenimiento y monitoreo a la reforestación.	Se brindó asistencia técnica integral durante el establecimiento y monitoreo de las actividades de reforestación.
5	Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Se cumplió a cabalidad con todas las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, garantizando que cada etapa del proyecto se ejecutara de acuerdo con los requisitos, términos y lineamientos definidos, asegurando transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo en todas las actividades realizadas.

6	Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	El objeto del contrato se desarrolló cumpliendo plenamente con las condiciones de calidad, oportunidad y las obligaciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. Todas las actividades fueron ejecutadas con altos estándares técnicos, dentro de los plazos estipulados, y respetando los compromisos adquiridos, lo que aseguró el logro de los objetivos del proyecto de manera eficiente y efectiva.
7	Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.	Se mantuvo una comunicación permanente y efectiva con el supervisor del contrato durante toda la ejecución del proyecto. Esto incluyo reuniones de seguimiento, resolución oportuna de inquietudes y la notificación inmediata de avances y eventualidades, asegurando una coordinación adecuada y el cumplimiento de las metas establecidas.
8	Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Se facilitó de manera continua la labor de seguimiento y control realizada por el supervisor del contrato, atendiendo oportunamente todas las observaciones y requerimientos formulados. Se proporcionó la documentación necesaria, acceso a las áreas de trabajo y respuestas claras y precisas, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los objetivos del contrato.
9	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Se dispuso del personal idóneo, debidamente capacitado y con experiencia en las actividades requeridas, así como de los recursos logísticos, materiales y equipos necesarios para desarrollar el contrato. Esto permitió cumplir con los plazos establecidos y garantizar la calidad esperada en cada una de las etapas del proyecto, asegurando el éxito de su ejecución.
10	Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	Se cumplió plenamente con las normas de gestión ambiental y las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo vigentes durante la ejecución del contrato. Todas las actividades se llevaron a cabo respetando los lineamientos ambientales y promoviendo un entorno seguro para el personal involucrado. Además, se atendieron todas las acciones requeridas y se presentaron las evidencias correspondientes de conformidad con los anexos del contrato, garantizando el cumplimiento normativo y contractual.
11	Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	Tras la buena comunicación se pudo informar de manera oportuna a la Entidad Estatal sobre cualquier situación que implicara una modificación en el estado de los riesgos existentes, conforme a lo establecido en el contrato, sin embargo no existieron cambios.
12	Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Se comunicaron de manera inmediata y detallada a la Entidad Estatal todas las circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier otro tipo que pudieran afectar la ejecución del contrato. Esta comunicación fue oportuna y transparente, permitiendo la adopción de medidas

		adecuadas para mitigar posibles impactos y garantizar el cumplimiento de los términos contractuales.
13	Presentar informe final con soporte fotográfico donde se evidencie el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la realización de los servicios logísticos y la entrega de elementos contratados.	Se presentó el informe final con soporte fotográfico, en el cual se evidenció el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. El informe incluyó detalles sobre la realización de los servicios logísticos, así como la entrega de los elementos contratados, con fotografías que respaldaron cada etapa del proceso y demostraron el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.
14	El contratista debe garantizas la entrega de los bienes que requieren entrada al almacén de la entidad	El contratista garantizó la entrega oportuna de los bienes que requieren ingreso al almacén de la entidad, cumpliendo con todos los procedimientos establecidos para su recepción y registro. Se aseguraron las condiciones de calidad y cantidad de los bienes entregados, conforme a las especificaciones contractuales, y se gestionó adecuadamente la documentación necesaria para su correcta entrada y control en el almacén.
15	las demás que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumplió con todas las demás obligaciones que demandaba el cabal cumplimiento del objeto contractual, asegurando la correcta ejecución de cada actividad y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos. Esto incluyó la atención a las necesidades adicionales que surgieron durante el desarrollo del proyecto, siempre alineadas con los objetivos y condiciones pactadas en el contrato.

6.2 Cumplimiento de Especificaciones técnicas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1	**CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS**		
1.1	Suministro e instalación de Poste de madera aserrada de Eucalipto, inmunizado por inmersión. Dimensiones 8-10 x 210 centímetros (Cada 3 metros)	und	330
1.2	Suministro e instalación de alambre de púa Galvanizado calibre 12.5, rollo por 350 m lineales. (240m x 4 líneas de alambrado)	Ml	3900
2	**CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (Incluye control de insectos, control de enfermedades, etc)**		
2.1	Polvo Espolvoreable, ingredientes activos: Clorphiryfos, organofosforados, formulados para control de hormiga arriera en presentacion de bolsa de 1 kilogramo (5 gr por planta)	Kg	17
3	**ABONO ORGANICO**		
3.1	Suministro y aplicación de abono de origen orgánico bio-solido, compostado pre húmico, con características físicas, biológicas y químicas conocidas, productos registrados. (500 gr por árbol)	Bulto	55
4	**CORRECTIVO DE ACIDEZ**		
4.1	Suministro y aplicación de mineral calcáreo compuesto de un carbonato doble de calcio y magnesio. Su color varia del	Bulto	15

	blanco al gris pasando por ligeros tonos de amarillo en algunos casos Es una cal agrícola destinada a corregir la acidez en suelos, también es un fertilizante simple por su alto contenido de magnesio. (200gr por árbol)		
5	**FERTILIZANTE**		
5.1	Suministro y aplicación de fertilizante edáfico compuesto NPK RELACION 18-18-18, sólido soluble triple quince. (40 gr por planta)	Bulto	4
6	**HIDRORETENEDOR**		
6.1	Suministro y aplicación de acondicionador físico del suelo, para mejorar la capacidad de absorción, retención de agua y nutrientes del suelo, no contamina el suelo ni el agua, su pH es neutro. Al entrar en contacto con el agua puede llegar a absorber de 400 a 500 veces su peso y los cristales se convierten en un gel granulado que queda a disposición de las raíces de las plantas. (5gr por planta)	Kg	18
7	**PLANTULAS (Palma de Moriche, Nacedero, Búcaro, Guásimo, Cedro Amargo, Guarataro)**		
7.1	Suministro y siembra de plántula presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de un kilo. Las plántulas deben tener una altura mínima de 50 cm. y no mayor de 80 cm. (Especies nativas).	Unid	2033
7.2	Suministro y siembra de plántula de moriche presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle de 20*15 cm, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de 1 kilo. Las plántulas deben tener una altura entre 50 y 80 cm.	Unid	1300
8	**PLATEO y AHOYADO**		
8.1	Plateo y ahoyado	Ha	3
9	**LIMPIEZA (Corte de vegetación (incluye guadañadora))**		
9.1	Corte de vegetación (incluye guadañadora)	Ha	3

Ejecución económica: Ítems ejecutados en el periodo comprendido del 13/12/2024 al 27/12/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR ACTUALIZADO	VALOR TOTAL
1	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS				
1.1	Suministro e instalación de Poste de madera aserrada de Eucalipto, inmunizado por inmersión. Dimensiones 8-10 x 210 centímetros (Cada 3 metros)	Und	330	$ 40.000	$13.200.000
1.2	Suministro e instalación de alambre de púa Galvanizado calibre 12.5, rollo por 350 m lineales. (240m x 4 líneas de alambrado)	Ml	3900	$ 4,670	$18.213.000
2	CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (Incluye control de insectos, control de enfermedades, etc)				
2.1	Polvo Espolvoreable, ingredientes activos: Clorphiryfos, organofosforados, formulados para control de hormiga arriera en presentación de bolsa de 1 kilogramo (5gr por planta)	Kg	17	$ 20,857	$ 354.569
3	ABONO ORGANICO				

3.1	Suministro y aplicación de abono de origen orgánico bio-solido, compostado pre húmico, con características fisicas, biológicas y químicas conocidas, productos registrados. (500 gr por árbol)	Bulto	55	$ 51,873	$ 2.853.015
4	CORRECTIVO DE ACIDEZ				
4.1	Suministro y aplicación de mineral calcáreo compuesto de un carbonato doble de calcio y magnesio. Su color varia del blanco al gris pasando por ligeros tonos de amarillo en algunos casos Es una cal agrícola destinada a corregir la acidez en suelos, también es un fertilizante simple por su alto contenido de magnesio. (200gr por árbol)	Bulto	15	$ 32,080	$ 481.200
5	FERTILIZANTE				
5.1	Suministro y aplicación de fertilizante edáfico compuesto NPK RELACION 18-18-18, sólido soluble triple quince. (40 gr por planta)	Bulto	4	$ 355.000	$ 1.420.000
6	HIDRORETENEDOR				
6.1	Suministro y aplicación de acondicionador físico del suelo, para mejorar la capacidad de absorción, retención de agua y nutrientes del suelo, no contamina el suelo ni el agua, su pH es neutro. Al entrar en contacto con el agua puede llegar a absorber de 400 a 500 veces su peso y los cristales se convierten en un gel granulado que queda a disposición de las raíces de las plantas. (5gr por planta)	Kg	18	$ 70.000	$ 1.260.000
7	PLANTULAS (Palma de Moriche, Nacedero, Hobo, Cedro Amargo, Orejero, Cajeto, Samán, Arrayan, Igua, Melina, Yopo, Algarrobo, Cachimbo, Caño fistol y Otras especies nativas)				
7.1	Suministro y siembra de plántula presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de libra. Las plántulas deben tener una altura mínima de 50 cm. y no mayor de 80 cm. (Especies nativas).	Unid	2033	$ 3,968	$ 8.066.944
7.2	Suministro y siembra de plántula de moriche presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle de 20*15 cm, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de 1 kilo. Las plántulas deben tener una altura entre 50 y 80 cm.	Unid	1300	$ 9.800	$ 12.740.000
8	PLATEO y AHOYADO				
8.1	Plateo y ahoyado	Ha	3	$ 470.000	$ 1.410.000
9	LIMPIEZA (Corte de vegetación (incluye guadañadora))				
9.1	Corte de vegetación (incluye guadañadora)	Ha	3	$ 448.000	$ 1.344.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 61.342.728,0

Administración	26 %	15.949.109,3
Imprevistos	1%	$ 612.932,399
Utilidades	4%	$ 2.453.709,1
Total		**$ 80.358.479,39**

M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

ACTIVIADES REALIZADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1	**CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS**		
1.1	Suministro e instalación de Poste de madera aserrada de Eucalipto, inmunizado por inmersión. Dimensiones 8 10 x 210 centímetros (Cada 3 metros)	und	330







1.2	Suministro e instalación de alambre de púa Galvanizado calibre 12.5, rollo por 350 m lineales. (240m x 4 líneas de alambrado)	Ml	3900



2	**CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (Incluye control de insectos, control de enfermedades, etc)**		
2.1	Polvo Espolvoreable, ingredientes activos: Clorphiryfos, organofosforados, formulados para control de hormiga arriera en presentacion de bolsa de 1 kilogramo (5 gr por planta)	Kg	17







M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

3	**ABONO ORGANICO**		
3.1	Suministro y aplicación de abono de origen orgánico bio-solido, compostado pre húmico, con caracteristicas fisicas, biologicas y químicas conocidas, productos registrados. (500 gr por árbol)	Bulto	55





4	**CORRECTIVO DE ACIDEZ**		
4.1	Suministro y aplicación de mineral calcáreo compuesto de un carbonato doble de calcio y magnesio. Su color varia del blanco al gris pasando por ligeros tonos de amarillo en algunos casos Es una cal agrícola destinada a corregir la acidez en suelos, también es un fertilizante simple por su alto contenido de magnesio. (200gr por árbol)	Bulto	15





M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

5	**FERTILIZANTE**		
5.1	Suministro y aplicación de fertilizante edáfico compuesto NPK RELACION 18-18-18, sólido soluble triple quince. (40 gr por planta)	Bulto	4







6	**HIDRORETENEDOR**		
6.1	Suministro y aplicación de acondicionador físico del suelo, para mejorar la capacidad de absorción, retención de agua y nutrientes del suelo, no contamina el suelo ni el agua, su pH es neutro. Al entrar en contacto con el agua puede llegar a	Kg	18

M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

absorber de 400 a 500 veces su peso y los cristales se convierten en un gel granulado que queda a disposición de las raíces de las plantas. (5gr por planta)








M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

7	**PLANTULAS (Palma de Moriche, Nacedero, Búcaro, Guásimo, Cedro Amargo, Guarataro)**		
7.1	Suministro y siembra de plántula presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de un kilo. Las plántulas deben tener una altura mínima de 50 cm. y no mayor de 80 cm. (Especies nativas).	Unid	2033

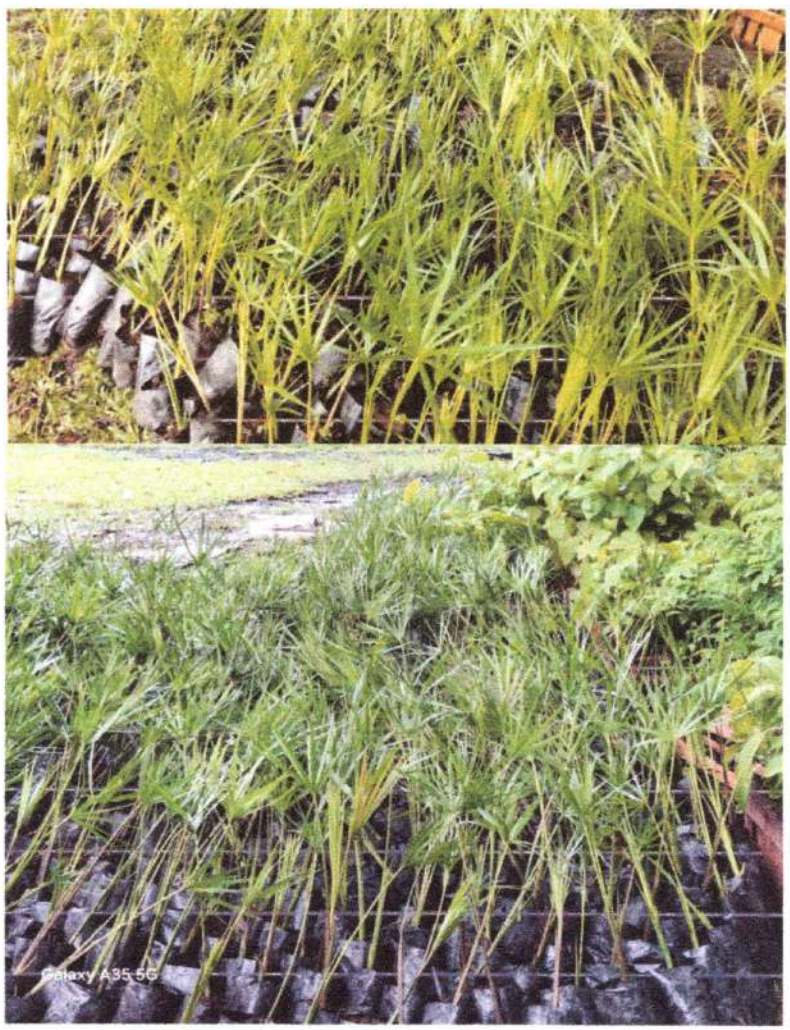



M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

7.2	Suministro y siembra de plántula de moriche presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle de 20*15 cm, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de 1 kilo. Las plántulas deben tener una altura entre 50 y 80 cm.	Unid	1300

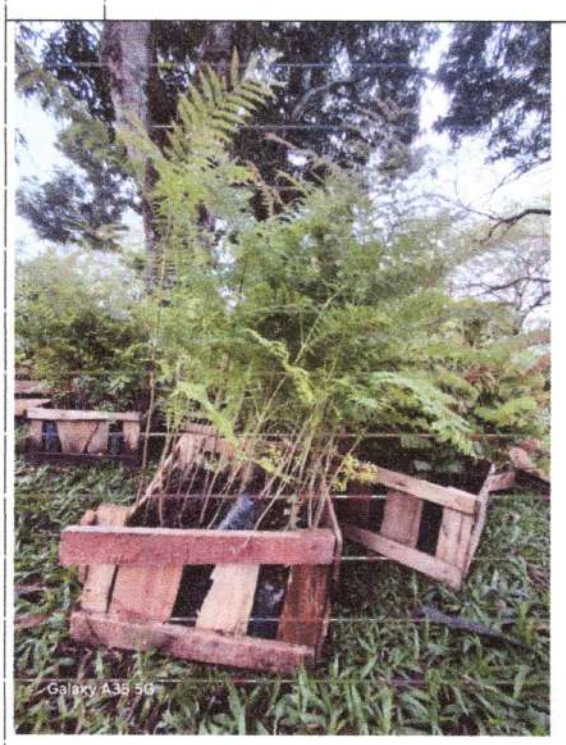

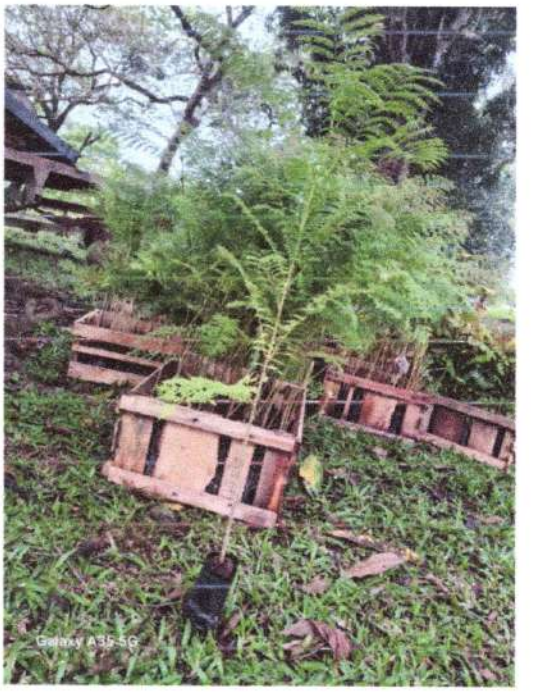

M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.



8	PLATEO y AHOYADO		
8.1	Plateo y ahoyado	Ha	3





9	**LIMPIEZA (Corte de vegetación (incluye guadañadora))**		
9.1	Corte de vegetación (incluye guadañadora)	Ha	3





M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

8. PERSONAL DE OBRA.

ITEM	NOMBRES	CARGO	No. CEDULA
1	MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL	Ing. Residente	1096958294
2	JOSE ANTONIO GARCIA MURILLO	Técnico	93130366
3	FREIMAN YESID GÁMEZ SOLER	Operario	1118167840
4	RICARDO GONZALEZ MOSQUERA	Operario	1121878156
5	CRISTIAN ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS	Operario	1010141322
6	YIMIR SILVA REYES	Operario	8192879

9. CONCLUSIONES.

- El presente informe detalla las actividades ejecutadas por el contratista en el marco del contrato de obra 1451 del 10 de diciembre de 2024, culminando con la suscripción del acta de recibo final. Se evidencia una ejecución satisfactoria al 100% de la obra, conforme a las cantidades programadas y los términos pactados, no obstante se ejecutó el 99.99% del presupuesto oficial.
- **Avance y cumplimiento:** Se verificó que todas las actividades programadas fueron realizadas dentro de los estándares de calidad establecidos, cumpliendo con los tiempos y especificaciones técnicas del contrato. Esto asegura que el objeto del contrato, enfocado en la restauración ecológica de 3 hectáreas por medio de reforestación tipo protector para las cuencas hidrográficas del municipio de Puerto Gaitán, Meta, fue alcanzado de manera íntegra.
- **Valor económico del contrato:** De acuerdo con las condiciones estipuladas, el valor a cobrar por la ejecución de las obras asciende a **OCHETA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUECE CENTAVOS M/CTE ($ $ 80.358.479,39)**. Este valor refleja la inversión destinada a garantizar la sostenibilidad y conservación de los recursos hídricos de la región.
- **Garantía del cumplimiento:** El desarrollo de las actividades ejecutadas confirma el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, evidenciando la responsabilidad del contratista en la preservación del entorno natural, especialmente en áreas clave para la protección de las fuentes hídricas locales.
- **Impacto ambiental y social:** La finalización de este proyecto contribuye directamente a la protección ambiental del municipio, asegurando la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas y beneficiando a la comunidad. Estas acciones fortalecen el equilibrio ecológico, fomentan la conservación de la biodiversidad y promueven el desarrollo sostenible en Puerto Gaitán, Meta.

Cordialmente,

Mildreth Soto

ANA MILDRETH SOTO MEDINA
CC: 30.982.985
R/L SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS
NIT: 901.764.884-0

235

SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS

Nit: 901764884

Nómina # NO 22 correspondiente al periodo del
01/12/2024 al 30/12/2024

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
GONZALEZ MOSQUERA RICARDO				***CC 1121878156***	
Cargo: CAPATAZ				**Sueldo Básico**	*1.965.300*
Sueldo		30	65.510	1.965.300	0
Bonificaciones NS		1	750.000	750.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	78.612
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	78.612
			Total	**2.715.300**	**157.224**
			Neto Pagado		**2.558.076**

Firma del Empleado

C.C. 1121878156

AnyScanner

SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS

Nit: 901764884

Nómina # NO 22 correspondiente al periodo del 01/12/2024 al 30/12/2024

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
ACEVEDO ROJAS CRISTIAN ALEJANDRO				***CC 1010141322***	
Cargo: OBRERO				**Sueldo Básico**	*1.965.300*
Sueldo		30	65.510	1.965.300	0
Bonificaciones NS		1	65.510	65.510	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	78.612
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	78.612
Firma del Empleado			**Total**	**2.030.810**	**157.224**
C.C. 1010141322			**Neto Pagado**		**1.873.586**

AnyScanner

235

SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS

Nit: 901764884

Nómina # NO 22 correspondiente al periodo del
01/12/2024 al 30/12/2024

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
SILVA REYES YIMIR				***CC 8192879***	
Cargo: OBRERO				**Sueldo Básico**	*1.965.300*
Sueldo		30	65.510	1.965.300	0
Bonificaciones NS		1	475.000	475.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	78.612
Aportes Salud Trabajador	salud total			0	78.612
			Total	**2.440.300**	**157.224**
			Neto Pagado		**2.283.076**

Firma del Empleado

C.C. 8192879

AnyScanner

SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS

Nit: 901764884

Nómina # NO 22 correspondiente al periodo del 01/12/2024 al 30/12/2024

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
GAMEZ SOLER FREIMAN YESID				***CC 1118167840***	
Cargo: OBRERO				**Sueldo Básico**	*1.965.300*
Sueldo		30	65.510	1.965.300	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	78.612
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	78.612
Firma del Empleado			**Total**	**1.965.300**	**157.224**
C.C. 1118167840			**Neto Pagado**		**1.808.076**

AnyScanner

Puerto Gaitán META
Paraíso Natural

FORMATO DE CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL
OTRO TIPO DE CONTRATOS
DAC-FR-100 V01
Vigente desde 08/11/2021

EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1703 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato N° 1451 de 2024 que**, SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS** identificado con (Nit 901.764.884-0, **ANA MILDRETH SOTO MEDINA** identificada con CC 30.982.985 expedida en Puerto Gaitán Meta,, cumplió en el periodo del **13 al diciembre al 27 de DICIEMBRE del 2024**, realizo el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION, ARL, ICBF, CAJA DE COMPENSACION, SENA) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato suscrito con la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "RESTAURACION DE 3 HECTAREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACION TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENTAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META".

PLANILLA DE MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL.

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla Nº 75182939 correspondiente al mes de **DICIEMBRE** pagada el 26/12/2024, con pago a Nueva eps, porvenir y ARL, ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION, para la presente se anexa TRES (03) folios:

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
DICIEMBRE	75182939	26/12/2024	$162.500	$208.000	$6.800	$0	$0	$7.800	$385.100
								VALOR TOTAL	$385.100

PLANILLA DE JOSE ANTONIO GARCIA MURILLO.

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla N. 9478039139 correspondiente al mes de **DICIEMBRE** pagada el 02/12/2024, con pago a salud total, porvenir y ARL, ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION, para la presente se anexa UN (01) folio.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPE	TOTAL

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co

		PLANILLA						NSACION	
DICIEMBRE	947803 9139	02/12/2024	$180.000	$230.400	$15.100	$0	$0	$0	$425.500
								VALOR TOTAL	$425.500

Planilla de la persona jurídica **SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS**

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla N° 9480088646 correspondiente al mes de **DICIEMBRE** pagada el 08/01/2025 CAJACOPI, CAPITAL SALUD, FAMISANAR, NUEVA E.P.S., NUEVA EPS MOVILIDAD, PIJAOSALUD, SALUD TOTAL, SANITAS, (PROTECCION FONDO DE PENSIONES) COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION y ARL SEGUROS BOLIVAR Y CFF COFREM, para la presente se anexa tres (03) folios.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
DICIEMBRE	948008 8646	08/01/2025	$3.135.900	$12.582.000	$4.476.600	$0	$0	$3.135.400	$23.312.900
								VALOR TOTAL	$23.312.900

Esta certificación forma parte integral del acta final del año 2024, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los 27 días del mes de diciembre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA
Secretaria Ecológica y Ambiental
SUPERVISORA

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co

ROCIO DEL PILAR CLAVIJO CERVERA
TP. No 233770-T
Contadora Publica

CERTIFICACIÓN

Yo, **ROCIO DEL PILAR CLAVIJO CERVERA**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.120.559.643 en condición de contadora pública, hago constar que la empresa **SERVICIOS E INGENIERÍA M&M PG S.A.S** identificada con NIT 901.764.884-0, ha realizado los pagos y se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y para fiscales de empleados con corte del trece (13) de diciembre del 2024 al veintisiete (27) de diciembre del 2024, correspondiente al contrato de obra 1451 del 20 de diciembre del 2024.

Lo anterior, dando cumplimiento a los establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 dias de diciembre del 2024.

ROCIO DEL PILAR CLAVIJO CERVERA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 233770-T.

SERVICIOS E INGIENERIA M&M P.G. S.A.S.
R.L: ANA MILDRETH SOTO MEDINA
Nit. 901.764.884-0

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

233770-T



ROCIO DEL PILAR
CLAVIJO CERVERA
C.C. 1120559643
RES. INSCRIPCION 874 DEL 27/10/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

239341 254971

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 9 B 7 E E 9 7 F 3 6 1 5 7 4 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROCIO DEL PILAR CLAVIJO CERVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1120559643 de SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE) Y Tarjeta Profesional No 233770-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.120.559.643**

CLAVIJO CERVERA
APELLIDOS

ROCIO DEL PILAR
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1986**

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-AGO-2004 SAN JOSE DEL GUAVIARE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5400100-00175709-F-1120559643-20090907 **0015**779596A 1 99933980

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901764884	0	SERVICIOS EINGENIERIA M&M P.G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CRA 4 # 17A -27	PUERTO GAITAN-META	3144012401	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1181581830	9480088646	E	2025/01/22	2025/01/08	BANCOLOMBIA	0	$23,312,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (43 Afiliados)						$78,721,455	$12,582,000			$78,721,455	$3,135,900			$78,284,700	$3,118,400			$78,721,455	$4,476,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (7 Afiliados)						$14,695,900	$2,351,500			$14,695,900	$588,100			$14,695,900	$588,100			$14,695,900	$77,000		$0	$0
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (7 Afiliados)						$14,695,900	$2,351,500			$14,695,900	$588,100			$14,695,900	$588,100			$14,695,900	$77,000		$0	$0
1	CC	1120564194	CAMACHO ANLLY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1120563438	CLAVIJO LINA	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS005	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$10,300	30	$0	$0
3	CC	1116616439	DUQUE HEIDY	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$10,300	30	$0	$0
4	CC	1003520462	MORENO KAREN	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$10,300	30	$0	$0
5	CC	1007140662	RIVERA ANGIE	25-14	30	$2,200,000	$352,000	CCFC55	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
6	CC	30982985	SOTO ANA	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF34	30	$2,800,000	$112,000	14-7	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
7	CC	1121966255	SOTO JUAN	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (36 Afiliados)						$64,025,555	$10,230,500			$64,025,555	$2,547,800			$63,588,800	$2,530,300			$64,025,555	$4,399,600		$0	$0
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (36 Afiliados)						$64,025,555	$10,230,500			$64,025,555	$2,547,800			$63,588,800	$2,530,300			$64,025,555	$4,399,600		$0	$0
8	CC	1010141322	ACEVEDO CRISTIAN	230201	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
9	CC	1006811634	ACOSTA JAIVER	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
10	CC	1027280795	AGUIRRE JUAN	25-14	30	$1,965,300	$314,500	EPS002	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
11	CC	1031142383	AMADO ECCENOVER	230201	26	$1,703,260	$272,600	EPS002	26	$1,703,260	$68,200	CCF34	26	$1,703,260	$68,200	14-7	26	$1,703,260	$118,600	26	$0	$0
12	CC	1031142383	AMADO ECCENOVER	230201	4	$174,702	$28,000	EPS002	4	$174,702	$7,000	CCF34	0	$0	$0	14-7	4	$174,702	$0	0	$0	$0
13	CC	80239318	ANGEL LUIS	231001	3	$196,530	$31,500	EPS002	3	$196,530	$7,900	CCF34	3	$196,530	$7,900	14-7	3	$196,530	$13,700	3	$0	$0
14	CC	1124825812	APONTE YULY	231001	30	$1,965,300	$314,500	EPS041	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
15	CC	5729110	ARAQUE LUIS	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
16	CC	86052101	AVILA CARLOS	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
17	CC	1124820904	BARRETO JOHAN	230301	21	$1,375,710	$220,200	CCFC55	21	$1,375,710	$55,100	CCF34	21	$1,375,710	$55,100	14-7	21	$1,375,710	$95,800	21	$0	$0
18	CC	1120356302	BUENDIA KEVIN	230301	1	$65,510	$7,900	EPS041	1	$65,510	$0	CCF34	1	$65,510	$0	14-7	1	$65,510	$0	1	$0	$0
19	CC	1120356302	BUENDIA KEVIN	230301	20	$1,310,200	$209,700	EPS041	20	$1,310,200	$52,500	CCF34	20	$1,310,200	$52,500	14-7	20	$1,310,200	$91,200	20	$0	$0
20	CC	1023883497	FERNANDEZ BRICEIDA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
21	CC	1124991562	GAITAN ARLEY	230301	29	$1,899,790	$304,000	EPS037	29	$1,899,790	$76,000	CCF34	29	$1,899,790	$76,000	14-7	29	$1,899,790	$132,300	29	$0	$0
22	CC	1124991562	GAITAN ARLEY	230301	1	$65,510	$7,900	EPS037	1	$65,510	$0	CCF34	1	$65,510	$0	14-7	1	$65,510	$0	1	$0	$0
23	CC	1118167840	GAMEZ FREIMAN	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
24	CC	1121878156	GONZALEZ RICARDO	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
25	CC	1003563322	HERRERA MANUEL	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
26	CC	1124825387	HOYOS OMAR	230301	1	$65,510	$7,900	CCFC55	1	$65,510	$0	CCF34	1	$65,510	$0	14-7	1	$65,510	$0	1	$0	$0
27	CC	1124825387	HOYOS OMAR	230301	29	$1,899,790	$304,000	CCFC55	29	$1,899,790	$76,000	CCF34	29	$1,899,790	$76,000	14-7	29	$1,899,790	$132,300	29	$0	$0
28	CC	1006313047	LLANOS CAMILO	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
29	CC	1122677943	MONTENEGRO NILSON	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS002	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
30	CC	23315890	MUÑOZ LUCILA	231001	2	$131,020	$21,000	EPSC34	2	$131,020	$5,300	CCF34	2	$131,020	$5,300	14-7	2	$131,020	$9,200	2	$0	$0
31	CC	1124821022	MUÑOZ YEISON	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
32	CC	33646510	PALACIOS LEYDY	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
33	CC	1125553465	PENAGOS DUBAN	230301	21	$1,375,710	$220,200	EPS041	21	$1,375,710	$55,100	CCF34	21	$1,375,710	$55,100	14-7	21	$1,375,710	$95,800	21	$0	$0
34	CC	1116616178	PERDOMO JESSICA	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS041	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
35	CC	74754045	PEREZ RITO	231001	30	$1,965,300	$314,500	EPS002	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	8192692	QUINTERO JAIME	230301	1	$65,510	$7,900	EPSIC6	1	$65,510	$0	CCF34	1	$65,510	$0	14-7	1	$65,510	$0	1	$0	$0
37	CC	8192692	QUINTERO JAIME	230301	29	$1,899,790	$304,000	EPSIC6	29	$1,899,790	$76,000	CCF34	29	$1,899,790	$76,000	14-7	29	$1,899,790	$132,300	29	$0	$0
38	CC	1117322589	REYES ALBA	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
39	CC	1120874598	REYES CAMILO	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS041	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
40	CC	1124824918	REYES YEISON	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS002	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
41	CC	8337136	RODRIGUEZ LUIS	230301	21	$1,540,000	$246,400	EPS037	21	$1,540,000	$61,600	CCF34	21	$1,540,000	$61,600	14-7	21	$1,540,000	$107,200	21	$0	$0
42	CC	1006555319	SANCHEZ IVAN	230301	21	$1,375,710	$220,200	EPS002	21	$1,375,710	$55,100	CCF34	21	$1,375,710	$55,100	14-7	21	$1,375,710	$95,800	21	$0	$0
43	CC	1120866973	SEGURA NUMAR	25-14	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
44	CC	1120563962	SILVA HERMES	230301	21	$1,375,710	$220,200	CCFC55	21	$1,375,710	$55,100	CCF34	21	$1,375,710	$55,100	14-7	21	$1,375,710	$95,800	21	$0	$0
45	CC	1124831742	SILVA JOSE	230301	22	$1,441,220	$230,600	EPS041	22	$1,441,220	$57,700	CCF34	22	$1,441,220	$57,700	14-7	22	$1,441,220	$100,400	22	$0	$0
46	CC	1124831742	SILVA JOSE	230301	2	$131,020	$15,800	EPS041	2	$131,020	$0	CCF34	2	$131,020	$0	14-7	2	$131,020	$0	2	$0	$0
47	CC	1124831742	SILVA JOSE	230301	6	$262,053	$42,000	EPS041	6	$262,053	$10,500	CCF34	0	$0	$0	14-7	6	$262,053	$0	0	$0	$0
48	CC	8192879	SILVA YIMIR	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS002	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
49	CC	1121826160	SOTO ARIOSTO	230201	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
50	CC	86070543	SOTO OVER	230301	30	$1,965,300	$314,500	EPS037	30	$1,965,300	$78,700	CCF34	30	$1,965,300	$78,700	14-7	30	$1,965,300	$136,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(43)**			**$78,721,455**	**$12,582,000**			**$78,721,455**	**$3,135,900**			**$78,284,700**	**$3,118,400**			**$78,721,455**	**$4,476,600**		**$0**	$0

294

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901764884	0	SERVICIOS EINGENIERIA M&M P.G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CRA 4 # 17A -27	PUERTO GAITAN-META	3144012401	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1181581830	9480088646	E	2025/01/22	2025/01/08	BANCOLOMBIA	0	$23,312,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	$12,582,000	$0	$0	$12,582,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$681,500	$0	$0	$681,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,333,000	$0	$0	$1,333,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$9,637,900	$0	$0	$9,637,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$929,600	$0	$0	$929,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$4,476,600	$0	$0	$4,476,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	43	$4,476,600	$0	$0	$4,476,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$3,118,400	$0	$0	$3,118,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	43	$3,118,400	$0	$0	$3,118,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				43	$3,135,900	$0	$0	$3,135,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$274,200	$0	$0	$274,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$5,300	$0	$0	$5,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$1,646,100	$0	$0	$1,646,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$411,900	$0	$0	$411,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$76,000	$0	$0	$76,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$531,700	$0	$0	$531,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$190,700	$0	$0	$190,700
TOTAL				43	$23,312,900	$0	$0	$23,312,900

PLANILLA PAGADA

245

194

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93130366		GARCIA MURILLO JOSE ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 6 no. 3 - 25 barrio la esperanza	PUERTO GAITAN-META	6460050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1086416362	9478039139	I	2025/01/17	2024/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$425,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$15,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$15,100		$0	$0
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (1 Afiliados)							$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$15,100		$0	$0
1	CC	93130366	GARCIA JOSE	230301	30		$1,440,000	$230,400	EPS002	30	$1,440,000	$180,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,440,000	$15,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$15,100		$0	$0

2024/11/29 06:50 PM

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-04, 09:04:48 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 76374089

Nro Planilla Corregida: 75182939 **Periodo Cotización:** diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 27/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL		
Documento	CC1096958294	**Dirección**	CL 6B #6 A - 22 CARRERA 6B NO 6A -22
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3142605302
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SIBATE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1096958294	MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL	03	00									A								0	30	30	0	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,000	$ 0	$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.300
C 1096958294	MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL	57	00									C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 200	$ 7.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ROCIO DEL PILAR CLAVIJO CERVERA
TP. No 233770-T
Contadora Publica

CERTIFICACIÓN

Yo, **ROCIO DEL PILAR CLAVIJO CERVERA**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.120.559.643 en condición de contadora pública, hago constar que la empresa **SERVICIOS E INGENIERÍA M&M PG S.A.S** identificada con NIT 901.764.884-0, se encuentra exonerada del pago parafiscales, SENA e ICBF y Salud, de acuerdo al Art 114-1 del Estatuto Tributario.

Expedido a las 27 días de diciembre del 2024.

ROCIO DEL PILAR CLAVIJO CERVERA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 233770-T

3124719216, Email: rocio.clavijo1986@gmail.com
Bogota DC

Trabajo

Fecha: 2025-02-05 01:50:52 pm

Remitente: Sede: D. T. META

Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL

Destinatario INGENIERIA MYM P.G S.A.S

Anexos: 0 Folios: 1

08SE2025745000100000527

248

Villavicencio, Colombia, enero de 2025

Al responder por favor citar este número de radicado

Señor
Representante legal
INGENIERIA MYM P.G S.A.S –
Carrera 4 - 17 A 27 Nueva Jerusalén -- PUERTO GAITAN
Cel, 3144012401 - 3124233056
Correo: fabianguevara80@hotmail.com

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO N° 05EE2025745000100000144 -De, 10/01/2025 - INGENIERIA MYM P.G S.A.S

De conformidad con su solicitud de existencia de reclamaciones e investigaciones administrativas y sanciones impuestas, y una vez verificado por los Grupos de: Prevención, Inspección Vigilancia-RCC, Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites, Grupo de Riesgos Laborales; Inspecciones Municipales y este Despacho, se procede a informar que:

La empresa**: INGENIERIA MYM P.G S.A.S**

Identificada con **NIT: 901.764.884 -0**

REGISTRO: No Registra Sanciones, Reclamaciones y/o Investigaciones Administrativos Laborales.

Periodo: El Periodo corresponde al último año a la fecha de la solicitud.

Lo anterior, teniendo en cuenta la Resolución 3455 del 16/11/2021 artículo primero, numeral 20 del Ministerio del Trabajo.

Se advierte que el contenido de la presente comunicación únicamente tiene validez en la jurisdicción del Departamento META, y los Municipios de Guayabetal, Quetáme, Paratebueno y Medina (Cundinamarca). Según Resolución de Jurisdicción 3723 del 19 de septiembre de 2016, Art. 2.

Atentamente,

JENNIFER PAOLA MORENO VERGARA
Director (E)Territorial Meta

, COFREM
, SENA

Elaboró:
Jose Luis Ramirez Berrio
Auxiliar administrativa
DT-Meta

Revisó:
Jennifer Paola Moreno V
Director Encargado
DT-Meta

Aprobó:
Jennifer Paola Moreno V
Director Encargado
DT-Meta

M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

PAZ Y SALVO

JOSE ANTONIO GARCIA MURILLO, mayor de edad identificado con CC No. 93.130.366, declaro que SERVICIOS E INGENIERIA M&M PG SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO, con todo concepto relacionado con mi cargo como obrero, para la ejecución del contrato de obra No. 1451 del diez (10) de diciembre del 2024, ejecutadas en el municipio de Puerto Gaitán Meta, declaro que al haber dado por terminadas las actividades en el desarrollo del objeto contractual del contrato en mención, a su vez haber recibido todo lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la obra y lo establecido en la ley.

Correspondiente al periodo del **TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024 AL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024.**

Se expide la presente solicitud a la parte interesada en el municipio de puerto Gaitán mera el día 27 de Diciembre del 2024.

Sin otro particular

Jose Antonio Garcia.

JOSE ANTONIO GARCIA MURILLO
CC. 93.130.366

M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

PAZ Y SALVO

RICARDO GONZALEZ MOSQUERA, mayor de edad identificado con CC No. 1.121.878.156, declaro que SERVICIOS E INGENIERIA M&M PG SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO, con todo concepto relacionado con mi cargo como obrero, para la ejecución del contrato de obra No. 1451 del diez (10) de diciembre del 2024, ejecutadas en el municipio de Puerto Gaitán Meta, declaro que al haber dado por terminadas las actividades en el desarrollo del objeto contractual del contrato en mención, a su vez haber recibido todo lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la obra y lo establecido en la ley.

Correspondiente al periodo del **TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024 AL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024.**

Se expide la presente solicitud a la parte interesada en el municipio de puerto Gaitán mera el día 27 de Diciembre del 2024.

Sin otro particular

Ricardo Gonzalez

RICARDO GONZALEZ MOSQUERA
CC. 1.121.878.156.

M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

PAZ Y SALVO

FEIMAN YESID GAMEZ SOLER, mayor de edad identificado con CC No. 1.118.167.840, declaro que SERVICIOS E INGENIERIA M&M PG SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO, con todo concepto relacionado con mi cargo como obrero, para la ejecución del contrato de obra No. 1451 del diez (10) de diciembre del 2024 ejecutadas en el municipio de Puerto Gaitán Meta, declaro que al haber dado por terminadas las actividades en el desarrollo del objeto contractual del contrato en mención, a su vez haber recibido todo lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la obra y lo establecido en la ley.

Correspondiente al periodo del **TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024 AL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024.**

Se expide la presente solicitud a la parte interesada en el municipio de puerto Gaitán mera el día 27 de Diciembre del 2024.

Sin otro particular

Feiman Gamez S.

FEIMAN YESID GAMEZ SOLER
CC. 1.118.167.840.

M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

PAZ Y SALVO

MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL, mayor de edad identificada con CC No. 1.096.958.294, declaro que SERVICIOS E INGENIERIA M&M PG SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO, con todo concepto relacionado con mi cargo como obrero, para la ejecución del contrato de obra No. 1451 del diez (10) de diciembre del 2024 ejecutadas en el municipio de Puerto Gaitán Meta, declaro que al haber dado por terminadas las actividades en el desarrollo del objeto contractual del contrato en mención, a su vez haber recibido todo lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la obra y lo establecido en la ley.

Correspondiente al periodo del **TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024 AL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024.**

Se expide la presente solicitud a la parte interesada en el municipio de puerto Gaitán mera el día 27 de Diciembre del 2024.

Sin otro particular

Mariam Mojica E.

MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL
CC. 1.096.958.294.

M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

PAZ Y SALVO

YIMIR SILVA REYES, mayor de edad identificado con CC No. 8.192.879, declaro que SERVICIOS E INGENIERIA M&M PG SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO, con todo concepto relacionado con mi cargo como obrero, para la ejecución del contrato de obra No.1451 del diez (10) de diciembre del 2024 ejecutadas en el municipio de Puerto Gaitán Meta, declaro que al haber dado por terminadas las actividades en el desarrollo del objeto contractual del contrato en mención, a su vez haber recibido todo lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la obra y lo establecido en la ley.

Correspondiente al periodo del **TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024 AL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024**.

Se expide la presente solicitud a la parte interesada en el municipio de puerto Gaitán mera el día 27 de Diciembre del 2024.

Sin otro particular

Yimir Silva Reyes

YIMIR SILVA REYES
CC. 8.192.879.

M&M P.G SAS

NIT 901764884

ASESORIAS, CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ROCERIA, FUMIGACION, OBRA CIVIL, AMBIENTAL Y SERVICOS DE CATERING, SUMINISTROS, BIENES E INMUEBLES.

PAZ Y SALVO

CRISTIAN ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS, mayor de edad identificado con CC No. 1.010.141.322, declaro que SERVICIOS E INGENIERIA M&M PG SAS, se encuentra a PAZ Y SALVO, con todo concepto relacionado con mi cargo como obrero, para la ejecución del contrato de obra No. 1451 del diez (10) de diciembre del 2024 ejecutadas en el municipio de Puerto Gaitán Meta, declaro que al haber dado por terminadas las actividades en el desarrollo del objeto contractual del contrato en mención, a su vez haber recibido todo lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la obra y lo establecido en la ley.

Correspondiente al periodo del **TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024 AL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024.**

Se expide la presente solicitud a la parte interesada en el municipio de puerto Gaitán mera el día 27 de Diciembre del 2024.

Sin otro particular

Cristian Acevedo R.

CRISTIAN ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS
CC. 1.010.141.322.

DEPARTAMENTO META
1011 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2024

Fecha de Entrada
16/12/2024
No. Comprobante de Entrada
2024.CEN.01.000251

Programación de Compra No. 2024.CEN.01.000266 **Fecha de Programación de Compras:** 16 / 12 / 2024

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS	901.764.884	16 / 12 / 2024	004

Teléfono	Dirección	Ciudad
314401240	CR 4 17A 27 NUEVA JERUSALEN	PUERTOGAITAN

Dependencia	Bodega	Responsable
1015 - ALMACEN	BODEGA DE ALMACEN	RICARDO GIL ETELBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
301029040001	POSTES DE MADERA Suministro e instalación de Poste de madera aserrada de Eucalipto inmunizado por inmersión. Dimensiones 8-10 x 210 centímetros (Cada 3 metros)	UNIDAD	330	40.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00
311520020002	ALAMBRE DE PUA ROL Suministro e instalación de alambre de púa Galvanizado calibre 12.5, rollo por 350 m lineales (920m x 4 líneas de alambrado)	UNIDAD	3900	4.670,00	0,00	0,00	18.213.000,00	0,00
101716030006	POLVO ESPOLVOREABLE Polvo Espolvoreable, ingredientes activos: Clorphiryfos. organofosforados, formulados para control de hormiga arriera en presentacion de bolsa de 1 kilogramo (5gr por planta)-MARCA LORSBAN	KILOS	17	20.857,00	0,00	0,00	354.569,00	0,00
101715040005	ABONO ORGANICO Suministro y aplicación de abono de origen orgánico bio-solido, compostado pre húmico, con caracteristicas fisicas, biológicas y quimicas conocidas, productos registrados. (800 gr por árbol) -MARCA BIOCARBONO	UNIDAD	55	51.873,00	0,00	0,00	2.853.015,00	0,00
101717010008	CAL AGRICOLA Suministro y aplicación de mineral calcáreo compuesto de un carbonato doble de calcio y magnesio. Su color varia del blanco al gris pasando por ligeros tonos de amarillo en algunos casos Es una cal agrícola destinada a corregir la acidez en suelos, también es un fertilizante simple por su alto contenido de magnesio. (200gr por árbol)-MARCA CALLLANOS	UNIDAD	15	32.080,00	0,00	0,00	481.200,00	0,00
101716020029	FERTILIZANTE Suministro y aplicación de fertilizante edáfico compuesto NPK RELACION 18-18-18, sólido soluble triple quince. (60 gr por planta)-MARCA ECOFERTIL	UNIDAD	4	355.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00
211019020012	HIDRORETENEDOR Suministro y aplicación de acondicionador físico del suelo, para mejorar la capacidad de absorción, retención de agua y nutrientes del suelo, no contamina el suelo ni el agua, su pH es neutro. Al entrar en contacto con el agua puede llegar a absorber de 400 a 500 veces su peso y los cristales se convierten en un gel granulado que queda a disposición de las raíces de las plantas. (5gr por planta)-MARCA ECOFERTIL	UNIDAD	18	70.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
101520010055	PLANTULAS Suministro y siembra de plántula presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de libra. Las plántulas deben tener una altura mínima de 80 cm. (Especies nativas).-PLANTULAS (Palma de Moriche, Nacedero, Hobo, Cedro Amargo, Orejero, Cajeto, Samán, Arrayan, Igua, Melina, Yopo, Algarrobo, Cachimbo, Caño fistol y Otras especies nativas)	UNIDAD	2033	3.968,00	0,00	0,00	8.066.944,00	0,00
101520010036	PLANTULA DE MORICHE Suministro y siembra de plántula de moriche presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle de 20*15 cm, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de 1 kilo. Las plántulas deben tener una altura entre 50 y 80 cm.	UNIDAD	1300	9.800,00	0,00	0,00	12.740.000,00	0,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CONTRATO DE OBRA N°1451 "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.

SUBTOTAL	$ 58.588.728,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 58.588.728,00

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Aprobado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

DEPARTAMENTO META
1011 - SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN - META
VIGENCIA FISCAL - 2024

Fecha de Salida
16/12/2024
Salida No.
2024.CEN.01.000856

Consecutivo de Entrada: 2024.CEN.01.000251

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA MEDIO AMBIENTE

Responsable de Almacén
RICARDO GIL ETELBERTO

Dependencia Destino
SECRETARIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL

Bodega/Área Destino
SECRETARIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL

Tercero que Recibe
CASTAÑEDA PINILLA SANDRA MILENA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
301029040001	POSTES DE MADERA Suministro e instalación de Poste de madera aserrada de Eucalipto, inmunizado por inmersión. Dimensiones 8-10 x 210 centímetros (Cada 3 metros)	UNIDAD	330	40.000,00	13.200.000,00
311520020002	ALAMBRE DE PUA ROL Suministro e instalación de alambre de púa Galvanizado calibre 12.5, rollo por 350 m lineales.(920m x 4 lineas de alambrado)	UNIDAD	3900	4.670,00	18.213.000,00
101716030006	POLVO ESPOLVOREABLE Polvo Espolvoreable, ingredientes activos: Clorphiryfos, organofosforados, formulados para control de hormiga arriera en presentacion de bolsa de 1 kilogramo (5gr por planta)-MARCA LORSBAN	KILOS	17	20.857,00	354.569,00
101715040005	ABONO ORGANICO Suministro y aplicación de abono de origen orgánico bio-solido, compostado pre húmico, con caracteristicas fisicas, biológicas y químicas conocidas, productos registrados. (800 gr por árbol) -MARCA BIOCARBONO	UNIDAD	55	51.873,00	2.853.015,00
101717010008	CAL AGRICOLA Suministro y aplicación de mineral calcáreo compuesto de un carbonato doble de calcio y magnesio. Su color varia del blanco al gris pasando por ligeros tonos de amarillo en algunos casos Es una cal agricola destinada a corregir la acidez en suelos, también es un fertilizante simple por su alto contenido de magnesio. (200gr por árbol)-MARCA CALLLANOS	UNIDAD	15	32.080,00	481.200,00
101716020029	FERTILIZANTE Suministro y aplicación de fertilizante edáfico compuesto NPK RELACION 18-18-18, sólido soluble triple quince. (60 gr por planta)-MARCA ECOFERTIL	UNIDAD	4	355.000,00	1.420.000,00
211019020012	HIDRORETENEDOR Suministro y aplicación de acondicionador fisico del suelo, para mejorar la capacidad de absorción, retención de agua y nutrientes del suelo, no contamina el suelo ni el agua, su pH es neutro. Al entrar en contacto con el agua puede llegar a absorber de 400 a 500 veces su peso y los cristales se convierten en un gel granulado que queda a disposición de las raíces de las plantas. (5gr por planta)-MARCA ECOFERTIL	UNIDAD	18	70.000,00	1.260.000,00
101520010055	PLANTULAS Suministro y siembra de plántula presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de libra. Las plántulas deben tener una altura mínima de 80 cm. (Especies nativas).-PLANTULAS (Palma de Moriche, Nacedero, Hobo, Cedro Amargo, Orejero, Cajeto, Samán, Arrayan, Igua, Melina, Yopo, Algarrobo, Cachimbo, Caño fistol y Otras especies nativas)	UNIDAD	2033	3.968,00	8.066.944,00
101520010036	PLANTULA DE MORICHE Suministro y siembra de plántula de moriche presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle de 20*15 cm, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de 1 kilo. Las plántulas deben tener una altura entre 50 y 80 cm.	UNIDAD	1300	9.800,00	12.740.000,00

Valor en Letras:
CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 58.588.728,00**

Detalle:
CONTRATO DE OBRA N°1451 "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.

Elaborado por:

RICARDO GIL ETELBERTO
ALMACENISTA

Recibido por:

CASTAÑEDA PINILLA SANDRA MILENA

Puerto Gaitán Potencia Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: viernes, 27 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**15**	**DIAS PENDIENTES**	**0**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Dia 15: En este día, el contratista, la supervisión, la ingeniera residente y el técnico se desplazaron al sitio para realizar una revisión final del proceso de reforestación tipo protector establecido. Durante la visita, se verificaron detalladamente todas las actividades realizadas, asegurando que se cumplieran al 100% las condiciones estipuladas en el contrato 1451 de 2024. Este proceso incluyó una inspección exhaustiva del terreno, la distribución de las plántulas y la correcta aplicación de los insumos, así como la calidad general de la siembra y el cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos. La revisión final no solo confirmó que todas las actividades se ejecutaron conforme a lo acordado, sino que también garantizó que el proyecto estuviera alineado con los objetivos de sostenibilidad y regeneración ecológica que fueron la base del contrato.	Und	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: jueves, 26 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**14**	**DIAS PENDIENTES**	**1**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Dia 14: Aprovechando el clima favorable y las óptimas condiciones ambientales, este día se concluyó exitosamente el establecimiento de todas las plántulas previstas en el contrato. En total, se plantaron 3,333 plántulas, distribuidas estratégicamente entre moriches y diversas especies nativas, asegurando una alta biodiversidad y una adecuada regeneración del ecosistema.	Und	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	
Además, se completó la aplicación de todos los productos necesarios para garantizar un desarrollo saludable de las plantas. Esto incluyó abonos orgánicos, fertilizantes específicos como el triple 18, cal agrícola para corregir posibles desequilibrios del suelo y el hidroretenedor activado para optimizar la retención de humedad en el terreno. Estas aplicaciones técnicas se realizaron de manera uniforme y siguiendo estrictos estándares de calidad para maximizar los beneficios de cada insumo. La finalización de esta etapa representa un hito clave en el proyecto, marcando el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del cronograma planificado. Gracias a la combinación de esfuerzos de todo el equipo y al liderazgo técnico, el terreno ahora está completamente sembrado y con insumos aplicados, listo para iniciar el seguimiento y monitoreo de las plántulas en su etapa de crecimiento.	Bulto	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

Mariam Mojica

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL** **Ingeniera Forestal Residente**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA** **Secretaria Ecologica y Ambiental**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara



Puerto Gaitán Tierra Paraíso Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: miércoles, 25 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**13**	**DIAS PENDIENTES**	**2**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Dia 13: Manteniendo el ritmo constante en las labores de siembra, el equipo logró avanzar un 20% adicional en el establecimiento forestal, alcanzando así un progreso acumulado del 85% del área total prevista. Durante esta jornada, se ejecutaron las actividades de manera eficiente y siguiendo las recomendaciones técnicas, lo que permitió optimizar el uso de los recursos y garantizar la adecuada distribución del material vegetal en el terreno.	Und	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

Mariam Mojica

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán Potencia Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: martes, 24 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**12**	**DIAS PENDIENTES**	**3**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Aprovechando las condiciones favorables, se continuó con la siembra de árboles y la aplicación de insumos esenciales, siguiendo estrictamente las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. Gracias al esfuerzo coordinado de la cuadrilla y al liderazgo técnico, se logró avanzar un 20% adicional en el establecimiento forestal, alcanzando un total acumulado del 65% del área total trabajada. Durante esta jornada, se priorizó mantener un ritmo constante y una distribución estratégica de las especies, garantizando la diversidad ecológica y la sostenibilidad del terreno a largo plazo.	Und	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO			
		C	NC	FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán Meta Paraíso Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: lunes, 23 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**11**	**DIAS PENDIENTES**	**4**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Dia 11: Siguiendo la planificación establecida, se continuó con la siembra del material vegetal y la aplicación de los productos esenciales, como se venía realizando en los días anteriores. No obstante, las labores se vieron afectadas por fuertes lluvias que comenzaron a caer a partir del mediodía, dificultando las actividades en campo y obligando a suspender el trabajo antes de lo previsto. A pesar de las condiciones climáticas adversas, la cuadrilla logró aprovechar la primera mitad del día para avanzar un 10% adicional en el establecimiento forestal, aplicando cuidadosamente los insumos y realizando la siembra de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. Este esfuerzo permitió alcanzar un progreso acumulado del 45% del área total del terreno	Und	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán Meta
Paraíso Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: domingo, 22 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**10**	**DIAS PENDIENTES**	**5**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Dia 10: Basándose en la experiencia adquirida durante el día anterior, se continuó con el proceso de aplicación de todos los insumos planificados y la siembra del material vegetal. Este avance incluyó una combinación estratégica de moriches con otras especies nativas, asegurando una diversidad ecológica que favorece la regeneración del ecosistema y promueve la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.	Und	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	
El equipo trabajó de manera coordinada, aplicando abonos, fertilizantes y el hidroretenedor activado según las técnicas previamente definidas para maximizar su efectividad.	Bulto	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

Mariam Mojica

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán Puerto Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: sábado, 21 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**9**	**DIAS PENDIENTES**	**6**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
A partir de las pruebas realizadas, se diseñó e implementó un plan estratégico para la aplicación de los insumos necesarios antes de proceder con la siembra del material vegetal. Este plan incluyó varias etapas cuidadosamente organizadas para garantizar condiciones óptimas para el establecimiento y desarrollo de las plántulas. Inicialmente, se aplicó abono orgánico y cal agrícola, con el propósito de enriquecer el suelo con materia orgánica y corregir posibles problemas de acidez, respectivamente.	Bulto	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	
Posteriormente, se utilizó un fertilizante del tipo triple 18 (NPK 18-18-18), conocido por su balance equilibrado de nitrógeno, fósforo y potasio, esenciales para un crecimiento vigoroso y uniforme de las plantas.	Bulto	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	
Además, se incorporó un hidroretenedor previamente activado, el cual mejora la capacidad del suelo para retener humedad, reduciendo la frecuencia de riego necesaria y asegurando que las plántulas dispongan de agua suficiente durante su etapa inicial de desarrollo. Este producto es especialmente útil en zonas con estrés hídrico o suelos con baja retención de agua. Como resultado de este proceso integral, se logró completar la aplicación de todos los insumos y la siembra de las plántulas en un 15% del área total del terreno.	Kg	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

Mariam Mojica

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán — Paraíso Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: viernes, 20 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**8**	**DIAS PENDIENTES**	**7**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Dia 8: Se completó con éxito el ahoyado de la totalidad del predio, dejando el terreno completamente preparado para dar inicio al establecimiento forestal.	Ha	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	
Además, se realizó una prueba inicial de aplicación de productos calcáreos y abonos como primeros suministros para el enriquecimiento del suelo. Este ensayo tuvo como objetivo evaluar la efectividad y rapidez en la aplicacion de los insumos con las caracteristicas especificas del terreno. Los productos calcáreos ayudarán a corregir posibles problemas de acidez en el suelo, mientras que los abonos aportarán los nutrientes esenciales para un crecimiento vigoroso de las especies forestales.	Bulto	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

Mariam Mojica

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán — Paraíso Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: jueves, 19 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	15 dias	DIAS TRANSCURRIDOS	7	DIAS PENDIENTES	8

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Dia 7: Se completaron con éxito las labores de plateo en las 3 hectáreas destinadas al establecimiento forestal, dejando el terreno completamente limpio y preparado para las siguientes etapas del proceso de plantación.	Ha	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	
Asimismo, se avanzó significativamente en la tarea de ahoyado, alcanzando el 75% de la meta prevista.	Ha	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		

LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

C: Conforme	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme	MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL	SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: miércoles, 18 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**6**	**DIAS PENDIENTES**	**9**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Dia 6: Se completó exitosamente la instalación del alambre de púas, finalizando el cercado perimetral en su totalidad. Con esta tarea culminada, el área quedó completamente delimitada y asegurada, marcando un hito significativo en el avance del proyecto. Con el cercado terminado, toda la cuadrilla, junto con el técnico, inició las labores de plateo y ahoyado bajo la dirección de la ingeniera forestal residente. Estas actividades se llevaron a cabo siguiendo un plan técnico detallado, garantizando la preparación adecuada del suelo para el establecimiento forestal.	Metros	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	
Se realizo el plateo que consistió en la limpieza del área inmediata alrededor de los puntos de siembra, mientras que el ahoyado aseguró la excavación de hoyos con las dimensiones y características necesarias para favorecer el crecimiento saludable de las plantas.	Ha	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL	SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán Tierra Paraíso Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: martes, 17 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**5**	**DIAS PENDIENTES**	**10**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Dia 5: Se continuó con la instalación del alambre de púas como parte del cercado perimetral, asegurando la correcta fijación y tensión del material en los postes previamente colocados. Este avance refuerza la delimitación del terreno, garantizando la seguridad y protección del área destinada para el proyecto. Simultáneamente, se finalizó el trazado del terreno destinado al establecimiento forestal. Este proceso incluyó la demarcación precisa de las áreas de plantación, tomando en cuenta factores como la topografía del terreno, la orientación y la densidad de siembra previamente definida.	Metros	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

Mariam Mojica

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán Paraíso Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: lunes, 16 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**4**	**DIAS PENDIENTES**	**11**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	Unidad	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Dia 4: Se dio inicio al proceso de instalación del alambre de púas como parte del cercado perimetral, avanzando hacia la conclusión de esta etapa clave para la protección y delimitación del terreno. El trabajo se llevó a cabo de manera ordenada, asegurando la correcta tensión y fijación del alambre en los postes previamente instalados. Paralelamente, la ingeniera forestal y el técnico comenzaron a realizar el trazado del terreno para definir las áreas de siembra. Se estableció una densidad de plantación de 3x3 metros, garantizando un equilibrio óptimo entre el crecimiento de las plantas, el aprovechamiento del espacio y la sostenibilidad del proyecto.	Metros	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO			
		C	NC	FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

Mariam Mojica

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: domingo, 15 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**3**	**DIAS PENDIENTES**	**12**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Día 3: Se completó al 100% la limpieza general del área, dejando el espacio completamente despejado y preparado para las siguientes etapas del proyecto. Además, se finalizó exitosamente la instalación del 100% de los postes destinados al cercado perimetral, asegurando la delimitación del terreno y sentando las bases para la colocación del cerramiento definitivo	Ha	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

Mariam Mojica

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán Meta Paraíso Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: sábado, 14 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**2**	**DIAS PENDIENTES**	**13**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Día 2: Se continuó con el avance en la limpieza general del predio, utilizando la guadañadora para despejar eficientemente la vegetación y los residuos en la zona. Este trabajo permitió un mayor despeje del área destinada para la restauración. Además, se dio inicio a la instalación de los postes que servirán como soporte para el cercado perimetral, un paso clave para asegurar la delimitación adecuada del terreno. La colocación de los postes se realizó con cuidado, garantizando su firmeza y estabilidad, lo que permitirá contar con una estructura segura y duradera para el cercado del área en los próximos días	Ha	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

ota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevament

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

Mariam Mojica

C: Conforme	**FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

Puerto Gaitán Pueblo Natural

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA
INF-FR-12 V03
Vigente desde 22/11/2021

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A	**CONTRATO DE OBRA No. __1451__ DE __2024___**
OBJETO: N/A	**OBJETO: "RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
RESIDENTE: N/A	**RESIDENTE: Ing. Mariam Mojica**
FECHA: viernes, 13 de diciembre de 2024	**HORAS DE LLUVIA:**

PLAZO ACTUAL	**15 dias**	**DIAS TRANSCURRIDOS**	**1**	**DIAS PENDIENTES**	**14**

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA						Cascos	X	
RESIDENTE	1					Gafas	X	
TECNICO	1					Tapabocas	X	
OFICIAL						Guantes	X	
CUADRILLA	4					Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Día 1: Se realizó la delimitación del cercado perimetral siguiendo las coordenadas exactas proporcionadas por la Secretaría Ecológica y Ambiental, lo que permitió establecer con precisión el lindero del área destinada a la restauración. Una vez definido el polígono en el terreno y marcado con estacas, se comenzó con el proceso de limpieza de la zona utilizando una guadañadora, logrando completar alrededor del 5% del total del área asignada.	Metros	Predio Nebilnas 2 - Area destinada para la restauracion de 3Ha por medio de reforestacion tipo protector (Coordenadas 4°18'30.55"N y 72° 3'4.95"O)	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	**LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Las actividades corresponden a lo planeado según los tiempos de ejecucion del contrato			Todos los suministros fueron entregados a la Secretaria Ecologica y Ambiental al iniciar el tiempo de ejecucion del contrato		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	**SE SOLICITARON ENSAYOS**	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
Cumplen a cabalidad			N/A		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	**SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES**	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO			
		C	NC	FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

ESQUEMA DE OBRA

N/A

OBSERVACIONES:

C: Conforme	Mariam Mojica **FIRMA**	**FIRMA**
NC: No Conforme	**MARIAM LISSDET YOORLEY MOJICA ESPINEL** **Ingeniera Forestal Residente**	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA** **Secretaria Ecologica y Ambiental**

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

COMITÉ CONTRATO NO. 1451 DE 2024

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° *1*	
Hora:	**Fecha:**
Lugar:	**DESPACHO SECRETARIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL**
Dependencia que Convoca:	**SECRETARIA ECOLÓGICA Y AMBIENTAL**
Proceso:	**CONTRATO No. 1451 de 2024**
Objetivo:	**"RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**

Agenda: ***EJECUCION DEL*** **CONTRATO No. 1451 de 2024.**

Desarrollo:

LA SUPERVISORA encabeza de la secretaria ecológica y ambiental concede el uso de la palabra al contratista **SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS**, con el fin de que informe la ejecución del contrato de referencia.

EL CONTRATISTA *manifiesta que ya se encuentra en la zona trabajando pero se han presentado dificilcultades por los temas de las fuertes lluvias que golpean el municipio*

Que, se presentaron imprevistos en la ejecución del contrato no. 1451 de 2024, con respecto al item 7.1 suministro y siembra de plántula presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de libra. Las plántulas deben tener una altura mínima de 80 cm. (Especies nativas).

Que surgió la eventualidad durante la ejecución de las actividades de siembra de item que por lluvias intensas que presento el municipio durante los días 17 y 18 de diciembre se presentó **ENCHARCAMIENTO** en la zona donde ya se habían sembrado plantas, lo que asfixio las raíces de las plantas y altera su desarrollo, generando danos en las plantas, causando la pérdida de flores y capullos, oscurecimiento de las puntas de las hojas, y problemas en las raíces, presentándose esta eventualidad que no era predecible en 170 unidades del item 71.

Por ende, se solicita autorización para sustituir las plantas afectadas, y estas sean cubiertas por el item de **IMPREVISTOS** que corresponde al **1% por un valor de $639.384,17, ya que generaría un desequilibrio económico el tener que cubrirlas del presupuesto del contratista.**

SUPERVISORA: Que una vez analizada la situación y revisada la situación se evidencia que este imprevisto no podía preverse, y dar esa carga al contratista genera un gasto más.

Por ende, con el fin de cubrir la necesidad presentada y que el objeto del presente contrato corresponde a **"RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS**

CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META", se debe tratar de garantizarse su cumplimiento.

Por otro lado, solo se tiene **$639.384,17** de imprevistos, por ende, al realizar el cálculo se pueden sustituir 161 unidades del item 7.1, de da un valor de **$ 638.889,86,** que las demás plantas afectadas, las demás deben ser asumidas por el contratista, ya que no se cuenta con más presupuesto.

EL CONTRATISRA: informa que ve viable las sustitución de las plantas restantes afectadas que no se alcanzan a cubrir con el item de imprevistos, ya que no es una cantidad tan alta y no generaría un desequilibrio económico.

DECISIONES: *se utilizara el valor de* **$ 638.889,86** *del item de imprevistos del contrato de referencia con el fin de cubrir la eventualidad descrita anteriormente por el contratista, quedando un saldo por el valor de* ***$ 494,31.***

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Imprevisto	*Cubrir el imprevisto presentado por al valor de* **$ 638.889,86**	

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA	Supervisora, Secretaria Ecológica y Ambiental	Alcaldía municipal de puerto Gaitán	
ANA MILDRETH SOTO MEDINA	**R/L de SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS**	CONTRATISTA	

Puerto Gaitán META Paraíso Natural

IMPREVISTOS NO IMPUESTOS
INF-FR-29 V02
Vigente desde 22/11/2021

LIQUIDACIÓN DE IMPREVISTOS

PROCESO No.:	**MC-SEAM-075-2024**
CONTRATO No.:	**1451 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024**
OBRA:	**RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META**
VALOR CONTRATO:	**OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($ 80.358.973,70)**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

VALORACIÓN DE IMPREVISTOS

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
7.1	Suministro y siembra de plántula presentación en bolsa plástica negra perforada con fuelle, de material original (no reciclado), que permita su movilización sin deterioro de la misma, con pan de tierra mínimo de libra. Las plántulas deben tener una altura mínima de 80 cm. (Especies nativas).	unid	161	$ 3.968,26	$ 638.889,86
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA				$ 638.889,86

JUSTIFICACIÓN

Que surgió la eventualidad durante la ejecución de las actividades de siembra de item que por lluvias intensas que presento el municipio durante los días 17 y 18 de diciembre se presentó ENCHARCAMIENTO en la zona donde ya se habían sembrado plantas, lo que asfixio las raíces de las plantas y altera su desarrollo, generando danos en las plantas, causando la pérdida de flores y capullos, oscurecimiento de las puntas de las hojas, y problemas en las raíces, presentándose esta eventualidad que no era predecible en 170 unidades del item 71, que por el valor que se contaba en el item de imprevistos el presupuesto solo alcanza para subsanar esta eventualidad con 161 unidades del item 71.

SOPORTES ANEXADOS (FACTURA)

Firma:

Nombre: Ana Maldreth Soto M.

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Sandra Cabrera

SUPERVISOR

Factura Electrónica De Venta No

MMPG No. 46

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066123707 que habilita desde MMPG 1 hasta MMPG 500000. Vence 2025-02-24

SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS

Nit 901764884

Régimen Simple
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8130 8.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
NIT	800079035 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CLL 10 10 60	Puerto Gaitán	3203750721

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/01/2025	14/01/2025	HEIDY TATIANA DUQUE DAZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	330	Und.	40.000,00	0%	0,00	13.200.000,00
2	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	3.900	Und.	4.670,00	0%	0,00	18.213.000,00
3	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	17	Und.	20.857,00	0%	0,00	354.569,00
4	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	55	Und.	51.873,00	0%	0,00	2.853.015,00
5	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	15	Und.	32.080,00	0%	0,00	481.200,00
6	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	4	Und.	355.000,00	0%	0,00	1.420.000,00
7	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	18	Und.	70.000,00	0%	0,00	1.260.000,00
8	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	2.033	Und.	3.968,00	0%	0,00	8.066.944,00
9	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	1.300	Und.	9.800,00	0%	0,00	12.740.000,00
10	INSUMOS AG	VENTA INSUMOS AGRICOLAS	3	Und.	470.000,00	0%	0,00	1.410.000,00
11	Serv10	Servicio de cuadrilla ambiental	3	Und.	448.000,00	0%	0,00	1.344.000,00
12	41309502	Administración	1	Und.	15.949.109,28	0%	0,00	15.949.109,28
13	41309503	imprevistos	1	Und.	612.932,99	0%	0,00	-612.932,99
14	41309504	Utilidad	1	Und.	2.453.709,12	0%	0,00	2.453.709,12

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**80.358.479,39**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**80.358.479,39**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**80.358.479,39**

Valor en Letras

OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/01/2025 10:41:52

CRA 4 17A 27 BRR NUEVA JERUSALEN Teléfono 3144012401 Puerto Gaitán
Correo Electrónico gerenciamympgsas@hotmail.com

CUFE: 802d18def09e7b871163c8cc697cc8f8929ce3873f73d06544fb6b03cdb5c5687c6aa9ee59ab4d4b32cba4d7ca561368--Expedición:13/01/2025 12:27 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Puerto Gaitán

FORMATO ACTA PAGO
INF-FR-28 V03
Vigente desde 04/02/2022

ACTA PARA PAGO

PAGO PARCIAL No. _____	**PAGO FINAL _____X_____**
CONTRATO No:	1451 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META
VALOR INICIAL :	$ 80.358.973,70
VALOR ADICION No. __	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO :	$ 80.358.973,70
VALOR TOTAL CONTRATO EN LETRAS:	OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE
CONTRATISTA:	SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA RECIBO FINAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA

RESUMEN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 80.358.973,70**
VALOR ANTICIPO RECIBIDO 50%	**$ 0,00**
VALOR ADICION No. ___	**$ 0,00**
VALOR ANTICIPO ADICION No. ___ RECIBIDO 50%	**$ 0,00**
VALOR ACTA PARCIAL N° __	**$ 0,00**
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. __	**$ 0,00**
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL N° ___	**$ 0,00**
VALOR ACTA PARCIAL N° ___	**$ 0,00**
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL N° ___	**$ 0,00**
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° __	**$ 0,00**
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL N° ___	**$ 0,00**
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA PARCIAL N° ___	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1	**$ 80.358.479,39**
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	**$ 0,00**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 494,31**

VALOR DEL CONTRATO		**$ 80.358.973,70**
VALOR ADICION No. __ AL CONTRATO		**$ 0,00**
VALOR ACTAS ANTERIORES	**$ 0,00**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N° __	**$ 80.358.479,39**	
SALDO POR EJECUTAR	**$ 494,31**	
SUMAS IGUALES:	**$ 80.358.973,70**	**$ 80.358.973,70**

El valor a pagar en la presente acta es la suma de **OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 80.358.479,39)**

Con la firma de la presente acta, el contratista recibe el pago final del 99% para un acumulado de 100% de la obra ejecutada, quedando un saldo del 0,02% del valor total del contrato por ejecutar de imprevistos, se firma en Puerto Gaitán - Meta.

Mildreth Soto

ANA MILDRETH SOTO MEDINA
Representante Legal
SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS
Contratista

SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA
Secretaria Ecológica y Ambiental
SUPERVISORA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1451 de 2024	
CONTRATANTE **NIT**	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META) 800.079.035-1
CONTRATISTA	SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS
NIT N°	901.764.884-0
REPRESENTANTE LEGAL	ANA MILDRETH SOTO MEDINA
C.C.	30.982.985 de Puerto Gaitán-Meta
OBJETO	**"RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($ 80.358.973,70)
VALOS EJECUTADO	OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 80.358.479,39)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 494,31)
PLAZO	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	**SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA,** Secretaria Ecológica y Ambiental
FECHA INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA RECIBO FINAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSION	N/A
REINICIO	N/A
MODIFICATORIA	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SEGUN PRORROGAS, REINICIOS)	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	

Entre los suscritos a saber **LUIS CESAR PÉREZ GAITÁN** Mayor de edad, vecino de Puerto Gaitán, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.122.120.037 expedida en Puerto Gaitán-Meta en su calidad de alcalde municipal de Puerto Gaitán, el (la) Secretaria ecológica y ambiental en cabeza de la doctora **SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA** en calidad de Supervisora del contrato y **SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS** identificado con (Nit 901.764.884-0, **ANA MILDRETH SOTO MEDINA** identificada con CC 30.982.985 expedida en Puerto Gaitán Meta. para la liquidación del presente contrato de 1451 DEL 2024 con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato No. 1451 DEL 2024 y de acuerdo con lo siguiente:

PRIMERA. Que el **Municipio** celebro el día diez (10) de diciembre del 2024 con **SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS** identificado con (Nit 901.764.884-0, **ANA MILDRETH SOTO MEDINA** identificada con CC 30.982.985 expedida en Puerto Gaitán Meta, el contrato N° 1451 de 2024 cuyo objeto es: **"RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".**

SEGUNDA. Que mediante Acta de Terminación del día veintisiete (27) días de diciembre de 2024, se informó al **Municipio** del cumplimiento de las obligaciones pactadas en la minuta del contrato.

TERCERA. Que la Supervisora del **Municipio. SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA** certifica que se ha cumplido con lo pactado en el contrato.

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597

CUARTA. Que el contrato se liquida de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

QUINTA. Que el contratista presentó informe final de ejecución y soportes de pago de seguridad social, revisados a satisfacción por parte del supervisor y que de acuerdo al balance financiero se concluye lo siguiente:

RESUMEN FINANCIERO

Acta No.	Mes Ejecutado	Comprobante de Egreso	Fecha	Valor Facturado	Valor ajuste	Anticipo		Valor de Retención
						Amortizado	Saldo	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Totales				$	$	$	$	$

BALANCE DEL CONTRATO

Datos Generales			
Valor Inicial del Contrato	**$80.358.973,70**	Valor actas parciales	$ 0.00
Valor Adiciones	$ 0.00	Valor Anticipo	$ 0.00
Valor Contrato mas adiciones	$ 0.00	Valor Anticipo Amortizado	$ 0.00
Valor del Contrato Ejecutado	$ 80.358.479,39	Valor Anticipo x amortizar	$ 0.00

Concepto	Valor
Valor Inicial	**$80.358.973,70**
Adicion	$ 0
Valor pagos anteriores	$ 0
Valor autorizado en la presente acta	$ 0
Saldo a favor del Municipio	**$ 494,31**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 80.358.479,39

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

SEXTA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

SEPTIMA. Ordenar la liberación presupuestal del saldo a favor del Municipio, el cual está bajo el Certificado de Disponibilidad N° DIS.2024003310 de fecha 25 de noviembre del 2024 y el Registro Presupuestal N° RES.2024003934 de fecha 10 de diciembre del 2024..

OCTAVA. Consecuentemente con lo aquí expuesto, previa verificación del informe de ejecución y soportes de pago de seguridad social presentados según se indica en la minuta y presentación por parte del contratista y del supervisor de los siguientes documentos pertinentes para el pago:

a) Informe del contratista
b) Informe final del supervisor
c) Cuenta de cobro o factura (según aplique)
d) Acta de terminación de contrato/ Acta de recibo

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co

e) Pagos de seguridad social

El Municipio cancelará la suma de **OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 80.358.479,39).**

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato N° 1451 de 2024 cuyo objeto es: **"RESTAURACIÓN DE 3 HECTÁREAS POR MEDIO DE UNA REFORESTACIÓN TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".** y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones sin prejuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

Para constancia, se firma en el Municipio de Puerto Gaitán Meta el día

ORDENADOR DEL GASTO

LUIS CESAR PEREZ GAITAN
ALCALDE MUNICIPAL

CONTRATISTA

ANA MILDRETH SOTO MEDINA
CC: 30.982.985 DE PUERTO GAITAN -META

SUPERVISOR

SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA
SECRETARIA ECOLOGICA Y AMBIENTA

Elaboro: Martin Sebastián Pérez Romero	Reviso: Sandra Milena Castañeda Pinilla	Aprobó: Sandra Milena Castañeda Pinilla
Cargo : CPS 1162/2024 ABOGADO	Cargo Secretaria Ecológica y Ambiental	Cargo: Secretaria Ecológica y Ambiental

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co
