Parte 1

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	1	RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 1.287.864,00	-	$ -	-	$ -
3010	1,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	307,00	$35.050,00	$ 45.540,47	$ 13.980.924,00	-	$ -	-	$ -
3710	1,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	720,00	$5.198,00	$ 6.751,16	$ 4.860.835,00	-	$ -	-	$ -
3017	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	748,80	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 40.418.868,00	-	$ -	-	$ -
4613	1,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	187,20	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 12.935.889,00	-	$ -	-	$ -
4015	1,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.218,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 19.500.143,00	-	$ -	-	$ -
4157	1,007	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$170.358,00	$ 221.346,15	$ 47.810.768,00	-	$ -	-	$ -
4743	1,008	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$164.610,00	$ 213.877,77	$ 30.796.398,00	-	$ -	-	$ -
4160	1,009	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 42.887.346,00	-	$ -	-	$ -
4747	1,010	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 28.591.564,00	-	$ -	-	$ -
4200	1,011	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	$1.002.096,00	$ 1.302.023,33	$ 1.302.023,00	-	$ -	-	$ -
4712	1,012	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	32,40	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 60.258.567,00	-	$ -	-	$ -
3864	1,013	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1.200,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 4.657.212,00	-	$ -	-	$ -
3867	1,014	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	3.116,95	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 13.878.843,00	-	$ -	-	$ -
4240	1,015	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0,12M (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	ML	800,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 16.525.016,00	-	$ -	-	$ -
4246	1,016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	8,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 1.652.460,00	-	$ -	-	$ -
4248	1,017	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	40,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 6.885.250,00	-	$ -	-	$ -
6313	1,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	75,60	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 107.943.506,00	-	$ -	-	$ -
	2	RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO									
3007	2,001	REPLANTEO GENERAL	M2	10.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 10.946.844,00	1.951,91	$ 2.094.833,68	5.428,87	$ 5.826.376,59
3486	2,002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1.020,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 228.454.123,00	178,75	$ 40.037.705,22	669,03	$ 149.845.747,07
3710	2,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5.100,00	$5.198,00	$ 6.751,16	$ 34.430.916,00	447,89	$ 3.023.804,60	1.127,04	$ 7.608.854,91

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3017	2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5.967,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 322.071.928,00	1.021,62	$ 55.142.273,07	3.085,11	$ 166.520.218,83
4613	2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	663,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 45.814.806,00	-	$ -	-	$ -
4015	2,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE:CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.100,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 81.650.847,00	-	$ -	-	$ -
4161	2,007	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$146.967,00	$ 190.954,22	$ 175.295.974,00	-	$ -	-	$ -
4746	2,008	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 121.514.148,00	-	$ -	-	$ -
4158	2,009	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$161.586,00	$ 209.948,69	$ 192.732.897,00	-	$ -	-	$ -
4744	2,01	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 137.439.845,00	-	$ -	-	$ -
3708	2,011	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	5.000,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 34.015.650,00	2.444,25	$ 16.628.567,51	2.444,25	$ 16.628.567,51
5404	2,012	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2.000,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 21.890.600,00	1.085,73	$ 11.883.640,57	1.085,73	$ 11.883.640,57
4958	2,013	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	20.000,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 203.964.200,00	1.742,67	$ 17.772.114,62	1.742,67	$ 17.772.114,62
4238	2,014	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	137,95	$6.866,00	$ 8.920,99	$ 1.230.651,00	-	$ -	-	$ -
3806	2,015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	5.100,00	$2.404,00	$ 3.123,52	$ 15.929.952,00	-	$ -	-	$ -
3204	2,016	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	1.620,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.596.471.395,00	-	$ -	-	$ -
3394	2,017	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	408,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 395.717.148,00	-	$ -	-	$ -
3837	2,018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	6.900,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 116.045.166,00	473,91	$ 7.970.284,73	473,91	$ 7.970.284,73
3811	2,019	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	5.200,00	$2.397,00	$ 3.114,42	$ 16.194.984,00	473,91	$ 1.475.954,78	473,91	$ 1.475.954,78
3872	2,02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INC MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$2.367,00	$ 3.075,44	$ 10.456.496,00	-	$ -	-	$ -
3180	2,021	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT, A=0,15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B, AGUA, INC, SUM Y APLIC. CON EQUIPO, INC MICROESF.)	ML	500,00	$6.520,00	$ 8.471,44	$ 4.235.720,00	-	$ -	-	$ -
3178	2,022	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	M2	600,00	$37.459,00	$ 48.670,48	$ 29.202.288,00	-	$ -	-	$ -
4244	2,023	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	34,00	$200.044,00	$ 259.917,17	$ 8.837.184,00	-	$ -	-	$ -
4245	2,024	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INC. MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	34,00	$288.806,00	$ 375.245,64	$ 12.758.352,00	-	$ -	-	$ -
4246	2,025	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	34,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 7.022.956,00	-	$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
5225	2,026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$4.038,00	$ 5.246,57	$ 5.246.570,00	-	$ -	-	$ -
5226	2,027	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$5.455,00	$ 7.087,68	$ 7.087.680,00	-	$ -	-	$ -
5227	2,028	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	600,00	$24.667,00	$ 32.049,83	$ 19.229.898,00	-	$ -	-	$ -
4569	2,029	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	7.000,00	$10.112,00	$ 13.138,52	$ 91.969.640,00	-	$ -	-	$ -
4240	2,03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 70.231.318,00	-	$ -	-	$ -
4246	2,031	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	68,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 14.045.911,00	-	$ -	-	$ -
4247	2,032	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	1,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 172.131,00	-	$ -	-	$ -
8617	2,033	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	306,00	$179.000,00	$ 232.574,70	$ 71.167.858,00	468,32	$ 108.920.104,49	1.136,54	$ 264.331.170,52
4034	2,034	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	2.550,00	$29.125,00	$ 37.842,11	$ 96.497.381,00	1.141,66	$ 43.202.634,08	2.780,76	$ 105.229.636,59
3800	2,035	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	11.400,00	$1.605,00	$ 2.085,38	$ 23.773.332,00	881,59	$ 1.838.439,73	2.520,69	$ 5.256.596,09
7900	2,036	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	7.980,00	$89.333,00	$ 90.084,37	$ 718.873.273,00	881,59	$ 79.417.029,33	2.520,69	$ 227.074.320,19
4262	2,037	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	9.120,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 61.570.579,00	200,08	$ 1.350.797,65	694,30	$ 4.687.355,95
4848	2,038	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	1.700,00	$9.318,00	$ 12.106,88	$ 20.581.696,00	-	$ -	-	$ -
7883	2,039	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	40,00	$250.490,00	$ 325.461,68	$ 13.018.466,00	-	$ -	-	$ -
7512	2,04	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1,70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	40,00	$558.003,00	$ 725.013,30	$ 29.000.532,00	-	$ -	2,00	$ 1.450.026,60
4578	2,041	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$112.143,00	$ 145.707,40	$ 72.853.700,00	-	$ -	6,00	$ 874.244,40
3879	2,042	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCL. SUMIN. INST.)	UN	40,00	$1.063.572,00	$ 1.381.899,10	$ 55.275.964,00	-	$ -	5,00	$ 6.909.495,50
3011	2,043	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	1.700,00	$5.521,00	$ 7.173,44	$ 12.194.848,00	- 1,52	$ (10.903,63)	596,66	$ 4.280.104,71
6218	2,044	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.000,00	$68.053,00	$ 88.421,26	$ 88.421.260,00	-	$ -	-	$ -
4558	2,045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	20,00	$6.980.739,00	$ 9.044.088,18	$ 180.881.764,00	-	$ -	-	$ -
7713	2,046	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	10.000,00	$7.401,00	$ 9.616,12	$ 96.161.200,00	-	$ -	-	$ -
4579	2,047	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$198.856,00	$ 258.373,60	$ 129.186.800,00	-	$ -	4,00	$ 1.033.494,40
7432	2,048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$574.835,00	$ 746.883,12	$ 74.688.312,00	-	$ -	-	$ -
7435	2,049	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$1.493.142,00	$ 1.940.039,40	$ 194.003.940,00	-	$ -	-	$ -
5220	2,05	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744, SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	100,00	$12.446,00	$ 16.171,09	$ 1.617.109,00	-	$ -	-	$ -
8566	2,051	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744, SUMINISTRO Y APLICACIÓN (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2	1.100,00	$105.843,00	$ 137.521,81	$ 151.273.991,00	-	$ -	-	$ -
5241	2,052	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	5.000,00	$15.143,00	$ 19.675,30	$ 98.376.500,00	-	$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
6564	2,053	BANDA SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	100,00	$637.895,00	$ 828.816,97	$ 82.881.697,00	-	$ -	-	$ -
3046	2,054	TUBERIA PVC U.M, EXT CORRIGADO/NT LISO U.M, NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	200,00	$242.177,00	$ 314.660,58	$ 62.932.116,00	-	$ -	-	$ -
7831	2,055	CONEXIÓN KIT SILLA YEE 400X200 PVC SUMINISTRO E INSTALCION	UN	100,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 37.851.467,00	-	$ -	-	$ -
6542	2,056	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	100,00	$68.040,00	$ 88.404,37	$ 8.840.437,00	-	$ -	-	$ -
	3	MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO FLEXIBLE									
3007	3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00	-	$ -	-	$ -
4515	3,002	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	22,95	$233.920,00	$ 303.932,26	$ 6.975.245,00	-	$ -	-	$ -
3710	3,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	30,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 202.535,00	-	$ -	-	$ -
3017	3,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00	-	$ -	-	$ -
4613	3,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00	-	$ -	-	$ -
3021	3,006	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE, INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100,00	$6.629,00	$ 8.613,06	$ 861.306,00	-	$ -	-	$ -
4487	3,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00	-	$ -	-	$ -
4150	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 198.553,00	-	$ -	-	$ -
8613	3,009	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	10,00	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 14.278.242,00	-	$ -	-	$ -
4712	3,010	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	3,00	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 5.579.497,00	-	$ -	-	$ -
3864	3,011	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 388.101,00	-	$ -	-	$ -
3867	3,012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 445.270,00	-	$ -	-	$ -
4758	3,013	SELLO DE FISURAS	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00	-	$ -	-	$ -
4598	3,014	SELLO DE GRIETAS	ML	200,00	$9.181,00	$ 11.928,87	$ 2.385.774,00	-	$ -	-	$ -
3723	3,015	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,48	$ 119.426,00	-	$ -	-	$ -
3724	3,016	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,48	$ 119.426,00	-	$ -	-	$ -
	4	MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO RIGIDO									
3007	4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00	-	$ -	-	$ -
3464	4,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	30,00	$39.688,00	$ 51.566,82	$ 1.546.999,00	-	$ -	-	$ -
3017	4,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00	-	$ -	-	$ -
4613	4,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00	-	$ -	-	$ -
3486	4,005	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue), No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	20,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 4.479.493,00	-	$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4487	4,006	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00	-	$ -	-	$ -
4744	4,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 224.575,00	-	$ -	-	$ -
3748	4,008	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	500,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 3.401.565,00	-	$ -	-	$ -
3708	4,009	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	200,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 2.189.060,00	-	$ -	-	$ -
5404	4,010	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	200,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 2.039.642,00	-	$ -	-	$ -
4959	4,011	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	2,00	$758.487,00	$ 985.476,17	$ 1.970.952,00	-	$ -	-	$ -
4758	4,012	SELLO DE FISURAS	ML	20,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 19.397.899,00	-	$ -	-	$ -
3837	4,013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00	-	$ -	-	$ -
3723	4,014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	200,00	$12.944,00	$ 16.816,14	$ 3.363.628,00	-	$ -	-	$ -
3724	4,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,48	$ 477.706,00	-	$ -	-	$ -
3434	4,016	TACHON EN CONCRETO L=0.40m H=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suministro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,48	$ 477.706,00	-	$ -	-	$ -
	5	[illegible]									
3012	5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	3.800,00	$7.379,00	$ 9.587,53	$ 36.432.614,00	-	$ -	-	$ -
3464	5,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.140,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 58.785.947,00	-	$ -	-	$ -
3017	5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.482,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 79.991.721,00	-	$ -	-	$ -
4757	5,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	444,60	$103.143,00	$ 134.013,70	$ 59.582.491,00	-	$ -	-	$ -
3425	5,005	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	3.800,00	$75.625,00	$ 98.259,56	$ 373.386.328,00	-	$ -	-	$ -
3394	5,006	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	171,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 165.882.040,00	-	$ -	-	$ -
3621	5,01	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	20,00	$895.086,00	$ 1.162.985,24	$ 23.259.705,00	-	$ -	-	$ -
5181	5,011	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	ML	1.520,00	$57.377,00	$ 74.549,94	$ 113.315.909,00	-	$ -	-	$ -
4054	5,012	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.520,00	$75.643,00	$ 98.282,95	$ 149.390.084,00	261,18	$ 25.669.540,88	581,18	$ 57.120.084,88
3210	5,013	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACION 2000 PSI)	ML	760,00	$63.543,00	$ 82.561,42	$ 62.746.679,00	-	$ -	-	$ -
9997	5,014	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	3.800,00	$2.960,00	$ 3.845,93	$ 14.614.534,00	-	$ -	-	$ -
4089	5,015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	1.700,00	$58.921,00	$ 76.556,06	$ 130.145.302,00	-	$ -	-	$ -
5952	5,016	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	500,00	$298.002,00	$ 387.194,00	$ 193.597.000,00	-	$ -	-	$ -
	6	[illegible]									
3009	6,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	475,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 24.494.145,00	17,94	$ 925.342,37	192,85	$ 9.944.625,25

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-5	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3017	6,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	617,50	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 33.329.884,00	23,32	$ 1.258.789,01	241,95	$ 13.059.456,95
4613	6,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 138.204,00	-	$ -	-	$ -
3050	6,004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	10,00	$33.628,00	$ 43.692,86	$ 436.929,00	-	$ -	-	$ -
5412	6,005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	190,00	$148.309,00	$ 192.697,88	$ 36.612.597,00	22,53	$ 4.340.583,03	110,50	$ 21.292.215,54
4792	6,006	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	475,00	$90.368,00	$ 117.415,14	$ 55.772.192,00	169,93	$ 19.952.908,28	656,50	$ 77.083.341,69
4837	6,007	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	60,00	$195.775,00	$ 254.370,48	$ 15.262.228,00	-	$ -	-	$ -
3024	6,008	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	60,00	$143.400,00	$ 186.319,62	$ 11.179.177,00	12,18	$ 2.269.372,97	38,68	$ 7.205.911,30
3878	6,009	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TAPA)	UN	76,00	$1.772.907,00	$ 2.303.538,07	$ 175.068.893,00	7,00	$ 16.124.766,49	7,00	$ 16.124.766,49
3471	6,01	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	121,60	$676.767,00	$ 879.323,36	$ 106.925.721,00	-	$ -	7,46	$ 6.559.752,27
3722	6,011	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0,15M, INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	76,00	$121.375,00	$ 157.702,54	$ 11.985.393,00	-	$ -	-	$ -
4265	6,012	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$125.354,00	$ 162.872,45	$ 1.628.725,00	-	$ -	-	$ -
3937	6,013	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$368.834,00	$ 479.226,02	$ 4.792.260,00	-	$ -	-	$ -
3041	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350,00	$29.100,00	$ 37.809,63	$ 13.233.371,00	-	$ -	-	$ -
3042	6,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.200,00	$49.946,00	$ 64.894,84	$ 77.873.808,00	-	$ -	211,13	$ 13.701.247,57
3043	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$69.231,00	$ 89.951,84	$ 35.980.736,00	82,44	$ 7.415.629,69	110,14	$ 9.907.295,66
3044	6,017	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$97.705,00	$ 126.948,11	$ 50.779.244,00	-	$ -	145,08	$ 18.417.631,80
3045	6,018	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	500,00	$136.670,00	$ 177.575,33	$ 88.787.665,00	39,15	$ 6.952.074,17	113,68	$ 20.186.763,51
3047	6,019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	49,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 19.734.202,00	-	$ -	-	$ -
4611	6,02	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 , 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.316,00	$ 231.685,98	$ 10.425.869,00	3,40	$ 787.732,33	3,40	$ 787.732,33
4612	6,021	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 , 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.928,00	$ 232.481,15	$ 10.461.652,00	-	$ -	-	$ -
4614	6,022	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 , 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$179.530,00	$ 233.263,33	$ 10.496.850,00	-	$ -	-	$ -
4615	6,023	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 , 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$230.292,00	$ 299.218,40	$ 13.464.828,00	-	$ -	-	$ -
4982	6,024	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	UN	45,00	$177.746,00	$ 230.945,38	$ 10.392.542,00	-	$ -	-	$ -
5015	6,025	CAJA DE INSPECCION 0.60X0.6M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M, INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CANUELA).	UN	45,00	$558.245,00	$ 725.327,73	$ 32.639.748,00	-	$ -	4,00	$ 2.901.310,92
7830	6,026	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	250,00	$214.063,00	$ 278.132,06	$ 69.533.015,00	-	$ -	-	$ -
7831	6,027	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	255,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 96.521.241,00	-	$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
8970	6.028	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	97,00	$283.252,00	$ 368.029,32	$ 35.688.844,00	-	$ -	-	$ -
3047	6.029	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M, NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	50,00	$309.966,00	$ 402.736,82	$ 20.136.941,00	-	$ -	-	$ -
	1	NO PREVISTO									
	NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0,21M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$225.987,00	$293.624,91	$ -	1.087,11	$ 319.201.695,04	2.379,51	$ 698.682.528,72
	NP-02	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	M3		$369.623,00	$480.251,16	$ -	294,87	$ 141.611.851,65	566,59	$ 272.105.696,84
	NP-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.22M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$238.867,00	$310.359,89	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0,25M acelerado 7 dias	M2		$264.493,00	$343.655,75	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-05	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$57.303,00	$74.453,79	$ -	410,56	$ 30.567.381,71	1.379,97	$ 102.743.698,77
	NP-06	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.18M acelerado 7 dias	M2		$201.230,00	$261.458,14	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-07	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$205.185,00	$266.596,87	$ -	-	$ -	20,00	$ 5.331.937,40
	NP-08	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN		$5.078.248,00	$6.598.167,63	$ -	-	$ -	10,00	$ 65.981.676,30
	NP-09	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.930.270,00	$2.507.998,81	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-10	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.203.970,00	$2.863.618,22	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-11	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$257.718,00	$334.853,00	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-12	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$573.534,00	$745.192,73	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-13	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$276.165,00	$358.821,18	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-14	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)	UN		$7.767.377,00	$10.092.152,94	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-15	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD EL 12"X4"=1 UN, UZ U.M PVC D=12"=1 UN, UZ U.M PVC D=4"=1 UN, UR U.M PVC D=12"=1 UN, UR U.M PVC D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$5.460.638,00	$7.095.006,95	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-16	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD 4"X4" PARA AC=1 UN, UG HD D=4"=3 UN, ADAPTADOR U.S. D=4"=1 UN, UR HD D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$1.302.235,00	$1.691.993,94	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-17	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN		$8.105.183,00	$10.531.064,27	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-18	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN		$464.663,00	$603.736,64	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-19	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO. TRAMOS MÁXIMOS DE 500M, INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN		$1.380.400,00	$1.793.553,72	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-20	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$197.855,00	$257.073,00	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-21	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.314.441,00	$3.007.153,19	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-22	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.284.691,00	$2.968.498,02	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-23	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$418.527,00	$543.792,13	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-24	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$530.942,00	$689.852,94	$ -	64,25	$ 44.323.051,40	151,91	$ 104.795.560,12
	NP-25	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$74.860,00	$97.265,60	$ -	127,94	$ 12.444.160,86	310,54	$ 30.204.859,42

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-26	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.210.133,00	$1.572.325,81	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-27	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$229.605,00	$298.325,78	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-28	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$215.325,00	$279.771,77	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-29	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.241.418,00	$1.612.974,41	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-30	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$196.182,00	$254.899,27	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-31	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.244.646,00	$1.617.168,55	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-32	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$75.683,00	$98.334,92	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-33	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$108.935,00	$141.539,25	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-34	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.562.482,00	$2.030.132,86	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-35	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$81.588,00	$106.007,29	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-36	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$123.986,00	$161.095,01	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$7.587.734,00	$9.858.742,79	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.244.588,00	$2.916.383,19	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-39	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.187.868,00	$1.543.396,89	$ -	-	$ -	-	$ -
	NP-40	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$729.696,00	$948.094,01	$ -	-	$ -	92,07	$ 87.291.015,50
	NP-41	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3.00 MM. EC = 14,200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN. INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$1.725.500,00	$2.241.942,15	$ -	-	$ -	-	$ -
		(A) VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUIDO A.I.U.) (A)					**$ 9.497.978.346,00**		**$ 1.024.592.160,00**		**$ 2.648.087.304,00**
(B) VALOR FIJO 1		**COSTOS TOTALES PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U (B)**	**UN**	**1,00**			**$ 499.083.537,00**	**9,49%**	**$ 47.387.757,00**	24,54%	**$ 75.087.237**
(C) VALOR FIJO 2		**COSTOS TOTALES ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA) (C)**	**UN**	**1,00**			**$ 241.107.411,00**		**$ -**	1,00	**$ 241.107.411**
(D) VALOR FIJO 3		**OBRAS COMPLEMENTATIOS Y/O AJUSTES**	**UN**	**1,00**			**$ 552.949.979,00**			-	
		VALOR TOTAL PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCION [(A) + (B) + (C) + (D)] =					**$ 10.791.127.273,00**		**$ 1.071.979.917,00**		**$ 2.964.281.952,00**
						VALOR A PAGAR			**$ 1.071.979.917,00**		**$ 2.964.281.952,00**

DANIEL EDUARDO PABON JAIMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

GERMAN RAMIREZ BARBOSA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA



CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000763 CL 19 S ENTRE KR 10BIS ESTE HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	1	RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 1.287.864,00		$ -	-	$ -
3010	1,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	307,00	$35.050,00	$ 45.540,47	$ 13.980.924,00		$ -	-	$ -
3710	1,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	720,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 4.860.835,00		$ -	-	$ -
3017	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	748,80	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 40.416.869,00		$ -	-	$ -
4613	1,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	187,20	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 12.935.889,00		$ -	-	$ -
4015	1,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.218,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 19.500.143,00		$ -	-	$ -
4157	1,007	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$170.358,00	$ 221.346,15	$ 47.810.768,00		$ -	-	$ -
4743	1,008	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$164.610,00	$ 213.877,77	$ 30.798.399,00		$ -	-	$ -
4160	1,009	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 42.887.346,00		$ -	-	$ -
4747	1,010	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 28.591.564,00		$ -	-	$ -
4200	1,011	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	$1.002.096,00	$ 1.302.023,33	$ 1.302.023,00		$ -	-	$ -
4712	1,012	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	32,40	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 60.258.567,00		$ -	-	$ -
3864	1,013	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1.200,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 4.657.212,00		$ -	-	$ -
3867	1,014	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	3.116,95	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 13.878.843,00		$ -	-	$ -
4240	1,015	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	800,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 16.525.016,00		$ -	-	$ -
4246	1,016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	8,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 1.652.460,00		$ -	-	$ -
4248	1,017	DEMARCACIÓN PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	40,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 6.885.250,00		$ -	-	$ -
6313	1,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	75,60	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 107.943.506,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000763 CL 19 S ENTRE KR 10BIS ESTE HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.886.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3007	2,001	REPLANTEO GENERAL	M2	10.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 10.946.844,00	330,88	$ 355.107,10	330,88	$ 355.107,10
3486	2,002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1.020,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 228.454.123,00	41,14	$ 9.214.068,77	41,14	$ 9.214.068,77
3710	2,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5.100,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 34.430.916,00	26,47	$ 178.731,29	26,47	$ 178.731,29
3017	2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5.967,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 322.071.926,00	88,19	$ 4.760.211,52	88,19	$ 4.760.211,52
4613	2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 26 KM)	M3	663,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 45.814.806,00		$ -	-	$ -
4015	2,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.100,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 81.650.847,00		$ -	-	$ -
4181	2,007	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$146.967,00	$ 190.954,22	$ 175.295.974,00		$ -	-	$ -
4746	2,008	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 121.514.148,00		$ -	-	$ -
4158	2,009	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$161.586,00	$ 209.948,69	$ 192.732.897,00		$ -	-	$ -
4744	2,01	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 137.439.845,00		$ -	-	$ -
3708	2,011	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	5.000,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 34.015.650,00		$ -	-	$ -
5404	2,012	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2.000,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 21.890.600,00		$ -	-	$ -
4959	2,013	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	20.000,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 203.964.200,00		$ -	-	$ -
4238	2,014	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	137,95	$6.866,00	$ 8.920,99	$ 1.230.651,00		$ -	-	$ -
3808	2,015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	5.100,00	$2.404,00	$ 3.123,52	$ 15.929.952,00		$ -	-	$ -
3204	2,016	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	1.620,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.596.471.395,00		$ -	-	$ -
3394	2,017	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	408,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 395.717.148,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000763 CL 19 S ENTRE KR 10BIS ESTE HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3837	2,018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	6.900,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 116.045.166,00		$ -	-	$ -
3811	2,019	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM. AGUA Y MANO DE OBRA	ML	5.200,00	$2.397,00	$ 3.114,42	$ 16.194.984,00		$ -	-	$ -
3872	2,02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0,12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$2.367,00	$ 3.075,44	$ 10.456.496,00		$ -	-	$ -
3180	2,021	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0,15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	ML	500,00	$6.520,00	$ 8.471,44	$ 4.235.720,00		$ -	-	$ -
3178	2,022	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	M2	600,00	$37.459,00	$ 48.670,48	$ 29.202.288,00		$ -	-	$ -
4244	2,023	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	34,00	$200.044,00	$ 259.917,17	$ 8.837.184,00		$ -	-	$ -
4245	2,024	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INC. MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	34,00	$288.806,00	$ 375.245,64	$ 12.758.352,00		$ -	-	$ -
4246	2,025	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	34,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 7.022.956,00		$ -	-	$ -
5225	2,026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$4.038,00	$ 5.246,57	$ 5.246.570,00		$ -	-	$ -
5226	2,027	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$5.455,00	$ 7.087,68	$ 7.087.680,00		$ -	-	$ -
5227	2,028	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	600,00	$24.667,00	$ 32.049,83	$ 19.229.898,00		$ -	-	$ -
4569	2,029	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	7.000,00	$10.112,00	$ 13.138,52	$ 91.969.640,00		$ -	-	$ -
4240	2,03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0,12M (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 70.231.318,00		$ -	-	$ -
4246	2,031	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	68,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 14.045.911,00		$ -	-	$ -
4247	2,032	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2,3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	1,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 172.131,00		$ -	-	$ -
8617	2,033	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	306,00	$179.000,00	$ 232.574,70	$ 71.167.858,00	33,09	$ 7.696.524,77	33,09	$ 7.696.524,77
4034	2,034	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	2.550,00	$29.125,00	$ 37.842,11	$ 96.497.381,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000763 CL 19 S ENTRE KR 10BIS ESTE HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3800	2,035	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	11.400,00	$1.605,00	$ 2.085,38	$ 23.773.332,00		$ -	-	$ -
7900	2,036	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	7.980,00	$69.333,00	$ 90.064,37	$ 718.873.273,00		$ -	-	$ -
4262	2,037	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	9.120,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 61.570.579,00		$ -	-	$ -
4848	2,038	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	1.700,00	$9.318,00	$ 12.106,88	$ 20.581.696,00		$ -	-	$ -
7893	2,039	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	40,00	$250.490,00	$ 325.461,66	$ 13.018.466,00		$ -	-	$ -
7512	2,04	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1,50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	40,00	$558.003,00	$ 725.013,30	$ 29.000.532,00		$ -	-	$ -
4878	2,041	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$112.143,00	$ 145.707,40	$ 72.853.700,00		$ -	-	$ -
3879	2,042	PLACA FONDO D=1,70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCL. SUMIN, INST.)	UN	40,00	$1.063.572,00	$ 1.381.899,10	$ 55.275.964,00		$ -	-	$ -
3011	2,043	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	1.700,00	$5.521,00	$ 7.173,44	$ 12.194.848,00		$ -	-	$ -
6216	2,044	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.000,00	$68.053,00	$ 88.421,26	$ 88.421.260,00		$ -	-	$ -
4558	2,045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	20,00	$6.960.739,00	$ 9.044.088,18	$ 180.881.764,00		$ -	-	$ -
7713	2,046	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	10.000,00	$7.401,00	$ 9.616,12	$ 96.161.200,00		$ -	-	$ -
4879	2,047	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$198.856,00	$ 258.373,60	$ 129.186.800,00		$ -	-	$ -
7432	2,048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$574.835,00	$ 746.883,12	$ 74.688.312,00		$ -	-	$ -
7435	2,049	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$1.493.142,00	$ 1.940.039,40	$ 194.003.940,00		$ -	-	$ -
5220	2,05	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACION CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	100,00	$12.446,00	$ 16.171,09	$ 1.617.109,00		$ -	-	$ -
8566	2,051	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2	1.100,00	$105.843,00	$ 137.521,81	$ 151.273.991,00		$ -	-	$ -
5241	2,052	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	5.000,00	$15.143,00	$ 19.675,30	$ 98.376.500,00		$ -	-	$ -
8564	2,053	BANDA SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	100,00	$637.895,00	$ 828.816,97	$ 82.881.697,00		$ -	-	$ -
3046	2,054	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRIGADO/INT LISO U.M. NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	200,00	$242.177,00	$ 314.660,58	$ 62.932.116,00		$ -	-	$ -
7831	2,055	CONEXIÓN KIT SILLA YEE 400X200 PVC SUMINISTRO E INSTALCION	UN	100,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 37.851.467,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000763 CL 19 S ENTRE KR 10BIS ESTE HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)	12 MESES
NIT:	901.896.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO	FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICIÓN 1	$0,00	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$ -
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$ -
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL	12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
6542	2,056	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	100,00	$68.040,00	$ 88.404,37	$ 8.840.437,00		$ -	-	$ -
3007	3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
4515	3,002	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0,14M, (INCLUYE DEMOLICION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0,14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	22,95	$233.920,00	$ 303.932,26	$ 6.975.245,00		$ -	-	$ -
3710	3,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	30,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 202.535,00		$ -	-	$ -
3017	3,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -
4613	3,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3021	3,006	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100,00	$6.629,00	$ 8.613,06	$ 861.306,00		$ -	-	$ -
4487	3,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4180	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 198.553,00		$ -	-	$ -
8613	3,009	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	10,00	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 14.278.242,00		$ -	-	$ -
4712	3,010	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	3,00	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 5.579.497,00		$ -	-	$ -
3864	3,011	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 388.101,00		$ -	-	$ -
3867	3,012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 445.270,00		$ -	-	$ -
4758	3,013	SELLO DE FISURAS	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
4588	3,014	SELLO DE GRIETAS	ML	200,00	$9.181,00	$ 11.928,87	$ 2.385.774,00		$ -	-	$ -
3723	3,015	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3724	3,016	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3007	4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
3464	4,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	30,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 1.546.998,00		$ -	-	$ -
3017	4,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000763 CL 19 S ENTRE KR 10BIS ESTE HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4613	4.004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3486	4.005	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	20,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 4.479.493,00		$ -	-	$ -
4487	4.006	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4744	4.007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 224.575,00		$ -	-	$ -
3748	4.008	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	500,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 3.401.565,00		$ -	-	$ -
3708	4.009	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	200,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 2.189.060,00		$ -	-	$ -
5404	4.010	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	200,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 2.039.642,00		$ -	-	$ -
4859	4.011	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	2,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.970.952,00		$ -	-	$ -
4758	4.012	SELLO DE FISURAS	ML	20,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 19.397.899,00		$ -	-	$ -
3837	4.013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
3723	4.014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	200,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 3.363.628,00		$ -	-	$ -
3724	4.015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3434	4.016	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
	5	PREDADO DE PAVIMENTO									
3012	5.001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M, INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	3.800,00	$7.379,00	$ 9.587,53	$ 36.432.614,00		$ -	-	$ -
3464	5.002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.140,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 58.785.947,00		$ -	-	$ -
3017	5.003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.482,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 79.991.721,00		$ -	-	$ -
4757	5.004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	444,60	$103.143,00	$ 134.013,70	$ 59.582.491,00		$ -	-	$ -
3425	5.005	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	3.800,00	$75.625,00	$ 98.259,56	$ 373.386.328,00		$ -	-	$ -
3394	5.006	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO. CURADO, JUNTAS)	M3	171,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 165.852.040,00		$ -	-	$ -
3621	5.01	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	20,00	$895.086,00	$ 1.162.985,24	$ 23.259.705,00		$ -	-	$ -
5181	5.011	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	ML	1.520,00	$57.377,00	$ 74.549,94	$ 113.315.909,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000763 CL 19 S ENTRE KR 10BIS ESTE HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4054	5,012	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.520,00	$75.643,00	$ 98.282,95	$ 149.390.084,00		$ -	-	$ -
3210	5,013	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	760,00	$63.543,00	$ 82.561,42	$ 62.746.679,00		$ -	-	$ -
9997	5,014	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	3.800,00	$2.960,00	$ 3.845,93	$ 14.614.534,00		$ -	-	$ -
4089	5,015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	1.700,00	$58.921,00	$ 76.556,06	$ 130.145.302,00		$ -	-	$ -
5952	5,016	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	500,00	$298.002,00	$ 387.194,00	$ 193.597.000,00		$ -	-	$ -
3009	6,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	475,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 24.494.145,00		$ -	-	$ -
3017	6,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	617,50	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 33.329.884,00		$ -	-	$ -
4613	6,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 138.204,00		$ -	-	$ -
3050	6,004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	10,00	$33.628,00	$ 43.692,86	$ 436.929,00		$ -	-	$ -
5412	6,005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	190,00	$148.309,00	$ 192.697,88	$ 36.612.597,00		$ -	-	$ -
4792	6,006	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	475,00	$90.368,00	$ 117.415,14	$ 55.772.192,00		$ -	-	$ -
4837	6,007	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	60,00	$195.775,00	$ 254.370,46	$ 15.262.228,00		$ -	-	$ -
3024	6,008	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	60,00	$143.400,00	$ 186.319,62	$ 11.179.177,00		$ -	-	$ -
3878	6,009	PLACA CUBIERTA D=1,70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	76,00	$1.772.907,00	$ 2.303.538,07	$ 175.068.893,00		$ -	-	$ -
3471	6,01	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	121,60	$676.767,00	$ 879.323,36	$ 106.925.721,00		$ -	-	$ -
3722	6,011	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	76,00	$121.375,00	$ 157.702,54	$ 11.985.393,00		$ -	-	$ -
4265	6,012	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$125.354,00	$ 162.872,45	$ 1.628.725,00		$ -	-	$ -
3937	6,013	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$368.834,00	$ 479.226,02	$ 4.792.260,00		$ -	-	$ -
3041	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350,00	$29.100,00	$ 37.809,63	$ 13.233.371,00		$ -	-	$ -
3042	6,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.200,00	$49.946,00	$ 64.894,84	$ 77.873.808,00		$ -	-	$ -
3043	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$69.231,00	$ 89.951,84	$ 35.980.736,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000763 CL 19 S ENTRE KR 10BIS ESTE HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3044	6,017	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$97.705,00	$ 126.948,11	$ 50.779.244,00		$ -	-	$ -
3045	6,018	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	500,00	$136.670,00	$ 177.575,33	$ 88.787.665,00		$ -	-	$ -
3047	6,019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	49,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 19.734.202,00		$ -	-	$ -
4611	6,02	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.316,00	$ 231.685,98	$ 10.425.869,00		$ -	-	$ -
4612	6,021	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.928,00	$ 232.481,15	$ 10.461.652,00		$ -	-	$ -
4614	6,022	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$179.530,00	$ 233.263,33	$ 10.496.850,00		$ -	-	$ -
4615	6,023	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$230.292,00	$ 299.218,40	$ 13.464.828,00		$ -	-	$ -
4982	6,024	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6,50M).	UN	45,00	$177.746,00	$ 230.945,38	$ 10.392.542,00		$ -	-	$ -
5015	6,025	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	45,00	$558.245,00	$ 725.327,73	$ 32.639.748,00		$ -	-	$ -
7830	6,026	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	250,00	$214.063,00	$ 278.132,06	$ 69.533.015,00		$ -	-	$ -
7831	6,027	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	255,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 96.521.241,00		$ -	-	$ -
8970	6,028	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	97,00	$283.252,00	$ 368.029,32	$ 35.698.844,00		$ -	-	$ -
3047	6,029	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	50,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 20.136.941,00		$ -	-	$ -
	NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.21M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$225.987,00	$293.624,91	$ -		$ -	-	$ -
	NP-02	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	M3		$369.623,00	$480.251,16	$ -	33,09	$ 15.892.807,56	33,09	$ 15.892.807,56
	NP-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.22M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$238.867,00	$310.359,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.25M acelerado 7 dias	M2		$264.493,00	$343.655,75	$ -		$ -	-	$ -
	NP-05	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$57.303,00	$74.453,79	$ -		$ -	-	$ -
	NP-06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.18M acelerado 7 dias	M2		$201.230,00	$261.458,14	$ -		$ -	-	$ -
	NP-07	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$205.185,00	$266.596,87	$ -		$ -	-	$ -
	NP-08	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN		$5.078.248,00	$6.598.167,63	$ -		$ -	-	$ -
	NP-09	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.930.270,00	$2.507.999,81	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000763 CL 19 S ENTRE KR 10BIS ESTE HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-10	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.203.970,00	$2.863.618,22	$ -		$ -	-	$ -
	NP-11	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$257.718,00	$334.853,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-12	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$573.534,00	$745.192,73	$ -		$ -	-	$ -
	NP-13	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$276.165,00	$358.821,18	$ -		$ -	-	$ -
	NP-14	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)	UN		$7.767.377,00	$10.092.152,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-15	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD EL 12"X4"=1 UN, UZ U.M PVC D=12"=1 UN, UZ U.M PVC D=4"=1 UN, UR U.M PVC D=12"=1 UN, UR U.M PVC D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$5.460.638,00	$7.095.006,95	$ -		$ -	-	$ -
	NP-16	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD 4"X4" PARA AC=1 UN, UG HD D=4"=3 UN, ADAPTADOR U.S. D=4"=1 UN, UR HD D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$1.302.235,00	$1.691.993,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-17	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN		$8.105.183,00	$10.531.064,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-18	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M. INCLUYE CAJILLA EN	UN		$464.663,00	$603.736,64	$ -		$ -	-	$ -
	NP-19	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN		$1.380.400,00	$1.793.553,72	$ -		$ -	-	$ -
	NP-20	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$197.855,00	$257.073,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-21	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.314.441,00	$3.007.153,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-22	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.284.691,00	$2.968.499,02	$ -		$ -	-	$ -
	NP-23	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$418.527,00	$543.792,13	$ -		$ -	-	$ -
	NP-24	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$530.942,00	$689.852,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-25	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$74.880,00	$97.265,60	$ -		$ -	-	$ -
	NP-26	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.210.133,00	$1.572.325,81	$ -		$ -	-	$ -
	NP-27	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$229.605,00	$298.325,78	$ -		$ -	-	$ -
	NP-28	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$215.325,00	$279.771,77	$ -		$ -	-	$ -
	NP-29	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.241.418,00	$1.612.974,41	$ -		$ -	-	$ -
	NP-30	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$196.182,00	$254.899,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-31	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.244.646,00	$1.617.168,55	$ -		$ -	-	$ -
	NP-32	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$75.683,00	$98.334,92	$ -		$ -	-	$ -
	NP-33	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$108.935,00	$141.539,25	$ -		$ -	-	$ -
	NP-34	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.562.482,00	$2.030.132,86	$ -		$ -	-	$ -
	NP-35	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$81.588,00	$106.007,29	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000763 CL 19 S ENTRE KR 10BIS ESTE HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)	12 MESES
NIT:	901.896.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO	FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICION 1	$0,00	FECHA DE TERMINACION INICIAL	FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$ -
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$ -
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL	12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-36	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$123.986,00	$161.095,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$7.587.734,00	$9.858.742,79	$ -		$ -	-	$ -
	NP-38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.244.588,00	$2.916.393,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-39	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.187.868,00	$1.543.396,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-40	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$729.696,00	$948.094,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-41	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$1.725.500,00	$2.241.942,15	$ -		$ -	-	$ -
		(A) VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUIDO A.I.U.) (A)					$ 9.497.876.346,00		$ 38.097.451,00		$ 38.097.451,00
(B) VALOR FIJO 1		COSTOS TOTALES PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U (B)	UN	1,00			$ 498.093.537,00	0,35%	$ 1.762.021	0,35%	$ 1.762.021
(C) VALOR FIJO 2		COSTOS TOTALES ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA) (C)	UN	1,00			$ 241.167.411,00		$ -	-	$ -
(D) VALOR FIJO 3		OBRAS COMPLEMENTATIOS Y/O AJUSTES	UN	1,00			$ 552.949.979,00			-	$ -
		VALOR TOTAL PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCION [(A) + (B) + (C) + (D)] =					$ 10.791.127.273,00		$ 39.859.472,00		$ 39.859.472,00
						VALOR A PAGAR			$ 39.859.472,00		$ 39.859.472,00

DANIEL EDUARDO PABÓN JAIMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

GERMAN RAMIREZ BARBOSA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

4000763

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4000763
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 19 S ENTRE KR 10BIS E HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	2,001	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	REPLANTEO GENERAL	**UNIDAD**	M2

ESQUEMA

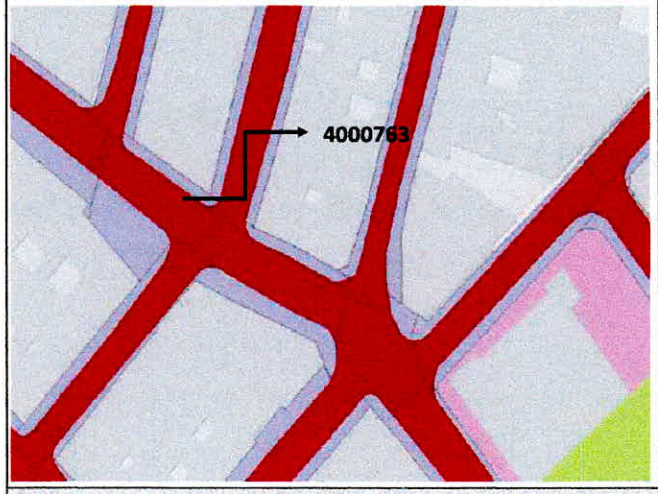

NOTA:

DESCRIPCIÓN	**DIMENSION**						**ABSCISAS**	**CANTIDAD TOTAL**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	**VOLUMEN**	**CANTIDAD**		
REPLANTEO GENERAL	23,47	14,10		330,88			K0+074,31 - K0+097,78	330,88

DESCUENTOS	**DIMENSION**						**ABSCISAS**	**CANTIDAD TOTAL**
	RADIO	**ANCHO**	**AREA**	**PESO KG/M2**	**PESO TOTAL**	**CANTIDAD**		

TOTAL ÍTEM	330,88

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


BOGOTÁ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000763
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 18 S ENTRE KR 10BIS E HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	2,002	DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	UNIDAD	M3

ESQUEMA

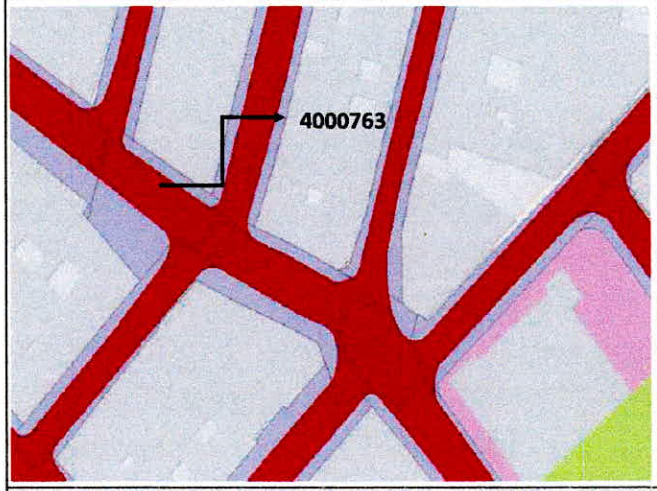

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
DEMOLICION LOSA DE CONCRETO	23,47	7,05	0,25	165,46	41,37		K0+074,31 - K0+097,78	41,37

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
DESCUENTO POZOS	0,85	0,85	0,20	1,13	0,23	1,00		0,23

TOTAL ÍTEM	41,14

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

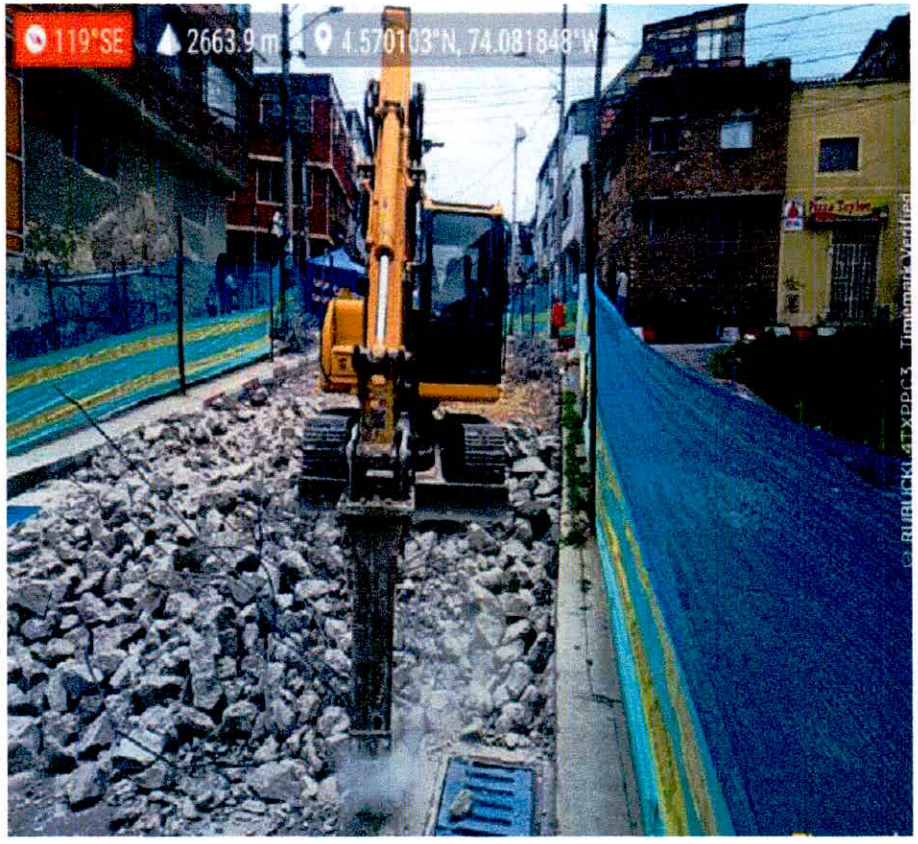



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4000763
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 19 S ENTRE KR 10BIS E HASTA KR 18A E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	2,003	DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD	M3

ESQUEMA

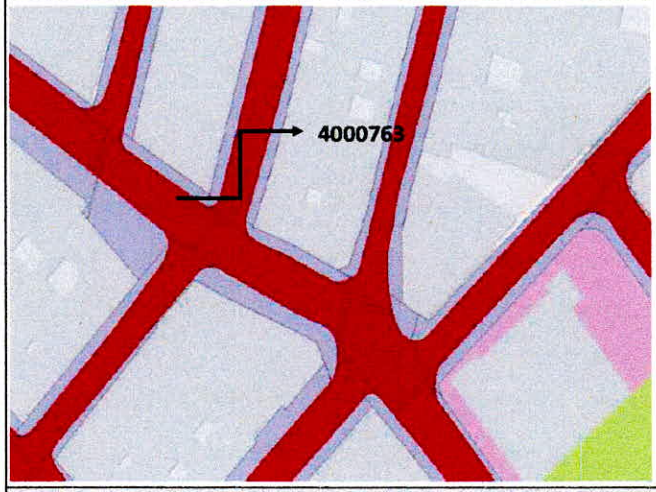

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
EXCAVACION MECANICA VIA	23,47	7,05	0,16	165,46	26,47		K0+074,31 - K0+097,78	26,47


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD		

TOTAL ÍTEM	26,47

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

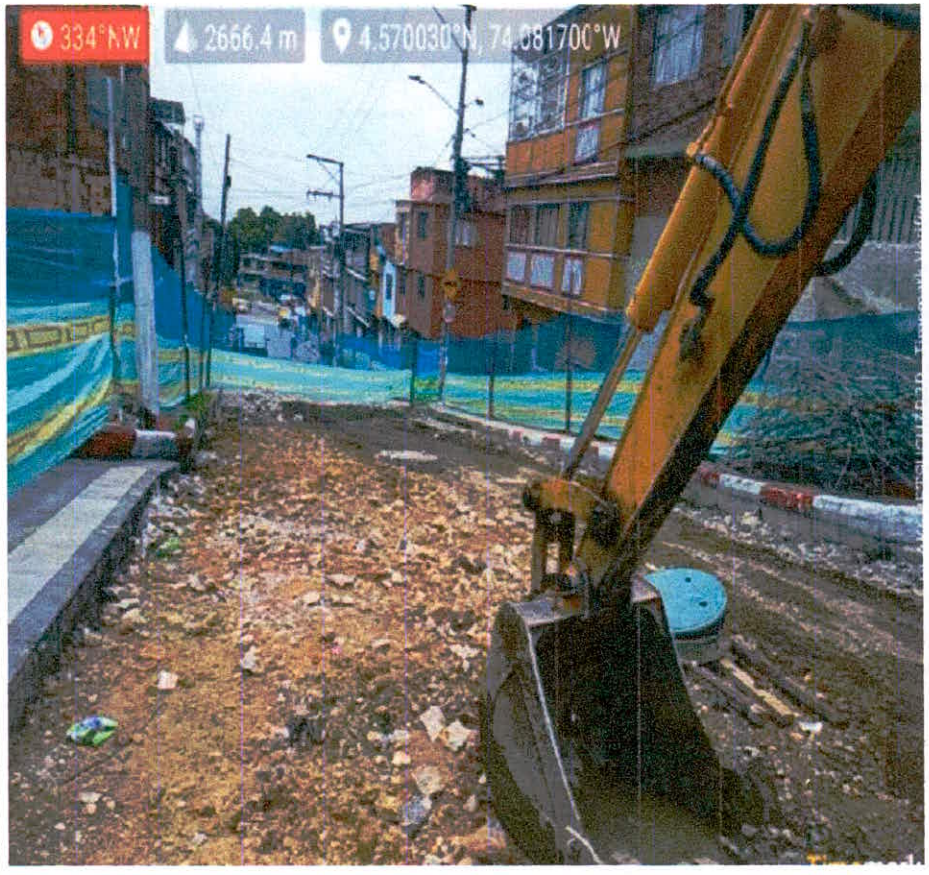
334°NW
2666.4 m
4.570030°N, 74.081700°W


333°NW
2667.9 m
4.569871°N, 74.081393°W

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000763
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 19 S ENTRE KR 19BIS E HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	2,004	DESCRIPCIÓN ÍTEM	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (98 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	UNIDAD	M3

ESQUEMA

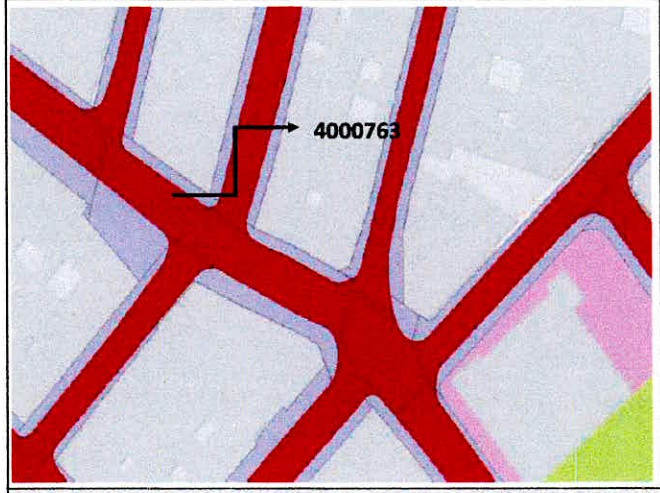

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSION	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
DEMOLICION LOSA DE CONCRETO	23,47	7,05	0,25	165,46	41,37	1,30	K0+074,31 - K0+097,78	53,78
EXCAVACION MECANICA VIA	23,47	7,05	0,15	165,46	26,47	1,30	K0+074,31 - K0+097,78	34,42


DESCUENTOS	DIMENSION RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL

TOTAL ÍTEM	88,19

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

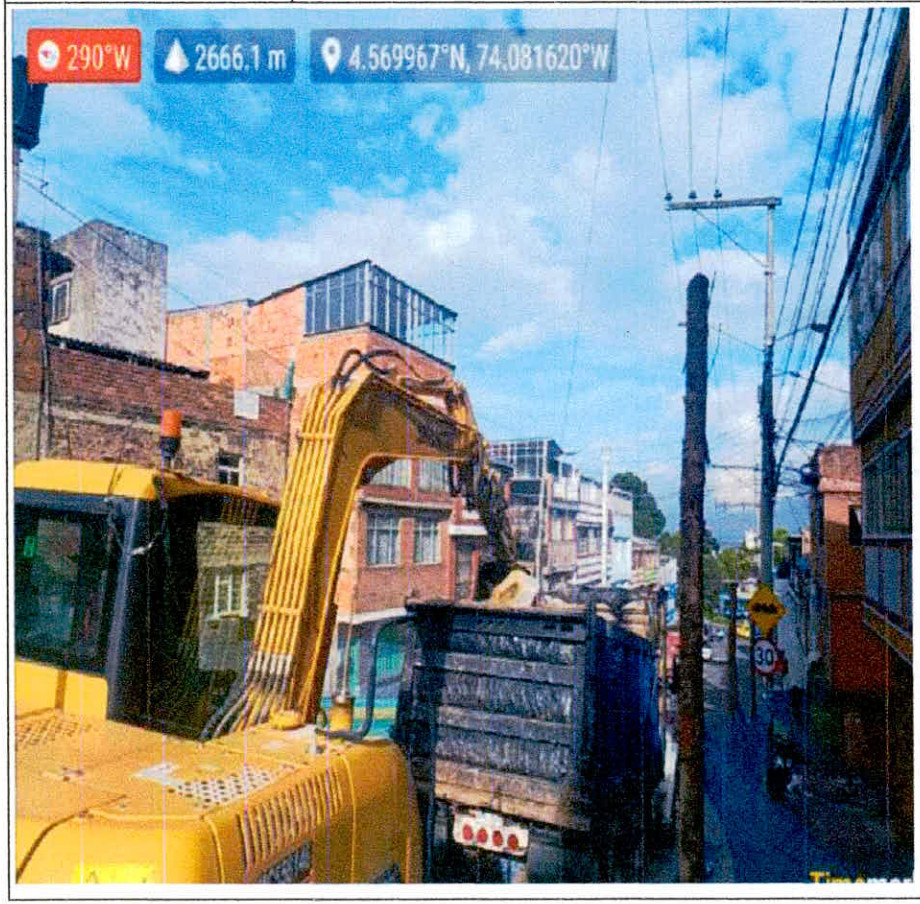
290°W
2666.1 m
4.569967°N, 74.081620°W



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000763
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 19 S ENTRE KR 10BIS E HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	2,033	DESCRIPCIÓN ÍTEM	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	UNIDAD	M3

ESQUEMA

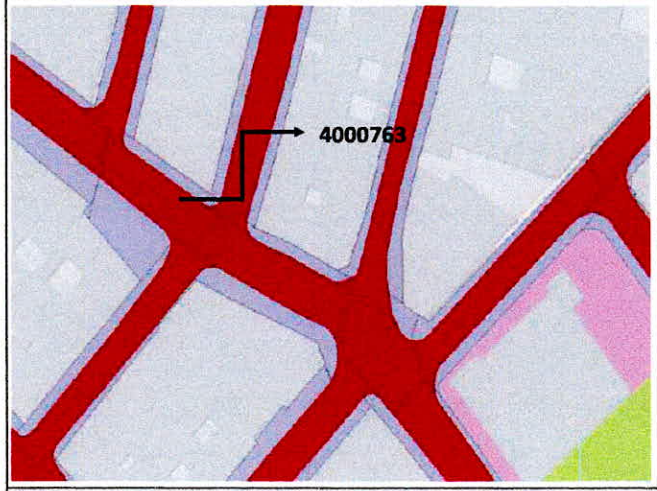

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSION	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
SUB BASE ESTABILIZADA VIA	23,47	7,05	0,20	165,46	33,09		K0+074,31 - K0+097,78	33,09

DESCUENTOS	DIMENSIÓN RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL

TOTAL ÍTEM	33,09

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1138 DE 2024	CIV	4000763
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 19 S ENTRE KR 19BIS E HASTA KR 10A E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	NP-02	DESCRIPCIÓN ITEM	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4% .	UNIDAD	M3

ESQUEMA

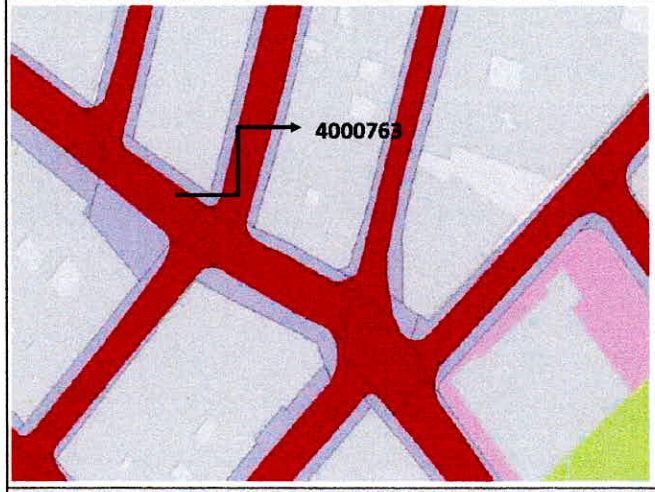

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSION	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
SUB BASE ESTABILIZADA VIA	23,47	7,05	0,20	165,46	33,09		K0+074,31 - K0+097,78	33,09

DESCUENTOS	DIMENSION RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL

TOTAL ÍTEM	33,09

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000774 CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	1	RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 1.287.864,00		$ -	-	$ -
3010	1,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	307,00	$35.050,00	$ 45.540,47	$ 13.980.924,00		$ -	-	$ -
3710	1,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	720,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 4.860.835,00		$ -	-	$ -
3017	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	748,80	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 40.416.869,00		$ -	-	$ -
4613	1,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	187,20	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 12.936.889,00		$ -	-	$ -
4015	1,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.218,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 19.500.143,00		$ -	-	$ -
4157	1,007	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$170.358,00	$ 221.346,15	$ 47.810.768,00		$ -	-	$ -
4743	1,008	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$164.610,00	$ 213.877,77	$ 30.798.399,00		$ -	-	$ -
4160	1,009	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 42.887.346,00		$ -	-	$ -
4747	1,010	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 28.591.564,00		$ -	-	$ -
4200	1,011	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	$1.002.096,00	$ 1.302.023,33	$ 1.302.023,00		$ -	-	$ -
4712	1,012	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	32,40	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 60.258.567,00		$ -	-	$ -
3864	1,013	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1.200,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 4.657.212,00		$ -	-	$ -
3867	1,014	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	3.116,95	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 13.878.843,00		$ -	-	$ -
4240	1,015	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	800,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 16.525.016,00		$ -	-	$ -
4246	1,016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	8,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 1.652.460,00		$ -	-	$ -
4248	1,017	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	40,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 6.885.250,00		$ -	-	$ -
6313	1,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	75,60	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 107.943.506,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000774 CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3007	2,001	REPLANTEO GENERAL	M2	10.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 10.946.844,00	369,83	$ 396.907,49	369,83	$ 396.907,49
3486	2,002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1.020,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 228.454.123,00	49,51	$ 11.089.661,44	49,51	$ 11.089.661,44
3710	2,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5.100,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 34.430.916,00	31,87	$ 215.158,93	31,87	$ 215.158,93
3017	2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5.967,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 322.071.928,00	106,17	$ 5.730.401,27	106,17	$ 5.730.401,27
4613	2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	663,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 45.814.606,00		$ -	-	$ -
4015	2,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.100,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 81.650.847,00		$ -	-	$ -
4161	2,007	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$146.967,00	$ 190.954,22	$ 175.295.974,00		$ -	-	$ -
4746	2,008	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 121.514.148,00		$ -	-	$ -
4158	2,009	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$161.586,00	$ 209.948,69	$ 192.732.897,00		$ -	-	$ -
4744	2,01	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 137.438.845,00		$ -	-	$ -
3708	2,011	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	5.000,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 34.015.650,00		$ -	-	$ -
5404	2,012	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2.000,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 21.890.600,00		$ -	-	$ -
4959	2,013	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	20.000,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 203.964.200,00		$ -	-	$ -
4238	2,014	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	137,95	$6.866,00	$ 8.920,99	$ 1.230.651,00		$ -	-	$ -
3806	2,015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	5.100,00	$2.404,00	$ 3.123,52	$ 15.929.952,00		$ -	-	$ -
3204	2,016	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	1.620,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.596.471.395,00		$ -	-	$ -
3394	2,017	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	408,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 395.717.148,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000774 CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3837	2,018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	6.900,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 116.045.166,00		$ -	-	$ -
3811	2,019	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	5.200,00	$2.397,00	$ 3.114,42	$ 16.194.984,00		$ -	-	$ -
3872	2,02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$2.367,00	$ 3.075,44	$ 10.456.496,00		$ -	-	$ -
3180	2,021	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	ML	500,00	$6.520,00	$ 8.471,44	$ 4.235.720,00		$ -	-	$ -
3178	2,022	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	M2	600,00	$37.459,00	$ 48.670,48	$ 29.202.288,00		$ -	-	$ -
4244	2,023	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	34,00	$200.044,00	$ 259.917,17	$ 8.837.184,00		$ -	-	$ -
4245	2,024	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	34,00	$288.806,00	$ 375.245,64	$ 12.758.352,00		$ -	-	$ -
4246	2,025	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	34,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 7.022.956,00		$ -	-	$ -
5225	2,026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$4.038,00	$ 5.246,57	$ 5.246.570,00		$ -	-	$ -
5226	2,027	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$5.455,00	$ 7.087,68	$ 7.087.680,00		$ -	-	$ -
5227	2,028	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	600,00	$24.667,00	$ 32.049,83	$ 19.229.898,00		$ -	-	$ -
4569	2,029	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	7.000,00	$10.112,00	$ 13.138,52	$ 91.969.640,00		$ -	-	$ -
4240	2,03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 70.231.318,00		$ -	-	$ -
4246	2,031	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	68,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 14.045.911,00		$ -	-	$ -
4247	2,032	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	1,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 172.131,00		$ -	-	$ -
8617	2,033	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	306,00	$179.000,00	$ 232.574,70	$ 71.167.858,00	39,84	$ 9.265.171,35	39,84	$ 9.265.171,35
4034	2,034	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACION)	M2	2.550,00	$29.125,00	$ 37.842,11	$ 96.497.381,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000774 CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3800	2,035	NIVELACION Y COMPACTACIÒN DE SUBRASANTE	M2	11.400,00	$1.605,00	$ 2.085,38	$ 23.773.332,00		$ -	-	$ -
7900	2,036	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	7.980,00	$69.333,00	$ 90.084,37	$ 718.873.273,00		$ -	-	$ -
4262	2,037	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	9.120,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 61.570.579,00		$ -	-	$ -
4848	2,038	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	1.700,00	$9.318,00	$ 12.106,88	$ 20.581.696,00		$ -	-	$ -
7893	2,039	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	40,00	$250.490,00	$ 325.461,66	$ 13.018.466,00		$ -	-	$ -
7512	2,04	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	40,00	$558.003,00	$ 725.013,30	$ 29.000.532,00		$ -	-	$ -
4878	2,041	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$112.143,00	$ 145.707,40	$ 72.853.700,00		$ -	-	$ -
3879	2,042	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	40,00	$1.063.572,00	$ 1.381.899,10	$ 55.275.964,00		$ -	-	$ -
3011	2,043	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	1.700,00	$5.521,00	$ 7.173,44	$ 12.194.848,00		$ -	-	$ -
6216	2,044	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.000,00	$68.053,00	$ 88.421,26	$ 88.421.260,00		$ -	-	$ -
4558	2,045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	20,00	$6.960.739,00	$ 9.044.088,18	$ 180.881.764,00		$ -	-	$ -
7713	2,046	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	10.000,00	$7.401,00	$ 9.616,12	$ 96.161.200,00		$ -	-	$ -
4879	2,047	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$198.856,00	$ 258.373,60	$ 129.186.800,00		$ -	-	$ -
7432	2,048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$574.835,00	$ 746.883,12	$ 74.688.312,00		$ -	-	$ -
7435	2,049	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$1.493.142,00	$ 1.940.039,40	$ 194.003.940,00		$ -	-	$ -
5220	2,05	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	100,00	$12.446,00	$ 16.171,09	$ 1.617.109,00		$ -	-	$ -
8566	2,051	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2	1.100,00	$105.843,00	$ 137.521,81	$ 151.273.991,00		$ -	-	$ -
5241	2,052	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	5.000,00	$15.143,00	$ 19.675,30	$ 98.376.500,00		$ -	-	$ -
6564	2,053	BANDA SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	100,00	$637.895,00	$ 828.816,97	$ 82.881.697,00		$ -	-	$ -
3046	2,054	TUBERIA PVC U,M, EXT CORRIGADO/INT LISO U.M. NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	200,00	$242.177,00	$ 314.660,58	$ 62.932.116,00		$ -	-	$ -
7831	2,055	CONEXIÓN KIT SILLA YEE 400X200 PVC SUMINISTRO E INSTALCION	UN	100,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 37.851.467,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000774 CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
6542	2,056	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	100,00	$68.040,00	$ 88.404,37	$ 8.840.437,00		$ -	-	$ -
	3	MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO FLEXIBLE									
3007	3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
4515	3,002	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M, (INCLUYE DEMOLICION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0,14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD19)	M2	22,95	$233.920,00	$ 303.932,26	$ 6.975.245,00		$ -	-	$ -
3710	3,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	30,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 202.535,00		$ -	-	$ -
3017	3,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -
4613	3,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3021	3,006	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE, INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100,00	$6.629,00	$ 8.613,06	$ 861.306,00		$ -	-	$ -
4487	3,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4160	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 198.553,00		$ -	-	$ -
8613	3,009	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	10,00	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 14.278.242,00		$ -	-	$ -
4712	3,010	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	3,00	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 5.579.497,00		$ -	-	$ -
3864	3,011	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 388.101,00		$ -	-	$ -
3867	3,012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 445.270,00		$ -	-	$ -
4758	3,013	SELLO DE FISURAS	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
4598	3,014	SELLO DE GRIETAS	ML	200,00	$9.181,00	$ 11.928,87	$ 2.385.774,00		$ -	-	$ -
3723	3,015	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3724	3,016	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
	4	MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO VIA PAVIMENTO RIGIDO									
3007	4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
3464	4,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	30,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 1.546.999,00		$ -	-	$ -
3017	4,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000774 CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4613	4,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3486	4,005	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	20,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 4.479.493,00		$ -	-	$ -
4487	4,006	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4744	4,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 224.575,00		$ -	-	$ -
3748	4,008	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	500,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 3.401.565,00		$ -	-	$ -
3708	4,009	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	200,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 2.189.060,00		$ -	-	$ -
5404	4,010	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	200,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 2.039.642,00		$ -	-	$ -
4959	4,011	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	2,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.970.952,00		$ -	-	$ -
4758	4,012	SELLO DE FISURAS	ML	20,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 19.397.899,00		$ -	-	$ -
3837	4,013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
3723	4,014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	200,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 3.363.628,00		$ -	-	$ -
3724	4,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3434	4,016	TACHON EN CONCRETO L=0,40m Hi=0,15m, Hs=0,08m (Incluye Suministro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3012	5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0,10 M, INCLUYE CARGUE), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	3.800,00	$7.379,00	$ 9.587,53	$ 36.432.614,00		$ -	-	$ -
3464	5,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.140,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 58.785.947,00		$ -	-	$ -
3017	5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.482,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 79.991.721,00		$ -	-	$ -
4757	5,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	444,60	$103.143,00	$ 134.013,70	$ 59.582.491,00		$ -	-	$ -
3425	5,005	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0,10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	3.800,00	$75.625,00	$ 98.259,56	$ 373.386.328,00		$ -	-	$ -
3394	5,006	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	171,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 165.852.040,00		$ -	-	$ -
3621	5,01	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	20,00	$895.086,00	$ 1.162.985,24	$ 23.259.705,00		$ -	-	$ -
5181	5,011	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, (GRAVA COMÚN) E=0,20M H=0,35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	ML	1.520,00	$57.377,00	$ 74.549,94	$ 113.315.909,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000774 CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4054	5,012	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.520,00	$75.643,00	$ 98.262,95	$ 149.360.084,00		$ -	-	$ -
3210	5,013	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	760,00	$63.543,00	$ 82.561,42	$ 62.746.679,00		$ -	-	$ -
9997	5,014	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	3.800,00	$2.960,00	$ 3.845,93	$ 14.614.534,00		$ -	-	$ -
4089	5,015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	1.700,00	$58.921,00	$ 76.556,06	$ 130.145.302,00		$ -	-	$ -
5952	5,016	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	500,00	$298.002,00	$ 387.194,00	$ 193.597.000,00		$ -	-	$ -
3009	6,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	475,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 24.494.145,00		$ -	-	$ -
3017	6,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	617,50	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 33.329.884,00		$ -	-	$ -
4613	6,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 138.204,00		$ -	-	$ -
3050	6,004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	10,00	$33.628,00	$ 43.692,86	$ 436.929,00		$ -	-	$ -
5412	6,005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	190,00	$148.309,00	$ 192.697,88	$ 36.612.597,00		$ -	-	$ -
4792	6,006	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	475,00	$90.368,00	$ 117.415,14	$ 55.772.192,00		$ -	-	$ -
4837	6,007	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	60,00	$195.775,00	$ 254.370,46	$ 15.262.228,00		$ -	-	$ -
3024	6,008	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	60,00	$143.400,00	$ 186.319,62	$ 11.179.177,00		$ -	-	$ -
3878	6,009	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	76,00	$1.772.907,00	$ 2.303.538,07	$ 175.068.893,00		$ -	-	$ -
3471	6,01	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	121,60	$676.767,00	$ 879.323,36	$ 106.925.721,00		$ -	-	$ -
3722	6,011	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	76,00	$121.375,00	$ 157.702,54	$ 11.985.393,00		$ -	-	$ -
4265	6,012	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$125.354,00	$ 162.872,45	$ 1.628.725,00		$ -	-	$ -
3937	6,013	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$368.834,00	$ 479.226,02	$ 4.792.260,00		$ -	-	$ -
3041	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350,00	$29.100,00	$ 37.809,63	$ 13.233.371,00		$ -	-	$ -
3042	6,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.200,00	$49.946,00	$ 64.894,84	$ 77.873.808,00		$ -	-	$ -
3043	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$69.231,00	$ 89.951,84	$ 35.980.736,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000774 CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3044	6,017	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$97.705,00	$ 126.948,11	$ 50.779.244,00		$ -	-	$ -
3045	6,018	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	500,00	$136.670,00	$ 177.575,33	$ 88.787.665,00		$ -	-	$ -
3047	6,019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	49,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 19.734.202,00		$ -	-	$ -
4611	6,02	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.316,00	$ 231.685,98	$ 10.425.869,00		$ -	-	$ -
4612	6,021	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.928,00	$ 232.481,15	$ 10.461.652,00		$ -	-	$ -
4614	6,022	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$179.530,00	$ 233.263,33	$ 10.496.850,00		$ -	-	$ -
4615	6,023	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$230.292,00	$ 299.218,40	$ 13.464.828,00		$ -	-	$ -
4982	6,024	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	UN	45,00	$177.746,00	$ 230.945,38	$ 10.392.542,00		$ -	-	$ -
5015	6,025	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	45,00	$558.245,00	$ 725.327,73	$ 32.639.748,00		$ -	-	$ -
7830	6,026	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	250,00	$214.063,00	$ 278.132,06	$ 69.533.015,00		$ -	-	$ -
7831	6,027	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	255,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 96.521.241,00		$ -	-	$ -
8970	6,028	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	97,00	$283.252,00	$ 368.029,32	$ 35.698.844,00		$ -	-	$ -
3047	6,029	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	50,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 20.136.941,00		$ -	-	$ -
	NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.21M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$225.987,00	$293.624,91	$ -		$ -	-	$ -
	NP-02	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	M3		$369.623,00	$480.251,16	$ -	39,84	$ 19.131.957,56	39,84	$ 19.131.957,56
	NP-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.22M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$238.867,00	$310.359,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.25M acelerado 7 dias	M2		$264.493,00	$343.655,75	$ -		$ -	-	$ -
	NP-05	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M2		$57.303,00	$74.453,79	$ -		$ -	-	$ -
	NP-06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.18M acelerado 7 dias	M2		$201.230,00	$261.458,14	$ -		$ -	-	$ -
	NP-07	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$205.185,00	$266.596,87	$ -		$ -	-	$ -
	NP-08	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN		$5.078.248,00	$6.598.167,63	$ -		$ -	-	$ -
	NP-09	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.930.270,00	$2.507.999,81	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000774 CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-10	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.203.970,00	$2.863.618,22	$ -		$ -	-	$ -
	NP-11	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$257.718,00	$334.853,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-12	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$573.534,00	$745.192,73	$ -		$ -	-	$ -
	NP-13	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$276.165,00	$358.821,18	$ -		$ -	-	$ -
	NP-14	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)	UN		$7.767.377,00	$10.092.152,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-15	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD EL 12"X4"=1 UN, UZ U.M PVC D=12"=1 UN, UZ U.M PVC D=4"=1 UN, UR U.M PVC D=12"=1 UN, UR U.M PVC D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$5.460.638,00	$7.095.006,95	$ -		$ -	-	$ -
	NP-16	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD 4"X4" PARA AC=1 UN, UG HD D=4"=3 UN, ADAPTADOR U.S. D=4"=1 UN, UR HD D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$1.302.235,00	$1.691.993,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-17	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN		$8.105.183,00	$10.531.064,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-18	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M. INCLUYE CAJILLA EN	UN		$464.663,00	$603.736,64	$ -		$ -	-	$ -
	NP-19	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN		$1.380.400,00	$1.793.553,72	$ -		$ -	-	$ -
	NP-20	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$197.855,00	$257.073,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-21	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.314.441,00	$3.007.153,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-22	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.284.691,00	$2.968.499,02	$ -		$ -	-	$ -
	NP-23	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$418.527,00	$543.792,13	$ -		$ -	-	$ -
	NP-24	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$530.942,00	$689.852,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-25	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$74.860,00	$97.265,60	$ -		$ -	-	$ -
	NP-26	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.210.133,00	$1.572.325,81	$ -		$ -	-	$ -
	NP-27	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$229.605,00	$298.325,78	$ -		$ -	-	$ -
	NP-28	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$215.325,00	$279.771,77	$ -		$ -	-	$ -
	NP-29	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.241.418,00	$1.612.974,41	$ -		$ -	-	$ -
	NP-30	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$196.182,00	$254.899,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-31	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.244.646,00	$1.617.168,55	$ -		$ -	-	$ -
	NP-32	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$75.683,00	$98.334,92	$ -		$ -	-	$ -
	NP-33	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$108.935,00	$141.539,25	$ -		$ -	-	$ -
	NP-34	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.562.482,00	$2.030.132,86	$ -		$ -	-	$ -
	NP-35	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$81.588,00	$106.007,29	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000774 CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-36	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$123.986,00	$161.095,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$7.587.734,00	$9.858.742,79	$ -		$ -	-	$ -
	NP-38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.244.588,00	$2.916.393,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-39	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.187.868,00	$1.543.396,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-40	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$729.696,00	$948.094,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-41	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$1.725.500,00	$2.241.942,15	$ -		$ -	-	$ -
		(A) VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUIDO A.I.U.) (A)					$ 9.497.976.346,00		$ 45.829.258,00		$ 45.829.258,00
(B) VALOR FIJO 1		COSTOS TOTALES PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U (B)	UN	1,00			$ 499.093.537,00	0,42%	$ 2.119.620	0,42%	$ 2.119.620
(C) VALOR FIJO 2		COSTOS TOTALES ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA) (C)	UN	1,00			$ 241.107.411,00		$ -	-	$ -
(D) VALOR FIJO 3		OBRAS COMPLEMENTATIOS Y/O AJUSTES	UN	1,00			$ 552.949.979,00			-	$ -
		VALOR TOTAL PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCION [(A) + (B) + (C) + (D)] =					$ 10.791.127.273,00		$ 47.948.878,00		$ 47.948.878,00
		VALOR A PAGAR							$ 47.948.878,00		$ 47.948.878,00

DANIEL EDUARDO PABÓN JAIMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

GERMAN RAMIREZ BARBOSA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

4

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000774
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	2,001	DESCRIPCIÓN ÍTEM	REPLANTEO GENERAL	UNIDAD	M2

ESQUEMA

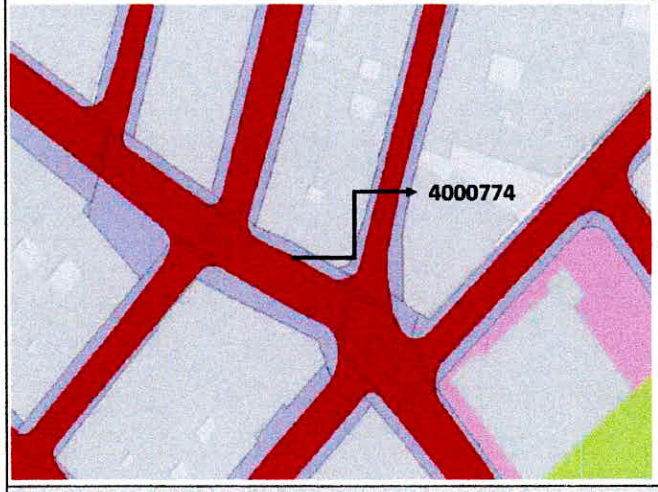

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSION	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
REPLANTEO GENERAL	28,66	12,90		369,83			K0+097,78 - K0+126,44	369,83

DESCUENTOS	DIMENSION RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL

TOTAL ÍTEM	369,83

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


BOGOTÁ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000774
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 19ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	2,002	DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSION		
DEMOLICION LOSA DE CONCRETO	28,66	6,95	0,25	199,19	49,80		K0+097,78 - K0+126,44	49,80


DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
DESCUENTO POZOS	0,85	0,85	0,25	1,13	0,28	1,00		0,28

TOTAL ÍTEM	49,51

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

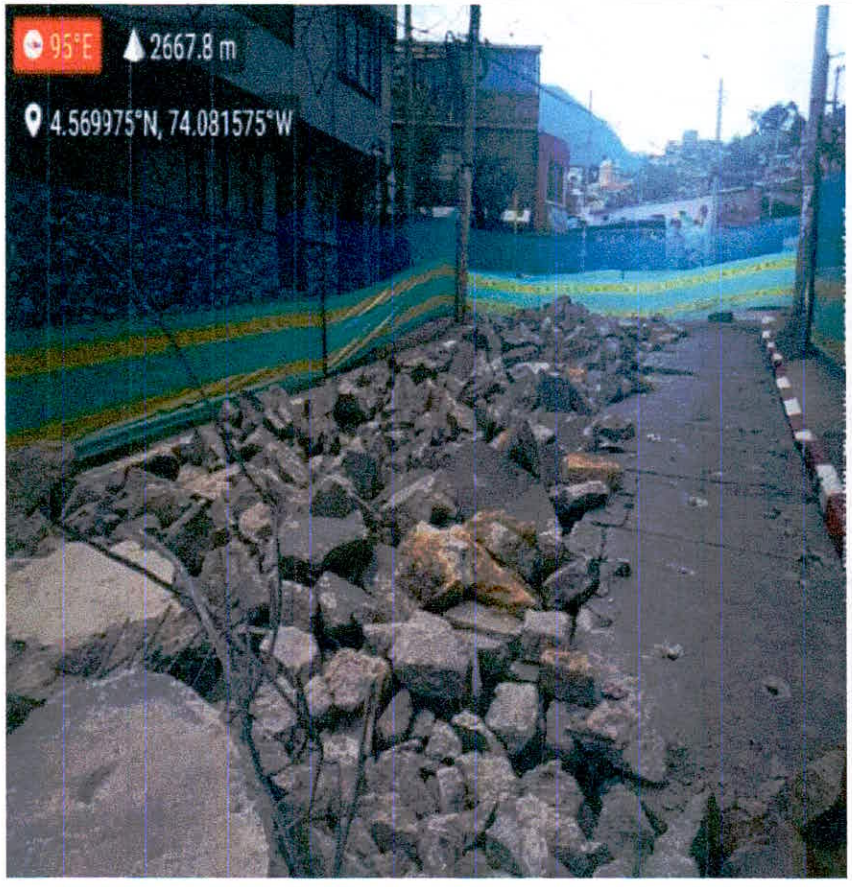
95°E
2667.8 m
4.569975°N, 74.081575°W


314°NW
2666.5 m
4.569982°N, 74.081757°W

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1138 DE 2024	**CIV**	4000774
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CL 19 S ENTRE KR 18A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	2,003	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	**UNIDAD**	M3

ESQUEMA

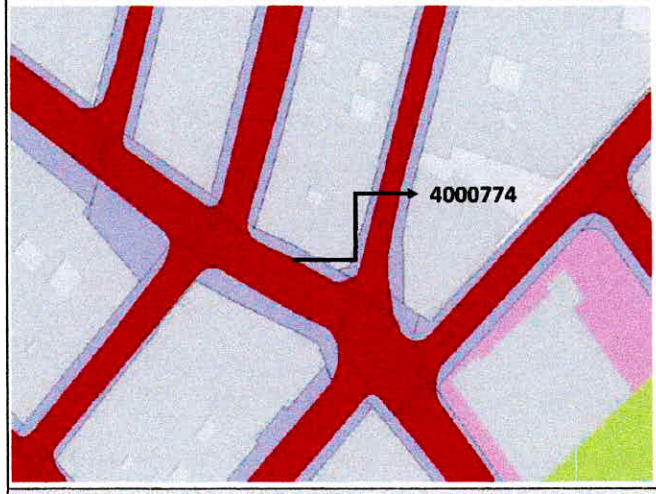

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSION		
EXCAVACION MECANICA VIA	28,66	6,95	0,16	199,19	31,87		K0+097,78 - K0+126,44	31,87


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD		


TOTAL ÍTEM	31,87

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JOAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

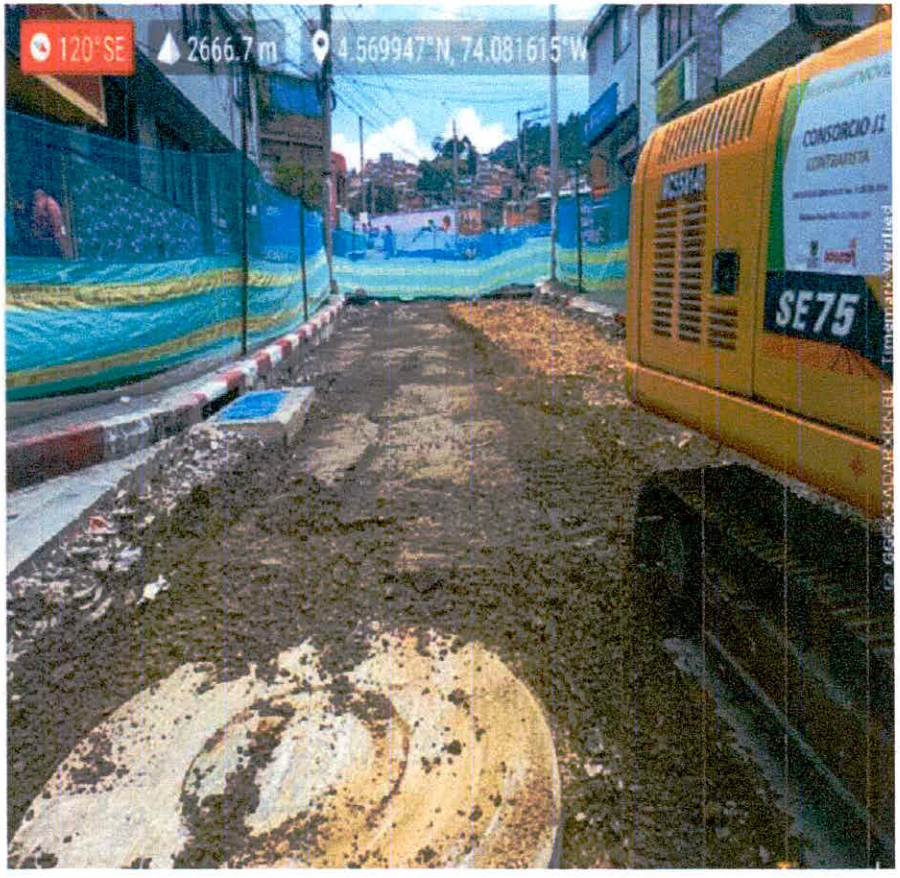
120°SE
2666.7 m
4.569947°N, 74.081615°W
CONSORCIO J1
CONTRATISTA
SE75

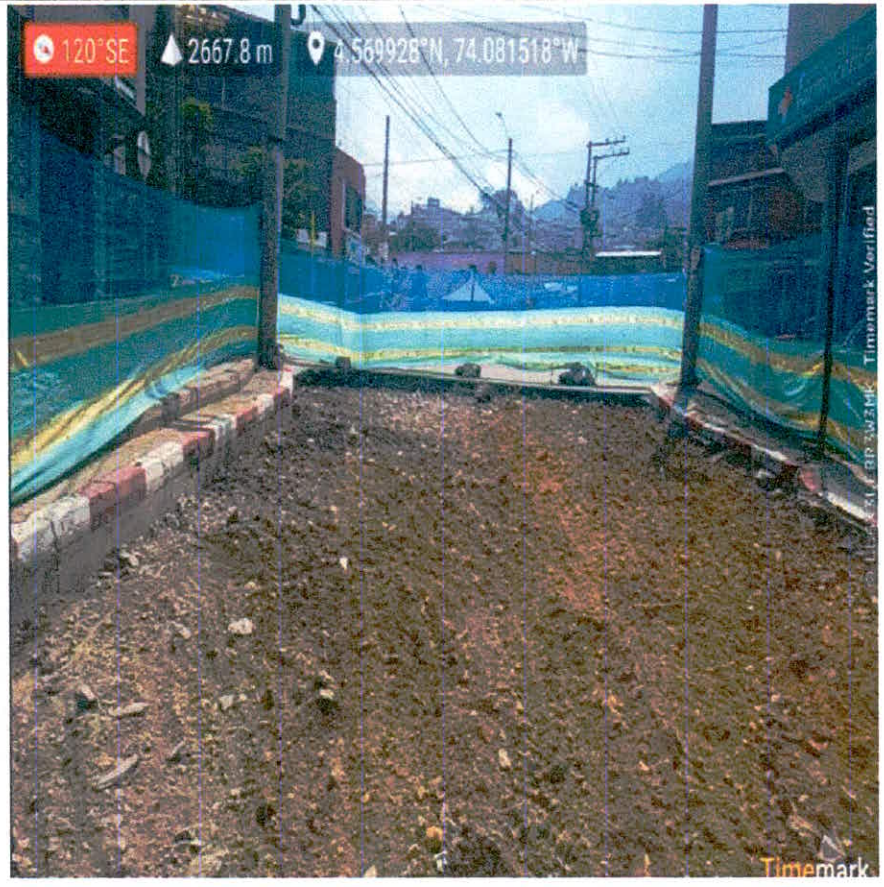
120°SE
2667.8 m
4.569928°N, 74.081518°W
Timemark

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000774
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	2,004	DESCRIPCIÓN ITEM	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (80 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSION		
DEMOLICION LOSA DE CONCRETO	28,66	6,95	0,25	199,19	49,80	1,30	K0+097,78 - K0+126,44	64,74
EXCAVACION MECANICA VIA	28,66	6,95	0,16	199,19	31,87	1,30	K0+097,78 - K0+126,44	41,43


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD		

TOTAL ÍTEM	106,17

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

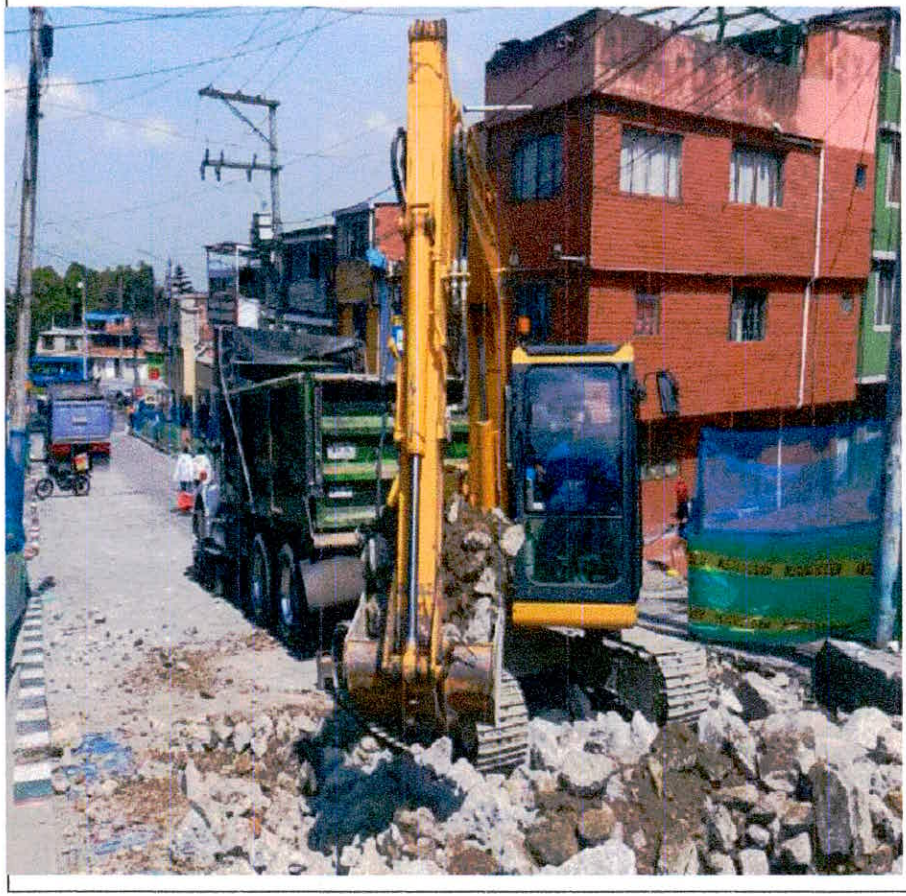


SHANTUI
30
SE75

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000774
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	2.033	DESCRIPCIÓN ÍTEM	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSION		
SUB BASE ESTABILIZADA VIA	28,66	6,95	0,20	199,19	39,84		K0+097,78 - K0+126,44	39,84

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD		

TOTAL ÍTEM	39,84

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000774
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CL 19 S ENTRE KR 10A E HASTA KR 10ABIS E (SAN CRISTOBAL SUR)

# ÍTEM	NP-02	DESCRIPCIÓN ITEM	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	UNIDAD	M3

ESQUEMA

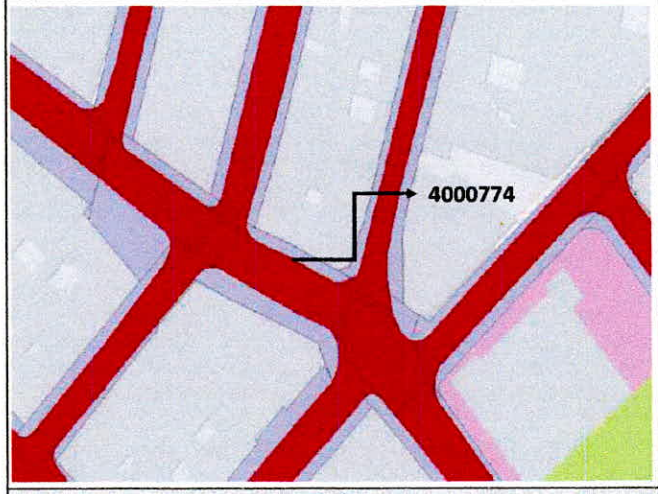

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSION		
SUB BASE ESTABILIZADA VIA	28,66	6,95	0,20	199,19	39,84		K0+097,78 - K0+126,44	39,84

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD		

TOTAL ÍTEM	39,84

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000818 CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	1	**RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 1.287.864,00		$ -	-	$ -
3010	1,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	307,00	$35.050,00	$ 45.540,47	$ 13.980.924,00		$ -	-	$ -
3710	1,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	720,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 4.860.835,00		$ -	-	$ -
3017	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	748,80	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 40.416.869,00		$ -	-	$ -
4613	1,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	187,20	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 12.935.889,00		$ -	-	$ -
4015	1,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.218,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 19.500.143,00		$ -	-	$ -
4157	1,007	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$170.358,00	$ 221.346,15	$ 47.810.768,00		$ -	-	$ -
4743	1,008	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$164.610,00	$ 213.877,77	$ 30.798.399,00		$ -	-	$ -
4160	1,009	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 42.887.346,00		$ -	-	$ -
4747	1,010	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 28.591.564,00		$ -	-	$ -
4200	1,011	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	$1.002.096,00	$ 1.302.023,33	$ 1.302.023,00		$ -	-	$ -
4712	1,012	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	32,40	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 60.256.567,00		$ -	-	$ -
3864	1,013	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1.200,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 4.657.212,00		$ -	-	$ -
3867	1,014	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	3.116,95	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 13.878.843,00		$ -	-	$ -
4240	1,015	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	800,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 16.525.016,00		$ -	-	$ -
4246	1,016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	8,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 1.652.460,00		$ -	-	$ -
4248	1,017	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	40,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 6.885.250,00		$ -	-	$ -
6313	1,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica). Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	75,60	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 107.943.506,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000818 CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. EDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3007	2,001	REPLANTEO GENERAL	M2	10.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 10.946.844,00		$ -	1.512,00	$ 1.622.708,64
3486	2,002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1.020,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 228.454.123,00	7,79	$ 1.744.782,37	138,20	$ 30.953.293,87
3710	2,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5.100,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 34.430.916,00	14,24	$ 96.136,52	284,27	$ 1.919.152,25
3017	2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5.967,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 322.071.926,00	28,65	$ 1.546.204,45	826,43	$ 44.606.794,80
4613	2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 26 KM)	M3	663,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 45.814.806,00		$ -	-	$ -
4015	2,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.100,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 81.650.847,00		$ -	-	$ -
4161	2,007	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$146.967,00	$ 190.954,22	$ 175.285.974,00		$ -	-	$ -
4746	2,008	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 121.514.148,00		$ -	-	$ -
4158	2,009	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$161.586,00	$ 209.948,69	$ 192.732.897,00		$ -	-	$ -
4744	2,01	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 137.439.845,00		$ -	-	$ -
3708	2,011	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	5.000,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 34.015.650,00	1.598,66	$ 10.875.891,81	1.598,66	$ 10.875.891,81
5404	2,012	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2.000,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 21.890.600,00	747,04	$ 8.176.576,91	747,04	$ 8.176.576,91
4959	2,013	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	20.000,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 203.964.200,00	935,09	$ 9.536.244,19	935,09	$ 9.536.244,19
4238	2,014	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	137,95	$6.866,00	$ 8.920,99	$ 1.230.651,00		$ -	-	$ -
3806	2,015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	5.100,00	$2.404,00	$ 3.123,52	$ 15.929.952,00		$ -	-	$ -
3204	2,016	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	1.620,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.596.471.395,00		$ -	-	$ -
3394	2,017	Llosa DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	408,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 395.717.148,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000818 CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3837	2,018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	6.900,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 116.045.166,00	265,71	$ 4.468.747,98	265,71	$ 4.468.747,98
3811	2,019	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	5.200,00	$2.397,00	$ 3.114,42	$ 16.194.984,00	265,71	$ 827.532,54	265,71	$ 827.532,54
3872	2,02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$2.367,00	$ 3.075,44	$ 10.456.496,00		$ -	-	$ -
3180	2,021	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	ML	500,00	$6.520,00	$ 8.471,44	$ 4.235.720,00		$ -	-	$ -
3178	2,022	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	M2	600,00	$37.459,00	$ 48.670,48	$ 29.202.288,00		$ -	-	$ -
4244	2,023	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	34,00	$200.044,00	$ 259.917,17	$ 8.837.184,00		$ -	-	$ -
4245	2,024	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INC. MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	34,00	$288.806,00	$ 375.245,64	$ 12.758.352,00		$ -	-	$ -
4246	2,025	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	34,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 7.022.956,00		$ -	-	$ -
5225	2,026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$4.038,00	$ 5.246,57	$ 5.246.570,00		$ -	-	$ -
5226	2,027	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$5.455,00	$ 7.087,68	$ 7.087.680,00		$ -	-	$ -
5227	2,028	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	600,00	$24.667,00	$ 32.049,83	$ 19.229.898,00		$ -	-	$ -
4569	2,029	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2,5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	7.000,00	$10.112,00	$ 13.136,52	$ 91.969.640,00		$ -	-	$ -
4240	2,03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 70.231.318,00		$ -	-	$ -
4246	2,031	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS), MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	68,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 14.045.911,00		$ -	-	$ -
4247	2,032	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2,3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS)	M2	1,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 172.131,00		$ -	-	$ -
8617	2,033	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	306,00	$179.000,00	$ 232.574,70	$ 71.167.858,00	- 23,60	$ (5.488.762,92)	268,45	$ 62.434.678,22
4034	2,034	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=80 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	2.550,00	$29.125,00	$ 37.842,11	$ 96.497.381,00	132,24	$ 5.004.051,42	789,24	$ 29.866.317,69

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000818 CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.886.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3800	2,035	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	11.400,00	$1.605,00	$ 2.085,38	$ 23.773.332,00	34,66	$ 72.268,84	691,66	$ 1.442.363,50
7900	2,036	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	7.980,00	$69.333,00	$ 90.084,37	$ 718.873.273,00	34,66	$ 3.121.873,84	691,66	$ 62.307.304,93
4262	2,037	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3,5M (INCLUYE CARGUE)	M3	9.120,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 61.570.579,00		$ -	209,64	$ 1.415.313,18
4848	2,038	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	1.700,00	$9.318,00	$ 12.106,88	$ 20.581.696,00		$ -	-	$ -
7893	2,039	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	40,00	$250.490,00	$ 325.461,66	$ 13.018.466,00		$ -	-	$ -
7512	2,04	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	40,00	$558.003,00	$ 725.013,30	$ 29.000.532,00		$ -	2,00	$ 1.450.026,60
4878	2,041	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$112.143,00	$ 145.707,40	$ 72.853.700,00		$ -	-	$ -
3879	2,042	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCL. SUMIN, INST.)	UN	40,00	$1.063.572,00	$ 1.381.899,10	$ 55.275.964,00		$ -	4,00	$ 5.527.596,40
3011	2,043	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	1.700,00	$5.521,00	$ 7.173,44	$ 12.194.848,00		$ -	190,00	$ 1.362.953,60
6216	2,044	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.000,00	$68.053,00	$ 88.421,26	$ 88.421.260,00		$ -	-	$ -
4558	2,045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	20,00	$6.960.739,00	$ 9.044.088,18	$ 180.881.764,00		$ -	-	$ -
7713	2,046	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	10.000,00	$7.401,00	$ 9.616,12	$ 96.161.200,00		$ -	-	$ -
4879	2,047	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$198.856,00	$ 258.373,60	$ 129.186.800,00		$ -	-	$ -
7432	2,048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$574.835,00	$ 746.883,12	$ 74.688.312,00		$ -	-	$ -
7435	2,049	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$1.493.142,00	$ 1.940.039,40	$ 194.003.940,00		$ -	-	$ -
5220	2,05	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	100,00	$12.446,00	$ 16.171,09	$ 1.617.109,00		$ -	-	$ -
8566	2,051	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2	1.100,00	$105.843,00	$ 137.521,81	$ 151.273.991,00		$ -	-	$ -
5241	2,052	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	5.000,00	$15.143,00	$ 19.675,30	$ 98.376.500,00		$ -	-	$ -
6564	2,053	BANDA SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2". PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	100,00	$637.895,00	$ 828.816,97	$ 82.881.697,00		$ -	-	$ -
3046	2,054	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRIGADO/INT LISO U.M. NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	200,00	$242.177,00	$ 314.660,58	$ 62.932.116,00		$ -	-	$ -
7831	2,055	CONEXIÓN KIT SILLA YEE 400X200 PVC SUMINISTRO E INSTALCION	UN	100,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 37.851.467,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000818 CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
6542	2,056	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	100,00	$68.040,00	$ 88.404,37	$ 8.840.437,00		$ -	-	$ -
3007	3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
4515	3,002	SACREO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0,14M, (INCLUYE DEMOLICION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0,14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0,20M, BASE ASFALTICA MD10	M2	22,95	$233.920,00	$ 303.932,26	$ 6.975.245,00		$ -	-	$ -
3710	3,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	30,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 202.535,00		$ -	-	$ -
3017	3,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -
4613	3,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3021	3,006	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100,00	$6.629,00	$ 8.613,06	$ 861.306,00		$ -	-	$ -
4487	3,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4160	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 198.553,00		$ -	-	$ -
8613	3,009	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	10,00	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 14.278.242,00		$ -	-	$ -
4712	3,010	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	3,00	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 5.579.497,00		$ -	-	$ -
3864	3,011	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 388.101,00		$ -	-	$ -
3867	3,012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 445.270,00		$ -	-	$ -
4758	3,013	SELLO DE FISURAS	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
4596	3,014	SELLO DE GRIETAS	ML	200,00	$9.181,00	$ 11.928,87	$ 2.385.774,00		$ -	-	$ -
3723	3,015	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3724	3,016	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3007	4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
3464	4,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	30,00	$39.688,00	$ 51.566,52	$ 1.546.999,00		$ -	-	$ -
3017	4,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000818 CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4613	4,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3486	4,005	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	20,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 4.479.493,00		$ -	-	$ -
4457	4,006	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	30,00	$165.665,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4744	4,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 224.575,00		$ -	-	$ -
3748	4,008	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	500,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 3.401.565,00		$ -	-	$ -
3708	4,009	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	200,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 2.189.060,00		$ -	-	$ -
5404	4,010	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	200,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 2.039.642,00		$ -	-	$ -
4959	4,011	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	2,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.970.952,00		$ -	-	$ -
4758	4,012	SELLO DE FISURAS	ML	20,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 19.397.899,00		$ -	-	$ -
3837	4,013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
3723	4,014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	200,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 3.363.628,00		$ -	-	$ -
3724	4,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3434	4,016	TACHON EN CONCRETO L=0.40m H=0.15m, Ha=0.08m (Incluye Suministro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
		[redacted]									
3012	5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0,10 M, INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	3.800,00	$7.379,00	$ 9.587,53	$ 36.432.614,00		$ -	-	$ -
3484	5,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.140,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 58.785.947,00		$ -	-	$ -
3017	5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.482,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 79.981.721,00		$ -	-	$ -
4757	5,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	444,60	$103.143,00	$ 134.013,70	$ 59.582.491,00		$ -	-	$ -
3425	5,005	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	3.800,00	$75.625,00	$ 98.259,56	$ 373.386.328,00		$ -	-	$ -
3394	5,006	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	171,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 165.852.040,00		$ -	-	$ -
3521	5,01	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	20,00	$895.086,00	$ 1.162.985,24	$ 23.259.705,00		$ -	-	$ -
5181	5,011	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	ML	1.520,00	$57.377,00	$ 74.549,94	$ 113.315.909,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000818 CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4054	5,012	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.520,00	$75.643,00	$ 98.262,95	$ 149.360.084,00		$ -	150,00	$ 14.742.442,50
3210	5,013	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	760,00	$63.543,00	$ 82.561,42	$ 62.746.679,00		$ -	-	$ -
9997	5,014	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	3.800,00	$2.960,00	$ 3.845,93	$ 14.614.534,00		$ -	-	$ -
4089	5,015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	1.700,00	$58.921,00	$ 76.556,06	$ 130.145.302,00		$ -	-	$ -
5952	5,016	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	500,00	$298.002,00	$ 387.194,00	$ 193.597.000,00		$ -	-	$ -
3009	6,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	475,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 24.494.145,00		$ -	22,77	$ 1.174.324,06
3017	6,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	617,50	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 33.328.894,00		$ -	29,61	$ 1.598.215,15
4613	6,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 138.204,00		$ -	-	$ -
3050	6,004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	10,00	$33.628,00	$ 43.692,86	$ 436.929,00		$ -	-	$ -
5412	6,005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	190,00	$148.308,00	$ 192.697,88	$ 36.612.597,00		$ -	36,27	$ 6.989.152,11
4792	6,006	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	475,00	$90.368,00	$ 117.415,14	$ 55.772.192,00		$ -	141,48	$ 16.611.542,74
4837	6,007	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	60,00	$195.775,00	$ 254.370,46	$ 15.262.228,00		$ -	-	$ -
3024	6,008	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	60,00	$143.400,00	$ 186.319,62	$ 11.179.177,00		$ -	-	$ -
3678	6,009	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	76,00	$1.772.907,00	$ 2.303.538,07	$ 175.068.893,00	6,00	$ 13.821.228,42	6,00	$ 13.821.228,42
3471	6,01	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	121,60	$576.767,00	$ 879.323,36	$ 106.925.721,00		$ -	5,96	$ 5.240.767,23
3722	6,011	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	76,00	$121.375,00	$ 157.702,54	$ 11.985.393,00		$ -	-	$ -
4265	6,012	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$125.354,00	$ 162.872,45	$ 1.628.725,00		$ -	-	$ -
3937	6,013	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$368.834,00	$ 479.226,02	$ 4.792.260,00		$ -	-	$ -
3041	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350,00	$29.100,00	$ 37.809,63	$ 13.233.371,00		$ -	-	$ -
3042	6,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.200,00	$49.946,00	$ 64.894,84	$ 77.873.808,00		$ -	65,35	$ 4.240.877,79
3043	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$69.231,00	$ 89.951,84	$ 35.980.736,00	3,40	$ 305.836,26	3,40	$ 305.836,26

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000818 CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3044	6,017	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$97.705,00	$ 126.948,11	$ 50.779.244,00		$ -	91,68	$ 11.638.602,72
3045	6,018	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	500,00	$136.670,00	$ 177.575,33	$ 88.787.665,00		$ -	-	$ -
3047	6,019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	49,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 19.734.202,00		$ -	-	$ -
4611	6,02	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.316,00	$ 231.685,98	$ 10.425.869,00	3,40	$ 787.732,33	3,40	787.732,33
4612	6,021	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.928,00	$ 232.481,15	$ 10.461.652,00		$ -	-	$ -
4614	6,022	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$179.530,00	$ 233.263,33	$ 10.496.850,00		$ -	-	$ -
4615	6,023	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$230.292,00	$ 299.218,40	$ 13.464.828,00		$ -	-	$ -
4982	6,024	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	UN	45,00	$177.746,00	$ 230.945,38	$ 10.392.542,00		$ -	-	$ -
5015	6,025	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	45,00	$558.245,00	$ 725.327,73	$ 32.639.748,00		$ -	-	$ -
7830	6,026	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	250,00	$214.063,00	$ 278.132,06	$ 69.533.015,00		$ -	-	$ -
7831	6,027	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	255,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 96.521.241,00		$ -	-	$ -
8970	6,028	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	97,00	$283.252,00	$ 368.029,32	$ 35.698.844,00		$ -	-	$ -
3047	6,029	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	50,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 20.136.941,00		$ -	-	$ -
3009	NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.21M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$225.987,00	$293.624,91	$ -	31,63	$ 9.286.475,03	652,63	$ 191.627.544,14
3009	NP-02	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	M3		$369.623,00	$480.251,16	$ -	7,03	$ 3.376.165,65	134,83	$ 64.752.263,90
3009	NP-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.22M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$238.867,00	$310.359,89	$ -		$ -	-	$ -
3009	NP-04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.25M acelerado 7 dias	M2		$264.493,00	$343.655,75	$ -		$ -	-	$ -
3009	NP-05	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$57.303,00	$74.453,79	$ -		$ -	616,69	$ 45.915.274,07
3009	NP-06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.18M acelerado 7 dias	M2		$201.230,00	$261.458,14	$ -		$ -	-	$ -
	NP-07	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$205.185,00	$266.596,87	$ -		$ -	-	$ -
	NP-08	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN		$5.078.248,00	$6.598.167,63	$ -		$ -	8,00	$ 52.785.341,04
	NP-09	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.930.270,00	$2.507.999,81	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000818 CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.886.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-10	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.203.970,00	$2.863.618,22	$ -		$ -	-	$ -
	NP-11	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$257.718,00	$334.853,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-12	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$573.534,00	$745.192,73	$ -		$ -	-	$ -
	NP-13	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$276.165,00	$358.821,18	$ -		$ -	-	$ -
	NP-14	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERIA RDE 21)	UN		$7.767.377,00	$10.092.152,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-15	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD EL 12"X4"=1 UN, UZ U.M PVC D=12"=1 UN, UZ U.M PVC D=4"=1 UN, UR U.M PVC D=12"=1 UN, UR U.M PVC D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$5.460.638,00	$7.095.006,95	$ -		$ -	-	$ -
	NP-16	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"X4" SEGUN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD 4"X4" PARA AC=1 UN, UG HD D=4"=3 UN, ADAPTADOR U.S.	UN		$1.302.235,00	$1.691.993,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-17	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN		$8.105.183,00	$10.531.064,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-18	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M. INCLUYE CAJILLA EN	UN		$464.663,00	$603.736,64	$ -		$ -	-	$ -
	NP-19	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN		$1.380.400,00	$1.793.553,72	$ -		$ -	-	$ -
	NP-20	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$197.855,00	$257.073,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-21	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.314.441,00	$3.007.153,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-22	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.284.691,00	$2.968.499,02	$ -		$ -	-	$ -
	NP-23	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$418.527,00	$543.792,13	$ -		$ -	-	$ -
	NP-24	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$530.942,00	$689.852,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-25	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$74.860,00	$97.265,60	$ -		$ -	-	$ -
	NP-26	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.210.133,00	$1.572.325,81	$ -		$ -	-	$ -
	NP-27	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$229.605,00	$298.325,78	$ -		$ -	-	$ -
	NP-28	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$215.325,00	$279.771,77	$ -		$ -	-	$ -
	NP-29	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.241.418,00	$1.612.974,41	$ -		$ -	-	$ -
	NP-30	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$196.182,00	$254.899,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-31	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.244.646,00	$1.617.168,55	$ -		$ -	-	$ -
	NP-32	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$75.683,00	$98.334,92	$ -		$ -	-	$ -
	NP-33	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$108.935,00	$141.539,25	$ -		$ -	-	$ -
	NP-34	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.562.482,00	$2.030.132,86	$ -		$ -	-	$ -
	NP-35	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$81.588,00	$106.007,29	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4000818 CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)	12 MESES
NIT:	901.896.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO	FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICIÓN 1	$0,00	FECHA DE TERMINACION INICIAL	FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$ -
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$ -
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL	12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-36	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$123.986,00	$161.095,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$7.587.734,00	$9.858.742,79	$ -		$ -	-	$ -
	NP-38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.244.588,00	$2.916.393,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-39	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.187.868,00	$1.543.396,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-40	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$729.696,00	$948.094,01	$ -		$ -	92,07	$ 87.291.015,50
	NP-41	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL, DIÁMETRO 8", ESPESOR 3,00 MM, EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER). PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$1.725.500,00	$2.241.942,15	$ -		$ -	-	$ -
		(A) VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUIDO A.I.U.) (A)					$ 9.497.976.346,00		$ 67.559.966,00		$ 788.315.757,06
(B) VALOR FIJO 1		COSTOS TOTALES PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U (B)	UN	1,00			$ 499.093.537,00	0,63%	$ 3.124.827	7,40%	$ 36.922.392
(C) VALOR FIJO 2		COSTOS TOTALES ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA) (C)	UN	1,00			$ 241.107.411,00		$ -	-	$ -
(D) VALOR FIJO 3		OBRAS COMPLEMENTATIOS Y/O AJUSTES	UN	1,00			$ 552.949.979,00			-	$ -
		VALOR TOTAL PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCION [(A) + (B) + (C) + (D)] =					$ 10.791.127.273,00		$ 70.683.593,00		$ 835.238.149,00
		VALOR A PAGAR							$ 70.683.593,00		$ 835.238.149,00

DANIEL EDUARDO PABÓN JAIMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

GERMAN RAMIREZ BARBOSA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	2,002	DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL), NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	UNIDAD	M3

ESQUEMA

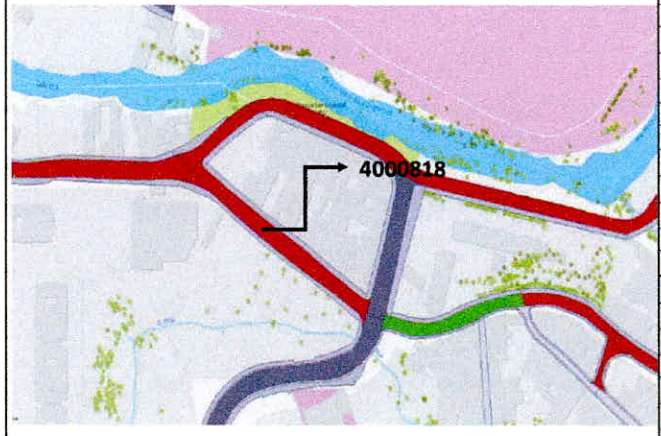

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	97,58	6,90	0,21	673,30	141,39		K0+018,35 - K0+115,93	141,39


DESCUENTOS	DIMENSIÓN LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	90,00	6,90	0,21	621,00	130,41		K0+25 - K0+115	130,41
DESCUENTO POZOS	0,85	0,85	0,21	6,81	1,43			1,43
DESCUENTO SUMIDERO	2,00	0,70	0,21	8,40	1,76			1,76

TOTAL ÍTEM 7,79

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

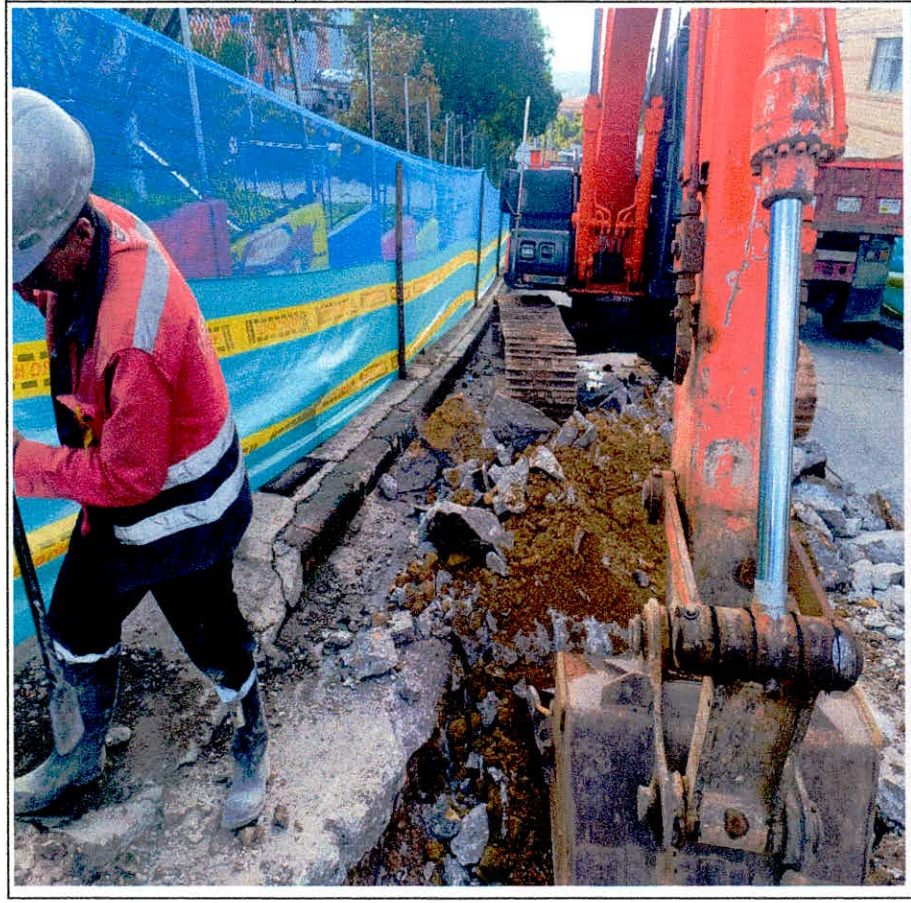



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	2,003	DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD	M3

ESQUEMA

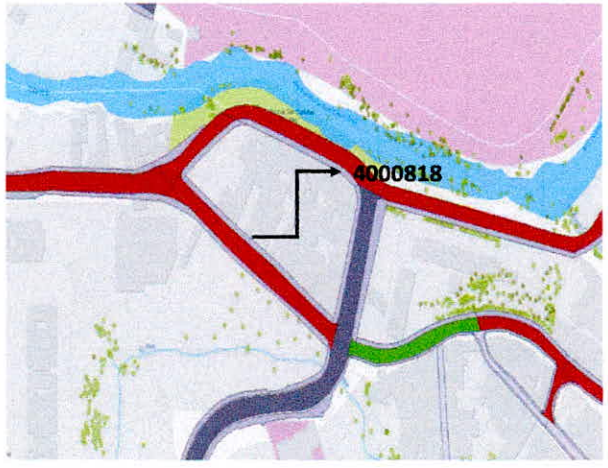

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
EXCAVACIÓN MECÁNICA	97,58	7,30	0,41	712,33	292,77		K0+018,35 - K0+115,93	292,77

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
EXCAVACIÓN MECÁNICA	90,00	7,30	0,41	657,00	270,03		K0+25 - K0+115	270,03
DESCUENTO POZOS	0,85	0,85	0,21	13,62	5,6			5,60
DESCUENTO SUMIDERO	2,00	0,70	0,21	7,06	2,9			2,90

TOTAL ÍTEM	14,24

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA





MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	2,004	DESCRIPCIÓN ÍTEM	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	UNIDAD	M3

ESQUEMA

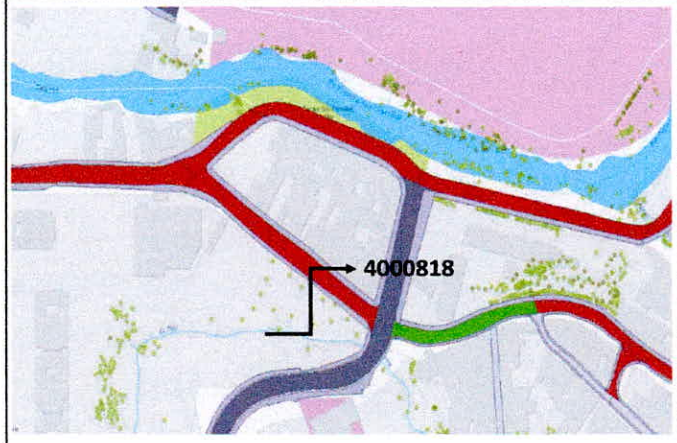

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	97,58	6,90	0,21	673,30	141,39	1,30	K0+018,35 - K0+115,9	183,81
EXCAVACIÓN MECÁNICA	97,58	7,30	0,41	712,33	292,77	1,30	K0+018,35 - K0+115,9	380,60

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	90,00	6,90	0,21	621,00	130,41	1,30	K0+25 - K0+115	169,53
DESCUENTO POZOS	0,85	0,85	0,21	6,81	1,43	1,30		1,86
DESCUENTO SUMIDERO	2,00	0,70	0,21	8,40	1,76	1,30		2,29
EXCAVACIÓN MECÁNICA	90,00	7,30	0,41	657,00	270,027	1,30	K0+25 - K0+115	351,04
DESCUENTO POZOS	0,85	0,85	0,21	13,62	5,60	1,30		7,28
DESCUENTO SUMIDERO	2,00	0,70	0,21	7,06	2,90	1,30		3,77


TOTAL ÍTEM	28,65

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

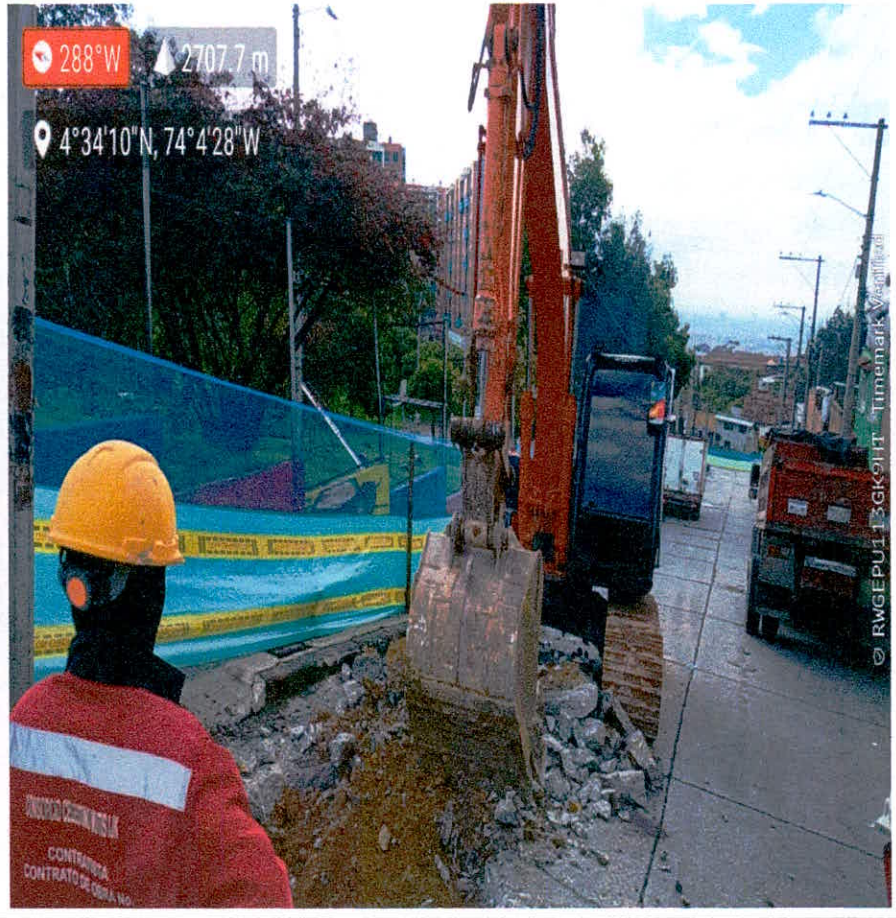


288°W
2707.7 m
4°34'10"N, 74°4'28"W
© RWGEPU113GK9IT Timemark Verified

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	2,811	DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	UNIDAD	KG

ESQUEMA

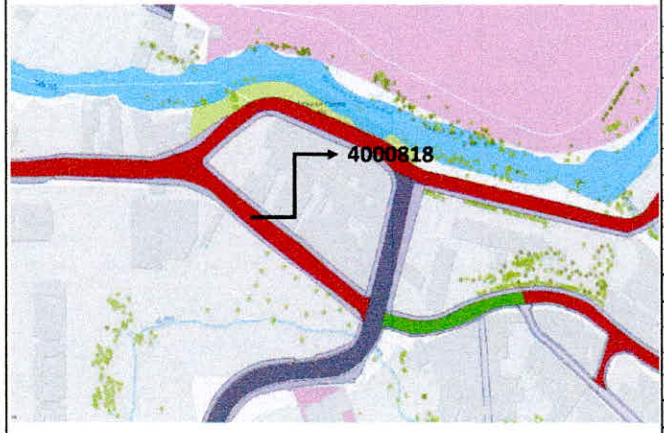

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION LONGITUD	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
ACERO EN LOSAS IRREGULARES 1	4,25 4,20	6,90	29,15	7,95	231,82	2,00		463,64
ACERO EN LOSAS IRREGULARES 2	6,55	6,90	45,20	7,95	359,39	2,00		718,78
ACERO EN LOSAS IRREGULARES 3	8,00	3,45	27,60	7,95	219,48	2,00		438,95
ACERO EN LOSAS IRREGULARES 4	7,00 6,24	6,90	45,68	7,95	363,23	2,00		726,46

DESCUENTOS	DIMENSION RADIO	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
POZOS EN LOSA IRREGULAR 1	0,85		7,13	7,95	56,70	4,00		226,82
POZOS EN LOSA IRREGULAR 2	0,85		7,13	7,95	56,70	2,00		113,41
POZOS EN LOSA IRREGULAR 3	0,85		7,13	7,95	56,70	2,00		113,41
POZOS EN LOSA IRREGULAR 4	0,85		7,13	7,95	56,70	4,00		226,82

DESCUENTOS	DIMENSION LONGITUD	ANCHO	AREA	PESO KG/M2	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
SUMIDEROS	1,20	0,90	1,08	7,95	8,59	8,00		68,71

TOTAL ÍTEM	1.598,66

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	2,012	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	**UNIDAD**	KG

ESQUEMA

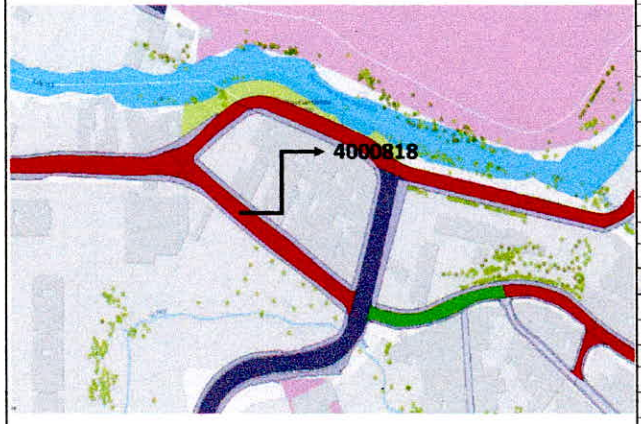

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION LONGITUD	CANTIDAD	LONG.TOTAL	PESO (KG)	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
CANASTILLAS	6,90	4,00	27,60	0,56	15,46	46,00		710,98
ATIESADORES DE CANASTILLA	0,35	4,00	1,40	0,56	0,78	46,00		36,06

DESCUENTOS	DIMENSION LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL

TOTAL ÍTEM	747,04

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
Foto 100% Real


Timemark
Foto 100% Real

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	2,046	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	**UNIDAD**	KG

ESQUEMA

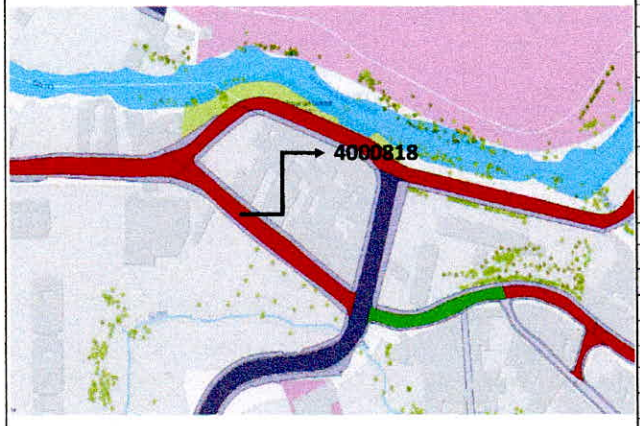

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN LONGITUD	CANTIDAD	LONG.TOTAL	PESO (KG/M)	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
DOVELAS	0,35	22,00	7,70	5,06	38,96	24,00		935,09

DESCUENTOS	DIMENSIÓN LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL

TOTAL ÍTEM 935,09

Wendy sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
Foto 100% Real


Timemark
Foto 100% Real

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	2,018	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	**UNIDAD**	ML

ESQUEMA

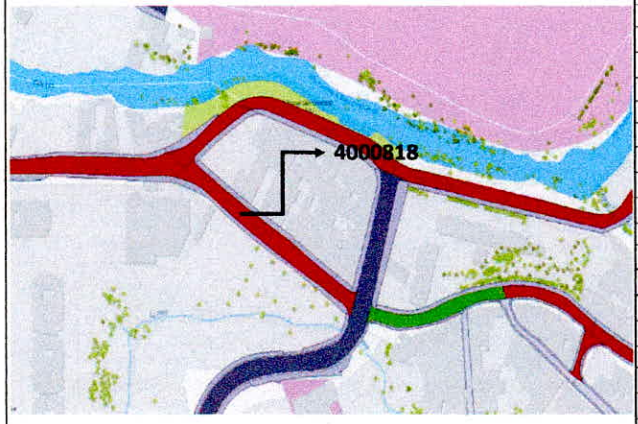

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	CANTIDAD	LONG.TOTAL	PESO (KG)	PESO TOTAL	CANTIDAD		
SELLO DE LOSAS TRANSVERSALES	6,90					24,00		165,60
SELLO DE LOSAS TRANSVERSALES	2,25					1,00		2,25
SELLO DE LOSAS TRANSVERSALES	0,28					1,00		0,28
SELLO DE LOSAS LONGITUDINAL	97,58					1,00		97,58

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		


TOTAL ÍTEM	265,71

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
10:38
08 de ene 2026
Jue

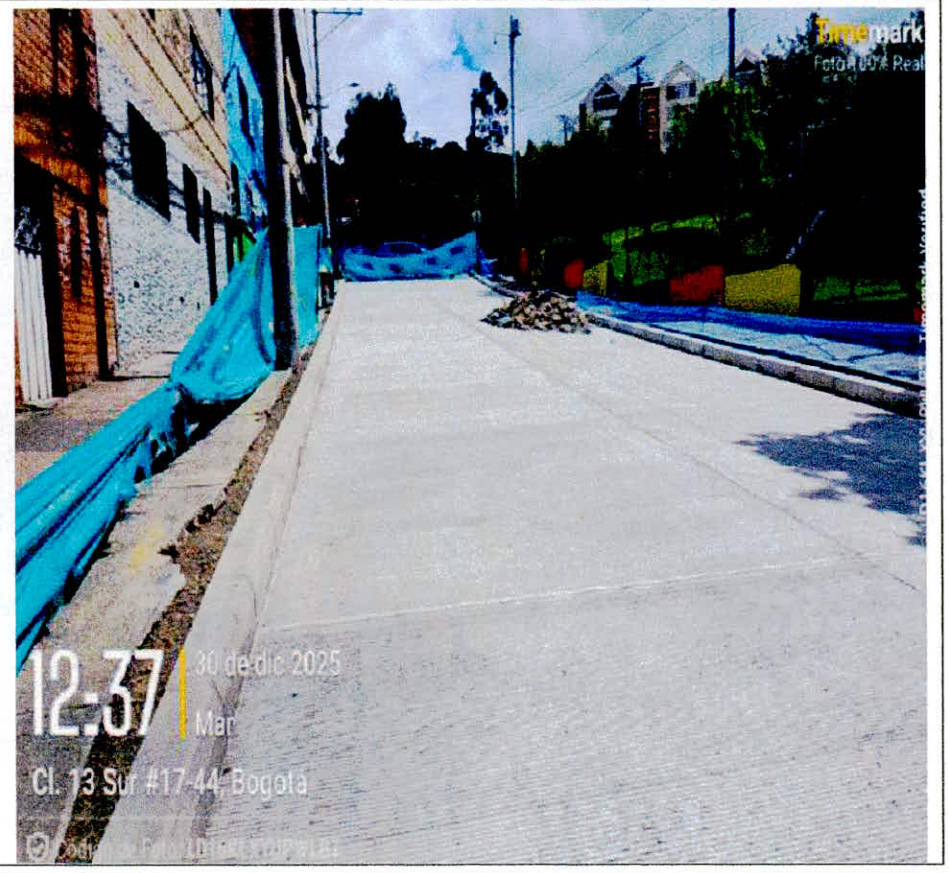
Timemark
12:37
30 de dic 2025
Mar
Cl. 13 Sur #17-44, Bogotá

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	2,019	**DESCRIPCIÓN ITEM**	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	**UNIDAD**	ML

ESQUEMA

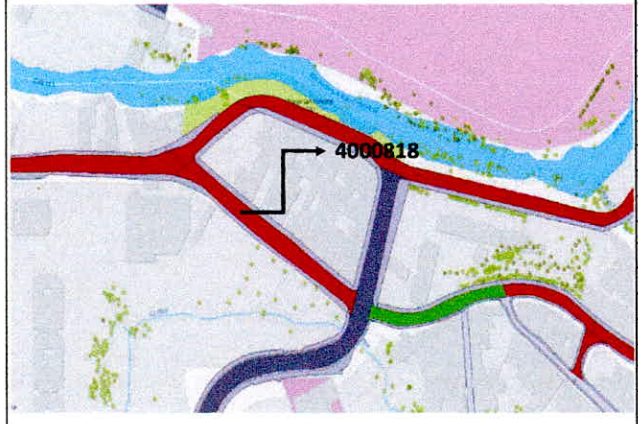

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	CANTIDAD	LONG.TOTAL	PESO (KG)	PESO TOTAL	CANTIDAD		
CORTE DE LOSAS TRANSVERSALES	6,90					24,00		165,60
CORTE DE LOSAS TRANSVERSALES	2,25					1,00		2,25
CORTE DE LOSAS TRANSVERSALES	0,28					1,00		0,28
CORTE DE LOSAS LONGITUDINAL	97,58					1,00		97,58

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	265,71

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SÁNCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark


Timemark

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 19 ESTE

# ÍTEM	2,034	DESCRIPCIÓN ÍTEM	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	UNIDAD	M2

ESQUEMA

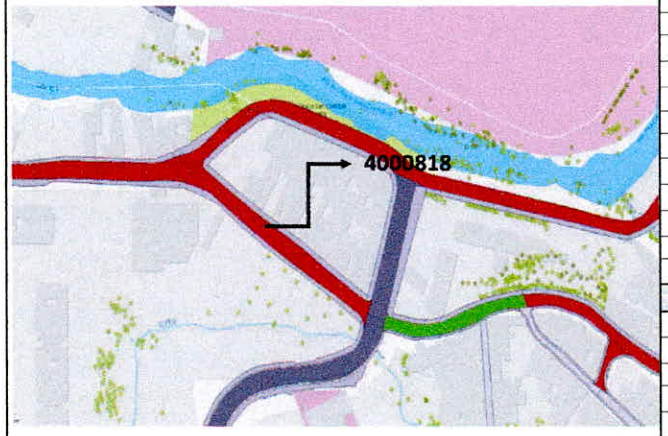

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
GEOTEXTIL	97,58	8,30		809,91			K0+018,35 - K0+115,93	809,91

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
GEOTEXTIL	90,00	7,30		657,00				657,00
DESCUENTO POZOS	0,85	0,85	0,21	13,62	5,6			13,62
DESCUENTO SUMIDERO	2,00	0,70	0,21	7,06	2,9			7,06

TOTAL ÍTEM 132,24

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
Timemark Verified
de sep 2025



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	2,035	DESCRIPCIÓN ITEM	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA

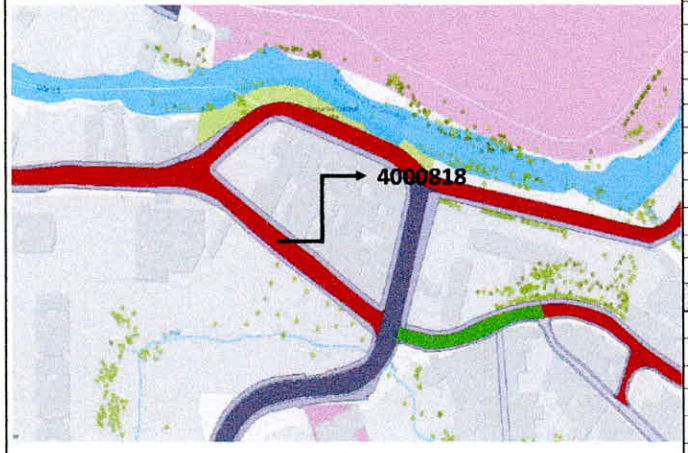

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
NIVELACIÓN DE SUBRASANTE	97,58	7,30		712,33			K0+018,35 - K0+115,93	712,33

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
NIVELACIÓN DE SUBRASANTE	90,00	7,30		657,00				657,00
DESCUENTO POZOS	0,85	0,85	0,21	13,62				13,62
DESCUENTO SUMIDERO	2,00	0,70	0,21	7,06				7,06

NOTA:


TOTAL ÍTEM 34,66

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

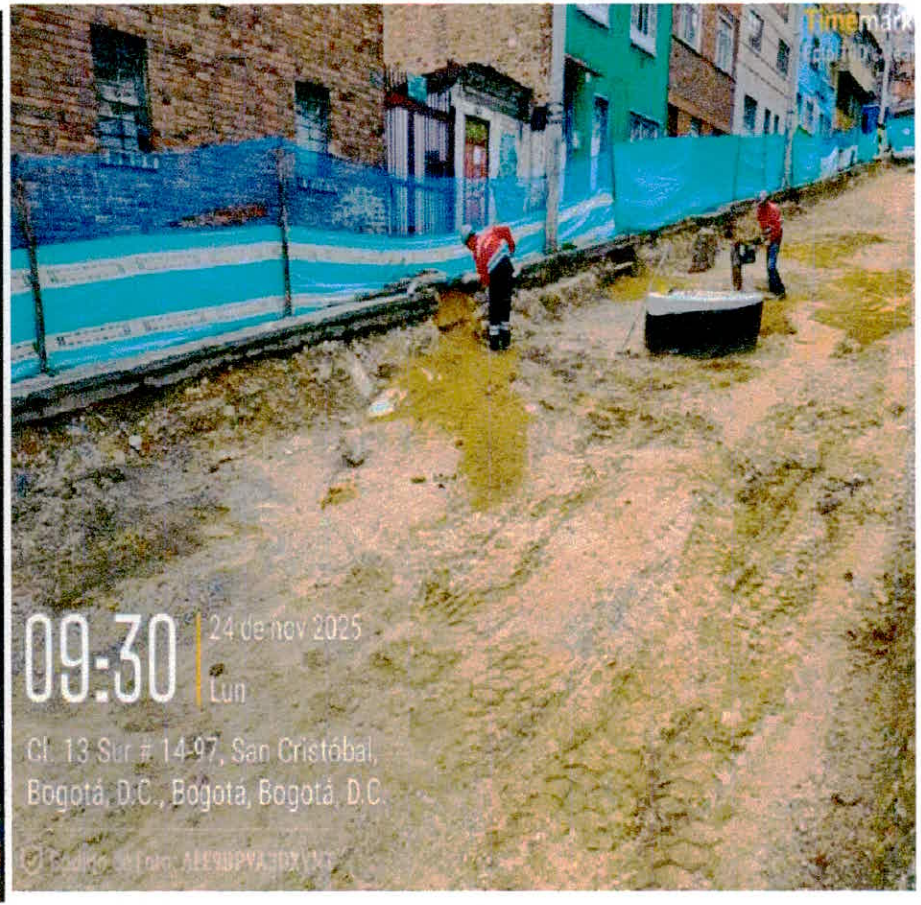


09:30
24 de nov 2025
Lun
Cl. 13 Sur # 14-97, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	2,036	DESCRIPCIÓN ÍTEM	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UNIDAD	M2

ESQUEMA

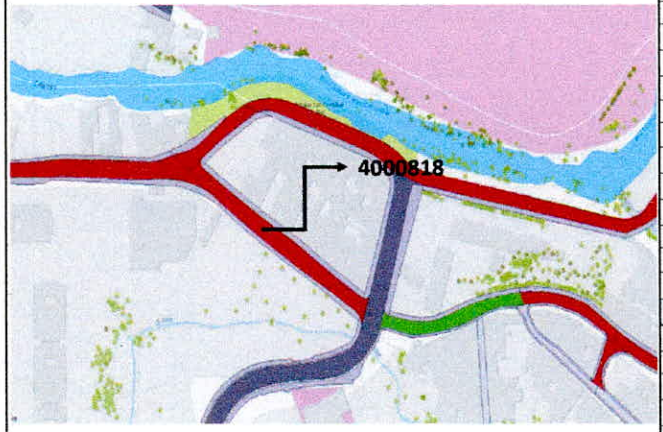

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
GEOCELDA	97,58	7,30		712,33			K0+018,35 - K0+115,93	712,33

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
GEOCELDA	90,00	7,30		657,00				657,00
DESCUENTO POZOS	0,85	0,85	0,21	13,62				13,62
DESCUENTO SUMIDERO	2,00	0,70	0,21	7,06				7,06

TOTAL ÍTEM 34,66

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


de sep 2025 08:52


25 nov 2025 8:20:20 a. m.
12-75 Carrera 11 Este
San Cristóbal
Bogotá

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	2,033	DESCRIPCIÓN ITEM	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	UNIDAD	M3

ESQUEMA

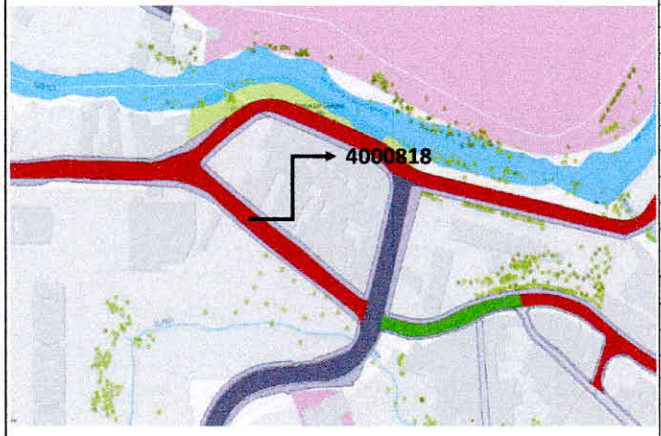

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	COMPACTACIÓN		
ESTIBILIZADA CAPA 1	97,58	7,30	0,11	712,33	78,36		K0+018,35 - K0+115,93	78,36
ESTIBILIZADA CAPA 2	90,00	6,90	0,09	621,00	55,89		K0+018,35 - K0+115,93	55,89
LLENO GEOCELDA	97,58	7,30	0,20	712,33	142,47		K0+018,35 - K0+115,93	142,47

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
ESTIBILIZADA	90,00	7,30	0,10		65,70			65,70
ESTIBILIZADA	90,00	6,90	0,10		62,10			62,10
DESCUENTO POZO	0,85	0,85		13,62	5,45			5,45
DESCUENTO SUMIDEROS	2,52	0,70		7,06	2,82			2,82
Lleno de la geocelda	90,00	7,30	0,20		131,40	1,25		164,25

TOTAL ÍTEM	- 23,60

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA




Timemark
CIV. 4000818
Mié, 26 de nov 2025 10:36
Weather –
Carrera 11 Este 12 S-79, 110411 Bogotá, D.C.
4.569455°N, 74.074550°W

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	6,009	DESCRIPCIÓN ÍTEM	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UNIDAD	UN

ESQUEMA

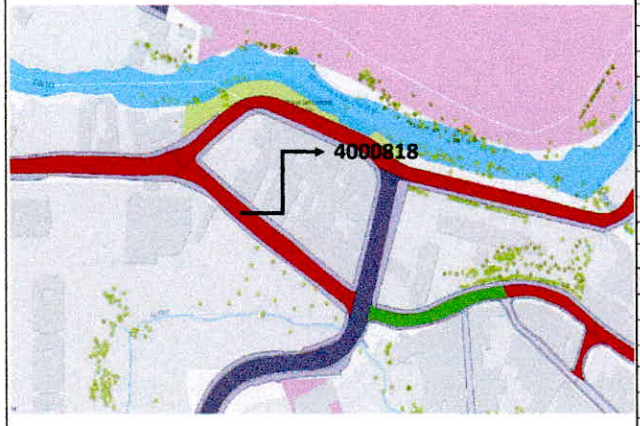

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN LONGITUD	CANTIDAD	LONG.TOTAL	PESO (KG)	PESO TOTAL	CANTIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
PLACA CUBIERTA						6,00		6,00


DESCUENTOS	DIMENSIÓN LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL


TOTAL ÍTEM	6,00

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

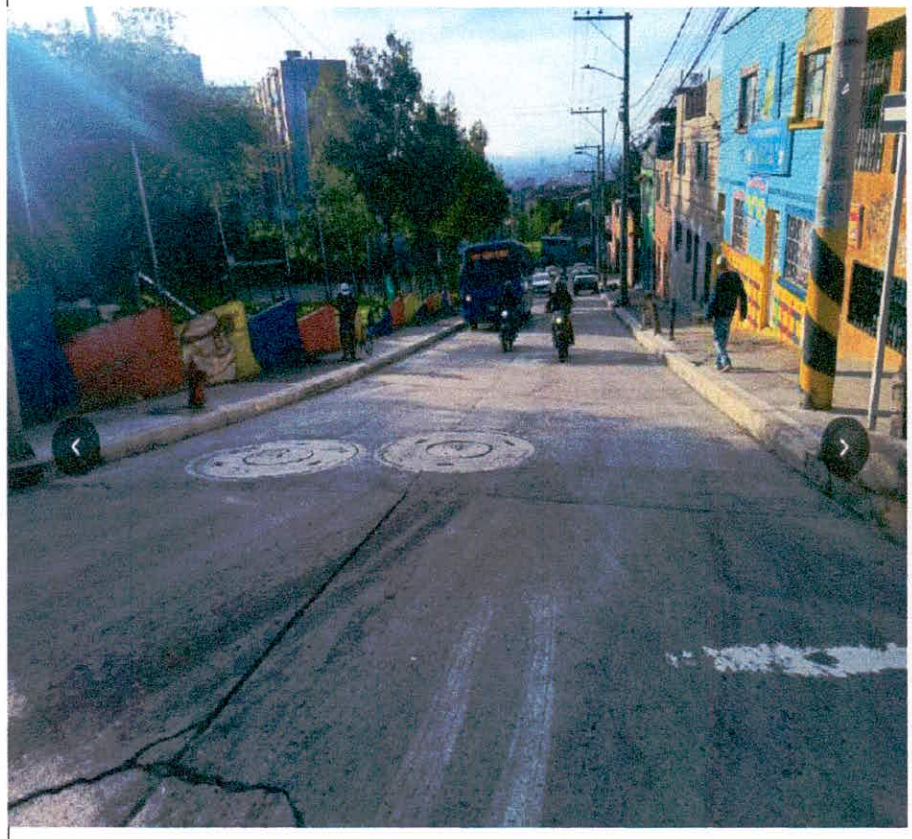

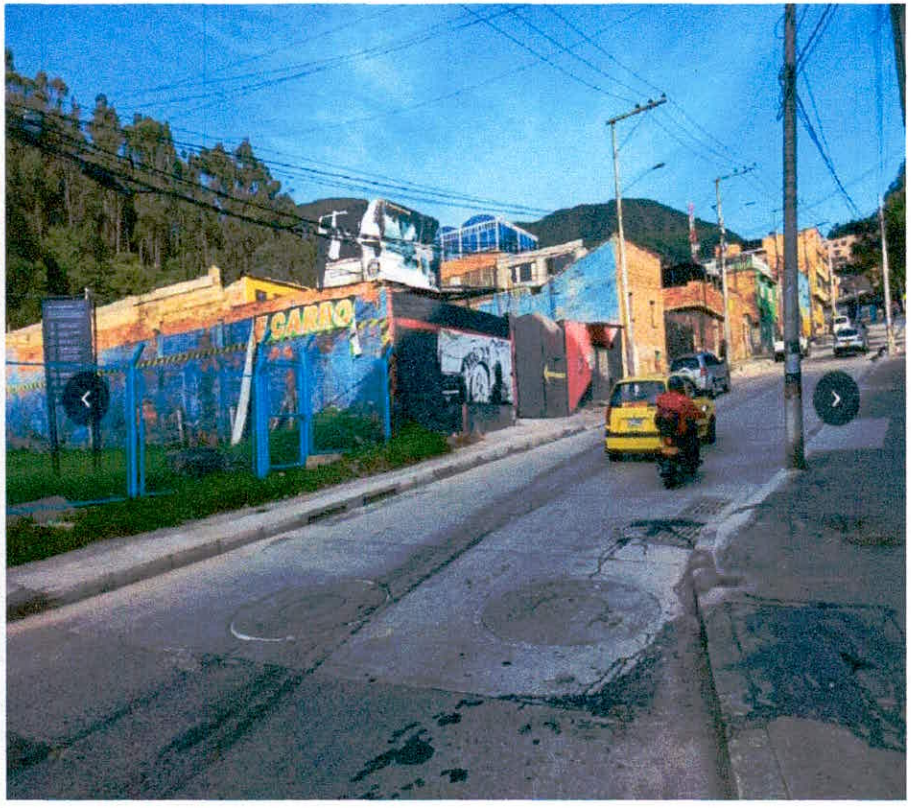
CARAO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	6,016	DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	ML

ESQUEMA

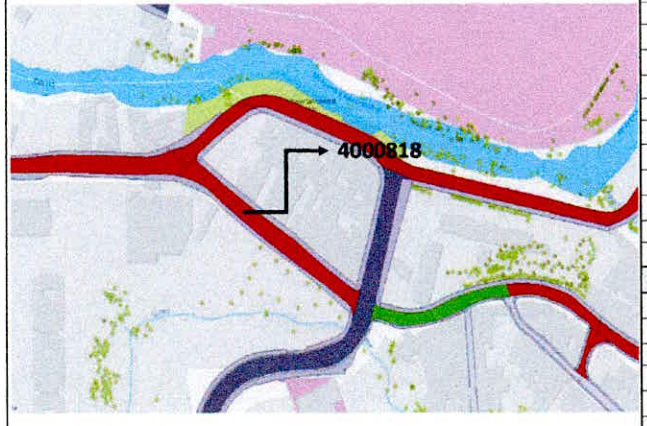

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	CANTIDAD	LONG.TOTAL	PESO (KG)	PESO TOTAL	CANTIDAD		
TUBERIA CONEXIÓN SUMIDERO	3,40						K0+000	3,40

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM 3,40

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
CIV. 4000818
Jue, 16 de oct 2025 15:53
Nublado 12°C
Carrera 18 Este # 12-58, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
4.569506°N, 74.074522°W


13:50
23 de oct 2025
Jue
Cl. 13 Sur # 17-28, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.
Coordenadas: 4.569875°N, 74.075087°W
Timemark

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	6,020	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	**UNIDAD**	ML

ESQUEMA

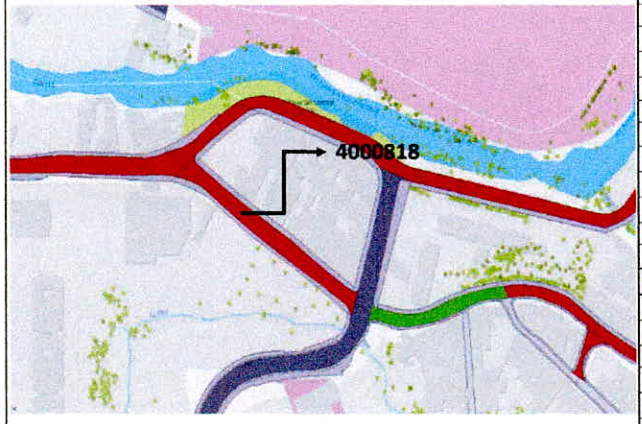

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	CANTIDAD	LONG.TOTAL	PESO (KG)	PESO TOTAL	CANTIDAD		
CARCAMO PROTECCION TUBERIA 8"	3,40						K0+000	3,40

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	3,40

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
11:10
06 de ene 2026
Mar
Cl. 13 Sur # 14-80, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.


Timemark
11:21
06 de ene 2026
Mar
Cl. 13 Sur # 14-80, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	NP-01	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.21M ACELERADO 7 DÍAS	UNIDAD	M2

ESQUEMA

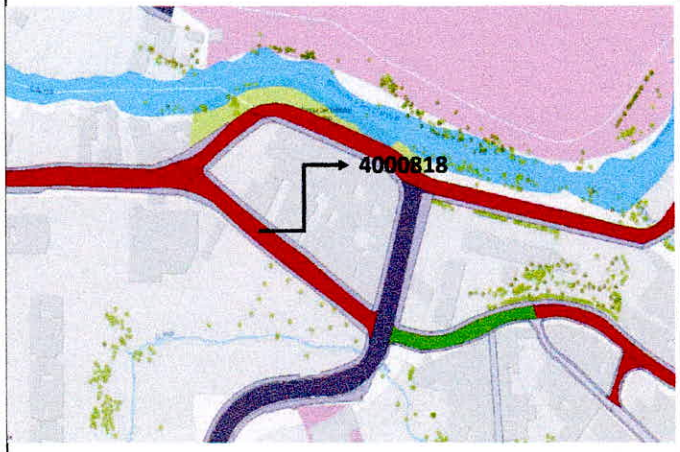

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	COMPACTACION		
CONCRETO	97,58	6,90		673,30	-		K0+018,35 - K0+115,93	673,30

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
CONCRETO	90,00	6,90		621,00	-			621,00
DESCUENTO POZO	0,85	0,85		13,62				13,62
DESCUENTO SUMIDEROS	2,52	0,70		7,06				7,06

TOTAL ÍTEM	31,63

Wendy Sánchez
WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL









MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4000818
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	CLL 13 SUR DESDE CR 17 ESTE HASTA CR 18 ESTE

# ÍTEM	NP-02	DESCRIPCIÓN ITEM	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	UNIDAD	M3

ESQUEMA

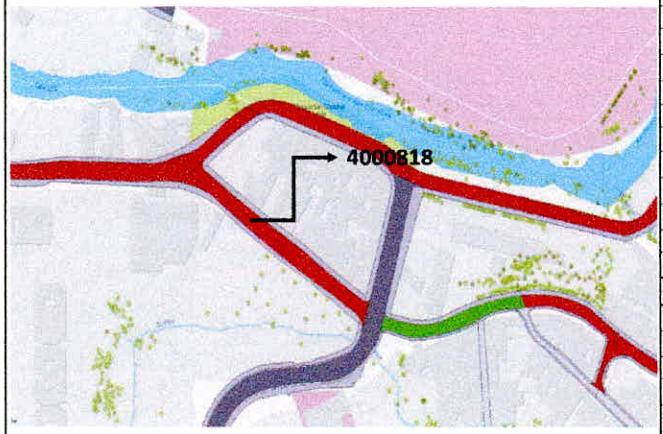

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	COMPACTACION	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
ESTIBILIZADA CAPA 1	97,58	7,30	0,11		78,36			78,36
ESTIBILIZADA CAPA 2	97,58	6,90	0,09		60,60			60,60

DESCUENTOS	DIMENSION LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
ESTIBILIZADA	90,00	7,30	0,10		65,70			65,70
ESTIBILIZADA	90,00	6,90	0,10		62,10			62,10
DESCUENTO POZO	0,85	0,85		13,62	2,72			2,72
DESCUENTO SUMIDEROS	2,52	0,70		7,06	1,41			1,41

TOTAL ÍTEM 7,03

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark


Timemark

ACTA PARCIAL N° 5

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001620 KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	1	**RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 1.287.864,00		$ -	-	$ -
3010	1,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	307,00	$35.050,00	$ 45.540,47	$ 13.980.924,00		$ -	-	$ -
3710	1,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	720,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 4.860.835,00		$ -	-	$ -
3017	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (60 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	748,80	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 40.416.869,00		$ -	-	$ -
4613	1,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	187,20	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 12.935.889,00		$ -	-	$ -
4015	1,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.218,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 19.500.143,00		$ -	-	$ -
4157	1,007	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$170.358,00	$ 221.346,15	$ 47.810.768,00		$ -	-	$ -
4743	1,008	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$164.610,00	$ 213.877,77	$ 30.798.399,00		$ -	-	$ -
4160	1,009	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	216,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 42.887.346,00		$ -	-	$ -
4747	1,010	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	144,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 28.591.564,00		$ -	-	$ -
4200	1,011	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,00	$1.002.096,00	$ 1.302.023,33	$ 1.302.023,00		$ -	-	$ -
4712	1,012	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	32,40	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 60.256.567,00		$ -	-	$ -
3864	1,013	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1.200,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 4.657.212,00		$ -	-	$ -
3867	1,014	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	3.116,95	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 13.878.843,00		$ -	-	$ -
4240	1,015	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	800,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 16.525.016,00		$ -	-	$ -
4246	1,016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	8,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 1.652.460,00		$ -	-	$ -
4248	1,017	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	40,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 6.885.250,00		$ -	-	$ -
6313	1,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	75,60	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 107.943.506,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001620 KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)		12 MESES
NIT:	901.896.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO		FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICIÓN 1	$0,00	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$	-
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$	-
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL		12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3007	2.001	REPLANTEO GENERAL	M2	10.200,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 10.946.844,00	183,23	$ 196.646,10	503,55	$ 540.419,93
3486	2.002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1.020,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 228.454.123,00	- 9,77	$ (2.187.588,94)	57,50	$ 12.879.184,42
3710	2.003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5.100,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 34.430.916,00	156,48	$ 1.056.421,52	156,48	$ 1.056.421,52
3017	2.004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	5.967,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 322.071.926,00	234,46	$ 12.655.100,42	326,67	$ 17.632.183,12
4613	2.005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	663,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 45.814.606,00		$ -	-	$ -
4015	2.006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.100,00	$12.322,00	$ 16.009,97	$ 81.650.847,00		$ -	-	$ -
4161	2.007	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$146.967,00	$ 190.954,22	$ 175.295.974,00		$ -	-	$ -
4746	2.008	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 121.514.148,00		$ -	-	$ -
4158	2.009	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	918,00	$161.586,00	$ 209.948,69	$ 192.732.867,00		$ -	-	$ -
4744	2.01	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	612,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 137.439.845,00		$ -	-	$ -
3708	2.011	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO. INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	KG	5.000,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 34.015.650,00		$ -	-	$ -
5404	2.012	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2.000,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 21.890.600,00		$ -	-	$ -
4959	2.013	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	20.000,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 203.964.200,00		$ -	-	$ -
4238	2.014	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	137,95	$6.866,00	$ 8.920,99	$ 1.230.651,00		$ -	-	$ -
3806	2.015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	5.100,00	$2.404,00	$ 3.123,52	$ 15.929.952,00		$ -	-	$ -
3204	2.016	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	1.620,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.596.471.395,00		$ -	-	$ -
3394	2.017	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	408,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 395.717.146,00		$ -	-	$ -
3837	2.018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	6.900,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 116.045.166,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001620 KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICION 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
3811	2.019	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE, INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	5.200,00	$2.397,00	$ 3.114,42	$ 16.194.984,00		$ -	-	$ -
3872	2,02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$2.367,00	$ 3.075,44	$ 10.456.496,00		$ -	-	$ -
3180	2.021	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0,15M (E=15 MILS. ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO, INC MICROESF.)	ML	500,00	$6.520,00	$ 8.471,44	$ 4.235.720,00		$ -	-	$ -
3178	2.022	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, INCL. MICROESFERAS)	M2	600,00	$37.459,00	$ 48.670,48	$ 29.202.288,00		$ -	-	$ -
4244	2.023	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	UN	34,00	$200.044,00	$ 259.917,17	$ 8.837.184,00		$ -	-	$ -
4245	2.024	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	UN	34,00	$288.806,00	$ 375.245,64	$ 12.758.352,00		$ -	-	$ -
4246	2.025	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	34,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 7.022.956,00		$ -	-	$ -
5225	2.026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$4.038,00	$ 5.246,57	$ 5.246.570,00		$ -	-	$ -
5226	2.027	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1.000,00	$5.455,00	$ 7.087,68	$ 7.087.680,00		$ -	-	$ -
5227	2.028	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	600,00	$24.667,00	$ 32.049,83	$ 19.229.898,00		$ -	-	$ -
4569	2.029	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	7.000,00	$10.112,00	$ 13.138,52	$ 91.969.640,00		$ -	-	$ -
4240	2.03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3.400,00	$15.898,00	$ 20.656,27	$ 70.231.318,00		$ -	-	$ -
4246	2.031	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA, INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	68,00	$158.976,00	$ 206.557,52	$ 14.045.911,00		$ -	-	$ -
4247	2.032	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	1,00	$132.480,00	$ 172.131,26	$ 172.131,00		$ -	-	$ -
8617	2.033	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	306,00	$179.000,00	$ 232.574,70	$ 71.167.858,00	131,15	$ 30.502.288,19	131,15	$ 30.502.288,19
4034	2.034	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	2.550,00	$29.125,00	$ 37.842,11	$ 96.497.361,00	377,22	$ 14.274.838,58	377,22	$ 14.274.838,58
3800	2.035	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	11.400,00	$1.605,00	$ 2.085,38	$ 23.773.332,00	332,22	$ 692.807,03	332,22	$ 692.807,03
7900	2.036	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	7.980,00	$69.333,00	$ 90.084,37	$ 718.873.273,00	332,22	$ 29.927.919,49	332,22	$ 29.927.919,49
4262	2.037	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	9.120,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 61.570.579,00	71,53	$ 482.912,74	71,53	$ 482.912,74
4848	2.038	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	1.700,00	$9.316,00	$ 12.106,88	$ 20.581.696,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001620 KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
7893	2,039	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	40,00	$250.490,00	$ 325.461,66	$ 13.018.466,00		$ -	-	$ -
7512	2,04	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1,50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	40,00	$558.003,00	$ 725.013,30	$ 29.000.532,00		$ -	-	$ -
4878	2,041	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$112.143,00	$ 145.707,40	$ 72.853.700,00		$ -	-	$ -
3879	2,042	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	40,00	$1.063.572,00	$ 1.381.869,10	$ 55.275.964,00		$ -	-	$ -
3011	2,043	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	1.700,00	$5.521,00	$ 7.173,44	$ 12.194.848,00	- 1,52	$ (10.903,63)	90,00	$ 645.606,60
6216	2,044	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)	M3	1.000,00	$68.053,00	$ 88.421,26	$ 88.421.260,00		$ -	-	$ -
4558	2,045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	20,00	$6.960.739,00	$ 9.044.088,18	$ 180.881.764,00		$ -	-	$ -
7713	2,046	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	10.000,00	$7.401,00	$ 9.616,12	$ 96.161.200,00		$ -	-	$ -
4879	2,047	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	500,00	$198.856,00	$ 258.373,60	$ 129.186.800,00		$ -	-	$ -
7432	2,048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$574.835,00	$ 746.883,12	$ 74.688.312,00		$ -	-	$ -
7435	2,049	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	$1.493.142,00	$ 1.940.039,40	$ 194.003.940,00		$ -	-	$ -
5220	2,05	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	100,00	$12.446,00	$ 16.171,09	$ 1.617.109,00		$ -	-	$ -
8566	2,051	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE. SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2	1.100,00	$105.843,00	$ 137.521,81	$ 151.273.991,00		$ -	-	$ -
5241	2,052	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	5.000,00	$15.143,00	$ 19.675,30	$ 98.376.500,00		$ -	-	$ -
6564	2,053	BANDA SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	100,00	$637.895,00	$ 828.816,97	$ 82.881.697,00		$ -	-	$ -
3046	2,054	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRIGADO/INT LISO U.M. NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	200,00	$242.177,00	$ 314.660,58	$ 62.932.116,00		$ -	-	$ -
7831	2,055	CONEXIÓN KIT SILLA YEE 400X200 PVC SUMINISTRO E INSTALCION	UN	100,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 37.851.467,00		$ -	-	$ -
6542	2,056	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	100,00	$68.040,00	$ 88.404,37	$ 8.840.437,00		$ -	-	$ -
3007	3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001620 KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4515	3,002	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M, (INCLUYE DEMOLICION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	22,95	$233.920,00	$ 303.932,26	$ 6.975.245,00		$ -	-	$ -
3710	3,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	30,00	$5.196,00	$ 6.751,16	$ 202.535,00		$ -	-	$ -
3017	3,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -
4613	3,005	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3021	3,006	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE, INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100,00	$6.629,00	$ 8.613,06	$ 861.306,00		$ -	-	$ -
4487	3,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	30,00	$165.865,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -
4180	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1,00	$152.815,00	$ 198.552,53	$ 198.553,00		$ -	-	$ -
8613	3,009	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación Mecanica) Incluye: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	10,00	$1.098.918,00	$ 1.427.824,16	$ 14.278.242,00		$ -	-	$ -
4712	3,010	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	3,00	$1.431.411,00	$ 1.859.832,31	$ 5.579.497,00		$ -	-	$ -
3864	3,011	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$2.987,00	$ 3.881,01	$ 388.101,00		$ -	-	$ -
3867	3,012	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100,00	$3.427,00	$ 4.452,70	$ 445.270,00		$ -	-	$ -
4758	3,013	SELLO DE FISURAS	ML	200,00	$7.858,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
4598	3,014	SELLO DE GRIETAS	ML	200,00	$9.181,00	$ 11.928,87	$ 2.385.774,00		$ -	-	$ -
3723	3,015	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3724	3,016	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	1,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 119.426,00		$ -	-	$ -
3007	4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	100,00	$826,00	$ 1.073,22	$ 107.322,00		$ -	-	$ -
3464	4,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	30,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 1.546.999,00		$ -	-	$ -
3017	4,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	39,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 2.105.045,00		$ -	-	$ -
4613	4,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 69.102,00		$ -	-	$ -
3486	4,005	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	20,00	$172.381,00	$ 223.974,63	$ 4.479.493,00		$ -	-	$ -
4487	4,006	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	30,00	$165.865,00	$ 215.248,53	$ 6.457.456,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001620 KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**		**12 MESES**
NIT:	901.886.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**		**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**		**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$**	**-**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$**	**-**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**		**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4744	4,007	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	$172.843,00	$ 224.574,91	$ 224.575,00		$ -	-	$ -
3748	4,008	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	500,00	$5.236,00	$ 6.803,13	$ 3.401.565,00		$ -	-	$ -
3708	4,009	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	200,00	$8.424,00	$ 10.945,30	$ 2.189.060,00		$ -	-	$ -
5404	4,010	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	200,00	$7.849,00	$ 10.198,21	$ 2.039.642,00		$ -	-	$ -
4956	4,011	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	2,00	$758.467,00	$ 985.476,17	$ 1.970.952,00		$ -	-	$ -
4758	4,012	SELLO DE FISURAS	ML	20,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 19.397.899,00		$ -	-	$ -
3837	4,013	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	200,00	$7.856,00	$ 10.207,30	$ 2.041.460,00		$ -	-	$ -
3723	4,014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	200,00	$12.944,00	$ 16.818,14	$ 3.363.628,00		$ -	-	$ -
3724	4,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3434	4,016	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suministro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	4,00	$91.916,00	$ 119.426,46	$ 477.706,00		$ -	-	$ -
3012	5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	3.800,00	$7.379,00	$ 9.587,53	$ 36.432.614,00		$ -	-	$ -
3464	5,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1.140,00	$39.688,00	$ 51.566,62	$ 58.785.947,00		$ -	-	$ -
3017	5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.482,00	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 79.991.721,00		$ -	-	$ -
4757	5,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	444,60	$103.143,00	$ 134.013,70	$ 59.582.491,00		$ -	-	$ -
3425	5,005	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	3.800,00	$75.625,00	$ 98.259,56	$ 373.386.328,00		$ -	-	$ -
3384	5,006	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	171,00	$746.475,00	$ 969.894,97	$ 165.882.040,00		$ -	-	$ -
3621	5,01	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	20,00	$895.086,00	$ 1.162.985,24	$ 23.259.705,00		$ -	-	$ -
5181	5,011	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	ML	1.520,00	$57.377,00	$ 74.549,94	$ 113.315.909,00		$ -	-	$ -
4054	5,012	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.520,00	$75.643,00	$ 98.282,95	$ 149.390.084,00	72,00	$ 7.076.372,40	72,00	$ 7.076.372,40
3210	5,013	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	760,00	$63.543,00	$ 82.561,42	$ 62.746.679,00		$ -	-	$ -
9997	5,014	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	3.800,00	$2.980,00	$ 3.845,93	$ 14.614.534,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001620 KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	**CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL**	**VR. INICIAL**	**$10.791.127.273,00**	**PLAZO INICIAL (DÍAS)**	**12 MESES**
NIT:	901.896.421-0	**ANTICIPO**	**$0**	**FECHA DE INICIO**	**FEBRERO 24 DE 2025**
DIRECCION:		**VR. ADICIÓN 1**	**$0,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**FEBRERO 23 DE 2026**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA**	**VR. ADICIÓN 2**	**$0,00**	**PLAZO ADICIONAL (DÍAS)**	**$ -**
NIT:	901.902.570-6	**VR. TOTAL**	**$10.791.127.273,00**	**SUSPENSIONES (DÍAS)**	**$ -**
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			**PLAZO TOTAL**	**12 MESES**

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4089	5,015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	1.700,00	$58.921,00	$ 76.556,06	$ 130.145.302,00		$ -	-	$ -
5952	5,016	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	500,00	$298.002,00	$ 387.194,00	$ 193.597.000,00		$ -	-	$ -
3009	6,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	475,00	$39.688,00	$ 51.586,62	$ 24.494.145,00		$ -	-	$ -
3017	6,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	617,50	$41.542,00	$ 53.975,52	$ 33.329.884,00		$ -	-	$ -
4613	6,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	2,00	$53.184,00	$ 69.101,97	$ 138.204,00		$ -	-	$ -
3050	6,004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	10,00	$33.628,00	$ 43.692,86	$ 436.929,00		$ -	-	$ -
5412	6,005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	190,00	$148.309,00	$ 192.697,88	$ 36.612.597,00	6,90	$ 1.328.716,78	6,90	$ 1.328.716,78
4792	6,006	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	475,00	$90.368,00	$ 117.415,14	$ 55.772.192,00	63,32	$ 7.434.312,40	63,32	$ 7.434.312,40
4837	6,007	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	60,00	$195.775,00	$ 254.370,46	$ 15.262.228,00		$ -	-	$ -
3024	6,008	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	60,00	$143.400,00	$ 186.319,62	$ 11.179.177,00		$ -	-	$ -
3678	6,009	PLACA CUBIERTA D=1,70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	76,00	$1.772.907,00	$ 2.303.538,07	$ 175.068.893,00		$ -	-	$ -
3471	6,01	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	121,60	$676.767,00	$ 879.323,36	$ 106.925.721,00		$ -	-	$ -
3722	6,011	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0,15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	76,00	$121.375,00	$ 157.702,54	$ 11.985.393,00		$ -	-	$ -
4265	6,012	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$125.354,00	$ 162.872,45	$ 1.628.725,00		$ -	-	$ -
3937	6,013	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,00	$368.834,00	$ 479.226,02	$ 4.792.260,00		$ -	-	$ -
3041	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350,00	$29.100,00	$ 37.809,63	$ 13.233.371,00		$ -	-	$ -
3042	6,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1.200,00	$49.946,00	$ 64.894,84	$ 77.873.808,00		$ -	-	$ -
3043	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$69.231,00	$ 89.951,84	$ 35.980.736,00	41,97	$ 3.775.278,72	41,97	$ 3.775.278,72
3044	6,017	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	400,00	$97.705,00	$ 126.948,11	$ 50.779.244,00		$ -	-	$ -
3045	6,018	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	500,00	$136.670,00	$ 177.575,33	$ 88.787.665,00		$ -	-	$ -
3047	6,019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	49,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 19.734.202,00		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001620 KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)	12 MESES
NIT:	901.896.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO	FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICIÓN 1	$0,00	FECHA DE TERMINACION INICIAL	FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$ -
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$ -
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL	12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
4611	6,02	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.316,00	$ 231.685,98	$ 10.425.869,00		$ -	-	$ -
4612	6,021	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$178.926,00	$ 232.481,15	$ 10.461.652,00		$ -	-	$ -
4614	6,022	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$179.530,00	$ 233.263,33	$ 10.496.850,00		$ -	-	$ -
4615	6,023	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	45,00	$230.292,00	$ 299.218,40	$ 13.464.828,00		$ -	-	$ -
4982	6,024	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	UN	45,00	$177.746,00	$ 230.945,38	$ 10.392.542,00		$ -	-	$ -
5015	6,025	CAJA DE INSPECCION 0.80X0,6M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	45,00	$558.245,00	$ 725.327,73	$ 32.639.748,00		$ -	-	$ -
7830	6,026	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	250,00	$214.063,00	$ 278.132,06	$ 69.533.015,00		$ -	-	$ -
7831	6,027	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	255,00	$291.322,00	$ 378.514,67	$ 96.521.241,00		$ -	-	$ -
8970	6,028	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	97,00	$283.252,00	$ 368.029,32	$ 35.698.844,00		$ -	-	$ -
3047	6,029	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	50,00	$309.966,00	$ 402.738,82	$ 20.136.941,00		$ -	-	$ -
	7	NO PREVISTO									
	NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0,21M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$225.987,00	$293.624,91	$ -	321,75	$ 94.473.814,79	321,75	$ 94.473.814,79
	NP-02	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	M3		$369.623,00	$480.251,16	$ -	63,20	$ 30.352.113,44	63,20	$ 30.352.113,44
	NP-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.22M ACELERADO 7 DÍAS	M2		$238.867,00	$310.359,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0,25M acelerado 7 dias	M2		$264.493,00	$343.655,75	$ -		$ -	-	$ -
	NP-05	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$57.303,00	$74.453,79	$ -	158,96	$ 11.834.898,98	158,96	$ 11.834.898,98
	NP-06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.18M acelerado 7 días	M2		$201.230,00	$261.458,14	$ -		$ -	-	$ -
	NP-07	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$205.185,00	$266.596,87	$ -		$ -	-	$ -
	NP-08	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN		$5.078.246,00	$6.598.167,63	$ -		$ -	-	$ -
	NP-09	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.930.270,00	$2.507.999,81	$ -		$ -	-	$ -
	NP-10	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.203.970,00	$2.863.618,22	$ -		$ -	-	$ -
	NP-11	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$257.718,00	$334.853,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-12	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$573.534,00	$745.192,73	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001620 KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)		12 MESES
NIT:	901.896.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO		FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICION 1	$0,00	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$	-
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$	-
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL		12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-13	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$276.165,00	$358.821,18	$ -		$ -	-	$ -
	NP-14	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)	UN		$7.767.377,00	$10.092.152,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-15	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD EL 12"X4"=1 UN, UZ U.M PVC D=12"=1 UN, UZ U.M PVC D=4"=1 UN, UR U.M PVC D=12"=1 UN, UR U.M PVC D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$5.460.638,00	$7.095.006,95	$ -		$ -	-	$ -
	NP-16	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD 4"X4" PARA AC=1 UN, UG HD D=4"=3 UN, ADAPTADOR U.S. D=4"=1 UN, UR HD D=4"=1 UN (Suministro e instalación).	UN		$1.302.235,00	$1.691.993,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-17	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN		$8.105.183,00	$10.531.064,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-18	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN		$464.663,00	$603.736,64	$ -		$ -	-	$ -
	NP-19	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN		$1.380.400,00	$1.793.553,72	$ -		$ -	-	$ -
	NP-20	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$197.855,00	$257.073,00	$ -		$ -	-	$ -
	NP-21	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.314.441,00	$3.007.153,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-22	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.284.691,00	$2.968.499,02	$ -		$ -	-	$ -
	NP-23	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$418.527,00	$543.792,13	$ -		$ -	-	$ -
	NP-24	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$530.942,00	$689.852,94	$ -		$ -	-	$ -
	NP-25	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$74.860,00	$97.265,60	$ -		$ -	-	$ -
	NP-26	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.210.133,00	$1.572.325,81	$ -		$ -	-	$ -
	NP-27	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$229.605,00	$298.325,78	$ -		$ -	-	$ -
	NP-28	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$215.325,00	$279.771,77	$ -		$ -	-	$ -
	NP-29	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.241.418,00	$1.612.974,41	$ -		$ -	-	$ -
	NP-30	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$196.182,00	$254.899,27	$ -		$ -	-	$ -
	NP-31	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.244.646,00	$1.617.168,55	$ -		$ -	-	$ -
	NP-32	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$75.683,00	$98.334,92	$ -		$ -	-	$ -
	NP-33	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$108.935,00	$141.539,25	$ -		$ -	-	$ -
	NP-34	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.562.482,00	$2.030.132,86	$ -		$ -	-	$ -
	NP-35	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$81.588,00	$106.007,29	$ -		$ -	-	$ -
	NP-36	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$123.986,00	$161.095,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-37	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$7.587.734,00	$9.858.742,79	$ -		$ -	-	$ -

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ACTA PARCIAL N° 5

BOGOTÁ

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PERIODO DE ACTA CORRESPONDE A: 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE ENERO 2026

CIV 4001620 KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S (SAN PEDRO)

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	VR. INICIAL	$10.791.127.273,00	PLAZO INICIAL (DÍAS)	12 MESES
NIT:	901.896.421-0	ANTICIPO	$0	FECHA DE INICIO	FEBRERO 24 DE 2025
DIRECCION:		VR. ADICION 1	$0,00	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	FEBRERO 23 DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	VR. ADICIÓN 2	$0,00	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	$ -
NIT:	901.902.570-6	VR. TOTAL	$10.791.127.273,00	SUSPENSIONES (DÍAS)	$ -
DIRECCIÓN:	Calle 124 No. 15- 29 oficina 409			PLAZO TOTAL	12 MESES

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA 5		ACUMULADO	
				Cantidad Total	Valor Unitario	Valor Unitario (CON AIU)	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial	Cantidad Total	Valor Parcial
	NP-38	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$2.244.588,00	$2.916.393,19	$ -		$ -	-	$ -
	NP-39	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$1.187.868,00	$1.543.396,89	$ -		$ -	-	$ -
	NP-40	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$729.696,00	$948.094,01	$ -		$ -	-	$ -
	NP-41	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$1.725.500,00	$2.241.942,15	$ -		$ -	-	$ -
		(A) VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUIDO A.I.U.) (A)					$ 9.497.976.346,00		$ 243.865.949,00		$ 264.910.092,00
(B) VALOR FIJO 1		COSTOS TOTALES PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U (B)	UN	1,00			$ 499.093.537,00	2,26%	$ 11.278.888	2,45%	$ 12.252.188
(C) VALOR FIJO 2		COSTOS TOTALES ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA) (C)	UN	1,00			$ 241.107.411,00		$ -	-	$ -
(D) VALOR FIJO 3		OBRAS COMPLEMENTATIOS Y/O AJUSTES	UN	1,00			$ 552.949.979,00			-	$ -
		VALOR TOTAL PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCION [(A) + (B) + (C) + (D)] =					$ 10.791.127.273,00		$ 255.144.837,00		$ 277.162.280,00
		VALOR A PAGAR							$ 255.144.837,00		$ 277.162.280,00

DANIEL EDUARDO RABÓN JAIMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

GERMAN RAMIREZ BARBOSA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	2,001	DESCRIPCIÓN ÍTEM	REPLANTEO GENERAL	UNIDAD	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
REPLANTEO GENERAL	45,00	11,19		503,55			K0+006.4 A K0+051.40	503,55

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
REPLANTEO GENERAL	45,76	7,00		320,32			K0+00 A K0+45,76	320,32

TOTAL ÍTEM 183,23

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


30



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	2,002	DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	UNIDAD	M3

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	45,00	7,20	0,18	324,00	58,32		K0+006.4 A K0+051.40	58,32

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	45,76	7,00	0,21	320,32	67,27		K0+00 A K0+45,76	67,27
DEDSCUENTO 2 POZOS	0,85	0,85		4,54	0,82			0,82

NOTA:

TOTAL ÍTEM	-	9,77

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SÁNCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA




Timemark
13:56
14 de ene 2026
Mié
Cra 1 # 27-3, San Cristobal, Bogota, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	2,003	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD	M3

ESQUEMA

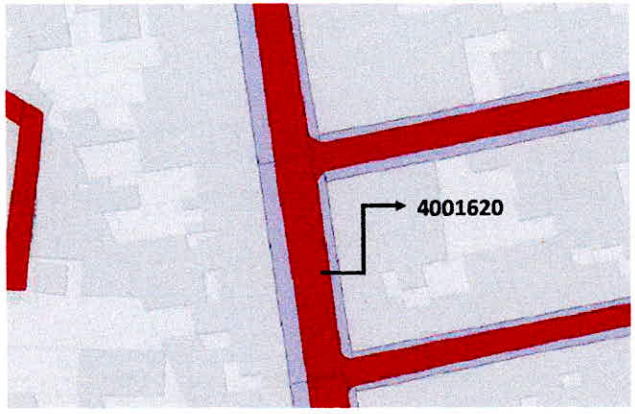

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
EXCAVACION MECANICA CAJA	45,00	7,55	0,47	339,75	159,68		K0+006.4 A K0+051.40	159,68

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DEDSCUENTO 3 POZOS	0,85	0,85	0,47	4,54	3,20			3,20

TOTAL ÍTEM	156,48

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL



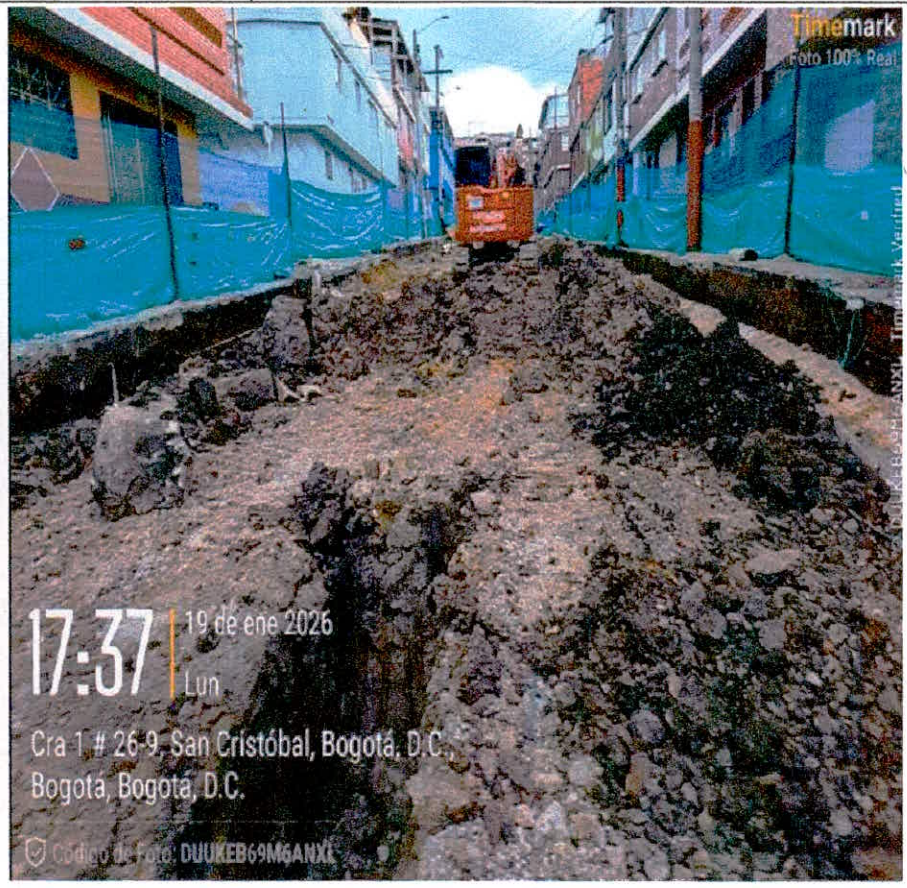

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	2,004	DESCRIPCIÓN ÍTEM	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (80 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	EXPANSIÓN		
TRANSPORTE DEMOLICIÓN	45,00	7,20	0,18	324,00	58,32	1,30	K0+00 A K0+45,76	75,82
TRANSPORTE DE DEM SARDINEL	45,00	0,20	0,20	9,00	1,80	1,30	K0+00 A K0+45,76	2,34
EXCAVACION MECANICA TUBERIA 8"	21,40	0,90	2,027	19,26	39,04	1,30	K0+005.7 - K0+027.10	50,75
EXCAVACION MECANICA TUBERIA 8"	20,57	0,90	1,755	18,51	32,49	1,30	K0+028.30 - K0+048.87	42,24
EXCAVACION MECANICA CAJA	45,00	7,55	0,47	339,75	159,68		K0+006.4 A K0+051.40	159,68

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
TRANSPORTE DEMOLICIÓN	45,76	7,00	0,21	320,32	67,2672	1,30	K0+00 A K0+45,76	87,45
TRANSPORTE DE SARDINEL	91,52	0,20	0,20	18,30	3,6608	1,30	K0+00 A K0+45,76	4,76
DEDSCUENTO 3 POZOS	0,85	0,85	0,47	4,54	3,20	1,30		4,16

TOTAL ÍTEM	234,46

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
FOTON


Timemark
Timemark Verified

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTÓBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	2,037	DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
EXCAVACION MECANICA TUBERIA 8"	21,40	0,90	2,027	19,26	39,04		K0+005.7 - K0+027.10	39,04
EXCAVACION MECANICA TUBERIA 8"	20,57	0,90	1,755	18,51	32,49		K0+028.30 - K0+048.87	32,49

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		


TOTAL ÍTEM	71,53

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
17:37
19 de ene 2026
Lun
Cra 1 # 26-9, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

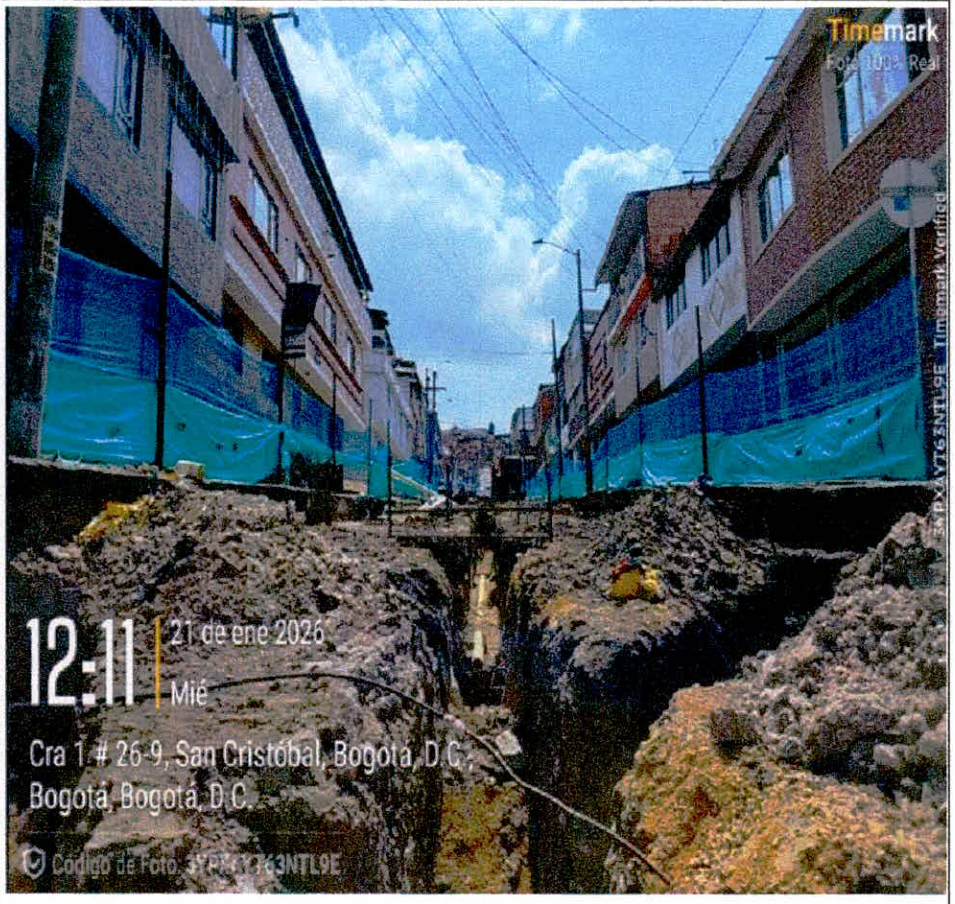
Timemark
12:11
21 de ene 2026
Mié
Cra 1 # 26-9, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	**CONTRATO No:**	1136 DE 2024	**CIV**	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	**CONTRATO No:**	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			**DIRECCIÓN**	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	2,043	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	**UNIDAD**	ML

ESQUEMA

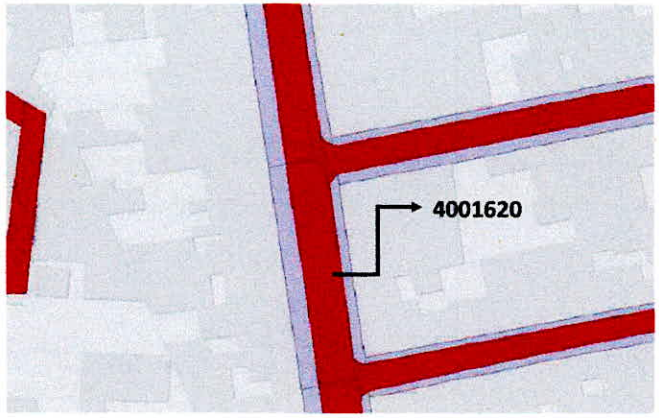

NOTA:


DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
DEMOLICIÓN DE SARDINEL	45,00					2,00	K0+006.4 A K0+051.4	90,00


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DEMOLICIÓN DE SARDINEL	45,76					2,00	K0+07 - K0+036	91,52

TOTAL ÍTEM	-	1,52

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

IVAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

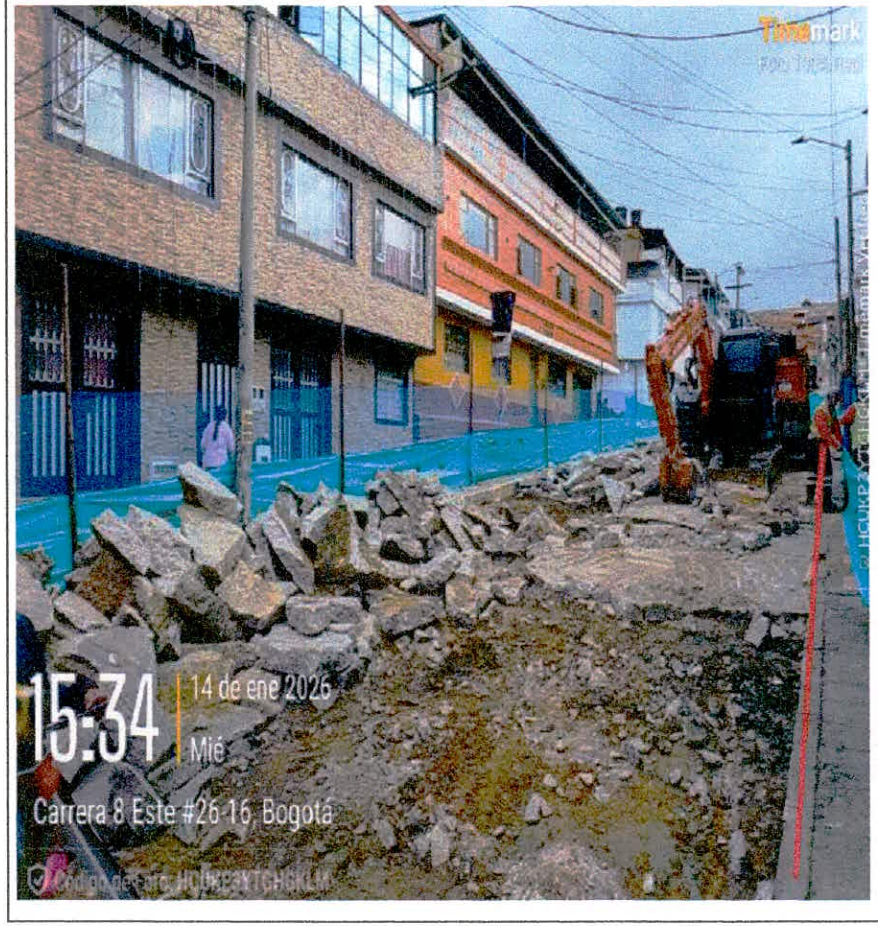
Timemark
15:34
14 de ene 2026
Mié
Carrera 8 Este #26-16, Bogotá

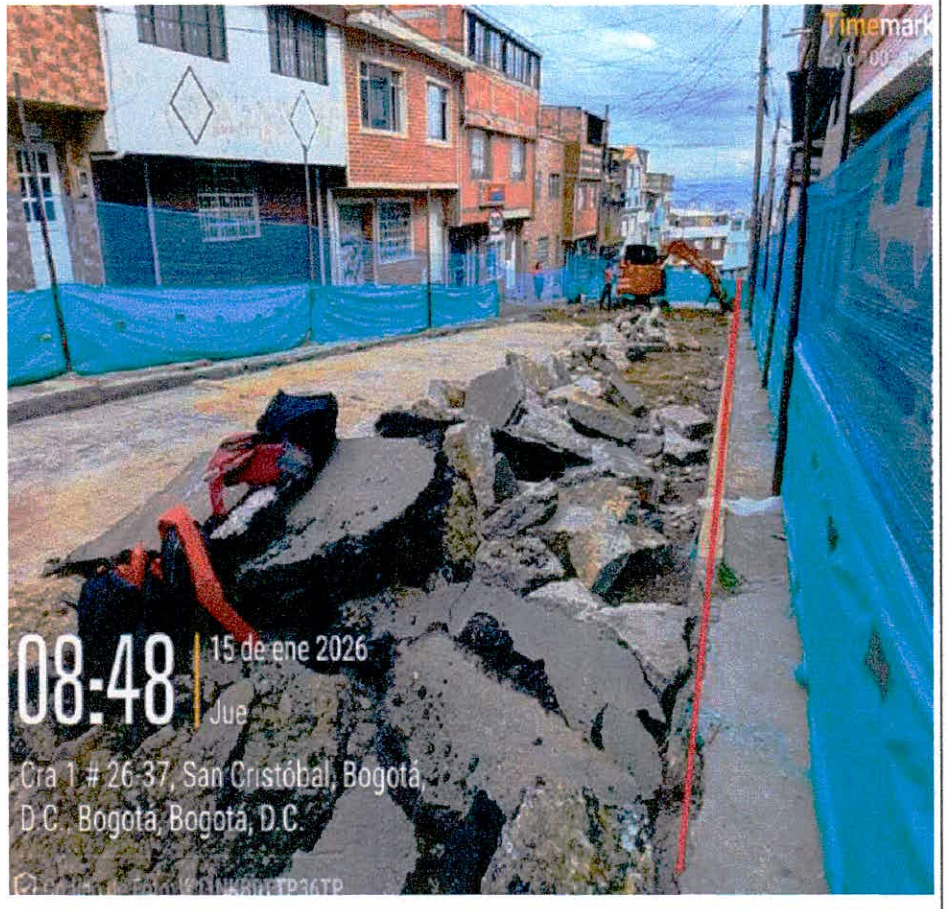
Timemark
08:48
15 de ene 2026
Jue
Cra 1 # 26-37, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	2,033	DESCRIPCIÓN ÍTEM	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	UNIDAD	M3

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
LLENO DE GEOCELDA	45,00	7,55	0,20	339,75	67,95		K0+006.4 A K0+051.40	67,95
LLENO ESTABILIZADA	45,00	7,55	0,11	339,75	37,37		K0+006.4 A K0+051.40	37,37
LLENO ESTABILIZADA	45,00	7,12	0,09	320,40	28,84		K0+006.4 A K0+051.40	28,84

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO POZOS				6,81	2,72			2,72
DESCUENTO SUMIDEROS				0,72	0,29			0,29

NOTA:

TOTAL ÍTEM	131,15

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
Foto 1002 Rear
@ 3.3HYR2HDB8EPMA Timemark Verified



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	2,034	DESCRIPCIÓN ÍTEM	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=80 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	UNIDAD	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
GEOTEXTIL VIA	45,00	8,55		384,75			K0+006.4 A K0+051.40	384,75

DESCUENTOS	DIMENSIÓN						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO POZOS				6,81	2,72			6,81
DESCUENTO SUMIDEROS				0,72	0,29			0,72

TOTAL ÍTEM	377,22

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

BOGOTÁ

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL





MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	2,035	DESCRIPCIÓN ÍTEM	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA

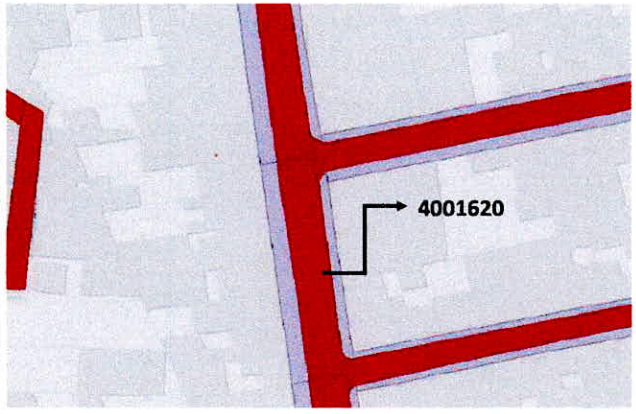

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
NIVELACION CAJA VIA	45,00	7,55		339,75			K0+006.4 A K0+051.40	339,75


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO POZOS				6,81	2,72			6,81
DESCUENTO SUMIDEROS				0,72	0,29			0,72

TOTAL ÍTEM	332,22

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

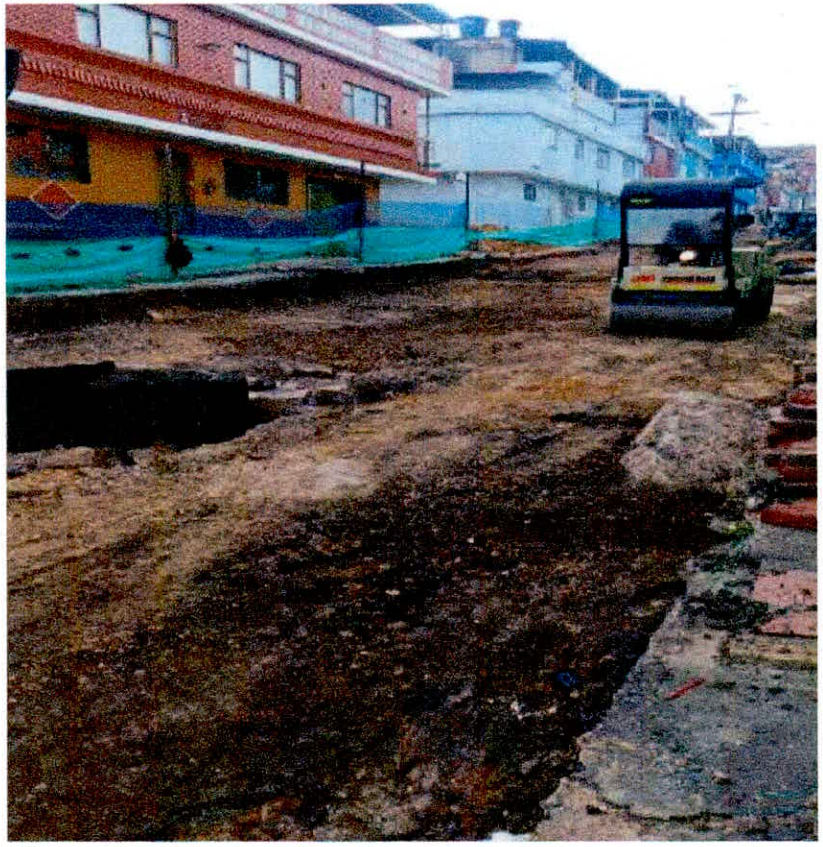

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	2,036	DESCRIPCIÓN ÍTEM	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UNIDAD	M2

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
GEOCELDA	45,00	7,55		339,75			K0+006.4 A K0+051.40	339,75

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO POZOS				6,81	2,72			6,81
DESCUENTO SUMIDEROS				0,72	0,29			0,72

TOTAL ÍTEM 332,22

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA




Timemark
Foto 100% Real
© 33HYR2HOBBEPMA Timemark Verified

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 28 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	5,012	DESCRIPCIÓN ÍTEM	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	UNIDAD	ML

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
SARDINEL COSTADO NORTE	36,00			-			K0+006.4 A K0+051.40	36,00
SARDINEL COSTADO SUR	36,00						K0+006.4 A K0+051.40	36,00

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	72,00

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	6,005	DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	UNIDAD	M3

ESQUEMA

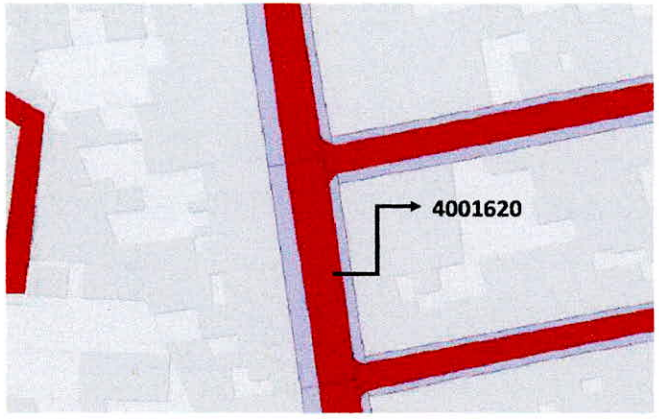

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
LLENO TRITURADO TUBERIA 8"	21,40	0,90	0,200	19,26	3,85		K0+005.7 - K0+027.10	3,85
LLENO TRITURADO TUBERIA 8"	20,57	0,90	0,200	18,51	3,70		K0+028.30 - K0+048.87	3,70

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO TUBO	21,40	0,10	0,10	0,016	0,34		K0+005.7 - K0+027.10	0,34
DESCUENTO TUBO	20,57	0,10	0,10	0,016	0,32		K0+028.30 - K0+048.87	0,32

TOTAL ÍTEM	6,90

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


6°N
2699.4 m
4°33'52"N, 74°5'10"W


Timemark
13:43
23 de ene 2026
Vie
Cra 1 # 27-3, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	6,006	DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	UNIDAD	M3

ESQUEMA



NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
LLENO RECEBO TUBERIA 8"	21,40	0,90	1,827	19,26	35,19		K0+005.7 - K0+027.10	35,19
LLENO RECEBO TUBERIA 8"	20,57	0,90	1,555	18,51	28,79		K0+028.30 - K0+048.87	28,79

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO TUBO	21,40	0,10	0,10	0,016	0,34		K0+005.7 - K0+027.10	0,34
DESCUENTO TUBO	20,57	0,10	0,10	0,016	0,32		K0+028.30 - K0+048.87	0,32

TOTAL ÍTEM	63,32

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
14:18
23 de ene 2026
Vie
Cra 1 # 26-9, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.


Timemark
17:35
19 de ene 2026
Lun
Cra 1 # 26-9, San Cristóbal, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	6,016	DESCRIPCIÓN ITEM	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNIDAD	ML

ESQUEMA

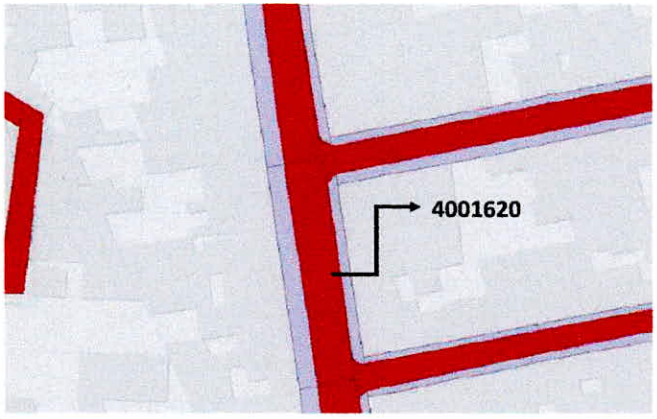

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
INSTALACION TUBERIA 8"	21,40						K0+005.7 - K0+027.10	21,40
INSTALACION TUBERIA 8"	20,57						K0+028.30 - K0+048.87	20,57

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	41,97

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


Timemark
12:13
21 de ene 2026
Mié
Cra 1 # 26-9, San Cristóbal, Bogotá, D.C.,
Bogotá, Bogotá, D.C.


6°N
2699.4 m
4°33'52"N 74°5'10"W
Timemark

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 28 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	NP-01	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.21M ACELERADO 7 DÍAS	UNIDAD	M2

ESQUEMA

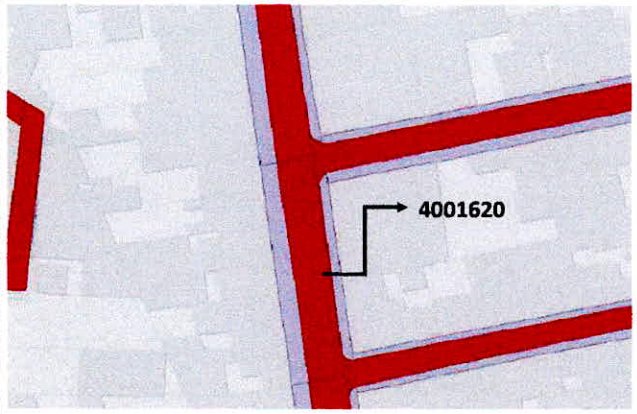

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
MR 45 CONCRETO VIA	45,00	7,15		321,75			K0+006.4 A K0+051.40	321,75

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM 321,75

Wendy Sanchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	NP-02	DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTABILIZACION DE MATERIALES GRANULARES CON CEMENTO 1% Y EMULSION 4%.	UNIDAD	M3

ESQUEMA

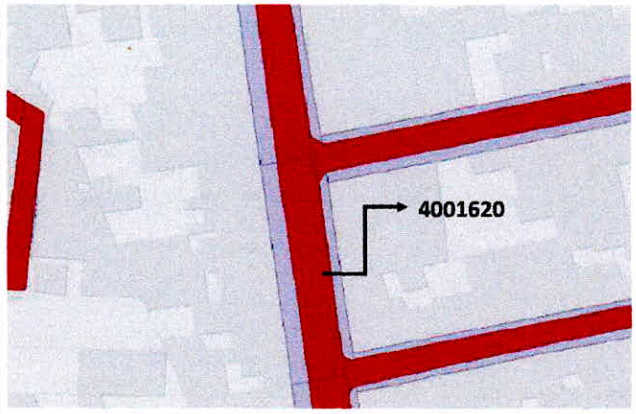

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
LLENO ESTABILIZADA	45,00	7,55	0,11	339,75	37,37		K0+006.4 A K0+051.40	37,37
LLENO ESTABILIZADA	45,00	7,12	0,09	320,40	28,84		K0+006.4 A K0+051.40	28,84

DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		
DESCUENTO POZOS				6,81	2,72			2,72
DESCUENTO SUMIDEROS				0,72	0,29			0,29

TOTAL ÍTEM	63,20

Wendy Sánchez

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

CONTRATISTA:	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	CONTRATO No:	1136 DE 2024	CIV	4001620
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA	CONTRATO No:	1144 de 2024		
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE."			DIRECCIÓN	KR 8 E ENTRE CL 26 S HASTACL 27 S

# ÍTEM	NP-05	DESCRIPCIÓN ÍTEM	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	M2

ESQUEMA

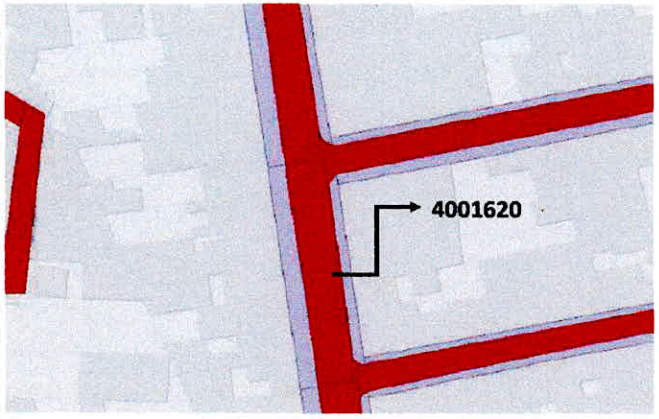

NOTA:

DESCRIPCIÓN	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD		
EXCAVACION MECANICA TUBERIA 8"	21,40		2,027	-	-	2,00	K0+005.7 - K0+027.10	86,76
EXCAVACION MECANICA TUBERIA 8"	20,57		1,755	-	-	2,00	K0+028.30 - K0+048.87	72,20


DESCUENTOS	DIMENSION						ABSCISAS	CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD		

TOTAL ÍTEM	158,96

WENDY JULIETH SANCHEZ SALANUEVA
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN DAVID PORTELA OSORIO
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA


150°SE
2701.7 m
4°33'51"N, 74°5'10"W
HITACHI
Timemark

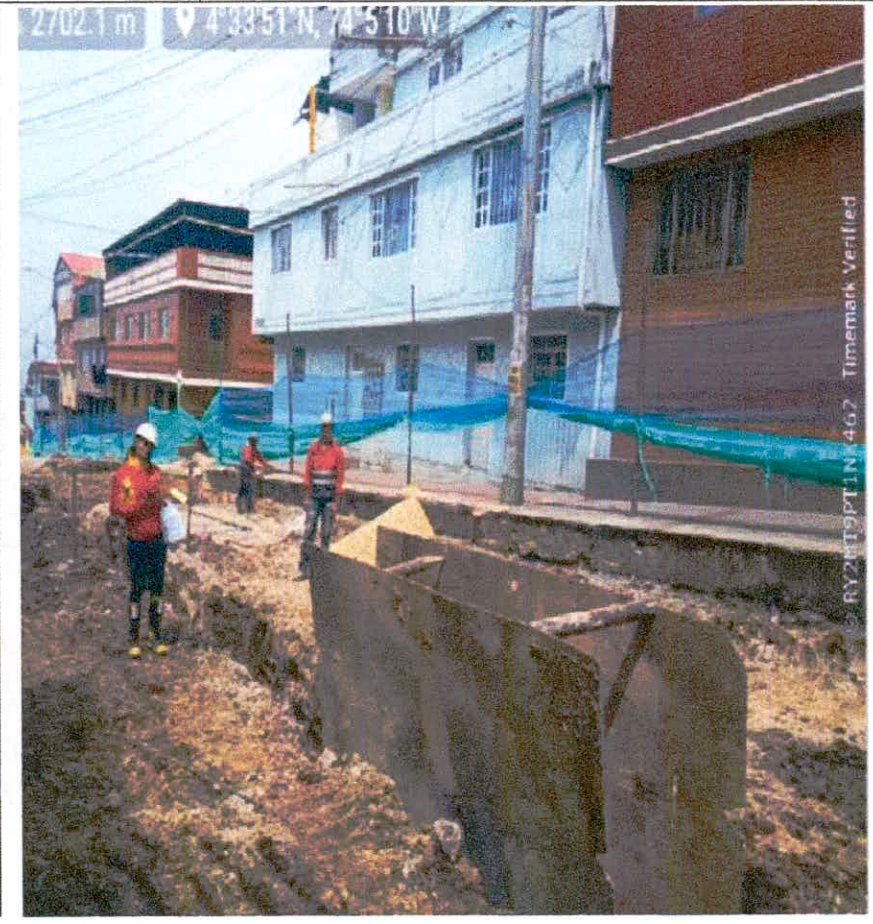
2702.1 m
4°33'51"N, 74°5'10"W
RY2PT9PT1N462 Timemark Verified
