	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: PLANTA CENTRAL SEMANA No.: 16 del 1 DE OCTUBRE al 7 DE OCTUBRE (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ingeneiro Camilo Roa GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN FABIO VILLAREAL

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Realizar el MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Con los recursos disponibles se pretenden realizar MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE. con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad de desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias tales como Actualización de estudios y diseños,Limpieza de la zona del muelle (Incluye remoción de escombros y de basura),Rocería de la vegetación en la zona del muelle, Demolición de estructuras en concreto (incluye cargue, transporte y disposición final de escombros), Suministro e instalación de barandas metálicas perimetrales de protección con una altura libre de 0,90 m. Entre otras actividades.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DUGTRIO		INTERVENTOR:	INGEBEL S.A.S	
INTEGRANTES:	CONSULTORIA HIDRAULICA S.A.S. OSWALS CONSTRUCTORA, AEM INGENIERÍA SAS		INTEGRANTES:	N/A	
CONTRATO No.	4952 de 2023	VALOR INICIAL: $ 1.810.838.502,00	CONTRATO No.	4976 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 431.989.587,00
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	18/09/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	18/09/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ 1.810.838.502,00			SALDO POR AMORTIZAR: $ 431.989.587,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.810.838.502			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.401.226.833			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 409.611.669			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 431.989.587			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 334.273.542			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 97.716.045			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.810.838.502,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.401.226.833,00	77,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.401.226.833,00	77,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 238.000.000,00	13,14%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.401.226.833,00	77,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.401.226.833,00	77,38%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 49.073.723,00	2,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 49.073.723,00	2,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 243.427.305,56

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 334.273.542,00	77,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 334.273.542,00	77,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.706.918,00	2,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.706.918,00	2,71%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 24.573.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 566.641.426,00
Amortizado $	$ 344.242.855,73
Saldo $	$ 222.398.570,27

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 77,38%
Meta Física Ejecutada % 77,38%
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Unidad	1			Prog	1			1	100,00%
					Ejec	1			1	100,00%
* Construccion	unidad	1			Prog	1			1	77,38%
					Ejec	1			1	77,38%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EXCAVADORA	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI / NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO (DISPONIBLE)
UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI / NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	X	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En el perido en mención no aplica

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE MEJORAMIENTO NO APLICA LA COMPRA DE PREDIOS N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se inicia fundicion de vigas de cimentacion, instalacion de geotextil, relleno de de las estructuras, y fundicion de losa

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

continuar fundicion de vigas de cimentacion, instalacion de geotextil, relleno de de las estructuras, y fundicion de losa

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

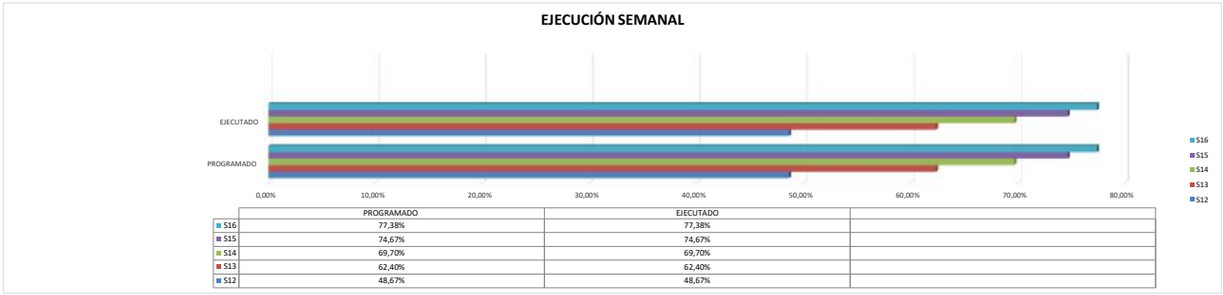

	PROGRAMADO	EJECUTADO	
S16	77,38%	77,38%	
S15	74,67%	74,67%	
S14	69,70%	69,70%	
S13	62,40%	62,40%	
S12	48,67%	48,67%	

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se avanza con lo correspondiente a la actualización de diseños .	FIRMA NOMBRE: Matrícula Profesional No

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
