| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: PLANTA CENTRAL SEMANA No.: 18 del 15 DE OCTUBRE al 21 DE OCTUBRE Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ingeneiro Camilo Roa GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN FABIO VILLAREAL

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Realizar el MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Con los recursos disponibles se pretenden realizar MEJORAMIENTO MUELLE CALAMAR, MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE. con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad de desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias tales como Actualización de estudios y diseños,Limpieza de la zona del muelle (Incluye remoción de escombros y de basura),Rocería de la vegetación en la zona del muelle, Demolición de estructuras en concreto (incluye cargue, transporte y disposición final de escombros), Suministro e instalación de barandas metálicas perimetrales de protección con una altura libre de 0,90 m. Entre otras actividades.

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO DUGTRIO | | | INTERVENTOR: | INGEBEL S.A.S | | |
| INTEGRANTES: | CONSULTORIA HIDRAULICA S.A.S, OSWALS CONSTRUCTORA, AEM INGENIERÍA SAS | | | INTEGRANTES: | N/A | | |
| CONTRATO No. | 4952 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 1.810.838.502,00 | CONTRATO No. | 4976 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 431.989.587,00 |
| FECHA DE INICIO: | 28/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 28/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 18/09/2024 | | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 18/09/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ 1.810.838.502,00 | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 431.989.587,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.810.838.502 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 1.498.287.777 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 312.550.725 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 431.989.587 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 357.428.184 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 74.561.403 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 1.810.838.502,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.498.287.777,00 | 82,74% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.498.287.777,00 | 82,74% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 238.000.000,00 | 13,14% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.498.287.777,00 | 82,74% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.498.287.777,00 | 82,74% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 48.711.556,00 | 2,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 48.711.556,00 | 2,69% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 357.428.184,00 | 82,74% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 357.428.184,00 | 82,74% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 11.620.520,00 | 2,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 11.620.520,00 | 2,69% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 566.641.426,00 |
| Amortizado $ | $ 344.242.855,73 |
| Saldo $ | $ 222.398.570,27 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | $ - |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 82,74%
Meta Física Ejecutada % 82,74%
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | Unidad | 1 | | | Prog | 1 | | | 1 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | 1 | | | 1 | 100,00% |
| * Construccion | unidad | 1 | | | Prog | 1 | | | 1 | 82,74% |
| | | | | | Ejec | 1 | | | 1 | 82,74% |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| EXCAVADORA | 1 | 1 |
| MEZCLADORA DE CONCRETO | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | 2 | 2 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: N/A | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |
| UBICACIÓN: N/A | PERMISO MINERO: | SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | X | | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 7 | 4 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 7 | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:** En el perido en mención no aplica

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE MEJORAMIENTO NO APLICA LA COMPRA DE PREDIOS** N/A

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua fundicion de vigas de cimentacion, instalacion de geotextil, relleno de de las estructuras, y fundicion de losa

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

continuar fundicion de vigas de cimentacion, instalacion de geotextil, relleno de de las estructuras, y fundicion de losa

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

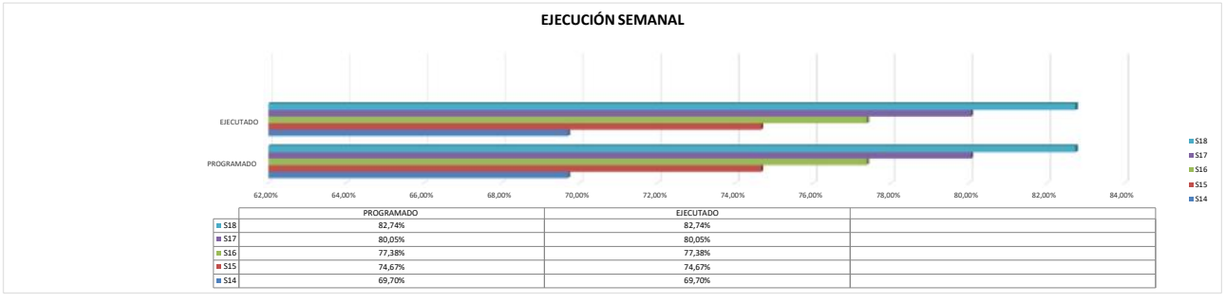


| | PROGRAMADO | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|
| S18 | 82,74% | 82,74% | |
| S17 | 80,05% | 80,05% | |
| S16 | 77,38% | 77,38% | |
| S15 | 74,67% | 74,67% | |
| S14 | 69,70% | 69,70% | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

Se avanza con lo correspondiente a la actualización de diseños .

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____

NOMBRE: _____

Matrícula Profesional No

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
