CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 67 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA AUXILIAR DE USAQUÉN – BOGOTÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

ÍTEM N° 5769 **UNIDAD** UN

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1

CONTRATISTA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALISON MOLINA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN		ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
REGISTRADURIA AUXILIAR DE USAQUEN					
CORREDOR MURO ORIENTAL	MURO	2,38	2,43		5,78
CORREDOR MURO ORIENTAL	MURO	2,38	0,62		1,48
CORREDOR MURO ORIENTAL	MURO	2,38	3,15		7,50
CORREDOR PUERTA COCINA	PUERTA	-1,88	0,69		-1,30
CORREDOR PUERTA BAÑO	PUERTA	-0,85	2,00		-1,70
CORREDOR VIGA	VIGA	-0,22	0,26		-0,06
CORREDOR TABLETA	POCETA	-1,02	0,66		-0,67
CORREDOR MURO SUR	MURO	2,38	1,57		3,74
CORREDOR MURO SUR	PUERTA	-2,38	0,87		-2,07
CORREDOR MURO SUR	POCETA	-1,02	0,65		-0,66
CORREDOR MURO OCCIDENTAL	MURO	2,38	5,55		13,21
CORREDOR MURO OCCIDENTAL	PUERTA	-1,98	0,90		-1,78
CORREDOR MURO OCCIDENTAL	VENTANA	-1,17	0,60		-0,70
CORREDOR INGRESO A NUEVO ARCHIVO.	PUERTA	-1,99	1,95		-3,88
CORREDOR PLACA	PLACA	-0,35	0,20		-0,07
CORREDOR MURO OCCIDENTAL VIGA	VIGA	-0,20	0,26		-0,05
CORREDOR MURO OCCIDENTAL VIGA	VIGA	-0,20	0,16		-0,03
CORREDOR VIGA CENTRO	VIGA	0,66	1,50		0,99
CORREDOR VIGA SUR	VIGA	0,16	1,50		0,24
CORREDOR TECHO	TECHO	0,88	2,08		1,83
CORREDOR TECHO	TECHO	1,17	1,50		1,76
ZONA DE PATIO	MUROS	1,70	1,30	2	4,42
ZONA DE PATIO	MUROS	1,70	1,30	2	4,42
ZONA DE PATIO	MUROS	1,70	1,30	2	4,42
ZONA DE PATIO	MUROS FILOS	3,00	0,08	3	0,72
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**37,52**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA

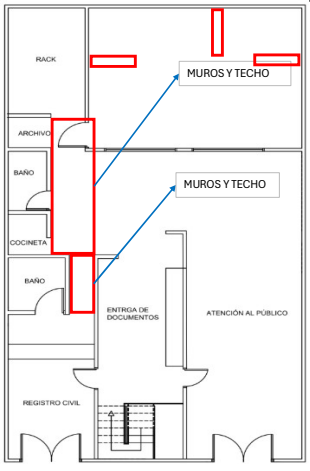

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) HARRY PIRE

Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) LUIS CARLOS VELOSA

Director de Proyectos

(Firma)

(Nombre) ALISON MOLINA

SUPERVISORA CONTRATO

Original : Supervisor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.
