CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 67 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA AUXILIAR DE USAQUÉN – BOGOTÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

ÍTEM N° 6197 **UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS EXTERIORES

CONTRATISTA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALISON MOLINA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN		ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
REGISTRADURIA AUXILIAR DE USAQUEN					
CUBIERTA PISO 1	Muro oriental	1,50	9,46	1	14,19
CUBIERTA PISO 1	Muro occidental pestaña	5,70	0,40	1	2,28
CUBIERTA PISO 1	Muro norte	2,75	11,00	1	30,25
CUBIERTA PISO 1	Ventanas oficinas	-1,20	1,85	2	-4,44
CUBIERTA PISO 1	Ventanas baños	-1,03	0,50	2	-1,03
PATIO	Muro sur	3,10	7,40	1	22,94
PATIO	Muro sur	-2,00	0,28	1	-0,56
PATIO	Muro ccidental	3,00	5,70	1	17,10
PATIO	Muro norte	2,65	3,45	1	9,14
PATIO	Muro norte	-2,00	1,50	1	-3,00
PATIO	Muro oriental	3,00	5,54	1	16,62
PATIO	Ventanas orientales	-1,16	1,00	2	-2,32
PATIO	Estractor	-0,18	0,18	1	-0,03
PATIO	Puerta	-2,00	0,75	1	-1,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**99,64**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA

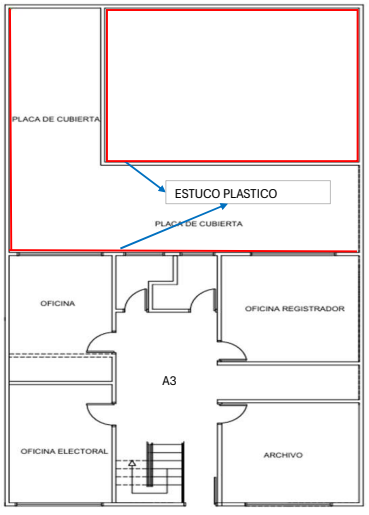

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) HARRY PIRE

Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) LUIS CARLOS VELOSA

Director de Proyectos

(Firma)

(Nombre) ALISON MOLINA

SUPERVISORA CONTRATO

Original : Supervisor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.
