RADICADO - EXTERNO 2765320260216000537 FECHA DE RECEPCIÓN 2026-02-16 08:56:27 TIPO DOCUMENTO: INFORMATIVO

000537

INESCO PROYECTOS S.A.S.

Nocaima, Cundinamarca 11 de febrero de 2025

Señores

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRASTRUCTURA Y PROYECTOS
Atn, Ing, JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
Municipio de Nocaima Cundinamarca

ASUNTO: ENTREGA ACTA DE RECIBO FINAL

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 215-2025

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del acta recibo final con la documentación que se relaciona a continuación:

1. Balance Acta Recibo Final
2. Memorias
3. Informe, registro fotográfico
4. Informe Ejecución
5. Bitácora, periodos 11/12/2025 a 27/12/2025 y 24/01/2026 a 06/02/2026
6. Certificación pago parafiscales y documentos contadores
7. Paz y salvo proveedores y trabajadores
8. Sena FIC
9. Factura
10. Certificación Bancaria

Total (54) Folios

De antemano agradezco su atención y colaboración.

Lina Salazar

LINA SALAZAR NARVAEZ
R/L INESCO PROYECTOS SAS
NIT. 900.892.992-2

Barrio la Bienvenida CRA 2 # 5-60 Barrio la Bienvenida, Nocaima-Cundinamarca
E-mail: inescogerencia@gmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ACTA RECIBO FINAL

CONTRATISTA	INESCO PROYECTOS SAS	**CONTRATO**	215-2026	**FECHA PRESENTE ACTA**	11/02/2026
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	**FECHA ACTA DE INICIO**	23/12/2025	**ESTADO**	FINALIZADO
SUPERVISOR	JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ	**PLAZO DE EJECUCION**	UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS	**VALOR A ACTA RECIBO FINAL**	$ 39.840.431,00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA

			CANTIDADES CONTRACTUALES					**ACTA DE RECIBO FINAL**		**ACUMULADO EJECUTADO**		**MAYORES Y MENORES**		**SALDO POR EJECUTAR**	
Nº	**ITEM DE PAGO**	**GENERAL**	**DESCRIPCIÒN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**MAYOR (+)**	**MENOR (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	16,4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	19,27	$ 98.752,50	$ 1.902.960,68	49,01	$ 4.839.662,20	49,01	$ 4.839.662,20	29,74		29,74	$ 2.936.701,52
2	IDU		CONCRETO ESTAMPADO MULTICOLOR	M2	136,5	$ 150.423,00	$ 20.532.739,50	122,09	$ 18.365.144,07	122,09	$ 18.365.144,07		-14,41	-14,41	-$ 2.167.595,43
3	16,7		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	13,65	$ 160.151,95	$ 2.186.074,12	34,36	$ 5.503.365,52	34,36	$ 5.503.365,52	20,71		20,71	$ 3.317.291,40
4	14,4		BORDILLO PREFABRICADO A-80	M2	48	$ 130.210,99	$ 6.250.127,52	13,82	$ 1.799.515,68	13,82	$ 1.799.515,88		-34,18	-34,18	-$ 4.450.611,64
5			REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA	M2	136,5	$ 14.330,75	$ 1.956.147,38	131,59	$ 1.885.783,39	131,59	$ 1.885.783,39		-4,91	-4,91	-$ 70.363,98
6	1,15		ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	220	$ 8.691,55	$ 1.912.141,00	270,00	$ 2.346.718,50	270,00	$ 2.346.718,50	50,00		50,00	$ 434.577,50
7			SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA LUMINARIA LED SOLAR CON BRAZO 200 W (INCLUYE TUBO AN 2" Y DADO EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO)	UND.	6	$ 650.472,41	$ 3.902.834,46	6,00	$ 3.902.834,46	6,00	$ 3.902.834,46			0,00	$ -
8			REPARACIÓN INCLUYE (VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ARANDELAS, GUAYAS Y SOLDADURA)	GLOBAL	1	$ 346.206,98	$ 346.206,98	1,00	$ 346.206,98	1,00	$ 346.206,98			0,00	$ -
9	18,14		SUMINISTRO ES INSTALACION COLUMPIO LONA Y CADENA GALAVANIZADA	UND.	2	$ 425.600,00	$ 851.200,00	2,00	$ 851.200,00	2,00	$ 851.200,00			0,00	$ -
			VALOR TOTAL				$ 39.840.431,63		$ 39.840.431,00		$ 39.840.431,00				-$ 0,63
			AJUSTE				-$ 0,63		$ -		$ -				$ 0,63
			VALOR TOTAL				$ 39.840.431,00		$ 39.840.431,00		$ 39.840.431,00				$ 0,00

BALANCE ADICIÓN

DESCRIPCION	**VALOR**	**PORCENTAJE**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.840.431,00	100,00%
VALOR ACTA RECIBO FINAL	$ 39.840.431,00	100,00%
ACUMULADO EJECUTADO	$ 39.840.431,00	100,00%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0,00	0,00%

Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO	PARQUES DEL MUNICIPIO							
ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)					UND.	M3	
16,4	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANT.	UND.	TOTAL	
		LONGITUD	ALTURA	AREA				
1	PARQUE CASA DE LA CULTURA		0,33	131,59	1,00		44,06	
2	BORDILLOS	11,50	0,30	3,45	1,00		3,45	
3	RAMPA DE ACCESO			1,50	1,00		1,50	
		SUB TOTAL					49,01	
		TOTAL					49,01	



Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO	PARQUES DEL MUNICIPIO							
ITEM	CONCRETO ESTAMPADO MULTICOLOR					UND.	M2	
IDU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANT.	UND.	TOTAL	
				AREA				
1	PISO			120,59	1,00		120,59	
2	RAMPA ACCESO			1,50	1,00		1,50	
		SUB TOTAL					122,09	
		TOTAL					122,09	



Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO	PARQUES DEL MUNICIPIO						
ITEM	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE					UND.	M3
16,7	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANT.	UND.	TOTAL
			AREA	ALTO			
1	PARQUE CASA DE LA CULTURA		131,59	0,26	1,00		34,21
2	RAMPA DE ACCESO		1,50	0,10			0,15
							-
							-
		SUB TOTAL					34,36
		TOTAL					34,36



Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO	MANTENIMIENTO LAS BRISAS						
ITEM	BORDILLO PREFABRICADO A-80					UND.	ML
14,4	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANT.	UND.	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	LONGITUD CONFINAMIENTO PARQUE	13,82			1,00		13,82
							-
							-
		SUB TOTAL					13,82
		TOTAL					13,82



Nota: Los ítems 4 (Bordillo prefabricado A-80) y 5 (Refuerzo en malla electrosoldada) presentan una inconsistencia en la unidad de medida establecida en el contrato. En consecuencia, para efectos de la correcta liquidación y cobro de las cantidades ejecutadas, se realizó la contabilización de la siguiente manera: el ítem 4 se midió en metros lineales (ML) y el ítem 5 en metros cúbicos (m^3), de acuerdo con la forma real de ejecución y control en obra.

Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO	PARQUES DEL MUNICIPIO							
ITEM	REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA						UND.	M2

	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANT.	UND.	TOTAL
		LARGO	ANCHO	AREA			
4,4	PARQUE CASA DE LA CULTURA			131,59	1,00		131,59
							-
							-
							-
		SUB TOTAL					131,59
		TOTAL					131,59



Nota: Los ítems 4 (Bordillo prefabricado A-80) y 5 (Refuerzo en malla electrosoldada) presentan una inconsistencia en la unidad de medida establecida en el contrato. En consecuencia, para efectos de la correcta liquidación y cobro de las cantidades ejecutadas, se realizó la contabilización de la siguiente manera: el ítem 4 se midió en metros lineales (ML) y el ítem 5 en metros cúbicos (m^3), de acuerdo con la forma real de ejecución y control en obra.

Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO	PARQUES DEL MUNICIPIO							
ITEM	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL						UND.	M^3

1,15	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANT.	UND.	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO			
1	PARQUE FLORILANDIA	135,00			2,00		270,00
		SUB TOTAL					270,00
		TOTAL					270,00



Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO	PARQUES DEL MUNICIPIO						
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LÁMPARA LUMINARIA LED SOLAR CON BRAZO 200 W (INCLUYE TUBO AN 2" Y DADO EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO)					UND.	UND

	PARQUE CASA DE LA CULTURA	DIMENSIONES			CANT.	UND.	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	PARQUE FLORILANDIA				6,00		6,00
							-
							-
							-
		SUB TOTAL					6,00
		TOTAL					6,00



Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO	PARQUES DEL MUNICIPIO						
ITEM	REPARACIÓN INCLUYE (VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ARANDELAS, GUAYAS Y SOLDADURA)					UND.	GLOBAL

	PARQUE FLORILANDIA	DIMENSIONES			CANT.	UND.	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	PARQUES				1,00		1,00
							-
							-
							-
		SUB TOTAL					1,00
		TOTAL					1,00



Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO	PARQUES DEL MUNICIPIO						
ITEM	SUMINISTRO ES INSTALACION COLUMPIO LONA Y CADENA GALAVANIZADA					UND.	M^3
	0	DIMENSIONES			CANT.	UND.	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	PARQUES				2,00		2,00
							-
							-
							-
		SUB TOTAL					2,00
		TOTAL					2,00



Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

INFORME PARA PAGO ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No 215 DE 2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.

FEBRERO DE 2026

1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

- ✓ **TIPO DE CONTRATO:** OBRA
- ✓ **NO. DE CONTRATO:** Contrato No 215 de 2025
- ✓ **OBJETO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.
- ✓ **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($39.840.431,00).
- ✓ **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($39.840.431,00).
- ✓ **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO** 01 DE DICIEMBRE DE 2025
- ✓ **PLAZO DE EJECUCIÓN** UN (1) MES
- ✓ **FECHA DE INICIACIÓN:** 11 DE DICIEMBRE DE 2025
- ✓ **FECHA TERMINACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025
- ✓ **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 29 DE DICIEMBRE DE 2025
- ✓ **FECHA DE REINICIO:** 24 DE ENERO DE 2026
- ✓ **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** 09 DE FEBRERO DE 2026

2. UBICACIÓN DE LA OBRA

1. La obra por intervenir por el CONTRATISTA se ejecutará en MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.



3. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	215 de 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	INESCO PROYECTOS SAS
SUPERVISOR	JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 39.840.431,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 39.840.431,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	11 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUPENSIÓN No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	UN (1) MES
FECHA DE REINICIO SUSPENSION 1:	24 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE ENERO DE 2026
MODIFICATORIO 1:	PRORROGA: Modificar el numeral 1 del contrato inicial, prorrogando el plazo de ejecución del contrato en Quince (15) días, fijando la fecha de terminación para el día nueve de febrero de dos mil veintiséis (2026).
PRORROGA 1:	QUINCE (15) DIAS
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO:	Un (1) mes y cinco (5) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	11 DE FEBRERO DE 2026

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DE CONTRATO:	$ 39.840.431,00
VALOR FINAL DE CONTRATO:	$ 39.840.431,00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 39.840.431,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 0

6.1 TIEMPO DE EJECUCION

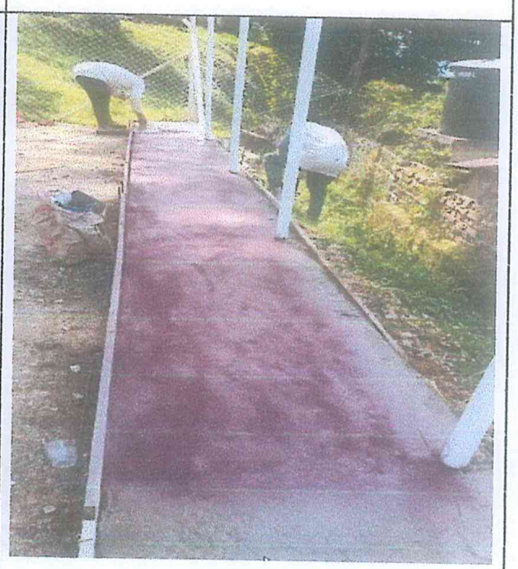
TIEMPO EN EJECUCIÓN	**EJECUCION**
	UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS

INESCO
PROYECTOS S.A.S.

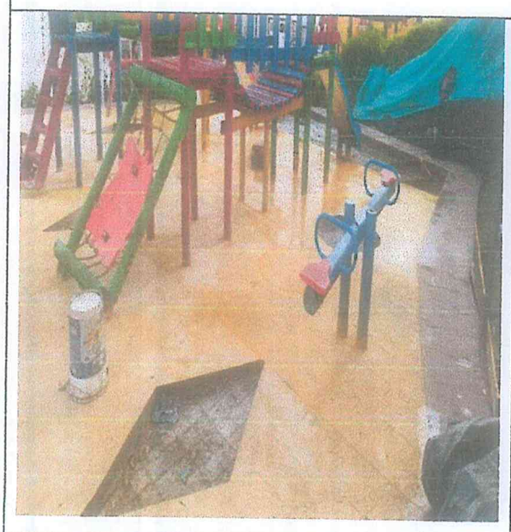
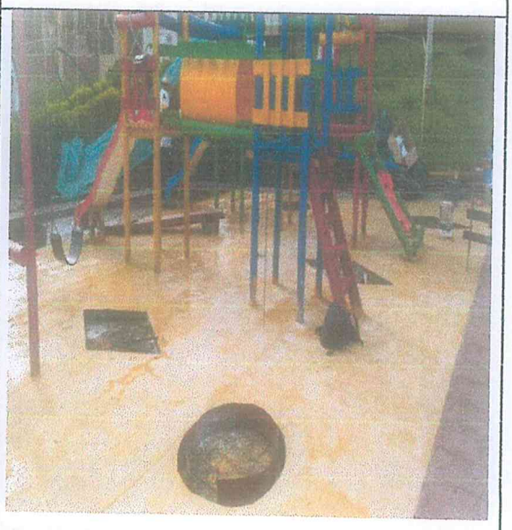
REGISTRO FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:	**INESCO PROYECTOS SAS**	**NIT:**	**900.892.992-2**
OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA**		

	
Descripción: Excavación manual en material común.	**Descripción:** Excavación manual en material común.
	
Descripción: Concreto estampado multicolor	**Descripción:** Concreto estampado multicolor

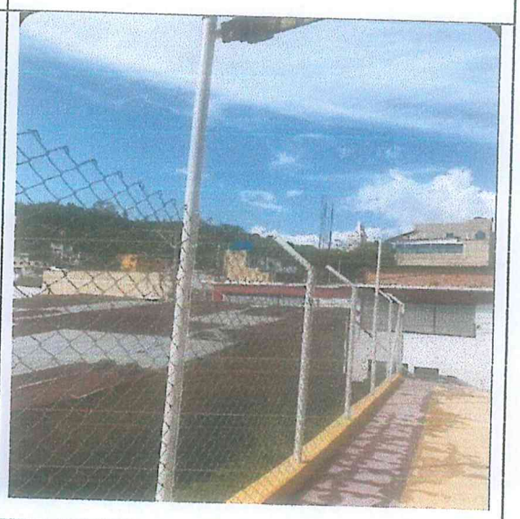
CONTRATISTA:	**INESCO PROYECTOS SAS**	**NIT:**	**900.892.992-2**
OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA**		

	
Descripción: Concreto estampado multicolor	**Descripción:** Concreto estampado multicolor
	
Descripción: Concreto estampado multicolor	**Descripción:** Concreto estampado multicolor

CONTRATISTA:	INESCO PROYECTOS SAS	NIT:	900.892.992-2
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA		

	
Descripción: Relleno en recebo	**Descripción:** Relleno en recebo
	
Descripción: Bordillo prefabricado A-80	**Descripción:** Refuerzo malla electrosoldada

CONTRATISTA:	INESCO PROYECTOS SAS	NIT:	900.892.992-2
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA		

	
Descripción: Refuerzo malla electrosoldada	**Descripción**: Esmalte sobre madera lineal
	
Descripción: Esmalte sobre madera lineal	**Descripción:** Suministro e instalación lámpara luminaria LED Solar

CONTRATISTA:	**INESCO PROYECTOS SAS**	**NIT:**	**900.892.992-2**
OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA**		

	
Descripción: Reparaciones	**Descripción** Instalación columpio lona y cadena galvanizada

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	11 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Movilización y Excavación Inicial: Inicio de actividades con la localización y replanteo de las áreas de juego. Se procedió con la excavación manual en material común (profundidades de 0.0 a 2.0 m) para la conformación de la caja donde se alojará la estructura de pavimento del parque.	CASA DE LA CULTURA		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA		
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA	
SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	12 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Finalización de Excavación y Retiro de Sobrantes: Se completaron los volúmenes de excavación manual, asegurando los niveles de desplante. Se ejecutó el retiro de materiales sobrantes a una distancia menor de 5 km, dejando la subrasante limpia y nivelada para la siguiente fase	CASA DE LA CULTURA		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	13 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Suministro y Extensión de Recebo: Se dio inicio al relleno en recebo común, extendiendo el material en capas controladas. Se verificó la humedad óptima del material para garantizar una base estable para las áreas de concreto.	CASA DE LA CULTURA		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	15 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Compactación Mecánica de Base: Se realizó la compactación mecánica del recebo empleando equipo ligero (rana/saltarín) para no afectar las estructuras aledañas. Se verificó la densidad del terreno para evitar futuros asentamientos en el concreto estampado.	CASA DE LA CULTURA		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES		
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	16 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Instalación de Bordillo Prefabricado A-80: Inicio de la instalación de bordillos prefabricados A-80. Estos elementos sirven como confinamiento lateral para el área de juegos y definen la geometría del concreto estampado multicolor.	CASA DE LA CULTURA		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	17 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Nivelación y Remate de Bordillos: Se finalizó el pegue y alineación de los bordillos, asegurando las pendientes para el drenaje de aguas lluvias del parque. Se realizaron los rellenos laterales necesarios para dar firmeza a las piezas prefabricadas.	CASA DE LA CULTURA		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salanc

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	18 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada: Se procedió con el corte y figurado del refuerzo en malla electrosoldada. Se instaló sobre la base de recebo utilizando distanciadores para garantizar que el acero quede embebido correctamente en el centro de la losa de concreto.	CASA DE LA CULTURA		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salma

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	19 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Amarre de Refuerzo y Preparación de Mezcla: Finalización del amarre de la malla y verificación de traslapos. Se realizó la limpieza de la formaleta lateral para asegurar que el vaciado del concreto sea limpio y cumpla con los espesores de diseño.	CASA DE LA CULTURA		M3

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	20 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Inicio de Vaciado de Concreto Estampado: Se inició la fundida del concreto estampado multicolor. Se aplicó el endurecedor de color y se procedió con el estampado manual de las texturas según el diseño arquitectónico del parque, controlando los tiempos de fraguado inicial.	CASA DE LA CULTURA		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	22 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Continuación de Estampado (Módulo Central): Se avanzó con el vaciado del área principal de juegos. Se puso especial atención en la uniformidad del color y la profundidad de la huella del estampado para garantizar un acabado antideslizante y estético.	CASA DE LA CULTURA		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

	MAÑANA	TARDE
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES: SI NO

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lina Salamanca

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	23 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Finalización de Áreas de Concreto: Se concluyó el vaciado de las losas de concreto estampado. Se realizaron los cortes de dilatación para controlar la retracción del material y se inició el proceso de curado químico para evitar fisuramientos	CASA DE LA CULTURA		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salamanca

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
216-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	24 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Lavado y Sellado de Superficies: Tras el fraguado suficiente, se realizó el lavado a presión para retirar el exceso de desmoldante. Se aplicó la primera capa de sellador acrílico para resaltar el brillo y proteger el concreto multicolor del desgaste por tráfico.	CASA DE LA CULTURA		N/A

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	
			SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Jhon Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	26 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Detallado de Juntas y Limpieza: Se ejecutó la limpieza de las juntas de dilatación y el retiro de rebabas en los bordes de los bordillos. El área de concreto se dejó protegida para permitir el endurecimiento final antes de la instalación de equipos.	CASA DE LA CULTURA		N/A

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA		
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salas

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
216-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	27 de diciembre de 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Verificación Técnica y Suspensión de Obra: Inspección general de la obra civil terminada. Se realizó el inventario de materiales en bodega y se procedió con la suspensión temporal del contrato por un periodo de un mes, de acuerdo a lo concertado con la administración municipal.	CASA DE LA CULTURA		N/A

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salma

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	24 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Reinicio y Adecuación de Mobiliario: Tras el mes de suspensión, se retomaron labores con la limpieza general del polvo acumulado en el concreto. Se iniciaron las actividades de reparación de estructuras existentes, incluyendo el cambio de varillas roscadas, tuercas y arandelas oxidadas.	CASA DE LA CULTURA		GLOBAL

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	26 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Soldadura y Refuerzo de Guayas: Continuación de las reparaciones metálicas. Se ejecutaron labores de soldadura en puntos críticos de la estructura y se instalaron nuevas guayas de seguridad para los equipos de juego que presentaban desgaste.	CASA DE LA CULTURA		GLOBAL

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4
.			

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	27 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Preparación de Madera para Pintura: Se realizó el lijado y limpieza de los elementos de madera del parque (vallas o soportes). Se eliminaron capas de barniz viejo para asegurar la adherencia del nuevo recubrimiento.	CASA DE LA CULTURA/FLORILANDIA		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	28 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Aplicación de Esmalte sobre Madera (Mano 1): Se inició la aplicación de esmalte sobre madera lineal. Se utilizó un producto de alta resistencia a la intemperie (rayos UV y lluvia) para proteger los elementos decorativos y de seguridad del parque infantil.	CASA DE LA CULTURA/FLORILANDIA		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	29 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Segunda Mano de Esmalte Lineal: Se aplicó el acabado final de pintura sobre madera, garantizando un tono uniforme y un sellado total de la porosidad. Se señalizaron las áreas pintadas para evitar que el contacto accidental dañara el acabado fresco.	CASA DE LA CULTURA/FLORILANDIA		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	30 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Suministro e Instalación de Columpio (Estructura): Iniciamos la instalación del columpio. Se realizó el anclaje de los soportes principales a la base de concreto, verificando la verticalidad y la resistencia de los pernos de fijación.	FLORILANDIA		UND

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE		
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI	NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5						
MAESTRO GENERAL	OTROS							

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Salinas

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
216-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	31 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Montaje de Lona y Cadenas Galvanizadas: Se completó la instalación del columpio con lona y cadena galvanizada. Se verificó que el sistema de giro fuera suave y que la altura de la lona respecto al piso cumpliera con las normas de seguridad para niños.	FLORILANDIA		UND

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	2 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Pruebas de Carga y Ajuste de Equipos: Se realizaron pruebas de funcionamiento en todos los equipos instalados y reparados. Se ajustaron tensiones en las guayas y se verificó que no existieran filos cortantes o puntos de atrapamiento en los juegos.	FLORILANDIA		UND

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	3 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Instalación de Soporte para Luminaria LED: Se procedió a la instalación del brazo de 2" y el dado en concreto para la ubicación de la iluminación. Se garantizó que el dado tuviera el refuerzo de acero necesario para soportar el peso de la luminaria solar.	CASA DE LA CULTURA		UND

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	4 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Suministro e Instalación de Lámpara LED Solar: Se montó la luminaria LED solar de 200 W. Se configuró el panel solar para asegurar la máxima captación de energía y se probó el sensor de encendido automático, garantizando la iluminación nocturna del parque.	CASA DE LA CULTURA		UND

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	5 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Remates de Pintura y Ajustes Finales Jornada de "detallado": Se realizaron retoques de pintura en los puntos de soldadura y se aplicó una última capa de protección a los tornillos y pernos instalados para evitar la corrosión temprana	CASA DE LA CULTURA/FLORILANDIA		ML

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	6 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Limpieza General y Desmovilización: Retiro de todas las herramientas, escombros menores y residuos de pintura. Se realizó un lavado final al concreto estampado para entregarlo en óptimas condiciones estéticas a la comunidad de Nocaima.	CASA DE LA CULTURA		N/A

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	
			SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA			
215-2025	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.	7 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Limpieza General y Desmovilización: Retiro de todas las herramientas, escombros menores y residuos de pintura. Se realizó un lavado final al concreto estampado para entregarlo en óptimas condiciones estéticas a la comunidad de Nocaima.	FLORILANDIA		N/A

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE	
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1	Herramienta menor	9	5	4	SI NO
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5					
MAESTRO GENERAL	OTROS						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. SMC-050-2025

FORMATO 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ** identificado con C.C. No. 1.072.466.185, en mi condición de Representante Legal de la empresa **INESCO PROYECTOS SAS.** identificada con NIT **900.892.992- 2**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Nocaima, Cundinamarca, a los 11 días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ
INESCO PROYECTOS SAS, NIT 900.892.992-2

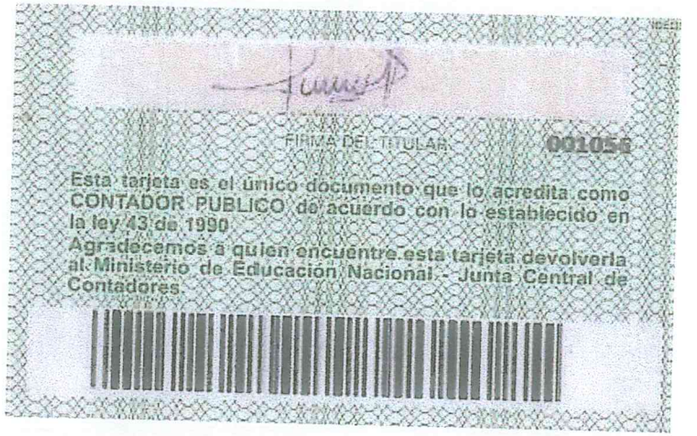
JAVIER LAVERDE RAMIREZ
Contador Público TP. 82843-T

Barrio la Bienvenida CRA 2 # 5-60 Barrio la Bienvenida, Nocaima-Cundinamarca E-mail: inescogerencia@gmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 3.108.723
LAVERDE RAMIREZ
APELLIDOS
JAVIER
NOMBRES
FIRMA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
82843-T
JAVIER
LAVERDE RAMIREZ
C.C. 3108723
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN
PRESIDENTE
92021


FECHA DE NACIMIENTO 19-MAY-1961
NOCAIMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-AGO-1979 NOCAIMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00129841-M-0003108723-20061119 0006389035A 2 1130029670


FIRMA DEL TITULAR 001056
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B75E4E7AE7ABB4F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAVIER LAVERDE RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3108723 de NOCAIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 82843-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Nocaima, Cundinamarca 06 de febrero de 2026

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

ALBERTO BRASVI
C.C. 3.109.312

CERTIFICA

Que la empresa **INESCO PROYECTOS SAS** con **NIT. 900.892.992-2,** se encuentra a paz y salvo por la prestación de servicios como **AYUDANTE DE OBRA** para el contrato de obra No. 215-2025, cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.**

Alberto Brasvi
ALBERTO BRASVI
C.C. 3.109.312
Ayudante de Obra

Nocaima, Cundinamarca 06 de febrero de 2026

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
C.C. 13.992.428

CERTIFICA

Que la empresa **INESCO PROYECTOS SAS** con **NIT. 900.892.992-2,** se encuentra a paz y salvo por la prestación de servicios como **MAESTRO DE OBRA** para el contrato de obra No. 215-2025, cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.**

Alexander Rojas
JAIRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ
C.C. 13.992.428
Maestro de Obra

Nocaima, Cundinamarca 06 de febrero de 2026

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

FREDY ALEJANDRO BAUTISTA AVILA

C.c 3'110.008

CERTIFICA

Que la empresa **INESCO PROYECTOS SAS** con **NIT. 900.892.992-2,** se encuentra a paz y salvo por la prestación de servicios como **AYUDANTE DE OBRA** para el contrato de obra No. 215-2025, cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.**

Fredy Bautista

FREDY ALEJANDRO BAUTISTA AVILA
C.c 3'110.008
Ayudante de Obra

Nocaima, Cundinamarca 06 de febrero de 2026

PAZ Y SALVO

RONAL FABIAN GOMEZ MOLINA
C.C. 1.079.233.079
DISTRISUMINISTROS AG
NIT. 1079233079

CERTIFICA

Que la empresa **INESCO PROYECTOS SAS** con **NIT. 900.892.992-2**, se encuentra a paz y salvo por el suministro de materiales de ferretería para el contrato de obra No. 215-2025, cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.**

Ronal Fabian Gomez
RONAL FABIAN GÓMEZ MOLINA
C.C. 1.079.233.079
DISTRISUMINISTROS AG
Nit. 1.079.233.079
Proveedor De Materiales De Ferretería

Nocaima, Cundinamarca 06 de febrero de 2026

PAZ Y SALVO

FLORESMIRO MATIZ ROJAS
NIT. 3.108.966-6

CERTIFICA

Que la empresa **INESCO PROYECTOS SAS** con **NIT. 900.892.992-2**, se encuentra a paz y salvo por el suministro de materiales de cantera para el contrato de obra No. 215-2025, cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.**

Floresmiro Matiz
FLORESMIRO MATIZ ROJAS
C.C. 3.108.966
NIT. 3.108.966-6

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	156205574	57607428	12/02/2026

Número de Identificación
900892992

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona
2

Departamento
CUNDINAMARCA

Dirección de Domicilio
Cra 2 Nro 5-60

Localización
Nacional

Correo electrónico
inescogerencia@gmail.com

Regional
Cundinamarca

Número Licencia de Obra

Nombre Obra
Mejoramiento Parques Infantile

Fecha Terminación Obra
07/02/2026

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar
2

Costo Total Mano de Obra
9960107.75

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte SENA
0.00

Primer Nombre ó Razón Social
INESCO PROYECTOS SAS

Tipo de documento
01

Naturaleza Juridica
01

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio
Nocaima

Teléfono de Contacto
+57,314 2193426

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF
36-02-00-025-000000

Número Contrato de Obra
215-2025

Fecha Inicio Obra
11/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
Nocaima

Año Periodo a Pagar
2026

Costo Total de Obra a Todo Costo
39840431.00

Número de Trabajadores en el Periodo
4

Aporte FIC
99601.00

Valor del Pago
99601.00

ecollect
Seguro para ti

INESCO PROYECTOS SAS
NIT 900.892.992-2
CR 149 BIS 137 52
Tel: (601) 3138932806
Bogotá - Colombia
inescogerencia@gmail.com

Espacio para Logo Corporativo

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764104132661 aprobado en 20251230 prefijo IPR desde el número 6 al 200 Vigencia: 12 Meses Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. IPR 8

Fecha y hora Factura
Generación: 12/02/2026, 12:57
Expedición: 12/02/2026, 12:57

Nombre del Cliente Municipio de Nocaima	**Nit ó C.C.** 899.999.718-9	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social Municipio de Nocaima	**Dirección** Cra 6 Nro 6-41	**Teléfono** (031) 3007285906
Correo planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	**Vendedor** INESCO PROYECTOS SAS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA. Acta de Recibo Final	1.00	39,840,431.00	0.00	39,840,431.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
Somos Régimen Simple de Tributación
Favor no descontar retención en la fuente.

Favor transferir el valor de esta factura a la cuenta:
Bancolombia Ahorros #89200000253 a favor de Picbras SAS Nit 900.439.176-8

Total Bruto	39,840,431.00
Total a Pagar	39,840,431.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 39,840,431.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: d034d447b2d828adca3e3f106639c939efe8d597f9bdd9d8428a106d4e08c68e8cb08a4b29261d8e8df56a76ddeff03c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

La Vega, Abril 15 de 2025

Señor (es)
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa INESCO PROYECTOS SAS identificada con NIT 900892992 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Tipo de cuenta	Número Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	892-000021-76	2024/08/29	ACTIVA

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA
Jineth Maryuri Ramirez
Cedula Nº 1065668896

Atentamente,
Jineth Maryuri Ramirez Peña
Gerencia de Equipos especializados Pyme - PAM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia
