Radicado Nº 0125012718002 / MDN-COGFM-JEMCO-CCOET-JEMCT-DEMEM-MUFMC

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2025

Señor Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUAREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 001 del Contrato No. 255 de fecha 28 de agosto de 2025, Mensual ___ o Final _X__

Respetuosamente, me dirijo al señor Coronel, GEOVANNY ANDRÉS SUAREZ PENAGOS, Director Administrativo y Financiero, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	SPIF John Carlos Valderrama Ramirez
Dependencia	Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET).
Cargo	Supervisor CONTRATO No. 255 COGFM DIADF 2025 (10 de septiembre de 2025)
Apoyo a la supervisión	NO

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		Contrato 255 del 10 de septiembre de 2025	
Contratista		MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		900785304-7	
Objeto		Requiere contratar la adquisición e instalación de rampas para personas con discapacidad física para el Museo Militar de las Fuerzas Militares (Candelaria), de acuerdo con las especificaciones técnicas	
Valor del Contrato		$ 6.746.000	
Plazo de ejecución		14 de noviembre de 2025	
Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificatorio:			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución	X		El contratista cumple con el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas
2	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato	X		El contratista cumple en vista que no requiere de permiso alguno para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato
3	Mantener durante el plazo de ejecución del contrato los precios ofertados	X		El contratista cumple manteniendo los precios ofertados
4	Dentro de los cinco (5) primeros días calendario del plazo de ejecución, el contratista deberá presentar un cronograma con las actividades relacionadas con la ejecución del objeto del contrato, para aprobación del supervisor del contrato	X		El contratista cumple al presentar el cronograma de actividades para la ejecución del contrato.
5	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del mismo, el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato (según aplique)	X		El contratista entrega el certificado del virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
6	RAMPA 1 PASILLO 2 PATIO EXTERNO (1 unidad) Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado	X		Se entrega rampa1 PASILLO 2 PATIO EXTERNO acuerdo a especificaciones técnicas.

	con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas			
7	RAMPA 2 ACCESO ASCENSOR (1 unidad) Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas	X		Se entrega RAMPA 2 ACCESO ASCENSOR acuerdo a especificaciones técnicas.
8	RAMPA 3 ACCESO SALA ARMAS (1 unidad) Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas	X		Se entrega rampa 3 ACCESO SALA ARMAS acuerdo a especificaciones técnicas.
9	ESCALERA 4 ACCESO MUSEO (1 unidad) Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas	X		Se entrega rampa ESCALERA 4 ACCESO MUSEO acuerdo a especificaciones técnicas.
10	RAMPA 5 ACCESO A BAÑO (1 unidad) Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada	X		Se entrega RAMPA 5 ACCESO A BAÑO acuerdo a especificaciones técnicas.

	25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas			
11	El Contratista debe garantizar 6 meses de calidad de las uniones que serán sometidas a soldadura, mismas que deberán quedar correctamente protegidas de corrosión y entregarse estéticamente acorde a los requerimientos de la supervisión	X		Se entrega certificado de garantía
12	Previo al inicio de la manufactura de la estructura de las rampas, el contratista deberá efectuar una rectificación de medidas con compañía del supervisor, de tal forma que se mitigue cualquier tipo de error, por mínimo que este sea, de cinta métrica, lo anterior ante la necesidad de que las rampas empaten perfectamente con cada área en la que deben ser localizadas	X		El contratista efectuó la rectificación de medidas.
13	Las rampas deben ser nuevas, originales y no re manufacturadas, estas deben ser entregadas con todos los accesorios y cualidades exigidas en las especificaciones técnicas de cada referencia	X		El contratista entrega las rampas con todos los accesorios y cualidades exigidas en las especificaciones técnicas de cada referencia
14	Cada Rampa debe ser entregada en sus condiciones de fábrica. No se aceptan partes sueltas	X		El contratista entrega certificación de condiciones de fábrica.
15	El contratista deberá efectuar todas las pruebas necesarias para comprobar el correcto, perfecto y continuo funcionamiento de cada una de las rampas entregadas a plena satisfacción. Estas pruebas de funcionamiento serán coordinadas por el supervisor y en las mismas se verificará que el empalme entre el elemento rampa y la infraestructura del Museo sea el adecuado	X		El contratista certificado de pruebas de funcionamiento.
16	La Entidad podrá rechazar las rampas, si no se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas. En estos casos, el contratista rectificará o reemplazará las rampas rechazadas o cualquier parte de estas para que se ajuste a las especificaciones	X		El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de las rampas solicitadas
17	El contratista deberá proveer a su personal con el equipo de seguridad	X		El contratista dispuso de señales de precaución y control en las zonas a intervenir,

	industrial que sea necesario para la prestación del presente servicio "instalación y/o mantenimiento" que se va a realizar, además, dispondrá de señales de precaución y control en las zonas a intervenir, para limitar el tránsito y prevenir la ocurrencia de siniestros, todo el personal deberá tener su respectivo carnet de identificación			para limitar el tránsito y prevenir la ocurrencia de siniestros, todo el personal tenía su respectivo carnet de identificación.
18	El Comando General, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se ocasionen, debido al incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas de seguridad industrial necesarias en este tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del CONTRATISTA	X		El contratista esta notificado que el comando General no asume ninguna responsabilidad o daños y perjuicios que se ocasionen, debido al incumplimiento por parte del CONTRATISTA
19	El CONTRATISTA, deberá entregar al supervisor del contrato, un informe con fotografías anexas, de la manufactura de las rampas, esto con el fin de mantener actualizado al COGFM de cualquier novedad que pudiese identificarse durante esta etapa. Atendiendo las recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar la misma y las demás observaciones que sean necesarias para que se dé un buen cumplimiento al objeto contractual	X		El contratista entrega informe con fotografías anexas
20	El contratista garantiza que las características técnicas, de operación y seguridad ocupacional de los equipos utilizados para la entrega y localización de cada una de las rampas dentro del museo acorde a las indicaciones del supervisor, cumplan con todas las medidas de seguridad industrial	X		El contratista garantizo las características técnicas, de operación y seguridad ocupacional de los equipos utilizados para la entrega y localización de cada una de las rampas dentro del museo acorde a las indicaciones del supervisor, cumplan con todas las medidas de seguridad industrial
21	El período de garantía de debe ser de 1 año y la totalidad de los elementos adquiridos para las mismas, contados a partir del acta de recibo a satisfacción	X		El contratista entrega certificado de garantía
22	Es la obligación, en los términos de la ley 1480 de 2011 de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos. de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas	X		El contratista entrega ficha técnica
23	Corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones:	X		El contratista entrega ficha técnica y certificado de garantía

	- Como regla general, reparación totalmente gratuita de los defectos de los bienes, así como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos (cuando aplique). Si los bienes no admiten reparación, se procederá a su reposición. Cualquiera de las anteriores en un término no superior de quince (15) días calendario, contados a partir del requerimiento que realice el supervisor del contrato. - En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las características del defecto, a elección del COGFM-DIADF, se procederá a una nueva reparación o al cambio parcial o total de los bienes por otros de la misma especie, características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las requeridas en las especificaciones técnicas exigidas. - Disponer de asistencia o soporte técnico para la instalación, mantenimiento de los bienes y su utilización, de acuerdo con la naturaleza de estos y las especificaciones técnicas exigidas - Las partes, insumos, accesorios o componentes adheridos a los bienes inmuebles que deban ser cambiados por efectividad de garantía, deberán ser de igual o mejor calidad. - El contratista deberá atender cualquier solicitud o requerimiento de acuerdo con el objeto contractual en coordinación con el supervisor y en un periodo no mayor a 24 horas dará la solución			
24	El contratista debe cumplir con la normativa ambiental vigente en cuanto al almacenamiento, transporte, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos, ordinarios o especiales generados en la ejecución del contrato, tales como, residuos de pinturas y otras sustancias químicas	X		El contratista manifiesta no tener disposición final
25	En la Ejecución del contrato, si se llegan a generar residuos peligrosos, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato, los siguientes documentos, los cuales se anexarán en el informe de supervisión: - Registro de cantidad, caracterización y destino (disposición o aprovechamiento)	X		El contratista no genero residuos peligrosos

	de los residuos peligrosos, ordinarios o especiales generados en la ejecución del contrato. - Hojas de seguridad de todos los residuos peligrosos que se generen, las cuales deberá entregar al supervisor del contrato. - Lista de verificación del transportista. - Copia del manifiesto de recolección, transporte - Licencias ambientales para el tratamiento, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. - Certificados de disposición final o aprovechamiento con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente. Teniendo en cuenta que estos se deben almacenar en el COGFM por mínimo 5 años. - Visto bueno del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastre, para verificar el cumplimiento de los documentos entregados por el contratista			
26	El CONTRATISTA deberá sostener los precios unitarios adjudicados para evitar el incremento de estos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar	X		El contratista sostuvo los precios unitarios adjudicados
27	Certificar que cumple con los reglamentos en Seguridad y salud en el trabajo (SGSST) conforme a la reglamentación del sector del trabajo decreto 1072 del 2015 resolución 1111 del 2017 "por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleados y contratantes" Anexar certificación emitida por la ARL, lo anterior debido a que durante la localización de las rampas en el Museo deberán disponer del personal necesario	X		El contratista entrega certificado de (SGSST)
28	EL CONTRATISTA debe disponer de personal necesario al momento de la entrega y localización en las instalaciones del Museo de cada una de las rampas y dicho personal deberá cumplir con todas las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas que rigen el manejo de personal para este tipo de actividades	X		El contratista dispuso del personal necesario para dar cumplimiento al ítem.
29	EL CONTRATISTA deberá entregar los bienes y la documentación requerida por	X		El contratista entrego los bienes y la documentación requerida.

	el Supervisor del Contrato a más tardar 15 días antes de la finalización del plazo contractual, lo anterior con el fin de contar con tiempos de verificación de las rampas, así como para efectuar el ingreso de las mismas a los inventarios fiscales del COGFM			

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N°91452856, con fecha de pago 13 de noviembre de 2025, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 14 de noviembre de 2025, suscrita por el señor Mauricio Cortes Rivera, representante legal de la empresa MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$ 6.746.000
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	$ XXXXXXXX
Valor Total del Contrato es de:	$ 6.746.000

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
FE169	13 -nov- 2025	$ 6.746.000,01
NC 2 - 2025	13 -nov- 2025	$ - 0.01
Valor Facturado		$ 6.746.000
Saldo por Facturar		$ 0
Valor de Reintegro		$ 0
Valor Total del Contrato		$ 6.746.000

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:

Relacione los documentos anexos conforme al clausulado del contrato y el anexo técnico. (Garantías, Actas, Cronogramas, Informes, Registros Fotográficos y Medios Magnéticos, etc.)

Atentamente,

John Carlos Valderrama Ramírez
Sargento Primero de I.F
Supervisor
Correo electrónico johnvald@cgfm.mil.co
No. de contacto 255

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	14 Nov/25	14 Nov/25	P Lozada Tovar 14 Nov/25 5:05 PM	

CRONOGRAMA DE OBRA: CONTRATO 255 COGFM DIADF

Contratista: MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS
Contratante: COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
Contrato: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 255 COGFM DIAF 2025
Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACIÒN E INSTALACION EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA PARA EL MUSEO MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES (CANDELARIA), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TENCICAS DEL ANEXO.
Fecha de inicio de ejecucion: 18/09/2025
Fecha de finalizacion instalacion: 14/11/2025

CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	OCTUBRE																			
			miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	lunes
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	**Elaboracion en taller**		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x					
1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centimetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND																x	x	x	x	x
2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centimetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND																x	x	x	x	x
3	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centimetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND																x	x	x	x	x
4	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centimetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND																x	x	x	x	x
5	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centimetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND																x	x	x	x	x

ING. MAURICIO CORTES RIVERA
C.C. 79.913.293 de Bogotá
MATRICULA PROFESIONAL 25202-252679
mauriciocortes21@gmail.com
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.785.304-7

SPIF JOHN CARLOS VALDERRAMA RAMIREZ
Supervisor del contrato

equidad
riesgos laborales

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EN SU NOMBRE
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.
NIT 830.008.686-1

Debidamente autorizada y habilitada por el Ministerio del Trabajo bajo el número de registro ***RCO 0018***, otorga la certificación correspondiente a la capacitación virtual en el ***Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)*** a:

carolina lozano palacios

C.C. No. **1032470344**

Número de horas cursadas: **50 horas**

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Número **4927 del 2016**
El presente certificado se expide el **20 de mayo de 2020**

Bogotá D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SAFE

La República De Colombia, el Ministerio de Trabajo y

SAFE SAS

Servicios y Actividades en Fisioterapia y Ergonomía

Con Registro de oferente RCO-0047

Hace constar que

Carolina Lozano Palacios

Con Cédula de Ciudadanía No. **1032470344**

Ha finalizado correctamente la formación

ACTUALIZACIÓN VIRTUAL DEL CURSO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Con una intensidad de 20 horas

En testimonio de lo anterior, se firma en Cali, a los veintiseis (26) días del mes de Junio del 2023
Para verificación de este certificado se registra con el N°2662023-1327

Bebsy Bibiana Jiménez
SAFE SAS Representante Legal
NIT 900044243-7

Julián Andrés Molina B
Líder de Academia y SST
SAFE SAS

Dirección	Teléfono	Celular
Avenida 5N	(2) 6613131	3166911538
38N-81 La flora		3154755906
Cali-Valle del Cauca		3163581824

contacto@safesas.com

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900785304-7

CERTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE FABRICA:

El Suscrito MAURICIO CORTES en mi calidad de representante legal de la empresa MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS por medio del presente me permito certificar las instalaciones de la empresa MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS cumplen con las **condiciones técnicas, de infraestructura, seguridad y operatividad** necesarias para llevar a cabo el proceso de fabricación de las RAMPAS DE ACCESIBILIDAD SUMINISTRADAS E INSTALADAS BAJO EL CONTRATO 255 CGFM DIADF DE 202, conforme a los requisitos establecidos en el CONTRATO 255 CGFM DIADF DE 2025 y a los requisitos legales y normativos.

Atentamente,

Mauricio Cortés

ING. MAURICIO CORTES RIVERA
C.C. 79.913.293 de Bogotá
MP 25202-252679
Carrera 37 B No 1 D –45 Bogotá
Cel 3192114355
mauriciocortes21@gmail.com
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.785.304-7

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900785304-7

CERTIFICADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Empresa: MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS
Dirección: Carrera 37 B No 1 D 45
Tel 3192114355
Correo: mauriciocortes21@gmail.com

Lugar de la prueba:
Dirección: Carrera 37 B No 1 D 45
Fecha de realización 10 de noviembre de 2025
Hora de inicio: 8:00 a.m.
Hora de finalización: 10 a.m.

Objetivo de la prueba:

Verificar el correcto funcionamiento de las RAMPAS DE ACCESIBILIDAD SUMINISTRADAS E INSTALADAS BAJO EL CONTRATO 255 CGFM DIADF DE 2025, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones operativas establecidas por el fabricante o normativa aplicable.

Conclusiones:

Se certifica que las RAMPAS DE ACCESIBILIDAD SUMINISTRADAS E INSTALADAS BAJO EL CONTRATO 255 CGFM DIADF DE 2025, cumplen conforme a las especificaciones técnicas y condiciones operativas establecidas por el fabricante o normativa aplicable con las condiciones de funcionamiento establecidas BAJO EL CONTRATO 255 CGFM DIADF DE 2025,

Atentamente,

Mauricio Cortés

ING. MAURICIO CORTES RIVERA
C.C. 79.913.293 de Bogotá
MP 25202-252679
Carrera 37 B No 1 D –45 Bogotá
Cel 3192114355
mauriciocortes21@gmail.com
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.785.304-7

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900785304-7

FICHA TECNICA RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA PARA EL MUSEO MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES (CANDELARIA) CONTRATO 275 COGFM DIADF

El Suscrito MAURICIO CORTES en mi calidad de representante legal de la empresa MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS me permito presentar las fichas técnicas de las **RAMPAS CONTRATO 255 COGFM DIADF**

ITEM	ACTIVIDAD	UND
1	Rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas	UND
2	Rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND

3	Rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND
4	Rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND
5	Rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900785304-7

CONTRATISTA

MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S

INFORME DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA PARA EL MUSEO MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES (CANDELARIA), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO"

ELABORÓ:

Mauricio Cortés

CONTRATISTA
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
MAURICIO CORTES RIVERA


TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. RESUMEN DEL PROYECTO
   2.1 Datos del proyecto
3. ASPECTOS TECNICOS
4. NORMATIVIDAD APLICABLE
5. MEMORIAS
6. REGISTROS FOTOGRAFICOS
7. CONCLUSIONES

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900785304-7

1. INTRODUCCION

El presente informe presenta la finalización de actividades contenidas en el CONTRATO 255CGFM DIADF 2025 celebrado entre EL COMNADO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES y MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS cuyo objeto es "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA PARA EL MUSEO MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES (CANDELARIA), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO"



2. RESUMEN DEL PROYECTO

El CONTRATO CONTRATO 255CGFM DIADF 2025 consistió en REALIZAR las "RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA PARA EL MUSEO MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES (CANDELARIA), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO

Las actividades se realizaron sin novedad y en los plazos establecidos.

2.1 Datos del proyecto

CONTRATISTA: MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS

CONTRATANTE: COMANDO GENMERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

TIEMPO DE EJECUCION: 18 de septiembre al 14 de noviembre de 2025

LUGAR DE EJECUCION: MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES CALLE 10 No 4-92

PERSONA CONTACTO POR MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS: Mauricio Cortes

PERSONA CONTACTO POR COMANDO GENERAL DE LAS FUERZA MILITARES: Sargento John Carlos Valderrama Ramírez

3. ASPECTOS TECNICOS

Previo a la actividad de producción de las rampas se realiza una visita de reconocimiento al MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES CALLE 10 No 4-92.

ITEM	ACTIVIDAD	UND
1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND
2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND
3	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND


4	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND
5	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50, estructura interna en Angulo de 2"X2"x3/16" con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:	UND

4. NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE


NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 6047. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO, ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

1. REGISTROS FOTOGRAFICOS



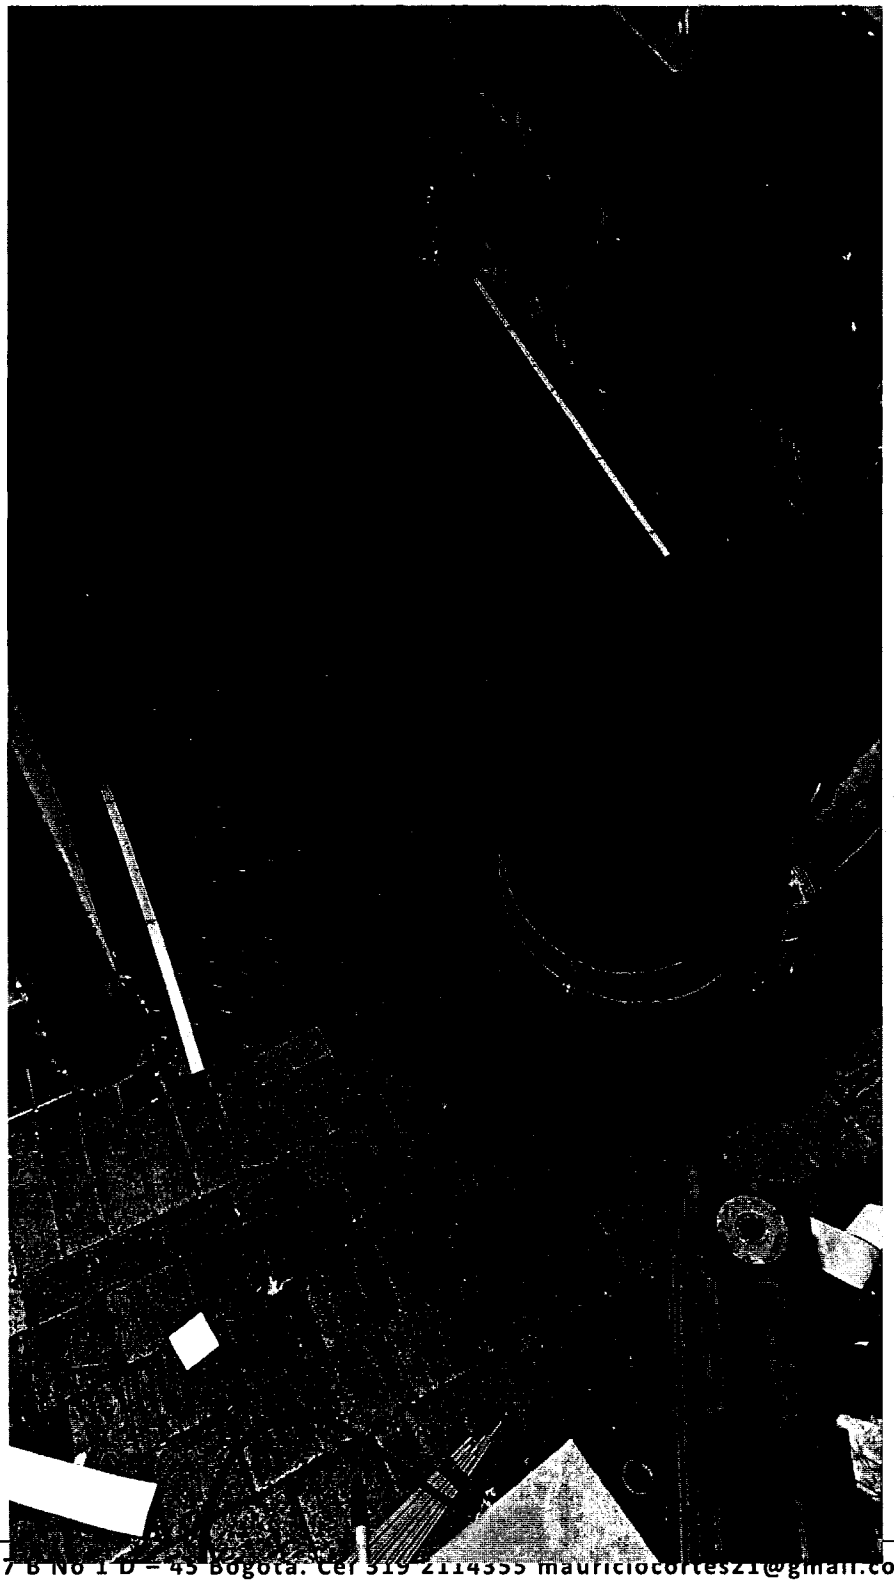


MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 900785304-7

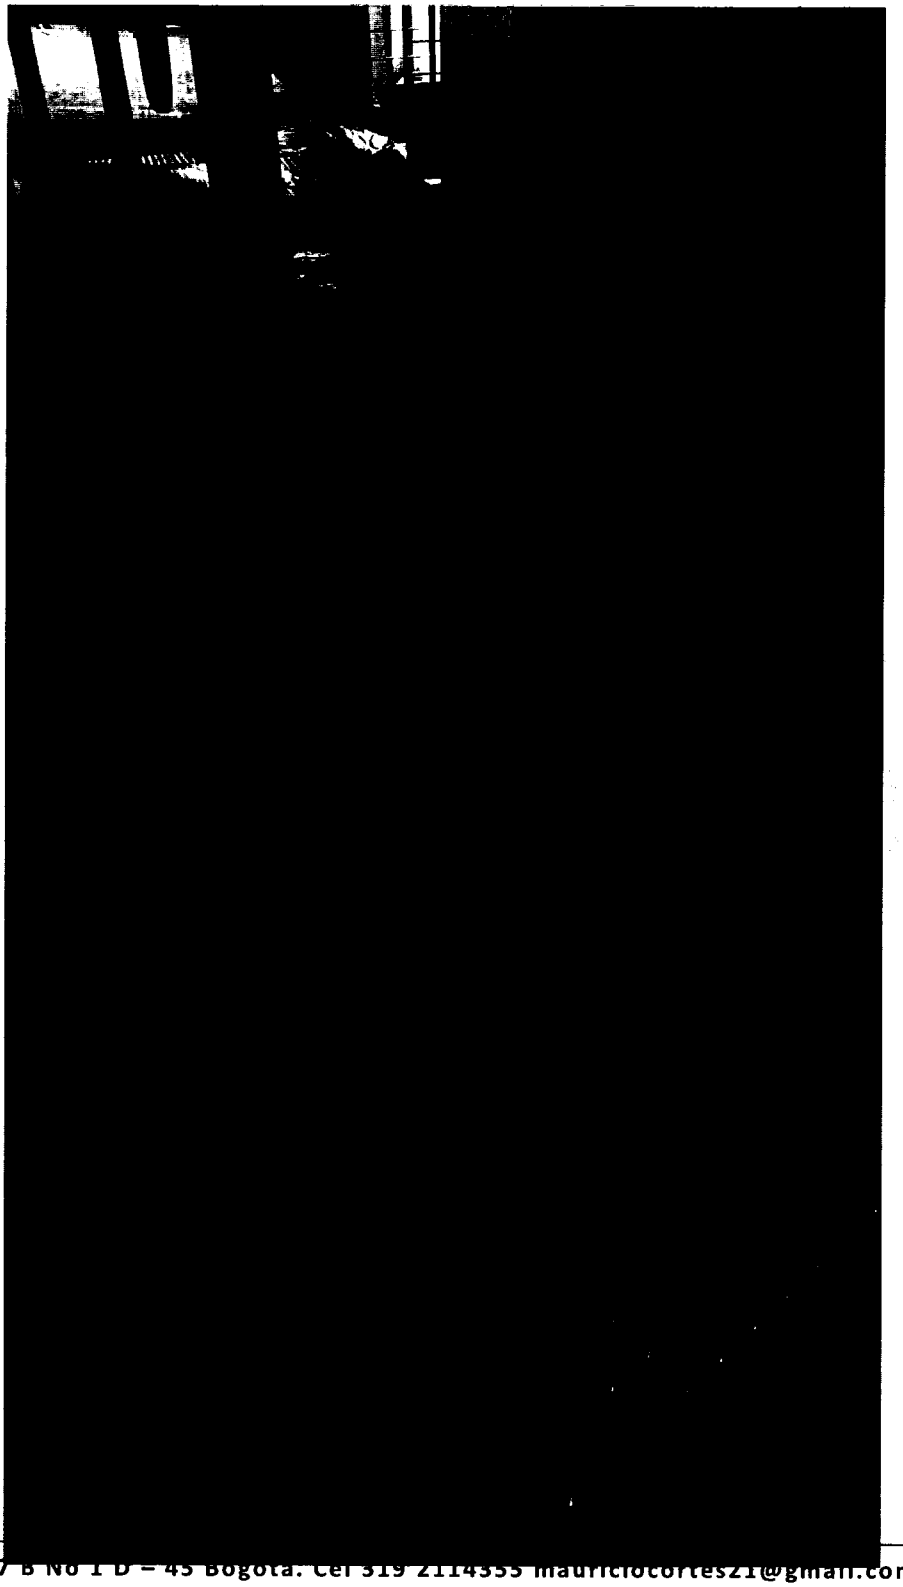



Carrera 37 B No 1 D – 45 Bogotá. Cel 319 2114355 mauriciocortes21@gmail.com

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900785304-7

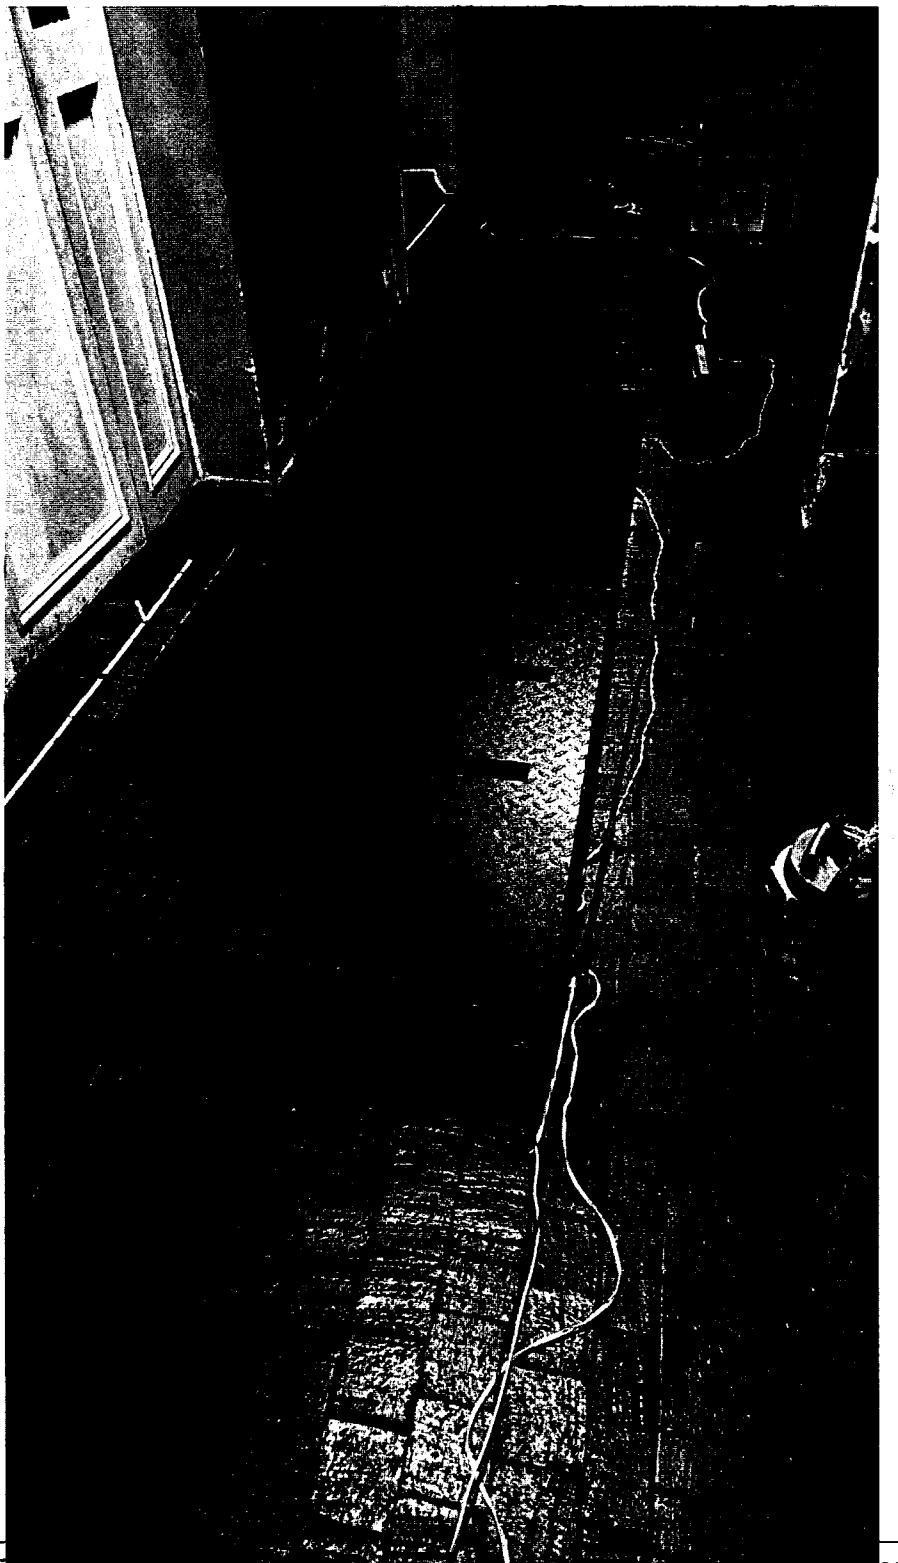


Carrera 37 B No 1 D – 45 Bogota. Cel 319 2114355 mauriciocortes21@gmail.com

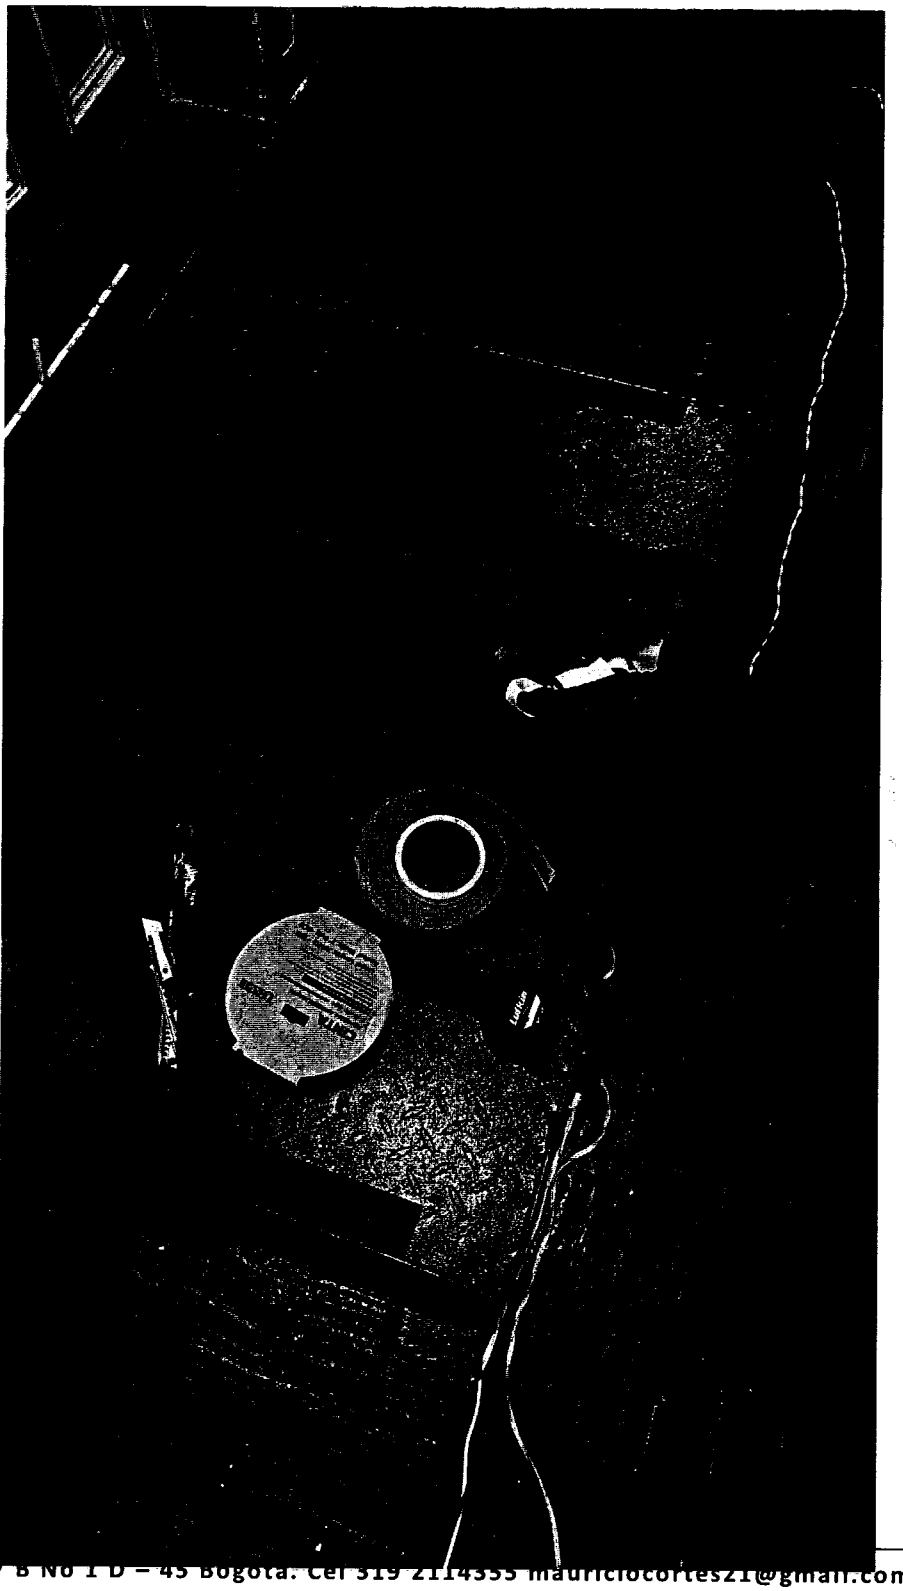

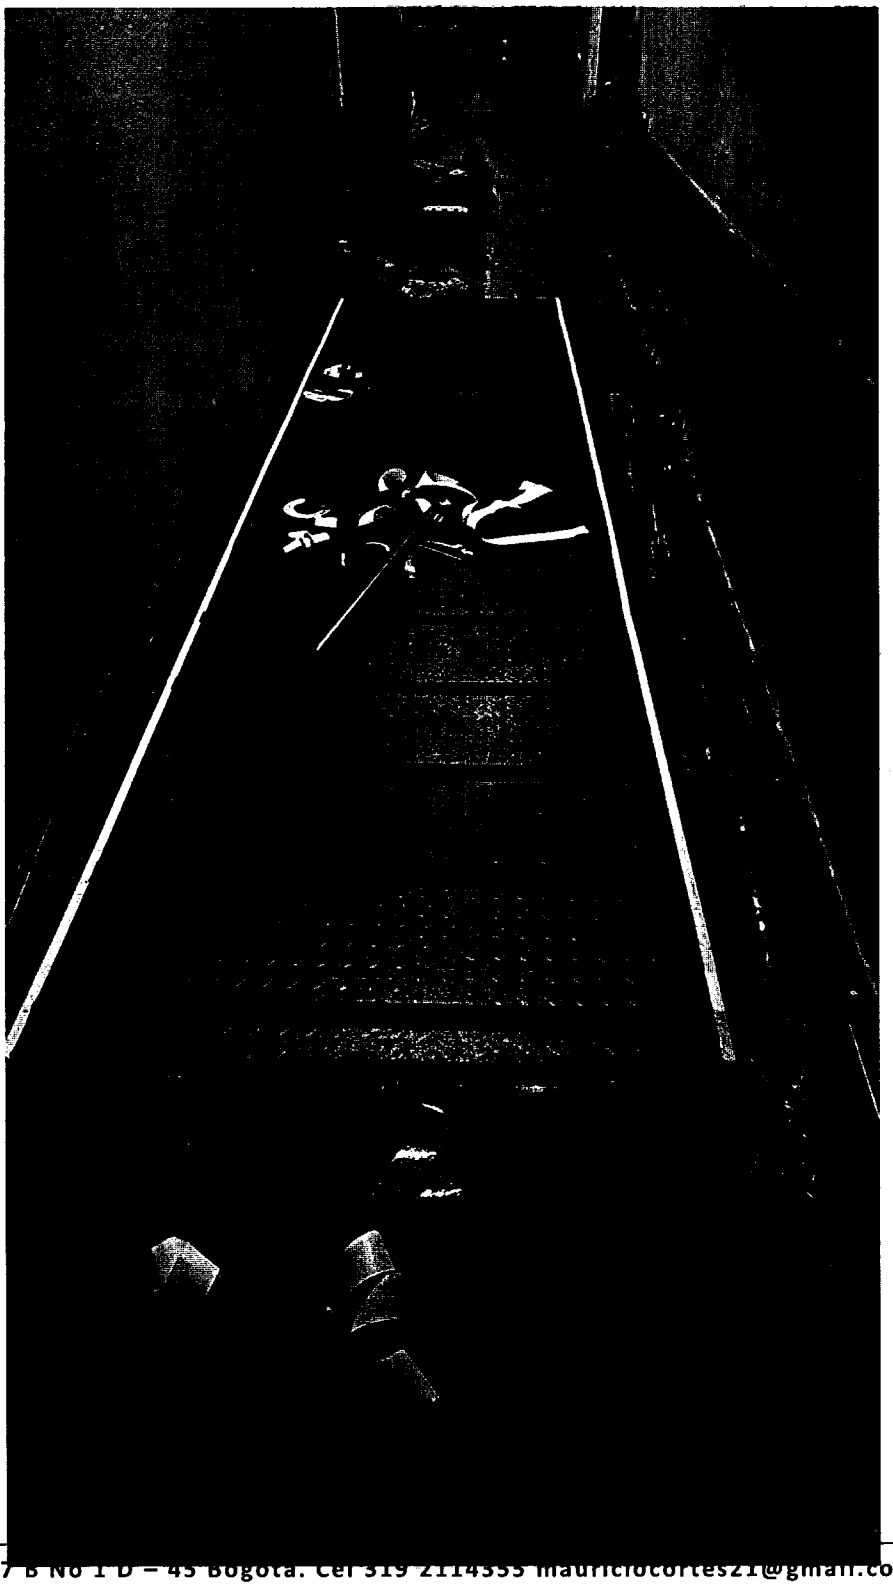


MASE
INGENIEROS
CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900785304-7

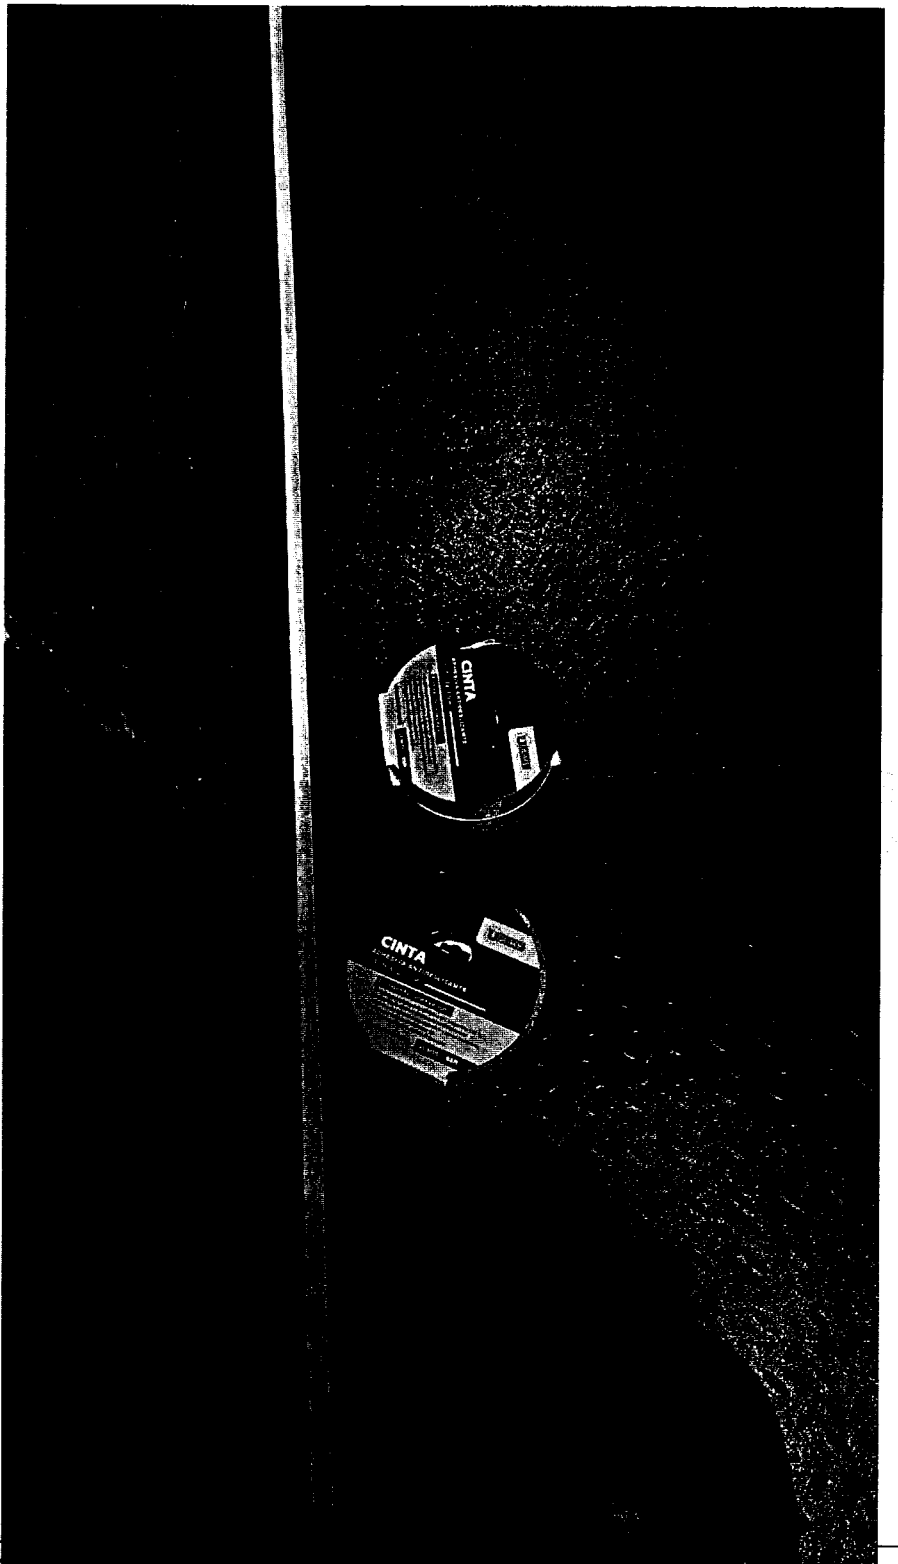



Carrera 37 B No 1 D – 45 Bogotá. Cel 319 2114355 mauricciocortes21@gmail.com

MASE
INGENIEROS
CONSTRUCTORES
NIT. 900785304-7 ASOCIADOS S.A.S

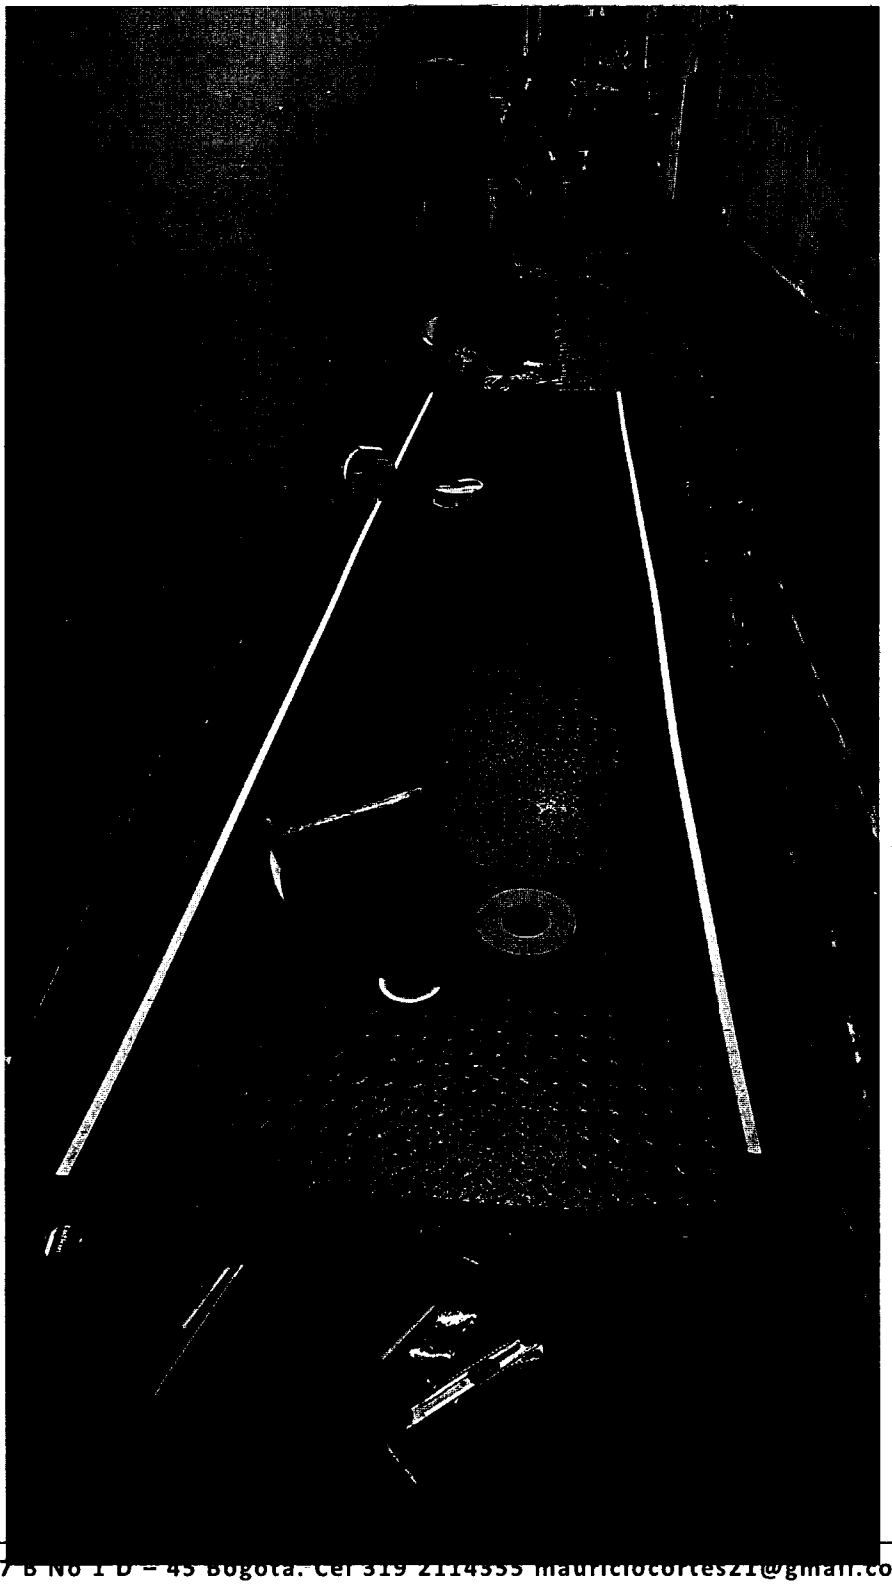


Carrera 37 B No 1 D – 45 Bogotá. Cel 319 2114355 mauriciocortes21@gmail.com

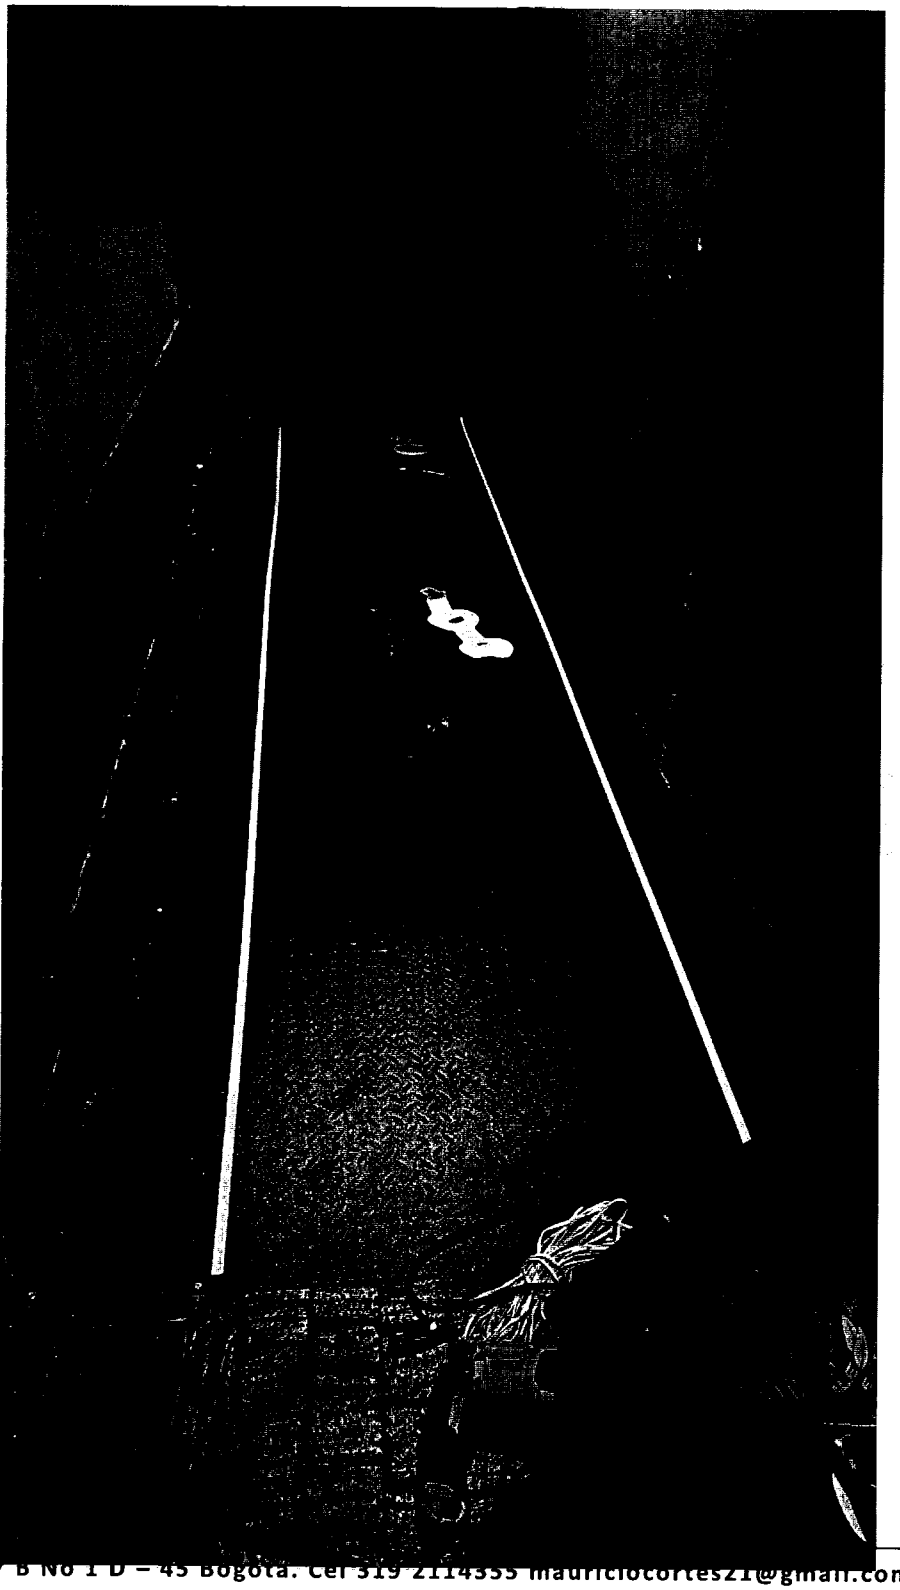

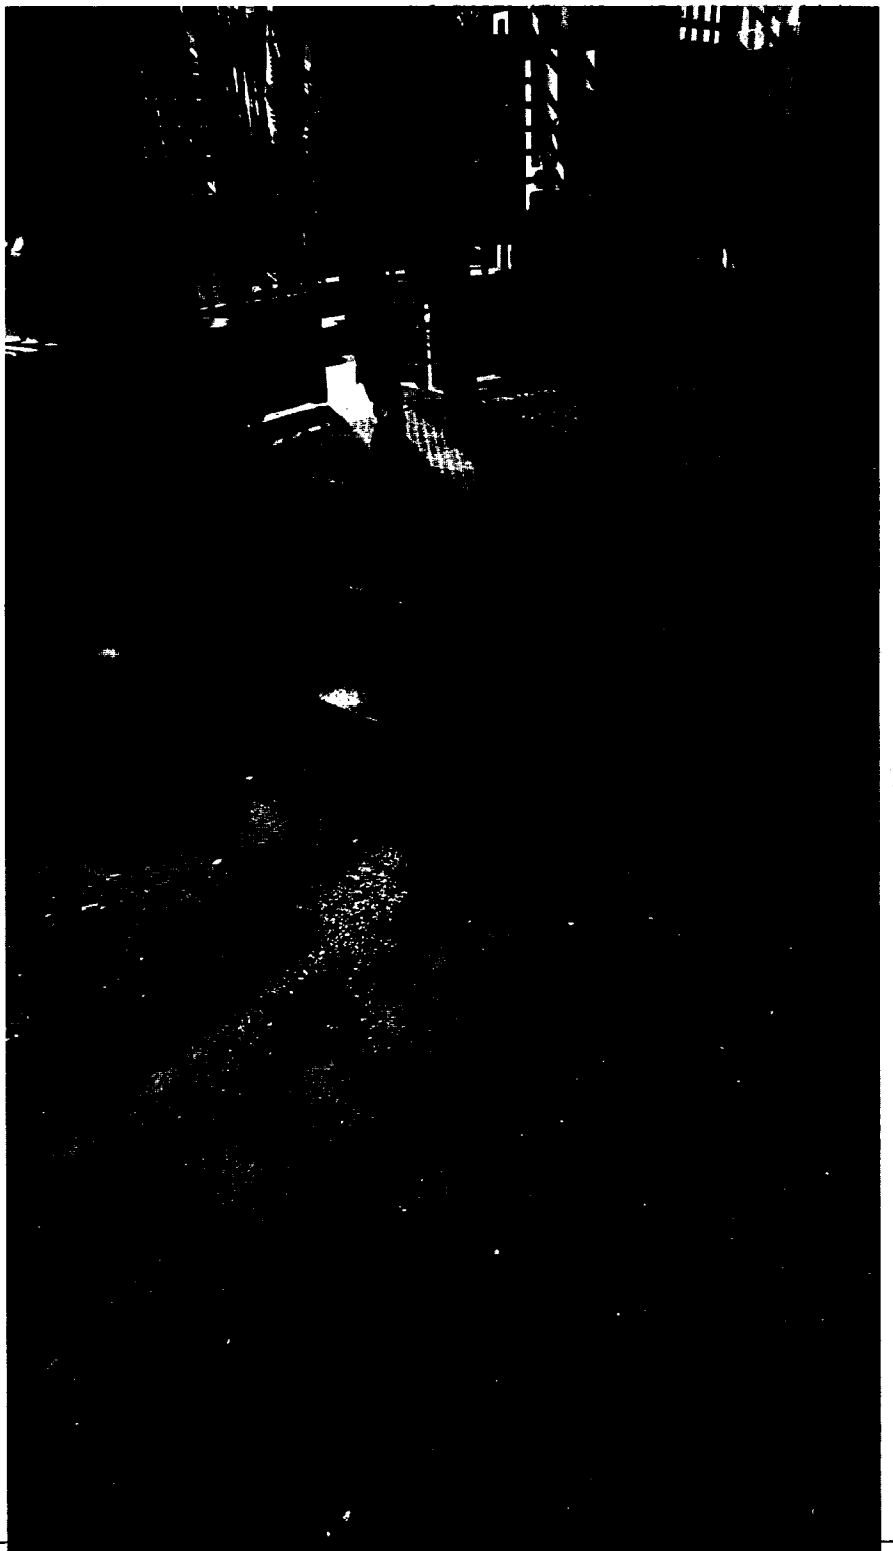

CONCLUSIONES

1. Se requiere de mantenimiento periódico consistente en el cambio de cinta aislante dependiendo el desgaste.
2. La limpieza de las rampas se puede realizar con agua jabón y una esponja y luego un trapo húmedo.

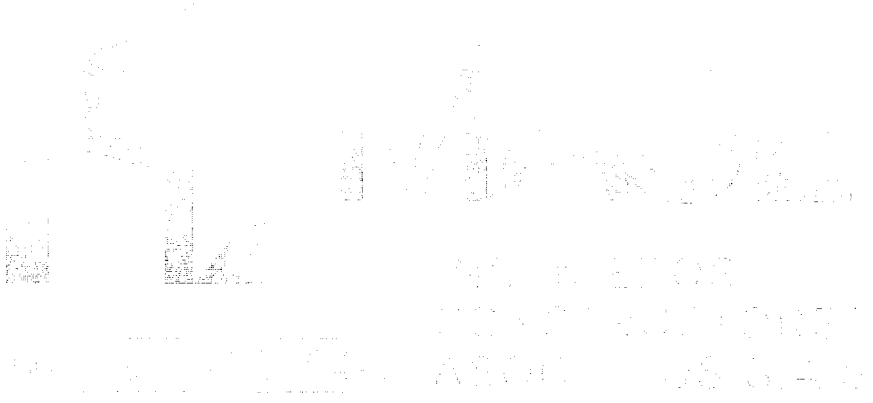

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900785304-7

Carrera 37 B No 1 D – 45 Bogotá. Cel 319 2114355 mauriciocortes21@gmail.com

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900785304-7

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2025

SEÑORES
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Atn;John Carlos Valderrama Ramírez
Supervisor del Contrato 255.
Ciudad

Ref: CERTIFICADO DE NO GENERACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Contrato 255.

Respetado Sargento Valderrama,

En mi calidad de representante legal de la empresa MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS NIT 900.785.304-7 declaro bajo la gravedad de juramento que durante el desarrollo del contrato 255, no se generaron residuos que requieran tratamiento, manejo o disposición final por parte de un gestor autorizado, de conformidad con la normativa ambiental vigente.

En consecuencia, no se emitió Certificado de Disposición Final.

Cordialmente,

Mauricio Cortés

ING. MAURICIO CORTES RIVERA
C.C. 79.913.293 de Bogotá
MP 25202-252679
Carrera 37 B No 1 D –45 Bogotá
Cel 3192114355
mauriciocortes21@gmail.com
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.785.304-7

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900785304-7

CERTIFICACION DE CUMPLMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA

Yo MAURICIO CORTES RIVERA identificado con C.C. 79.913.293 de Bogotá, en mi condición de representante legal de la empresa MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S., identificada con Nit. 900.785.304-7 debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá, certifico el pago de aportes realizados por la compañía durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los 14 días de noviembre de 2025

Atentamente,

Mauricio Cortés

ING. MAURICIO CORTES RIVERA
C.C. 79.913.293 de Bogotá
MP 25202-252679
Carrera 37 B No 1 D –45 Bogotá
Cel 3192114355
mauriciocortes21@gmail.com
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.785.304-7

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900785304-7	MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.		AK 15 No 118-03 OF 109	3192114355	mauriciocortes21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-10	E	13/11/2025	91452856	$746.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	28.500	0		0		0	8	200	0	28.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	8	300	0	57.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	17.100	0		0		0	8	100	0	17.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800229739-8	410.100	0	0		0	8	2.100	0	412.200	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	830011153-6	178.500				178.500		900	179.400			1	179.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	51.400	8	300	51.700	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	102.600	103.200
Pensión	1	410.100	412.200
Riesgos Laborales	1	178.500	179.400
CCF	1	51.400	51.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	742.600	746.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900785304-7	MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.	AK 15 No 118-03 OF 109	3192114355	mauriciocortes21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	13/11/2025	91452856	$746.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79913293	CORTES RIVERA MAURICIO ORLANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0
2	CC	79973320	GUEVARA RINCON JOHN JAIRO	1	0			S	X	X															230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-23	427.050	5	29.800	CCF22	427.050	8.600	0	0	0	0	0
3	CC	85152096	GUTIERREZ MENDEZ JHON JAIRO	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS005	711.750	28.500	14-23	711.750	5	49.800	CCF22	711.750	14.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900785304-7

GARANTIA RAMPAS DE ACCESIBILIDAD SUMINISTRADAS E INSTALADAS BAJO EL CONTRATO 255 CGFM DIADF DE 2025 A QUIEN CORRESPONDA:

El Suscrito MAURICIO CORTES en mi calidad de representante legal de la empresa MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS por medio del presente documento GARANTIZO el buen funcionamiento de las RAMPAS DE ACCESIBILIDAD SUMINISTRADAS E INSTALADAS BAJO EL CONTRATO 255 CGFM DIADF DE 2025 las cuales suministramos e instaladas en el Museo de las Fuerzas Militares Ubicado en la calle 10 No 4_92 el pasado 12 de noviembre de 2025.

La garantía aplica por un término de doce meses contados a partir del 14 de noviembre de 2025 y no aplicara si las RAMPAS son modificadas por otra compañía y/o entidad contratante

Atentamente,

Mauricio Cortés

ING. MAURICIO CORTES RIVERA
C.C. 79.913.293 de Bogotá
MP 25202-252679
Carrera 37 B No 1 D –45 Bogotá
Cel 3192114355
mauriciocortes21@gmail.com
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. NIT 900.785.304-7
