
PROGRAMACION UNION SUCRE 18 ENERO


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**PROGRAMACION BAJO TABLAZO**	**134,75 días**	**mié 17/09/25**	**dom 18/01/26**
2	Fecha Inicio De Obra	0 días	mié 17/09/25	mié 17/09/25
3	**PRELIMINARES**	**96,5 días**	**mié 17/09/25**	**dom 14/12/25**
4	Trazado y replanteo	15 días	mié 17/09/25	mar 30/09/25
5	Realizacion de tala de arboles, compensacion y reforestacion	1 día	mar 23/09/25	mié 24/09/25
6	Demolicion de muro perimetral	2 días	mié 1/10/25	vie 3/10/25
7	Retiro a disposicion final de material de demolicion	20 días	jue 2/10/25	dom 14/12/25
8	Suministro e instalacion de cerramiento en tela verde y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	10 días	mar 23/09/25	jue 2/10/25
9	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**69,5 días**	**mar 7/10/25**	**mié 10/12/25**
10	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro) < 0,50 mts	69,5 días	mar 7/10/25	mié 10/12/25
11	**IDENTIFICACION INSTITUCIONAL**	**4,25 días**	**mar 4/11/25**	**vie 7/11/25**
12	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable brillante con corte láser color a elección h: 20 cm y escudo en acero inoxidable en contraste satinado d: 80 cm	4,25 días	mar 4/11/25	vie 7/11/25
13	**CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL**	**14,38 días**	**lun 1/12/25**	**dom 14/12/25**
14	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	14,38 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
15	Suministro y colocación de solado en concreto pobre de 17,5 MPa (2500 PSI) hecho en obra	14,38 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
16	Suministro y colocación de concreto de 21 mpa para columnas y vigas (3,000 psi)	13,25 días	mar 2/12/25	dom 14/12/25
17	Suministro e instalacion de levante de muro en bloque e = 0,15 mts	13,25 días	mar 2/12/25	dom 14/12/25
18	**TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA**	**64 días**	**vie 17/10/25**	**dom 14/12/25**
19	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	15 días	vie 17/10/25	jue 30/10/25
20	Suministro y colocación de concreto de 28 mpa (4,000 psi)	15 días	mar 21/10/25	mié 5/11/25
21	Suministro e instalación de tapa en concreto de 21mpa (3000 psi) con bordes en ángulo de 2"x2" y reforzado con varillas de 3/8" de medidas 0,6mx0,6m, incluye ganchos de apertura.	14 días	mié 22/10/25	mié 5/11/25
22	Pañete impermeabilizado dosificación 1:4	5 días	jue 30/10/25	mié 5/11/25
23	Suministro e instalación de electrobomba de 1 Caballo	7 días	dom 7/12/25	dom 14/12/25
24	suministro e isntalacion de tubería pvc de 1/2" (incluye accesorios)	7 días	dom 7/12/25	dom 14/12/25
25	suministro e instalacion de tuberia pvc de 3/4" (inc. accesorios)	7 días	dom 7/12/25	dom 14/12/25

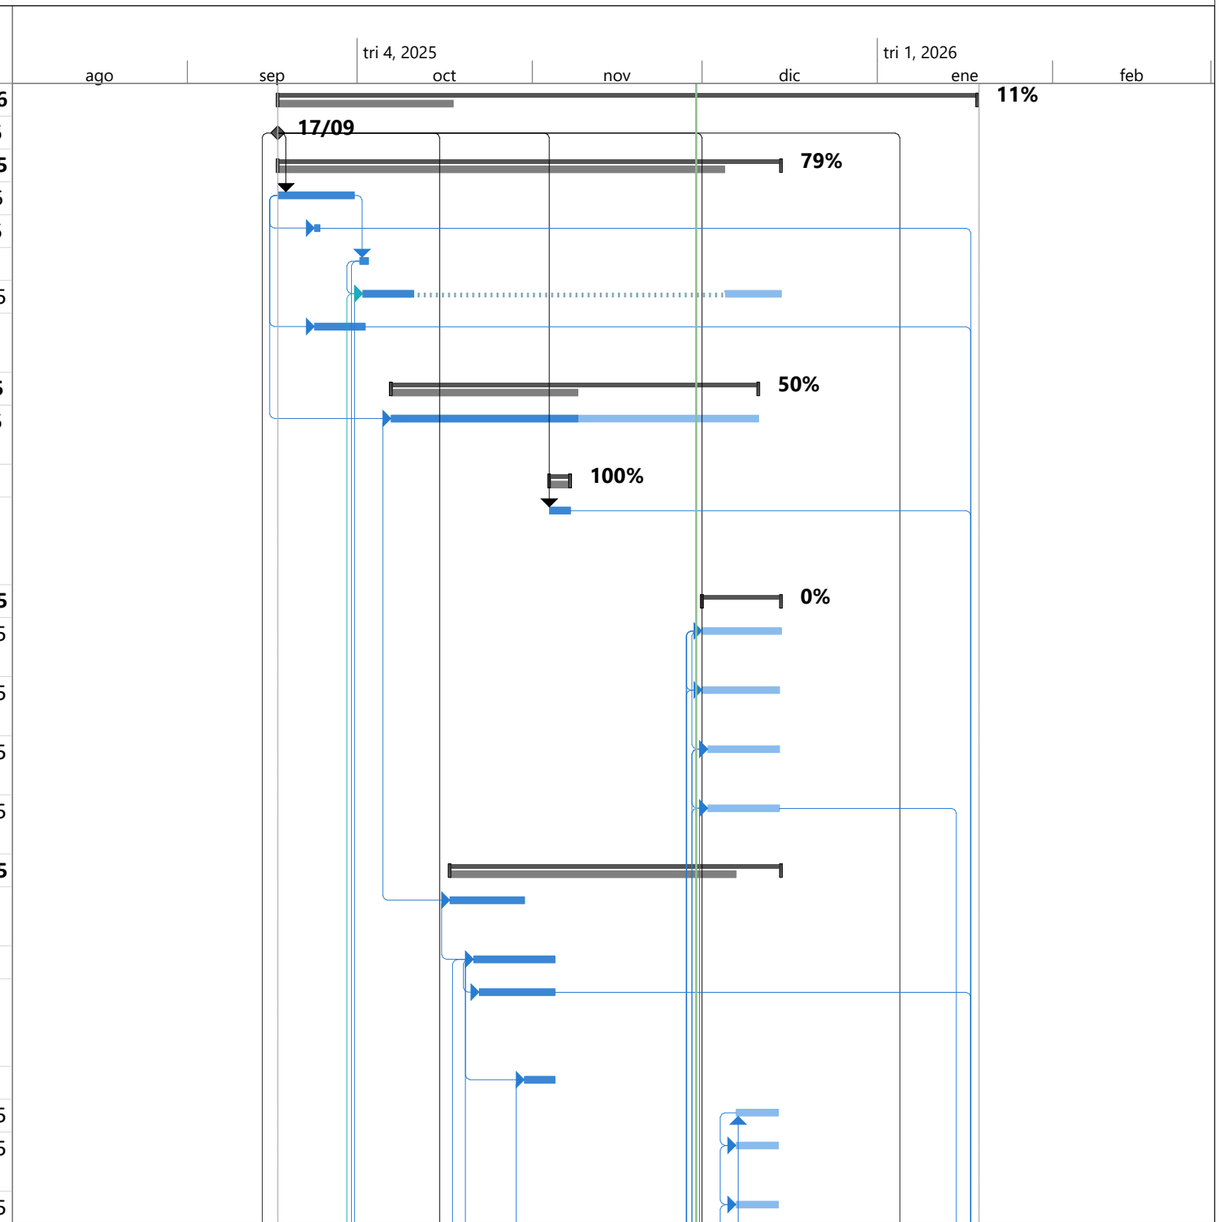

Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Tareas críticas
División crítica
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

PROGRAMACION UNION SUCRE 18 ENERO


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
26	Suministro e instalación de sika waterbar/cinta pvc o-22 sellar e impermeabilizar juntas en tanques	16 días	lun 20/10/25	mié 5/11/25
27	Suministro e instalación de interruptor flotador eléctrico	7 días	dom 7/12/25	dom 14/12/25
28	**CARPINTERIA METALICA**	**17 días**	**mié 15/10/25**	**jue 30/10/25**
29	Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable en tubería de 1" y ½".	17 días	mié 15/10/25	jue 30/10/25
30	Suministro e instalación de rejas para patio en tubería de 1 pulgada en acero inoxidable REF. 304	17 días	mié 15/10/25	jue 30/10/25
31	Suministro e instalacion de puerta de acceso en vidrio templado 2,30x2,20 incluye bisagra y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion, incluye desmonte de puerta existente y disposicion final.	17 días	mié 15/10/25	jue 30/10/25
32	**CERRAMIENTO ELECTRICO**	**4,25 días**	**jue 15/01/26**	**dom 18/01/26**
33	Suministro e instalación de kit solar para cerca eléctrica	4,25 días	jue 15/01/26	dom 18/01/26
34	Suministro e instalación de postes para cerca eléctrica. Incluye anclado de postes y aisladores para el cable	4,25 días	jue 15/01/26	dom 18/01/26
35	Cable para cercado eléctrico de 4 líneas	4,25 días	jue 15/01/26	dom 18/01/26
36	**SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO**	**45,88 días**	**vie 7/11/25**	**jue 18/12/25**
37	Suministro e instalación de tablero bypass de 40 A, con luz indicadora de la posición (Red o UPS).	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
38	Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 40 A	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
39	Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 x 15 A	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
40	Suministro e instalación de coraza liquid tight de 1" para conectar la entrada y salida de la UPS, conexionado del tablero regulado. Debe incluir acoples para conexión y correcta instalación.	45,88 días	vie 7/11/25	jue 18/12/25
41	Suministro e Instalación de ducto para salida 220 V desde el tablero hasta caja de conexión. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1 desde el tablero hasta el cuarto técnico.	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
42	Suministro e instalación de cable de cobre calibre #8 AWG THWN-2	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
43	Suministro e instalación de borna para ponchar de cobre calibre #8 AWG THWN-2	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
44	Suministro e instalación de caja de paso y conexiones	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
45	Instalación de tablero de 8 circuitos para el sistema regulado	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
46	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente doble regulado a 120 V, hasta 3 m. Incluye tomacorriente, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalación en canaleta metálica de 10 cm.	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25

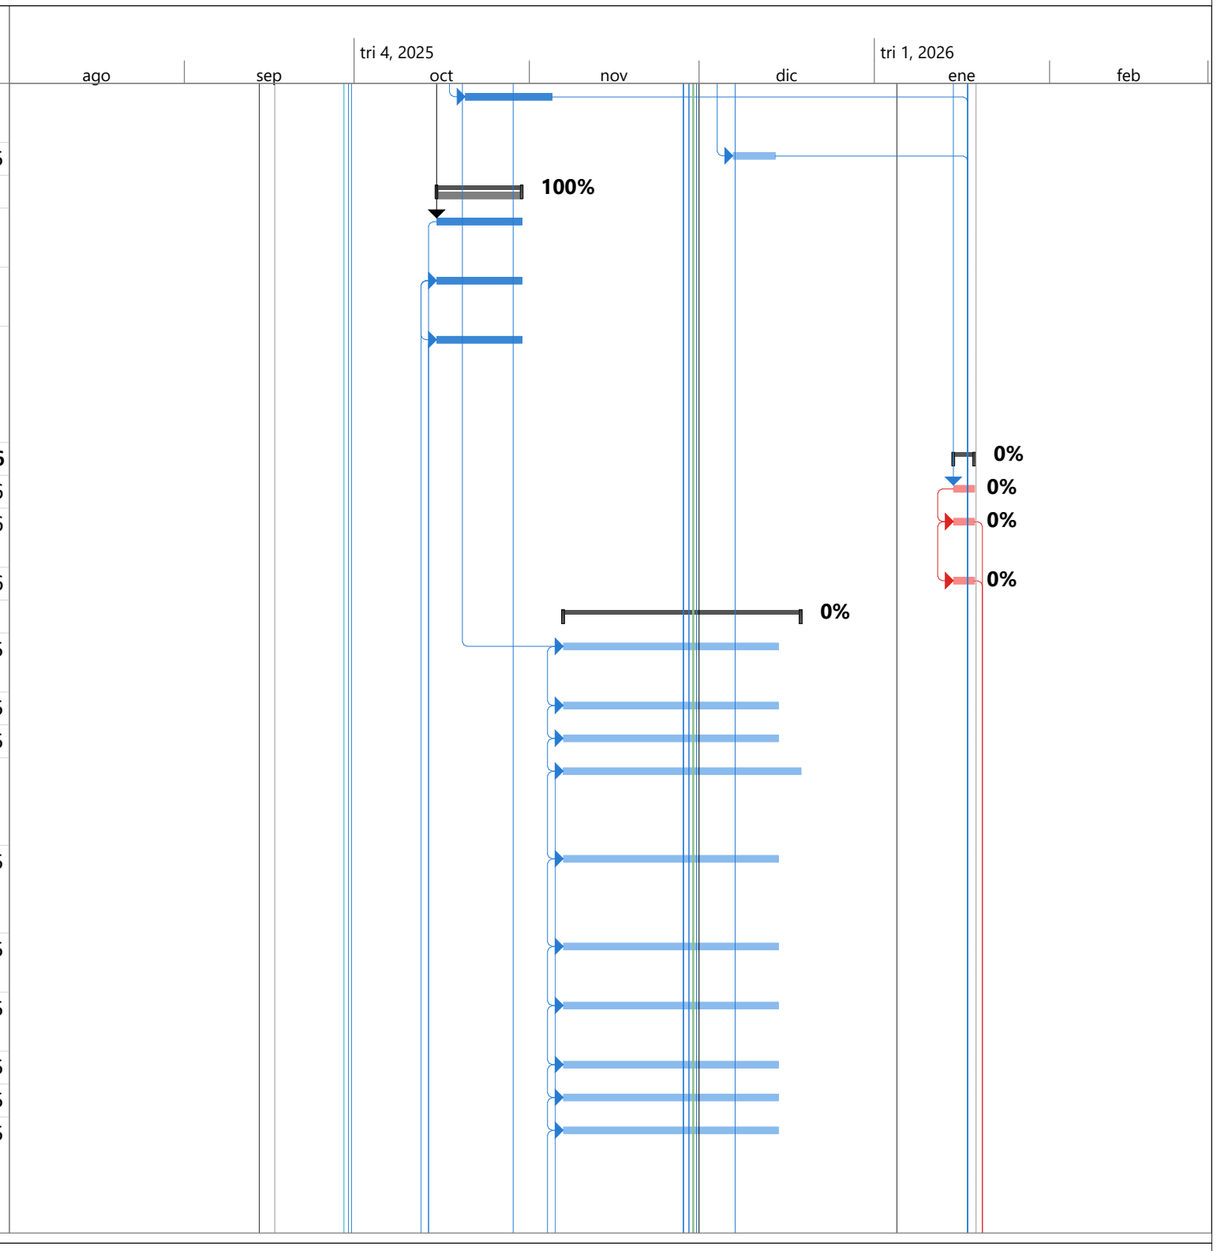

Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Tareas críticas
División crítica
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

PROGRAMACION UNION SUCRE 18 ENERO


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
47	Suministro e instalación de alimentador en cable 3* # 12 AWG	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
48	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2" para alimentador en cable 3* # 12 AWG	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
49	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2" incrustado para alimentador en cable 3* # 12 AWG. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
50	Suministro e instalación de salida para toma de electrobomba de 1 hp. Incluye tablero con protección termica y contol para los niveles	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
51	Suministro e instalación de puente para equipotencialización a la puesta a tierra en cable calibre # 8 AWG en el tablero principal	41,38 días	vie 7/11/25	dom 14/12/25
52	**ITEM NO PREVISTOS**	**48,13 días**	**lun 1/12/25**	**mié 14/01/26**
53	Retiro de suelo saturado procedente de excavaciones a zona de secado y acopio para su respectivo cargue	14 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
54	Excavaciones en suelo humedo profundidad variable entre 1mts a 2,0mts, incluye manejo de agua con motobomba	14 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
55	Trasiego de insumos hasta zona de patio interno	48,13 días	lun 1/12/25	mié 14/01/26
56	Demolición de cimentación existente con roto martillo (zapatas y pedestales)	4,25 días	lun 1/12/25	jue 4/12/25
57	Demolición de cimentación existente con roto martillo (viga cimiento)	4,5 días	lun 1/12/25	jue 4/12/25
58	Suministro y colocación de concreto de 28 mpa (4000psi) para muro de contención , incluye aditivo acelerante e impermeabilizante, espesor de muro e: 0,20m	20 días	lun 1/12/25	vie 19/12/25
59	Construcciòn de redoblon en concreto de 3000 psi , incluye producto pastoso impermeabilizante con tela de refuerzo poliester	11 días	lun 5/01/26	mié 14/01/26
60	Impermeabilización de viga canal con manto asfaltico de 2,5mm y pintura color aluminio	11 días	lun 5/01/26	mié 14/01/26
61	Picada sobre placa , retiro de bajante existente e instalación tuberia bajante, incluye sello en concreto	11 días	lun 5/01/26	mié 14/01/26
62	Suministro e instalación de coraza liquid tight de 3/4" para conectar la entrada de la bomba	14,38 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
63	Suministro e instalación de coraza liquid tight de 1/2" para conectar la entrada de la bomba	14,38 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
64	Suministro e instalción de tubo pvc de 1/2" subterraneo para alimentador de control de bomba, con excavaciòn	14,38 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
65	Suministro e instalción de tubo pvc de 3/4" subterraneo para alimentador de control de bomba, con excavacion	14,38 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25

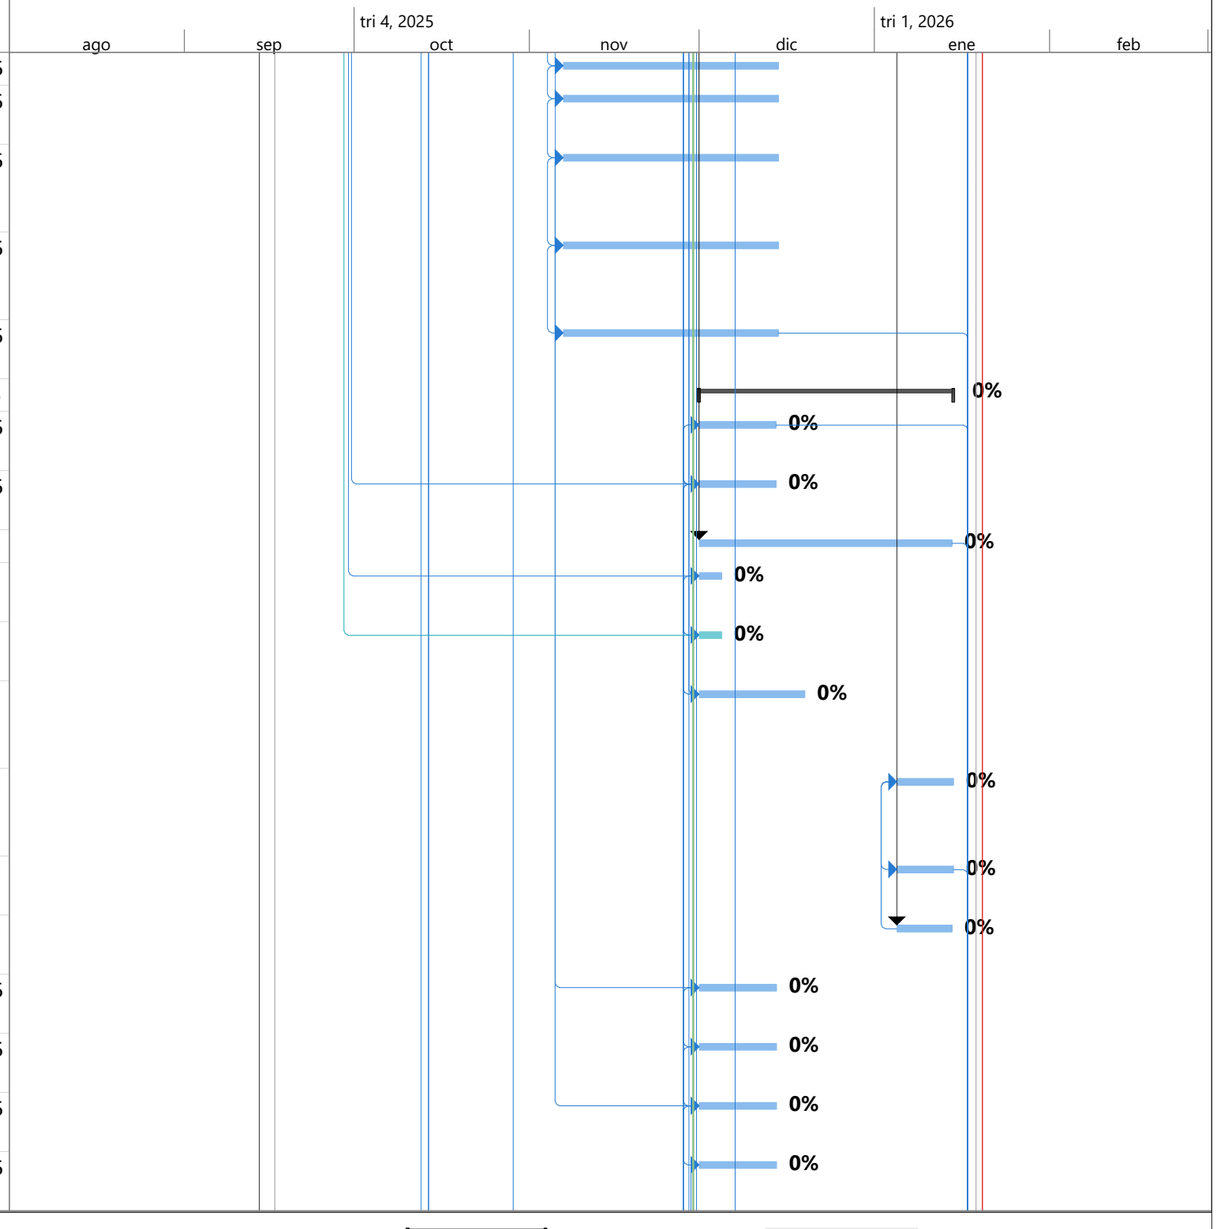

Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Tareas críticas
División crítica
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

PROGRAMACION UNION SUCRE 18 ENERO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
66	Registro electrico en concreto de 3000 psi , incluye tapa (medidas internas 40 x 40)	1 día	dom 14/12/25	lun 15/12/25
67	Base a piso para puerta princpial , incluye su corte de piso, base de zocalo y fijaciones a hoja de vidrio	17 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
68	Retiro de vinilo existente, limpieza de ventanas e instalaciòn de nueva capa de vinilo esmerilado para puertas y ventanas	17 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25
69	Sum. e instalación de tuberia sanitaria perforada de 6" para filtro	14,38 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
70	Relleno con grava limpia para filtro de drenaje	14,38 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
71	Sum e instalación de geotextil nt 1800 para filtro de drenaje	14,38 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
72	Caseta para electrobomba de 1a x 1,3b x 1,7h dimensiones internas (incluye placa en concreto 3000 psi e = 8 cm y protector metalico y sistema de seguridad cadena y candado)	5,38 días	lun 1/12/25	vie 5/12/25
73	Relleno transportado de cantera , incluye compactaciòn y cumplimiento de proctor modif 95%, especial para terraplenes	17,75 días	mar 30/12/25	mié 14/01/26
74	Concreto ciclopeo para estabilizar fondos de zapatas	14,38 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
75	Concreto de 4000 psi impermeabilizado para zapatas, pedestales y viga princiupal (incluye acelerante)	14,38 días	lun 1/12/25	dom 14/12/25
76	**COSTOS INDIRECTOS**	**133,63 días**	**mié 17/09/25**	**sáb 17/01/26**
77	Administración	133,63 días	mié 17/09/25	sáb 17/01/26
78	Imprevistos	133,63 días	mié 17/09/25	sáb 17/01/26
79	Utilidad	133,63 días	mié 17/09/25	sáb 17/01/26
80	IVA Sobre La Utilidad	133,63 días	mié 17/09/25	sáb 17/01/26
81	Fin De La Obra	0 días	dom 18/01/26	dom 18/01/26

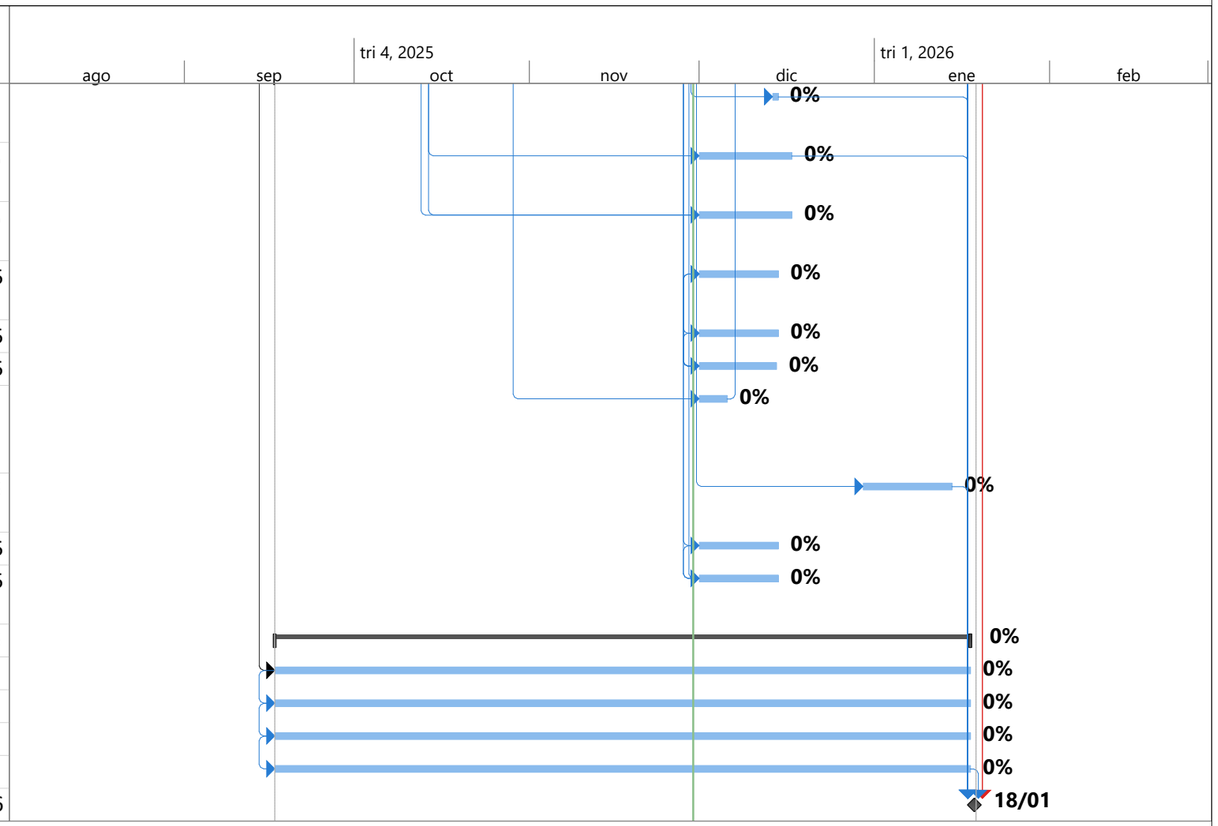

Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Línea base		Resumen		Tarea inactiva	
Tarea		solo fin		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo	
División		solo duración		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo	
Progreso de tarea		Tareas críticas		Hito		Tareas externas		Fecha límite	
Tarea manual		División crítica		Progreso del resumen		Hito externo			
