	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	PRELIMINARES	**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Retiro a disposicion final de material de demolicion	**UND**	M3







DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 1.04									
MURO	30,69	0,15	4,07		28,08			1,00	28,08
SUMA									28,08
F. EXPANS	1,20								33,69
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**33,69**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL	FECHA DE CORTE	20/12/2023
ITEM	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	UND	KG









DESCRIPCION	DIMENSIONES						No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	DIAMETRO	PESO(KG/M)	# ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD		
ZAPATAS 1X0.6	1,20	1/2"	0,9960	3,00			13,00	46,61
ZAPATAS 1X0.6	0,80	1/2"	0,9960	6,00			13,00	62,15
PEDESTAL 30X35 ACERO LONGITUDINAL	2,95	1/2"	0,9960	8,00			2,00	47,01
PEDESTAL 30X35 ACERO TRANSVERSAL	0,90	3/8"	0,5570	33,00			2,00	33,09
PEDESTAL 30X30 ACERO LONGITUDINAL	2,95	1/2"	0,9960	8,00			8,00	188,04
PEDESTAL 30X30 ACERO TRANSVERSAL	0,80		0,5570	33,00			8,00	117,64
PEDESTAL 30X40 ACERO LONGITUDINAL	2,95	1/2"	0,9960	10,00			3,00	88,15
PEDESTAL 30X40 ACERO TRANSVERSAL	1,00	3/8"	0,5570	33,00			3,00	55,14
COLUMNAS 15X20	4,40	1/2"	0,9960	4,00			18,00	315,53
COLUMNAS 15X20	0,60	1/4"	0,25	56,00			18,00	151,20
VIGA 30X40 ACERO LONGITUDINAL	6,00	5/8"	1,5600	25,00			1,00	234,00
VIGA 30X40 ACERO TRANSVERSAL	1,00	3/8"	0,5570	288,00			1,00	156,61
VIGA 15X20 ACERO LONGITUDINAL	6,00	1/2"	0,9960	25,00			1,00	149,40
VIGA 15X20 ACERO TRANSVERSAL	0,60	1/4"	0,25	288,00			0,00	0,00
VIGA 20X20 ACERO LONGITUDINAL	6,00	1/2"	0,9960	25,00			1,00	149,40
VIGA 20X20 ACERO TRANSVERSAL	0,70	1/4"	0,25	288,00			0,00	0,00
MURO e=20cm ACERO VERTICAL	2,00	3/8"	0,5570	316,00			1,00	352,02
MURO e=20cm ACERO HORIZONTAL	6,00	1/2"	0,9960	127,00			0,00	0,00
TOTAL								2146,00


Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL	**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro y colocación de solado en concreto pobre de 17,5 MPa (2500 PSI) hecho en obra	**UND**	M2



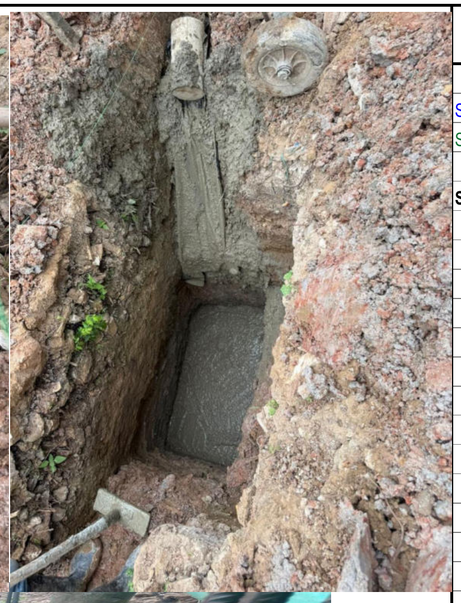



DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 4.02									
SOLADO ZAPATA 1	1,00	1,00		1,00				4,00	4,00
SOLADO ZAPATA 1	1,00	0,60		0,60				8,27	4,96
SOLADO VIGA	20,00	0,30		6,00				1,00	6,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**14,96**


Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA		FECHA DE CORTE	20/12/2023
ITEM	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi		UND	KG



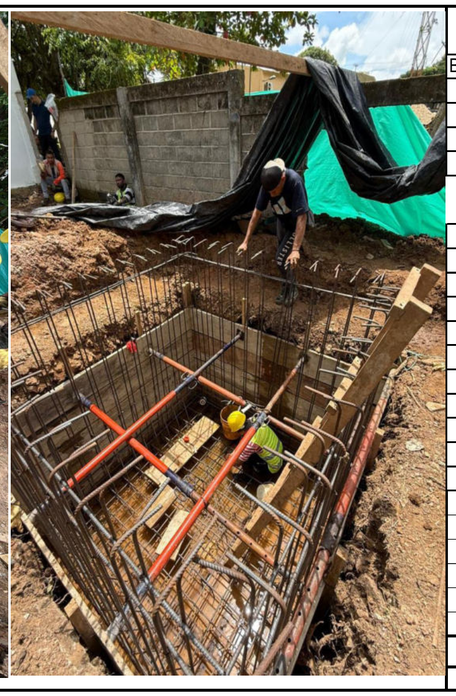


DESCRIPCION	DIMENSIONES						No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	DIAMETRO	PESO(KG/M)	# ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD		
BASTONES MUROS Y LOSAS	2,80	1/2"	0,9960	190,33			1,00	530,80

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA		FECHA	15/10/2025
ITEM	Suministro y colocación de concreto de 28 mpa (4,000 psi)		UND	M3



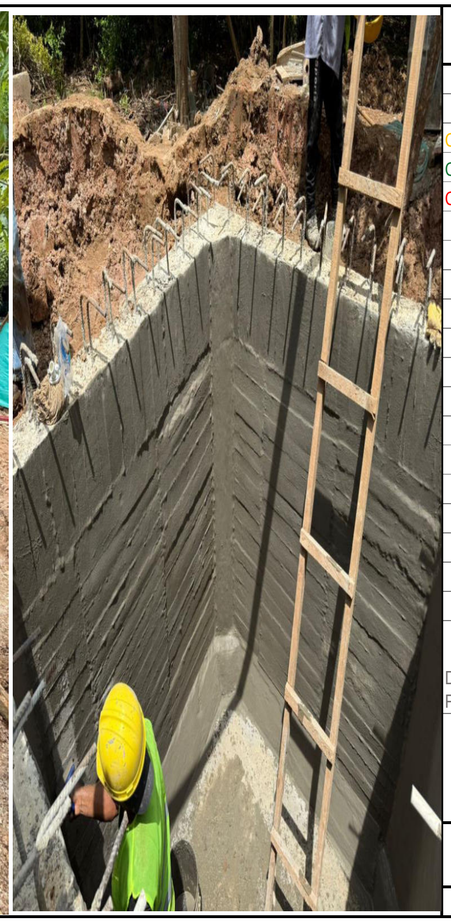

DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 5.01									
CCONCRETO LOSA SUPERIOR	2,60	2,60	0,30		2,03			1,00	2,03
CONCRETO MUROS	9,20	0,30	1,80		4,97			1,00	4,97
CONCRETO CUÑAS	16,40			0,02	0,33			1,00	0,33
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									7,32

Contratista-de Obra


VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA		**FECHA**	15/10/2025	
ITEM	suministro e isntalacion de tubería pvc de 1/2" (incluye accesorios)			**UND**	UND





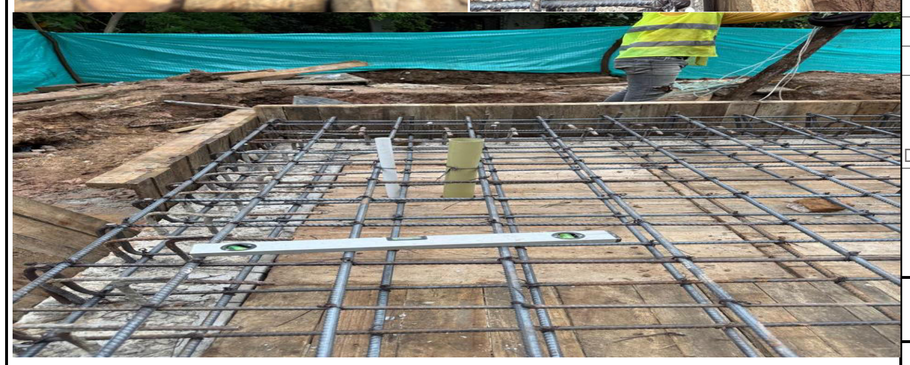

DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 5.06									
TUBBERIA PVC 1/2"	22,00					1,00		1,00	22,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**22,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	suministro e instalacion de tuberia pvc de 3/4" (inc. accesorios)		**UND**	UND







DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 5.07									
TUBERIA PVC 3/4"	26,00					1,00		1,00	26,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**26,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de tablero bypass de 40 A, con luz indicadora de la posición (Red o UPS).		**UND**	UND



DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.01									
TABLERO						1,00		1,00	1,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**1,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de coraza liquid tight de 1" para conectar la entrada y salida de la UPS, conexionado del tablero regulado. Debe incluir acoples para conexión y correcta instalación.		**UND**	m



DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.04									
CORAZA	12,00							1,00	12,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**12,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.

BALANCE

BALANCE N1

PAGINA 1 DE 1
REV. N°1
FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		FECHA	15/10/2025
ITEM	Suministro e Instalación de ducto para salida 220 V desde el tablero hasta caja de conexión. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1 desde el tablero hasta el cuarto técnico.		UND	m



DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.05									
DUCTO	10,00							1,00	10,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**10,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de cable de cobre calibre #8 AWG THWN-2		**UND**	m



DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.06									
CABLE #8	98,00							1,00	98,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**98,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de borna para ponchar de cobre calibre #8 AWG THWN-2		**UND**	UND




DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.07									
BORNA PARA PONCHAR						1,00		16,00	16,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**16,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de caja de paso y conexiones		**UND**	UND

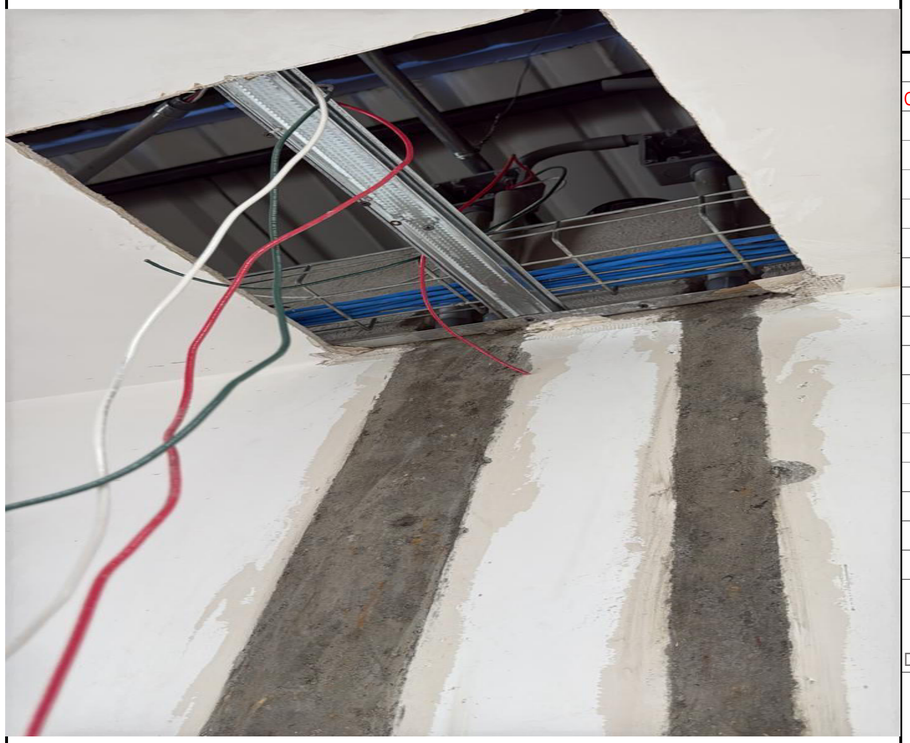

DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 8.08									
CAJA DE PASO						2,00		1,00	2,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**2,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.

BALANCE

BALANCE N1

REV. N°1

FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		FECHA	15/10/2025
ITEM	Instalación de tablero de 8 circuitos para el sistema regulado		UND	UND



DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.09									
TABLERO 8 CIRC						1,00		1,00	1,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**1,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		FECHA	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente doble regulado a 120 V, hasta 3 m. Incluye tomacorriente, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalación en canaleta metálica de 10 cm.		UND	UND








DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.10									
SALIDA ELECTRICA						1,00		8,00	8,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**8,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2" para alimentador en cable 3* # 12 AWG		**UND**	m



DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM 8.12									
TUBERIA PVC SCH40	26,00							1,00	26,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**26,00**


Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	SISTEMA ELECTRICO REGULADO		FECHA	15/10/2025
ITEM	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2" incrustado para alimentador en cable 3* # 12 AWG. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1		UND	m



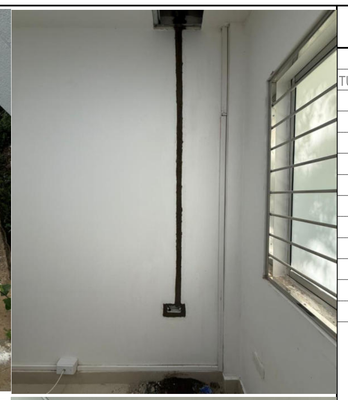





DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 8.13									
TUBO PVC DE 1/2"	36,00							1,00	36,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**36,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	RETIRO DE SUELO SATURADO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES A ZONA DE SECADO Y ACOPIO PARA SU RESPECTIVO CARGUE		**UND**	M3









DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM NP 1.1									
TANQUE	3,00	3,00	2,10		18,90			1,00	18,90
VIGAS	20,00	0,60	1,1		13,20			1,00	13,20
ZAPATA 1	1,20	1,20	1,80		2,59			4,00	10,37
ZAPATAS 2	1,20	0,80	1,80		1,73			13,00	22,46
ESCARIFICAR CAPA EXISTENTE			13,15	10,00	0,30			1,00	39,45
			L	A	ESP				
SUBTOTAL									104,38
FACTOR EXPANSION		1,20							125,26
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**125,26**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	EXCAVACIONES EN SUELO HUMEDO PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 1MTS A 2,0MTS, INCLUYE MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA		**UND**	M3









DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM NP 1.2									
VIGAS	20,00	0,60	1,30		15,60			2,00	31,20
ZAPATAS 1	1,20	1,20	1,80		2,59			4,00	10,37
ZAPATAS 2	1,20	0,80	1,80		1,73			9,00	15,55
TANQUE	3,00	3,00	2,10		18,90			1,00	18,90
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**76,02**

Contratista-de Obra


VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	TRASIEGO DE INUSMOS HASTA ZONA DE PATIO INTERNO		**UND**	M3





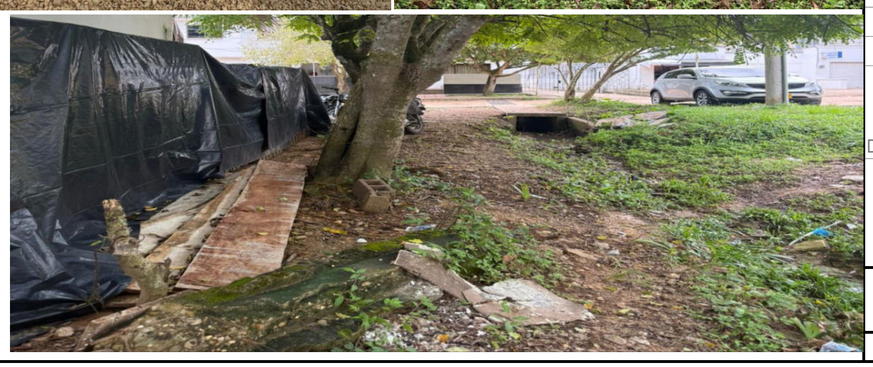

DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM NP 1.3									
BLOQUE 015					10,63			1,00	10,63
ARENA DE RIO					11,50			1,00	11,50
GRAVA					11,50			1,00	11,50
RELLENO					28,000			1,00	28,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**61,63**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE CON ROTO MARTILLO (VIGAS,ZAPATAS Y PEDESTALES)		**UND**	UND



DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM NP 1.4									
ZAPATAS 1						1,00		9,00	9,00

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE CON ROTO MARTILLO (VIGA CIMIENTO)		**UND**	ML



DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM NP 1.5									
VIGA CIMIENTO	20,00							1,00	20,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**20,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		FECHA	15/10/2025
ITEM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPA (4000PSI) PARA MURO DE CONTENCIÓN , ESP: 0,20M		UND	M2








DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM NP 1.6									
MURO	33,00		1,20	39,60				1,00	39,60
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**39,60**


Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	CONSTRUCCIÒN DE REDOBLON EN CONCRETO DE 3000 PSI , INCLUYE PRODUCTO PASTOSO IMPERMEABILIZANTE CON TELA DE REFUERZO POLIESTER		**UND**	ML

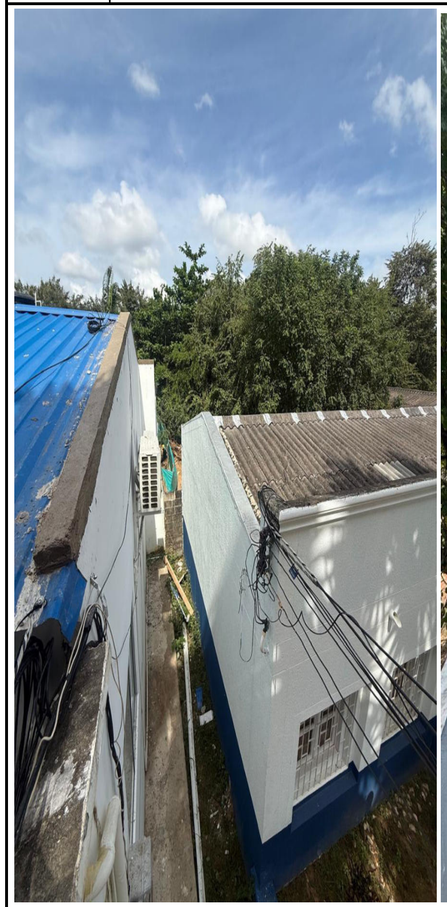

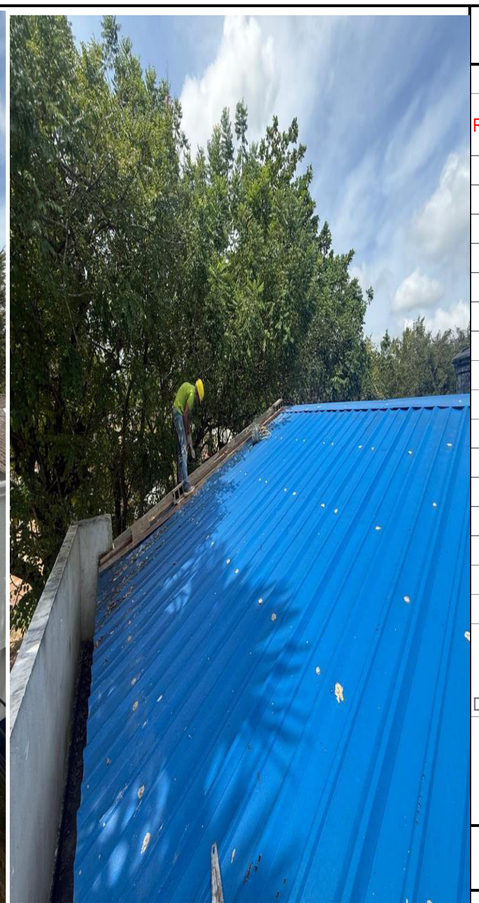

DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM NP 1.7									
REDOBLON BORDES	25,00							1,00	25,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**25,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL CON MANTO ASFALTICO DE 2,5MM Y PINTURA COLOR ALUMINIO		**UND**	M2




DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM NP 1.8									
VIGA CANAL	10,00	2,50		25,00				1,00	25,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**25,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	PICADA SOBRE PLACA , RETIRO DE BAJANTE EXISTENTE E INSTALACIÓN TUBERIA BAJANTE, INCLUYE SELLO EN CONCRETO		**UND**	UND

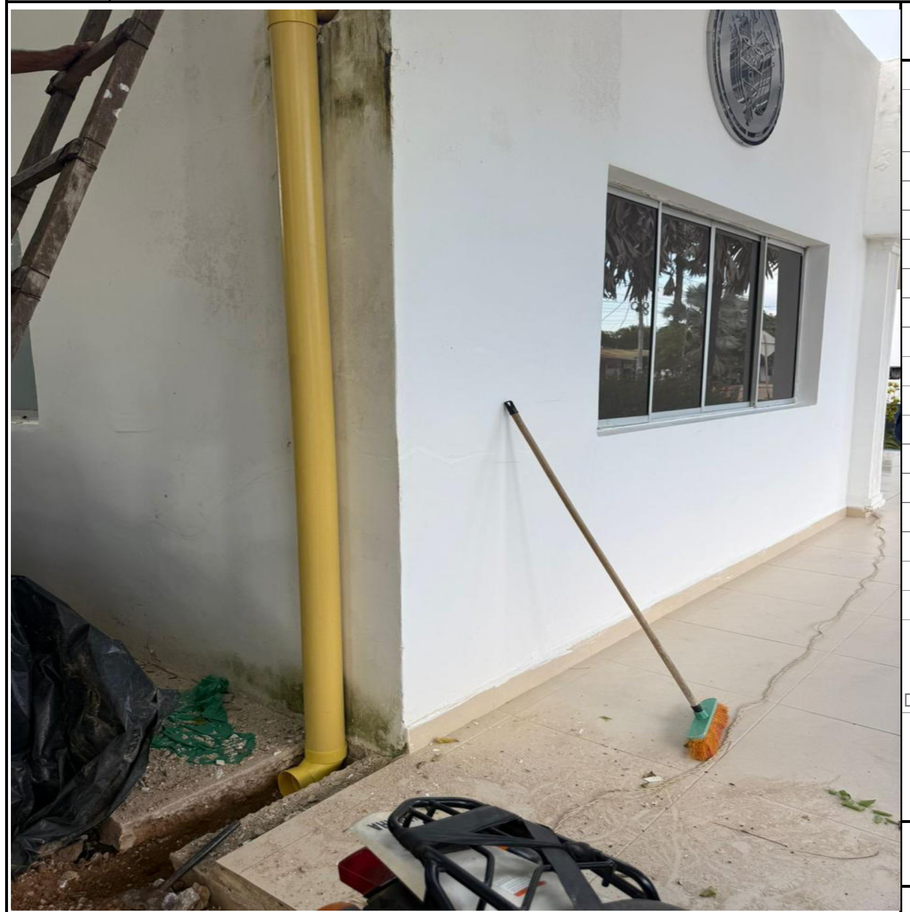

DESCRIPCION	DIMENSIONES								
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**				
ITEM NP 1.9									
						1,00		1,00	1,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**1,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	BASE A PISO PARA PUERTA PRINCPIAL , INCLUYE SU CORTE DE PISO Y FIJACIONES A HOJA DE VIDRIO		**UND**	UND



DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM NP 1.15									
BASE A PISO Y BASE SOCALO						1,00		1,00	1,00
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**1,00**

Contratista-de Obra


VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		**FECHA**	15/10/2025
ITEM	RETIRO DE VINILO EXISTENTE, LIMPIEZA DE VENTANAS E INSTALACIÒN DE NUEVA CAPA DE VINILO ESMERILADO PARA PUERTAS Y VENTANAS		**UND**	M2





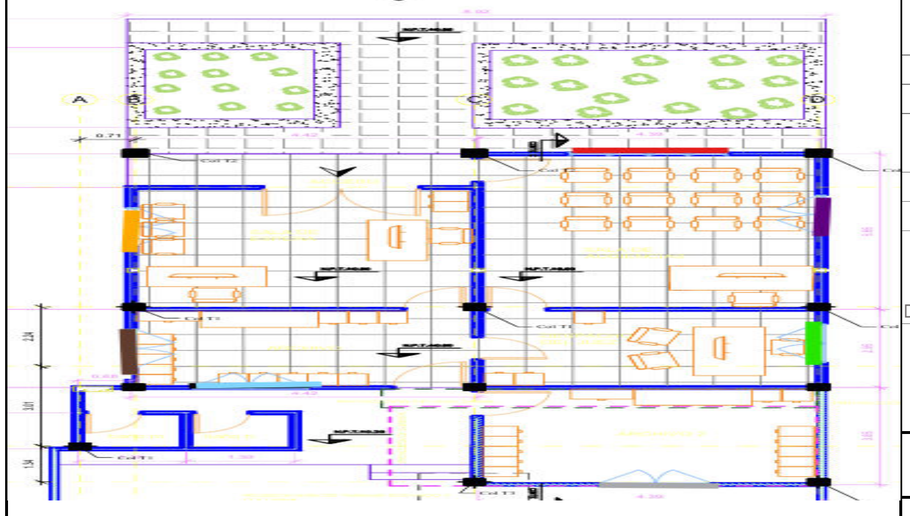

DESCRIPCION	DIMENSIONES							**No. ELEM**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**M2**	**M3**	**UNIDAD**	**PESO**		
ITEM NP 1.16									
VINILO								1,00	0,00
VINIL VENTANA 1	2,55	1,19		3,03				1,00	3,03
VINIL VENTANA 2	1,15	1,51		1,74				1,00	1,74
VINIL VENTANA 3	1,31	1,16		1,52				1,00	1,52
VINIL VENTANA 4	1,45	1,20		1,74				1,00	1,74
VINIL VENTANA 5	1,46	1,16		1,69				1,00	1,69
VINIL VENTANA 6	1,44	1,14		1,64				1,00	1,64
VINIL VENTANA 7	1,47	1,16		1,71				1,00	1,71
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**13,07**

Contratista-de Obra


VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	MOVIMIENTO DE SUELO	FECHA	15/10/2025
ITEM	RELLENO TRANSPORTADO DE CANTERA , INCLUYE COMPACTACIÒN Y CUMPLIMIENTO DE PROCTOR MODIF 95%, ESPECIAL PARA SUBRASANTES	UND	M3





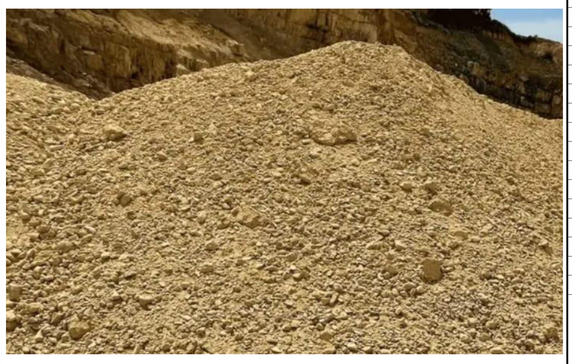

DESCRIPCION	DIMENSIONES							No. ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO		
ITEM 1.21									
RELLENO PATIO									
PATIO INTERNO					22,00			1,00	22,00
TOTAL									**22,00**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		FECHA	23/11/2025
ITEM	CONCRETO CICLOPEO PARA ESTABILIZAR FONDOS DE ZAPATAS		UND	M3



DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
ITEM NP 1.22									
ZAPATAS DE ESQUINAS	1,00	1,20	0,30		0,36			4,00	1,44
ZAPATAS INTERIORES	1,00	0,70	0,30		0,21			9,00	1,89
VIGAS	33,00	0,70	0,30		6,93			1,00	6,93
SOBREANCHOS	33,00	0,30	0,30		2,97			1,00	2,97
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									13,23

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNIÓN, SUCRE.	BALANCE
	BALANCE N1	PAGINA 1 DE 1 REV. N°1 FECHA: OCT-2025

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		FECHA	23/11/2025
ITEM	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA ZAPATAS , PEDESTALES Y VIGA PRINCIPAL (INCLUYE ACELERANTE)		UND	M3










DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	M2	M3	UNIDAD	PESO	No. ELEM	MEDIDA TOTAL
ITEM NP 1.23									
ZAPATAS DE ESQUINAS	1,00	1,00	0,25		0,25			4,00	1,00
ZAPATAS INTERIORES	1,00	0,60	0,25		0,15			9,00	1,35
VIGA CIMIENTO	29,00	0,30	0,40		3,48			1,00	3,48
PEDESTALES 30X30	0,30	0,30	2,30		0,21			8,00	1,66
PEDESTALES 30X40	0,40	0,30	2,30		0,28			3,00	0,83
PEDESTALES 30X35	0,35	0,30	2,30		0,24			2,00	0,48
DSCTO ACUMULADO ACTAS PARCIALES									0,00
TOTAL									**8,80**

Contratista-de Obra

VoBo Interventoria
