CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Retroalimentación Orden y Aseo	FECHA:	13-12-2025
EXPOSITOR:	Liray Janeth Ramirez	HORAS	15 minutos
LUGAR:	construccion nuevo Hospital	TOTAL DE PERSONAS:	26

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	[illegible]	RIVERO	73575360		
2	[illegible]	Sergio	Operador		
3	1067600766	Andres F Muñoz No	Operador		Andres Muñoz
4	1007413782	Andres [illegible]	Operador		
5	1053010798	Abraham Henriquez	Cadenero		
6	1007316713	Yuri Alejandra Lopez	Operadora		Yuri Alejandra Lopez
7	1128044706	Jorge A Caballero Reyth	Topografo		
8	9.165.734	Jose Luis S/R	Oficios		
9	97027664	Jose Hernandez	Oficios		
10	1047414876	Cristian Eduardo Lu	Oficial		
11	73737393	Robinson Saavedra	Oficial		
12	1003699422	Yulet castellar.	Ayudante		
13	1007289931	Sharon Castro	Medidor		Sharon
14	1005951365	Jose granados	AUX		Jose Manuel
15	1007316544	Cristian Ortega	Oficial		
16	1706758910	Yoiser Jose	Ayudante		
17	73193932	Ramiro Herrera	Oficial		
18	1006369457	Juan David Narvaez	Aux		
19	1067750977	Steban Castro	Steban		
20	1007287807	Jose Anderson Loaiza	Aux.		
21	1007042464	Julian David castro	Aux		Julian
22	1076502220	Ruiz Garcia Daniel	Ayudante		
23	1067732699	Anderson Guzman	Aux		Anderson
24	1128254322	Pedro Luis Zapata	Oficial		Pedro
25	1013578 527	Juan C. guerrero	Auxiliar		Juan Camilo
26	3527609 63	Juan Munoz	Mitos		
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Retroalimentacion del Reglamento Interno del consorcio Equigrava		FECHA:	15-12-2025	
			HORAS	15 minutos	
EXPOSITOR:	Luzy Joneth Ramirez.		TOTAL DE PERSONAS	28.	
LUGAR:	nuevo proyecto Hospital sanjuan Bautista				

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1067600766	Andres F Muñoz Noreña	operador		Andres Munoz
2	1002347207	Andres D Perez Ch.	Operador		
3	1006775969	Andres Serrato	Operador		
4	1053010598	Abraham Henriquez	cadenero		
5	1128044706	Jony A Caraballo	Topografo		
6	9.105.204	Jairo Luis A R	Oficial		
7	1047414876	Cristian Chamizo	oficial		
8	73575366	Humberto	Ofi		
9	73727073	Roberto Saborido	Ofi		Roberto
10	1067688546	Jorel Bayardo	Ay-1		Jorel Bayardo
11	1005851365	Jose manuel	Aux		Jose manuel
12	1076302770	Rojas Forero Daniel	Ayudante		
13	1005819442	Kelex Cespedes.	Ayudante.		
14	1007816778	Yuli Alexander	Oficial		
15	1067727649	Anderson Guzman	Aux		Anderson
16	1196769457	Juan David Narvaez	Aux		
17	1206738918	Yelson Ortiz	Aux		
18	1077189931	Shaon Castro	Ayudante		Shaon Castro
19	73193932	Bonifacio Alvarez.	Ofi		
20	1002165449	Escalante Ortiz.	Aux		Escalante
21	1011042164	Julian Patricio Castro	Aux		Julian
22	1007116084	Andres David Perez	Ayudante		
23	1067759857	Johan Castro	Ayudante		Johan. F
24	1128064322	Pedro Luis	Ofi		Pedro
25	1007288807	Jobe Anderson Lanza	Aux.		
26	1113.578.527	Juan C Guerrero	Auxiliar		
27	1005851375	Edwar Rodriguez	Ayudante		Edwar R
28	25.260.863	Juan Alvarez	Ayudante		
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 15/11/2025
	CONSORCIO EQUIGRAVA	CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Resbalos, Tropezones y caidas	FECHA:	16-12-2025
EXPOSITOR:	Lirdy Janeth Ramirez C.	HORAS	15 minutos
LUGAR:	nuevo proyecto Hospital San Juan Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	26.

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1706788978	Yulson Zaiy	AUX1		
2	1706775961	Wilder Sen	Operador		
3	1007347783	Andres Chaun	Operador		
4	1067600766	Anderson Felipe Munar	Operador		
5	1053010598	Abraham Henriquez	cadenero		
6	1128044706	Jorge A Caraballo Bayuth	Topografo		
7	1007816718	Yuli. Mendez Ayala	Oficiador		
8	7707726.6	[illegible]	[illegible]		
9	9145254	[illegible]	[illegible]		
10	1047414876	Fabian E Ramirez T	Oficial		
11	1004228546	Jose Luis	Mtl		
12	1007189931	Shoan Castro	Ayudante		
13	23575360	[illegible]	Ofi		
14	1005851365	Jose manuel	Aux		
15	1005851395	Edgar Rodriguez	Aycontic		
16	1006772649	Anderson Guzman	Ayu		
17	1122 0412 1264	Julian David	Ayu		
18	1006774444	Shoan Castro	Ayu		
19	1005819422	Jales Regredes	Ayu		
20	1002216549	Eudomilio cortes	[illegible]		
21	1128054772	Pedro Luis Suarez	Mtl		
22	1007287807	Jose Anderson Loaiza	Aux.		
23	1018.528.1	Juan Camilo guerrero	Auxilia		
24	85.966.963	Yuran Mynaz	Mecanico		
25	1076507726	Elvis Perez Daniel	Ayudante		
26	73 771 09	Robert Tarazona	Oficial		
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO EQUIGRAVA	Versión: 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Charla Riesgo Atmosferico en Tiempos de lluvias	FECHA:	17-12-2025
EXPOSITOR:	Lizy Janeth Ramirez C.	HORAS	15 minutos
LUGAR:	Nuevo Proyecto Hospital san Juan B.	TOTAL DE PERSONAS:	25.

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1012 STB. 527	Juan C guerrero	Auxiliar	Consorcio Equigrava	
2	1006891365	Jose manuel Gaitan	Aux	consorcio EQUIgrava	
3	735375360	Humberto	Ofic	C Equ	
4	1007RE8574	Josel Sarte	Aux. I. Ac.	Josel.bcsAC	
5	73193932	Reinaldo Navarro	Oficial		
6	1007189931	Jhoan Castro	Ayudante	Jhonathan Castro	
7	9.1452.14	Jorge Luis A R	Oficial		
8	1067600766	Andres Felipe Nuñez	Operador		
9	1128044706	Jorge A Carabalo R	Topografo		
10	1053010598	Abraham Henriquez	cadenero		
11	1003453702	Andres R. Perez Ch	Oficial		
12	7797376C4	Luis Felipe Rosillo	Oficial		
13	737710083	Nestor Sabogal	OFICIAL		
14	1002316544	Enrique Ortiz	Ayu.		
15	1041146082	Isaac Diaz	Auxiliar		
16	1106788918	Yoiser Salas	Aux		
17	1111 [illegible] 4C4	Juan David Castro	Ay		
18	1106760453	Juan David Narvaez	Aux	Consorcio	
19	1106778877	Jhoan Castro	Ayu		
20	1128054322	Pedro Luis Zabaleta	Ofi		
21	1106772699	anderson guzman	Ayu.		
22	1007287807.	Jose Anderson Lozano	Aux.	consorcio.	
23	1003819427	Aslid Cabrales	Aux	Consorcio	
24	1005851325	Alexander Rodriguez R	Ayudante		
25	1061816778	Yuly Morales A.	Operador		
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO EQUIGRAVA	Versión: 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Riesgo Atmosferico Precauciones en tiempos de lluvia	FECHA:	18-12-2025
EXPOSITOR:	Lirsy Janeth Ramirez C.	HORAS:	7:00Am-7:15 Am.
LUGAR:	Nuevo proyecto Hospital San Juan Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	23.

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1-1766258918	Yelson Javier Marin	Auxiliar		
2	1004288574	Jose Luis Conde	Auxiliar		Jose
3	1007789931	Jhon Castro	Ayudante		Jhon
4	1013.579.577	Juan Camilo guerrero	Auxiliar		
5	1047149876	Cristian Ramirez	Oficial		
6	1002165449	Luisella Cotta	Oficial		
7	9145254	Jorge Luis J. O	Oficial		
8	1053010598	Abrahan Henriquez	cadenero		
9	1007342382	Hanlis Chapman	Oficial		
10	1129044706	Jorge A Caraballo R	Topografo		
11	1067600766	Andres F Illuncl Noriga	Oficial		Andres Noriga
12	1002916778	Jul Alexander Morles M.	Oficial		Jul Morles
13	73575360	Eduardo Ortiz	Oficial		
14	1005851365	Jose Manuel Gaitan	aux		Jose Manuel
15	1007257807	Jose Anderson Lovera	Auxi		
16	1106272699	Anderson Guzman	Auxi		Anderson
17	1106769457	Juan David Narvaez	Auxi		
18	1126054322	Pedro Luis	Oficial		Pedro
19	1005851225	Eduar Rodriguez R	Ayudante		Eduar R
20	1076507770	Jesus Lucero Daniel	Ayudante		
21	77.177.273	Roberto Saavedra	Oficial		Roberto
22	85.260.963	Juan montes	maestro		
23	77027624	Luis Rodriguez	Oficial		
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 15/11/2025
	CONSORCIO EQUIGRAVA	CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Riesgo físico. Disconfort térmico	FECHA:	19-12-2025.
EXPOSITOR:	Uroy janeth Ramirez	HORAS	7:00-7:15 AM.
LUGAR:	Nuevo proyecto san juan Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	25.

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	77 777 073	Robert Tosabal Zea	Oficial		
2	1007816772	Yuli Andres Ayala	Operador		
3	1005851365	Jose Manuel Gaitan	Auxiliar		
4	1053010598	Abraham Henriquez	cadenero		
5	77197972	Reinaldo Alvarez	Oficial		
6	1067600766	Andres Felipe Ulloa	Oficial		
7	1047414876	Cristian E Ramirez	Oficial		
8	1007342292	Andres D Perez	Oficial		
9	1140 [illegible]	Jorges Jis A. D.	Oficial		
10	1005 551 325	Edgar Rodriguez R	Ayudante		
11	77027766	Jul Rodriguez	Operador		
12	1047616 [illegible]	Andres [illegible]	Auxiliar		
13	1002216549	[illegible]	[illegible]		
14	73575560	Humberto	Operador		
15	1128054322	Pedro Luis Subiza	Oficial		
16	1067775077	Jhoan Castro	Ayu		
17	1067112699	Anderson Guzman	Ayu		
18	1070502770	Lenis Maria Daniel	Ayudante		
19	1111 [illegible]	Julian David Castro	Ayu		
20	1013.578.527	Juan C querero	Auxiliar		
21	1003614 y 22	Angel Estefes	Auxiliar		
22	1007289931	Jhoan Castro	Ayudante		
23	1007287807	Jose Anderson Lozano L.	Aux		
24	1007220574	Jesus Ibarguen	Aux		
25	1106464957	Juan David Narvaez	Auxi		
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 15/11/2025
	CONSORCIO EQUIGRAVA	CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Retroalimentacion sobre el uso de los EPP y la importancia	FECHA:	20-12-2025
		HORAS	15 minutos
EXPOSITOR:	Lizy Janeth Ramirez C.	TOTAL DE PERSONAS:	26.
LUGAR:	Nuevo proyecto Hospital San Juan Bautista	NOMBRE CONTRATISTA	

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	1007341787	Andres Alberto Perez [illegible]	Operador	
2	1067600766	Andres Felipe Ulloa	operador	Andres Ulloa
3	1106775967	Andres Serna	Operador	
4	1007816778	[illegible] montes Ayala	Operador	[illegible] Montes
5	77177073	Roberto Taborda Lopez	Oficial	Roberto
6	1005851365	Jose Manuel	Aux	Jose Manuel
7	1086788918	Yeison Saiz Montes	Aux	
8	1047414876	Cristian Eduardo [illegible]	Oficial	
9	1041146091	Andres Tobon	Auxiliar	
10	7707766	Ali Pachyles	Albañil	
11	9145254	[illegible]	Ofi	
12	1128054322	Pedro Luis	Ofi	Pedro
13	1007898931	Shaun Castro	Ayudante	Castro
14	1005581325	Edwar Rodriguez R	Ayudante	Edwar R
15	1007287209	Jose Anderson Loaiza	Aux.	
16	1053040598	Abraham Henriquez	Cadenero	
17	1128044706	Jorge A Caraballo R	Topografo	
18	23575360	Luz Mabel Soto	Ofi	
19	1117 412 1161	Julian David	Ayu	Julian
20	1013.578.527	Juan C guerrero	Auxiliar	Juan Camilo
21	1106772699	Anderson Guzman	Auxi	Anderson
22	1003 819 472	Alex Cespedes	Ayudante	
23	1106769457	Juan David Marquez P.	Ayudante	
24	1041866446	Jose Eliseo	Rut	Jose
25	25.260.963	Juan [illegible]	Maestro	
26	1002365449	[illegible]	[illegible]	
27				
28				
29				
30				

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 15/11/2025
	CONSORCIO EQUIGRAVA	CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Retroalimentacion Reglamento interno.	FECHA:	21-12-2025
EXPOSITOR:	Lcda. Janeth Ramirez C.	HORAS	7:00 Am - 7:15 Am.
LUGAR:	Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	19.

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1707766044	[illegible]	[illegible]		
2	1004140421	[illegible]	AUXILIAR		
3	1067288546	[illegible]	AUXILIAR		JOSE
4	1005851365	Jose Manuel Gaitan	Auxiliar		Jose Manuel
5	1047449276	Cristian [illegible]	OFI		
6	Cribouio	[illegible]	[illegible]		
7	1013.578.527	[illegible]	Auxiliar		
8	1128054322	PEDRO [illegible]	OFI		PEDRO
9	91.140.254	[illegible]	OFI		
10	1067-89931	[illegible]	Ayudante		
11	1106112699	ANDERSON [illegible]	AYUD		Anderson
12	1111 0412 1161	Julian [illegible]	Ayud		JULIAN
13	1106769457	Juan David Narvaez	Ayu		
14	1005846325	Edgar [illegible]	Ayudante		Edgar P
15	1106745967	[illegible]	Oficial		
16	1003811422	[illegible]	Ayudante		
17	735 75360	[illegible]	Ofi		
18	1007287507	Jose Anderson [illegible]	Aux.		
19	73143977	[illegible]	OFICI		
20	77 7770993	ROBERTO [illegible]	OFICIAL		
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Retroalimentacion del buen uso de andamios	FECHA:	05-12-2025
EXPOSITOR:	Lilay Janeth Ramirez C.	HORAS:	30 minutos
LUGAR:	proyecto nuevo Hospital San Juan Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	11.

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	16677558	Albeiro Vargas	maestro	Albeiro Vargas.	Albeiro
2	1106788475	Cristian Camilo Flores	ayu	Albeiro Vargas.	Cristian
3	1110.531.059	Gastian Eduardo Rubio	Oficial	Albeiro Vargas	Gastian Eduardo
4	1106773407	Dayer Alexandra Andrade Florez	ayu	Albeiro Vargas	Dayer A.
5	1006852333	Miguel Rivas	ayudante	Luis lasso	
6	1005851424	Juan Fernando Perez	ayudante	Luis lasso	Juan Acuña
7	1106787119	Willington Ramirez Barrera	Oficial	Luis lasso	
8	1106775558	Juan David Arciniegas	ayudante	Luis lasso	
9	35574729	Ruby Patricia Ruiz	SE	Luis lasso	Ruby Ruiz
10	1106790005	Gustavo Valencia Moreno	Rj.	Luis lasso	Gustavo Valencia M.
11	1005853087	Luis Fernando Lasso	contratista	Luis lasso.	Luis Lasso
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 15/11/2025
	CONSORCIO EQUIGRAVA	CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Socialización Reglamento Interno de la empresa	FECHA:	10-12-2025.
EXPOSITOR:	Lizy Janeth Ramirez C.	HORAS	15 minutos.
LUGAR:	Construccion nuevo Hospital	TOTAL DE PERSONAS:	14

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1106 787 119	Willington Ramirez Barrera	Oficial	Luis lasso.	
2	3557 922	Reinel Antonio M	OF	Luis lasso	Reinel A M
3	1110-531-059	Cristian Fernando Glavito	Official	Albeiro Vargas	Cristian Glavito R
4	1106768340	Ricardo Bañez	ayudante	Albeiro Vargas	Ricardo
5	1106788475	Cristian Camilo Fierro	ayudante	Albeiro Vargas	Cristian Camilo
6	1106773407	David Alejandro Andrade F	ayudante	Albeiro Vargas.	David A.
7	1106775558	Juan David Arcinegas	ayudante	Luis lasso	
8	1067907 40	Hugo Jimmel Tique	ayudante	Albeiro Vargas.	Hugo Jimmel
9	1005854424	Juan Fernando perez	ayudante	Luis lasso.	Juan Aguirre
10	1106790005	Cristian Valencia Mercado	Ay.	Luis lasso	Cristian Valencia
11	1007295543	Neider Yoven moya	ayudante	Albeiro Vargas	Neider Yoven
12	1106773497	Cristian cadiz rodriguez	ayudante	Albeiro Vargas	Hugo Jimmel T.
13	1618 [illegible]	Albeiro vargas	maestro	Albeiro Vargas	Albeiro
14	1005853087	Luis fernando lasso	contratista	Luis lasso	Luis Fernando.
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

?

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Retroalimentacion en orden y Aseo en la Obra	FECHA:	11-12-2025
EXPOSITOR:	Liza Janeth Ramirez. C.	HORAS	15 minut.
LUGAR:	Nuevo. proyecto Hospital San juan Bautista.	TOTAL DE PERSONAS:	15.

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1					
2	1061757155	Albeiro Vargas	maestro	Albeiro Vargas	Albeiro
3	1106768340	Ricardo Briñez	ayudante	Albeiro Vargas	Ricardo
4	1110.531.059	Cristian fernando Gloop	oficial	Albeiro Vargas	Cristian Gloop
5	1005851424	Jugo Fernando eever	ayudante	Luis lasso	Jugo Aguja
6	1106775558	Juan david Arciniegas	ayudante	Luis lasso	
7	1106782119	willington Ramirez Barrera	Oficial	Luis lasso	
8	1057792??	Reinel Antonio M	OF	Luis lasso	Reinel Anto
9	1106796005	Esteban Ricardo Mora	AY	Luis lasso	
10	1106773497	Dauer Alejandro Andrade F	ayudante	Albeiro Vargas	Dauer A.
11	1007284543	Neider Yoan Mora	ayudante	Albeiro Vargas	Neider Yoan
12	1106788475	Cristian Camilo Fierro	ayudante	Albeiro Vargas	Cristian Camilo
13	1106790740	Hugo Jimenez Tigre.	ayudante.	Albeiro Vargas	Hugo Jimenez T.
14	1106773497	Cristian andres mendez	ayudante.	Albeiro Vargas	Cristian Mendez
15	1005853097	Luis fernando lasso	1005 contratista	Luis fernando lasso	Luis Fernando lasso
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO EQUIGRAVA	Versión: 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Capacitacion, planificacion de trabajo seguro (ATS)	FECHA:	12-12-2025
EXPOSITOR:	Lizy Janeth Ramirez C.	HORAS:	30minutos.
LUGAR:	Construccion nuevo Hospital	TOTAL DE PERSONAS:	16.

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1'110.531.059	Cristian Fernando G.	oficial	Albeiro Vargas	Cristian Garzon
2	1106768340	Ramirez Olmedo	ayudante	Albeiro Vargas	Ricardo
3	1106773407	Dayer Andrade Florez	ayudante	Albeiro Vargas	Dayer A.
4	1007205443	Nelder Vanegas	ayudante	Albeiro Vargas.	Nelder Vanegas
5	1106790740	Hugo Jimenez Tique	ayudante	Albeiro Vargas	Hugo Jimenez T.
6	1106788475	Cristian Camilo Florez	ayudante	Albeiro Vargas	
7	1106773497	Cristian Andres	ayudante	Albeiro Vargas	Cristian
8	1151436798	Deiver Betancur	OF	Albeiro Vargas	Cristian
9	1616775[illegible]	[illegible]	maestro	Albeiro Vargas	Deiver
10	1106760805	Cristian Rodriguez Marin	A	Luis lasso	Albeiro
11	1106787119	Willington Ramirez Barrera	Oficial	Luis lasso.	
12	3557499	Brinet Antonio [illegible]	OF	Luis lasso.	Brinet Acuc
13	1005822233	Lucia del Pilar [illegible]	ayudante	Luis lasso	
14	1005851491	Juan Fernando Perez	ayudante	Luis lasso	Juan Acuña
15	1106775559	Juan David Arciniegas	ayudante	Luis lasso	
16	1005953087	Luis Fernando Lasso	contratista	Luis Lasso	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Retroalimentacion Orden y Aseo.	FECHA:	13-12-2025
EXPOSITOR:	Liray Janeth Ramirez	HORAS	15 minutos
LUGAR:	Construcción nuevo Hospital	TOTAL DE PERSONAS:	15

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1110.551.054	Cristian Fernando Chaya	orgal	Albeiro Vargas	Cristian Chaya
2	7166140605	Gustavo Rodriguez Marin	A-y	Luis Lasso	
3	1106 787 119	Willington Ramirez B.	Oficial	Luis Lasso	
4	3557499	Ruby Antonio Mc	OF	Luis Lasso	Ruby Anto R
5	1005852233	Michael Pigño	ayudante	Luis Lasso	
6	1075303993	Yoiner Stiven C.	Ayudante	Luis Lasso.	Yoiner S.
7	1151 436 791	Deiver Botache	OF	Albeiro Vargas	De! Vel
8	1106790740	Hogll Jsmael Yaya	Ay	Albeiro Vargas	Hogll Jsmael
9	1007299543	Neider Varon	ayudante	Albeiro Vargas	Neider Varon
10	1618475	Albeiro Vargas		Albeiro Vargas	
11	1106773997	Cristian Mendez	ayudante	Albeiro Vargas	cristian
12	1106718340	Ricardo Ximenez	ayudante	Albeiro Vargas	Ricardo
13	1106773407	Dayer Alejandra Andrade F	ayudante	Albeiro Vargas	Dayer A.
14	1106788479	Cristian Romero	ayudante	Albeiro Vargas	Cristian
15	1005453097	Luis Fernando Lasso	contratista	Luis Lasso.	Luis Fernando
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSORCIO EQUIGRAVA	FECHA: 15/11/2025
		CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Retroalimentacion del Reglamento interno del consorcio Equigrava	FECHA:	15-12-2025
EXPOSITOR:	Liray Janeth Ramirez C.	HORAS	15 minut.
LUGAR:	Nuevo proyecto Hospital San Juan Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	14

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1106700005	Cristian Rodriguez Alarcon	Aux	Luis lasso	Cristian Rodriguez
2	1106768340	Ricardo BRIÑEZ	ayudante	Alberto vargas.	Ricardo
3	1106773497	cristian MENDEZ	ayudante	Alberto Vargas	cristian
4	1005851424	Juan Fernando Perez.	ayudante	Luis lasso	Juan Fernando
5	1106787119	willington Ramirez B.	Oficial	Luis lasso.	
6	1005832233	Michael Rialo S.	ayudante	Luis lasso.	
7	1106775558	Juan david Arcinieges	ayudante	Luis lasso	Juan
8	~~1106~~				
9	1151436292	Deiver Batache	Aux	Alberto Vargas.	Deiver
10	1106788415	Cristian camilo Flevo	ayudante	Alberto vargas	Cristian
11	1106790740	Hugo Jimenez Tique	ayudante	Alberto Vargas.	Hugo Jimenez.
12	1106773401	Jhoyer Andrade Florez	Jayudante	Alberto vargas	Jhoyer A.
13	1005853087	Luis fernando lasso	contratista	Luis lasso	Luis fernando lasso
14	1007289543	Neider Yoven mora	ayudante	Alberto vargas.	Neider Yoven
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 15/11/2025
	CONSORCIO EQUIGRAVA	CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Reobalos, Tropetones y caidas.	FECHA:	16-12-2025
		HORAS	15 minutos.
EXPOSITOR:	Liny Janeth Ramirez Cabrera	TOTAL DE PERSONAS:	11
LUGAR:	nuevo proyecto Hospital San Juan Bautista		

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1005852233	Michael Riaño	ayudante	Luis lasso	
2	1005851474	Jugo Fernando perez	ayudante	Luis lasso	
3	1106775558	Juan david Arciniegas	ayudante	Luis lasso	
4	1106768340	Ricardo Brito	ayudante	Albeiro Vargas	
5	1706788475	Cristian Camilo Fierro	ayudante	Albeiro Vargas	
6	1106790740	Hugo Jimenez Tique	ayudante	Albeiro Vargas	
7	1151426292	Deiver Botache	oF	Albeiro Vargas	
8	1007289343	Neider Javier	ayudante	Albeiro Vargas.	
9	1106790005	Cristian Patricio Moreno	Ayudante	Luis lasso	
10	1106787419	Willington Ramirez	Oficial	Luis lasso	
11	1005953087	Jorge Fernando Lasso	CONTRATISTA	Luis Lasso.	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 15/11/2025
	CONSORCIO EQUIGRAVA	CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	charla Riesgo Atmosferico en tiempos de lluvias	FECHA:	17-12-2025
EXPOSITOR:	Lizy Janeth Ramirez C.	HORAS:	15 minutos
LUGAR:	Nuevo Proyecto Hospital San Juan B.	TOTAL DE PERSONAS:	12.

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1056 [illegible]	José Fernando Justo	contratista	Albeiro Vargas	
2	1106700005	Cristian Mahecha Muñoz	Aprendiz	Cristian Luis Lasso	
3	1106787119	Wilington Ramirez Barrera	Oficial	Luis Lasso	
4	1005[illegible]020	Juan Gelonado perez	ayudante	Luis Lasso	Juan Nuño
5	1151[illegible]292	Oliver Botache	OF	Albeiro Vargas.	Oliver
6	1106[illegible]510	Ricardo Benitez	ayudante	Albeiro Vargas.	Ricardo
7	1106790110	Hugo Jimenez Figue	ayudante	Albeiro Vargas.	Hugo Jimenez
8	1106[illegible]475	Cristian Camilo Fierro	ayudante	Albeiro Vargas	Cristian
9	1067209543	Maicol veron mora	ayudante	Albeiro Vargas	[illegible]
10	1106[illegible]856	Hubeiro	ayudante	Albeiro Vargas.	
11	1106773497	Cristian camacho	ayudante	Albeiro Vargas	
12	1067[illegible]58	Albeiro Vargas		Albeiro Vargas.	Cristian Albeiro
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO EQUIGRAVA	Versión: 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Riesgo Atmosferico Precauciones en tiempos de lluvia	FECHA:	19-12-2025
EXPOSITOR:	Luzy Janeth Ramirez C.	HORAS	7:00Am-7:15 Am.
LUGAR:	Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista.	TOTAL DE PERSONAS:	13.

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1106740005	Cristian Andres Moreno	H.T	Luis Lasso	Cristian Andres Moreno
2	1106768340	Ricardo Benitez	ayudante	Luis Lasso.	Ricardo
3	1106773497	cristian Mendez	ayudante	Albeiro Vargas	cristian
4	1007209543	Neider Varon	ayudante	Albeiro Vargas.	Neider Varon
5	1106788415	cristian Camilo Fierro	ayudante	Albeiro Vargas	Cristian
6	1151436292	Deivi Botache	OF	Albeiro Vargas	Deivi
7	1106384858	[illegible]	oficial	Albeiro Vargas	[illegible]
8	1618747506	Alberto	maestro	Albeiro Vargas	Alberto
9	1005851491	Juan Fernando perez	ayudante	Luis Lasso	Juan Acuña
10	1106787119	willington Ramirez Barrera	Oficial	Luis Lasso	[illegible]
11	1106775518	Juan david Arciniegas	ayudante	Luis Lasso	Juan
12	1005852237	Michael Rignos	ayudante	Luis Lasso	[illegible]
13	1005853097	Jeffersson Lasso	CONTRATISTA	Luis Lasso.	Jeffersson Lasso
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 15/11/2025
	CONSORCIO EQUIGRAVA	CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Riesgo Físico. Disconfort Kimico.	FECHA:	19-12-2025
EXPOSITOR:	Liny Janeth Ramirez C	HORAS	15 minutos.
LUGAR:	Nuevo proyecto Hospital San Juan Bautista	TOTAL DE PERSONAS:	13

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1106768340	Ricardo Benitez	ayudante	Albeiro Vargas	Ricardo
2	1151426292	Deiver Botache	OF	Albeiro Vargas	Deiver
3	1706788475	Cristian Camilo Fierro	ayudante	Albeiro Vargas	Cristian
4	1106796746	Hugo Jimenez Tique	ayudante	Albeiro Vargas	Hugo Jimenez.
5	1007289513	Cecidy Vanessa Mora	ayudante	Albeiro Vargas	Neider Varon
6	1106773497	Cristian andres Martez	ayudante	Albeiro Vargas	Cristian Martez.
7	16164756	Albeiro Vargas		Albeiro Vargas	Albeiro
8	1005851420	Juan Fernando perez	ayudante	Luis 10000	Juan Ruiz
9	1005852733	Michael Ricaurte	ayudante	Luis 10000	
10	1106775558	Juan David Arciniegas	ayudante	Luis 10000	
11	1106700005	Cristian Valencia M.	Ayt	Luis 10000	Cristian Valencia
12	1106787119	William Ramirez B.	Oficial	Luis 10000	
13	1005853087	Luis Fernando Lavao	contratista	Luis 10000	Luis Fernando Lavao
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					


Powered by CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	REGISTRO DE ASISTENCIA, CHARLA, CAPACITACION O DIVULGACIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 15/11/2025
	CONSORCIO EQUIGRAVA	CÓDIGO: FOR-001-SST

TEMA/ACTIVIDAD:	Retroalimentacion Sobre el uso de los EPP y la importancia			FECHA:	20-12-2025.
EXPOSITOR:	Lisy Janeth Ramirez.			HORAS	15 minutos.
LUGAR:	Nuevo proyecto Hospital San Juan Bautista			TOTAL DE PERSONAS:	14

Nº	Nº DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
1	1106700005	Gustavo Rodriguez Moreno	AO	Luis Lasso.	
2	1005351074	Juan Fernando perez	ayudante	Luis lasso	
3	1106775158	Juan David Arciniegas	ayu	Luis lasso	
4	1005852233	Rianos Sabogal Karla	ayudante	Luis lasso	
5	1007289503	Nicolas Javier Mora	ayudante	Alberto Vargas	
6	1106788475	Cristian Camilo Fierro	ayudante	Alberto Vargas	
7	1106768340	Ricardo Briñez	ayudante	Alberto Vargas	
8	1106787119	Willington Ramirez B	Oficial	Luis lasso	
9	1106790818	Yulieth Catalina Castillo	ayudante	Alberto Vargas.	
10	1106790740	Hugo Jimenez Tique	ayudante	Alberto Vargas	
11	1151436292	Deiver Barrera	OF	Alberto Vargas	
12	1106773497	Cristian Mendez	ayudante	Alberto Vargas	
13	1618775	Alberto Vargas	ALBEIVO	Alberto Vargas	
14	1005853097	Luis Fernando Lasso	CONTRATISTA	Luis lasso.	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Powered by CamScanner

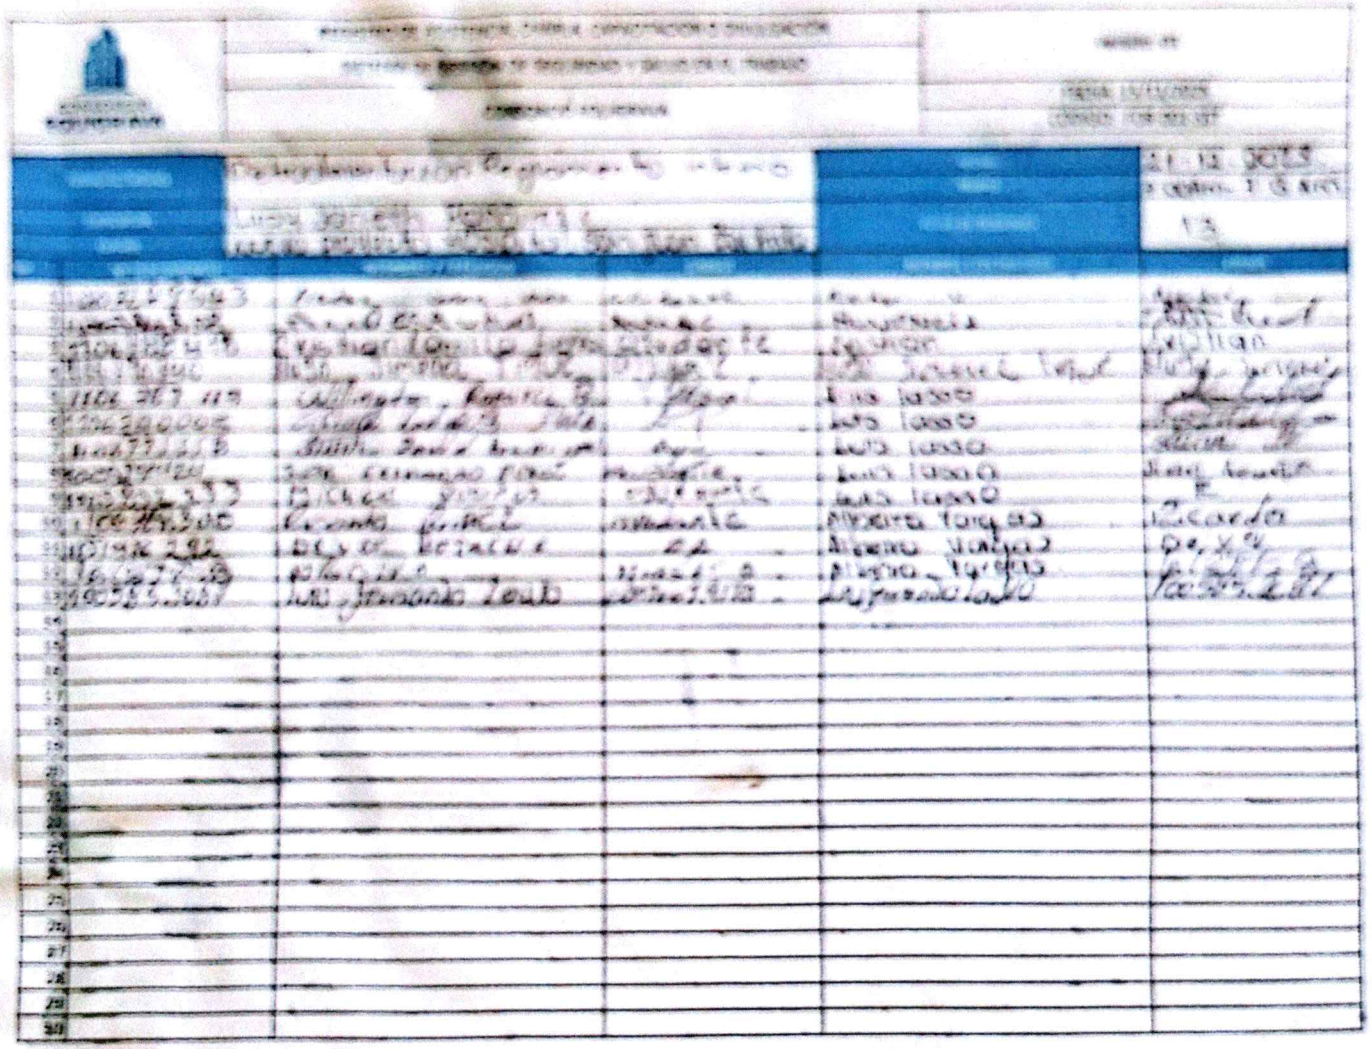

Powered by CamScanner

INFORME DE OBRA No. 4

"CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CODIGO BPIN 2022000060023"

DEL 01 DE ENERO DEL 2025 – AL 31 DE ENERO DEL 2026

PARA: LA GOBERNACION DEL TOLIMA

REALIZADO POR: CONSORCIO EQUIGRAVA

Chaparral, Tolima

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVO GENERAL 6
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 6
3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 7
3.1 LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO 7
3.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 8
4. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO 9
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9
4.2 FORMA DE PAGO 10
4.3 ANTICIPO 10
4.4 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA 11
4.5 PAGO DE IMPUESTOS 12
4.5 GARANTIAS DEL CONTRATO 12
4.6 MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES AL CONTRATO 13
5. INFORMACIÓN TECNICA Y AVANCE DE OBRA 14
5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 14
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 14
5.3 AVANCE DE OBRA 17
5.4 AVANCE FINANCIERO 19
5.5 RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS 20
5.6 RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 26
5.7 CONTROL DE CALIDAD 26
5.8 CONTROL CLIMATOLOGICO 26
6. COMPONENTE AMBIENTAL 28
7. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 30
8. REGISTRO FOTOGRAFICO 37
9. CONCLUSIONES 41
10. ANEXOS 42

TABLA DE ILUSTRACIONES (TABLA)

Tabla 1. Información general del contrato de obra 9
Tabla 2. Certificado de disponibilidad presupuestal 11
Tabla 3. Registro presupuestal 11
Tabla 4. Pago de impuestos del contrato de obra 12
Tabla 5. Pólizas de seguro contrato de obra 12
Tabla 6. Actualizaciones del contrato 13
Tabla 7. Resumen de actividades ejecutadas 25
Tabla 8. Relación de equipos y maquinaria 26
Tabla 9. Trámites ante autoridades ambientales 29
Tabla 10. Relación de personal en obra 31
Tabla 11. Consumo de EPP mensual 32
Tabla 12. Charlas y Capacitaciones 34

TABLA DE IMÁGENES

Imagen. 1 Localización dentro del municipio de Chaparral 7
Imagen. 2 Vista en planta del proyecto 8
Imagen. 3 Curva avance físico 18
Imagen. 4 Curva avance presupuestal 18
Imagen. 5 Estado de facturación 19
Imagen. 6 Estado del tiempo 27
Imagen. 7 Instalación de acero 37
Imagen. 8 Construcción de columnas 37
Imagen. 9 Instalación de acero 37
Imagen. 10 Muro de contención 37
Imagen. 11 Acero en muro de contención 37
Imagen. 12 Muro de contención 37
Imagen. 13 Construcción de columnas 38
Imagen. 14 Cimentación y columnas 38
Imagen. 15 Entrega de EPP 38
Imagen. 16 Socializaciones SST 38
Imagen. 17 Capacitaciones SST 38
Imagen. 18 Inducción del Personal 38
Imagen. 19 Instalación de señales en obra 39
Imagen. 20 Aseo de obra 39
Imagen. 21 Inspección maquina amarilla 39
Imagen. 22 Inspección volqueta 39
Imagen. 23 Entrega de dotación 39
Imagen. 24 Pausas activas 39
Imagen. 25 Jornada de vacunación 40
Imagen. 26 Retroalimentación para trabajos en alturas 40
Imagen. 27 Instalación reglamento institucional 40
Imagen. 28 Inspección de EPP 40
Imagen. 29 Manipulación de herramienta critica 40
Imagen. 30 Acopio punto ecológico 40

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento elaborado por CONSORCIO EQUIGRAVA identificado con NIT 901.965.829-8 contiene el informe de obra No. 4 correspondiente al Contrato No. 2631 del 17 julio 2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CODIGO BPIN 2022000060023", el cual fue adjudicado por la gobernación del Tolima a través de la resolución No. 002414 del 09 de Julio de 2025 mediante licitación pública No. LPO-026-2025.

En este Informe, se hace una descripción de las actividades realizadas mensualmente, de tal manera que le permita tener a la entidad una visión general del desarrollo y cada etapa del contrato de obra en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambiental, calidad, social y de seguridad y salud en el trabajo.

2. OBJETIVO GENERAL

Informar a la entidad contratante sobre el estado del contrato y ejecución de las actividades de obra, realizando seguimiento a las actividades desarrolladas cada mes en el marco técnico, administrativo, financiero, ambiental, calidad, social y de seguridad y salud en el trabajo del proyecto "Construcción Nuevo Hospital San Juan Bautista" de conformidad con las especificaciones y características técnicas, programación de obra y planes de gestión, garantizando la calidad y el buen funcionamiento de la estructura.

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Proporcionar a la entidad contratante una visión global de las ejecuciones del contrato, dentro del periodo en estudio.
- Realizar seguimiento y evidenciar los avances de las actividades realizadas en obra.
- Construir infraestructura institucional adecuada.
- Cumplir con los parámetros técnicos normativos vigentes.
- Cumplir los plazos contractuales de ejecución.

3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

El municipio de chaparral se encuentra localizado en la región sur del departamento del Tolima, su cabecera es eje social y económico de la región, la cual se encuentra a aproximadamente 163km de Ibagué, capital del departamento y a 250km de Bogotá D.C. Limita al oriente con los municipios de Ataco y Coyaima, al occidente con los municipios de Tuluá, Buga, Cerrito y pradera localizados en el departamento del Valle del Cauca.

El proyecto se localiza en el municipio de chaparral, departamento del Tolima, la construcción del nuevo hospital se encuentra a aproximadamente diez (10) minutos en móviles motorizados del centro del municipio exactamente entre las coordenadas 903119,083 norte – 845696,208 este y 903094,88 norte – 845806,285 este, sobre la vía Chaparral – Ataco en la vereda Las Tapias.

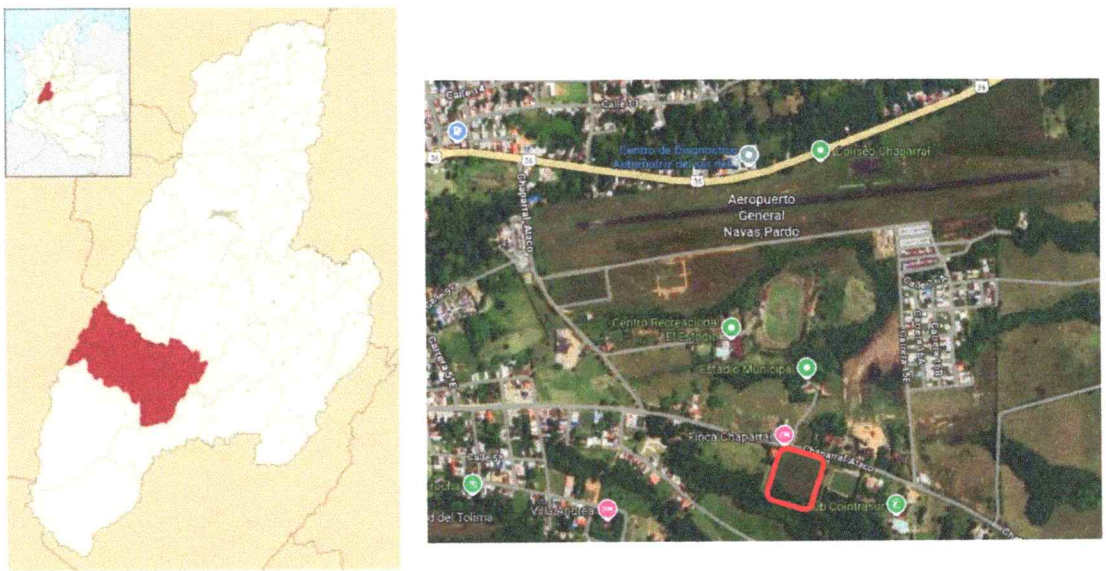


Imagen. 1 Localización dentro del municipio de Chaparral

3.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

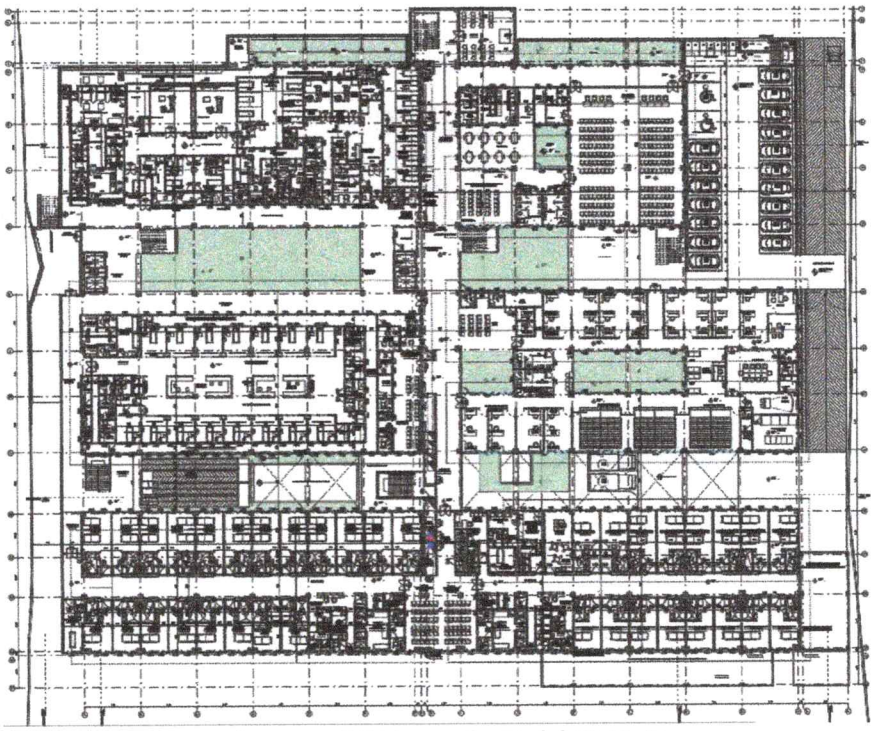


Imagen. 2 Vista en planta del proyecto

La secretaria departamental de salud del Tolima cuenta con el programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de las redes de ESE del departamento del Tolima, el cual fue viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social en diciembre de 2021. En este se contempla que la tipología del Hospital San Juan Bautista es IAE2 y el hospital de referencia de la región Chaparral. Los servicios ofertados por el Hospital San Juan Bautista de Chaparral se encuentran limitado por el espacio físico de la actual infraestructura pues las instalaciones con que cuenta el único hospital de chaparral deben cumplir con los requisitos normativos y técnicos vigentes para su funcionamiento. Teniendo en cuenta el incumplimiento de la actual infraestructura es clara la necesidad de la construcción del nuevo San Juan Bautista del Municipio de Chaparral con el fin de garantizar la prestación de servicio público de salud en el sur del Tolima, sino para proteger el derecho fundamental a la salud de sus habitantes.

4. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA
N° PROCESO DE SELECCIÓN:	LPO-026-2025
N° CONTRATO:	2631 del 17 julio 2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL TOLIMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO EQUIGRAVA
NIT:	901.965.829-8
REPRESENTANTE LEGAL:	OMAR MOUKARZEL DE LA ESPRIELLA
C.C	73.197.965
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CODIGO BPIN 2022000060023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 82'725.665.350
VALOR DEL PAGO ANTICIPADO:	SIN ANTICIPO NI PAGO ANTICIPADO
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 82'725.665.350,17
PLAZO INICIAL DE LA EJECUCION DE OBRA:	VEINTICUATRO (24) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE OCTUBRE DE 2027
INTERVENTOR:	CONSORCIO SJB INTERVENTORIA
NIT:	901.989.292-7
SUPERVISIÓN:	ALISON AMAYA REYES, DIRECTORA DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN

Tabla 1. Información general del contrato de obra

4.2 FORMA DE PAGO

El pago del presente proceso será bajo la modalidad de precio unitario el cual deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del constructor.

El Departamento pagará el 95% del valor total del contrato mediante actas parciales de obra.

- El valor del contrato se cancelará en pagos parciales hasta el noventa y cinco (95%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obras.
- Un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de obra se pagará por el departamento del Tolima al momento de la suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato de obra y el lleno de requisitos exigidos.

Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el contratista de obra, la interventoría y el supervisor.

El contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el inciso 2° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley de 1150 de 2007.

Los pagos están supeditados al PAC del sistema general de regalías que es administrado por el ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre los recursos asignados al Departamento para la ejecución de este proyecto.

4.3 ANTICIPO

Para la ejecución del presente contrato no se recibió anticipo y/o pago anticipado.

4.4 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP REGALIAS)		
NÚMERO	**FECHA**	**VALOR**
22525	30/04/2025	$29.522.330.328,35
22425	30/04/2025	$7.986.459.052,00
22625	30/04/2025	$5.207.860.342,54
22125	30/04/2025	$2.730.198.013,66
22225	30/04/2025	$20.472.707.854,36
22325	30/04/2025	$20.472.707.854,35

Tabla 2. Certificado de disponibilidad presupuestal

REGISTRO PRESUPUESTAL		
NÚMERO	**FECHA**	**VALOR**
26525	19/08/2025	$29.522.330.328,35
26625	19/08/2025	$20.472.707.854,36
26725	19/08/2025	$20.472.707.854,35
26925	19/08/2025	$2.730.198.013,66
26825	19/08/2025	$7.986.459.052,00
27025	19/08/2025	$1.541.262.247,45

Tabla 3. Registro presupuestal

4.5 PAGO DE IMPUESTOS

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
Estampilla pro-Tolima 150 años	$82'725.665.350,17	2.0%	$1.654.513.000,00
Estampilla pro-Cultura	$82'725.665.350,17	1.0%	$ 827.257.000,00
Estampilla pro-Desarrollo	$82'725.665.350,17	2.0%	$1.654.513.000,00

Tabla 4. Pago de impuestos del contrato de obra

4.5 GARANTIAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA					
				VIGENCIA	
COMPAÑÍA	No. PÓLIZA	AMPARO	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguros mundial	NB-100397128	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 8.272.566.535,02	02/10/2025	03/04/2028
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 4.136.283.267,51	02/10/2025	02/10/2030
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 16.545.133.070,03	02/10/2027	02/10/2032
	NB-100103939	RESPONSABILIDAD EXTRA-CONTRACTUAL	$ 4.136.283.268,00	02/10/2025	02/10/2027

Tabla 5. Pólizas de seguro contrato de obra

Las garantías del contrato se encuentran en vigencia y actualizadas de acuerdo con el acta de inicio de fecha 02 de octubre de 2025. A este informe, se anexan las pólizas actualizadas.

4.6 MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES AL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL ACTO	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA
Se realizó el trámite respectivo para la actualización del cambio de representante legal del Consorcio Equigrava ante la dirección de contratación.	Respuesta de radicación de documentos para actualización de representante legal.	19/11/2025
El Departamento administrativo de asuntos jurídicos dirección de contratación levantó el acta aclaratoria no. 001 en donde se explica lo relacionado con la asignación presupuestal numeral 6 del contrato electrónico.	Acta aclaratoria no. 001.	05/08/2025
El Departamento administrativo de asuntos jurídicos dirección de contratación levantó el acta aclaratoria no. 002 en donde el contratista Consorcio Equigrava requiere que se modifique el encabezado de la minuta del contrato, ya que por proceso de actualización administrativa se realizó un cambio de la cuenta bancaria para la recepción de pagos.	Acta aclaratoria no. 002.	20/11/2025

Tabla 6. *Actualizaciones del contrato*

5. INFORMACIÓN TECNICA Y AVANCE DE OBRA

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el mes de enero se realizaron actividades en el componente administrativo y técnico, las cuales permitieron una planeación y ejecución de las actividades de obra.

Entre las actividades administrativas se destacan:

- Contratación del personal de obra.
- Afiliaciones a la seguridad social del personal.
- Entrega de dotación.
- Revisión de planos y diseños.
- Seguimiento de la programación de obra.
- Ejecución de informes mensuales de obra.
- Cálculo de cantidades de obra.
- Cotizaciones de materiales y consecución de proveedores.

En el componente técnico se ejecutaron las actividades correspondientes a los capítulos:

- Capítulo 2. Movimientos de tierras.
- Capítulo 4. Acero de refuerzo.
- Capítulo 5. Suministro e instalación de cimentación.
- Capítulo 6. Suministro e instalación de estructura.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Capítulo 2. Movimientos de tierras

Se desarrollaron actividades de movimientos de tierra (excavaciones). El equipo topográfico realizó replanteo topográfico de acuerdo con los planos de diseño,

posteriormente, se realizaron las excavaciones mecánicas para las estructuras de cimentación, garantizando las cotas de diseño, dimensiones y recomendaciones estipuladas en el estudio de suelos.

Capítulo 4. Acero de refuerzo

El acero de refuerzo y las mallas electrosoldadas se almacenan en un lugar seco, sin contacto directo con el terreno natural. Se procedió con la figuración respectiva del mismo para los elementos estructurales (zapatas, vigas de cimentación, columnas, muros de contención), cumpliendo con los diseños y planos, verificando traslapos, cantidad y diámetros de varillas. Las intersecciones de barras se amarraron con alambre negro recocido mediante nudos simples o dobles, para garantizar la rigidez de las armaduras durante el vaciado del concreto.

Capítulo 5. Suministro e instalación de cimentación

Se realizó la construcción de zapatas, vigas de cimentación y muros de contención, como también, la aplicación de solado y la construcción de un concreto ciclópeo de acuerdo con los diseños y planos estructurales.

El concreto de limpieza se preparó en obra con una dosificación para una resistencia nominal 1500 PSI asegurando espesores de 5cm para evitar el contacto directo del acero con el terreno, antes de su aplicación se verificaron dimensiones y cotas de excavaciones y se realizaron compactaciones manuales y/o mecánicas sobre las áreas.

Para las zonas donde el terreno no cumplía con la capacidad portante, de acuerdo al estudio de suelos y siguiendo las recomendaciones del geotecnista, se realizó un mejoramiento con concreto ciclópeo 2500 PSI 60% concreto y 40% roca. Primeramente, se realizó la excavación del terreno hasta la profundidad determinada, compactando el fondo de la excavación y se instaló la formaleta. Se realizó el vaciado de concreto en capas de 20 cm, agregando piedras grandes aproximadamente de 20 a 30 cm, con bordes irregulares, limpias y húmedas, espaciadas entre sí, garantizando el recubrimiento de concreto en cada piedra. Para el acabado final se garantizó una superficie lisa y uniforme solo con concreto.

Para la construcción de las estructuras de cimentación, se realizó la instalación de la formaleta, garantizando las dimensiones de acuerdo con los planos estructurales y se instalaron los refuerzos y apuntalamientos para evitar fugas del material. Se realizó el vaciado de concreto directamente en los elementos estructurales, con una resistencia nominal de 3000 PSI y con la implementación de un vibrador eléctrico se garantizó la adecuada compactación para minimizar la formación de vacíos. El curado del concreto se realizó mediante riego constante de agua por un periodo de 7 días. El desencofrado se realizó siguiendo las recomendaciones técnicas y evitando dañar las estructuras.

Capítulo 6. Suministro e instalación de estructura

Se continuó con la construcción de las columnas, para esto, primero se realizó la revisión previa del acero de refuerzo, verificando diámetros, traslapos, longitudes, ganchos y la limpieza del mismo. Seguidamente, se instaló la formaleta, garantizando las dimensiones y cotas conforme a los planos estructurales, alineaciones verticales y horizontales y se instalaron los refuerzos y apuntalamientos para evitar posibles fugas del concreto durante la actividad del vaciado o el desplome del elemento estructural. Se realizó el vaciado de concreto con una resistencia nominal de 4000 PSI y con la implementación de un vibrador eléctrico se garantizó la adecuada compactación para minimizar la formación de vacíos. El curado del concreto se realizó mediante riego constante de agua por un periodo de 7 días. El desencofrado se realizó siguiendo las recomendaciones técnicas y evitando dañar las estructuras.

5.3 AVANCE DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO Y EJECUCION PRESUPUESTAL				
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**
OCT	AVANCE FISICO (%)	1,13%	3,04%	1,91%
	AVANCE PRESUPUESTAL ($)	$ 937.292.549,94	$ 2.511.071.243,00	$ 1.573.778.693,06
NOV	AVANCE FISICO (%)	3,70%	8,97%	5,27%
	AVANCE PRESUPUESTAL ($)	$ 3.062.780.570,43	$ 7.422.033.706,79	$ 4.359.253.136,36
DIC	AVANCE FISICO (%)	4,26%	2,49%	-1,77%
	AVANCE PRESUPUESTAL ($)	$ 3.520.254.950,02	$ 2.064.465.677,73	-$ 1.455.789.272,29
ENE	AVANCE FISICO (%)	3,43%	2,57%	-0,86%
	AVANCE PRESUPUESTAL ($)	$ 2.841.301.601,71	$ 2.122.833.126,46	-$ 718.468.475,25
ACUM	**AVANCE FISICO (%)**	**12,53%**	**17,07%**	**4,54%**
	AVANCE PRESUPUESTAL ($)	**$10.361.629.672,11**	**$ 14.120.403.753,98**	**$ 3.758.774.081,87**

Tabla 7. Avance físico y ejecución presupuestal

A la fecha se evidencia un adelanto del 4.54% equivalente a $3.758.774.081,87, representado en las actividades de acero de refuerzo, cimentación y estructura, en donde se evidencian mayores cantidades ejecutadas en relación con la programación de obra.

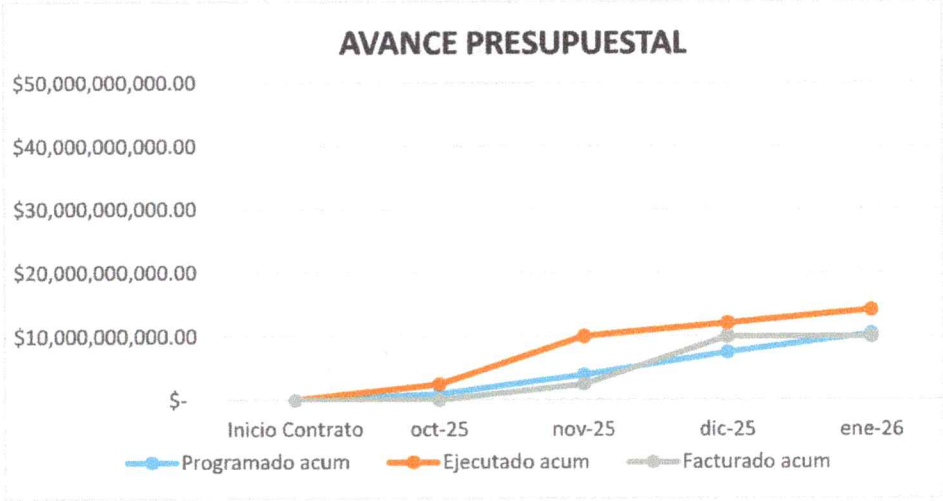


Imagen. 3 Curva avance físico

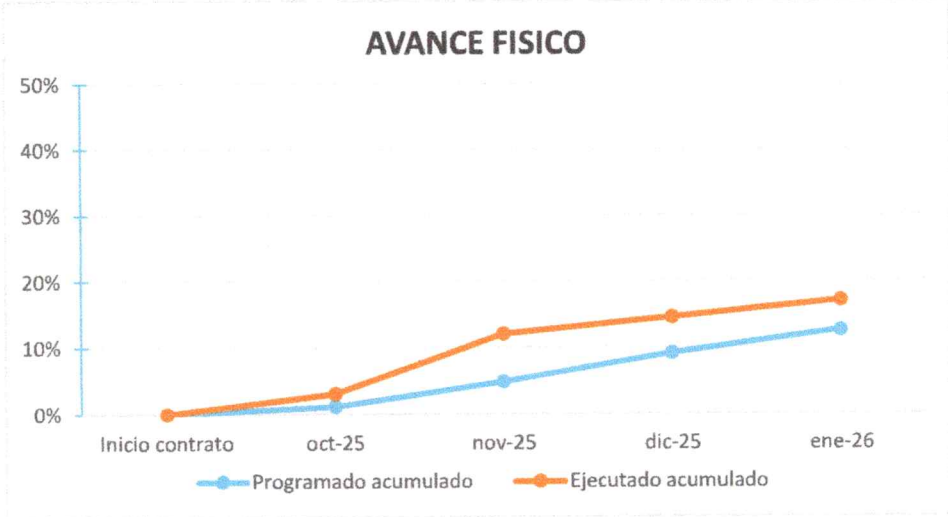


Imagen. 4 Curva avance presupuestal

5.4 AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO					
CONTRATO:	2631 del 17 julio 2025		**VALOR INICIAL**	$ 82.725.665.350,17	
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00		**VALOR ACTUAL**	$ 82.725.665.350,17	
DESCRIPCIÓN	**VALOR ACTA**	**VALOR ACUMULADO**	**FECHA DE ACTA**	**% PARCIAL**	**% ACUM**
Acta parcial #1	$ 2.511.071.243,00	$ 2.511.071.243,00	11/11/2025	3,04%	3,04%
Acta parcial #2	$ 7.422.033.706,54	$ 9.933.104.949,54	05/12/2025	8,97%	12,01%

Tabla 8. Resumen actas parciales

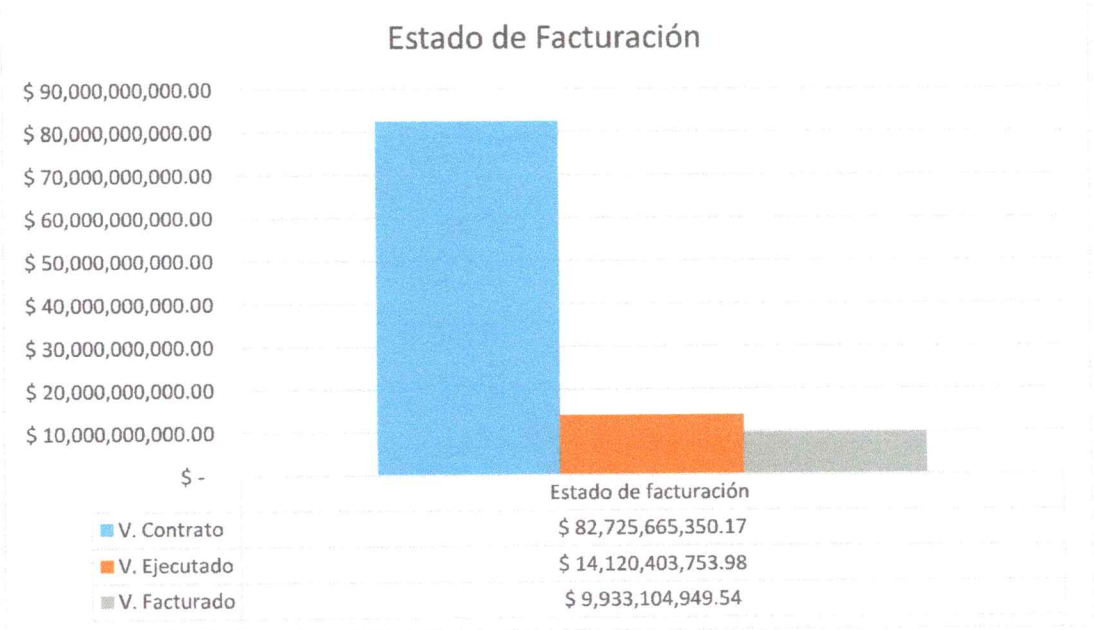


Imagen. 5 Estado de facturación

5.5 RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ENERO		ACUMULADO TOTAL		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 99,670,453.31**		**$ 99,670,439.59**		**$ -**		**$ 99,670,439.59**	**100.00%**	**0.00%**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 1,125,079,455.36**		**$ 1,062,739,268.95**		**$ 44,256,353.1**		**$ 1,106,995,622.02**	**98.39%**	**1.61%**
2.2	EXCAVACION MECANICA (Incluye retiro de material sobrante)	m3	15,640.95	$ 31,611.00	$ 494,426,097.55	13,834.1	$ 437,309,951.64	1,316.46	41,614,711.9	15,150.6	478,924,663.53	96.86%	3.14%
2.4	EXCAVACION MATERIAL ROCA (Incluye retiro de material sobrante)	m3	1,737.88	$ 121,204.00	$ 210,638,423.08	1,715.86	$ 207,968,919.69	21.80	2,641,641.18	1,737.65	210,610,560.87	99.99%	0.01%
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DESAGÜES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS**				**$ 301,385,962.42**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**100.00%**
4	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 10,161,407,238.51**		**$ 4,880,272,228.83**		**440,409,816**		**$ 5,320,682,044.83**	**52.36%**	**47.64%**
4.2	MALLAS ESTRUCTURALES 5 mm 6X2,35M SEPARACIÓN 15X15CM	und	1,394.00	$ 330,638.00	$ 460,909,372.00	-	$ -	1,332.00	440,409,816	1,332.00	440,409,816.00	95.55%	4.45%

5	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CIMENTACIÓN**				**$ 3,818,431,541.18**		**$ 2,674,380,513.88**		**1,059,192,864.41**	-	**$ 3,733,573,378.29**	**97.78%**	**2.22%**
5.1	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 psi	m3	1,167.87	$ 991,575.00	$ 1,158,028,934.21	1,151.46	$ 1,141,758,899.92	14.91	14,787,952.92	1,166.37	1,156,546,852.84	99.87%	0.13%
5.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 psi	m3	615.30	$ 891,786.00	$ 548,717,089.58	606.91	$ 541,230,612.99	7.72	6,880,681.90	614.62	548,111,294.89	99.89%	0.11%
5.3	PLACA CONTRAPISO 15 CMS	m2	8,112.25	$ 117,765.00	$ 955,339,521.65	-	$ -	7,762.47	914,147,279.55	7,762.47	914,147,279.55	95.69%	4.31%
5.4	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI 60% CONCRETO, 40% ROCA	m3	893.08	$ 503,472.00	$ 449,638,464.84	839.36	$ 422,595,856.44	52.66	26,514,220.07	892.03	449,110,076.51	99.88%	0.12%
5.6	MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 psi	m3	444.92	$ 939,279.00	$ 417,904,309.73	353.26	$ 331,813,926.30	83.85	78,761,103.7	437.12	410,575,029.98	98.25%	1.75%
5.7	CONCRETO SOLADO LIMPIEZA 1500 PSI E=0,05m	m2	9,585.17	$ 27,413.00	$ 262,758,287.55	8,644.85	$ 236,981,218.22	660.33	18,101,626.3	9,305.18	255,082,844.51	97.08%	2.92%
6	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA**				**$ 6,719,915,108.76**		**$ 323,425,911.24**		**$ 120,836,341.68**	-	**$ 444,262,252.92**	**6.61%**	**93.39%**
6.1	COLUMNAS EN CONCRETO 4000 psi	m3	754.18	$ 1,168,404	$ 881,185,760.32	276.81	$ 323,425,911.24	103.42	120,836,341.68	380.23	444,262,252.92	50.42%	49.58%
7	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPOSTERÍA**				**$ 2,958,227,632.06**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**		**100.00%**
8	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETES**				**$ 1,400,846,125.75**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**		**100.00%**

9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTAS Y ESTRUC. DE SOPORTE				$ 2,340,161,898.09		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASOS				$ 1,216,326,799.45		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA				$ 3,526,871,719.79		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS				$ 3,054,617,913.36		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPES Y ACCESORIOS				$ 1,434,906,383.63		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAJERÍA HERRAJES				$ 25,095,675.00		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS Y ESPEJOS				$ 10,495,779.12		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS/GRIFERIAS				$ 331,055,541.00		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURAS				$ 2,280,309,480.78		$ -		$ -	-	$ -		100.00%

18	SUMINISTRO E INSTALACION DE OBRAS EXTERIORES				$ 2,384,510,671.31		$ 406,417,643.43		$ -	-	$ 406,417,643.43	17.04%	82.96%
19	ASEO Y SEÑALIZACIÓN				$ 199,426,804.87		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
20	SUM. INST. HIDROSANITARIAS									-			
21	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS												
22	RED DE GASES MEDICINALES									-			
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA												
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE				$ 1,400,185,609.09		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAS NATURAL				$ 18,958,500.00		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS CON AIU				$ 58,451,622,879.90		$ 9,446,906,005.92		$ 1,664,695,375.16	-	$ 11,111,601,381.08	19.01%	80.99%

26	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS FIJOS ELECTRICOS				$ 2,320,736,067.00		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
27	SUMINISTRO DE EQUIPOS FIJOS AIRE ACONDICIONADO				$ 399,665,142.00		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
28	EQUIPOS FIJOS RED DE GASES MEDICINALES												
29	SUMINISTRO DE MUEBLE FIJO EN ACERO INOXIDABLE				$ 635,814,615.45		$ -		$ -	-	$ -		100.00%
	SUB TOTAL EQUIPOS				$ 7,521,657,046.45		$ -		$ -		$ -		100.00%
	DILIGENCIA LEGALIZACION ANTE CELSIA Y CERTIFICACION DE INSPECCION RETIE		1.00	$ 69,500,000	$ 69,500,000.00								
	PLAN DE GESTION AMBIENTAL		1.00	$ 51,000,000	$ 51,000,000.00			0.17	8,670,000.00	0.17	8,670,000.00		
	SUB TOTAL OTROS COSTOS				$ 120,500,000.00		$ -		$ -		$ -		100.00%
				SUBTOTAL OBRAS	$ 58,451,622,879.9		$ 9,446,906,005.92		$ 1,664,695,375.16		$ 11,111,601,381.08		PORCENTAJES
	VALOR COSTOS ADMINISTRATIVOS A.I.U 27%			ADMINISTRACION (20%)	$ 11,690,324,575.9	A.I.U 27%	$ 1,889,381,201.18	A.I.U 27%	$ 332,939,075.03	A.I.U 27%	$ 2,222,320,276.22	EJECUTADO	POR EJECUT

| | | |

5.6 RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Descripción	Maquinaria/equipo en obra	Cantidad	Estado		
			Bueno	Aceptable	Malo
Equipo de topografía	Si	1	x		
Vibrocompactador doble rodillo	Si	1	x		
Doble troque	Si	1	x		
Retroexcavadora	Si	1	x		
Pajarita	Si	1	x		
Minicargador	Si	1	x		
Autohormigonera	Si	1	x		

Tabla 8. Relación de equipos y maquinaria

5.7 CONTROL DE CALIDAD

Con el fin de verificar y certificar que los materiales usados cumplen con los diseños y especificaciones técnicas se realizaron los ensayos correspondientes a todos los materiales utilizados en cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo, como también se realizó seguimiento a los certificados de calidad de los materiales y certificados de calibración de los equipos.

5.8 CONTROL CLIMATOLOGICO

Durante el mes de enero se presentaron lluvias intensas en un 2% y lluvias moderadas en un 7%. En general, la condición climatológica en el mes fue buena, representando una condición climatológica favorable para el avance de la obra.

ESTADO DEL TIEMPO

MES	ENERO	AÑO	2026

SECO 1 | LLUVIAMODERADA 2 | LLUVIA INTENSA 3 | NUBOSO 4

HORAS	FECHA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 - 8:00					1	2	1	1	2	1		1	4	4	3	2	1		1	1	1	4	2	4		1	1	1	4	4	2
8:00 - 9:00					1	2	1	1	2	1		1	4	4	3	2	1		1	1	1	4	2	4		1	1	1	4	4	2
9:00 - 10:00					1	2	1	1	2	1		1	4	4	3	2	1		1	1	1	4	2	4		1	1	1	1	1	1
10:00 - 11:00					1	2	1	1	2	1		1	1	1	3	1	1		1	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1
11:00 - 12:00					1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1
12:00 - 13:00					1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1
13:00 - 14:00					4	4	1	1	1	1		1	1	1	4	1	1		1	1	1	4	1	4		1	1	1	1	1	1
14:00 - 15:00					4	4	1	1	1	1		1	1	1	4	1	1		1	1	1	4	4	4		1	1	1	1	1	1
15:00 - 16:00					4	4	1	1	1	1		1	1	1	4	1	1		1	1	1	1	4	4		1	1	1	1	1	1
16:00 - 17:00					4	4	1	1	1	1		1	1	1	4	1	1		1	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1

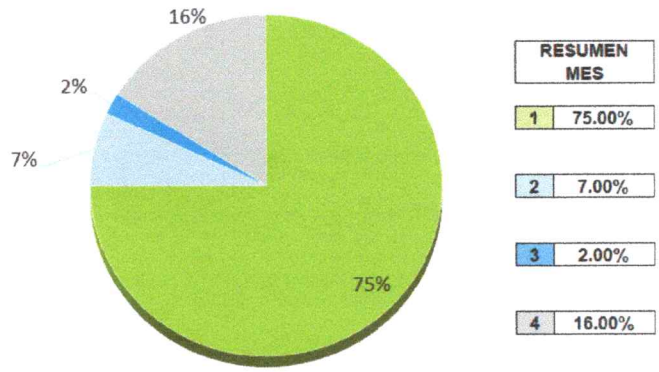


Imagen. 6 Estado del tiempo

6. COMPONENTE AMBIENTAL

El proyecto de construcción del hospital San Juan Bautista en el municipio de Chaparral, Tolima contempla la incorporación de medidas básicas de manejo ambiental durante todas las fases de ejecución, en concordancia con el plan de gestión ambiental.

Durante el mes de enero, se tomaron las siguientes acciones:

Control de emisiones y polvo: Se implementaron riegos periódicos y cubrimiento de materiales sueltos para minimizar la generación de partículas.

Manejo adecuado de residuos: Los residuos sólidos, peligrosos y líquidos generados durante la obra fueron segregados, almacenados temporalmente y dispuestos conforme a la normativa vigente.

A la fecha, la obra cuenta con áreas provisionales destinadas para el acopio temporal de materiales de construcción. Estos sitios de almacenamiento se encuentran debidamente identificados, demarcados y, cuando las condiciones atmosféricas o la naturaleza de los materiales lo requieren, cubiertos para evitar afectaciones ambientales.

Durante el periodo reportado no se registraron quejas o reclamos por parte de los trabajadores ni de la comunidad aledaña al área de influencia directa del proyecto, en relación con el manejo de los materiales de construcción.

Protección de áreas verdes y suelo: Se delimitaron las zonas de intervención, evitando afectaciones a áreas no involucradas en la construcción.

Ruido y vibraciones: Se ha procurado el uso de maquinaria en buen estado y se han restringido horarios de operación ruidosa en cumplimiento de la normativa local.

Capacitación y sensibilización: Se han realizado charlas y capacitaciones al personal sobre buenas prácticas ambientales, seguridad ocupacional y manejo adecuado de residuos, con la finalidad fortalecer las competencias del recurso humano en materia de gestión ambiental, promoviendo la adopción de buenas prácticas para la prevención, mitigación y control de impactos asociados a las actividades constructivas.

Trámites ante autoridades ambientales: El proyecto se está desarrollando bajo cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así como de las condiciones establecidas en las licencias, permisos y autorizaciones emitidas por las autoridades competentes. Así mismo, el proyecto demanda la gestión de diversos trámites ante autoridades ambientales y municipales, así como la verificación de autorizaciones y permisos otorgados por terceros:

ACTIVIDAD	TIPO DE PERMISO Y/O REQUERIMIENTO	ENTIDAD QUE OTORGA	OBLIGACIONES
Manejo y disposición de residuos sólidos convencionales	Certificaciones	CORTOLIMA	Empresa de Servicios Públicos de Chaparral E.S.P. (EMPOCHAPARRAL).
Título minero y licencia ambiental para explotación de materiales	Título Minero Licencia Ambiental	CORTOLIMA	Resolución No 6282 del 11 de octubre del 2023 Título minero No HJ5-13591X.
Concesión de Aguas superficiales	solicitud conexión provisional de agua	EMPOCHAPARRAL ESP.	Instalación provisional de conexión de agua con la empresa EMPOCHAPARRAL ESP.

Tabla 9. Trámites ante autoridades ambientales

El consorcio continuará con la gestión de los requerimientos legales y permisos ambientales, en coordinación con las autoridades ambientales con jurisdicción en la zona de influencia del proyecto.

7. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

El informe comprende el seguimiento a las actividades HSE realizadas en el mes de enero, con el objetivo de brindar acompañamiento a la planificación y ejecución segura de las labores que puedan poner en riesgo la integridad de los trabajadores, del medio ambiente y seguridad física, verificando la correcta evaluación de los riesgos e implementación de las diferentes barreras en el formato de Planificación Diario de Trabajo Seguro.

De manera general, se consideran las siguientes medidas:

Afiliaciones al sistema general de seguridad social en salud: A cada colaborador vinculado a la organización se le ha realizado la correspondiente afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que incluye la EPS, ARL, AFP y la Caja de Compensación Familiar. Es importante resaltar que, antes del ingreso del trabajador a su zona de labor dentro del proyecto de construcción, se lleva a cabo la verificación de su afiliación a la ARL correspondiente, así como la validación del nivel de riesgo asociado a la actividad que va a desempeñar, garantizando así el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas para el desarrollo de sus funciones. A continuación, relacionamos el listado del personal vinculado a la obra directamente con el Consorcio:

NOMBRE Y APELLIDO	SEGURIDAD SOCIAL	ARL	EPS	AFP	CARGO
Abrahan Estaly Henríquez	SI	SI	SI	SI	Cadenero
Andrés David Tejedor	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Andrés Felipe Muñoz	SI	SI	SI	SI	Operador Volqueta
Carlos Alberto Ortiz	SI	SI	SI	SI	Oficios varios
Carlos Fernando Parra	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Cristian Camilo Caicedo	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Cristian Eduardo Ramírez	SI	SI	SI	SI	Oficial
Deiver Rativa	SI	SI	SI	SI	Operador
Edward Rodriguez Ramirez	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Eriberto Ortega Avila	SI	SI	SI	SI	Oficial

Felipe Loaiza	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Harold Augusto Carranza	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Hector Eudoro Usaquen	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Jhonathan Castro	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Jimmy Alexander Morales	SI	SI	SI	SI	Operador Pajarita
Jorge Armando Caraballo	SI	SI	SI	SI	Topógrafo
Jorge Luis Álvarez	SI	SI	SI	SI	Oficial
Jose Armando Otavo	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Jose Edinson Mendez	SI	SI	SI	SI	Operador
Jose Fidel Rodriguez	SI	SI	SI	SI	Almacenista
Jose Libardo Gutierrez	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Jose Manuel Gaitan	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Juan Carlos Rivera	SI	SI	SI	SI	Oficios varios
Juan David Narvaez	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Juan José Muñoz Esalas	SI	SI	SI	SI	Maestro de Obra
Juan Pablo Velazquez	SI	SI	SI	SI	Oficios varios
Julian David Castro	SI	SI	SI	SI	Ayudante
Lirsy Janeth Ramirez Cabrera	SI	SI	SI	SI	Residente HSE
Marco Remberto Álvarez	SI	SI	SI	SI	Oficial
Omar Moukarzel de la Espriella	SI	SI	SI	SI	Director de obra
Pedro Enrique Bonfante	SI	SI	SI	SI	Ingeniero civil residente
Pedro Luis Sabalza	SI	SI	SI	SI	Oficial
Ralfhi José Peña	SI	SI	SI	SI	Ingeniero auxiliar residente
Roberto de los Ángeles Sabalza	SI	SI	SI	SI	Oficial
Wilder Andres Serrate	SI	SI	SI	SI	Operador Retro
William Yohanny Sabogal	SI	SI	SI	SI	Operador Volqueta
Wilson Martinez	SI	SI	SI	SI	Ayudante

Tabla 10. Relación de personal en obra

Se anexa planilla de seguridad social del mes de enero.

Equipos de protección personal (EPP): Se suministró la dotación al personal como jeans, botas y elementos de protección personal a los colaboradores porque

protege la integridad física del trabajador al actuar como barrera contra los riesgos laborales inevitables, previniendo lesiones y enfermedades profesionales. Los elementos de protección individual como guantes de vaqueta, gafas de seguridad, casco de seguridad entre otros elementos de protección personal de consumo; por deterioro de los mismos, necesidades propias de la actividad y para que los trabajos a ejecutar fueran realizados bajo las condiciones de seguridad apropiadas.

A continuación, se describe el consumo de EPP durante el mes de enero:

DOTACION Y EPP	TOTAL CONSUMIDO MES ENERO
Buso manga larga	23
Jeans	25
Botas de Caucho	5 pares
Botas de seguridad	25 pares
Guante de vaqueta	15
Gafa transparente	10
Casco de Seguridad	7
Gafas lente oscuro	15
Tapa oídos inserción	10
Impermeables	3

Tabla 11. Consumo de EPP mensual

Se anexa a este informe el formato de entrega de EPP y dotación.

Inspecciones de seguridad: Se han realizado inspecciones periódicas y reportes de condiciones inseguras, promoviendo la mejora continua de las prácticas de seguridad.

El cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo se rigen por la legislación nacional vigente y las disposiciones de la autoridad competente, asegurando el desarrollo de todas las actividades en un entorno controlado y seguro.

En el mes de enero se realizaron las siguientes inspecciones de seguridad, anexando a este informe los formatos de inspecciones:

Inspecciones preoperacionales a los equipos, con el objetivo de revisar sus condiciones antes de empezar la actividad.

Inspecciones a las maquinarias amarilla como: la Retro excavadora de oruga, la pajarita, volqueta, verificando que estén en buen estado para garantizar la seguridad de los operadores, prevenir fallos graves, asegurar el rendimiento optimo del equipo, cumplir con las normativas.

Supervisión y seguimiento: Se realizó acompañamiento en la actividad de encofrado y fundida de columnas y muros, ya que es una actividad de alto riesgo, por ser un trabajo en altura, se verificó el adecuado uso de los equipos de alturas como arnes de cuerpo entero y eslinga en Y con impacto de seguridad.

Se hizo acompañamiento a los colaboradores en diferentes actividades, verificando que tengan todos los elementos de protección personal acorde a cada actividad y que utilicen correctamente las herramientas, desarrollando las actividades con las normas de seguridad.

Se hizo una actividad de calistenia a los colaboradores con el fin de relajar los músculos y mejorar la fuerza funcional, la flexibilidad, la coordinación y el control corporal, fortaleciendo músculos estabilizadores.

Se realizó una jornada de vacunación contra la fiebre amarilla al personal con el fin de reducir el riesgo de enfermedades inmunoprevenibles, disminuir la mortalidad y prevenir la reaparición de brotes.

Inducción y capacitación del personal: Se realizaron charlas de seguridad a los colaboradores dándole la importancia que tienen cada una de ellas donde reduce accidentes y enfermedades laborales, creando conciencia sobre riesgos, reforzando con buenas prácticas y cumpliendo las normativas, lo que resulta en un menor ambiente laboral, mayor productividad y menores costos, fortaleciendo una cultura de prevención y compromiso.

Se les hace la inducción al personal que ingresa nuevo, para dar cumplimiento al sistema de gestión de la empresa, permitiéndoles comprender la cultura, normas y funciones específicas desde el primer día.

TEMA	FECHA
Retroalimentación Riesgos en obra	05-01-2026
Retroalimentación del uso de EPP	06-01-2026
Riesgo Atmosférico cuidados en días de lluvias	07-01-2026
Retroalimentación de la importancia del uso de EPP	08-01-2026
Socialización Reglamento Interno de la empresa	09-01-2026
Riesgo Físico "Ruido"	10-01-2026
Política Cero Alcohol	11-01-2026
Riesgo Mecánico	14-01-2026
Riesgo Biológico	15-01-2026
El Autocuidado	16-01-2026
Riesgo Biológico por Macroorganismo	17-01-2026
Riesgo Físico "Golpe de calor"	19-01-2026
Manipulación de Herramienta Manual	20-01-2026
Retroalimentación para trabajos en altura	21-01-2026
Retroalimentación orden y aseo	26-01-2026
Riesgos Biomecánicos por movimiento repetitivo	28-01-2026
Seguridad vial en obra y reporte estado de EPP	29-01-2026
Riesgos críticos y locativos, control del entorno	30-01-2026
Autocuidado y prevención de heridas por objetos cortopunzantes	31-01-2026

Tabla 12. Charlas y Capacitaciones

Se debe concientizar a los trabajadores sobre el uso de los elementos de protección personal porque protege la integridad física del trabajador al actuar como barrera contra los riesgos laborales inevitables, previniendo lesiones y enfermedades profesionales. Se capacita al personal sobre el uso adecuado de los EPP y el correcto manejo de las herramientas y equipos, es importante proteger la salud y la vida de los trabajadores al prevenir lesiones y enfermedades, es fundamental para

el cumplimiento de normativas legales y la creación de una cultura de seguridad en el trabajo.

Es importante que los colaboradores tengan claro el uso adecuado y la forma correcta de utilizar los andamios para garantizar la seguridad de ellos mismos y así aumentar la eficiencia. Proporcionan una plataforma estable y un acceso seguro a alturas elevadas, que lo permite realizar sus actividades.

Se realizaron capacitaciones sobre el reglamento interno de la empresa. Es muy importante establecer normas, políticas y expectativas claras, evitando malentendidos y conflictos al formalizar la relación laboral. Proporciona un marco de referencia para las sanciones y el cumplimiento legal, asegura el cumplimiento de la normatividad vigente y promueve un ambiente de trabajo ordenado, respetuoso y eficiente.

Se realizaron charlas sobre el orden y aseo en el trabajo son fundamentales para garantizar la seguridad, prevenir accidentes e incidentes y aumenta la productividad al optimizar el espacio y el tiempo. Un entorno limpio mejora el clima laboral, reduce el estrés y fomenta el autocuidado, requiriendo el compromiso de todos.

Se realizaron charlas sobre la importancia de gestionar el riesgo biomecánico para prevenir lesiones musculoesqueléticas y enfermedades laborales, tales como lumbagos o desgarros, mediante la optimización de posturas, manipulación de cargas y movimientos repetitivos, busca proteger la integridad física del trabajador mejorando la interacción entre el cuerpo y las actividades laborales.

Se anexan a este informe los formatos de charlas y capacitaciones.

Orden y limpieza en obra: Se han realizado jornadas de orden y aseo para garantizar áreas de trabajo libres de obstáculos, con adecuada disposición de materiales y residuos para prevenir accidentes, garantizando condiciones de trabajo seguras. Todo el material se acopió en un sitio temporal.

Señalización y control de accesos: Se instalaron señalizaciones preventivas e informativas en todas las zonas de riesgo, con el fin de tener claro la ruta de evacuación y el punto de encuentro, y demarcar con cinta de peligro señalando por donde no se puede transitar. Son cruciales para prevenir accidentes, protegiendo a los trabajadores y transeúntes al advertir sobre los peligros, delimitando zonas

restringidas, mejoran la organización y eficiencia del sitio, aseguran el cumplimiento normativo, haciendo la obra más segura, ordenada y fluida para todos. Así mismo, se tiene un control de ingreso al proyecto, en donde se restringe el acceso al personal no autorizado.

Atención de emergencias: El proyecto cuenta con un botiquín de primeros auxilios, personal capacitado y un plan de respuesta ante emergencias que contempla incendios, caídas o accidentes.

Reporte de eventos: No se reportaron accidentes e incidentes durante el mes de enero, esto se atribuye al compromiso de los colaboradores y la buena planificación de trabajo seguro que se realizan previa a la ejecución de las actividades.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen. 7 Instalación de acero



Imagen. 8 Construcción de columnas



Imagen. 9 Instalación de acero



Imagen. 10 Muro de contención

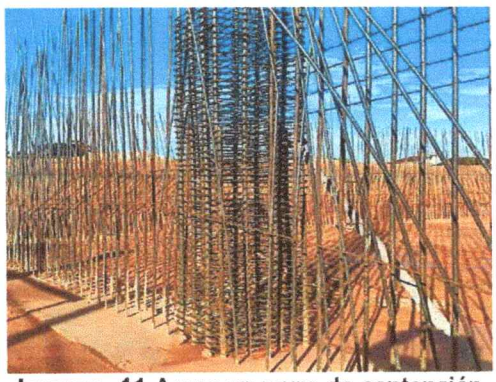


Imagen. 11 Acero en muro de contención



Imagen. 12 Muro de contención



Imagen. 13 Construcción de columnas



Imagen. 14 Cimentación y columnas



Imagen. 15 Entrega de EPP



Imagen. 16 Socializaciones SST



Imagen. 17 Capacitaciones SST



Imagen. 18 Inducción del Personal



Imagen. 19 Instalación de señales en obra



Imagen. 20 Aseo de obra



Imagen. 21 Inspección maquina amarilla



Imagen. 22 Inspección volqueta



Imagen. 23 Entrega de dotación



Imagen. 24 Pausas activas



Imagen. 25 Jornada de vacunación



Imagen. 26 Retroalimentación para trabajos en alturas



Imagen. 27 Instalación reglamento institucional



Imagen. 28 Inspección de EPP

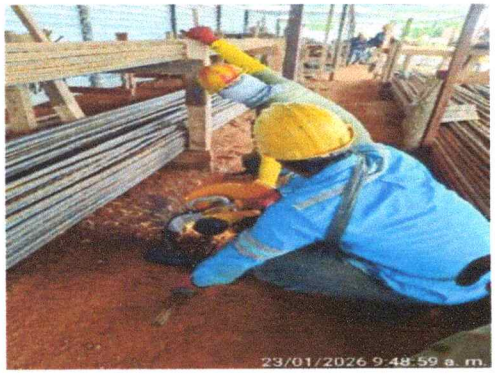


Imagen. 29 Manipulación de herramienta critica



Imagen. 30 Acopio punto ecológico

9. CONCLUSIONES

El consorcio Equigrava ha ejecutado las actividades en obra siguiendo los diseños y planos estructurales. Se ejecutaron actividades en los capítulos de movimientos de tierras, acero de refuerzo, suministro e instalación de cimentación y estructura. Como también, todas las actividades administrativas y de apoyo al equipo técnico requeridas para garantizar el adecuado desarrollo de cada actividad en campo, cumpliendo con todos los cuidados y parámetros ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

En el mes de enero se ejecutaron actividades en un menor porcentaje que la programación de obra, se evidencia un porcentaje ejecutado en el mes del 2,57% equivalente a $ 2.122.833.126,46 y un porcentaje programado del 3,43% equivalente a $ 2.841.301.601,71. Sin embargo, con la ejecución alcanzada durante el mes de enero, el proyecto se mantiene por encima de la programación, alcanzando un adelanto acumulado del 4,54%, representado en un porcentaje ejecutado acumulado del 17,07% con una inversión de $14.120.403.753,98 en relación con el porcentaje programado acumulado del 12,53% equivalente a $10.361.629.672,11.

Se evidencia la segunda acta de cobro presentada a la entidad contratante con fecha del 05 de diciembre, por un valor de $7.422.033.706,54 lo que equivale a un porcentaje ejecutado del 8,97%. A la fecha con un total cobrado de $9.933.104.949,54 y un porcentaje total de 12,01% del total del contrato.

Todas los procesos constructivos, administrativos y financieros han sido supervisados por el consorcio SJB interventoría, siguiendo todas las sugerencias y recomendaciones.

10. ANEXOS

Se incluyen en este informe los siguientes documentos soportes:

- Certificados de calidad de los materiales.
- Certificados de calibración de los equipos de topografía.
- Resultados de ensayos de laboratorio.
- Planilla de seguridad social del mes de enero.
- Formatos de entrega de elementos de protección personal y dotación al personal de obra.
- Formatos de inspecciones de seguridad.
- Registros de asistencia, charla, capacitación o divulgación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
