Nota - 184: viernes 3d de octubre 2025
dice: llueve en la tarde
Personal: 3 sintético, 1 residente.
CTR Ronald Lozano

Nota 185: se coonza con la pulida de toda la capa de sintético como sobre el problema presentado con las adiciones en los empalmes, se aplica una capa de slurry esparcido en el costado nor-occidental de la cancha, lugar donde se encuentra una lumina de agua.
CTR Ronald Lozano

Nota 186: Sabado 4 de octubre 2025
Dice: llueve en la tarde
Personal: 3 sintético, 1 residente
CTR Ronald Lozano

Nota 187: Se continua y avanza con la pulida de toda la superficie de la cancha, como tambien de las adiciones que se presentan en los empalmes de los colores.
CTR Ronald Lozano

Norma

Nota 188 - Lunes 27 de octubre 2025
Cmo: Cavidad de la boca.
Personal: 3 sintético, 1 residente.
CTR Ronald Lozano

Nota 189: como actividad importante se continua con la pulida de toda la superficie de la concha, con el fin de retirar toda la capa sintética y corregir y sobsonar las dislocaciones que se presentaron en la capa del sintético, acogiendose a la nota realizada para interoclo #170 del 15 de octubre.
CTR Ronald Lozano

Nota 190 - Martes, 28 de octubre 2025
Cmo: Cavidad oclusal.
Personal: 1 residente, 3 tipo sintético.
CTR Ronald Lozano

Nota 191: la interventoría regulera y acompaña al cirujano revisor el avance y toma donde quieren q instalando los extensiones de los

pulidores, los nodos se encuentran guardados
superficialmente y se requiere el cambio,
así mismo se ordena cada pulido de
toda la superficie de la concha nacarada
y poder subsanar las dilataciones que
se presentaron en los empalmes y
en gran parte de la concha, acatando
y acatando las recomendaciones dadas
por la interventoría en distintos notas
del libro de obra y por comunicado

CTP Perdomo Lozano

Nota 192: Martes 29 de octubre 2019
Amo. Nublado.
Personal: Trabajando, 3 pulidores.

CTP Perdomo Lozano

Nota 193: En el día de hoy se termina
de pulir la capa del enchape en toda
la superficie de la concha y se procede
a lavar con acido y agua, se remueve
el empaste limpiar muy bien la
superficie y reparar muy bien los
zonas donde se observan agujeros

Norma

laminas de agua, se recomienda realizar una buena superficie de la concha o limpiar muy bien con algun producto antes de aplicar los apoyos de neopreno.

Ronald Bravo

Nota 194: Jueves 30 de octubre 2025
Clima: Soleado
Personal: 2 Asistente. 1 inspector.

Ronald Bravo

Nota 195: como actividad importante se realizo nivelacion de ciertos puntos con estuco y antidigo siguiendo las recomendaciones de la interventoria.

Ronald Bravo

Nota 196: Viernes 31 de octubre 2025
Clima: Nublado
Personal: 2 Asistente, 1 inspector.

Ronald Bravo

Nota 197: se procede en la nivelacion con stuco, asistio en ciertos puntos que presentaban algunas laminas de agua, segun la inspeccion y recomendacion

de la intervención, se requiere al contratista reparar muy bien los dilataciones y laminas, antes de continuar con la soldadura, se recomienda imprimar la superficie de la concha y garantizar la adherencia con el sintético de acabado.

Ronald Lozano

CONSORCIO Belzcon
IDRD I

ANEXO 16 BITÁCORA PARQUE BERLÍN

NOTA 005 Fecha: 26 de septiembre al 30 de septiembre de 2025
Estado del tiempo: Días nublados
Personal: 3 ayudantes (pintores)
Equipo y herramienta menor.
Actividades: Se continua con el mantenimiento de cerramiento perimetral de la conchy.
Sintética y se finaliza la actividad.
Se encuentran pendientes los módulos de cambio que se autorizaron.
Las actividades fueron supervisadas y avaladas por la interventoría. Nota: Están en observación.
Chupesa.

NOTA 006. Fecha: 01 octubre de 2025.
La Interventoría, recomienda instalar los módulos metálicos de cambio, de manera urgente, antes de continuar con la aplicación de pintura del cerramiento perimetral.
Chupesa.

Powered by CamScanner

4

Nota 007 Fecha: 02 de octubre de 2025.
Estado del Clima: Día nublado.
Personal: 3 pintores (ayudantes).
Herramienta y equipo Menor.
Actividades: Se continua con el mantenmiento de pintura en el cuarto eléctrico. Estan pendientes la instalación de los módulos.
Chuprosa.

Nota 008 Fecha: 03 de octubre de 2025
Estado del clima: Dia nublado.
Personal: 3 pintores (ayudantes)
Herramienta y equipo menor
Actividades: se continua y finalita el mantenmiento de pintura del ceramiento del cuarto eléctrico. Está pendiente la instalación de los módulos.
Chuprosa.

Nota 009. Fecha: DEL 04 al 31 de octubre de 2025.
Personal: No se cuenta con Personal.
Actividades: No se realizan actividades en.

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 17
BITÁCORA TIMIZA
COD. 08-219

01-10-25 Nota 291: Miercoles 1 de octubre 2025
Hno. soldado.
sin personal.
el contratista realiza el suministro de malla bastinet, la supervisora requiere implementar de manera urgente un plan de contingencia para mitigar el atraso en la ejecucion y culminacion de los obras en el sondeo geotecnia y muro concreto sur.

Fdo. Ing. Ronald Lucero

02-10-25 Nota 292: Jueves 2 de octubre 2025
sin personal.
la supervisora le requiere nuevamente al contratista, implementar de manera inmediata un plan de contingencia con el fin de mitigar el atraso de los obras, con el servicio inmediato de los daños en el sondeo geotecnia y muro concreto sur, recordando que es obligacion del contratista

Scanned with CamScanner

garantizar la continuidad de los obra segun sus obligaciones contractuales, la permanencia a estos requerimientos. dando lugar a posibles sanciones.

CTR Pardo Lorano

03-10-25 Nota 293: Viernes 3 de octubre. 2025
Sin personal.
La interventoria requiere nuevamente al contratista implementar de manera urgente un plan de contingencia, con el fin de continuar los obras en el sendero peatonal y muro costado sur, ya que desde varios dias no se adelanta ninguna actividad, recordando que es obligacion del contratista garantizar la continuidad de los obras segun sus obligaciones especificos.

CTR Pardo Lorano

04-10-25 Nota 294: Sabado 4 de octubre 2025
la interventoria requiere nuevamente al contratista implementar de manera inmediata un plan de contingencia y reiterar

Scanned with CamScanner

21 los otros en el muro colado sur entubarían de la barenda T-80 en el sardinel del lago, recordando que se obligaban del contratista garantizar la continuidad de los otros.

CTR Ronald Bravo

06-10-25 Nota 295 Bravo 6 de octubre 2025
Cno. Nublado
Personal: 1 inspector, 1 chofer, 1 ayudante

CTR Ronald Bravo

23 Nota 296: se permiten los otros en el muro colado sur, restando donde van del muro existente, dejando el avance la interventoría requiere resina y dejar muy bien el terminado así como retirar los escombros en sitio autorizado.

CTR Ronald Bravo

07-10-25 Nota 297: Martes 7 de octubre 2025
Cno: Nublado
Personal: 1 inspector, 1 chofer, 2 ayudantes

CTR Ronald Bravo

Scanned with CamScanner

Nota 298: se ocurre en la dirección del muro costado sur, se requiere realizar y abastar muy bien el cerramiento y estudiar esta abada y evitar cualquier incidente, se requiere instalar barrera TBO en sendero peatonal donte el lago.

CR Ronald Lizano, Santana

08-10-25 Nota 299: Miércoles 8 de octubre
Clima: Nublado
Personal: Inspector, Control, Topógrafos
CR Ronald Lizano Santana

Nota 300: se acerca y termina en la demolición del muro costado sur del parque, la maquinaria requiere y recomienda nuevamente el Gancho Pike semi-trailer instalar la barrera TBO en sendero peatonal.

Santana CR Ronald Lizano

09-10-25 Nota 301: Jueves 9 de octubre 2025
Clima: Nublado
Personal: 1 Inspector, Residente, Topógrafo

Scanned with CamScanner

z ayudantes.

CR Pardo bravo

Nota302: se ocarra en el armado de acero de refuerzo de la viga del cerramiento malla tortinet, se realiza instalacion de tomatela, la supervisora recomienda alinear muy bien la tomatela antes de fundir, se requiere retira los escombros caido ocasionado, se requiere suministrar e instalar concreto 4180 en sandero peatonal.

CR Pardo bravo.

10-10-25 Nota303: viernes 10 de octubre 2025
Clima: soleado
Personal: 1 residente, 20 oficiales, 20 ayudantes.

CR Pardo bravo

Nota304: se ocarra en la fundicion de la viga e instalacion de los postes del cerramiento tortinet, se requiere retirar los escombros a sitio autorizado y se requiere nuevamente supervisar

Scanned with CamScanner

e instala la baranda 780 en sendero peatonal.

CFR Pardo bravo

11-10-25 Nota 305: Sabado 11 de octubre. clima: Ventoso. Personal: 1 residente, 2 fiscales, 2 ayudantes.

CFR Pardo bravo

Nota 306: se coloca con el desarrollo de la obra, se requiere retiro escombros y suministro la baranda 780 en sendero peatonal y poder realizar acto de puesta en servicio.

CFR Pardo bravo

14-10-25 Nota 307: Martes. 14 de octubre 2025 clima: soleado. Personal: 1 residente, 2 oficiales, 2 ayudantes.

CFR Pardo bravo

Nota 308: Se coloca en la instalación de la malla perimetral, se requiere retiro de escombros y suministro e instalación.

Scanned with CamScanner

de la barandilla TIPO en sendero peatonal, recordando que el contrato finaliza el próximo 19 de Noviembre del 2025.

CPR Pondal Bravo

15-10-25 Nota: 309: Viernes 17 de octubre 2025
Amor. soleado
Personal: Presidente, 20 Fieles, 20 yodoles.

CPR Pondal Bravo

Nota 310: se constata armando el muro en cerramiento malla bastinet, se requiere retirar los escombros y realizar y templar frente malla, se requiere suministrar e instalar la barandilla TIPO en sendero peatonal recordando que el contrato finaliza el proximo 19 de Noviembre del 2025.

CPR Pondal Bravo

16-10-25 Nota 311: Jueves 16 de octubre 2025
se requiere al contratista suministrar e instalar la barandilla TIPO en el sendero peatonal, recordando que el incumplimiento del contrato acarrea la suspensión de los pagos

CPR Pondal Bravo

Scanned with CamScanner

17-10-25 Nota 312: viernes 17 de octubre se requiere nuevamente al contratista ingresos, suministros e instalar la toma-tierra TBO en el sendero peatonal y retirar los escombros en la zona contigua sur.

Ponddbono Santana

20-10-25 Nota 313: Lunes 20 de octubre 2025 se requiere nuevamente al contratista retirar los escombros en zona contigua sur, y suministrar e instalar bornado TBO en sendero peatonal.

Ponddbono Santana

21-10-25 Nota 314: Martes 21 de octubre 2025 La interventoría realiza visita al parque y observa que el contratista no ha suministrado la borna del sendero peatonal del lago, la interventoría requiere embaquillar bien el sendero, y a que se observan deficiencias expuestas anteriormente se requiere retirar escombros en zona sur y empalmar bien la malla torres.

Ponddbono Santana

Scanned with CamScanner

22-10-25 Nota 315: Miercoles 22 de octubre 2025
la interventoria realiza visita y
observa que el contratista no ha tomado
ninguna medida para el suministro
e instalacion de la baranda del sendero,
se requiere nuevamente al reinicio de
las obras y el retiro de escombros
en la entrada sur, recordando que
es obligacion del contratista garantizar
la continuidad de las obras.
CFR Ronald Irano

23-10-25 Nota 316: Jueves 23 de octubre 2025
Dia: soleado
personal: 3 ayudantes, 1 inspector.
CFR Ronald Irano
Nota 317: como actividad importante
el contratista ingresa personal y
material de obra, para inicio la
construccion de la baranda del sendero
peatonal, se recomienda al personal
de obra por parte de la interventoria
planos y alineo muy bien las postes

Scanned with CamScanner

se recomienda realizar el empalme entre los bordes lo mejor posible y evitar grietas que este genere de no ser así deben retirarse y reemplazarse nuevamente el concreto en mal estado. Se coloca sur y remata el cerramiento en malla eslabonada.

CTR Donald Orono Santana

24-10-25 Nota 318: Viernes 24 Octubre 2025

Clima: Soleado

Personal: Un (1) inspector de obra y tres (3) ornamentadores

Santana

Nota 319: Se realiza el cargue, retiro y disposición final de 7 m^3 de RCD acopiado en zona de acceso costado oriental.

Santana

Nota 320: Se continua con suministro e instalación de baranda metálica M-80 con pasamanos en tramo No. 2 de sendero lago.

Santana

25-10-25 Nota 321: Sábado 25 Octubre 2025

Clima: Soleado

Scanned with CamScanner

Personal: Un(1) inspector de obra y tres (3) ornamentadores

Santana

Nota 322: Se continua con instalación y pintura tipo anticorrosivo de baranda M-80 y pasamanos en tramo # 2 de sendero zona del lago.

Santana

27-10-25 Nota 323: Lunes 27 Octubre 2025

Clima: Soleado

Personal: Un(1) inspector obra y cuatro (4) ornamentadores.

Santana

Nota 324: Se continua con soldadura, pintura tipo anticorrosivo y pintura tipo esmalte en baranda M-80 y pasamanos en tramo # 2 de sendero zona del lago.

Santana

Scanned with CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 18 BITÁCORA PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) COD. 13-089

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

NOTA 160. Continúa pendiente la instalación del cerramiento en madera rolliza que falta en la zona de juegos infantiles aprox. son 10 travesaños.

NOTA 161. Se le solicita realizar el cambio de unos elementos PVC que están torcidos en los sillas que se instalaron en la zona de juegos infantiles

NOTA 162. Fecha: 25 de octubre 2025 y 27 de octubre 2025
Estado del tiempo: mañana lluviosa
Actividades: Limpieza y recolección de escombros
No se han atendido las actividades consignadas en las Notas 159 a 162.
Instalación del policlorito en cubierta invernadero.

NOTA 163. Fecha 4 noviembre de 2025 y 6 noviembre 2025
Estado del tiempo: Días secos.
Actividades:

NOTA 164 Instalación del rodadero metálico en la zona de juegos infantiles ts
Instalación de bornes para señaléticas en la zona de juegos infantiles.

NOTA 165. No se han atendido las observaciones de acuerdo a lo consignado en las NOTA 160 y 161.

Nota 149 Fecha: 27 de agosto de 2025
estado del tiempo: Dia despejado
Personal: 2 instaladores.
equipo y herramienta menor.

Nota 150. Actividades: se continua con la instalación de caucho (color) en las zonas 1 y 6.
Chupinazo.

Nota 151 Fecha: 28 de agosto de 2025.
Estado del tiempo: Dia despejado
Personal: 3 instaladores.
equipo y herramienta: Menor

Nota 152. Actividades: se continua con la instalación de caucho (color) en las zonas 1 y 6.
de la zona de juegos infantiles.
Chupinazo.

Nota 152. Fecha: 29 y 30 de agosto de 2025
Estado del tiempo: Dia despejado.
Personal: No hay personal en el parque, ni en la zona de juegos, ni en las administraciones.
Chupinazo.

Nota 154 Fecha: 9 de octubre 2025 y 10 de octubre 2025
Estado del tiempo: Lluvias moderadas
Personal: 1 ayudante, 2 ornamentadores
Herramienta y Equipo: menor./soldadura.
Actividades realizadas: Remate de soldaduras, lijado, subsanación imperfecciones, se realiza liberación de la actividad para proceder con la prueba o ensayo de soldadura.

NOTA 155 Prueba de tintas y liberación para aplicación de anticorrosivo.

NOTA 156 Liberación de la actividad.

NOTA 157 Avance instalación de piso caucho en Zonas 1 y 6.
Chupinazo

NOTA 158 Fecha: 15 de octubre 2025
Estado del Tiempo: Dia nublado
Personal: 2 ornamentadores.
Equipo: Compresor y herramienta menor
Actividades: Aplicación de pintura para la estructura metalica del invernadero

NOTA 159 Observaciones al Contratista para que instale la señaletica en Zona de Juegos infantiles
Pendiente instalar el rodadero en Zona #3.

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 19 BITÁCORA LA ESPERANZA COD. 07-273

debido a las lluvias durante la jornada

01-10-25 Nota 88: Miercoles 01 de octubre 2025
Clima: Soleado
Personal: 1 oficial, 2 ornamentadores y 2 en pista de patinaje

Nota 89: Se termina el retiro de baner en modulos de servicio, se continua con la aplicacion de pintura de cerramiento de la cancha sintetica, donde se reitera la proteccion de la grama y no mezclar directamente sobre la grama, tambien se debe retirar los tarros de pintura, se continua con las actividade de aplicación de pintura (recubrimiento) en la pisto de patinaje, no se observa avance en las actividades de la zona de juegos y pista de trote

Scanned with CamScanner

02-10-25 Nota 90: Jueves 02 de octubre de 2025

clima: Soleado

Personal: 1 oficial + 2 pinta de trote + 2 ornamentadores

Se continua la aplicación de recubrimiento en la pista de trota patinaje, de igual forma se realizan actividades de aplicación de pintura en cerramiento de cancha sintetica, se realiza el desmonte de lamina exterior del modulo para realizar la reparación de los baños fuera de servicio

CR Pardolleono Residente

Andres Felipe Inspector

Nota 91: la interventoria observando el avance de las obras requiere y recomienda al contratista mantener la limpieza del adecuado estado actual de la cancha la cual se encuentra bloqueada, se requiere limpieza de la vega perimetral de la concha, se requiere implementar un plan de contingencia para mitigar el atraso en zona infantil, pista de trote y zona de modulos, recordando que es obligacion del contratista garantizar la continuidad de las obras.

CR Pardolleono Residente interventoria

Scanned with CamScanner

03-10-25 Nota 92: Viernes 3 de octubre 2025
Dmo: soleado- Nublado
Personal- Inspector, Emaldo, Zarbies
Z pista principal.
C+R Ronald Lozano Santana

Nota 93: La intervención observando el
avance de las obras requiere y recomienda
nuevamente aplicar la pintura esmalte
RAL 6029, tal como lo contempla las
especificaciones técnicas, se requiere
remolar muy bien la pintura del
cerramiento, se observa puntos degradados,
se requiere limpios muy bien los
ojos perimetral y el adoquín el
cual esta degradados, se requiere
implementar un plan de contingencia
con el fin de vigilar el abuso
en el mantenimiento zona industrial
y pista de hielo, recordando que
el contrato finaliza el próximo 19
de Noviembre.
C+R Ronald Lozano Santana

Scanned with CamScanner

04-10-25 Nota 94. sabado 4 de octubre 2025
Clima. soleado.
Personal: 3 para polvorde, 2 oranamaticas.
Ronald Lopez Santana

Nota 95: se requiere el contratista implementar de manera inmediata un plan de contingencia para mitigar y reiniciar los obras en zona infantil, y para de hoy, ya que estas aceras estan quietas desde hace varios semanas, se requiere limpiar muy bien el bordillo paimetral de la cancha y sardineles peatonales, los cuales se observan taqueados.
Ronald Lopez Santana

06-10-25 Nota 96: lunes 6 de octubre 2025
Clima. Nublado.
Personal. 3 pista polvorde, 2 anomaticas.
Ronald Lopez Santana

Nota 97: la entrevistada requiere y recomienda al contratista que el residente e inspector de obra este pendiente de los obras que se ejecutan en el parque

Scanned with CamScanner

con el fin de evitar retrasos en la ejecucion de las obras, lo anterior para observando el avance de las obras requiere nuevamente al Contratista implementar un plan de Contingencia para mitigar el atraso de las obras en zona intermedia y pista de hote asi como la terminacion de los bordes del modulo y pintura del cerramiento Concha #8, se requiere nuevamente al Contratista cumplir a cabalidad las especificaciones tecnicas del IDRD en cuanto al mantenimiento de la borde o cerramiento de los Conchas, se requiere nuevamente limpiar muy bien la viga perimetral de la Concha y sondeos profundos, los cuales se deberan fraguados.

Ronald Lozano Santana

07-10-25 Nota de Campo: Fecha 7 de octubre 2025
Clima: Nublado
Personal: 2 pala delantera, retroexcavadora,

Scanned with CamScanner

2 pintores, 1 inspector.

GR Ronald Lozano Santana

Nota 99: La interventoria observando el avance requiere nuevamente al contratista residente e implementar un plan de contingencia para los obras en zona portuaria y pista de hotel, se requiere remotar muy bien la pintura del cerramiento ya que se observa fogueados algunos puntos, se requiere limpiar bien el sardinel peatonal y viga perimetral donde se observa fogueado, se requiere cuenta en la instalación de los toldos de los modulos, y se requiere limpiar bien la grama la cual esta fogueado de pintura.

GR Ronald Lozano Santana

08-10-25 Nota: 100. Miercoles 8 de octubre 2025 dinamico soleado

Personal: 1 oficial, 3 pintor getinado.

GR Ronald Lozano Santana

Nota 101: En el dia de hoy se continua

Scanned with CamScanner

de realizar la demolición y detalles en la pista de patinaje, no se observa avance de obra en cerramiento cancha F8, pista de baile y zona infantil, se requiere implementar un plan de contingencia para reiniciar las obras en pista de baile, zona infantil, cerramiento y banner de modelos, recordando que el contrato finaliza el próximo 19 de diciembre, la interventoría le recuerda que es obligación del contratista garantizar la continuidad de las obras priorizadas, se requiere limpiar muy bien la grama, urge parimetral y adoquines, las cotas se deben topografiar.

Ronald Leano. Santos

09-10-25 Notaría: Jueves 9 de octubre 2025
Firmado
Personal: (2) anomalías, 1 residente, 1 otical.

Ronald Leano Santos

Scanned with CamScanner

Nota 103: como actividad importante se realiza la puesta en servicio de la pista de patinaje donde los respectivos recomendaciones de uso al administrador del porque, se requiere terminar de detallar la baranda o cerramiento de la Cancha PB, la cual presenta ciertas observaciones de acabados, se requiere limpiar muy bien la grama, viga perimetral y sardineles peatonales los cuales se encuentran fragmentados, se requiere nuevamente implementar un plan de contingencia para contar y reiniciar los otros concernientes a la pista de trote, zona infantil y modelos. R. interventoría.

Ronald Bravo Santana

10-10-25 Nota 104: Viernes 10 de octubre 2025
Clima: soleado
Personal: 1 inspector, 2 ornamentadores

Ronald Bravo Santana

Nota 105: se continua con el listado de la baranda PB3 en zona infantil

Scanned with CamScanner

como montajimiento, se requiere nuevamente al Contratista remitir el cronomiento de la cuadra F8, la cual presenta ciertas observaciones de acabado, se requiere implementar de manera inmediata un plan de contingencia y riesgos el atraso en las obras de piso caucho en pista de bote y zona infantil así como los bancos en los modulos. R. Interventoria.

Ronald Bravo

11-10-25 Nota 106: Sabado 11 de octubre 2025 clima: soleado
Personal: 1 inspector, 5 piso caucho, 1 pintor.

Ronald Bravo

Nota 107: Como Actividad Importante se inicia con la instalación del piso caucho SBR en zona infantil segun lo asesores y respetando los juegos que se encuentran en la zona, se requiere al Contratista terminar y

Scanned with CamScanner

rematar los pendientes de pintura en el ceramiento de la concha FB, se requiere nuevamente limpiar muy bien el piso o sandeos pegotes así como la goma, la cual presenta fogueo de pintura esmalte. R. Interpintura.

Ronald Bono Santana

13-10-25 Nota 108: lunes 13 de octubre 2025 dimo: 1 boina oxidada.
Personal: 1 inspector, 5 piso Concha.

Ronald Bono Santana

Nota 109: se comenza en la instalación del piso Concha SBR en zona infantil, respetando los espesores que cada juego requiere según hoja de calidad, se requiere terminar de rematar la pintura de acabado en el ceramiento de la concha FB, se requiere comenzar con el piso concha en pista de hote, y se requiere instalar bonder en modelos. R. Interpintura.

Ronald Bono Santana

Scanned with CamScanner

14-10-25 Nota 110: Martes 14 de octubre 2025
clima: Nublado
Personal: 1 residente, 5 piso cacho,
1 ornamentación.
GR Ronald Ibarra

Nota 111: se comenzó con la instalación del piso cacho SBR en zona infantil, respetando espesores de factor de caída de cada juego, se requiere nuevamente ingresar más personal para acabar con el piso cacho en pista de bote, acabar con la instalación del borde en modulos, terminar remates de pintura en cancha FB, terminar desagües debajo de limpieza en grama y senderos peatonales, recordando que el contrato finaliza el próximo 19 de Noviembre 2025.
GR Ronald Ibarra.

15-10-25 Nota 112: Miércoles 15 de octubre 2025
clima: soleado

Scanned with CamScanner

Personal: 5 piso concho

~~CyC~~ Parcial bravo ~~Damara~~

Nota 113: En el dia de hoy, se ocupa en la instalacion de piso concho SBR en zona infantil, se requiere nuevamente que parte de la interventoria al contrato. iniciar con la instalacion de piso concho en pista de hoce, se requiere instalar bajar en modulos sanitarios, cafe, y camerinos, se requiere demas de pintar el cerramiento de la cancha FB y cerramiento de la zona infantil.

~~CyC~~ Parcial bravo ~~Damara~~

Nota 114: la interventoria requiere revisar y corregir una imperfeccion en la pista de patinaje, ya que en 3 puntos especificos se levanta la capa de pintura color morado.

~~CyC~~ Parcial bravo ~~Damara~~

16-10-25 Nota 115: Jueves 16 de octubre 2025

dimo: Nublado

Personal: 5 piso concho.

Scanned with CamScanner

Nota 116: Por lemos de dimy no se ha podido avanzar en la instalación del piso cocido SBS, ya que se han presentado lluvias altas lo que impide su instalación, ordenado que si se presentan lluvias no se adhiere de la mala manera, el ganado ganado, se requiere nuevamente al contratista reparar las obras de piso cocido en pista de hote, se requiere instalar barandas en modulos, se requiere terminar mantenimiento de pintura en cerramiento de cancha #8 y zona infantil.

CFR Pardo Lorano Santana

Nota 117: se requiere nuevamente corregir 3 puntos específicos en la pista de pintada, ya que se aprecia desprendimiento de pintura color morado.

CFR Pardo Lorano Santana

17-10-25 Nota 118: Viernes 17 de octubre 2025
Clima soleado
Personal: 1 inspector, 2 obra civil, 4

Scanned with CamScanner

piso coucho

GTR Ronald bruno Santana

Nota 119: Para llevar una adecuada flexibilidad se libera la instalacion de la primera capa de piso coucho SBR en zona infantil, una vez se verifico el espesor y comprobacion, se requiere el contratista entregar fichas tecnicas y certificado de calidad y ambiental del granulo de coucho SBR.

GTR Ronald bruno Santana

Nota 120: se requiere nuevamente corregir y solucionar puntos especificos por garantia y estabilidad de los trabajos ejecutados en la pista de patinaje, ya que se observa desprendimiento de la capa de pintura de la recibose.

GTR Ronald bruno Santana

Nota 121: se termina de instalar el piso coucho SBR en zona infantil y se prida la instalacion con se especifica imprimacion con resina en la pista

Scanned with CamScanner

de lote, se requiere remotar el compuesto de la cancha F8 y zona interior, ya que se observan puntos sin pintar, igualmente se requiere instalar bonet en modulos.

C+R Ronald Lorono Santana

18-10-25 Nota 122: Sabado 18 de octubre 2025
Clima: soleado.
Personal: 5 Piso nacho, 2 sindelico.

C+R Ronald Lorono Santana

Nota: 123: La interventora observando el avance de las obras, recomienda realizar mantenimiento de lote, entrenguma y pintura alrededor de la zona interior, antes de instalar el piso cancha EPDM, se requiere instalar los bonet en los modulos y remotar esquinero de la cancha.

C+R Ronald Lorono Santana

Nota 124: se continua instalando piso cancha SBR en pista de lote, se realiza correccion de algunos puntos en la pista de patinaje, donde se

Scanned with CamScanner

había levantado la capa de pintura, se requiere subsanar todos los gastos como el del cambio norte de la pista.

Ronald Lozano Santana

20-10-25 Nota 125: Jueves 20 de octubre 2025.
Clima: soleado
Personal: 5 piso caucho

Ronald Lozano Santana

Nota 126: El contratista realiza el suministro de piso caucho EPDM color terracota para iniciar con su instalación en la pista de baile, se recomienda por parte de la interventoría aplicar y disponer muy bien la retina y lograr una perfecta adherencia, se requiere remover el concreto de la cancha #8, y alrededor de la zona instalada, e instalar el caucho en modulos.

Ronald Lozano Santana

21-10-25 Nota 127: Martes 21 de octubre 2025
Clima: soleado

Scanned with CamScanner

Personal: 1 inspector, 5 piso cuocho

CR Ronald Irono J Santana

Nota 128: como actividad importante se inicia con la localizacion y replanteo de la propuesta de diseño del piso cuocho EDIT, Nº 2, aprobada por el IDRD, igualmente se inicia con su instalacion segun diseño y obras, la interventora recuerda subsanar el sintetico en punto de penalty, instalar bancas en modulos, remotar cerramiento de la cancha FB.

CR Ronald Irono. J Santana

22-10-25 Nota 129: Miercoles 22 de octubre 2025
Clima: soleado
Personal: 1 inspector, 2 ornamentacion, 2 demolicion piso cuocho, 6 piso cuocho

CR Ronald Irono J Santana

Nota 130: como actividad importante se ocupa en la instalación del piso cuocho EDIT en zona infantil segun diseño aprobado, se ocupa en el demolicion

Scanned with CamScanner

de piso caucho en pista de trote sector norte se ocupa con el fibob de lo borrado de la zona infantil se requiere colocar los pernos especificos en la pista de granulado en el cual se localizo la capa de pintura, se requiere instalar el caucho en los modelos y rematar la pintura en el cerramiento del fibob concha #8.

FR Parada bono Santana

23-10-25 Nota 131: Jueves 23 Octubre 2025

Clima: Mañana soleado y tarde lluviosa

Personal: Un(1) inspector obra y dos (2) instaladores. y dos (2) ayudantes. Santana

Nota 132: Se continuo instalación de piso caucho EPDM (1cm) en zona de juegos infantiles; Desmonte de piso caucho existente en tramo #2 de pista de trote; Limpieza (lijado) de baranda M-83 en zona de juegos.

Santana

24-10-25 Nota 132: Viernes 24 Octubre 2025

Clima: Soleado

Scanned with CamScanner

Personal : Un (1) inspector obra , tres (3) instaladores y dos (2) ayudantes.

Santana

Nota 133 : Se inicia instalación de piso caucho SBR (2 cm) en tramo # 2 de pista de trote ; Se continua limpieza (lijado) de baranda M-83 en zona de juegos infantiles.

Santana

25-10-25 Nota 134 : Sabado 25 Octubre 2025

Clima : soleado

Personal : Un (1) inspector obra, tres (3) instaladores y dos (2) ayudantes.

Santana

Nota 135 : Se realiza instalación de piso caucho EPDM (1 cm) color rojo en tramo # 2 de pista de trote ; Se continua limpieza (lijado) de baranda M-83 en zona de juegos infantiles.

Santana

Scanned with CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD I

ANEXO 20 BITÁCORA URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5 COD. 11-686

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Nota 009. Fecha: 13 al 30 de Septiembre de 2025
personal: No se cuenta con personal
Actividades: Durante el periodo no se realizaron actividades, se tiene pendiente la instalación de la lámina de señalétrica y la disposición de módulos retirados.
Supervisor.

Nota 010. Fecha 1 de octubre de 2025.
Se le recuerda al Contratista efectuar revisión a la templada de la malla eslabonada para los módulos contraimpacto que se instalaron frente a los arcos, en ambas costados Ver Notas 007 y Nota 008.
Supervisor:

Nota 011. Fecha: Del 02 al 08 de octubre de 2025.
Personal: No se cuenta con personal:
Actividades: Durante el periodo no se cuenta con personal ya que se concluyo la instalación de módulos y mantenimiento de la cancha, se encuentra pendiente la instalación de la señalética y disposición de los modulos

Powered by CamScanner

8

retirados y los cuales se encuentran.
almacenados en el cuarto eléctrico.
Cluprea.

Nota 012 Fecha: octubre 08 de 2025
En la cancha sintética se presenta. caída
de uno de los módulos instalados en el costado.
sur oriental y se encuentra otro con la soldadura.
despegada, por lo anterior se coordina para.
realizar el arreglo de estos el día de
mañana. Jueves 09 de octubre de 2025.
Cluprea.

Nota 013. Fecha: 09 de octubre de 2025.
Estado del clima: día nublado.
Personal: 2 ornamentadores
Equipo y herramienta menor.
Actividades: Se realiza el ajuste de soldadura.
de los módulos instalados en el costado.
sur oriental, se refuerza la soldadura y.
se instala el módulo caído. Queda pendiente
remate de pintura, instalación de láminas de

Powered by CamScanner

señaletica informativo de la cancha, mantenimiento de la estructura de la señaletica y disposición de los módulos retirados en la cancha.

Cluperca.

Nota.014 Fecha: Del 10 al 15 de octubre de 2025.
Personal: sin Personal.
Actividades: Durante el periodo no se realizaron actividades en la cancha sintética.

Cluperca.

Nota.015 Fecha: 16 de octubre de 2025
estado del clima: dia despejado.
Personal: 3 Ayudantes. (Recolectores de módulos)
Actividades: se realizan actividades de recolección, transporte y disposición de los módulos retirados en la cancha sintéticas y los cuales fueron reemplazados por los nuevos. los módulos son dispuestos con el gestor ambiental aprobado para esta labor.

Cluperca.

Powered by CamScanner

Nota 016 Fecha: del 17 al 31 de octubre de 2025.
Personal: No se cuenta con personal.
Actividades: No se realizan actividades durante el periodo; se encuentran pendientes los remates de pintura en los módulos reinstalados y con retrumo de soldadura, mantenimiento de estructura metálica de señaletica e instalación de laminas de señaletica informativa de la cancha.
Chupina.

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 21 BITÁCORA PARQUE URBANIZACIÓN VICTORIA NORTE COD. 11-162

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Nota 008 Fecha: 05 al 30 de septiembre de 2025
Personal: Sin personal.
Actividades: Durante el periodo no se presentaron actividades, esta pendiente la instalación de los modulos detenedores antimascotas. Se recomienda instalar de manera urgente
Cleyrna.

Nota 009. Fecha: Del 01 al 31 de Octubre de 2025
Personal: Sin Personal.
Actividades: No se realizaron actividades en el periodo. Aún se encuentra pendiente la instalación de los módulos antimascotas y repaso de pintura de la baranda de la pista de patinaje que se encuentra alrededor de la cancha sintética.
Cleyrna.

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 22 BITÁCORA PARQUE LOMBARDÍA

PARQUE LOMBARDIA

Nota 001 Fecha: 08 de octubre de 2025
Estado del clima: Dia nublado.
Personal: 1 ornamentador - pintor
Herramienta y equipo menor:
Actividades: se inician actividades de mantenimiento de cerramiento de la cancha sintética. Se inicia con limpieza y lijado de estructura de cerramiento.
Cluprisa.

Nota 002 Fecha: 09 de octubre al 10 de octubre de 2025
Estado del clima: Dia nublado.
Personal: 1 ayudante - pintor
Herramienta y equipo Menor
Actividades: Se continua con actividades de lijado y limpieza de estructura de cerramiento de cancha. (mantenimiento de cerramiento).

Nota 003 En el sector, se han tenido inconvenientes con personas que han realizado anexatas al personal, por lo anterior se está coordinando

Powered by CamScanner

reunión para el próximo lunes 14 de octubre de 2025, con los profesionales encargados del escenario, presidenta de junta de acción Comunal y contratista; con el fin de establecer acuerdos para poder realizar los trabajos en la concha.

Cluperco.

Nota 004 Fecha: 14 de octubre de 2025.

Se realita reunión entre encargados de la concha por parte del IDRD, presidenta de la junta de acción comunal, cuadrante del sector y contratista frente al tema de amenazas presentadas al personal de obra; frente a lo anterior se definió que el escenario se debe cerrar mientras los trabajadores esten realizando su labor. de 7:00 am a 4:00 pm, una vez finalizada la jornada se dejará abierto para su uso por parte de la comunidad. se tendrá constante comunicación con el cuadrante de policia y ellos realizaran rondas por la.

Powered by CamScanner

cancha. Se le informará a la comunidad.
Sobre los trabajos en la cancha para evitar
inconvenientes, esto se hará por medio de la.
presidenta de la junta de acción comunal.
Chupena.

Nota. 005. Fecha: 14 de octubre de 2025.
Personal: 2 ayudantes (pintura)
Estado del clima: Dia nublado.
Equipo y herramienta menor.
Actividades: Se retoman las actividades
de lijado y limpieza del cerramiento
(mantenmiento)
Chupena.

Nota 006. Fecha: Del 15 de octubre al 22 de octubre de 2025
Personal: 3 ayudantes+1 oficial (pintura).
Estado del clima: Dias despejados
Equipo y herramienta: Menor
Actividades: Se realizan actividades de
mantenimiento de cerramiento de la cancha.
como lijado, limpieza, gratado de zocos con óxido

Powered by CamScanner

4

con el fin de dejar adecuadas las zonas del cerramiento para instalación de anticorrosivo y posteriormente pintura.

Chupina.

Nota 001: Fecha: 23 de octubre al 31 de octubre de 2025
estado del clima: días nublados, algunos con lloviznas leves.
Personal: 3 ayudantes y 2 oficiales (pintura)
Actividades: El pasado 22 de octubre de 2025 en horas de la tarde se inició con la instalación de anticorrosivo, esta actividad continuó el día 23 y 24 de octubre de 2025, desde el día 25 de octubre de 2025 se inicia con la instalación de pintura del cerramiento de la cancha y hasta el día 31 de octubre se continua con la actividad de pintura.

Chupina

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 23 BITÁCORA PARQUE URBANIZACIÓN FLORENCIA I SECTOR COD. 10-249

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

PARQUE VECINAL FLORENCIA
I SECTOR.

Nota 001 Fecha: 11 de septiembre de 2015
Estado del clima: Dia despejado
Personal: 3 ayudantes (Pintura)
Equipo y herramienta menor.
Actividades: se inician actividades de mantenimiento del cerramiento perimetral de la cancha sintétrca.
Chupina.

Nota 002. Fecha: DEL 12 de septiembre al 17 de septiembre de 2015.
Estado del tiempo: Dias nublados.
Personal: 3 ayudantes (pintura).
Equipo y herramienta menor.
Nota 003 Actividades: se realitan actividades de lijado, limpieta, retiro de material vegetal. alrededor de la cancha; lo anterior para. realizar adecuadamente el mantenimiento del cerramiento perimetral.
Chupina

Powered by CamScanner

2

Nota 004. Fecha: 19 de septiembre al 19 de septiembre de 2025
Estado del Clima: Dio nublados
Personal: 3 ayudantes. (pintura)
Equipo y herramienta menor.
Actividades: Se continua con el mantenimiento del cerramiento Pometal de la cancha (lijada limpieza, instalación de anticorrosivo).
Chupinga.

Nota 005. Fecha: 20 de septiembre al 22 de septiembre de 2025
Personal: sin Personal.
Actividades: No se realizan actividades, estan Pendientes concluir las actividades de mantenimiento del Cerramiento pometal de la cancha.
Chupinga.

Nota 006. Fecha: Del 23 de septiembre al 27 de septiembre de 2025.
Personal: 2 ayudantes (Pintura)
Estado del Clima: Dia nublados
Equipo y herramienta menor.
Actividades: Se continuan con el mantenimento

Powered by CamScanner

de cerramiento perimetral de la cancha.
Sintetica.
Chupaca.

Nota 007 Fecha: 28 de septiembre al 30 de septiembre de 2025.
Personal: sin personal.
Actividades: No se realizan actividades de obra.
Chupaca.

Nota 008 Fecha: Del 01 al 15 de octubre de 2025
estado del Clima: Dias nublados
Personal: 3 ayudantes (pintura)
Equipo y herramienta menor.
Actividades: Se continua con el mantenimiento de cerramiento (pintura) y se realiza cambio de módulos, queda pendiente la pintura de estos, encamisado de parales y pintura de la parte superior de parales de 4".
Chupaca.

Powered by CamScanner

4

Nota 009. Fecha: 17 de octubre de 2025
Personal: Sin personal.
Actividades: No se realizan actividades de obra
Chupinca.

Nota 010 Fecha: Del 18 al 21 de octubre de 2025
Personal: Sin personal.
Actividades: No se realizan actividades de obra, esta pendiente el encamisado de parales, Pintura de módulos instalados y Pintura de parales en la parte superior.
Chupinca.

Nota 011 Fecha: 21 de octubre de 2025. al 23 de octubre de 2025
Estado del clima: Día nublado
Personal: 3 ayudantes
Equipo y herramienta menor.
Actividades: Se realiza Pintura de módulos instalados, encamisado de parales en la parte inferior. Queda pendiente Pintura de parales de 4" en la parte superior.
Chupinca.

Powered by CamScanner

5

Nota 012 Fecha: Del 24 de octubre al 31 de octubre de 2025
Personal: Sin Personal.
Actividades: No se realizan actividades de obra. Está pendiente la pintura de la parte superior de los paneles de 4".
Clausura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD I

ANEXO 24 BITÁCORA EMERGENCIAS

Nota 615: 7 de octubre 2025 martes.
Porque sonrolito: se procura en todos
de la emergencia, reportado por la supervisión,
se realiza mantenimiento de la fabrica de
suministro que se dirige a los bomberos ubicados
del 2 piso, sector sobre de bomberos.
CTR Ronald Irono

Nota 616: Porque Nacional
se acerca y continua con la demolición
de los placas de concreto sector poderia
de la origen, debiendo acopiado en
sitio los RCD para su retiro a sitio
autorizado.
CTR Ronald Irono

Nota 617: viernes 3 de octubre 2025
CETE tonal: la supervisora reporta
la falla de un asensor, de tipo cultural
presentado ruidos y quedandose trabado
al subir, se requiere su revision e intervencion.
CTR Ronald Irono

Nota 618: Porque Nacional:
la interventoria requiere al contratista retirar

los escombros y programar la nivelacion y suministro de concreto para fundir la placa de concreto en sector de lavanderia.

CTR Ronald Herrera

Nota 614: sabado 4 de octubre 2025
Porque Personal: se inicia con la fundida de los losas en concreto sector de la cisterna con concreto premezclado, se realizan los respectivos muestreos del concreto por temas de calidad,

CTR Ronald Herrera

Nota 615: UOS:
el contratista realizo revision de tuberia de iluminacion e informa que se encontró cable soldado y en corto de la torre de iluminacion 3, se realizo aviso y se deja en funcionamiento, la unica torre que se encuentra deshabilitada es la torre 2, el resto de torres estan en funcionamiento al 100%, queda pendiente la instalacion de los faroles y la proteccion de la tuberia de la torre.

CTR Ronald Herrera

LUNES 6- OCT. 2025

- PARQUE NACIONAL NOTA 61:
SE ATIENDE CON LOS DEBERES DE
PLACAS DE CONTRAPISO SECTOR LA VIRGEN
PERSONAL: OFICIAL + 1 AYUDA + 1 INSPECTOR
NOTA 62: 6 OCT. 2025
- PARQUE CAMINATA ATENCIONES OCURRENTES
SE ATIENDE CON LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CERRAMIENTO
PERIMETRAL DE LA CANCHA: ATENDIDO
ESTADO DE ELEMENTOS
PERSONAL: 3 AYUDANTES

R. Ronald Lema

- NOTA 63:
PARQUE TIWIZA:
PERSONAL: 2 TRABAJADORES
SE TERMINA DEMOLICION DE MURO DE
CERRAMIENTO LATERAL EN PIEDRA Y LADRILLO
ENTRADA PUERTA # 2.

R. Ronald Lema

NOTA: 64 Lunes 6 OCT. 25
PARQUE PRADO PINZON
INICIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Y PINTURA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
DE LA CANCHA SINTETICA
PERSONAL: 2 TRABAJADORES
Ronald Lopez

NOTA 65
MARTES 7 OCTUBRE 2025
PARQUE NACIONAL
SE AVANZA CON LA DEMOLICION DE
PISCAS DE CONTRAPISO EN EL SECTOR
DE PISTOLETA DE LA VIVIENDA
PERSONAL: 2 OPERARIO + 1 AYUDANTE + 1 RESIDENTE
Ronald Lopez

NOTA 66. MARTES 7 OCT. 25
PARQUE MIRAVALLE TERCERA
SE AVANZA CON LOS TRABAJOS DE SEPARACION
Y ZARANDEADO DEL MATERIAL: PIEDRA/ARENA

50

ENCONTRADO EN LA ZONA INFANTIL
PIEZA SU RECIBIDO Y PUESTO NUEVAMENTE EN SITIO.
PERSONAL: 2 TRABAJADORES.
FR Ronald Lozano

NOTA 67: MARTES 7. OCT. 25
PARQUE LA PEPITA
SE INICIAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PUESTA DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL
ACTIVIDAD: LIJADO Y LIMPIEZA
PERSONAL: 3 TRABAJADORES
FR Ronald Lozano

Nota 66: Miércoles 8 de octubre 2025
Parque Pinares: la interventoría le recuerda y requiere nuevamente al contratista iniciar los daños en el parque pinares, recordando que esta emergencia fue requerida desde hace varios semanas y recordando al contratista que es obligación mantener parque

de obra en todas las bases

CFR Ronald bravo

Nota 69: Bayer Nacional

se aprecia en la demolición manual de la placa de contrapiso de la planta sector de la viga, se requiere y recargada nivelar y compactar muy bien la base, y retirar los escombros a sitios autorizados

CFR Ronald bravo.

Nota 70: Fuegos 9 de octubre 2015

Porque Rotura Teja.

como Actividad, importante el contenido realiza el suministro de 1 m3 de arena polvo para una del aparato, se aprecia en la excavación manual, y en la zapata de la arena excavada para posteriormente ser retirada.

CFR Ronald bravo

Nota 71 Sabanilla 11 de octubre 2015

Porque Marginal,

como Actividad importante se realiza

52

demolicion y retiro de escombros del parque nacional, pradito lo hubieron de placa de cortesia

Parada bosque

Nota 72: Martes 14 de octubre 2025
Miercoles Tejer:
se procura en la prioridad de la cama pelos y posteriormente se colocan nuevamente sobre geotextil.

Parada florero

Nota 73: Miercoles 15 de octubre 2025
Parque Pinos: la intervencion requiere necesariamente el retiro de los arbs conflictivos de la construccion de la virgen de dimensiones del cerramiento corto amplio, recordando que es obligacion del contratista garantia la conservacion y ejecucion de los obras.

Parada bosque

Nota 74: Jueves 16 de octubre 2025
Parque Miguel Tejer
El contratista realiza el suministro de tierra de cierre pelos para instalar

a lo sobre del arenero Interior, se requiere suministro e instalación de barandal en la rampa que se construyó y poder realizar dicha obra puesta en servicio.

CFE Parcial Único

Obra 75 Viernes 17 de octubre 2025

Porque Hubiera Retraso.

se observa en la zoroncada y suministro e instalación de la arena pelada en zona interior, la supervisora requiere suministrar e instalar la baranda 183 en rampa. construido.

CFE Parcial Único

Nota 76: Porque Pinares.

La supervisoria requiere nuevamente el contratista el inicio de los obras faltantes de construcción de la virgen y estación de la media contemplado, recordando que es obligación del contratista garantizar la continuidad de las obras, y recordando que el contrato finaliza el próximo 14 de Noviembre CFE Parcial Único

54

Nota 77: Sabado 18 de octubre 2025
Parque Regional, como actividad importante se realiza
condiciones de un sector del sendero de
los cirgos con concreto premezclado de
la empresa congemovil, se realiza la
respectiva prueba de slump, y se toman
los muestras del concreto, se requiere
y reconviene por parte de la interventoria
citar y darle un adecuado acabado
a la placa y los demas construcciones.
se recibe el concreto con la remision
26862. para trazabilidad del concreto.
CFZ Pardo Lopez

Nota 78: Lunes 20 de octubre 2025
Parque Primero. la moderatoria requieren
nuevamente al contratista el inicio de
las obras con arreglos al cerramiento
contaminado de la cancha, recordando
que esta solicitud ha realizado hace
varios semanas por la supervisora,
y recordando que el contrato

finaliza el proximo 19 de Noviembre del 2025.

CFR, Ronald Lozano

Nota 79: Martes 21 de octubre 2025
Porque Nocturno.
Como Actividad Importante el contratista realiza la Instalacion de placa de Contrapiso en todo sector del sendero de la virgen con concreto premezclado de la empresa Concrempoi con remision 40786 y concreto de 210 kg/cm².

CFR Ronald Lozano

Nota 80: Porque Viernes
La Interventoria requiere nuevamente al contratista iniciar las obras correspondientes a la virgen para el cerramiento contraimpacto de la cancha, la cual se desmantó hace varios dias.

CFR Ronald Lozano

Nota 81: Miercoles 22 de octubre 2025
Porque Visita Tecnica:
La Interventoria requiere al contratista

inicio en la construccion e instalacion de la baranda en la rampa construida, con el fin de realizar puesta en servicio.

CFR Randol Lopez

Nota 82: Jueves 23 de octubre 2025
Porque Pinares: se requiere nuevamente el contratista inicio en la construccion del ceramiento Contraimpacto de la rampa.

CFR Randol Lopez

Nota 83: Martes 28 de octubre 2025
Porque Pedroza: como Actividad importante se realiza fundicion de la losa
de la placa de contrapiso en el sector de la virgen.

CFR Randol Lopez

Nota 84: Porque Molinas
la supervision requiere y requiere atender una emergencia con la puerta del ceramiento de la concha sintetica, la cual se desprendio del ceramiento.

Nota 85: Parque Milenio Tesoro:
como actividad importante se ocurren en
la construccion de la baranda perimetral
de la rampa construido en días anteriores.
CFR Ronald Lozano.

Nota: 86: Jueves 30 de octubre 2025
Parque Nacional
como actividad importante se realiza
la fundicion de la placa de contrapiso
en el sector de la virgen, donde por
favor pedimos dicha actividad, se realiza
la instalacion de bordillo A80 como
enderezamiento de la placa con el asfalto
de la via o calle 39.
CFR Ronald Lozano

Nota 87: Parque Milenio Tesoro.
se ocurre en la construccion e instalacion
de la baranda en la rampa como seguridad
del personal.
CFR Ronald Lozano.

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 27 BITÁCORA PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS) COD. 12-092

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

1

PARQUE DE LOS NOVIOS

OBJETO DEL CONTRATO. "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
GRUPO 2 - "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Contrato C.O.P. 4060 DE 2024
Contrato Interventoría 4080 de 2024

Fecha de inicio: 20 de noviembre de 2024
Fecha de terminación: 19 de julio de 2025
Fecha final terminación: 19 de noviembre de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Director de Obra:

Ing. Enrique Guzmán

Residente de Obra:

Ing. Claudia Pedraza

INTERVENTORÍA: CONSORCIO SANTA TERESA 028
Director de Interventoría:

Ing. Raúl Delgado C.

Residente Interventoría:

Ing. Luis A. Medrano B

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Supervisor:

Ing. Rodrigo Manrique

Apoyo Supervisión

Arq. Iván Velásquez

NOTA 1

Fecha: 20 de octubre de 2025

Estado del tiempo: Día soleado

Actividades de obra:

En este día, los vendedores de los módulos del trencito, desocupan los vagones.

NOTA 2

Fecha: 21 de octubre de 2025 y 22 de octubre 2023

Estado del tiempo: Día soleado

Estado del tiempo: Seco

Personal: 1 residente de obra, 1 oficial + 1 ayudante

Actividades de obra:

Se inicia el cerramiento provisional con cercos de madera rolliza y lona verde

NOTA 3

Fecha: 23 de octubre de 2025 al 25 de octubre 2023

Estado del tiempo: Día soleado

Estado del tiempo: Seco

Personal: 1 residente de obra, 1 oficial + 1 ayudante

Actividades de obra:

Continúa la ejecución del cerramiento provisional de la obra.

Se inicia el desmonte de láminas de cubierta del vagón #4

Desmonte y retiro de lámina alfajor de piso.

Se observa el mal estado de la estructura, así como la perfilería oxidada y podrida.



Se realiza revisión de las instalaciones eléctricas existentes.

NOTA 4

Se inicia el desmonte de láminas de cubierta del vagón #2

Desmonte y retiro de lámina alfajor de piso.





NOTA 5

Fecha: 28 de octubre de 2025 al 31 de octubre 2025

Estado del tiempo: Día soleado

Estado del tiempo: El 28 de octubre día lluvioso en horas de la tarde; los demás son soleados.

Personal: 2 ornamentadores



Desmonte de láminas podridas en vagones del trencito. Se le ha solicitado al Contratista presentar los esquemas de ubicación de redes, cajas (eléctricas y sanitarias)

NOTA 6

Se le reitera al contratista presentar esquema de ubicación de redes hidráulicas , sanitarias, cajas de inspección para establecer localización en el terreno, antes de iniciar intervención.



NOTA 7

Continúan los desmontes de láminas de cubierta de vagones #3 y 4
Desmonte y retiro de lámina alfajor de piso.
Pelada y retiro de pintura de las estructuras metálicas (perfiles y ángulos).

NOTA 8

Fecha: noviembre 4 de 2025
Estado del tiempo: Día soleado
Personal : 2 oficiales de carpintería metálica.
Actividades de obra:
Se avanza con el retiro de la pintura existente en los vagones 1 y 2.,



NOTA 9

La interventoría realiza inspección visual en el vagón #1 y le hace al Contratista las siguientes observaciones:
Los elementos metálicos (perfiles o ángulos) de la estructura que se han encontrado con herrumbe o que están totalmente podridos, se deben retirar y reemplazar por nuevos elementos, que conserven las las mismas características y dimensiones.




NOTA 10

Se evidencia que una vez aplicada la soldadura, en algunos sectores, no se ha limado o pulido adecuadamente; ya que aún se observan bastantes limaduras y porosidades.

NOTA 11

Por facilidad de revisión y avance de obra, se le recomienda entregar la totalidad de la estructura de cada vagón, una vez esté lijada la superficie de elementos que se intervienen.

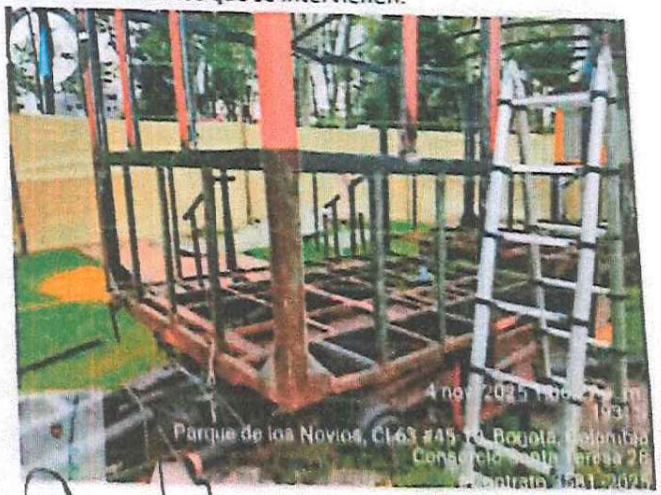

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 28 BITÁCORA PARQUE GUSTAVO URIBE BOTERO COD. 02-004

PARQUE LINEAL CUENCA CRIMEA PERDIDO
COD 02-004

Nota 001 Fecha: 27 de octubre de 2025.
Estado del Clima: Dia nublado.
Personal: 1 oficial + 1 ayudante.
Equipo y herramienta menor
Actividades: Se inicia actividad de limpieza de cañuela - cuneta alrededor de la zona de juegos infantiles.
Cluprisa.

Nota 002 Fecha: Del 28 al 31 de octubre de 2025.
Estado del clima: Dia nublado.
Personal: 1 oficial + 1 ayudante.
Equipo y herramienta menor
Actividades: Se continúa con la actividad de limpieza de cañuela, es importante tener en cuenta que en la mayoría de los tramos de limpieza hasta el momento se han encontrado colmatados hasta 40 cm de altura.
Cluprisa.

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 29 BITÁCORA PARQUE FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR COD. 10-028

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

FLORENCIA LOS TRONQUITOS

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR.

COD: AO-02E.

Nota 001 Fecha: 22 de septiembre de 2025.

Estado del Clima: Día nublado

Personal: 3 ayudantes (pintura).

Equipo y herramienta menor.

Actividades: Se inicia con las actividades de mantenimiento del cerramiento de la cancha sintetica, (lijado y limpieza).

Cherpa.

Nota 002 Fecha: Del 23 al 27 de septiembre de 2025.

Estado del tiempo: Días despejados y nublados.

Personal: 1 oficial + 2 ayudantes (pintura).

Equipo y herramienta menor.

Actividades: se realiza lijado, limpieza, instalación de antiabrasivo y pintura en cerramiento perimetral de la cancha sintética.

Cherpa.

Powered by CamScanner

2

Nota 003 Fecha: DEL 29 al 30 de septiembre de 2025
Estado del tiempo: Días nublados.
Personal: 1 oficial + 2 ayudantes
Equipo y herramienta menor.

Nota 004. Actividades: Se concluyen actividades de mantenimiento de cerramiento de la cancha. Sintética (lijado, limpieza, aplicación de antricorrosivo y pintura).
Está pendiente la instalación de módulos, es decir retiro de módulos dañados e instalación de los nuevos, adicionalmente pintura de tubería adicional de 4" ya que solo se pinto hasta la mitad.
Cluprosa.

Nota 005 Fecha: DEL 01 al 04 de octubre de 2025.
Estado del tiempo: Días nublados
Personal: Sin personal.
Actividades: No se realizan actividades en la cancha, está pendiente el cambio de módulos y concluir pintura de tubería de 4"
Cluprosa

Powered by CamScanner

Nota 006 Fecha: del 6 al 15 de octubre de 2025
Estado del tiempo: Dias nublados y lluviosos
personal: Sin personal.
Actividades: No se realizan actividades en la cancha, están pendientes las siguientes actividades: Cambio de módulos y pintura de tubería de 4" faltante, encamisado de tubería.
Chupresa.

Nota 007 Fecha: 16 de octubre de 2025
Estado del clima: Dia nublado
Personal: 1 oficial + 2 ayudantes
Equipo y herramienta menor
Actividades: se realiza cambio de módulos, se retiran los módulos deteriorados y se instalón los nuevos.
Chupresa

Nota 008 Fecha: del 17 al 21 de octubre de 2025.
Personal: Sin personal
Actividades: No se realizan actividades en la Cancha; están pendientes actividades de

Powered by CamScanner

encamisado de tubería de las esquinas, falta pintura de los módulos nuevos instalados, se realiza la observación por parte de interventoría de que en algunas zonas la pintura se está levantando evidenciando óxido en la estructura y pintura de tubería de 4" de la mitad hacia arriba.

Cuerpo.

Nota 009. Fecha: 22 de octubre de 2025.
Estado del Clima: Día nublado
Personal: 1 oficial + 2 ayudantes
Equipo y herramienta menor

Nota 010 Actividades: se realiza encamisado de la tubería de las esquinas de la cancha, se realiza pintura de módulos nuevos instalados en días anteriores. Queda pendiente la pintura de tubería de 4" y el repaso de pintura en las zonas observadas por interventoría.

Cuerpo.

Powered by CamScanner

Obs.01. Fecha: Del 23 al 31 de octubre de 2025
personal: sin personal.
Actividades: No se realitan actividades en la cancha: se encuentan pendientes las actividades mencionadas en. la nota. 0.10.
Chupina.

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 30
BITÁCORA PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA
COD: 18-207

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Nota 607: viernes 10 de octubre 2025
clima: soleado.
Personal: 1 Residente, 1 oficial, 2 ayudante.
↩R Ronald Lozano

Nota 608: Por motivos de partidos de futbol categoria sub 20, programados por la administracion, el dia de hoy se ve afectado, los obras de construccion del PUTU debido a tu presencia de civiles, se acuerda en la construcción de, viga de confinamiento y muros en ladrillo limpio en espacio publico de los modulos.
↩R Ronald Lozano

Nota 609: la interventoria requiere nuevamente al contratista implementar de manera inmediata un plan de contingencia con el fin de iniciar los obras de los modulos y puntos solidos de emergencia en cancha del estadio, recordando que el contrato finaliza el proximo 14 de noviembre. ↩R Ronald Lozano

Norma

Nota 610: Sabado 11 de octubre 2025
clima: llovisno aislados.
Personal: 2 obra civil, 2 modulo PTU.
CTR Ronald Lorno

Nota 611: como Actividad importante se avanza en la instalacion de los laminas de superboard en el piso y en muros del PTU, se requiere al contratista reiniciar las obras en los modulos sanitarios y de comedores asi como la instalacion de los puertos de la concha.
CTR Ronald Lorno

Nota 612: Martes 14 de octubre 2025
clima: soleado
Personal: 2 obra civil, 2 PTU.
CTR Ronald Lorno

Nota 613: se avanza en la instalacion de los laminas en superboard del modulo PTU, se requiere coordinar la compra del vidrio y programar la instalacion de los rieles electricos del PTU, y poder avanzar y no se vea afectado el

ooonce por falla de material se
sequiere nuevamente al contratista ingresar
cuadrilla y material para la instalacion
de los puertos salida de emergencia en
la concha del estadio, se requiere
nuevamente iniciar en la construccion de
los modulos sanitarios y de comercios,
recordando que el contrato finaliza el
proximo 19 de Noviembre del 2025.

CFR Ronald Lozano

Nota GRF: Ilperades 15 de octubre 2025
elimo. solicado
Personal: 2 obra civil, 1 modulo PTO.

CFR Ronald Lozano

Nota GRF: se ooorna en la construccion
del PTO, instalando mura en sanitarios,
se ooorna en la conformacion del espacio
publico en los modulos sanitarios y
comercios, la interventoria requiere
nuevamente al contratista suministrar
e instalar los puertos de salida de emergen-
cia asi como la construccion de los

Norma

modelos de comedinos y sanitarios, recordando que el contrato finalizara el próximo 14 de noviembre 2025, se requiere se implemente un plan de contingencia y mitigar este riesgo.

Donald Bravo

Notario: Jueves 16 de octubre 2025
Clima: soleado
Personal: 1 residente, 2 modelo Piso, 2 obra civil. Donald Bravo

Nota 617: como actividad importante el contratista realiza pruebas de tubos de la red hidráulica del piso, se coloca en la instalación de lavamanos en sujeción de baño como y cerca la muros divisorios y de fachada, se coloca con la mezcladora y de los lavamanos, en los modelos sanitarios y de comedinos se coloca en la instalación de desagüe y cinta de acero, la intervención requiere necesario el Contratista

reinicio las obras de construccion de los modulos sanitarios y de comedor asi como la instalacion de las puertas de salida de emergencia en el exterior, recordando que el contrato finaliza el proximo 19 de Noviembre del 2015.

Ronald Lopez

Nota 618. viernes 17 de octubre 2015
clima: Nublado
Personal: 1 residente, 2 obrero, 2 modulo PTV

Ronald Lopez

Nota 619: Para llevar una adecuada trabajabilidad y tomando como sugerencia la prueba de tintas, se plantea la estructura mecanica del PTV.

Ronald Lopez

Nota 620: se observa en la instalacion y nivelado de muros en seguridad en el PTV, se observa en la compactacion de la capa de base granular en los modulos sanitarios y de

Norma

comerinos, se requiere nuevamente al contratista iniciar en la construcción de los modulos sanitarios y de comerinos, igualmente en la instalación de los puertas solido de emergencia, recordando que el contrato finaliza el proximo 19 de Noviembre del 2025.

Ronald Lozano

Nota 621. Sabado 18 de octubre 2025 dima: soleado.

Personal: 1 residente, 1 oficial BTV, 2 otro civil modulos.

Ronald Lozano

Nota 622: Se asume y continua con la mampostería de los muros en superboard del modulo BTV, se continua con la instalación de adoquin en senderos, urbanismo de los modulos, la interventoria requiere nuevamente iniciar la construcción de los modulos sanitarios y de comerinos, asi como la instalación de los puertas solidos de emergencia

de la concha de baño, recordando que el contrato finaliza el proximo 14 de Noviembre del 2025.

C+R Ronald Leon

Nota 623: Lunes 20 de octubre 2025
Turno: Sabado
Personal: 2 otro civil.

C+R Ronald Leon

Nota 624: Por programacion de pintado organizados y programados por la administracion del parque, no se logra contar en las actividades que se vienen desarrollando en el PTV, debido a la ausencia de agua en el sitio,

C+R Ronald Leon.

Nota 625: Se continua con la instalacion de adoquin en espacio publico de los modulos, la interventoria requiere al contratista suministrar recebo y poder compactar hasta la rasante y finalizar la instalacion del adoquin, se requiere suministrar e instalar los puentes de

salida de emergencia en la cancha del estadio, así como el inicio en la construcción de los modulos sanitarios y de comerinos.

FR Ronald Lobo

Nota 626: Martes 21 de octubre 2025
Clima: soleado.
Personal: 1 Ing, 2 obreros civil, 1 residente.

FR Ronald Lobo

Nota 627: Se observa en la maqueta de los muros en superboard del modulo del Ing, se observa en la instalación de drywall y recubrimiento en modulos de sanitarios y de comerinos, la fiscalizadora requiere nuevamente al contratista iniciar la construcción de los modulos sanitarios y de comerinos así como la instalación de los puntos de salida de emergencia de la cancha, recordando que el contrato finaliza el proximo 14 de diciembre y recordando el compromiso de cumplir de obra.

FR Ronald Lobo

Nota 628: Miercoles 22 de octubre 2025
Clima: lluvioso en la tarde
Personal: 1 drywall, 2 obra civil.
FR Ronald Bravo

Nota 629: se continua y acaba con resane de los muros en superboard en el modulo del piso, se recomienda cambiar en la tapa del muro cortado ya que el modulo PTAR. teniendo todas las precauciones de seguridad, se requiere suministrar material para limpiar el espacio publico en los modulos, se requiere suministrar e instalar los pasos de salida de emergencia de la concha, se requiere iniciar en la construccion de los modulos sanitarios y de camaras.
FR Ronald Bravo

Nota 630: Jueves 23 de octubre 2025
Clima: soleado
Personal: 1 obra civil, 2 drywall. PTAR.
FR Ronald Bravo

Nota 631: la interventora observando el avance de las obras, requiere nuevamente al contratista implementar un plan de contingencia en el reinicio de las obras en el modulo sanitario y comercio, así como en la instalación de los puntos salida de emergencia y demarcar el espacio público en las modulos, recordando que es obligación del contratista garantizar la continuidad de las obras, y recordando que el contrato finaliza el proximo 19 de Noviembre del 2015.

CTR Parcial Mayo

Nota 632: Viernes 24 de octubre 2015 Dimit. Soldado.
Personal: 2 Residencial, 2 PTO, 1 residente.

CTR Parcial Mayo

Nota 633: El Contratista realiza el suministro de base granular y adquirir para terminar el espacio público de

Norma

los modulos, se ocupa en la compactación de la capa de base granular y se nivela y se instalan la cama de arena y se ocupa en la instalación del adoquín, la interventoría observando el avance de las obras, requiere y recomienda al contratista reiniciar las obras en la construcción de los modulos y suministrar e instalar los puentes en la rampa del sótano, se ocupa en la instalación de laminas de separador como también de los muros del PTO.

CTR Parcial 1 mano

Nota 634: Sabado, 25 de octubre 2025 Jornada: 2 Ocupación, 1 residente, 2 PTO. Obra: Lluvias en la tarde.

CTR Parcial 1 mano

Nota 635: se ocupa en la construcción del PTO, instalando muros en superboard y se ocupa en la pavimentación del adoquín en espacio publico de los

Norma

Nota 644: Viernes 31 de octubre 2015
Dmo: Nombre + Nombres apellidos
Personal: 1 inspector, 2 ATTO.
Ronald Bravo
Nota 645: La interventora realiza visita y observa con preocupación la ausencia de personal en los modulos sanitarios y de comerinas, asi como en los puertos salida de emergencia, se requiere nuevamente al contratista implementar un plan de contingencia de manera inmediata para realizar estos adicionales que se encuentran ahogados, recordando que el contrato finaliza el proximo 19 de noviembre y dichos obras deben estar culminadas.
Ronald Bravo.

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 31
BITÁCORA PARQUE ZONA FRANCA
(PM-16)
COD. 09-125

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site:
www.belzcon.com.co

Nota 38 Miercoles 01 de octubre 2025.
clima: soleado
Personal de obra: sin personal.

Interventoria

Nota 39 - se refiera al inicio de actividades segun lo solicitado en Nota 37 ya que en recorrido por esta interventoria no se evidencia inicio de Actividades y rebmo re las que estan en ejecucion.

Interventoria

Nota 40 viernes 03 de octubre 2025.
clima: soleado
Personal de obra: sin personal

Interventoria

Nota 41 - se realiza recorrido por parte de interventoria y a la fecha no se evidencia el reinicio de actividades en este frente, se solicita al contratista el reinicio de actividades.

Interventoria

Nota 42. Martes 07 de octubre 2025

Clima: Soleado

Personal: Sin personal.

Interventoria

Nota 43- Se realiza visita y recorrido por esta interventoria y no se evidencia personal retomando las actividades, se reitera al contratista retomar las actividades para que este no afecte el buen manejo de los tiempos y las entregas en los tiempos contractuales de este contrato.

Interventoria.

Nota 45- Jueves 23 de octubre 2025

Clima: Soleado

Personal: Sin personal.

Interventor.

Nota 46- Se continuan los recorridos por parte de esta interventoria y se solicita al contratista retomar actividades,

en este frente, ya que a la fecha no se adelanta ninguna actividad y ya se ha reiterado en varias oportunidades para que las actividades se culminen al 100% dentro de los tiempos contractuales de este contrato

Interventoría

CONSORCIO Belzco
IDRD I

ANEXO 32 BITÁCORA CERRAMIENTOS

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Nota 47 Parque villa rica
(02) trabajadores , (01) Inspector
· Se inician actividades de limpieza y lijado en el cerramiento de la subestación de la cancha sintetica

Inalcubores

Nota 48 - Parque : Villa de los saures.
(02) trabajadores
· Se inician actividades de limpieza y lijado en el cerramiento de la cancha de futbol sintetica.

Inalcubores

Nota 49 - Jueves 02 de octubre 2025
clima : Soleado

Inalcubores

Nota 50 - Parque villa rica.
(02) trabajadores.
· Se continua con mantenimiento de lijado y

aplicación de anticorrosivo en malla eslabonada del costado occidental del cerramiento de futbol 7.

Interventoría

Obs 51: Se recomienda al contratista realizar la aplicación de pintura y anticorrosivo segun especificaciones tecnicas y de diseño

Interventoría

Obs 52: Se retira al contratista la aplicación de pintura ral 6028 segun especificación tecnica y que esto no afecte el momento de la entrega

Interventoría

Obs 53: Villa de los Sauces:

(02) Trabajadores:

- Se continua con lijado de todos los elementos del cerramiento de la cancha sintetica.

Interventoría

Nota 54 - Martes 07 de octubre 2025
Clima: Nublado.

Inteventora

Nota 55 - Parque villa rica:
se continuo con limpieza lijado y
aplicacion de anticorrosivo y pintura
esmalte en cerramiento de cancha de
futbol.

Nota 56 - En los porques. america occidental y
la pepita se avanzo con limpieza
y lijado de estructura metalica en
cerramientos de cancha de futbol

Inteventora

Nota 57 - Jueves 09 de octubre 2025
clima: Soleado.

Inteventora

Nota 58 - Parque America Occidental:
se encuentran 03 trabajadores en actividad de lijado y aplicacion de anticorrosivo.

Inventario

Nota 59 - Parque la pepita: se encuentran 04 trabajadores en actividades de lijado y aplicacion de anticorrosivo

Inventario

Nota 60 - Parque villa rica: se continua con lijado, aplicacion de anticorrosivo y pintura esmalte en cerramiento de cancha futbol.

Inventario

Nota 61 - Parque villa de los Sauces se avanza en lijado de cerramiento

Inventario

Nota 62 - Jueves 16 de octubre 2025
clima: soleado

Inventario

Nota 63- Parque Gorgonzola: el dia de ayer se realizo limpieza y lijado de estructura al dia de hoy se inicia con aplicacion de anticorrosivo y pintura.

Interventoria

Nota 64 Parque villa rica: se terminan actividades y se liberan estas por parte de esta interventoria, se requiere realizar acta de puesta en servicio.

Interventoria

Nota 65 Parque la Pepita: se termino actividad de pintura en cerramiento, se solicita al contratista realizar el cambio de modulos que se evaluaron para cambio y dar por terminadas las actividades de este frente.

Interventoria

Nota 66 Parque villa de los sauces se continua con actividad de lijado y aplicacion

de anticorrosiva en el cerramiento de cancha

Inspectora

Nota 67 Cancha Amerrisque occidental se continua con aplicacion de anticorrosiva y pintura esmalte en cerramientos.

Inspectora

Nota 68- Lunes 20 de octubre 2025
clima : soleado.

Inspectora

Pradera Sur se da inicio a actividad de cerramiento con limpieza y lijado del parque.

Inspectora

Nota 69- Martes 21 de octubre 2025
clima: soleado.

Inspectora

Nota 70- Parque Gorgonzola se continua con limpieza, lijado, aplicacion de anticor

sua y pintura esmalte del cerramento de cancha.

Nota 71. America occidental y villa de los sauces se realiza limpieza, lijado, se aplica anticorrosivo y pintura sintetica en los cerramientos de las canchas.

Nota 72- En la cancha de america occidental se termino, y quedo pendiente el cambio de 03 modulos los cuales estan rotos y se tienen que cambiar segun lo solicitado y presupuesto.

Nota 73 Miercoles 22 de octubre 2025
clima: Soleado.

Nota 74- Se solicita al contratista instalar los modulos a cambiar en los canchas ya intervenidas, para dar por finalizad

Norma

dos las actividades en los cerramientos ya intervenidos

Nota 75 - Jueves 23 de octubre 2025
clima: Soleada
Interventor

Nota 76 - Parque gorgonzala se continua con limpieza, lijado y aplicación de anti corrosivo en cerramiento
Interventor

Nota 77 Parque pradera sur desde el dia de ayer no se evidencia personal adelantando las actividades pertinentes de este contrato se solicita retomar actividades lo mas pronto posible
Interventor

Nota 78 - En el parque mariscos se cuanto con lijado, anticorrosivo y pintura de

modulos de igual forma se realiza cambio de modulos rotos en el cerramiento.

Interventor

Nota 79. Martes 28 de octubre 2025
clima soleado

Interventor

Nota 80- Parque Gorgonzola se continua con lijado, anticorrosivo y pintura de modulos de cerramiento.

Nota 81 En el parque pradera sur se reitera el contratista ingresar personal para retomar actividades de mantenimiento de cerramiento.

Interventor

Nota 82 En la cancha de marruecos en cancha de futbol 8 se continua con lijado,

aplicación de anticorrosivo y pintura de todo el cerramiento.

Interventoría

Nota 83- Se solicita al contratista dar inicio a las actividades del cerramiento de la cancha de molinos.

Interventoría

Nota 84- Miercoles 05 de Noviembre 2025
clima: Soleado

Interventoría

Nota 85 En las canchas de pradera y villa de los sauces se continua con lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte en cerramientos de canchas.

Interventoría

Nota 86- Se refiera al contratista realizar en los cerramientos desmonte e instalación de los modulos afectados en las canchas actividad que se ha venido solici-

CONSORCIO Belzcon
IDRD I

ANEXO
REGISTRO FOTOGRAFIA EMERGENCIA

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".


CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

PARQUE SAUZALITO CÓD. 09-111





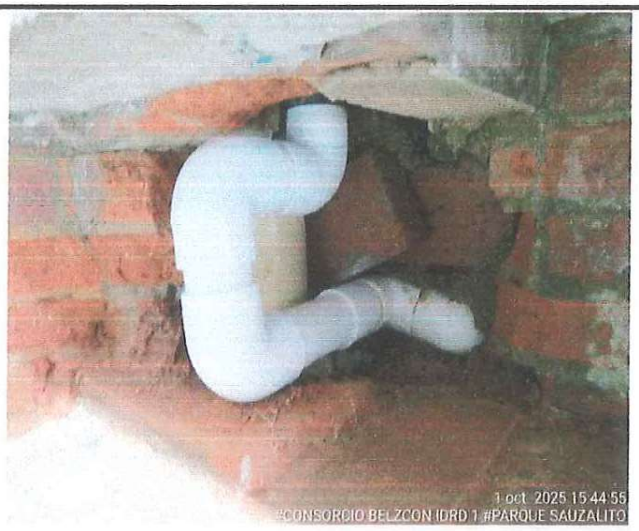

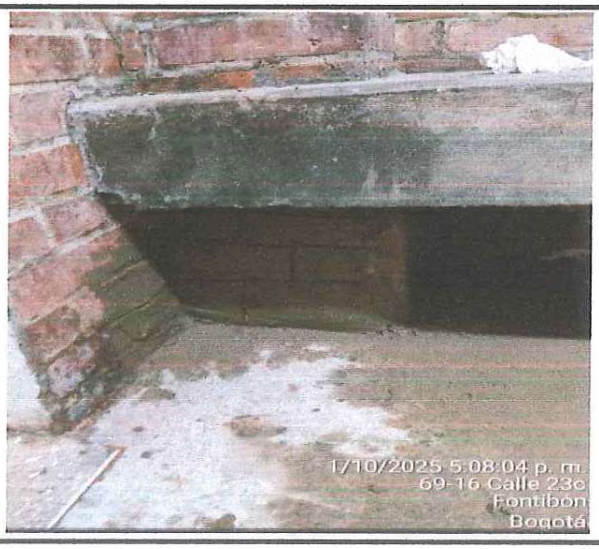

FOTOS
Demolición de muros en mampostería en zona salón de boxeo.
Desmonte de redes hidráulicas PVC-P 2" en zona salón de boxeo.
Suministro e instalación de tubería PVC-P 2" en zona salón de boxeo.
Suministro e instalación de accesorios PVC-P 2" en zona salón de boxeo.

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO IDRD 1


PARQUE QUIROGA CÓD. 18-205









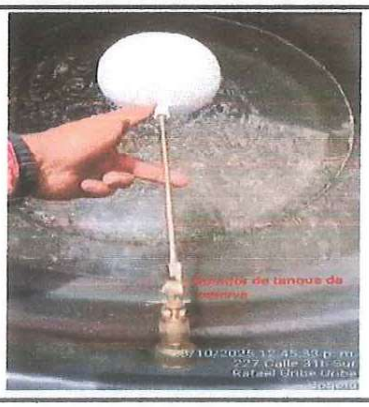



FOTOS
Se realiza el cambio del kit completo de flotadores y manijas sanitarios: 1 y 2 baños coliseo.
Se realiza el cambio de flotador de ingreso tanque de reserva número 3 aéreo de los baños Coliseo.
Instalación llave de riego rota del ecomuro Coliseo.

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO BELZOC IDRD 1


PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA CÓD.18-207









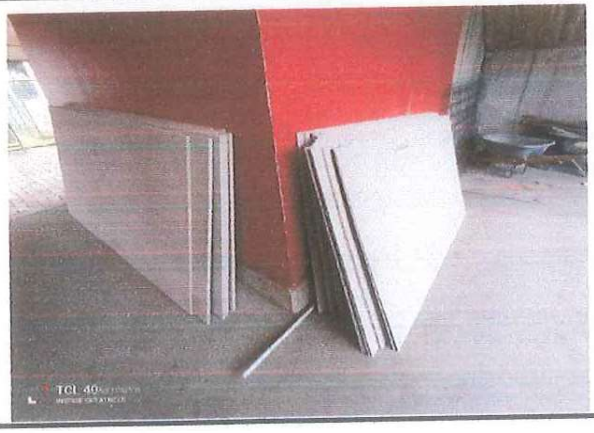



BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO BOZZO
IDRD 1


PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA CÓD.18-207









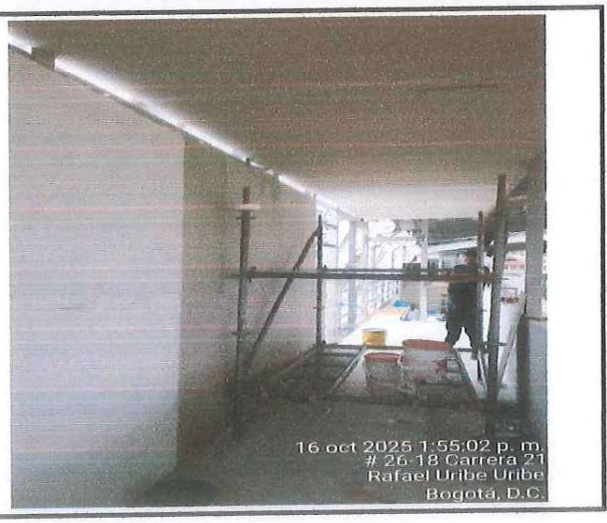





BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO Bellavista IDRD 1

PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA CÓD.18-207





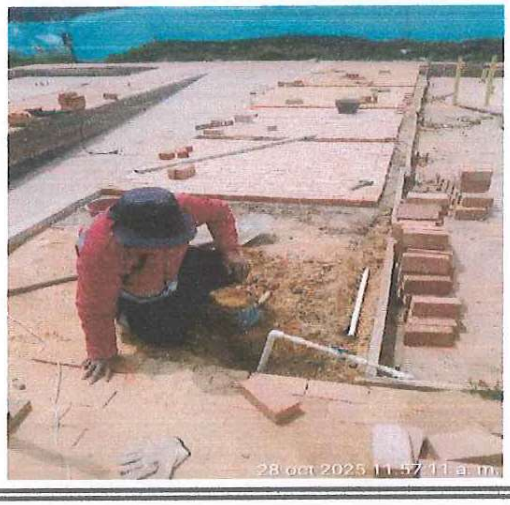

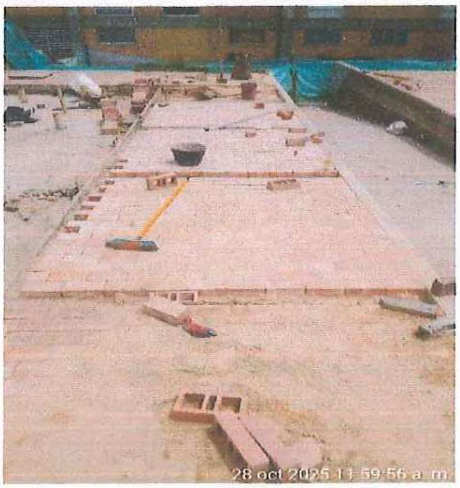

FOTOS
Se continúan trabajos de estructura metálica (módulo PMU) en gradería occidental sur.
Fabricación de módulo de cabina de locución graderías costado oriental.
Se realizan actividades de urbanismo de zona de módulos baños costado cancha sintética; incluyendo recebo compacto, instalación adoquín, cenefa en concreto de confinamiento, elaboración de muros en ladrillo a la vista, redes hidrosanitarias.

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

PARQUE PORVENIR CÓD. 07-391

















REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE PORVENIR CÓD. 07-391

















FOTOS

Limpieza (lijado), pintura anticorrosivo y pintura tipo esmalte en estructura metálica de cerramiento cancha sintética F8.
Limpieza (lijado), pintura anticorrosiva en estructura metálica de cerramiento canchas de tenis.
Desmonte de lámina (señal) en cerramiento cancha sintética F8.
Nivelación y compactación mecánica de material granular en pista de trote zona cancha sintética F8.

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO Belzico IDRD 1

PARQUE QUIROGA CÓD. 18-205












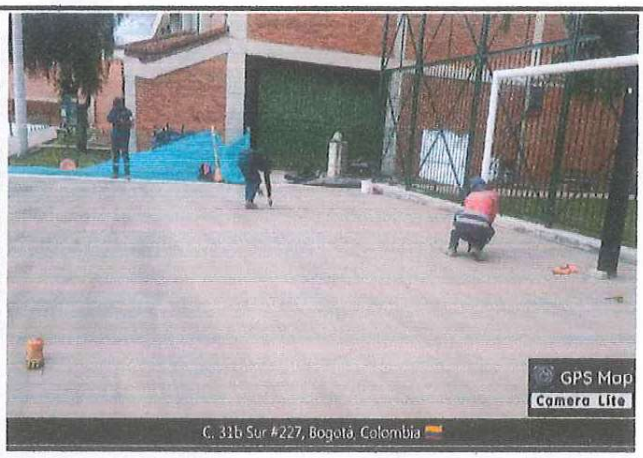

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE QUIROGA CÓD. 18-205









FOTOS
Mantenimiento y pintura de cancha múltiple; incluyendo aplicación de recíbase, sellantes y pinturas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE BERLIN CÓD.11-015










FOTOS
Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha sintética, incluyendo: Soldadura, cambio de módulos, deteriorados, Lijado, anticorrosivo y pintura del mismo.

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO

PARQUE URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS CÓD. 05-042





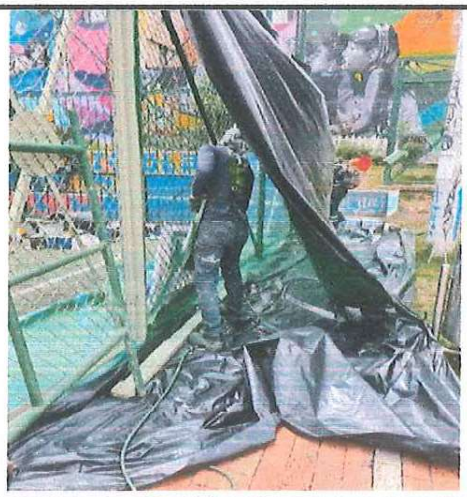




FOTOS
Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha; incluyendo: soldadura, cambio de módulos deteriorados, Lijado, anticorrosivo y pintura del mismo.


BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

PARQUE TIMIZA CÓD. 08-219





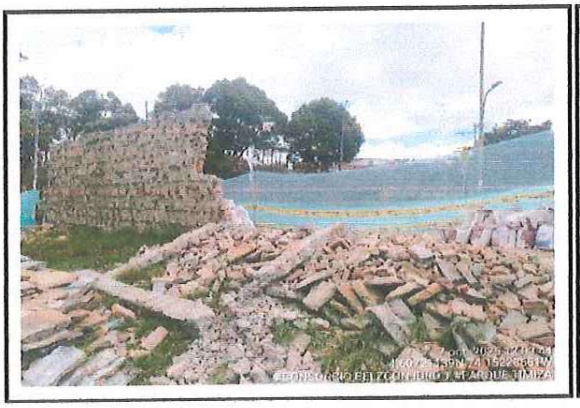

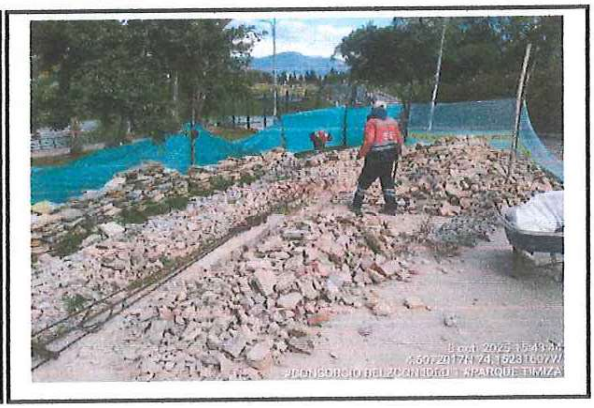










REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE TIMIZA CÓD. 08-219



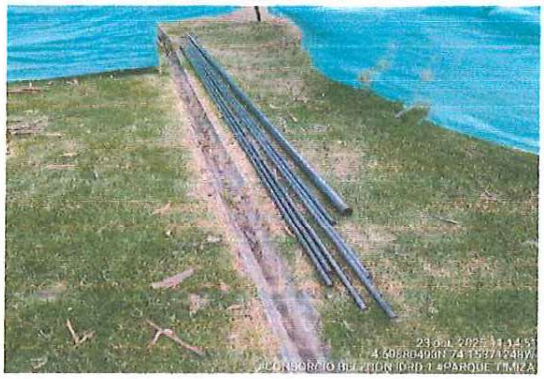







FOTOS
Demolición de muro en mampostería en zona de acceso No. 2
Demolición de columnetas y vigas de confinamiento en concreto en zona de acceso No. 2
Viga de concreto 0,30 x 0,30 m en zona de acceso No. 2
Suministro e instalación de parales metálicos de cerramiento en zona de acceso No. 2
Suministro e instalación de cerramiento en malla Fortinet en zona de acceso No. 2
Cargue, retiro y disposición final de RCD en zona de acceso No. 2
Desmonte y re instalación de baranda M-80 en zona sendero del lago (tramo 2)
Suministro e instalación de baranda M-80 en zona sendero del lago (tramo 2)

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE LAS LUCES Y VILLA RICA CÓD. 08-533

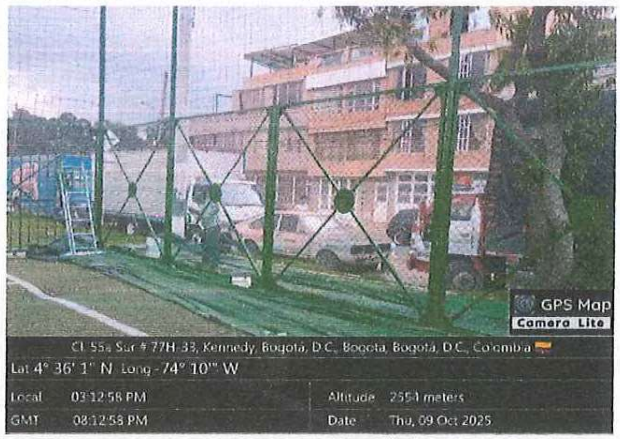


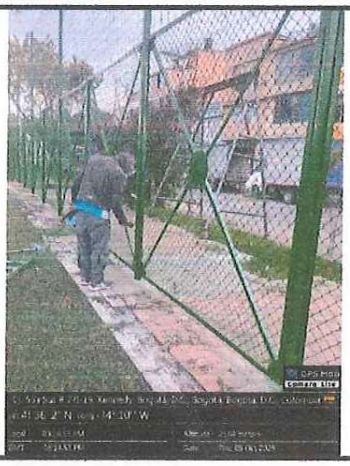



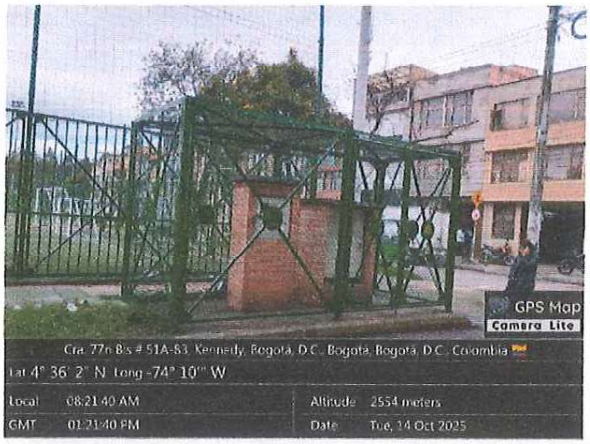



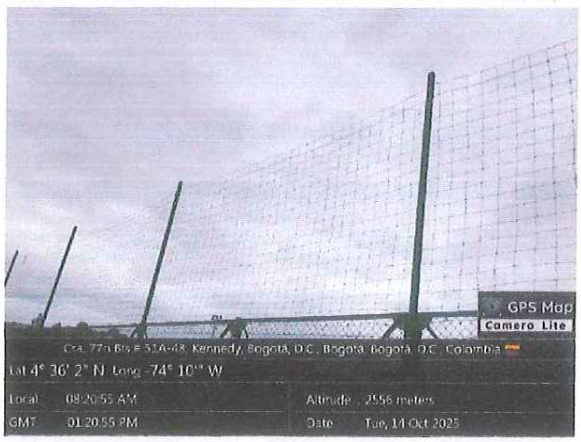

FOTOS
Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha; incluyendo: soldadura, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura del mismo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE LAS AMERICAS OCCIDENTAL IV ETAPA CÓD.08-127









FOTOS

Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha; incluyendo: soldadura, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura del mismo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE PRADO PINZON CÓD.11-109









FOTOS
Mantenimiento del cerramiento de la cancha de futbol sintética.

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO BELLAVISTA IDRD 1

PARQUE URBANIZACIÓN LA ESPERANZA CÓD. 07-273

















BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONSORCIO BELZCON IDRD 1

PARQUE URBANIZACIÓN LA ESPERANZA CÓD. 07-273


















FOTOS
Pintura tipo esmalte en estructura metálica de cerramiento cancha sintética F8.
Desmonte de lámina (señal) en cerramiento cancha sintética F8.
Recubrimiento sintético y demarcación en placa de contrapiso en zona pista de patinaje
Suministro e instalación de piso caucho en zona de juegos y pista de trote (tramo 1)
Retiro de banner en baranda zona pista de patinaje.
Limpieza (lijado) y pintura anticorrosiva en baranda M-83 zona de juegos infantiles
Cerramiento provisional en contorno de pista de trote (tramo 2)
Desmonte de piso caucho en pista de trote (tramo 2)

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO EMPRESAS IDRD 1

PARQUE BARRIO LA PEPITA CÓD. 14-008





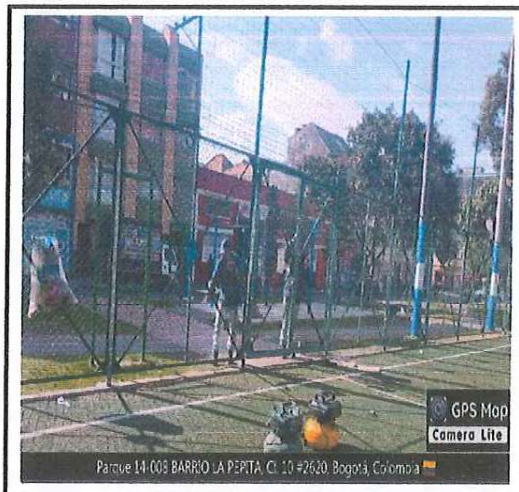







FOTOS
Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha; incluyendo: soldadura, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura del mismo.

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO

PARQUE SIMON BOLIVAR (UNIDAD DEPORTIVO EL SALITRE) CÓD. 10-290














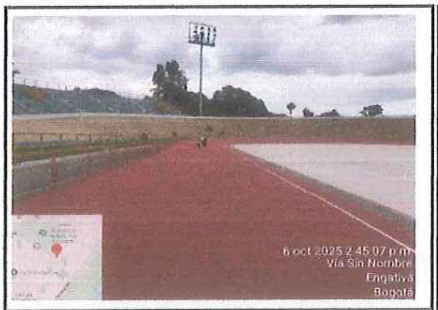



FOTOS
Desmonte puertas de los baños del módulo de comida de la señora Rosa
Instalación de puertas de los baños del módulo de comida de la señora Rosa
Retiro de puertas de baños para disposición final
Arreglo de fisuras en pista de patinaje por garantía
se encontró cable sulfatado y en corto de la torre de iluminación 3, se realiza ajuste y se deja en funcionamiento


BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".


CONSORCIO

PARQUE GORGONZOLA CÓD. 16-126

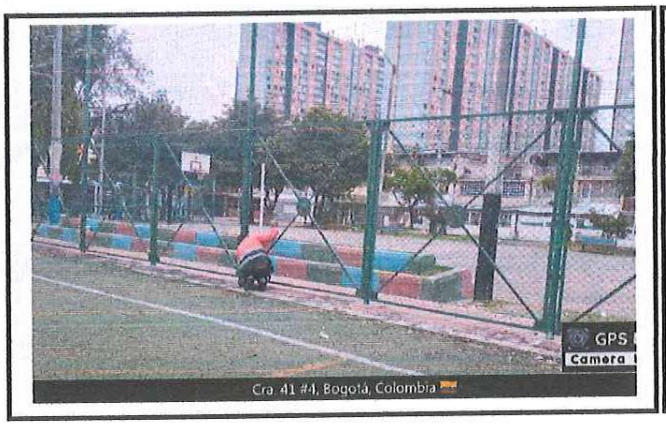






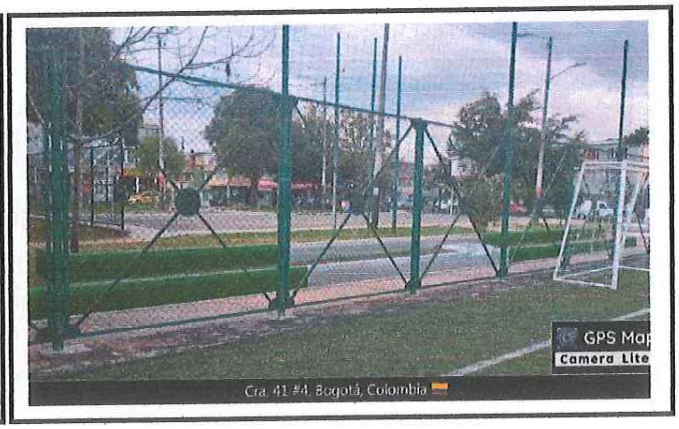



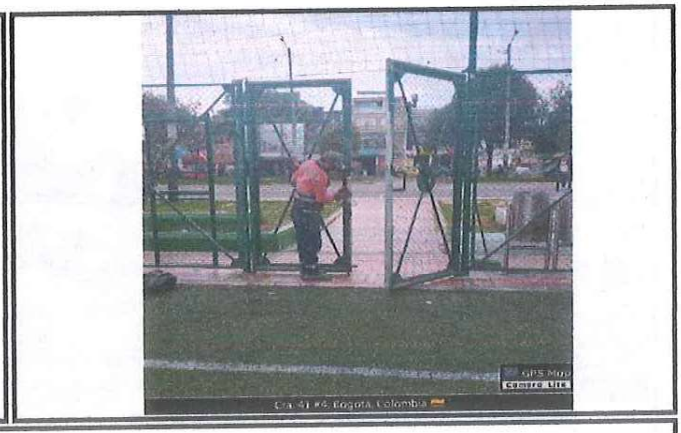

FOTOS
Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha; incluyendo: soldadura, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura del mismo.

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO 16-099

















BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
	CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	


PARQUE PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO) CÓD.03-035









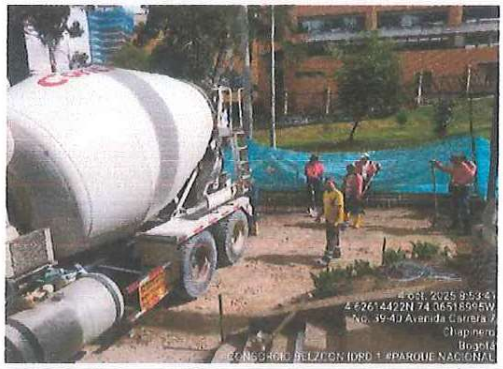







BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

PARQUE PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO) CÓD.03-035














REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR CÓD.10-028

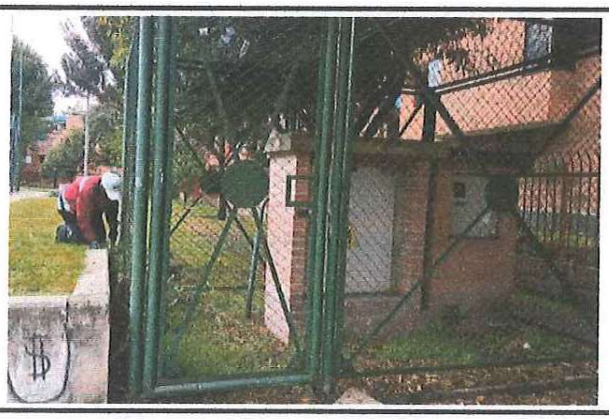











FOTOS
Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha, incluyendo: soldaduras, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura del mismo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS) **COD: 12-092**







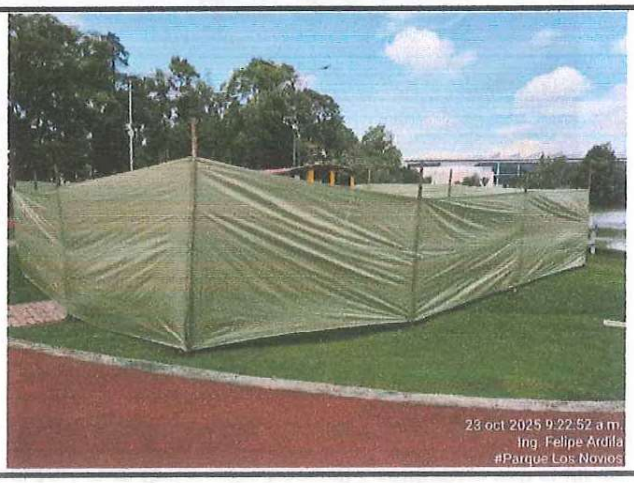






BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**REGISTRO FOTOGRÁFICO** CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".	CONSORCIO Belzoc IDRD 1

PARQUE SIMON BOLIVAR - SECTOR CENTRAL CÓD.13-089





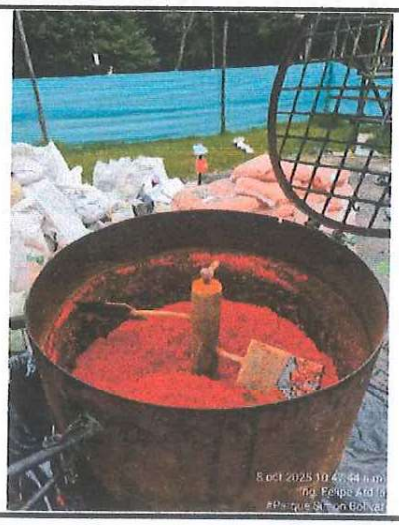







"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"



CONTRATO DE OBRA No IDRD-SG-4060-2024

INFORME DE GESTION SOCIAL No. 12

VERSIÓN 1


CONSORCIO BELZCON IDRD 1

OCTUBRE DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	27-10-2025	Documento original	144

CONTROL DE APROBACIONES

Elaborado por:	Validado Por:
	
T.S. Viviana Paulina García Mancipe	Ing. Enrique Guzmán
Residente Social Contratista	Director de Obra Contratista


Revisado Por:	Aprobado Por:
	
T.S María del Rosario Cárdenas Junca	T.S María del Rosario Cárdenas Junca
Residente Social de Interventoría	Residente Social de Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCIÓN 5
2. ALCANCE 6
3. MARCO JURIDICO 7
4. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL 10
4.1. Objetivo General 10
4.2. Objetivos Específicos 10
5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 11
6. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL 13
6.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 13
6.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 15
a. Volantes de Información 15
b. Valla Informativa 15
c. Convocatorias 16
6.3. PROGRAMA DE PARTICIPACION Y CONTROL 17
d. Reunión de Inicio 17
e. Reunión de avance de obra 17
f. Reunión de Finalización de La Obra 17
g. Reuniones adicionales y/o extraordinarias 18
h. Comités de Participación Ciudadana 18
6.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 19
6.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS 21
a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre 22
b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes 22
a. Desmonte y entrega de mobiliario existente 22
6.6 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 23
6.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL 26
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 26
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 27
TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 27
OTRAS ACTIVIDADES 27
7. PROGRAMA DE REPORTES E INFORMES 28
a. Evaluación 28
b. Seguimiento 28
c. Informe Mensual 29
d. Informe Final 29
e. Productos Entregables 29

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Marco Jurídico 7
Tabla 2. Información del Contrato 11
Tabla 3. Identificación de impactos 13
Tabla 4. Relación pendones informativos 15
Tabla 5. Volantes de convocatoria 16
Tabla 6. Indicador de cumplimiento de divulgación 16
Tabla 7. Reuniones de inicio 17
Tabla 8. Reuniones de finalización 18
Tabla 9. Comité de participación 18
Tabla 10. Indicador de cumplimiento de información 19
Tabla 11. Atenciones ciudadanas 19
Tabla 12. Información atención a la comunidad 21
Tabla 13. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano 21
Tabla 14. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas 22
Tabla 15. Personal femenino vinculado 23
Tabla 16. Personal vulnerable vinculado 23
Tabla 17. Personal no calificado de las localidades intervenidas vinculado 24
Tabla 18. Personal joven vinculado 24
Tabla 19. Personal adulto vinculado 24
Tabla 20. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra 26
Tabla 21. Indicador de cumplimiento Sostenibilidad Social 28

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Registro fotográfico 16
Anexo 2. Soportes de convocatoria 16
Anexo 3. Soportes de reunión 17
Anexo 4. Soportes reuniones de finalización 18
Anexo 5. Consolidado de atenciones ciudadanas 21
Anexo 6. Copia de acta de desmonte 22
Anexo 7. Encuestas de satisfacción 27
Anexo 8. Copia correos electrónicos 29

1. INTRODUCIÓN

El presente documento describe las actividades desarrolladas por parte del componente social, en cumplimiento de lo establecido en la Guía de Gestión Social para la Red Distrital de Parques, presentando de manera clara la implementación de actividades del componente desde una perspectiva de responsabilidad social, en cumplimiento del contrato IDRD SG 4060 de 2024, cuyo objeto es "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

El presente Informe de Gestión Social, presenta el desarrollo de los siete programas principales de acción ejecutados por el Consorcio Belzcon IDRD 1, en cumplimiento de lo requerido en el anexo técnico. Su objetivo principal consiste reportar el cumplimiento de lo propuesto en el Plan de Gestión Social, encaminado a prevenir, controlar y/o mitigar los impactos que se pudiesen generar por las obras de manera oportuna y eficiente.

Desde esta perspectiva, el presente informe reporta la implementación de los siguientes programas durante el décimo segundo periodo de ejecución, comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025:

- Programa de Información y Divulgación
- Programa de Participación y Control Social
- Programa de Atención a la Ciudadanía
- Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas
- Programa de Apoyo a la Contratación de Mano de Obra no Calificada
- Programa de Sostenibilidad Social
- Programa de Reportes e Informes

2. ALCANCE

El presente informe consolida las acciones adelantadas desde el componente social para garantizar el cumplimiento en lo propuesto desde esta área en el Plan de Gestión, para garantizar la participación ciudadana de las comunidades del área de influencia directa del proyecto; así mismo, busca presentar el contexto social de los parques objeto de intervención en desarrollo del presente contrato, identificando actores sociales e institucionales que intervienen en el espacio, así como los usos actuales y apropiaciones preexistentes y/o esperadas por la comunidad.

Cabe destacar que el alcance en las actividades a desarrollar desde el componente social, corresponden de manera estricta al desarrollo de las actividades constructivas que se ejecutan en cada uno de los parques priorizados, con base en los presupuestos avalados por la interventoría y el IDRD.

3. MARCO JURIDICO

La Carta Magna de Colombia, plantea mecanismos de participación ciudadana para involucrar a las comunidades en la construcción de normatividad, toma de decisiones, rendición de cuentas, y acciones respecto a la afectación de su vida económica, política, administrativa y cultural, es por eso que con el fin de involucrar a las comunidades en el marco del bien colectivo y defensa de los intereses comunes (Ley 99 de 1993 Títulos X y XI, Artículos 69 al 76 y la Ley 134 de 1993) se han generado espacios para permitir relaciones cercanas entre la sociedad y el estado, siendo los ciudadanos interlocutores legítimos para proteger el patrimonio, los derechos comunes y particulares, el espacio, el entorno, la integridad y conservación del medio ambiente.

Tabla 1. Marco Jurídico

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Constitución Política de Colombia de 1991 - Asamblea Nacional Constituyente	Los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política establecen en el marco del Estado Social Derecho sus principios democráticos, participativos y pluralistas, con prevalencia en el interés general y por tanto la importancia de la participación ciudadana en las decisiones que los afectan a fin de garantizar el cumplimiento y efectividad de los principios, derechos y deberes sociales y del Estado consagrados en la Carta Constitucional. En relación con los derechos colectivos y del ambiente los Artículos 78 y 79 señalan que el Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen, así como la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos, a fin de garantizar el derecho que tienen todas las personas de gozar de un ambiente sano.

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
	Artículo 80: Señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo, su sostenibilidad, su conservación, su restauración o sustitución. Artículos 7 y 330 (Parágrafo), indican que la participación ciudadana, entendida como premisa fundamental de índole constitucional, se perfecciona y desarrolla mediante los mecanismos de participación allí establecidos, tales como: Derechode Petición (Art. 23), Acción de Tutela (Art. 86), Acción de Cumplimiento (Art. 87), Acciones Populares y de Grupo (Art. 88). Artículo 90: establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños jurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.
Ley 134 de 1994 Congreso de Colombia	Normas sobre mecanismos de participación ciudadana
Ley 1955 de 2019	"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad."
Acuerdo 761 de 2020	"Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"
Ley 134 de 1994	"Por lo cual se establecen los mecanismos de participación ciudadana"
Ley 1755 de 2015	"Por medio del cual se regula el Derecho fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
Ley 1757 de 2015	Por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".
Decreto 263 de 2003	Por el cual reglamentaran los artículos 6° y 10° del Acuerdo Distrital 078 de 2002 que dicto normas para la administración y Sostenibilidad del sistema Distrital de Parques" señala el objetivo de los comités locales de control social de los parques metropolitanos, zonales y vecinales del sistema distrital de parques."
Decreto Distrital 215 de 2005	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Modificado por el art.23, Decreto Distrital 527 de 2014.

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Decreto 308 de 2006	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito Capital". Título III Política de Gestión para la sostenibilidad, Capitulo II Estrategia de Gestión Social".
Decreto 448 de 2007	"Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana".
Decreto 371 de 2010	Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y Organismos del Distrito Capital".
Decreto Distrital 503 de 2011	"Por la cual se adopta la política pública de participación incidente para el Distrito Capital".
Decreto 483 de 2018	"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 229 de 2015," Por medio del cual se adopta la Política pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 557 de 2018	"Por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos recreativos y deportivos para Bogotá D.C – DRAFE y se dictan otras medidas".
Decreto 197 de 2014	"Por medio del cual se adopta la Política Publica Distrital de servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C"
Directiva 001 2017	Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la Ciudad.
Decreto 332 de 2020	Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital

Fuente: Constitución Política de Colombia y Guía de Gestión Social para la Red de Parques

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

4.1. Objetivo General

Describir las actividades realizadas por el Consorcio Belzcon IDRD 1, encaminadas al cumplimiento de las obligaciones de gestión social para el desarrollo del contrato de obra 4060-2024, según las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los criterios de calidad, oportunidad y veracidad, así como la presentación de los resultados de la ejecución, para el décimo segundo mes comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025.

4.2. Objetivos Específicos

- Presentar el avance en el desarrollo de las actividades sociales por parte del Consorcio Belzcon IDRD 1, dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Gestión Social.
- Evidenciar los procesos de ejecución y seguimiento adelantados desde el contratista, en cumplimiento de cada uno de los programas establecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD para la ejecución de obras de infraestructura urbana.

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato 4060 de 2024 se firmó entre Consorcio Belzcon IDRD 1 y el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, pretende beneficiar a los habitantes de diferentes localidades del distrito capital, atendiendo de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramientointegral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas, de los parques asignados para tal fin con un manejo presupuestal a monto agotable.

Tabla 2. Información del Contrato

CONTRATANTE **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**	
Profesional de apoyo a la supervisión técnica:	Iván Velásquez
Profesional de apoyo a la supervisión Social:	Claudia Milena Corredor
INTERVENTORÍA **Contrato IDRD - 4080- 2024**	
Interventoría:	Consorcio Santa Teresa 28
Director de Interventoría:	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Residente Social:	María del Rosario Cárdenas Junca
Objeto:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.
Duración inicial del contrato:	Ocho (8) meses
Fecha de inicio del proyecto:	20 de noviembre de 2024
Prorroga 1:	Cuatro (4) meses
Fecha de Terminación:	19 de noviembre de 2025
CONTRATISTA **Contrato IDRD– 4060 - 2024**	
Contratista:	Consorcio Belzcon IDRD 1
Director de Obra:	Enrique Guzmán

Residente Social:	Viviana Paulina García Mancipe
Objeto:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD
Duración inicial del contrato:	Ocho (8) meses
Fecha de inicio del proyecto:	20 de noviembre de 2024
Prórroga 1:	Cuatro (4) meses
Fecha de Terminación:	19 de noviembre de 2025

6. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

La Gestión Social comprende el conjunto de actividades cuyo objetivo es garantizar que la comunidad conozca, apropie y participe, en el desarrollo de las actividades de obra, sean estas mantenimiento, adecuación, rehabilitación y/o reconstrucción de los parques priorizados para el presente contrato, y se generen espacios para la interacción permanente con los ciudadanos y las ciudadanas ubicados en el área de influencia directa e indirecta del proyecto y efectuar una gestión eficiente, que cumpla con las expectativas de los beneficiarios.

Con base en lo anterior, a continuación se presenta el desarrollo de la gestión social durante el décimo segundo mes de ejecución de contrato a partir de los siete programas sociales.

6.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Se consideran impactos aquellos efectos directos sobre los residentes en el área de influencia (tanto directa como indirectamente) de la intervención. Estos impactos pueden clasificarse según su duración (permanente/transitorio), la población que afectan (directa/indirectamente) y el tipo de afectación (positivo/negativo), entre otros aspectos.

Durante el presente periodo se mantienen los impactos identificados previo a las actividades de obra, los cuales se pretende mitigar con la ejecución del Plan de Gestión Social propuesto para aval de la interventoría y la entidad.

Tabla 3. Identificación de impactos

PROCESO	ZONA - LUGAR	ACTIVIDAD	IMPACTO		SITUACIÓN	CALIFICACIÓN	MEDIDAS A TOMAR
			DESCRIPCION	COMPETENCIA			
PRELIMINAR Y OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	PRELIMINAR / OBRA	DESINFORMACION	SOCIAL	CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD POR DESCONOCIMIENTO DEL PROYECTO, SU ALCANCE O DESARROLLO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES INFORMATIVAS PIEZAS INFORMATIVAS RECORRIDOS DE ATENCIÓN PUNTOS SATÉLITE DE INFORMACIÓN CONFORMACIÓN DE COMITÉS INSTALACIÓN DE VALLAS Y/O PEDONES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	INQUIETIDES POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO	SOCIAL - TECNICO	INCREMENTO DE CONSULTAS CIUDADANAS POR DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROECTO	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	REUNIONES DE AVANCE – FINALIZACIÓN – EXTRAORDINARIAS REUNIONES CON COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	ORDEN PUBLICO	SOCIAL - SST	ROBOS AMENAZAS BLOQUEOS ACTOS VANDÁLICOS ASONADAS	NEGATIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	RECORRIDOS DE ATENCIÓN IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES COMUNALES DIRECTORIO INSTITUCIONAL
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A VIAS Y/O ESPACIO PÚBLICO	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR DAÑOS EN VIAS RECLAMACIONES POR DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO	NEGATIVO INDIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ACTAS DE DESMONTE ACTAS DE INSPECCIÓN PRELIMINAR E INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A PREDIOS	TECNICO - SOCIAL - SST	RECLAMACIONES POR AFECTACIÓN A VIVIENDAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO	NEGATIVO DIRECTO TRANSITORIO	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD A PREDIOS UBICADOS EN EL AREA AFERENTE DEL PROYECTO
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	TECNICO - SOCIAL - SST	APERTURA DE VACANTES LABORALES PARA PERSONAL DE OBRA	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO TRANSITORIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS LOCALIDADES INTERVENIDAS – POBLACIÓN VULNERABLE - MUJERES
OBRA	AREAS DE INTERVENCIÓN	EJECUCION DE OBRA	AFECTACION A OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN Y USO INADECUADO DE ESCENARIOS	TECNICO - SOCIAL	DAÑOS A LAS OBRAS EJECUTADAS, ELEMENTOS INTALADOS, DISMINUCIÓN DE LA VIDA UTIL DE CADFA ESCENARIO	NEGATIVO DIRECTO PERMANENTE	MANUALES DE MANTENIMIENTO PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD CAPACITACIONES A COMITÉ DE PARTICIPACIÓN TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO
RECIBO	AREAS DE INTERVENCIÓN	ENTREGA DE OBRA	DECONOCIMIENTO DEL IMPACTO PRODUCIDO POR LAS OBRAS EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS	SOCIAL	APROBACIN POR PARTE DE LAS COMUNIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL IDRD Y SU IMPACTO	POSITIVO DIRECTO / INDIRECTO PERMANENTE	APLICACIÓN Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION

6.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Este programa tiene por objeto ejecutar acciones encaminadas a garantizar la difusión del proyecto dentro del área de influencia directa, de forma tal que mitigue cualquier efecto que se pueda producir por desinformación en el territorio frente a las acciones propias del contrato. Para tal fin se deberán identificar los líderes comunales de los sectores beneficiarios con el fin de apoyarse en ellos para la difusión de la información. A continuación se describe la implementación de las estrategias.

a. Volantes de Información

Durante el periodo reportado, no se emitieron volantes informativos.

b. Valla Informativa

Durante el periodo reportado se mantuvieron los pendones informativos en los parques intervenidos por el consorcio, en cumplimiento de lo propuesto en el plan de gestión social.

Tabla 4. Relación pendones informativos

No.	PARQUE	LOCALIDAD	CANTIDAD
1	Simón Bolívar	Teusaquillo	1
2	Porvenir	Bosa	1
3	UDS	Engativá	1
4	Milenta Tejar	Puente Aranda	1
5	La Esperanza	Bosa	1

No.	PARQUE	LOCALIDAD	CANTIDAD
6	Florencia Los Tronquitos	Engativá	1
7	Zona Franca	Fontibón	1
8	Refous	Suba	1
9	Américas Occidental	Kennedy	1

Anexo 1. Registro fotográfico

c. Convocatorias

Durante el periodo reportado en el presente informe, gestionó la aprobación de los siguientes volantes de convocatoria:

Tabla 5. Volantes de convocatoria

No.	OBJETO	FECHA	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
12	Convocatoria reunión de finalización parque El Country	01-03/10/2025	1	Se remite volante de convocatoria a través de correo electrónico a la administración del parque y a los participantes de la reunión de inicio
14	Convocatoria reunión de finalización pista de patinaje UDS	30/09/2025	1	Se remite volante de convocatoria a través de correo electrónico a la administración del parque y a los participantes de la reunión de inicio
15	Convocatoria reunión de inicio parque de Los Novios	01-04/10/2025	5	Se remite volante de convocatoria a través de correo electrónico a la administración del parque y se entregan volantes a los comerciantes de los módulos de alimentación

Anexo 2. Soportes de convocatoria

Tabla 6. Indicador de cumplimiento de divulgación

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	$\frac{\text{\# volantes entregados}}{\text{\# volantes requeridos}} \frac{7*100}{7}$	100%

PRODUCTIVIDAD	# pendones / vallas instaladas 9*100 # pendones requeridos 9	100%

6.3. PROGRAMA DE PARTICIPACION Y CONTROL

Este programa busca "propiciar la creación de espacios de participación ciudadana que posibiliten el intercambio permanente de información entre el IDRD y la ciudadanía, garantizando una permanente y oportuna comunicación entre los actores sociales e institucionales involucrados en el proceso".

d. Reunión de Inicio

Durante el periodo reportado en el presente informe, se celebró la reunión de inicio de actividades de mantenimiento, para el parque de Los Novios. Para tal fin, el día 1 de octubre de 2025 se remitió la presentación para revisión de interventoría. A continuación se relaciona el desarrollo de la reunión:

Tabla 7. Reuniones de inicio

No.	OBJETO	FECHA	ASISTENTES	OBSERVACIÓN
1	Reunión de inicio de actividades de mantenimiento parque de Los Novios	08/10/2025	5	Se presentan a la administración del parque y los comerciantes que actualmente tiene arrendados los módulos de administración del parque.

Anexo 3. Soportes de reunión

e. Reunión de avance de obra

Para el presente periodo, no se adelantaron reuniones de avance de obra.

f. Reunión de Finalización de La Obra

Durante el periodo reportado en el presente informe, se adelantó la reunión de finalización

de los parque UDS y El Country. Para tal fin, los días 1 y 2 de octubre de 2025, se remitieron a la interventoría las presentaciones correspondientes a estos dos escenarios. El día 7 de octubre se solicitaron ajustes por parte de interventoría las cuales fueron atendidas. A continuación se relaciona el desarrollo de las reuniones:

Tabla 8. Reuniones de finalización

No.	OBJETO	FECHA	ASISTENTES	OBSERVACIÓN
1	Reunión de finalización parque UDS	03/10/2025	13	Se presenta la administración del parque y los representantes de escuelas y ligas de patinaje
2	Reunión de finalización parque El Country	08/10/2025	3	Se presenta la administración del parque y una representante de Asocarolina.

Anexo 4. Soportes reuniones de finalización

g. Reuniones adicionales y/o extraordinarias

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió la celebración de reuniones extraordinarias.

h. Comités de Participación Ciudadana

Durante el periodo reportado en el presente informe, se conformó el comité de participación con los asistentes a la reunión de inicio de obra del parque de Los Novios.

Tabla 9. Comité de participación

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	TELÉFONO
Sandra Patricia Aguilar	Comunidad	3202805696
Faride Ibarra Mojica	Comunidad	3135347665
Johan Camilo Mina	Comunidad	3123203666
Javier Alexander Suarez	Comunidad	3112468694
Marta Lucia Agudelo	Comunidad	3124185871

Tabla 10. Indicador de cumplimiento de información

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# reuniones de inicio celebradas / # reuniones de inicio requeridas *100 (1 / 1)	100%
PRODUCTIVIDAD	# socializaciones celebradas / # socializaciones requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# reuniones de avance celebradas / # reuniones de avance requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# reuniones de finalización celebradas / # reuniones de finalización requeridas 2*100 (2 / 2)	100%
PRODUCTIVIDAD	# reuniones extraordinarias celebradas / # reuniones extraordinarias requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# comités de participación conformados / # comités de participación requeridos *100 (1 / 1)	100%

6.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Este programa busca atender, gestionar y tramitar las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la población y promover mecanismos adecuados de diálogo y conversación en torno al proyecto.

Durante el periodo reportado en el presente informe, se recibió una consulta ciudadana. A continuación se presenta el consolidado de consultas recepcionadas:

Tabla 11. Atenciones ciudadanas

No.	FECHA	ASUNTO	TRÁMITE	ESTADO
1	25-03-2025	La señora Melisa Mutis solicita información respecto a las obras que se están adelantando en el área de juegos infantiles del parque El Country y qué tiempo tomarán.	Se informa a la ciudadana que en parque El Country se adelantan obras de mejoramiento, dentro de las que se contempla el remplazo de los juegos actuales, los cuales presentan alto grado de deterioro y ampliación de la arenera. De igual forma se indica que se contempla el mantenimiento de bancas y bebedero del parque y	Cerrada por línea telefónica el 25 de marzo de 2025.

			mejoramiento de la red eléctrica en puntos específicos. Se espera terminar con las actividades de obra en mes y medio aproximadamente Se invita a la ciudadana a participar en la próxima reunión informativa.	
2	19-05-2025	La señora Amparo Morales escribe al correo de gestión social solicitando ser contactada telefónicamente.	Se establece comunicación con la administración del parque, quien indica que la señora Morales solicita una reunión con el contratista para obtener información sobre el proyecto. Se informa al componente técnico, este indica que se postergue el encuentro para luego de la instalación de juegos infantiles. Se contacta a la señora Morales y se establece como compromiso informar una fecha para este encuentro el día 30 de mayo de 2025. La señora Morales solicita copia del acta de la reunión de inicio, la cual es remitida vía correo electrónico. Se celebra reunión de carácter extraordinario con la peticionaria y una ciudadana representante de ASOCAROLINA, miembro del comité de participación y se presenta el estado de avance de las actividades socializadas durante la reunión de inicio de obra. Los soportes de esta actividad se encuentran en el anexo 2 del presente informe.	Cerrada con acta de reunión extraordinaria el 5 de junio de 2025.
3	21-07-2025	La señora Melisa Mutis solicita información respecto a la entrega del parque para uso de los niños y refiere uso inadecuado de elementos instalados por parte del personal de obra.	Se establece contacto telefónico con la señora Mutis y se le indica que ya se firmó acta de puesta en funcionamiento con la administración del parque y se dio apertura para uso del área de juegos. De la misma forma se indica que se realizó llamado de atención al personal de obra. Se invita a la ciudadana a participar en la reunión de finalización.	Cerrada por línea telefónica el 22 de julio de 2025.
4	12-08-2025	El señor Andrés Barragán solicita al apoyo a la supervisión del contrato información sobre el desarrollo de la obra en el parque Gilma Jiménez.	Se contacta vía telefónica al ciudadano y se le informa que, de acuerdo con la programación de actividades, las obras en la pista BMX del parque se terminarán la semana del 18 al 22 de agosto de 2025.	Cerrada por WhatsApp el 12 de agosto de 2025.

5	20-10-2025	El señor Germán Pinilla remite correo electrónico, requiriendo la instalación de la baranda del sendero peatonal intervenido en el parque Milenta Tejar San Eusebio.	Se da respuesta mediante correo electrónico indicando que, de acuerdo con la programación del componente técnico, la baranda será instalada durante la primera semana del mes de noviembre de 2025.	Cerrada vía correo electrónico el 24 de octubre de 2025.

Anexo 5. Consolidado de atenciones ciudadanas

Con el fin de dar alcance a los requerimientos e inquietudes de la población en general, se mantienen los siguientes canales de atención virtuales que serán atendidos por la profesional social del Consorcio Belzcon IDRD 1.

Tabla 12. Información atención a la comunidad

LINEAS DE ATENCION VIRTUAL AL CIUDADANO	
No. telefónico	**Correo electrónico**
6017689259 Horario atención telefónica: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.	gestionsocial4060@gmail.com

Tabla 13. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano

INDICADOR	FORMULA	CUMNPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de PQRS atendidas / # de PQRS recibidas × 1*100 / 1	N/A
PRODUCTIVIDAD	# total de PQRS cerradas / # total de PQRS recibidas × 5*100 / 5	100%

6.5 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS

El propósito de este programa es realizar el acompañamiento en el desarrollo las actividades que tengan relación directa con la comunidad, pero cuya responsabilidad es competencia del componente técnico. Se refiere a aquellas situaciones en las que sea preciso mediaro servir como puente entre la población beneficiaria y le ejecución del

proyecto como tal.

a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre

Durante el periodo reportado no se requirió el levantamiento de actas de vecindad.

b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se levantaron actas de inspección preliminar.

c. Desmonte y entrega de mobiliario existente

Durante el periodo reportado en el presente informe, se recibió copia del acta de retiro de mobiliario del parque Palestina aprobada por interventoría.

Anexo 6. Copia de acta de desmonte

Tabla 14. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de actas de inicio levantadas / # actas de inicio requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# actas de cierre levantadas / # actas de cierre requeridas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# actas de inspección levantadas / #actas de inspección preliminar registradas *100	N/A
PRODUCTIVIDAD	# de actas de desmonte levantadas / # de actas de desmonte requeridas 1 *100 / 1	100%

6.6 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La generación de opciones de empleo en los territorios objeto de intervención, permite aportaren el mejoramiento de la calidad de vida de la población, más allá de los beneficios que producela ejecución de las obras en cuanto a infraestructura. Es eso por lo que, la promoción de empleo productivo y decente es también uno de los beneficios del proyecto.

Para el mes de octubre de 2025 se contrató el personal necesario para la atención de emergencias y obras requeridas por el IDRD.

A continuación, se relaciona el personal vinculado con el proyecto durante el presente periodo:

Tabla 15. Personal femenino vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
1	ADRIANA PACHON FAJARDO	1.019.011.012	RESIDENTE AMBIENTAL	PERSONAL CALIFICADO
2	VIVIANA PAULINA MANCIPE GARCIA	52.990.836	RESIDENTE SOCIAL	PERSONAL CALIFICADO
3	PATRICIA SERRANO	51.923.580	ESPECIALISTA DE CALIDAD	PERSONAL CALIFICADO
4	ASDRID TOLOSA	52.423.434	ESPECIALISTA FORESTAL	PERSONAL CALIFICADO
5	MARIANA BOLIVAR	1.010.190.348	CONTADOR	PERSONAL CALIFICADO
6	PAULA ANDREA ROMERO VASQUEZ	1.020.785.662	COORDINADORA DE ALTURAS	PERSONAL CALIFICADO
7	CLAUDIA PEDRAZA	52.879.800	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
8	PAULA ORDOÑEZ	1.110.517.297	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
9	LEIDY JOHANA MERCADO	1.116.788.542	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
10	MARIA ANGELICA PADILLA	1.071.163.319	INSPECTORA	PERSONAL CALIFICADO
11	INGRID GARZON	1.023.896.907	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO

Tabla 16. Personal vulnerable vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
12	RODRIGO MOSQUERA GARZON	19.225.828	CADENERO 2	ADULTO MAYOR
13	JAIME MUÑOZ RODRIGUEZ	80.268.734	OFICIAL	ADULTO MAYOR
14	LUIS MERCADO	15.903.052	AYUDANTE	ADULTO MAYOR
15	LUIS ROJAS	19.401.764	AYUDANTE	ADULTO MAYOR
16	JOSE ORDUZ	79.252.275	OP. COMPACTADOR	ADULTO MAYOR
17	JOSE QUIROZ	3.942.184	AYUDANTE	ADULTO MAYOR

Tabla 17. Personal no calificado de las localidades intervenidas vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
18	JORGE EDUARDO CHICO	1.109.843.533	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
19	DAVID CORTES	79.728.460	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
20	EDGAR ESPITIA	1.018.462.151	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
21	JEISON ANGEL	1.083.917.804	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
22	JEISON ROJAS	1.193.311.210	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
23	JOSE MAURICIO VAQUIRO LEAL	5.972.793	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
24	RODRIGO MURCIA	79.825.593	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
25	FELIX CARVAJAL	79.770.599	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
26	EUGENIO SARAVIA	1.065.873.982	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
27	JEISON JAVIER ROJAS RICO	1.193.311.210	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
28	EDGAR HUESO	3.256.331	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
29	JOSE JAVIER VELASQUEZ	11.521.300	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
30	JHON FREDY SARMIENTO VANEGAS	80.048.932	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
31	JOSE LUIS LEGUIZAMON MORENO	1072701885	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
32	ANDRES MAURICIO PAEZ RODRIGUEZ	1.010.222.631	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
33	EDISSON STIVEN PAEZ RODRIGUEZ	1.026.270.973	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
34	DIDER CAMILO RODRIGUEZ HIGUITA	1.020.420.943	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
35	FRANCISCO TORRES	1.024.550.163	AUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

Tabla 18. Personal joven vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
36	ROSSY CATALINA RUBIO	1.001.203.623	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
37	FRANCO PEÑA	1.031.807.494	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
38	FABIO PEÑA	1.031.807.299	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO

Tabla 19. Personal adulto vinculado

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	OBSERVACIONES
39	JOSE CARLOS ARDILA MUÑOZ	79.992.215	CONTRATISTA	PERSONAL CALIFICADO
40	LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA	9.533.226	DIRECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
41	GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO	79.863.726	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
42	JHON CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	1.012.420.871	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
43	JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA	79.352.621	RESIDENTE DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
44	RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ	1.012.342.987	TOPOGRAFO	PERSONAL CALIFICADO

45	SEBASTIAN RODRIGUEZ	1.030.661.956	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
46	ANDRES JIMENEZ	1.014.239.649	ESPECIALISTA ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
47	JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA	79.986.418	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	PERSONAL CALIFICADO
48	JHONY MAURICIO ROJAS	80.209.784	ELECTRISCISTA	PERSONAL CALIFICADO
49	NUMAEL MEDINA MEDINA	79.382.708	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
50	HECTOR REINEL ROJAS MEDINA	79.764.999	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
51	JOSE AGUSTIN LOZANO CASTRO	79.244.131	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
52	LUIS FERNANDO LOZANO	80.473.084	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
53	WILMER ARMANDO BAUTISTA AMAYA	80.027.455	TECNICO ELECTRISTA	PERSONAL CALIFICADO
54	OSCAR DARIO CARDENAS	1.024.543.912	RESIDENTES DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	PERSONAL CALIFICADO
55	SAUL GOMEZ SALAMANCA	80.435.393	MAESTRO DE OBRA	PERSONA CALIFICADO
56	CRISTIAN FELIPE ARDILA	1.010.223.116	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
57	ANDRES MAURICIO TAVERA	1.053.784.849	INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO
58	JAIRO CASTAÑEDA	3.256.087	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
59	CAMPO ELIAS VARGAS	7.210.085	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
60	JAIR ALONSO	1.032.419.520	RESIDENTE	PERSONAL CALIFICADO
61	CARLOS ANDRES CHAVARRO	1.026.251.328	CONDUCTOR	PERSONAL CALIFICADO
62	JEFERSON CAMARGO	1.033.775.106	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
63	CAMILO ANDRES CAMARGO	1.000.352.200	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
64	EMILIO MEDINA	79.352.750	ELECTRICO	PERSONAL CALIFICADO
65	ALEXANDER DAZA	1.070.324.519	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
66	RONALDO RIVERA	1.012.450.951	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
67	NEY SANTANA	73.030.088	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
68	NELSON ALFONSO URREGO	1.079.032.313	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
69	DUBALIER CARLOS IZASA CUERVO	1.024.529.102	PLOMERO	PERSONAL CALIFICADO
70	DUBAN FELIPE DUQUE CASTRO	1.077.975.089	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
71	YEFERSON LEON	1.024.564.338	OPERADOR	PERSONAL CALIFICADO
72	JOSE MANUEL GONZALEZ	79.572.922	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
73	JUAN CAMILO FALLA	1.013.662.731	INSTALADOR	PERSONAL CALIFICADO
74	ABEL BARRERA	79.986.517	SOLDADOR	PERSONAL CALIFICADO
75	WILLIAM LEZMA	14.325.045	ELECTRICISTA	PERSONAL CALIFICADO
76	ORLANDO PAZ	6.802.435	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO
77	OSCAR ALEJANDRO MENESES GOMEZ	79.048.834	ENCARGADO	PERSONAL CALIFICADO
78	ANDRES FERNANDO PERICO REAL	1.007.158.678	INSPECTOR SST	PERSONAL CALIFICADO
79	PABLO ELIECER PIMIENTA VANEGAS	7.689.226	RESIDENTE SST	PERSONAL CALIFICADO
80	ROLANDO LOAIZA MEJIA	75084740	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
81	VICTOR RAUL HURTADO GALVAN	1.127.653.696	AYUDANTE	PERSONAL NO CALIFICADO
82	JORGE RODRIGUEZ	93.087.692	OFICIAL	PERSONAL CALIFICADO

Nota: Para efectos de la división de la población contratada en grupos etarios, se tendrá

en cuenta la estratificación establecida por el Ministerio de Salud, a saber, juventud (14 - 26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y más).

Tabla 20. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# de mujeres contratadas 12*100 # personas contratadas 82	14.6%
PRODUCTIVIDAD	# de personas vulnerables contratadas 6*100 # personas contratadas 82	7.3%
PRODUCTIVIDAD	# de personas de la localidad contratadas 18*100 # personas no calificadas contratadas 27	66%
PRODUCTIVIDAD	# de personas jóvenes contratadas 3*100 # personas contratadas 82	3.6%

6.7 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Este programa tiene como finalidad promover en los ciudadanos actitudes de apropiación, buen uso y cuidado de los parques del Sistema Distrital, además de contribuir con el aprovechamientode la comunidad frente al espacio público.

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA USO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se requirió adelantar actividades relacionadas con la sostenibilidad de las obras.

CAPACITACIÓN MANUALES DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se adelantaron capacitaciones de mantenimiento relacionadas con las comunidades de los parques intervenidos. Es importante recalcar que, en gran medida, las actividades adelantadas en ejecución de proyecto a la fecha, corresponde a atención de acciones correctivas inmediatas.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Durante el periodo reportado en el presente informe, se aplicaron encuestas de satisfacción a usuarios de los parques El Country y Unidad Deportiva el Salitre. A continuación se relacionan las encuestas realizadas:

Tabla 21. Encuestas de satisfacción

PARQUE	CÓDIGO	ENCUESTAS REQUERIDAS	ENCUESTAS APLICADAS
El Country	01-1000	30	39
Unidad Deportiva El Salitre	10-290	38	30

Para el próximo periodo se dará continuación a la aplicación de las encuestas de satisfacción y se procederá con el reporte de la tabulación y análisis de la información.

Ilustración 1. Aplicación de encuestas de satisfacción



Anexo 7. Encuestas de satisfacción

TALLERES DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se celebraron talleres de prevención de violencia de género.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante el mes de octubre de 2025 no se realizaron actividades adicionales.
