| Periodo | Cantidad de material aprovechado en la obra in situ + compra de material(t)/Cantidad de materiales que ingresan a la obra | % |
|---|---|---|
| 1 al 30 junio del 2025 | 106,99/702,93 | 15,22% |
| 1 al 31 julio del 2025 | 16,10/194,63 | 8,27% |
| 1 al 31 de agosto de 2025 | 35,8/69,39 | 51,59% |
| 1 al 30 septiembre 2025 | 14,1/14,1 | 100% |
| 1 al 31 octubre 2025 | 9,23/109,53 | 8,42% |

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1


## 6.6 D4 Manejo Integral de cuerpos de agua y sumideros

1. No se realizó ningún tipo de reparación
2. En ni lavado de vehículos ni maquinaria, en el frente de obra y menos en cercanía a sumideros.
3. En los frentes de obra no se instalaron unidades sanitarias portátiles, ya que se utilizaron las existentes en cada parque intervenido.

## 6.7 D5 Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

Durante el periodo del informe no se realizó la instalación de campamentos de obra temporales, sin embargo, se realizó el uso de los puntos ecológicos de los parques intervenidos para el manejo de los residuos, se realizó la protección y cerramiento de acopios, así como el orden y aseo de las áreas de trabajo.

Ilustración 2 Registro fotográfico manejo de áreas de trabajo
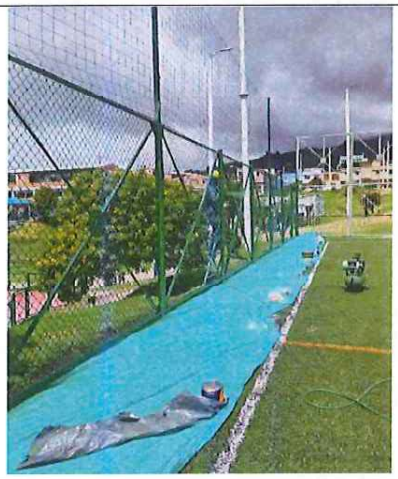
| INSTALACIÓN GRANULO DE CAUCHO | DELIMITACION DE ÁREAS |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

## 6.8 D-6 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Para el periodo del informe se utilizaron los siguientes vehículos.

Ilustración 3 Registro fotográfico manejo de áreas de trabajo

| CARGUE DE RCD | CARPADO DE VOLQUETAS |
|---|---|
|  |  |



Tabla 13 Relación de Vehículos

| TIPO DE VEHICULO | PLACA | PIN | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | SKJ 269 | 1316 | 15/08/2026 |
| VOLQUETA | THY433 | 21286 | 05/07/2026 |
| VOLQUETA | WTP796 | 21447 | 23/04/2026 |

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Tabla 14 Relación de maquinaria

| EQUIPO | MARCA | MODELO |
|---|---|---|
| Minicargador | Caterpillar | 305CR |
| Brazo articulado 405 A | JLG | 405AJ |
| Brazo articulado 1890 | PLATFORMBASKET | SP 1890 |
| Brazo articulado 304 | JLG | 405 A serie II BA 304 |
| Brazo articulado 305 | GENIE | 745/25 BA 305 |
| Brazo articulado 310 | JLG | 405 AJ BA 310 |
| Brazo articulado 311 | JLG | 405 AJ BA 311 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO |
|---|---|---|
| Brazo Telescópico 211 | JLG | 800S |
| Retrocargador | CASE | 575SV |
| Excavadora | HITACHI | ZAXIS 75US-3 |
| Minicargador | Bobcat | S570 |

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

La documentación correspondiente a equipos vehículos y maquinaria es reportada en el informe de SST

## 7. CONCLUSIONES

- Se ejecutaron actividades constructivas y retiro de RCD con gestores autorizados.
- Se realiza seguimiento en el frente de obra para el control de los impactos ambientales generados.
- Se cuentan con las certificaciones de materiales y RCD correspondientes a los periodos anteriores.

CONSORCIO Belzcoq
IDRD 1

# Anexo 1 Registro de Capacitación

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

| CONSORCIO BELZCON IDRD 1<br>FECHA ACTUALIZACION: 30/JUNIO/2025 | PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | PMA-01<br>VERSION 1<br>FECHA 26-12-2024 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 1. OBJETIVO | 1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.<br>2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.<br>3. Gestionar adecuadamente los recursos asignados<br>4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental |
| 2. META | Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente. |
| 3. ALCANCE | Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas. |
| 4. RESPONSABILIDADES | Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. |

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION (13 MESES)

| ACTIVIDADES | RECURSOS ASIGNADOS | DIRIGIDO A | RESPONSABLES | ESTADO | MES 1 | | | | MES 2 | | | | MES 3 | | | | MES 4 | | | | MES 5 | | | | MES 6 | | | | MES 7 | | | | MES 8 | | | | MES 9 | | | | MES 10 | | | | MES 11 | | | | MES 12 | | | | % | REGISTRO O SOPORTE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO BELZCON IDRD 1<br>FECHA ACTUALIZACION: 30/JUNIO/2025 | PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | PMA-01<br>VERSION 1<br>FECHA 26-12-2024 |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETIVO | 1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.<br>2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.<br>3. Gestionar adecuadamente los recursos asignados<br>4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental |
| 2. META | Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medción del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente. |
| 3. ALCANCE | Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas. |
| 4. RESPONSABILIDADES | Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental |

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (12 MESES)

| ACTIVIDADES | RECURSOS ASIGNADOS | DIRIGIDO A | RESPONSABLES | ESTADO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | % | REGISTRO O SOPORTE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operadores | SST | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES PÉTREOS DE CONSTRUCCIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reporte suministro de materiales a la supervicion del contrato | Humanos, Tecnologicos y Fisicos | SDE- Interventoria | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solicitud a proveedores de certificados del suministro de material | Humanos, Tecnologicos, Financiera y Fisicos | Proveedores | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalar los sitios de acopio temporales de los materiales y realizar el respectivo cerramiento y señalizacion | Humanos, Tecnologicos, Financieros y Fisicos | Residente de Obra - Inspector de Obra - Ayudantes de Obra | Residente de obra, Residente ambiental Ambiental, BCAL, inspectores | P | | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, ESPECIALES Y RCD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a la gestion de los residuos solidos ordinarios. | | BCAL | Residente Ambiental, BCAL e inspectores | P | | | | | | | | | | | | | 82% | | |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a la gestion de los residuos especiales. | Humanos y Fisicos | BCAL | Residente Ambiental, BCAL e inspectores | P | | | | | | | | | | | | | 75% | | |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalar los sitios de acopio temporales de los RCD y realizar el respectivo cerramiento y señalizacion. | Humanos, Tecnologicos, Financieros y Fisicos. | Residente de Obra - Inspector de obra | Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST e inspectores | P | | | | | | | | | | | | | 83% | | |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reporte disposicion de RCD a la supervision del Contrato | Humanos, Tecnologicos y Fisicos | SDE - interventoria | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | 83% | | |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solicitud de la certificacion de la entrega y disposicion de los RCD | Humanos, Tecnologicos, Financieros y Fisicos | Sitio de Disposicion final de RCD | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | 82% | | |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO BELZCON IDRD 1<br>FECHA ACTUALIZACIÓN: 30/JUNIO/2025 | PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | PMA-01<br>VERSION 1<br>FECHA 26-12-2024 |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETIVO | 1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.<br>2. Cumplir a cabalidad con el prgrama de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.<br>3. Gestionar adecuadamente los recursos asignados<br>4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental |
| 2. META | Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente. |
| 3. ALCANCE | Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas. |
| 4. RESPONSABILIDADES | Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. |

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (13 MESES)

| ACTIVIDADES | RECURSOS ASIGNADOS | DIRIGIDO A | RESPONSABLES | ESTADO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | % | REGISTRO O SOPORTE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | | | |
| 6. ETAPA DE CIERRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboracion informe de Cierre Ambiental | Humanos | Contratista - Interventoria | Residente Ambiental | P<br>E | | | | | | | | | | | | | | | |

7. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| FORMULA | VARIABLES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 2 | MES 11 | MES 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Actividades Ejecutadas / # de Actividades Programadas * 100 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 24 | 36 | 35 | 32 | 33 | 34 | 31 | 30 | 31 | 37 | 31 | 24 |
| | ACTIVIDADES EJECUTADAS | 19 | 30 | 33 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 32 | 26 | 24 |
| | RESULTADO | 79% | 83% | 94% | 69% | 73% | 74% | 81% | 90% | 87% | 86% | 84% | 100% |
| | META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

9. RESPONSABLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA: | | FIRMA: | |
| ELABORÓ: | ADRIANA PACHON FAJARDO | REVISÓ: | ENRIQUE GUZMAN |
| CARGO: | ESPECIALISTA AMBIENTAL | CARGO: | DIRECTOR DE OBRA |

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

# Anexo 2 Control de materiales

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

**COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES -COMIND SAS**

**NIT 900186992-4**

## CERTIFICACIÓN COMERCIAL

**COMIND S.A.S.**, identificada con NIT **900.186.992-4,** se permite certificar que el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificado con NIT 901.886.663-3, realizó la compra de Arena 500 en el mes de octubre de 2025, con la siguiente información;

- **CANTIDAD ARENA 500**: 34 Toneladas totales, que equivalen a 22.6 M3.

Que la presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los seis días (06) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

**MARTHA LILIANA PARDO SALINAS**
Representante legal



727

**CODIGO 2025-M009**

CERTIFICACION

Por medio del presente en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES DFL SAS NIT:900814668-8** certifico el material suministrado a la empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con NIT: 901.886.663-3 Para el contrato CONTRATO IDRD N° SG-4060 con objeto:** "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" PIN AMBIENTAL 26732.

Relacionamos cantidades detalladas a continuación:

| OBRA/PARQUE | AREA TOTAL M2 | CANTIDADES (KG) SBR | CANTIDADES (KG) EPDM | MES DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| LA ESPERANZA | 968,34 | 11620,08 | 8715,06 | OCTUBRE |
| | 58,08 | 1742,4 | 522,72 | OCTUBRE |
| | | | | |
| TOTALES | | **13362,48** | **9237,78** | |

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de noviembre del 2025.

Cordialmente,

NINI JOHANA RAMOS
C.C. 35.198.755 DE CHIA
Representante Legal
CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.

Tel.9252730 – Cel. 3134421809 -Email: admonconstruccionesdfl@hotmail.com –
gerencia@construccionesdfl.com – www.construccionesdfl.com
Bogotá DC – Colombia

Concremóvil

Bogotá, noviembre 8 de 2025

Señores
**CONSORCIO BELZCON IDRD 1**
**Nit 901.886.663-3**

Con la presente certificamos el concreto suministrado al CONTRATO IDRD N° SG-4060 Con PIN No. 26732 en el periodo del 1 de octubre al 31 de octubre del año 2025.

| Producto | Volumen (m3) |
|---|---|
| C-3000-4-28-6 | **39** |
| **TOTAL** | **39** |

- Nota: Información con corte al 31 de octubre del 2025.

Cordialmente,

Ing. Miguel Jure Bayona
Gerente Comercial y técnico - Concremovil S.A.S.
Email: Miguel.jure@concremovil.com
Cel: 317-4273397

## ANEXO

| Planta | Fecha | Remisión | Cliente | Obra | Concreto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá - Tun | 4/10/2025 | 40331 | BELZCON SAS | PARQUE NACIONAL | C-3000-4-28-6 | 7 |
| Bogotá - Cazı | 18/10/2025 | 26862 | BELZCON SAS | PARQUE NACIONAL | C-3000-4-28-6 | 7 |
| Bogotá - Tun | 21/10/2025 | 40786 | BELZCON SAS | PARQUE NACIONAL | C-3000-4-28-6 | 7 |
| Bogotá - Tun | 23/10/2025 | 40860 | BELZCON SAS | PARQUE NACIONAL | C-3000-4-28-6 | 7 |
| Bogotá - Tun | 28/10/2025 | 41032 | BELZCON SAS | PARQUE NACIONAL | C-3000-4-28-6 | 7 |
| Bogotá - Tun | 30/10/2025 | 41110 | BELZCON SAS | PARQUE NACIONAL | C-3000-4-28-6 | 4 |

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

# Certificaciones materiales septiembre

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

**CODIGO 2025-M008**

CERTIFICACION

Por medio del presente en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES DFL SAS NIT:900814668-8** certifico el material suministrado a la empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con NIT: 901.886.663-3 Para el contrato CONTRATO IDRD N° SG-4060 con objeto:** "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" PIN AMBIENTAL 26732.

Relacionamos cantidades detalladas a continuación:

| OBRA/PARQUE | AREA TOTAL M2 | CANTIDADES (KG) SBR | CANTIDADES (KG) EPDM | MES DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| LA ESPERANZA | 88,03 | 1584,54 | 792,27 | SEPTIEMBRE |
| | 195,65 | 4695,6 | 1760,85 | SEPTIEMBRE |
| | | | | |
| TOTALES | | 6280,14 | 2553,12 | |

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de noviembre del 2025.

Cordialmente,

NINI JOHANA RAMOS
C.C. 35.198.755 DE CHIA
Representante Legal
CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.

Tel.9252730 – Cel. 3134421809 -Email: admonconstruccionesdfl@hotmail.com –
gerencia@construccionesdfl.com – www.construccionesdfl.com
Bogotá DC – Colombia

| | |
|---|---|
| VECOAGREINT S.A.S | **CERTIFICADO: SUMINISTRO DE MATERIAL** |

| | |
|---|---|
| **MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NO. 20232051011 DEL 22 DE JUNIO DE 2023 REGISTRO DE GESTOR CAR No.54** | **REGISTRO IDU 683 de 2023 Y 687 de 2023** |

| **1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT | 901886663-3 |
| Representante Legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección obra | PARQUES IDRD |
| Teléfono | 3107069144 |
| Correo electrónico | idrdcorrespondencia@idrd.gov.co |
| Municipio o distrito | BOGOTÁ DC |
| Nombre de la Obra | CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES |
| PIN | 26732 |
| **2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR** | |
| Nombre o razón social | VECOAGREINT SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901660184-6 |
| Representante Legal | YEIMEN GAONA BAUTISTA |
| Dirección domicilio | AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2 VÍA PARCELAS, 500M COSTADO IZQUIERDO |
| Teléfono | 3143949448 |
| Correo electrónico | vecoagreintsas@gmail.com |
| **3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR** | |
| *Nota 1. La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.* | |

| VEHÍCULO | TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD m3 | CANTIDAD (Ton) | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|---|
| VOLQUETA DOBLE | AGREGADO RECICLADO | 7 | 11,55 | AR_SBG_PEA50 IDU 2018 - M3 |

| | | |
|---|---|---|
| Total RCD suministrados | 7 | 11,55 |
| Fecha de suministro de material | septiembre-25 | |

| | | |
|---|---|---|
| Nombre del representante legal del proveedor | YEIMEN GAONA BAUTISTA | REPRESENTANTE LEGAL VECOAGREINT SAS |
| CC: 79761226 | FIRMA | |

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios.
Nota: La información suministrada en este certificado referente al generador, lugar de procedencia, obra y demás datos asociados al origen de los RCD´S, es suministrada por el cliente a VECOAGREINT S.AS.; por lo que el generador, con el recibo de este certificado de disposición y/o por haber recibido la prestación del servicio por parte de VECOAGREINT S.A.S, declara y garantiza a VECOAGREINT S.A.S. que la información suministrada es veraz, completa y exonera a VECOAGREINT S.A.S. de toda responsabilidad con respecto a la misma. Esta certificación se emite en el marco del convenio de colaboración suscrito entre VECOAGREINT S.A.S. e INAR – Industria Nacional de Agregados Reciclados, mediante el cual se articula la operación técnica de la planta de aprovechamiento conforme a lo establecido contractualmente, sin que ello implique modificación alguna en los registros y obligaciones ambientales vigentes.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Consecutivo para verificación del certificado | VEAG | 474 | de | 2025 |

VECOAGREINT S.A.S

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

# Anexo 3 Gestión de Residuos

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

ANEXO REPORTE RCD OCTUBRE 2025

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (m3) | ORIGEN | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (m3) | TIPO DE GESTIÓN (Marque con una X la gestión que se adelantara para losRCD) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Disposició n Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | 68,85 | 49 | X | | | | Maquinas Amarillas |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | 66,3 | 39 | CONCRMEOVIL | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | 22,6 | 34 | COMIND | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | 9,23 | | CONSTRUCCIONES DFL | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | 9,16 | 7 | | X | | | RECICLADOS INDUSTRIALES |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | PARQUES | 0,14 | | | | X | | DEPOSITO SAN VICENTE |
| | **02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad. | | | | | | | | | | |

**El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.*

***Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada bajo la gravedad de juramento.*

| | |
|---|---|
| BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | **ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU** |

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | **OCTUBRE DE 2025** |
| Nombre del Proyecto: | CONTRATO IDRD 4060 -2024 - |
| PIN-GEN: 26732 | |

**1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.**

Descripcion:

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

Alto: Ancho: Largo

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

Descripcion detallada:

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

Descripción:

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles : **( Ton )**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): N/A ( Ton )

8. Volumen total reutilizado: **m3**

9. Duración del proceso:**(meses)**

10. Área final recuperada: m2

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: **(%)**

**12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:**

ENRIQUE GUZMAN

**Firma del Representante Legal o Director de obra**

| fecha_transp | placa_transp | pin_transpor | clasif_sitio_d | etapa_RCD | responsable_ | nombre_sitio | dir_sitio_rece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/2025 | SSE015 | 13363 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 |
| 8/10/2025 | SSE015 | 13363 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 |
| 8/10/2025 | FAJ786 | 966 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 |
| 16/10/2025 | SKJ269 | 1316 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 |
| 21/10/2025 | AIG659 | 1027 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 |
| 21/10/2025 | SSE015 | 13363 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 |
| 21/10/2025 | SKJ269 | 1316 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 |
| 9/10/2025 | FAJ786 | 966 | 2 | 3 | CONSORCIO I | RECICLADOS INDUSTRIALES | |

MÁQUINAS AMARILLAS

Bogotá, 7 de noviembre de 2025

CERT-2312-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

**CERTIFICA QUE:**

| **DATOS EL GESTOR** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. |
| Número de identificación | NIT: 900.459.311-1 |
| Representante Legal | HERNANDO LAVERDE MANJARRES |
| Teléfono | +57 (601) 7023060 |
| Correo electrónico | comercial@maquiamarillas.com |
| Dirección | AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20 |
| Municipio o Distrito | BOGOTÁ D.C. |
| Gestor | DISPOSICION FINAL |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR** | |
| Pin de la obra | 26732 |
| Nombre de la obra | CONTRATO IDRD NÂ° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÃfiN, REPARACIÃfiN Y RECUPERACIÃfiN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD |
| Nombre o razón social | BELZCON SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901252860 |
| Representante Legal | BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 26 P 2 |
| Teléfono | 601 8052552 |
| Correo electrónico | facturacion.bzc@gmail.com |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |

| ***TIPO DE RESIDUO*** | ***CANTIDAD M3*** | ***CANTIDAD TON*** |
|---|---|---|
| *1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.* | *28,00* | *35,92* |
| *1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros* | *21,00* | *34,63* |
| *1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso ( drywall) entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| ***Totales:*** | ***49,00*** | ***70,55*** |

Fecha de Recepción RCD el día 01 de octubre de 2025 hasta el día 21 de octubre de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**
Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

Gestor

Operador

Código de Verificación:

Cota, 5 de enero de 2026

CERT-10-2026

Registro CAR No. 64 dando cumplimiento a la resolución 1257 expedida por el Ministerio de ambiente y desarollo, La Granja J&L - Reciclados industriales de Colombia -

**CERTIFICA QUE:**

| **DATOS EL GESTOR** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | LA GRANJA J&L S.A.S |
| Número de identificación | 901.625.481-0 |
| Representante Legal | YESSICA ALEXANDRA PEREZ VARGAS |
| Teléfono | 3136482964 |
| Dirección | VEREDA LA AURORA VIA EL CODITO - LA CALERA |
| Municipio o Distrito | LA CALERA |
| Gestor | PLANTA DE APROVECHAMIENTO |

**Cantidad de RCD recibidos del generador**

| *DESCRIPCION* | *CANTIDAD M3* | *CANTIDAD TON* |
|---|---|---|
| *CONCRETO* | *7,00* | *9,16* |
| ***Totales:*** | ***7,00*** | ***9,16*** |

| | |
|---|---|
| Destino del RCD | APROVECHAMIENTO |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR / CLIENTE** | |
| Nombre del Generador | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Número de identificación | 901886663 |
| Teléfono | 6017689259 |
| Origen / Dirección | GENERAL |
| Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN) | CONTRATO IDRD N° SG-4060 PIN: 26732 |

**CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO**

| **Tipo de Residuo** | **Cantidad de RCD** |
|---|---|
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | - |
| 1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros. | - |
| 1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. | - |
| 1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros. | 9,16 |
| 1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. | - |
| **Total RCD recibidos (toneladas)** | **9,16** |
| Fecha de Recepción RCD el día 09 de octubre de 2025 hasta el día 09 de octubre de 2025 | |

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257 /2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

Yessica Perez V

PP

Representante Legal

Gestor

Operador

Código de Verificación:

Registro CAR No. 64 dando cumplimiento a la resolución 1257 expedida por el Ministerio de ambiente y desarollo, La Granja J&L - Reciclados industriales de Colombia -

**CERTIFICA QUE:**

| ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN | |
|---|---|
| **1. DATOS DEL GENERADOR** | |
| PIN-GEN | 26732 |
| Nombre del proyecto (obra) | CONTRATO IDRD N° SG-4060 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT | 901886663 |
| Representante Legal | BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK |
| Dirección domicilio | Cl 105 # 46 - 26 |
| Teléfono | 6 0 1 7 6 8 9 2 5 9 |
| Correo electrónico | facturacionconsorcioidrd.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | GENERAL |
| **2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD** | |
| **Transportador** | |
| Razón Social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| No. de Identificación | 901886663 |
| Tipo | Ver anexos |
| Placa | Ver anexos |
| No. PIN TRANS | Ver anexos |
| No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador | Ver anexos |
| **3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)** | |
| **Gestor** | |
| PIN del gestor | 27010 |
| NTR | |
| Fecha de recepción RCD | el día 09 de octubre de 2025 hasta el día 09 de octubre de 2025 |
| **Datos del Gestor** | |
| Nombre o Razón Social | LA GRANJA J&L S.A.S |
| Identificación o NIT | 901.625.481-0 |
| Representante Legal | YESSICA ALEXANDRA PEREZ VARGAS |
| Dirección | VEREDA LA AURORA VIA EL CODITO - LA CALERA |
| Municipio | LA CALERA |
| Teléfono de contacto | 3136482964 |
| tablarcd | |
| Nombre del encargado obra | |
| CC | |
| Firma | |

**Nota:** La información incluida en este certificado, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA**, por lo cual declara y garantiza a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** de toda responsabilidad con respecto a la misma.

Gestor

Operador

Código de Verificación:

Jessica Perez V

PP

Representante Legal

CERTIFICADO No. **CERT: 0026**
FECHA DE EMISIÓN: **19 ENERO 2026**

## ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

| DATOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| PIN de gestor de residuos | 20497 | |
| Nombre o razón social | DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S. | |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901437458 - 4 | |
| Representante legal | Fredy Andrey Quiroz Mesa | |
| Dirección | Carrera 69K No. 74B-99 | |
| Teléfono | 310 242 43 42 | |
| Correo electronico | faquiroz1983@gmail.com | |
| Gestor | Punto limpio | X |
| | Planta de aprovechamiento | |
| | Disposición final | |

| DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| PIN de generador de residuos | 26732 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901886663 - 3 |
| Representante legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 - 26 2do piso |
| Teléfono | 601 7 68 92 59 |
| Correo electronico | apachon.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | CONTRATO IDRD No SG-4060 - "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" - CANCHA SINTÉTICA RESOULS |

| CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO | | |
|---|---|---|
| **Periodo reportado:** | **16 DE OCTUBRE DE 2025** | |
| **TIPO DE RCD** *(Total del periodo)* | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** | |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. | X | **CHATARRA:** transportada a PAPELES EL VERGEL al reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros . **REJAS**<br>**RESIDUOS DE OBRA :** selección en SAN VICENTE UNO S.A.S; por tipo y otras variantes, empacado, almacenado, en mayor cantidad transportado a las plantas de tratamiento o recuperación a gran escala; el material restante es empacado y transportado a celdas de seguridad. **CANCHA SINTETICA** |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 2.1. Los contaminados con residuos peligrosos. | | |
| 2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados. | | |
| **Total RCD recibidos /t)** | **0,140 ton** | |
| **Fecha de recepción de los RCD** | **16 DE OCTUBRE DE 2025** | |

Cordialmente,

FIRMA: **DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.**
NIT: **901437458 - 4**
NOMBRE: **FREDY ANDREY QUIROZ MESA**

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

# Certificaciones RCD Septiembre

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

MÁQUINAS AMARILLAS

Bogotá, 7 de noviembre de 2025

CERT-2318-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

**CERTIFICA QUE:**

| DATOS EL GESTOR | |
|---|---|
| Nombre o razón social | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. |
| Número de identificación | NIT: 900.459.311-1 |
| Representante Legal | HERNANDO LAVERDE MANJARRES |
| Teléfono | +57 (601) 7023060 |
| Correo electrónico | comercial@maquiamarillas.com |
| Dirección | AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20 |
| Municipio o Distrito | BOGOTÁ D.C. |
| Gestor | DISPOSICION FINAL |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR** | |
| Pin de la obra | 26732 |
| Nombre de la obra | CONTRATO IDRD NÂ° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÃfiN, REPARACIÃfiN Y RECUPERACIÃfiN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD |
| Nombre o razón social | BELZCON SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901252860 |
| Representante Legal | BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 26 P 2 |
| Teléfono | 601 8052552 |
| Correo electrónico | facturacion.bzc@gmail.com |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |

| *TIPO DE RESIDUO* | *CANTIDAD M3* | *CANTIDAD TON* |
|---|---|---|
| *1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.* | *28,00* | *35,92* |
| *1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| *1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso ( drywall) entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| ***Totales:*** | ***28,00*** | ***35,92*** |

Fecha de Recepción RCD el día 03 de septiembre de 2025 hasta el día 04 de septiembre de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 339071750061769746369**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA ESPERANZA, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA61433 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 12/09/2025 | 3510.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 19/01/2026. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

CONSORCIO Belzcoq
IDRD 1

# Anexo 4 Trazabilidad reportes RCD

CONSORCIO Belzcoa
IDRD 1

# Trazabilidad abril

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

ANEXO REPORTE RCD ABRIL 2025

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (m3) | ORIGEN | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (m3) | TIPO DE GESTIÓN (Marque con una X la gestión que se adelantara para los RCD) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | 01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento | | | | | | | | | | |
| | 01 01 Excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | 124 | 159.06 | X | | | | Maquinas Amarillas |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje | | | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | | | |
| | 01 03 Pétreos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | 11.56 | 8.8 | 6VP PREFABRICADOS | | | | | | X | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material | | | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 No pétreos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y caucho | | | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Asfalto | | | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | | | |
| | 01 05 Metales | | | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | OBRA MATERIAL VIRGEN | 2.06 | | | | X | | CHATARRERIA LA ESMERALDA |
| | 02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento | | | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | | | |
| | 02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad | | | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que la contengan | | | | 0.2 | | | | | | TRACOL |
| | 02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad | | | | 1.41 | | | | | | TRACOL |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada bajo la gravedad de juramento.

| fecha_transp | placa_transp | pin_transpor | clasif_sitio_d | etapa_RCD | responsable_ | nombre_sitio | dir_sitio_rece | vol_mü,,,,,,,,, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/04/2025 | USC745 | 560 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 7 |
| 3/04/2025 | SPT393 | 566 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 3/04/2025 | USC745 | 560 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 7 |
| 4/04/2025 | USC745 | 560 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 7 |
| 23/04/2025 | UPS399 | 1805 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 23/04/2025 | UPS399 | 1805 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 23/04/2025 | USC745 | 560 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 7 |
| 24/04/2025 | UPS399 | 1805 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |

| | |
|---|---|
| BOGOTÁ | ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU |

**Mes del Aprovechamiento:** ABRIL DE 2025

Nombre del Proyecto: CONTRATO IDRD 4060 -2024 -

PIN-GEN: 26732

**1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.**

Descripcion:

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

Alto: Ancho: Largo

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

Descripcion detallada:

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

Descripción:

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Informaciòn de la Reutilización:**

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles : **( Ton )**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): N/A ( Ton )

8. Volumen total reutilizado: **m3**

9. Duración del proceso:**(meses)**

10. Área final recuperada: m2

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: **(%)**

**12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:**

De acuerdo con las actividades contructivas realizadas en el periodo, no se realizó el aprovechamiento de materiales in situ, puesto ue el resultantw de estas actividades no cumplia con las caracteristicas técnica para ser instalado nuevamente en el área intervenida

ENRIQUE GUZMAN

**Firma del Representante Legal o Director de obra**

MÁQUINAS AMARILLAS

CERT-900-2025

Bogotá, 21 de mayo de 2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

**CERTIFICA QUE:**

| **DATOS EL GESTOR** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. |
| Número de identificación | NIT: 900.459.311-1 |
| Representante Legal | HERNANDO LAVERDE MANJARRES |
| Teléfono | +57 (601) 7023060 |
| Correo electrónico | comercial@maquiamarillas.com |
| Dirección | AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20 |
| Municipio o Distrito | BOGOTÁ D.C. |
| Gestor | DISPOSICION FINAL |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR** | |
| Pin de la obra | 26732 |
| Nombre de la obra | CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD |
| Nombre o razón social | BELZCON SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901252860 |
| Representante Legal | BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK |
| Dirección domicilio | CI 105 46 26 P 2 |
| Teléfono | 601 8052552 |
| Correo electrónico | facturacion.bzc@gmail.com |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |

| *TIPO DE RESIDUO* | *CANTIDAD M3* | *CANTIDAD TON* |
|---|---|---|
| *1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.* | *124,00* | *159,06* |
| *1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| *1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso ( drywall) entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| ***Totales:*** | ***124,00*** | ***159,06*** |

Fecha de Recepción RCD el día 03 de abril de 2025 hasta el día 25 de abril de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**
Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 58553013899363731285458 48**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA SERENA, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA56161 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 25/04/2025 | 230.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.

2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 23/12/2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 659588995553114146935**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA SERENA, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA56161 | Residuos Solidos Especiales | 25/04/2025 | 200.00 | Residuos Solidos Especiales | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.

2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 23/12/2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 58553080262727932604540 47**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA SERENA, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA56161 | TEJA DE ASBESTO CEMENTO | 25/04/2025 | 1250.00 | TEJA DE ASBESTO CEMENTO | No aplica | | Y36 - Asbesto (polvo y fibras) |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 23/12/2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

# Trazabilidad mayo

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

| fecha_transp | placa_transp | pin_transport | clasif_sitio_di | etapa_RCD | responsable_ | nombre_sitio | dir_sitio_rece | vol_mü,,,,,,,,, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 2/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 3/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 5/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 5/05/2025 | STR 897 | 26292 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 5/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 5/05/2025 | STR 897 | 26292 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 5/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 5/05/2025 | STR 897 | 26292 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 6/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 6/05/2025 | STR 897 | 26292 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 7/05/2025 | STR 897 | 26292 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 8/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 8/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 9/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 10/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 12/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 12/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 12/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 15/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 29/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 29/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 31/05/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 28/05/2025 | THY 433 | 21286 | 3 | 2 | CONSORCIO I | GRECO | AUTOPISTA N | 14 |
| 29/05/2025 | THY 433 | 21286 | 3 | 2 | CONSORCIO I | GRECO | AUTOPISTA N | 14 |

| | | ANEXO REPORTE RCD MAYO 2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (m3) | ORIGEN | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (m3) | TIPO DE GESTIÓN (Marque con una X la gestión que se adelantara para los RCD) | | | | |
| | | | | | | | Disposición Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | 01 01 Excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Cobertura vegetales | | | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | 432,53 | 345 | X | | | | Maquinas Amarillas |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje | | | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Ranchonitas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | | | |
| | 01 03 Pétreos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | 86,2 | 51 | CONCRIMIXTA | | | | | | | |
| | 01 03 02 Grasas | | | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | 19,47 | 9,65 | ARKA LADRILLERA SAN JOAQUIN | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | 68,12 | 45,5 | CEMMIX | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | | | |
| | 01 01 08 Residuos de material | | | | 51,2 | 40 | | X | | | GRECO |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | 167,4 | 112 | GRECO | | | | X | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 No pétreos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (Dry wall) | | | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Asfalto | | | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base Fibrocemento | | | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | | | |
| | 01 05 Metales | | | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | PARQUES | 2,25 | | | | X | | CHATARRERIA ARRIBA DE LA CUENCA DE RIO DESPUES SAN VICENTE 0 515 |
| | **02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad** | | | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad | | | PARQUES | 2,81 | | | | | X | TRACOL |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada bajo la gravedad de juramento.

| | |
|---|---|
| BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | **ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU** |

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | **MAYO DE 2025** |
| Nombre del Proyecto: | CONTRATO IDRD 4060 -2024 - |
| PIN-GEN: 26732 | |

**1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.**

Descripcion:

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

Alto: Ancho: Largo

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

Descripcion detallada:

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

Descripción:

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles : **( Ton )**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): N/A ( Ton )

8. Volumen total reutilizado: **m3**

9. Duración del proceso:**(meses)**

10. Área final recuperada: m2

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: **(%)**

**12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:**

De acuerdo con las actividades contructivas realizadas en el periodo, no se realizó el aprovechamiento de materiales in situ, puesto ue el resultantw de estas actividades no cumplia con las caracteristicas técnica para ser instalado nuevamente en el área intervenida

ENRIQUE GUZMAN

**Firma del Representante Legal o Director de obra**

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | ANEXO VI - CONSTANCIA DE MATERIALES PÉTREOS Y NO PÉTREOS VALORIZADOS DE RCD |
|---|---|
| **1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO** | |
| **Nombre o razón social** | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| **Documento de identificación o NIT** | 901.886.663-3 |
| **Representante Legal** | Willy Patrick Belzner Salazar |
| **Dirección** | Cl. 105 #46 – 26 |
| **Teléfono** | 3107069144 |
| **Correo electrónico** | APACHON.BZC@GMAIL.COM |
| **Municipio o distrito** | BOGOTÁ D.C. |
| **Nombre de la Obra** | CONTRATO IDRD N° SG-4060 |
| **PIN-GEN** | 26732 |
| **2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR** | |
| **PIN-PROV** | 26495 |
| **Nombre o razón social** | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS |
| **Documento de identificación o NIT** | 900767473-7 |
| **Representante Legal** | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZÁLEZ |
| **Dirección domicilio** | Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota |
| **Teléfono** | 304 6383774 |
| **Correo electrónico** | jcastillo@recicladosgreco.com |

**3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR**

*Nota 1. La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.*

*Nota 2. Se debe anexar certificados, soportes de estudios técnicos de laboratorios, y/o ficha técnica de la composición del material valorizado*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD (Ton) | CARACTERISTICAS /COMPOSICIÓN |
|---|---|---|
| SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 162,40 | CONCRETOS + GRAVAS + CANTOS + LADRILLOS + ARENAS + MORTEROS + MATERIALES CERÁMICOS + RESIDUOS DE MATERIAL ASFÁLTICO + BASES Y SUB BASES GRANULARES + OTROS RESIDUOS PETREOS |
| **Total RCD suministrados (Ton)** | 162,4 | |
| **Fecha de suministro de material** | DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 | |

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C. o NIT** 900767473-7
**NOMBRE** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

**CONSECUTIVO** CTA-2025-VA-01582
**FECHA DE EMISIÓN** 2/07/2025



759

CONSORCIO Belzcoq
IDRD 1

# Trazabilidad junio

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

| | fecha_transp | placa_transp | pin_transport | clasif_sitio_di | etapa_RCD | responsable_ | nombre_sitio | dir_sitio_rece | vol_mü,,,,,,,, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180252 | 4/06/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 180181 | 4/06/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 180545 | 5/06/2025 | STR 897 | 26292 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 180491 | 5/06/2025 | STR 897 | 26292 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 180555 | 5/06/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 180623 | 5/06/2025 | STR 897 | 26292 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 180543 | 5/06/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 180696 | 5/06/2025 | STR 897 | 26292 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 180850 | 6/06/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 180755 | 6/06/2025 | STR 897 | 26292 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 180718 | 6/06/2025 | THY 433 | 21286 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| 180845 | 6/06/2025 | STR 897 | 26292 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 15 |
| | 6/06/2025 | THY 433 | 21286 | 3 | 2 | CONSORCIO I | GRECO | AUTOPISTA N | 14 |

ANEXO REPORTE RCD JUNIO 2025

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (m3) | ORIGEN | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (m3) | TIPO DE GESTIÓN (Marque con una X la gestión que se adelantara para losRCD) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Disposició n Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | 01 01 Excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | 230,88 | 180 | X | | | | Maquinas Amarillas |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | 385,9 | 227 | CONCRMEOVIL | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | 5,8 | 2,4 | LADRILLERA SAN JOAQUIN | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | 102,24 | 68,16 | COMIND | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | 17,92 | 14 | | X | | | GRECO |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | 204 | 120 | DROMOS | | | | X | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | PARQUES | 2,71 | | | | X | | DEPOSITO SAN VICENTE |
| | **02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad. | | | PARQUES | 1,38 | | | | | X | TRACOL |

**El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.*

***Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada bajo la gravedad de juramento.*

| | |
|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU |

**Mes del Aprovechamiento:** JUNIO DE 2025

Nombre del Proyecto: CONTRATO IDRD 4060 -2024 -

PIN-GEN: 26732

**1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.**

Descripcion:

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

Alto: Ancho: Largo

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

Descripcion detallada:

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

Descripción:

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles : **( Ton )**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): N/A ( Ton )

8. Volumen total reutilizado: **m3**

9. Duración del proceso:**(meses)**

10. Área final recuperada: m2

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: **(%)**

**12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:**

De acuerdo con las actividades contructivas realizadas en el periodo, no se realizó el aprovechamiento de materiales in situ, puesto ue el resultantw de estas actividades no cumplia con las caracteristicas técnica para ser instalado nuevamente en el área intervenida

ENRIQUE GUZMAN

**Firma del Representante Legal o Director de obra**

MÁQUINAS AMARILLAS

Bogotá, 4 de julio de 2025

CERT-1210-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

**CERTIFICA QUE:**

| **DATOS EL GESTOR** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. |
| Número de identificación | NIT: 900.459.311-1 |
| Representante Legal | HERNANDO LAVERDE MANJARRES |
| Teléfono | +57 (601) 7023060 |
| Correo electrónico | comercial@maquiamarillas.com |
| Dirección | AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20 |
| Municipio o Distrito | BOGOTÁ D.C. |
| Gestor | DISPOSICION FINAL |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR** | |
| Pin de la obra | 26732 |
| Nombre de la obra | CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD |
| Nombre o razón social | BELZCON SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901252860 |
| Representante Legal | BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 26 P 2 |
| Teléfono | 601 8052552 |
| Correo electrónico | facturacion.bzc@gmail.com |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |

| *TIPO DE RESIDUO* | *CANTIDAD M3* | *CANTIDAD TON* |
|---|---|---|
| *1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.* | *180,00* | *230,89* |
| *1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| *1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso ( drywall) entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| ***Totales:*** | ***180,00*** | ***230,89*** |

Fecha de Recepción RCD el día 04 de junio de 2025 hasta el día 06 de junio de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

**Consecutivo para la verificación del certificado:** PBT VD A001952-106-2025-CV1819

**Generado el:** 2025-08-29

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S**

**NIT. 900767473-7**

**PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD**

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con NIT 901.886.663-3 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con el Nit 901.886.663-3 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-06-01 al 2025-06-30 para la obra CONTRATO IDRD N° SG-4060, cuyo objeto es: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES con pin de obra 26732, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

| Material/RCD (*) | Cant. Viajes | Volumen (m3) | Peso (Tn) |
|---|---|---|---|
| Asfalto | 1 | 14 | 17.92 |
| Totales | 1 | 14 | 17.92 |

**Observaciones:**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2025-08-29, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

**JAVIER CASTILLO GONZALEZ**

Director Comercial

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

765

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una* ***COPIA NO CONTROLADA"***

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

| DATOS BÁSICOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| **Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto** | 013 y 19309 | |
| **Nombre o razón social** | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS | |
| **Documento de identificación o NIT** | 900767473-7 | |
| **Representante Legal** | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ | |
| **Dirección** | KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín | |
| **Teléfono** | 3046383774 | |
| **Correo electrónico** | dircomercial@recicladosgreco.com | |
| **Municipio o Distrito** | Cota - Cundinamarca | |
| **Gestor** | Punto limpio | |
| | Planta de aprovechamiento | X |
| | Disposición final | |
| **DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR** | | |
| **Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto** | 26732 | |
| **Nombre o razón social** | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | |
| **Documento de identificación o NIT** | 901.886.663-3 | |
| **Representante Legal** | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR | |
| **Dirección domicilio** | Cl. 105 #46 – 26 piso 2, | |
| **Teléfono** | 3107069144 | |
| **Correo electrónico** | apachon.bzc@gmail.com | |

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Dirección de generación de RCD** | PARQUES BOGOTÁ D.C |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |
| **Tipo de Residuo** | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | - |
| **1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.** | - |
| **1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.** | - |
| **1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.** | 14 m3 en<br>Toneladas 17.92 |
| **1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.** | - |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | - |
| **2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.** | - |
| **2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.** | - |
| **2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.** | - |
| **Total RCD recibidos (t)** | 14 m3 en<br>Toneladas 17.92 |
| **Fecha de recepción de los RCD** | 01 de junio al 30 de junio de 2025 |

Firma

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

# Anexo IV CONSTANCIA DE GESTIÓN – Decreto 507 de 2023

(Aplicable solo para gestores de puntos limpios, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)

| 1. DATOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| | PBT VD A001952-106-2025-CV1819 |
| PIN - GEN | 26732 |
| Nombre del proyecto (obra) | CONTRATO IDRD N° SG-4060 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Identificación o NIT | 901.886.663-3 |
| Representante Legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección domicilio | Cl. 105 #46 – 26 piso 2, |
| Teléfono | 3107069144 |
| Correo electrónico | apachon.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | PARQUES BOGOTÁ D.C |

**2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD**

| Transportador | Razón Social | No de Identificación | Vehículos autorizados | Tipo | No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador | No. PIN TRANS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO ROJAS SALAMANCA | 79546227 | 79546227 | THY433 | Doble | 1 | 21286 |

**3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD) | Punto Limpio | | Sitio de disposición fina | | Recuperador Especifico | |
| | Receptor | | Planta de tratamiento y/o aprovechamiento | x | Otro ¿Cuál? | |

| PIN del gestor | 26491 y 19309 |
|---|---|
| NTR | PBT VD A001952-106-2025-CV1819 |
| Fecha de recepción RCD | 01 de junio al 30 de junio de 2025 |

| Datos del Gestor | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S |
| Identificación o NIT | 900.767.473-7 |

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | **CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S** | **Código:** FO-CM-005<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** 25/07/2025 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Representante Legal | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ |
| Dirección | Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur |
| Municipio | Cota (Cundinamarca) |
| Teléfono | 3046383774 |

| **01 RDC susceptibles de aprovechamiento** | | |
|---|---|---|
| **01 01 Excavación** | | **Ton** |
| 01 01 01 | Coberturas vegetales | |
| 01 01 02 | Tierras limpias de excavación | |
| 01 01 03 | Limos | |
| 01 01 04 | Materiales petreos de excavación | |
| 01 01 05 | Otros residuos de excavación | |

| **01 02 Productos de cimentación y pilotaje** | | **Ton** |
|---|---|---|
| 01 02 01 | Arcillas | |
| 01 02 02 | Bentonitas | |
| 01 02 03 | Otros residuos de cimentación y pilotaje | |

| **01 04 No pétreos M** | | **Ton** |
|---|---|---|
| 01 04 01 | Madera | |
| 01 04 02 | Plásticos | |
| 01 04 03 | Vidrio | |
| 01 04 04 | Papel y cartón | |
| 01 04 05 | Gomas y cauchos | |
| 01 04 06 | Cartón yeso (Drywall) | |

| **01 03 Pétreos** | | **Ton** |
|---|---|---|
| 01 03 01 | Concretos | |
| 01 03 02 | Gravas | |
| 01 03 03 | Cantos | |
| 01 03 04 | Ladrillos | |
| 01 03 05 | Arenas | |
| 01 03 06 | Morteros | |
| 01 03 07 | Materiales cerámicos | |
| 01 03 08 | Residuos de material asfáltico | 17.92 ton |
| 01 03 09 | Bases y sub bases granulares | |
| 01 03 10 | Otros residuos pétreos | |

| **01 05 Metales** | | **Ton** |
|---|---|---|
| 01 05 01 | Acero y hierro | |
| 01 05 02 | Zinc | |
| 01 05 03 | Cobre | |
| 01 05 04 | Aluminio | |
| 01 05 05 | Otros metales | |

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | **CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S** | **Código:** FO-CM-005<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** 25/07/2025 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 01 04 07 | Acrílico | |
| 01 04 08 | Mezclas bituminosas y alquitrán | |
| 01 04 09 | Materiales a base de fibrocemento | |
| 01 04 10 | Otros residuos no pétreos | |

| **02 RCD – No susceptibles de aprovechamiento** | | **Ton** |
|---|---|---|
| 02 01 | Los que por su estado no pueden ser aprovechados | |
| 02 02 | Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado. | |
| 02 02 | Los que tengan características de peligrosidad | |
| 02 02 01 | Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | |
| 02 02 02 | Otros residuos con características de peligrosidad | |

| **FIRMAS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del encargado de obra** | | **CC** | | **Firma** | |
| **Nombre del representante legal gestor** | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ | **CC** | 900.767.473-7 | **Firma** |  |

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 689897378940515417886229 59**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PORVENIR, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA58322 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 13/06/2025 | 5130.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 22/12/2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 514026655944008012903420 4**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - EL COUNTRY, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA58014 | RESIDUOS DE MADERA AGLOMERADA O ESPECIAL | 04/06/2025 | 360.00 | RESIDUOS DE MADERA AGLOMERADA O ESPECIAL | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.

2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 23/12/2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 5140329777501535779389564**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA SERENA, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA58014 | TEJA DE ASBESTO CEMENTO | 04/06/2025 | 650.00 | TEJA DE ASBESTO CEMENTO | No aplica | | Y36 - Asbesto (polvo y fibras) |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 22/12/2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

**TRACOL S.A.S E.S.P**
**NIT. 900.962.813-3 - Bogotá D.C.**

Recibo Número: 15279

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Placa:** | SMD710 | **Fecha Entrada:** | 4/06/2025 2:00:10 p. m. |
| | | **Fecha Salida:** | 4/06/2025 3:31:33 p. m. |
| **Bruto:** | 4190 | **Empresa:** | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS |
| **Tara:** | 2810 | | |
| **Neto:** | 1380 | **Producto:** | SOLIDOS CONTAMINADOS |
| | | **Conductor:** | GILBERTO COGARIA |
| **Precio:** | 1 | **Procedencia:** | SIN PRETRATAMIENTO |
| | | **Usuario:** | 1 |

**Observaciones:** TRA58014

PESADO POR:

CONDUCTOR:

| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE REVISIÓN |
|---|---|---|
| FO-RT-01 | V2 | 10/24/18 |

## MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS

| Solicitud No. | Transportador de los Residuos | Receptor de los Residuos |
|---|---|---|
| TRA58014 | **2.1. Razón Social:** CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS | **3.1. Razón Social:** TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS |
| | **2.2. Ciudad/Dirección:** CL 23 NO. 72 D - 27 TO 1 AP 1206 | **3.2. Ciudad/Dirección:** Parque industrial San Jorge |
| | **2.3. Teléfono:** 3105757100 | **3.3. Teléfono:** 3045935404 |
| | **2.4. Fecha Transporte:** 04/06/2025 | **3.4. Fecha Transporte:** 04/06/2025 |

### INFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS

| Cliente | Sede | Tipo Residuo | Tipo | Cantidad | Peso | R Fotográfico | Canecas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - EL COUNTRY | Residuos Solidos Especiales | bolsas plasticas | 3 | 370 | no | no | |
| CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA SERENA | TEJA DE ASBESTO CEMENTO | otro | 2 | 650 | no | no | |
| CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - EL COUNTRY | RESIDUOS DE MADERA AGLOMERADA O ESPECIAL | otro | 3 | 360 | no | no | |

### INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** N/A | **Placa del Vehículo:** SMD710 | **Nombre Conductor:** GILBERTO COGARIA | **Teléfono de Emergencia:** 3105757100 |
| **C.C.:** N/A | **Firma:** | | |

276

TRACOL

**TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP**
NIT: 900.962.813-3 **Recibo No. TRA58014**

# RECIBO DE RECEPCIÓN

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificada con NIT No. **901886663-1** de la sede **CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - EL COUNTRY**, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS**, quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117-1**, entregó a **TRACOL S.A.S ESP** los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

**INFORMA QUE:**

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Peso (Kg) | Fecha de Recepción | Nombre Declarado |
|---|---|---|---|---|
| TRA58014 | RESIDUOS DE MADERA AGLOMERADA O ESPECIAL | 360 | 04/06/2025 | SOLIDOS CONTAMINADOS O CADUCADOS |

**RECIBO DE RECEPCIÓN NO VALIDA COMO ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL**

Nota: El peso relacionado es peso aproximado generado en la solicitud, el real será entregado en el acta de disposición final.

El material se tratará de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: "Almacenamiento, tratamiento y disposición final en celda de desechos peligrosos".
2. Licencia ambiental cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de julio de 2017 a TRACOL SAS ESP Nit. 900962813-3.

Cualquier información adicional relacionada con este recibo se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

**Planta**

Km 4 vía La Mesa Sector Los Puentes
Vereda Balsillas - Mosquera

**Oficina principal**

Calle 3 No. 17-03 L1-187
Parque Industrial San Jorge - Mosquera

**Contacto**

**304 593 5404**
info@tracolsas.com
www.tracolsas.com

**TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP**
NIT: 900.962.813-3 **Recibo No. TRA58014**

# RECIBO DE RECEPCIÓN

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificada con NIT No. **901886663-1** de la sede **CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - EL COUNTRY**, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS**, quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117-1**, entregó a **TRACOL S.A.S ESP** los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

**INFORMA QUE:**

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Peso (Kg) | Fecha de Recepción | Nombre Declarado |
|---|---|---|---|---|
| TRA58014 | Residuos Solidos Especiales | 370 | 04/06/2025 | SOLIDOS CONTAMINADOS O CADUCADOS |

**RECIBO DE RECEPCIÓN NO VALIDA COMO ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL**

Nota: El peso relacionado es peso aproximado generado en la solicitud, el real será entregado en el acta de disposición final.

El material se tratará de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: "Almacenamiento, tratamiento y disposición final en celda de desechos peligrosos".
2. Licencia ambiental cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de julio de 2017 a TRACOL SAS ESP Nit. 900962813-3.

Cualquier información adicional relacionada con este recibo se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

**Planta**
Km 4 vía La Mesa Sector Los Puentes
Vereda Balsillas - Mosquera

**Oficina principal**
Calle 3 No. 17-03 L1-187
Parque Industrial San Jorge - Mosquera

**Contacto**
**304 593 5404**
info@tracolsas.com
www.tracolsas.com

TRACOL

**TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP**
NIT: 900.962.813-3 **Recibo No. TRA58014**

# RECIBO DE RECEPCIÓN

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificada con NIT No. **901886663-1** de la sede **CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA SERENA**, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS**, quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117-1**, entregó a **TRACOL S.A.S ESP** los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

**INFORMA QUE:**

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Peso (Kg) | Fecha de Recepción | Nombre Declarado |
|---|---|---|---|---|
| TRA58014 | TEJA DE ASBESTO CEMENTO | 650 | 04/06/2025 | ASBESTO |

**RECIBO DE RECEPCIÓN NO VALIDA COMO ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL**

Nota: El peso relacionado es peso aproximado generado en la solicitud, el real será entregado en el acta de disposición final.

El material se tratará de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: "Almacenamiento, tratamiento y disposición final en celda de desechos peligrosos".
2. Licencia ambiental cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de julio de 2017 a TRACOL SAS ESP Nit. 900962813-3.

Cualquier información adicional relacionada con este recibo se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

**Planta**
Km 4 vía La Mesa Sector Los Puentes
Vereda Balsillas - Mosquera

**Oficina principal**
Calle 3 No. 17-03 L1-187
Parque Industrial San Jorge - Mosquera

**Contacto**
**304 593 5404**
info@tracolsas.com
www.tracolsas.com

CERTIFICADO No. **CERT: 0435**
FECHA DE EMISIÓN: **01 SEPTIEMBRE 2025**

## ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

| DATOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| PIN de gestor de residuos | 20497 | |
| Nombre o razón social | DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S. | |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901437458 - 4 | |
| Representante legal | Fredy Andrey Quiroz Mesa | |
| Dirección | Carrera 69K No. 74B-99 | |
| Teléfono | 310 242 43 42 | |
| Correo electronico | faquiroz1983@gmail.com | |
| Gestor | Punto limpio | X |
| | Planta de aprovechamiento | |
| | Disposición final | |

| DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| PIN de generador de residuos | 26732 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901886663 - 3 |
| Representante legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 - 26 2do piso |
| Teléfono | 601 7 68 92 59 |
| Correo electronico | apachon.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | CONTRATO IDRD nro: SG - 4060 - EL COUNTRY |

| CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO | |
|---|---|
| **Periodo reportado:** | **06 DE JUNIO DE 2025** |
| **TIPO DE RCD** *(Total del periodo)* | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | |
| 1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. | X **MADERA:** transportada a la comapñia PRIMADERA para el tratamiento de ésta. es seleccionada, triturada y almacenada para la creación de láminas, postas, Industrias maderera entre otras ***10 mtr³*** |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | |
| 2.1. Los contaminados con residuos peligrosos. | |
| 2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados. | |
| **Total RCD recibidos /t)** | **10 mtr3** |
| **Fecha de recepción de los RCD** | **06 DE JUNIO DE 2025** |

Cordialmente,

FIRMA: **DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.**
NIT: **901437458 - 4**
NOMBRE: **FREDY ANDREY QUIROZ MESA**

CERTIFICADO No. **CERT: 0436**
FECHA DE EMISIÓN: **01 SEPTIEMBRE 2025**

## ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

| DATOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| PIN de gestor de residuos | 20497 | |
| Nombre o razón social | DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S. | |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901437458 - 4 | |
| Representante legal | Fredy Andrey Quiroz Mesa | |
| Dirección | Carrera 69K No. 74B-99 | |
| Teléfono | 310 242 43 42 | |
| Correo electronico | faquiroz1983@gmail.com | |
| Gestor | Punto limpio | X |
| | Planta de aprovechamiento | |
| | Disposición final | |

| DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| PIN de generador de residuos | 26732 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901886663 - 3 |
| Representante legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección domiciio | Cl 105 46 - 26 2do piso |
| Teléfono | 601 7 68 92 59 |
| Correo electronico | apachon.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | CONTRATO IDRD nro: SG - 4060 - PALESTINA |

| CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO | | |
|---|---|---|
| **Periodo reportado:** | 07 DE JUNIO DE 2025 | |
| **TIPO DE RCD** *(Total del periodo)* | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** | |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. | X | **CHATARRA: transportada a PAPELES EL VERGEL al reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros 0,380 ton** |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 2.1. Los contaminados con residuos peligrosos. | | |
| 2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados. | | |
| **Total RCD recibidos /t)** | **0,380 ton** | |
| **Fecha de recepción de los RCD** | **07 DE JUNIO DE 2025** | |

Cordialmente,

FIRMA: **DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.**
NIT: **901437458 - 4**
NOMBRE: **FREDY ANDREY QUIROZ MESA**

CONSORCIO Belzcoa
IDRD 1

# Trazabilidad julio

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

ANEXO REPORTE RCD JULIO 2025

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (m3) | ORIGEN | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (m3) | TIPO DE GESTIÓN (Marque con una X la gestión que se adelantara para losRCD) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Disposició n Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | 17,96 | 14 | X | | | | Maquinas Amarillas |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | 22,4 | 14 | CONCRMEOVIL | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | 156,13 | 104 | COMIND | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | | | | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | 9,4 | 6 | SECAM JR | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | 6,7 | | CONSTRUCCIONES DFL | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | PARQUES | 1,48 | | | | X | | DEPOSITO SAN VICENTE |
| | **02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad. | | | PARQUES | 26,18 | | | | | X | TRACOL |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.*

***Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada bajo la gravedad de juramento.*

| | |
|---|---|
| BOGOTÁ | ANEXO VI. CONSTANCIA DE MATERIALS PÉTREOS Y NO PÉTREOS VALORIZADOS DE RCD |

| 1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO | |
|---|---|
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT | 901.886.663-3 |
| Representante Legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR, |
| Dirección | Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá) |
| Teléfono | 3107069144 |
| Correo electrónico | apachon.bzc@gmail.com |
| Municipio o distrito | BOGOTÁ |
| Nombre de la Obra | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES |
| PIN-GEN | 26732 |
| **2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR** | |
| PIN-PROV | |
| Nombre o razón social | SECAM JR |
| Documento de identificación o NIT | 830507163 |
| Representante Legal | ANGIE PANQUEVA |
| Dirección domicilio | AUTOPISTA MEDELLIN K1,5 PUENTE DE GUADUA |
| Teléfono | 3015981851 |
| Correo electrónico | solicitudes.soacha@secamjr.com |

**3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR**

**Nota 1.** La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.
**Nota 2.** Se debe anexar certificados, soportes de estudios técnicos de laboratorios, y/o ficha técnica de la composición del material valorizado

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD (Ton) | CARACTERISTICAS /COMPOSICIÓN |
|---|---|---|
| SBG-PEA | 13,6 | SUBBASE GRANULAR TIPO PEATONAL - RECICLADA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total RCD suministrados (Ton) | 13,6 | |
| Fecha de suministro de mater | 7/07/2025 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NIT 901.886.663-3

| | |
|---|---|
| BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU |

**Mes del Aprovechamiento:** JULIO DE 2025

Nombre del Proyecto: CONTRATO IDRD 4060 -2024 -

PIN-GEN: 26732

**1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.**

Descripcion:

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

Alto: Ancho: Largo

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

Descripcion detallada:

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

Descripción:

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Informacion de la Reutilización:**

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles : **( Ton )**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): N/A ( Ton )

8. Volumen total reutilizado: **m3**

9. Duración del proceso:**(meses)**

10. Área final recuperada: m2

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: **(%)**

**12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:**

De acuerdo con las actividades contructivas realizadas en el periodo, no se realizó el aprovechamiento de materiales in situ, puesto ue el resultantw de estas actividades no cumplia con las caracteristicas técnica para ser instalado nuevamente en el área intervenida

ENRIQUE GUZMAN

**Firma del Representante Legal o Director de obra**

| fecha_transp | placa_transp | pin_transport | clasif_sitio_di | etapa_RCD | responsable_ | nombre_sitio | dir_sitio_rece | vol_mü,,,,,,,, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07/2025 | AMA959 | 20229 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 7 |
| 1/07/2025 | AMA959 | 20229 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 7 |

MÁQUINAS AMARILLAS

Bogotá, 22 de agosto de 2025

CERT-1670-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

**CERTIFICA QUE:**

| **DATOS EL GESTOR** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. |
| Número de identificación | NIT: 900.459.311-1 |
| Representante Legal | HERNANDO LAVERDE MANJARRES |
| Teléfono | +57 (601) 7023060 |
| Correo electrónico | comercial@maquiamarillas.com |
| Dirección | AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20 |
| Municipio o Distrito | BOGOTÁ D.C. |
| Gestor | DISPOSICION FINAL |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR** | |
| Pin de la obra | 26732 |
| Nombre de la obra | CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD |
| Nombre o razón social | BELZCON SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901252860 |
| Representante Legal | BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 26 P 2 |
| Teléfono | 601 8052552 |
| Correo electrónico | facturacion.bzc@gmail.com |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |

| *TIPO DE RESIDUO* | *CANTIDAD M3* | *CANTIDAD TON* |
|---|---|---|
| *1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.* | *14,00* | *17,96* |
| *1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| *1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso ( drywall) entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| ***Totales:*** | ***14,00*** | ***17,96*** |

Fecha de Recepción RCD el día 01 de julio de 2025 hasta el día 02 de julio de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 038486650957824771972**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PORVENIR, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA58844 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 07/07/2025 | 10380.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 23/12/2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 381040329725858420051**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA SERENA, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA59089 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 09/07/2025 | 9480.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 22/12/2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 941001624941576148021**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - SIMON BOLIVAR SECTOR CENTRAL ZONA 6, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA59131 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 10/07/2025 | 5060.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 22/12/2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 795837362726894545935**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - SIMON BOLIVAR SECTOR CENTRAL ZONA 6, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA59768 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 28/07/2025 | 1260.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 19/01/2026. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

CERTIFICADO No. **CERT: 0440**
FECHA DE EMISIÓN: **01 SEPTIEMBRE 2025**

## ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

| DATOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| PIN de gestor de residuos | 20497 | |
| Nombre o razón social | DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S. | |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901437458 - 4 | |
| Representante legal | Fredy Andrey Quiroz Mesa | |
| Dirección | Carrera 69K No. 74B-99 | |
| Teléfono | 310 242 43 42 | |
| Correo electronico | faquiroz1983@gmail.com | |
| Gestor | Punto limpio | X |
| | Planta de aprovechamiento | |
| | Disposición final | |

| DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| PIN de generador de residuos | 26732 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901886663 - 3 |
| Representante legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 - 26 2do piso |
| Teléfono | 601 7 68 92 59 |
| Correo electronico | apachon.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | CONTRATO IDRD nro: SG - 4060 - PALESTINA |

| CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO | | |
|---|---|---|
| **Periodo reportado:** | 15 DE JULIO DE 2025 | |
| **TIPO DE RCD** *(Total del periodo)* | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** | |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. | X | **CHATARRA: transportada a PAPELES EL VERGEL al reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros 0,310 ton rejas** |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 2.1. Los contaminados con residuos peligrosos. | | |
| 2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados. | | |
| **Total RCD recibidos /t)** | 0,310 ton | |
| **Fecha de recepción de los RCD** | 15 DE JULIO DE 2025 | |

Cordialmente,

FIRMA: **DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.**
NIT: **901437458 - 4**
NOMBRE: **FREDY ANDREY QUIROZ MESA**

Deposito SAN VICENTE UNO SAS

CERTIFICADO No. **CERT: 0441**
FECHA DE EMISIÓN: **01 SEPTIEMBRE 2025**

## ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

| DATOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| PIN de gestor de residuos | 20497 | |
| Nombre o razón social | DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S. | |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901437458 - 4 | |
| Representante legal | Fredy Andrey Quiroz Mesa | |
| Dirección | Carrera 69K No. 74B-99 | |
| Teléfono | 310 242 43 42 | |
| Correo electronico | faquiroz1983@gmail.com | |
| Gestor | Punto limpio | X |
| | Planta de aprovechamiento | |
| | Disposición final | |

| DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| PIN de generador de residuos | 26732 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901886663 - 3 |
| Representante legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección domiciio | Cl 105 46 - 26 2do piso |
| Teléfono | 601 7 68 92 59 |
| Correo electronico | apachon.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | CONTRATO IDRD nro: SG - 4060 - SIMON BOLIVAR |

| CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO | | |
|---|---|---|
| **Periodo reportado:** | 22 DE JULIO DE 2025 | |
| TIPO DE RCD *(Total del periodo)* | Cantidad de RCD recibidos del generador (t) | |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. | X | **CHATARRA: transportada a PAPELES EL VERGEL al reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros**<br>**0,610 ton + 0,560 ton = 1,170 ton** |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 2.1. Los contaminados con residuos peligrosos. | | |
| 2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados. | | |
| **Total RCD recibidos /t)** | **1,170 ton** | |
| **Fecha de recepción de los RCD** | **22 DE JULIO DE 2025** | |

Cordialmente,

FIRMA: **DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.**
NIT: **901437458 - 4**
NOMBRE: **FREDY ANDREY QUIROZ MESA**

**CODIGO 2025-M005**

# CERTIFICACION

Por medio del presente en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES DFL SAS NIT:900814668-8** certifico el material suministrado a la empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con NIT: 901.886.663-3 Para el contrato CONTRATO IDRD N° SG-4060 con objeto:** "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" PIN AMBIENTAL 26732.

Relacionamos cantidades detalladas a continuación:

| OBRA/PARQUE | AREA TOTAL | CANTIDADES (KG) SBR | MES DE EJECUCION |
|---|---|---|---|
| SIMON BOLIVAR ZONA 2 | 26,68 | 1600 | JULIO 2025 |
| | 24,98 | 899 | JULIO 2025 |
| | 27,17 | 652 | JULIO 2025 |
| | 197,26 | 3550 | JULIO 2025 |

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de septiembre del 2025.

Cordialmente,

NINI JOHANA RAMOS
C.C. 35.198.755 DE CHIA
Representante Legal
CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.

Tel.9252730 – Cel. 3134421809 -Email: admonconstruccionesdfl@hotmail.com –
gerencia@construccionesdfl.com – www.construccionesdfl.com
Bogotá DC – Colombia

Transforma Ambientes

**Bogotá D.C., lunes, 25 de agosto de 2025** **Certificación No. SEC-01071SMJR-2025**

**SECAM J.R S.A.S.**
**NIT. 830.507.163-0**
**GESTOR DE RCDS**

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RCDS
"Carrera 7D Este con calle 115 sur, lote 4 localidad de Usme, Bogotá D.C"
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 001 MAYO 2 DE 2018
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN No. 514-2019 y 517-2019 del Directorio Ambiental de Proveedores IDU

# CERTIFICA QUE

Durante el periodo comprendido entre el 07/07/2025 al 07/07/2025, nuestra Planta de Aprovechamiento de RCD suministró 9.4098 TON equivalentes a 6 M3 de material SUB BASE GRAN TIPO PEA. Suministrados para el contrato de obra No. CONTRATO IDRD N° SG-4060 cuyo objeto es - con el pin ambiental: 26732, para la razón social: CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con el NIT: 901.886.663-3.

Cabe destacar que es de vital importancia dar cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución 1257 de 23 de noviembre de 2021, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se toman otras disposiciones".

**Atentamente,**

Verificar autenticidad

**ANGIE PANQUEVA RADA**

**C.C. No. 1.010.234.998**

**Representante Legal**

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de página o por medio del correo electrónico solicitudes@secamjr.com

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

# Trazabilidad agosto

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

ANEXO REPORTE RCD AGOSTO 2025

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (m3) | ORIGEN | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (m3) | TIPO DE GESTIÓN (Marque con una X la gestión que se adelantara para losRCD) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Disposició n Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | 01 01 Excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | 17,96 | 14 | X | | | | Maquinas Amarillas |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | 6,4 | 4 | CONCRMEOVIL | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | 15 | | CONSTRUCCIONES DFL | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | 20,3 | 14 | SUBBASE PEA RECICLADA | 16,92 | 14 | | X | | | GRECO |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | 27,19 | 15,99 | PAVIOBRAS | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | PARQUES | 0,056 | | | | X | | DEPOSITO SAN VICENTE |
| | **02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad. | | | PARQUES | 18,59 | | | | | X | TRACOL |

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.*

***Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.*

| | |
|---|---|
| BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | **ANEXO VI. CONSTANCIA DE MATERIALS PÉTREOS Y NO PÉTREOS VALORIZADOS DE RCD** |

| **1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| **Nombre o razón social** | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| **Documento de identificación o NIT** | 901.886.663-3 |
| **Representante Legal** | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR, |
| **Dirección** | Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá) |
| **Teléfono** | 3107069144 |
| **Correo electrónico** | apachon.bzc@gmail.com |
| **Municipio o distrito** | BOGOTÁ |
| **Nombre de la Obra** | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES |
| **PIN-GEN** | 26732 |
| **2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR** | |
| **PIN-PROV** | |
| **Nombre o razón social** | GRECO |
| **Documento de identificación o NIT** | 830507163 |
| **Representante Legal** | ANGIE PANQUEVA |
| **Dirección domicilio** | AUTOPISTA MEDELLIN K1,5 PUENTE DE GUADUA |
| **Teléfono** | 3015981851 |
| **Correo electrónico** | solicitudes.soacha@secamjr.com |

**3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR**

**Nota 1.** La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.
**Nota 2.** Se debe anexar certificados, soportes de estudios técnicos de laboratorios, y/o ficha técnica de la composición del material valorizado

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD (Ton) | CARACTERISTICAS /COMPOSICIÓN |
|---|---|---|
| SBG-PEA | 20,3 | SUBBASE GRANULAR TIPO PEATONAL - RECICLADA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total RCD suministrados (Ton)** | 20,3 | |
| **Fecha de suministro de mater** | 31/08/2025 | |

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:**
**NIT 901.886.663-3**

| | |
|---|---|
| BOGOTÁ | ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU |

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | **AGOSTO DE 2025** |
| Nombre del Proyecto: | CONTRATO IDRD 4060 -2024 - |
| PIN-GEN: 26732 | |

**1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.**

Descripcion:

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

Alto: Ancho: Largo

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

Descripcion detallada:

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

Descripción:

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles : **( Ton )**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): N/A ( Ton )

8. Volumen total reutilizado: **m3**

9. Duración del proceso:**(meses)**

10. Área final recuperada: m2

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: **(%)**

**12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:**

De acuerdo con las actividades contructivas realizadas en el periodo, no se realizó el aprovechamiento de materiales in situ, puesto ue el resultantw de estas actividades no cumplia con las caracteristicas técnica para ser instalado nuevamente en el área intervenida

ENRIQUE GUZMAN

**Firma del Representante Legal o Director de obra**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Granulados Reciclados de Colombia Greco | **CERTIFICADO DE SUMINSITRO DE MATERIAL RCD GRECO S.A.S** | Código: | FO-CM-007 |
| | | Versión: | 0 |
| | | Fecha: | 2024-11-26 |

**Consecutivo para la verificación del certificado:** CTA-2025-VA-01754
6/11/2025

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.**
**NIT. 900767473-7**
**PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD**

**MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR NO 9162109219 DEL 31 DE OCT DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NO C015712 DEL 12 DE JUNIO 2017**

**CERTIFICA QUE:**

La firma CONSORCIO BELZCON IDRD 1, identificada con NIT 901.886.663-3, realizó la compra de material en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 al 31 de AGOSTO de 2025 para la obra CONTRATO IDRD Nº SG-4060 , cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", con PIN de obra 26732 en la PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RCD GRECO SAS, quién aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación:

**CANTIDADES A CERTIFICAR**

| MATERIAL | Cantidad (Viajes) | Volumen (m3) | Tn |
|---|---|---|---|
| SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 2 | 14 | 20,30 |

OBSERVACIÓN: N/A

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 6 días del mes de NOVIEMBRE de 2025, Cota - Cundinamarca.

En constancia se firma,

**ING. JAVIER CASTILLO**
Director Comercial
**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS.**
Cel: 3046383774
dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios

800

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente | ANEXO VI - CONSTANCIA DE MATERIALES PÉTREOS Y NO PÉTREOS VALORIZADOS DE RCD |
|---|---|
| **1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO** | |
| **Nombre o razón social** | CONSORCIO BELZCON IDRD I |
| **Documento de identificación o NIT** | 901.886.663-3 |
| **Representante Legal** | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| **Dirección** | CALLE 105 # 46-26 |
| **Teléfono** | 3008506053 |
| **Correo electrónico** | apachon.bzc@gmail.com |
| **Municipio o distrito** | BOGOTÁ D.C. |
| **Nombre de la Obra** | CONTRATO IDRD N° SG-4060 |
| **PIN-GEN** | 26732 |
| **2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR** | |
| **PIN-PROV** | 26495 |
| **Nombre o razón social** | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS |
| **Documento de identificación o NIT** | 900767473-7 |
| **Representante Legal** | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ |
| **Dirección domicilio** | Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota Cundinamarca |
| **Teléfono** | 304 6383774 |
| **Correo electrónico** | jcastillo@recicladosgreco.com |

**3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR**

*Nota 1. La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.*

*Nota 2. Se debe anexar certificados, soportes de estudios técnicos de laboratorios, y/o ficha técnica de la composición del material valorizado*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD (Ton) | CARACTERISTICAS /COMPOSICIÓN |
|---|---|---|
| SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 20,30 | CONCRETOS + GRAVAS + CANTOS + LADRILLOS + ARENAS + MORTEROS + MATERIALES CERÁMICOS + RESIDUOS DE MATERIAL ASFÁLTICO + BASES Y SUB BASES GRANULARES + OTROS RESIDUOS PETREOS |
| **Total RCD suministrados (Ton)** | 20,3 | |
| **Fecha de suministro de material** | DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | |

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C. o NIT** 900767473-7
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

**NOMBRE**

**CONSECUTIVO** CTA-2025-VA-01754
**FECHA DE EMISIÓN** 6/11/2025

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 096111447694097287795**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA ESPERANZA, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA60688 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 25/08/2025 | 6740.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 19/01/2026. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 735220380709435576686**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA ESPERANZA, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA60765 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 26/08/2025 | 7130.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 19/01/2026. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 643833716860361517660**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA ESPERANZA, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA60809 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 27/08/2025 | 5890.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 19/01/2026. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 840123142661207832683**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA ESPERANZA, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA60969 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 30/08/2025 | 5960.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 19/01/2026. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

**Consecutivo para la verificación del certificado:** GRE VD A004305-070-2025

**Generado el:** 2025-09-10

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S**

**NIT. 900767473-7**

**PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD**

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS identificada con NIT 901.713.117-1 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con el Nit 901.886.663-3 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-08-01 al 2025-08-31 para la obra COUNTRY, cuyo objeto es: Remodelación con pin de obra 26732, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

| Material/RCD (*) | Cant. Viajes | Volumen (m3) | Peso (Tn) |
|---|---|---|---|
| Heterogéneo | 1 | 7 | 8.96 |
| Totales | 1 | 7 | 8.96 |
| | | | |
| **Observaciones:** | | | |

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2025-09-10, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

**JAVIER CASTILLO GONZALEZ**

Director Comercial

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

806

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

| DATOS BÁSICOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| **Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto** | 013 y 19309 | |
| **Nombre o razón social** | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS | |
| **Documento de identificación o NIT** | 900767473-7 | |
| **Representante Legal** | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ | |
| **Dirección** | KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín | |
| **Teléfono** | 3046383774 | |
| **Correo electrónico** | dircomercial@recicladosgreco.com | |
| **Municipio o Distrito** | Cota - Cundinamarca | |
| **Gestor** | Punto limpio | |
| | Planta de aprovechamiento | x |
| | Disposición final | |
| **DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR** | | |
| **Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto** | 26732 | |
| **Nombre o razón social** | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | |
| **Documento de identificación o NIT** | 901.886.663-3 | |
| **Representante Legal** | WILLY PATRICK NBELZNER SALAZAR | |
| **Dirección domicilio** | Calle 105 46 - 26 2do piso | |
| **Teléfono** | 6017689259 | |
| **Correo electrónico** | apachon.bzc@gmail.com | |



807

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

| Dirección de generación de RCD | CONTRATO IDRD No SG-4060 |
|---|---|
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |
| **Tipo de Residuo** | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | - |
| **1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.** | - |
| **1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.** | - |
| **1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.** | 7 m3 en<br>Toneladas 8.96 |
| **1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.** | - |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | - |
| **2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.** | - |
| **2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.** | - |
| **2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.** | - |
| **Total RCD recibidos (t)** | 7 m3 en<br>Toneladas 8.96 |
| **Fecha de recepción de los RCD** | 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 |

Firma

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

# Anexo IV CONSTANCIA DE GESTIÓN – Decreto 507 de 2023

(Aplicable solo para gestores de puntos limpios, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)

| 1. DATOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| | GRE VD A004305-070-2025 |
| PIN - GEN | 26732 |
| Nombre del proyecto (obra) | COUNTRY |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Identificación o NIT | 901.886.663-3 |
| Representante Legal | WILLY PATRICK NBELZNER SALAZAR |
| Dirección domicilio | Calle 105 46 - 26 2do piso |
| Teléfono | 6017689259 |
| Correo electrónico | apachon.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | CONTRATO IDRD No SG-4060 |

| 2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportador | Razón Social | No de Identificación | Vehículos autorizados | Tipo | No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador | No. PIN TRANS |
| WALTER PEREZ | 79791878 | 79791878 | AAI420 | Sencillo | 1 | NA |

| 3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD) | Punto Limpio | | Sitio de disposición fina | | Recuperador Especifico | |
| | Receptor | | Planta de tratamiento y/o aprovechamiento | x | Otro ¿Cuál? | |

| | |
|---|---|
| **PIN del gestor** | 26491 y 19309 |
| **NTR** | GRE VD A004305-070-2025 |
| **Fecha de recepción RCD** | 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 |

| Datos del Gestor | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S |
| Identificación o NIT | 900.767.473-7 |

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Representante Legal | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ |
| Dirección | Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur |
| Municipio | Cota (Cundinamarca) |
| Teléfono | 3046383774 |

| 01 RDC susceptibles de aprovechamiento | | |
|---|---|---|
| 01 01 Excavación | | Ton |
| 01 01 01 | Coberturas vegetales | |
| 01 01 02 | Tierras limpias de excavación | |
| 01 01 03 | Limos | |
| 01 01 04 | Materiales petreos de excavación | |
| 01 01 05 | Otros residuos de excavación | |

| 01 02 Productos de cimentación y pilotaje | | Ton |
|---|---|---|
| 01 02 01 | Arcillas | |
| 01 02 02 | Bentonitas | |
| 01 02 03 | Otros residuos de cimentación y pilotaje | |

| 01 04 No pétreos M | | Ton |
|---|---|---|
| 01 04 01 | Madera | |
| 01 04 02 | Plásticos | |
| 01 04 03 | Vidrio | |
| 01 04 04 | Papel y cartón | |
| 01 04 05 | Gomas y cauchos | |
| 01 04 06 | Cartón yeso (Drywall) | |

| 01 03 Pétreos | | Ton |
|---|---|---|
| 01 03 01 | Concretos | |
| 01 03 02 | Gravas | |
| 01 03 03 | Cantos | |
| 01 03 04 | Ladrillos | |
| 01 03 05 | Arenas | |
| 01 03 06 | Morteros | |
| 01 03 07 | Materiales cerámicos | |
| 01 03 08 | Residuos de material asfáltico | |
| 01 03 09 | Bases y sub bases granulares | |
| 01 03 10 | Otros residuos pétreos | 8.96 ton |

| 01 05 Metales | | Ton |
|---|---|---|
| 01 05 01 | Acero y hierro | |
| 01 05 02 | Zinc | |
| 01 05 03 | Cobre | |
| 01 05 04 | Aluminio | |
| 01 05 05 | Otros metales | |

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 01 04 07 | Acrílico | |
| 01 04 08 | Mezclas bituminosas y alquitrán | |
| 01 04 09 | Materiales a base de fibrocemento | |
| 01 04 10 | Otros residuos no pétreos | |

| 02 RCD – No susceptibles de aprovechamiento | | Ton |
|---|---|---|
| 02 01 | Los que por su estado no pueden ser aprovechados | |
| 02 02 | Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado. | |
| 02 02 | Los que tengan características de peligrosidad | |
| 02 02 01 | Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | |
| 02 02 02 | Otros residuos con características de peligrosidad | |

| FIRMAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del encargado de obra** | | **CC** | | **Firma** | |
| **Nombre del representante legal gestor** | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ | **CC** | 900.767.473-7 | **Firma** |  |

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

**Consecutivo para la verificación del certificado:** PBT VD A006871-001-2025

**Generado el:** 2025-09-24

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S**
**NIT. 900767473-7**

**PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD**

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con NIT 901.886.663-3 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con el Nit 901.886.663-3 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-08-01 al 2025-08-30 para la obra CONTRATO IDRD N° SG-4060, cuyo objeto es: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES con pin de obra 26732, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

| Material/RCD (*) | Cant. Viajes | Volumen (m3) | Peso (Tn) |
|---|---|---|---|
| Asfalto | 1 | 7 | 8.96 |
| Totales | 1 | 7 | 8.96 |
| | | | |
| **Observaciones:** | | | |

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2025-09-24, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

**JAVIER CASTILLO GONZALEZ**

Director Comercial

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una* ***COPIA NO CONTROLADA"***

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

| **DATOS BÁSICOS DEL GESTOR** | | |
|---|---|---|
| **Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto** | 013 y 19309 | |
| **Nombre o razón social** | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS | |
| **Documento de identificación o NIT** | 900767473-7 | |
| **Representante Legal** | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ | |
| **Dirección** | KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín | |
| **Teléfono** | 3046383774 | |
| **Correo electrónico** | dircomercial@recicladosgreco.com | |
| **Municipio o Distrito** | Cota - Cundinamarca | |
| **Gestor** | Punto limpio | |
| | Planta de aprovechamiento | x |
| | Disposición final | |
| **DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR** | | |
| **Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto** | 26732 | |
| **Nombre o razón social** | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | |
| **Documento de identificación o NIT** | 901.886.663-3 | |
| **Representante Legal** | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR | |
| **Dirección domicilio** | Cl. 105 #46 – 26 piso 2, | |
| **Teléfono** | 3107069144 | |
| **Correo electrónico** | apachon.bzc@gmail.com | |



814

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

| Dirección de generación de RCD | PARQUES BOGOTÁ D.C |
|---|---|
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |
| **Tipo de Residuo** | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | - |
| **1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.** | - |
| **1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.** | - |
| **1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.** | 7 m3 en<br>Toneladas 8.96 |
| **1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.** | - |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | - |
| **2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.** | - |
| **2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.** | - |
| **2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.** | - |
| **Total RCD recibidos (t)** | 7 m3 en<br>Toneladas 8.96 |
| **Fecha de recepción de los RCD** | 01 de agosto al 30 de agosto de 2025 |

Firma

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

817

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

# Anexo IV CONSTANCIA DE GESTIÓN – Decreto 507 de 2023

(Aplicable solo para gestores de puntos limpios, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)

| 1. DATOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| | PBT VD A006871-001-2025 |
| PIN - GEN | 26732 |
| Nombre del proyecto (obra) | CONTRATO IDRD N° SG-4060 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Identificación o NIT | 901.886.663-3 |
| Representante Legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección domicilio | Cl. 105 #46 – 26 piso 2, |
| Teléfono | 3107069144 |
| Correo electrónico | apachon.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | PARQUES BOGOTÁ D.C |

**2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD**

| Transportador | Razón Social | No de Identificación | Vehículos autorizados | Tipo | No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador | No. PIN TRANS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO MURCIA | 79902268 | 79902268 | USC745 | Sencillo | 1 | NA |

**3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD) | Punto Limpio | | Sitio de disposición fina | | Recuperador Especifico | |
| | Receptor | | Planta de tratamiento y/o aprovechamiento | x | Otro ¿Cuál? | |

| PIN del gestor | 26491 y 19309 |
|---|---|
| NTR | PBT VD A006871-001-2025 |
| Fecha de recepción RCD | 01 de agosto al 30 de agosto de 2025 |

| Datos del Gestor | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social | GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S |
| Identificación o NIT | 900.767.473-7 |

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Representante Legal | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ |
| Dirección | Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur |
| Municipio | Cota (Cundinamarca) |
| Teléfono | 3046383774 |

| 01 RDC susceptibles de aprovechamiento | | |
|---|---|---|
| **01 01 Excavación** | | **Ton** |
| 01 01 01 | Coberturas vegetales | |
| 01 01 02 | Tierras limpias de excavación | |
| 01 01 03 | Limos | |
| 01 01 04 | Materiales petreos de excavación | |
| 01 01 05 | Otros residuos de excavación | |

| **01 02 Productos de cimentación y pilotaje** | | **Ton** |
|---|---|---|
| 01 02 01 | Arcillas | |
| 01 02 02 | Bentonitas | |
| 01 02 03 | Otros residuos de cimentación y pilotaje | |

| **01 04 No pétreos M** | | **Ton** |
|---|---|---|
| 01 04 01 | Madera | |
| 01 04 02 | Plásticos | |
| 01 04 03 | Vidrio | |
| 01 04 04 | Papel y cartón | |
| 01 04 05 | Gomas y cauchos | |
| 01 04 06 | Cartón yeso (Drywall) | |

| **01 03 Pétreos** | | **Ton** |
|---|---|---|
| 01 03 01 | Concretos | |
| 01 03 02 | Gravas | |
| 01 03 03 | Cantos | |
| 01 03 04 | Ladrillos | |
| 01 03 05 | Arenas | |
| 01 03 06 | Morteros | |
| 01 03 07 | Materiales cerámicos | |
| 01 03 08 | Residuos de material asfáltico | 8.96 ton |
| 01 03 09 | Bases y sub bases granulares | |
| 01 03 10 | Otros residuos pétreos | |

| **01 05 Metales** | | **Ton** |
|---|---|---|
| 01 05 01 | Acero y hierro | |
| 01 05 02 | Zinc | |
| 01 05 03 | Cobre | |
| 01 05 04 | Aluminio | |
| 01 05 05 | Otros metales | |

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

| Granulados Reciclados de Colombia Greco | CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S | Código: FO-CM-005<br>Versión: 0<br>Fecha: 25/07/2025 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 01 04 07 | Acrílico | |
| 01 04 08 | Mezclas bituminosas y alquitrán | |
| 01 04 09 | Materiales a base de fibrocemento | |
| 01 04 10 | Otros residuos no pétreos | |

| 02 RCD – No susceptibles de aprovechamiento | | Ton |
|---|---|---|
| 02 01 | Los que por su estado no pueden ser aprovechados | |
| 02 02 | Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado. | |
| 02 02 | Los que tengan características de peligrosidad | |
| 02 02 01 | Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | |
| 02 02 02 | Otros residuos con características de peligrosidad | |

| FIRMAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del encargado de obra** | | **CC** | | **Firma** | |
| **Nombre del representante legal gestor** | JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ | **CC** | 900.767.473-7 | **Firma** |  |

MÁQUINAS AMARILLAS

CERT-1861-2025

Bogotá, 8 de septiembre de 2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

**CERTIFICA QUE:**

| **DATOS EL GESTOR** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. |
| Número de identificación | NIT: 900.459.311-1 |
| Representante Legal | HERNANDO LAVERDE MANJARRES |
| Teléfono | +57 (601) 7023060 |
| Correo electrónico | comercial@maquiamarillas.com |
| Dirección | AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20 |
| Municipio o Distrito | BOGOTÁ D.C. |
| Gestor | DISPOSICION FINAL |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR** | |
| Pin de la obra | 26732 |
| Nombre de la obra | CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD |
| Nombre o razón social | BELZCON SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901252860 |
| Representante Legal | BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 26 P 2 |
| Teléfono | 601 8052552 |
| Correo electrónico | facturacion.bzc@gmail.com |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |

| *TIPO DE RESIDUO* | *CANTIDAD M3* | *CANTIDAD TON* |
|---|---|---|
| *1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.* | *14,00* | *17,96* |
| *1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| *1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso ( drywall) entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| ***Totales:*** | ***14,00*** | ***17,96*** |

Fecha de Recepción RCD el día 04 de agosto de 2025 hasta el día 11 de agosto de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

**CODIGO 2026-M001**

CERTIFICACION

Por medio del presente en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES DFL SAS NIT:900814668-8** certifico el material suministrado a la empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con NIT: 901.886.663-3 Para el contrato CONTRATO IDRD N° SG-4060 con objeto:** "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" PIN AMBIENTAL 26732.

Relacionamos cantidades detalladas a continuación:

| OBRA/PARQUE | CANTIDADES (KG) SBR | MES DE EJECUCION |
|---|---|---|
| LA ESPERANZA | 14000 | AGOSTO |
| | | |
| | | |
| TOTALES | | |

La presente certificación se expide a los 07 días del mes de enero del 2026.

Cordialmente,

NINI JOHANA RAMOS
C.C. 35.198.755 DE CHIA
Representante Legal
CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.

Tel.9252730 – Cel. 3134421809 -Email: admonconstruccionesdfl@hotmail.com –
gerencia@construccionesdfl.com – www.construccionesdfl.com
Bogotá DC – Colombia

822

CERTIFICADO No. **CERT: 0442**
FECHA DE EMISIÓN: **01 SEPTIEMBRE 2025**

## ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

| DATOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| PIN de gestor de residuos | 20497 | |
| Nombre o razón social | DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S. | |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901437458 - 4 | |
| Representante legal | Fredy Andrey Quiroz Mesa | |
| Dirección | Carrera 69K No. 74B-99 | |
| Teléfono | 310 242 43 42 | |
| Correo electronico | faquiroz1983@gmail.com | |
| Gestor | Punto limpio | X |
| | Planta de aprovechamiento | |
| | Disposición final | |

| DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| PIN de generador de residuos | 26732 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901886663 - 3 |
| Representante legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección domiciio | Cl 105 46 - 26 2do piso |
| Teléfono | 601 7 68 92 59 |
| Correo electronico | apachon.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | CONTRATO IDRD nro: SG - 4060 - MUSEO DE LOS NIÑOS |

| CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO | | |
|---|---|---|
| **Periodo reportado:** | **06 DE AGOSTO DE 2025** | |
| **TIPO DE RCD** *(Total del periodo)* | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** | |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. | X | **CHATARRA:** transportada a PAPELES EL VERGEL al reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros **0,025 ton** |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 2.1. Los contaminados con residuos peligrosos. | | |
| 2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados. | | |
| **Total RCD recibidos /t)** | **0,025 ton** | |
| **Fecha de recepción de los RCD** | **06 DE AGOSTO DE 2025** | |

Cordialmente,

FIRMA: **DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.**
NIT: **901437458 - 4**
NOMBRE: **FREDY ANDREY QUIROZ MESA**

CERTIFICADO No. **CERT: 0443**
FECHA DE EMISIÓN: **01 SEPTIEMBRE 2025**

## ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

| DATOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| PIN de gestor de residuos | 20497 | |
| Nombre o razón social | DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S. | |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901437458 - 4 | |
| Representante legal | Fredy Andrey Quiroz Mesa | |
| Dirección | Carrera 69K No. 74B-99 | |
| Teléfono | 310 242 43 42 | |
| Correo electronico | faquiroz1983@gmail.com | |
| Gestor | Punto limpio | X |
| | Planta de aprovechamiento | |
| | Disposición final | |

| DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| PIN de generador de residuos | 26732 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901886663 - 3 |
| Representante legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 - 26 2do piso |
| Teléfono | 601 7 68 92 59 |
| Correo electronico | apachon.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | CONTRATO IDRD nro: SG - 4060 - COUNTRY |

| CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO | | |
|---|---|---|
| **Periodo reportado:** | **06 DE AGOSTO DE 2025** | |
| **TIPO DE RCD** *(Total del periodo)* | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** | |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. | X | **CHATARRA: transportada a PAPELES EL VERGEL al reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros 0,031 ton** |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 2.1. Los contaminados con residuos peligrosos. | | |
| 2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados. | | |
| **Total RCD recibidos /t)** | **0,031 ton** | |
| **Fecha de recepción de los RCD** | **06 DE AGOSTO DE 2025** | |

Cordialmente,

FIRMA: **DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.**
NIT: **901437458 - 4**
NOMBRE: **FREDY ANDREY QUIROZ MESA**

CONSORCIO Belzcoq
IDRD-1

# Trazabilidad septiembre

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site:
www.belzcon.com.co

825

ANEXO REPORTE RCD SEPTIEMBRE 2025

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (m3) | ORIGEN | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (m3) | TIPO DE GESTIÓN (Marque con una X la gestión que se adelantara para losRCD) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Disposició n Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | **01 01 Excavación** | | | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | 35,92 | 28 | X | | | | Maquinas Amarillas |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | | | | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | 2,55 | | CONSTRUCCIONES DFL | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | 11,55 | 7 | SUBBASE PEA RECICLADA | | | | | | | |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (drywall) | | | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | | | | | | | | |
| | **02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechadas | | | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad. | | | PARQUES | 3,51 | | | | | X | TRACOL |

**El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.*

***Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la.gravedad de juramento.*

| | |
|---|---|
| BOGOTÁ | ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU |

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | **SEPTIEMBRE DE 2025** |
| Nombre del Proyecto: | CONTRATO IDRD 4060 -2024 - |
| PIN-GEN: 26732 | |

**1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.**

Descripcion:

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

Alto: Ancho: Largo

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

Descripcion detallada:

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

Descripción:

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles : **( Ton )**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): N/A ( Ton )

8. Volumen total reutilizado: **m3**

9. Duración del proceso:**(meses)**

10. Área final recuperada: m2

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: **(%)**

**12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:**

De acuerdo con las actividades contructivas realizadas en el periodo, no se realizó el aprovechamiento de materiales in situ, puesto ue el resultantw de estas actividades no cumplia con las caracteristicas técnica para ser instalado nuevamente en el área intervenida

ENRIQUE GUZMAN

**Firma del Representante Legal o Director de obra**

| fecha_transp | placa_transp | pin_transport | clasif_sitio_di | etapa_RCD | responsable_ | nombre_sitio | dir_sitio_rece | vol_mü,,,,,,,, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/09/2025 | SBG424 | 2808 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 7 |
| 3/09/2025 | ACD971 | 703 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 7 |
| 3/09/2025 | JAD276 | 208 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 7 |
| 4/09/2025 | ACD971 | 703 | 1 | 2 | CONSORCIO I | MAQUINAS A | AV BOYACÁ 7 | 7 |

| | |
|---|---|
| VECOAGREINT S.A.S | **CERTIFICADO: SUMINISTRO DE MATERIAL** |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NO. 20232051011 DEL 22 DE JUNIO DE 2023<br>REGISTRO DE GESTOR CAR No.54 | REGISTRO IDU 683 de 2023 Y 687 de 2023 |

| **1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT | 901886663-3 |
| Representante Legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección obra | PARQUES IDRD |
| Teléfono | 3107069144 |
| Correo electrónico | idrdcorrespondencia@idrd.gov.co |
| Municipio o distrito | BOGOTÁ DC |
| Nombre de la Obra | CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES |
| PIN | 26732 |
| **2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR** | |
| Nombre o razón social | VECOAGREINT SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901660184-6 |
| Representante Legal | YEIMEN GAONA BAUTISTA |
| Dirección domicilio | AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2 VÍA PARCELAS, 500M COSTADO IZQUIERDO |
| Teléfono | 3143949448 |
| Correo electrónico | vecoagreintsas@gmail.com |
| **3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR** | |
| *Nota 1. La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.* | |

| VEHÍCULO | TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD m3 | CANTIDAD (Ton) | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|---|
| VOLQUETA DOBLE | AGREGADO RECICLADO | 7 | 11,55 | AR_SBG_PEA50 IDU 2018 - M3 |

| | | |
|---|---|---|
| Total RCD suministrados | 7 | 11,55 |
| Fecha de suministro de material | septiembre-25 | |

| | | |
|---|---|---|
| Nombre del representante legal del proveedor | YEIMEN GAONA BAUTISTA | REPRESENTANTE LEGAL VECOAGREINT SAS |
| CC: 79761226 | FIRMA | |

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios.
Nota: La información suministrada en este certificado referente al generador, lugar de procedencia, obra y demás datos asociados al origen de los RCD´S, es suministrada por el cliente a VECOAGREINT S.AS.; por lo que el generador, con el recibo de este certificado de disposición y/o por haber recibido la prestación del servicio por parte de VECOAGREINT S.A.S, declara y garantiza a VECOAGREINT S.A.S. que la información suministrada es veraz, completa y exonera a VECOAGREINT S.A.S. de toda responsabilidad con respecto a la misma. Esta certificación se emite en el marco del convenio de colaboración suscrito entre VECOAGREINT S.A.S. e INAR – Industria Nacional de Agregados Reciclados, mediante el cual se articula la operación técnica de la planta de aprovechamiento conforme a lo establecido contractualmente, sin que ello implique modificación alguna en los registros y obligaciones ambientales vigentes.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Consecutivo para verificación del certificado | VEAG | 474 | de | 2025 |

VECOAGREINT S.A.S

**CODIGO 2025-M008**

# CERTIFICACION

Por medio del presente en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES DFL SAS NIT:900814668-8** certifico el material suministrado a la empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con NIT: 901.886.663-3 Para el contrato CONTRATO IDRD N° SG-4060 con objeto:** "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" PIN AMBIENTAL 26732.

Relacionamos cantidades detalladas a continuación:

| OBRA/PARQUE | AREA TOTAL M2 | CANTIDADES (KG) SBR | CANTIDADES (KG) EPDM | MES DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| LA ESPERANZA | 88,03 | 1584,54 | 792,27 | SEPTIEMBRE |
| | 195,65 | 4695,6 | 1760,85 | SEPTIEMBRE |
| | | | | |
| TOTALES | | 6280,14 | 2553,12 | |

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de noviembre del 2025.

Cordialmente,

NINI JOHANA RAMOS
C.C. 35.198.755 DE CHIA
Representante Legal
CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.

Tel.9252730 – Cel. 3134421809 -Email: admonconstruccionesdfl@hotmail.com –
gerencia@construccionesdfl.com – www.construccionesdfl.com
Bogotá DC – Colombia

MÁQUINAS AMARILLAS

Bogotá, 7 de noviembre de 2025

CERT-2318-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

**CERTIFICA QUE:**

| **DATOS EL GESTOR** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. |
| Número de identificación | NIT: 900.459.311-1 |
| Representante Legal | HERNANDO LAVERDE MANJARRES |
| Teléfono | +57 (601) 7023060 |
| Correo electrónico | comercial@maquiamarillas.com |
| Dirección | AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20 |
| Municipio o Distrito | BOGOTÁ D.C. |
| Gestor | DISPOSICION FINAL |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR** | |
| Pin de la obra | 26732 |
| Nombre de la obra | CONTRATO IDRD NÂ° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÃfiN, REPARACIÃfiN Y RECUPERACIÃfiN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD |
| Nombre o razón social | BELZCON SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901252860 |
| Representante Legal | BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 26 P 2 |
| Teléfono | 601 8052552 |
| Correo electrónico | facturacion.bzc@gmail.com |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |

| *TIPO DE RESIDUO* | *CANTIDAD M3* | *CANTIDAD TON* |
|---|---|---|
| *1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.* | *28,00* | *35,92* |
| *1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| *1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso ( drywall) entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| ***Totales:*** | ***28,00*** | ***35,92*** |

Fecha de Recepción RCD el día 03 dc septiembre de 2025 hasta el día 04 de septiembre de 2025
Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**
Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

## TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

**NIT: 900.962.813-3**

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 339071750061769746369**

La empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** identificado con NIT No. **901886663 - 1** de la sede CONTRATO IDRD No SG-4060 - PIN 26732 - PARQUE LA ESPERANZA, por intermedio de **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA D.M SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901713117 - 1**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

| Solicitud No. | Nombre Técnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente A | Corriente Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA61433 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | 12/09/2025 | 3510.00 | RESIDUO ESPECIAL GRANULO CAUCHO | No aplica | A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III | |

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 19/01/2026. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

# Trazabilidad octubre

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

ANEXO REPORTE RCD OCTUBRE 2025

| ETAPA CONSTRUCTIVA | TIPO DE RCD | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas) | CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (m3) | ORIGEN | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas) | CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (m3) | TIPO DE GESTIÓN (Marque con una X la gestión que se adelantara para losRCD) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Disposició n Final | Reutilización | Reciclaje | Otros | Lugar de Disposición Final |
| Demolición, Excavación y cimentación Construcción | **01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | 01 01 Excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 01 Coberturas vegetales | | | | | | | | | | |
| | 01 01 02 Tierras limpias de excavación | | | | | | | | | | |
| | 01 01 03 Limos | | | | | | | | | | |
| | 01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación | | | | 68,85 | 49 | X | | | | Maquinas Amarillas |
| | 01 01 05 Otros residuos de excavación | | | | | | | | | | |
| | **01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje** | | | | | | | | | | |
| | 01 02 01 Arcillas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 02 Bentonitas | | | | | | | | | | |
| | 01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje | | | | | | | | | | |
| | **01 03 Pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 03 01 Concretos | 66,3 | 39 | CONCRMEOVIL | | | | | | | |
| | 01 03 02 Gravas | | | | | | | | | | |
| | 01 03 03 Cantos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 04 Ladrillos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 05 Arenas | 22,6 | 34 | COMIND | | | | | | | |
| | 01 03 06 Morteros | | | | | | | | | | |
| | 01 03 07 Materiales Cerámicos | | | | | | | | | | |
| | 01 03 08 Residuos de material asfáltico | 9,23 | | CONSTRUCCIONES DFL | | | | | | | |
| | 01 03 09 Bases y sub bases granulares | | | | 9,16 | 7 | | X | | | RECICLADOS INDUSTRIALES |
| | 01 03 10 Otros residuos pétreos | | | | | | | | | | |
| | **01 04 No pétreos** | | | | | | | | | | |
| | 01 04 01 Madera | | | | | | | | | | |
| | 01 04 02 Plásticos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 03 Vidrio | | | | | | | | | | |
| | 01 04 04 Papel y Cartón | | | | | | | | | | |
| | 01 04 05 Gomas y cauchos | | | | | | | | | | |
| | 01 04 06 Cartón yeso (crywall) | | | | | | | | | | |
| | 01 04 07 Acrílico | | | | | | | | | | |
| | 01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán | | | | | | | | | | |
| | 01 04 09 Materiales a base fibrocemento | | | | | | | | | | |
| | 01 04 10 Otros residuos no pétreos | | | | | | | | | | |
| | **01 05 Metales** | | | | | | | | | | |
| | 01 05 01 Acero y hierro | | | | | | | | | | |
| | 01 05 02 Zinc | | | | | | | | | | |
| | 01 05 03 Cobre | | | | | | | | | | |
| | 01 05 04 Aluminio | | | | | | | | | | |
| | 01 05 05 Otros metales | | | PARQUES | 0,14 | | | | X | | DEPOSITO SAN VICENTE |
| | **02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento** | | | | | | | | | | |
| | 02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados | | | | | | | | | | |
| | **02 02 Los que tengan características de peligrosidad** | | | | | | | | | | |
| | 02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan | | | | | | | | | | |
| | 02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad. | | | | | | | | | | |

**El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.*

***Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada bajo la gravedad de juramento.*

| | |
|---|---|
| BOGOTÁ | ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU |

| | |
|---|---|
| **Mes del Aprovechamiento:** | **OCTUBRE DE 2025** |
| Nombre del Proyecto: | CONTRATO IDRD 4060 -2024 - |
| PIN-GEN: 26732 | |

**1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.**

Descripcion:

**2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)**

Alto: Ancho: Largo

**3. Tipo de material a emplear en la reutilización:**

Descripcion detallada:

**4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.**

**5. Registro fotográfico durante la reutilización:**

Descripción:

**6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:**

**Información de la Reutilización:**

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles : **( Ton )**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): N/A ( Ton )

8. Volumen total reutilizado: **m3**

9. Duración del proceso:**(meses)**

10. Área final recuperada: m2

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: **(%)**

**12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:**

ENRIQUE GUZMAN

**Firma del Representante Legal o Director de obra**

MÁQUINAS AMARILLAS

CERT-2312-2025

Bogotá, 7 de noviembre de 2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

**CERTIFICA QUE:**

| **DATOS EL GESTOR** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. |
| Número de identificación | NIT: 900.459.311-1 |
| Representante Legal | HERNANDO LAVERDE MANJARRES |
| Teléfono | +57 (601) 7023060 |
| Correo electrónico | comercial@maquiamarillas.com |
| Dirección | AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20 |
| Municipio o Distrito | BOGOTÁ D.C. |
| Gestor | DISPOSICION FINAL |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR** | |
| Pin de la obra | 26732 |
| Nombre de la obra | CONTRATO IDRD NÂ° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÃfiN, REPARACIÃfiN Y RECUPERACIÃfiN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD |
| Nombre o razón social | BELZCON SAS |
| Documento de identificación o NIT | 901252860 |
| Representante Legal | BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 26 P 2 |
| Teléfono | 601 8052552 |
| Correo electrónico | facturacion.bzc@gmail.com |
| **CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO** | |

| ***TIPO DE RESIDUO*** | ***CANTIDAD M3*** | ***CANTIDAD TON*** |
|---|---|---|
| *1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.* | *28,00* | *35,92* |
| *1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros* | *21,00* | *34,63* |
| *1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso ( drywall) entre otros* | *0,00* | *0,00* |
| ***Totales:*** | ***49,00*** | ***70,55*** |

Fecha de Recepción RCD el día 01 de octubre de 2025 hasta el día 21 de octubre de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**
Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

Gestor

Operador

Código de Verificación:

CERT-10-2026

Cota, 5 de enero de 2026

Registro CAR No. 64 dando cumplimiento a la resolución 1257 expedida por el Ministerio de ambiente y desarollo, La Granja J&L - Reciclados industriales de Colombia -

**CERTIFICA QUE:**

| **DATOS EL GESTOR** | |
|---|---|
| Nombre o razón social | LA GRANJA J&L S.A.S |
| Número de identificación | 901.625.481-0 |
| Representante Legal | YESSICA ALEXANDRA PEREZ VARGAS |
| Teléfono | 3136482964 |
| Dirección | VEREDA LA AURORA VIA EL CODITO - LA CALERA |
| Municipio o Distrito | LA CALERA |
| Gestor | PLANTA DE APROVECHAMIENTO |

**Cantidad de RCD recibidos del generador**

| *DESCRIPCION* | *CANTIDAD M3* | *CANTIDAD TON* |
|---|---|---|
| *CONCRETO* | *7,00* | *9,16* |
| ***Totales:*** | ***7,00*** | ***9,16*** |

| | |
|---|---|
| Destino del RCD | APROVECHAMIENTO |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR / CLIENTE** | |
| Nombre del Generador | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Número de identificación | 901886663 |
| Teléfono | 6017689259 |
| Origen / Dirección | GENERAL |
| Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN) | CONTRATO IDRD N° SG-4060 PIN: 26732 |

**CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO**

| **Tipo de Residuo** | **Cantidad de RCD** |
|---|---|
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | - |
| 1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros. | - |
| 1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. | - |
| 1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros. | 9,16 |
| 1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. | - |
| **Total RCD recibidos (toneladas)** | **9,16** |
| Fecha de Recepción RCD el día 09 de octubre de 2025 hasta el día 09 de octubre de 2025 | |

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257 /2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

Yessica Perez V

PP

Representante Legal

Gestor

Operador

Código de Verificación:

Registro CAR No. 64 dando cumplimiento a la resolución 1257 expedida por el Ministerio de ambiente y desarollo, La Granja J&L - Reciclados industriales de Colombia -

**CERTIFICA QUE:**

| ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN | |
|---|---|
| **1. DATOS DEL GENERADOR** | |
| PIN-GEN | 26732 |
| Nombre del proyecto (obra) | CONTRATO IDRD N° SG-4060 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT | 901886663 |
| Representante Legal | BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK |
| Dirección domicilio | Cl 105 # 46 - 26 |
| Teléfono | 6 0 1 7 6 8 9 2 5 9 |
| Correo electrónico | facturacionconsorcioidrd.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | GENERAL |
| **2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD** | |
| **Transportador** | |
| Razón Social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| No. de Identificación | 901886663 |
| Tipo | Ver anexos |
| Placa | Ver anexos |
| No. PIN TRANS | Ver anexos |
| No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador | Ver anexos |
| **3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)** | |
| **Gestor** | |
| PIN del gestor | 27010 |
| NTR | |
| Fecha de recepción RCD | el día 09 de octubre de 2025 hasta el día 09 de octubre de 2025 |
| **Datos del Gestor** | |
| Nombre o Razón Social | LA GRANJA J&L S.A.S |
| Identificación o NIT | 901.625.481-0 |
| Representante Legal | YESSICA ALEXANDRA PEREZ VARGAS |
| Dirección | VEREDA LA AURORA VIA EL CODITO - LA CALERA |
| Municipio | LA CALERA |
| Teléfono de contacto | 3136482964 |
| tablarcd | |
| Nombre del encargado obra | |
| CC | |
| Firma | |

**Nota:** La información incluida en este certificado, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA**, por lo cual declara y garantiza a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** de toda responsabilidad con respecto a la misma.

Gestor

Operador

Código de Verificación:

Jessica Perez V

PP

Representante Legal

**CODIGO 2025-M009**

CERTIFICACION

Por medio del presente en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES DFL SAS NIT:900814668-8** certifico el material suministrado a la empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1 identificada con NIT: 901.886.663-3 Para el contrato CONTRATO IDRD N° SG-4060 con objeto:** "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" PIN AMBIENTAL 26732.

Relacionamos cantidades detalladas a continuación:

| OBRA/PARQUE | AREA TOTAL M2 | CANTIDADES (KG) SBR | CANTIDADES (KG) EPDM | MES DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|
| LA ESPERANZA | 968,34 | 11620,08 | 8715,06 | OCTUBRE |
| | 58,08 | 1742,4 | 522,72 | OCTUBRE |
| | | | | |
| TOTALES | | **13362,48** | **9237,78** | |

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de noviembre del 2025.

Cordialmente,

**NINI JOHANA RAMOS**
C.C. 35.198.755 DE CHIA
Representante Legal
CONSTRUCCIONES DFL S.A.S.

Tel.9252730 – Cel. 3134421809 -Email: admonconstruccionesdfl@hotmail.com –
gerencia@construccionesdfl.com – www.construccionesdfl.com
Bogotá DC – Colombia

840

CERTIFICADO No. **CERT: 0026**
FECHA DE EMISIÓN: **19 ENERO 2026**

## ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

| DATOS DEL GESTOR | | |
|---|---|---|
| PIN de gestor de residuos | 20497 | |
| Nombre o razón social | DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S. | |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901437458 - 4 | |
| Representante legal | Fredy Andrey Quiroz Mesa | |
| Dirección | Carrera 69K No. 74B-99 | |
| Teléfono | 310 242 43 42 | |
| Correo electronico | faquiroz1983@gmail.com | |
| Gestor | Punto limpio | X |
| | Planta de aprovechamiento | |
| | Disposición final | |

| DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR | |
|---|---|
| PIN de generador de residuos | 26732 |
| Nombre o razón social | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas) | 901886663 - 3 |
| Representante legal | WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR |
| Dirección domicilio | Cl 105 46 - 26 2do piso |
| Teléfono | 601 7 68 92 59 |
| Correo electronico | apachon.bzc@gmail.com |
| Dirección de generación de RCD | CONTRATO IDRD No SG-4060 - "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" - CANCHA SINTÉTICA RESOULS |

| CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO | | |
|---|---|---|
| **Periodo reportado:** | **16 DE OCTUBRE DE 2025** | |
| **TIPO DE RCD** *(Total del periodo)* | **Cantidad de RCD recibidos del generador (t)** | |
| **1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros. | X | **CHATARRA:** transportada a PAPELES EL VERGEL al reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros . **REJAS**<br>**RESIDUOS DE OBRA :** selección en SAN VICENTE UNO S.A.S; por tipo y otras variantes, empacado, almacenado, en mayor cantidad transportado a las plantas de tratamiento o recuperación a gran escala; el material restante es empacado y transportado a celdas de seguridad. **CANCHA SINTETICA** |
| **2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:** | | |
| 2.1. Los contaminados con residuos peligrosos. | | |
| 2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados. | | |
| **Total RCD recibidos /t)** | **0,140 ton** | |
| **Fecha de recepción de los RCD** | **16 DE OCTUBRE DE 2025** | |

Cordialmente,

FIRMA: **DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.**
NIT: **901437458 - 4**
NOMBRE: **FREDY ANDREY QUIROZ MESA**

# CONSORCIO BELZCON IDRD 1

CONTRATO DE OBRA No.4060 – 2024

## EL OBJETO DEL CONTRATO ES:

**"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"**

**GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"**

## INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD # 12 (OCTUBRE) Versión 2
## CORTE: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN OCHO (8) MESES

CONTRATANTE INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28



842

Tabla de contenido

1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 6
1.1. LOCALIZACIÓN ..... 6
1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 6
2. ESTADO CONTRACTUAL DE GESTIÓN ..... 8
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO ..... 8
2.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN ..... 9
2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS ..... 11
2.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD ..... 14
2.5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES ..... 14
2.5.1 ACTAS COMITÉ ..... 14
2.5.2 SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ..... 15
2.5.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA ..... 15
2.5.4. BITÁCORA DE OBRA ..... 15
2.6. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..... 15
2.6.1. CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..... 15
2.6.2. CONTROL DE LOS REGISTROS ..... 16
2.6.3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ..... 16
2.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES ..... 16
3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO ..... 16
3.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN ..... 16
3.1.1 EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS ..... 17
3.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS ..... 17
3.2 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS ..... 17
3.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO ..... 18
3.3.1. EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ..... 18



843

3.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 20
3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ..... 20
3.5.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS (EMERGENCIAS) ..... 21
3.5.1.1. PARQUE SAUZALITO ..... 21
3.5.1.2. PARQUE QUIROGA ..... 21
3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS ..... 21
3.5.2.1. PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA ..... 21
3.5.2.2. PARQUE ELPORVENIR ..... 22
3.5.2.3. PARQUE QUIROGA ..... 22
3.5.2.7. PARQUE LAS LUCES Y VILLA RICA ..... 23
3.5.2.9. PARQUE PRADO PINZON ..... 23
3.5.2.10. PARQUE URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA) ..... 23
3.5.2.12. PARQUE BARRRIO LA PEPITA ..... 24
3.5.2.13. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA DEL SALITRE) ..... 24
3.5.2.14. PARQUE GORGONZOLA ..... 24
3.5.2.15. PARQUE URBANIZACION MARRUECOS II SECTOR ..... 25
3.5.2.16. PARQUE URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5 25
3.5.2.17. PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO ..... 25
3.5.2.18. PARQUE URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR ..... 25
3.5.2.19. PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO) ..... 26
3.5.2.20. PARQUE FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR ..... 26
3.5.2.21. PARQUE VALLES DE CAFAM ..... 26
3.5.2.22. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS) ..... 26
3.5.2.23. PARQUE URBANIZACIÓN PRIMAVERA ..... 27
3.5.2.24. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) ..... 27
4. CONTROL DE LA GESTIÓN ..... 27
4.1. CONTROL DE CAMBIOS ..... 27

4.2. SALIDAS NO CONFORMES ..... 27
4.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE ..... 29
4.4. AUDITORIAS ..... 30
4.5. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ..... 30
4.6. PQRFS ..... 30
5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES ..... 30

## INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información que evidencia la gestión de calidad por parte de CONSORCIO BELZCON IDRD 1, quien tiene a su cargo el manejo de los parques y escenarios y la búsqueda de apropiación social por parte de la ciudadanía y su aprovechamiento económico, así como la atención de las necesidades, para lo cual debe contratar el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques, estructuras deportivas del Sistema Distrital de Parques priorizados para éste contrato y ubicados en las localidades que conforman el Grupo 2 para este contrato.

Con el fin de lograr satisfacer los requisitos del cliente y alcanzar los objetivos que han sido establecidos en el contrato, se han contemplado las exigencias de la Norma NTC ISO 9001:2015 orientando las actividades administrativas y operativas al cumplimiento de estas y a su vez las que han sido establecidas en el pliego de condiciones y requeridas por la entidad contratante IDRD.

Durante el periodo del presente informe se ha asumido con responsabilidad la verificación de calidad de la ejecución del contrato de obra No. 4060 - 2024, de lo cual se evidencia el cumplimiento de las especificaciones aplicables a las actividades ejecutadas en el presente periodo y establecidas por el IDRD en el apéndice correspondiente.

Para la ejecución del proyecto se verificó también el cumplimiento de las especificaciones de la norma sismo resistente NSR-10 y demás normas establecidas para la ejecución del contrato.

# 1. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

## 1.1. LOCALIZACIÓN

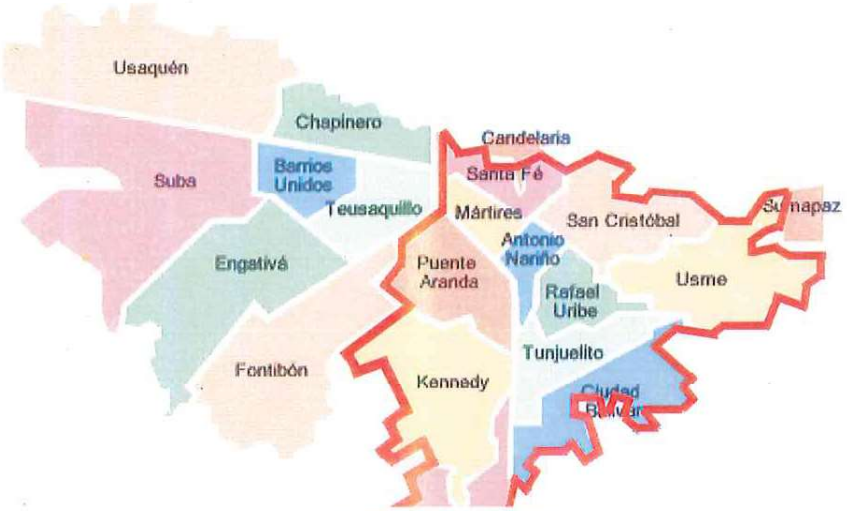



*Ilustración 1. Localización.*

*(https://www.google.com/maps/@4.6355237,-74.1431059,397m/data=!3m1!1e3?hl=es)*

## 1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las actividades del mantenimiento y dotación de los parques priorizados corresponderán de acuerdo con el alcance de cada uno de ellos serán:

Mantenimiento de:

- Área de Juegos Infantiles.
- Zona de Canchas Múltiples y Patinaje
- Suministro e instalación de Mobiliario Urbano.
- Carpintería metálica (soldadura, pintura, reemplazo de malla y Módulos entre otros).
- Instalaciones deportivas - Mantenimiento Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas.
- Pisos Duros.
- Cubiertas y fachadas.
- Ecomuros



847

Para el Grupo No. 2 perteneces los parques ubicados en las siguientes localidades:

*Tabla 1. Esquema Básico de las localidades.*

| No. | LOCALIDADES |
|---|---|
| **Localidad 1** | **Usaquén** |
| **Localidad 2** | Chapinero |
| **Localidad 3** | Santa Fe |
| **Localidad 4** | San Cristóbal |
| **Localidad 5** | Usme |
| **Localidad 6** | Tunjuelito |
| **Localidad 7** | Bosa |
| **Localidad 8** | Kennedy |
| **Localidad 9** | Fontibón |
| **Localidad 10** | Engativá |
| **Localidad 11** | Suba |
| **Localidad 12** | Barrios Unidos |
| **Localidad 13** | Teusaquillo |
| **Localidad 14** | Los Mártires |
| **Localidad 15** | Antonio Nariño |
| **Localidad 16** | Puente Aranda |
| **Localidad 17** | La Candelaria |
| **Localidad 18** | Rafael Uribe |
| **Localidad 19** | Ciudad Bolívar |
| | Sumapaz |




*Ilustración 2. UPZ Bogotá.*



348

Las unidades territoriales o sectores de planificación y desarrollo urbano a nivel zonal – UPZ las cuales son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio.

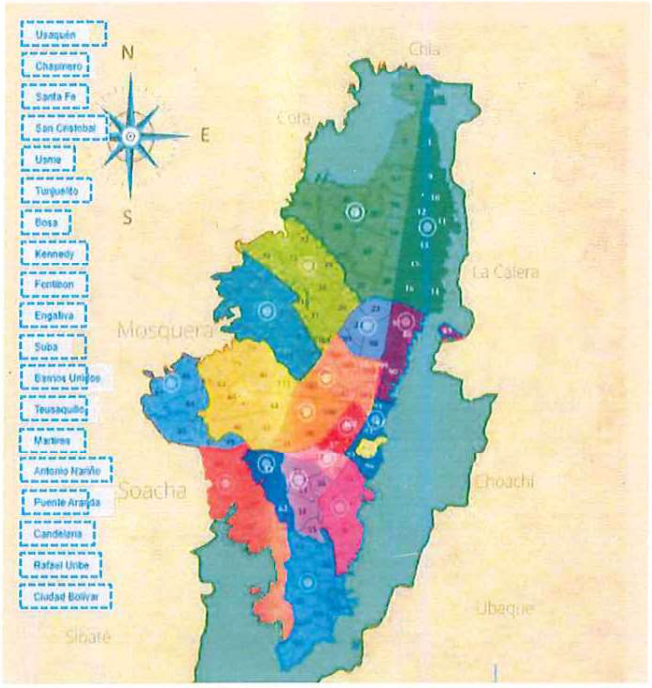



*Ilustración 3. Mapa ubicación de las localidades*

## 2. ESTADO CONTRACTUAL DE GESTIÓN

### 2.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO

*Tabla 2.Generalidades Contrato.*

| NUMERO DE CONTRATO DE OBRA | CONTRATO 4060 DEL 2024 |
|---|---|
| OBJETO | "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".<br>GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD". |
| CONTRATO DE OBRA No. | IDRD SG 4060-2024 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |
| INTERVENTORIA | CONSORCIO SANTA TERESA 28 |
| ENTIDAD CONTRATANTE | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD |



849

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 12.900.349.807,00<br>DOCE MIL NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | OCHO (8) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 20 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 19 DE JULIO DE 2025 |
| **SUSPENSIONES** | N/A |
| **ADICIONES** | No. 1: $2.924.350.500 |
| **PRORROGAS** | No. 1: Cuatro (04) meses a partir del 19 de julio del 2025 hasta el 19 de noviembre del 2025. |

## 2.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Se presentan el reporte de los indicadores de gestión del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025.

*Tabla 3. Seguimiento a los indicadores.*

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **NOMBRE** | **INDICADOR** | **META** | **RESPONSABLE** | **MEDICIÓN PERIODO 12** | **OBSERVACIÓN** |
| 1 | Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S | Tiempo real de ejecución de obra Vs tiempo proyectado de ejecución de obra | 100% | Director de obra | 77,70% | Durante el presente periodo han transcurrido 315 días los que representa el 92% y se han se ejecutado actividades en los siguientes parques priorizados por la entidad contratante – IDRD, se ejecutaron los siguientes parques: SAN CRISTOBAL 04-127, ALFONSO LOPEZ 05-141, URBANIZACION LA ESPERANZA 07-273, PORVENIR 07-391, TIMIZA 08-219, LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552, ZONA FRANCA 09-125, SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE) 10-290, SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) 12-091, SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) 13-089, QUIROGA (18-205), ESTADIO OLAYA HERRERA 18-207, URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5 11-686, LA FLORIDA 10-311, 11-052 URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA ), 16-099 MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO, 05-042 URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS, 18-041 URBANIZACON MARRUECOS II SECTOR, Y las emergencias asignadas por la supervisión del contrato Octubre - Programado 89% Ejecutado 77% Debido al incumplimiento del indicador se toma la acción correctiva 007. |



850

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | NOMBRE | INDICADOR | META | RESPONSABLE | MEDICIÓN PERIODO 12 | OBSERVACIÓN |
| 2 | Índice de valor ganado | Presupuesto ejecutado Vs presupuesto presentado | 100% | Director de obra | 77,70% | Ejecutado: $ 12.295.792.138,539 / Proyectado: $14.107.716.597,44. Debido al incumplimiento del indicador se toma la acción correctiva 008. |
| 3 | Índice de cumplimiento de entregables contractuales | No de entregables planificados Vs total de entregables radicados y aceptados sin observaciones | 80% | Director de obra | 80% | Se cumple con la meta establecida, aunque los informes del componente de calidad tuvieron observaciones por parte de la interventoría las cuales se están observando de manera inoportuna, por lo cual se deja un cumplimiento del 80%. |
| 4 | Índice de cumplimiento del plan de inspección y ensayos | No de actividades del plan de inspección y ensayos ejecutadas Vs las actividades del plan de inspección y ensayos planificadas | 100% | Profesional de Calidad | 100% | Durante este periodo de 7 actividades que tuvieron seguimiento en el plan de inspección y ensayos se cumplieron 7. |
| 5 | Índice de Satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes | No de encuestas de satisfacción con calificación buena Vs en total de encuestas de satisfacción | 80% | Profesional Social | 100% | Se recibe resultado de la encuesta con calificación de 3,57 sobre 5 es decir suficiente por lo cual el indicador cumple con la meta establecida. |
| 6 | Índice de satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes PQRFS | No de PQRFS resueltas efectivamente Vs total de PQRFS recibidas | 100% | Profesional Social | 100% | Durante el periodo se surtió una PQRFS. La cual fue tratada oportunamente. |
| 7 | Índice de Salidas No Conformes | No. de salidas no conformes eficaces Vs el No. de Salidas No Conformes | 80% | Profesional de Calidad | 80% | Para el presente periodo se han surtido10 SNC en la totalidad del proyecto de las cuales dos de ellas han sido ineficaces. Debido al incumplimiento del indicador se toma la acción correctiva 0012. |
| 8 | Índice de mejora continua | No de indicadores de gestión que cumplieron con la meta Vs el total de indicadores | 80% | Profesional de Calidad | 71% | De los 7 indicadores propuestos que aplicaron a este periodo, 2 no cumplieron con la meta por lo cual se seguirá trabajando en el plan de acción propuesto en aras de mejorar los diferentes procesos.<br>Este indicador de mejora continua es un indicador que se ve afectado por los otros indicadores, ya que es la medición del cumplimiento de los indicadores vs las metas propuestas, por lo cual no aplica acción correctiva propia, su mejora se refleja en la mejora de los demás indicadores. |

Con el fin de llevar la trazabilidad de las mediciones de los periodos y sus respectivas formulaciones se anexa el soporte de los indicadores.



351

Ver ***(Anexo 11 Soporte de Indicadores)***

## 2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Se han determinado y proporcionado las personas necesarias para la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos contractuales, así mismo se han asignado los roles, responsabilidades y autoridades de dicho personal, el personal que hace parte del proyecto se relaciona a continuación.

| CARGO | NOMBRE | % DE DEDICACIÓN | FECHA Y # RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA | FECHA Y # RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA | 50% | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| RESIDENTE DE OBRA | JOHN LIAN CUELLAR SALAMANCA | 100% | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| RESIDENTE DE OBRA | DAVID ORLANDO ORTIZ SABOGAL RETIRADO Y REMPLAZADO EL 6 DE FEBRERO POR LA ING. CLAUDOA PEDRAZA | 100% | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| RESIDENTE DE OBRA | CLADIA PEDRAZA | | BEL-MPI-ADM-0127-24 | IDRD-4080-G2-2024-226- "RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-127-24 CAMBIO HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA" |
| RESIDENTE DE OBRA | GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO | 100% | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| INSPECTOR DE OBRA | JOHN CARLOS SANTANA BOHORQUEZ | 100% | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| INSPECTOR DE OBRA | CRISTIAN CAMILO MALDONADO PEREZ reemplazado por Cristian Felipe Ardila (RETIRADO) | 100% | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |



352

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CRISTIAN FELIPE ARDILA | | BEL-MPI-ADM-0128-24 del 7 de febrero de 2025 | IDRD-408-G2-2024-557 del 23 de julio del 20025 |
| INSPECTOR DE OBRA | GINNA PAOLA CIPRIAN CASALLAS - Se reemplaza por Paula Andrea Ordóñez | **100%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| | PAULA ANDREA ORDOÑEZ COCA | **100%** | BEL-MPI-ADM-201-24- Solicitud Cambio Hoja de Vida Profesional Inspector de obra. 10 DE ABRIL DE 2025 | IDRD-4080-G2-2024-372- RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-201-24 HOJA DE VIDA INSPECTOR OBRA del 14 de febrero de 2025 |
| INSPECTOR DE OBRA | CLAUDIA ALEJANDRA SANCHEZ VELASCO | **100%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | CPK-IDRD-023A-2022 - Aprobación hojas de vida - Contrato de obra |
| INSPECTOR DE OBRA | DURGUY JULIET SIERRA | **100%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| INSPECTOR DE OBRA | JOSE DAVID PATIÑO GARZÓN INGRESO EL 3 DE FEBRERO DE 2025 En remplazo de Durguy Juliet Sierra | **100%** | BEL-MPI-ADM-092-24- SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL INSPECTOR DE OBRA. Del 20/01/2025 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | WILLIAM EDUARDO SEGURA GARCIA RETIRADO EL 30 DE JULIO | **57,86%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | PABLO ELIECER PIMIENTA VANEGAS | **57,86%** | BEL-MPI-ADM-0396-24– Solicitud de cambio Hoja de Vida Profesional en Seguridad Industrial del 11 de septiembre de 2025 | IDRD-4080-G2-2024-671 del 23 de septiembre de 2025- RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-0396-24 CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| PROFESIONAL AMBIENTAL | ADRIANA PACHON FAJARDO | **50,00%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| PROFESIONAL EN SISTEMA DE CALIDAD | SONIA PATRICIA SERRANO | **30,00%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| INGENIERO ESTRUCTURAL | JORGE WILLIAMS CARDENAS AGUJA | **30,00%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERO ELECTRICISTA O ELÉCTRICO | ANDRES FELIPE JIMENEZ VILLAMIL | **35,61%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| INGENIERO DE TRANSITO | JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ LLANOS | **20,00%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| INGENIERO HIDRÁULICO Y GAS | ANDRES MAURICIO TAVERA PINZON | **35,61%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| PROFESIONAL SOCIAL | VIVIANA PAULINA GARCIA MANCIPE | **30,00%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| PROFESIONAL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | JORGE BERNARDO TONCEL AREVALO SE REEMPLAZA POR EL ING. OSCAR DARÍO CÁRDENAS LOZANO | **50,00%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| | OSCAR DARÍO CÁRDENAS LOZANO | | BEL-MPI-ADM-0128-24- Solicitud Cambio Hoja de Vida Profesional de Presupuestos y Programación e Inspector de Obra. 7 de febrero de 2025 | IDRD-4080-G2-2024-232- RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-136-24 CAMBIO HOJA DE VIDA PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN. 12 de febrero de 2025 |
| PROFESIONAL FORESTAL | MARICELA ASDRID TOLOZA CUBAQUE | **20,00%** | BEL-MPI-ADM-014-24 – Remisión hojas de vida. 26/11/2024 | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| Topógrafo | RODRIGO MOSQUERA IBAÑEZ | **20,00%** | | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| Cadenero 1 | RODRIGO MOSQUERA GARZON | **20,00%** | | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| Cadenero 2 | ERVIN ARTURO RODRIGUEZ DUARTE | **20,00%** | | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| Secretaria | MARIA CAMILA JOJOA HERNANDEZ | **5,00%** | | |



854

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| Contador | MARIANA BOLIVAR ARENAS | 3,00% | | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |
| Abogado | MIGUEL FRANCISCO DE LA ESPRIELLA GARCIA | 3,00% | | IDRD-4080-G2-2024-065 del 23 de diciembre de 2024 RESPUESTA COMUNICADOS BEL-MPI-ADM-061-24 Y BEL-MPI-ADM-062-24 - SUBSANACION HOJAS DE VIDA |

Tabla 4. Cuadro de Firmas.

| CARGO | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| Director de obra | LUIS ENRIQUE GUZMAN CONDIA | |
| Profesional calidad | SONIA PATRICIA SERRANO ESPINEL | |

## 2.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

Se han venido implementando las actividades propuestas en el plan de calidad, toda vez que el Plan de Calidad propuesto para el proyecto ya se encuentra aprobado por la Interventoría.

## 2.5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

### 2.5.1 ACTAS COMITÉ

A continuación, se relaciona las actas de los comités celebrados en el periodo. (***Anexo 1 Actas comité)***

*Tabla 5. Actas Comité.*

| Acta No | COMITÉ / REUNIÓN | FECHA |
|---|---|---|
| 36 | Comité | 14/10/2025 |



855

| | | |
|---|---|---|
| 37 | Comité | 27/10/2025 |

### 2.5.2 SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

Los compromisos son adquiridos en los comités de obra se dejan consignados en las actas, así mismo los asistentes del equipo del BELZCON toman las notas respectivas quienes propenden por dar cumplimiento a estos bajo el liderazgo del director de obra Ing. Enrique Guzman quien gestiona con cada uno de los responsables y se hace seguimiento y control al avance de estos; desde el área de calidad se presenta el registro de dicho seguimiento en los informes mensuales. ***(Anexo 1 Control de compromisos - Actas comité)***

### 2.5.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Como parte del control de las comunicaciones, se mantiene el control de la correspondencia enviada y recibida. Para el presente periodo, se anexa el cuadro de seguimiento a la correspondencia enviada y recibida ***(Anexo 2 Correspondencia Enviada y Recibida.)***

### 2.5.4. BITÁCORA DE OBRA

La bitácora se abre el 20 de noviembre de 2024, tras surtirse el acta de inicio, es así como durante el presente periodo se llevó la bitácora de obra, que es la memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logra la comprensión general de la obra y parte de la evidencia del desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra, ésta se está llevando debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella se tiene acceso, cuando lo requieran, los delegados de la supervisión del IDRD. (***Anexo No. 3 bitácora de Obra)***

## 2.6. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

### 2.6.1. CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA



756

Para el presente periodo se conserva el formato del LMD, al cual se le incluyeron las columnas de observación y descripción del cambio para poder atender las observaciones de la interventoría respecto a dicho documento.

No se generan cambios a los documentos como: planes, programas, otros formatos, ni planos.

Se maneja en DRIVE la información documentada de tal manera que sea de fácil acceso al personal que haga parte del proyecto.

Como seguimiento y control a la información documentada, control de los documentos internos y/o externos que se requieran en el desarrollo del Contrato 4060 de 2024 se enuncia lo siguiente:

### 2.6.2. CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros que se han generado en el periodo se han conservado y se han manejado debidamente sin tachones ni enmendaduras: se manejó debidamente la bitácora, las actas de comité, listas de asistencia, verificación de equipos topográficos, entre otros.

Cabe anotar que se surte la primera adición y prórroga al contrato de acuerdo con lo enunciado anteriormente en la tabla No. 2 Generalidades del contrato.

### 2.6.3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Durante el presente periodo, se actualiza el Listado Maestro de Documentos Internos y Externos. Se incluyen las versiones presentadas de cronograma y presupuesto. ***(Anexo 4 LMD Listado maestro de documentos.)***

## 2.7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES

Para el presente periodo, se presenta el plan de adquisiciones, el cual se está monitoreando mensualmente de acuerdo con el avance y necesidades del proyecto y alineado con el flujo de caja y programación de obra. ***(Anexo 5 Plan de Adquisiciones.)***

# 3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO

## 3.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

Para el desarrollo y ejecución del alcance del presente contrato se determinó y proporcionó la infraestructura necesaria para cumplir con los requerimientos del cliente y lograr la



857

conformidad con los requisitos del producto. la Oficina Administrativa, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 105 No. 46 – 26 Piso 2, la cual cuenta con software; hardware; muebles, enseres y equipos de comunicación; para el presente periodo se cuenta con los campamentos de obra, los cuales tienen las condiciones de ambiente de trabajo adecuado, luz, temperatura, ventilación, etc.

### 3.1.1 EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS

- Ambiente para la operación de los procesos

Durante el presente periodo de  se ha determinado, proporcionado y mantenido el ambiente necesario para la operación de los procesos y la ejecución de la obra, la combinación de los factores humanos y físicos ha sido efectiva para el buen funcionamiento de la obra, se ha contado con un ambiente tranquilo, libre de conflictos; los espacios se mantienen a una temperatura adecuada, bien ventilados e iluminados y con puntos de hidratación para contemplar la estabilidad y vitalidad de los diferentes colaboradores en este proyecto.

### 3.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Para el periodo se presenta el siguiente listado de vehículo-volqueta y/o maquinaria las cuales se mantuvieron en el proyecto.

*Tabla 6. Maquinaria y Equipos.*

| No | TIPO | PLACA | MARCA | PIN | MODELO | SOAT | TECNOMECANICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETROCARGADOR | NKJ575SVCPKH33080 | CASE 575SV | N/A | 2023 | SI | PERIODICA |
| 2 | MINICARGADOR | N/A | BOBCAT S570 | N/A | 2014 | SI | PERIODICA |
| 3 | CAMIÓN | TAP920 | ZNA | N/A | 2011 | SI | PERIODICA |
| 4 | VOLQUETA | LZN571 | VOLKSWAGEN | N/A | 2023 | SI | PERIODICA |

- Equipos Incluyendo Hardware y Software

El consorcio cuenta en obra con los equipos de cómputo (HARDWARE Y SOFTWARE), necesarios para la buena operación de los procesos técnicos, administrativos y financieros que haya a lugar durante la ejecución de la obra.

### 3.2 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS



858

Se anexa al presente el Plan de Inspección y Ensayos construido para el proyecto y el registro de seguimiento de este, en el formato elaborado para tal fin. ***(Anexo 6 Seguimiento a los ensayos).*** Y los soportes que evidencian dicho cumplimiento.

Se contempla que para compras menores las cuales se efectúan por ferretería para atención de emergencias no se exige el certificado de calidad.

### 3.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

El Consorcio trabaja con el laboratorio CONCRELAB acreditado por la ONAC, el cual cuenta con todos sus equipos de seguimiento y medición debidamente mantenidos y calibrados.

Los equipos de topografía que se usan para las labores del proyecto se encuentran debidamente calibrados y se verifican quincenalmente de acuerdo con lo establecido por el IDRD en su formato. Cada equipo de medición debe tener su certificado de calibración comparado con patrones de medición trazables o patrones de mediciones nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración. A continuación, se relacionan los equipos a los que se les hace seguimiento y medición. ***(Anexo 7 Control de Topografía).***

#### 3.3.1. EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

- ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO

  El proyecto cuenta con el laboratorio CONCRELAB debidamente acreditado el cual fue presentado a Interventoría y del que se ha entregado el certificado de acreditación vigente en periodos anteriores.

- CALIBRACIÓN EQUIPOS LABORATORIO

  El proyecto cuenta con el laboratorio CONCRELAB del cual se mantienen los certificados de calibración aportados en el periodo 11.

- EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

  El CONSORCIO ejecuta sus actividades de topografía asegurando la validez y fiabilidad de sus resultados, por lo cual hace seguimiento al estado de conformidad



359

de los equipos de topografía, presenta los certificados de calibración y las verificaciones quincenales de los equipos en el formato establecidos por el IDRD. ***(Anexo 7 Control de topografía).***

*Tabla 7. Control Equipos Topografía.*

| Equipo | Marca | No. Serial | Certificado | Fecha de calibración | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIÓN | HI TARGET | H236544 | 2742 | 26/09/2025 | 26/03/2026 |
| NIVEL | HI TARGET | 332060172 | 2805 | 10/05/2025 | 10/11/2025 |



860

*Tabla 8. registro fotográfico de Equipos de Topografía.*

| REGISTRO FOTOGRÁFICO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS | |
|---|---|
|  |  |
| Descripción:Estación Total Hi Target | Descripción:Estación Total Hi Target |
|  |  |
| Descripción:Nivel Automático Hi Target. | Descripción:Nivel Automático Hi Target. |

## 3.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

Se presenta el registro del seguimiento en el formato establecido para tal fin, con el respectivo reporte de los materiales recibidos en el presente periodo. (***Anexo 8 Trazabilidad de los materiales)***

## 3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Se presentan a continuación todas las actividades realizadas en este periodo las cuales de efectuaron con todos los lineamientos técnicos y de calidad exigidos en el contrato como en las especiaciones técnicas del IDRD.



861

Se aclara que todas las actividades realizadas se han ejecutado bajo la supervisión de la interventoría y se han aplicado los controles establecidos en el plan de calidad; los procesos constructivos se han llevado acabo de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas y la normatividad vigente NSR-10 entre otras, se han realizado los ensayos establecidos, y se gestiona la consecución de los certificados de calidad, aunque en este último en ocasiones nos demoran las entregas.
Como evidencia de que las cosas se efectúan de esta manera a se presentan las liberaciones respectivas. ***(Anexo 9 Liberaciones)***

### 3.5.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS (EMERGENCIAS)

#### 3.5.1.1. PARQUE SAUZALITO

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades en atención a la emergencia por tubería rota en sector tubería de suministro que se dirige a baños públicos segundo piso, sector salón de boxeo.

- Demolición de muros en mampostería en zona salón de boxeo.
- Desmonte de redes hidráulicas PVC-P 2" en zona salón de boxeo.
- Suministro e instalación de tubería PVC-P 2" en zona salón de boxeo.
- Suministro e instalación de accesorios PVC-P 2" en zona salón de boxeo.

#### 3.5.1.2. PARQUE QUIROGA

Durante este periodo se atendió emergencia

- Se realiza el cambio del kit completo de flotadores y manijas sanitarios: 1 y 2 baños coliseo.
- Se realiza el cambio de flotador de ingreso tanque de reserva número 3 aéreo de los baños Coliseo.
- Instalación llave de riego rota del ecomuro Coliseo.

### *3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS*

#### 3.5.2.1. PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se continúan trabajos de estructura metálica (módulo PMU) en gradería occidental sur.
- Fabricación de módulo de cabina de locución graderías costado oriental.
- Se realizan actividades de urbanismo de zona de módulos baños costado cancha sintética; incluyendo recebo compacto, instalación adoquín, cenefa en concreto de confinamiento, elaboración de muros en ladrillo a la vista, redes hidrosanitarias.

### 3.5.2.2. PARQUE ELPORVENIR

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza (lijado), pintura anticorrosivo y pintura tipo esmalte en estructura metálica de cerramiento cancha sintética F8.
- Limpieza (lijado), pintura anticorrosiva en estructura metálica de cerramiento canchas de tenis.
- Desmonte de lámina (señal) en cerramiento cancha sintética F8.
- Nivelación y compactación mecánica de material granular en pista de trote zona cancha sintética F8.

### 3.5.2.3. PARQUE QUIROGA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintura de cancha múltiple; incluyendo aplicación de recíbase, sellantes y pinturas.

### 3.5.2.4. PARQUE BERLIN

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha sintética, incluyendo: Soldadura, cambio de módulos, deteriorados, Lijado, anticorrosivo y pintura del mismo.

### 3.5.2.5. PARQUE URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha; incluyendo: soldadura, cambio de módulos deteriorados, Lijado, anticorrosivo y pintura del mismo.

### 3.5.2.6. PARQUE TIMIZA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Demolición de muro en mampostería en zona de acceso No. 2
- Demolición de columnetas y vigas de confinamiento en concreto en zona de acceso No. 2
- Viga de concreto 0,30 x 0,30 m en zona de acceso No. 2
- Suministro e instalación de parales metálicos de cerramiento en zona de acceso No. 2
- Suministro e instalación de cerramiento en malla Fortinet en zona de acceso No. 2
- Cargue, retiro y disposición final de RCD en zona de acceso No. 2
- Desmonte y reinstalación de baranda M-80 en zona sendero del lago (tramo 2)
- Suministro e instalación de baranda M-80 en zona sendero del lago (tramo 2)

### 3.5.2.7. PARQUE LAS LUCES Y VILLA RICA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha; incluyendo: soldadura, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura de este.

### 3.5.2.8. PARQUE LAS AMERICAS OCCIDENTAL IV ETAPA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha; incluyendo: soldadura, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura de este.

### 3.5.2.9. PARQUE PRADO PINZON

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento del cerramiento de la cancha de futbol sintética.

### 3.5.2.10. PARQUE URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Lijado de pintura existente del cerramiento de la cancha de futbol sintética
- Aplicación de anticorrosivo cerramiento de la cancha de futbol sintética.

### 3.5.2.11. PARQUE *URBANIZACIÓN LA ESPERANZA*

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Pintura tipo esmalte en estructura metálica de cerramiento cancha sintética F8.
- Desmonte de lámina (señal) en cerramiento cancha sintética F8.
- Recubrimiento sintético y demarcación en placa de contrapiso en zona pista de patinaje
- Suministro e instalación de piso caucho en zona de juegos y pista de trote (tramo 1)
- Retiro de banner en baranda zona pista de patinaje.
- Limpieza (lijado) y pintura anticorrosiva en baranda M-83 zona de juegos infantiles
- Cerramiento provisional en contorno de pista de trote (tramo 2)
- Desmonte de piso caucho en pista de trote (tramo 2)

### 3.5.2.12. PARQUE BARRRIO LA PEPITA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha; incluyendo: soldadura, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura de este.

### 3.5.2.13. PARQUE SIMÓN BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA DEL SALITRE)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Desmonte puertas de los baños del módulo de comida de la señora Rosa
- Instalación de puertas de los baños del módulo de comida de la señora Rosa
- Retiro de puertas de baños para disposición final
- Arreglo de fisuras en pista de patinaje por garantía

### 3.5.2.14. PARQUE GORGONZOLA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha; incluyendo: soldadura, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura de este.

### 3.5.2.15. PARQUE URBANIZACION MARRUECOS II SECTOR

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha: incluyendo; soldadura, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura de este.

### 3.5.2.16. PARQUE URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Reinstalación de módulos nuevos cerramiento cancha sintética por garantía
- Retiro de módulos existentes para disposición final
- Instalación de módulos nuevos del cerramiento de la cancha sintética.

### 3.5.2.17. PARQUE MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Excavación manual en zona de juegos infantiles
- Suministro e instalación de geotextil NT-1600 en zona de juegos infantiles
- Tamizado de arena Peldar existente en zona de juegos infantiles
- Relleno y nivelación de material seleccionado (arena Peldar) en zona de juegos infantiles
- Suministro e instalación de arena Peldar en zona de juegos infantiles
- Cargue, retiro y disposición final de RCD en zona de sendero (rampa)

### 3.5.2.18. PARQUE URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se continua con la aplicación de anticorrosivo y posteriormente pintura sintética de color verde a todo el cerramiento perimetral de la cancha sintética.
- Suministro e instalación de módulos de cerramiento nuevos en reemplazo de los módulos en mal estado.



866

### 3.5.2.19. PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Demolición de placa de contrapiso en concreto e:0,10 m en zona senderos monumento La virgen
- Instalación de placa de contrapiso en concreto 3000 PSI e:0,10 m en zona senderos monumento La virgen
- Cargue, retiro y disposición final de RCD

### 3.5.2.20. PARQUE FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral de la cancha, incluyendo: soldaduras, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura de este.

### 3.5.2.21. PARQUE VALLES DE CAFAM

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Desmonte de cerramiento en malla Fortinet en zona costado nor occidental
- Suministro e instalación de parales para cerramiento en malla Fortinet en zona costado nor occidental
- Suministro e instalación de malla Fortinet en zona costado nor occidental

### 3.5.2.22. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Reunión con vendedores del módulo de comidas (tren) entre la administración del parque, IDRD (parte legal y social) y contratista con el fin de ratificar la actividad de mantenimiento de los módulos.
- Instalación de cerramiento perimetral en la zona a intervenir.
- Inicio de actividades de mantenimiento módulo de zona de comidas, se realiza el desmonte de láminas de los módulos de comida.
- Revisión para puntos eléctricos en los módulos de comida.
- Retiro de vidrios módulos de comida.



867

### 3.5.2.23. PARQUE URBANIZACIÓN PRIMAVERA

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral cancha: incluyendo; soldadura, cambio de módulos deteriorados, lijado, anticorrosivo y pintura de este.

### 3.5.2.24. PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación de piso en gránulo de caucho de color en la zona de juegos infantiles.
- Retiro de material granular.
- Limpieza en zona de juegos infantiles.
- Cargue, retiro y disposición final de RCD's.

## 4. CONTROL DE LA GESTIÓN

### 4.1. CONTROL DE CAMBIOS

Para el presente periodo no se presentan cambios de diseño.

### 4.2. SALIDAS NO CONFORMES

En este periodo se hizo seguimiento a las 4 SNC, que para el proyecto son 4 incluyendo aquellas resultantes de la auditoría. (Ver tabla No 10).

A continuación, se relacionan las Salidas no conformes generadas en el proyecto:

*Tabla 9. Salidas No Conformes.*

| No. | DESCRIPCION | FECHA | PROCESO | TIPO ACCION | FUENTE | ESTADO | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se está incumpliendo con los compromisos adquiridos en comité y por ende con los requisitos contractuales por parte con del Consorcio Belzcon IDRD I, lo cual se está evidenciando en los comités semanales celebrados con la Entidad y la Interventoría los días 26 de noviembre y 03 de diciembre de 2024. | 03/12/2024 | Gestión Estratégica | SNC | Interventoría | Abierta | No ha sido eficaz, si bien es cierto se revisan los compromisos existen determinantes que han impedido el cumplimiento total de los mismos, se toma acción correctiva 001 |



868

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Presunto Incumplimiento según lo establecido en los siguientes comunicados:IDRD-4080-G2-2024-025 del 24/12/2024,IDRD-4080-G2-2024-074 del 26/12/2024,IDRD-4080-G2-2024-094 del 30/12/2024,IDRD-4080-G2-2024-130 y IDRD-4080-G2-2024-133 del 17/01/2025,IDRD-4080-G2-2024-142 del 20/01/2025,IDRD-4080-G2-2024-179 y IDRD-4080-G2-2024-187 del 31/01/2025,IDRD-4080-G2-2024-200 del 04/02/2025, IDRD-4080-G2-2024-203 y IDRD-4080-G2-2024-207 del 5/02/2025, IDRD-4080-G2-2024-210 del 06/02/2025, IDRD-4080-G2-2024-220 del 10/02/2025, IDRD-4080-G2-2024-248 del 17/02/2025, IDRD-4080-G2-2024-276 del 06/03/2025. | 24/12/2024 | Técnico | SNC | Interventoría | Abierta | El área Jurídica y la alta dirección trabajaron de la mano en afrontar el tema del presunto incumplimiento, se sostuvieron varias reuniones y se implementaron acciones que propendieron por minimizar el tema. La alta dirección |
| 3 | Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, ensayos de laboratorio, caracterizaciones de materiales granulares y diseño de mezclas. | 13/01/2025 | Calidad | SNC | Interventoría | Abierta | Se toma acción correctiva No 002, si bien es cierto la acción correctiva tomada no ha sido del todo eficaz, si ha mejorado bastante la consecución de los certificados de calidad al disponer a nuevo personal de apoyo como Rossy y Paula que han aportado a la mejora del proceso, llevando la información de una manera organizada y de fácil acceso, utilizando la herramienta DRIVE para algunos temas de uso común del equipo de trabajo. |
| 4 | Incumplimiento de las metas establecidas de los siguientes Indicadores de Gestión: -Índice de cumplimiento de entregables contractuales, -Índice de cumplimiento del Plan de Inspección y ensayos: Incumplimiento de requisitos contractuales por la falta de certificados de calidad, fichas técnicas y frecuencia de ensayos establecida en el plan de inspección y ensayos.-Índice de mejora continua. | 23/01/2025 | Mejora continua | SNC | Interventoría | Abierta | Se toma acción correctiva No 003 sin embargo, esta no ha sido eficaz, si bien es cierto se revisan las causas que conllevan a no alcanzar las metas existen determinantes que han impedido el cumplimiento total de ellas. |
| 5 | Se evidencia un avance del 51% en el cual aún no se ha aplicado la encuesta de satisfacción del Cliente, lo cual contraviene con lo establecido en el plan de Calidad numeral 20,3 Encuesta de satisfacción "...Con el fin de hacer seguimiento a las percepciones del cliente: IDRD dentro del presente plan de la calidad se establece efectuar encuestas de satisfacción al cliente, las cuales se llevarán a cabo trimestralmente." | 7 /06/ 2025 | Calidad | NC | Auditoría de 30% | Abierta | Se toma acción correctiva No 004, Se aplico la encuesta, sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe esta no fue contestada. |



369

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Se evidencian muestras de cilindros de concreto tomadas el 22 de mayo de 2025 sin un curado adecuado, lo cual contraviene con lo establecido en la LISTA DE CHEQUEO SEMANAL DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA y en la NTC 550 numeral 10.2.2. Curado inicial" después del moldeo, los especímenes se deben almacenar a un intervalo de temperatura de 16°C a 27°C y en un ambiente húmedo, de manera que se impida la pérdida de humedad hasta por 48h.." | 7 /06/ 2025 | Técnico y Calidad | NC | Auditoria de 30% | Abierta | Se toma acción correctiva No 004A, se sumergen los cilindros en agua de manera inmediata de acuerdo lo establecido en la norma NTC 550 numeral 10.2.2. Se concientiza a la profesional encargada del Simón Bolivar y su equipo de trabajo de la importancia de dar cumplimiento con el curado adecuado de los cilindros. |
| 7 | Se ha evidenciado en la presentación de los informes SST, de los meses de julio y agosto, que no se presentan los pagos de seguridad social correspondientes al personal a cargo del aliado Carlos Ardila. | 30/07/2025 | SST | SNC | Interventoria | Cerrada | Se toma acción correctiva No 005, finalmente el aliado Carlos Ardila pago las planillas pendientes el 29 de septiembre se adjuntan los soportes. |
| 8 | La profesional de calidad está presentando los informes del componente de calidad y las respectivas subsanaciones de estos de manera inoportuna. Falta de oportunidad en la información de insumo para el informe de calidad por parte del área técnica, tal como: informe técnico, actas de comité, actas de puesta en servicio, verificaciones de los equipos de topografía, seguimiento al plan de adquisiciones, registro completo de los materiales en el Drive, bitácoras, certificados de calidad y fichas técnicas ( los proveedores no entregan a tiempo) | 29/08/2025 | CALIDAD | SNC | Interventoria | Abierta | Se toma acción correctiva No 006, se han realizó la socialización via correo electrónico, y se reitera la solicitud de la información, sin embargo, esta no es entregada al componente de calidad oportunamente. |
| 9 | Incumplimiento del control de procesos y servicios contratados externamente – ISO 9001:2015 (Numeral 8.4) | 23/09/2025 | COMPRAS | NC | Auditoria 70% | Abierta | Se toma acción correctiva 007 |
| 10 | Falta de actualización y control del Plan de Inspección y Ensayos Según el numeral 8.1 "Planificación y Control Operacional" | 23/09/20255 | CALIDAD | NC | Auditoria 70% | Abierta | Se toma acción correctiva 008 |

Ver ***(Anexo 10 Salidas No Conformes)***

## 4.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Como está previsto desde el Plan de Calidad el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 cuida la propiedad del cliente perteneciente a los clientes o proveedores externos que están bajo su control por lo anterior se identifican, verifican, protegen y salvaguardan las propiedades de los clientes, como registro de ello se utiliza el formato dispuesto por el IDRD dejando las actas donde se evidencie.



870

En el presente periodo no se gestionaron actas en donde consta el tratamiento a la propiedad del cliente.

### 4.4. AUDITORIAS

En el presente no se realizaron auditorias, en el presente periodo se adelantas los planes de acción resultado de los hallazgos respectivos.

Ver ***(Anexo 12 Auditoria).***

### 4.5. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

En el presente periodo continuamos esperando la contestación de la encuesta por parte del IDRD, para de esta manera utilizarlo para la mejora continua y presentar los resultados a la interventoría. Se da claridad sobre en momento en que fueron efectuadas las dos auditorias exigidas contractualmente. Ver ***(Anexo 13 Encuesta de Satisfacción).***

### 4.6. PQRFS

Durante el periodo se surte una PQRFS por lo cual se reporta el mismo consolidado de las PQRFS del proyecto. Ver ***(Anexo 14 PQRFS).***

## 5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

- Se continua con la implementación el Plan de Inspección de Ensayos presentado con el apoyo del laboratorio CONCRELAB.
- Se realizan recorridos y comités de obra en donde se trataron temas de tipo técnico y administrativo de manera eficaz.
- Se continúa con la implementación de los formatos establecidos por el IDRD, para la gestión de la Calidad.



871

- Se sigue optimizado la gestión de los procesos en aras de mejorar las metas establecidas en los indicadores de gestión, parte de ello resultante de las acciones correctivas tomadas ante las no conformidades encontradas.

## ANEXOS

Anexo 1 Actas de comité y seguimiento a los compromisos

Anexo 2 Correspondencia

Anexo 3 Bitácora

Anexo 4 Listado Maestro de Documentos

Anexo 5 Plan de Adquisiciones



872

Anexo 6 Seguimiento al Plan de inspección y ensayos

Anexo 6A Ensayos de laboratorio

Anexo 6B Certificados de Calidad

Anexo 6C Fichas técnicas

Anexo 7 Control de equipos de seguimiento y medición

Anexo 8 Trazabilidad de los materiales

Anexo 9 Liberaciones

Anexo 10 Control Salidas No Conformes

Anexo 11 soporte de Indicadores

Anexo 12 Auditoria

Anexo 13 Encuesta de satisfacción

Anexo 14 PQRFS



873

## TABLAS

Tabla 1. Esquema Básico de las localidades. ..... 7
Tabla 2.Generalidades Contrato. ..... 8
Tabla 3. Seguimiento a los indicadores. ..... 9
Tabla 4. Cuadro de Firmas. ..... 14
Tabla 5. Actas Comité. ..... 14
Tabla 6. Maquinaria y Equipos. ..... 17
Tabla 7. Control Equipos Topografía. ..... 19
Tabla 8. registro fotográfico de Equipos de Topografía. ..... 20
Tabla 9. Salidas No Conformes. ..... 27



874

## ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización. ..... 6
Ilustración 2. UPZ Bogotá. ..... 7
Ilustración 3. Mapa ubicación de las localidades ..... 8

**Arq. Patricia Serrano Espinel**
**Profesional de la calidad**
**Consorcio Belzcon IDRD 1**



875

# ANEXO 1

# CONTROL ACTAS DE COMITÉ

BOGOTÁ

| Si no maneja consecutivo coloque N.A | COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 36 COP 4060124 Cto Int 4080/24 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | | 14 | 10 | 2025 |

LUGAR: Oficina Interventoría - Solium S.A.S HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 12:00 m

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado de asistencia | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Revisión compromisos pactados. | 4. SST |
| 2. Técnico | 5. |
| 3. Control cronograma | 6. |

**TEMAS TRATADOS**

1. Revisión compromisos pactados:

1.1. Subsanación informe mensual de calidad # 10:

No se cumplió el compromiso, se informa por parte de interventoría que el contratista aportó el informe # 11, no obstante, a la fecha el informe # 10 no ha sido subsanado.

El contratista manifiesta que aún no cuenta con los resultados de las pruebas de tintas para subsanar: Pergola Country, invernadero y una cancha. La subsanación se entregaría el día de mañana.

1.2. Subsanación informe mensual SST # 10:

No se cumplió el compromiso

1.3. Informe mensual ambiental:

Se informa que el documento correspondiente al informe # 10 fue subsanado y se encuentra aprobado.

1.4. Informe técnico # 11:

Se solicita incluir la información eléctrica que no se aportó en el informe # 10 en el informe # 11 con la respectiva subsanación a las observaciones de ese mes. El contratista manifiesta que subsana el próximo

martes.

En resumen, en cuánto a informes mensuales del contrato 4060 de 2024 se tiene:

- Informes mensuales # 10: Calidad → No aprobado, SST → No aprobado
- Informes mensuales # 11: Calidad En revisión, Ambiental: En revisión SST En subsanación de observaciones, al igual que el componente técnico.

La supervisión solicita que los informes estén subsanados en su totalidad ésta semana.

1.5 Otaya - Puertas:

No se ha continuado con la actividad, el contratista manifiesta que están en fabricación y que la instalación se iniciará el día de hoy. Se solicita al contratista informar el estado de la fabricación de la estructura metálica de los módulos de servicio.

1.6 CEFE San Cristóbal - Informe hidraúlico:

No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que ésta semana se realizará la visita para emitir el informe, se programa visita para el próximo jueves a las 8:00 am.

1.7 Tunal - Ascensores emergencia:

No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que OTIS solicitó cancelar el saldo que se le adeuda para atender la emergencia.

El contratista informa que no había realizado el pago pues los informes entregados no cumplen. Se solicita por parte de interventoría que, de ser necesario se subsanen los informes por parte de los residentes de obra y no se dependa del proveedor.

1.8 Quiroga - Arte sintético:

Se cumplió el compromiso, el arte ya se encuentra definido.

1.9 Quiroga - Secretaría de Salud:

El contratista informa que las tomas ya están, las actividades adicionales solicitadas por la administración del parque no se encuentran priorizadas pues no hay recursos. Las tomas las instaló ambulancia de parques y no el contratista.

1.10 Florida - Inicio eléctrico:

No se cumplió el compromiso, no se ha iniciado, el contratista manifies-

ta que realizará la actividad ésta semana.

1.11. Imprevistos:
El compromiso continúa pendiente

1.12 Gimnasio del Norte - Cubierta:
El compromiso no se cumplió, continúa pendiente

1.13 PRD. Visita Retie y Retilap:
No se cumplió el compromiso.

1.14. Cometas - Eléctrico:
No se cumplió el compromiso

1.15. PRD - Fotometria Iluminación:
No se cumplió el compromiso.

1.16. Niños - Piso Deck:
Se cambió la pieza y se finalizó la actividad, se revisará por parte de interventoría.

1.17 Niños - Repuestos juegos:
No se cumplió el compromiso, no se ha iniciado la actividad. Se solicita al contratista tomar las medidas para garantizar el flujo de caja para el proyecto.

1.18. Cayetano - Banner:
El compromiso continúa pendiente.

1.19 Cafam Gavilanes - Eléctrico:
No se cumplió el compromiso. Se solicita al contratista tomar las medidas necesarias para garantizar flujo de recursos para el proyecto.

1.20. Palestina - Garantía piso:
No se cumplió el compromiso, se reitera al contratista que debe remitir el informe correspondiente.

1.21. Gilma Jimenez - Garantía travesaño / piso:
No se cumplió el compromiso, se realizará la actividad ésta semana.

1.22. Gilma Jimenez - Máquinas Biosaludables:
No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que las máquinas continúan en mantenimiento en el taller.

1.23. Palacio de los Deportes - Puesto en servicio mesón:
Pendiente, se realizará el acta mañana con el administrador.

1.24 Chicalá - Acometidas:

TEMAS TRATADOS

No se cumplió el compromiso.

1.25. UDS - Puertas, baños, terminación eléctrico:

- El contratista manifiesta que la puerta no está en presupuesto, la puerta de Doña Rosa, pero se aclara que sí está incluido en el balance.
- Las puertas en acero ya se instalaron
- Se solicita por parte de IDRD revisar el balance, pues las puertas son necesarias.
- Del componente eléctrico no hay avances.

1.26. UDS - Emergencia atletismo:

Se atendió la emergencia del componente eléctrico, respecto a las observaciones de la pista de patinaje el contratista informa que mañana se realizará visita y se va a remitir el cronograma de subsanación de las observaciones.

1.27. Terminación Timiza y Valles de Cafam:

No se cumplió el compromiso, en Valles de Cafam no se dió terminación de las actividades y en Timiza se se instalaron parales para instalar malla

Falta la baranda del sendero en Timiza y se solicita. hacer retiro de los RCD. La piedra se debe disponer según lo solicitado por la administración del parque.

El contratista manifiesta que termina las actividades ésta semana.

1.28. PED - lámina baño mujeres:

No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que instalará la lamina el próximo jueves.

1.29. Milenta Tejar - Terminacion

- No se cumplió el compromiso, no se ha instalado la baranda y no se ha finalizado la arena de la zona de juegos. El IDRD solicita finalizar actividades el martes.

1.30 Independencia - Cerramiento:

No se cumplió el compromiso

1.31 Complejo Acuatico - Acometidas:

Se informa que la actividad finalizó ésta semana, se verificará lo correspondiente por parte de interventoría.

TEMAS TRATADOS

1.32 Pinares - Emergencia cerramiento
No se cumplió el compromiso, el contratista no ha iniciado la intervención.
1.33 Porvenir - Terminación:
El compromiso continúa sin cumplirse, sólo se está trabajando en el cerramiento de la cancha.
- No hay avance en módulo solar, banner, pista de trote.
El viernes se retoman actividades de piso de caucho
1.34 Cedritos - Acometida:
No se cumplió el compromiso, no ha iniciado la actividad.
1.35 Bicicleteros Ponderables:
No se cumplió el compromiso, no ha iniciado la instalación de los elementos en los parques definidos
1.36. Altos de la estancia:
Se terminó la emergencia priorizada.

*Gaitana, pendiente instalación de concertina.

2. Técnico:
2.1. Gustavo Uribe: No iniciado, no se cumple el compromiso.
2.2. Miravalle En ejecución, ya debería estar definido. (Terminado).
Respecto al balance, se solicita nuevamente su actualización. para verificación de los cerramientos perimetrales de las canchas. Se recuerda que el contrato ya no cuenta con recursos por lo cual no se aceptan mayores intervenciones.
2.3. Esperanza:
Se finalizó la pista de patinaje, los demás frentes presentan observaciones como la pintura del cerramiento. de la cancha.
Pista de trote no presenta avance significativo.
Se solicita instalar la baranda de la zona de juegos infantiles.
2.4. Porvenir: Debería estar finalizado según cronograma.
El módulo solar no se ha ejecutado
los demás frentes se encuentran en ejecución.
2.6. Americas Occidental: Inicio tardío, se encuentra en ejecución.
2.7 Sauces: Inicio tardío, se encuentra en ejecución

TEMAS TRATADOS

2.8 Lucas Villarica: La actividad presenta atraso, se encuentra en ejecución y finalizaría la próxima semana

2.9 Primavera Kennedy: No iniciado, el contratista informa que iniciará mañana, se encuentra por fuera de los tiempos establecidos en la programación

2.10 Zona Franca - Presenta atraso, no cuenta con personal actualmente, el próximo lunes inician actividades de piso caucho según lo informado por el contratista.
Se remitió el arte del piso para aval de IDRD.

2.11 Florencia I Sector y Florencia Tronquitos - Terminado

2.12 UDS - Pista patinaje: Como se mencionó previamente, el contratista remitirá mañana el cronograma de remates de las obras.

2.13 Berlín: En ejecución

2.14 Prado Pinzón y Lombardía: En ejecución, presenta atraso.

2.15 Refas: Terminado

2.16 Nuevos: Se realizó socialización, se acordó inicio de obras dentro de 8 días.

2.17 Simón Bolivar: Pendiente cerramiento madera (arreglo de algunas piezas), pendiente rodadero.

2.18 Pepita: Inicio tardío, se encuentra en ejecución.

2.19 Gorgonzola: En ejecución.

2.20 Olaya:
No se evidencia avance de los módulos de servicios PMU se encuentra en ejecución.

3 Seguimiento al cronograma:
% Programado → 84,17%.
% Ejecutado → 72,31%.
Atraso: -11,86%.

Se solicita realizar un plan de contingencia para mitigar el atraso del contrato.

Se solicita cobrar el componente eléctrico faltante en la siguiente acta parcial.

Se solicita cumplir con el PAC programado correspondiente a 1.800

TEMAS TRATADOS

4 SST:

- En el reporte de personal, se cuentan con 20 trabajadores.
- Se solicita por parte de IDRD legalizar los cambios de hojas de vida de obra e interventoría.

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Subsanación informe mensual # 10 Calidad | Contratista | 15 - 10 - 25 |
| Subsanación informe SST # 10 | Contratista | 14 - 10 - 25 |
| Subsanación Informe técnico # 11 | Contratista | 16 - 10 - 25 |
| Olaya - Puertas - Inicio | Contratista | 14 - 10 - 25 |
| San Cristóbal - Informe hidráulico | Contratista | 16 - 10 - 25 |
| Informes ascensores - Subsanados | Contratista | 17 - 10 - 25 |
| Ascensores Tunal - Emergencia | Contratista | Pendiente |
| Quiroga - Secretaria Salud Hidraúlico) | Contratista | 15 - 10 - 25 |
| Florida - Eléctrico | Contratista | 16 - 10 - 25 |
| Imprevistos | Contratista / Interv / IDRD | Pendiente |
| Gimnasio del Norte - Cubierta (Visita) | Contratista | 14 - 10 - 25 |
| Cometas - Eléctrico | Contratista | 17 - 10 - 25 |
| PRD - Retie y Retilap Visita | Contratista | 17 - 10 - 25 |
| PRD - Fotometria Iluminación acceso | Contratista | 17 - 10 - 25 |
| Niños - Aso Deck - Verificación | Contratista | 17 - 10 - 25 |
| Niños - Repuestos juegos < Malla Cucharones | Contratista | 17 - 10 - 25 |
| Caipetano - Bamer | Contratista | 17 - 10 - 25 |
| Cafam Gaviianes (eléctrico) | Contratista | 17 - 10 - 25 |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | |

| Observaciones | | |
|---|---|---|
| Palestina - Informe garantía piso | Contratista | 15 - 10 - 25 |
| Gilma Jimenez - Maq Biosaludables | Contratista | 17 - 10 - 25 |
| Gilma Jimenez - Travesaño | Contratista | 17 - 10 - 25 |
| Chiraló - Acometidas | Contratista | 17 - 10 - 25 |
| UDS - Puertas / Baños | Contratista | 20 - 10 - 25 |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIEN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | | |
| NOMBRE | | NOMBRE | | |
| CARGO | | CARGO | | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | |
|---|---|

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| UDS - Puerta Doña Rosa | Contratista | 17-10-25 |
| UDS - Electrico | Contratista | 17-10-25 |
| UDS - Cronograma pista | Contratista | 15-10-25 |
| Timiza - Terminación | Contratista | 17-10-25 |
| Valles de Cafam - Terminación | Contratista | 17-10-25 |
| PRD - Mujeres baño lámina | Contratista | 17-10-25 |
| Milenta Tejar - Terminación - Baranda - Arena | Contratista | 17-10-25 |
| Independencia - Cerramiento Inicio | Contratista | 15-10-25 |
| Complejo Acuático - Acometidas | Contratista | Pendiente revisión |
| Pinares - Emergencia - Inico | Contratista | 15-10-25 |
| Porvenir - Plazoleta, cancha | Contratista | 15-10-25 |
| Bicicleteros Ponderables. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | |
| Observaciones | | | | |
| | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:


| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | | |
| NOMBRE | | NOMBRE | | |
| CARGO | | CARGO | | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | |
|---|---|


| Id | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pro_4060_2024_ADICION | 116,75 días | $ 6.027.974.858,00 | dom 20/07/25 | mié 19/11/25 |
| 1 | INICIO | 0 días | $ 0,00 | dom 20/07/25 | dom 20/07/25 |
| 2 | GUSTAVO URIBE 02-004 | 52 días | $ 37.419.166,00 | lun 1/09/25 | vie 24/10/25 |
| 3 | INICIO 02-004 | 0 días | $ 0,00 | lun 1/09/25 | lun 1/09/25 |
| 4 | OBRAS CIVILES - SECTOR MAQUINAS BIOSALUDABLES | 52 días | $ 24.880.747,00 | lun 1/09/25 | vie 24/10/25 |
| 22 | OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGOS INFANTILES | 31 días | $ 9.720.327,00 | lun 1/09/25 | jue 2/10/25 |
| 38 | OBRAS CIVILES - CUNETA SOBRE MURO | 4 días | $ 458.472,00 | lun 1/09/25 | jue 4/09/25 |
| 42 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO BARANDA INGRESO CLL 70 | 8 días | $ 2.359.620,00 | jue 4/09/25 | vie 12/09/25 |
| 46 | FIN 02-004 | 0 días | $ 0,00 | vie 24/10/25 | vie 24/10/25 |
| 47 | URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS 05-042 | 21 días | $ 13.303.371,00 | mar 19/08/25 | mar 9/09/25 |
| 48 | INICIO 18-207 | 0 días | $ 0,00 | mar 19/08/25 | mar 19/08/25 |
| 49 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 21 días | $ 13.303.371,00 | mar 19/08/25 | mar 9/09/25 |
| 59 | FIN 18-207 | 0 días | $ 0,00 | mar 9/09/25 | mar 9/09/25 |
| 60 | ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA ALBORADA) 05-141 | 32 días | $ 24.570.597,00 | lun 25/08/25 | vie 26/09/25 |
| 61 | INICIO 05-141 | 0 días | $ 0,00 | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 |
| 62 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 32 días | $ 24.570.597,00 | lun 25/08/25 | vie 26/09/25 |
| 72 | FIN 05-141 | 0 días | $ 0,00 | vie 26/09/25 | vie 26/09/25 |
| 73 | LA ESPERANZA 07-273 | 115,75 días | $ 803.673.536,00 | lun 21/07/25 | mié 19/11/25 |
| 74 | INICIO 07-273 | 0 días | $ 0,00 | lun 21/07/25 | lun 21/07/25 |
| 75 | OBRAS CIVILES - PISTA DE TROTE | 115,75 días | $ 280.271.379,00 | lun 21/07/25 | mié 19/11/25 |
| 85 | OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGOS INFANTIL | 105,75 días | $ 340.854.499,00 | mié 30/07/25 | mié 19/11/25 |
| 95 | OBRAS CIVILES - PISTA DE PATINAJE | 30 días | $ 73.955.441,00 | lun 25/08/25 | mié 24/09/25 |
| 101 | OBRAS CIVILES - CANCHA SINTETICA | 26 días | $ 19.720.800,00 | lun 8/09/25 | sáb 4/10/25 |
| 107 | OBRAS CIVILES - SEÑALIZACION | 22 días | $ 38.426.075,00 | lun 27/10/25 | mar 18/11/25 |
| 126 | OBRAS CIVILES - RETIRO BANNER | 10 días | $ 44.581.974,00 | jue 6/11/25 | sáb 15/11/25 |
| 132 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO MODULO DE BAÑOS | 15 días | $ 5.022.985,00 | lun 25/08/25 | mar 9/09/25 |
| 146 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO MODULO CAMERINO | 7 días | $ 709.538,00 | sáb 6/09/25 | sáb 13/09/25 |
| 156 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO MODULO CAFETERIA | 4 días | $ 130.845,00 | mar 9/09/25 | vie 12/09/25 |
| 163 | FIN 07-273 | 0 días | $ 0,00 | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 |
| 164 | PORVENIR 07-391 | 73,5 días | $ 564.327.898,00 | dom 20/07/25 | lun 6/10/25 |
| 165 | INICIO 07-391 | 0 días | $ 0,00 | dom 20/07/25 | dom 20/07/25 |
| 166 | OBRAS ELECTRICAS MODULO SOLAR | 41 días | $ 173.992.092,00 | lun 25/08/25 | lun 6/10/25 |
| 172 | OBRA TROTE PLAZOLETA | 25 días | $ 204.293.910,00 | dom 20/07/25 | vie 15/08/25 |
| 182 | OBRA TROTE CANCHA TENNIS | 28 días | $ 186.041.896,00 | lun 28/07/25 | mié 27/08/25 |
| 192 | FIN 07-391 | 0 días | $ 0,00 | lun 6/10/25 | lun 6/10/25 |

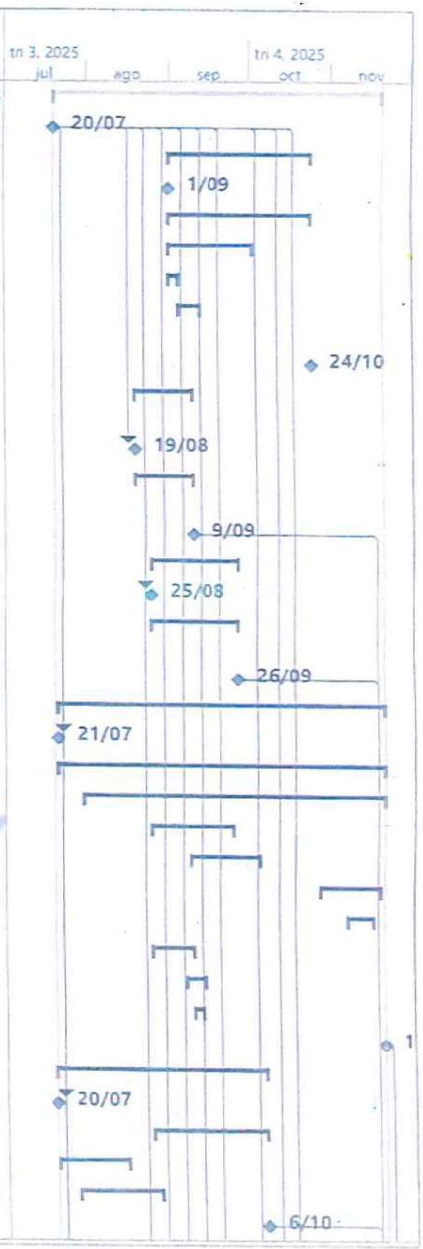


| Id | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | **AMERICAS OCCIDENTAL IV ETAPA 08-127** | **52,88 días** | **$ 26.017.908,00** | **lun 25/08/25** | **dom 19/10/25** |
| 194 | INICIO 08-127 | 0 días | $ 0,00 | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 |
| 195 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | **34 días** | **$ 26.017.908,00** | **lun 25/08/25** | **lun 29/09/25** |
| 205 | FIN 08-127 | 0 días | $ 0,00 | dom 19/10/25 | dom 19/10/25 |
| 206 | **VILLA DE LOS SAUCES 08-180** | **39,38 días** | **$ 28.542.852,00** | **lun 8/09/25** | **dom 19/10/25** |
| 207 | INICIO 08-180 | 0 días | $ 0,00 | lun 8/09/25 | lun 8/09/25 |
| 208 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | **39 días** | **$ 28.542.852,00** | **lun 8/09/25** | **sáb 18/10/25** |
| 225 | FIN 08-127 | 0 días | $ 0,00 | dom 19/10/25 | dom 19/10/25 |
| 226 | **LAS LUCES VILLA RICA 08-533** | **37,75 días** | **$ 32.729.964,00** | **lun 1/09/25** | **jue 9/10/25** |
| 227 | INICIO 08-180 | 0 días | $ 0,00 | lun 1/09/25 | lun 1/09/25 |
| 228 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | **37,75 días** | **$ 32.729.964,00** | **lun 1/09/25** | **jue 9/10/25** |
| 245 | FIN 08-127 | 0 días | $ 0,00 | jue 9/10/25 | jue 9/10/25 |
| 246 | **LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ) 08-552** | **84,5 días** | **$ 99.951.504,00** | **dom 20/07/25** | **sáb 18/10/25** |
| 247 | INICIO 08-552 | 0 días | $ 0,00 | dom 20/07/25 | dom 20/07/25 |
| 248 | OBRA PISTA BMX | **70 días** | **$ 99.951.504,00** | **lun 4/08/25** | **sáb 18/10/25** |
| 263 | FIN 08-552 | 0 días | $ 0,00 | sáb 18/10/25 | sáb 18/10/25 |
| 264 | **URBANIZACION PRIMAVERA KENNEDY 08-770** | **58,5 días** | **$ 35.297.964,00** | **lun 21/07/25** | **sáb 20/09/25** |
| 265 | INICIO 07-273 | 0 días | $ 0,00 | lun 21/07/25 | lun 21/07/25 |
| 266 | PRELIMINARES | **6 días** | **$ 1.661.136,00** | **lun 21/07/25** | **sáb 26/07/25** |
| 269 | PINTURA | **20 días** | **$ 13.794.300,00** | **lun 4/08/25** | **mar 26/08/25** |
| 272 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | **25 días** | **$ 19.842.528,00** | **mar 26/08/25** | **sáb 20/09/25** |
| 274 | FIN 07-273 | 0 días | $ 0,00 | sáb 20/09/25 | sáb 20/09/25 |
| 275 | **ZONA FRANCA 09-125** | **112,38 días** | **$ 413.170.151,00** | **lun 21/07/25** | **sáb 15/11/25** |
| 276 | INICIO 09-125 | 0 días | $ 0,00 | lun 21/07/25 | lun 21/07/25 |
| 277 | OBRAS CIVILES - ZONA BICICLEROS | **26 días** | **$ 12.808.870,00** | **lun 21/07/25** | **mar 19/08/25** |
| 284 | OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGOS PEQUEÑA 1 | **98,88 días** | **$ 118.659.629,00** | **lun 21/07/25** | **sáb 1/11/25** |
| 297 | OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGOS ARAÑA ESTRELLA | **93,25 días** | **$ 268.510.151,00** | **lun 11/08/25** | **sáb 15/11/25** |
| 312 | OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGO BARCO | **10 días** | **$ 3.353.235,00** | **lun 1/09/25** | **mié 10/09/25** |
| 319 | OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGO ESFERAS | **19 días** | **$ 5.358.261,00** | **lun 15/09/25** | **vie 3/10/25** |
| 326 | OBRAS CIVILES - ZONA DE JUEGOS PEQUEÑA 2 | **14 días** | **$ 4.480.005,00** | **lun 29/09/25** | **mar 14/10/25** |
| 333 | FIN 09-125 | 0 días | $ 0,00 | sáb 15/11/25 | sáb 15/11/25 |
| 334 | FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR 10-028 | **40 días** | **$ 18.434.930,00** | **lun 1/09/25** | **sáb 11/10/25** |
| 335 | INICIO 10-028 | 0 días | $ 0,00 | lun 1/09/25 | lun 1/09/25 |
| 336 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | **40 días** | **$ 18.434.930,00** | **lun 1/09/25** | **sáb 11/10/25** |

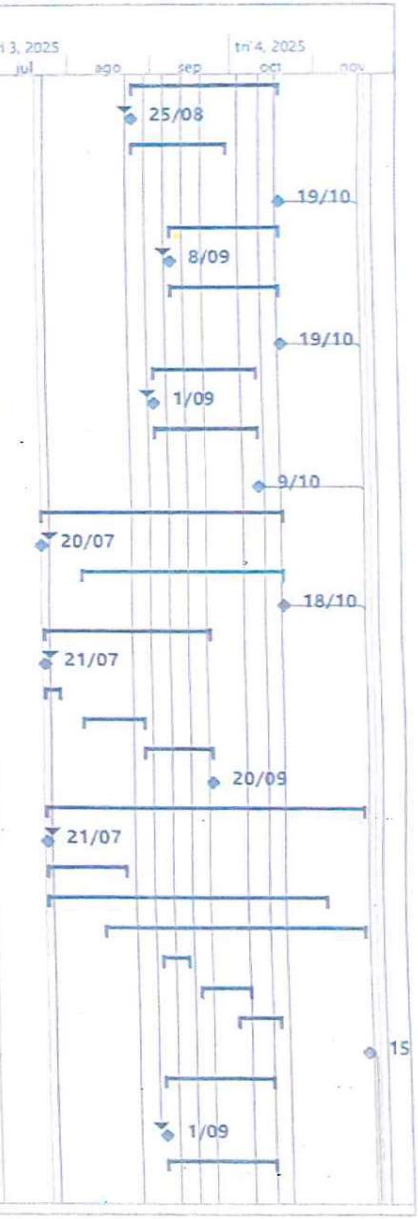

| Id | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 | FIN 10-028 | 0 días | $ 0,00 | sáb 11/10/25 | sáb 11/10/25 |
| 350 | URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR 10-249 | 32 días | $ 18.562.061,00 | lun 22/09/25 | vie 24/10/25 |
| 351 | INICIO 10-249 | 0 días | $ 0,00 | lun 22/09/25 | lun 22/09/25 |
| 352 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 32 días | $ 18.562.061,00 | lun 22/09/25 | vie 24/10/25 |
| 365 | FIN 10-249 | 0 días | $ 0,00 | vie 24/10/25 | vie 24/10/25 |
| 366 | SIMON BOLIVAR ( SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE ) 10-290 | 57,25 días | $ 215.790.837,00 | lun 22/09/25 | mié 19/11/25 |
| 367 | INICIO 10-290 | 0 días | $ 0,00 | lun 22/09/25 | lun 22/09/25 |
| 368 | OBRA CIVIL - PISTA DE PATINAJE LUIS CARLOS GALAN | 57,25 días | $ 215.790.837,00 | lun 22/09/25 | mié 19/11/25 |
| 380 | FIN 10-290 | 0 días | $ 0,00 | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 |
| 381 | BERLIN 11-015 | 20 días | $ 12.945.420,00 | lun 25/08/25 | sáb 13/09/25 |
| 382 | INICIO 11-015 | 0 días | $ 0,00 | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 |
| 383 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 20 días | $ 12.945.420,00 | lun 25/08/25 | sáb 13/09/25 |
| 387 | FIN 10-249 | 0 días | $ 0,00 | sáb 13/09/25 | sáb 13/09/25 |
| 388 | URBANIZACION LOMBARDIA (II ETAPA) 11-052 | 31 días | $ 25.450.031,00 | lun 8/09/25 | jue 9/10/25 |
| 389 | INICIO 11-052 | 0 días | $ 0,00 | lun 8/09/25 | lun 8/09/25 |
| 390 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 31 días | $ 25.450.031,00 | lun 8/09/25 | jue 9/10/25 |
| 400 | FIN 11-052 | 0 días | $ 0,00 | jue 9/10/25 | jue 9/10/25 |
| 401 | PRADO PINZON 11-109 | 44 días | $ 30.541.086,00 | lun 22/09/25 | jue 6/11/25 |
| 402 | INICIO 11-109 | 0 días | $ 0,00 | lun 22/09/25 | lun 22/09/25 |
| 403 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 44 días | $ 30.541.086,00 | lun 22/09/25 | jue 6/11/25 |
| 417 | FIN 11-109 | 0 días | $ 0,00 | jue 6/11/25 | jue 6/11/25 |
| 418 | URBANIZACION VICTORIA NORTE 11-162 | 30 días | $ 20.196.201,00 | lun 21/07/25 | vie 22/08/25 |
| 419 | INICIO 11-162 | 0 días | $ 0,00 | lun 21/07/25 | lun 21/07/25 |
| 420 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 30 días | $ 20.196.201,00 | lun 21/07/25 | vie 22/08/25 |
| 430 | FIN 11-162 | 0 días | $ 0,00 | vie 22/08/25 | vie 22/08/25 |
| 431 | URBANIZACION VALLE DE REFOUS (SECTORES 1,2,3,4,5) 11-686 | 58 días | $ 68.074.458,00 | lun 21/07/25 | sáb 20/09/25 |
| 432 | INICIO 11-686 | 0 días | $ 0,00 | lun 21/07/25 | lun 21/07/25 |
| 433 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 58 días | $ 66.830.200,00 | lun 21/07/25 | sáb 20/09/25 |
| 442 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CUARTO ELECTRICO | 17 días | $ 1.244.258,00 | lun 25/08/25 | jue 11/09/25 |
| 451 | FIN 11-868 | 0 días | $ 0,00 | sáb 20/09/25 | sáb 20/09/25 |
| 452 | PALACIO DE LOS DEPORTES 12-125 | 34 días | $ 381.546.720,00 | dom 20/07/25 | mar 26/08/25 |

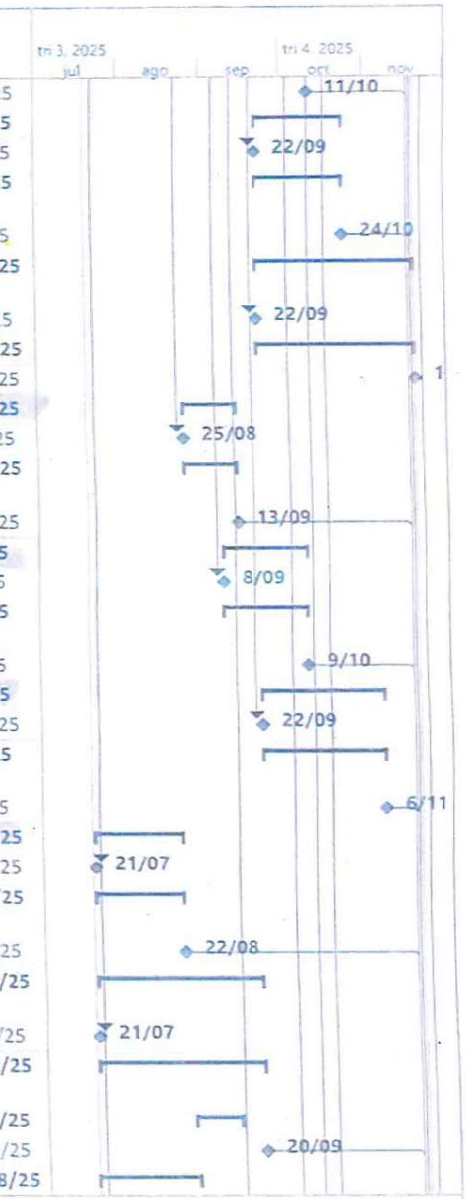


| Id | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 453 | INICIO 12-125 | 0 días | $ 0,00 | dom 20/07/25 | dom 20/07/25 |
| 454 | OBRAS CERRAMIENTO PERIMETRAL | 34 días | $ 381.546.720,00 | dom 20/07/25 | mar 26/08/25 |
| 461 | FIN 12-125 | 0 días | $ 0,00 | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 |
| 462 | SIMON BOLIVAR ( SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS ) | 48 días | $ 183.357.538,00 | lun 22/09/25 | lun 10/11/25 |
| 463 | INICIO 12-146 | 0 días | $ 0,00 | lun 22/09/25 | lun 22/09/25 |
| 464 | OBRAS CIVILES - ZONA DE MODULO DE COMIDAS | 48 días | $ 183.357.538,00 | lun 22/09/25 | lun 10/11/25 |
| 490 | FIN 12-146 | 0 días | $ 0,00 | lun 10/11/25 | lun 10/11/25 |
| 491 | SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) 13-089 | 59,25 días | $ 1.209.393.258,00 | dom 20/07/25 | sáb 20/09/25 |
| 492 | INICIO 13-089 | 0 días | $ 0,00 | dom 20/07/25 | dom 20/07/25 |
| 493 | OBRAS RECREACION - JUEGOS DE EMBARCADERO | 58,25 días | $ 606.011.819,00 | lun 21/07/25 | sáb 20/09/25 |
| 512 | OBRAS RECREACION - JUEGOS INFANTILES | 54,25 días | $ 510.806.445,00 | dom 20/07/25 | mar 16/09/25 |
| 535 | OBRAS RECREACION - JUEGOS INFANTILES N.2 | 24 días | $ 22.208.570,00 | lun 21/07/25 | vie 15/08/25 |
| 547 | OBRAS RECREACION - JUEGOS INFANTILES N.3 | 26 días | $ 25.632.512,00 | dom 20/07/25 | sáb 16/08/25 |
| 557 | OBRAS RECREACION - JUEGOS INFANTILES N.4 | 36,13 días | $ 22.572.128,00 | dom 20/07/25 | jue 28/08/25 |
| 568 | OBRAS RECREACION - JUEGOS INFANTILES N.5 | 28,5 días | $ 22.161.784,00 | dom 20/07/25 | mié 20/08/25 |
| 579 | FIN 13-089 | 0 días | $ 0,00 | sáb 20/09/25 | sáb 20/09/25 |
| 580 | BARRIO LA PEPITA 14-008 | 34 días | $ 24.252.584,00 | lun 15/09/25 | lun 20/10/25 |
| 581 | INICIO 14-008 | 0 días | $ 0,00 | lun 15/09/25 | lun 15/09/25 |
| 582 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 34 días | $ 24.252.584,00 | lun 15/09/25 | lun 20/10/25 |
| 595 | FIN 14-008 | 0 días | $ 0,00 | lun 20/10/25 | lun 20/10/25 |
| 596 | GORGONZOLA 16-126 | 26 días | $ 16.944.223,00 | lun 6/10/25 | sáb 1/11/25 |
| 597 | INICIO 16-126 | 0 días | $ 0,00 | lun 6/10/25 | lun 6/10/25 |
| 598 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 26 días | $ 16.944.223,00 | lun 6/10/25 | sáb 1/11/25 |
| 608 | FIN 16-126 | 0 días | $ 0,00 | sáb 1/11/25 | sáb 1/11/25 |
| 609 | URBANIZACION LA PRADERA SUR (ANTES SALAZAR-GOMEZ) 16-153 | 31 días | $ 20.925.773,00 | mar 14/10/25 | jue 13/11/25 |
| 610 | INICIO 16-153 | 0 días | $ 0,00 | mar 14/10/25 | mar 14/10/25 |
| 611 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 31 días | $ 20.925.773,00 | mar 14/10/25 | jue 13/11/25 |
| 624 | FIN 16-153 | 0 días | $ 0,00 | jue 13/11/25 | jue 13/11/25 |
| 625 | URBANIZACION MARRUECOS II SECTOR 18-041 | 28 días | $ 24.219.419,00 | lun 20/10/25 | lun 17/11/25 |
| 626 | INICIO 18-041 | 0 días | $ 0,00 | lun 20/10/25 | lun 20/10/25 |
| 627 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 28 días | $ 24.219.419,00 | lun 20/10/25 | lun 17/11/25 |
| 636 | FIN 18-041 | 0 días | $ 0,00 | lun 17/11/25 | lun 17/11/25 |
| 637 | MOLINOS 18-055 | 30 días | $ 46.751.822,00 | lun 20/10/25 | mié 19/11/25 |
| 638 | INICIO 18-055 | 0 días | $ 0,00 | lun 20/10/25 | lun 20/10/25 |

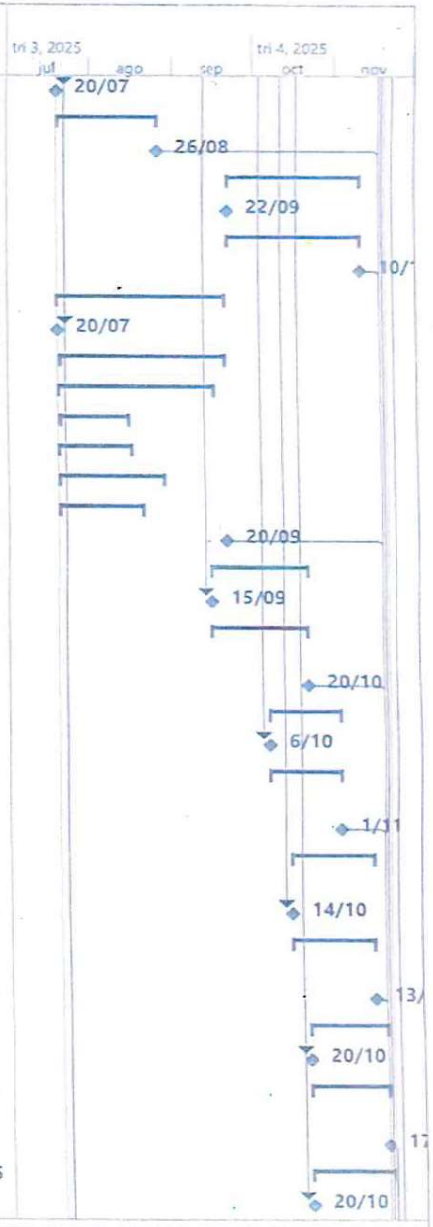


628

| Id | Nombre de tarea | Duración | Costo | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 | OBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL / CANCHA GRAMA SINTETICA | 30 días | $ 46.751.822,00 | lun 20/10/25 | mié 19/11/25 |
| 648 | FIN 18-055 | 0 días | $ 0,00 | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 |
| 649 | QUIROGA 18-205 | 85 días | $ 340.798.763,00 | dom 20/07/25 | sáb 18/10/25 |
| 650 | INICIO 18-205 | 0 días | $ 0,00 | dom 20/07/25 | dom 20/07/25 |
| 651 | OBRAS CERRAMIENTOS - CANCHA GRAMA NATURAL | 85 días | $ 324.030.171,00 | dom 20/07/25 | sáb 18/10/25 |
| 677 | OBRA CIVIL - COLISEO | 14 días | $ 16.768.592,00 | lun 1/09/25 | lun 15/09/25 |
| 681 | FIN 18-205 | 0 días | $ 0,00 | sáb 18/10/25 | sáb 18/10/25 |
| 682 | ESTADIO OLAYA HERRERA 18-207 | 116,5 días | $ 990.784.823,00 | dom 20/07/25 | mié 19/11/25 |
| 683 | INICIO 18-207 | 0 días | $ 0,00 | dom 20/07/25 | dom 20/07/25 |
| 684 | OBRA HIDROSANITARIA MODULO | 116,13 días | $ 401.560.698,40 | dom 20/07/25 | mié 19/11/25 |
| 707 | OBRAS CIVILES - MODULO CAMERINO | 116,13 días | $ 362.157.610,52 | dom 20/07/25 | mié 19/11/25 |
| 719 | OBRAS HIDROSANITARIAS - GRADERIA PMU | 84 días | $ 121.021.872,37 | lun 25/08/25 | mié 19/11/25 |
| 745 | URBANISMO MODULO SANITARIO | 110,63 días | $ 64.685.712,76 | dom 20/07/25 | jue 13/11/25 |
| 774 | URBANISMO MODULO CAMERINO | 112,63 días | $ 41.358.928,95 | dom 20/07/25 | sáb 15/11/25 |
| 802 | FIN 18-207 | 0 días | $ 0,00 | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 |
| 803 | EMERGENCIAS | 116,75 días | $ 300.000.000,00 | dom 20/07/25 | mié 19/11/25 |
| 804 | INICIO | 0 días | $ 0,00 | dom 20/07/25 | dom 20/07/25 |
| 805 | EMERGENCIAS | 116 días | $ 300.000.000,00 | dom 20/07/25 | mié 19/11/25 |
| 806 | FIN | 0 días | $ 0,00 | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 |
| 807 | FIN CONTRATO | 0 días | $ 0,00 | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 |

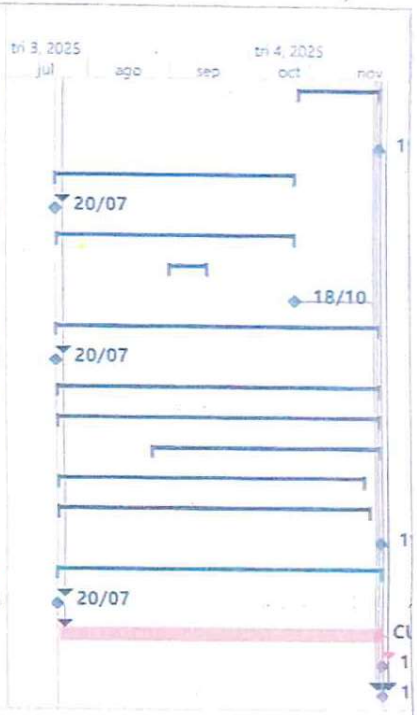


**WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR**
**Representante Legal**
**Consorcio Belzcon IDRD 1**

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

282

BOGOTÁ

## LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento # 36 COP 4060124 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoria.

FECHA 14 10 25 HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 12:00 m LUGAR Oficina Interventoría.

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| 1 | Ronald Ricardo Lozano | 5470331 | Residente | Interventoría | | CST 28 | Proyectos2@cstcinsas | 3124221918 |
| 2 | LUIS A. MEDRANO | 19331.078 | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | CST 28 | proyectos22@cstcinsas.com | 3242219218 |
| 3 | Carlos Andrés Figueroa Ayala | 1094629534 | Director | Interventoría | | CST 28 | proyectos2@cstcinsas.com | 3143773275 |
| 4 | G-STAVO VARGAS FIGUEREDO | 79.603776 | Ing. Civil | CONTRATISTA | | - | - | - |
| 5 | Oscar Javier Cardenas Lozano | 1.024.543.912 | Prof. Costos Presupuestos | Contratista | | - | - | 311 5745879 |
| 6 | ENRIQUE GORMAN. | 9533226 | Arquitecto | Dirección | | - | | 3205430075 |
| 7 | JORGE MADERO G. | 79424228 | CONTRATIST. | STP | | IDRD | - | - |
| 8 | IVAN VELASQUEZ | 80117639 | APOYO SUPERVISIÓN | STP | | IDRD | | |
| 9 | ANTONIO ROJAS L. | 1010020390 | CONTRATISTA | STP. | | IDRD | JOSE.ROJAS@IDRD.GOV.CO | 315 7871437 |
| 10 | Karen Adriana Algeciras C. | 1014266409 | Inspectora | Interventoria | Karen A | CST 28 | proyectos@cstcinsas | 7653016 |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativas/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL V3

T-82

BOGOTÁ

| Si no maneja consecutivo coloque N.A. | COMITÉ/REUNION: | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | Comité de seguimiento # 37<br>COP 4060/24 Cto Int 4080/24 | 29 | 10 | 25 |

LUGAR: Oficina Interventoría – Soliun SAS. HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 11:00 am

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado asistencia | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Revisión compromisos pactados. | 4. Calidad |
| 2. Técnico | 5. |
| 3. Cronograma / Seguimiento | 6. |

**TEMAS TRATADOS**

1. Revisión compromisos pactados:

1.1. Subsanación informe mensual de calidad No. 10:

No se cumplió el compromiso, el contratista informa que ya cuenta con los resultados de las pruebas de tintas, se remitirá la subsanación el día de hoy.

1.2. Subsanación informe mensual de calidad No. 11

No se cumplió el compromiso, no se ha subsanado el informe. El contratista manifiesta que subsanará el día de hoy. Se recuerda por parte de interventoría que para el trámite de la cuenta los informes deben estar aprobados. Se requiere la remisión de los informes mensuales No. 12

1.3. Subsanación informe mensual SST No. 10 y No. 11:

- El contratista remite subsanación al informe SST No. 10 el día de hoy para revisión
- Respecto del informe mensual No. 11 a la fecha no se ha remitido la subsanación correspondiente. El contratista manifiesta que subsanará el día de mañana las observaciones.

Se solicita radicación del informe No. 12 el día de hoy.

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| 1.4 Subsanación informe técnico No. 11 |
| Se informa por parte de interventoria que el informe se encuentra acorde, por lo cual se puede radicar. |
| Se solicita radicación de informe No 12 el dia de hoy. |
| 1.5. Olaya - Puertas: |
| - No subsanado, no se ha dado cumplimiento al compromiso, el contratista manifiesta que entre hoy y mañana se instalarán 4 puertas |
| - Respecto de los módulos de servicio no se evidencia inicio, el contratista manifiesta que el módulo se encuentra en fabricación por lo cual se programará visita a taller. |
| - Se recomienda suministrar adoquin y recebo para finalizar las obras de urbanismo, el contratista manifiesta que realizó el suministro el dia de hoy. |
| - Se solicita coordinar las obras eléctricas en PMU. |
| - El piso del PMU se define en grama por parte de IDRD. |
| 1.6. San Cristóbal - Informe hidraúlico: |
| No se cumplió el compromiso, el contratista informa que se realizará el próximo miercoles o viernes, pendiente por confirmar. |
| 1.7. CEFE Tunal - Subsanación informes: |
| El contratista manifiesta que remitirá la subsanación el dia de mañana. |
| 1.8. Tunal - Emergencia ascensores: |
| Se programa atención en el CEFE Tunal para el próximo martes. |
| 1.9. Quiroga - Subsanación tema hidraúlico - Sec de Salud: |
| - No se ha finalizado la intervención, el contratista manifiesta que terminará la intervención el dia de hoy. |
| - Se informa que se tuvo que levantar la capa de sintético debido a una reacción química que afectó el acabado. |
| 1.10. Florida - Eléctrico: |
| No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que realizará lo correspondiente esta semana. |
| 1.11. Imprevistos: |
| El compromiso continua pendiente, se verificará con el area juridica de IDRD. |

TEMAS TRATADOS

* Respecto de las actas de precios no previstos la supervisión informa que:
- El acta NP 4 está acorde, en trámite de firmas.
- El acta NP 5 cuenta con creación de insumos en el área de costos, el memorando se remitirá mañana para continuar con el proceso de legalización correspondiente.

El contratista solicita evaluar el costo de la disposición final del piso en granulo de caucho.

1.12. Gimnasio del Norte - Cubierta:
El compromiso continúa pendiente, se programa para el día de hoy.

1.13. Cometas - Finalización:
El compromiso continúa pendiente, el contratista manifiesta que la cuadrilla eléctrica se encuentra finalizando actividades en PRD y continuará para Cometas.

1.14. PRD - Retie y Retilap.
Se informa que se programa visita ésta semana.

1.15. PRD - Fotometria zonas de acceso:
Se solicita revisar si se encuentra incluido en el balance, además se aclara que el compromiso continúa pendiente.

1.16. Piso Deck - Niños:
Se solicita verificar la última intervención realizada. con ángulo y tornillos.

1.17. Niños - Respuestos red y Cucharones:
No se cumplió el compromiso, no se ha realizado pago al proveedor por parte del Consorcio Belzcon, por lo cual no se han llevado los elementos.
Se recomienda al contratista tomar las medidas necesarias para financiar el proyecto.
Se solicita revisar con los proveedores temas de pago.

1.18 Cayetano - Bamer:
el compromiso continúa pendiente.

1.19 Cafam Gavilanes - Eléctrico:
No se cumplió el compromiso.

1.20. Palestina - Informe garantía piso:

TEMAS TRATADOS

No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que remitirá el informe el día de hoy.

1.21. Gilma Jimenez Travesaño 1Piso:

No se ha cumplido el compromiso.

1.22. Gilma Jimenez - Hay Biosaludable:

No se cumplió el compromiso, el contratista informa que no se consigue la tarjeta para carga de celular, pero el funcionamiento de la máquina ya está acorde. Se solicita instalar el elemento con el mantenimiento mecánico y estético que se realizó.

1.23. Chicalá - Acometidas:

No se cumplió el compromiso.

1.24. UDS - Puertas:

El contratista manifiesta que las 3 puertas pequeñas están en fabricación, frente a la puerta grande (Doña Rosa), el contratista no ha remitido la propuesta para revisión.

Se solicita revisar el presupuesto de la puerta grande.

1.25. UDS - Eléctrico:

El contratista informa que ya se realizaron los senderos, está pendiente la iluminación interna. Se realizará verificación.

1.26. UDS - Cronograma pista patinaje:

El contratista no allegó el cronograma solicitado, se informa por parte del contratista que se tiene previsto inicio la próxima semana para atención de las fisuras.

1.27. Timiza - Terminación:

El contratista informa que ya finalizó la baranda, la interventoría aclara que verificará los empalmes que era lo que faltaba.

Se solicita retirar los RCD y realizar jornada de orden y aseo en el frente de obra.

1.28. Valles de Cafam - Terminación

El compromiso continua pendiente, se solicita revisar el tema de los policarbonatos con la administración.

El contratista manifiesta que finalizará la intervención el próximo viernes.

1.29. Hilenta Tejar - Arena / Baranda:

TEMAS TRATADOS

-Se finalizó el suministro de la arena.
- La baranda continúa pendiente, el contratista manifiesta que finalizará la baranda el próximo miercoles

1.30. Independencia - Cerramiento:
No se cumplió el compromiso, el contratista informa que ya se fabricaron los módulos y se instalarán entre jueves y viernes

1.31. Pinares - Cerramiento:
El contratista manifiesta que iniciará las actividades el día de hoy.

1.32 Porvenir - Terminación:
- Se solicita revisar el arco que se encuentra suelto, en la cancha.
- Se encuentra en ejecución, aunque según el cronograma ya debería estar finalizado, el contratista manifiesta que mañana se instalará el piso de caucho.
- El precio se debe legalizar en NP 5, el memorando de costos llega mañana.

1.33. Bicicleteros ponderables:
- Hoy se instalan los 2 de Patio Bonito.

2. Técnico:

2.1. Novios - Trencito:
· Se informa por parte del contratista que se desmontó la estructura de 3 módulos y 1 módulo no se ha intervenido pues debajo de una silla hay un nido de una pata con 10 huevos, por lo cual deben quedarse quietos.
· Se evidencia alto estado de deterioro en el módulo trencito.
★ Se informa que el viernes el IDRD allegó oficio de solicitud de aceptación de acción y prórroga, se solicita remitir respuesta lo antes posible ante la entidad.
- Se contempla mantenimiento rutinario de canchas: sintéticos, canchas de tennis y emergencias.
El contratista manifiesta que evaluará lo correspondiente.
En los novios, los módulos se encuentran podridos, se contempla cambio de lavaplatos y revisión del desagüe, además de los

TEMAS TRATADOS

vidrios. Se solicita presupuesto actualizado.
· La cantidad de tomas será la misma existente, no se contempla aumento.
· En cuanto a colores, se recomienda conservar el existente.

2.2. Gustavo Uribe - No iniciado; El contratista manifiesta que hoy realizará visita para dar inicio.
Se advierte que según el cronograma, la intervención debería estar terminada.
2.3. Miravalle - En ejecución : Se encuentra terminado
2.4. Alfonso López = Terminado
2.5. La Esperanza: En ejecución
- Instalación piso caucho color
- Faltan banners modulos y remate de pintura de la cancha.
- Pendiente señalética.
2.6. Porvenir : Ya debería estar terminado
2.7 Américas Occidental:
- Se finalizó mantenimiento de cerramiento
- Pendiente instalación de módulos nuevos.
2.8. Villa de los Sauces: En ejecución con atraso
2.9. Las luces Villa rica: Terminado.
2.10. Primavera Kennedy: En ejecución con atraso.
2.11. Zona Franca: Atrasado.
- El contratista informa que ésta semana inicia instalación de piso de caucho.
- Se requiere vinculación de personal en el frente de obra.
2.12. Florencia y Florencia Triciguetes: Terminado.
2.13. Berlín: Pendiente remates cerramiento, Atrasado
2.14. Lombardía: En ejecución con atraso.
2.15. Prado Pinzón. En ejecución, debe finalizar el 6 de noviembre
2.16. Refous: Terminado, pendiente lámina señal.
2.17. Patuca: Pendiente revisión de 2 goteras.
2.18. Simón Bolivar - Sector Central:
- Pendiente instalación de plástico de invernadero.

TEMAS TRATADOS

- Pendiente instalación de rodadero y piezas de baranda.
- Puesta en Servicio el viernes.

2.19. Pepita: En ejecución
- Pendiente Suministro de módulos

2.20. Gorgonzola - En ejecución.

2.21. Pradera Sur: Inició el viernes.

2.22. Marruecos. En ejecución

2.23 Molinos, En ejecución.

2.24 Olaya:
Color de la fachada definido en PMU: Rojo.

3. Seguimiento cronograma:
% Programado: 86,02%  % Atraso: -8,55%
% Ejecutado: 77,47%
Se tiene un valor ejecutado de $12.200, se han pagado $11.400, la diferencia arroja 800' millones para cobro.
- Se solicita al contratista tomar las medidas correspondientes para cumplir con el PAC programado y remitir el acta parcial en debida forma.
- Se solicita actualizar Secop II.
- Se solicita entrega certificación Vartor.
- Pendiente señaletica / Prueba / Cuerpos de Agua

4. Calidad:
- Informes 10 y 11 pendiente
- Se solicita presentar prueba de fmtas de los módulos
- Se solicita remitir el reporte de materiales de octubre
- Se solicita informe 12.
- Se solicita remitir resultados de laboratorio de las muestras de concreto.
- Se solicitan manuales de mantenimiento y planos récord.

5. Social:
- Se solicita semisión de informe 12.

TEMAS TRATADOS

6. SST

- Se solicitó remisión de soportes de participación del Simulacro Nacional de Respuestas a emergencias.
- Se solicita subsane de informe 11
- Se solicita implementar acciones de orden y aseo, señalización, entrega de EPP y Pendones informativos.

7. Ambiental:

- Se solicita subsane de informe 11
- Se remitió requerimiento para entrega de certificados de Tracol.

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Subsanación informes calidad #10 y #11 | Contratista | 27-10-25 |
| Subsanación informe SST # 11 | Contratista | 28-10-25 |
| Entrega informes mensuales # 12 | Contratista | 27-10-25 |
| Olaya - Puertas Inicio (3 a 4 puertas) | Contratista | 27-10-25 |
| Olaya - Visita Taller módulos | Contratista / Int | Por Definir |
| CEFE San Cristóbal - Informe hidraúlico | Contratista | 29-10-25 |
| Quiroga - Secretaria de Salud (hidraúlico) | Contratista | 27-10-25 |
| Ascensores Tunal - Emergencia | Contratista | Pendiente |
| Quiroga - Sintético | Contratista | 31-10-25 |
| Florida - Eléctrico. | Contratista | 31-10-25 |
| Imprevistos | IDRD/Contratista /Interv | Pendiente |
| Gimnasio del Norte - Cubierta | Contratista | 28-10-25 |
| Cometas - Eléctrico | Contratista | 28-10-25 |
| PRD - Retie y Retilap | Contratista | 31-10-25 |
| PRD - Fotometria Iluminación acceso | Contratista | Pendiente |
| Niños - Piso Deck - Verificación | Contratista | 27-10-25 |
| Niños - Repuestos juegos < Halla cucharones | Contratista | Pendiente. |
| Cayelano - Banner | Contratista | Pendiente. |
| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | |
| ¿Se logró el objetivo? | SI [X] | NO [ ] |
| Observaciones | | |
| Cafam Gaviotanes - Eléctrico | Contratista | 31-10-25 |
| Palestina - Informe garantia piso | Contratista | 27-10-25 |
| Gilma Jimenez - Travesaño / piso | Contratista | 28-10-25 |
| Gilma Jimenez - 1 Mag Biosaludable | Contratista | 28-10-25 |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algecuras | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algecuras | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora Interventoria | |

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: Karen Adriana Algecuras Castro.

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Chicalá - Acometidas | Contratista | 31-10-25 |
| UDS - Puertas | Contratista | 31-10-25 |
| UDS - Cronograma fisuras pista | Contratista | 31-10-25 |
| Timiza - Retiro RCD / Orden y aseo | Contratista | 28-10-25 |
| Valles de Cafam - Terminación | Contratista | 31-10-25 |
| Milenta Tejar - Terminación baranda | Contratista | 5-11-25 |
| Independencia - Cerramiento / Terminación | Contratista | 31-10-25 |
| Pinares - Cerramiento - Inicio | Contratista | 27-10-25 |
| Bicicleteros Ponderables / Patio Bonito | Contratista | 27-10-25 |
| Bicicleteros Ponderables / Pendientes | Contratista | 31-10-25 |
| Respuesta adición y prórroga | Contratista | 30-10-25. |
| Novios - Presupuesto actualizado | Contratista | 29-10-25 |
| Simón Bolivar - Sector Central | Contratista | 31-10-25 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | |
| Observaciones | | | | |
| | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIEN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algeciras | | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Algecíras | | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora Interventoría | | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algecíras Castro |
|---|---|

BOGOTÁ

## LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento # 37 COP 4060/24 RESPONSABLE DEL EVENTO Interventoría

FECHA 27 10 25 HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL 11:30 am. LUGAR Interventoría

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN VELASQUEZ | 80117639 | APOYO SUPERVISION | STP | | IDRD | | |
| 2 | ANTONIO ROJAS L. | 1010020340 | CONTRATISTA | STP | | IDRD | JOSE.ROJAS@IDRD.GOV.CO | 3137779432 |
| 3 | John J. Cubillos S. | 79852621 | Residente | Beltecon IDRD | | Beltecon | | 3205881881 |
| 4 | LUIS A MEDRANO | 1933178 | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | CST 028 | proyectos28@solucionesst.com | 3202011 |
| 5 | Oscar Orlando Cardenas Lozano | 1020 543 912 | Ing Presupuestos | Contratista | | Beltecon | | 3115733834 |
| 6 | Claudia Padata. | 52879900 | Resid. obra. | Contratista. | | Beltecon. | cpadata.beltecon@gmail.com | 3015519468 |
| 7 | Carlos Andrés Figueroa Ayala | 1049629554 | Director | Interventoría | | CST 28 | proyectos2@solucionesst.com | 3143773225 |
| 8 | GUSTAVO VANEGAS FIGUEREDO | 79863776 | ING. RESIDENTE | BELTECON | | BELTECON | | |
| 9 | Kornald Ricardo Lozano | 5470331 | Residente | Interventoria. | | CST28 | Proyectos2@solucionesst. | 3204200975 |
| 10 | ENRIQUE GUZMAN | 9533226 | Dir Obra | BELTECON | | BELTECON | | 3203932027 |
| 11 | Karen Adriana Algeciras Castro | 1014266409 | Inspectora | Interventoria | | CST 28 | proyectos2@solucionesst | 7653016 |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL V.5

# ANEXO 1

# CONTROL COMPROMISOS ACTAS DE COMITÉ

| | SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS | Código | |
|---|---|---|---|
| | | Versión | |
| | | Vigente | |

| | |
|---|---|
| OBJETO | |
| PERIODO DEL | |

| FECHA LIMITE | ACTA No. | COMPROMISO | FECHA DE ENTREGA DE COMPROMISO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATISTA | | |
| | | | | CONTRATISTA | | |
| | | | | CONTRATISTA | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONTRATISTA | [illegible] |

# ANEXO 2

# CORRESPONDENCIA ENVIADA

| | CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA | BZC-FO-5-01-D |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Página 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO | IDRD-SG-4060-2024 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 |

| CONSECUTIVO | FECHA ENVIÓ | MEDIO DE ENVIO | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO | ESTADO | ELABORÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL-MPI-ADM-408-25 | 2-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-674 Acta Parcial de Obra No.9 | ENVIADO | G |
| BEL-MPI-ADM-409-25 | 7-oct-25 | FISICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | RADICACIÓN INFORME No. 10 V2 COMPONENTE TÉCNICO EN FÍSICO | ENVIADO | PAOC |
| BEL-MPI-ADM-410-25 | 7-oct-25 | FISICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | RADICACIÓN INFORME No. 10 V1 COMPONENTE SOCIAL EN FÍSICO | ENVIADO | PAOC |
| BEL-MPI-ADM-411-25 | 9-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | BEL-MPI-ADM-411-25 RESPUESTA A COMUNICADO IDRD-4080-G2-2024-679 REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGABLES ANTES DE INTERVENIR EL VELÓDROMO-UDS | | CP |
| BEL-MPI-ADM-412-25 | 9-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | INFORME DEL COMPONENTE DE CALIDAD No 11 | ENVIADO | SPSE |
| BEL-MPI-ADM-413-25 | 10-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Acta de Actividades No Previstas No. 6 | ENVIADO | G |
| BEL-MPI-ADM-414-25 | 15-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Alcance al Comunicado BEL-MPI-ADM-413-25 Acta de Actividades No Previstas No.6 V.1 | ENVIADO | G |
| BEL-MPI-ADM-415-25 | 16-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | RESPUESTA A IDRD-4080-G2-2024-687ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO MENSUAL NO. 11 V | ENVIADO | PAOC |
| BEL-MPI-ADM-416-25 | 21-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | REMISIÓN DE CONSTANCIA Y CERTIFICADO ASCENSOR 2 CEFE SAN CRISTOBAL | ENVIADO | PAOC |
| BEL-MPI-ADM-417-25 | 22-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-695 Acta de Actividades No Previstas No.6 v1 | ENVIADO | G |
| BEL-MPI-ADM-418-25 | 28-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Informes de mantenimientos Preventivos (San Cristóbal, Fontanar del rio, Comet:as) | ENVIADO | OC |
| BEL-MPI-ADM-419-25 | 28-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | REMISIÓN INFORME TÉCNICO MENSUAL No.12 VERSION 0 | ENVIADO | PAOC |
| BEL-MPI-ADM-420-25 | 29-oct-25 | FISICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | RADICACIÓN DE INFORME #10 AMBIENTAL V.3 EN FÍSICO | ENVIADO | AMCG |
| BEL-MPI-ADM-421-25 | 29-oct-25 | FISICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | RADICACIÓN DE INFORME #10 SST V.3 EN FÍSICO | ENVIADO | AMCG |
| BEL-MPI-ADM-422-25 | 29-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28 Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Informes de mantenimientos Preventivos (Tunal) | ENVIADO | OC |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL-MPI-ADM-423-25 | 29-oct-25 | FISICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | RADICACIÓN INFORME No. 11 V1 COMPONENTE SOCIAL EN FÍSICO | ENVIADO | PAOC |
| BEL-MPI-ADM-424-25 | 29-oct-25 | FISICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | RADICACIÓN INFORME No. 11 V1 COMPONENTE TÉCNICO EN FÍSICO | ENVIADO | PAOC |
| BEL-MPI-ADM-425-25 | 29-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Acta Pacial de Obra No.10 | ENVIADO | G |
| BEL-MPI-ADM-426-25 | 29-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-702<br>Acta de Actividades No Previstas No.6 v2 | ENVIADO | G |
| BEL-MPI-ADM-427-25 | 30-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Alcance al Comunicado IDRD-4080-G2-2024-696<br>Solicitud SST- Registro participación y evidencias Simulacro Nacional Respuesta a Emergencias 2025 | ENVIADO | AMCG |
| BEL-MPI-ADM-428-25 | 30-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | Presupuesto Parques Priorizados V.14 | ENVIADO | G |
| BEL-MPI-ADM-429-25 | 31-oct-25 | CORREO ELECTRONICO | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CONSORCIO SANTA TERESA 28<br>Interventoría al Contrato IDRD-SG-4060-2024 | | ENVIADO | GPCC |

808

# ANEXO 2

# CORRESPONDENCIA RECIBIDA

| | CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA | BZC-FO-5-01-D<br>Versión: 1<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|
| CONTRATO | IDRD-SG-4060-2024 | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | |

| CONSECUTIVO | FECHA ENVIÓ | MEDIO DE ENVIO | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO | ESTADO | OFICIO RESPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDRD-4080-G2-2024-675 | 1 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA A OFICIO BEL-MPI-ADM-403-25 PRESUPUESTO | | |
| IDRD-4080-G2-2024-676 | 1 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | CITACIÓN REPRESENTANTE LEGAL – REUNIÓN SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL CONTRATO COP 4060 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-677 | 1 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REQUERIMIENTO ESTABILIDAD PARQUE RECREO | | |
| IDRD-4080-G2-2024-678 | 3 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No. 3 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-679 | 5 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGABLES ANTES DE INTERVENIR EL VELÓDROMO-UDS | | BEL-MPI-ADM-411-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-680 | 6 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REITERACIÓN ENTREGA MANUAL DE MANTENIMIENTO - PARQUE EL COUNTRY | | |
| IDRD-4080-G2-2024-681 | 6 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | APREMIO INCUMPLIMIENTO TERMINACION DE ACTIVIDADES | | |
| IDRD-4080-G2-2024-684 | 9 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Observaciones informe SST N°11 | | CORREO ELECTRÓNICO |
| IDRD-4080-G2-2024-685 | 9 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Observaciones SST | | |
| IDRD-4080-G2-2024-687 | 9 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-406-25 OBSERVACIONES - INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 11 | | BEL-MPI-ADM-415-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-688 | 9 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-406-25 ATENCIÓN OBSERVACIONES COMPONENTE ELÉCTRICO | | |
| IDRD-4080-G2-2024-689 | 9 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REQUERIMIENTO REMISIÓN BALANCE ACTUALIZADO MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS DE CANCHAS SINTÉTICAS | | |
| IDRD-4080-G2-2024-690 | 10 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | OBSERVACIONES INFORME SST N°11 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-691 | 14 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Observaciones informe de Calidad N°11 V.0 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-692 | 15 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | SOLICITUD REPARACIÓN FILTRACIONES DE AGUA EN LA CUBIERTA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES. | | |
| IDRD-4080-G2-2024-693 | 16 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REQUERIMIENTO ESTABILIDAD PISO SINTETICO PARQUE QUIROGA | | |
| IDRD-4080-G2-2024-694 | 17 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REQUERIMIENTO ESTABILIDAD PISO SINTETICO PARQUE LA ESPERANZA | | |
| IDRD-4080-G2-2024-695 | 21 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | OBSERVACIONES ÍTEMS NO PREVISTOS V6 | | BEL-MPI-ADM-417-25 |
| IDRD-4080-G2-2024-696 | 21 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Solicitud SST- Registro participación y evidencias Simulacro Nacional Respuesta a Emergencias 2025 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-697 | 21 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Observaciones componente SST | | |
| IDRD-4080-G2-2024-698 | 21 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Reiteración entrega subsanación informes SST N°10 y N°11 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-699 | 22 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | REQUERIMIENTO DE ENTREGA TRAZABILIDAD RCD. | | |

410

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDRD-4080-G2-2024-700 | 24 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | TRASLADO COMUNICADO 20256100336341 - SOLICITUD ACEPTACIÓN DE ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4060/2024 | | |
| IDRD-4080-G2-2024-701 | 24 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | RESPUESTA COMUNICADO BEL-MPI-ADM-415-25 ATENCIÓN OBSERVACIONES INFORME TÉCNICO NO. 11 | | N/A |
| IDRD-4080-G2-2024-703 | 27 octubre 2025 | Correo Electronico | CONSORCIO SANTA TERESA 28 | CONSORCIO BELZCON IDRD 1 | Aprobación informe SST N°10 | | N/A |

# ANEXO 3

# BITÁCORA

Contrato de obra #4060 de 2024

Contratista: Consorcio Belzcon IDRD 1

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación, y reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"

Parque: La esperanza
Cod:

Contrato de Interventoria: 4080 de 2024

Interventoria: Consorcio Santa Teresa 28
Arq. Ronald Bravo

Scanned with CamScanner

debido a las lluvias durante la jornada

Andrés Córdoba Inter

Pandal Lozano
R. Interventoria

01-10-25 Nota 88: Miercoles 01 de octubre 2025
Clima: Soleado
Personal: 1 oficial, 2 ornamentadores y 2 en pista de patinaje

Santana

Pandal Lozano
R. Interventoria.

Andrés Córdoba
Inspector Inter

Nota 89: Se termina el retiro de baner en modulos de servicio, se continua con la aplicacion de pintura de cerramiento de la cancha sintetica, donde se reitera la protección de la grama y no mezclar directamente sobre la grama, tambien se debe reticar los tarros de pintura, se continua con las actividade de aplicación de pintura (recubrimiento) en la pista de patinaje, no se observa avance en las actividades de la zona de juegos y pista de trote

Santana

Andrés Córdoba
Interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

02-10-25 Nota 90: Jueves 02 de octubre de 2025

clima: Soleado

Personal: 1 oficial + 2 pista de trote + 2 ornamentadores

Se continua la aplicación de recubrimiento en la pista de trote patinaje, de igual forma se realizan actividades de aplicación de pintura en cerramiento de cancha sintetica, se realiza el desmonte de lamina exterior del modulo para realizar la reparación de los baños fuera de servicio

CTR Rondallano Residente — Andres Felipe Inspector

Nota 91: la interventoria observando el avance de las obras requiere y recomienda al contratista nuevamente la limpieza del adecuado estado arietal de la cancha la cual se encuentra fangueada, se requiere limpieza de la viga perimetral de la concha, se requiere implementar un plan de contingencia para mitigar el ahogo en zona infantil, pista de trote y zona de modulos, recordando que es obligacion del contratista garantizar la continuidad de las obras.

CTR Rondallano Residente interventoria

Scanned with CamScanner

03·10·25 Nota 92: viernes 3 de octubre 2025
Asunto: soldado- Modelo
Personal- inspector, trasladado, 2 grúas
2 pistolas pulverizador.
C+P Ronald Lozano Santana

Nota 93: la intervención observando el
avance de las obras requiere y recomienda
nuevamente aplicar la pintura esmalte
RAL 6028, tal como lo contempla las
especificaciones técnicas se requiere
remolar muy bien la pintura de
cerramiento, se observa puntos lagueados,
se requiere limpiar muy bien los
ángulos perimetral y el adoquín el
cual esta lagueados, se requiere
implementar un plan de contingencia
con el fin de vigilar el abuso
en el mantenimiento zona industrial
y pista de tiro, recordando que
el contrato finaliza el próximo 19
de Noviembre.
C+P Ronald Lozano Santana

Scanned with CamScanner

04-10-25 Nota 94. sabado 4 de octubre 2025
dimo. soldado.
Peisond. 3 pista pohnole, 2 anomalocaris.
C+Z Ponold Isano Santana

Nota 95: se requiere al contratita implemen-
tar de manera inmediata un plan de contin-
gencia para mitigar y reiniciar los obras
en zona infantil, y pista de hota, ya
que estas aeas estan quietas desde hace
cantos y anaros, se requiere limpiar
muy bien el bordillo perimetral de la
cancha y sendas peatonales, los cacles
se observan bloqueados.
C+Z Ponold Isano Santana

06-10-25 Nota 96: Isnes 6 de octubre 2025
dimo. Nabado.
Peisond. 3 pista pohnale, 2 anomalocaris.
C+Z Ponold Isano Santana

Nota 97: la entrevista requiere y
recomiendal contratita que el soldati
e inspector de obra este pendiente de
los obros que se elevan en el parque
Norma

Scanned with CamScanner
917

con el fin de evitar retrasos en la ejecucion de las obras, la entidad vera observando el avance de las obras requiere nuevamente al Contratista implementar un plan de Contingencia para mitigar el atraso de las obras en zona intermedia y pista de hote asi como la terminacion de las bancas del modulo y pintura en el cementerio Concha #8, y se requiere nuevamente al Contratista cumplir a cabalidad las especificaciones tecnicas del IDRD en cuanto al mantenimiento de la banda o cerramiento de las Canchas, se requiere nuevamente limpiar muy bien la viga perimetral de la Cancha y senderos peatonales, los cuales se deben fregados.

Ronald Lorono

07-10-25 Nota 98: Hoy 7 de octubre 2025 siendo Nublado
Personal: 2 para despalde, total,

Scanned with CamScanner

2 pintores, 1 inspector.

GR Ronald Lorono

Nota 99: La intervención abarcando el concreto requiere nuevamente al contratista revisión e implementar un plan de contingencia para los obreros en zona portuaria y pista de hotel, se requiere remotar muy bien la pintura del carramiento ya que se observa fogueados algunos puntos, se requiere limpiar bien el sondeo peatonal, viga perimetral donde se observa fogueado, se requiere cuenta en la instalación de los toner de los modulos, y se requiere limpiar bien la grama la cual esta fogueado de pintura.

GR Ronald Lorono

08-10-25 Nota: 100: Miercoles 8 de octubre 2025 dia: soleado

Personal: 1 oficial, 3 pintores.

GR Ronald Lorono

Nota 101: En el dia de hoy se continua

Scanned with CamScanner

de realizar la demolición y detalles en la pista de patinaje, no se observa avance de obra en cerramiento cancha F8, pista de baile y zona infantil, se requiere implementar un plan de contingencia para reinicio las obras en pista de baile, zona infantil, cerramiento y banner de modelos, recordando que el contrato finaliza el próximo 19 de noviembre, la interventoría le recuerda que es obligación del contratista garantizar la continuidad de las obras priorizadas, se requiere limpiar muy bien la grama, urge jardinería y abonarlas, las cuales se observan descuidadas.

Ronald Bravo. Contratista

09-10-25 Notaría: Jueves 9 de octubre 025
Firmado
Personal: (2) amonalobres, 1 residente, 1 oficial.

Ronald Bravo Contratista

Norma

Scanned with CamScanner

Nota 103: como actividad importante se realiza la puesta en servicio de la pista de polinole donde los respectivos recomendaciones de uso al administrador del porque, se requiere terminar de detallar la baranda o cerramiento de la Cancha P8, la cual presenta daños o abolladuras de acabados, se requiere limpiar muy bien la grama, viga perimetral y sanderos peatonales los cuales se encuentran fogueados, se requiere nuevamente implementar un plan de contingencia para cerrar y reiniciar los otros concernientes a la pista de trote, zona infantil y modelos. R: intervenida

CR Ronald Bravo Santana

10-10-25 Nota 104: Viernes 10 de octubre 2025
Clima: soleado
Personal: 1 inspector, 2 ornamentadores

CR Ronald Bravo Santana

Nota 105: se avanza con el listado de la baranda M83 en zona infantil

Norma

Scanned with CamScanner

como montajimiento, se requiere nuevamente al Contratista remitir el cerramiento de la cancha F8, la cual presenta ciertas observaciones de acabado, se requiere implementar de manera inmediata un plan de contingencia y mitigar el atraso en las obras de piso caucho en pista de hote y zona infantil así como los bancos en los modulos. R. Interventoría.

Ronald Isaac

11-10-25 Nota 106: Sabado 11 de octubre 2025 clima: soleado
Personal: 1 inspector, 5 piso caucho, 1 pintor.

Ronald Isaac

Nota 107: Como Actividad importante se inicia con la instalación del piso caucho SBR en zona infantil segun los espesores y respetando los juegos que se encuentran en la zona, se requiere al Contratista terminar y

Scanned with CamScanner

remotar los pendientes de pintura en el ceramiato, de la concha F8, se requiere nuevamente limpiar muy bien el piso o sandeos pegotes osi como la goma, la cual presenta togueo de pintura esmalte. R. Interpantera.

Ronald Isaac Santana

13-10-25 Nota 108: lunes 13 de octubre 2025 dimo: 1 boina ausentes.
Personal: 1 inspector, 5 piso concha.

Ronald Isaac Santana

Nota 109: se ocupa en la instalación del piso concha >BR en zona infantil, respetando los espacios que cada juego requiere según hoja de actividad, se requiere terminar de rematar la pintura de acabado en el ceramiato de la concha F8, se requiere ocupar con el piso concha en pista de baile, y se requiere instalar tener en modulos. R. Interpantera.

Ronald Isaac Santana

Scanned with CamScanner

14-10-25 Nota 110: Martes 14 de octubre 2025
clima: Nublado
Personal: 1 residente, 3 piso concho,
1 ornamentacion.
CTF Ronald Isaac Zambrano

Nota 111: se comenzo enla instalacion
del piso concho SBR en zona interior,
respetando espesores de factor de
caida de cada juego, se requiere
nuevamente ingresar mas personal
para agilizar con el piso concho
en pista de hoc, comenzar con la
instalacion del caucho en modulos,
terminar remates de pintura en
cancha FB, terminar dos segundos
detalles de limpieza en grama y
senderos peatonales, recordando que
el contrato finaliza el proximo
19 de Noviembre 2025.
CTF Ronald Isaac Zambrano

15-10-25 Nota 112: Miercoles 15 de octubre 2025
clima: soleado
Norma

Scanned with CamScanner
