RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

Sincelejo, diciembre 29 de 2025

OFI001SAM11-2025

Señores:


Dirección seccional de administración judicial
Ing. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
Supervisora del contrato

Referencia: Contrato de obra Nro. SAMC 11 DE 2025 cuyo objeto es "ADECUACIONES LOCATIVAS EN PISO 5 DE LA TORRE A DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE UN AREA ENFOCADA AL BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LOS SERVIDORES JUDICIALES".

Cordial saludo;

Por medio de la presente me permito suministrar la programación de obras inicial correspondiente al contrato referenciado.


Atentamente,



Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.
CC. 1.102.851.781 De Sincelejo.
Contratista de obras

Email: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin
0		**ADECUACIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO SALA DEL PENSAMIENTO EN EL PISO 5 EN LA TORRE A DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO**	**51 días**		**jue 16/10/25**	**mié 31/12/25**
1		**ETAPA PRECONTRACTUAL**	0 días		jue 16/10/25	jue 16/10/25
2		**INICIO DE ETAPA CONTRACTUAL**	0 días		mar 16/12/25	mar 16/12/25
3		**ACTIVIDADES PARA EL ALCANCE DE $ 241.965.741,00**	**11 días**		**mar 16/12/2**	**mié 31/12/25**
4		**ACTIVIDADES CIVILES Y DE ACABADOS**	**11 días**		**mar 16/12/2**	**mié 31/12/25**
5		Desmonte y acarreo de puertas en vidrio con marcos de aluminio	2 días	2	mar 16/12/25	mié 17/12/25
6		Desmonte de ventanas en vidrio con marco en acero (si la hoja mide más de 2m2 se contará como una unidad independiente)	2 días	5CC	mar 16/12/25	mié 17/12/25
7		Demolición manual de muros 0.15m de bloque de cemento	2 días	6CC	mar 16/12/25	mié 17/12/25
8		Desmonte de lamparas 30x100	2 días	7CC	mar 16/12/2	mié 17/12/25
9		Demolición alfajias en concreto reforzado	2 días	8CC	mar 16/12/2	mié 17/12/25
10		Desmonte red eléctrica existente (incluye desmote de tableros existentes, tomacorrientes, cableado, canaletas, etc.).	3 días	9CC	mar 16/12/25	jue 18/12/25
11		Levante de muro en bloque de concreto 5 Mpa 9 * 19 * 39	5 días	10	vie 19/12/25	vie 26/12/25
12		Suministro en instalación de Piso de vinilo tipo tableta de 2 mm Tablón Nuez	5 días	11CC	vie 19/12/25	vie 26/12/25
13		Pañete allanado en mortero 1:4 1 cara	3 días	11FC-2 días	mié 24/12/2	lun 29/12/25
14		Pañete allanado en mortero 1:4 para filos	3 días	13CC	mié 24/12/2	lun 29/12/25
15		Suministro y aplicación de estuco plástico en muros interiores color blanco en pared	3 días	14FC-2 días	vie 26/12/25	mar 30/12/25
16		Pintura tipo 1 sobre muros, aplicación de 3 manos color institucional	2 días	15FC-1 día	mar 30/12/25	mié 31/12/25
17		Suministro de plantas ornamentales. Incluye maceta, abono, rodachines y plato recolector	1 día	12	lun 29/12/25	lun 29/12/25
18		Cielo raso en panel PVC especificación 50% PVC (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre-aislante térmico acústico-auto estinguible-resistente a hongos-bacterias-no condultor de electricidad)	2 días	12	lun 29/12/25	mar 30/12/25
19		Perfil perimetral corniza PVC	2 días	12	lun 29/12/25	mar 30/12/25
20		Suministro e instalación de muro verde artificial en relieve tipo Jardín vertical artificial flores tropicales formato 50x100 cm	2 días	11	lun 29/12/25	mar 30/12/25
21		Suministro e instalación de sillón reclinable confort	1 día	12	lun 29/12/25	lun 29/12/25
22		Suministro e instalación de piso en grama sintética green garden 30 mm alto tráfico (incluye pegante)	5 días	12CC	vie 19/12/25	vie 26/12/25
23		Suministro e instalación de Mesa auxiliar Everett 63x39x30 Onix Blanco	1 día	21	mar 30/12/25	mar 30/12/25
24		Árbol Central, compuesto por 32 paneles entamborados de 260cm*180cm y grosor de 4cm, con caras externas en lámina fondo DURATEX AMARETTO de 5.5mm, con núcleo interno en MDF de 30mm y contorno en canto Rígido, 8 de los cuales con cinta de luz led cálida de	1 día	23CC	mar 30/12/25	mar 30/12/25
25		Suministro de bolsa de boxeo 23 kg, incluye 2 pares de guantes (1 par de hombre y 1 de mujer) y estructura para su correcta instalación	1 día	24CC	mar 30/12/25	mar 30/12/25
26		Suministro e instalación de cabina de oficina tipo pod acustica insonora movil antiestres con indicador en luces led 1.00x1.20 diseño contemporáneo. Colores a elegir x 2.23 m. Incluye esmerilado en vidrio de puerta y silla ajustable y ventilador con su re	1 día	25CC	mar 30/12/25	mar 30/12/25
27		Construcción de gradas del pensamiento, incluye acabados, estructura, arcos y demas de acuerdo a diseño	3 días	22	lun 29/12/25	mié 31/12/25
28		Suministro e instalación de múdulos divisorios en madera y nylon piso-techo , incluye punto de anclaje. Colores a elegir.	2 días	26CC	mar 30/12/25	mié 31/12/25
29		Suministro e instalación de lampara Pie Bissen 1 luz E 27	1 día	28CC	mar 30/12/25	mar 30/12/25
30		Suministro e instalación de Puerta corrediza en panel maderable recuebierto en wpc 1.50x2.40 1 hoja	2 días	28CC	mar 30/12/25	mié 31/12/25
31		Suministro e instalación de ventanas corredizas en vidrio templado laminado con tratamiento acustico y solar VPH COOL LITE 120, estructura de soporte en perfil negro, incluye todos los elementos necesarios para instalar. Altura 2.3m	2 días	30CC	mar 30/12/25	mié 31/12/25
32		Aviso motivacional en acrilico volumétrico luminoso 100x66 cm; acrilico dorado espejo, volumetrico con relieve 4 cm, flotante para efecto de retroiluminación con luces led modulares de alta intensidad , fuente de voltaje	1 día	26	mié 31/12/25	mié 31/12/25
33		Suministro e instalación de protectores en acero de ventanas altira 2.30 m	2 días	26CC	mar 30/12/25	mié 31/12/25
34		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de fuente de agua vertical caida en cascada ancho 3 m alto 2 m	1 día	33CC	mar 30/12/25	mar 30/12/25
35		Suministro e instalación de sistema de sonido ambiental e institucional integrado, tipo 2.1, con control central y periféricos de audio	2 días	14	mar 30/12/25	mié 31/12/25
36		Suministro e instalación de alfombra autoadhesiva	2 días	34CC	mar 30/12/2	mié 31/12/25
37		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELÉCTRICOS, AIRE Y DATOS**	**5 días**		**mié 24/12/25**	**mié 31/12/25**
38		Salida normal para tomacorriente doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	5 días	11FC-2 días	mié 24/12/25	mié 31/12/25
39		Salida regulada para tomacorriente naranja doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente naranja, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25

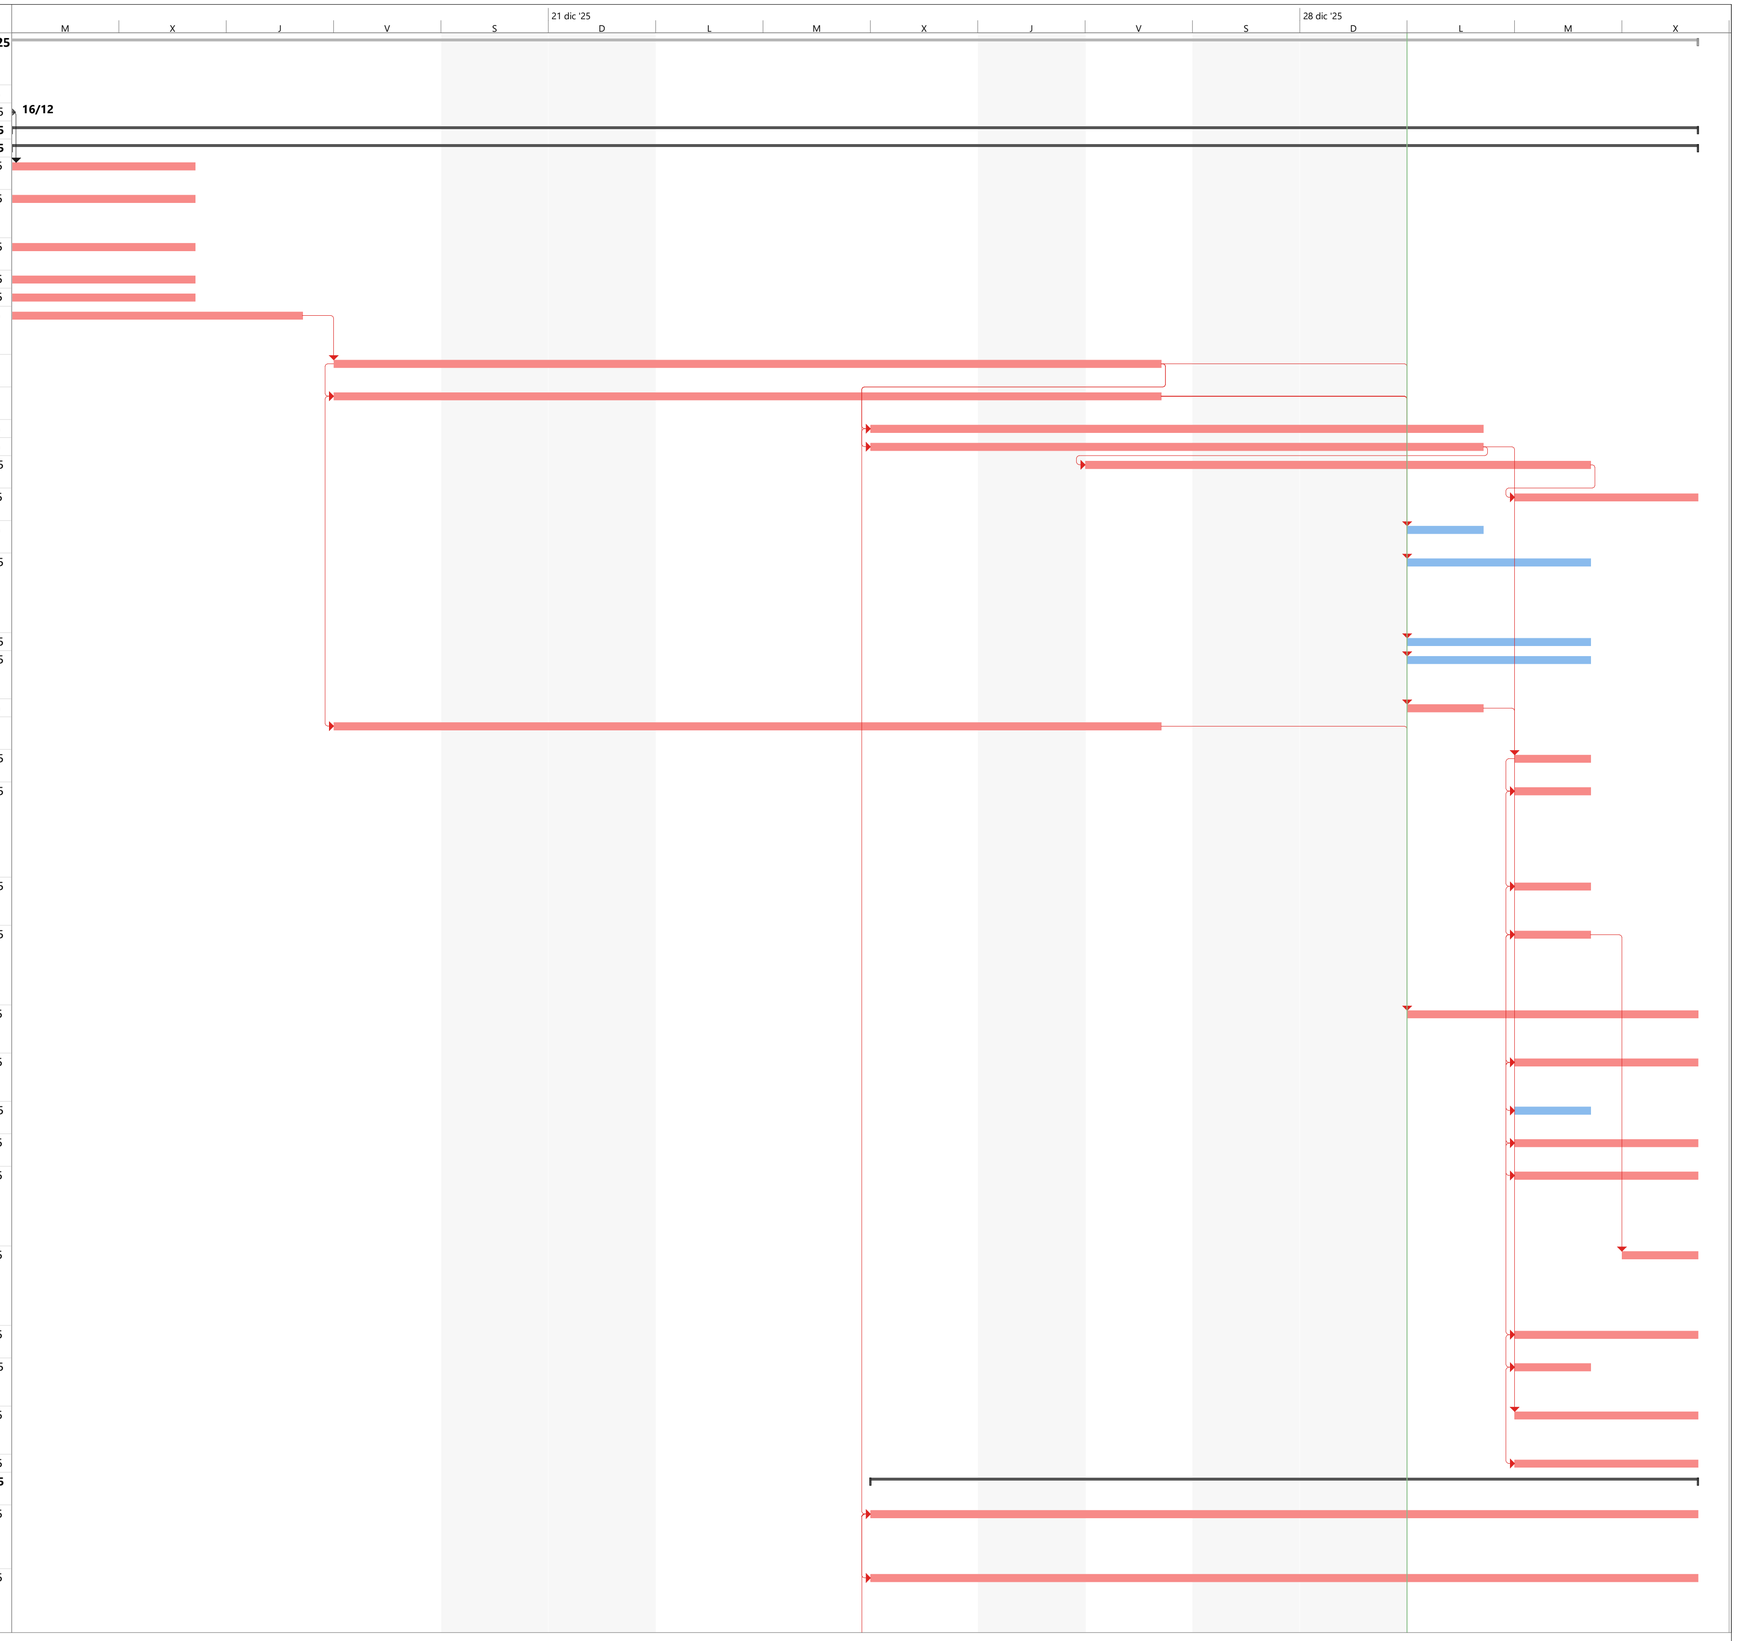

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: lun 29/12/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin
40		Salida de iluminación. Incluye cola en cable encauchetado de 3*14 AWG, tomas aéreas, prensa estopas, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
41		Salida para interruptor triple inteligente con luz indicadora circular.	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
42		Salida para interruptor cuádruple inteligente con luz indicadora circular.	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
43		Cable de cobre alimentador libre de halógenos 3*#14 AWG (Tres hilos de cable monopolar #14 AWG) en tubería EMT de 1/2". Incluye marcación de tubería cada m, curvas EMT, conectores, uniones, terminales, cajas con tapas, elemento estructurales para soportes	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
44		Cable de cobre alimentador libre de halógenos (#12 F + # 12 N + #12 T) AWG en tubería EMT de 1/2". Incluye marcación de tubería cada m, curvas EMT, conectores, uniones, terminales, cajas con tapas, elemento estructurales par soportes de la tubería y demás	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
45		Cable de cobre alimentador libre de halógenos (#12 F + # 12 N + #12 T) AWG en tubería PVC de 1/2". Incluye marcación de tubería cada m, curvas EMT, conectores, uniones, terminales, cajas con tapas, elemento estructurales par soportes de la tubería y demás	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
46		Regata, resane y pintura	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
47		Luz de Emergencia de incrustar	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
48		Salida bifásica a 220 V para aire acondicionado de 24000 BTU	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
49		Aire acondicionado de 24000 BTU, 220 V	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
50		Tuberías de cobre para aire de 24000 BTU	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
51		Cardan doble para bombillo Gu10, luz fría - luz cálida	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
52		Cinta led sencilla para iluminación en perfil de aluminio de incrustar (strip lines)	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
53		Salida de datos con Jack Rj45 Keystone Cat 6A 10 Gb	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
54		Salida HDMI de alta definición 4 k de 10 m en tubería PVC SCH 40 de 3/4"	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
55		Salida HDMI de alta definición 4 k de 15 m en tubería PVC SCH 40 de 3/4"	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
56		Cable HDMI de alta definición 4 k de 2m	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
57		Cable UTP cat 6A en tuberia SCH 40 de 3/4"	5 días	38CC	mié 24/12/25	mié 31/12/25
58		**ADMINISTRACION**	10 días		mar 16/12/25	mié 31/12/25
59		**IMPREVISTOS**	10 días		mar 16/12/25	mié 31/12/25
60		**UTILIDAD**	10 días		mar 16/12/25	mié 31/12/25
61		**IVA SOBRE LA UTILIDAD**	10 días		mar 16/12/25	mié 31/12/25
62		**FIN**	0 días	57	mié 31/12/25	mié 31/12/25

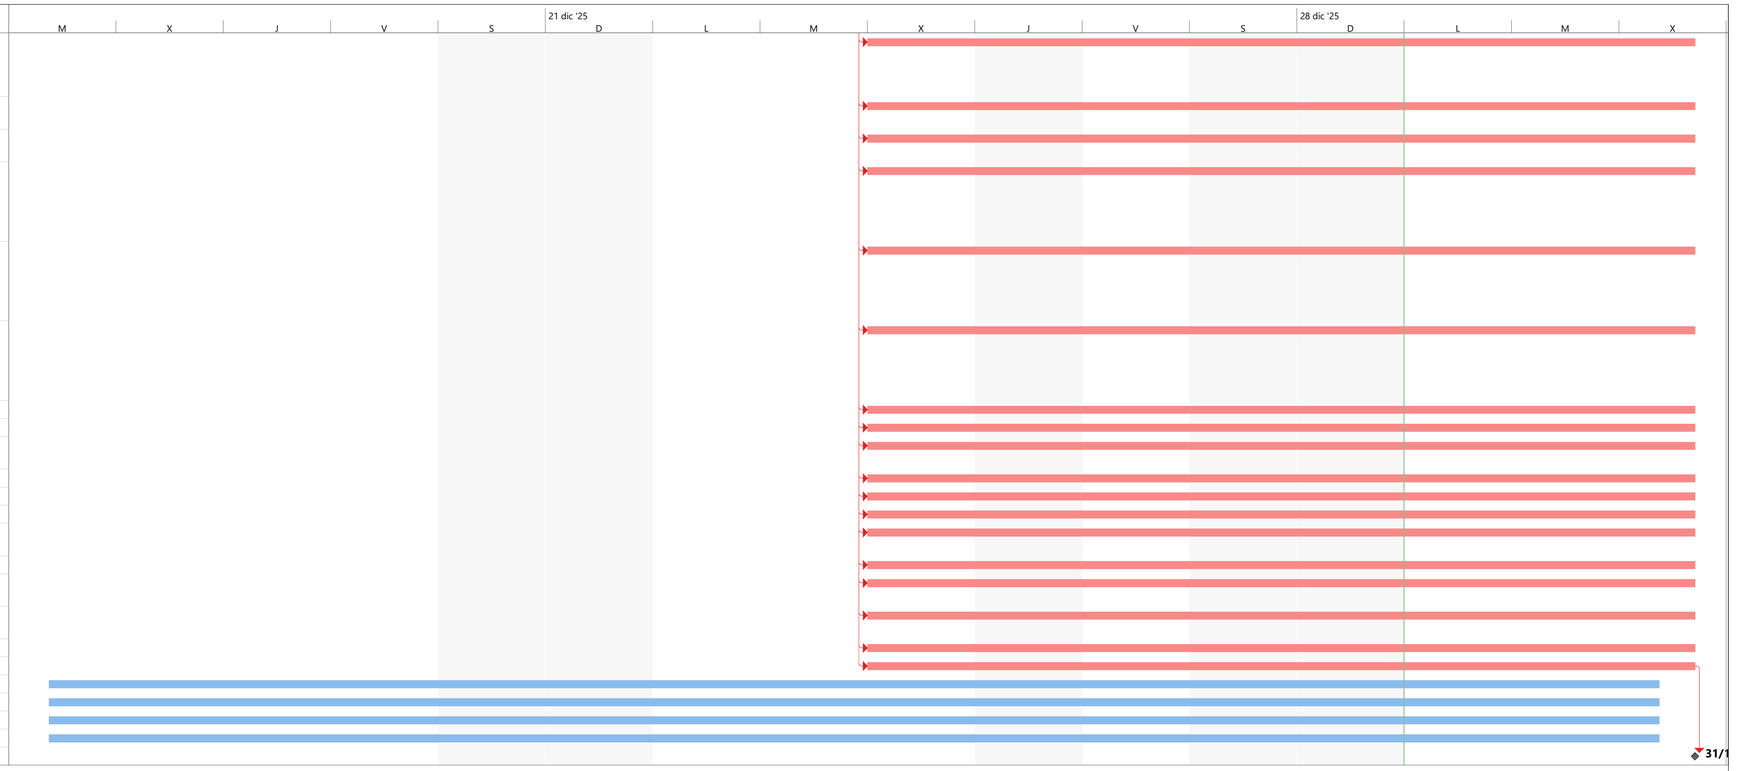

Proyecto: ADECUACIONES PAR
Fecha: lun 29/12/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual
