SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401
BOGOTA DC

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

CLIENTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**	**FACTURA PROFORMA**	**00105**
NIT:	800.215.807-2	**FECHA DE EMISION:**	7/08/2025
DIRECCION:	CL 25 G 73 B 90		
CIUDAD:	Bogotá DC	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	
Teléfono:	6017056142		
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ldiazp@invias.gov.co	COD PCI: **#$24-02-00;Contrato 973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$**	

CONCEPTO		VALOR
Acta de obra No. 50 Periodo: Julio 2025	3.379.103.565,00	**3.379.103.565,00**
Valor Total Básico	**3.379.103.565,00**	
Costo Directo	2.599.310.434,62	
A.I.U (30%)	779.793.130,39	
Utilidad (3%)	77.979.313,04	
Estudios y diseños	**72.997.058,00**	**72.997.058**
IVA de la Factura		**28.685.510**
IVA 19% sobre 3% de Utilidad	14.816.069,00	
IVA 19% sobre Estudios y Diseños	13.869.441,00	
(-) Menos amortización Anticipo (5,74%)	(193.960.545,00)	**(193.960.545,00)**
Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 11	3.286.825.588,00	

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3

VALOR EN LETRAS: **Tres Mil Doscientos Ochenta y Seis Millones Ochocientos Veinticinco Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos M/Cte**

SUBTOTAL	3.258.140.078,00
IVA	28.685.510,00
TOTAL	**3.286.825.588,00**

	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
	Identificación:	Identificación:
	FECHA:	FECHA:
_____	_____	_____
FIRMA EMISOR	FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO	FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 8 / 8 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 50 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.452.100.623,00 **MES** jul-2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 358.871.764.334,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 48.095.323.054,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 406.967.087.388,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12		Última Acta de de fecha Mayo 2025		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES												
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2	$ 1.816.892	$ 3.633.784,00	2,00	$ 3.633.784,00		$ -			$ -	
2	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95	$ 1.187.326	$ 112.795.970,00		$ -		$ -			$ -	
2.1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.187.326	$ -	93,00	$ 110.421.318,00		$ -			$ -	
2.2	1-11701	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.187.326	$ -	2,00	$ 2.374.652,00		$ -			$ -	
3	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	530	$ 113.989	$ 60.414.170,00	106,00	$ 12.082.834,00		$ -	106,00	$ 12.082.834,00		
3.1	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.989	$ -	3.732,00	$ 425.406.948,00	25,00	$ 2.849.725,00	3.170,90	$ 361.447.720,00		
3.2	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.989	$ -	30,00	$ 3.419.670,00		$ -	6,00	$ 683.934,00		
4	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	751	$ 69.636	$ 52.296.636,00	751,00	$ 52.296.636,00		$ -	263,00	$ 18.314.268,00		
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	4269	$ 4.475	$ 19.103.775,00		$ -		$ -			$ -	
5.1	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475	$ -	6.603,00	$ 29.548.425,00		$ -	6.550,00	$ 29.311.250,00		
5.2	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475	$ -	570,00	$ 2.550.750,00		$ -		$ -		
6	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240381	$ 60.000	$ 14.422.860.000,00	73.069,00	$ 4.384.140.000,00		$ -	50.435,10	$ 3.026.106.000,00		
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2183358	$ 10.642	$ 23.235.295.836,00		$ -		$ -		$ -		
7.1	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.642	$ -	410.046,70	$ 4.363.716.981,00	7.398,30	$ 78.732.709,00	164.139,50	$ 1.746.772.561,00		
7.2	1-11701	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.642	$ -	10.268,00	$ 109.272.056,00		$ -		$ -		
8	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	683232	$ 9.747	$ 6.659.462.304,00	683.232,00	$ 6.659.462.304,00	1.766,00	$ 17.213.202,00	349.019,00	$ 3.401.888.193,00		
9	1	220.1		Terraplenes	m3	58850	$ 13.119	$ 772.053.150,00		$ -		$ -		$ -		
9.1	1-11601	220.1		Terraplenes	m3		$ 13.119	$ -	20.381,00	$ 267.378.339,00		$ -	11.011,60	$ 144.461.180,00		
9.2	1-11701	220.1		Terraplenes	m3		$ 13.119	$ -	12.469,00	$ 163.580.811,00		$ -		$ -		
10	1-11601	221-13		Pedraplen compacto	m3	2625	$ 18.609	$ 48.848.625,00	34.125,00	$ 635.032.125,00	94,00	$ 1.749.246,00	20.600,00	$ 383.345.400,00		
11	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59655	$ 10.393	$ 619.994.415,00	2.287,00	$ 23.768.791,00		$ -	2.287,00	$ 23.768.791,00		
11.1	1-11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		$ 10.393	$ -	69.383,00	$ 721.097.519,00		$ -	28.985,40	$ 301.245.264,00		
12	1-11601	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	730752	$ 1.332	$ 973.361.664,00	730.752,00	$ 973.361.664,00		$ -		$ -		
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												
13	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	375760	$ 927	$ 348.329.520,00	424.154,00	$ 393.190.758,00		$ -	424.154,00	$ 393.190.758,00		
13.1	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927	$ -	2.940.086,00	$ 2.725.459.722,00	657,00	$ 609.039,00	1.104.947,90	$ 1.024.286.706,00		
14	2-11602	311-13		Afirmado	m3	70266	$ 132.094	$ 9.281.717.004,00	201.266,00	$ 26.586.031.004,00	8.000,70	$ 1.056.844.466,00	127.992,90	$ 16.907.094.133,00		
15	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174216	$ 180.000	$ 31.358.880.000,00		$ -		$ -		$ -		
15.1	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180.000	$ -	202.635,00	$ 36.474.300.000,00	271,40	$ 48.852.000,00	49.222,60	$ 8.860.068.000,00		
15.2	2-11703	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180.000	$ -	4.496,00	$ 809.280.000,00		$ -		$ -		
16	2	330-13		Base granular clase A	m3	97790	$ 206.690	$ 20.212.215.100,00		$ -		$ -		$ -		
16.1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 206.690	$ -	128.534,00	$ 26.566.692.460,00	554,30	$ 114.568.267,00	33.013,10	$ 6.823.477.639,00		
16.2	2-11703	330-13		Base granular clase A	m3		$ 206.690	$ -	1.528,00	$ 315.822.320,00		$ -		$ -		
17	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21000	$ 222.076	$ 4.663.596.000,00	21.000,00	$ 4.663.596.000,00		$ -	584,30	$ 129.759.007,00		
				PAVIMENTOS ASFALTICOS												
18	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642636	$ 2.918	$ 1.875.211.848,00		$ -		$ -		$ -		
18.1	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.918	$ -	757.438,00	$ 2.210.204.084,00	354,00	$ 1.032.972,00	279.543,00	$ 815.706.474,00		
18.2	7-11703	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.918	$ -	6.111,00	$ 17.831.898,00		$ -		$ -		
19	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432950	$ 1.849	$ 800.524.550,00		$ -		$ -		$ -		
19.1	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849	$ -	530.904,00	$ 981.641.496,00	8.915,00	$ 16.483.835,00	130.743,00	$ 241.743.807,00		
19.2	7-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849	$ -	6.111,00	$ 11.299.239,00		$ -		$ -		
20	7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25977	$ 863.363	$ 22.427.580.651,00		$ -		$ -		$ -		
20.1	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 863.363	$ -	4.730,10	$ 4.083.793.326,00		$ -		$ -		
20.2	7-11703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 863.363	$ -	611,00	$ 527.514.793,00		$ -		$ -		
21	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	25977	$ 879.613	$ 22.849.706.901,00		$ -		$ -		$ -		
21.1	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 879.613	$ -	36.251,00	$ 31.886.850.863,00	541,90	$ 476.662.285,00	20.614,40	$ 18.132.694.227,00		
21.2	7-11703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 879.613	$ -	458,30	$ 403.126.638,00		$ -		$ -		
22	7		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7350	$ 908.124	$ 6.674.711.400,00	1.602,90	$ 1.455.631.960,00		$ -	1.602,90	$ 1.455.631.960,00		
22.1	7-11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 908.124	$ -	42.947,10	$ 39.001.292.240,00	5,00	$ 4.540.620,00	35.176,40	$ 31.944.533.074,00		
22.2	7-11703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 908.124	$ -	2.231,10	$ 2.026.115.456,00		$ -	2.231,10	$ 2.026.115.457,00		
23	7		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	14600	$ 72.822	$ 1.063.201.200,00	1.477,00	$ 107.558.094,00		$ -	1.477,00	$ 107.558.094,00		
23.1	7-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	120	$ 65.247	$ 7.829.640,00	50.386,00	$ 3.669.209.292,00	5,00	$ 364.110,00	39.145,00	$ 2.850.617.190,00		
23.2	7-11703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72.822	$ -	1.807,00	$ 131.589.354,00		$ -	1.807,00	$ 131.589.354,00		
24	7-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	18250	$ 78.894	$ 1.439.815.500,00	33.250,00	$ 2.623.225.500,00		$ -	29.765,10	$ 2.348.287.799,00		
25	7	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	15000	$ 4.342	$ 65.130.000,00		$ -		$ -		$ -		
25.1	7-11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.342	$ -	14.550,00	$ 63.176.100,00		$ -		$ -		
25.2	7-11703	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.342	$ -	450,00	$ 1.953.900,00		$ -		$ -		
				PAVIMENTOS DE CONCRETO												
26	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	35	$ 783.524	$ 27.423.340,00	61,00	$ 47.794.964,00		$ -	20,60	$ 16.140.594,00		
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
27	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	208626	$ 30.000	$ 6.258.780.000,00		$ -		$ -		$ -		
27.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30.000	$ -	177.799,70	$ 5.333.991.000,00	1.314,20	$ 39.426.000,00	39.403,80	$ 1.182.114.000,00		
27.2	5-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30.000	$ -	66,00	$ 1.980.000,00		$ -		$ -		
28	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	132210	$ 32.000	$ 4.230.720.000,00	98.790,00	$ 3.161.280.000,00	67,40	$ 2.156.800,00	5.595,90	$ 179.068.800,00		
29	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	$ 25.958	$ 3.893.700,00	3.417,00	$ 88.698.486,00		$ -		$ -		
30	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120	$ 65.247	$ 7.829.640,00	713,00	$ 46.521.111,00		$ -	52,60	$ 3.431.992,00		
31	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	17520	$ 44.832	$ 785.456.640,00		$ -		$ -		$ -		
31.1	5-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44.832	$ -	16.698,00	$ 748.604.736,00	329,20	$ 14.758.694,00	6.648,20	$ 298.052.100,00		
31.2	5-11705	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44.832	$ -	822,00	$ 36.851.904,00		$ -		$ -		
32	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	52356	$ 65.112	$ 3.409.003.872,00	61.356,00	$ 3.995.011.872,00	1.500,70	$ 97.713.578,00	14.971,30	$ 974.811.283,00		
33	5-14101		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40	$ 2.233.592	$ 89.343.680,00	1.971,00	$ 4.402.409.832,00	90,00	$ 201.023.280,00	1.221,60	$ 2.728.555.987,00		
34	5-11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3764	$ 368.509	$ 1.387.067.876,00	3.764,00	$ 1.387.067.876,00		$ -		$ -		
35	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4709	$ 1.254.085	$ 5.905.486.265,00	4.709,00	$ 5.905.486.265,00		$ -		$ -		
36	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4792	$ 871.252	$ 4.175.039.584,00		$ -		$ -		$ -		
36.1	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252	$ -	1.200,00	$ 1.045.502.400,00	13,10	$ 11.413.401,00	573,40	$ 499.575.894,00		
36.2	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252	$ -	4.730,00	$ 4.121.027.960,00	224,90	$ 195.944.575,00	1.940,70	$ 1.690.838.756,00		
36.3	5-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252	$ -	14,00	$ 12.197.528,00		$ -		$ -		
37	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2354	$ 1.033.388	$ 2.432.595.352,00	3.354,00	$ 3.465.983.352,00	120,10	$ 124.109.899,00	2.261,90	$ 2.337.420.316,00		
38	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411	$ 1.127.087	$ 463.232.757,00	411,00	$ 463.232.757,00		$ -		$ -		
39	6-14103		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	1412	$ 1.184.864	$ 1.673.027.968,00	1.412,00	$ 1.673.027.968,00		$ -		$ -		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	4

FECHA: 8 / 8 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 50 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.452.100.623,00 **MES** jul-2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 358.871.764.334,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 48.095.323.054,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.967.087.388,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12	Última Acta de de fecha Mayo 2025	OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
40	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5444	$ 721.775	$ 3.929.343.100,00	5.444,00	$ 3.929.343.100,00	11,40	$ 8.228.235,00	226,00	$ 182.399.379,00
41	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	5382	$ 972.051	$ 5.231.578.482,00	5.382,00	$ 5.231.578.482,00	117,40	$ 114.118.787,00	117,40	$ 114.118.787,00
42	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1539	$ 539.260	$ 829.921.140,00		$ -		$ -		$ -
42.1	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260	$ -	1.509,00	$ 813.743.340,00	21,90	$ 11.809.794,00	865,40	$ 466.675.604,00
42.2	5-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260	$ -	16,00	$ 8.628.160,00		$ -		$ -
42.3	6-14101	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260	$ -	56,00	$ 30.198.560,00		$ -	3,00	$ 1.617.780,00
43	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1137	$ 485.168	$ 551.636.016,00	2.361,10	$ 1.145.530.165,00	61,10	$ 29.643.765,00	1.242,30	$ 602.724.205,00
44	4-14104		632.1P	Baranda Metálica	m	2915	$ 545.130	$ 1.589.053.950,00	2.915,00	$ 1.589.053.950,00		$ -		$ -
45	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2611800	$ 5.378	$ 14.046.260.400,00		$ -		$ -		$ -
45.1	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378	$ -	1.762.203,00	$ 9.477.127.734,00	59.360,00	$ 319.238.080,00	787.097,00	$ 4.233.007.666,00
45.2	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378	$ -	1.569,00	$ 8.438.082,00		$ -	1.127,00	$ 6.061.006,00
45.3	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378	$ -	891.348,00	$ 4.793.669.544,00		$ -	1.840,00	$ 9.895.520,00
46	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	256153	$ 5.483	$ 1.404.486.899,00		$ -		$ -		$ -
46.1	4-11604	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5.483	$ -	253.724,00	$ 1.391.168.692,00	4.175,00	$ 22.891.525,00	9.898,00	$ 54.270.734,00
46.2	4-11705	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5.483	$ -	2.429,00	$ 13.318.207,00		$ -		$ -
47	4-11606	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	2143171	$ 2.237	$ 4.794.273.527,00	2.143.171,00	$ 4.794.273.527,00		$ -		$ -
48	5-14103	642-13		Apoyo elastómero	u	243	$ 2.720.318	$ 661.037.274,00	243,00	$ 661.037.274,00		$ -		$ -
49	5-14103		642.3P	Junta FREYSINET M80 o similar	m	871	$ 2.799.200	$ 2.438.103.200,00	871,00	$ 2.438.103.200,00		$ -		$ -
50	5	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1035	$ 628.687	$ 650.691.045,00	14,00	$ 8.801.618,00		$ -	14,00	$ 8.801.618,00
50.1	5-11604	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628.687	$ -	1.375,00	$ 864.444.625,00	3,00	$ 1.886.061,00	535,30	$ 336.536.151,00
50.2	5-11705	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628.687	$ -	16,00	$ 10.058.992,00		$ -		$ -
51	5-11604		663.1P	Tubería para filtro PVC e 6"	m	58240	$ 66.621	$ 3.880.007.040,00	60.740,00	$ 4.046.559.540,00		$ -		$ -
52	5		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83952	$ 38.113	$ 3.199.662.576,00		$ -		$ -		$ -
52.1	5-11604		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38.113	$ -	88.375,00	$ 3.368.236.375,00	312,70	$ 11.917.935,00	18.172,90	$ 692.623.739,00
52.2	5-11705		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38.113	$ -	1.527,00	$ 58.198.551,00		$ -		$ -
53	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3	5784	$ 666.880	$ 3.857.233.920,00		$ -		$ -		$ -
53.1	5-11604		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3		$ 666.880	$ -	10.014,30	$ 6.678.336.384,00	43,30	$ 28.875.904,00	4.679,60	$ 3.120.731.648,00
53.2	5-11705		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3		$ 666.880	$ -	160,00	$ 106.700.800,00		$ -	62,00	$ 41.346.560,00
54	5-11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1400	$ 90.059	$ 126.082.600,00	10.525,00	$ 947.870.975,00	61,00	$ 5.493.599,00	112,40	$ 10.122.632,00
55	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	482587	$ 5.200	$ 2.509.452.400,00		$ -		$ -		$ -
55.1	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 5.200	$ -	525.476,00	$ 2.732.475.200,00	1.561,00	$ 8.117.200,00	196.338,00	$ 1.020.957.600,00
55.2	7-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 5.200	$ -	18.852,00	$ 98.030.400,00		$ -		$ -
56	5	673-13		Material granular drenante	m3	51808	$ 152.050	$ 7.877.406.400,00		$ -		$ -		$ -
56.1	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152.050	$ -	42.293,20	$ 6.430.681.060,00	238,00	$ 36.187.900,00	11.419,00	$ 1.736.258.950,00
56.2	5-11705	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152.050	$ -	1.837,00	$ 279.315.850,00		$ -		$ -
57	5-11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	21350	$ 152.000	$ 3.202.500.000,00	22.628,30	$ 3.394.245.000,00	42,20	$ 6.330.000,00	7.003,10	$ 1.050.465.000,00
58	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	5157	$ 173.904	$ 896.822.928,00	6.232,00	$ 1.083.769.728,00	670,50	$ 116.602.632,00	6.086,10	$ 1.058.397.135,00
59	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1250	$ 265.893	$ 332.366.250,00	1.750,00	$ 465.312.750,00		$ -	1.748,00	$ 464.780.964,00
										$ -				
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						$ -				
60	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111199	$ 1.794	$ 199.491.006,00	305.221,90	$ 547.568.089,00		$ -	305.221,90	$ 547.568.088,00
60.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794	$ -	1.884.104,10	$ 3.380.082.755,00		$ -	771.498,10	$ 1.384.067.592,00
60.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794	$ -	3.275,00	$ 5.875.350,00		$ -		$ -
61	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487	$ 22.076	$ 10.751.012,00		$ -		$ -		$ -
61.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076	$ -	8.113,00	$ 179.102.651,00		$ -	4.072,30	$ 89.900.095,00
61.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076	$ -	41,00	$ 905.053,00		$ -		$ -
62	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11798	$ 8.346	$ 98.466.108,00	17.541,00	$ 146.397.186,00		$ -		$ -
63	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513	$ 399.581	$ 204.985.053,00		$ -		$ -		$ -
63.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399.581	$ -	577,00	$ 230.558.237,00		$ -	116,00	$ 46.351.396,00
63.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399.581	$ -	12,00	$ 4.794.972,00		$ -		$ -
64	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	471	$ 327.606	$ 154.302.426,00	593,00	$ 194.270.358,00		$ -		$ -
65	4	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	5	$ 559.793	$ 2.798.965,00		$ -		$ -		$ -
65.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559.793	$ -	36,00	$ 20.152.548,00		$ -		$ -
65.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559.793	$ -	2,00	$ 1.119.586,00		$ -		$ -
66	4-11607	730-13		Defensa metálica	m	4245	$ 230.532	$ 978.608.340,00	7.031,00	$ 1.620.870.492,00	68,00	$ 15.676.176,00	527,10	$ 121.513.418,00
67	4-11607	730-13		Sección final	u	319	$ 103.189	$ 32.917.291,00	331,00	$ 34.155.559,00		$ -		$ -
68	4-11607	740-13		Captafaros	u	328	$ 22.031	$ 7.226.168,00	2.281,00	$ 50.252.711,00		$ -	138,00	$ 3.040.278,00
				OBRAS VARIAS										
69	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700	$ 17.838	$ 12.486.600,00	8.200,00	$ 146.271.600,00		$ -	2.325,00	$ 41.473.350,00
70	5	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4332	$ 34.235	$ 148.306.020,00		$ -		$ -		$ -
70.1	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34.235	$ -	15.234,00	$ 521.535.990,00		$ -	15.229,00	$ 521.364.815,00
70.2	5-11704	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34.235	$ -	570,00	$ 19.513.950,00		$ -	570,00	$ 19.513.950,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 50 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.452.100.623,00 **MES** jul-2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 358.871.764.334,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 48.095.323.054,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.967.087.388,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12		Última Acta de de fecha Mayo 2025		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				TRANSPORTES												
71	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	29933177	$ 1.100	$ 32.926.494.700,00		$ -		$ -		$ -		$ -
71.1	3-11608			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.100	$ -	8.286.584,40	$ 9.115.242.840,00	59.227,20	$ 65.149.920,00	1.254.129,20	$ 1.379.542.120,00		
71.2	3-11701			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.100	$ -	10.278,00	$ 11.305.800,00		$ -		$ -		$ -
72	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	6832314	$ 1.100	$ 7.515.545.400,00	280.416,00	$ 308.457.600,00		$ -	280.416,00	$ 308.457.600,00		
72.1	3-11608			Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.100	$ -	6.573.438,00	$ 7.230.781.800,00	19.212,80	$ 21.134.080,00	2.775.293,80	$ 3.052.823.180,00		
															$ -	
				OBRAS NO PREVISTAS											$ -	
73	650.3P		650.3P	Transporte de estructura metálica	Kg		$ 361	$ -	210.403,00	$ 75.955.483,00		$ -	65.635,90	$ 23.694.560,00		
74	650.4P		650.4P	Montaje de Estructura Metálica Puente Modular	Kg		$ 3.717	$ -	257.400,00	$ 956.755.800,00		$ -	112.632,50	$ 418.655.003,00		
75	730.1.3P		730.1.3P	Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m	m		$ 665.869	$ -	122,40	$ 81.502.366,00		$ -	122,40	$ 81.502.366,00		
76	730.2.1P		730.2.1P	Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, poste y espaciador para canal)	m		$ 752.076	$ -	250,00	$ 188.019.000,00		$ -	8,10	$ 6.091.816,00		
77	8.5P		8.5P	Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 624.680	$ -	513,00	$ 320.460.840,00		$ -	3,00	$ 1.874.040,00		
78	8.6P		8.6P	Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80.293	$ -	216,00	$ 17.343.288,00		$ -	216,00	$ 17.343.288,00		
79	8.7P		8.7P	Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla	u		$ 107.058	$ -	24,00	$ 2.569.392,00		$ -	24,00	$ 2.569.392,00		
80	8.8P		8.8P	Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80.293	$ -	50,00	$ 4.014.650,00		$ -	50,00	$ 4.014.650,00		
81	900.2.1P		900.2.1P	Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición	m3/km		$ 1.410	$ -	2.161.238,60	$ 3.047.346.426,00		$ -	1.783.105,70	$ 2.514.179.037,00		
82	233.1	233-13		Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2		$ 12.601	$ -	318.327,80	$ 4.011.248.608,00	3.869,00	$ 48.753.269,00	177.474,00	$ 2.236.349.874,00		
83	464.1.1	464-13		Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - Incluye riego de liga CRR-1	m2		$ 13.288	$ -	116.435,00	$ 1.547.188.280,00		$ -	46.806,00	$ 621.958.128,00		
84	672,4	672-13		Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m		$ 77.169	$ -	2.996,00	$ 231.198.324,00		$ -	1.481,50	$ 114.325.874,00		
85	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		$ 1.057	$ -	399.331,70	$ 422.093.607,00		$ -	286.763,10	$ 303.108.597,00		
86	662.2P		662.2P	Tuberia corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).	m		$ 1.098.470	$ -	168,00	$ 184.542.960,00		$ -	136,90	$ 150.380.543,00		
87	8P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 0.75m con lámina retroreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 y retroreflectiva Tipo XI).	u		$ 1.298.836	$ -	152,00	$ 197.423.072,00		$ -	57,00	$ 74.033.652,00		
				Ajustes al peso						$ 1,00					$ (3,00)	

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 305.189.938.913,00		$ 344.570.723.204,00		$ 3.379.103.565,00		$ 142.829.280.173,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 41.440.096.041,00		$ 45.484.182.571,00				$ 38.939.756.920,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 1.080.000.000,00		$ 1.080.000.000,00				$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 347.710.034.954,00		$ 391.134.885.775,00		$ 3.379.103.565,00		$ 181.769.037.093,00
VALOR IVA "OBRA" (E)	$ 1.524.574.769,00		$ 1.714.976.038,00		$ 14.816.069,00		$ 796.987.317,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	$ 349.234.609.723,00		$ 392.849.861.814,00		$ 3.393.919.634,00		$ 182.566.024.410,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1.281.000.000,00		$ 1.281.000.000,00		$ -		$ 1.268.677.959,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 243.390.000,00		$ 243.390.000,00		$ -		$ 241.048.812,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	$ 1.524.390.000,00		$ 1.524.390.000,00		$ -		$ 1.509.726.771,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)	$ -		$ 3.764.765.515,00		$ 72.997.058,00		$ 3.242.214.072,00
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)	$ -		$ 715.305.448,00		$ 13.869.441,00		$ 616.020.674,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)	$ -		**$ 4.480.070.963,00**		$ 86.866.499,00		$ 3.858.234.746,00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	$ 7.772.764.611,00		$ 7.772.764.611,00		$ -		$ 3.584.730.275,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 340.000.000,00		$ 340.000.000,00				$ 1.985.425,00
VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)	**$ 358.871.764.334,00**		**$ 406.967.087.388,00**		**$ 3.480.786.133,00**		**$ 191.520.701.627,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 3 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 31.009.208.054,00	7,60%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 193.960.545,00	5,74%
Valor Amortizado Acumulado	$ 18.639.666.752,00	60,11%
Valor Saldo por Amortizar	$ 12.369.541.302,00	39,89%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3.379.103.565,00	$ 14.816.069,00	$ 3.393.919.634,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$ 72.997.058,00	$ 13.869.441,00	$ 86.866.499,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 3.452.100.623,00	$ 28.685.510,00	$ 3.480.786.133,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 149.298.151,00	$ 11.685.777.269,00
SB	$ 48.852.000,00	$ 8.860.068.000,00
B	$ 1.172.021.772,00	$ 25.277.808.243,00
P	$ 499.083.822,00	$ 60.692.576.158,00
OA	$ 1.407.887.644,00	$ 25.792.717.786,00
SCT	$ 15.676.176,00	$ 2.379.870.071,00
OV	$ -	$ 582.352.115,00
T	$ 86.284.000,00	$ 7.558.110.534,00
TOTAL	$ 3.379.103.565,00	$ 142.829.280.176,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Preliminares y explanación	$ 100.544.882,00	$ 9.448.743.461,00
2. Afirmados, subbases y bases	$ 1.269.627.041,00	$ 36.374.226.117,00
3. Pavimentos asfalticos / concreto	$ 499.083.822,00	$ 58.534.871.347,00
4. Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 656.088.471,00	$ 16.783.009.538,00
5. Obras de urbanismo	$ -	$ -
6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 426.665.994,00	$ 3.890.973.807,00
7. Señalización y control de transito	$ 15.676.176,00	$ 2.379.870.071,00
8. Transporte y sobre acarreos	$ 86.284.000,00	$ 7.558.110.534,00
TOTAL	$ 3.053.970.386,00	$ 134.969.804.875,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 8 / 8 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 50 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.452.100.623,00 **MES** jul-2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 358.871.764.334,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 48.095.323.054,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.967.087.388,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12		Última Acta de de fecha Mayo 2025		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vías Urbanas

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanación	$ -	$ 683.934,00
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base	$ -	$ -
3. Estructura de pavimento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases	$ -	$ 2.157.704.811,00
4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público	$ -	$ 19.513.950,00
5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito	$ -	$ 161.733.440,00
6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	$ -	$ -
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal	$ -	$ -
8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal	$ -	$ -
9. Estabilización de terreno	$ -	$ -
10. Señalización vertical y horizontal	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ 2.339.636.135,00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Preliminares y cimentación	$ 201.023.280,00	$ 2.730.173.767,00
2. Subestructura y cimentación	$ 124.109.899,00	$ 2.337.420.316,00
3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 452.245.083,00
4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -
5. Drenajes	$ -	$ -
TOTAL	$ 325.133.179,00	$ 5.519.839.166,00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 100.544.882,00	$ 9.449.427.395,00
2 Sub-bases y bases	$ 1.220.873.772,00	$ 34.137.876.243,00
3 Transporte de materiales	$ 86.284.000,00	$ 7.581.805.094,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 357.805.781,00	$ 4.966.828.673,00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 933.530.940,00	$ 18.285.630.310,00
6 Concreto para estructura de puentes	$ 124.109.899,00	$ 2.339.038.096,00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 555.954.291,00	$ 66.068.674.365,00
TOTAL	$ 3.379.103.565,00	$ 142.829.280.176,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.452.100.623,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.258.140.078,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.286.825.588,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Tres Mil Doscientos Ochenta y Seis Millones Ochocientos Veinticinco Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o PMT, se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrícula Profesional No.: 091037-0734114 CND

Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAMEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 59

CONTRATO DE OBRA No. 673 DE 2021 — CONTRATO INTERVENTORIA 562 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"".

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA — INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISIÓN- 555

VALOR CONTRATO INCLUDO IVA : $ 406.857.667.388,00

SUDINCO — SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 12 Mayo 2025 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 12 Mayo 2025 VALOR TOTAL	Acta de fecha	CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR) CANTIDAD	CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR) VALOR TOTAL	CANTIDADES PRESENTE ACTA CANTIDAD	CANTIDADES PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CANTIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS VALOR TOTAL	% EJECUTADO
EXPLANACIONES																		
1	200,1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2,00	$ 1.816.892,00	$ 3.633.784,00	2,00	$ 3.633.784		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2	200,2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	85,00	$ 1.167.326,00	$ 112.755.573,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2,1	200,2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.167.326,00	$ 0,00	97,00	$ 116.421.378		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2,2	200,2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.167.326,00	$ 0,00	2,00	$ 2.374.652		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3	201,7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	536,00	$ 113.569,00	$ 60.414.170,00	106,00	$ 12.082.834		106,00	$ 12.082.834		$ -	106,00	$ 12.082.834	100,00%
3,1	201,7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.569,00	$ 0,00	3.732,00	$ 423.426.948		3.145,90	$ 356.597.995	25,88	$ 2.948.725	3179,90	$ 361.447.729	84,97%
3,2	201,7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.569,00	$ 0,00	30,00	$ 3.418.570		6,00	$ 683.834		$ -	6,00	$ 683.834	20,00%
4	201,15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	791,00	$ 60.636,00	$ 52.296.636,00	791,00	$ 47.296.636		263,00	$ 15.314.268		$ -	263,00	$ 15.314.268	36,92%
5	201,16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	4.269,00	$ 4.475,00	$ 19.103.775,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
5,1	201,16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475,00	$ 0,00	6.923,00	$ 30.548.425		5.330,00	$ 29.311.250		$ -	6550,00	$ 29.311.250	95,23%
5,2	201,16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475,00	$ 0,00	570,00	$ 3.560.750		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6	210,2,1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240.381,00	$ 60.000,00	$ 14.422.860.000,00	73.069,60	$ 4.384.140.000		50.435,10	$ 3.026.106.000		$ -	50435,10	$ 3.026.106.000	69,02%
7	210,2,2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2.183.358,00	$ 10.042,00	$ 20.235.295.836,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7,1	210,2,2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.042,00	$ 0,00	410.946,70	$ 4.363.716.861		156.741,20	$ 1.669.606.853	7.399,30	$ 79.730.709	164139,50	$ 1.749.772.569	40,09%
7,2	210,2,2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.042,00	$ 0,00	10.260,00	$ 109.272.958		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
8	211,1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	683.232,00	$ 9.747,00	$ 6.659.462.304,00	683.232,00	$ 6.659.462.304		347.203,00	$ 3.384.674.991	1.788,00	$ 17.213.202	348818,00	$ 3.401.888.193	51,09%
9	220,1	220-1		Terraplenes	m3	58.800,00	$ 13.119,00	$ 771.253.150,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
9,1	220,1	220-1		Terraplenes	m3		$ 13.119,00	$ 0,00	20.361,00	$ 267.179.338		11.011,60	$ 144.461.185		$ -	11011,60	$ 144.461.185	54,05%
9,2	220,1	220-1		Terraplenes	m3		$ 13.119,00	$ 0,00	17.469,00	$ 163.696.811		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
10	221,1	221-13		Pedraplen compacto	m3	2.625,00	$ 18.609,00	$ 48.848.625,00	34.125,00	$ 635.009.125		28.596,80	$ 531.566.154	64,00	$ 1.749.240	28660,80	$ 533.345.495	83,97%
11	230,1P		230,1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	33.000,00	$ 19.203,00	$ 618.804.419,00	2.267,00	$ 23.758.791		2.267,00	$ 23.758.791		$ -	2267,00	$ 23.758.791	100,00%
11,1	230,1P	-	230,1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		$ 19.203,00	$ 0,00	46.363,00	$ 721.697.519		28.985,40	$ 361.243.262		$ -	28985,40	$ 361.243.262	41,79%
12	234,1	234-13		Conformación de taludes estables	m2	730.752,00	$ 1.232,00	$ 973.361.664,00	730.752,00	$ 973.361.664		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
Subtotal								$ 46.999.120.329,69		$ 19.842.545.857,00			$ 9.349.982.899,00		$ 100.544.902,00		$ 9.440.427.391,00	
SARGAS, ALCANTARILLAS Y ATRAVIESOS																		
13	310,1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	373.765,00	$ 927,00	$ 346.529.020,00	424.154,00	$ 393.186.758		424.154,00	$ 393.186.758		$ -	424154,00	$ 393.186.758	100,00%
13,1	310,1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927,00	$ 0,00	2.940.396,00	$ 2.725.459.732		1.104.290,90	$ 1.023.677.865	607,00	$ 609.039	1104247,90	$ 1.024.286.704	37,55%
14	311,1	311-13		Alcantarilla	m3	70.268,00	$ 132.084,00	$ 9.281.717.004,00	291.268,00	$ 38.644.831.504		119.952,20	$ 15.859.245.688	8.930,70	$ 1.668.844.466	127882,90	$ 17.527.990.155	63,53%
15	320,1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174.210,00	$ 180.000,00	$ 31.358.083.000,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
15,1	320,1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180.000,00	$ 0,00	202.625,00	$ 36.474.390.000		48.551,20	$ 8.811.216.990	371,80	$ 46.853.000	49222,00	$ 8.860.368.990	24,29%
15,2	320,1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180.000,00	$ 0,00	4.699,00	$ 459.260.009		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
16	330,1	330-13		Base granular clase A	m3	87.795,00	$ 208.693,00	$ 30.212.215.160,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
16,1	330,1	330-13		Base granular clase A	m3		$ 255.693,00	$ 0,00	136.634,00	$ 36.668.682.469		32.458,80	$ 8.709.806.372	554,20	$ 114.569.367	33013,10	$ 8.823.477.838	24,08%
16,2	330,1	330-13		Base granular clase A	m3		$ 296.693,00	$ 0,00	1.028,00	$ 315.022.229		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
17	330,4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21.000,00	$ 222.076,00	$ 4.663.596.000,00	21.000,00	$ 4.663.596.960		584,20	$ 129.709.057		$ -	584,20	$ 129.709.057	2,78%
Subtotal								$ 95.864.737.824,69		$ 88.834.372.264,00			$ 32.917.502.468,00		$ 1.239.972.772,00		$ 34.157.876.241,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 09

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021

CONTRATO INTERVENTORÍA 992 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA : $ 406.557.887.368,00

SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificacion No. 12 Mayo 2025 Acta de fecha CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR TOTAL	CANTIDADES ACUMULADO ANTERIOR) CANTIDAD	CANTIDADES ACUMULADO ANTERIOR) VALOR TOTAL	CANTIDADES PRESENTE ACTA CANTIDAD	CANTIDADES PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CANTIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS VALOR TOTAL	% EJECUTADO
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
19	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642.036,00	$ 2.918,00	$ 1.875.211.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
19,1	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.918,00	$ 0,00	767.439,00	$ 2.239.394.884	279.189,00	$ 814.672.589	354,00	$ 1.032.972	279543,00	$ 815.705.474	36,41%
19,2	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.918,00	$ 0,00	6.111,00	$ 17.831.934	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
18	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432.866,30	$ 1.849,00	$ 800.524.566,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
18,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849,00	$ 0,00	530.804,00	$ 981.641.496	121.829,00	$ 225.279.872	6.615,00	$ 12.233.835	128743,00	$ 241.743.807	24,53%
18,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849,00	$ 0,00	6.111,00	$ 11.299.339	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
20	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	35.977,00	$ 960.363,00	$ 22.427.580.651,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
20,1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 960.363,00	$ 0,00	4.736,16	$ 4.548.789.336	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
20,2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 960.363,00	$ 0,00	611,00	$ 527.014.795	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
21	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	35.977,00	$ 679.613,00	$ 22.548.709.501,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
21,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 679.613,00	$ 0,00	38.251,56	$ 21.666.656.563	29.672,56	$ 17.658.021.343	541,00	$ 476.662.285	30614,46	$ 18.137.684.227	68,97%
21,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 679.613,00	$ 0,00	438,36	$ 463.126.638	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
22	450.3P		450.3P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7.350,00	$ 926.124,00	$ 6.874.711.400,00	1.602,90	$ 1.485.631.969	1.602,90	$ 1.485.631.969		$ -	1602,90	$ 1.485.631.969	100,00%
22,1	450.3P		450.3P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 926.124,00	$ 0,00	42.647,16	$ 39.951.292.249	35.171,46	$ 31.939.892.454	5,00	$ 4.540.020	35176,46	$ 31.944.530.074	81,91%
22,2	450.3P		450.3P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 926.124,00	$ 0,00	2.231,10	$ 2.026.115.456	2.231,10	$ 2.026.115.456		$ -	2231,10	$ 2.026.115.456	100,00%
23	490.1P		490.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m2	14.600,00	$ 72.622,00	$ 1.060.201.200,00	1.477,00	$ 107.558.994	1.477,00	$ 107.558.994		$ -	1477,00	$ 107.558.994	100,00%
23,1	490.1P		490.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m2		$ 72.622,00	$ 0,00	50.386,00	$ 3.659.256.292	33.140,00	$ 2.850.263.080	5,00	$ 364.110	33145,00	$ 2.850.617.109	77,59%
23,2	490.1P		490.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m2		$ 72.622,00	$ 0,00	1.807,00	$ 131.599.354	1.807,00	$ 131.599.354		$ -	1807,00	$ 131.599.354	100,00%
24	466.1	466-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	10.350,00	$ 79.694,00	$ 1.438.815.300,00	33.240,00	$ 2.672.235.300	29.785,10	$ 2.246.267.799		$ -	29785,10	$ 2.246.267.799	89,53%
25	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin rutas	m	10.000,00	$ 4.342,00	$ 65.130.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
25,1	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin rutas	m		$ 4.342,00	$ 0,00	14.500,00	$ 62.179.100	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
25,2	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin rutas	m		$ 4.343,00	$ 0,00	450,00	$ 1.953.800	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
Subtotal								$ 57.155.862.005,00	$ 99.202.914.233,00		$ 59.555.365.514,00		$ 499.683.822,00		$ 60.054.477.420,00		6,00%
PAVIMENTOS DE CONCRETO																	
26	500.1	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	30,00	780.524,00	$ 27.423.345,00	61,00	$ 47.704.964	20,00	$ 16.140.594		$ -	20,00	$ 16.140.594	33,77%
Subtotal								$ 27.423.345,00	$ 47.704.964,00		$ 16.140.594,00		$ 0,00		$ 16.140.594,00		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
27	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	208.626,39	$ 30.000,00	$ 6.258.760.033,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
27,1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30.000,00	$ 0,00	177.799,79	$ 5.333.991.333	39.590,00	$ 1.142.688.000	1.314,20	$ 39.426.000	39903,90	$ 1.182.114.000	22,16%
27,2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30.000,00	$ 0,00	66.000	$ 1.980.000	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
28	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	132.216,00	$ 33.000,00	$ 4.330.730.000,00	99.796,00	$ 3.161.268.000	5.526,00	$ 176.012.000	67,46	$ 2.159.000	5593,46	$ 178.004.698	5,64%
29	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	150,00	$ 26.658,00	$ 3.993.700,00	3.417,00	$ 88.888.486	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
30	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	150,00	$ 85.247,00	$ 7.829.640,00	713,00	$ 48.631.111	52,00	$ 3.431.993		$ -	52,00	$ 3.431.993	7,34%
31	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	17.520,00	$ 44.833,00	$ 785.453.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
31,1	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44.832,00	$ 0,00	15.998,00	$ 748.804.736	5.319,00	$ 283.265.488	329,20	$ 14.709.664	5648,20	$ 298.052.152	39,81%
31,2	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44.832,00	$ 0,00	620,80	$ 36.051.554	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
32	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	32.366,30	$ 85.112,00	$ 2.468.603.872,00	81.356,80	$ 5.065.011.972	13.470,40	$ 877.687.787	1.530,70	$ 97.713.078	14971,30	$ 974.811.266	24,40%
33	621.1.1P		0	Pilote de concreto vaciado in situ tipo cassone concreto clase fc=25 MPA de diámetro 1.2 m, (Incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40,00	$ 2.233.592,00	$ 89.343.680,00	1.071,00	$ 4.402.468.832	1.151,60	$ 2.527.792.797	69,00	$ 201.623.280	1221,60	$ 2.729.580.997	61,98%

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 10

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021

CONTRATO INTERVENTORÍA 962 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"".

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA : $ 466.867.087.388,00

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 12 Mayo 2025 Acta de fecha		CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		% EJECUTADO
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
34	623.1.2	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3.764,00	$ 368.509,00	$ 1.387.067.876,00	3.764,00	$ 1.387.067.876	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
35	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.709,00	$ 1.254.685,00	$ 5.905.486.265,00	4.709,00	$ 5.905.486.265	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
36	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4.762,00	$ 871.252,00	$ 4.175.039.584,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
36.1	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252,00	$ 0,00	1.200,00	$ 1.045.502.400	560,30	$ 488.162.496	13,10	$ 11.413.491	573,40	$ 499.575.987	47,76%
36.2	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252,00	$ 0,00	4.720,00	$ 4.121.071.960	1.715,60	$ 1.494.894.182	224,60	$ 195.944.575	1940,70	$ 1.690.838.758	41,03%
36.3	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252,00	$ 0,00	14,00	$ 12.197.528	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
37	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2.354,00	$ 1.033.368,00	$ 2.432.595.352,00	3.354,00	$ 3.465.963.352	2.141,80	$ 2.213.310.418	120,10	$ 124.109.899	2261,90	$ 2.337.420.317	67,44%
38	630.3.3P		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411,00	$ 1.127.097,00	$ 463.232.757,00	411,00	$ 463.232.757	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
39	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	1.412,00	$ 1.184.864,00	$ 1.673.027.968,00	1.412,00	$ 1.673.027.968	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
40	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5.444,00	$ 721.775,00	$ 3.929.343.100,00	5.444,00	$ 3.929.343.100	213,60	$ 154.171.140	11,40	$ 8.228.235	225,00	$ 162.399.375	4,13%
41	630.4.1P		630.4.1P	Concreto lanzado para paredes ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	5.392,00	972.051,00	$ 5.231.578.482,00	5.392,00	$ 5.231.578.482	0,00	$ -	117,40	$ 114.118.787	117,40	$ 114.118.787	2,18%
42	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1.539,00	$ 539.260,00	$ 829.921.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
42.1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260,00	$ 0,00	1.509,00	$ 813.743.340	843,50	$ 454.865.610	21,90	$ 11.809.794	865,40	$ 466.675.404	57,35%
42.2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260,00	$ 0,00	16,00	$ 8.628.160	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
42.3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260,00	$ 0,00	58,00	$ 30.169.660	3,00	$ 1.617.780		$ -	3,00	$ 1.617.780	3,36%
43	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1.137,00	$ 485.168,00	$ 551.636.016,00	2.361,10	$ 1.145.530.165	1.181,20	$ 573.080.442	61,10	$ 29.643.765	1242,30	$ 602.724.206	52,62%
44	632.1P		632.1P	Baranda Metálica	m	2.915,00	$ 545.130,00	$ 1.589.053.950,00	2.915,00	$ 1.589.053.950	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
45	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	2.611.600,00	$ 5.378,00	$ 14.046.360.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
45.1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		$ 5.378,00	$ 0,00	1.762.203,00	$ 9.477.127.734	727.737,00	$ 3.913.769.586	59.300,00	$ 319.238.080	787037,00	$ 4.233.007.666	44,67%
45.2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		$ 5.378,00	$ 0,00	1.569,00	$ 8.439.582	1.127,00	$ 6.061.006		$ -	1127,00	$ 6.061.006	71,83%
45.3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg		$ 5.378,00	$ 0,00	991.349,00	$ 4.793.669.544	1.840,00	$ 9.895.520		$ -	1840,00	$ 9.895.520	0,21%
46	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa	Kg	256.153,00	$ 5.483,00	$ 1.404.488.699,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
46.1	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa	Kg		$ 5.483,00	$ 0,00	253.724,00	$ 1.391.168.692	5.723,00	$ 31.379.209	4.175,00	$ 22.891.535	9898,00	$ 54.270.734	3,90%
46.2	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa	Kg		$ 5.483,00	$ 0,00	2.429,00	$ 13.318.207	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
47	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Ton	2.143.171,00	$ 2.237,00	$ 4.794.273.527,00	2.143.171,00	$ 4.794.273.527	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
48	642.1	642-13		Apoyo elastomero	u	243,00	$ 2.720.318,00	$ 661.037.274,00	243,00	$ 661.037.274	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
49	642.2P		642.2P	Junta FREYSSINET M80 o similar	m	871,00	$ 2.799.200,00	$ 2.438.103.200,00	871,00	$ 2.438.103.200	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
50	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.035,00	$ 628.687,00	$ 650.691.045,00	14,00	$ 8.801.618	14,00	$ 8.801.618		$ -	14,00	$ 8.801.618	100,00%
50.1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628.687,00	$ 0,00	1.375,00	$ 864.444.625	532,20	$ 334.650.090	3,00	$ 1.886.061	535,20	$ 336.536.151	39,93%
50.2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628.687,00	$ 0,00	16,00	$ 10.058.992	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
51	663.1P		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	58.240,00	$ 68.621,00	$ 3.996.007.040,00	60.740,00	$ 4.046.559.540	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
52	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83.952,00	$ 38.113,00	$ 3.199.662.576,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
52.1	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38.113,00	$ 0,00	88.375,00	$ 3.368.236.375	17.660,20	$ 680.705.802	312,70	$ 11.917.935	18172,90	$ 692.623.739	20,56%
52.2	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38.113,00	$ 0,00	1.527,00	$ 58.198.551	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
53	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3	5.784,00	$ 666.660,00	$ 3.857.233.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
53.1	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3		$ 666.660,00	$ 0,00	10.014,30	$ 6.676.338.384	4.636,30	$ 3.091.655.744	43,30	$ 28.875.904	4679,60	$ 3.120.731.648	46,73%
53.2	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3		$ 666.660,00	$ 0,00	160,00	$ 106.700.800	62,00	$ 41.346.560		$ -	62,00	$ 41.346.560	38,75%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 59

CONTRATO DE OBRA No. 673 DE 2021 **CONTRATO INTERVENTORÍA** 862 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2032"".

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA **INTERVENTORIA:** CONSORCIO ECOVISIÓN- 555

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA : $ 406.847.467.386,00

SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 12 Mayo 2023 Acta de fecha CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR TOTAL	CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR) CANTIDAD	CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR) VALOR TOTAL	CANTIDADES PRESENTE ACTA CANTIDAD	CANTIDADES PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CANTIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS VALOR TOTAL	% EJECUTADO
5a	672,1	672-13		Bandilles en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1.400,00	$ 90.659,00	$ 126.952.600,00	10.626,00	$ 947.870.975	21,40	$ 4.629.631	61,00	$ 5.490.695	112,40	$ 10.122.632	1,07%
5b	672,1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	482.597,00	$ 5.200,00	$ 2.509.452.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
5b,1	673,1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 5.200,00	$ 0,00	555.478,00	$ 2.732.475.200	194.777,00	$ 1.012.640.400	1.561,00	$ 8.117.200	196338,30	$ 1.020.967.600	37,35%
5b	673,2	673-13		Material granular drenante	m3	31.800,00	$ 152.053,00	$ 7.877.400.400,00	18.852,36	$ 88.090.400	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
5b,1	673,2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152.053,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
5b,2	673,2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152.053,00	$ 0,00	42.280,23	$ 6.430.681.363	11.181,86	$ 1.700.671.058	338,00	$ 36.187.990	11419,86	$ 1.736.259.363	27,09%
5f	673,3	673-13		Material de cobertura tipo ESG	m3		$ 152.053,00	$ 0,00	1.827,20	$ 277.815.559	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
5a	674,2	674-13		Drain horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	21.300,00	$ 153.000,00	$ 3.202.550.000,00	22.839,30	$ 3.394.345.939	6.666,90	$ 1.044.135.000	42,20	$ 6.339.000	7553,10	$ 1.050.465.009	33,05%
5b	681,1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	5.157,00	$ 173.604,00	$ 895.922.920,00	6.230,00	$ 1.083.766.729	5.415,60	$ 941.754.503	670,60	$ 116.632.632	5382,10	$ 1.058.387.135	97,66%
Subtotal						1.200,00	$ 255.850,00	$ 202.380.200,00	1.750,00	$ 465.312.799	1.748,00	$ 464.780.864		$ -	1748,00	$ 464.780.864	99,89%
								$ 42.828.396.481,00		$ 102.737.116.912,00		$ 23.877.774.168,00		$ 1.407.337.544,00		$ 25.085.661.912,00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
6a	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111.195,00	$ 1.794,00	$ 199.491.606,00	368.221,90	$ 947.668.589	105.221,90	$ 947.668.589		$ -	305221,90	$ 947.668.589	100,00%
6b,1	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794,00	$ 0,00	1.884.104,10	$ 3.380.092.758	771.498,10	$ 1.384.607.592		$ -	771498,10	$ 1.384.607.592	40,95%
6b,2	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794,00	$ 0,00	3.275,00	$ 5.875.350	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6f	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487,00	$ 22.076,00	$ 10.751.612,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6f,1	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076,00	$ 0,00	8.113,36	179.102.651	4.072,30	89.900.095		$ -	4072,30	$ 89.900.095	50,19%
6f,2	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076,00	$ 0,00	41,30	$ 911.643	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6g	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectivo bidireccionales	u	11.700,00	$ 5.346,00	$ 62.548.200,00	17.641,00	$ 148.397.188	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6h	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513,00	$ 389.581,00	$ 199.850.253,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6h,1	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 389.581,00	$ 0,00	577,00	$ 236.558.237	116,00	46.351.266		$ -	116,00	$ 46.351.266	20,19%
6h,2	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 389.581,00	$ 0,00	12,00	$ 4.794.972	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6k	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	471,00	$ 327.605,00	$ 154.332.426,00	593,00	$ 194.279.309	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6l	7P	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	5,00	$ 559.793,00	$ 2.799.665,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6l,1	7P	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559.793,00	$ 0,00	98,00	$ 35.102.549	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6l,2	7P	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559.793,00	$ 0,00	2,00	$ 1.119.586	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6q	720,1	720-13		Delores reciclica	m	4.340,00	$ 230.533,00	$ 979.606.340,00	7.031,20	$ 1.620.670.492	470,10	$ 105.497.242	68,00	$ 15.676.176	527,10	$ 121.513.418	7,50%
6r	730,2	730-13		Sección final	u	318,00	$ 103.163,00	$ 32.917.291,00	331,80	$ 34.166.559	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
6s	740,1	740-13		Capotaces	u	338,00	$ 22.051,00	$ 7.226.168,00	3.391,50	$ 50.262.711	186,00	$ 3.046.278		$ -	186,00	$ 3.046.278	6,06%
Subtotal								$ 1.689.046.369,00		$ 5.415.165.547,00		$ 2.179.764.892,00		$ 15.676.176,00		$ 3.162.443.968,00	
OBRAS VARIAS																	
6t	800,1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	706,00	$ 17.625,00	$ 12.450.000,00	8.308,00	$ 146.371.500	2.335,00	$ 41.473.200		$ -	2335,00	$ 41.473.200	28,30%
7G	800,2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4.332,00	$ 34.235,00	$ 148.303.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7G,1	800,2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34.235,00	$ 0,00	15.254,80	$ 521.690.998	15.229,00	$ 521.364.815		$ -	15229,00	$ 521.364.815	99,97%
7G,2	800,2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34.235,00	$ 0,00	570,00	$ 19.513.950	570,00	$ 19.513.950		$ -	570,00	$ 19.513.950	100,00%
Subtotal								$ 160.753.020,00		$ 687.321.048,00		$ 582.352.115,00		$ 0,00		$ 582.352.115,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 53

CONTRATO DE OBRA No. 575 DE 2021 — CONTRATO INTERVENTORIA 962 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - GTANCHE – CHOQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2020"".

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA — INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISIÓN- 155

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA : $ 486.917.087.369,00

SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 12 Mayo 2022 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 12 Mayo 2022 VALOR TOTAL	Acta de fecha	CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR) CANTIDAD	CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR) VALOR TOTAL	CANTIDADES PRESENTE ACTA CANTIDAD	CANTIDADES PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CANTIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS VALOR TOTAL	% EJECUTADO
TRANSPORTES																		
71	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	28.602.177,00	$ 1.100,00	$ 32.026.434.700,00	0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	
71,1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.100,00	$ 0,00	9.280.594,40	$ 9.115.242.540		1.194.902,00	$ 1.314.392.200	59.227,20	$ 65.149.320	1254129,20	$ 1.379.542.120	0,00%
71,2	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.100,00	$ 0,00	10.279,00	$ 11.305.900		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	15,13%
72	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	6.622.314,00	$ 1.100,00	$ 7.284.545.400,00	280.416,00	$ 308.457.600		280.416,00	$ 308.457.600		$ -	280416,00	$ 308.457.600	0,00%
72,1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.100,00	$ 0,00	6.573.436,00	$ 7.230.781.600		2.755.081,00	$ 3.031.089.100	19.212,80	$ 21.134.080	2775293,80	$ 3.052.223.180	100,00%
Subtotal								$ 39.442.040.100,00		$ 16.655.788.240,00			$ 4.554.530.900,00		$ 86.284.999,00		$ 4.740.822.900,00	42,20%
OBRAS NO PREVISTAS																		
73	650.3P	650-13		Transporte de estructura metálica	Kg		$ 361,00	$ 0,00	210.403,00	$ 75.955.483		55.635,00	$ 23.694.660		$ -	55635,00	$ 23.694.660	31,20%
74	650.4P	650-13		Montaje de Estructura Metálica Puente Modular	Kg		$ 3.717,00	$ 0,00	257.400,00	$ 956.755.800		112.632,50	$ 418.655.003		$ -	112632,50	$ 418.655.003	43,75%
75	720.1.2P	720-13		Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible saliente en viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye postes, separador, terminal, captafaro carta 3,81 m	m		$ 665.669,00	$ 0,00	122,40	$ 81.502.366		122,40	$ 81.502.366		$ -	122,40	$ 81.502.366	100,00%
76	720.2.1P	720-13		Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para apaltimiento, poste y separador para canal)	m		$ 752.676,00	$ 0,00	253,00	$ 188.919.000		8,10	$ 6.091.816		$ -	8,10	$ 6.091.816	3,24%
77	8.5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 624.683,00	$ 0,00	513,00	$ 320.492.540		3,00	$ 1.874.049		$ -	3,00	$ 1.874.049	0,06%
78	8.6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Tachon Sencillo Amarillo (Incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80.293,00	$ 0,00	216,00	$ 17.343.288		216,00	$ 17.343.288		$ -	216,00	$ 17.343.288	100,00%
79	8.7P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla	u		$ 107.059,00	$ 0,00	24,00	$ 2.569.392		24,00	$ 2.569.392		$ -	24,00	$ 2.569.392	100,00%
80	8.8P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80.293,00	$ 0,00	50,00	$ 4.014.650		50,00	$ 4.014.650		$ -	50,00	$ 4.014.650	100,00%
81	900.2.1P	900-13		Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición	m3/km		$ 1.410,00	$ 0,00	2.161.258,50	$ 3.047.346.435		1.753.105,70	$ 2.514.179.037		$ -	1753105,70	$ 2.514.179.037	82,50%
82	233.1	233-13		Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2		$ 12.601,00	$ 0,00	318.327,50	$ 4.011.240.928		173.605,00	$ 2.187.596.605	3.603,00	$ 49.753.203	177474,00	$ 2.236.349.974	55,75%
83	464.1.1	464-13		Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - Incluye riego de liga CRR-1	m2		$ 13.288,00	$ 0,00	116.435,00	$ 1.547.166.280		46.606,00	$ 621.958.128		$ -	46606,00	$ 621.958.128	40,20%
84	672,4	672-13		Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo.	m		$ 77.169,00	$ 0,00	2.899,00	$ 231.158.324		1.461,50	$ 114.325.074		$ -	1461,50	$ 114.325.074	49,45%
85	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre diez metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		$ 1.057,00	$ 0,00	399.331,70	$ 422.093.037		266.763,10	$ 303.108.597		$ -	266763,10	$ 303.108.597	71,81%
86	662.2P	662-13		Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).	m		$ 1.095.470,00	$ 0,00	168,00	$ 184.042.560		136,50	$ 150.380.643		$ -	136,50	$ 150.380.643	81,48%
87	SP	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 0.75m con lámina retroreflectiva tipo III (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizado calibre 16 y retroreflectiva Tipo XI).	u		$ 1.299.826,00	$ 0,00	152,00	$ 197.423.072		57,00	$ 74.033.652		$ -	57,00	$ 74.033.652	37,50%
Subtotal								$ 0,00		$ 11.267.662.096,00			$ 6.621.327.051,00		$ 49.753.203,00		$ 6.579.060.833,00	
Ajuste al peso										$ 1,00			-0,00				-0,00	
SUBTOTAL OBRAS								$ 365.188.934.013,00		$ 344.570.723.264,00			$ 128.450.176.668,00		$ 3.379.193.503,00		$ 142.829.369.172,00	

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 365.188.934.013,00	$ 344.570.723.264	$ 128.450.176.668	$ 3.379.193.503	$ 142.829.369.172	41,45%
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 41.440.686.941,00	$ 45.484.160.571	$ 36.736.544.374	$ 3.293.512.046	$ 36.929.706.226	85,61%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000	$ -	$ -	$ -	0,00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.281.000.000,00	$ 1.281.000.000	$ 1.266.677.969		$ 1.266.677.969	98,88%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$ -	$ 3.764.795.515	$ 3.169.217.014	$ 72.997.059	$ 3.242.214.073	86,12%
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 7.772.794.611,00	$ 7.772.794.611	$ 3.584.739.370		$ 3.584.739.370	46,12%
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 340.000.000,00	$ 340.000.000	$ 1.985.429		$ 1.985.429	0,58%

RESIDENTE DE OBRA
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ECOVISION -155

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
201.7	Demolición de Estructuras	m3	25,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PROFUND. (m)	CANTIDAD	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
1	23+926,00	23+926,00	6006	7,20	2,40	1,45		25,06	25,00	Demolicion ciclopeo estribo ponton antiguo
1	50+855,00	50+855,00	6007	3,00	0,50	0,30		0,45	0,00	Demolición cabezote existente

TOTAL	25,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	25,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	25,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	25,00
201.7	Demolición de Estructuras	m3		









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	7398,30
210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA - SECCIÓN TRANSVERSAL m2	ANCHO (m) (B)	ALTURA (m) (C)	VOLUMEN - SECCIÓN m3 (D=A*B*C)	TOTAL Redondeado especificacion INV 21.6	OBSERVACIONES
1	22+720,00	22+730,00	6006	10,00	0,75			12,81	2,60	Liquidación Movimiento de tierras. Avance del 20% este mes para un avance total acumulado de 100%
1	22+730,00	22+740,00	6006	10,00	3,17			19,64	3,90	
1	23+910,00	23+920,00	6006	10,00	0,47			3,57	1,10	Liquidación Movimiento de tierras. Avance del 30% este mes para un avance total acumulado de 100%
1	23+920,00	23+930,00	6006	10,00	0,55			5,03	1,50	
1	23+930,00	23+940,00	6006	10,00	0,98			7,58	2,30	
1	23+940,00	23+950,00	6006	10,00	0,45			7,11	2,10	
1	24+150,00	24+160,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	Retiro de material de subrasante no competente para garantizar ancho de vía
1	24+160,00	24+170,00	6006	10,00	11,75			61,58	61,60	
1	24+170,00	24+180,00	6006	10,00	12,60			124,58	124,60	
1	24+180,00	24+190,00	6006	10,00	17,72			151,21	151,20	
1	24+190,00	24+200,00	6006	10,00	9,26			135,14	135,10	
1	24+200,00	24+210,00	6006	10,00	8,09			88,03	88,00	
1	24+210,00	24+220,00	6006	10,00	9,46			89,11	89,10	
1	24+220,00	24+230,00	6006	10,00	10,05			98,71	98,70	
1	24+230,00	24+240,00	6006	10,00	12,34			113,28	113,30	
1	24+240,00	24+250,00	6006	10,00	10,38			115,38	115,40	
1	24+250,00	24+260,00	6006	10,00	8,62			97,80	97,80	
1	24+260,00	24+270,00	6006	10,00	6,68			79,32	79,30	
1	24+270,00	24+280,00	6006	10,00	6,59			69,20	69,20	
1	24+280,00	24+290,00	6006	10,00	5,88			65,18	65,20	
1	24+290,00	24+300,00	6006	10,00	3,45			50,54	50,50	
1	24+490,00	24+500,00	6006	10,00	25,69			170,05	170,10	Retiro de material de subrasante no competente para garantizar ancho de vía
1	24+500,00	24+510,00	6006	10,00	71,30			484,95	485,00	
1	24+510,00	24+520,00	6006	10,00	49,44			603,70	603,70	
1	24+520,00	24+530,00	6006	10,00	34,93			421,85	421,90	
1	24+530,00	24+540,00	6006	10,00	7,87			214,00	214,00	
1	24+540,00	24+550,00	6006	10,00	6,63			72,50	72,50	
1	24+550,00	24+560,00	6006	10,00	3,05			48,40	48,40	
1	24+560,00	24+570,00	6006	10,00	7,36			52,05	52,10	
1	24+570,00	24+580,00	6006	10,00	4,70			60,30	60,30	
1	24+580,00	24+590,00	6006	10,00	3,95			43,25	43,30	
1	24+590,00	24+600,00	6006	10,00	3,57			37,60	37,60	
1	24+600,00	24+610,00	6006	10,00	0,00			17,85	17,90	
1	24+610,00	24+620,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	
1	24+620,00	24+630,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	
1	24+630,00	24+640,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	
1	24+640,00	24+650,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	
1	24+650,00	24+660,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	
1	24+660,00	24+670,00	6006	10,00	6,66			33,30	33,30	
1	24+670,00	24+680,00	6006	10,00	6,62			66,40	66,40	
1	24+680,00	24+690,00	6006	10,00	10,92			87,70	87,70	
1	24+690,00	24+700,00	6006	10,00	6,59			87,55	87,60	
1	24+700,00	24+710,00	6006	10,00	0,00			32,95	33,00	
1	24+710,00	24+720,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	
1	24+720,00	24+730,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	
1	24+730,00	24+740,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	
1	24+740,00	24+750,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	
1	24+750,00	24+760,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	
1	24+760,00	24+770,00	6006	10,00	8,15			40,75	40,80	
1	24+770,00	24+780,00	6006	10,00	9,49			88,20	88,20	
1	24+780,00	24+790,00	6006	10,00	14,27			118,80	118,80	
1	24+790,00	24+800,00	6006	10,00	13,85			140,60	140,60	
1	24+800,00	24+810,00	6006	10,00	18,36			161,06	161,10	
1	24+810,00	24+820,00	6006	10,00	18,14			182,50	182,50	
1	24+820,00	24+830,00	6006	10,00	17,26			177,01	177,00	
1	24+830,00	24+840,00	6006	10,00	17,22			172,40	172,40	
1	24+840,00	24+850,00	6006	10,00	15,89			165,57	165,60	
1	24+850,00	24+860,00	6006	10,00	15,37			156,31	156,30	
1	24+860,00	24+870,00	6006	10,00	12,83			141,01	141,00	
1	24+870,00	24+880,00	6006	10,00	13,55			131,93	131,90	
1	24+880,00	24+890,00	6006	10,00	11,47			125,12	125,10	
1	24+890,00	24+900,00	6006	10,00	12,37			119,23	119,20	
1	24+900,00	24+910,00	6006	10,00	11,66			120,17	120,20	
1	24+910,00	24+920,00	6006	10,00	11,57			116,15	116,20	
1	24+920,00	24+930,00	6006	10,00	10,61			110,92	110,90	
1	24+930,00	24+940,00	6006	10,00	11,63			111,23	111,20	
1	24+940,00	24+950,00	6006	10,00	12,75			121,90	121,90	

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	7398,30
210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA - SECCIÓN TRANSVERSAL m2	ANCHO (m) (B)	ALTURA (m) (C)	VOLUMEN - SECCIÓN m3 (D=A*B*C)	TOTAL Redondeado especificacion INV 21.6	OBSERVACIONES
1	24+950,00	24+960,00	6006	10,00	11,43			120,90	120,90	
1	24+460,00	24+540,00	6006					-696,90	-696,90	Descuento liquidación por topografía. Cantidad cobrada en acta N°47
2	24+780,00	24+960,00	6006					-829,00	-829,00	Descuento liquidación por topografía. Cantidad cobrada en acta N°48
1	25+010,00	25+020,00	6006	10,00	0,00			0,00	0,00	
1	25+020,00	25+030,00	6006	10,00	10,64			51,39	51,40	
1	25+030,00	25+040,00	6006	10,00	7,96			89,76	89,80	
1	25+040,00	25+050,00	6006	10,00	7,12			72,75	72,80	
1	25+050,00	25+060,00	6006	10,00	5,60			62,13	62,10	
1	25+060,00	25+070,00	6006	10,00	8,19			68,95	69,00	
1	25+070,00	25+080,00	6006	10,00	8,25			82,17	82,20	
1	25+080,00	25+090,00	6006	10,00	13,04			106,45	106,50	
1	25+090,00	25+100,00	6006	10,00	13,42			132,33	132,30	
1	25+100,00	25+110,00	6006	10,00	12,50			129,61	129,60	
1	25+110,00	25+120,00	6006	10,00	9,08			107,87	107,90	
1	25+120,00	25+130,00	6006	10,00	10,37			97,24	97,20	Retiro de material de subrasante no competente para garantizar ancho de vía
1	25+130,00	25+140,00	6006	10,00	7,13			87,53	87,50	
1	25+140,00	25+150,00	6006	10,00	6,46			67,96	68,00	
1	25+150,00	25+160,00	6006	10,00	7,67			70,65	70,70	
1	25+160,00	25+170,00	6006	10,00	10,86			92,68	92,70	
1	25+170,00	25+180,00	6006	10,00	9,01			99,36	99,40	
1	25+180,00	25+190,00	6006	10,00	13,40			112,03	112,00	
1	25+190,00	25+200,00	6006	10,00	20,71			170,55	170,60	
1	25+200,00	25+210,00	6006	10,00	25,26			229,85	229,90	
1	25+210,00	25+220,00	6006	10,00	15,96			206,10	206,10	
1	25+220,00	25+230,00	6006	10,00	13,07			145,15	145,20	
1	25+230,00	25+240,00	6006	10,00	13,37			132,20	132,20	

TOTAL	7398,3
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	7398,3
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	7398,3

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	7398,30
210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		












RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA


22+640.00

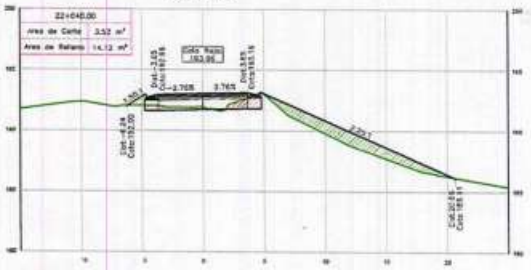


22+670.00

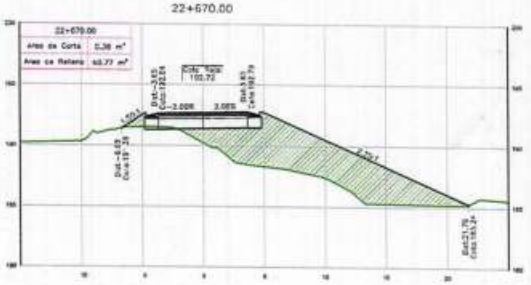


22+700.00

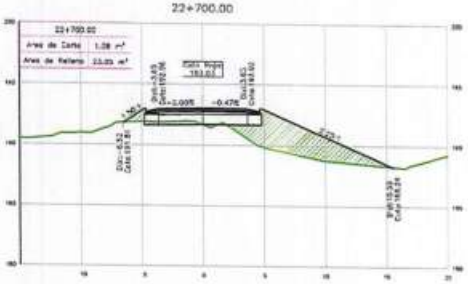


22+650.00

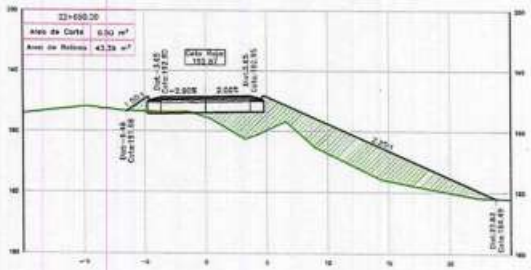


22+680.00

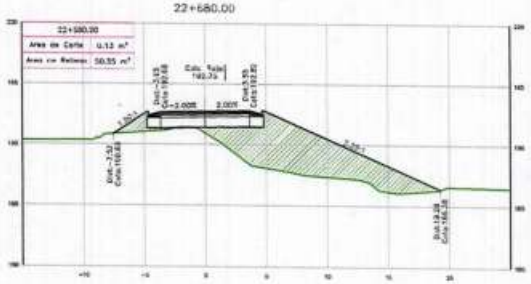


22+710.00



22+660.00

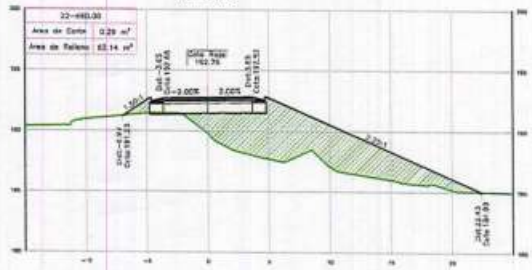

22+690.00

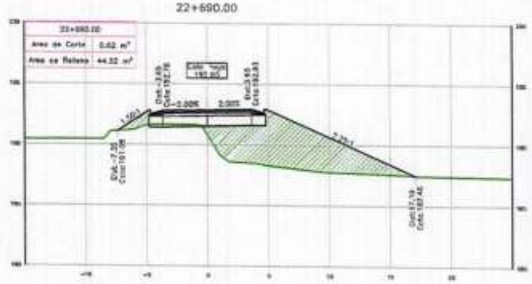

22+720.00



MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUENTE BOYACA – STANDAC – CHIQUINQUIRA – PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAPÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2020" MODULO 3".

DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6906


SECCION TRANSVERSAL - MEJORAMIENTO

PR22+640 A PR23+720

SUDINCO

O.F.R. SAS Consultores

014

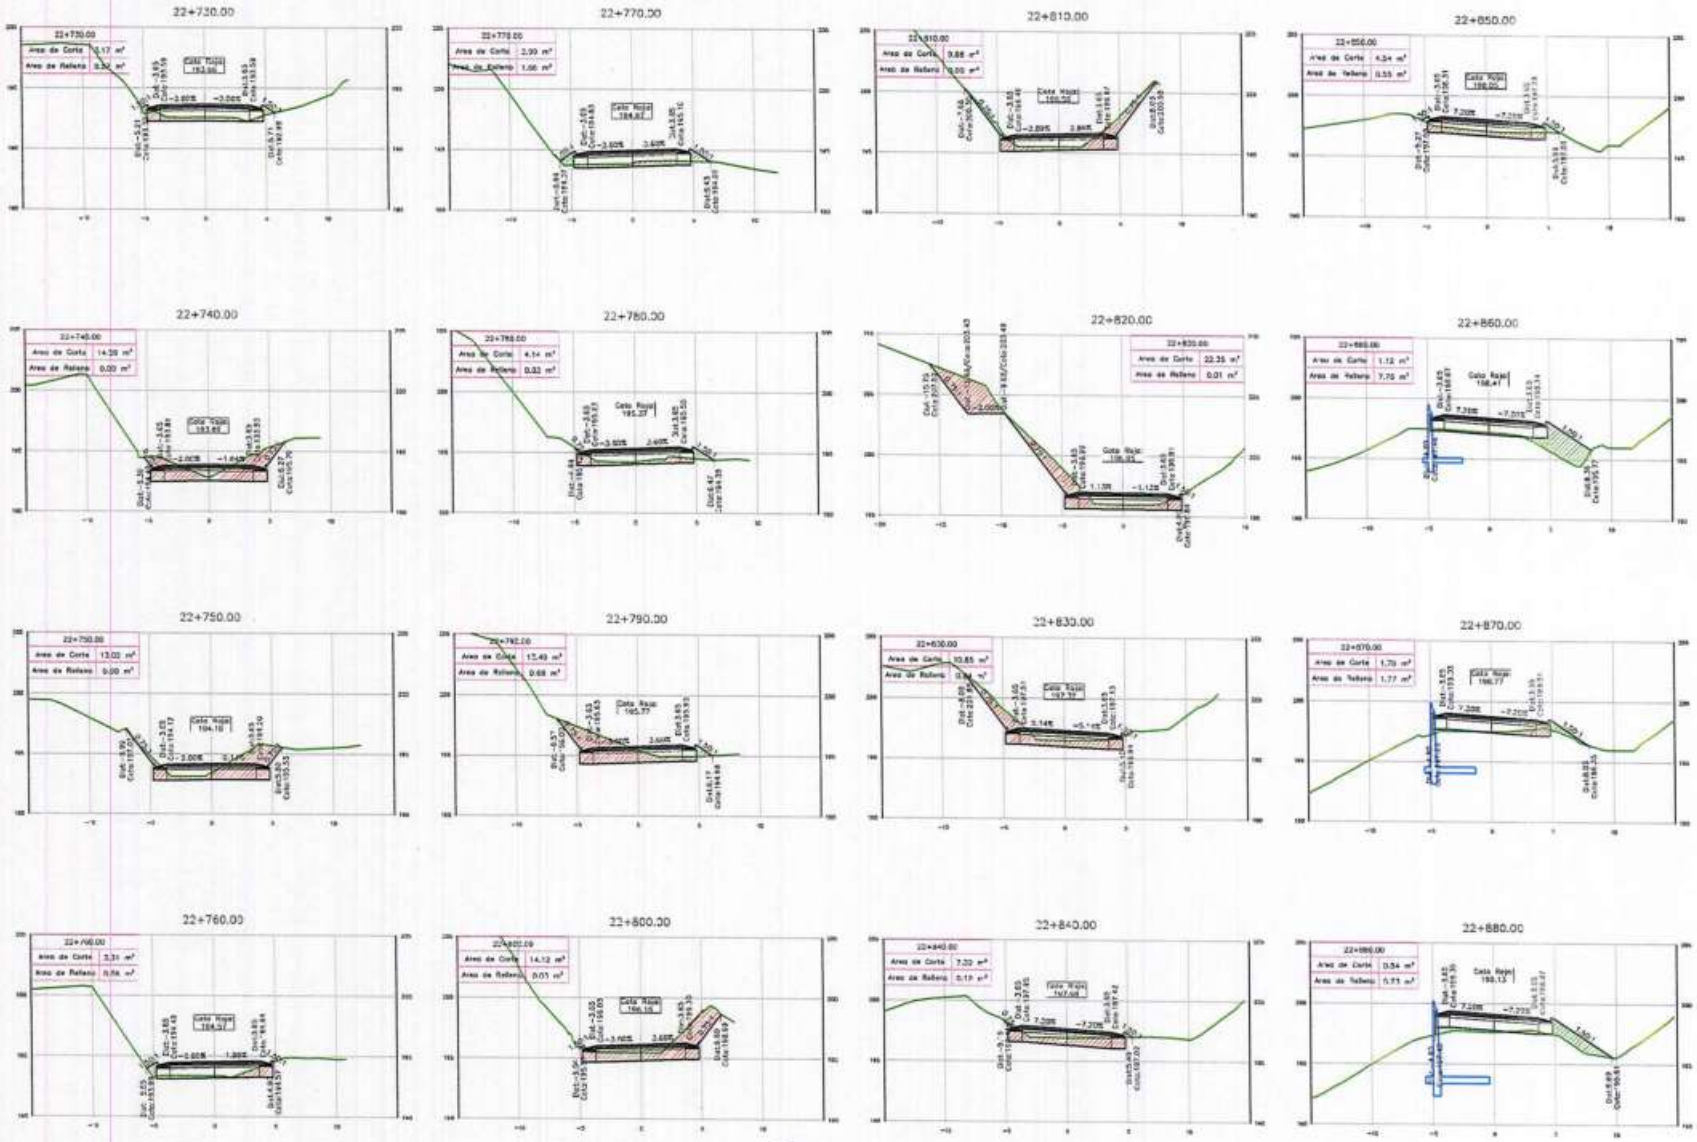


MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ – OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ – PAIPA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VIGENCIA 2020" MÓDULO 3".

DISEÑO GEOMETRICO RUTA 5006
SECCIÓN TRANSVERSAL - MEJORAMIENTO
PR22+730 A PR22+880

SUDINCO

O.F.S. SAS
Consultores

215

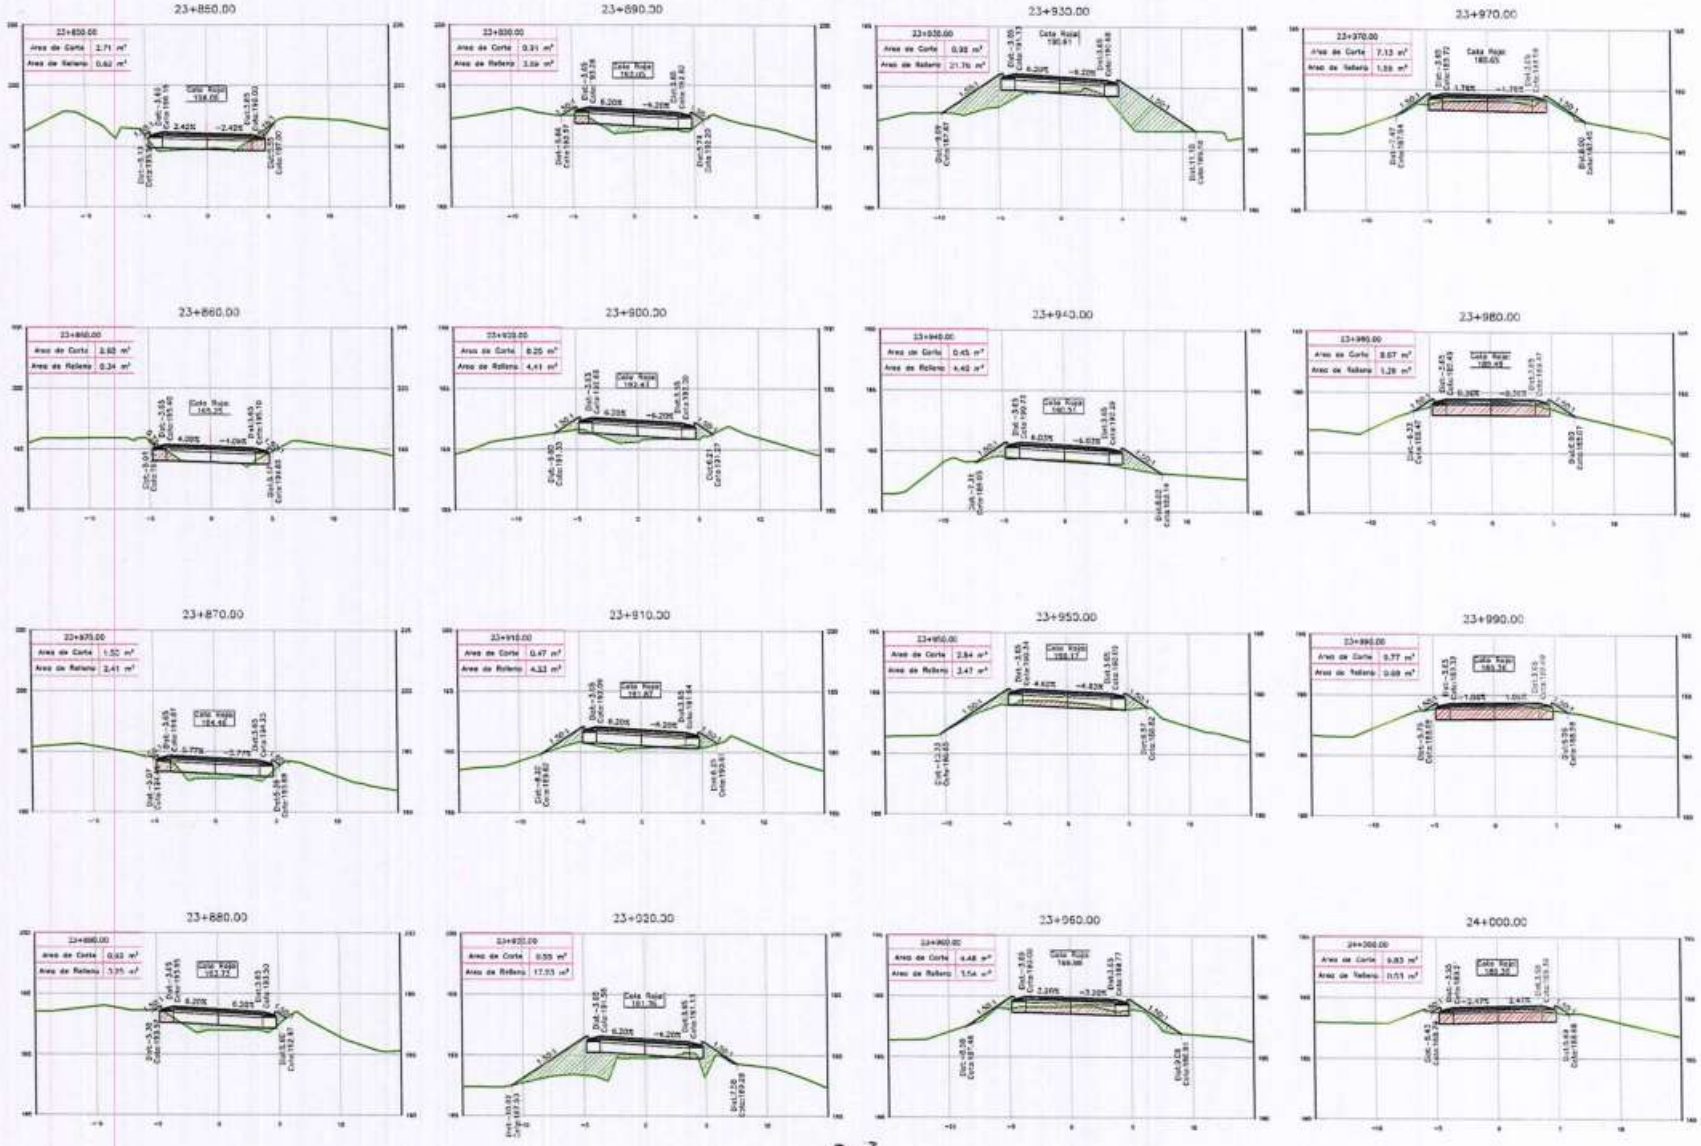

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ – TUNCHE – CHIQUINQUIRÁ – PAIPA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN APOYO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3".


DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6006
SECCION TRANSVERSAL – MEJORAMIENTO
PR23+850 A PR24+000

SUDINCO


D.F.S. SAS Consultores

022


24+150.00

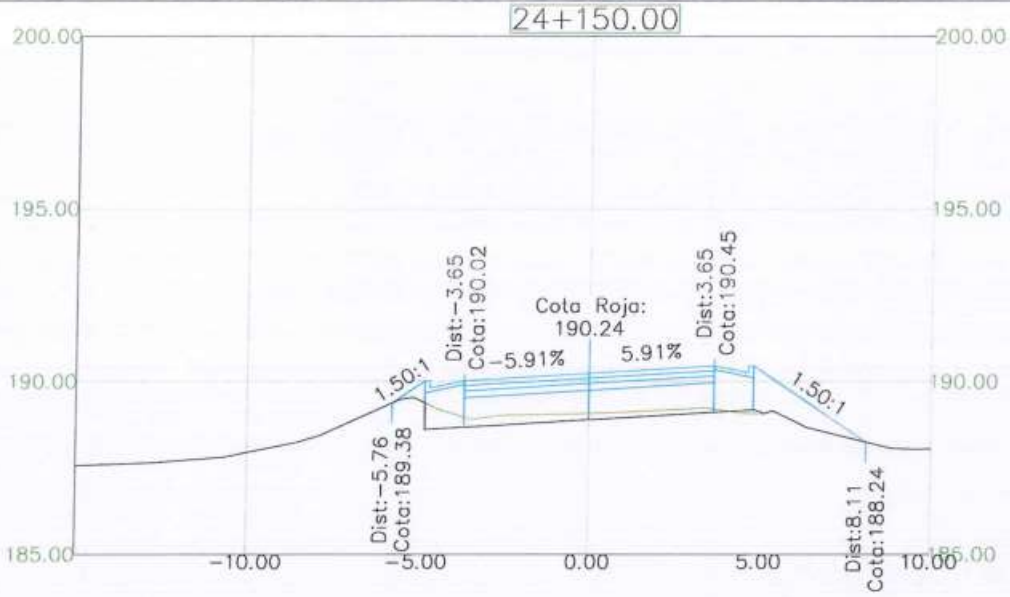

24+160.00

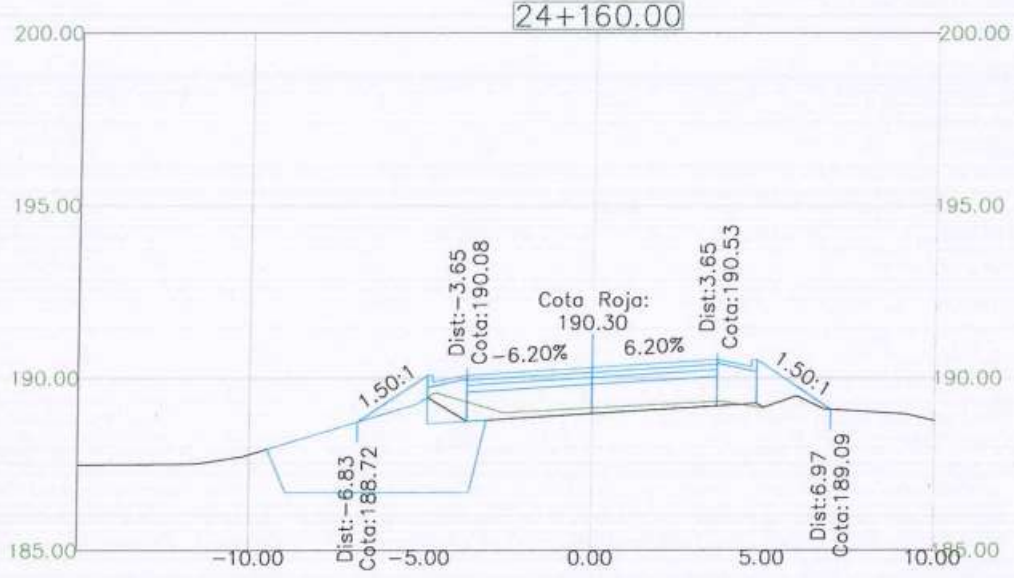


24+170.00

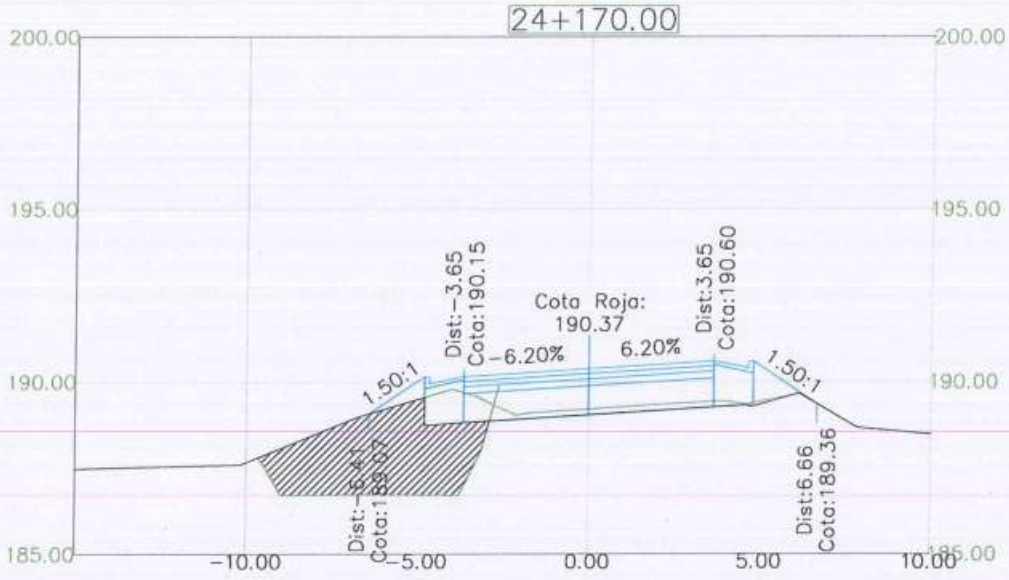


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


24+180.00

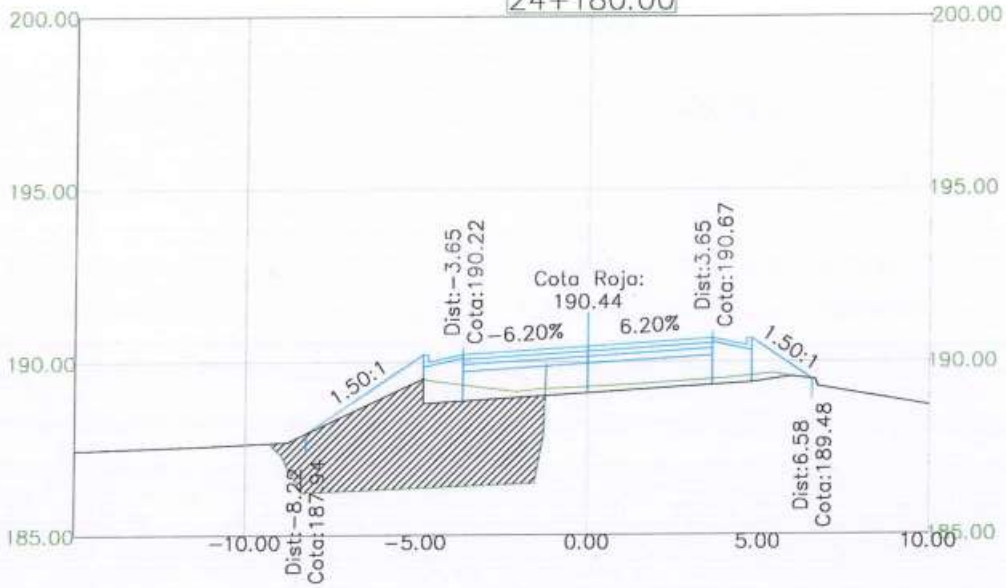

24+190.00

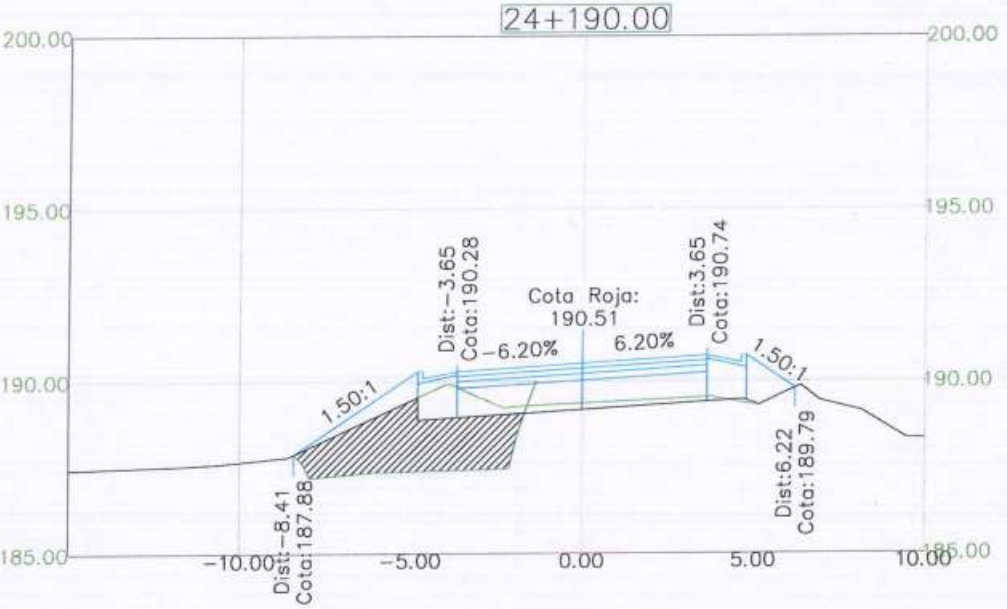

24+200.00

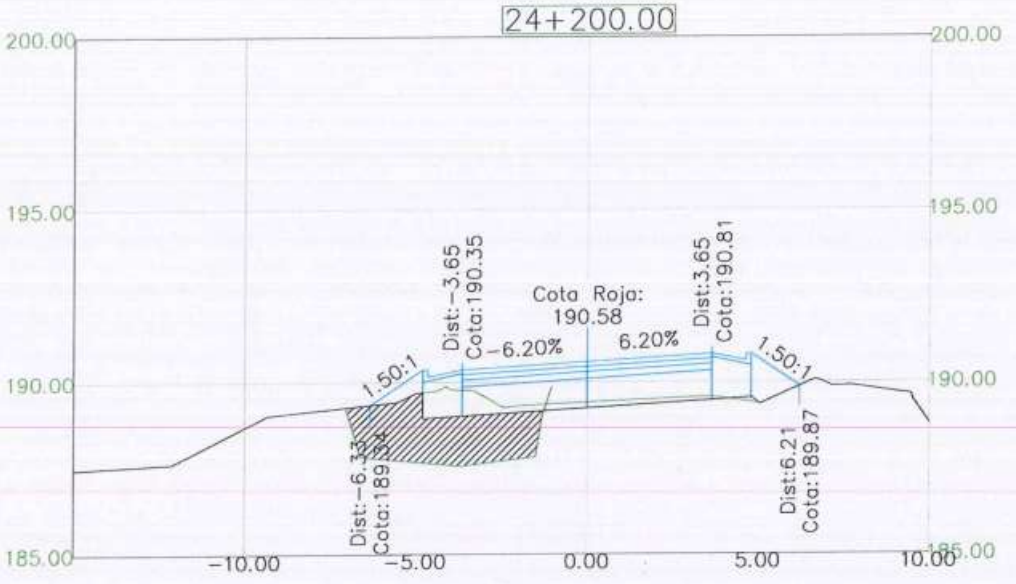


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE BAJA


2 - 30

18-07-2023


24+210.00

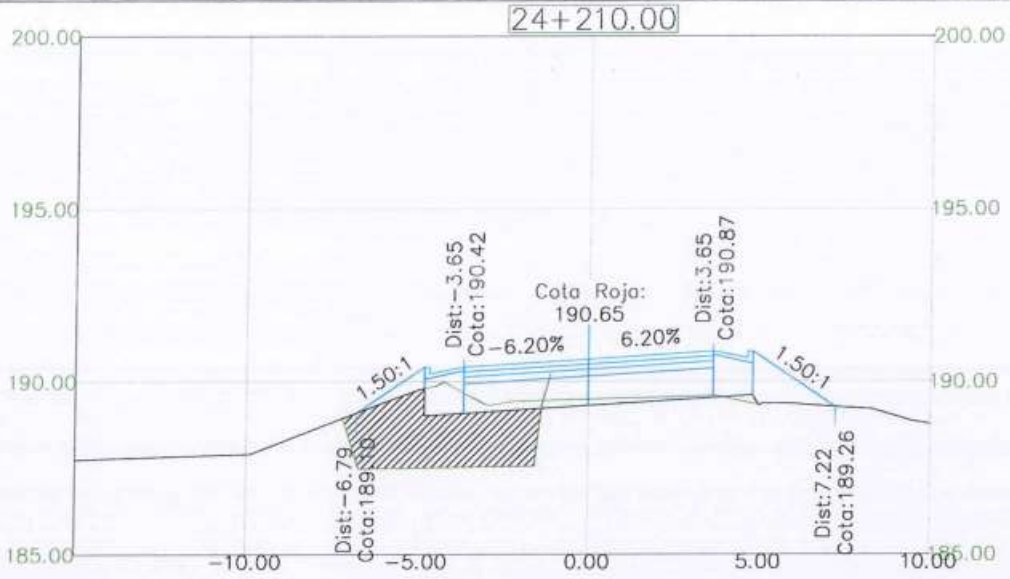

24+220.00

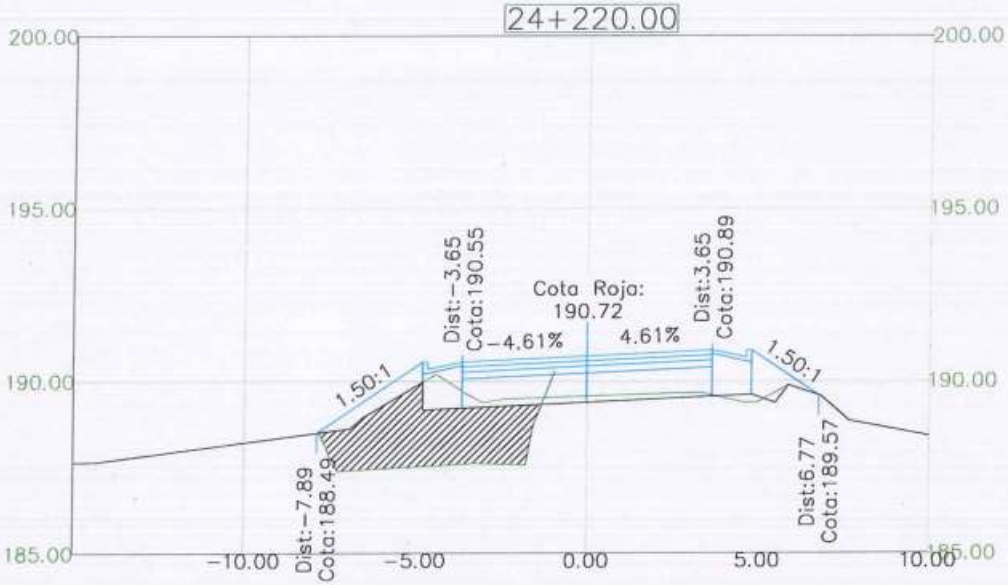

24+230.00

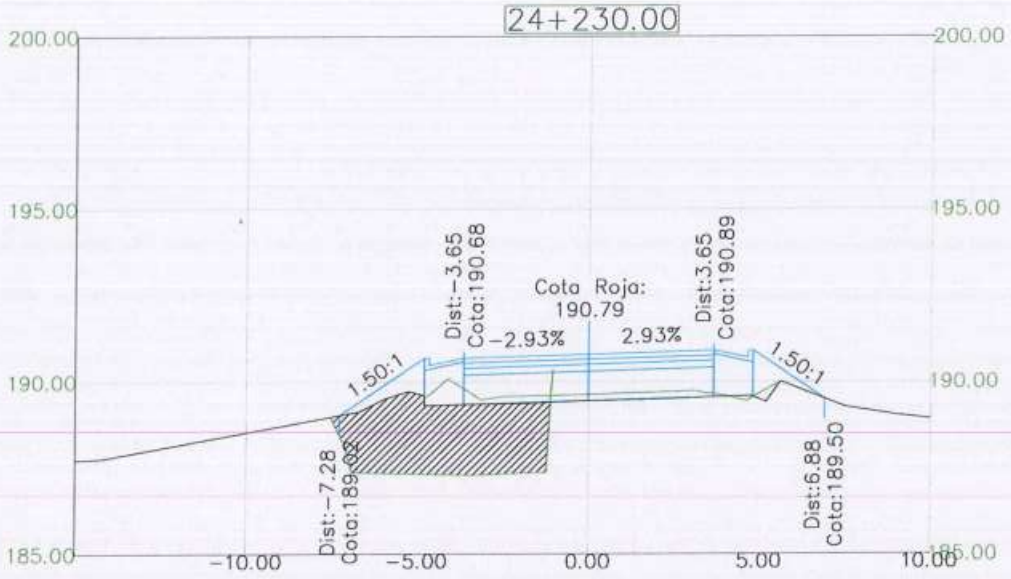


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE BAJA


3 -30

18-07-2025


24+240.00

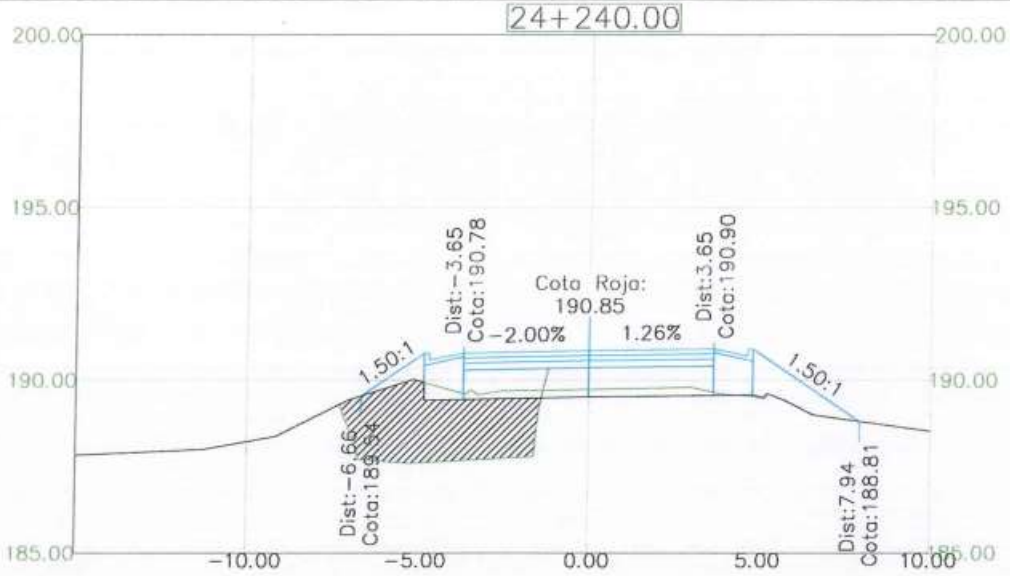

24+250.00

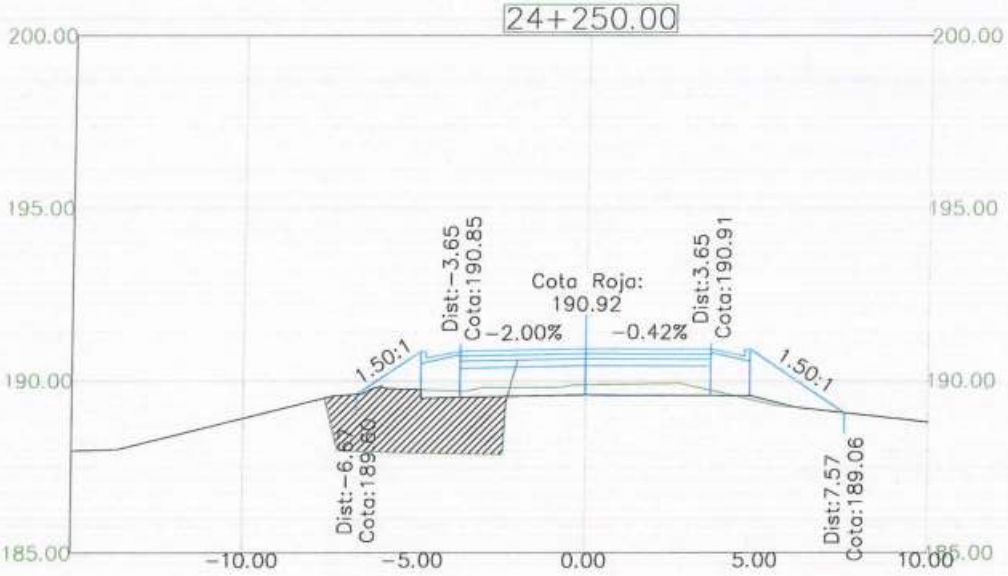

24+260.00

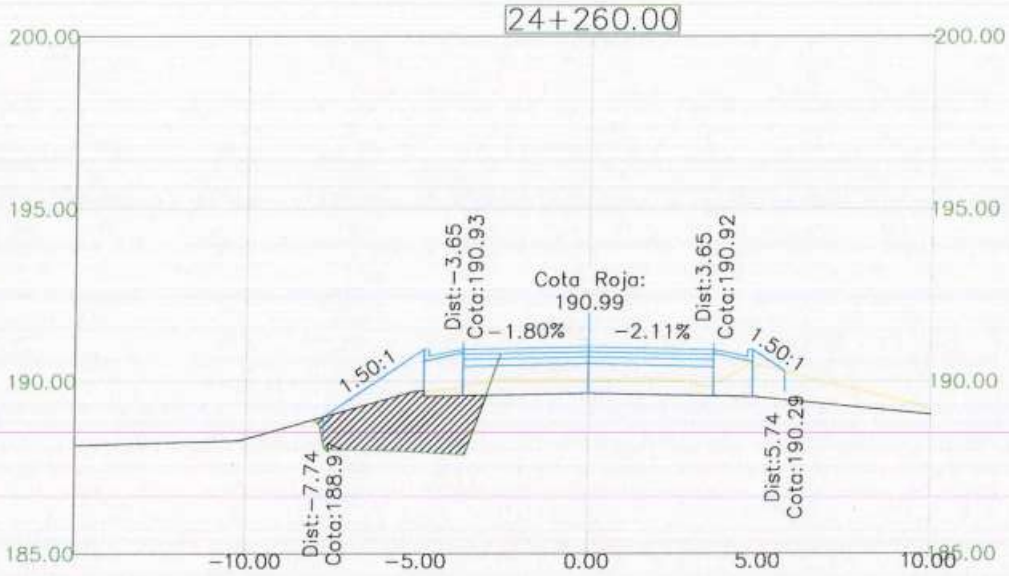


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


4 -30

18-07-2025


24+270.00

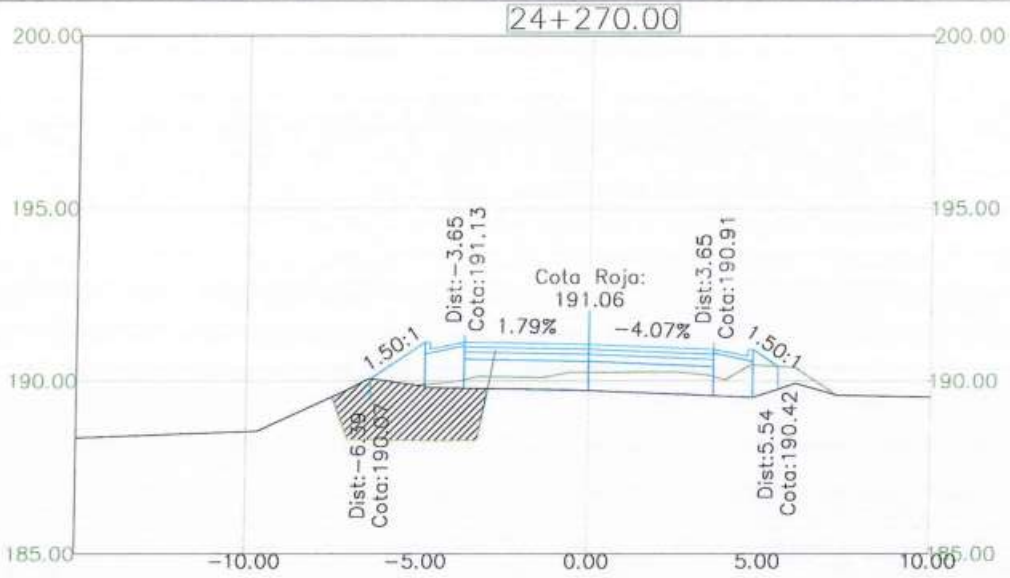


24+280.00

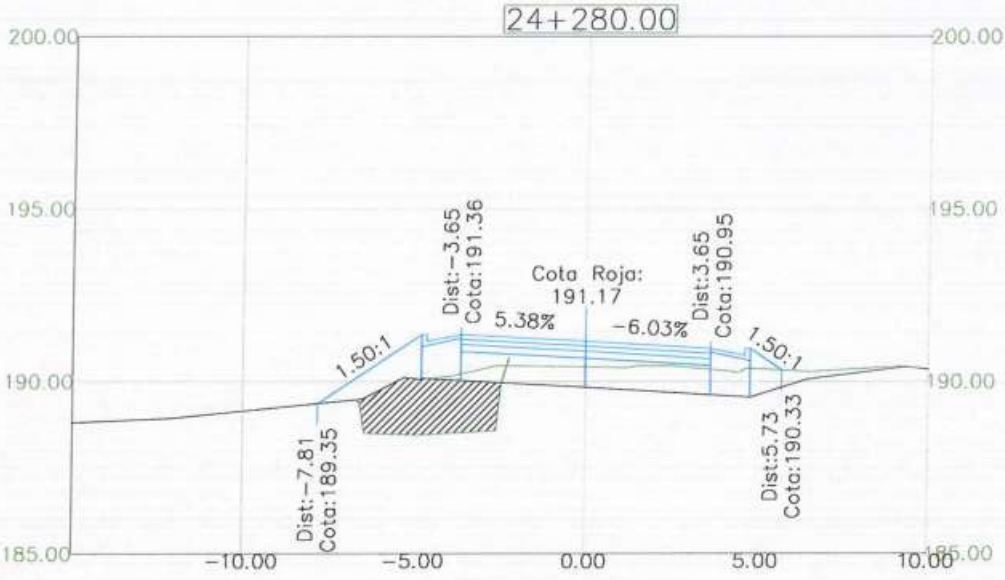


24+290.00

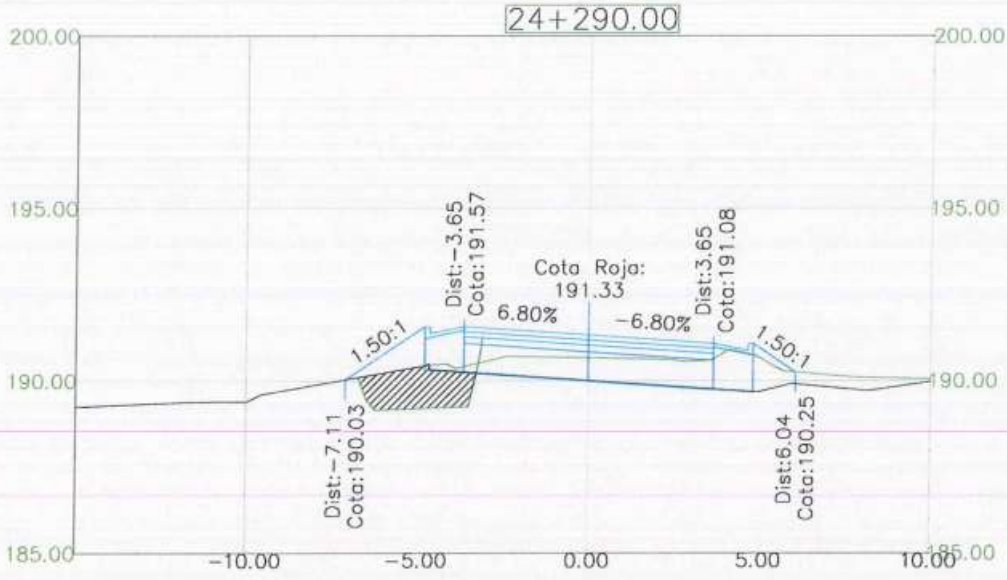

24+490.00

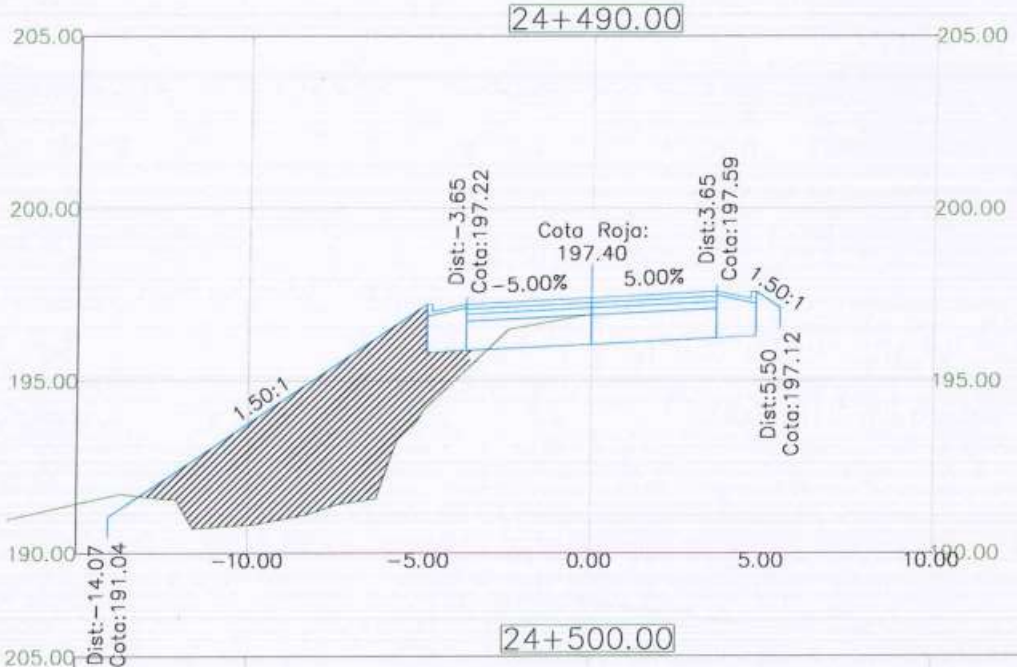

24+500.00

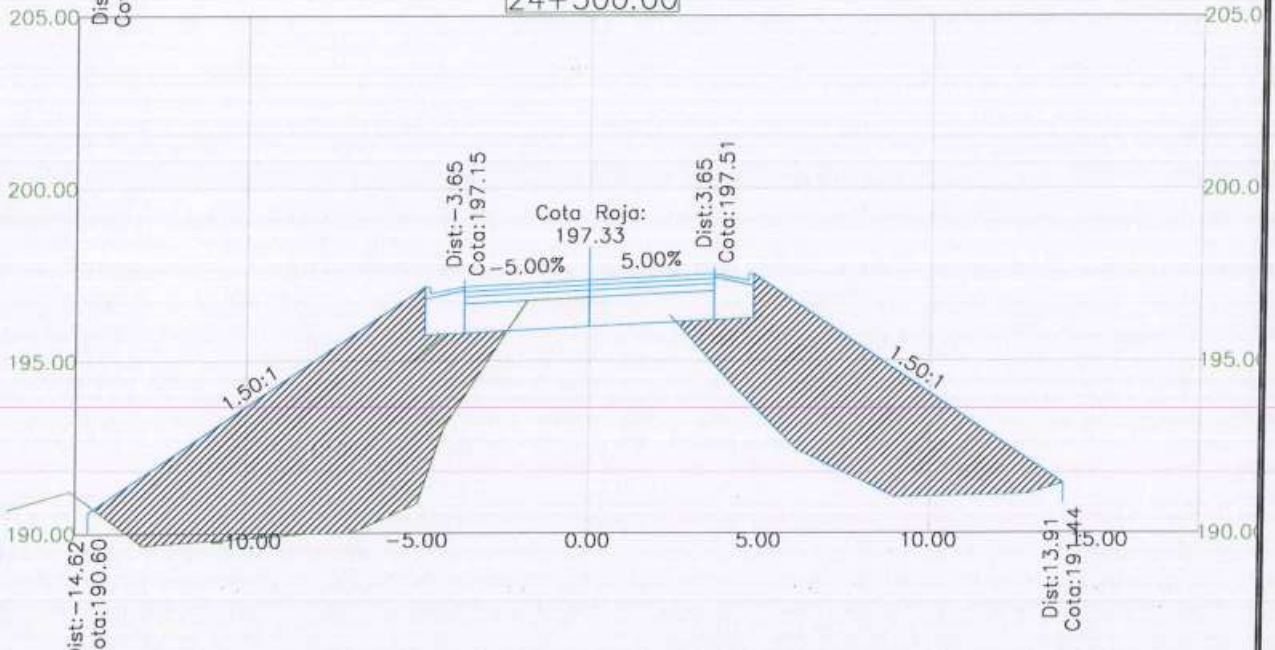


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE BAJA


6 - 30

18-07-2025


24+510.00

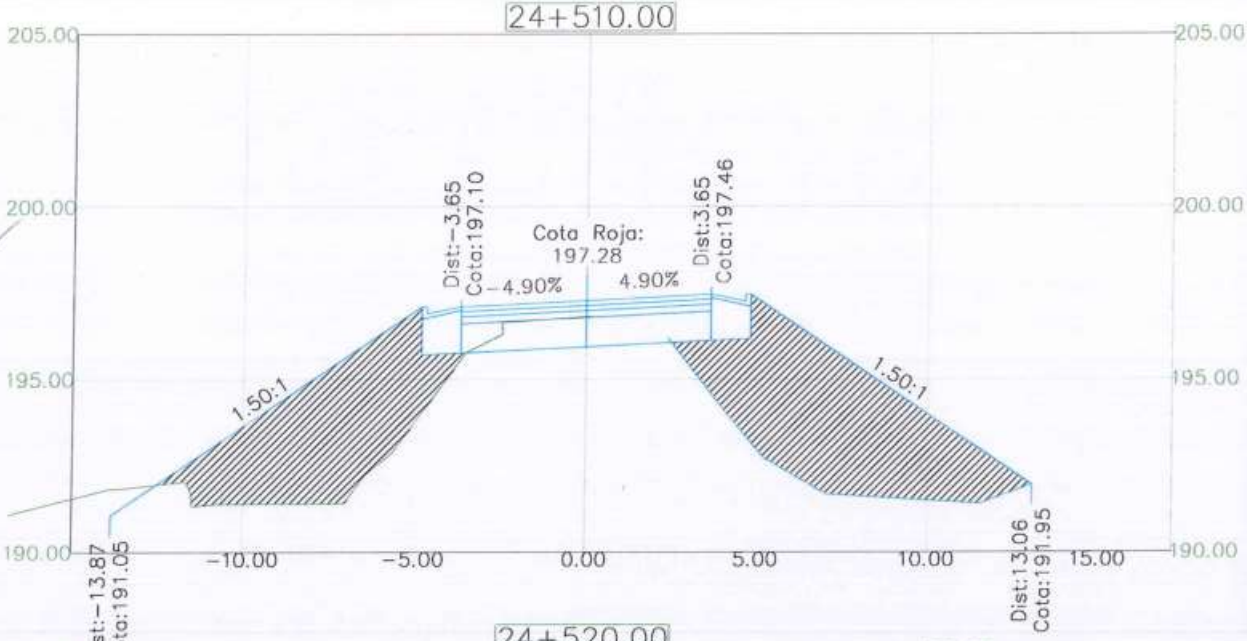

24+520.00

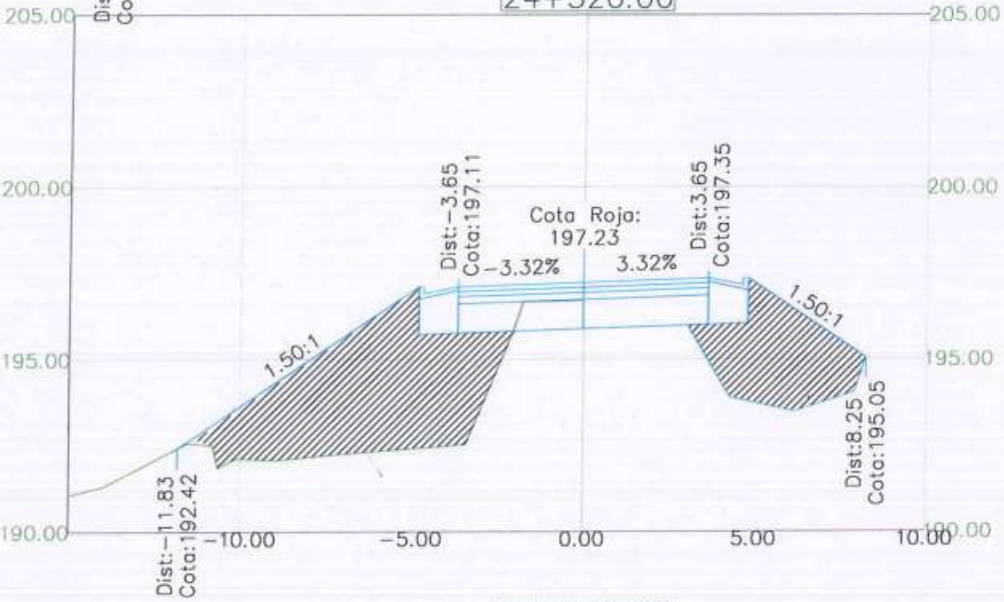

24+530.00

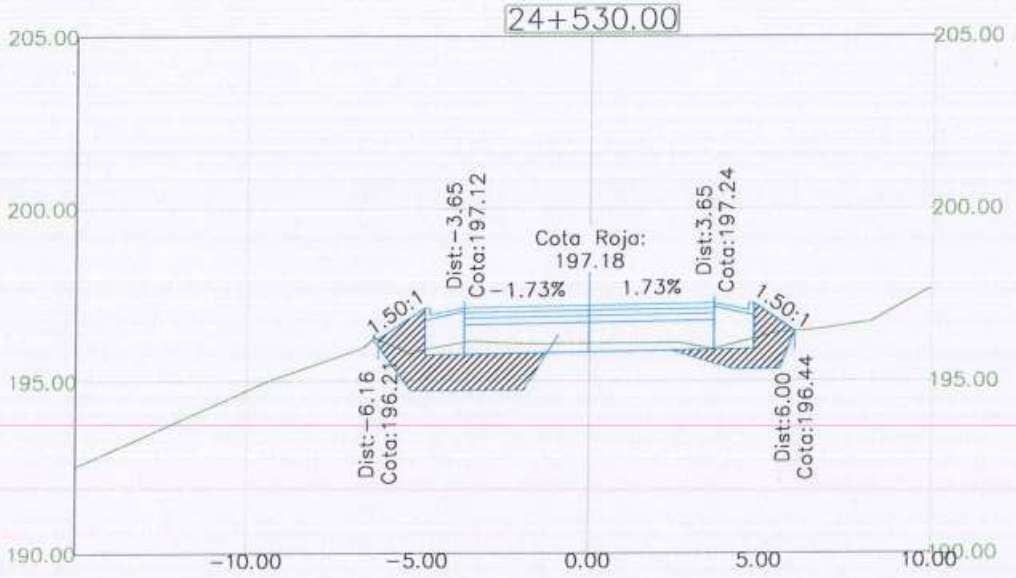


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


7 - 30

18-07-2025


24+540.00

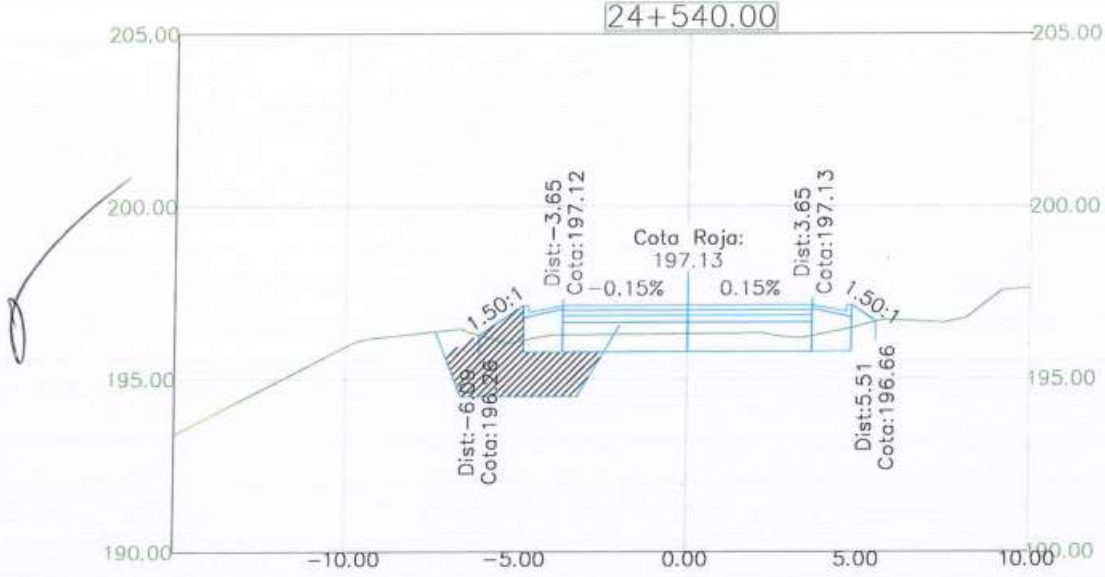



24+550.00

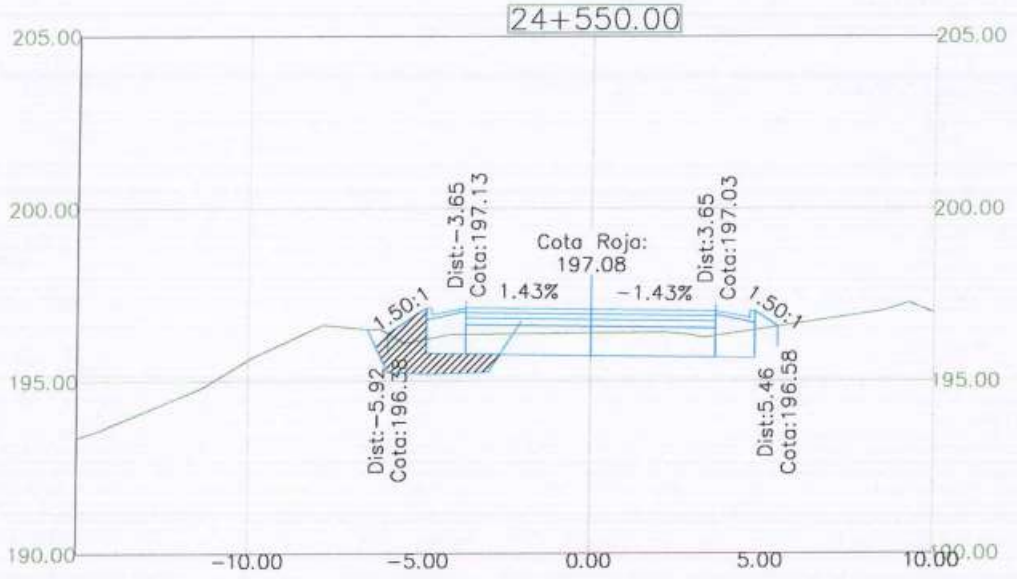


24+560.00

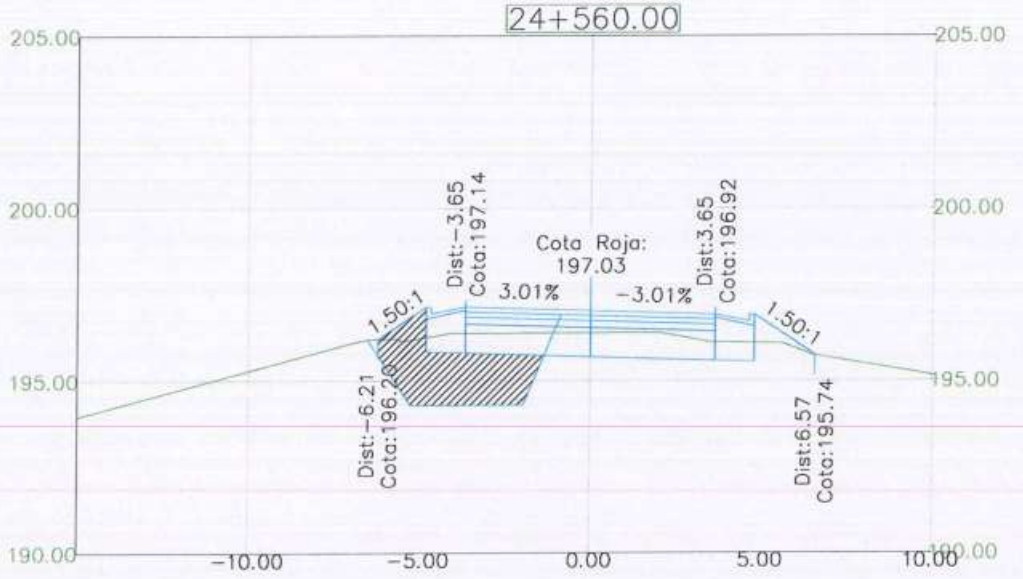

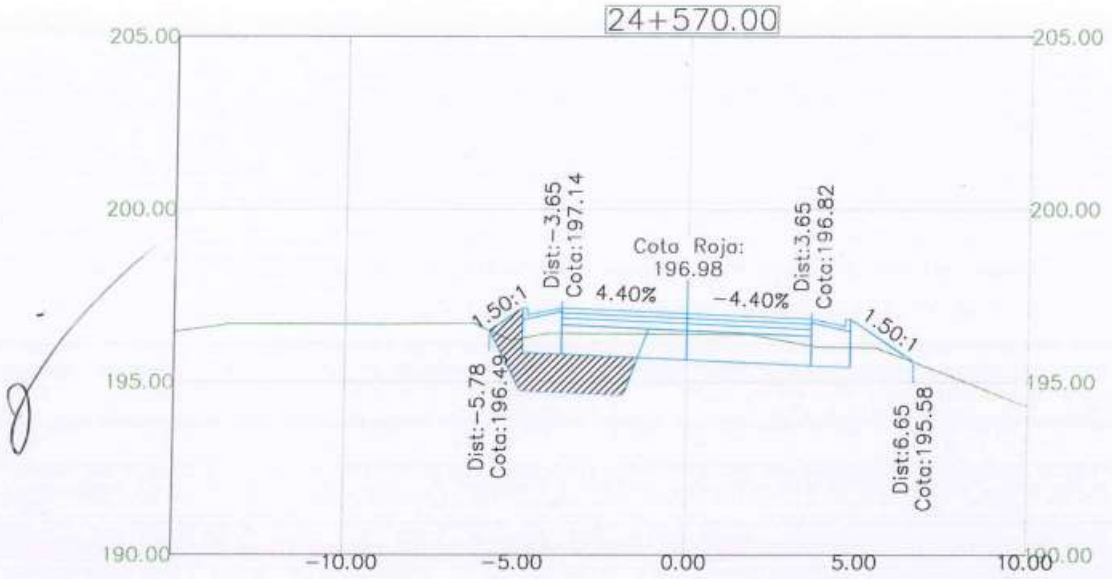

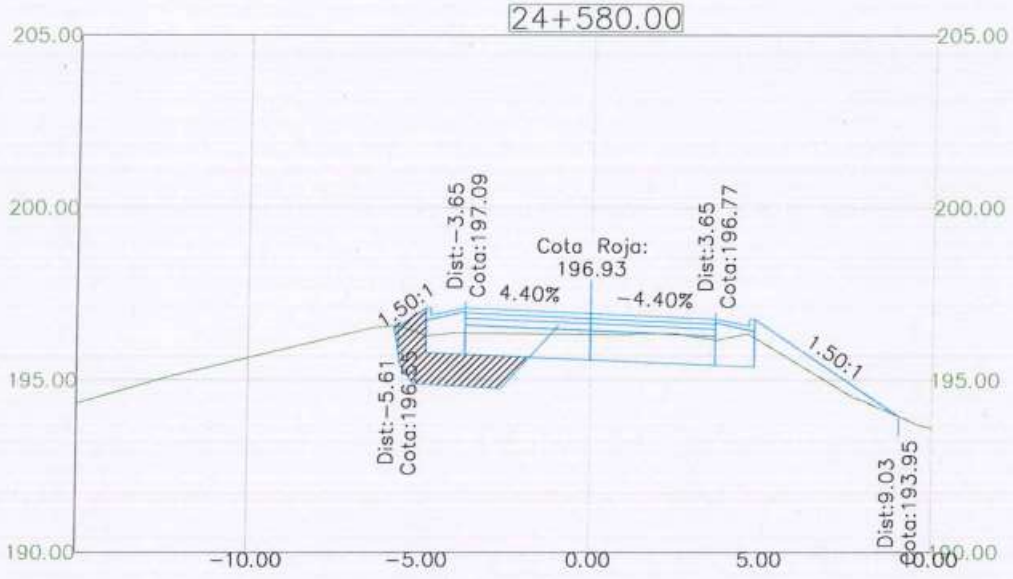

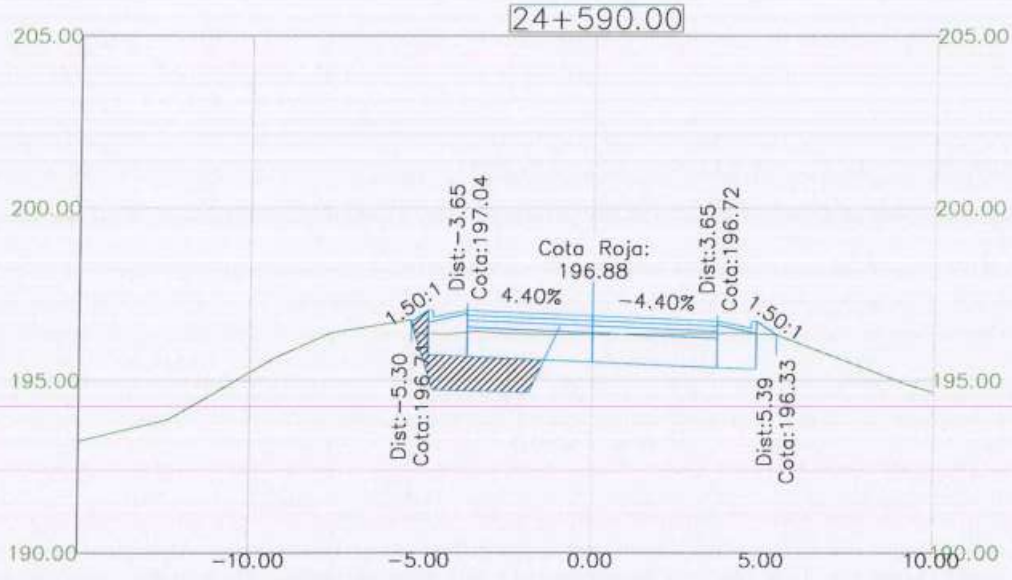


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


9 -30

18-07-2025


24+630.00

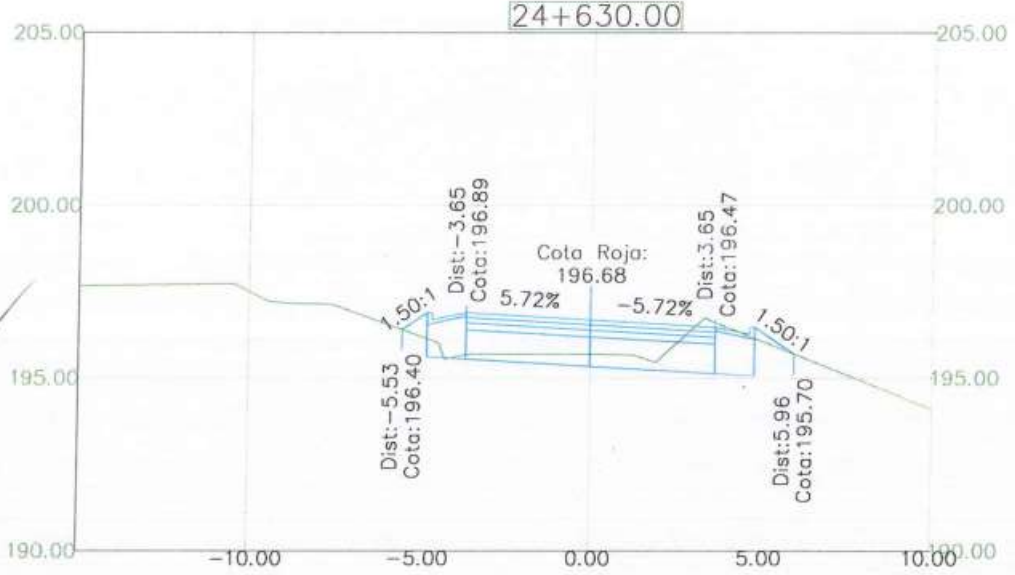

24+640.00

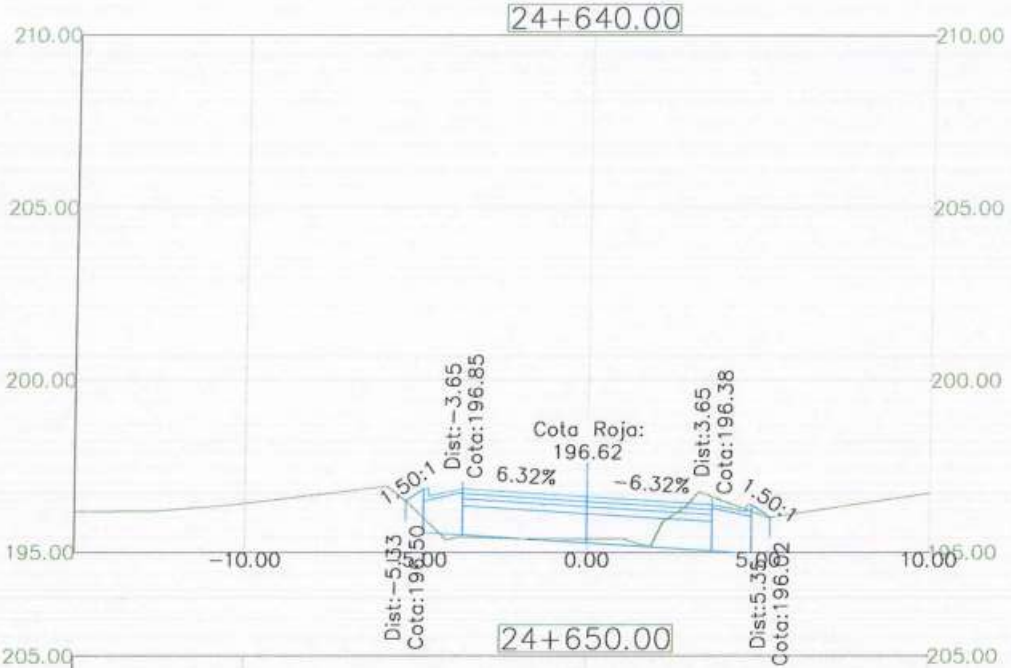

24+650.00

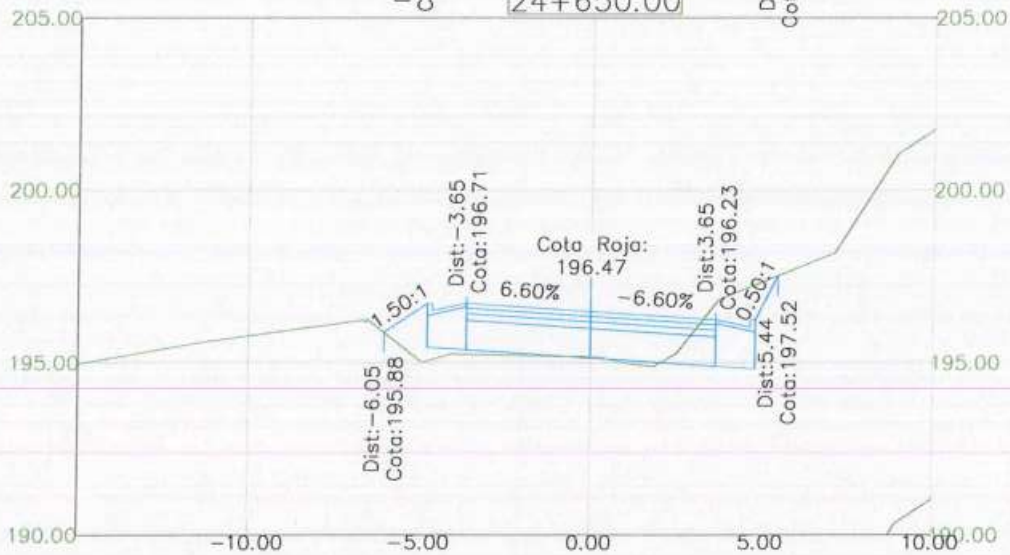


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
SOBRELAVA


11 -30

18-07-2025


24+660.00

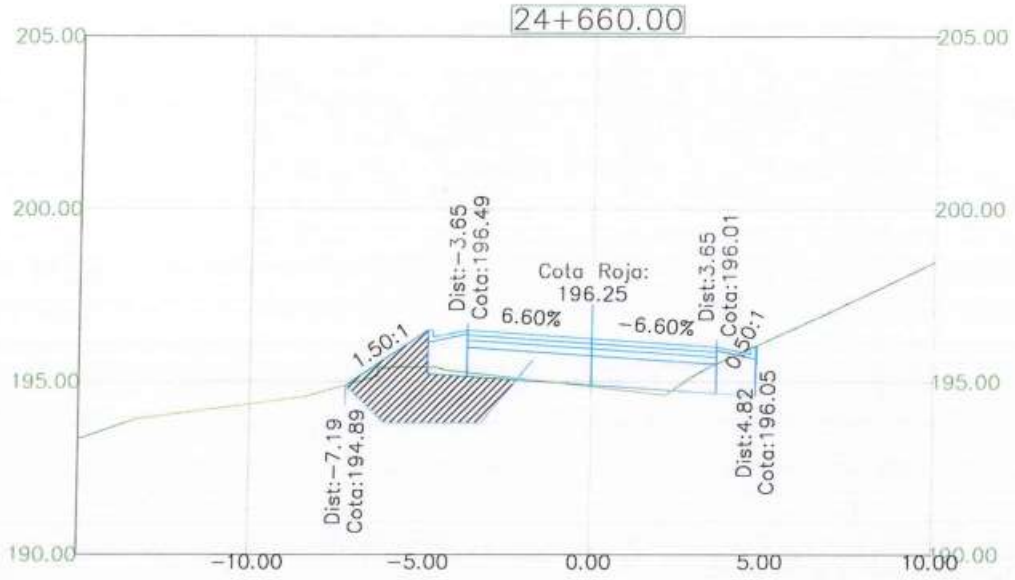

24+670.00

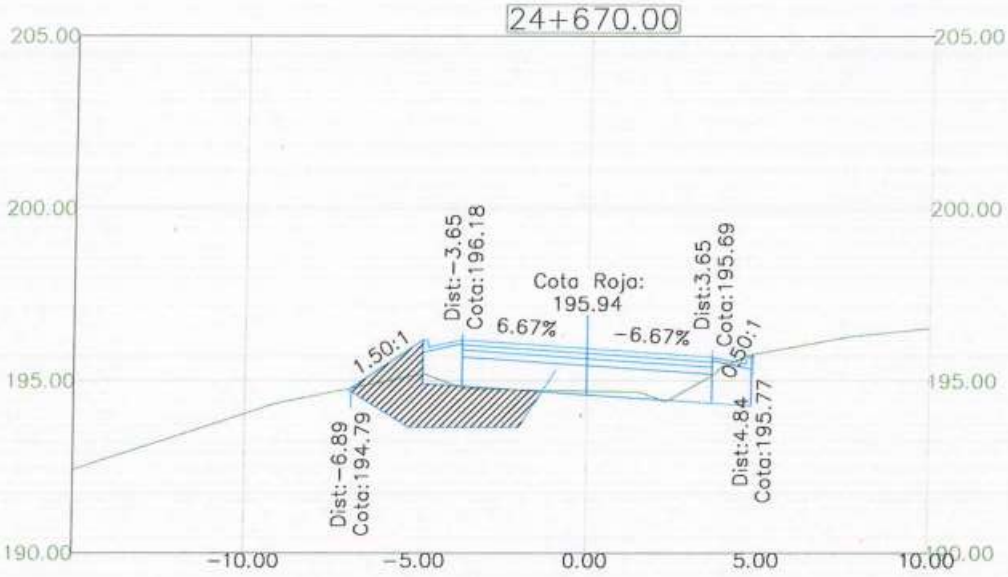

24+680.00

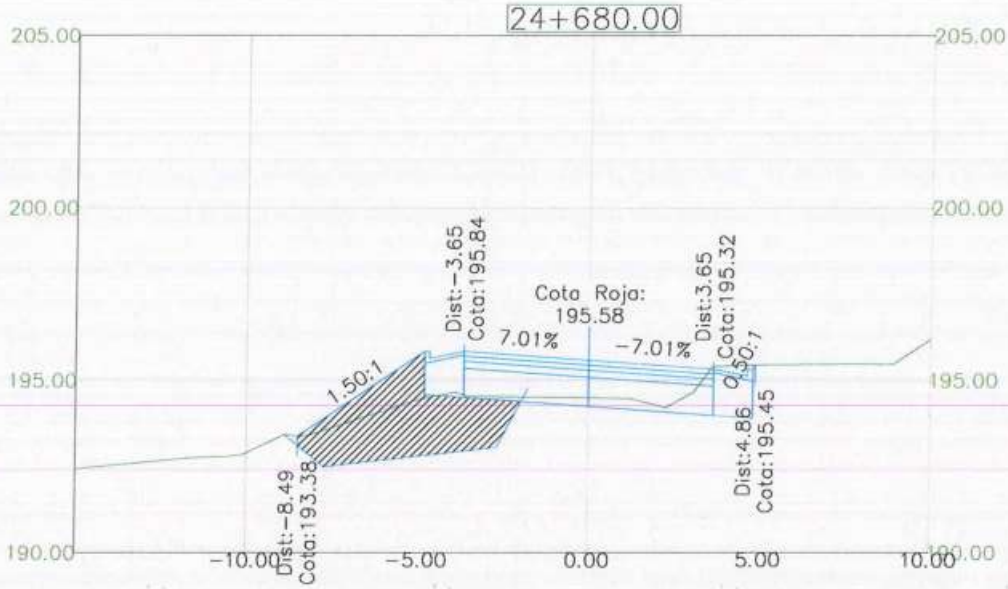


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


12 -30

18-07-2023


24+690.00

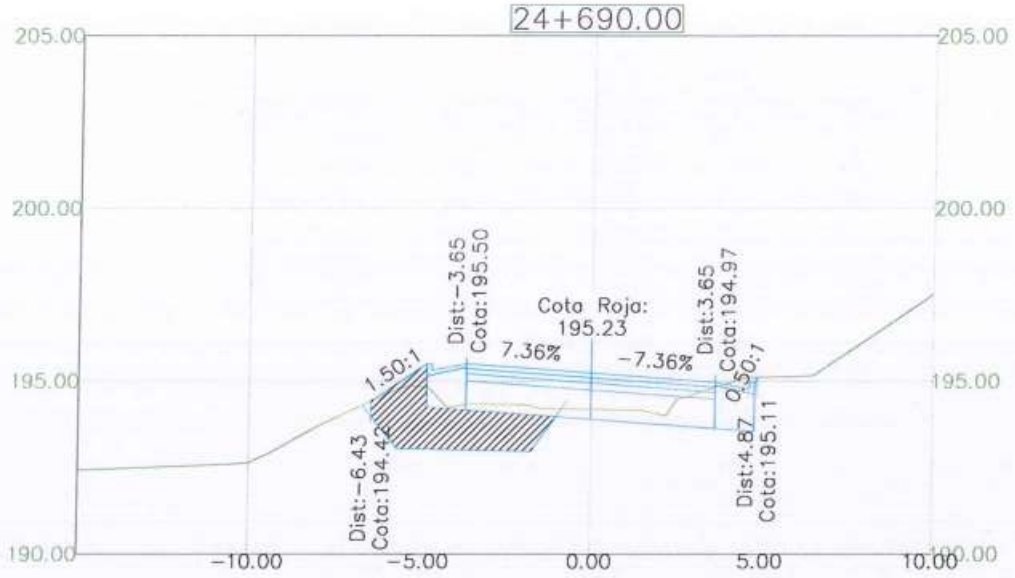

24+700.00

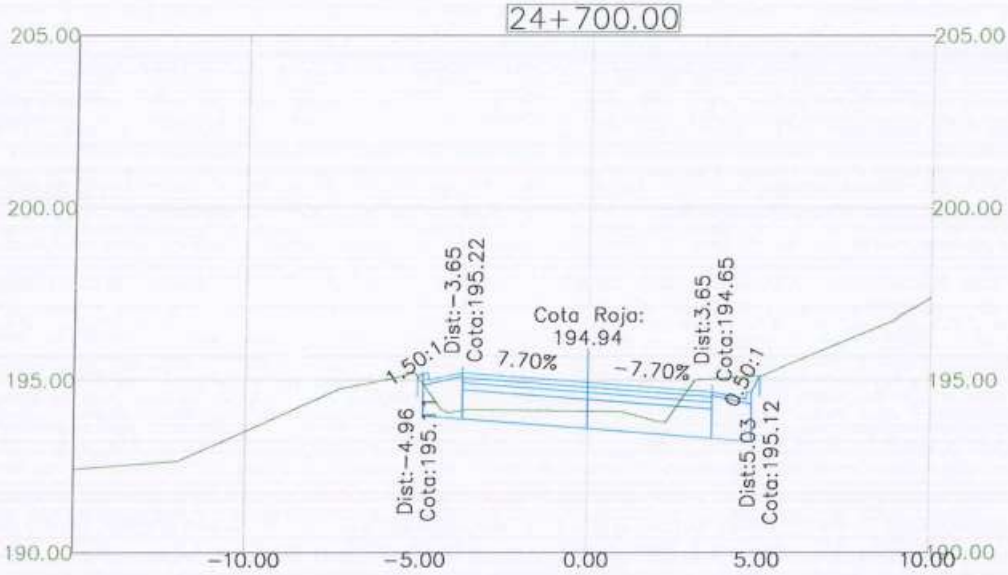

24+710.00

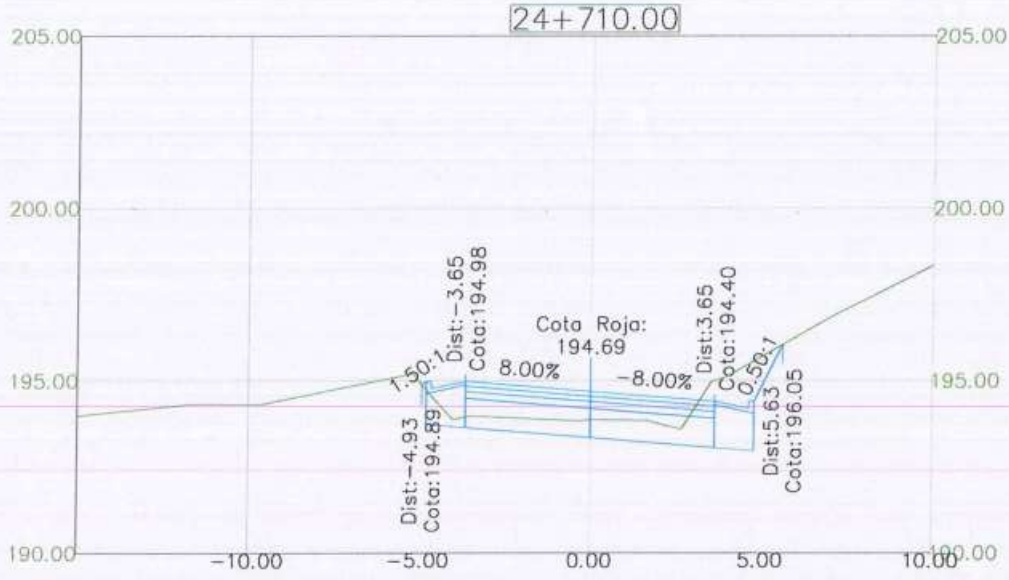


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE BAJA


1.3 -30

18-07-2025


24+720.00

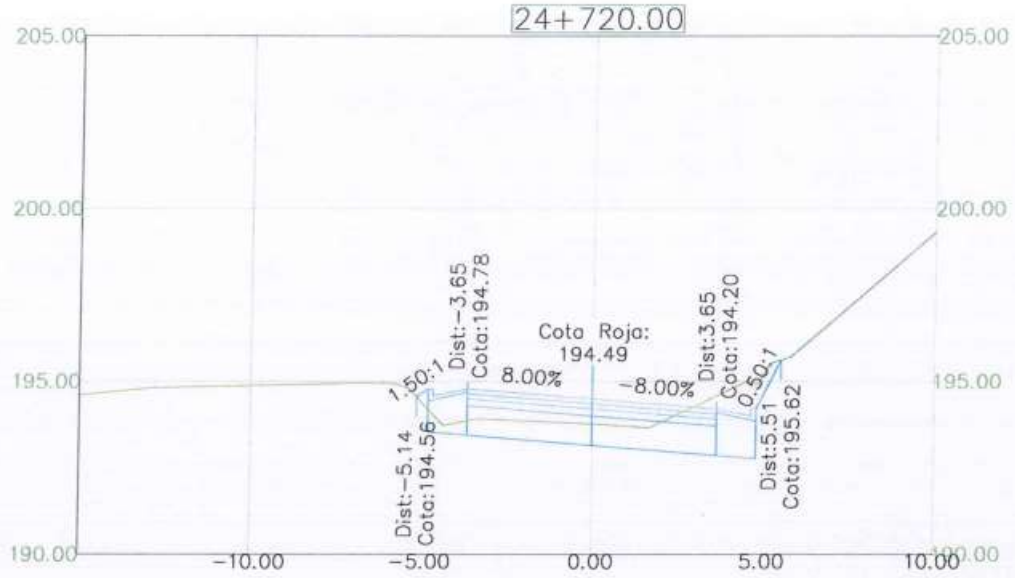

24+730.00

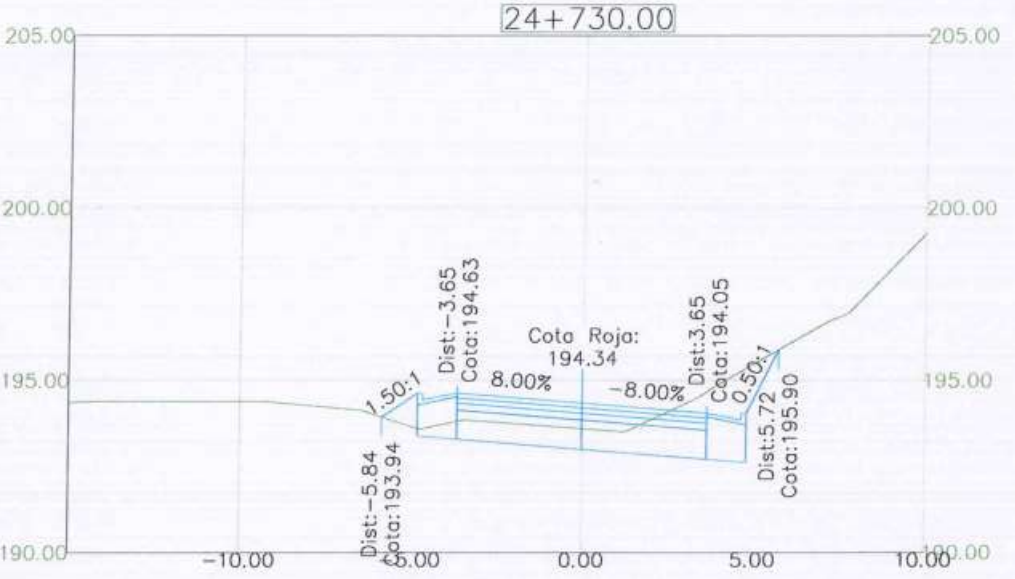

24+740.00

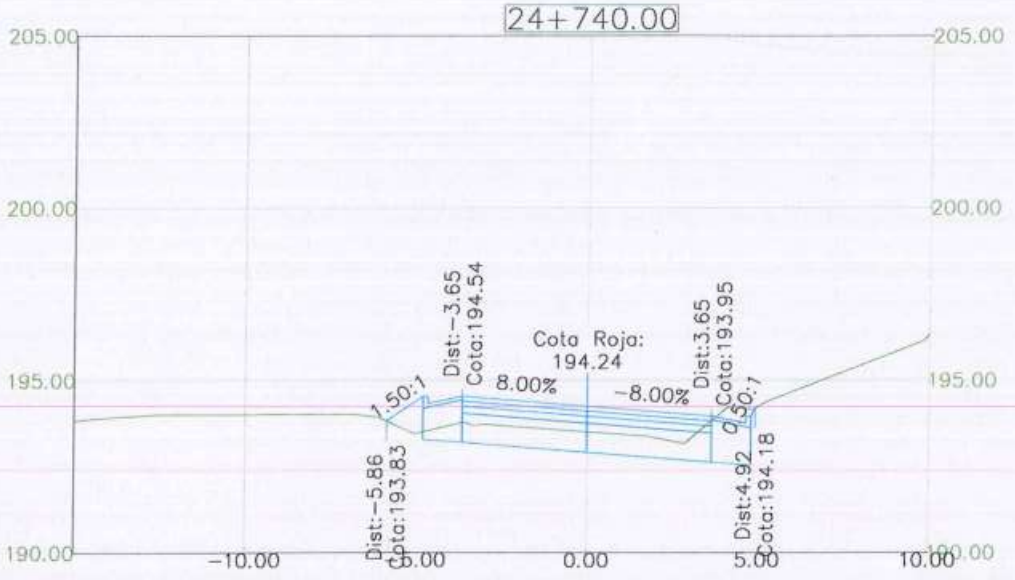


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE BAJA

14 -30


16-07-2025

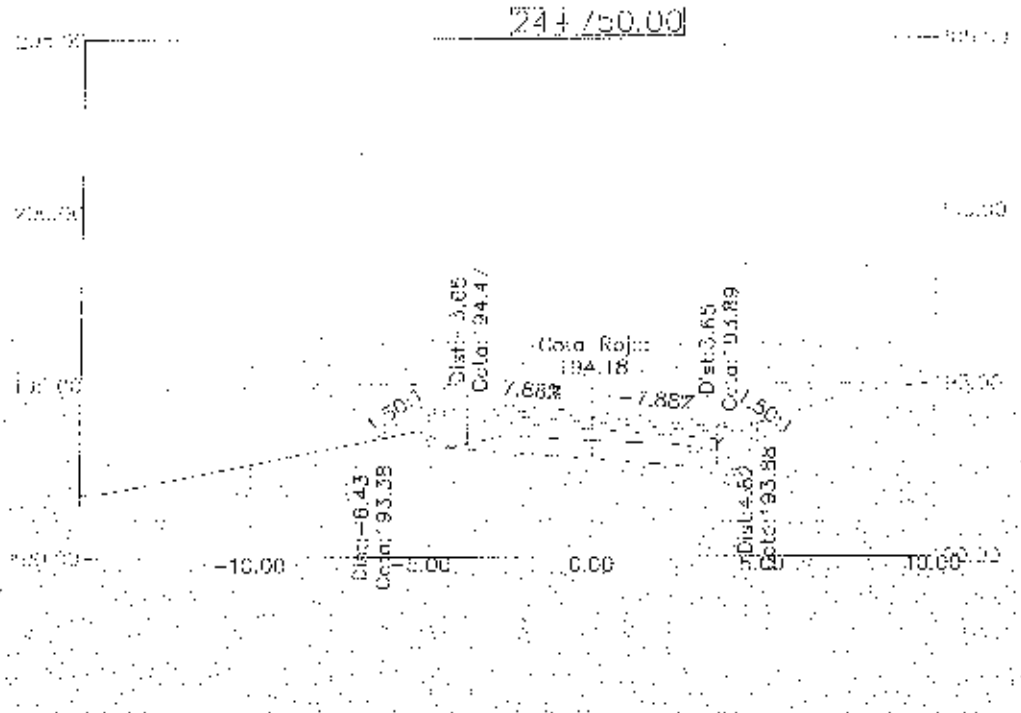
24+750.00
Dist:-6.43
Cota: 93.38
Dist: 3.65
Cota: 94.4
Cota: 94.18
7.882
7.882
Dist:3.65
Cota: 94.89
Dist:4.60
Cota: 93.96
-10.00
0.00
10.00


24+760.00



24+770.00

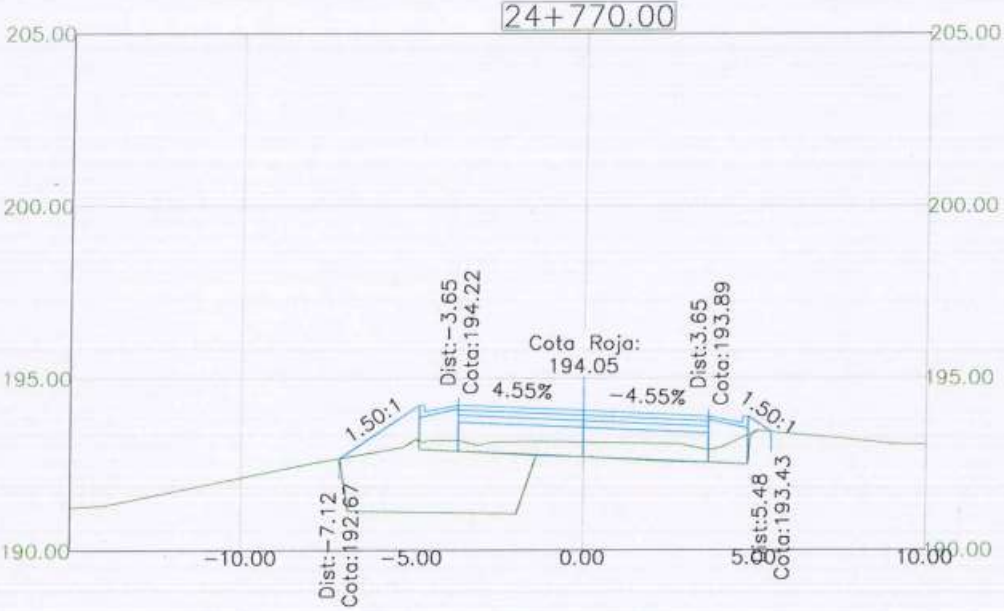

24+780.00

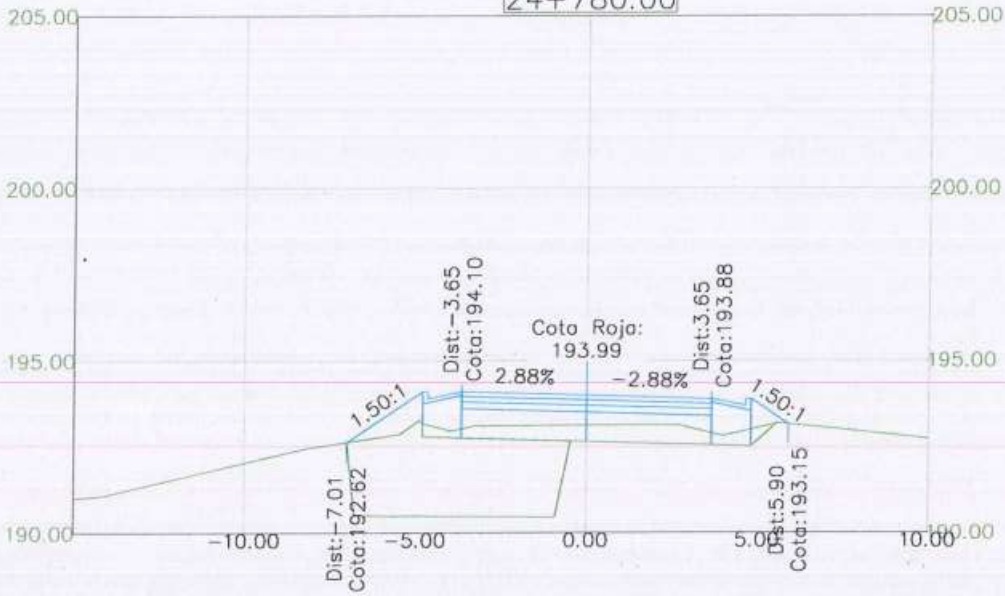


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
ESTE BAJA


16 -30

16-07-2025


24+790.00

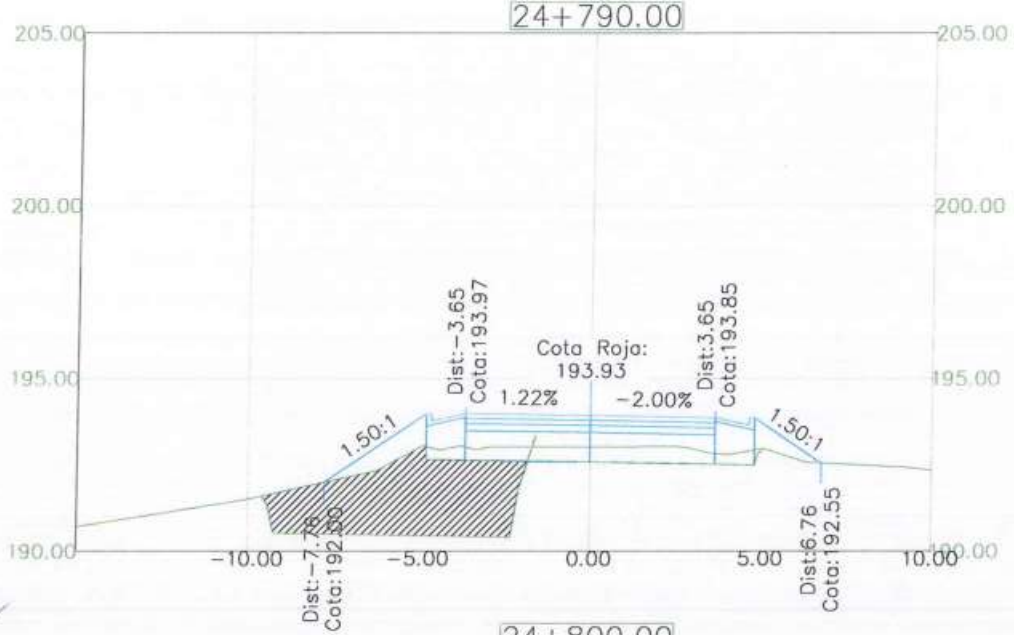

24+800.00

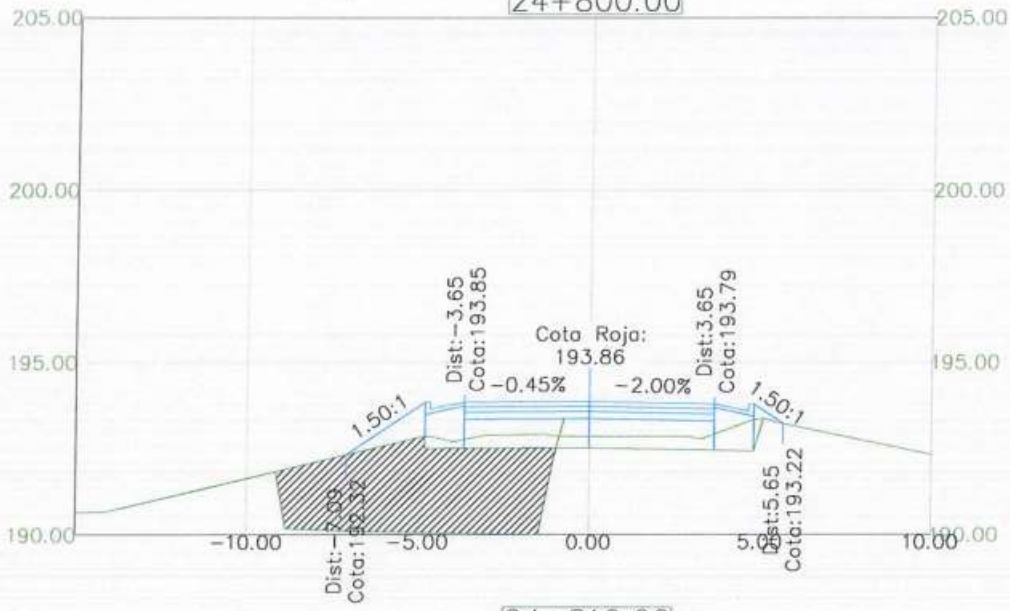

24+810.00

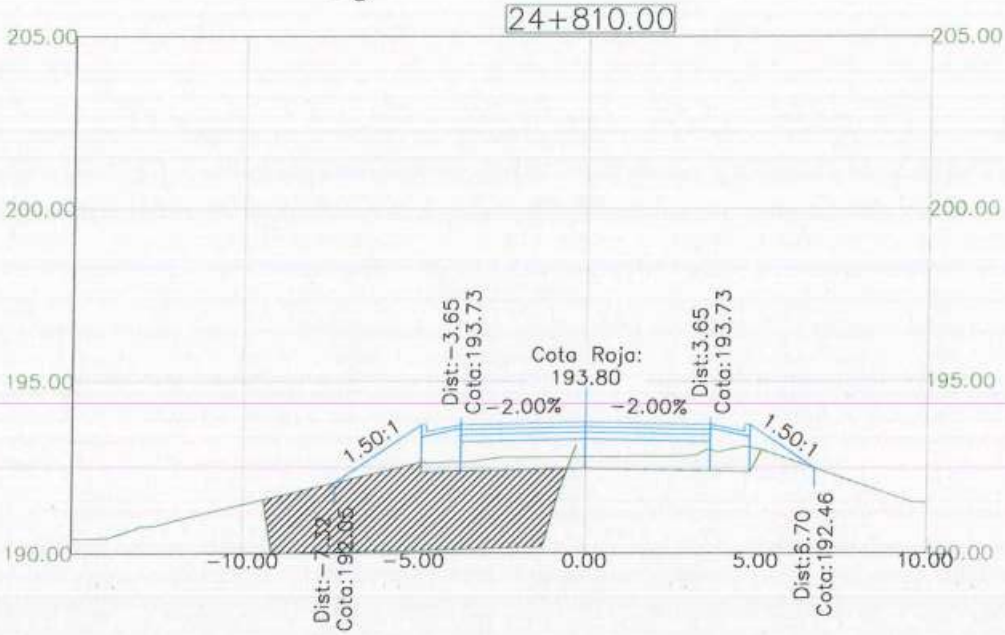


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


17 -30

16-07-2025


24+820.00

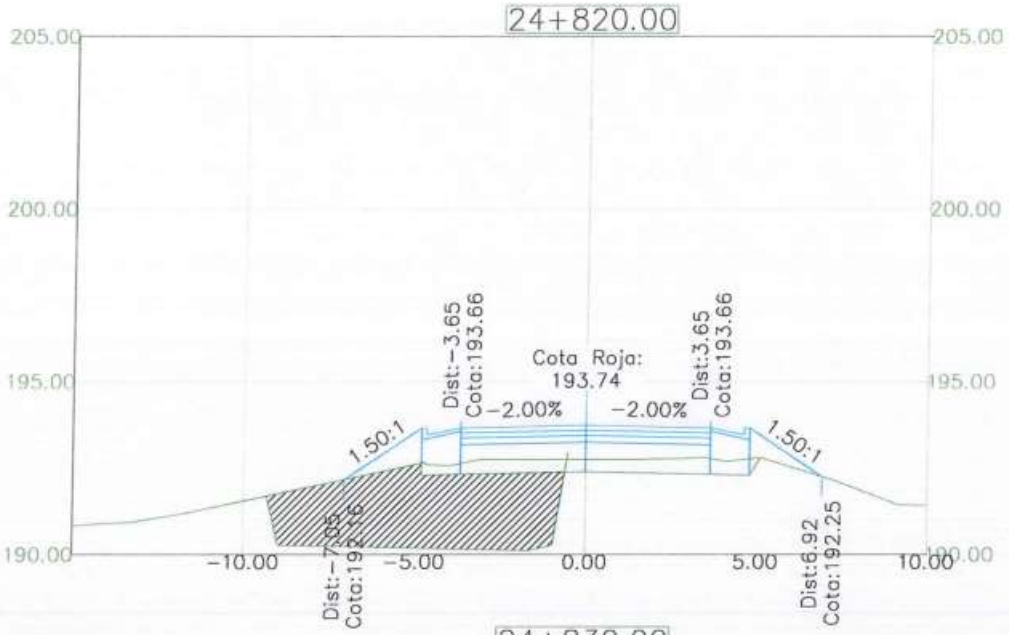

24+830.00

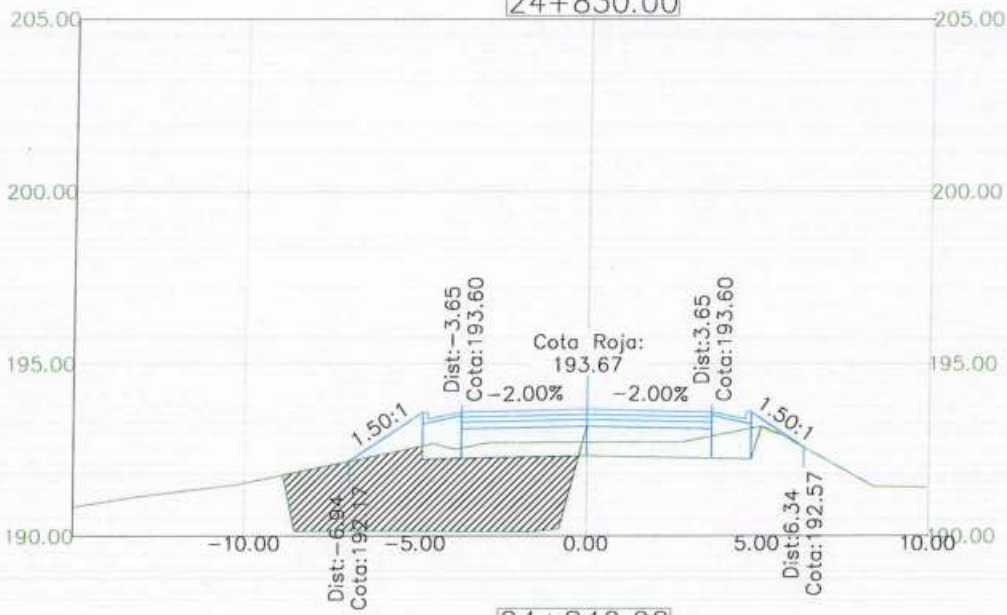


24+840.00

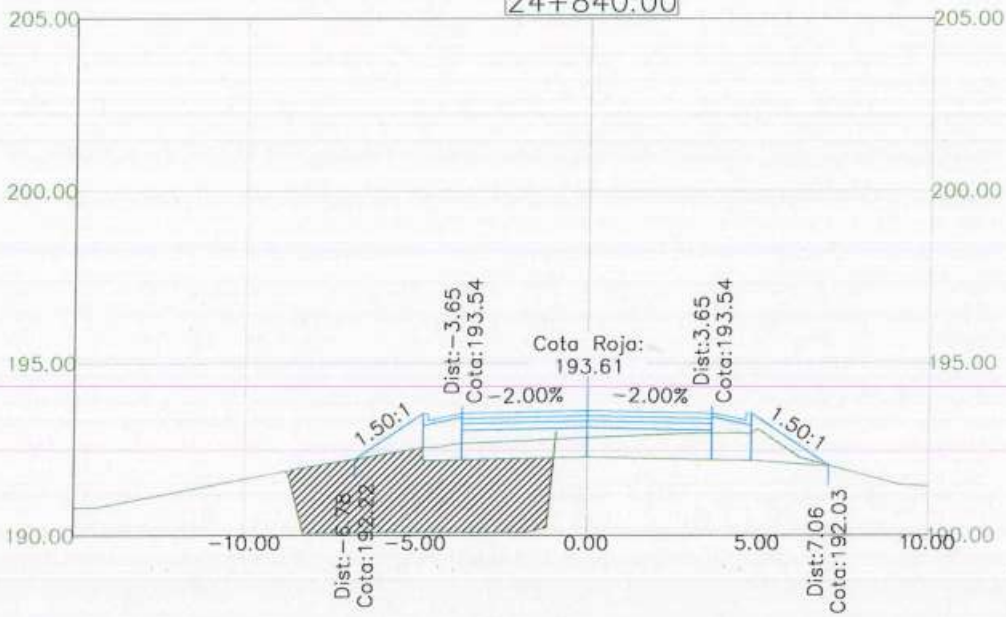


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


24+850.00

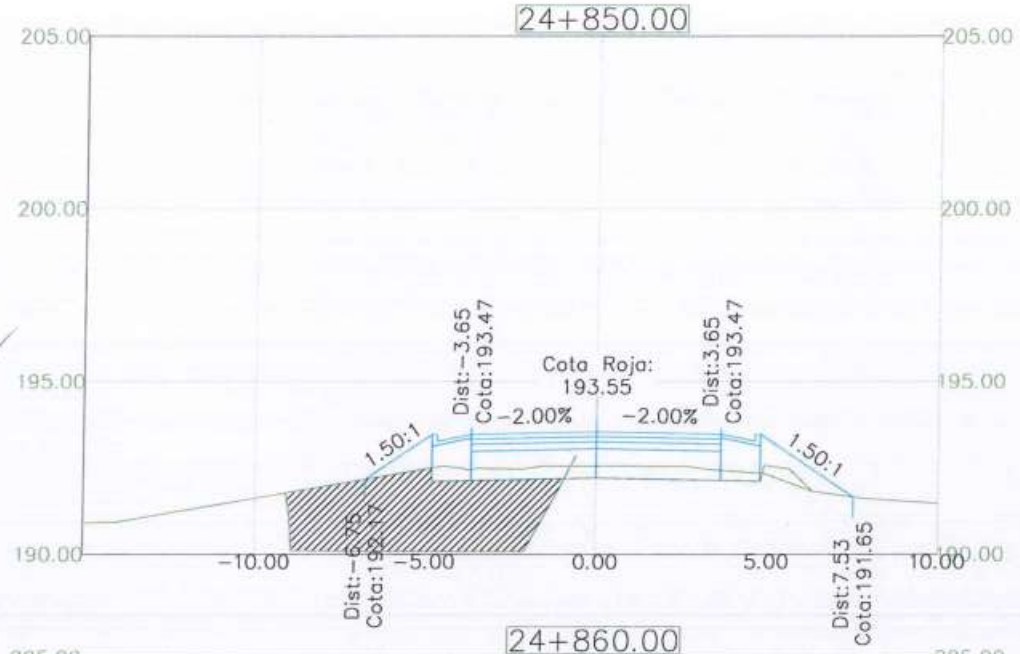

24+860.00

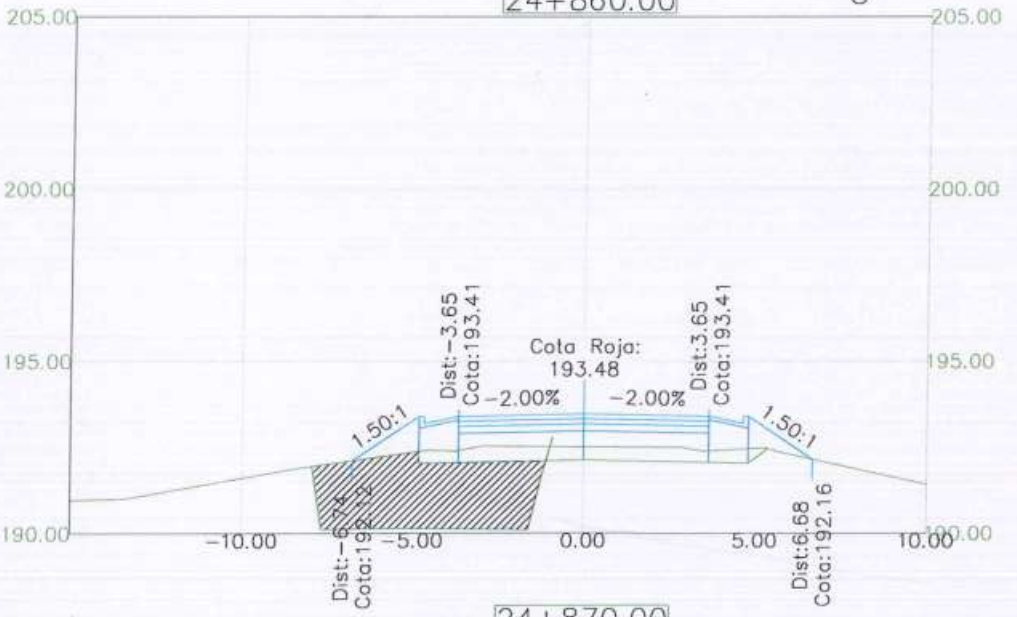

24+870.00

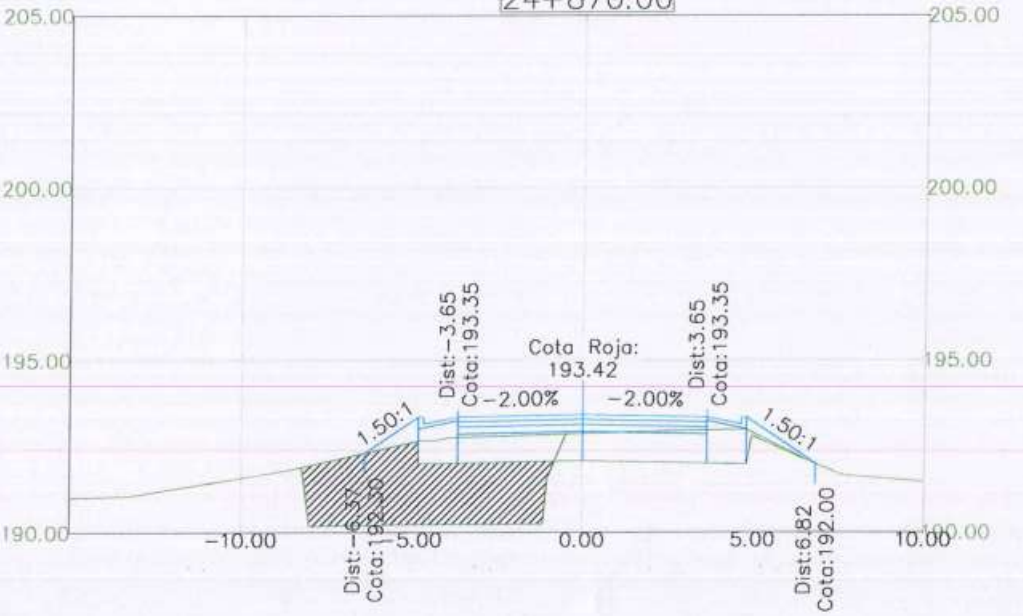


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
BODEGAJA


18 -30

18-07-2025


24+880.00

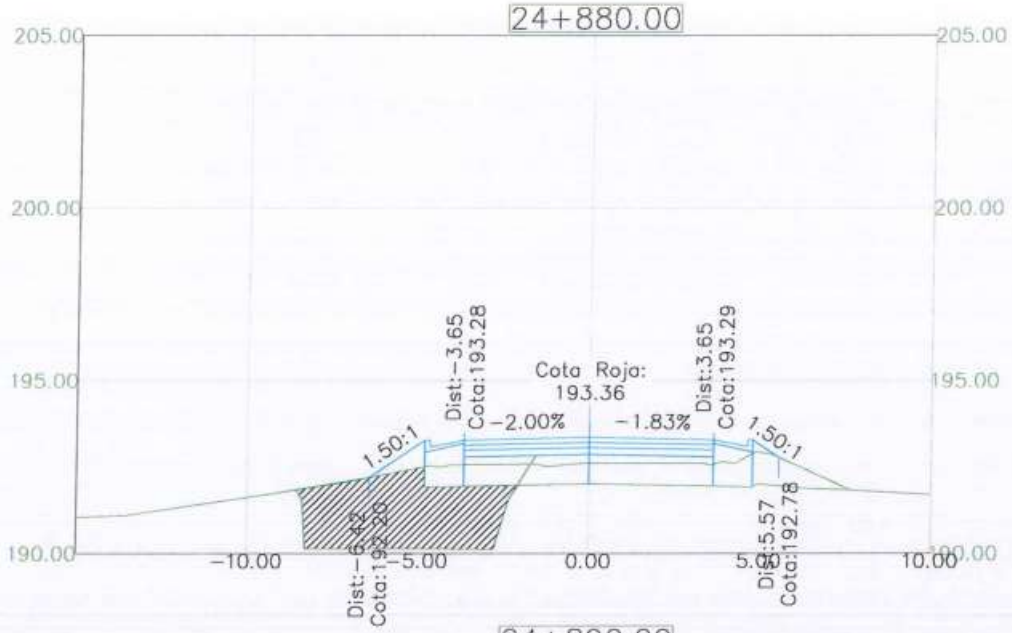

24+890.00

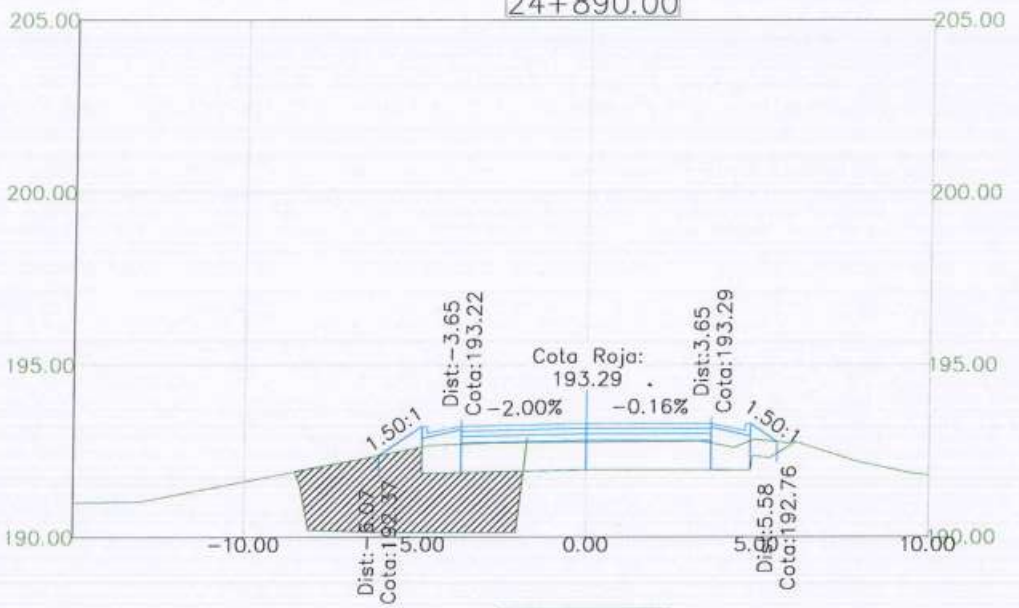


24+900.00

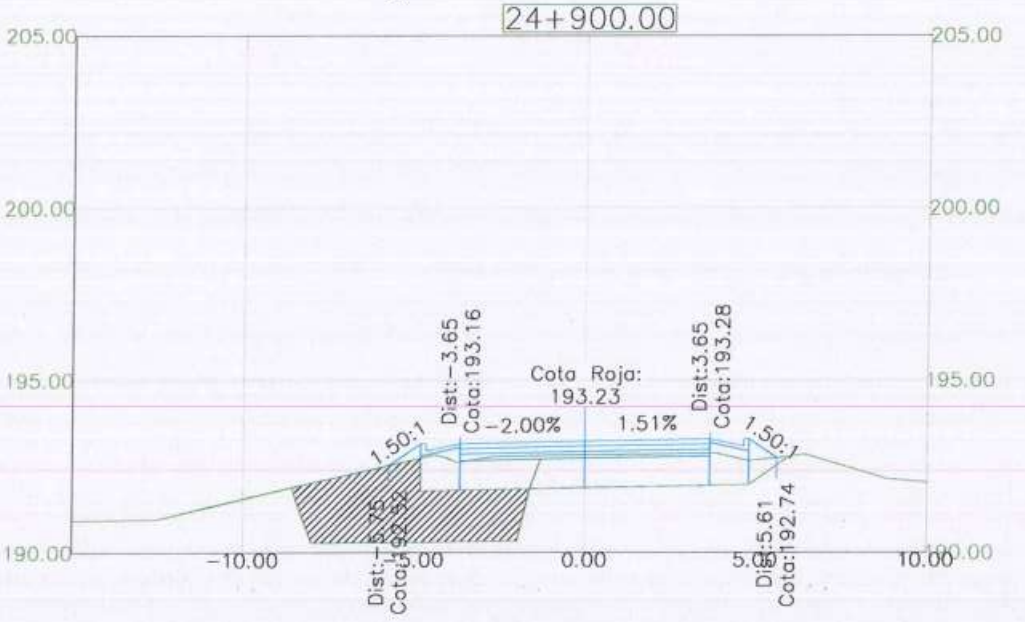



SUDINCO


20 - 30


16-07-2025

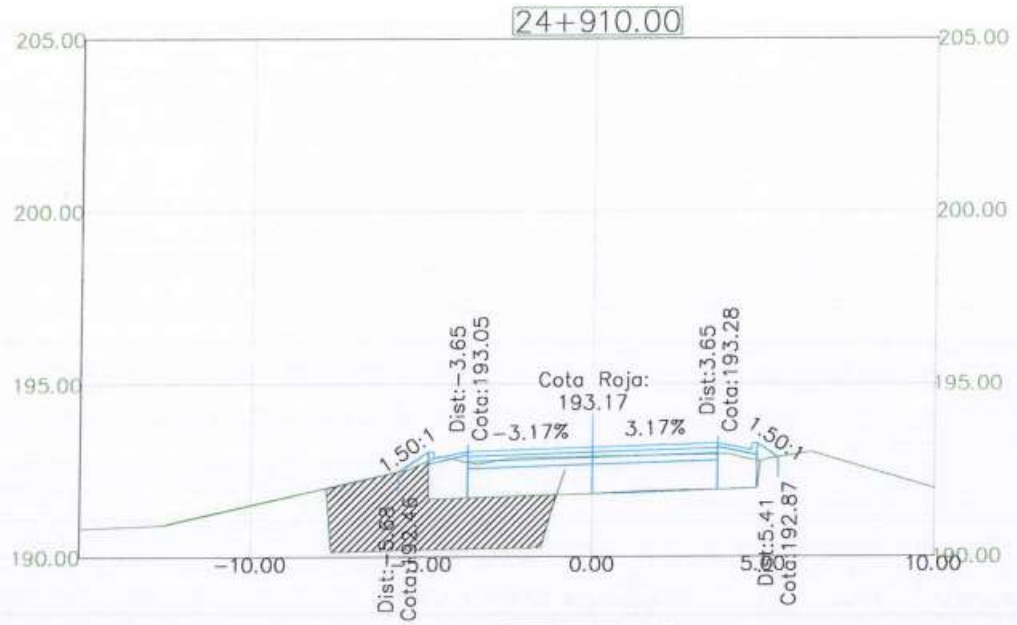
24+910.00
205.00
200.00
195.00
190.00
Cota Roja:
193.17
Dist:-3.65
Cota:193.05
Dist:3.65
Cota:193.28
-3.17%
3.17%
1.50:1
1.50:1
Dist:-5.68
Cota:192.46
Dist:5.41
Cota:192.87
-10.00
0.00
10.00

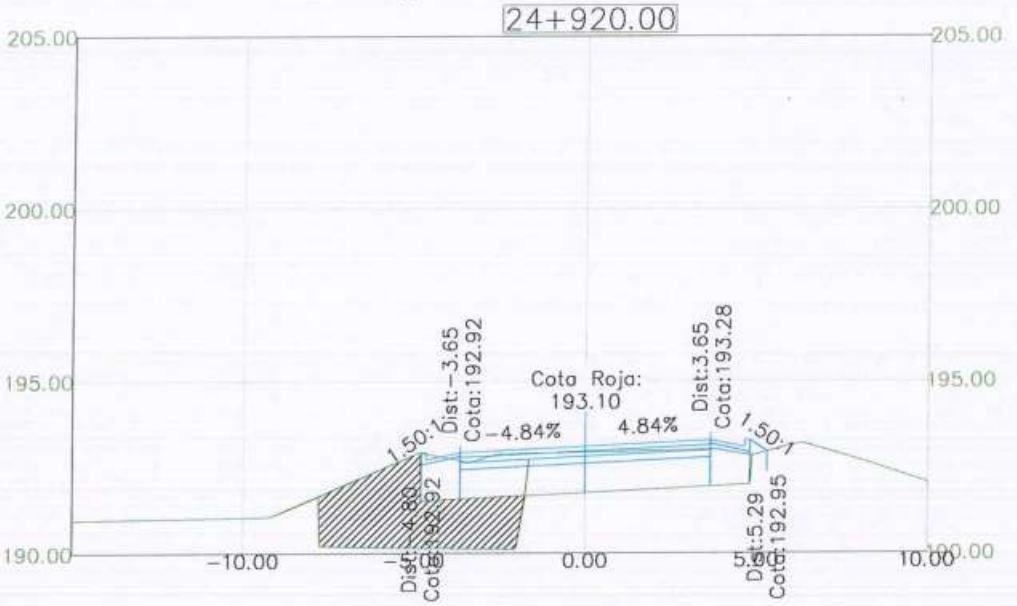
24+920.00
205.00
200.00
195.00
190.00
Cota Roja:
193.10
Dist:-3.65
Cota:192.92
Dist:3.65
Cota:193.28
-4.84%
4.84%
1.50:1
1.50:1
Dist:-4.80
Cota:192.92
Dist:5.29
Cota:192.95
-10.00
0.00
10.00

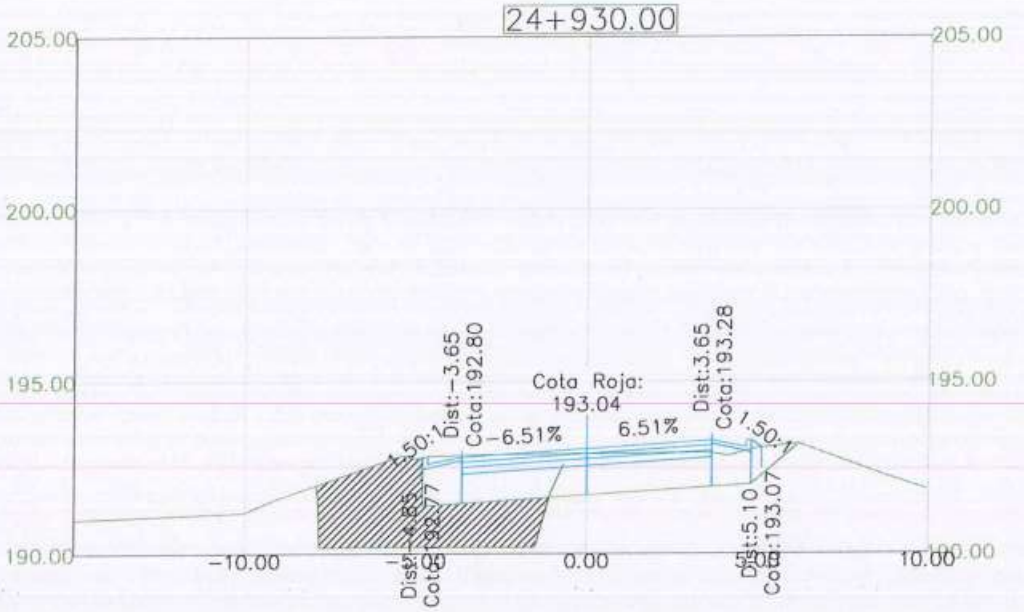
24+930.00
205.00
200.00
195.00
190.00
Cota Roja:
193.04
Dist:-3.65
Cota:192.80
Dist:3.65
Cota:193.28
-6.51%
6.51%
1.50:1
1.50:1
Dist:-4.83
Cota:192.77
Dist:5.10
Cota:193.07
-10.00
0.00
10.00

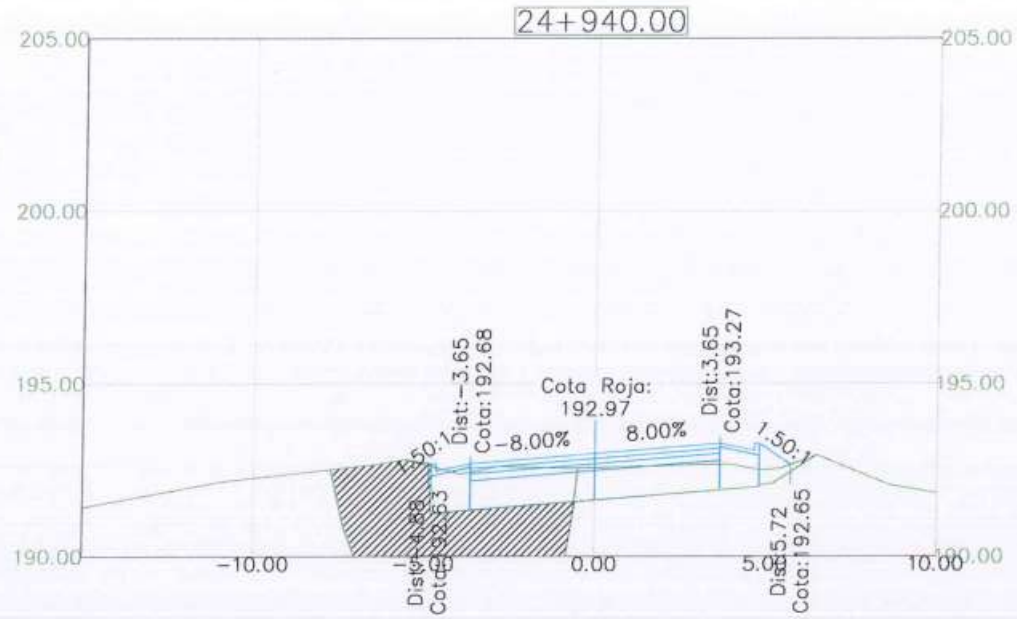

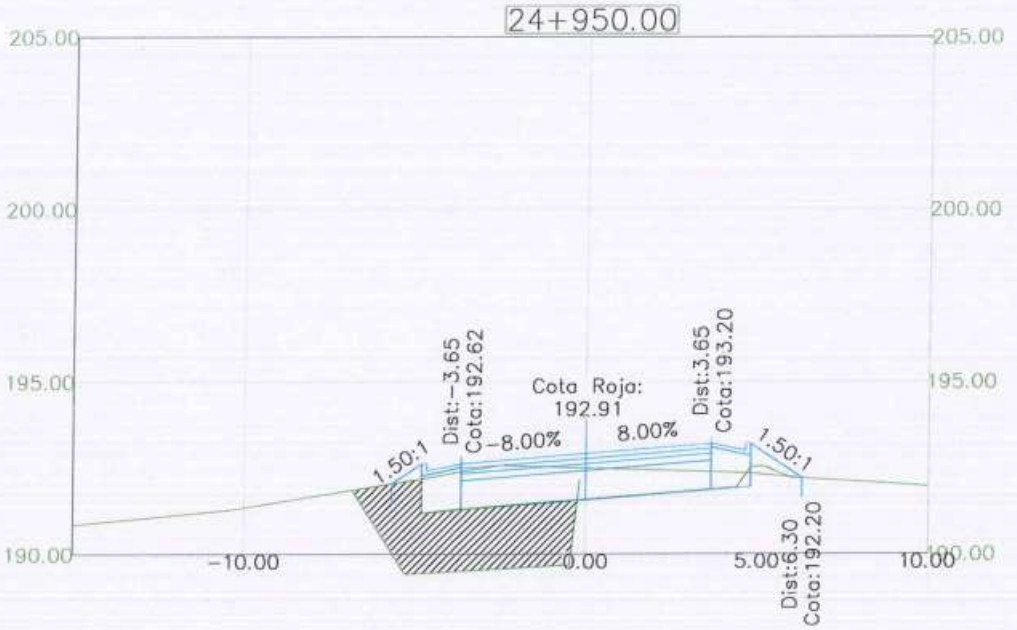



SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES

22 - 30

18-07-2025

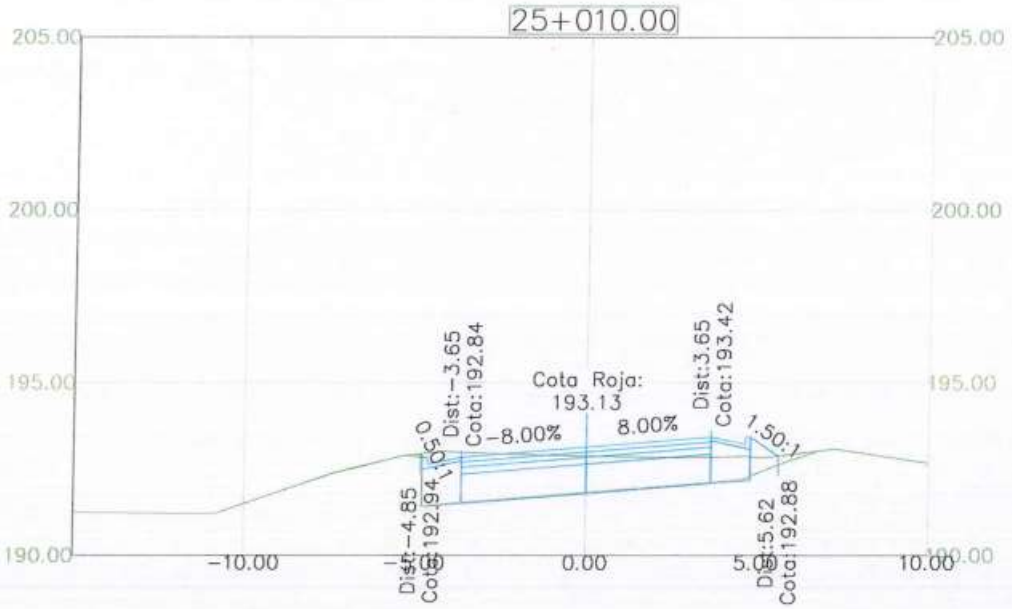

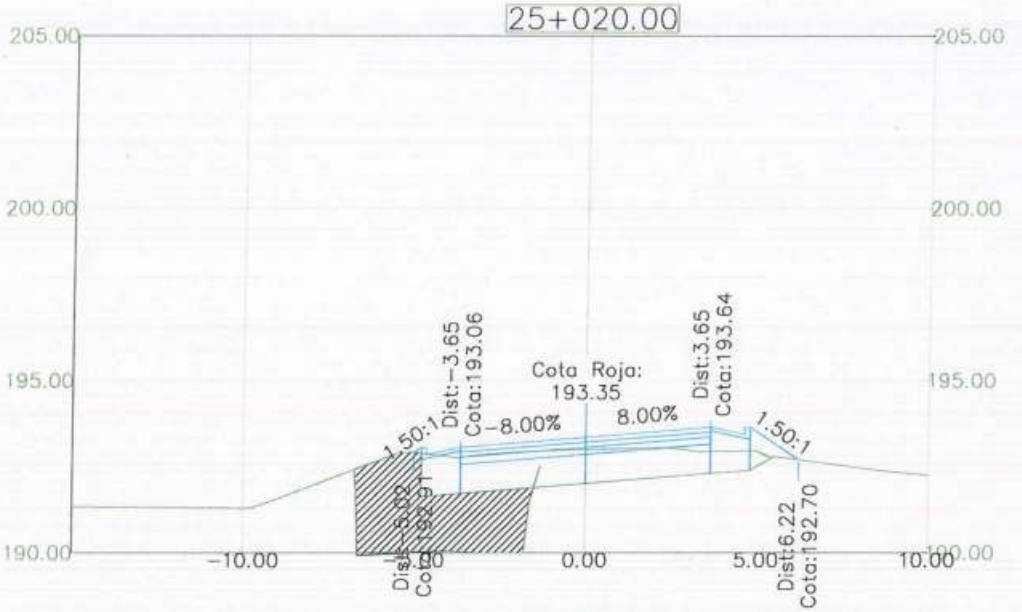




SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


23 - 30

16-07-2025


25+040.00

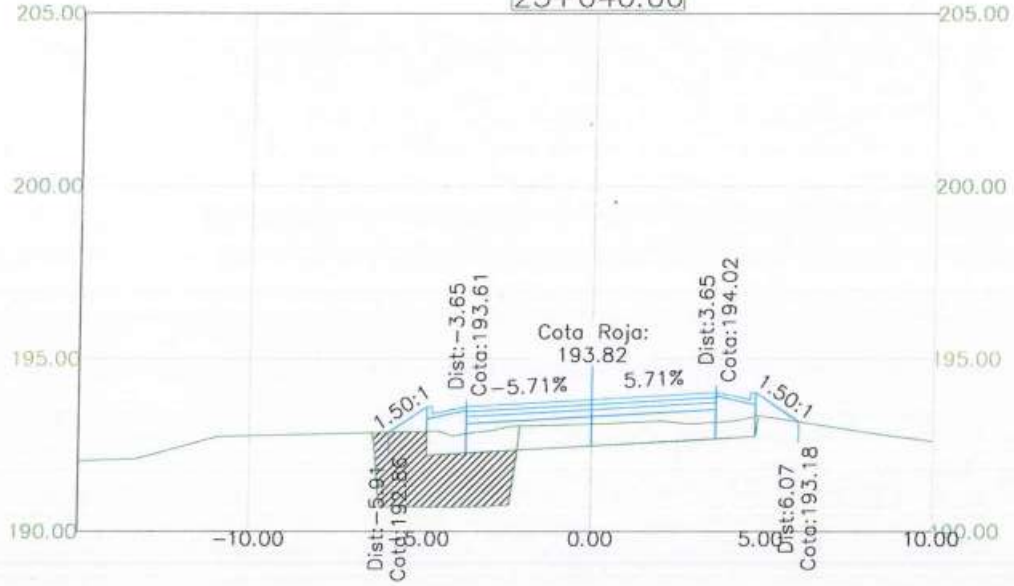

25+050.00

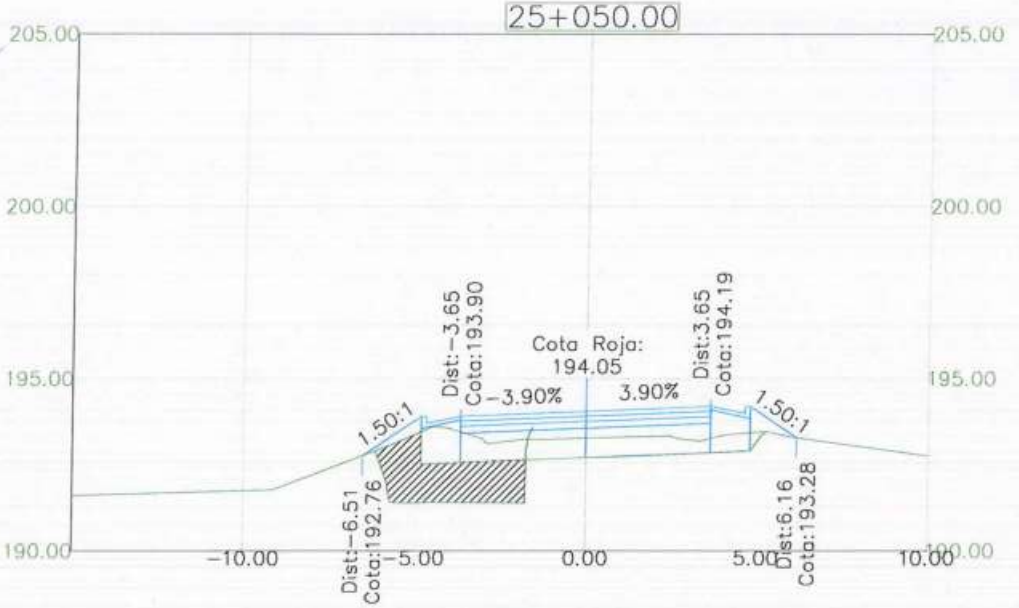

25+060.00

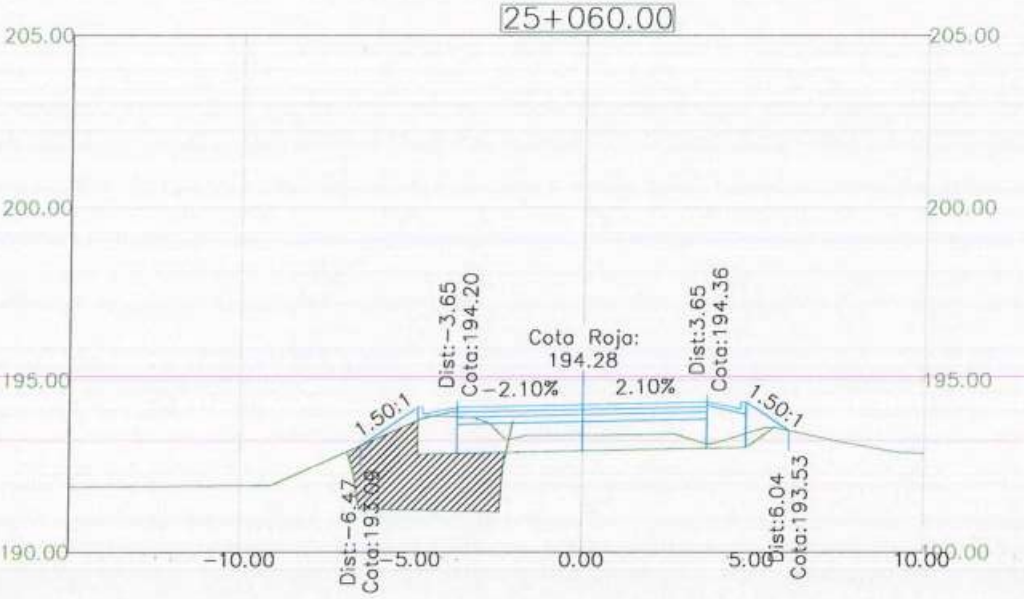


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE BAJA


24 -30

19-07-2023


25+070.00

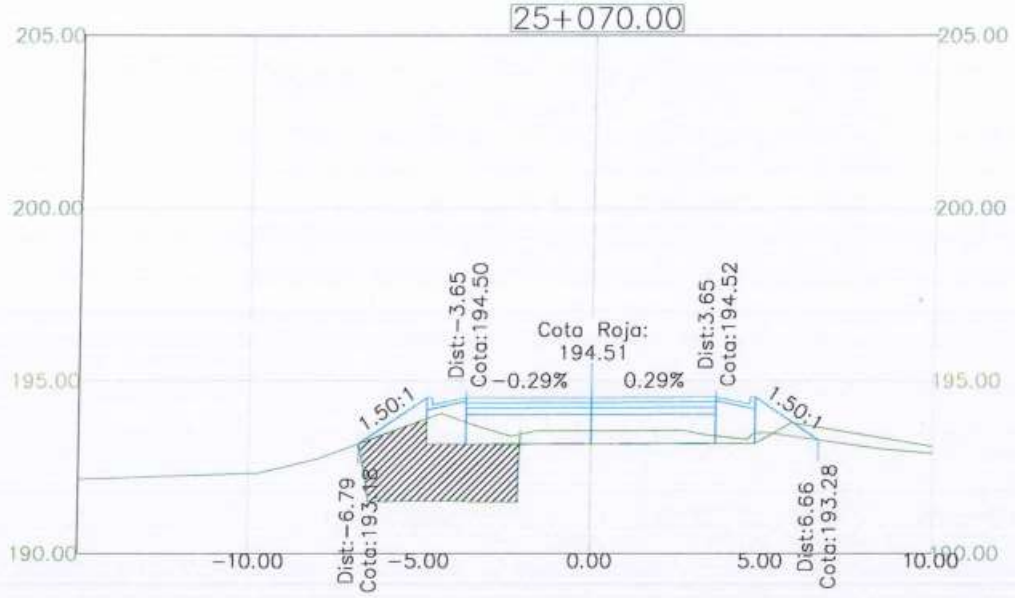

25+080.00

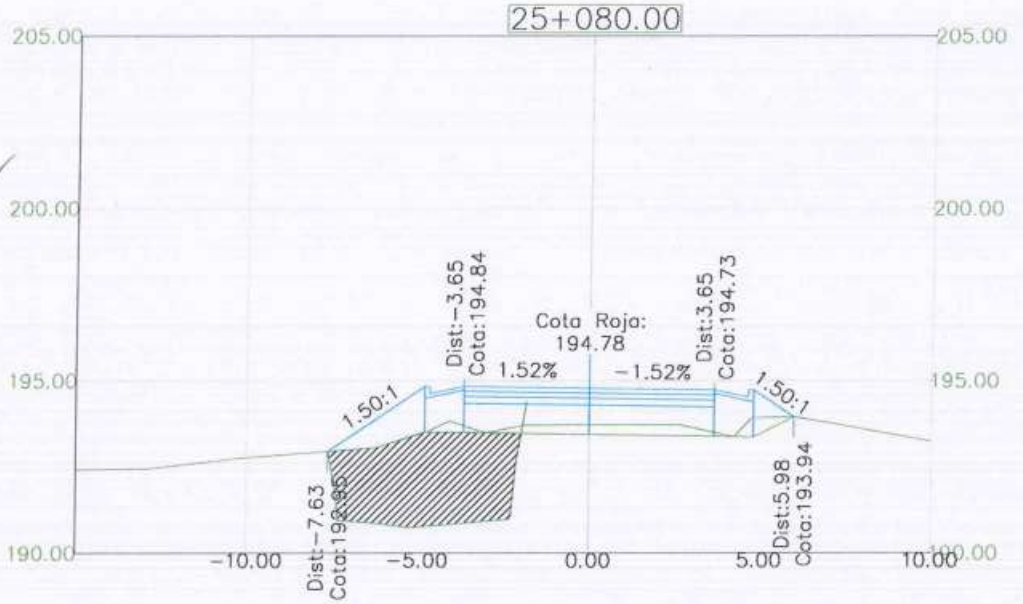

25+090.00

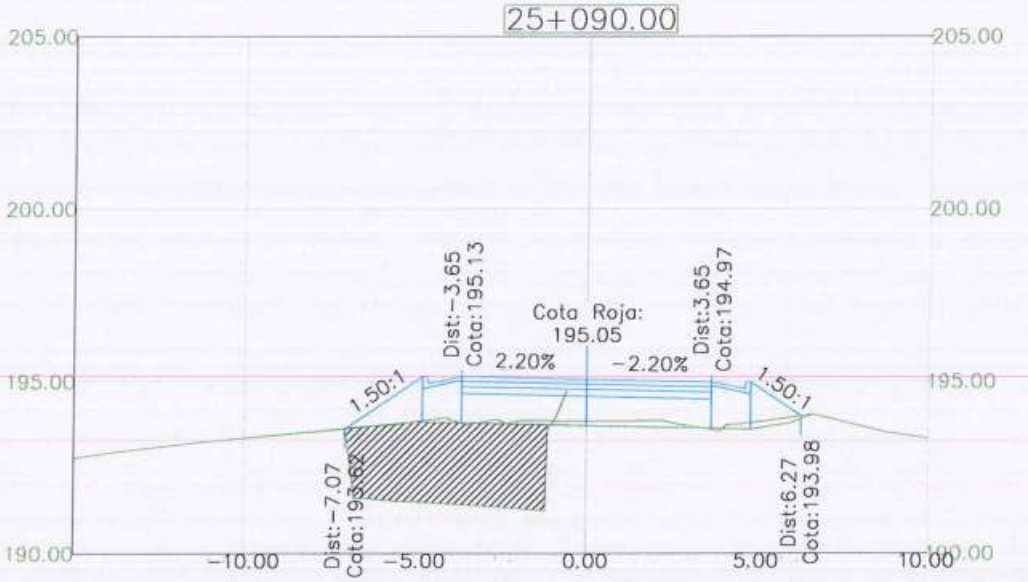


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


25 -30

19-07-2025


25+100.00

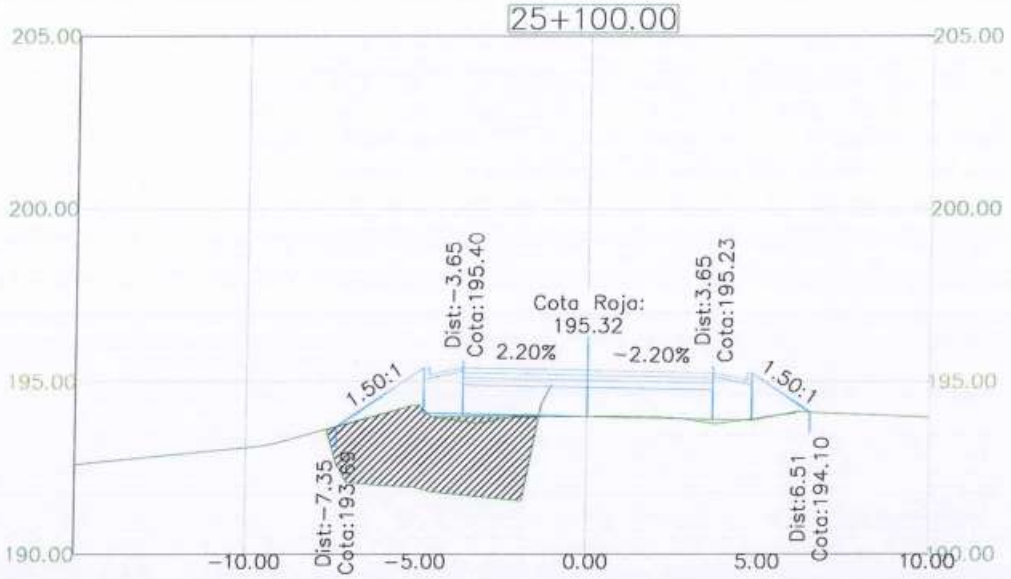

25+110.00

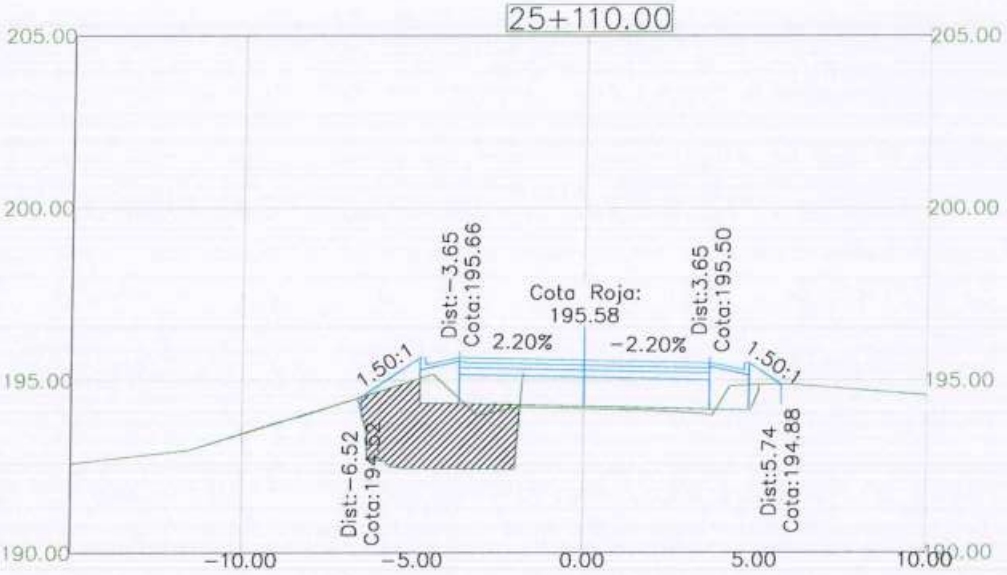

25+120.00

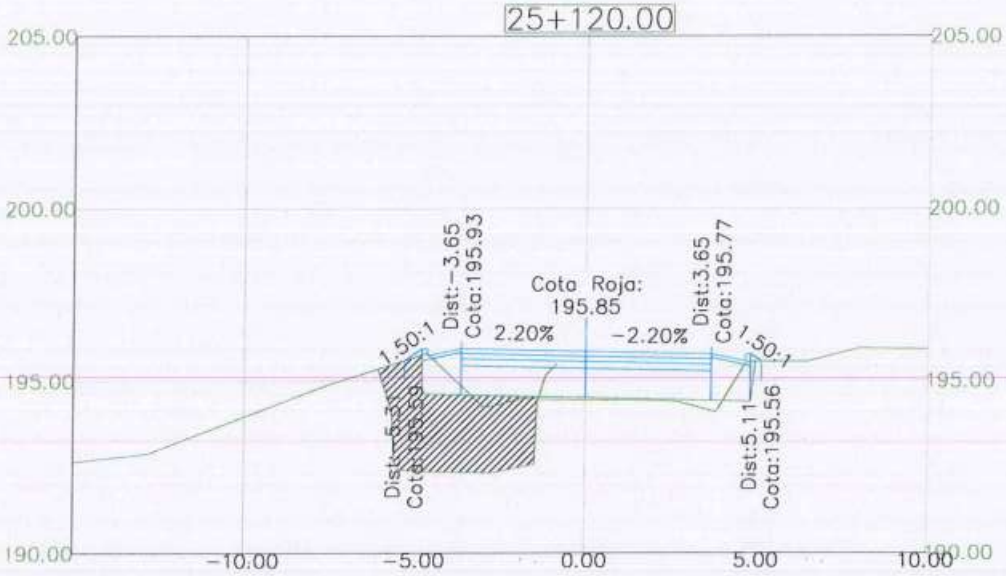


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


25 - 30

18-07-2025


25+130.00

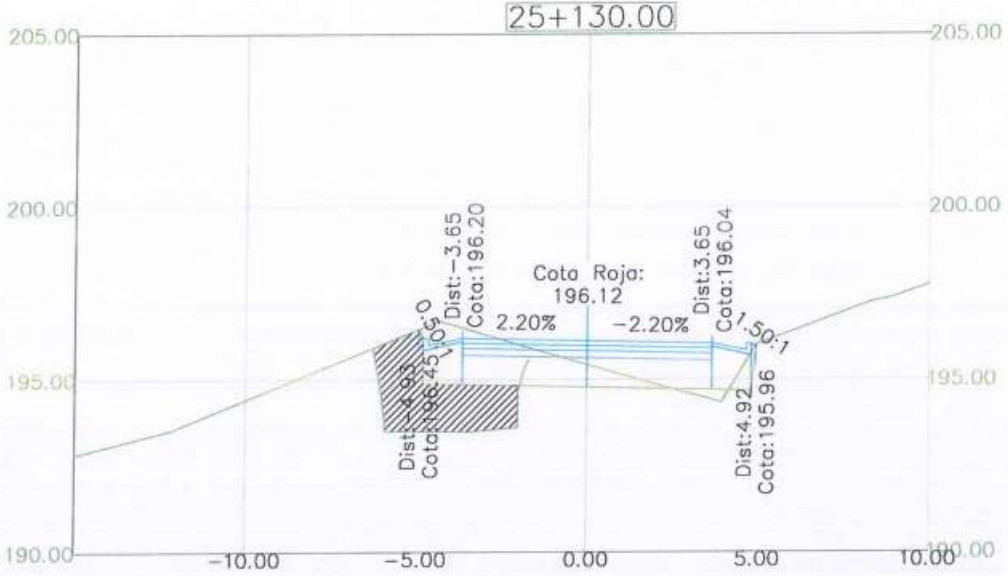


25+140.00

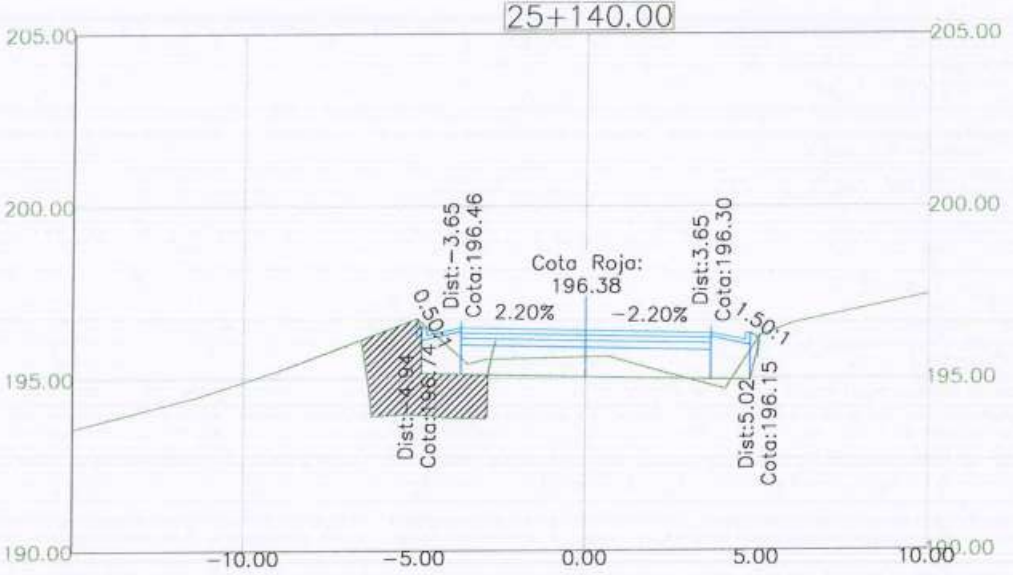


25+150.00

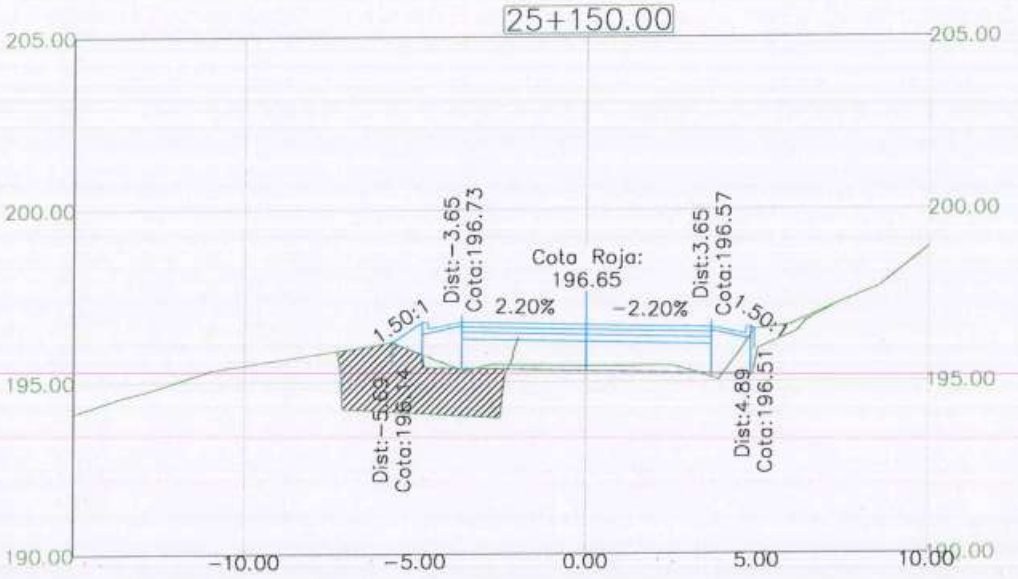


25+160.00

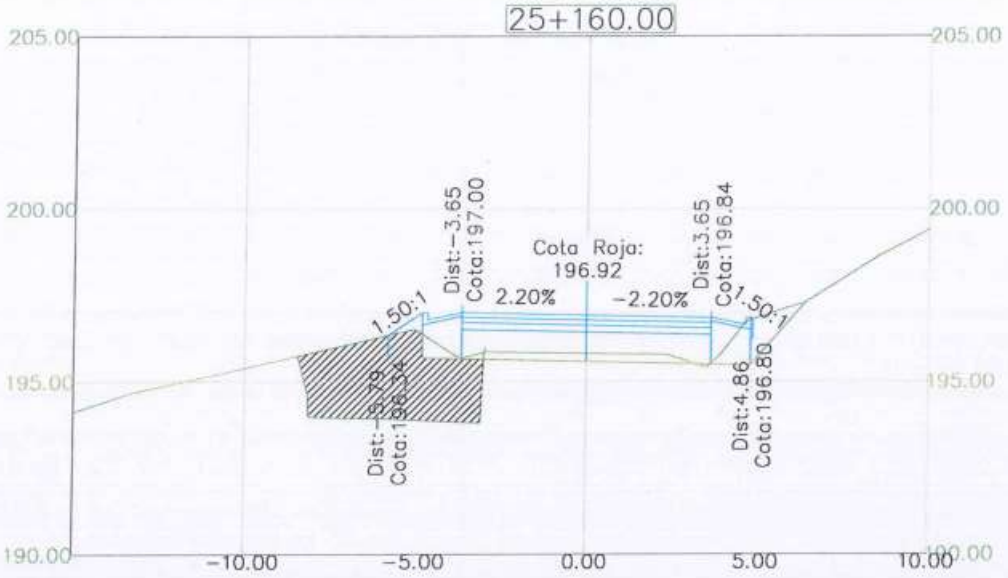

25+170.00

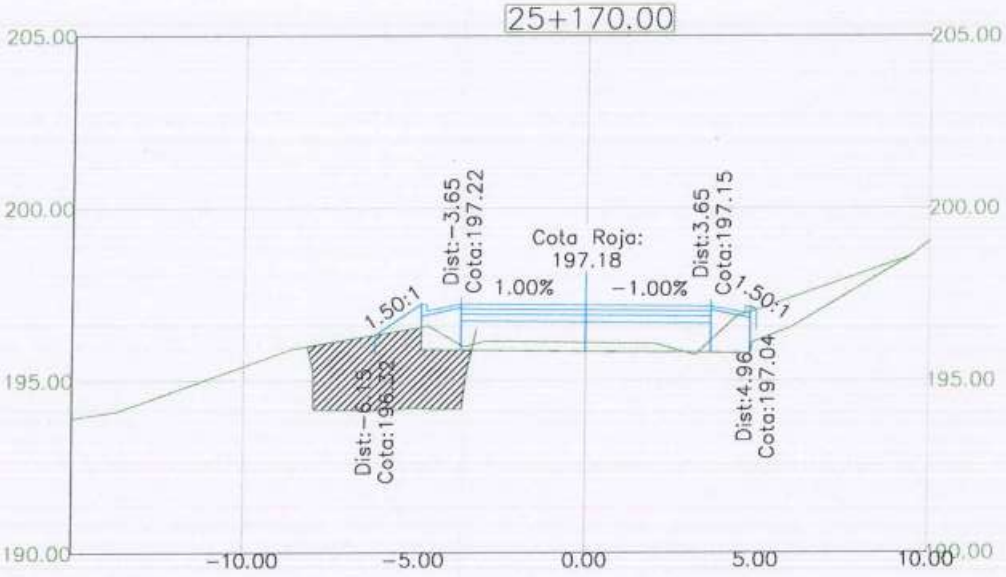

25+180.00

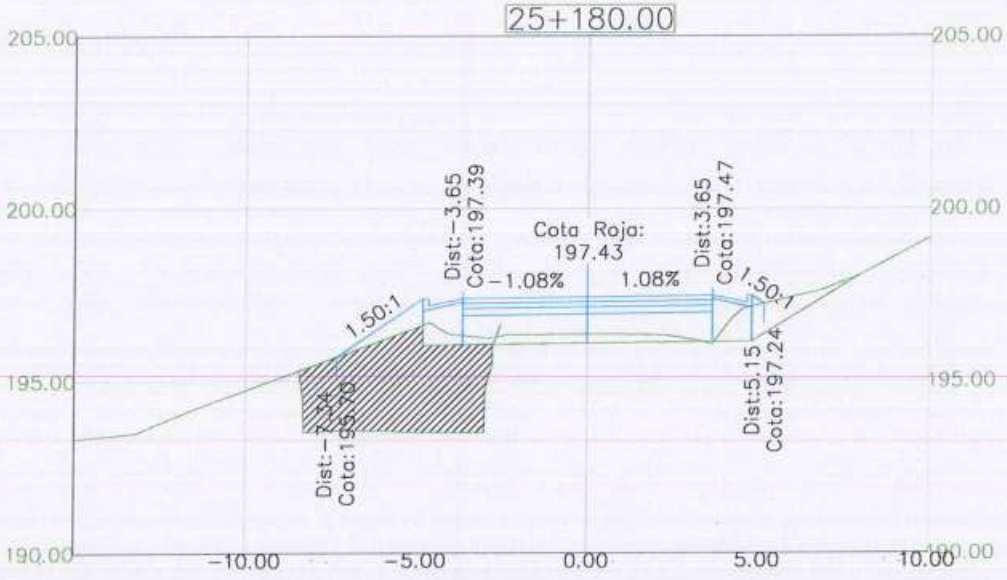


SUDINCO


28 - 30

18-07-2023


25+190.00

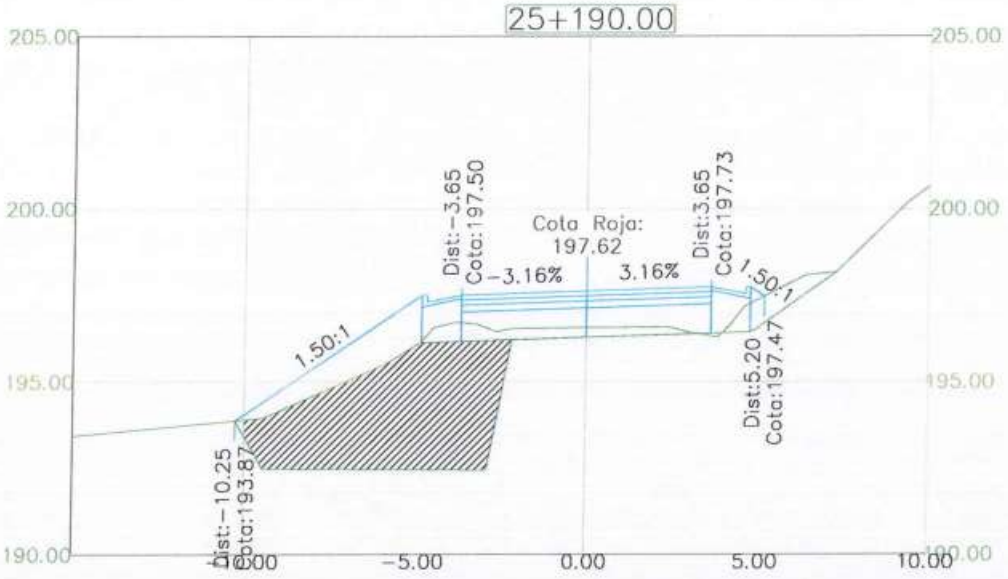

25+200.00

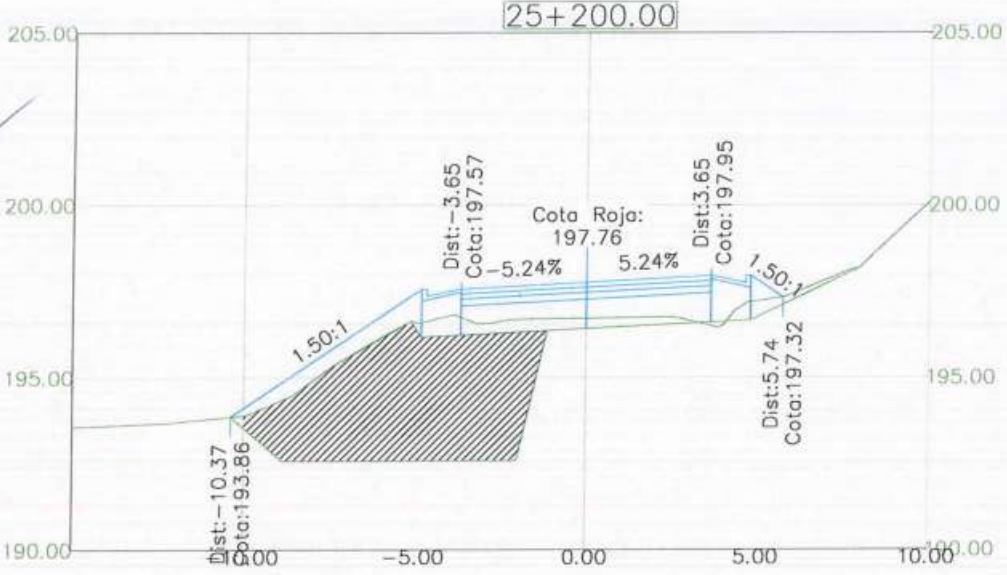

25+210.00

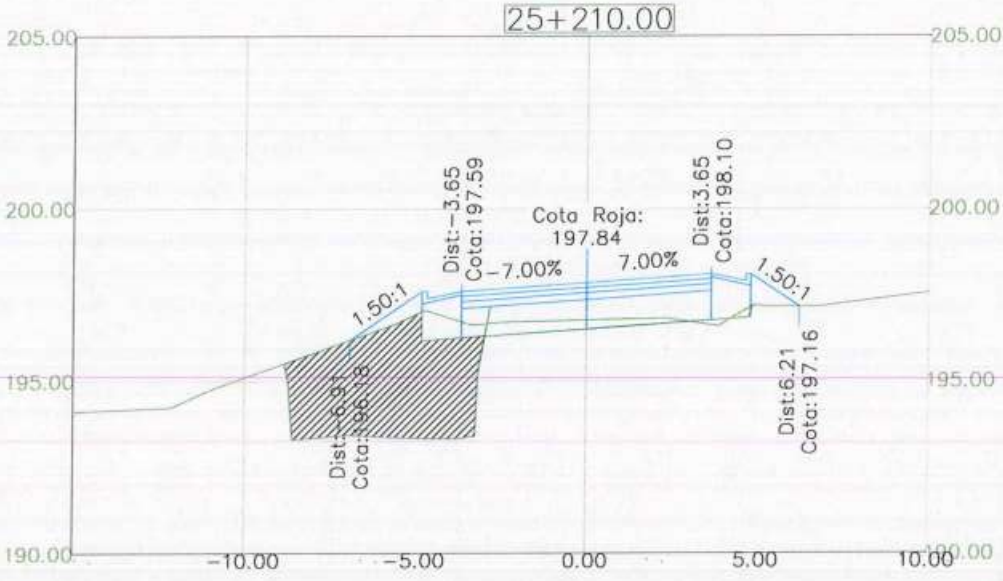



SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES

29 - 30

18-07-2025

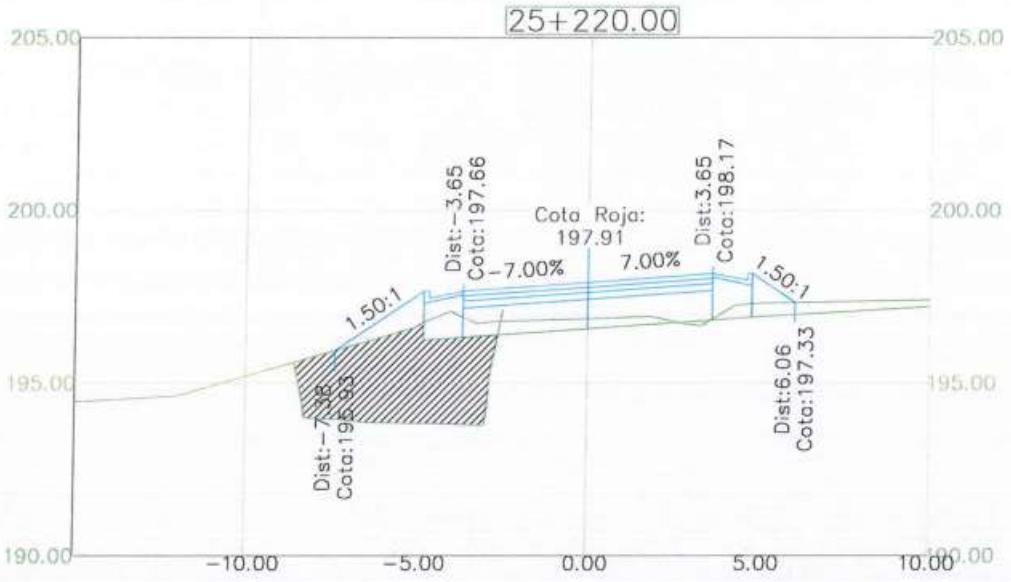

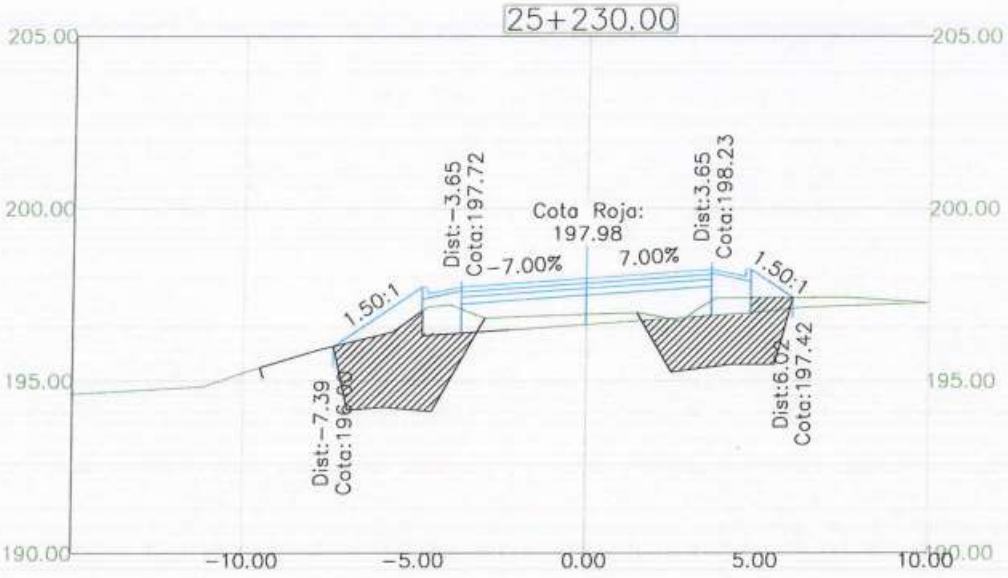

SUDINCO

30 -30

18-07-2025

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
211.1	Remoción de Derrumbes	m3	1766,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	FECHA	RUTA					VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
1	68+000,00	24/06/2025	6006					445,40	445,00	
1	68+000,00	24/06/2025	6006					265,20	265,00	
1	63+360,00	25/06/2025	6009					14,70	15,00	
1	60+190,00	26/06/2025	6009					13,90	14,00	
1	59+700,00	28/06/2025	6009					57,20	57,00	
1	59+700,00	1/07/2025	6009					34,90	35,00	
1	59+750,00	2/07/2025	6009					28,00	28,00	
1	59+750,00	3/07/2025	6009					14,70	15,00	
1	32+000,00	9/07/2025	6007					219,00	219,00	
1	32+000,00	10/07/2025	6007					116,10	116,00	
1	92+000,00	14/07/2025	6009					111,20	111,00	
1	59+750,00	14/07/2025	6009					55,60	56,00	
1	53+800,00	14/07/2025	6009					97,90	98,00	
1	92+000,00	15/07/2025	6009					152,90	153,00	
1	90+000,00	15/07/2025	6009					55,60	56,00	
1	59+750,00	18/07/2025	6009					83,40	83,00	

TOTAL	1766,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	1766,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	1766,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
211.1	Remoción de Derrumbes	m3		1766,00





















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Versión: 20
Fecha: 12.09.2021

PROYECTO: Transversal Boyaca
TRAMO: Ruta 6006 Alti
TIPO MATERIAL: Derrumbe
FUENTE: Via UBICACIÓN: 68+000
SUBCONTRATISTA: Sudinco
FECHA: 24-06-2025

TIPO DE CONTROL:
- [x] SALIDA
- [ ] LLEGADA
- [ ] INTERNO
- [ ] SUBCONTRATO

1

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	SPJ	231	14.85	14.85	7:30	60+400	
2	SIK	354	14.50	29.35	7:40	"	
3	UFX	632	15.2	44.55	7:50	"	
4	SPJ	231	14.85	59.4	8:30	60+400	
5	SIK	354	14.50	73.9	8:40	60+400	
6	SZV	246	15	88.9	8:50	"	
7	SIK	354	14.50	103.4	9:06	"	
8	UFX	632	15.2	118.6	9:40	"	
9	SPJ	231	14.85	133.45	9:20	"	
10	SZV	246	15	148.45	9:30	"	
11	UFX	632	15.2	163.65	9:40	60+400	
12	SIK	354	14.80	178.15	9:50	60+400	
13	SPJ	231	14.85	193	10:00	"	
14	SZV	246	15	208	10:10	"	
15	UFX	632	15.2	223.2	10:20	"	
16	SPJ	231	14.85	238.05	10:30	"	
17	SIK	354	14.80	252.85	10:40	"	
18	SZV	246	15	267.55	10:50	60+400	
19	SPJ	231	14.85	282.4	11:00	60+400	
20	UFX	632	15.2	297.6	11:10	"	
21	KWZ	487	14.80	312.1	11:20	"	
22	KWZ	349	14.7	326.8	11:30	"	
23	SPJ	231	14.85	341.65	11:40	"	
24	SIK	354	14.50	356.15	11:50	60+400	
25	SZV	246	15	371.15	12:00	"	
26	UFX	632	15.2	386.35	12:10	"	
27	KOK	102	14.5	400.85	12:20	"	
28	SPJ	231	14.85	415.7	12:30	60+400	
29	SIK	354	14.50	430.2	12:40	"	
30	UFX	632	15.2	445.21	12:50	"	
			TOTAL	445.2			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:
Claudia Galindo
Nombre
Cargo Aux. SST

Aprobado por:
Nombre
Cargo

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Versión: 01
Fecha: 16/07/2021

PROYECTO: Transversal Boyaca
TRAMO: Ruta 6006 A174
TIPO MATERIAL: Derrumbe
FUENTE: Via UBICACIÓN: 68+1000
SUBCONTRATISTA: Sudinco
FECHA: 24.06.2025

TIPO DE CONTROL:
- [x] SALIDA
- [ ] LLEGADA
- [ ] INTERNO
- [ ] SUBCONTRATO

1

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	SZV	246	15	15	1:20	60+400	
2	KNZ	487	14.50	29.5	1:30	60+400	
3	KNZ	349	14.7	44.2	1:40	"	
4	KOK	102	14.50	58.7	1:50	"	
5	SPJ	231	14.85	73.55	2:00	"	
6	SIK	354	14.50	88.05	2:10	"	
7	UFX	632	15.2	103.25	2:20	"	
8	SZV	246	15	118.25	2:30	60+400	
9	KNZ	487	14.5	132.75	2:40	60+400	
10	KNZ	349	14.7	147.45	2:50	"	
11	KOK	102	14.50	161.95	3'00	"	
12	SPJ	231	14.85	176.8	3'10	"	
13	SIK	354	14.50	191.3	3:20	"	
14	UFX	632	15.2	206.5	3:30	"	
15	SZV	246	15	221.5	3:40	60+400	
16	KNZ	487	14.50	236	3:50	"	
17	KNZ	349	14.7	250.7	4:00	"	
18	KOK	102	14.50	265.2	4:10	60+400	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
	TOTAL		2652				

- [ ] ESALOJO
- [ ] ATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:
Nombre: Claudia Galindo
Cargo: AUX-SST

Aprobado por:
Nombre: Ever Aguilar
Cargo

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

PROYECTO: Transversal - Boyaca
TRAMO: 6009
TIPO MATERIAL: Remocion de derrumbe
FUENTE: N1A UBICACIÓN: PR 631360
SUBCONTRATISTA: SUDINCO
FECHA: 25 Junio 2025

TIPO DE CONTROL:
- [x] SALIDA
- [ ] LLEGADA
- [ ] MIXTO
- [ ] OTRO: _____

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	KDK108	C4U193	14.7m	14.7m³	9.50	Sc1700	
2	"						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	14.1m			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:
Diana Lopez
Cargo planillera

Aprobado por:
Cargo

U7

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

PROYECTO: Transversal - Baraca
TRAMO: 6009
TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe
FUENTE: N.19 UBICACIÓN: P.R. 60+190
SUBCONTRATISTA: SUDINCO
FECHA: 26 Junio 2025

TIPO DE CONTROL:

SALIDA
LLEGADA
INTERNO
SUBCONTRATO

1

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	SMZ797	CU-196	13.9m³	13.9m³	1:50	56+700	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	13.9m³			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por
Nombre: Diana Lopez
Cargo: planillera

Aprobado por
Nombre: Edwin Agudelo
Cargo:

17

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Código: FOR-CLI-01-Nº
Versión: 00
Fecha: 29/08/2021

PROYECTO: Transversal - Boyacá
TRAMO: 6009
TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe
FUENTE: U/A UBICACIÓN: PR 59+7
SUBCONTRATISTA: SUDINCO
FECHA: 28 Junio 2023

TIPO DE CONTROL:

SALIDA	X
LLEGADA	
INTERNO	
SUBCONTRATO	

1

Nº	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	Nº INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	LCN790	CVU007	13.9m	13.9m	9:00	567+00	
2	LCN790	CVU007	13.9m	27.8m³	10:00	567+00	
3	KDK108	CVU197	14.7m³	42.5m³	11:05	567+00	
4	KDK108	CVU197	14.7m³	57.2m³	12:30	567+00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	57.2m³			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por

Diana Lopez
Nombre
Cargo planillera

Aprobado por

Nombre
Cargo

53

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Código: CO-021-2101
Versión: 00
Fecha: 28/09/2021

PROYECTO: Transversal - Boyacá

TRAMO: 6009

TIPO MATERIAL: Remocion de derrumbe

FUENTE: N/A UBICACIÓN: PR 59+700

SUBCONTRATISTA: SUDINCO

FECHA: 09 Julio 2023

TIPO DE CONTROL:

X	SALIDA
	LLEGADA
	INTERNO
	SUBCONTRATO

1

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m^3)	VOLUMEN ACUMULADO (m^3)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	LPZ434	CVV070	7m³	7m³	8:00	56+700	
2	LPZ434	CVV070	7m³	14m³	11:00	56+700	
3	LCM790	CVV007	13.9m	27.9m³	1:50	56+700	
4	LPZ434	CVV070	7m³	34.9m³	2:40	56+700	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	34.9m³			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por

Nombre: Diana Lopez
Cargo: Planillera

Aprobado por

Nombre: Ever Avellaneda
Cargo:

57

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

PROYECTO: Transversal - Boyacá

TRAMO: 6009

TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe

FUENTE: N/A UBICACIÓN: PR 397+750

SUBCONTRATISTA: SUDINCO

FECHA: 02 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

- [x] SALIDA
- [ ] LLEGADA
- [ ] INTERNO
- [ ] SUBCONTRATO

1

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	LPZ434	C4V000	7m³	7m³	9:00	56+700	
2	LPZ434	C4V030	7m³	14m³	10:20	56+700	
3	LPZ434	C4V030	7m³	21m³	11:05	56+700	
4	LPZ434	C4V030	7m³	28m³	1:40	56+700	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	28m³			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por

Diana Lopez
Nombre
Cargo planillera

Aprobado por

Nombre
Cargo

3

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

PROYECTO: Transversal - Boyaca
TRAMO: 6009
TIPO MATERIAL: Remocion de derrumbe
FUENTE: U/A UBICACIÓN: PR 59+750
SUBCONTRATISTA: SUDINCO
FECHA: 03 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

SALIDA
LLEGADA
INTERNO
SUBCONTRATO

1

Nº	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	Nº INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	KOA	[illegible]	14.3m³	14.3m³	3:00	56+750	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	14.3m³			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:
Diana Lopez
Cargo: planillera

Aprobado por:
Cargo:

57

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Código: FO-021-21-01
Versión: 00
Fecha: 28/09/2021

PROYECTO: Transversal Boyacá
TRAMO: Ruta 6007
TIPO MATERIAL: Derrumbe
FUENTE: Via UBICACIÓN: A 327.000
SUBCONTRATISTA: Sudinco S.A
FECHA: 09/07/2025

TIPO DE CONTROL:

- ☐ SALIDA
- ☐ LLEGADA
- ☐ INTERNO
- ☐ SUBCONTRATO

1

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	KNZ-791		14.6	14.6	8:02	321800	
2	KOK-098		14.9	29,5	8:17	321800	
3	KNZ-487		14.5	44	8:29	321800	
4	KNZ-794		14.4	58,4	8:42	321800	
5	KNZ-484		14.6	75	8:56	321800	
6	KCN-791		14.6	87,6	10:17	321800	
7	KOK-098		14.9	102,5	10:25	321800	
8	KNZ-487		14.5	117	10:36	321800	
9	KNZ-794		14.4	131,4	10:47	321800	
10	KNZ-484		14.6	146	11:15	321800	
11	KCN-791		14.6	160,6	11:30	321800	
12	KOK-098		14.9	175,5	1:06	321800	
13	KNZ-487		14.5	190	1:30	321800	
14	KNZ-794		14.4	204,4	1:48	321800	
15	KNZ-484		14.6	219	2:35	321800	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30			TOTAL	219,m³			

- ☐ DESALOJO
- ☐ MATERIALES PETREOS
- ☐ MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:

Nombre: Yenny Pinzón
Cargo: Planillero

Aprobado por:

Nombre: Erwin Aguilera
Cargo

SUDINCO	GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS FORMATO CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Código: FO-021-021-01 Versión: 00 Fecha: 28/09/2021

PROYECTO: TRANSVERSAL BOYACA

TRAMO: Ruta 6007

TIPO MATERIAL: Derrumbe

FUENTE: Vía UBICACIÓN: 327000

SUBCONTRATISTA: Sudinco S.A

FECHA: 10/07/2025

TIPO DE CONTROL:

- ☒ SALIDA
- ☐ LLEGADA
- ☐ INTERNO
- ☐ SUBCONTRATO

1

N°	VOLQUETA				SALIDA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	KNL-487		14.5	14.5	8:10	571800	
2	KN-791		14.6	29,1	8:25	571800	
3	KNZ-794		14.4	43,5	9:30	571800	
4	KNZ-487		14.5	58	10:02	571800	
5	KN-791		14.6	72,6	10:15	571800	
6	KNZ-794		14.4	87	11:42	571800	
7	KNL-487		14.5	101,5	11:40	571800	
8	KN-791		14.6	116,1	2:30	571800	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	116,1 m³			

- ☐ DESALOJO
- ☐ MATERIALES PETREOS
- ☐ MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:

Nombre Jonny Peña
Cargo Planillero

Aprobado por:

Nombre Ever Aguilar.
Cargo

17

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

TIPO DE CONTROL

PROYECTO
TRAMO
TIPO MATERIAL
FUENTE
SUBCONTRATISTA
FECHA

N°	VIAJE	INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	OBSERVACIONES
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
	TOTAL					

☐ DESMONTE
☐ MATERIALES PÉTREOS
☐ MOVIMIENTOS INTERNOS

Firma
Cargo

Firma
Cargo

SUDINCO	CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Código: FO-071-21-01 Versión: 01 Fecha: 21/09/2021

PROYECTO: Transucursal - Boyacá

TRAMO: 6009

TIPO MATERIAL: 80 Remoción de derrumbe

FUENTE: U.I.R. UBICACIÓN: 59+750

SUBCONTRATISTA: SUDINCO

FECHA: 14 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

✓ SALIDA
LLEGADA
INTERNO
SUBCONTRATO

Nº	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	Nº INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	LCN790	C00001	13.9m³	13.9m³	11:15	951000	
2	KUZ480	C00133	13.9m³	27.8m³	11:30	951000	
3	LCN790	C00001	13.9m³	41.7m³	11:40	951000	
4	KUZ486	C00133	13.9m³	55.6m³	12:00	951000	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	55.6m³			

LM

	DESALOJO
	MATERIALES PETREOS
	MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:

Nombre: Diana Lopez

Cargo: planillera

Aprobado por:

Nombre: Eder Avella

Cargo:

SUDINCO	CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Código: FO-SIG-21-04 Versión: 01 Fecha: 25/09/2021

PROYECTO: Transversal - Boyaca
TRAMO: 6009
TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe
PUENTE: N/A UBICACIÓN: PR 53+800
SUBCONTRATISTA: SUDINCO
FECHA: 14 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

X	SALIDA
	LLEGADA
	INTERNO
	SUBCONTRATO

Nº	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	Nº INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	LCN790	CUU001	13.9m³	13.9m³	7:00	45+800	
2	SOK102	CUU199	14.5m³	28.4m³	7:50	46+000	
3	KN248G	CUU133	13.9m³	42.3m³	8:40	46+800	
4	LCN790	CUU001	13.9m³	56.2m³	9:10	45+000	
5	KN248G	CUU133	13.9m³	70.1m³	10:00	45+000	
6	LCN790	CUU001	13.9m³	84m³	11:00	45+000	
7	KN248G	CUU133	13.9m³	97.9m³	12:00	45+000	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	97.9m³			

	DESALOJO
	MATERIALES PETREOS
	MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:
Diana Lopez
Nombre
Cargo planillero

Aprobado por:
Nombre
Cargo Residente

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Código: [illegible]
Versión: 02
Fecha: [illegible]

PROYECTO: Transversal – Boyacá
TRAMO: 6009
TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe
FUENTE: N/A UBICACIÓN: PR 92+000
SUBCONTRATISTA: SUDINCO
FECHA: 15 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

SALIDA	X
LLEGADA	
INTERNO	
SUBCONTRATO	

Nº	VOLQUETA		VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	Nº INTERNO			HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	LCN390	CVV001	13.9m³	13.9m³	7:40	93+500	
2	KMZ486	CVV133	13.9m³	27.8m³	8:20	93+500	
3	LCN390	CVV001	13.9m³	41.7m³	9:00	93+500	
4	KMZ486	CVV133	13.9m³	55.6m³	9:40	93+500	
5	LCN390	CVV001	13.9m³	69.5m³	10:00	93+500	
6	KMZ486	CVV133	13.9m³	83.4m³	11:20	93+500	
7	LCN390	CVV001	13.9m³	97.3m³	12:00	93+500	
8	LCN390	CVV001	13.9m³	111.2m³	1:20	93+500	
9	KMZ486	CVV133	13.9m³	125.1m³	1:40	93+500	
10	LCN390	CVV001	13.9m³	139m³	2:00	93+500	
11	KMZ486	CVV133	13.9m³	152.9m³	2:15	93+500	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	152.9m³			

UM

	DESALOJO
	MATERIALES PETREOS
	MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:
Nombre: Diego Lopez
Cargo:

Aprobado por:
Nombre:
Cargo:

SUDINCO	CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Código: 110-01-21-01 Versión: 05 Fecha: 25-04-2022

PROYECTO: Transversal - Boyacá
TRAMO: 6000
TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe
FUENTE: N/A UBICACIÓN: PR 90+000
SUBCONTRATISTA: SUDINCO
FECHA: 15 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

X	SALIDA
	LLEGADA
	INTERNO
	SUBCONTRATO

Nº	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	Nº INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	LCN790	CUU001	13.9m³	13.9m³	2:30	971500	
2	KIW486	CUU173	13.9m³	27.8m³	3:00	971500	
3	LCN790	CUU001	13.9m³	41.7m³	3:30	971500	
4	KIW486	CUU173	13.9m³	55.6m³	4:00	971500	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	55.6m³			

LM

	DESALOJO
	MATERIALES PETREOS
	MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:
Diana Lopez
Nombre
Cargo

Aprobado por:
Nombre
Cargo

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Código: FO-021 21 01
Versión: 00
Fecha: 28/09/2021

PROYECTO: Transversal - Boyaca
TRAMO: 6009
TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe
FUENTE: N.A UBICACIÓN: PR 59+950
SUBCONTRATISTA: SUDINCO
FECHA: 18 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

X	SALIDA
	LLEGADA
	INTERNO
	SUBCONTRATO

1

Nº	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	Nº INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	KNZ486	CUU133	13.9m³	13.9m³	11:20	US1000	
2	LCN790	CUU001	13.9m³	27.8m³	9:00	US1000	
3	KNZ486	CUU133	13.9m³	41.7m³	11:00	US1000	
4	LCN790	CUU001	13.9m³	55.6m³	12:00	US1000	
5	KNZ486	CUU133	13.9m³	69.5m³	1:30	US1000	
6	LCN790	CUU001	13.9m³	83.4m³	2:00	US1000	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	83.4m³			

1/1

	DESALOJO
	MATERIALES PETREOS
	MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por

Nombre: Diana Lopez
Cargo: planillera

Aprobado por

Nombre:
Cargo:

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
221.1	Pedraplen compacto	m3	94,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA - SECCIÓN TRANSVERSAL m2(B)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
1	23+926,00	23+926,00	6006	21,80		5,60	0,50	61,04	61,00	Mejoramiento costado derecho Box
1	23+926,00	23+926,00	6006	21,80		3,00	0,50	32,70	33,00	Mejoramiento costado izquierdo Box

TOTAL	94,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	94,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	94,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
221.1	Pedraplen compacto	m3		94,00









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
310.1	Conformación de la calzada existente	m2	657,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ANCHO Promedio (m)		ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	32+800,00	32+890,00	6006	90,00		7,30		657,00	657,00	Conformación para mejorar transitabilidad

TOTAL	657,00
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	657,00
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	657,00

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 60
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
310.1	Conformación de la calzada existente	m2		657,00





RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO — SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
311.1	Afirmado	m3		8000,70

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	SECCIÓN TRANSVERSAL (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	22+070,00	22+080,00	6006	10,00			6,48	35,64	7,10	Construcción capa granular. Avance del 20% de sección de diseño este mes para un avance acumulado de 100%
2	22+080,00	22+090,00	6006	10,00			3,02	47,51	9,50	
2	22+090,00	22+100,00	6006	10,00			0,86	19,43	3,90	
2	22+100,00	22+110,00	6006	10,00			0,50	7,10	1,40	
2	22+110,00	22+120,00	6006	10,00			0,72	6,32	1,30	
2	22+120,00	22+130,00	6006	10,00			0,57	6,54	1,30	
2	22+130,00	22+140,00	6006	10,00			1,61	10,92	2,20	
2	22+140,00	22+150,00	6006	10,00			1,95	17,00	3,40	
2	22+150,00	22+160,00	6006	10,00			0,58	11,98	2,40	
2	22+160,00	22+170,00	6006	10,00			0,44	5,02	1,00	
2	24+150,00	24+160,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	Reemplazo de material de subrasante no competente para garantizar ancho de vía
2	24+160,00	24+170,00	6006	10,00			11,75	61,58	61,60	
2	24+170,00	24+180,00	6006	10,00			12,60	124,58	124,60	
2	24+180,00	24+190,00	6006	10,00			17,72	151,21	151,20	
2	24+190,00	24+200,00	6006	10,00			9,26	135,14	135,10	
2	24+200,00	24+210,00	6006	10,00			8,09	88,03	88,00	
2	24+210,00	24+220,00	6006	10,00			9,46	89,11	89,10	
2	24+220,00	24+230,00	6006	10,00			10,05	98,71	98,70	
2	24+230,00	24+240,00	6006	10,00			12,34	113,28	113,30	
2	24+240,00	24+250,00	6006	10,00			10,38	115,38	115,40	
2	24+250,00	24+260,00	6006	10,00			8,62	97,80	97,80	
2	24+260,00	24+270,00	6006	10,00			6,68	79,32	79,30	
2	24+270,00	24+280,00	6006	10,00			6,59	69,20	69,20	
2	24+280,00	24+290,00	6006	10,00			5,88	65,18	65,20	
2	24+290,00	24+300,00	6006	10,00			3,45	50,54	50,50	
2	24+490,00	24+500,00	6006	10,00			25,69	170,05	170,10	Reemplazo de material de subrasante no competente para garantizar ancho de vía
2	24+500,00	24+510,00	6006	10,00			71,30	484,95	485,00	
2	24+510,00	24+520,00	6006	10,00			49,44	603,70	603,70	
2	24+520,00	24+530,00	6006	10,00			34,93	421,85	421,90	
2	24+530,00	24+540,00	6006	10,00			7,87	214,00	214,00	
2	24+540,00	24+550,00	6006	10,00			6,63	72,50	72,50	
2	24+550,00	24+560,00	6006	10,00			3,05	48,40	48,40	
2	24+560,00	24+570,00	6006	10,00			7,36	52,05	52,10	
2	24+570,00	24+580,00	6006	10,00			4,70	60,30	60,30	
2	24+580,00	24+590,00	6006	10,00			3,95	43,25	43,30	
2	24+590,00	24+600,00	6006	10,00			3,57	37,60	37,60	
2	24+600,00	24+610,00	6006	10,00			0,00	17,85	17,90	
2	24+610,00	24+620,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	
2	24+620,00	24+630,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	
2	24+630,00	24+640,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	
2	24+640,00	24+650,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	
2	24+650,00	24+660,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	
2	24+660,00	24+670,00	6006	10,00			6,66	33,30	33,30	
2	24+670,00	24+680,00	6006	10,00			6,62	66,40	66,40	
2	24+680,00	24+690,00	6006	10,00			10,92	87,70	87,70	
2	24+690,00	24+700,00	6006	10,00			6,59	87,55	87,60	
2	24+700,00	24+710,00	6006	10,00			0,00	32,95	33,00	
2	24+710,00	24+720,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	
2	24+720,00	24+730,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	
2	24+730,00	24+740,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	
2	24+740,00	24+750,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	
2	24+750,00	24+760,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	
2	24+760,00	24+770,00	6006	10,00			8,15	40,75	40,80	
2	24+770,00	24+780,00	6006	10,00			9,49	88,20	88,20	
2	24+780,00	24+790,00	6006	10,00			14,27	118,80	118,80	
2	24+790,00	24+800,00	6006	10,00			13,85	140,60	140,60	
2	24+800,00	24+810,00	6006	10,00			18,36	161,06	161,10	
2	24+810,00	24+820,00	6006	10,00			18,14	182,50	182,50	
2	24+820,00	24+830,00	6006	10,00			17,26	177,01	177,00	
2	24+830,00	24+840,00	6006	10,00			17,22	172,40	172,40	
2	24+840,00	24+850,00	6006	10,00			15,89	165,57	165,60	
2	24+850,00	24+860,00	6006	10,00			15,37	156,31	156,30	
2	24+860,00	24+870,00	6006	10,00			12,83	141,01	141,00	
2	24+870,00	24+880,00	6006	10,00			13,55	131,93	131,90	
2	24+880,00	24+890,00	6006	10,00			11,47	125,12	125,10	
2	24+890,00	24+900,00	6006	10,00			12,37	119,23	119,20	
2	24+900,00	24+910,00	6006	10,00			11,66	120,17	120,20	
2	24+910,00	24+920,00	6006	10,00			11,57	116,15	116,20	
2	24+920,00	24+930,00	6006	10,00			10,61	110,92	110,90	
2	24+930,00	24+940,00	6006	10,00			11,63	111,23	111,20	
2	24+940,00	24+950,00	6006	10,00			12,75	121,90	121,90	
2	24+950,00	24+960,00	6006	10,00			11,43	120,90	120,90	

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
311.1	Afirmado	m3	8000,70	

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	SECCIÓN TRANSVERSAL (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	24+460,00	24+540,00	6006					-699,20	-699,20	Descuento liquidación por topografía. Cantidad cobrada en acta N°47
2	24+780,00	24+960,00	6006					-829,00	-829,00	Descuento liquidación por topografía. Cantidad cobrada en acta N°48
2	25+010,00	25+020,00	6006	10,00			0,00	0,00	0,00	
2	25+020,00	25+030,00	6006	10,00			10,64	51,39	51,40	
2	25+030,00	25+040,00	6006	10,00			7,96	89,76	89,80	
2	25+040,00	25+050,00	6006	10,00			7,12	72,75	72,80	
2	25+050,00	25+060,00	6006	10,00			5,60	62,13	62,10	
2	25+060,00	25+070,00	6006	10,00			8,19	68,95	69,00	
2	25+070,00	25+080,00	6006	10,00			8,25	82,17	82,20	
2	25+080,00	25+090,00	6006	10,00			13,04	106,45	106,50	
2	25+090,00	25+100,00	6006	10,00			13,42	132,33	132,30	
2	25+100,00	25+110,00	6006	10,00			12,50	129,61	129,60	
2	25+110,00	25+120,00	6006	10,00			9,08	107,87	107,90	
2	25+120,00	25+130,00	6006	10,00			10,37	97,24	97,20	Reemplazo de material de subrasante no competente para garantizar ancho de vía
2	25+130,00	25+140,00	6006	10,00			7,13	87,53	87,50	
2	25+140,00	25+150,00	6006	10,00			6,46	67,96	68,00	
2	25+150,00	25+160,00	6006	10,00			7,67	70,65	70,70	
2	25+160,00	25+170,00	6006	10,00			10,86	92,68	92,70	
2	25+170,00	25+180,00	6006	10,00			9,01	99,36	99,40	
2	25+180,00	25+190,00	6006	10,00			13,40	112,03	112,00	
2	25+190,00	25+200,00	6006	10,00			20,71	170,55	170,60	
2	25+200,00	25+210,00	6006	10,00			25,26	229,85	229,90	
2	25+210,00	25+220,00	6006	10,00			15,96	206,10	206,10	
2	25+220,00	25+230,00	6006	10,00			13,07	145,15	145,20	
2	25+230,00	25+240,00	6006	10,00			13,37	132,20	132,20	
2	26+160,00	26+170,00	6006	10,00			4,38	70,94	14,20	
2	26+170,00	26+180,00	6006	10,00			2,23	33,05	6,60	
2	26+180,00	26+190,00	6006	10,00			1,64	19,34	3,90	Construcción capa granular. Avance del 20% de sección de diseño este mes para un avance acumulado de 100%
2	26+190,00	26+200,00	6006	10,00			0,26	9,50	1,90	
2	26+200,00	26+210,00	6006	10,00			0,32	2,93	0,60	
2	26+210,00	26+220,00	6006	10,00			0,95	6,39	1,30	
2	26+460,00	26+470,00	6006	10,00			0,48	7,25	1,50	
2	26+470,00	26+480,00	6006	10,00			0,47	5,06	1,00	
2	26+480,00	26+490,00	6006	10,00			0,89	7,29	1,50	
2	26+490,00	26+500,00	6006	10,00			0,74	8,80	1,80	
2	26+500,00	26+510,00	6006	10,00			0,79	8,28	1,70	
2	26+510,00	26+520,00	6006	10,00			0,63	7,11	1,40	
2	26+520,00	26+530,00	6006	10,00			0,68	6,58	1,30	
2	26+530,00	26+540,00	6006	10,00			0,63	6,56	1,30	
2	26+540,00	26+550,00	6006	10,00			0,93	7,83	1,60	
2	26+550,00	26+560,00	6006	10,00			1,33	11,30	2,30	
2	26+560,00	26+570,00	6006	10,00			2,04	16,82	3,40	
2	26+570,00	26+580,00	6006	10,00			2,33	21,85	4,40	
2	26+580,00	26+590,00	6006	10,00			2,41	24,07	4,80	
2	26+590,00	26+600,00	6006	10,00			2,28	26,66	5,30	
2	26+600,00	26+610,00	6006	10,00			0,32	14,81	3,00	Construcción capa granular. Avance del 20% de sección de diseño este mes para un avance acumulado de 100%
2	26+610,00	26+620,00	6006	10,00			0,01	1,85	0,40	
2	26+620,00	26+630,00	6006	10,00			0,00	0,08	0,00	
2	26+630,00	26+640,00	6006	10,00			0,05	0,22	0,00	
2	26+640,00	26+650,00	6006	10,00			0,11	0,81	0,20	
2	26+650,00	26+660,00	6006	10,00			0,56	3,33	0,70	
2	26+660,00	26+670,00	6006	10,00			1,03	7,93	1,60	
2	26+670,00	26+680,00	6006	10,00			3,70	23,66	4,70	
2	26+680,00	26+690,00	6006	10,00			6,01	48,82	9,80	
2	26+690,00	26+700,00	6006	10,00			3,15	45,88	9,20	
2	26+700,00	26+710,00	6006	10,00			2,12	26,04	5,20	
2	26+710,00	26+720,00	6006	10,00			1,62	18,40	3,70	
2	26+720,00	26+730,00	6006	10,00			2,37	19,81	4,00	
2	26+730,00	26+740,00	6006	10,00			1,49	19,31	3,90	
2	26+740,00	26+750,00	6006	10,00			2,98	22,35	4,50	
2	26+750,00	26+760,00	6006	10,00			0,45	17,11	3,40	
2	26+960,00	26+970,00	6006	10,00			0,26	4,35	0,90	
2	26+970,00	26+980,00	6006	10,00			0,31	2,86	0,60	Construcción capa granular. Avance del 20% de sección de diseño este mes para un avance acumulado de 100%
2	26+980,00	26+990,00	6006	10,00			0,46	3,85	0,80	
2	26+990,00	27+000,00	6006	10,00			0,85	6,56	1,30	
2	27+070,00	27+080,00	6006	10,00			10,00	148,90	148,90	
2	27+080,00	27+090,00	6006	10,00			1,52	57,57	57,60	

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
311.1	Afirmado	m3	8000,70	

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	SECCIÓN TRANSVERSAL (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	27+090,00	27+100,00	6006	10,00			0,26	8,87	8,90	Construcción capa granular. Avance del 100% de sección de diseño este mes.
2	27+100,00	27+110,00	6006	10,00			0,91	5,85	5,90	
2	27+110,00	27+120,00	6006	10,00			0,47	6,91	6,90	
2	27+120,00	27+130,00	6006	10,00			0,94	7,04	7,00	
2	27+130,00	27+140,00	6006	10,00			1,09	10,14	10,10	
2	27+140,00	27+150,00	6006	10,00			2,12	16,03	16,00	
2	27+150,00	27+160,00	6006	10,00			1,13	16,23	16,20	
2	27+160,00	27+170,00	6006	10,00			0,96	10,48	10,50	
2	27+170,00	27+180,00	6006	10,00			0,02	4,93	4,90	
2	22+850,00	22+880,00	6006	30,00	10,88	0,85		277,31	105,40	Avance del 38% de las actividades este mes, para un avance acumulado de la actividad igual a 100%
2	22+880,00	22+900,00	6006	20,00	10,88	0,85		184,88	37,00	Avance del 20% de las actividades este mes, para un avance acumulado de la actividad igual a 100%
2	50+324,00	50+333,00	6007	9,00	2,20	1,50		29,70	29,70	Lleno para anden

TOTAL	8000,7
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	8000,7
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	8000,7

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	8000,70
311.1	Afirmado	m3		











INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	8000,70
311.1	Afirmado	m3		














RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

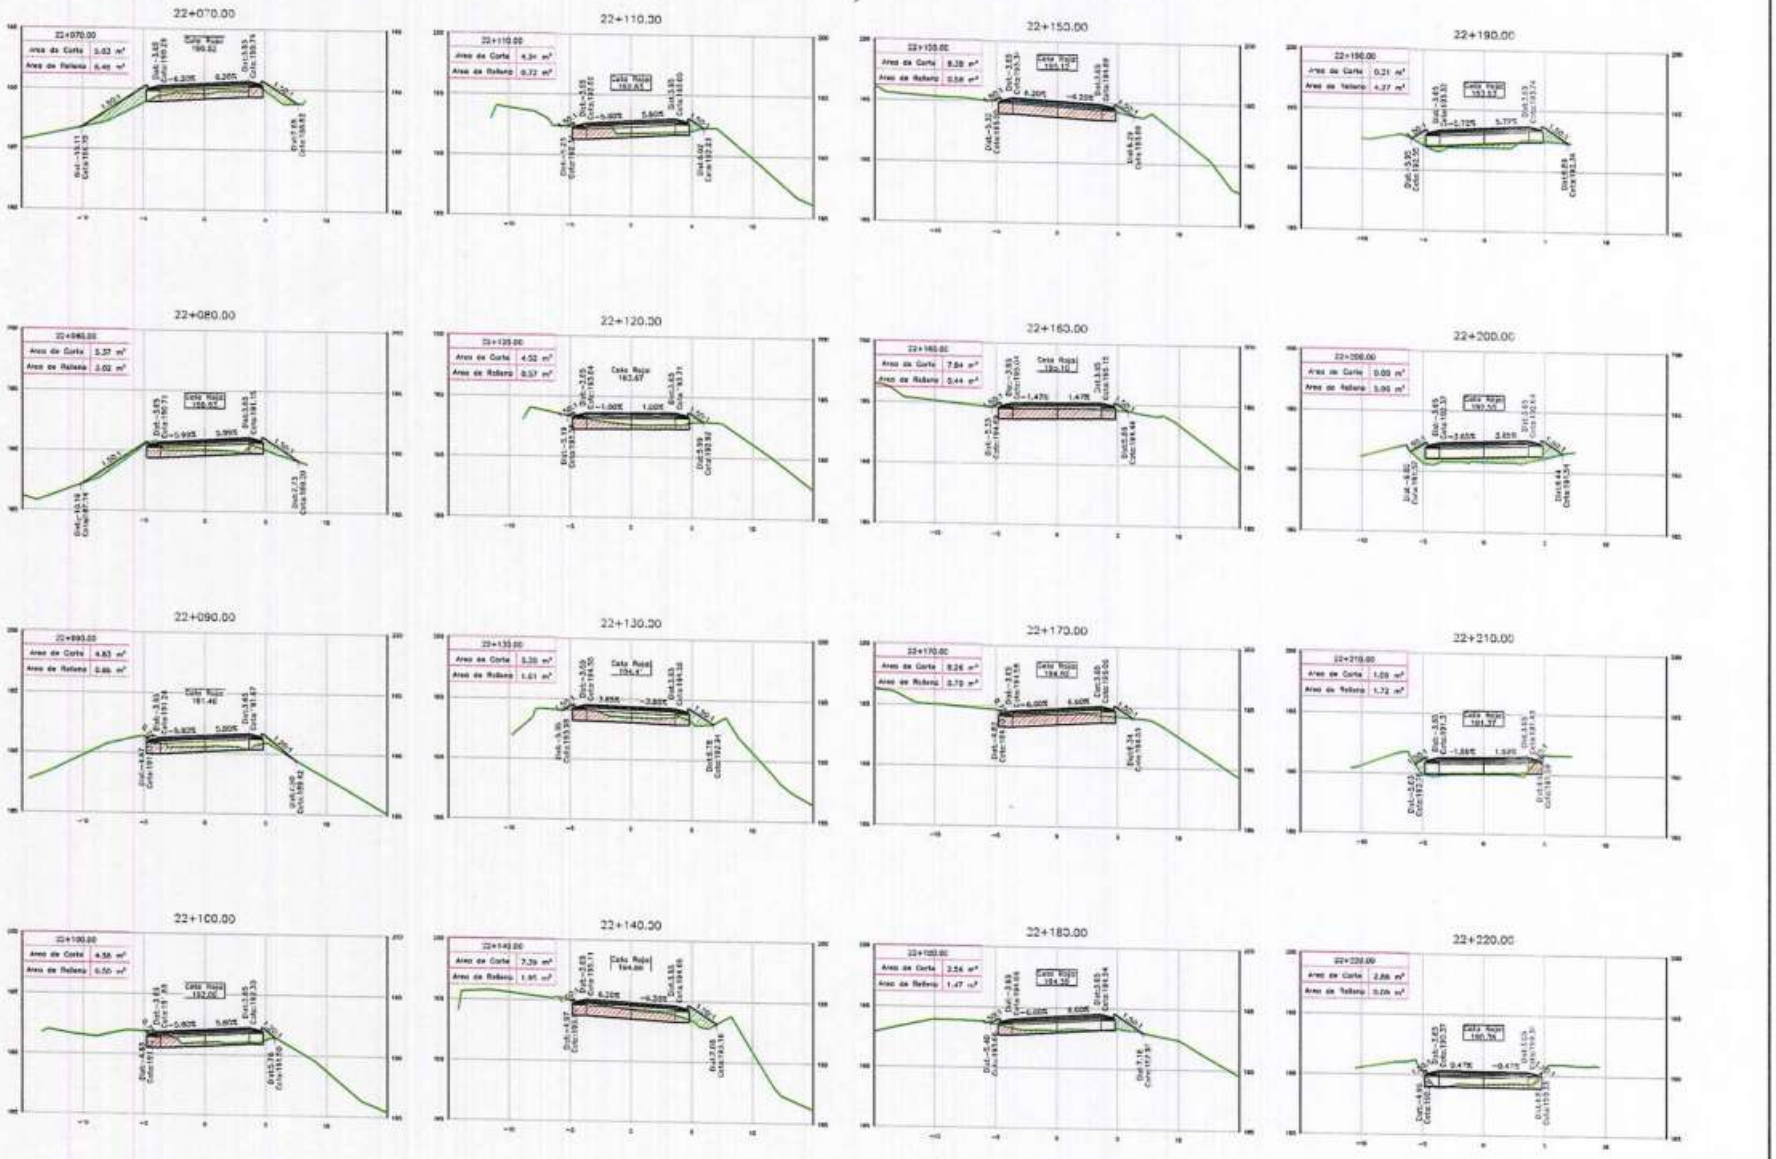

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ – OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ – PACO) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VIGENCIA 2020" MODULO 3"

DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6006

SECCIÓN TRANSVERSAL – MEJORAMIENTO


PR23+070 A PR23+220

SUDINCO

O.F.B. SAS Consultores

010

47

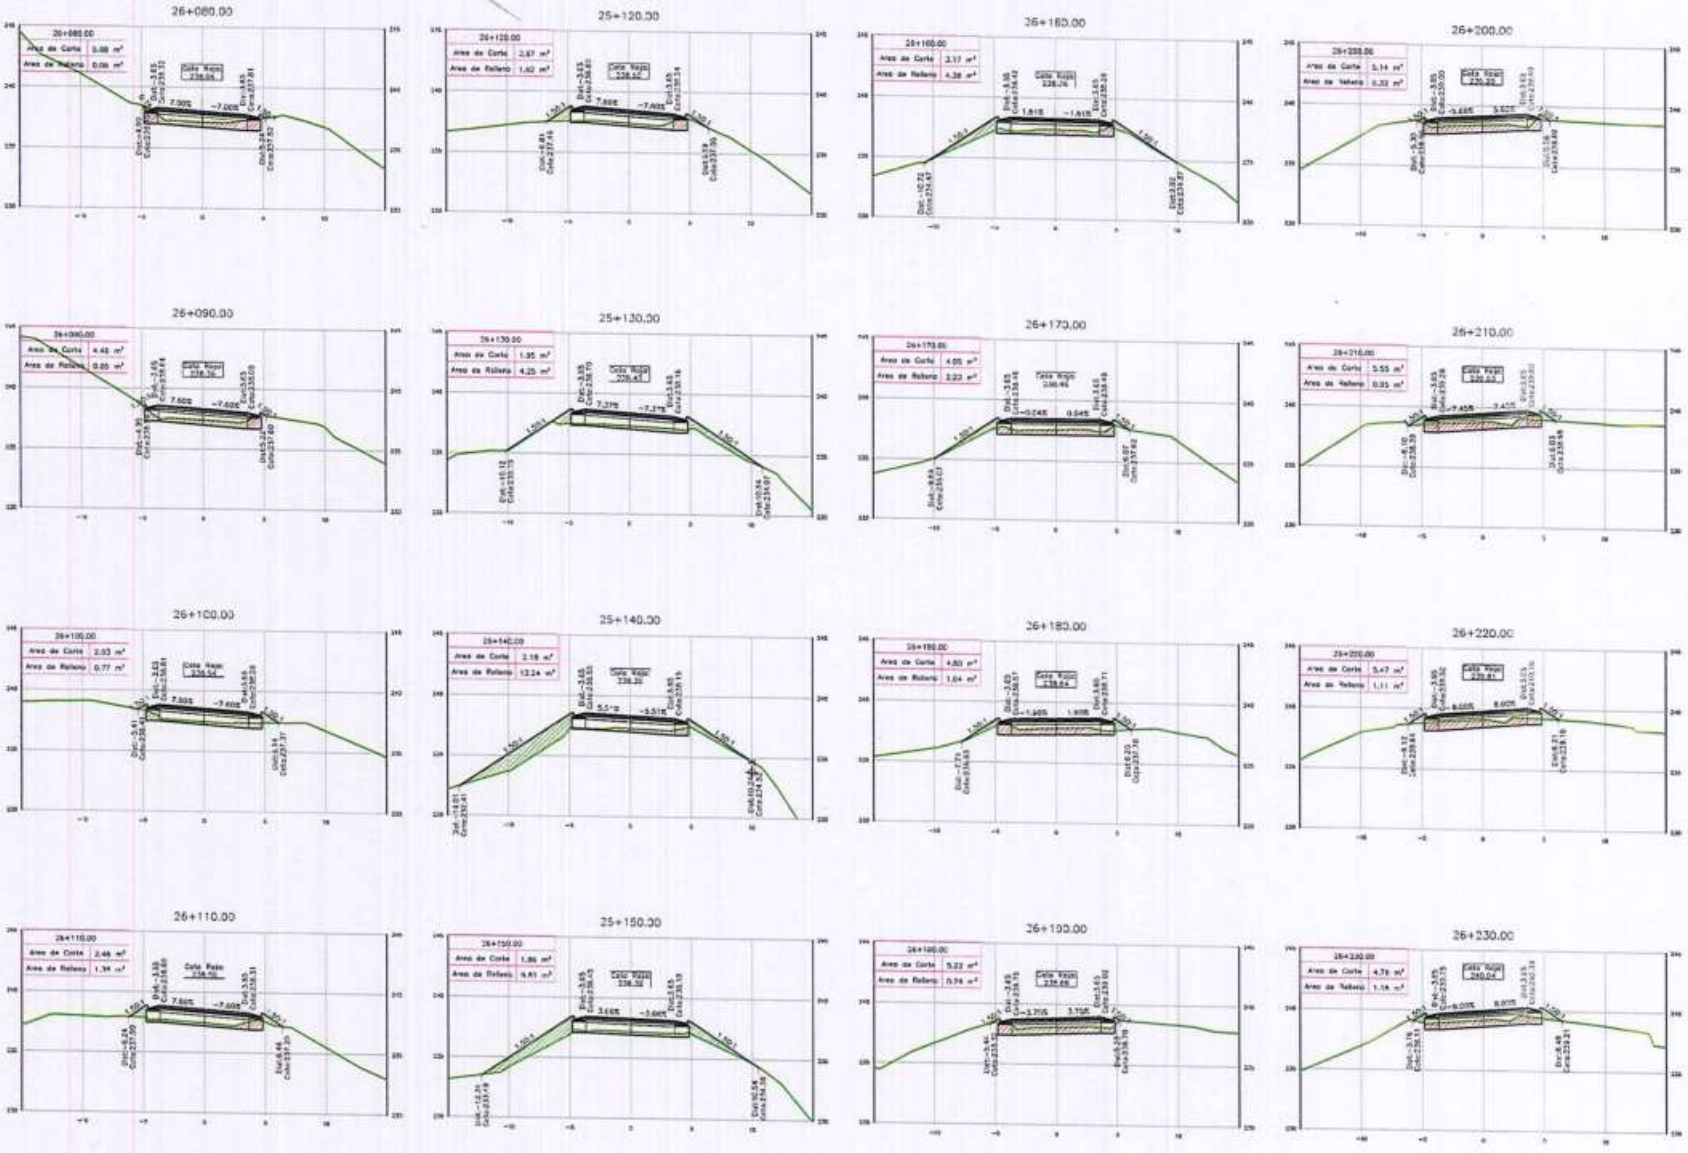

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUENTE BOYACÁ – STANCHIC – CHIQUINQUIRÁ – PAIPA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS YING PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VIGENCIA 2020" MODULO 3"


DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6006
SECCION TRANSVERSAL - MEJORAMIENTO
PR26+080 A PR26+230

SUDINCO

D.F.B. SAS Consultores

039

2

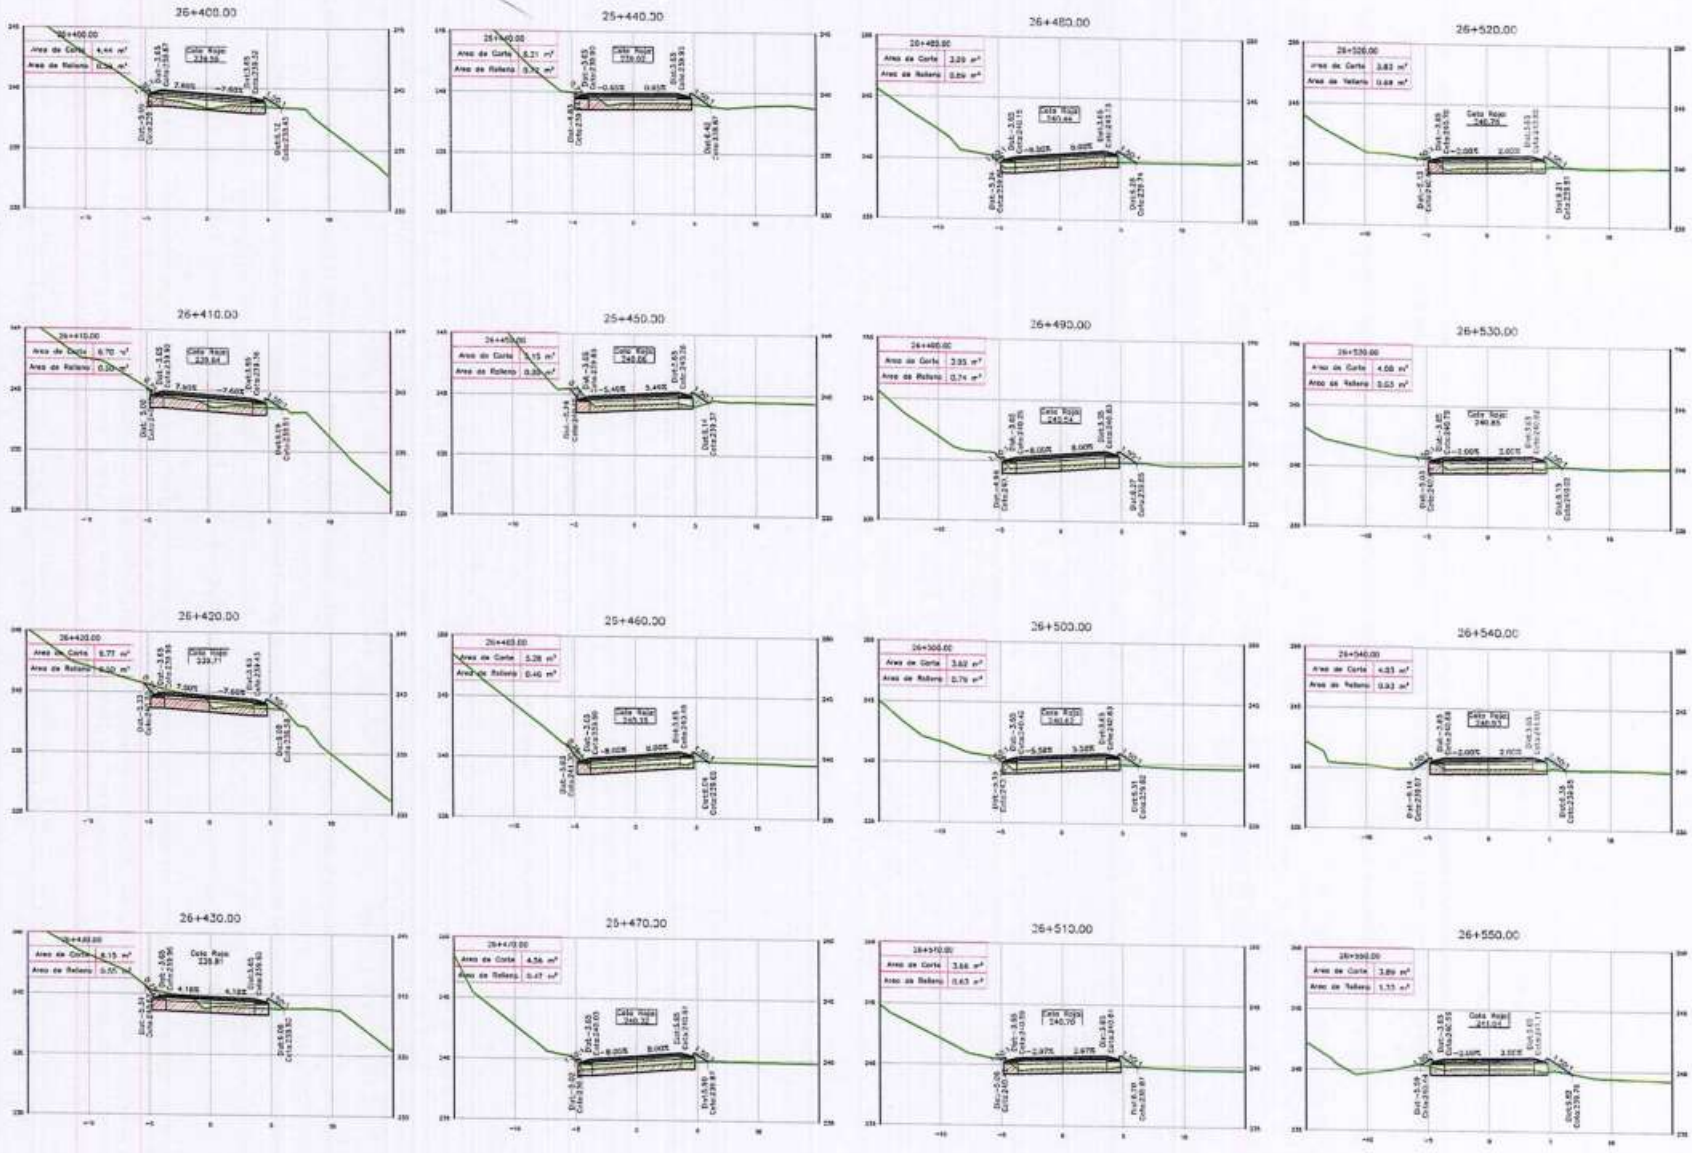


MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUENTE BOYACA – TUNCHE – CHIQUINQUIRA – PAIPA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAPUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VIGIAN 2020" MODULO 3".

DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6008
SECCION TRANSVERSAL + MEJORAMIENTO
PR26+400 A PR26+550

SUDINCO

O.F.B. SAS Consultores

4

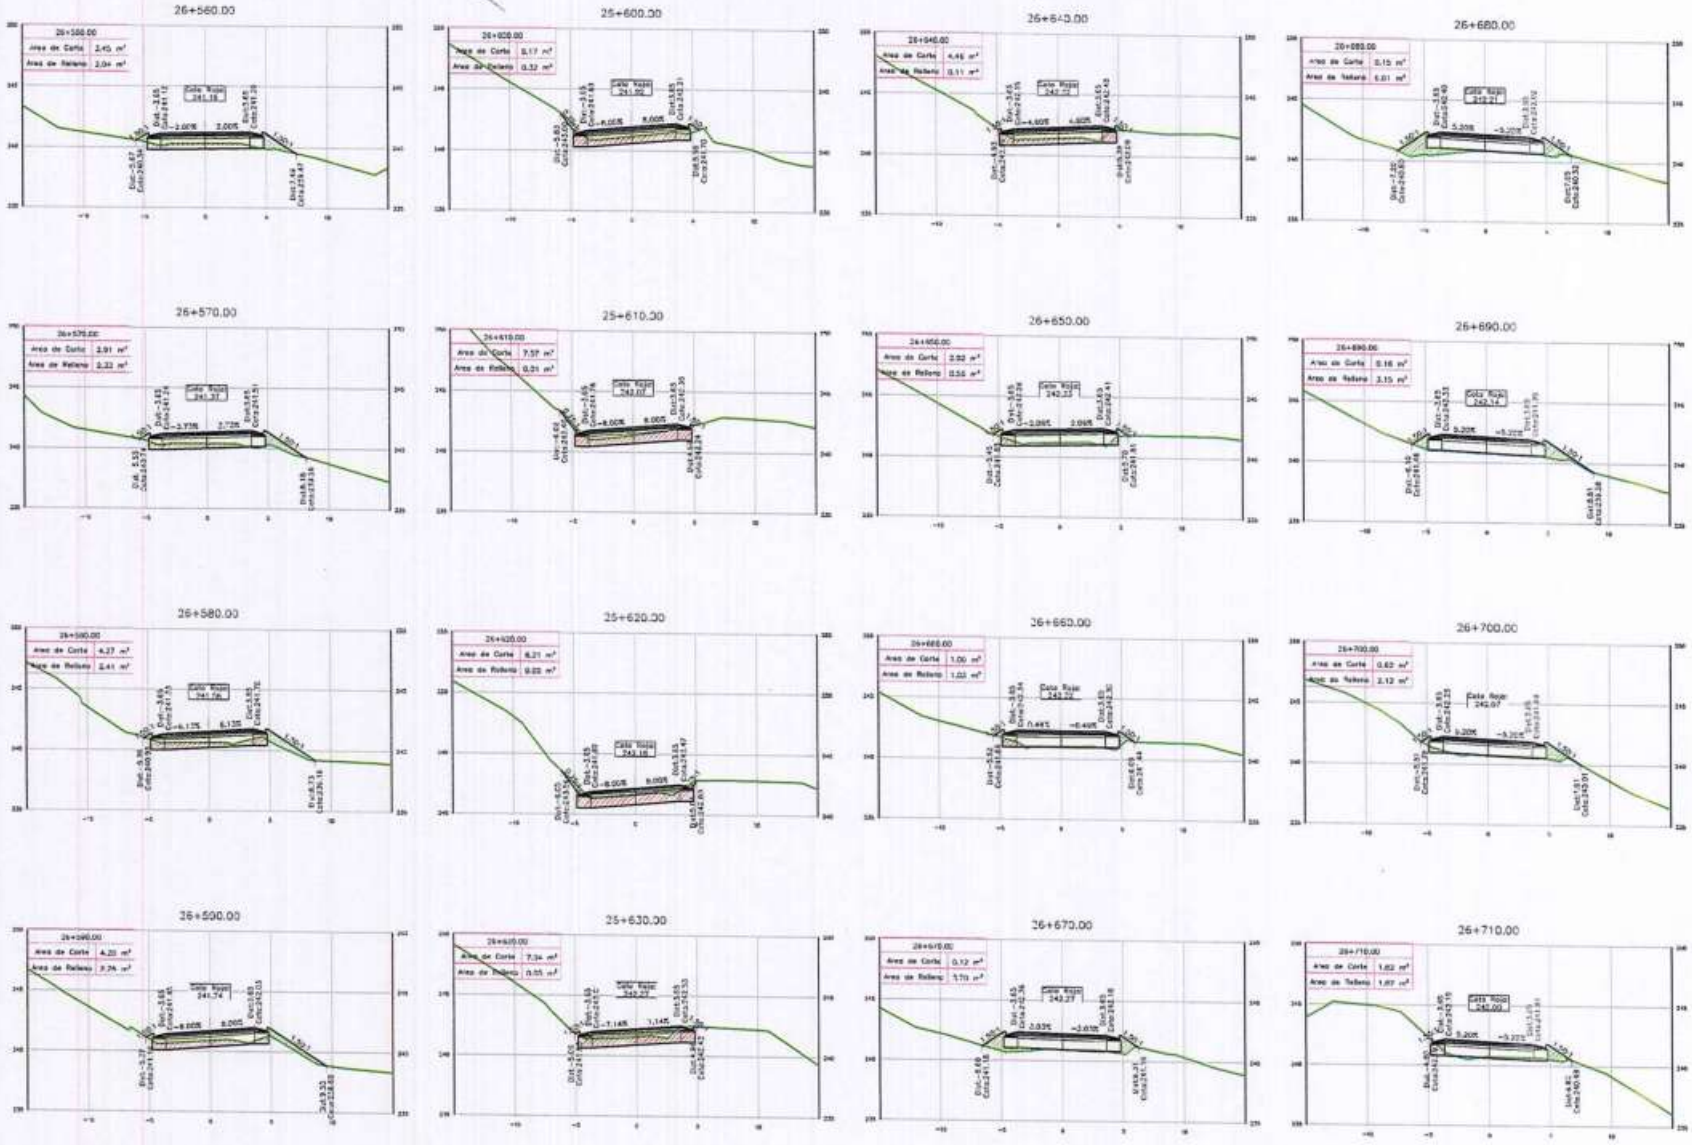


MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ – CHIQUINQUIRÁ – PAIPA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE DESARROLLO "MAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3".


DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 5008
SECCIÓN TRANSVERSAL – MEJORAMIENTO
PR26+560 A PR26+710

SUDINCO


D.F.R. SAS Consultores


4







































MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUENTE BOYACÁ – CHIVOR – GUACAMAYERA – PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISEM 2020" MODULO 3"

DISEÑO GEOMETRICO RUTA 6000

SECCION TRANSVERSAL - MEJORAMIENTO


PR26+720 A PR26+870

SUDINCO

D.F.R. SAS Consultores

S40

4

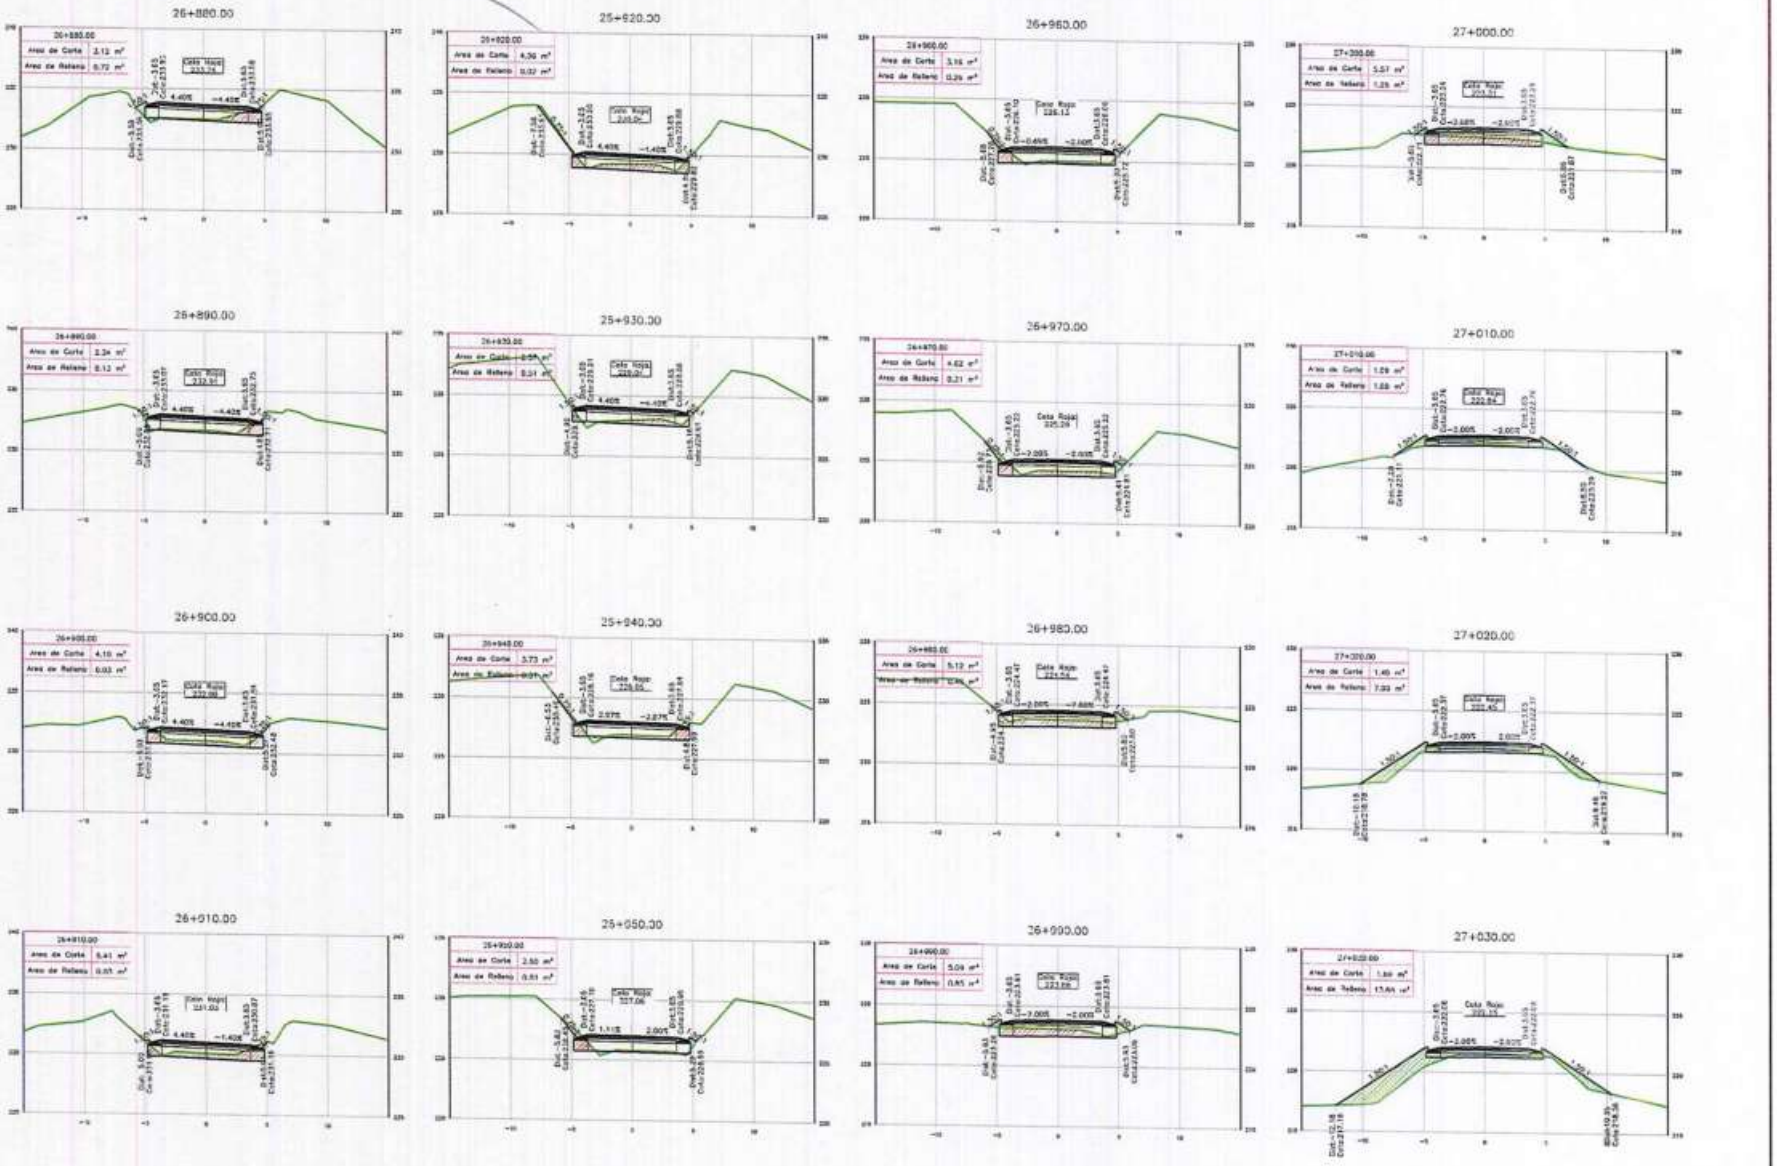

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUENTO BOYACÁ – TUNCHE – GHIQUIZAMA – PAUZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISEM 3320" MODULO 3"

DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 0309


SECCIÓN TRANSVERSAL - MEJORAMIENTO


PR09+092 A PR27+030

SUDINCO


O.F.B. SAS Consultores


041






























REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ – SOATÁ – CHIQUINQUIRÁ – PAIPA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONCESIONES 4G PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2032" MODULO 3"

DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6006
SECCIÓN TRANSVERSAL - MEJORAMIENTO
PR27+040 A PR27+150

SUDINCO

O.F.B. SAS Consultores


042

4


27+160.00




27+200.00




27+240.00




27+280.00




27+170.00



27+210.00




27+250.00




27+290.00



27+180.00




27+220.00



27+260.00




27+300.00



27+190.00



27+230.00



27+270.00



27+310.00



MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ – TUNCHE – CHIQUINQUIRÁ – PAIPA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CORAFUDELA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3".


DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6006
SECCION TRANSVERSAL + MEJORAMIENTO
PR07+160 A PR07+310

SUDINCO


O.F.B. SAS
Consultores

040


24+150.00

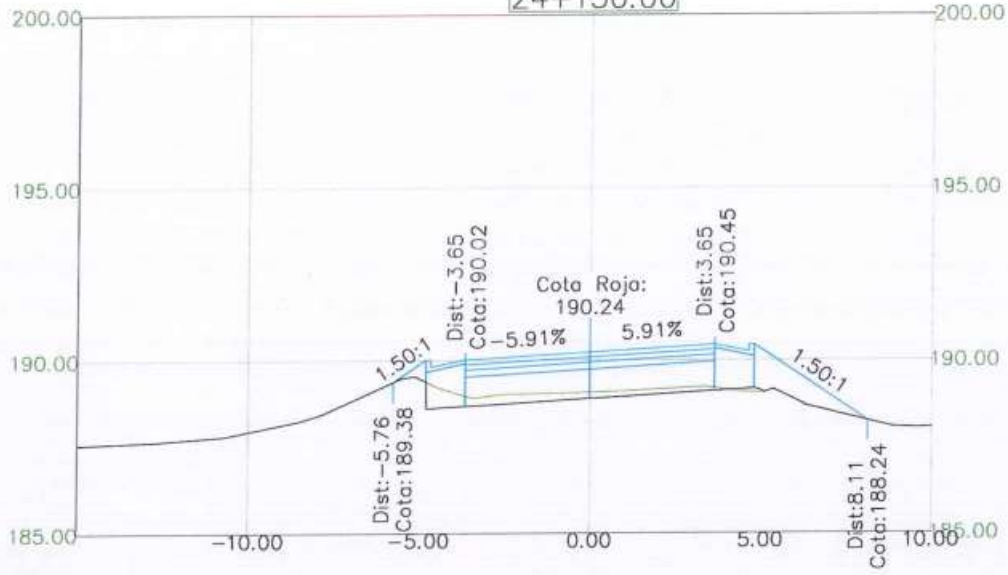

24+160.00

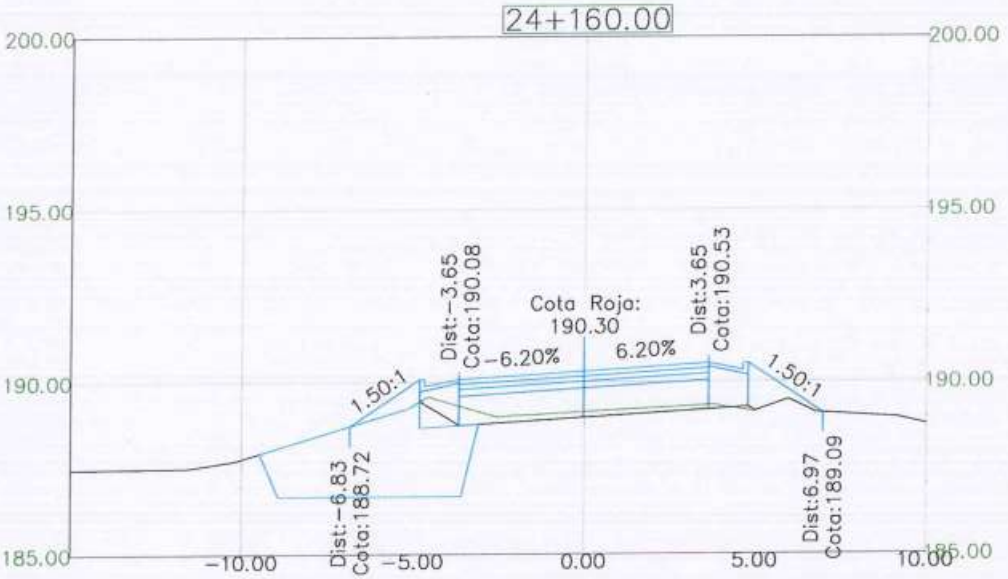

24+170.00

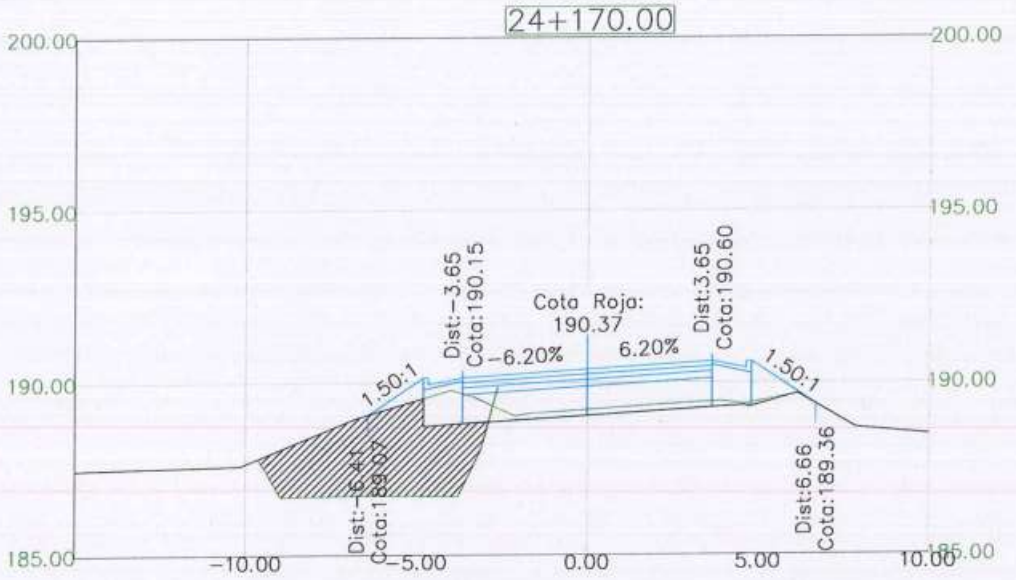


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


1 - 30

19-07-2025


24+180.00

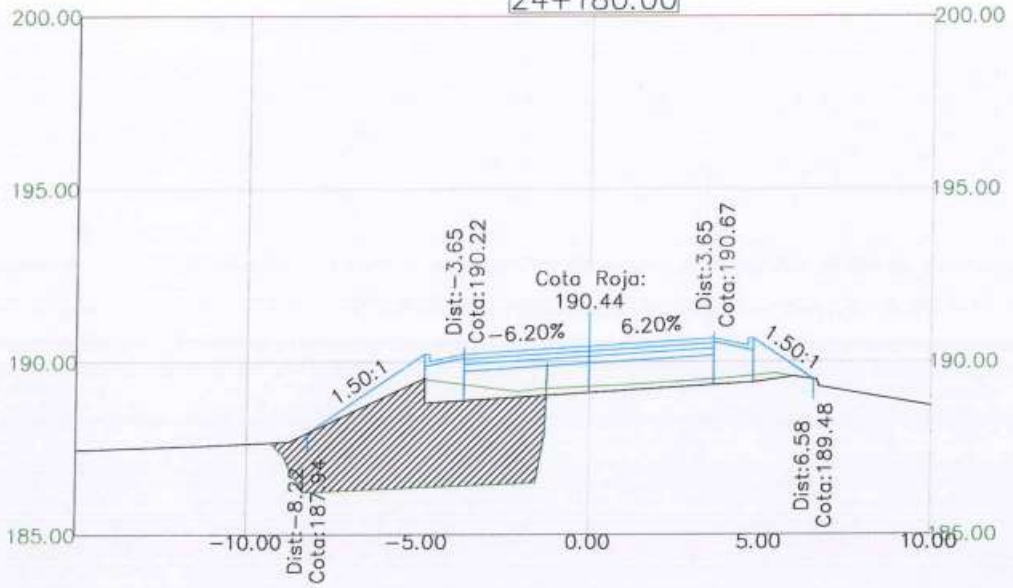

24+190.00

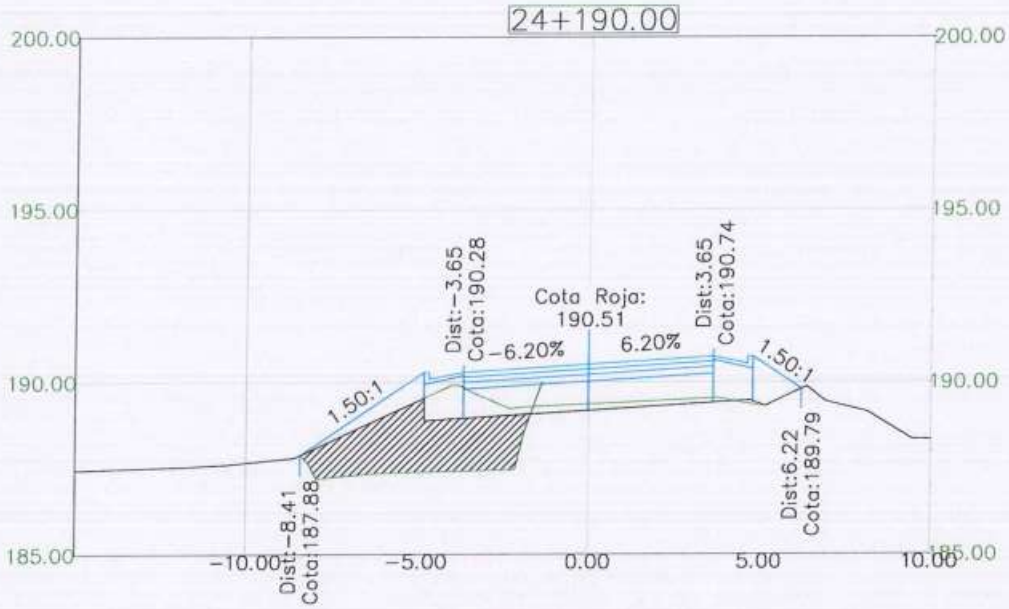

24+200.00

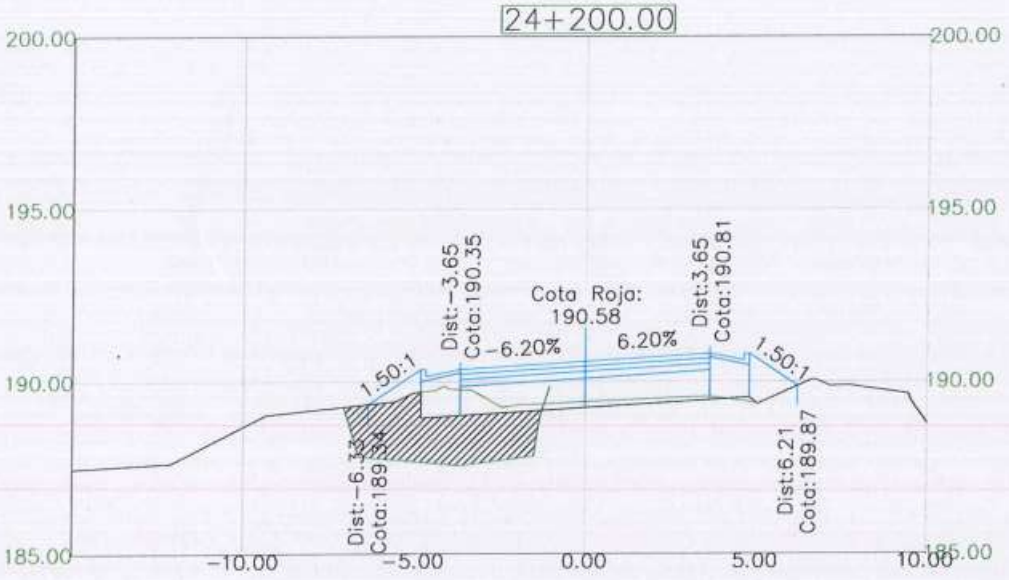


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJES BAJA


2 -30

18-07-2025


24+210.00

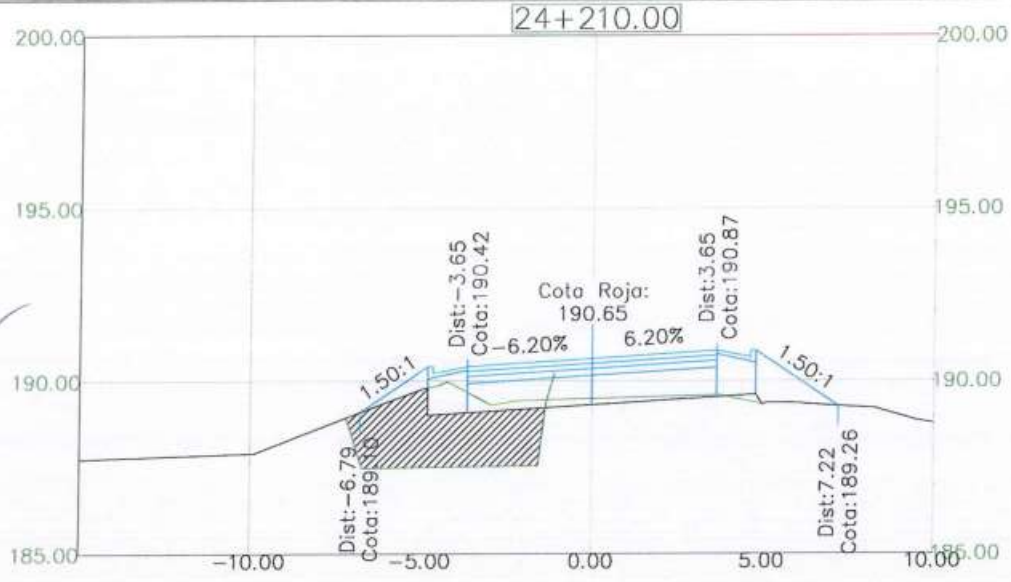

24+220.00

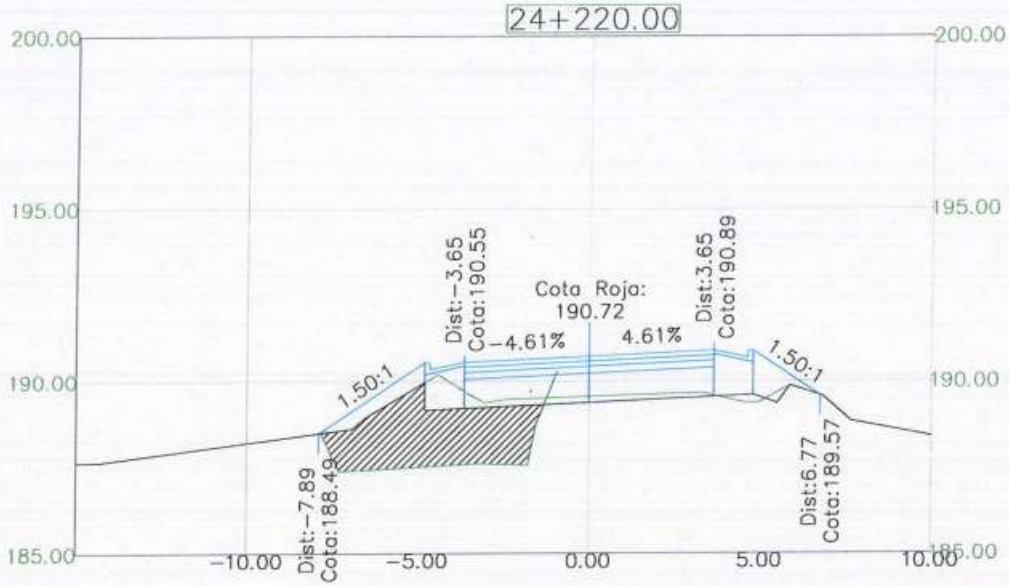

24+230.00

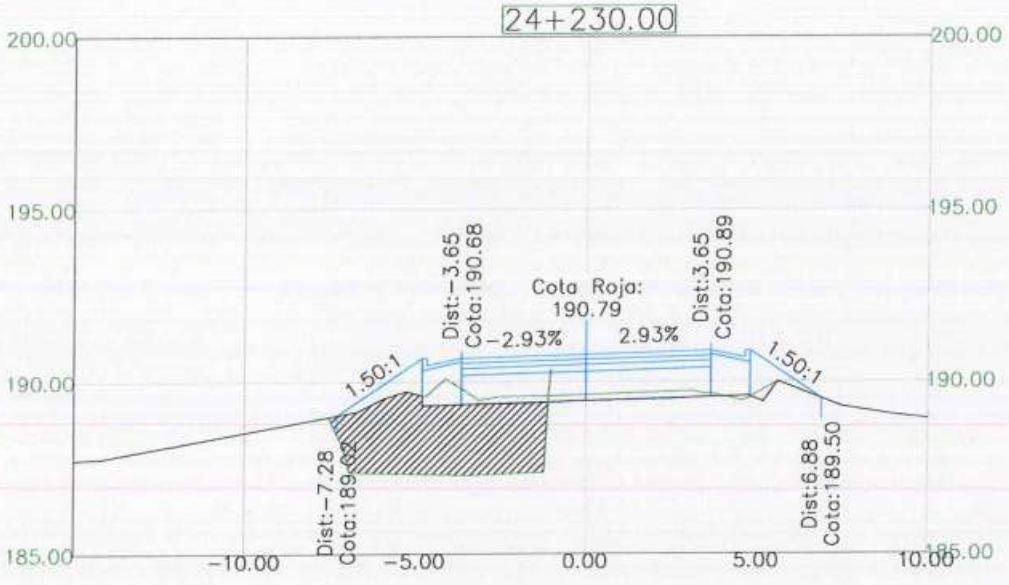


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


3 -30

18-07-2025


24+240.00

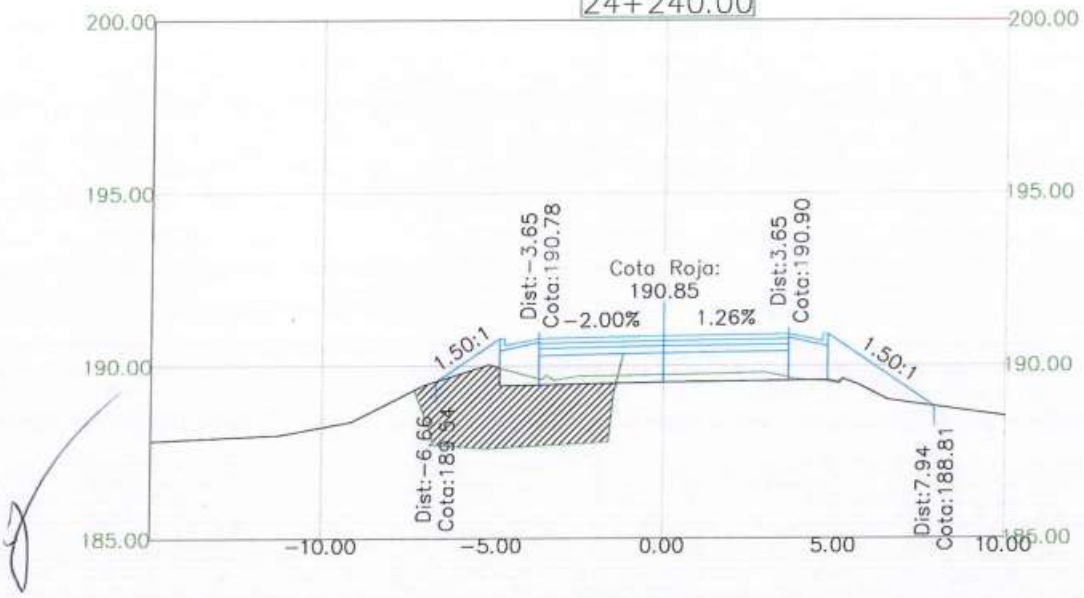

24+250.00

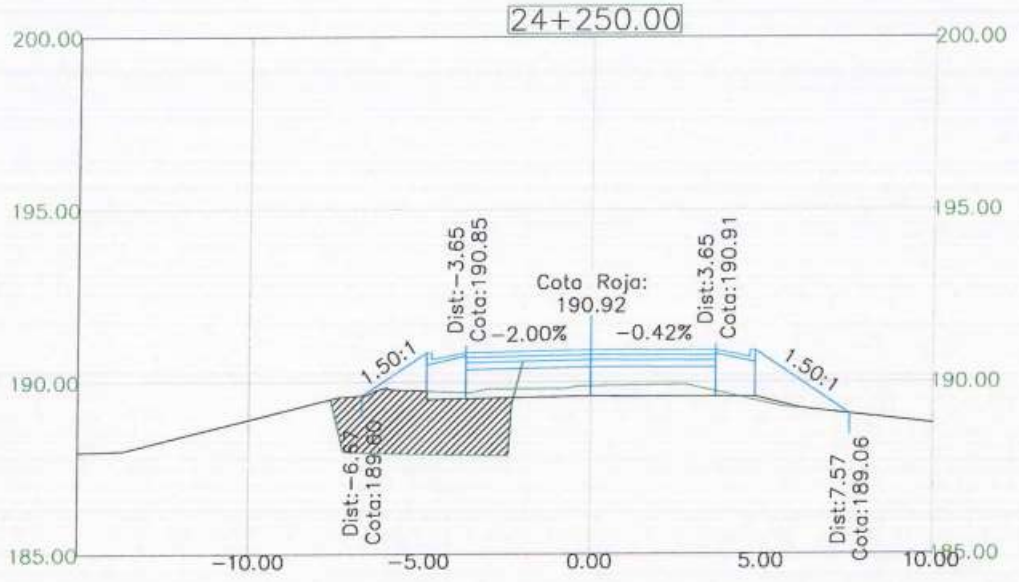

24+260.00

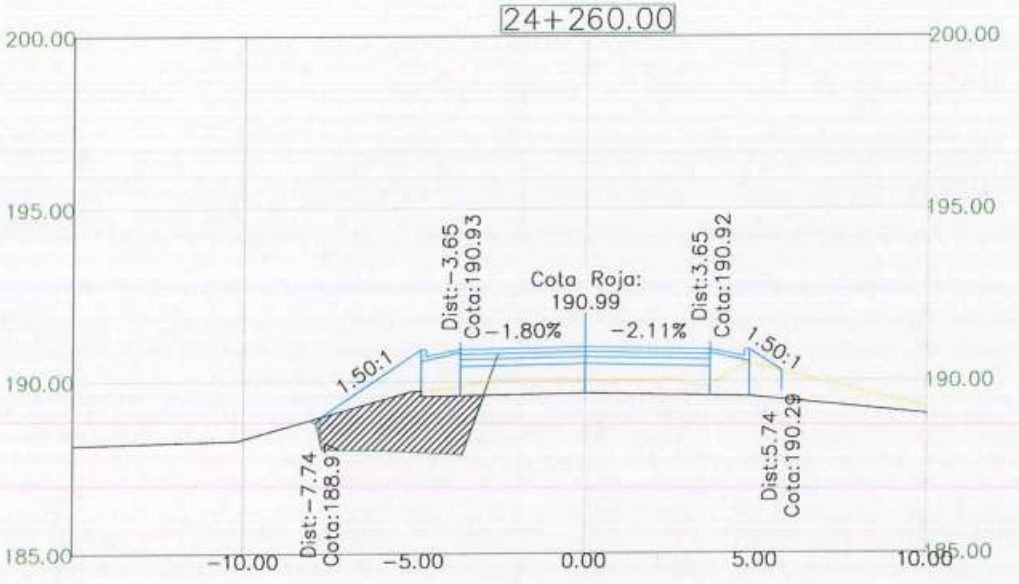


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE 2 RAMA


4 -30

18-07-2005


24+270.00

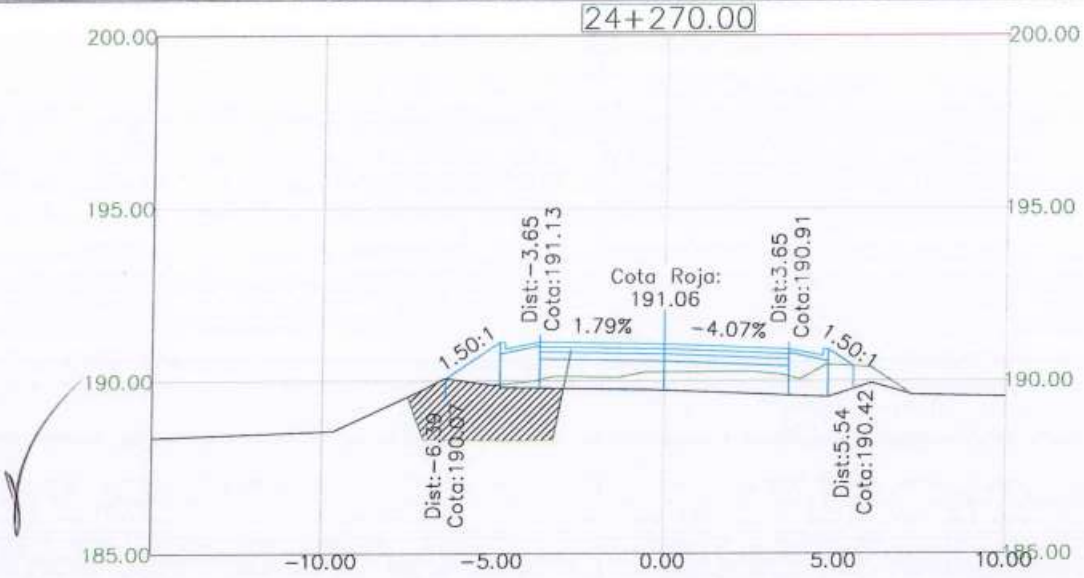



24+280.00

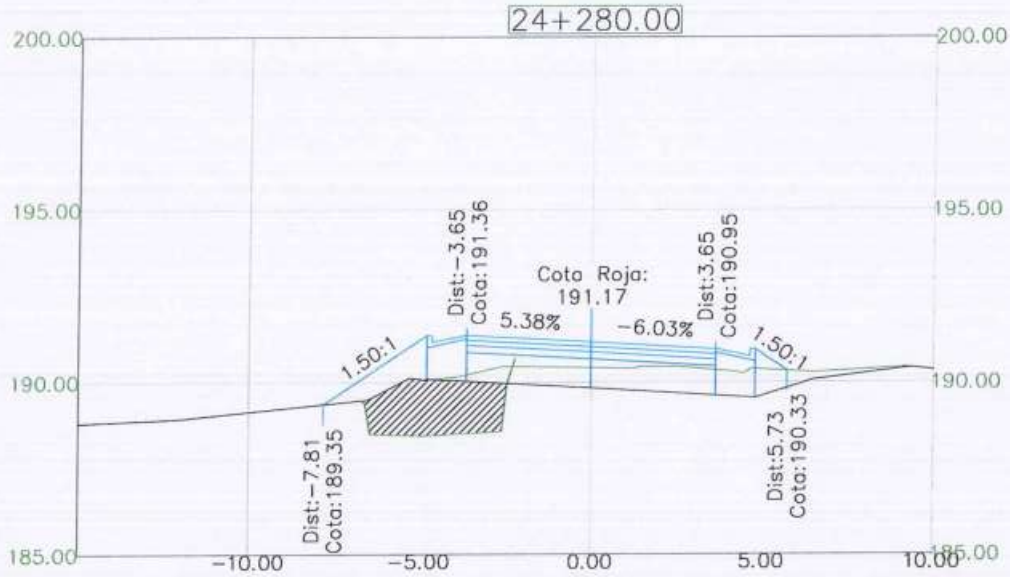

24+290.00

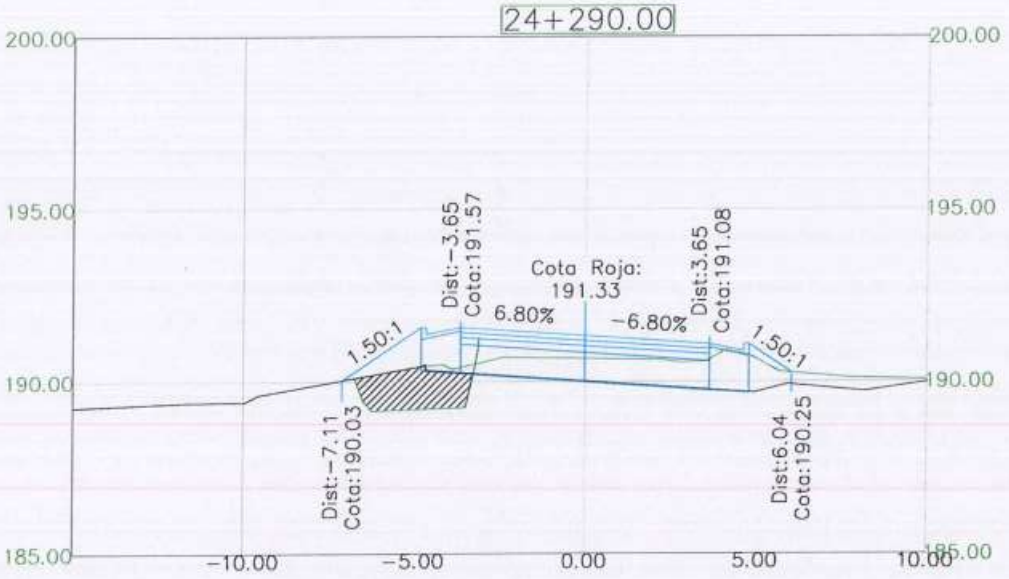

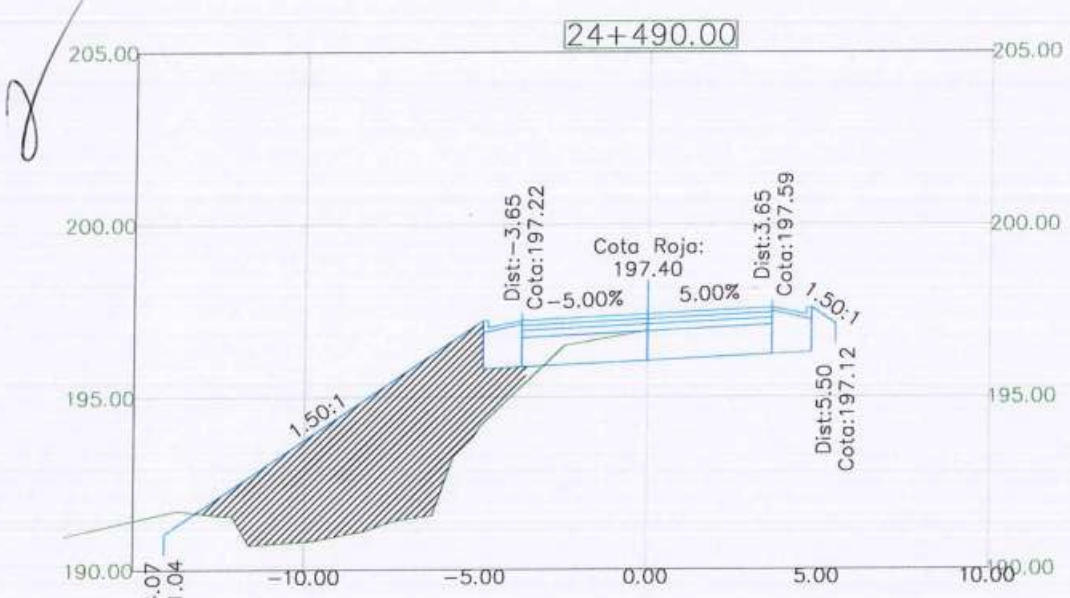

24+490.00
205.00
200.00
195.00
190.00
Dist:-3.65
Cota:197.22
Cota Roja:
197.40
Dist:3.65
Cota:197.59
-5.00%
5.00%
1.50:1
1.50:1
Dist:5.50
Cota:197.12
Dist:-14.07
Cota:191.04
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00

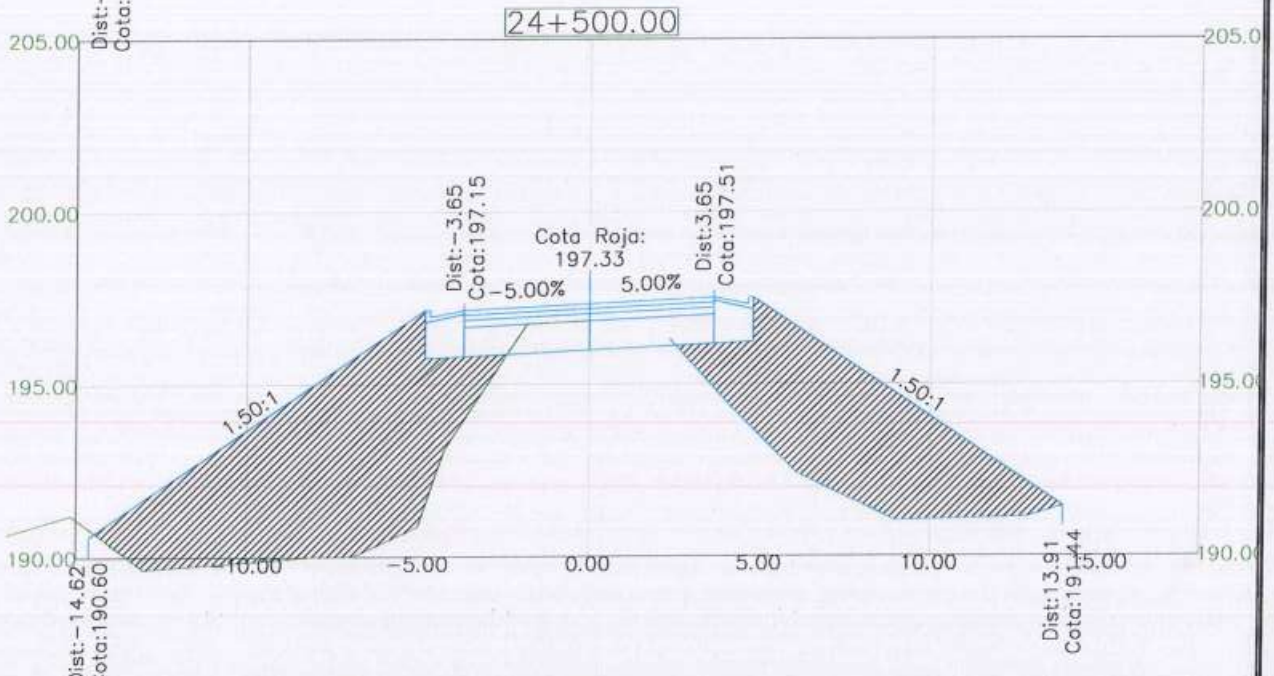
24+500.00
205.00
200.00
195.00
190.00
Dist:-3.65
Cota:197.15
Cota Roja:
197.33
Dist:3.65
Cota:197.51
-5.00%
5.00%
1.50:1
1.50:1
Dist:-14.62
Cota:190.60
Dist:13.91
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00


SUDINCO

6 -30


24+510.00

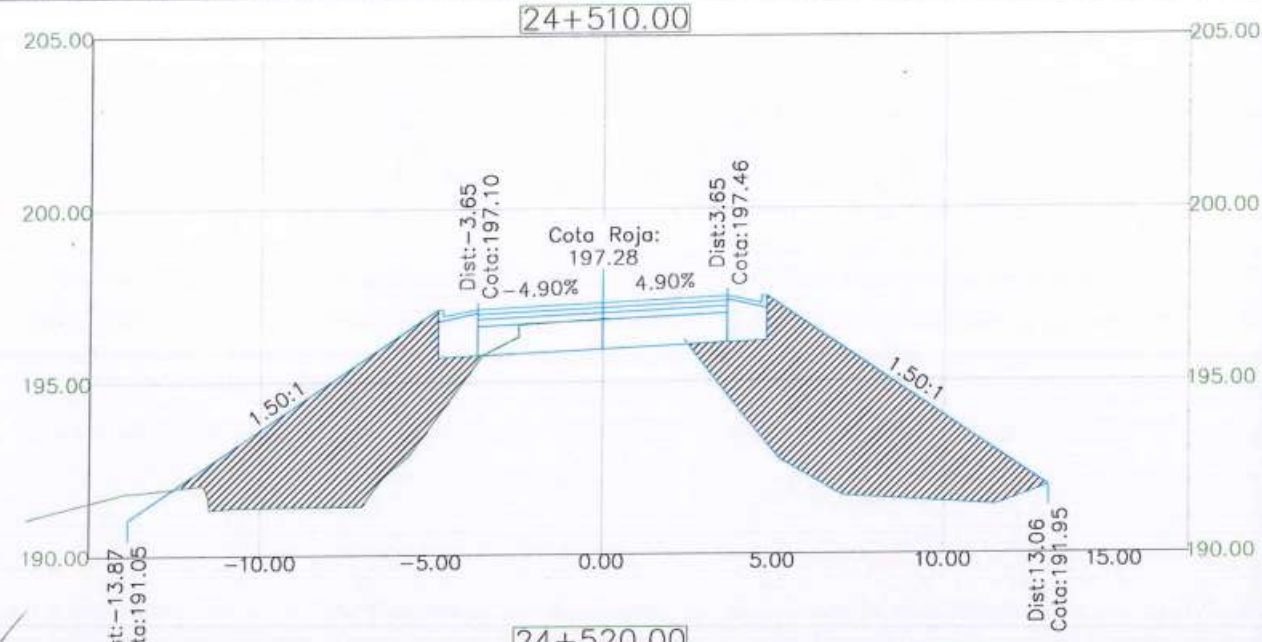

24+520.00

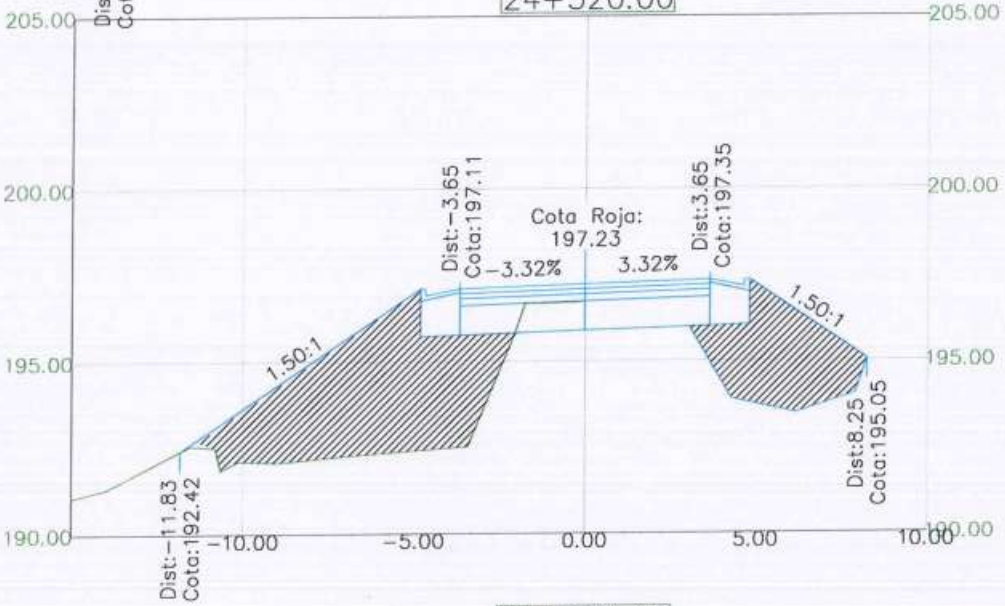

24+530.00

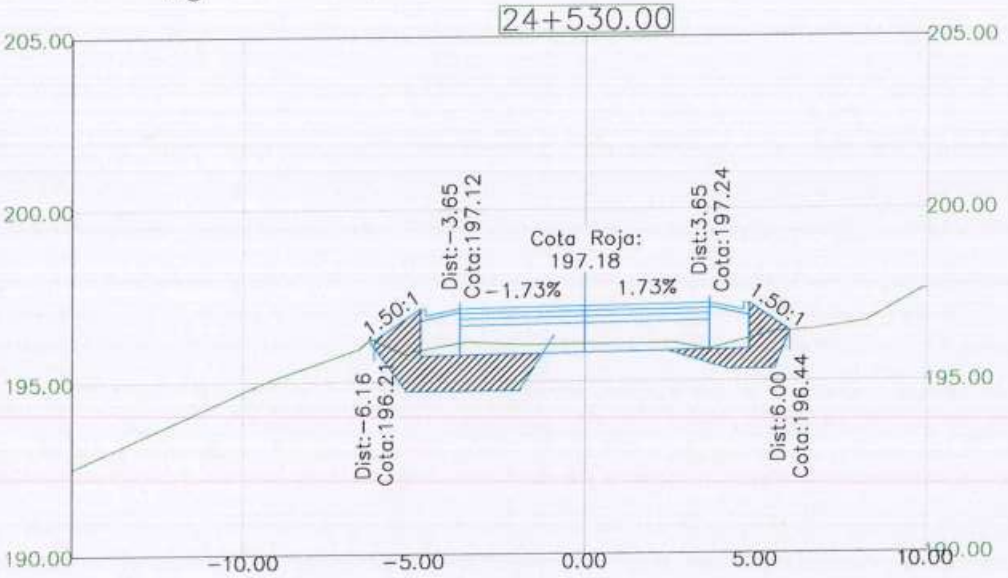



SUDINCO


SECCIONES TRANSVERSALES
EJES B-LA

7 - 30


18-07-2025

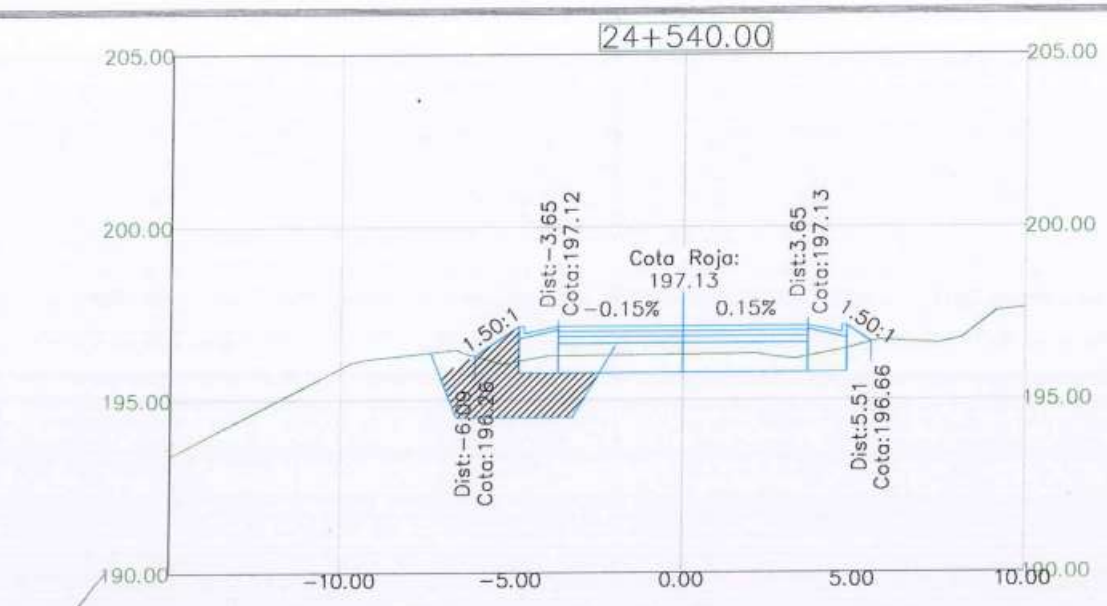
24+540.00
205.00
200.00
195.00
190.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Cota Roja:
197.13
-0.15%
0.15%
1.50:1
1.50:1
Dist:-3.65
Cota:197.12
Dist:3.65
Cota:197.13
Dist:-6.09
Cota:196.26
Dist:5.51
Cota:196.66

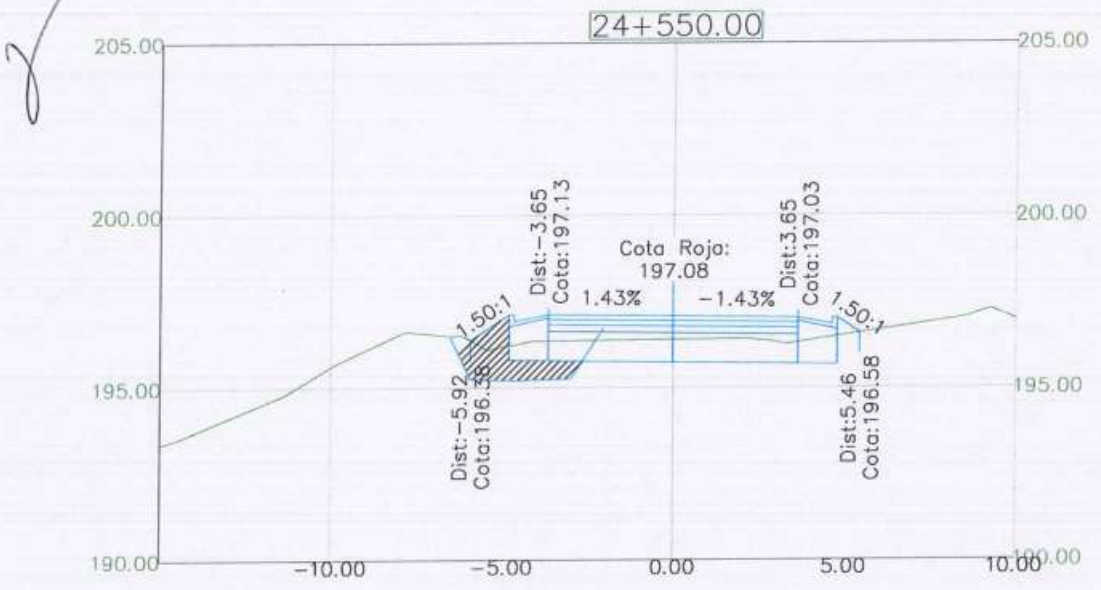

24+550.00
205.00
200.00
195.00
190.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Cota Roja:
197.08
1.43%
-1.43%
1.50:1
1.50:1
Dist:-3.65
Cota:197.13
Dist:3.65
Cota:197.03
Dist:-5.92
Cota:196.38
Dist:5.46
Cota:196.58

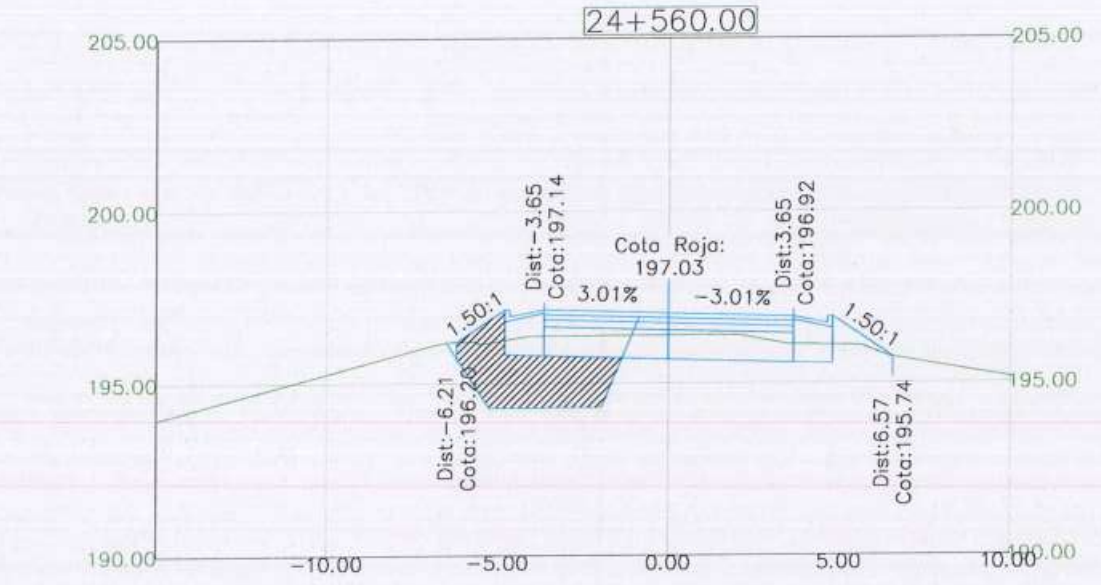
24+560.00
205.00
200.00
195.00
190.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Cota Roja:
197.03
3.01%
-3.01%
1.50:1
1.50:1
Dist:-3.65
Cota:197.14
Dist:3.65
Cota:196.92
Dist:-6.21
Cota:196.26
Dist:6.57
Cota:195.74


24+570.00

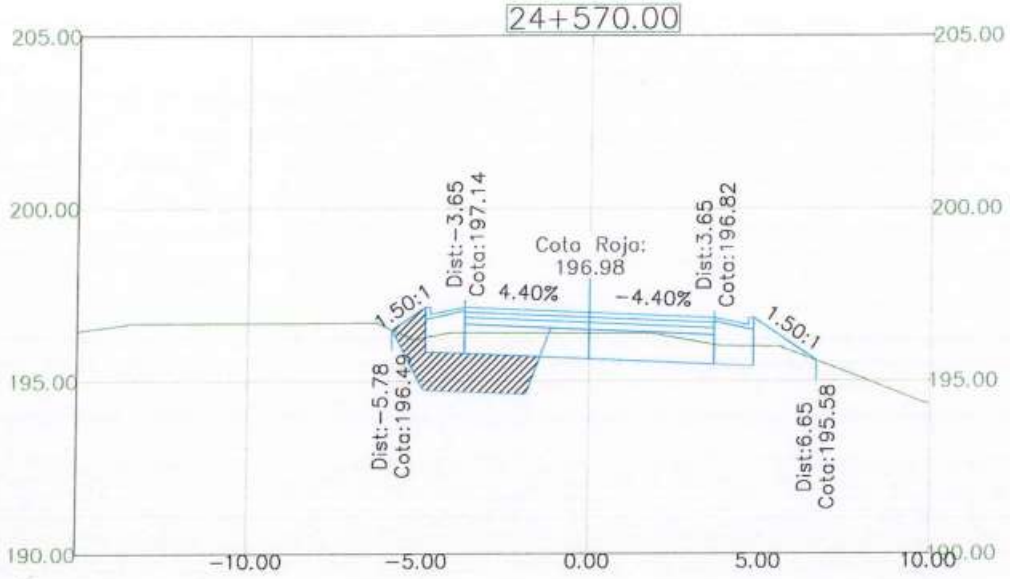

24+580.00

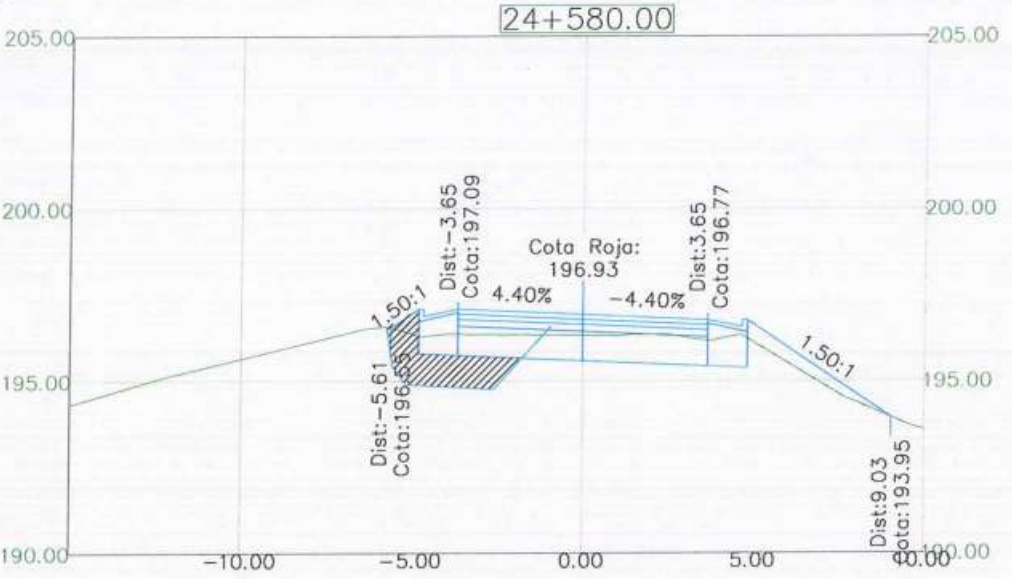


24+590.00

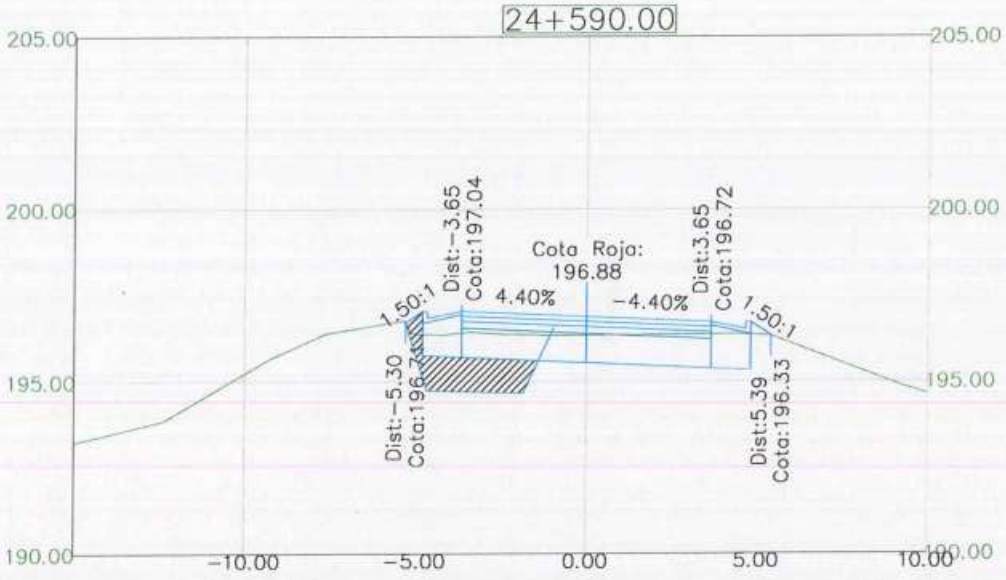



SUDINCO

9 -30

18-07-2025

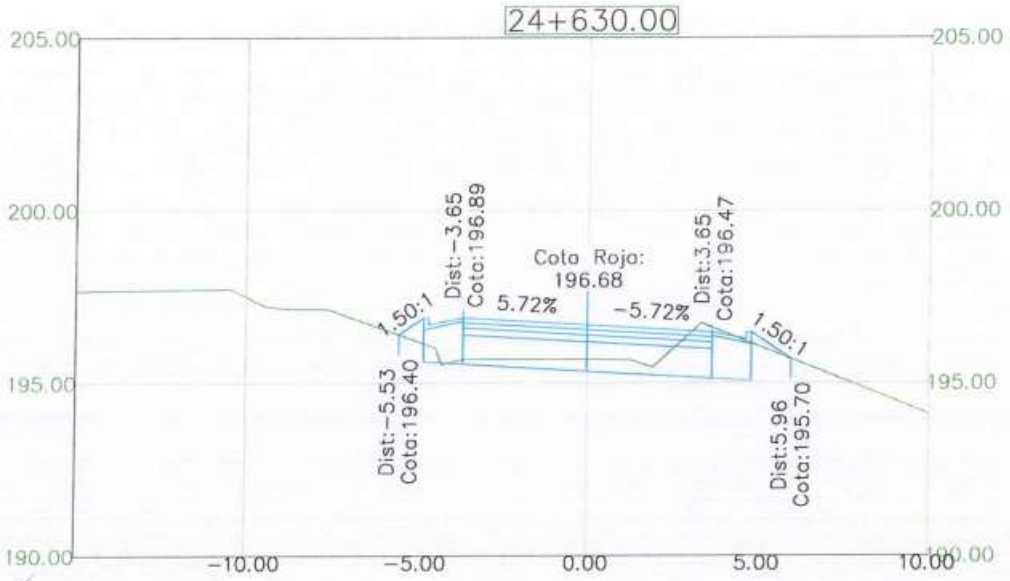

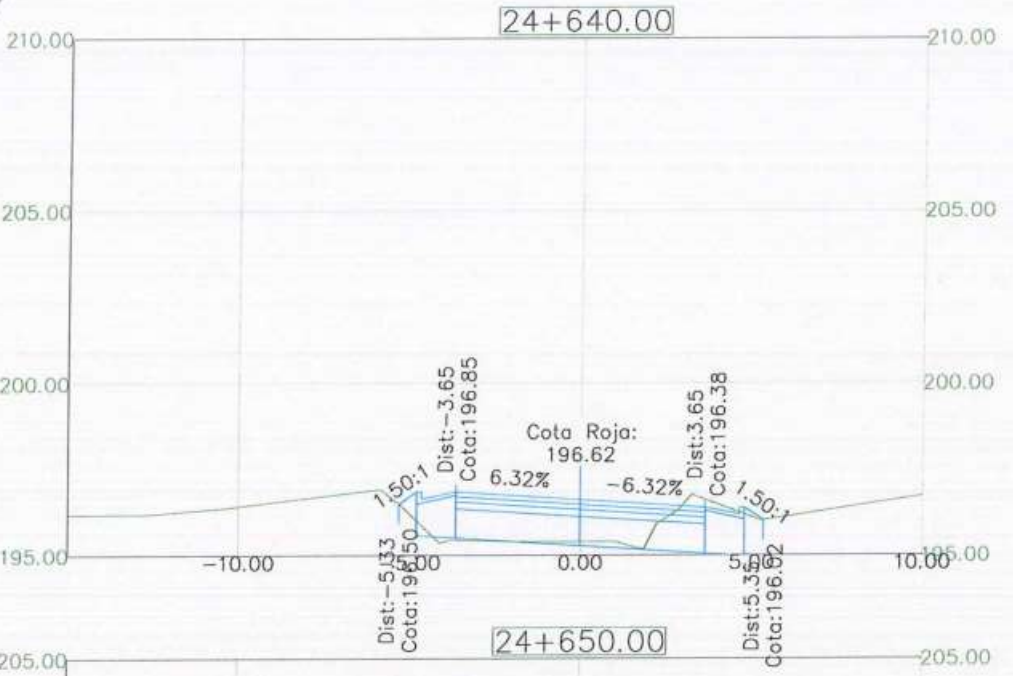

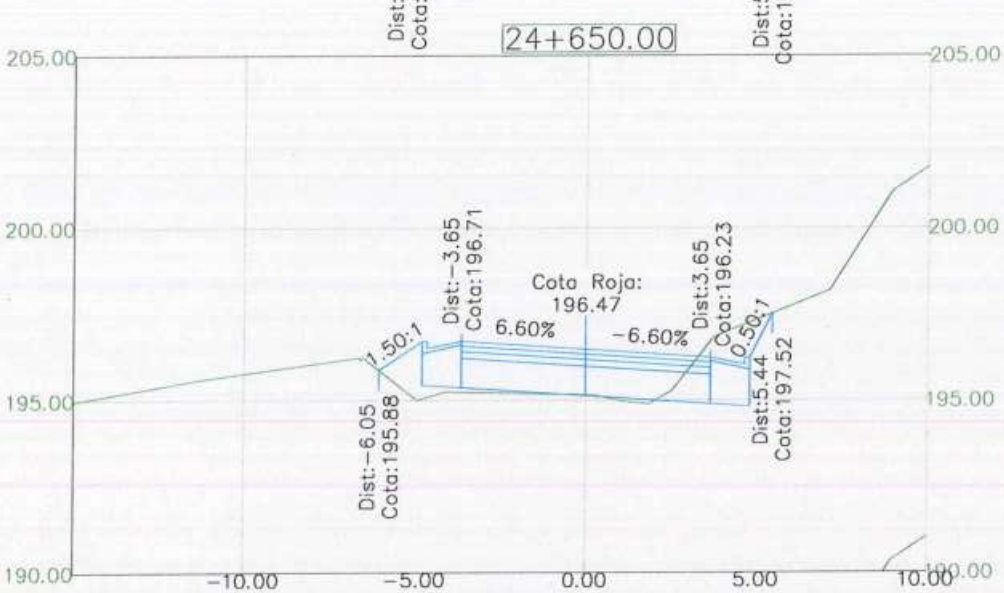


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


11 -30

18-07-2025


24+660.00

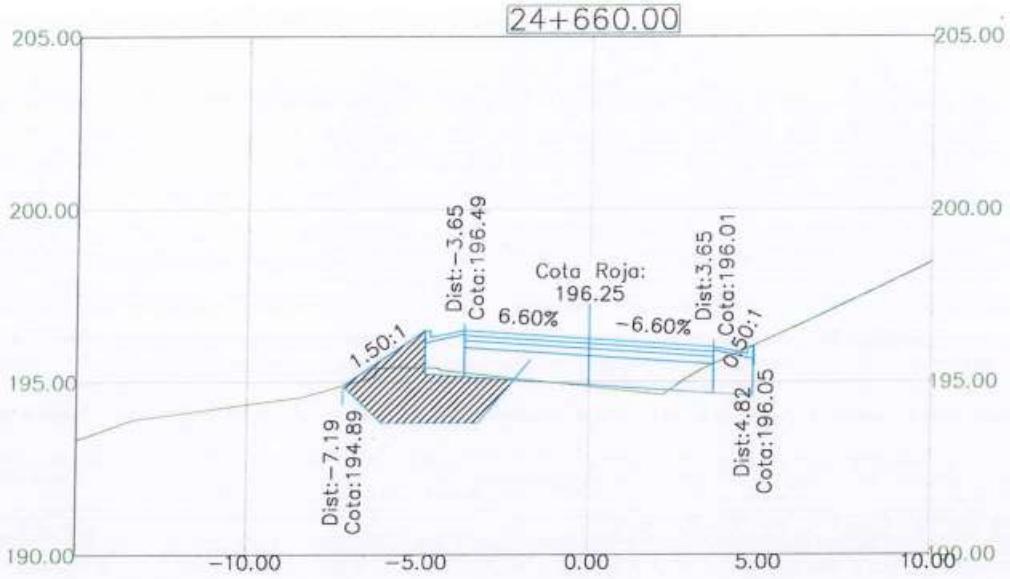

24+670.00

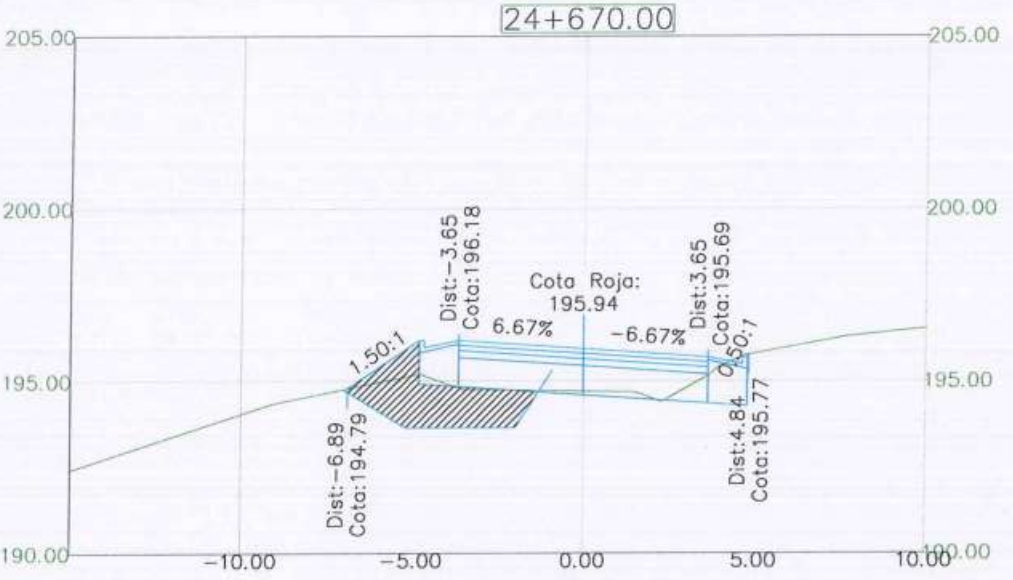

24+680.00

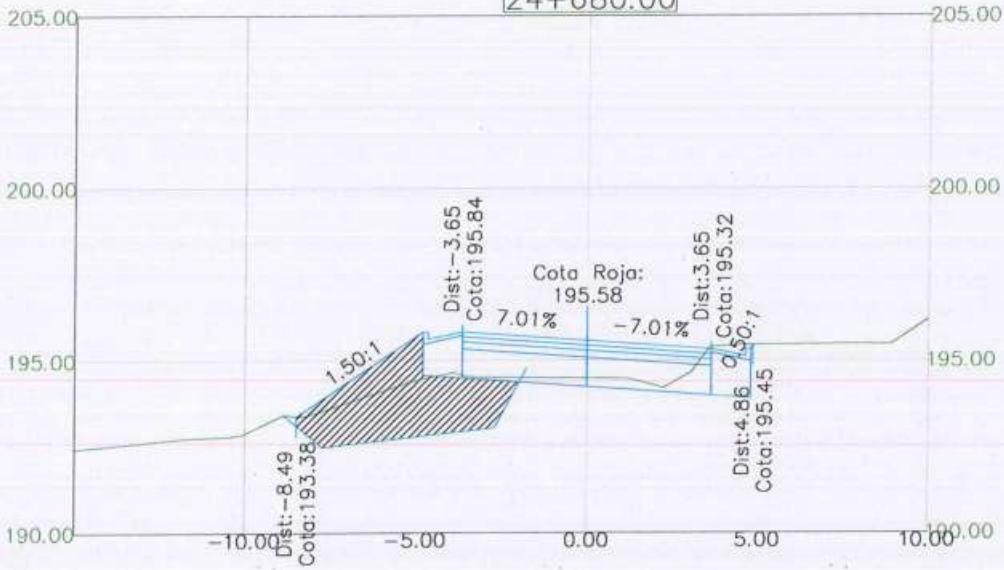


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE BAJA


12 - 30

19-07-2025


24+690.00

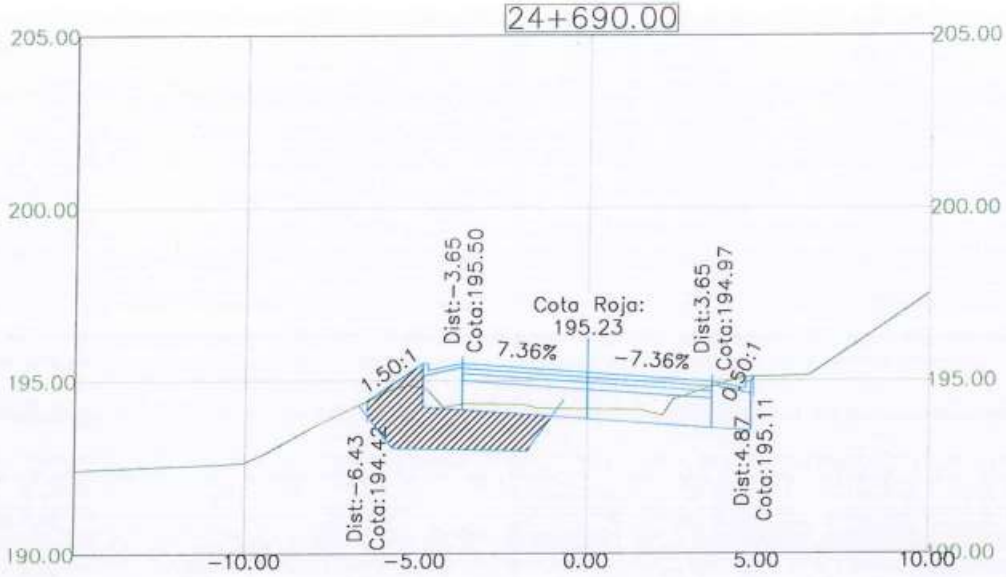

24+700.00

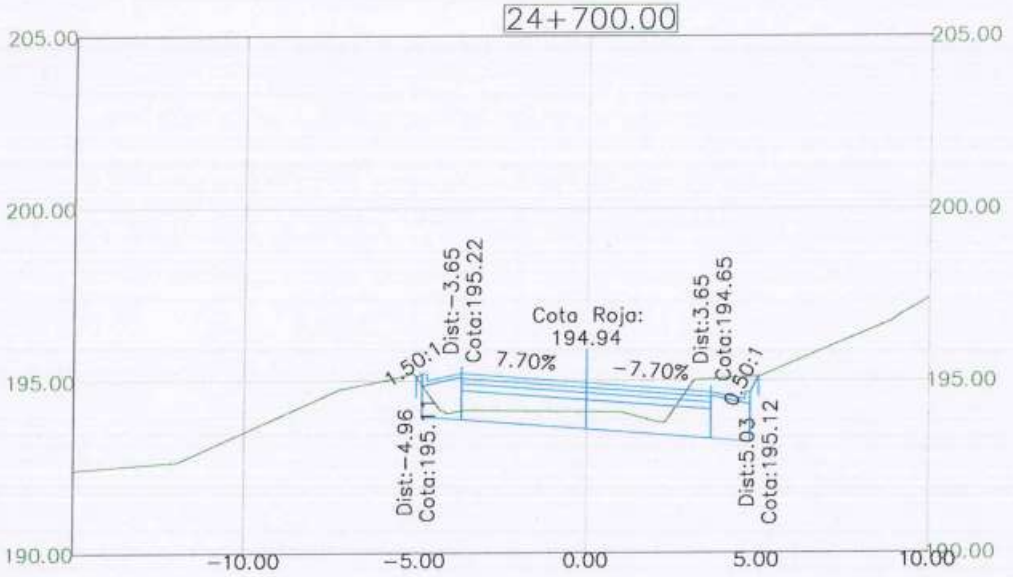


24+710.00

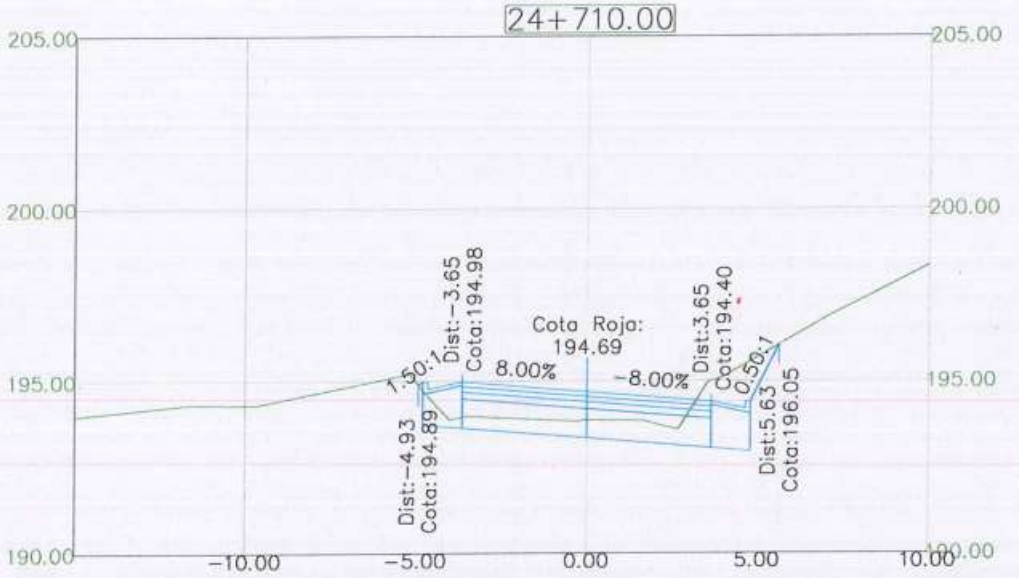



SUDINCO

13 -30

18-07-2025

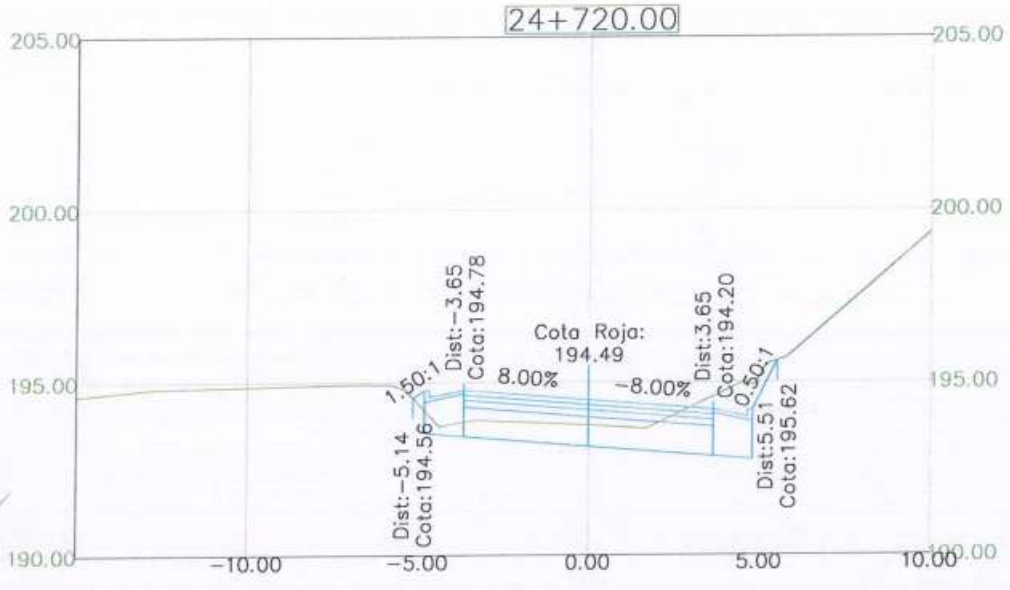

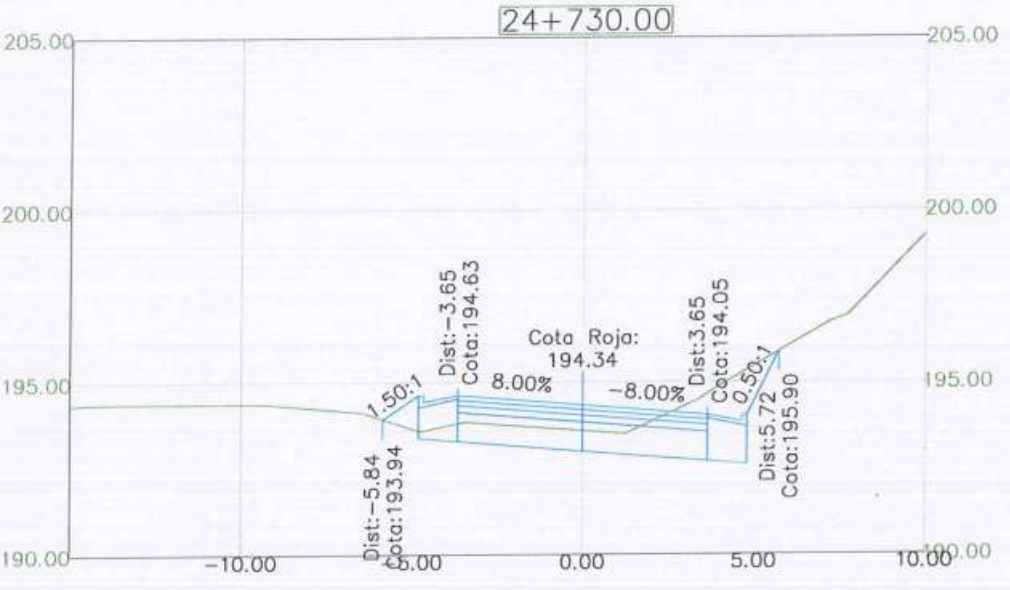

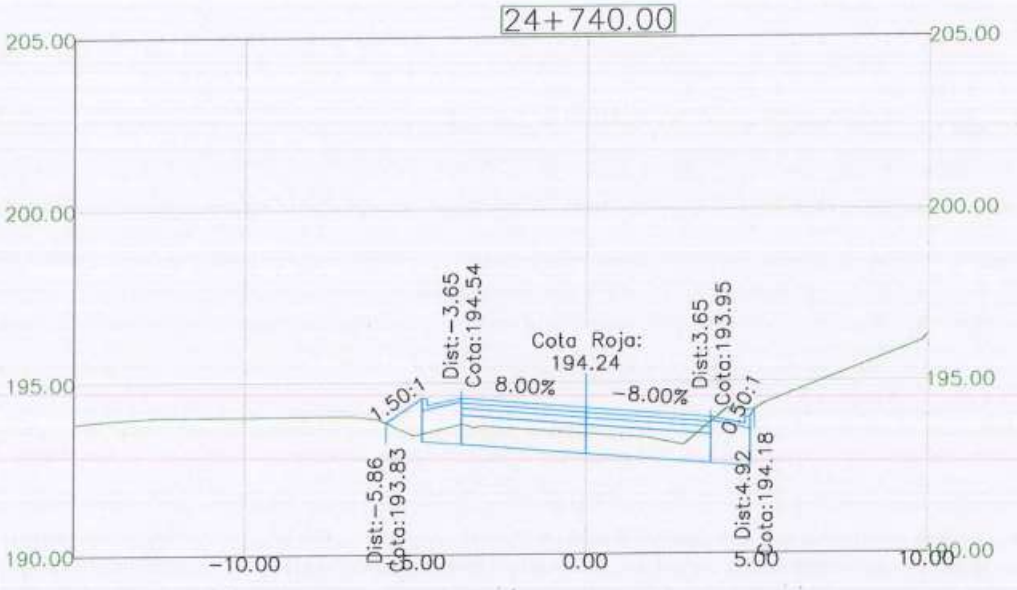


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
SUR-BAJA

14 -30

18-07-2025

4

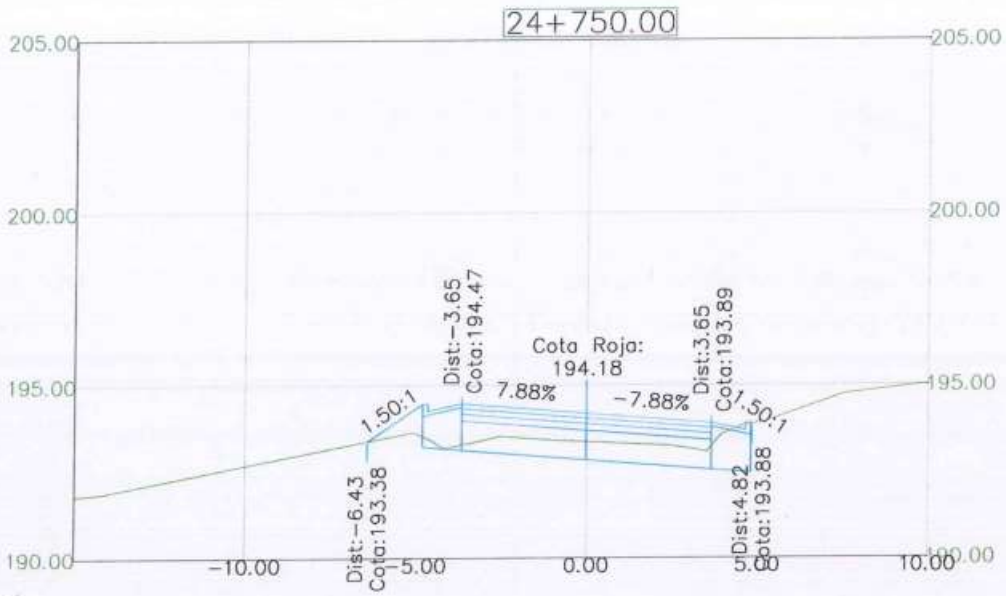

SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES

15 - 30


18-07-2025

4

24+760.00



24+770.00

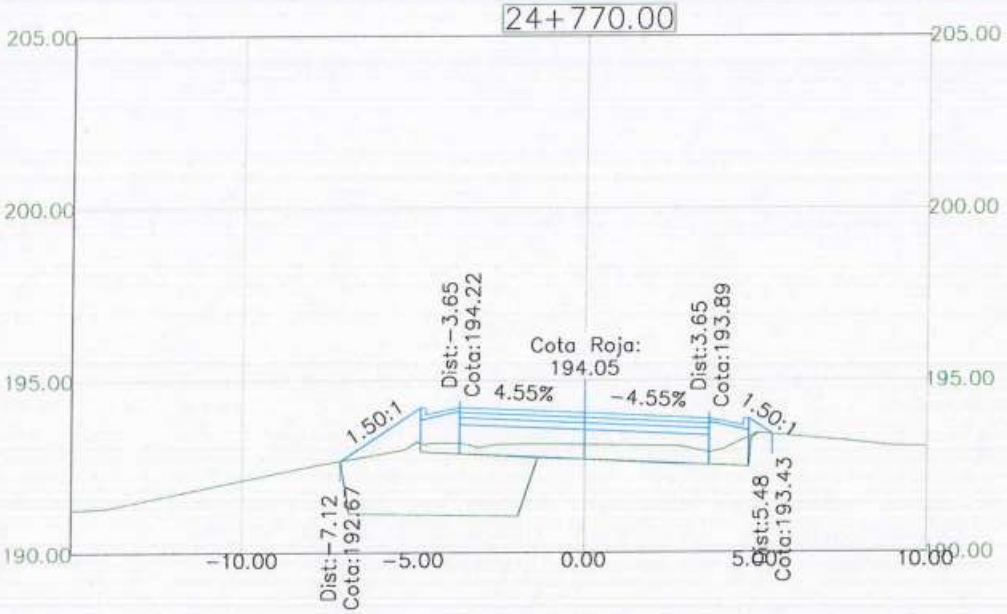

24+780.00




SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE BAJA


18 -30

18-07-2025


24+790.00

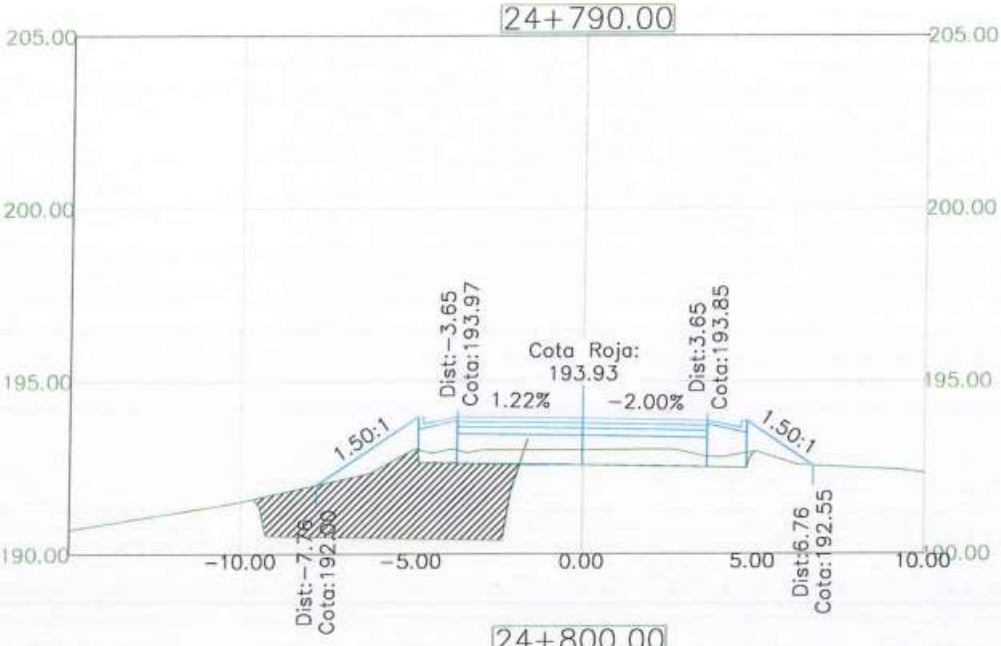

24+800.00

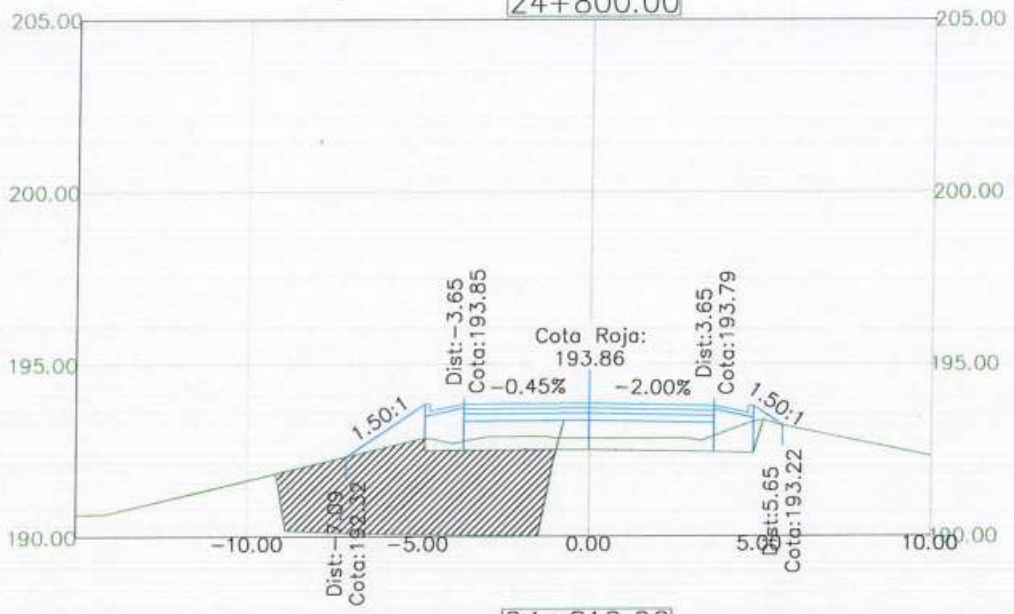

24+810.00

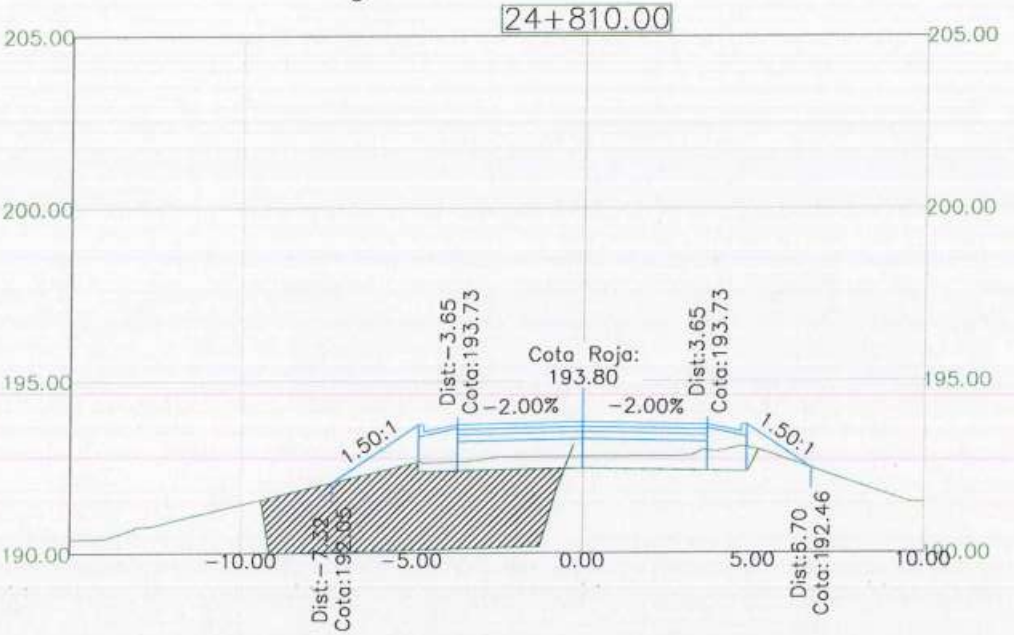


SUDINCO


17 - 30

15-07-2025


24+820.00

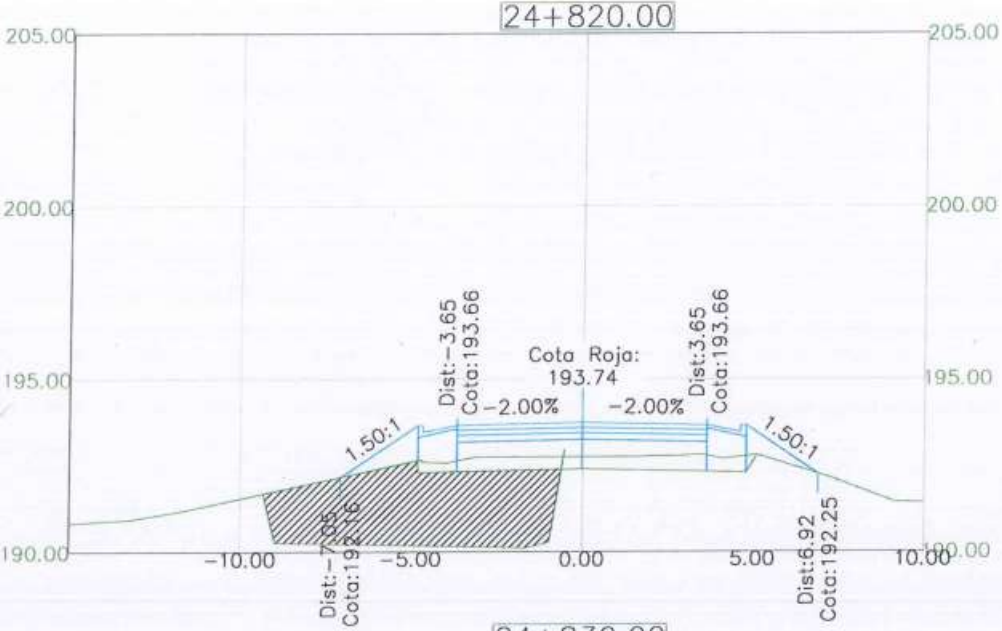

24+830.00

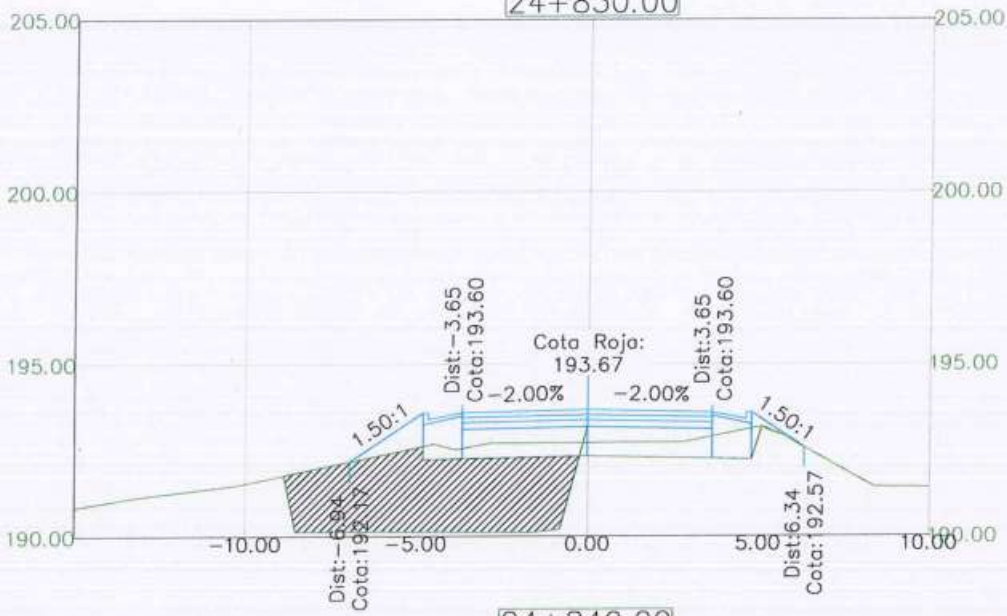

24+840.00

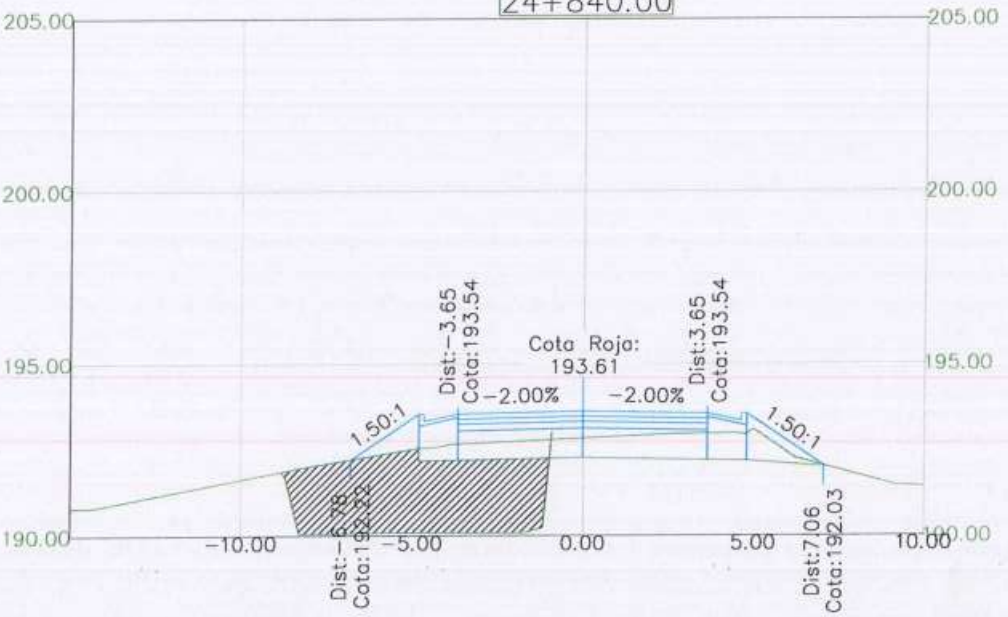


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


18 -30

18-07-2025


24+850.00

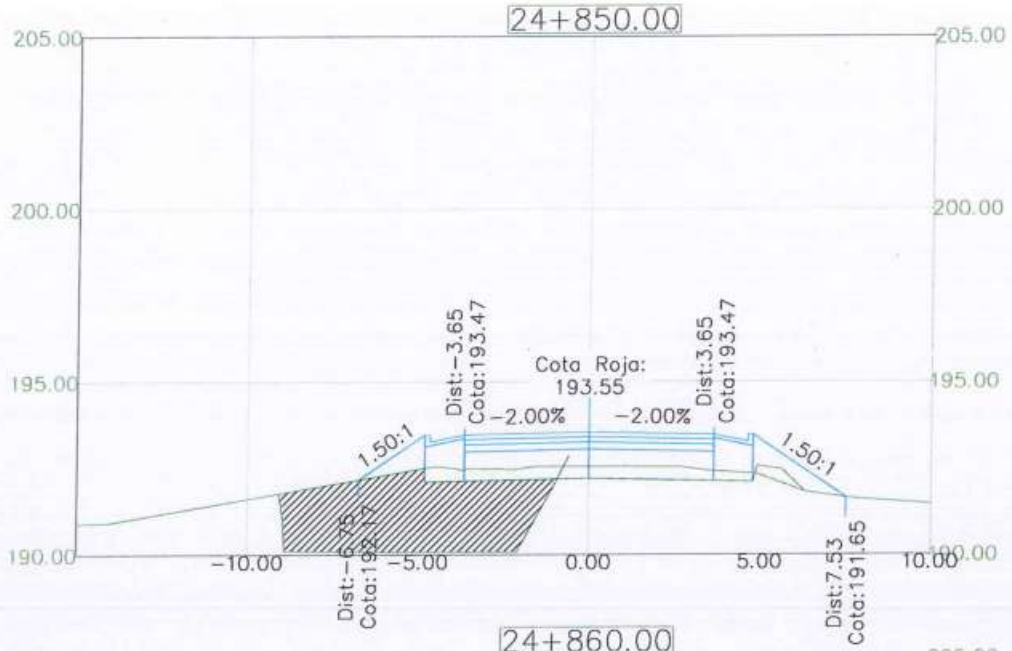

24+860.00

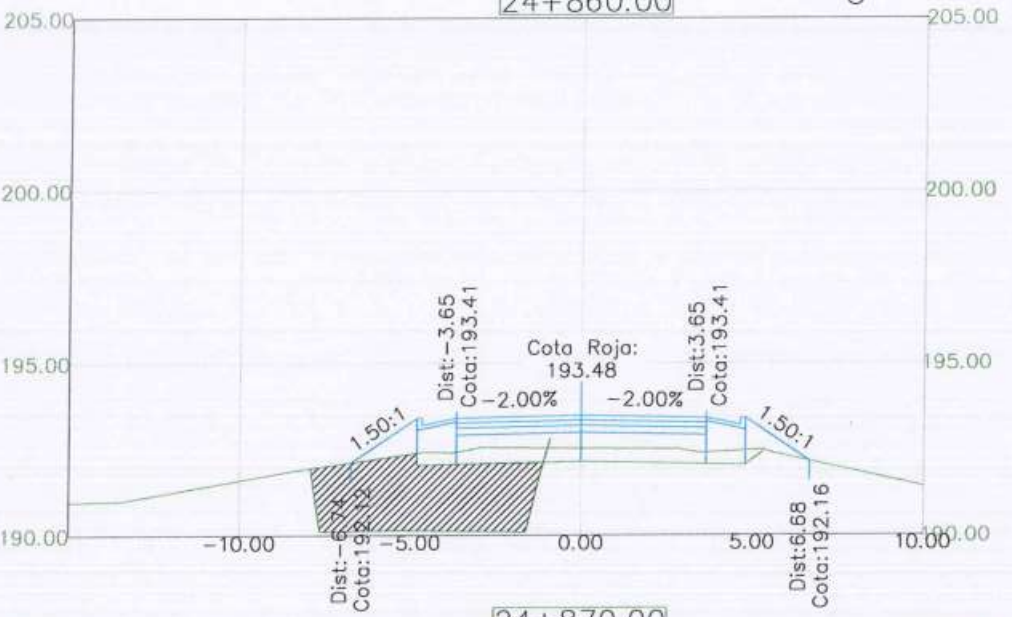

24+870.00

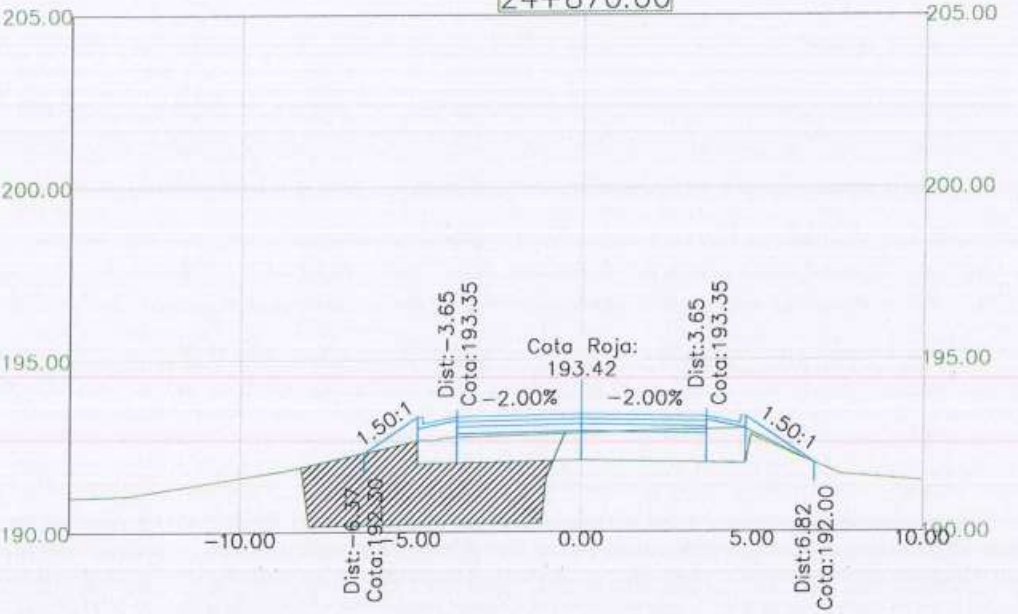


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
BASE BAJA


19 -30

16-07-2025


24+880.00

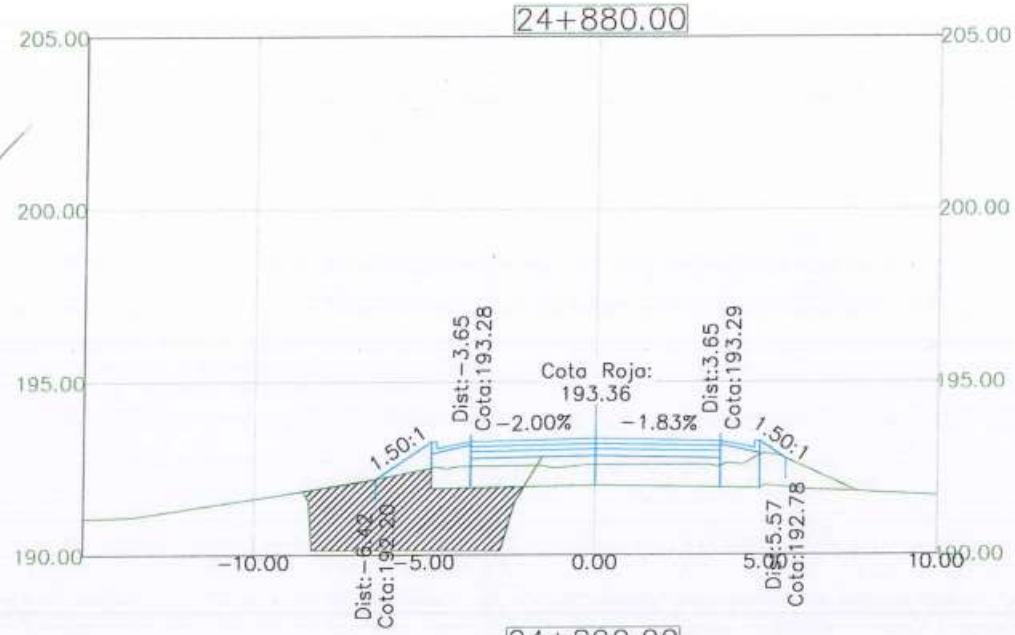

24+890.00

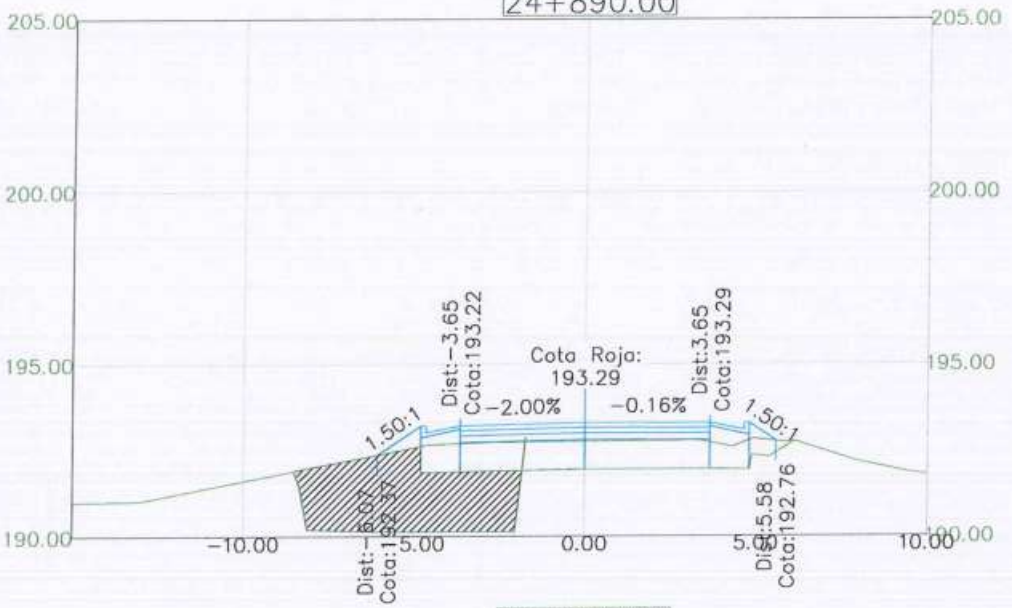


24+900.00

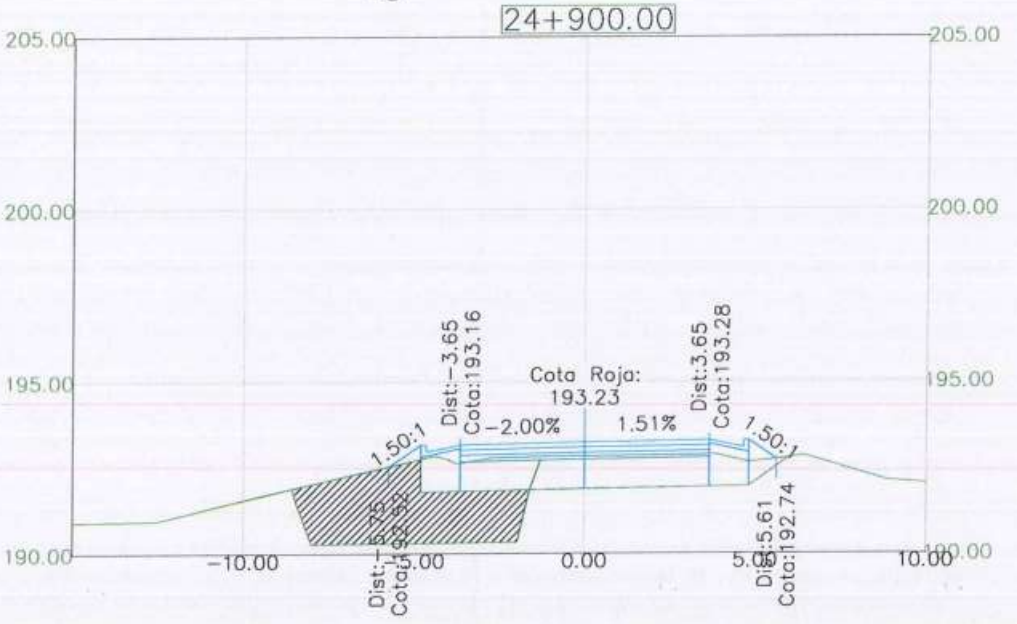



SUDINCO

20 – 30

19-07-2025

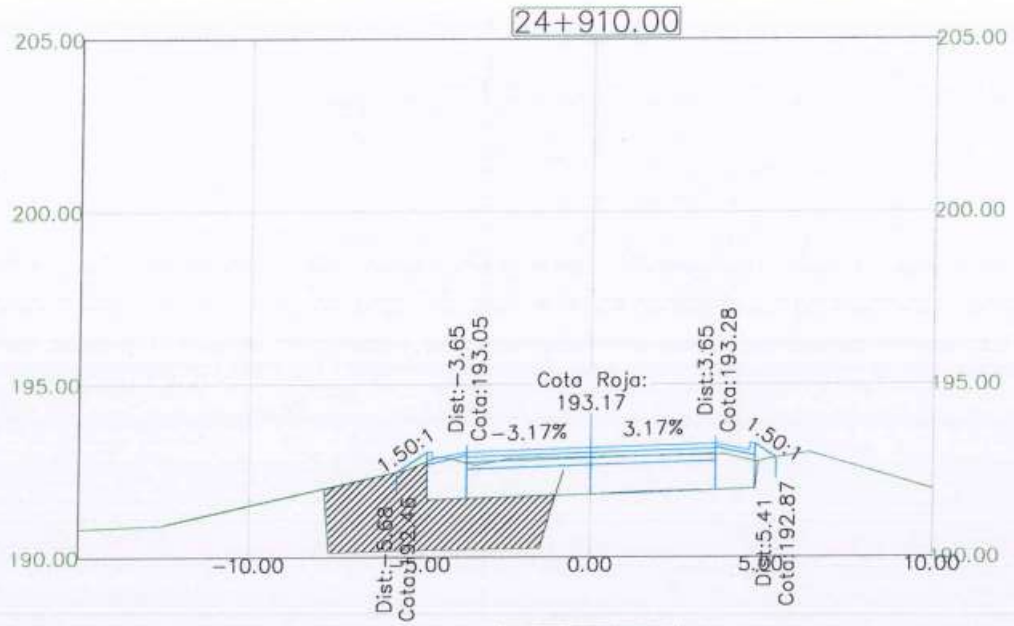

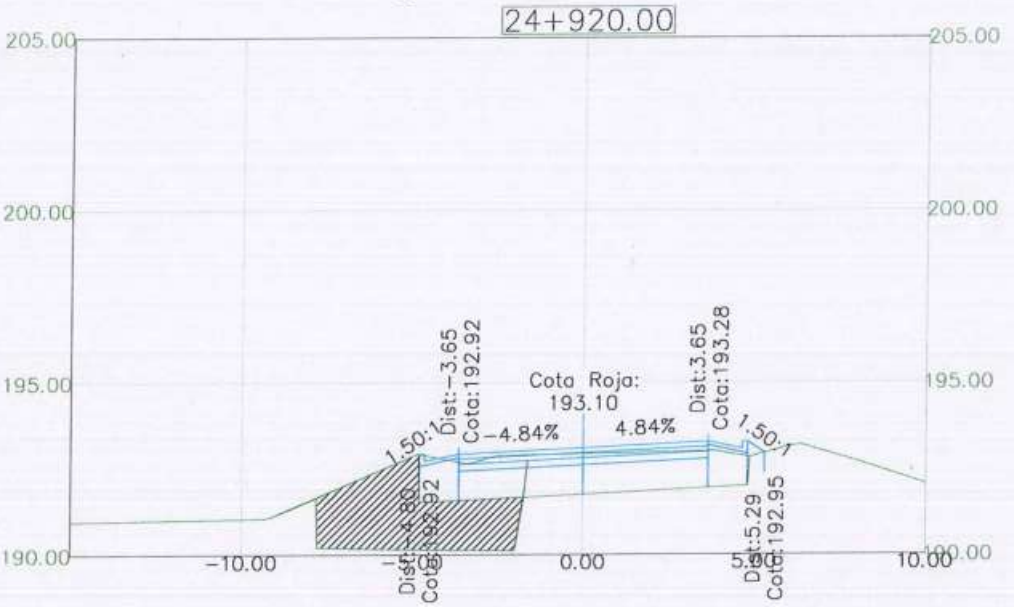


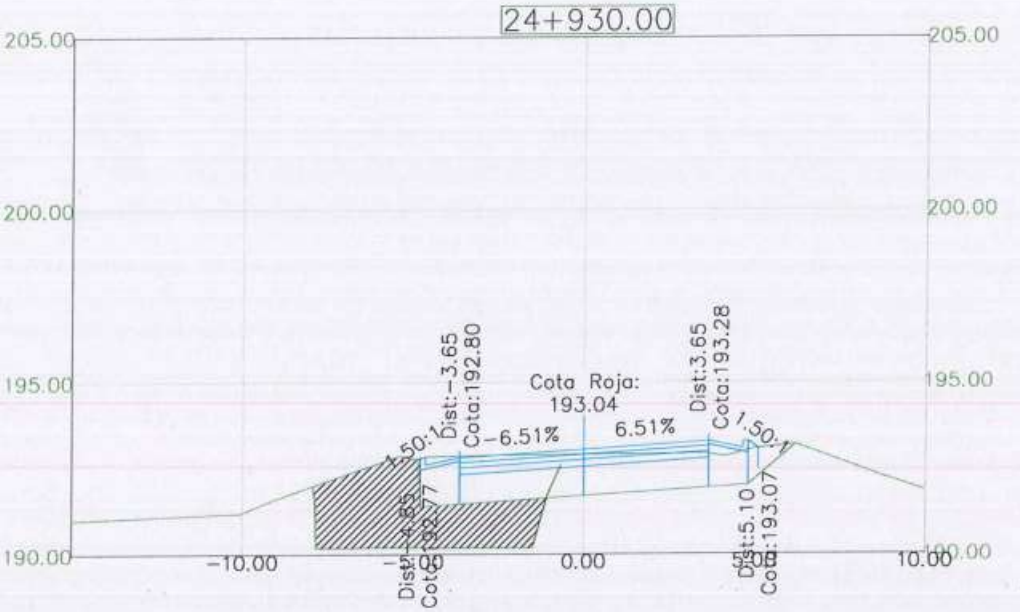


SUDINCO


21 - 30

18-07-2025

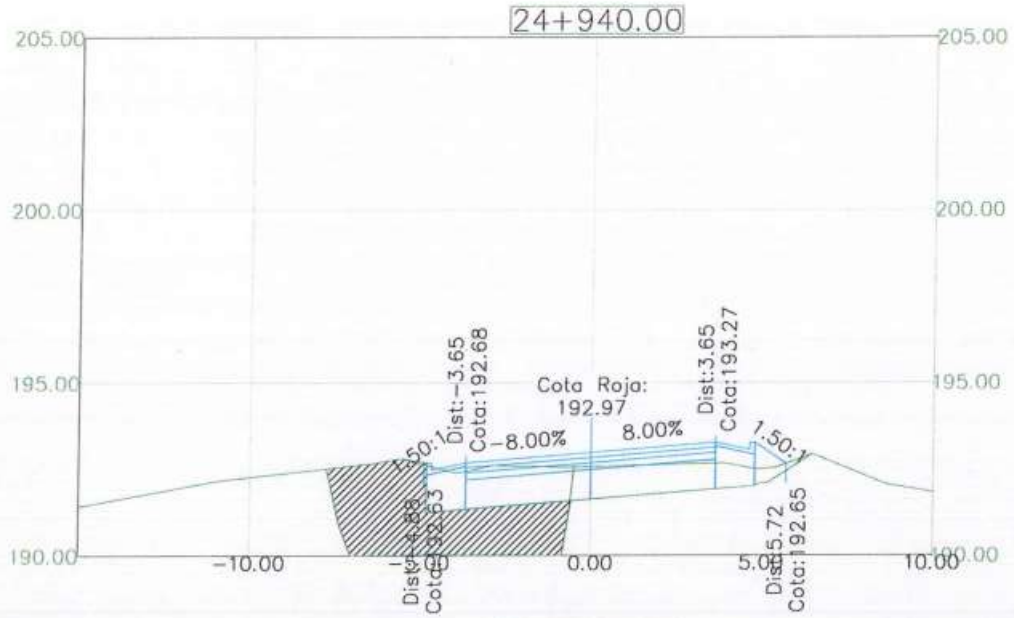

24+940.00
205.00
200.00
195.00
190.00
Cota Roja:
192.97
Dist:-3.65
Cota:192.68
Dist:3.65
Cota:193.27
-8.00%
8.00%
1.50:1
1.50:1
Dist:-4.88
Cota:192.53
Dist:5.72
Cota:192.65
-10.00
0.00
5.00
10.00

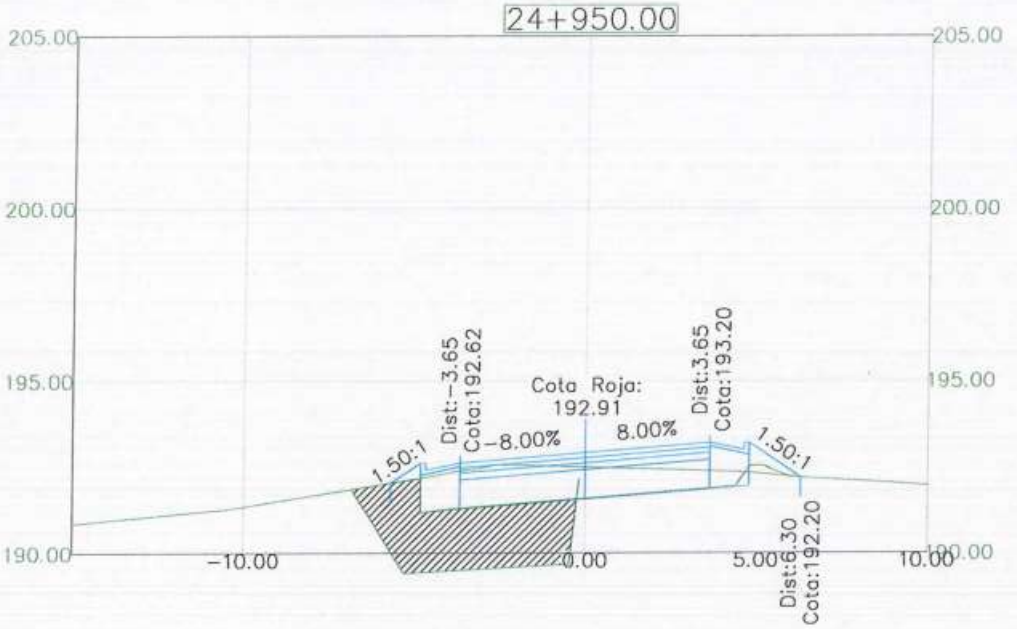
24+950.00
205.00
200.00
195.00
190.00
Cota Roja:
192.91
Dist:-3.65
Cota:192.62
Dist:3.65
Cota:193.20
-8.00%
8.00%
1.50:1
1.50:1
Dist:6.30
Cota:192.20
-10.00
0.00
5.00
10.00


25+010.00

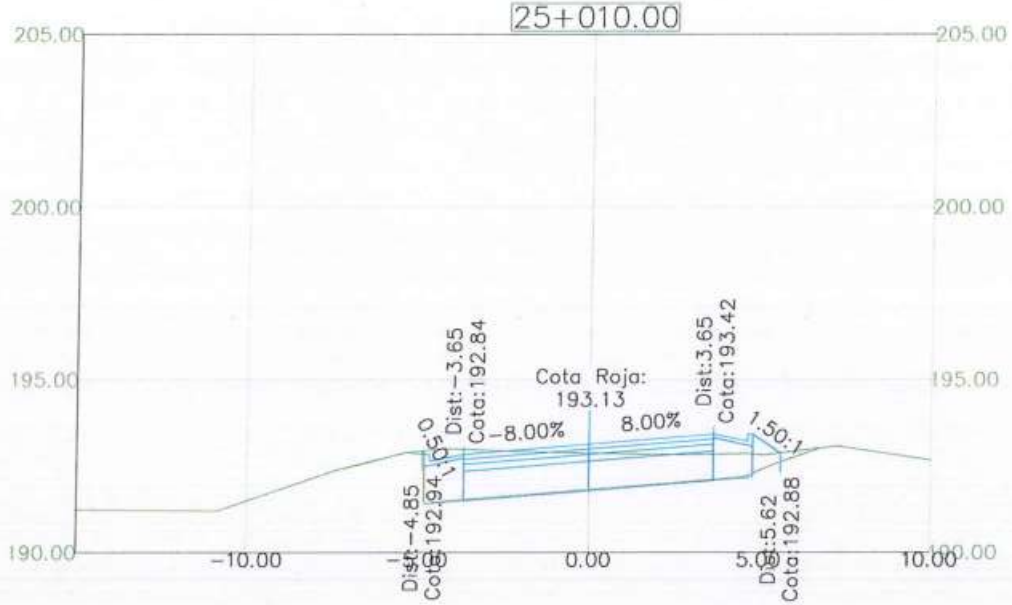

25+020.00

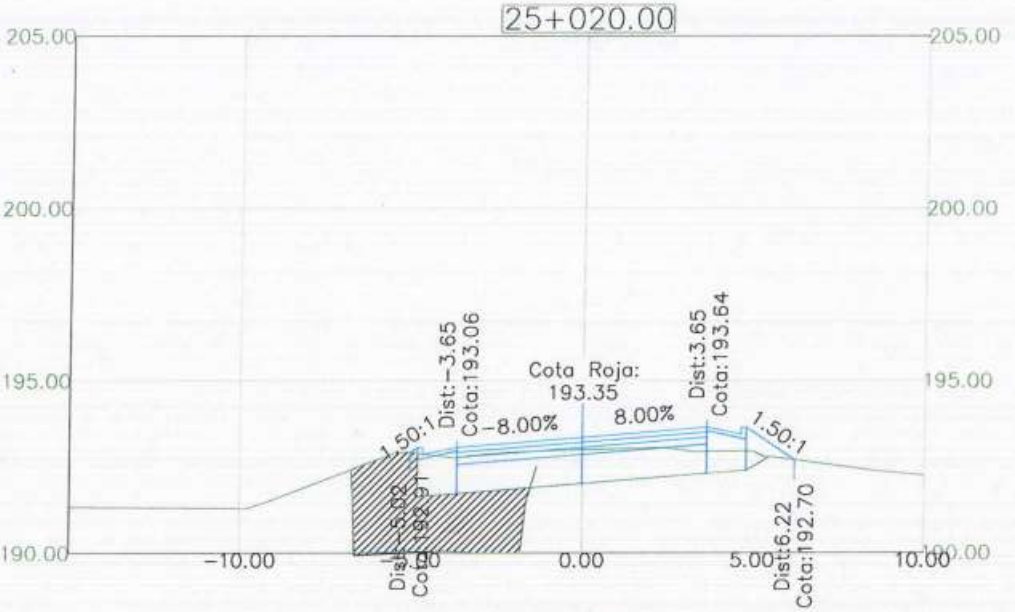

25+030.00

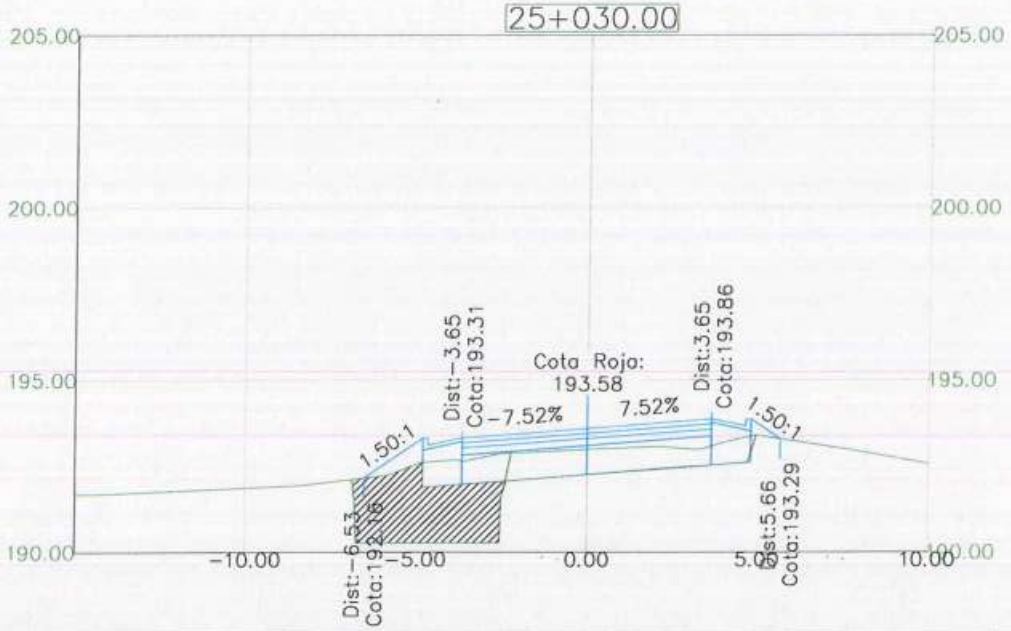



SUDINCO


SECCIONES TRANSVERSALES

23 -30

18-07-2025

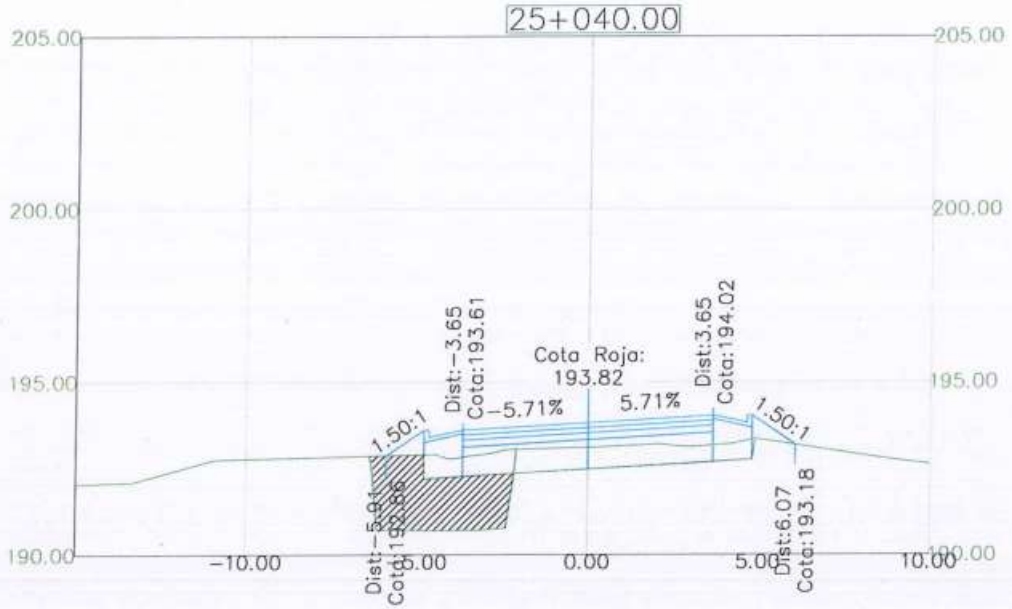

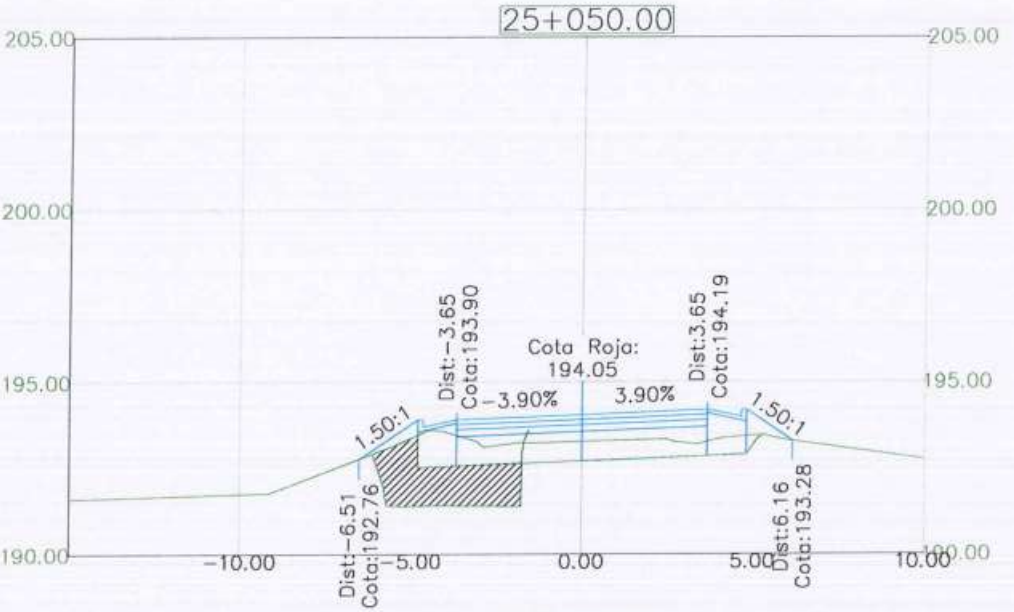

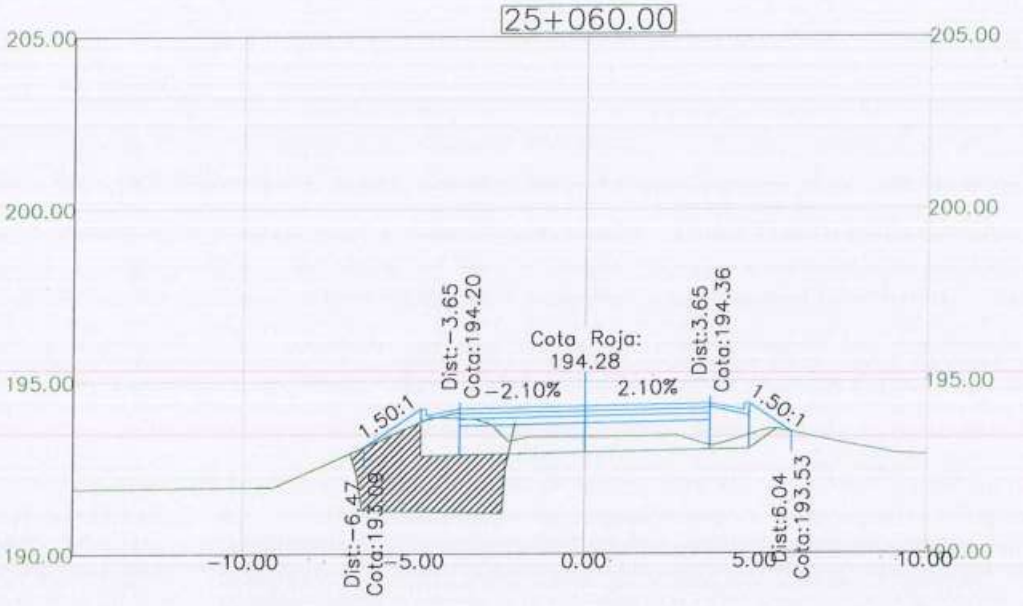


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE EJE


24 -30

18-07-2025


25+070.00

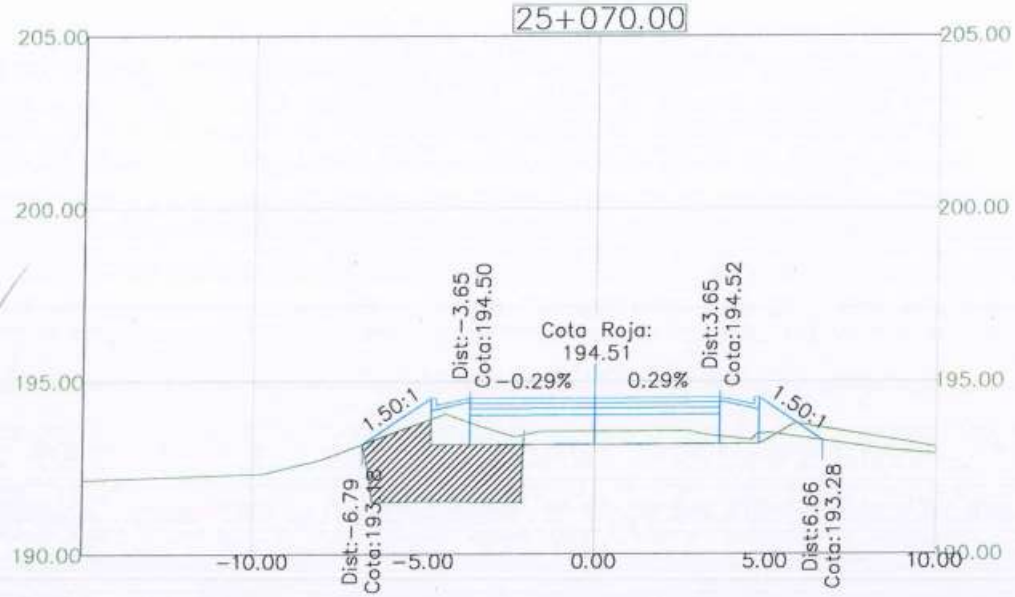

25+080.00

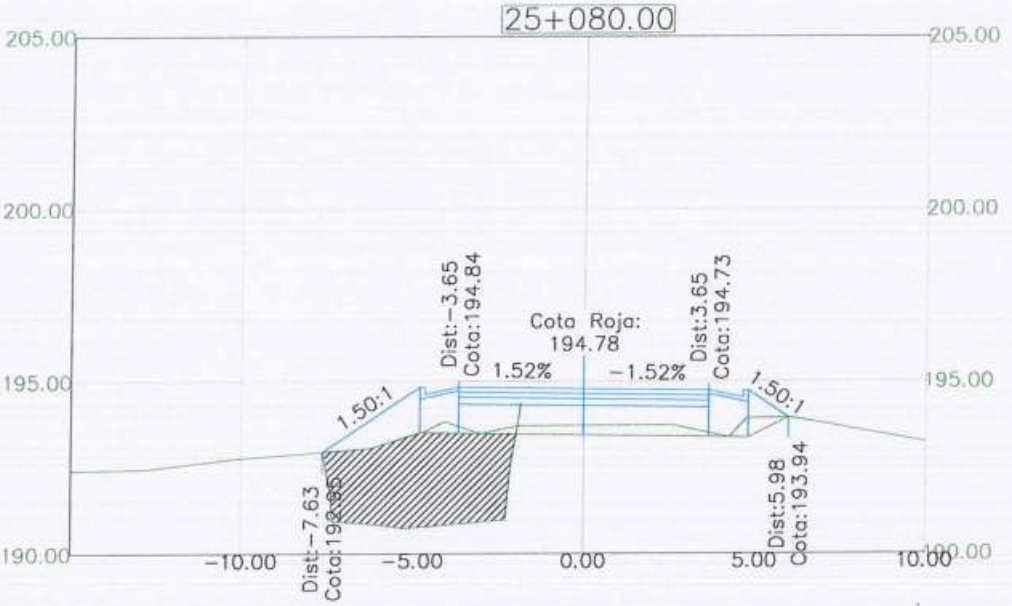

25+090.00

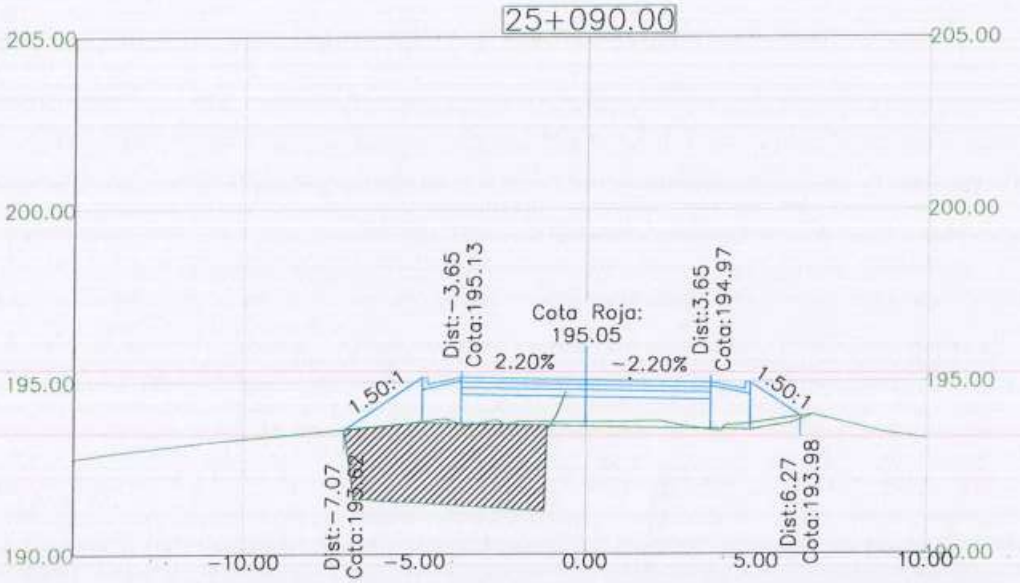


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


25 -30

19-07-2025


25+100.00

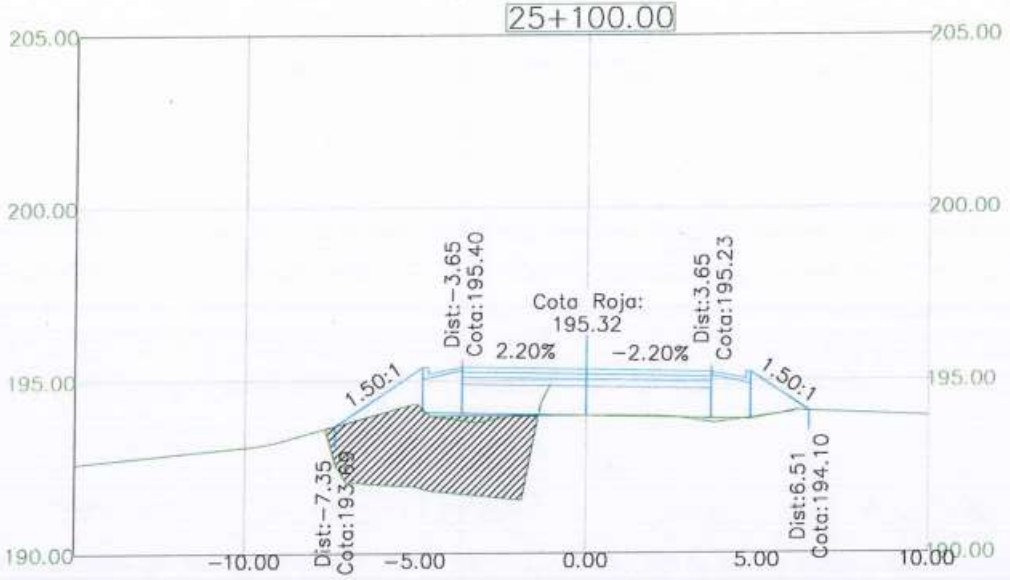

25+110.00

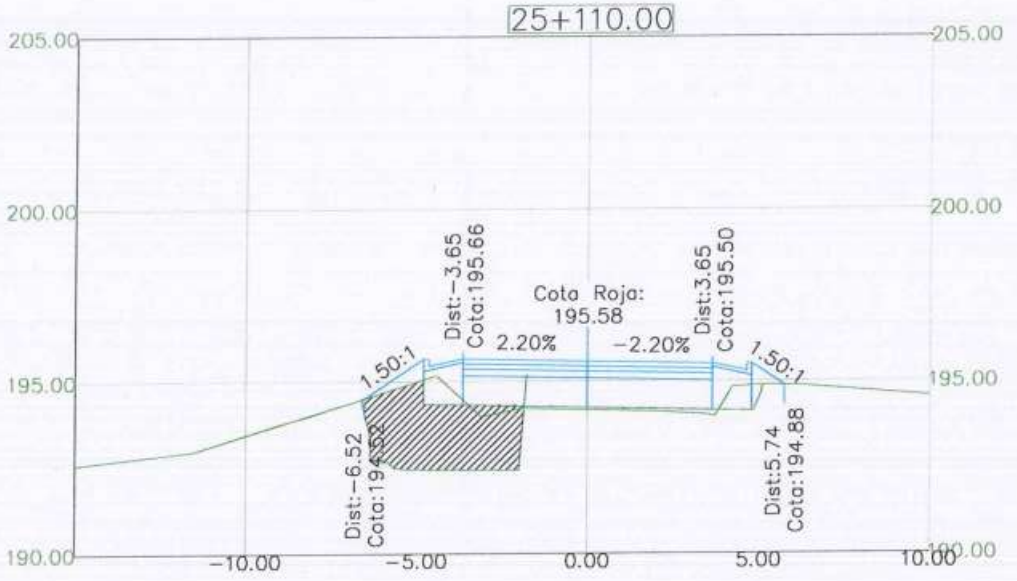

25+120.00

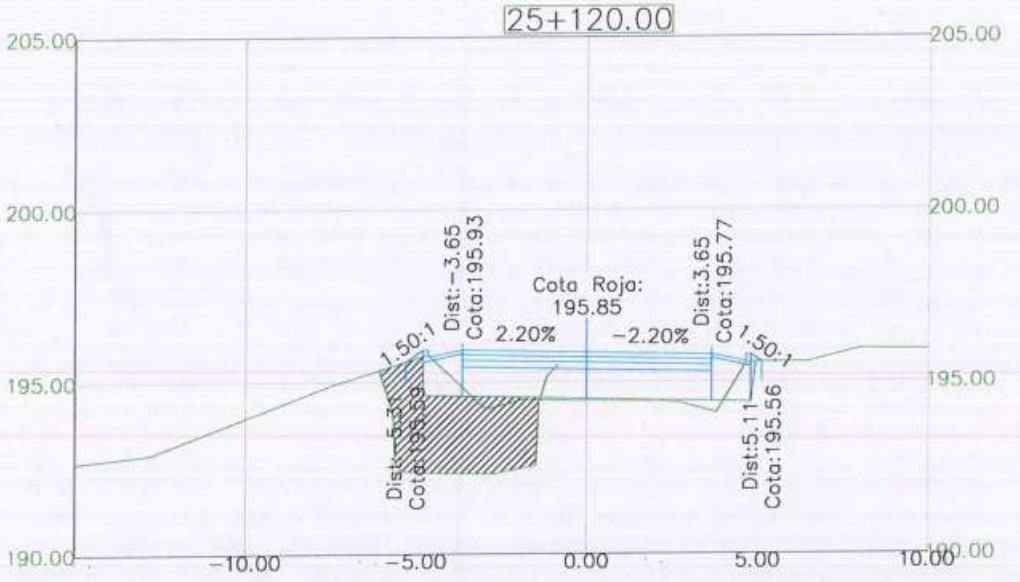



SUDINCO


SECCIONES TRANSVERSALES
ESCALA H/A


25 - 30


18-07-2025

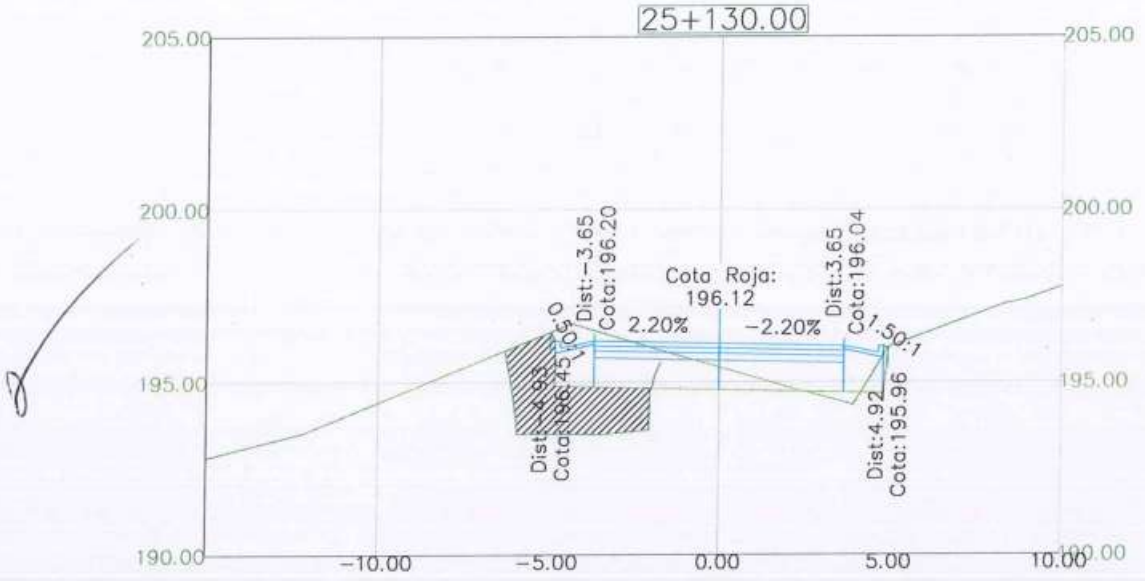

25+130.00
205.00
200.00
195.00
190.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Cota Roja:
196.12
2.20%
-2.20%
Dist:-3.65
Cota:196.20
Dist:3.65
Cota:196.04
Dist:-4.93
Cota:196.45
Dist:4.92
Cota:195.96
1.50:1
1.50:1

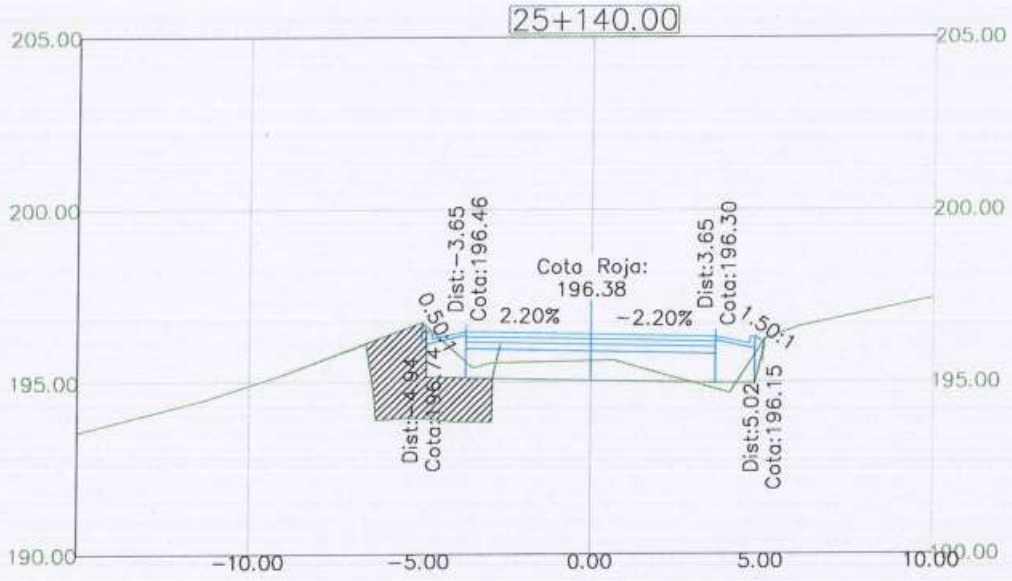

25+140.00
205.00
200.00
195.00
190.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Cota Roja:
196.38
2.20%
-2.20%
Dist:-3.65
Cota:196.46
Dist:3.65
Cota:196.30
Dist:-4.94
Cota:196.74
Dist:5.02
Cota:196.15
1.50:1
1.50:1

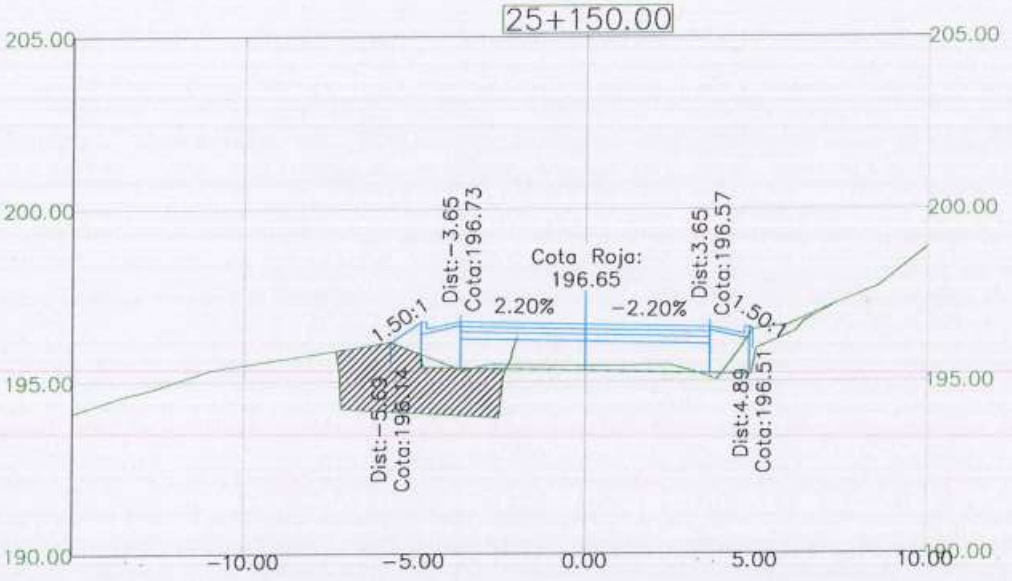

25+150.00
205.00
200.00
195.00
190.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Cota Roja:
196.65
2.20%
-2.20%
Dist:-3.65
Cota:196.73
Dist:3.65
Cota:196.57
Dist:-5.69
Cota:196.74
Dist:4.89
Cota:196.51
1.50:1
1.50:1

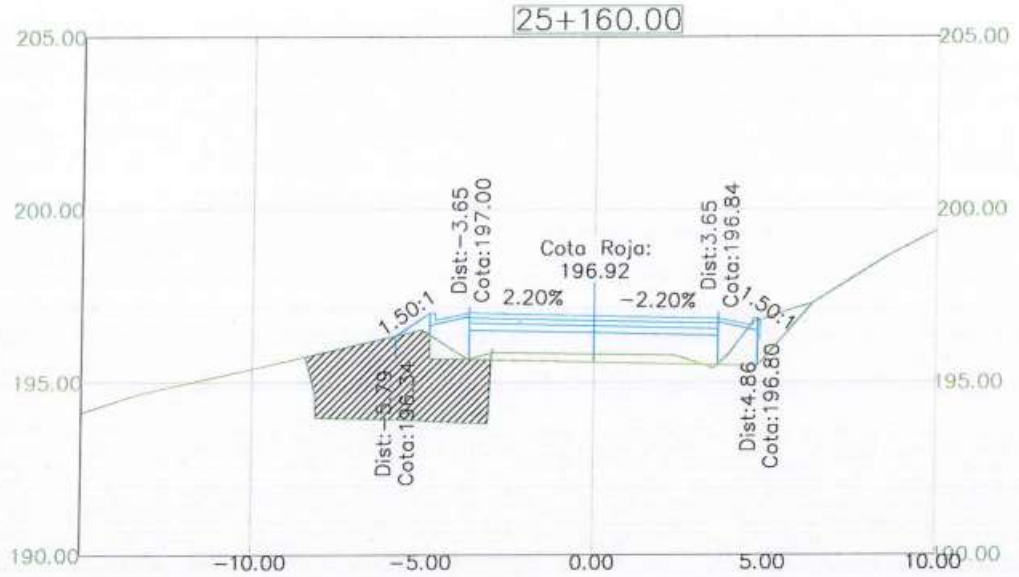

25+160.00
205.00
200.00
195.00
190.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Cota Roja:
196.92
2.20%
-2.20%
1.50:1
Dist:-3.65
Cota:197.00
Dist:3.65
Cota:196.84
Dist:-5.79
Cota:196.34
Dist:4.86
Cota:196.80

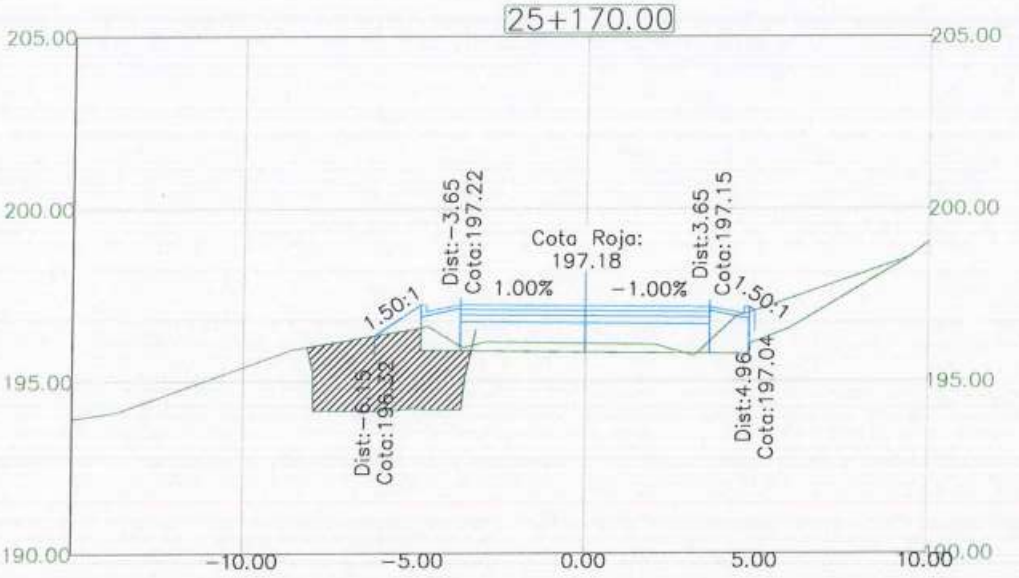
25+170.00
205.00
200.00
195.00
190.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Cota Roja:
197.18
1.00%
-1.00%
1.50:1
Dist:-3.65
Cota:197.22
Dist:3.65
Cota:197.15
Dist:-6.15
Cota:196.52
Dist:4.96
Cota:197.04

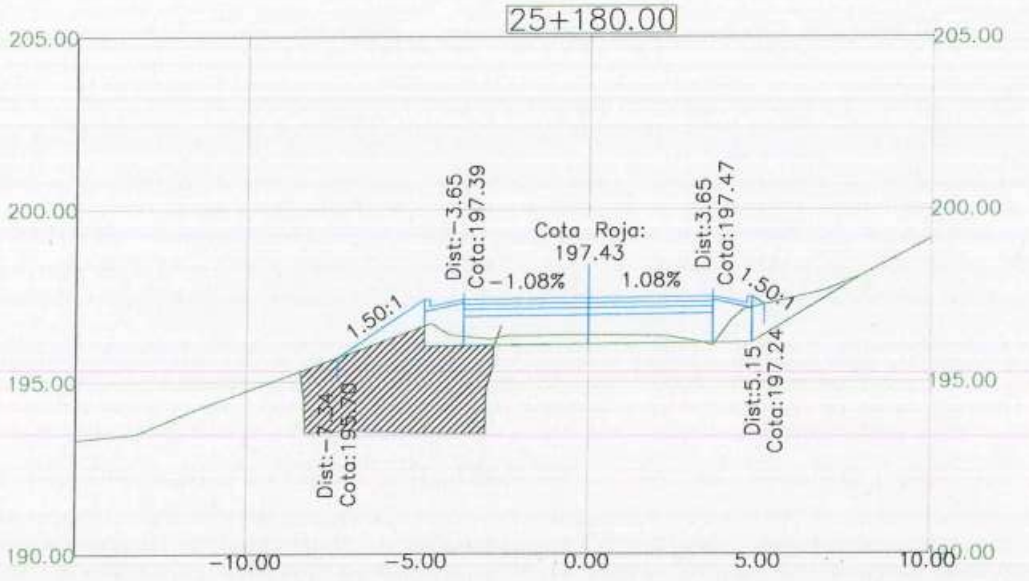
25+180.00
205.00
200.00
195.00
190.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Cota Roja:
197.43
-1.08%
1.08%
1.50:1
Dist:-3.65
Cota:197.39
Dist:3.65
Cota:197.47
Dist:-7.24
Cota:195.70
Dist:5.15
Cota:197.24

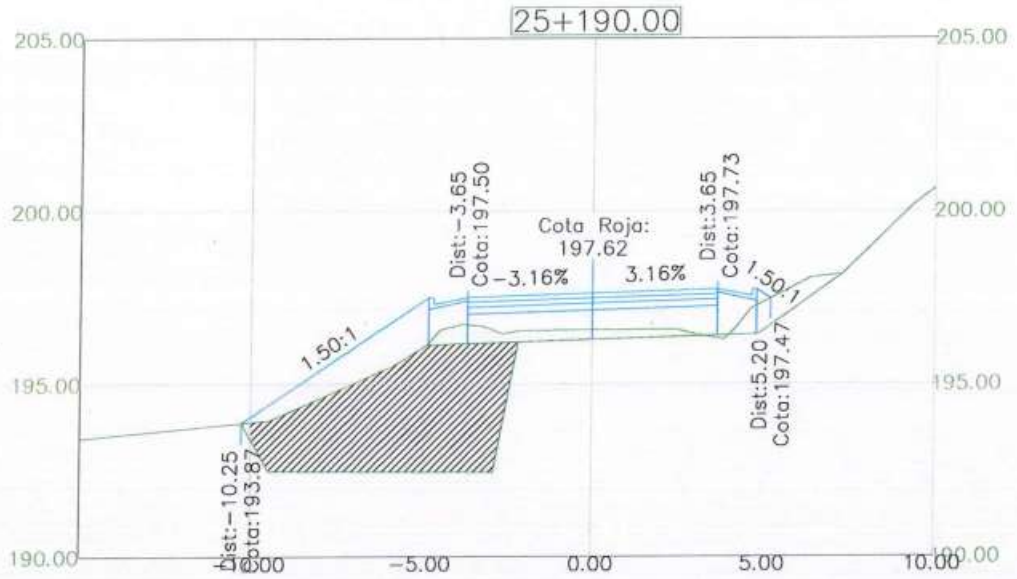


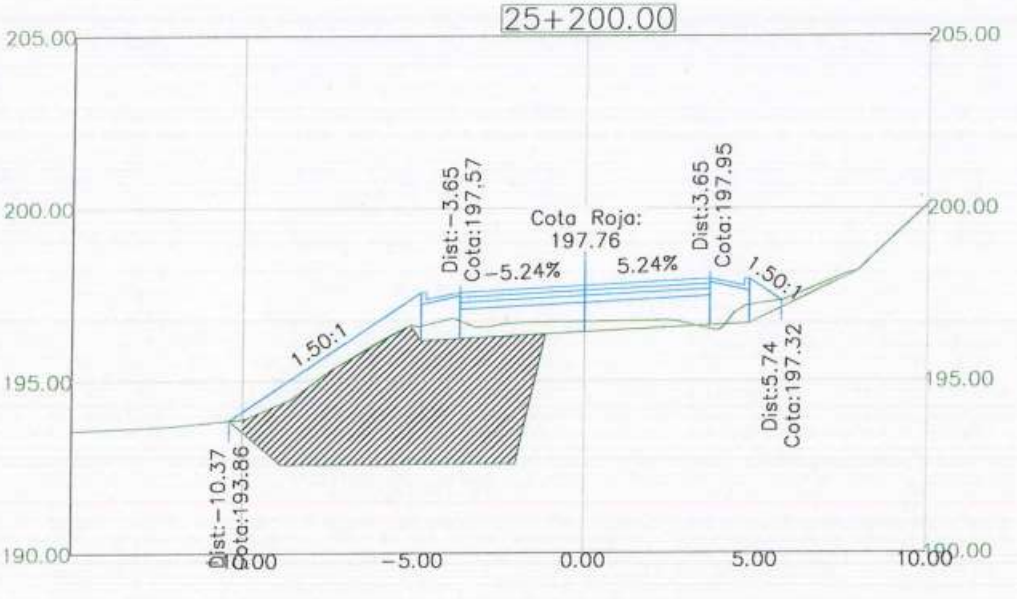


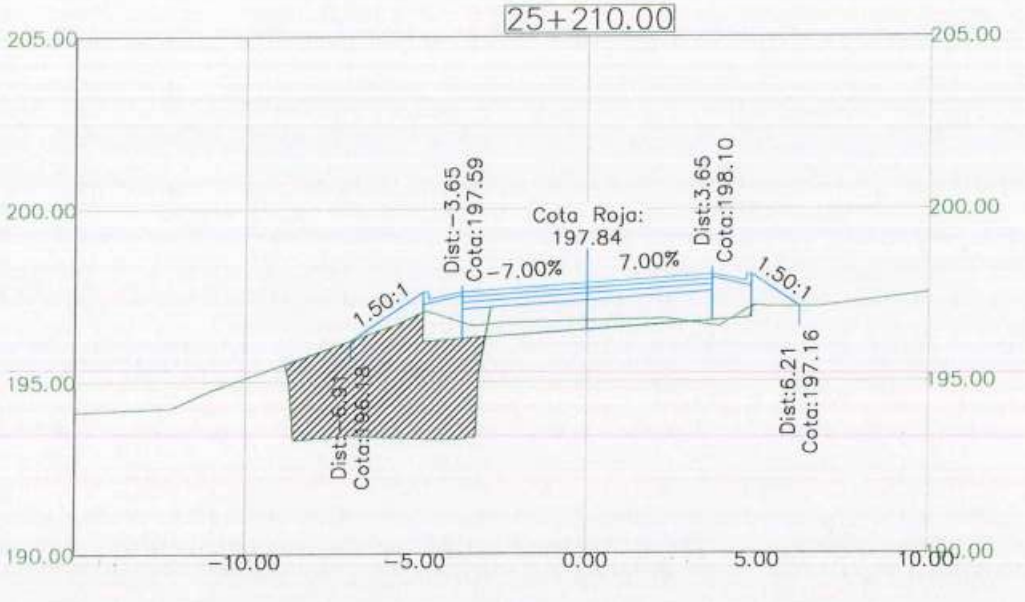

SUDINCO

29 -30

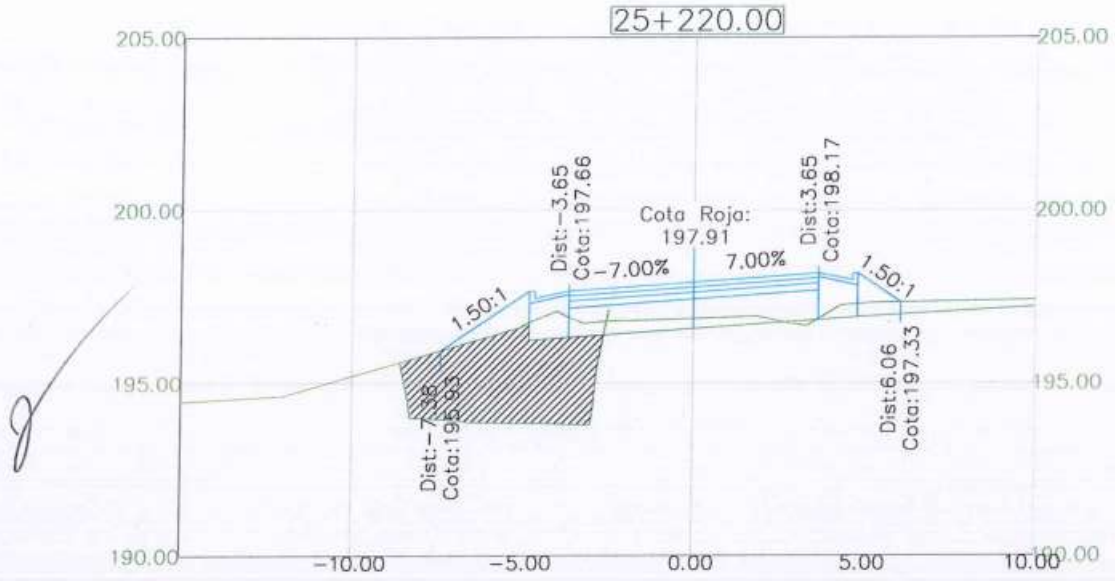
25+220.00
205.00
200.00
195.00
190.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Cota Roja:
197.91
Dist:-3.65
Cota:197.66
Dist:3.65
Cota:198.17
-7.00%
7.00%
1.50:1
1.50:1
Dist:6.06
Cota:197.33

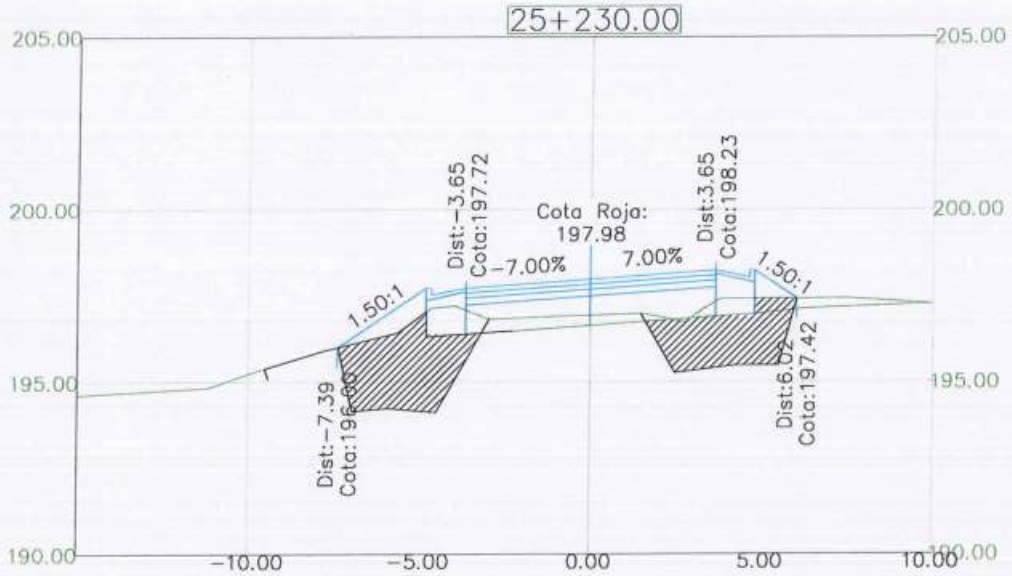
25+230.00
205.00
200.00
195.00
190.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Cota Roja:
197.98
Dist:-3.65
Cota:197.72
Dist:3.65
Cota:198.23
-7.00%
7.00%
1.50:1
1.50:1
Dist:6.02
Cota:197.42

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	271,40
320.1	Subbase Granular clase A	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA - SECCIÓN TRANSVERSAL m2(B)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	22+840,00	22+850,00	6006	10,00	9,90	0,20		19,80	4,00	Avance del 20% en la construcción de la capa este mes para un avance acumulado del 100%
2	22+850,00	22+900,00	6006	50,00	9,90	0,20		99,00	99,00	Avance del 100% en la construcción de la capa este mes.
2	22+900,00	22+920,00	6006	20,00	9,90	0,20		39,60	7,90	Avance del 20% en la construcción de la capa este mes para un avance acumulado del 100%
2	23+000,00	23+090,00	6006	90,00	9,90	0,20		178,20	35,60	Avance del 20% en la construcción de la capa este mes para un avance acumulado del 100%
2	24+170,00	24+370,00	6006	200,00	9,90	0,20		396,00	79,20	Avance del 20% en la construcción de la capa este mes para un avance acumulado del 100%
2	24+370,00	24+530,00	6006	160,00	9,90	0,20		316,80	47,50	Avance del 15% en la construcción de la capa este mes para un avance acumulado del 100%
2	60+140,00	60+140,00	6009	4,00	1,50	0,30		1,80	1,80	Acceso a vereda
2	59+465,00	59+490,30	6009	25,30	4,00	0,12		-12,14	-1,80	Descuento por obra de cimentación directa construida en este tramo. Pendiente 15%
2	59+550,00	59+575,30	6009	25,30	4,00	0,12		-12,14	-1,80	Descuento por obra de cimentación directa construida en este tramo. Pendiente 15%

TOTAL	271,4
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	271,4
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	271,4

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	271,40
320.1	Subbase Granular clase A	m3		













INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
320.1	Subbase Granular clase A	m3		271,40









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
330.1	Base granular clase A	m3	554,30

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA - SECCIÓN TRANSVERSAL m2(B)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	22+840,00	22+920,00	6006	80,00	7,93	0,15		95,10	80,80	Avance del 85% este mes para un avance total acumulado del 85%
2	23+000,00	23+090,00	6006	90,00	7,93	0,15		106,99	90,90	Avance del 85% este mes para un avance total acumulado del 85%
2	24+170,00	24+530,00	6006	360,00	7,93	0,15		427,95	363,80	Avance del 85% este mes para un avance total acumulado del 85%
2	52+570,00	52+590,00	6007					-44,50	-6,70	Descuento pendiente por Liquidación cantidad cobrada Acta N°33
2	60+140,00	60+140,00	6009	14,40	3,70	0,20		10,66	10,70	Acceso a vereda
2	59+465,00	59+490,30	6009					7,40	7,40	Reliquidación por mayor cantidad descontada en acta N°49
2	59+550,00	59+575,30	6009					7,40	7,40	Reliquidación por mayor cantidad descontada en acta N°49

TOTAL	554,3
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	554,3
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	554,3

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
330.1	Base granular clase A	m3		554,30













INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
330.1	Base granular clase A	m3		554,30













RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	354,00	

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO Promedio (m)		CANTIDAD	ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	52+573,00	52+633,00	6007	60,00	3,65			219,00	219,00	Izquierdo
7	52+573,00	52+610,00	6007	37,00	3,65			135,05	135,00	Derecho

TOTAL	354,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	354,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	354,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		354,00







RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	8915,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO Promedio (m)			ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	52+573,00	52+633,00	6007	60,00	3,65			219,00	219,00	Carril Izquierdo
7	52+573,00	52+610,00	6007	37,00	3,65			135,05	135,00	Carril Derecho
7	52+308,00	52+640,00	6007	332,00	3,65			1.211,80	1212,00	Carril Derecho
7	52+404,00	52+645,00	6007	241,00	3,65			879,65	880,00	Carril Izquierdo
7	52+200,00	52+404,00	6007	204,00	3,65			744,60	745,00	Carril Izquierdo
7	52+200,00	52+308,00	6007	108,00	3,65			394,20	394,00	Carril Derecho
7	51+372,00	51+735,00	6007	363,00	3,65			1.324,95	1325,00	Carril Izquierdo
7	51+660,00	51+735,00	6007	75,00	3,65			273,75	274,00	Carril Derecho
7	51+341,00	51+610,00	6007	269,00	3,65			981,85	982,00	Carril Derecho
7	50+985,00	51+341,00	6007	356,00	3,65			1.299,40	1299,00	Carril Derecho
7	51+012,00	51+372,00	6007	360,00	3,65			1.314,00	1314,00	Carril Izquierdo
7	50+985,00	51+012,00	6007	27,00	3,65			98,55	99,00	Carril Izquierdo
7	50+775,00	50+785,00	6007	10,00	3,65			36,50	37,00	Carril Derecho

TOTAL	8915,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	8915,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	8915,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021 hoja 2 de 2

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		8915,00

























RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	541,90
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO Promedio (m)	ESPESOR. (m)	CARRIL	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	52+573,00	52+633,00	6007	60,00	3,65	0,08	Izquierdo	17,52	17,50	Primera capa
7	52+573,00	52+610,00	6007	37,00	3,65	0,08	Derecho	10,80	10,80	Primera capa
7	52+308,00	52+640,00	6007	332,00	3,65	0,06	Derecho	72,71	72,70	Segunda capa
7	52+404,00	52+645,00	6007	241,00	3,65	0,06	Izquierdo	52,78	52,80	Segunda capa
7	52+200,00	52+404,00	6007	204,00	3,65	0,06	Izquierdo	44,68	44,70	Segunda capa
7	52+200,00	52+308,00	6007	108,00	3,65	0,06	Derecho	23,65	23,70	Segunda capa
7	51+372,00	51+735,00	6007	363,00	3,65	0,06	Izquierdo	79,50	79,50	Segunda capa
7	51+660,00	51+735,00	6007	75,00	3,65	0,06	Derecho	16,43	16,40	Segunda capa
7	51+341,00	51+610,00	6007	269,00	3,65	0,06	Derecho	58,91	58,90	Segunda capa
7	50+985,00	51+341,00	6007	356,00	3,65	0,06	Derecho	77,96	78,00	Segunda capa
7	51+012,00	51+372,00	6007	360,00	3,65	0,06	Izquierdo	78,84	78,80	Segunda capa
7	50+985,00	51+012,00	6007	27,00	3,65	0,06	Izquierdo	5,91	5,90	Segunda capa
7	50+775,00	50+785,00	6007	10,00	3,65	0,06	Derecho	2,19	2,20	Segunda capa

TOTAL	541,9
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	541,9
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	541,9

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS	La movilidad es de todos	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	541,90
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		














INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 458Y01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		541,90











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	5,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO Promedio (m)	ESPESOR. (m)	CARRIL	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	53+264,00	53+274,50	6007	10,50	3,15	0,15	Izquierdo	4,96	5,00	Mantenimiento pavimento

TOTAL	5,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	5,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	5,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	SOPORTE DE ACTA No.	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	PERIODO:	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	CONTRATO:	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	CONTRATO:	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		5,00











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	5,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO Promedio (m)	ESPESOR. (m)	CARRIL	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	53+264,00	53+274,50	6007	10,50	3,15	0,15	Izquierdo	4,96	5,00	Mantenimiento pavimento

TOTAL	5,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	5,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	5,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	5,00
460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	1314,20
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA SECCIÓN TRANSVERSAL (m2)	ANCHO PROMEDIO (m)	ALTURA PROMEDIO (m)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	23+926,00	23+926,00	6006	24,30	411,90			1.708,77	1708,80	Liquidación por topografía excavación Box Culvert
5	23+926,00	23+926,00	6006	24,30				-1.031,61	-1031,60	Descuento cantidad cobrada acta N°46
5	23+926,00	23+926,00	6006	7,00		3,20	0,70	15,68	15,70	Excavacion para mejoramiento encole
5	23+926,00	23+926,00	6006	21,80		2,40	0,70	36,62	36,60	Excavacion para mejoramiento costado derecho Box
5	23+926,00	23+926,00	6006	21,80		2,40	0,70	36,62	36,60	Excavacion para mejoramiento costado izquierdo Box
5	24+300,00	24+400,00	6006	100,00		0,60	1,00	60,00	60,00	Excavación subdren vial - costado izquierdo
5	52+638,00	52+650,00	6007	12,00		4,00	4,24	203,50	203,50	Excavación muro gaviones
5	52+639,00	52+650,00	6007	11,00		1,20	1,00	13,20	13,20	Filtro para muro de gaviones
5	53+382,00	53+400,00	6009	18,00	87,65			122,06	122,10	Excavación Muro
5	53+382,00	53+400,00	6009	18,00		1,60	0,10	2,88	2,90	Excavación para solado muro
5	59+730,00	59+730,00	6009	10,00		2,00	1,10	22,00	22,00	caja encole
5	60+230,00	60+232,00	6009	2,00		4,00	3,50	28,00	28,00	Excavación Muro G4
5	60+290,00	60+295,50	6009	5,50		4,50	3,89	96,40	96,40	Excavación Muro G4

TOTAL	1314,2
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	1314,2
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	1314,2

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		1340,10



















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

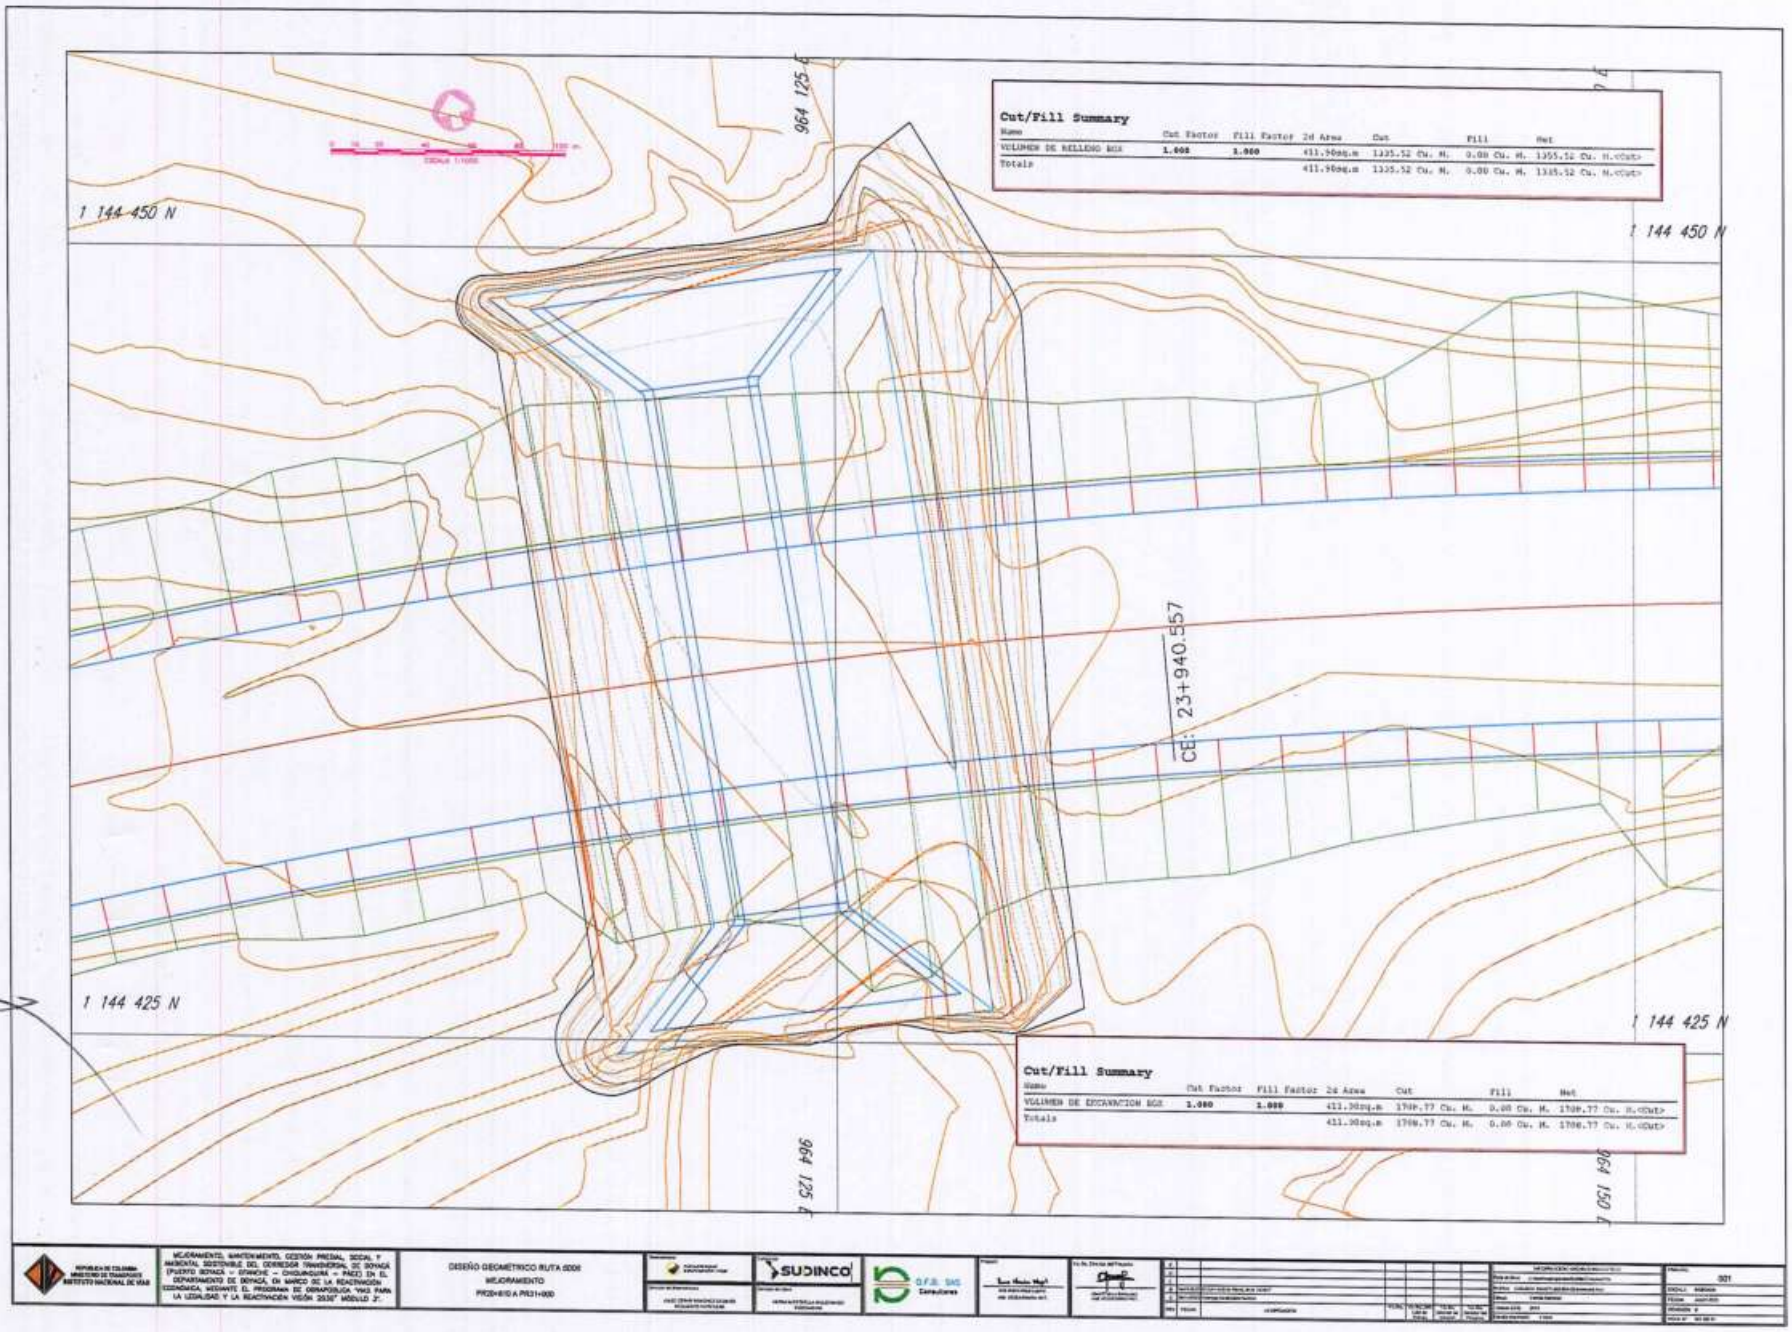
Cut/Fill Summary
Name | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area | Cut | Fill | Net
VOLUMEN DE RELLENO BOX | 1.000 | 1.000 | 411.96sq.m | 1325.52 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 1325.52 Cu. M.<Cut>
Totals | | | 411.96sq.m | 1325.52 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 1325.52 Cu. M.<Cut>
1 144 450 N
1 144 425 N
964 125 E
CE: 23+940.557
Cut/Fill Summary
Name | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area | Cut | Fill | Net
VOLUMEN DE EXCAVACION BOX | 1.000 | 1.000 | 411.96sq.m | 1708.77 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 1708.77 Cu. M.<Cut>
Totals | | | 411.96sq.m | 1708.77 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 1708.77 Cu. M.<Cut>
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR "PANAMERICANA DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ – OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ – PACO) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3".
DISEÑO GEOMETRICO RUTA 0006
MEJORAMIENTO
PR26+610 A PR31+000
SUDINCO
G.F.S. SAS
Consultores
021

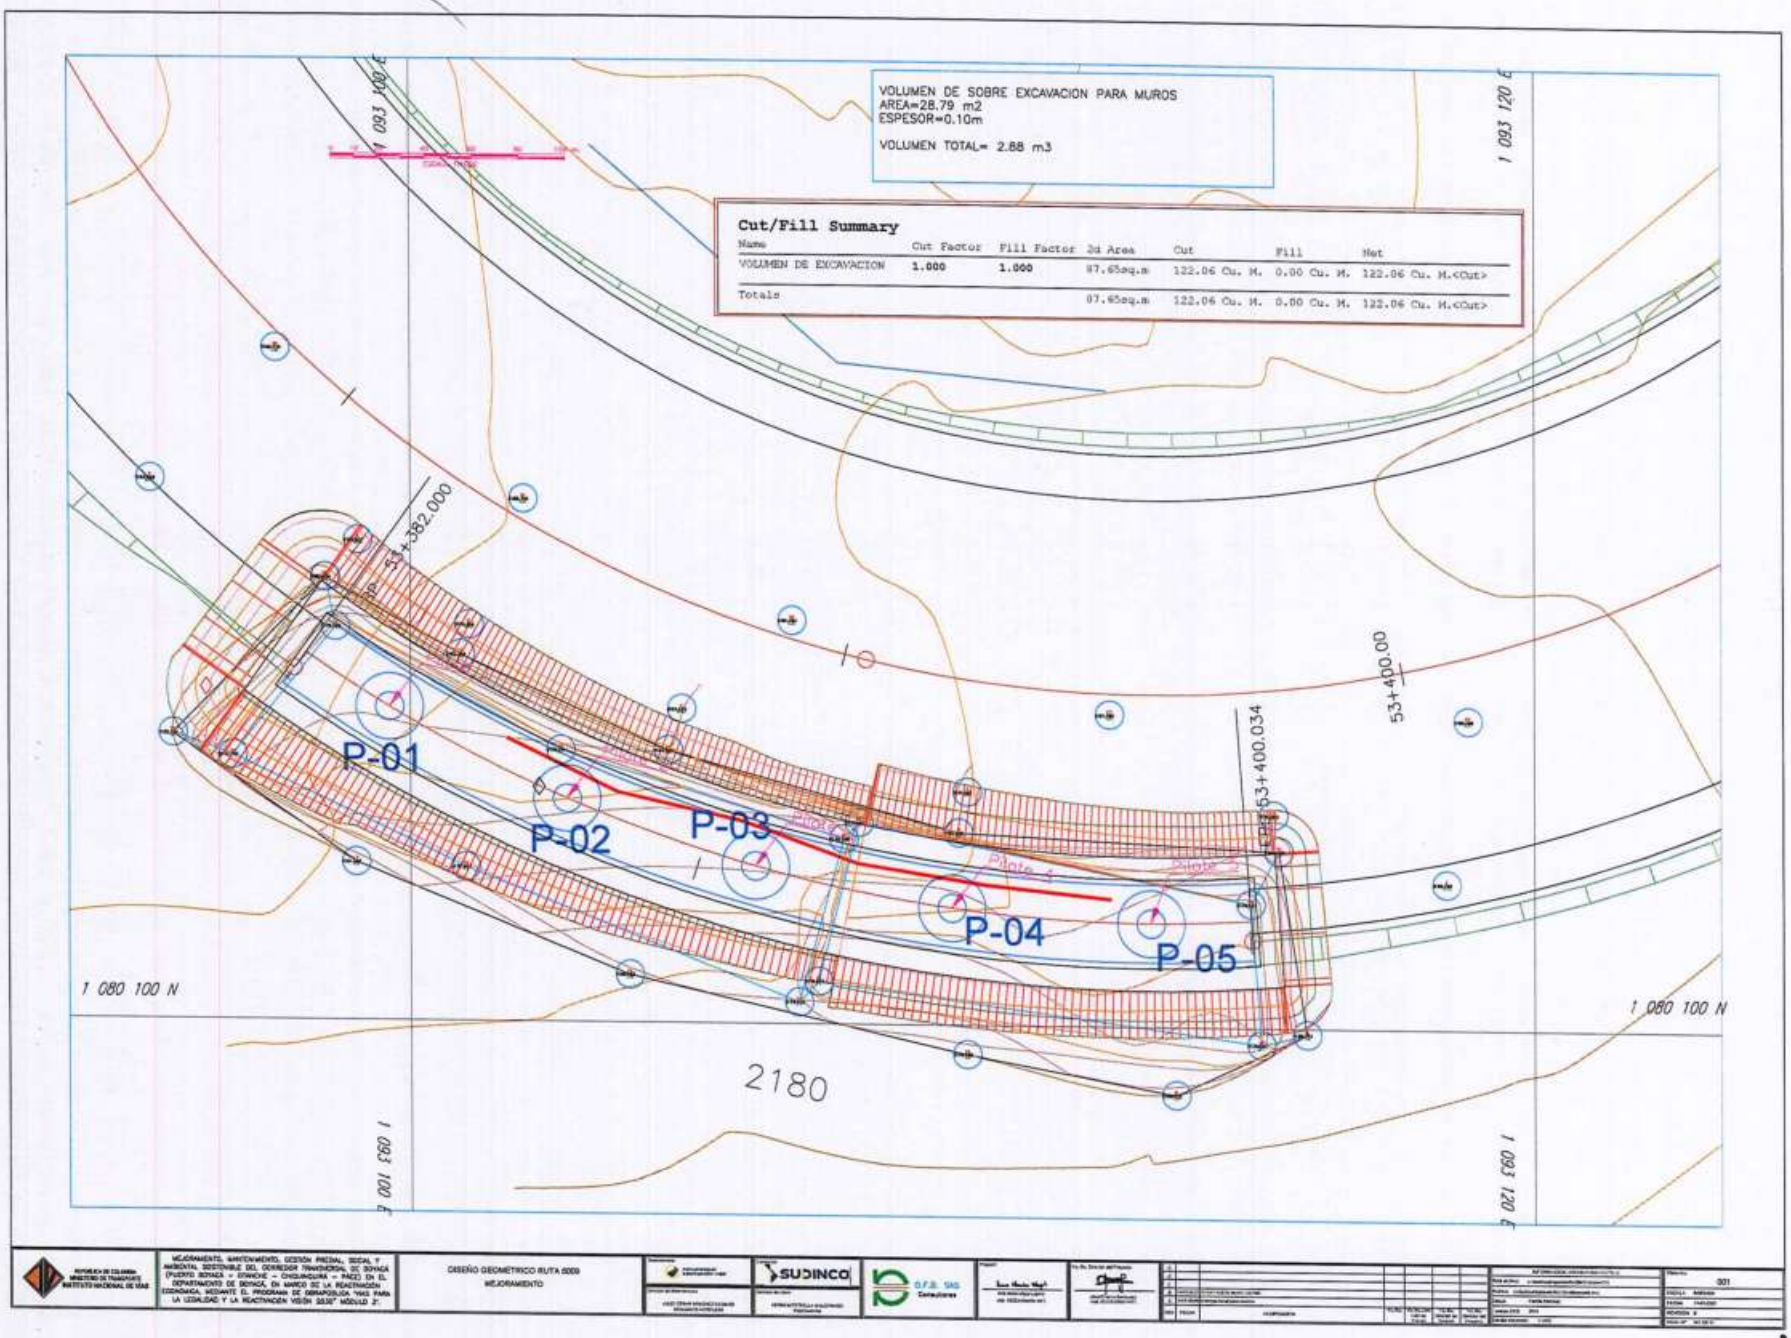
VOLUMEN DE SOBRE EXCAVACION PARA MUROS
AREA=28.79 m2
ESPESOR=0.10m
VOLUMEN TOTAL= 2.88 m3
Cut/Fill Summary
Name | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area | Cut | Fill | Net
VOLUMEN DE EXCAVACION | 1.000 | 1.000 | 87.65sq.m | 122.06 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 122.06 Cu. M.<Cut>
Totals | | | 87.65sq.m | 122.06 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 122.06 Cu. M.<Cut>
1 093 100 E
1 093 120 E
53+382.000
53+400.00
53+400.034
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
Plate 1
Plate 2
Plate 3
Plate 4
1 080 100 N
1 080 100 N
2180
1 093 100 E
1 093 120 E
SUDINCO
G.F.B. SAS
Consultores
DISEÑO GEOMETRICO RUTA 0009
MEJORAMIENTO
301

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	67,40

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA SECCIÓN CORTE (m2)	ANCHO PROMEDIO (m)	ALTURA PROMEDIO (m)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	63+277,00	63+426,00	6009	149,00		0,80	1,00	119,20	119,20	subdren vial - costado derecho
5	63+286,00	63+426,00	6009	140,00				-51,80	-51,80	Descuento por cantidad cobrada acta N°46

TOTAL	67,4
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	67,4
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	67,4

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3		67,40









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	329,20
610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	SECCIÓN PROMEDIO RELLENO (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	50+855,00	51+336,00	6007	481,00	0,35	0,45		75,76	75,80	Relleno espaldar cunetas costado derecho
5	50+855,00	51+336,00	6007	481,00	1,00	0,35		168,35	168,40	relleno espaldar cunetas - costado izquierdo
5	52+215,00	52+255,00	6007	40,00	1,00	0,35		14,00	14,00	relleno espaldar cunetas - costado derecho
5	51+691,00	51+829,00	6007	138,00	0,50	0,20		13,80	13,80	relleno espaldar cunetas - costado izquierdo
5	61+340,00	61+400,00	6009	60,00	1,40	0,30		25,20	25,20	Relleno espaldar cuneta costado derecho
5	53+370,00	53+390,00	6009	20,00	4,00	0,40		32,00	32,00	Relleno espaldar cuneta costado izquierdo

TOTAL	329,2
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	329,2
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	329,2

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUDINCO — SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	329,20
610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		



RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	1500,70

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	SECCIÓN PROMEDIO RELLENO (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	23+926,00	23+926,00	6006	0,00			411,90	1.335,52	1335,50	Relleno Box Culvert
5	50+855,00	50+855,00	6007	5,00	1,00	2,00		10,00	10,00	Lleno encole Box Culvert Aleta sur
5	50+855,00	50+855,00	6007	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	Lleno cabezote encole Box Culvert
5	50+855,00	50+855,00	6007	2,50	3,40	2,00		17,00	17,00	Lleno encole Box Culvert Aleta norte
5	50+765,00	50+765,00	6007	1,60	1,90	1,40		4,26	4,30	Lleno de aleta Box Culvert
5	50+309,00	50+309,00	6007	5,50	3,45	3,50		66,41	66,40	Lleno sur descole Box Culvert
5	50+309,00	50+309,00	6007	4,20	3,49	3,00		43,97	44,00	Lleno norte descole Box Culvert
5	60+190,00	60+190,00	6009	5,00	1,80	2,50		22,50	22,50	Lleno muro de gaviones

TOTAL	1500,7
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	1500,7
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	1500,7

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**

SUDINCO — SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	1500,70
610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3		















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

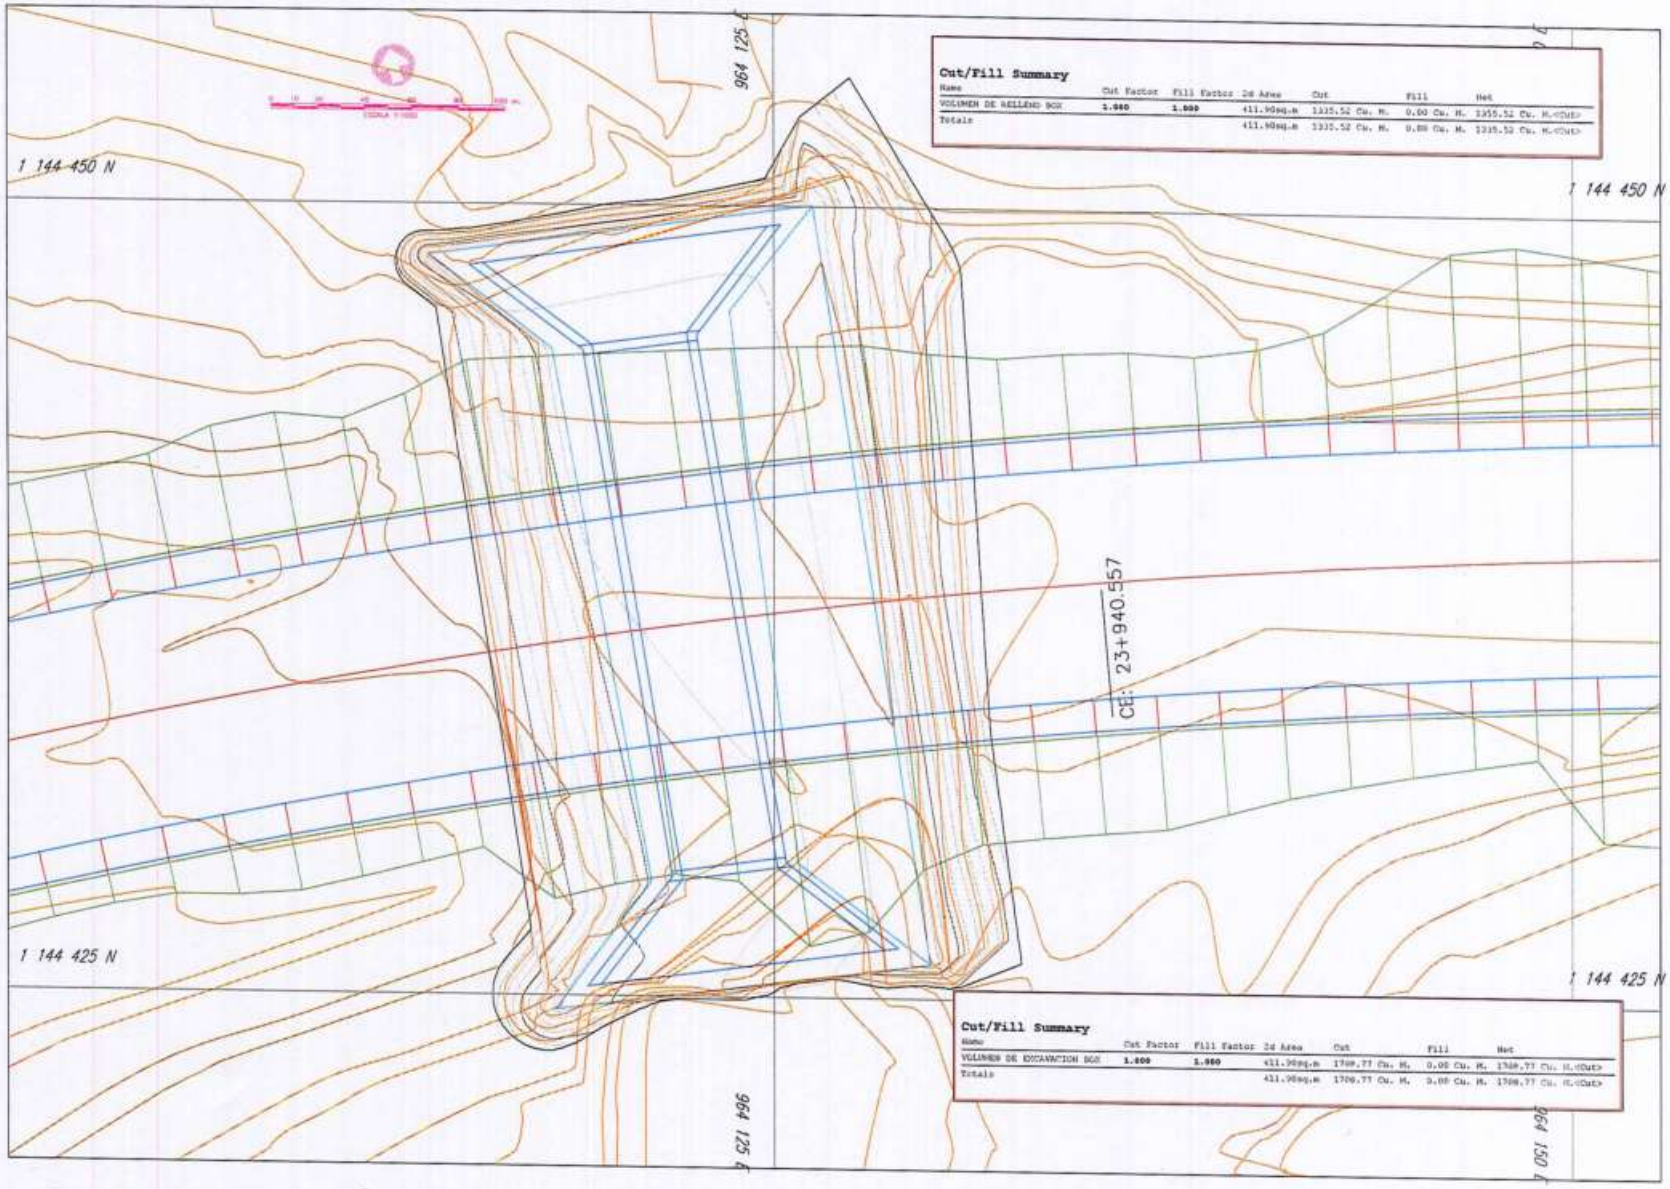
Cut/Fill Summary
Name | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area | Cut | Fill | Net
VOLUMEN DE RELLENO BOX | 1.000 | 1.000 | 411.90sq.m | 1335.52 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 1335.52 Cu. M.<Cut>
Totals | | | 411.90sq.m | 1335.52 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 1335.52 Cu. M.<Cut>
1 144 450 N
1 144 425 N
964 125 E
964 150 E
CE: 23+940.557
Cut/Fill Summary
Name | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area | Cut | Fill | Net
VOLUMEN DE EXCAVACION BOX | 1.000 | 1.000 | 411.90sq.m | 1708.77 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 1708.77 Cu. M.<Cut>
Totals | | | 411.90sq.m | 1708.77 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 1708.77 Cu. M.<Cut>
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ – OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ – PAIPA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3".
DISEÑO GEOMETRICO RUTA 6006
MEJORAMIENTO
PR35+810 A PR51+600
SUDINCO
G.F.S. SAS Consultores
001

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	90,00
621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)				LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	57+767,92	57+811,18	6009	10,00				10,00	10,00	Pilote 2 Muro
5	57+767,92	57+811,18	6009	10,00				10,00	10,00	Pilote 4 Muro
5	57+767,92	57+811,18	6009	10,00				10,00	10,00	Pilote 5 Muro
5	57+767,92	57+811,18	6009	10,00				10,00	10,00	Pilote 6 Muro
5	57+767,92	57+811,18	6009	10,00				10,00	10,00	Pilote 8 Muro
5	57+767,92	57+811,18	6009	10,00				10,00	10,00	Pilote 9 Muro
5	57+767,92	57+811,18	6009	10,00				10,00	10,00	Pilote 10 Muro
5	57+767,92	57+811,18	6009	10,00				10,00	10,00	Pilote 11 Muro
5	57+767,92	57+811,18	6009	10,00				10,00	10,00	Pilote 12 Muro

TOTAL	90,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	90,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	90,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		90,00





















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO — SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	238,00
630.3	Concreto clase 28 MPA	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	11+953,80	12+007,90	6006	54,10			0,23	12,50	12,50	New Jersey Muro Costado derecho
5	11+949,00	12+013,68	6006	64,70			0,23	14,95	14,90	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	22+126,00	22+153,00	6006	27,00			0,19	5,13	5,10	New Jersey Muro Costado derecho
5	23+020,00	23+030,00	6006	10,00	0,35	1,10	3,50	3,85	3,90	Vástago Módulo 1 Murete Costado izquierdo
5	23+030,00	23+039,00	6006	9,00	0,35	1,10	3,15	3,47	3,50	Vástago Módulo 2 Murete Costado izquierdo
5	23+039,00	23+048,00	6006	9,00	0,35	1,10	3,15	3,47	3,50	Vástago Módulo 3 Murete Costado izquierdo
5	23+048,00	23+057,00	6006	9,00	0,35	1,10	3,15	3,47	3,50	Vástago Módulo 4 Murete Costado izquierdo
5	23+057,00	23+066,00	6006	9,00	0,35	1,10	3,15	3,47	3,50	Vástago Módulo 5 Murete Costado izquierdo
5	26+141,00	26+150,00	6006	9,00	0,35	1,10	3,15	3,47	3,50	Vástago Módulo 2 Murete
5	26+150,00	26+159,00	6006	9,00	0,35	1,10	3,15	3,47	3,50	Vástago Módulo 3 Murete
5	72+967,24	72+985,78	6006	18,50			0,19	3,52	3,50	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	73+034,97	73+066,13	6006	31,20			0,19	5,93	5,90	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	73+221,96	73+248,43	6006	26,50			0,19	5,04	5,00	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	73+903,00	73+927,00	6006	24,00			0,19	4,56	4,60	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	74+046,00	74+087,11	6006	41,10			0,19	7,81	7,80	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	74+205,40	74+214,00	6006	8,60			0,19	1,63	1,60	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	74+510,00	74+533,30	6006	23,30			0,19	4,43	4,40	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	74+580,00	74+613,53	6006	33,50			0,19	6,37	6,40	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	74+656,00	74+694,38	6006	38,40			0,19	7,30	7,30	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	74+738,01	74+768,54	6006	30,50			0,19	5,80	5,80	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	74+867,00	74+875,00	6006	8,00			0,19	1,52	1,50	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	75+201,90	75+222,15	6006	20,30			0,19	3,86	3,90	New Jersey Voladizo Costado izquierdo
5	75+264,62	75+270,62	6006	6,00			0,19	1,14	1,10	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	50+414,55	50+429,85	6007	15,30			0,19	2,91	2,90	New Jersey Voladizo Costado izquierdo
5	50+633,64	50+725,14	6007	91,50			0,19	17,39	17,40	New Jersey Voladizo Costado izquierdo
5	50+885,00	50+906,04	6007	21,00			0,19	3,99	4,00	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	51+075,73	51+111,73	6007	36,00			0,19	6,84	6,80	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	52+216,12	52+258,20	6007	42,10			0,19	8,00	8,00	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	52+568,86	52+596,26	6007	27,40			0,19	5,21	5,20	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	50+855,00	50+855,00	6007	0,60	5,50	0,30	3,30	0,99	1,00	Losa superior Box Culvert Costado derecho
5	50+309,00	50+309,00	6007	2,40	2,40	0,35	5,76	2,02	2,00	Losa inferior prolongación Box Culvert costado izquierdo
5	50+309,00	50+309,00	6007	6,80	1,55	0,35	10,54	3,69	3,70	Losa inferior Box Culvert existente costado izquierdo
5	50+309,00	50+309,00	6007	2,40	2,50	0,30	6,00	3,60	3,60	Muros prolongación Box Culvert costado izquierdo (x2)
5	50+309,00	50+309,00	6007	2,40	2,50	0,30	6,00	1,80	1,80	Losa superior Box Culvert existente costado izquierdo
5	57+893,40	57+915,00	6009	21,60			0,19	4,10	4,10	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	58+872,00	58+898,20	6009	26,20			0,19	4,98	5,00	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	59+160,19	59+201,97	6009	41,80			0,19	7,94	7,90	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	59+464,85	59+490,45	6009	25,60			0,19	4,86	4,90	New Jersey Voladizo Costado izquierdo
5	59+550,00	59+575,60	6009	25,60			0,19	4,86	4,90	New Jersey Voladizo Costado izquierdo
5	59+749,92	59+863,19	6009	111,60			0,19	21,20	21,20	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	55+730,00	55+730,00	6009	3,90	0,30	0,60	1,17	0,70	0,70	Guardarrueda costado izquierdo
5	59+630,00	59+630,00	6009	1,90	0,20	0,90	0,38	0,34	0,30	Realce obra costado izquierdo
5	63+268,00	63+277,00	6009	9,00	0,35	3,21	3,15	10,11	10,10	Módulo 2 Muro 11N
5	63+277,00	63+286,00	6009	9,00	0,30	2,40	2,70	6,48	6,50	Módulo 3 Muro 11N
5	63+277,00	63+286,00	6009	0,30			0,79	-0,24	-0,20	Descuento alcantarilla Módulo 3 muro 11N

TOTAL	238,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	238,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	238,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 60
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
630.3	Concreto clase 28 MPA	m3		238,00















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSA BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	120,10

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PROFUND. (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	23+020,00	23+030,00	6006	10,00	2,50	0,33	25,00	8,13	8,10	Zapata Módulo 1 Murete Costado izquierdo sección trapezoidal
5	23+020,00	23+030,00	6006	10,00	0,35	0,40	3,50	1,40	1,40	Zapata Módulo 1 Murete Costado izquierdo sección rectangular
5	23+926,00	23+926,00	6006	4,20	0,35	2,27	1,47	6,67	6,70	Aletas descole Box Culvert (x2)
5	23+926,00	23+926,00	6006	9,80	1,00	0,40	9,80	3,92	3,90	Dentellón aletas encole Box Culvert
5	23+926,00	23+926,00	6006	6,35	3,00	0,40	19,05	7,62	7,60	Losa inferior aletas encole Box Culvert
5	23+926,00	23+926,00	6006	4,20	0,35	2,30	1,47	6,76	6,80	Aletas encole Box Culvert (x2)
5	50+309,00	50+309,00	6007	3,50	0,30	4,35	1,05	9,14	9,10	Aletas descole Box Culvert (x2)
5	50+309,00	50+309,00	6007	4,80	5,20	0,35	24,96	8,74	8,70	Losa inferior aletas descole Box Culvert
5	50+309,00	50+309,00	6007	5,10	3,55	0,30	18,11	5,43	5,40	Aleta descole Box Culvert
5	50+309,00	50+309,00	6007	2,10	1,10	0,30	2,31	0,69	0,70	Muro entre aletas descole Box Culvert
5	50+786,00	50+786,00	6007	3,55	2,05	0,20	7,28	1,46	1,50	Muro entre aletas encole Box Culvert
5	50+786,00	50+786,00	6007	1,80	1,60	0,20	2,88	1,15	1,20	Aletas encole Box Culvert (x2)
5	50+855,00	50+855,00	6007	2,50	0,30	2,50	0,75	1,88	1,90	Muro entre aletas encole Box Culvert
5	50+855,00	50+855,00	6007	2,85	0,30	4,13	0,86	7,06	7,10	Aletas encole Box Culvert (x2)
5	51+190,00	51+212,00	6007	22,00	1,30	0,30	28,60	8,58	8,60	Zarpa murete
5	51+190,00	51+212,00	6007	22,00	0,30	0,40	6,60	2,64	2,60	Dentellon murete
5	57+767,92	57+778,72	6009	10,80	1,40	0,70	15,12	10,58	10,60	Zapata Módulo 1 Muro
5	57+778,72	57+789,52	6009	10,80	1,40	0,70	15,12	10,58	10,60	Zapata Módulo 2 Muro
5	60+190,00	60+190,00	6009	3,00	0,30	2,55	0,90	2,30	2,30	Aletas encole Box
5	60+190,00	60+190,00	6009	2,50	4,00	0,40	10,00	4,00	4,00	Losa inferior aletas encole Box
5	63+277,00	63+286,00	6009	9,00	2,70	0,40	24,30	9,72	9,70	Zapata Módulo 3 Muro 11N
5	63+277,00	63+286,00	6009	9,00	0,60	0,30	5,40	1,62	1,60	Dentellón Módulo 3 Muro 11N

TOTAL	120,1
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	120,1
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	120,1

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSA BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	120,10
630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		



















7

5

REGISTRO FOTOGRAFICO


CARRETERA:	TRANSVERSA BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	120,10
630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		







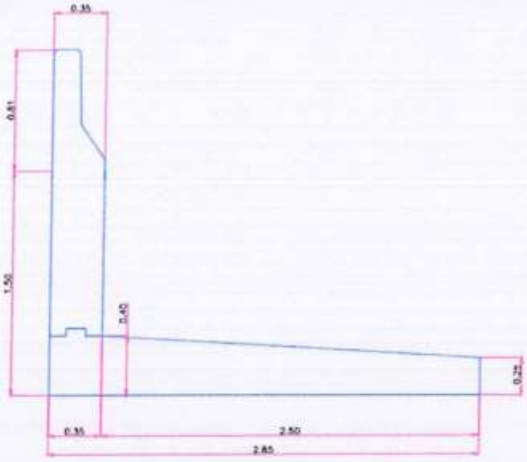

SECCIÓN TRANSVERSAL MURETE

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	117,40

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ÁREA TALUD (m2)	ESPESOR (m)		VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	55+930,00	55+950,00	6009	20,00	154,26	0,10		15,43	15,40	Protección talud costado derecho
5	56+700,00	56+745,00	6009	45,00	557,39	0,10		55,74	55,70	Protección talud costado derecho
5	57+715,00	57+745,00	6009	30,00	180,86	0,10		18,09	18,10	Protección talud costado derecho
5	59+835,00	59+866,00	6009	31,00	282,22	0,10		28,22	28,20	Protección talud costado izquierdo

TOTAL	117,4
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	117,4
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	117,4

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3		117,40


















RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORIA

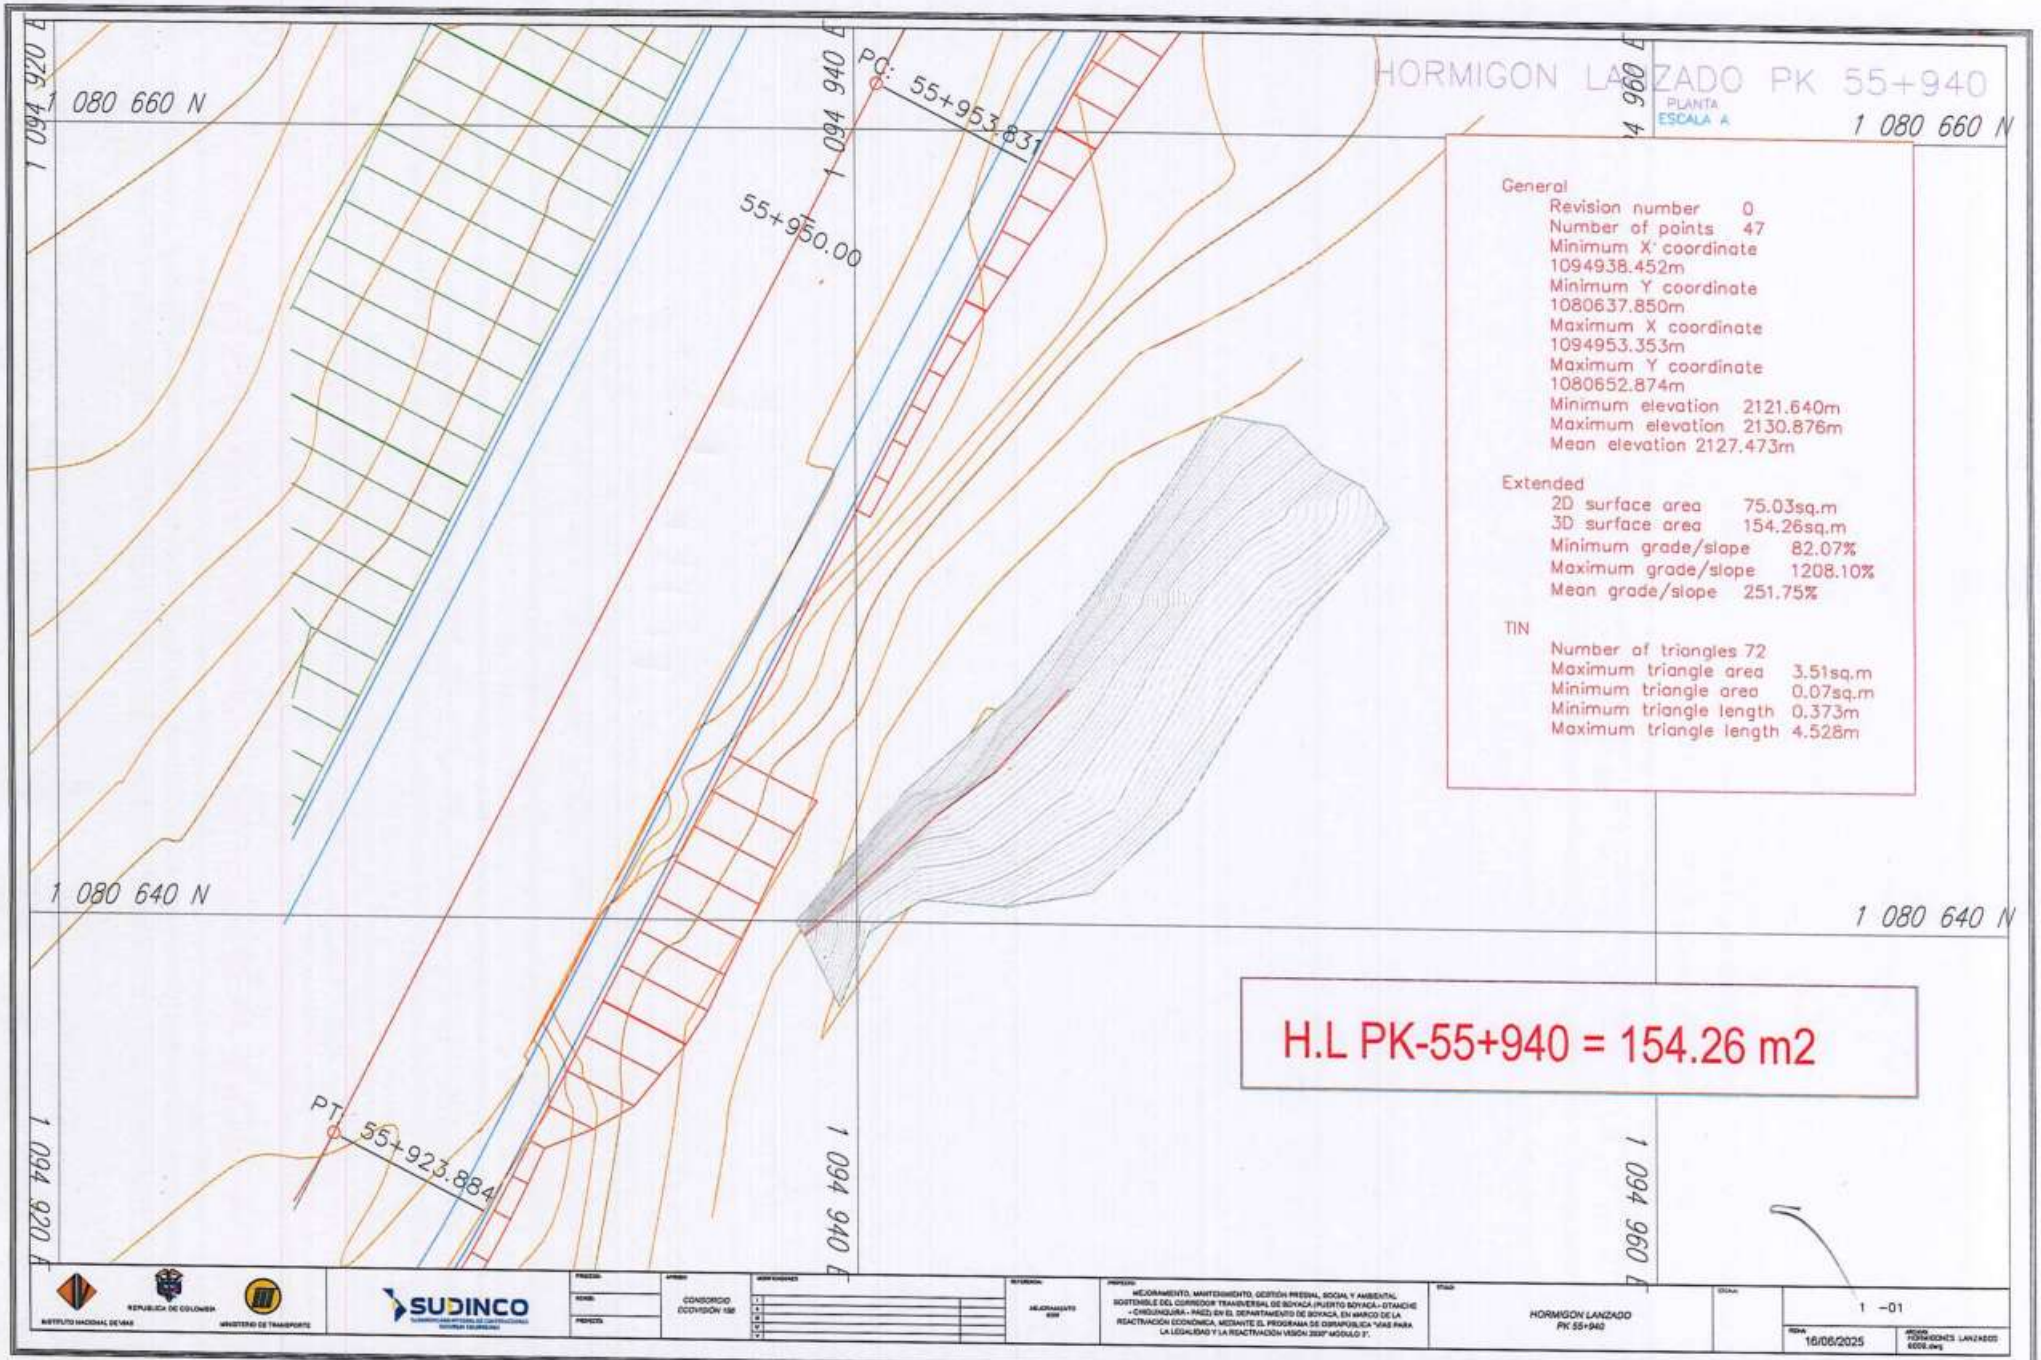
HORMIGON LANZADO PK 55+940
PLANTA
ESCALA A
1 080 660 N
1 080 640 N
1 094 920 E
1 094 940 E
1 094 960 E
PC: 55+953.831
55+950.00
PT: 55+923.884
General
Revision number 0
Number of points 47
Minimum X coordinate
1094938.452m
Minimum Y coordinate
1080637.850m
Maximum X coordinate
1094953.353m
Maximum Y coordinate
1080652.874m
Minimum elevation 2121.640m
Maximum elevation 2130.876m
Mean elevation 2127.473m
Extended
2D surface area 75.03sq.m
3D surface area 154.26sq.m
Minimum grade/slope 82.07%
Maximum grade/slope 1208.10%
Mean grade/slope 251.75%
TIN
Number of triangles 72
Maximum triangle area 3.51sq.m
Minimum triangle area 0.07sq.m
Minimum triangle length 0.373m
Maximum triangle length 4.528m
H.L PK-55+940 = 154.26 m2
SUDINCO
HORMIGON LANZADO
PK 55+940
1 -01
16/06/2025

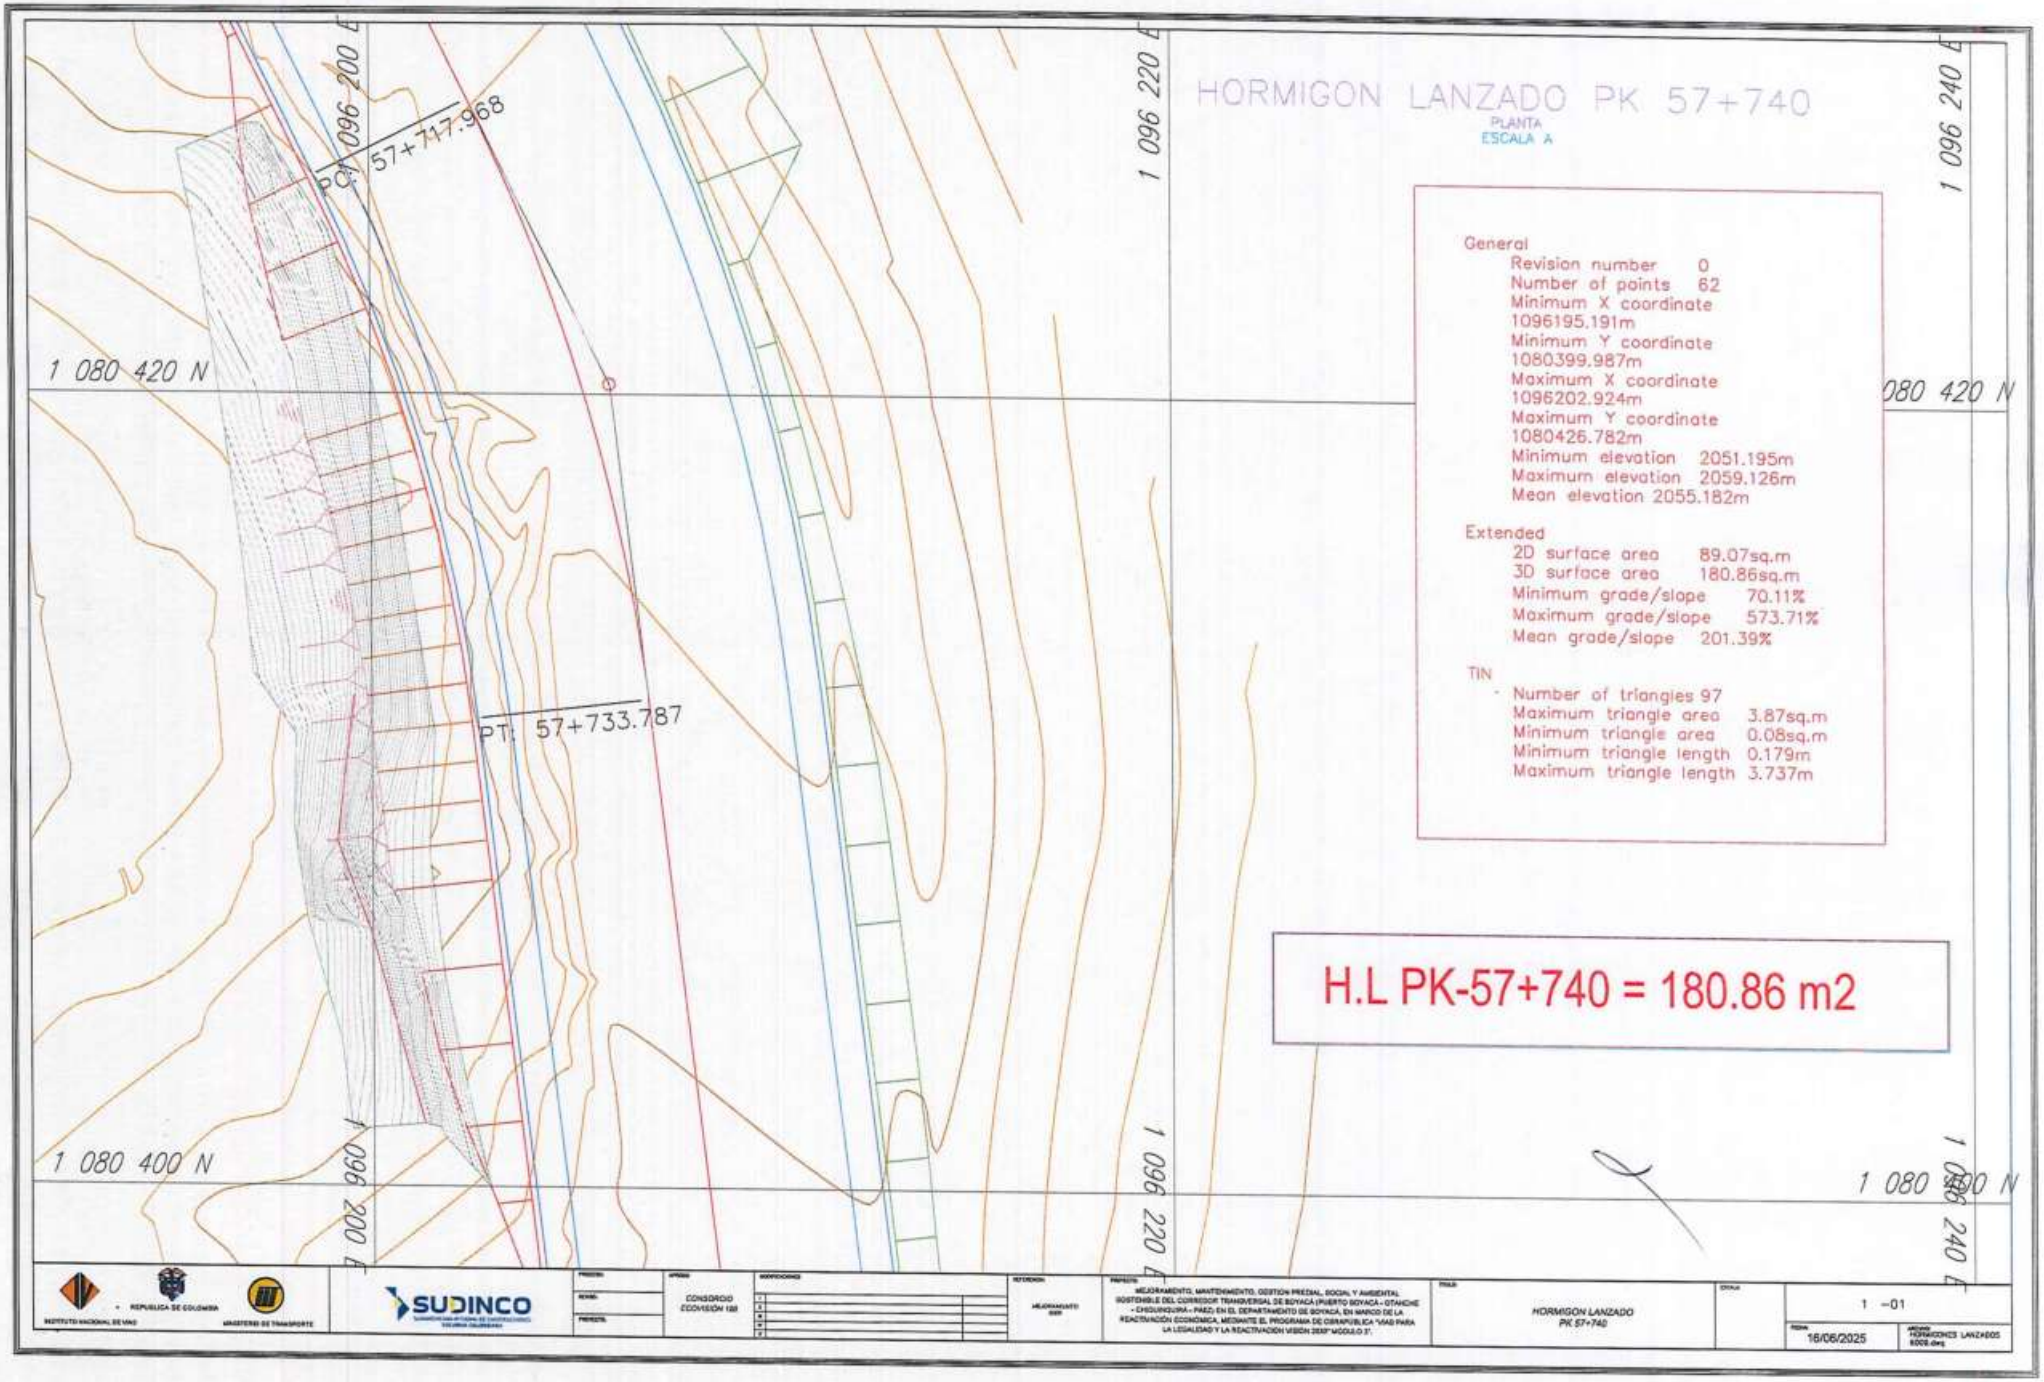
HORMIGON LANZADO PK 57+740
PLANTA
ESCALA A
PC: 57+717.968
PT: 57+733.787
1 096 200 E
1 096 220 E
1 096 240 E
1 080 420 N
1 080 400 N
General
Revision number 0
Number of points 62
Minimum X coordinate 1096195.191m
Minimum Y coordinate 1080399.987m
Maximum X coordinate 1096202.924m
Maximum Y coordinate 1080426.782m
Minimum elevation 2051.195m
Maximum elevation 2059.126m
Mean elevation 2055.182m
Extended
2D surface area 89.07sq.m
3D surface area 180.86sq.m
Minimum grade/slope 70.11%
Maximum grade/slope 573.71%
Mean grade/slope 201.39%
TIN
Number of triangles 97
Maximum triangle area 3.87sq.m
Minimum triangle area 0.08sq.m
Minimum triangle length 0.179m
Maximum triangle length 3.737m
H.L PK-57+740 = 180.86 m2
SUDINCO
CONSORCIO ECOVISIÓN 120
HORMIGON LANZADO PK 57+740
1 -01
16/06/2025

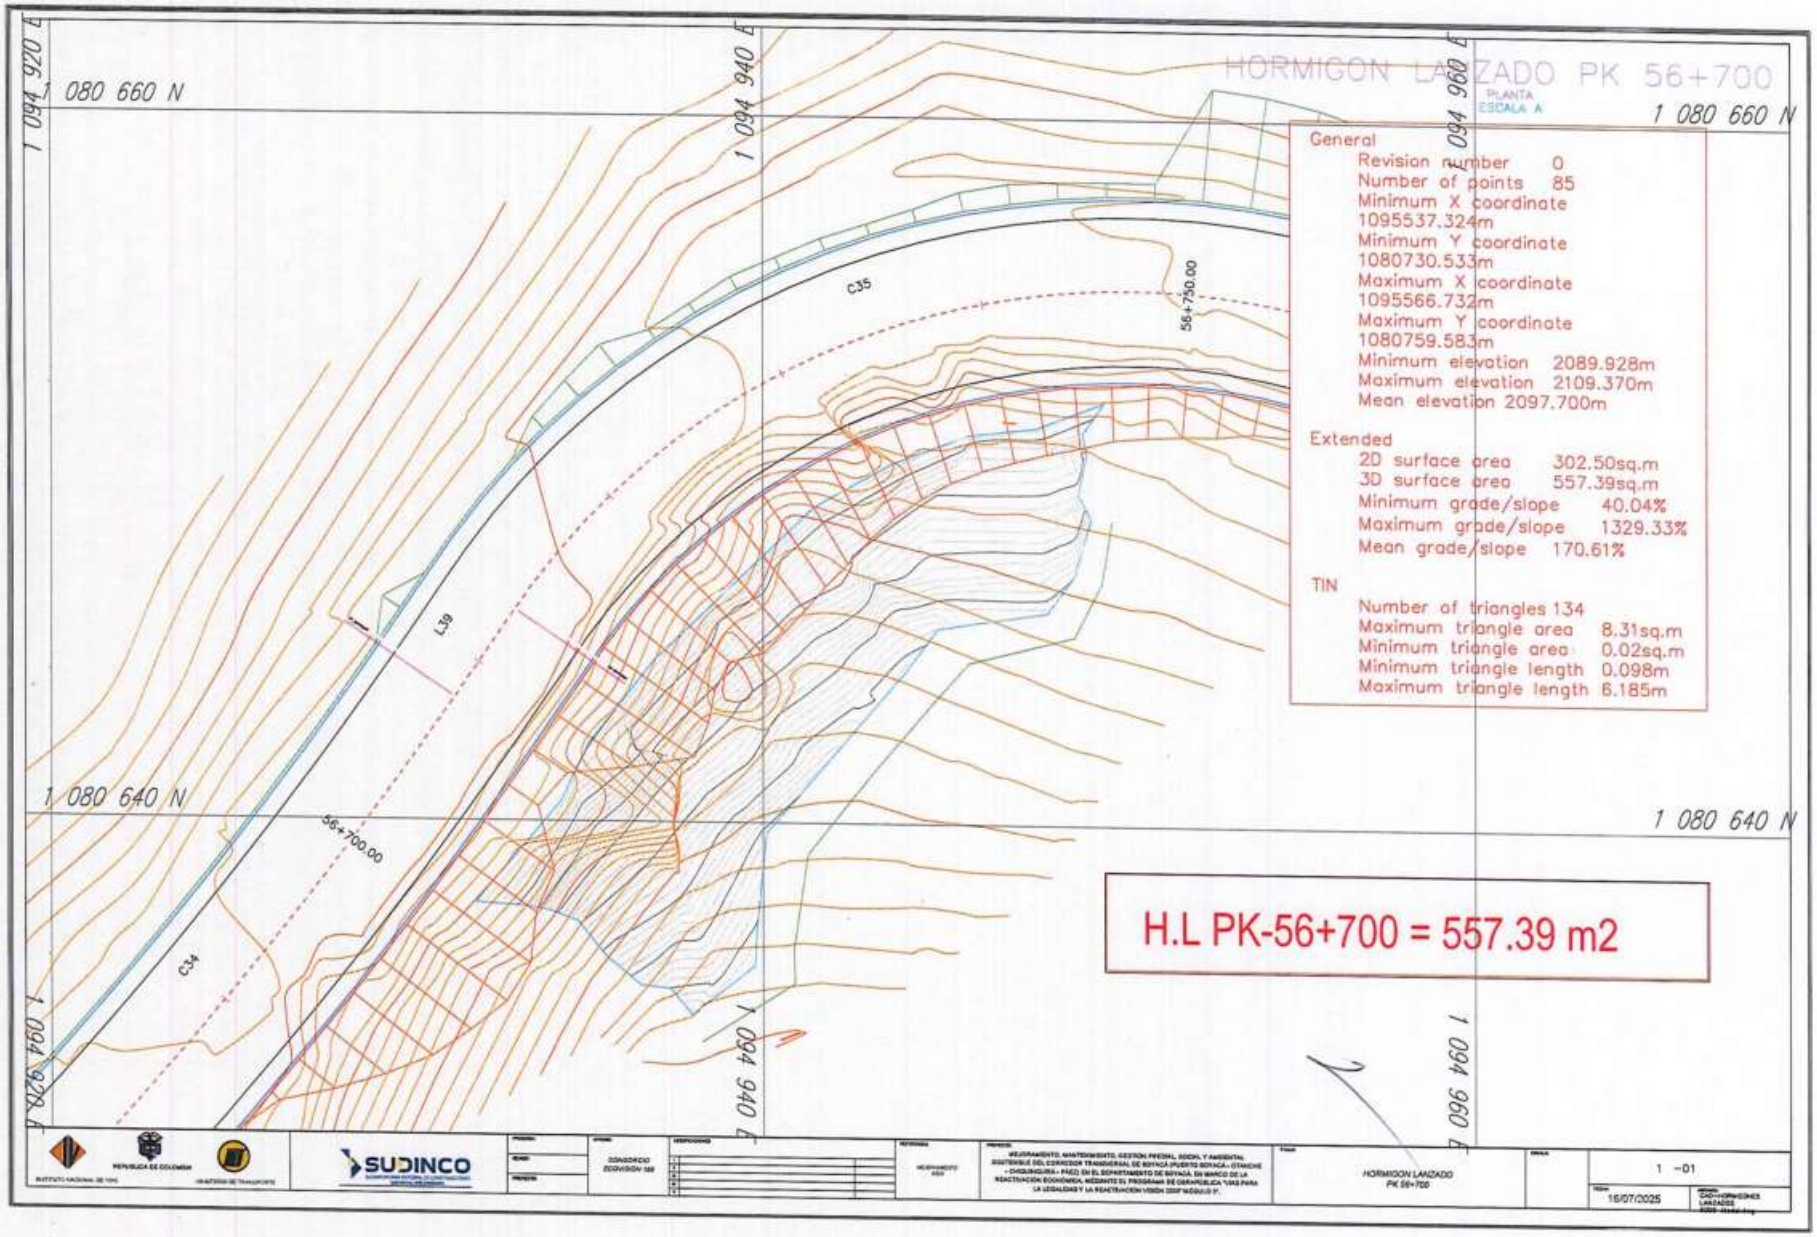
HORMIGON LANZADO PK 56+700
PLANTA
ESCALA A
1 080 660 N
1 080 640 N
1 094 920 E
1 094 940 E
1 094 960 E
C35
C34
L39
56+700.00
56+750.00
General
Revision number 0
Number of points 85
Minimum X coordinate 1095537.324m
Minimum Y coordinate 1080730.533m
Maximum X coordinate 1095566.732m
Maximum Y coordinate 1080759.583m
Minimum elevation 2089.928m
Maximum elevation 2109.370m
Mean elevation 2097.700m
Extended
2D surface area 302.50sq.m
3D surface area 557.39sq.m
Minimum grade/slope 40.04%
Maximum grade/slope 1329.33%
Mean grade/slope 170.61%
TIN
Number of triangles 134
Maximum triangle area 8.31sq.m
Minimum triangle area 0.02sq.m
Minimum triangle length 0.098m
Maximum triangle length 6.185m
H.L PK-56+700 = 557.39 m2
SUDINCO
HORMIGON LANZADO PK 56+700
1 -01
15/07/2025

57

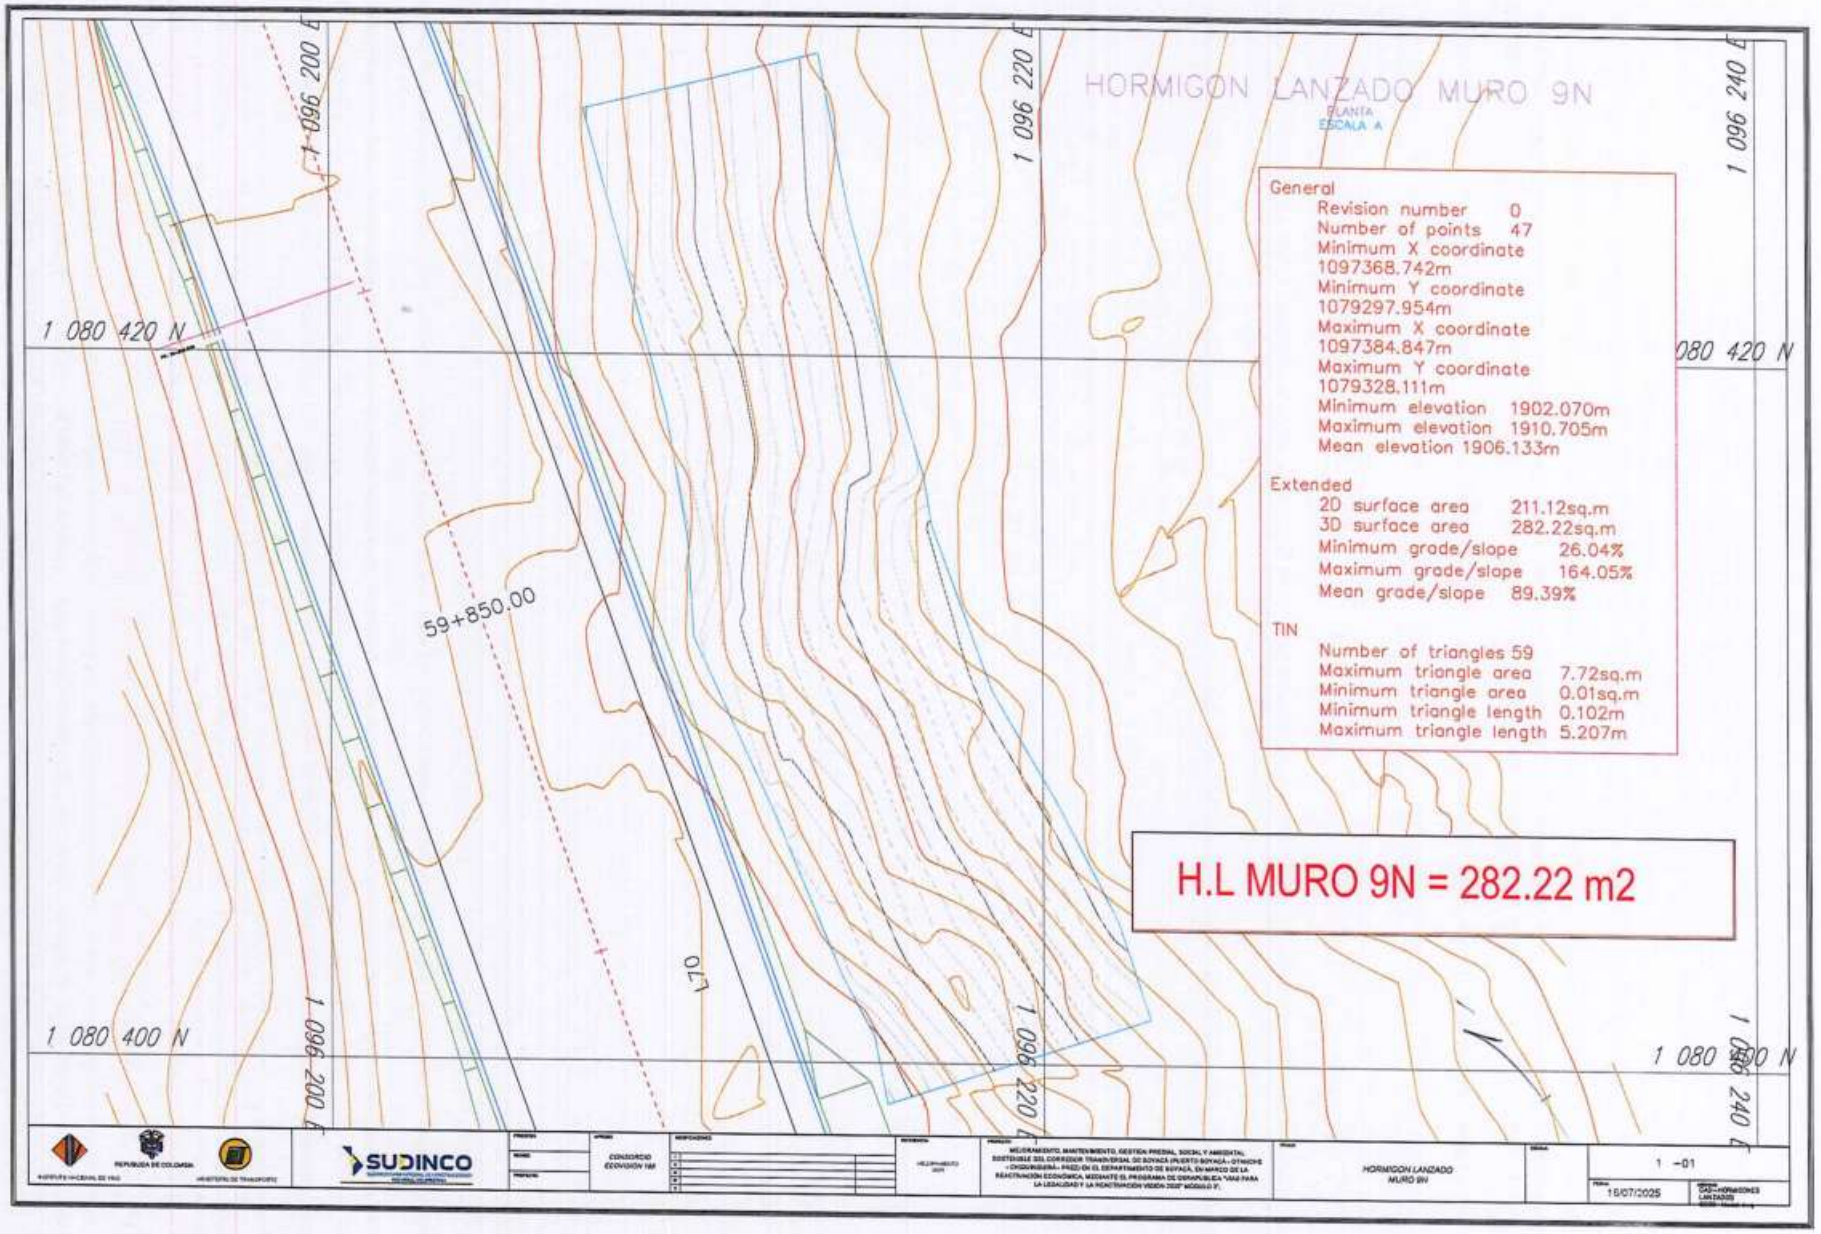
HORMIGON LANZADO MURO 9N
PLANTA
ESCALA A
1 096 200 E
1 096 220 E
1 096 240 E
1 080 420 N
1 080 400 N
59+850.00
L70
General
Revision number 0
Number of points 47
Minimum X coordinate 1097368.742m
Minimum Y coordinate 1079297.954m
Maximum X coordinate 1097384.847m
Maximum Y coordinate 1079328.111m
Minimum elevation 1902.070m
Maximum elevation 1910.705m
Mean elevation 1906.133m
Extended
2D surface area 211.12sq.m
3D surface area 282.22sq.m
Minimum grade/slope 26.04%
Maximum grade/slope 164.05%
Mean grade/slope 89.39%
TIN
Number of triangles 59
Maximum triangle area 7.72sq.m
Minimum triangle area 0.01sq.m
Minimum triangle length 0.102m
Maximum triangle length 5.207m
H.L MURO 9N = 282.22 m2
SUDINCO
CONSORCIO ECOVIGIA 161
HORMIGON LANZADO MURO 9N
1 -01
15/07/2025

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	11,40

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	50+323,00	50+470,00	6007	147,00	0,13	0,10		1,91	1,90	Nivelación entre vía y canal
5	52+235,00	52+235,00	6007	2,00	1,40	0,10		0,28	0,30	disipador entrega a encole Box Culvert
5	52+401,00	52+401,00	6007	4,00	1,40	0,10		0,56	0,60	disipador entrega encole alcantarilla
5	52+520,00	52+520,00	6007	1,90	1,40	0,10		0,27	0,30	disipidor entrega de cuneta
5	51+930,00	51+930,00	6007	2,90	1,20	0,15		0,52	0,50	acceso peatonal
5	51+932,00	51+932,00	6007	2,00	1,20	0,10		0,24	0,20	disipador entrega a cuneta
5	50+970,00	50+970,00	6007	4,00	5,00	0,10		2,00	2,00	Losa
5	51+710,00	51+710,00	6007	4,00	0,70	0,10		0,28	0,30	disipador para entrega a cuneta
5	50+309,00	50+314,00	6007	5,00	1,00	0,15		0,75	0,80	Losa inferior canal de entrega a encole boxculvert
5	50+296,00	50+316,00	6007	20,00	1,50	0,15		4,50	4,50	Anden

TOTAL	11,4
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	11,4
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	11,4

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	60
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	11,40
630.4	Concreto clase 21 MPA	m3		











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	21,90

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	23+926,00	23+926,00	6006	3,00	7,00	0,10	0,70	2,10	2,10	Solado descole Box Culvert
5	25+634,00	25+634,00	6006	5,40	1,60	0,10	0,16	0,86	0,90	Solado alcantarilla costado derecho
5	25+634,00	25+634,00	6006	5,00	1,00	0,34	0,34	1,70	1,70	Atraque alcantarilla costado derecho
5	52+255,00	52+275,00	6007	20,00	0,23	0,35	0,08	1,61	1,60	Lleno entre espaldar cuneta y gaviones construidos
5	52+286,00	52+314,00	6007	28,00	0,35	0,25	0,09	2,45	2,50	Lleno entre espaldar cuneta y gaviones construidos
5	52+505,00	52+511,00	6007	6,40	0,40	0,36	0,14	0,92	0,90	Lleno entre espaldar cuneta y gaviones construidos
5	52+614,00	52+634,00	6007	20,00	0,20	0,35	0,07	1,40	1,40	Lleno entre espaldar cuneta y gaviones construidos
5	51+705,00	51+715,00	6007	10,40	0,49	0,35	0,17	1,78	1,80	Lleno entre espaldar cuneta y gaviones construidos
5	52+570,00	52+590,00	6007	20,00	0,35	0,07	0,02	0,49	0,50	Lleno entre espaldar cuneta y gaviones construidos
5	51+190,00	52+212,00	6007	22,00	1,30	0,10	0,13	2,86	2,90	Solado murete
5	57+770,00	57+813,20	6009	43,20	1,40	0,10	0,14	6,05	6,00	Solado Módulos 1, 2 3 y 4 Muro
5	57+770,00	57+813,20	6009			0,10	-1,13	-1,36	-1,40	Descuento caisson construidos (12 en total)
5	63+274,00	63+274,00	6009	2,50	1,60	0,25	0,40	1,00	1,00	solado tubería

TOTAL	21,9
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	21,9
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	21,9

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 60
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
630.6	Concreto clase 14 MPA	m3		21,90

















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	61,10
630.7	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA SECCIÓN TRANSVERSAL (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	23+926,00	23+926,00	6006	7,00	2,60	0,70		12,74	12,70	Concreto Ciclópeo para mejoramiento encole Box Culvert
5	PR 050+324	PR 050+324	6007	5,00	1,00	0,20		1,00	1,00	Ciclópeo para entrega descole Box Culvert
5	PR 050+850	PR 050+853	6007	3,00	0,80	0,70		1,68	1,70	ciclópeo nivelación para soporte cunetas
5	PR 050+629	PR 050+629	6007	2,00	0,60	0,40		0,48	0,50	ciclópeo nivelación para soporte cunetas
5	PR 050+765	PR 050+765	6007	3,50	1,60	0,35		1,96	2,00	ciclópeo para entrega a encole alcantarilla
5	PR 050+786	PR 050+786	6007	1,50	2,90	0,60		2,61	2,60	ciclópeo para entrega a encole Box Culvert
5	PR 050+309	PR 050+309	6007	5,70	1,20	0,80		5,47	5,50	ciclópeo protección pata talud
5	PR 050+315	PR 050+315	6007	2,00	1,30	0,50		1,30	1,30	ciclópeo nivelación para entrega a descole
5	60+190,00	60+190,00	6009	3,50	1,50	1,00		5,25	5,30	(27/06/2025) ciclópeo protección talud encole Box Culvert
5	60+190,00	60+190,00	6009	6,00	1,50	1,00		9,00	9,00	(28/06/2025) ciclópeo protección talud encole Box Culvert
5	60+190,00	60+190,00	6009	4,80	1,30	1,20		7,49	7,50	(09/07/2025) ciclópeo protección talud encole Box Culvert
5	63+274,00	63+274,00	6009	1,50	1,60	0,30		0,72	0,70	mejoramiento superficie de apoyo instalación tubería
5	63+277,00	63+286,00	6009	9,00	2,10	0,60		11,34	11,30	mejoramiento para construcción módulo 3 Muro

TOTAL	61,1
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	61,1
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	61,1

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	61,10
630.7	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		59360,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	ELEMENTO	LONGITUD m (A)	DIAMETRO # (B)	PESO UNITARIO Kg (C)	CANTIDAD Und (D)	PESO TOTAL (E=A*C*D)	OBSERVACIONES
4	23+020,00	23+030,00	6006	New Jersey módulo 1	0,90	4	1,00	63,00	56,70	
4					2,17	4	1,00	81,00	175,77	
4	23+030,00	23+039,00	6006	New Jersey módulo 2	0,90	4	1,00	63,00	56,70	
4					2,17	4	1,00	81,00	175,77	
4	23+039,00	23+048,00	6006	New Jersey módulo 3	0,90	4	1,00	63,00	56,70	
4					2,17	4	1,00	81,00	175,77	
4	23+048,00	23+057,00	6006	New Jersey módulo 4	0,90	4	1,00	63,00	56,70	
4					2,17	4	1,00	81,00	175,77	
4	23+057,00	23+066,00	6006	New Jersey módulo 5	0,90	4	1,00	63,00	56,70	
4					2,17	4	1,00	81,00	175,77	
4	23+020,00	23+030,00	6006	Muro Módulo 1	9,90	4	1,00	29,00	287,10	
4					1,75	4	1,00	67,00	117,25	
4					4,15	4	1,00	51,00	211,65	
4					3,30	6	2,24	100,00	739,20	
4	23+926,00	23+926,00	6006	Encole Box Culvert	3,36	4	1,00	67,00	225,12	
4					2,85	4	1,00	36,00	102,60	
4					3,05	4	1,00	70,00	213,50	
4					6,90	5	1,55	25,00	267,38	
4					7,06	4	1,00	13,00	91,78	
4					4,40	4	1,00	12,00	52,80	
4					4,60	4	1,00	12,00	55,20	
4					2,40	4	1,00	18,00	43,20	
4					2,60	4	1,00	18,00	46,80	
4					1,82	4	1,00	12,00	21,84	
4	26+132,00	26+141,00	6006	New Jersey módulo 1	0,90	4	1,00	63,00	56,70	
4					2,17	4	1,00	81,00	175,77	
4	26+141,00	26+150,00	6006	New Jersey módulo 2	0,90	4	1,00	63,00	56,70	
4					2,17	4	1,00	81,00	175,77	
4	26+150,00	26+159,00	6006	New Jersey módulo 3	0,90	4	1,00	63,00	56,70	
4					2,17	4	1,00	81,00	175,77	
4	50+855,00	50+855,00	6007	Encole Box Culvert	3,95	4	1,00	40,00	158,00	
4					3,45	4	1,00	40,00	138,00	
4					4,40	4	1,00	11,00	48,40	
4					1,80	4	1,00	18,00	32,40	
4	50+309,00	50+309,00	6007	Box Culvert	7,30	4	1,00	16,00	116,80	
4					1,70	4	1,00	51,00	86,70	
4					1,70	4	1,00	51,00	86,70	
4					2,35	4	1,00	30,00	70,50	
4					2,35	4	1,00	30,00	70,50	
4					2,65	4	1,00	108,00	286,20	
4					3,50	4	1,00	44,00	154,00	
4					1,05	4	1,00	22,00	23,10	
4					3,50	4	1,00	41,00	143,50	
4					3,50	4	1,00	41,00	143,50	
4					5,00	4	1,00	41,00	205,00	
4					5,10	5	1,55	41,00	324,11	
4					4,00	4	1,00	110,00	440,00	
4					4,10	5	1,55	110,00	699,05	
4					9,00	4	1,00	42,00	378,00	
4					5,45	4	1,00	42,00	228,90	
4					2,90	4	1,00	14,00	40,60	
4					2,50	4	1,00	8,00	20,00	
4	50+786,00	50+786,00	6007	Encole Box Culvert	5,70	4	1,00	3,00	17,10	
4					1,70	4	1,00	4,00	6,80	
4					3,80	4	1,00	6,00	22,80	
4					3,90	4	1,00	5,00	19,50	
4					3,90	4	1,00	5,00	19,50	
4					3,40	4	1,00	8,00	27,20	
4					3,40	4	1,00	8,00	27,20	
4	50+500,00	50+500,00	6007	Acceso costado izquierdo	9,00	4	1,00	11,00	99,00	
4					1,90	4	1,00	45,00	85,50	
4	52+630,00	52+630,00	6007	Acceso costado izquierdo	8,00	4	1,00	10,00	80,00	
4					1,95	4	1,00	40,00	78,00	

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		59360,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	ELEMENTO	LONGITUD m (A)	DIAMETRO # (B)	PESO UNITARIO Kg (C)	CANTIDAD Und (D)	PESO TOTAL (E=A*C*D)	OBSERVACIONES
4	51+190,00	51+212,00	6007	Murete	1,75	5	1,55	74,00	200,73	
4					1,55	5	1,55	74,00	177,79	
4					2,90	5	1,55	74,00	332,63	
4					11,00	4	1,00	44,00	484,00	
4					1,50	5	1,55	74,00	172,05	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Pilote 10 (Profundidad L=10 m) Anillos	1,50	4	1,00	160,00	240,00	
4					4,87	4	1,00	40,00	194,80	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Pilote 11 (Profundidad L=10 m) Anillos	1,50	4	1,00	160,00	240,00	
4					4,87	4	1,00	40,00	194,80	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Pilote 12 (Profundidad L=10 m) Anillos	1,50	4	1,00	160,00	240,00	
4					4,87	4	1,00	40,00	194,80	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 1	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 2	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 3	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 4	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 5	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 6	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 7	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 8	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 9	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 10	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 11	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	59360,00
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	ELEMENTO	LONGITUD m (A)	DIAMETRO # (B)	PESO UNITARIO Kg (C)	CANTIDAD Und (D)	PESO TOTAL (E=A*C*D)	OBSERVACIONES
4	57+767,90	57+811,18	6009	Caisson 12	1,50	4	1,00	16,00	24,00	
4					4,87	4	1,00	4,00	19,48	
4					8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,00	8	3,97	46,00	730,48	
4					3,52	5	1,55	134,00	731,10	
4	57+767,90	57+778,70	6009	Módulo 1 Muro	2,90	6	2,24	109,00	708,06	
4					3,60	4	1,00	46,00	165,60	
4					11,10	4	1,00	20,00	222,00	
4					11,10	4	1,00	16,00	177,60	
4					0,90	4	1,00	56,00	50,40	
4					2,45	4	1,00	28,00	68,60	
4					6,66	4	1,00	2,00	13,32	
4	57+778,70	57+789,50	6009	Módulo 2 Muro	2,95	6	2,24	109,00	720,27	
4					3,65	4	1,00	46,00	167,90	
4					11,10	4	1,00	20,00	222,00	
4					11,10	4	1,00	16,00	177,60	
4					0,90	4	1,00	56,00	50,40	
4					2,45	4	1,00	28,00	68,60	
4					6,66	4	1,00	2,00	13,32	
4	63+268,00	63+277,00	6009	New Jersey Módulo 2 Muro 11N	2,26	4	1,00	75,00	169,50	
4					8,90	4	1,00	8,00	71,20	
4	63+277,00	63+286,00	6009	Zarpa y vástago módulo 3 Muro 11N	8,90	4	1,00	2,00	17,80	
4					2,60	6	2,24	120,00	698,88	
4					4,85	4	1,00	27,00	130,95	
4					8,90	4	1,00	4,00	35,60	
4					8,90	4	1,00	4,00	35,60	
4					8,90	4	1,00	16,00	142,40	
4					2,30	4	1,00	30,00	69,00	
4					8,90	4	1,00	8,00	71,20	
4					3,70	4	1,00	2,00	7,40	
4					8,00	4	1,00	8,00	64,00	
4					3,95	5	1,55	54,00	330,62	
4	63+277,00	63+286,00	6009	New Jersey Módulo 3 Muro 11N	2,26	4	1,00	75,00	169,50	
4					8,90	4	1,00	8,00	71,20	
4	53+382,00	53+400,00	6009	Caisson 1	8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					7,00	8	3,97	46,00	1278,34	
4					4,30	5	1,55	153,00	1019,75	
4	53+382,00	53+400,00	6009	Caisson 2	8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					7,00	8	3,97	46,00	1278,34	
4					4,30	5	1,55	153,00	1019,75	
4	55+730,00	55+730,00	6009						-44,20	Descuento cantidad duplicada reportada en acta N°49

Los cálculos del acero presentados en la memoria se realizan de acuerdo a los valores establecidos en la tabla 640-1 de la norma INVIAS.

TOTAL	59360,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	59360,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	59360,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		59360,00



















4/9

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		59360,00



















INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	59360,00
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		














RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Barrera New Jersey muros.

OBRA:	Muro de concreto PR23+020 - 23+030 Módulo 1
ESTRUCTURA:	Barrera New Jersey


Marca	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
N1	1/2"		0,90	63	56,70	56,70	Amarre barrera new Jersey
N2	1/2"		2,17	81	175,77	175,77	Refuerzo barrera new Jersey

Total acero de refuerzo	232,47	MODULO TIPO Z4-9

V LMJ


Barrera New Jersey muros.

OBRA:	Muro de concreto PR23+030 - 23+039 Módulo 2
ESTRUCTURA:	Barrera New Jersey

Marca	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
N1	1/2"		0,90	63	56,70	56,70	Amarre barrera new Jersey
N2	1/2"		2,17	81	175,77	175,77	Refuerzo barrera new Jersey
Total acero de refuerzo						232,47	MODULO TIPO Z4-9

Barrera New Jersey muros.


OBRA:	Muro de concreto PR23+039 - 23+048 Módulo 3
ESTRUCTURA:	Barrera New Jersey

Marca	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
N1	1/2"		0,90	63	56,70	56,70	Amarre barrera new Jersey
N2	1/2"		2,17	81	175,77	175,77	Refuerzo barrera new Jersey

Total acero de refuerzo	232,47	MODULO TIPO Z4-9

Barrera New Jersey muros.



OBRA:	Muro de concreto PR23+048 - 23+057 Módulo 4
ESTRUCTURA:	Barrera New Jersey

Marca	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
N1	1/2"		0,90	63	56,70	56,70	Amarre barrera new Jersey
N2	1/2"		2,17	81	175,77	175,77	Refuerzo barrera new Jersey

Total acero de refuerzo	232,47	MODULO TIPO Z4-9

Barrera New Jersey muros.


OBRA:	Muro de concreto PR23+057 - 23+066 Módulo 5
ESTRUCTURA:	Barrera New Jersey

Marca	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
N1	1/2"		0,90	63	56,70	56,70	Amarre barrera new Jersey
N2	1/2"		2,17	81	175,77	175,77	Refuerzo barrera new Jersey

Total acero de refuerzo	232,47	MODULO TIPO Z4-9

MURETE EN CONCRETO PR 23+020











OBRA:	Murete de concreto
ESTRUCTURA:	Murete de concreto Módulo 1 PR23+020 - PR23+030

Marca	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
M1	1/2"		9,90	29,00	287,10	287,10	Amarre externo vástago
M2	1/2"		1,75	67	117,25	117,25	Amarre externo vástago
M3	1/2"		4,15	51	211,65	211,65	Amarre interno vástago
M4	3/4"		3,30	100	330,00	739,20	Refuerzo externo vástago

Total acero de refuerzo	1355,20	MODULO TIPO Z4-9

ALCANTARILLA BOX PR23+926


OBRA:	Box Culvert	SUDINCO
ESTRUCTURA:	ALCANTARILLA BOX PR23+926 Encole.	

4	1/2"		3,36	67,00	225,12	225,12	
5	1/2"		2,85	36,00	102,60	102,60	
6	1/2"		3,05	70,00	213,50	213,50	
7	5/8"		6,90	25,00	172,50	267,38	
8	1/2"		7,06	13,00	91,78	91,78	
9	1/2"		4,40	12,00	52,80	52,80	
10	1/2"		4,60	12,00	55,20	55,20	
11	1/2"		2,40	18,00	43,20	43,20	
12	1/2"		2,60	18,00	46,80	46,80	
13	1/2"		1,82	12,00	21,84	21,84	

Total acero de refuerzo	1120,22	

Barrera New Jersey muros.


OBRA:	Muro de concreto PR26+132 - 26+141 Módulo 1
ESTRUCTURA:	Barrera New Jersey

Marca	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
N1	1/2"		0,90	63	56,70	56,70	Amarre barrera new Jersey
N2	1/2"		2,17	81	175,77	175,77	Refuerzo barrera new Jersey

Total acero de refuerzo	232,47	MODULO TIPO Z4-9



Barrera New Jersey muros.

OBRA:	Muro de concreto PR26+150 - 26+159 Módulo 3
ESTRUCTURA:	Barrera New Jersey

Marca	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
N1	1/2"		0,90	63	56,70	56,70	Amarre barrera new Jersey
N2	1/2"		2,17	81	175,77	175,77	Refuerzo barrera new Jersey
Total acero de refuerzo						232,47	MODULO TIPO Z4-9

Barrera New Jersey muros.

OBRA:	Muro de concreto PR26+141 - 26+150 Módulo 2
ESTRUCTURA:	Barrera New Jersey

Marca	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
N1	1/2"		0,90	63	56,70	56,70	Amarre barrera new Jersey
N2	1/2"		2,17	81	175,77	175,77	Refuerzo barrera new Jersey
Total acero de refuerzo						232,47	MODULO TIPO Z4-9

Encole Box Culvert 50+855

OBRA:	Box Culvert
ESTRUCTURA:	Encole Box Culvert 50+855

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		3,95	40,00	158,00	158,00	
	1/2"		3,45	40,00	138,00	138,00	
	1/2"		4,40	11,00	48,40	48,40	
	1/2"		1,80	18,00	32,40	32,40	
Total acero de refuerzo Encole Box Culvert 50+855						376,80	

Box Culvert PR 50+309

OBRA:	Box Culvert
ESTRUCTURA:	Box Culvert PR 50+309

SUDINCO

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		7,30	16,00	116,80	116,80	
	1/2"		1,70	51,00	86,70	86,70	
	1/2"		1,70	51,00	86,70	86,70	
	1/2"		2,35	30,00	70,50	70,50	
	1/2"		2,35	30,00	70,50	70,50	
	1/2"		2,65	108,00	286,20	286,20	
	1/2"		3,50	44,00	154,00	154,00	
	1/2"		1,05	22,00	23,10	23,10	
	1/2"		3,50	41,00	143,50	143,50	
	1/2"		3,50	41,00	143,50	143,50	
	1/2"		5,00	41,00	205,00	205,00	
	5/8"		5,10	41,00	209,10	324,11	
	1/2"		4,00	110,00	440,00	440,00	
	5/8"		4,10	110,00	451,00	699,05	

Box Culvert PR 50+309

OBRA:	Box Culvert
ESTRUCTURA:	Box Culvert PR 50+309

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		9,00	42,00	378,00	378,00	
	1/2"		5,45	42,00	228,90	228,90	
	1/2"		2,90	14,00	40,60	40,60	
	1/2"		2,50	8,00	20,00	20,00	
Total acero de refuerzo Box Culvert PR 50+309						3517,16	

U7

Encole Box Culvert PR50+786

OBRA:	Box Culvert
ESTRUCTURA:	Encole Box Culvert PR50+786

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		5,70	3,00	17,10	17,10	
	1/2"		1,70	4,00	6,80	6,80	
	1/2"		3,80	6,00	22,80	22,80	
	1/2"		3,90	5,00	19,50	19,50	
	1/2"		3,90	5,00	19,50	19,50	
	1/2"		3,40	8,00	27,20	27,20	
	1/2"		3,40	8,00	27,20	27,20	
Total acero de refuerzo Encole Box Culvert PR50+786						140,10	

Acceso vehicular PR50+500

OBRA:	Acceso
ESTRUCTURA:	Acceso vehicular PR50+500

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		9,00	11,00	99,00	99,00	
	1/2"		1,90	45,00	85,50	85,50	
Total acero de refuerzo Acceso vehicular PR50+500						184,50	



Acceso vehicular PR52+630

OBRA:	Acceso
ESTRUCTURA:	Acceso vehicular PR52+630

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		8,00	10,00	80,00	80,00	
	1/2"		1,95	40,00	78,00	78,00	
Total acero de refuerzo Acceso vehicular PR52+630						158,00	

Murete de Concreto PR51+190 - PR51+212


OBRA:	Murete de concreto
ESTRUCTURA:	Murete de Concreto PR51+190 - PR51+212

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	5/8"		1,50	74,00	111,00	172,05	dentellon
	1/2"		11,00	44,00	484,00	484,00	
	5/8"		2,90	74,00	214,60	332,63	
	5/8"		1,55	74,00	114,70	177,79	
	5/8"		1,75	74,00	129,50	200,73	

Total acero de refuerzo Murete de Concreto PR51+190 - PR51+212	1367,19	

ACERO ANILLOS PILOTES L=10 m



OBRA:	Anillos d=1,20 m
ESTRUCTURA:	Anillos Pilotes Profundidad L=10 m

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
1	1/2"		1,5	160	240,00	240,00	
2	1/2"		4,87	40	194,80	194,80	

Total acero de refuerzo Anillos Pilotes Profundidad L=10 m	434,80	

Acero Tipo Caisson Muro PR57+767






OBRA:	Muro de concreto
ESTRUCTURA:	Acero Tipo Caisson Muro PR57+767

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
1	1/2"		1,5	16	24,00	24,00	
2	1/2"		4,87	4	19,48	19,48	
3	1"		8	46	368,00	1460,96	
4	1"		4	46	184,00	730,48	
5	5/8"		3,52	134	471,68	731,10	

Total acero de refuerzo Acero Tipo Caisson Muro PR57+767	2966,02	

MURO DE CONCRETO PR57+767 - PR57+811

OBRA:	Muro de concreto
ESTRUCTURA:	Muro de concreto PR 57+767 - PR57+811 Módulo 1

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
V1	3/4"		2,9	109	316,10	708,06	
V2	1/2"		3,6	46	165,60	165,60	
C1	1/2"		11,1	20	222,00	222,00	
V3	1/2"		11,1	16	177,60	177,60	
C3	1/2"		0,9	56	50,40	50,40	
C2	1/2"		2,45	28	68,60	68,60	
V3	1/2"		6,66	2	13,32	13,32	
Total acero de refuerzo Muro de concreto PR 57+767 - PR57+811 Módulo 1						1405,58	

MURO DE CONCRETO PR57+767 - PR57+811

OBRA:	MURO ADICIONAL
ESTRUCTURA:	Muro de concreto PR 57+767 - PR57+811 Módulo 2

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
V1	3/4"	.20 / 2.45 / .30	2,95	109	321,55	720,27	FIGURADO POR CONTRATISTA
V2	1/2"	.20 / 3.15 / .30	3,65	46	167,90	167,90	FIGURADO POR CONTRATISTA
C1	1/2"	.20 — 10.70 — .20	11,1	20	222,00	222,00	
V3	1/2"	.20 .20 / 10.70	11,1	16	177,60	177,60	
C3	1/2"	0.60 / .15 .15	0,9	56	50,40	50,40	
C2	1/2"	.20 / .55 / 1.25	2,45	28	68,60	68,60	
V3	1/2"	.20 .20 / Var	6,66	2	13,32	13,32	

Total acero de refuerzo Muro de concreto PR 57+767 - PR57+811 Módulo 2	1420,09	

MURO 11N MODULO 2 PR63+260

OBRA:	NEW JERSEY
ESTRUCTURA:	PR63+260 Costado Izquiedo

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		2,26	75	169,50	169,50	
	1/2"		8,9	8	71,20	71,20	
Total acero de refuerzo PR63+260 Costado Izquiedo						240,70	

MURO 11N MODULO 3 PR63+200

OBRA:	Encole Alcantarilla
ESTRUCTURA:	PR63+200 Costado izquiedo

SUDINCO

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		8,9	2	17,80	17,80	
	3/4"		2,6	120	312,00	698,88	
	1/2"		4,85	27	130,95	130,95	
	1/2"		8,9	4	35,60	35,60	
	1/2"		8,9	4	35,60	35,60	
	1/2"		8,9	16	142,40	142,40	
	1/2"		2,3	30	69,00	69,00	
	1/2"		8,9	8	71,20	71,20	
	1/2"		3,7	2	7,40	7,40	
	1/2"		8	8	64,00	64,00	
	5/8"		3,95	54,00	213,30	330,62	
Total acero de refuerzo PR63+200 Costado izquiedo						1603,45	

MURO 11N MODULO 3 PR63+260

OBRA:	NEW JERSEY
ESTRUCTURA:	PR63+260 Costado Izquiedo

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		2,26	75	169,50	169,50	
	1/2"		8,9	8	71,20	71,20	

Total acero de refuerzo PR63+260 Costado Izquiedo	240,70	

ACERO TIPO CAISSON MURO PR53+382

OBRA:	Muro de concreto
ESTRUCTURA:	Acero tipo Caisson Muro PR53+382

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1"		8	46	368,00	1460,96	
	1"		7	46	322,00	1278,34	
	5/8"		4,3	153	657,90	1019,75	
Total acero de refuerzo Acero tipo Caisson Muro PR53+382						3759,05	

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
640.2	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		4175,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	ELEMENTO	ÁREA MALLA (m2)	REFERENCIA (B)	PESO UNITARIO Kg/m2 (C)	CANTIDAD Und (D)	PESO TOTAL (E=A*C*D)	OBSERVACIONES
4	50+309,00	50+309,00	6007	canal	31,34	XX-084	1,34	1,00	42,00	entrega a encole Box Culvert
4	55+930,00	55+950,00	6009	Protección talud	154,26	XX-221	3,52	1,00	543,00	Refuerzo protección talud
4	56+700,00	56+745,00	6009	talud	557,39	XX-221	3,52	1,00	1961,00	Refuerzo protección talud
4	57+715,00	57+745,00	6009	Protección talud	180,86	XX-221	3,52	1,00	636,00	Refuerzo protección talud
4	59+835,00	59+866,00	6009	talud	282,22	XX-221	3,52	1,00	993,00	Refuerzo protección talud

TOTAL	4175,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	4175,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	4175,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	4175,00
640.2	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

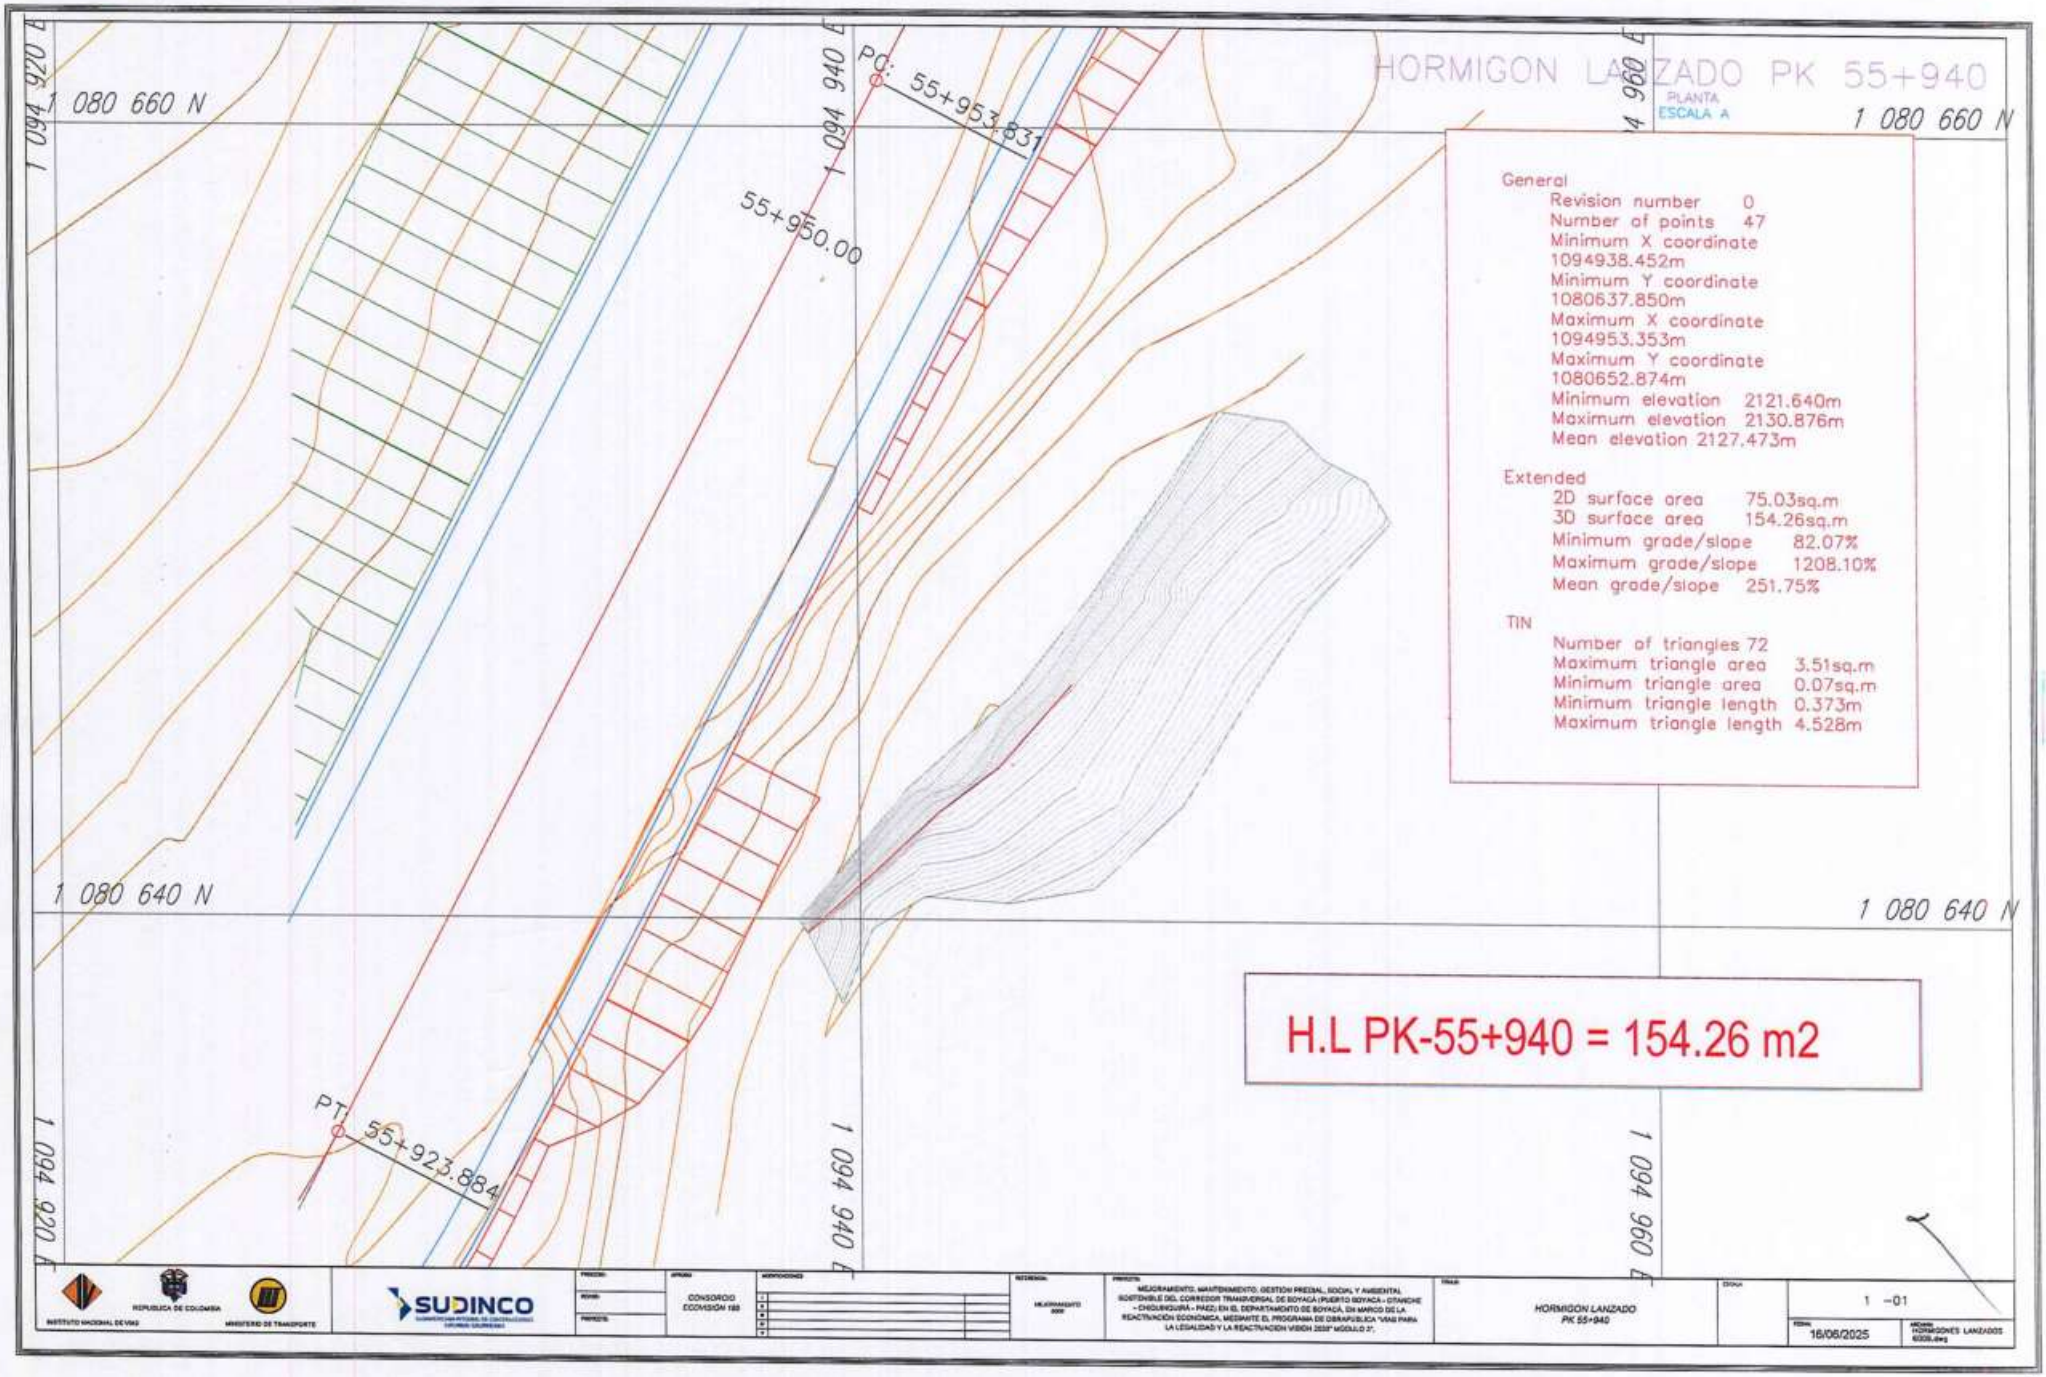

HORMIGON LANZADO PK 55+940
PLANTA
ESCALA A
1 080 660 N
1 080 640 N
1 094 920 E
1 094 940 E
1 094 960 E
PC: 55+953.831
55+950.00
PT: 55+923.884
General
Revision number 0
Number of points 47
Minimum X coordinate
1094938.452m
Minimum Y coordinate
1080637.850m
Maximum X coordinate
1094953.353m
Maximum Y coordinate
1080652.874m
Minimum elevation 2121.640m
Maximum elevation 2130.876m
Mean elevation 2127.473m
Extended
2D surface area 75.03sq.m
3D surface area 154.26sq.m
Minimum grade/slope 82.07%
Maximum grade/slope 1208.10%
Mean grade/slope 251.75%
TIN
Number of triangles 72
Maximum triangle area 3.51sq.m
Minimum triangle area 0.07sq.m
Minimum triangle length 0.373m
Maximum triangle length 4.528m
H.L PK-55+940 = 154.26 m2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUDINCO
CONSORCIO ECOVISION 188
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA-PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ; EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAPÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VIDEH 2020" MÓDULO 2".
HORMIGÓN LANZADO
PK 55+940
1 -01
16/05/2025
HORMIGONES LANZADOS
KCDS.dwg

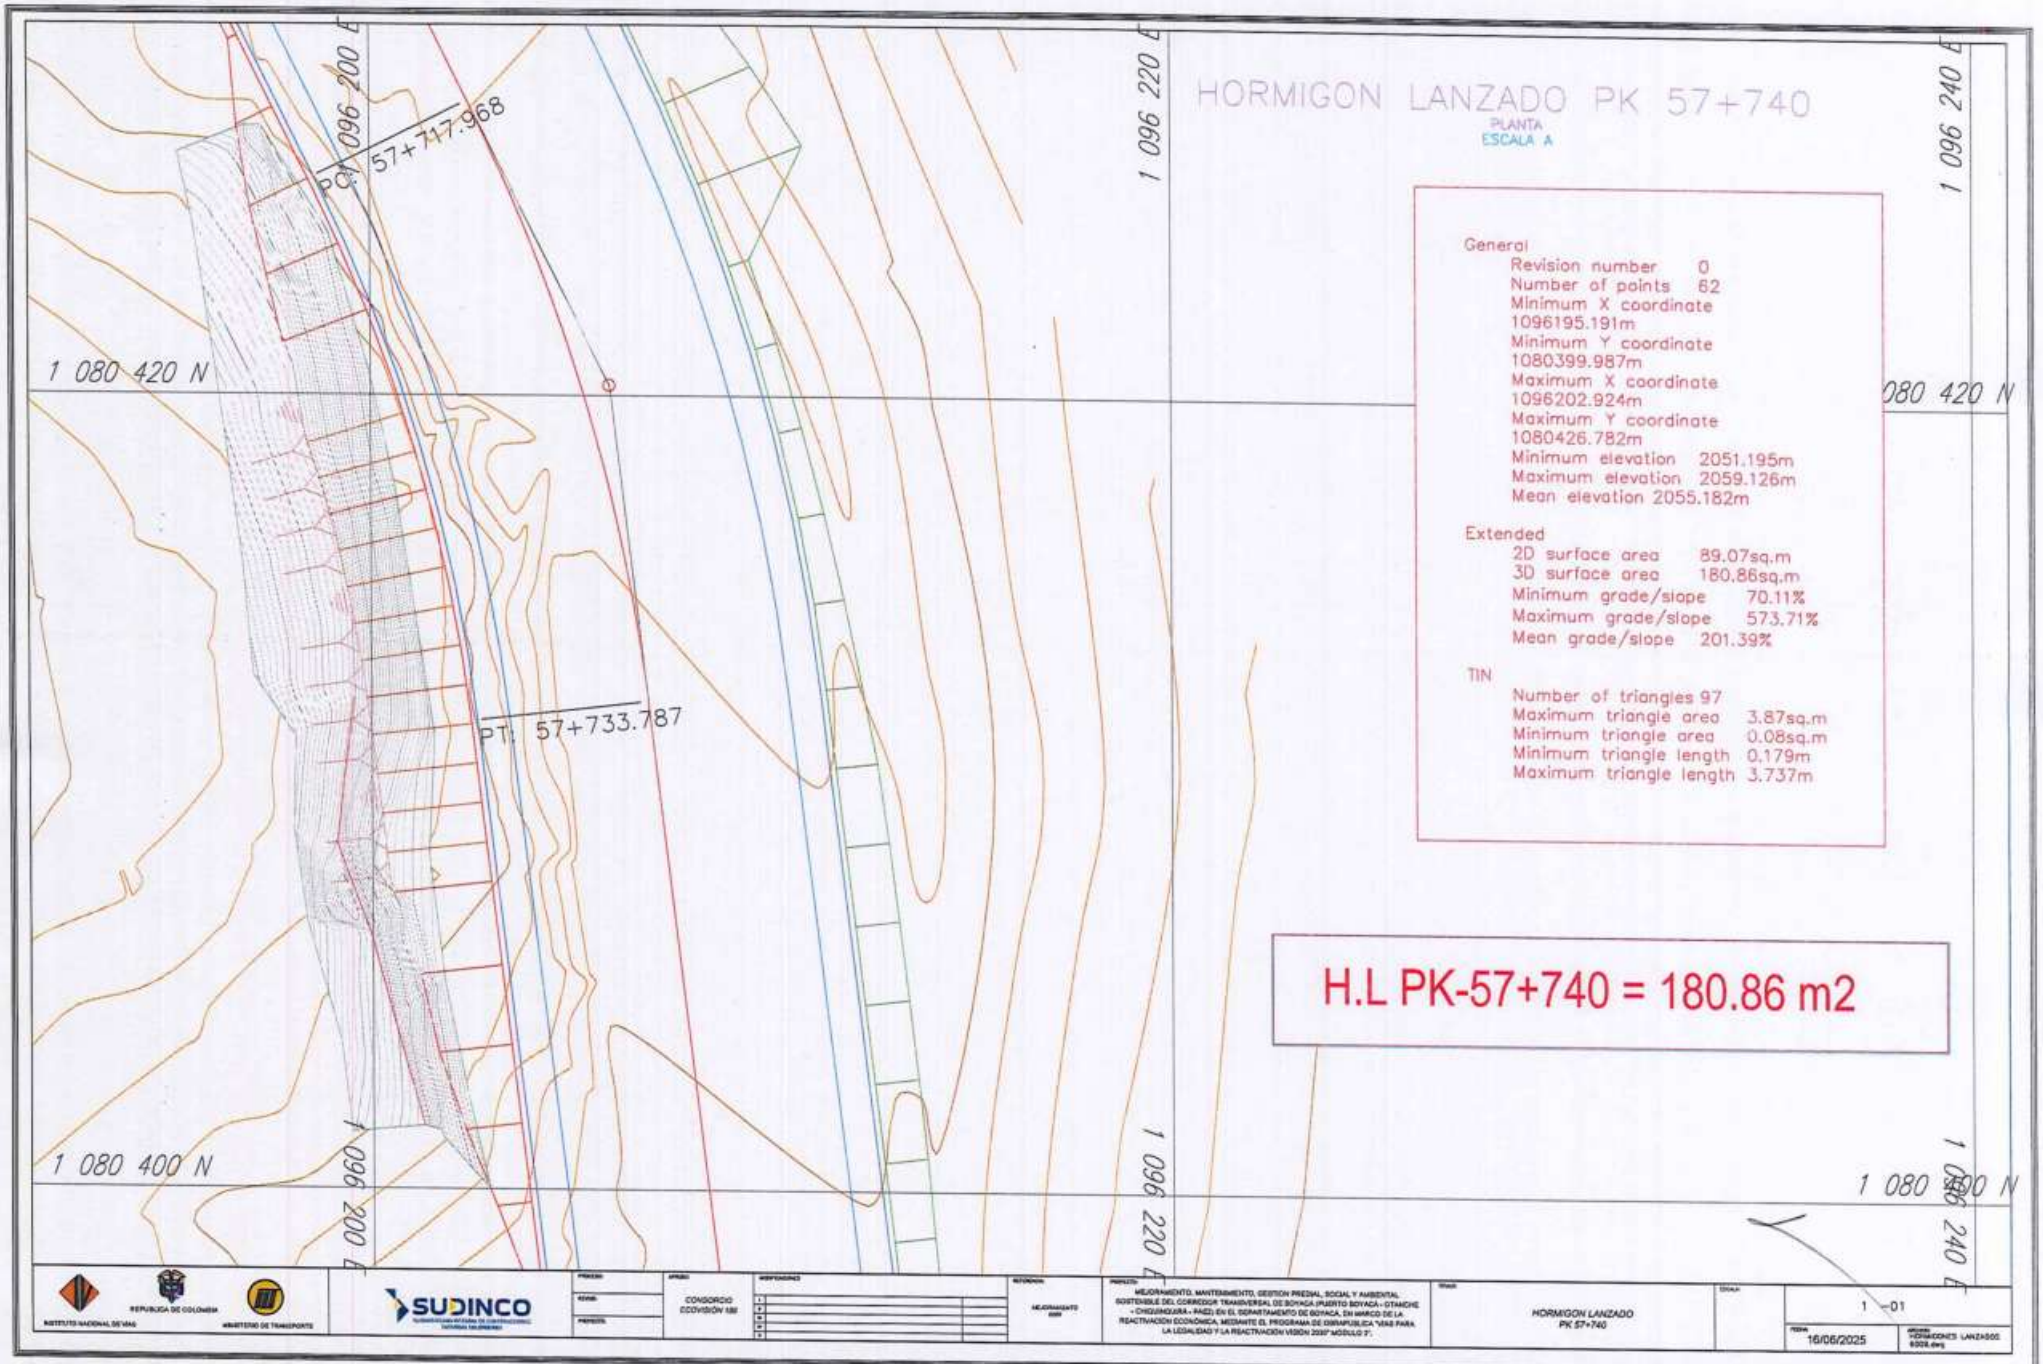
HORMIGON LANZADO PK 57+740
PLANTA
ESCALA A
PC: 57+717.968
PT: 57+733.787
1 096 200 E
1 096 220 E
1 096 240 E
1 080 420 N
1 080 400 N
General
Revision number 0
Number of points 62
Minimum X coordinate 1096195.191m
Minimum Y coordinate 1080399.987m
Maximum X coordinate 1096202.924m
Maximum Y coordinate 1080426.782m
Minimum elevation 2051.195m
Maximum elevation 2059.126m
Mean elevation 2055.182m
Extended
2D surface area 89.07sq.m
3D surface area 180.86sq.m
Minimum grade/slope 70.11%
Maximum grade/slope 573.71%
Mean grade/slope 201.39%
TIN
Number of triangles 97
Maximum triangle area 3.87sq.m
Minimum triangle area 0.08sq.m
Minimum triangle length 0.179m
Maximum triangle length 3.737m
H.L PK-57+740 = 180.86 m2
REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUDINCO
CONSORCIO ECOVISIÓN 138
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAPUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 7.
HORMIGON LANZADO
PK 57+740
1 - 01
16/06/2025

5

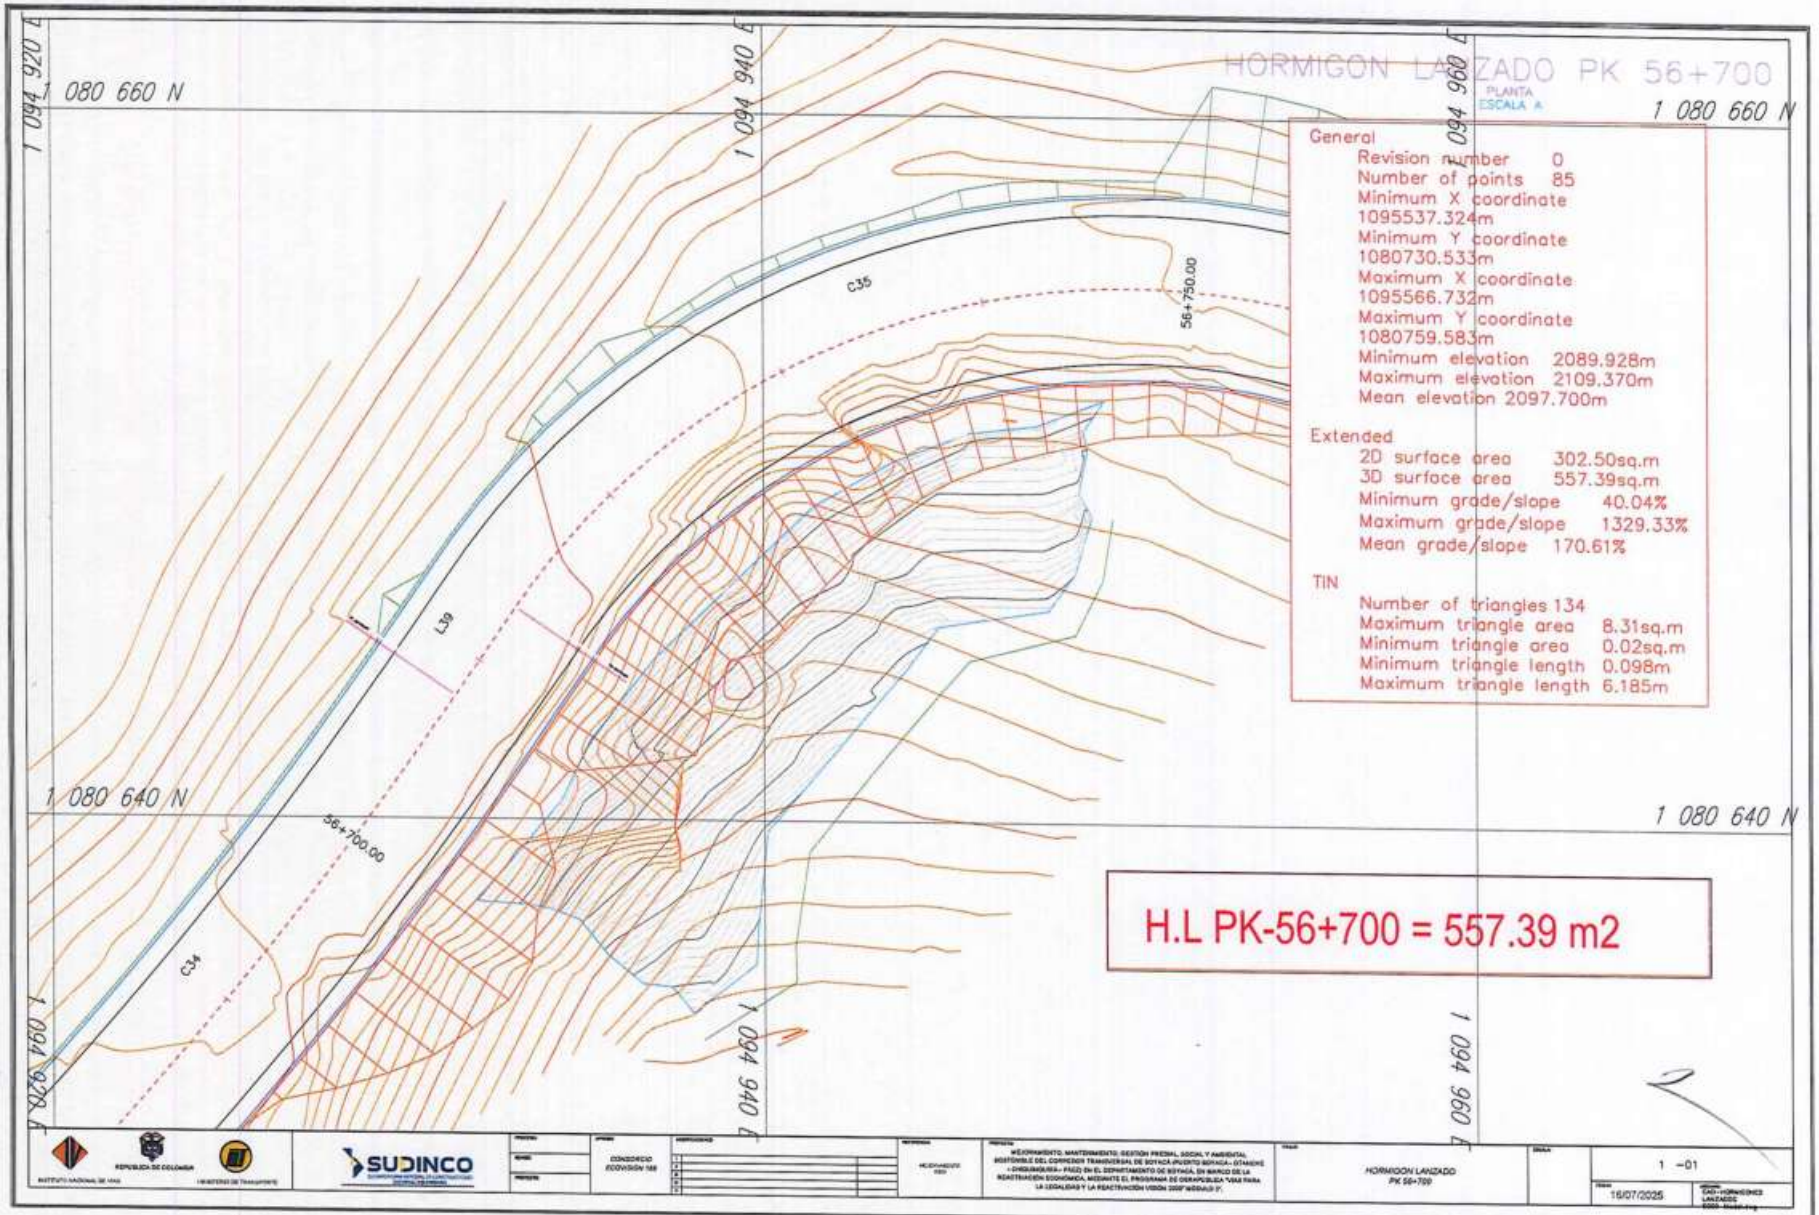
HORMIGON LANZADO PK 56+700
PLANTA
ESCALA A
1 094 920 E
1 094 940 E
1 094 960 E
1 080 660 N
1 080 640 N
C35
C34
L39
56+750.00
56+700.00
General
Revision number 0
Number of points 85
Minimum X coordinate 1095537.324m
Minimum Y coordinate 1080730.533m
Maximum X coordinate 1095566.732m
Maximum Y coordinate 1080759.583m
Minimum elevation 2089.928m
Maximum elevation 2109.370m
Mean elevation 2097.700m
Extended
2D surface area 302.50sq.m
3D surface area 557.39sq.m
Minimum grade/slope 40.04%
Maximum grade/slope 1329.33%
Mean grade/slope 170.61%
TIN
Number of triangles 134
Maximum triangle area 8.31sq.m
Minimum triangle area 0.02sq.m
Minimum triangle length 0.098m
Maximum triangle length 6.185m
H.L PK-56+700 = 557.39 m2
SUDINCO
HORMIGON LANZADO
PK 56+700
1 -01
16/07/2025

5

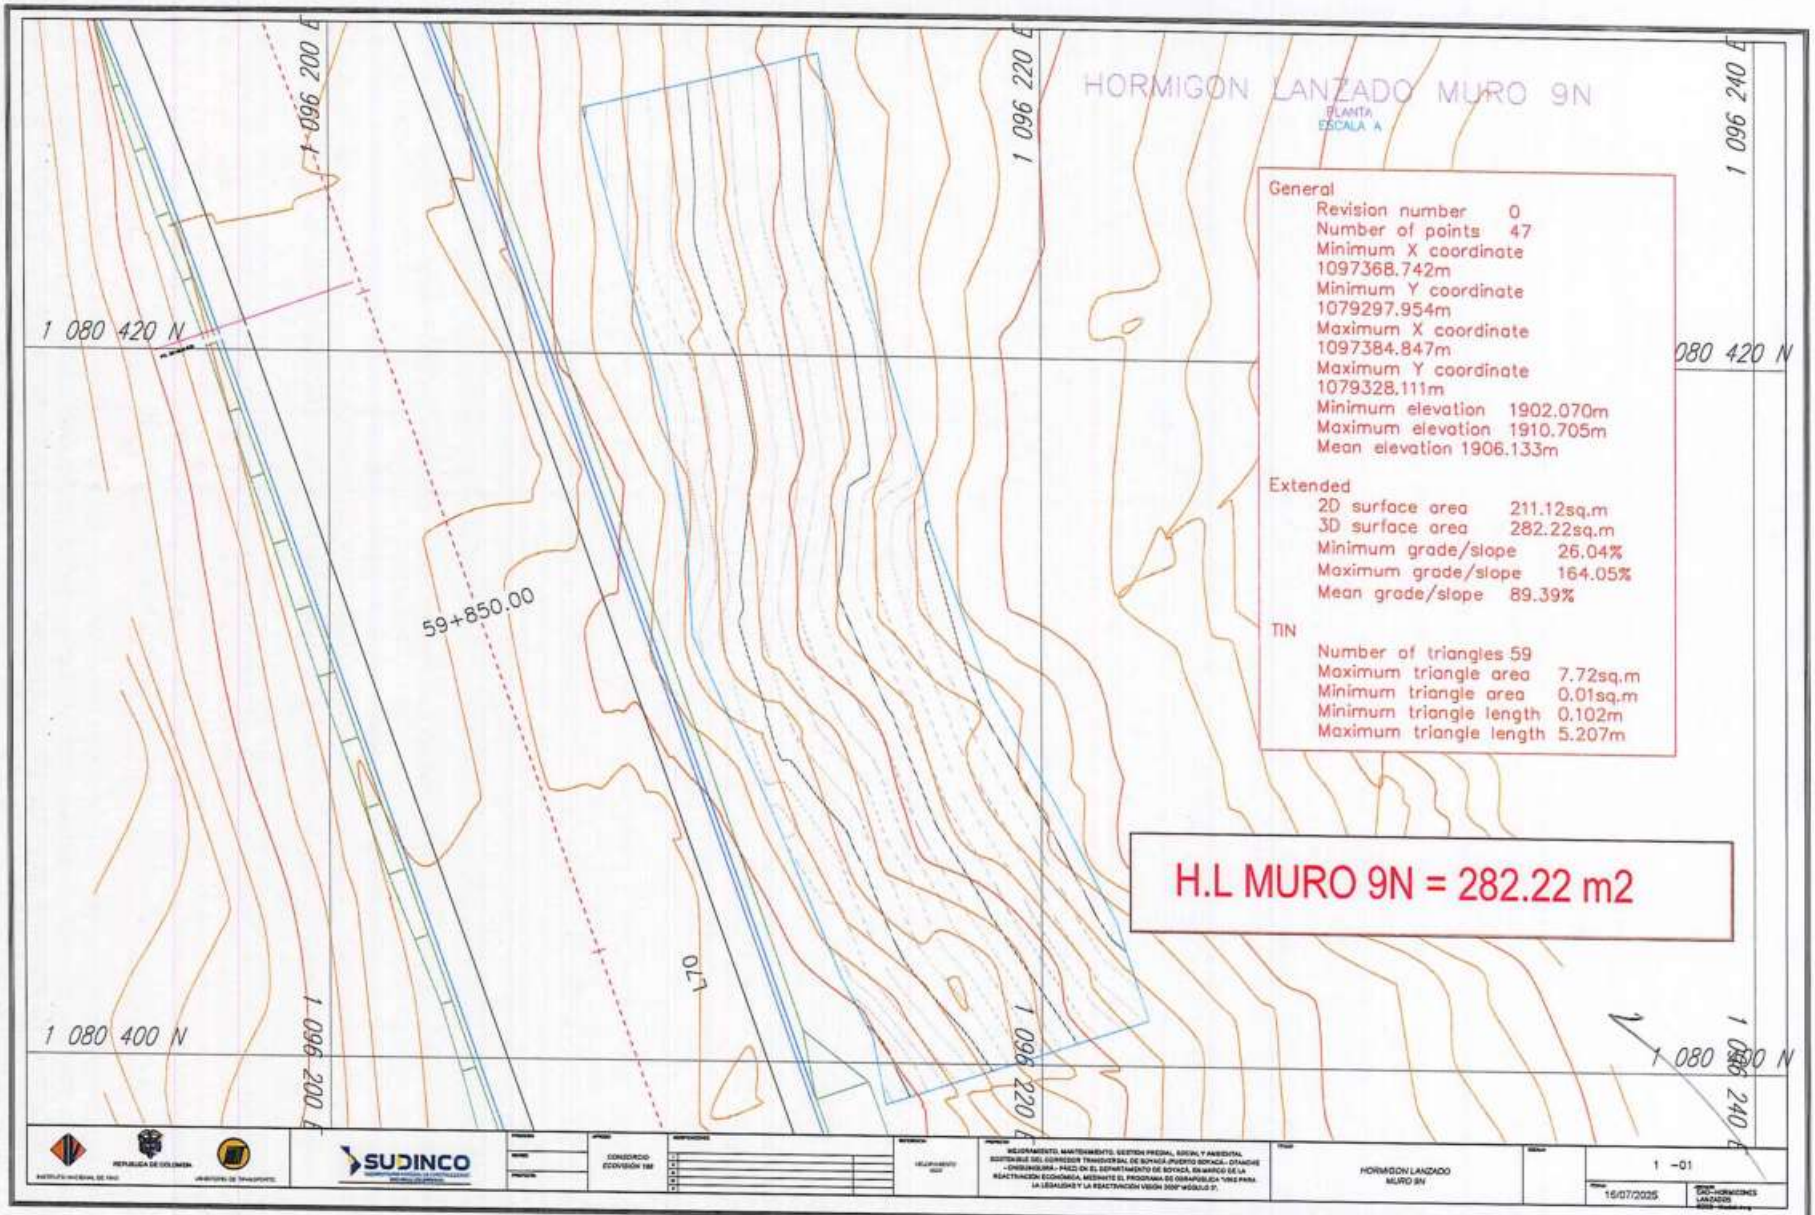
HORMIGON LANZADO MURO 9N
PLANTA
ESCALA A
General
Revision number 0
Number of points 47
Minimum X coordinate
1097368.742m
Minimum Y coordinate
1079297.954m
Maximum X coordinate
1097384.847m
Maximum Y coordinate
1079328.111m
Minimum elevation 1902.070m
Maximum elevation 1910.705m
Mean elevation 1906.133m
Extended
2D surface area 211.12sq.m
3D surface area 282.22sq.m
Minimum grade/slope 26.04%
Maximum grade/slope 164.05%
Mean grade/slope 89.39%
TIN
Number of triangles 59
Maximum triangle area 7.72sq.m
Minimum triangle area 0.01sq.m
Minimum triangle length 0.102m
Maximum triangle length 5.207m
H.L MURO 9N = 282.22 m2
1 080 420 N
1 080 400 N
1 096 200 E
1 096 220 E
1 096 240 E
59+850.00
L70
SUDINCO
1 -01
16/07/2025

57

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL		RUTA	LONGITUD (m)				LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	63+274,00		6009	3,00				3,00	3,00	Costado izquierdo

TOTAL	3,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	3,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	3,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSA BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		3,00





RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	312,70

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL		RUTA	LONGITUD (m)			CANTIDAD	LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	23+926,00	23+926,00	6006	25,60				25,60	25,60	Filtro Box costado derecho
5	23+926,00	23+926,00	6006	25,60				25,60	25,60	Filtro Box costado izquierdo
5	24+300,00	24+400,00	6006	100,00				100,00	100,00	Filtro subdren vial Costado izquierdo
5	50+855,00	50+857,50	6007	2,50				2,50	2,50	Filtro para gaviones
5	52+638,00	52+650,00	6007	11,00				11,00	11,00	Filtro para gaviones
5	63+277,00	63+425,00	6009	148,00				148,00	148,00	subdren vial costado derecho

TOTAL	312,7
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	312,7
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	312,7

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSA BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	312,70
663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
672.1	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	61,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)				LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	55+740,00	55+784,00	6009	44,00				44,00	44,00	
5	55+978,00	55+995,00	6009	17,00				17,00	17,00	

TOTAL	61,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	61,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	61,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
672.1	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m		61,00





RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3	43,30

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	51+438,00	51+446,00	6007	8,00	1,91	0,10	15,28	1,53	1,50	Costado Izquierdo
5	51+709,00	51+727,00	6007	17,50	1,00	0,13	17,50	2,28	2,30	Costado Izquierdo
5	51+703,00	51+724,00	6007	21,00	1,00	0,13	21,00	2,73	2,70	Costado Derecho
5	51+420,00	51+437,00	6007	17,00	1,00	0,13	17,00	2,21	2,20	Costado Derecho
5	51+437,00	51+444,00	6007	6,50	1,70	0,10	11,05	1,11	1,10	Costado Derecho
5	51+427,00	51+438,00	6007	10,50	1,55	0,10	16,28	1,63	1,60	empalme con Box Culvert - costado izquierdo
5	50+770,00	50+778,00	6007	8,50	1,00	0,13	8,50	1,11	1,10	Costado Izquierdo
5	50+788,00	50+794,00	6007	6,00	2,00	0,15	12,00	1,80	1,80	Costado Izquierdo
5	50+842,00	50+853,00	6007	11,50	1,35	0,10	15,53	1,55	1,60	empalme a descole Box Culvert - costado izquierdo
5	50+853,00	50+858,00	6007	5,00	1,60	0,10	8,00	0,80	0,80	empalme a descole Box Culvert - costado izquierdo
5	50+858,00	50+863,00	6007	5,00	1,00	0,13	5,00	0,65	0,70	Costado Izquierdo
5	50+490,00	50+502,00	6007	12,00	2,00	0,20	24,00	4,80	4,80	Acceso - costado izquierdo
5	50+502,00	50+513,00	6007	11,00	1,00	0,13	11,00	1,43	1,40	Costado Izquierdo
5	50+630,00	50+634,00	6007	3,50	1,00	0,13	3,50	0,46	0,50	Costado Izquierdo
5	50+724,00	50+735,00	6007	10,50	1,00	0,13	10,50	1,37	1,40	Costado Izquierdo
5	50+786,00	50+789,00	6007	7,90	1,10	0,10	8,69	0,87	0,90	Costado Derecho
5	50+789,00	50+796,00	6007	7,50	1,80	0,10	13,50	1,35	1,40	Costado Derecho
5	50+800,00	50+855,00	6007	4,30	1,37	0,10	5,89	0,59	0,60	Costado Derecho
5	50+855,00	50+860,00	6007	5,30	1,80	0,10	9,54	0,95	1,00	Costado Derecho
5	53+224,00	53+232,00	6007	8,40	1,00	0,13	8,40	1,09	1,10	Costado Derecho
5	53+224,00	53+232,00	6007	8,40	1,00	0,13	8,40	1,09	1,10	Costado Izquierdo
5	51+827,00	51+835,00	6007	8,00	2,38	0,10	19,04	1,90	1,90	empalme a caja encole - costado derecho
5	50+309,00	50+324,00	6007	14,00	1,00	0,13	14,00	1,82	1,80	Costado Izquierdo
5	50+310,00	50+310,00	6007	4,00	1,00	0,20	4,00	0,80	0,80	empalme a encole costado izquierdo
5	50+297,00	50+309,00	6007	12,00	1,00	0,13	12,00	1,56	1,60	Costado Izquierdo
5	59+900,00	59+871,00	6009	29,00	1,00	0,13	29,00	3,77	3,80	Costado Derecho
5	60+140,00	60+140,00	6009	11,00	1,00	0,13	11,00	1,43	1,40	Acceso - costado derecho
5	59+885,00	59+885,00	6009	1,76	1,00	0,20	1,76	0,35	0,40	costado izquierdo

TOTAL	43,3
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	43,3
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	43,3

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSA BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3		43,30












INVIAS | La movilidad es de todos | Mantenimiento

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSA BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3		43,30











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mininterior

INFORME PARA PAGO

SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	1561,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)		TOTAL	OBSERVACIONES
7	22+660,00	22+896,00	6006	36,00	7,40		266,40		266,00	Filtro Muro Costado Izquierdo
7	23+926,00	23+926,00	6006	25,60	2,90		74,24		74,00	Filtro Box costado derecho
7	23+926,00	23+926,00	6006	25,60	2,90		74,24		74,00	Filtro Box costado izquierdo
7	24+300,00	24+400,00	6006	100,00	3,50		350,00		350,00	Filtro subdren vial costado izquierdo
7	50+855,00	50+855,00	6007	3,10	3,50		10,85		11,00	Filtro empalme a encole
7	52+638,00	52+650,00	6007	12,00	5,60		67,20		67,00	Muro gaviones G6
7	52+638,00	52+650,00	6007	11,00	3,50		38,50		39,00	Filtro para gaviones
7	63+277,00	63+425,00	6009	148,00	3,60		532,80		533,00	subdren vial costado derecho
7	63+241,00	63+257,00	6009	16,00	7,00		112,00		112,00	Muro gaviones G4
7	60+290,00	60+292,00	6009	2,00	7,00		14,00		14,00	Muro gaviones G4
7	60+230,00	60+233,00	6009	3,00	7,00		21,00		21,00	Muro gaviones G4

TOTAL	1561,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	1561,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	1561,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2		1561,00















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 168

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
673.2	Material granular drenante	m3	238,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	SECCIÓN (m2/m)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	22+850,00	22+896,00	6006	36,00	0,30	3,25	10,60	35,10	35,00	Filtro Muro Costado izquierdo
5	23+926,00	23+926,00	6006	25,60	0,30	1,00	7,68	7,68	8,00	Filtro Box costado derecho
5	23+926,00	23+926,00	6006	25,60	0,30	1,00	7,68	7,68	8,00	Filtro Box costado izquierdo
5	24+300,00	24+400,00	6006	100,00	0,60	1,00	60,00	60,00	60,00	Filtro subdren vial costado izquierdo
5	50+855,00	50+857,50	6007	2,50	1,00	0,60	2,50	1,50	2,00	Filtro para gaviones
5	52+638,00	52+650,00	6007	11,00	1,00	0,60	11,00	6,60	7,00	Filtro para gaviones
5	63+277,00	63+425,00	6009	148,00	1,00	0,80	148,00	118,40	118,00	Subdren vial - costado derecho

TOTAL	238,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	238,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	238,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	238,00
673.2	Material granular drenante	m3		











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	42,20
673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTOS	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	22+860,00	22+896,00	6006	36,00	0,30	0,05		0,54	0,50	Filtro Muro Costado izquierdo
5	24+300,00	24+400,00	6006	100,00	0,60	0,05		3,00	3,00	Cobertura filtro - costado izquierdo
5	51+438,00	51+446,00	6007	8,00	1,91	0,15		2,29	2,30	Costado Izquierdo - cuneta
5	51+709,00	51+727,00	6007	17,50	1,00	0,15		2,63	2,60	Costado Izquierdo - cuneta
5	51+703,00	51+724,00	6007	21,00	1,00	0,15		3,15	3,20	Costado Derecho - cuneta
5	50+770,00	50+778,00	6007	8,50	1,00	0,15		1,28	1,30	Costado Izquierdo - cuneta
5	50+788,00	50+794,00	6007	6,00	2,00	0,15		1,80	1,80	Costado Izquierdo - cuneta
5	50+842,00	50+853,00	6007	11,50	1,35	0,15		2,33	2,30	Costado Derecho - cuneta
5	50+853,00	50+858,00	6007	5,00	1,60	0,15		1,20	1,20	Costado Izquierdo - cuneta
5	50+858,00	50+863,00	6007	5,00	1,00	0,15		0,75	0,80	Costado Izquierdo - cuneta
5	50+309,00	50+314,00	6007	5,00	1,00	0,20		1,00	1,00	Costado Derecho - canal
5	50+309,00	50+324,00	6007	15,00	1,00	0,15		2,25	2,30	Costado Izquierdo - cuneta
5	50+310,00	50+310,00	6007	4,00	1,00	0,20		0,80	0,80	Costado Izquierdo - entrega a descole
5	50+290,00	50+309,00	6007	19,00	1,00	0,15		2,85	2,90	Costado Izquierdo - cuneta
5	50+300,00	50+333,00	6007	33,00	1,50	0,20		9,90	9,90	Costado Izquierdo - anden
5	60+131,00	61+145,00	6009	14,00	3,00	0,15		6,30	6,30	acceso costado derecho

TOTAL	42,2
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	42,2
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	42,2

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	SOPORTE DE ACTA No.	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	PERIODO:	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	CONTRATO:	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	CONTRATO:	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3		42,20

















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	670,50
674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	COSTADO			LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	20+800,00	20+850,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 1 talud izquierdo
5	20+800,00	20+850,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 2 talud izquierdo
5	20+800,00	20+850,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 3 talud izquierdo
5	20+800,00	20+850,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 4 talud izquierdo
5	20+800,00	20+850,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 1 talud derecho
5	20+800,00	20+850,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 2 talud derecho
5	20+800,00	20+850,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 3 talud derecho
5	21+556,00	21+640,00	6006	12,00	Izquierdo			12,00	12,00	Dren 1 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	12,00	Izquierdo			12,00	12,00	Dren 2 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	12,00	Izquierdo			12,00	12,00	Dren 3 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	12,50	Izquierdo			12,50	12,50	Dren 4 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	12,00	Izquierdo			12,00	12,00	Dren 5 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 6 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 7 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 8 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 9 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 10 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 11 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 12 talud izquierdo
5	21+556,00	21+640,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 13 talud izquierdo
5	22+780,00	22+840,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 1 talud izquierdo
5	22+780,00	22+840,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 2 talud izquierdo
5	22+780,00	22+840,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 3 talud izquierdo
5	22+780,00	22+840,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 4 talud izquierdo
5	22+780,00	22+840,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 5 talud izquierdo
5	22+780,00	22+840,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 6 talud izquierdo
5	22+780,00	22+840,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 7 talud izquierdo
5	22+780,00	22+840,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 8 talud izquierdo
5	22+780,00	22+840,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 9 talud izquierdo
5	25+260,00	25+310,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 1 talud derecho
5	25+260,00	25+310,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 2 talud derecho
5	25+260,00	25+310,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 3 talud derecho
5	25+260,00	25+310,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 4 talud derecho
5	25+260,00	25+310,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 5 talud derecho
5	25+260,00	25+310,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 6 talud derecho
5	25+260,00	25+310,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 7 talud derecho
5	25+260,00	25+310,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 8 talud derecho
5	25+700,00	25+770,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 1 talud derecho
5	25+700,00	25+770,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 2 talud derecho
5	25+700,00	25+770,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 3 talud derecho
5	25+700,00	25+770,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 4 talud derecho
5	25+700,00	25+770,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 5 talud derecho
5	25+700,00	25+770,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 6 talud derecho
5	25+700,00	25+770,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 7 talud derecho
5	25+700,00	25+770,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 8 talud derecho
5	25+700,00	25+770,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 9 talud derecho
5	25+700,00	25+770,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 10 talud derecho
5	25+700,00	25+770,00	6006	10,00	Derecho			10,00	10,00	Dren 11 talud derecho
5	26+030,00	26+070,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 1 talud izquierdo
5	26+030,00	26+070,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 2 talud izquierdo
5	26+030,00	26+070,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 3 talud izquierdo
5	26+030,00	26+070,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 4 talud izquierdo
5	26+030,00	26+070,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 5 talud izquierdo
5	26+030,00	26+070,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 6 talud izquierdo
5	26+030,00	26+070,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 7 talud izquierdo
5	27+170,00	27+210,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 1 talud izquierdo
5	27+170,00	27+210,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 2 talud izquierdo
5	27+170,00	27+210,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 3 talud izquierdo
5	27+170,00	27+210,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 4 talud izquierdo
5	27+170,00	27+210,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 5 talud izquierdo
5	27+170,00	27+210,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 6 talud izquierdo

INVIAS | La movilidad es de todos | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	670,50

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	COSTADO			LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	27+170,00	27+210,00	6006	10,00	Izquierdo			10,00	10,00	Dren 7 talud izquierdo
5	51+830,00	51+830,00	6007	20,00	Derecho			20,00	20,00	Dren 1 talud superior
5	51+830,00	51+830,00	6007	20,00	Derecho			20,00	20,00	Dren 2 talud superior

TOTAL	670,5
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	670,5
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	670,5

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSA BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	670,50
674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m		

















INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSA BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	50
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m		670,50







RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
730.1	Defensa metálica	m	68,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	LONGITUD (m)			LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	30+650,00		6009	4,00				4,00	4,00	Abatimiento Defensa metálica
7	37+500,00		6009	8,00				8,00	8,00	Abatimiento Defensa metálica
7	37+700,00		6009	8,00				8,00	8,00	Abatimiento Defensa metálica
7	38+150,00		6009	8,00				8,00	8,00	Abatimiento Defensa metálica
7	38+350,00		6009	8,00				8,00	8,00	Abatimiento Defensa metálica
7	38+650,00		6009	8,00				8,00	8,00	Abatimiento Defensa metálica
7	39+800,00		6009	16,00				16,00	16,00	Abatimiento Defensa metálica
7	40+100,00		6009	8,00				8,00	8,00	Abatimiento Defensa metálica

TOTAL	68,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	68,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	68,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	60
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
730.1	Defensa metálica	m		68,00











Ilustración No. 1: Detalle sección de abatimiento

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 4SBY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 952 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	68227,30

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD km		RUTA	VOLUMEN EXPLANACION MATERIAL COMUN	VOLUMEN EXPLANACION EN ROCA	VOLUMEN EXCAVACIÓN REPARACIÓN PAVIMENTO	MEJORAMIENTO	TOTAL	OBSERVACIONES
3	22+720	18+500	4,10		6006	3,38				13,90	
3	22+730	18+500	4,10		6006	5,07				20,80	
3	23+910	18+500	5,30		6006	1,43				7,60	
3	23+920	18+500	5,30		6006	1,93				10,30	
3	23+930	18+500	5,30		6006	2,99				15,80	
3	23+940	18+500	5,30		6006	2,73				14,50	
3	24+150	18+500	5,60		6006	0,00				0,00	
3	24+160	18+500	5,60		6006	60,08				448,40	
3	24+170	18+500	5,60		6006	161,98				937,10	
3	24+180	18+500	5,60		6006	196,56				1100,70	
3	24+190	18+500	5,60		6006	179,63				983,50	
3	24+200	18+500	5,60		6006	114,40				640,60	
3	24+210	18+500	5,60		6006	115,83				648,60	
3	24+220	18+500	5,60		6006	128,31				718,50	
3	24+230	18+500	5,60		6006	147,29				824,80	
3	24+240	18+500	5,60		6006	160,02				848,10	
3	24+250	18+500	5,70		6006	127,14				724,70	
3	24+260	18+500	5,70		6006	103,09				587,60	
3	24+270	18+500	5,70		6006	89,94				512,60	
3	24+280	18+500	5,70		6006	84,76				483,10	
3	24+290	18+500	5,70		6006	65,80				374,20	
3	24+480	18+500	5,90		6006	221,13				1304,70	
3	24+500	18+500	5,90		6006	650,50				3720,00	
3	24+510	18+500	5,90		6006	784,81				4630,40	
3	24+520	18+500	5,90		6006	548,47				3238,00	
3	24+530	18+500	5,90		6006	278,20				1641,40	
3	24+540	18+500	5,90		6006	94,26				556,10	
3	24+550	18+500	6,00		6006	62,92				377,50	
3	24+560	18+500	6,00		6006	67,73				406,40	
3	24+570	18+500	6,00		6006	78,39				470,30	
3	24+580	18+500	6,00		6006	56,29				337,70	
3	24+590	18+500	6,00		6006	48,88				293,30	
3	24+600	18+500	6,00		6006	23,27				139,60	
3	24+610	18+500	6,00		6006	0,00				0,00	
3	24+620	18+500	6,00		6006	0,00				0,00	
3	24+630	18+500	6,00		6006	0,00				0,00	
3	24+640	18+500	6,00		6006	0,00				0,00	
3	24+650	18+500	6,10		6006	0,00				0,00	
3	24+660	18+500	6,10		6006	43,29				264,10	
3	24+670	18+500	6,10		6006	86,32				526,60	
3	24+680	18+500	6,10		6006	114,01				695,50	
3	24+690	18+500	6,10		6006	113,88				694,70	
3	24+700	18+500	6,10		6006	42,90				261,70	
3	24+710	18+500	6,10		6006	0,00				0,00	
3	24+720	18+500	6,10		6006	0,00				0,00	
3	24+730	18+500	6,10		6006	0,00				0,00	
3	24+740	18+500	6,10		6006	0,00				0,00	
3	24+750	18+500	6,20		6006	0,00				0,00	
3	24+760	18+500	6,20		6006	53,04				328,60	
3	24+770	18+500	6,20		6006	114,66				710,90	
3	24+780	18+500	6,20		6006	154,44				957,50	
3	24+790	18+500	6,20		6006	182,78				1133,20	
3	24+800	18+500	6,20		6006	209,43				1298,50	
3	24+810	18+500	6,20		6006	237,25				1471,00	
3	24+820	18+500	6,30		6006	230,10				1426,60	
3	24+830	18+500	6,30		6006	224,12				1389,50	
3	24+840	18+500	6,30		6006	215,28				1334,70	
3	24+850	18+500	6,30		6006	203,19				1259,80	
3	24+860	18+500	6,30		6006	183,30				1154,60	
3	24+870	18+500	6,30		6006	171,47				1060,30	
3	24+880	18+500	6,30		6006	162,63				1024,80	
3	24+890	18+500	6,30		6006	154,96				976,20	
3	24+900	18+500	6,30		6006	156,26				984,40	
3	24+910	18+500	6,30		6006	151,06				951,70	
3	24+920	18+500	6,30		6006	144,17				908,30	
3	24+930	18+500	6,30		6006	144,56				910,70	
3	24+940	18+500	6,30		6006	158,47				998,40	
3	24+950	18+500	6,40		6006	157,17				1006,90	
3					6006					-3345,30	Descuento cantidad cobrada Acta N°47 PR24+460 al PR24+530
3					6006					-6720,50	Descuento cantidad cobrada Acta N°48 PR24+780 al PR24+950

INFORME PARA PAGO

SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 4501/01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 58
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 992 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		59227,20

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD km		RUTA	VOLUMEN EXPLANACION MATERIAL COMUN	VOLUMEN EXPLANACION EN ROCA	VOLUMEN EXCAVACIÓN REPARACIÓN PAVIMENTO	MEJORAMIENTO	TOTAL	OBSERVACIONES
3	25+010	18+500	6,40		6006	0,00				0,00	
3	25+020	18+500	6,40		6006	66,83				427,60	
3	25+030	18+500	6,40		6006	116,74				747,10	
3	25+040	18+500	6,40		6006	94,64				605,70	
3	25+050	18+500	6,50		6006	80,73				524,70	
3	25+060	18+500	6,50		6006	89,70				583,10	
3	25+070	18+500	6,50		6006	108,88				894,65	
3	25+080	18+500	6,50		6006	138,45				899,90	
3	25+090	18+500	6,50		6006	171,99				1117,80	
3	25+100	18+500	6,50		6006	168,48				1095,10	
3	25+110	18+500	6,50		6006	140,27				911,80	
3	25+120	18+500	6,50		6006	126,36				821,39	
3	25+130	18+500	6,50		6006	113,75				739,40	
3	25+140	18+500	6,50		6006	88,40				574,60	
3	25+150	18+500	6,60		6006	91,91				606,60	
3	25+160	18+500	6,60		6006	120,51				795,40	
3	25+170	18+500	6,60		6006	129,22				852,90	
3	25+180	18+500	6,60		6006	148,60				981,00	
3	25+190	18+500	6,60		6006	221,76				1463,70	
3	25+200	18+500	6,60		6006	298,87				1972,50	
3	25+210	18+500	6,60		6006	267,93				1768,30	
3	25+220	18+500	6,60		6006	188,76				1245,80	
3	25+230	18+500	6,60		6006	171,86				1134,30	
		TOTAL									

El transporte es calculado a partir de las secciones reportadas en el ítem 210.2.2 y un factor de expansión de 30%

TOTAL	59.227,20
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	59.227,20
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	59.227,20

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		59227,20









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		19.212,80

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD km	FECHA	RUTA		VOLUMEN	VOLUMEN APROXIMADO (E-INVIAS 900.2.6)	TOTAL	OBSERVACIONES
3	68+000,00	60+400,00	7,50	24/06/2025	6006		445,40	445,00	3337,50	
3	68+000,00	60+400,00	7,50	24/06/2025	6006		265,20	265,00	1987,50	
3	63+360,00	56+700,00	6,60	25/06/2025	6009		14,70	15,00	99,00	
3	60+190,00	56+700,00	3,40	26/06/2025	6009		13,90	14,00	47,60	
3	59+700,00	56+700,00	2,90	28/06/2025	6009		57,20	57,00	165,30	
3	59+700,00	56+700,00	2,90	1/07/2025	6009		34,90	35,00	101,50	
3	59+750,00	56+700,00	3,00	2/07/2025	6009		28,00	28,00	84,00	
3	59+750,00	56+700,00	3,00	3/07/2025	6009		14,70	15,00	45,00	
3	32+000,00	57+800,00	25,70	9/07/2025	6007		219,00	219,00	5628,30	
3	32+000,00	57+800,00	25,70	10/07/2025	6007		116,10	116,00	2981,20	
3	92+000,00	97+500,00	5,40	14/07/2025	6009		111,20	111,00	599,40	
3	59+750,00	45+000,00	14,70	14/07/2025	6009		55,60	56,00	823,20	
3	53+800,00	45+000,00	8,70	14/07/2025	6009		97,90	98,00	852,60	
3	92+000,00	97+500,00	5,40	15/07/2025	6009		152,90	153,00	826,20	
3	90+000,00	97+500,00	7,40	15/07/2025	6009		55,60	56,00	414,40	
3	59+750,00	45+000,00	14,70	18/07/2025	6009		83,40	83,00	1220,10	

TOTAL	19.212,80
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	19.212,80
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	19.212,80

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 458Y01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021


ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
900.30	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		19212,80









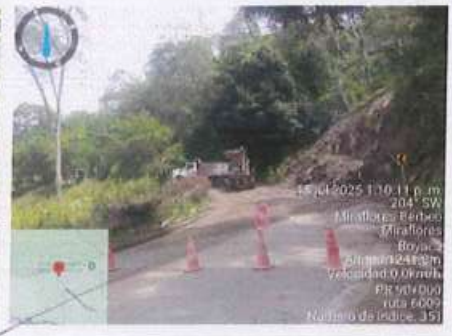



RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 50
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
233.1	Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2	3869,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA LLENO m2(B)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	22+840,00	22+920,00	6006	80,00		7,30		584,00	584,00	refuerzo a capas granulares (entre subbase y base) según diseño
7	23+000,00	23+090,00	6006	90,00		7,30		657,00	657,00	refuerzo a capas granulares (entre subbase y base) según diseño
7	24+170,00	24+530,00	6006	360,00		7,30		2.628,00	2628,00	refuerzo a capas granulares (entre subbase y base) según diseño

TOTAL	3869,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	3869,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	3869,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 60
PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2025 A 20 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	3869,00
233.1	Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2		










RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	8	8	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ PERIODO MES: jul/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 50 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.452.100.623

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8-ago-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	8-ago-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	9-ago-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO M.	Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-ago-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO M.	Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	14-ago-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	25/08/25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"' MÓDULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA **NIT.** 900.815.676-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Ing. Luis Jaime Diaz Perez (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3.286.825.588 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Tres Mil Doscientos Ochenta y Seis Millones Ochocientos Veinticinco Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.50 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 al 31 de Julio de 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO	Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO		Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO	Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO	Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS	Nombre : LUIS JAIME DIAZ PÉREZ
ROCA PACHECO Matricula No. 01102-0621 CPITVC	Matricula No. 01102-0621 CPITVC	Matricula profesional No.: 25202104893 CND	Matrícula: 22202-273807 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **973 DE 2021**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	50	1 al 31 de Julio de 2025
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	86825	RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 3.286.825.588
				TOTAL ACTA	$ 3.286.825.588

NOTA:
1. El valor total del acta es de $ 3.480.786.133, se descuenta $ 193.960.545 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de $ 3.286.825.588.

Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)
Matrícula No: 01102-0621 CPITVC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtedwin	EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-11:42 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13625 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	86825	**Fecha Registro:**	2025-02-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	55.544.554.455,00	**Valor Total Operaciones:**	-15.128.000.000,00			**Valor Actual:**	40.416.554.455,00	**Saldo x Obligar:**	40.416.554.455,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900815676	**Razón Social:**	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35195494	**Nombre:**	CATALINA TELLEZ POSADA	**Cargo:**	DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	973/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-02-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	11	CSF		38.182.423.981,00	0,00		
					Total:	38.182.423.981,00	0,00	38.182.423.981,00	38.182.423.981,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	16	CSF	2025-02-20	15.128.000.000,00	-15.128.000.000,00		
					Total:	15.128.000.000,00	-15.128.000.000,00	0,00	0,00

11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	16	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.234.130.474,00	0,00		
					Total:	2.234.130.474,00	0,00	2.234.130.474,00	2.234.130.474,00

Objeto:	SMCN CON 973/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:31/08/2030 Sol_77_10_02_25 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) DEPTO BOYACÁ,

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-30	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	416.554.455,00	416.554.455,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de Obra N°: 50 Valor básico $ 3.452.100.623 Período: 1 al 31 de Julio de 2025

Valor Incluido IVA $ 3.480.786.133

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45BY01	Puerto Boyacá	$ -	$ -	$ -	$ -
2	6006	Dos y Medio - Otanche	$ 1.835.452.999	$ 51.308.835	$ 13.445.605	$ 1.900.207.439
3	6007	Otanche - Chiquinquirá	$ 717.475.071	$ 35.557.664	$ 17.717.771	$ 770.750.506
4	6008	Chiquinquirá - Tunja	$ -	$ -	$ -	$ -
5	6009	Tunja - Páez	$ 781.193.291	$ -	$ 28.634.897	$ 809.828.188
						$ -
						$ -
		TOTALES	**$ 3.334.121.361**	**$ 86.866.499**	**$ 59.798.273**	**$ 3.480.786.133**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891800466-4	Puerto Boyacá	Boyacá	$ 1.835.919.303	$ 1.819.936.465
891801362-1	Otanche	Boyacá	$ 64.288.136	$ 64.007.488
891801369-2	San Pablo de Borbur	Boyacá	$ 35.557.664	$ 29.880.390
891801368-5	Pauna	Boyacá	$ 735.192.842	$ 731.983.376
800024789-8	Maripí	Boyacá	$ -	$ -
800099721-1	Briceño	Boyacá	$ -	$ -
891801796-4	Caldas	Boyacá	$ -	$ -
891800475-0	Chiquinquirá	Boyacá	$ -	$ -
800028436-1	Tinjacá	Boyacá	$ -	$ -
800030988-1	Sutamarchán	Boyacá	$ -	$ -
800019846-1	Sáchica	Boyacá	$ -	$ -
800016757-9	Samacá	Boyacá	$ -	$ -
891802089-1	Cucaita	Boyacá	$ -	$ -
800019277-9	Sora	Boyacá	$ -	$ -
891800846-1	Tunja	Boyacá	$ -	$ -
800015909-7	Soracá	Boyacá	$ -	$ -
800023383-7	Boyacá	Boyacá	$ -	$ -
891801280-6	Ramiriquí	Boyacá	$ -	$ -
891801988-1	Ciénaga	Boyacá	$ 4.630.856	$ 4.610.640
891801770-3	Rondón	Boyacá	$ 624.941.510	$ 622.213.344
891802106-7	Zetaquirá	Boyacá	$ 175.090.232	$ 174.325.880
800029660-1	Miraflores	Boyacá	$ 5.165.590	$ 5.143.040
800099390-5	Berbeo	Boyacá	$ -	$ -
800049508-3	Páez	Boyacá	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ		**$ 3.480.786.133**	**$ 3.452.100.623**

NIT	DEPARTAMENTO 2	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrícula: 091037-0734114 CND

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula: N/A

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la firma SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT No. 9 0 0. 8 1 5. 6 7 6 -1 y de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que la Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por ende, el suscrito representante legal de Sudinco SA Sucursal Colombiana informa a la interventoría que la planilla de seguridad social correspondiente al periodo de julio de 2025 se encuentra debidamente cancelada.

Dada en Bogotá D.C. a los (6) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,



Ing. ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
C.E. No. 542657
Representante Legal
SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S	TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	30/07/2025	88373367	$119.171.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	1
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	228.200	0		0		0	0	0	0	228.200	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	534.000	0		0		0	0	0	0	534.000	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.429.100	0		0		0	0	0	0	3.429.100	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	357.000	0		0		0	0	0	0	357.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	247.400	0		0		0	0	0	0	247.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.323.600	0		0		0	0	0	0	1.323.600	17
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	6.496.300	0		0		0	0	0	0	6.496.300	71
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.915.400	0		0		0	0	0	0	1.915.400	27
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	87.500	0		0		0	0	0	0	87.500	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	660.300	0		0		0	0	0	0	660.300	9
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	137.100	0		0		0	0	0	0	137.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.401.000	0	0	28.500	28.500	0	0		7.458.000	19
230301	Porvenir	800224808-8	41.369.700	0	0	192.300	192.300	0	0		41.754.300	103
231001	Colfondos	800227940-6	2.666.100	0	0	0	0	0	0		2.666.100	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	11.065.600	0	0	0	0	0	0		11.065.600	30

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	25.201.800				25.201.800	0	0	25.201.800			252.018	25.201.800	160

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	15.261.900	0	0	15.261.900	160

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S	TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	30/07/2025	88373367	$119.171.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	15.763.900	15.763.900
Pensión	4	62.944.000	62.944.000
Riesgos Laborales	1	25.201.800	25.201.800
CCF	1	15.261.900	15.261.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	19	119.171.600	119.171.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 160 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	30/07/2025	88373367	$119.171.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002539557	BARRERA CHAVEZ CARLOS ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.738.859	278.300	0	0	0	0	EPS041	1.738.859	69.600	14-11	1.738.859	5	121.100	CCF10	1.738.859	69.600	1.738.859	0	0	0	0
2	CC	1002624092	LEON GOMEZ ANDREY SEBASTIAN	1	0			S								X									230301	2.527.500	404.400	0	0	0	0	EPS041	2.527.500	101.100	14-11	2.527.500	5	176.000	CCF10	2.527.500	101.100	2.527.500	0	0	0	0
3	CC	1002674499	MORENO ROMERO ANGER ZAMIR	1	0			S												X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	ESSC24	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF10	237.250	9.500	237.250	0	0	0	0
4	CC	1002674499	MORENO ROMERO ANGER ZAMIR	1	0			S	X							X									230301	2.248.051	359.700	0	0	0	0	ESSC24	2.248.051	90.000	14-11	2.248.051	5	156.500	CCF10	2.248.051	90.000	2.248.051	0	0	0	0
5	CC	1002690747	ROJAS MONTES JEAN CARLOS	1	0			S												L					230301	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS037	60.000	2.400	14-11	60.000	5	0	CCF10	60.000	2.400	60.000	0	0	0	0
6	CC	1002690747	ROJAS MONTES JEAN CARLOS	1	0			S								X									230301	2.005.607	320.900	0	0	0	0	EPS037	2.005.607	80.300	14-11	2.005.607	5	139.600	CCF10	2.005.607	80.300	2.005.607	0	0	0	0
7	CC	1002691479	MORALES VERGARA LUIS FERNANDO	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
8	CC	1002702934	RODRIGUEZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S												L					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
9	CC	1002702934	RODRIGUEZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S								X									230301	1.422.637	227.700	0	0	0	0	EPS041	1.422.637	57.000	14-11	1.422.637	5	99.100	CCF10	1.422.637	57.000	1.422.637	0	0	0	0
10	CC	1003698704	GOMEZ MIRANDA JUAN ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.619.977	259.200	0	0	0	0	EPS037	1.619.977	64.800	14-11	1.619.977	5	112.800	CCF10	1.619.977	64.800	1.619.977	0	0	0	0
11	CC	1004738984	MUÑOZ OSORIO JERSSON	1	0			S								X									230301	2.243.439	359.000	0	0	0	0	EPS041	2.243.439	89.800	14-11	2.243.439	5	156.200	CCF10	2.243.439	89.800	2.243.439	0	0	0	0
12	CC	1006858110	BEJARANO ALZATE LINA VANESSA	1	0			S												X					230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS017	433.334	17.400	14-11	433.334	5	0	CCF10	433.334	17.400	433.334	0	0	0	0
13	CC	1006858110	BEJARANO ALZATE LINA VANESSA	1	0			S																	230301	2.166.667	346.700	0	0	0	0	EPS017	2.166.667	86.700	14-11	2.166.667	5	150.900	CCF10	2.166.667	86.700	2.166.667	0	0	0	0
14	CC	1007134193	CABRERA FUENTES ENRIQUE DE JESUS	1	0			S										X							230301	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS037	600.000	24.000	14-11	600.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1007134193	CABRERA FUENTES ENRIQUE DE JESUS	1	0			S												X					230301	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS037	500.000	20.000	14-11	500.000	5	0	CCF10	500.000	20.000	500.000	0	0	0	0
16	CC	1007134193	CABRERA FUENTES ENRIQUE DE JESUS	1	0			S												X					230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	0	CCF10	1.300.000	0	0	0	0	0	0
17	CC	1007134193	CABRERA FUENTES ENRIQUE DE JESUS	1	0			S																	230301	840.000	134.400	0	0	0	0	EPS037	840.000	33.600	14-11	840.000	5	58.500	CCF10	600.000	24.000	600.000	0	0	0	0
18	CC	1007426667	VANEGAS ESCOBAR EDILSON ALEXANDER	1	0			S								X									230201	1.611.340	257.900	0	0	0	0	EPS041	1.611.340	64.500	14-11	1.611.340	5	112.200	CCF10	1.611.340	64.500	1.611.340	0	0	0	0
19	CC	1007492600	VELASQUEZ ARIAS JONATHAN ALEXANDER	1	0			S										X							25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	1007492600	VELASQUEZ ARIAS JONATHAN ALEXANDER	1	0			S								X									25-14	1.817.780	290.900	0	0	0	0	EPS041	1.817.780	72.800	14-11	1.817.780	5	126.600	CCF10	1.817.780	72.800	1.817.780	0	0	0	0
21	CC	1010124055	CASTRO ROMERO JEISON ANDRES	1	0			S												X					230301	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS041	333.334	13.400	14-11	333.334	5	0	CCF10	333.334	13.400	333.334	0	0	0	0
22	CC	1010124055	CASTRO ROMERO JEISON ANDRES	1	0			S																	230301	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPS041	1.666.667	66.700	14-11	1.666.667	5	116.100	CCF10	1.666.667	66.700	1.666.667	0	0	0	0
23	CC	1013628167	GUTIERREZ AGUIRRE GINA DURLEY	1	0			S								X									230301	1.921.105	307.400	0	0	0	0	EPS017	1.921.105	76.900	14-11	1.921.105	5	133.800	CCF10	1.921.105	76.900	1.921.105	0	0	0	0
24	CC	1014298209	ROLDAN SANCHEZ YULY TATIANA	1	0			S												X					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
25	CC	1014298209	ROLDAN SANCHEZ YULY TATIANA	1	0			S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS041	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF10	1.376.050	55.100	1.376.050	0	0	0	0
26	CC	10171521	RODRIGUEZ LOPEZ RICARDO	1	0			S												X					25-14	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS017	100.000	4.000	14-11	100.000	5	0	CCF10	100.000	4.000	100.000	0	0	0	0
27	CC	10171521	RODRIGUEZ LOPEZ RICARDO	1	0			S								X									25-14	1.558.122	249.300	0	0	0	0	EPS017	1.558.122	62.400	14-11	1.558.122	5	108.500	CCF10	1.558.122	62.400	1.558.122	0	0	0	0
28	CC	1017249673	DELGADO HINCAPIE BRAYAN ESTEBAN	1	0			S								X									25-14	1.493.381	239.000	0	0	0	0	EPS037	1.493.381	59.800	14-11	1.493.381	5	104.000	CCF10	1.493.381	59.800	1.493.381	0	0	0	0
29	CC	10176383	ROJAS CHARRY JOSE EUSEBIO	1	0			S								X									230301	2.232.569	357.300	0	0	0	0	EPS041	2.232.569	89.400	14-11	2.232.569	5	155.400	CCF10	2.232.569	89.400	2.232.569	0	0	0	0
30	CC	10184130	HURTADO ORTIZ EBER ALEXANDER	1	0			S												X					230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0
31	CC	10184130	HURTADO ORTIZ EBER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS017	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	1.328.600	0	0	0	0
32	CC	1022369705	GOMEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA	1	0			S												X					230201	380.000	60.800	0	0	1.900	1.900	EPS037	380.000	15.200	14-11	380.000	5	0	CCF10	380.000	15.200	380.000	0	0	0	0
33	CC	1022369705	GOMEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA	1	0			S																	230201	5.320.000	851.200	0	0	26.600	26.600	EPS037	5.320.000	212.800	14-11	5.320.000	5	370.300	CCF10	5.320.000	212.800	5.320.000	0	0	0	0
34	CC	1024487963	GUZMAN CASTRO EDGAR ANTONIO	1	0			S										X							230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS008	521.950	20.900	14-11	521.950	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
35	CC	1024487963	GUZMAN CASTRO EDGAR ANTONIO	1	0			S												X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS008	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF10	237.250	9.500	237.250	0	0	0	0
36	CC	1024487963	GUZMAN CASTRO EDGAR ANTONIO	1	0			S										X							230301	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS008	664.300	26.600	14-11	664.300	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
37	CC	1024490247	MUÑOZ MEDINA ROBINSON	1	0			S								X									230301	3.427.478	548.400	0	0	0	0	ESSC62	3.427.478	137.100	14-11	3.427.478	5	238.600	CCF10	3.427.478	137.100	3.427.478	0	0	0	0
38	CC	1030521591	VANEGAS MORENO JUAN CARLOS	1	0			S								X									231001	1.573.636	251.800	0	0	0	0	EPS037	1.573.636	63.000	14-11	1.573.636	5	109.600	CCF10	1.573.636	63.000	1.573.636	0	0	0	0
39	CC	1032458041	RICO MORENO DIEGO ALFONSO	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF10	4.500.000	180.000	4.500.000	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	30/07/2025	88373367	$119.171.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1036220316	SALCEDO AMAYA KENER ALEXIS	1	0			S								X								230301	1.674.751	268.000	0	0	0	0	EPS017	1.674.751	67.000	14-11	1.674.751	5	116.600	CCF10	1.674.751	67.000	1.674.751	0	0	0	0
41	CC	1036222427	CIFUENTES VALENCIA JHON EDUER	1	0			S								X								230201	1.780.289	284.900	0	0	0	0	EPS037	1.780.289	71.300	14-11	1.780.289	5	124.000	CCF10	1.780.289	71.300	1.780.289	0	0	0	0
42	CC	1036224858	FONSECA RIOS JHON HARLINZON	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
43	CC	1049612325	LEON GARCIA LUIS EMBER	1	0			S																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF10	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0
44	CC	1049625844	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	1	0			S												X				230301	373.334	59.800	0	0	0	0	EPS005	373.334	15.000	14-11	373.334	5	0	CCF10	373.334	15.000	373.334	0	0	0	0
45	CC	1049625844	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	1	0			S																230301	5.226.667	836.300	0	0	0	0	EPS005	5.226.667	209.100	14-11	5.226.667	5	363.800	CCF10	5.226.667	209.100	5.226.667	0	0	0	0
46	CC	1049656277	SANDOVAL BLANCO JOSE LUIS	1	0			S							X									230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF10	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0
47	CC	1051589412	RUIZ MORENO HELMER ELIAS	1	0			S												X				230201	906.667	145.100	0	0	0	0	ESSC24	906.667	36.300	14-11	906.667	5	0	CCF10	906.667	36.300	906.667	0	0	0	0
48	CC	1051589412	RUIZ MORENO HELMER ELIAS	1	0			S	X							X								230201	1.084.243	173.500	0	0	0	0	ESSC24	1.084.243	43.400	14-11	1.084.243	5	75.500	CCF10	1.084.243	43.400	1.084.243	0	0	0	0
49	CC	1052338455	PUENTES COCA MANUEL EDILSON	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0
50	CC	1052391984	ACERO ACERO NACIM YANINE	1	0			S																25-14	4.350.000	696.000	0	0	0	0	EPS037	4.350.000	174.000	14-11	4.350.000	5	302.800	CCF10	4.350.000	174.000	4.350.000	0	0	0	0
51	CC	1053323821	CAICEDO VELASQUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF10	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0
52	CC	1053339460	CAÑON NEIZA JHON ALEXANDER	1	0			S								X								230301	1.808.967	289.500	0	0	0	0	EPS041	1.808.967	72.400	14-11	1.808.967	5	126.000	CCF10	1.808.967	72.400	1.808.967	0	0	0	0
53	CC	1053684347	LOPEZ GUERRERO DIANA PATRICIA	1	0			S								X								230301	1.501.483	240.300	0	0	0	0	EPS041	1.501.483	60.100	14-11	1.501.483	5	104.600	CCF10	1.501.483	60.100	1.501.483	0	0	0	0
54	CC	1053684532	BORDA GALINDO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X								230301	2.221.095	355.400	0	0	0	0	EPS041	2.221.095	88.900	14-11	2.221.095	5	154.600	CCF10	2.221.095	88.900	2.221.095	0	0	0	0
55	CC	1054544059	RAMIREZ GORDILLO JUAN GUILLERMO	1	0			S								X								25-14	1.589.031	254.300	0	0	0	0	EPS017	1.589.031	63.600	14-11	1.589.031	5	110.600	CCF10	1.589.031	63.600	1.589.031	0	0	0	0
56	CC	1054552172	GONZALEZ AGUDELO DARWIN ALVARO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
57	CC	1055246594	MURCIA JOHN JAIRO	1	0			S												X				230301	360.000	57.600	0	0	0	0	EPS008	360.000	14.400	14-11	360.000	5	0	CCF10	360.000	14.400	360.000	0	0	0	0
58	CC	1055246594	MURCIA JOHN JAIRO	1	0			S												X				230301	90.000	14.400	0	0	0	0	EPS008	90.000	3.600	14-11	90.000	5	0	CCF10	90.000	3.600	90.000	0	0	0	0
59	CC	1055246594	MURCIA JOHN JAIRO	1	0			S																230301	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS008	2.250.000	90.000	14-11	2.250.000	5	156.600	CCF10	2.250.000	90.000	2.250.000	0	0	0	0
60	CC	1055315226	VARGAS RODRIGUEZ DIMAS FERNEY	1	0			S								X								230301	2.254.308	360.700	0	0	0	0	EPS041	2.254.308	90.200	14-11	2.254.308	5	156.900	CCF10	2.254.308	90.200	2.254.308	0	0	0	0
61	CC	1055550117	BUITRAGO GUTIERREZ DUVAN ANDREY	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
62	CC	1055550363	ORTIZ PAEZ WILLIAM MAICO	1	0			S												X				230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	0	CCF10	142.350	5.700	142.350	0	0	0	0
63	CC	1055550363	ORTIZ PAEZ WILLIAM MAICO	1	0			S	X															230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS037	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	5	89.200	CCF10	1.281.150	51.300	1.281.150	0	0	0	0
64	CC	1055550512	PEÑA GOMEZ BREINER CLEVERSON	1	0			S																230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS041	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0
65	CC	1055550717	BAUTISTA GALINDO WILMAR	1	0			S								X								230301	3.038.087	486.100	0	0	0	0	EPS037	3.038.087	121.600	14-11	3.038.087	5	211.500	CCF10	3.038.087	121.600	3.038.087	0	0	0	0
66	CC	1055550893	CARRILLO ORDONEZ ELKIN ELIECER	1	0			S								X								230301	2.109.565	337.600	0	0	0	0	EPS037	2.109.565	84.400	14-11	2.109.565	5	146.900	CCF10	2.109.565	84.400	2.109.565	0	0	0	0
67	CC	1055550971	ARIZA ORDOÑEZ LUIS CAMILO	1	0			S								X								230301	1.524.692	244.000	0	0	0	0	EPS041	1.524.692	61.000	14-11	1.524.692	5	106.200	CCF10	1.524.692	61.000	1.524.692	0	0	0	0
68	CC	1055550981	TRIANA ORDONES JOSE GERMAN	1	0			S																230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF10	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0
69	CC	1055551646	ANZOLA PEREZ LINA YICETH	1	0			S												X				230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
70	CC	1055551646	ANZOLA PEREZ LINA YICETH	1	0			S								X								230201	1.465.173	234.500	0	0	0	0	EPS041	1.465.173	58.700	14-11	1.465.173	5	102.000	CCF10	1.465.173	58.700	1.465.173	0	0	0	0
71	CC	1055552123	CIFUENTES JIMENEZ CRISTIAN ALEXIS	1	0			S								X								230201	3.210.040	513.700	0	0	0	0	EPS037	3.210.040	128.500	14-11	3.210.040	5	223.500	CCF10	3.210.040	128.500	3.210.040	0	0	0	0
72	CC	1055552277	AGUILAR GOMEZ NESTOR JULIAN	1	0			S												X				230201	182.350	29.200	0	0	0	0	EPS037	182.350	7.300	14-11	182.350	5	0	CCF10	182.350	7.300	182.350	0	0	0	0
73	CC	1055552277	AGUILAR GOMEZ NESTOR JULIAN	1	0			S	X															230201	1.276.450	204.300	0	0	0	0	EPS037	1.276.450	51.100	14-11	1.276.450	5	88.900	CCF10	1.276.450	51.100	1.276.450	0	0	0	0
74	CC	1055554047	QUINTERO MALAGON JULIAN DAVID	1	0			S												X				230301	996.450	159.500	0	0	0	0	CCFC55	996.450	39.900	14-11	996.450	5	0	CCF10	996.450	39.900	996.450	0	0	0	0
75	CC	1055554047	QUINTERO MALAGON JULIAN DAVID	1	0			S	X							X								230301	558.077	89.300	0	0	0	0	CCFC55	558.077	22.400	14-11	558.077	5	38.900	CCF10	558.077	22.400	558.077	0	0	0	0
76	CC	1055554115	CARRILLO ARIZA SARAY CAMILA	1	0			S												X				25-14	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS017	200.000	8.000	14-11	200.000	5	0	CCF10	200.000	8.000	200.000	0	0	0	0
77	CC	1055554115	CARRILLO ARIZA SARAY CAMILA	1	0			S																25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF10	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0
78	CC	1056411023	CARO RODRIGUEZ CHRISTIAN ALEXANDER	1	0			S								X								231001	1.935.326	309.700	0	0	0	0	EPS037	1.935.326	77.500	14-11	1.935.326	5	134.700	CCF10	1.935.326	77.500	1.935.326	0	0	0	0
79	CC	1056412021	PEÑA SIERRA YENY PATRICIA	1	0			S												X				230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0
80	CC	1056412021	PEÑA SIERRA YENY PATRICIA	1	0			S								X								230201	1.982.298	317.200	0	0	0	0	EPS041	1.982.298	79.300	14-11	1.982.298	5	138.000	CCF10	1.982.298	79.300	1.982.298	0	0	0	0
81	CC	1056768150	VALERO WALTEROS OSCAR JAVIER	1	0			S								X								230301	2.670.652	427.400	0	0	0	0	EPS037	2.670.652	106.900	14-11	2.670.652	5	185.900	CCF10	2.670.652	106.900	2.670.652	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	30/07/2025	88373367	$119.171.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
82	CC	1056769743	USUGA USUGA JESUS ANTONIO	1	0			S								X									230301	2.695.652	431.400	0	0	0	0	EPS037	2.695.652	107.900	14-11	2.695.652	5	187.700	CCF10	2.695.652	107.900	2.695.652	0	0	0	0
83	CC	1056770155	DIAZ ROJAS LUIS FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.478.091	236.500	0	0	0	0	EPS017	1.478.091	59.200	14-11	1.478.091	5	102.900	CCF10	1.478.091	59.200	1.478.091	0	0	0	0
84	CC	1056770370	OSPINA HENAO DANIEL ARTURO	1	0			S												X					230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS037	332.150	13.300	14-11	332.150	5	0	CCF10	332.150	13.300	332.150	0	0	0	0
85	CC	1056770370	OSPINA HENAO DANIEL ARTURO	1	0			S								X									230301	1.180.473	188.900	0	0	0	0	EPS037	1.180.473	47.300	14-11	1.180.473	5	82.200	CCF10	1.180.473	47.300	1.180.473	0	0	0	0
86	CC	1056770893	TIQUE ARIAS CRISTIAN DAVID	1	0			S									X								230201	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS037	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
87	CC	1056770893	TIQUE ARIAS CRISTIAN DAVID	1	0			S									X								230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS037	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
88	CC	1056772194	BENAVIDES ARANGO LILIANA	1	0			S									X								230301	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS037	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
89	CC	1056772194	BENAVIDES ARANGO LILIANA	1	0			S								X									230301	1.592.599	254.900	0	0	0	0	EPS037	1.592.599	63.800	14-11	1.592.599	5	110.900	CCF10	1.592.599	63.800	1.592.599	0	0	0	0
90	CC	1056773544	PARRA DIAZ YEISON EDUARDO	1	0			S																	231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF10	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
91	CC	1056773652	RONCANCIO SALAZAR ANYI PAOLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
92	CC	1056778308	BERNAL RODRIGUEZ CESAR TIBERIO	1	0			S								X									230301	1.453.827	232.700	0	0	0	0	EPS017	1.453.827	58.200	14-11	1.453.827	5	101.200	CCF10	1.453.827	58.200	1.453.827	0	0	0	0
93	CC	1056780335	ANGARITA RAMIREZ JUAN DIEGO	1	0			S								X									230301	1.768.696	283.000	0	0	0	0	EPS037	1.768.696	70.800	14-11	1.768.696	5	123.200	CCF10	1.768.696	70.800	1.768.696	0	0	0	0
94	CC	1056781404	RODRIGUEZ VEGA JEISON NORBEY	1	0			S												L					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
95	CC	1056781404	RODRIGUEZ VEGA JEISON NORBEY	1	0			S								X									230301	1.904.490	304.800	0	0	0	0	EPS037	1.904.490	76.200	14-11	1.904.490	5	132.600	CCF10	1.904.490	76.200	1.904.490	0	0	0	0
96	CC	1056782087	VERA REAL JOSE MANUEL	1	0			S								X									230301	2.029.655	324.800	0	0	0	0	EPS037	2.029.655	81.200	14-11	2.029.655	5	141.300	CCF10	2.029.655	81.200	2.029.655	0	0	0	0
97	CC	1056784678	OSMA OQUENDO CRISTIAN HEBERTO	1	0			S								X									230301	2.243.439	359.000	0	0	0	0	EPS017	2.243.439	89.800	14-11	2.243.439	5	156.200	CCF10	2.243.439	89.800	2.243.439	0	0	0	0
98	CC	1056786778	SUAREZ CAÑAS JUAN DANIEL	1	0			S								X									230301	1.640.049	262.500	0	0	0	0	EPS037	1.640.049	65.700	14-11	1.640.049	5	114.200	CCF10	1.640.049	65.700	1.640.049	0	0	0	0
99	CC	1057410711	CARO SUAREZ ROCIO AZUCENA	1	0			S								X									25-14	1.993.223	319.000	0	0	0	0	ESSC24	1.993.223	79.800	14-11	1.993.223	5	138.800	CCF10	1.993.223	79.800	1.993.223	0	0	0	0
100	CC	1057412400	CIFUENTES HEREDIA ANGELA JULIETH	1	0			S												L					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
101	CC	1057412400	CIFUENTES HEREDIA ANGELA JULIETH	1	0			S												X					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
102	CC	1057412400	CIFUENTES HEREDIA ANGELA JULIETH	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	ESSC24	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	1.328.600	0	0	0	0
103	CC	1070004440	SOLER ORDUZ JOHAN STIVEN	1	0			S												L					230301	53.334	8.600	0	0	0	0	ESSC24	53.334	2.200	14-11	53.334	5	0	CCF10	53.334	2.200	53.334	0	0	0	0
104	CC	1070004440	SOLER ORDUZ JOHAN STIVEN	1	0			S																	230301	1.546.667	247.500	0	0	0	0	ESSC24	1.546.667	61.900	14-11	1.546.667	5	107.700	CCF10	1.546.667	61.900	1.546.667	0	0	0	0
105	CC	1073382738	MATALLANA HERNANDEZ ALBA LIDIA	1	0			S												X					231001	189.800	30.400	0	0	0	0	CCFC55	189.800	7.600	14-11	189.800	5	0	CCF10	189.800	7.600	189.800	0	0	0	0
106	CC	1073382738	MATALLANA HERNANDEZ ALBA LIDIA	1	0			S																	231001	1.233.700	197.400	0	0	0	0	CCFC55	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	5	85.900	CCF10	1.233.700	49.400	1.233.700	0	0	0	0
107	CC	1075539909	RAMIREZ DUSSAN CARLOS ANDRES	1	0			S	X																230301	2.560.000	409.600	0	0	0	0	EPS002	2.560.000	102.400	14-11	2.560.000	5	178.200	CCF10	2.560.000	102.400	2.560.000	0	0	0	0
108	CC	1085336564	REVELO CORDOBA NATALIA KATERINE	1	0			S												X					230301	3.033.333	485.400	0	0	0	0	EPS037	3.033.333	121.400	14-11	3.033.333	5	0	CCF10	3.033.333	0	0	0	0	0	0
109	CC	1085336564	REVELO CORDOBA NATALIA KATERINE	1	0			S																	230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS037	466.667	18.700	14-11	466.667	5	32.500	CCF10	466.667	18.700	466.667	0	0	0	0
110	CC	1088971630	MUÑOZ GARCIA BERNARDO ANDRES	1	0			S																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF10	4.500.000	180.000	4.500.000	0	0	0	0
111	CC	1090521048	PEREZ SOLER ANDRES CAMILO	1	0			S												X					230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0
112	CC	1090521048	PEREZ SOLER ANDRES CAMILO	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS041	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	1.328.600	0	0	0	0
113	CC	1090986420	DUARTE CORONEL CRISTIAN DANILO	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	CCFC50	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF10	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0
114	CC	1094909178	ALGARIN BEDOYA JOSE JAIDER	1	0			S								X									230301	2.042.609	326.900	0	0	0	0	EPS037	2.042.609	81.800	14-11	2.042.609	5	142.200	CCF10	2.042.609	81.800	2.042.609	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	30/07/2025	88373367	$119.171.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
115	CC	1096183231	VILLAREAL RUEDA LUIS ALFONSO	1	0			S												L					230301	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS037	50.000	2.000	14-11	50.000	5	0	CCF10	50.000	2.000	50.000	0	0	0	0
116	CC	1096183231	VILLAREAL RUEDA LUIS ALFONSO	1	0			S												X					230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS037	300.000	12.000	14-11	300.000	5	0	CCF10	300.000	12.000	300.000	0	0	0	0
117	CC	1096183231	VILLAREAL RUEDA LUIS ALFONSO	1	0			S																	230301	1.290.000	206.400	0	0	0	0	EPS037	1.290.000	51.600	14-11	1.290.000	5	89.800	CCF10	1.150.000	46.000	1.150.000	0	0	0	0
118	CC	1098221006	AGUILLON JAIMES EVER JESUS	1	0			S												X					230301	533.334	85.400	0	0	0	0	EPS005	533.334	21.400	14-11	533.334	5	0	CCF10	533.334	21.400	533.334	0	0	0	0
119	CC	1098221006	AGUILLON JAIMES EVER JESUS	1	0			S												X					230301	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.334	5.400	14-11	133.334	5	0	CCF10	133.334	5.400	133.334	0	0	0	0
120	CC	1098221006	AGUILLON JAIMES EVER JESUS	1	0			S																	230301	3.333.332	533.400	0	0	0	0	EPS005	3.333.332	133.400	14-11	3.333.332	5	232.000	CCF10	3.333.332	133.400	3.333.332	0	0	0	0
121	CC	1099548609	ARIZA GONZALEZ LUZ MYRIAM	1	0			S								X									231001	3.005.739	481.000	0	0	0	0	EPS037	3.005.739	120.300	14-11	3.005.739	5	209.200	CCF10	3.005.739	120.300	3.005.739	0	0	0	0
122	CC	1117547523	RICAURTE MUÑOZ ANGELICA MARIA	1	0			S								X									25-14	2.992.348	478.800	0	0	0	0	EPS037	2.992.348	119.700	14-11	2.992.348	5	208.300	CCF10	2.992.348	119.700	2.992.348	0	0	0	0
123	CC	11185056	LOPEZ MORALES WALTER LAVESI	1	0			S												X					231001	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS008	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	5	0	CCF10	3.200.000	128.000	3.200.000	0	0	0	0
124	CC	11185056	LOPEZ MORALES WALTER LAVESI	1	0			S																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0
125	CC	1118801937	ZUÑIGA ORTIZ HAROLD EMIR	1	0			S								X									230301	2.720.109	435.300	0	0	0	0	CCFC55	2.720.109	108.900	14-11	2.720.109	5	189.400	CCF10	2.720.109	108.900	2.720.109	0	0	0	0
126	CC	12264537	PATIÑO TOQUICA JAIME	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF10	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
127	CC	1233690646	ORTIZ CORTES PAULA VALENTINA	1	0			S																	230201	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS037	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF10	4.000.000	160.000	4.000.000	0	0	0	0
128	CC	12523657	QUIÑONEZ VILLEGAS DAYGER MANUEL	1	0			S																30		230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
129	CC	13064359	SANTACRUZ PANTOJA HECTOR HERNANDO	1	0			S																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF10	4.500.000	180.000	4.500.000	0	0	0	0
130	CC	13567075	BASTIDAS CAMPO MILTON	1	0			S												X					230201	270.000	43.200	0	0	0	0	EPS037	270.000	10.800	14-11	270.000	5	0	CCF10	270.000	10.800	270.000	0	0	0	0
131	CC	13567075	BASTIDAS CAMPO MILTON	1	0			S								X									230201	2.654.804	424.800	0	0	0	0	EPS037	2.654.804	106.200	14-11	2.654.804	5	184.800	CCF10	2.654.804	106.200	2.654.804	0	0	0	0
132	CC	1417240	ROMERO CARLOS AUGUSTO	1	0			S									X								230301	50.000	6.000	0	0	0	0	EPS037	50.000	0	14-11	50.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
133	CC	1417240	ROMERO CARLOS AUGUSTO	1	0			S									X								230301	100.000	12.000	0	0	0	0	EPS037	100.000	0	14-11	100.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
134	CC	1417240	ROMERO CARLOS AUGUSTO	1	0			S								X									230301	1.453.414	232.600	0	0	0	0	EPS037	1.453.414	58.200	14-11	1.453.414	5	101.200	CCF10	1.453.414	58.200	1.453.414	0	0	0	0
135	CC	14273389	OROZCO ROJAS JOSE RICARDO	1	0			S								X									230301	2.218.783	355.100	0	0	0	0	EPS010	2.218.783	88.800	14-11	2.218.783	5	154.500	CCF10	2.218.783	88.800	2.218.783	0	0	0	0
136	CC	14321265	TUNAROSA VALENCIA MARIO	1	0			S								X									230301	1.682.579	269.300	0	0	0	0	EPS037	1.682.579	67.400	14-11	1.682.579	5	117.200	CCF10	1.682.579	67.400	1.682.579	0	0	0	0
137	CC	14326002	ALVAREZ RIOS JULIO CESAR	1	0			S								X									230301	1.904.087	304.700	0	0	0	0	EPS017	1.904.087	76.200	14-11	1.904.087	5	132.600	CCF10	1.904.087	76.200	1.904.087	0	0	0	0
138	CC	14326049	CAMARGO HERNANDEZ LUIS ALVARO	1	0			S												L					230201	53.334	8.600	0	0	0	0	EPS037	53.334	2.200	14-11	53.334	5	0	CCF10	53.334	2.200	53.334	0	0	0	0
139	CC	14326049	CAMARGO HERNANDEZ LUIS ALVARO	1	0			S								X									230201	1.790.066	286.500	0	0	0	0	EPS037	1.790.066	71.700	14-11	1.790.066	5	124.600	CCF10	1.790.066	71.700	1.790.066	0	0	0	0
140	CC	15329674	FRANCO SANTOS MARX ALAIN	1	0			S																	230301	4.600.000	736.000	0	0	0	0	EPS037	4.600.000	184.000	14-11	4.600.000	5	320.200	CCF10	4.600.000	184.000	4.600.000	0	0	0	0
141	CC	21854909	AGUIRRE DIOSA FRANCY ELENA	1	0			S								X									230301	1.589.031	254.300	0	0	0	0	EPS002	1.589.031	63.600	14-11	1.589.031	5	110.600	CCF10	1.589.031	63.600	1.589.031	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	30/07/2025	88373367	$119.171.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
142	CC	23756114	VEGA RAMIREZ ALBA LUCIA	1	0			S										X							231001	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
143	CC	23756114	VEGA RAMIREZ ALBA LUCIA	1	0			S												X					231001	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0
144	CC	23756114	VEGA RAMIREZ ALBA LUCIA	1	0			S																	231001	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS037	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF10	1.186.250	47.500	1.186.250	0	0	0	0
145	CC	23875666	GONZALEZ CASTELLANOS ADRIANA PATRICIA	1	0			S													X				230301	189.800	30.400	0	0	0	0	ESSC24	189.800	7.600	14-11	189.800	5	0	CCF10	189.800	7.600	189.800	0	0	0	0
146	CC	23875666	GONZALEZ CASTELLANOS ADRIANA PATRICIA	1	0			S	X																230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	ESSC24	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	5	85.900	CCF10	1.233.700	49.400	1.233.700	0	0	0	0
147	CC	23876184	MURILLO TORRES MARIA EDILSA	1	0			S										X							25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
148	CC	23876184	MURILLO TORRES MARIA EDILSA	1	0			S													X				25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	ESSC24	189.800	7.600	14-11	189.800	5	0	CCF10	189.800	7.600	189.800	0	0	0	0
149	CC	23876184	MURILLO TORRES MARIA EDILSA	1	0			S		X							X								25-14	1.374.863	220.000	0	0	0	0	ESSC24	1.374.863	55.000	14-11	1.374.863	5	95.700	CCF10	1.374.863	55.000	1.374.863	0	0	0	0
150	CC	3133873	RODRIGUEZ GALLEGO HAROL AUGUSTO	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF10	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0
151	CC	3133974	MOSQUERA MINA JHON EDUAR	1	0			S									X								230301	1.867.540	298.900	0	0	0	0	EPS037	1.867.540	74.800	14-11	1.867.540	5	130.000	CCF10	1.867.540	74.800	1.867.540	0	0	0	0
152	CC	3134121	RODRIGUEZ TORRES LUIS ALBERTO	1	0			S									X								230301	1.590.606	254.500	0	0	0	0	EPS017	1.590.606	63.700	14-11	1.590.606	5	110.800	CCF10	1.590.606	63.700	1.590.606	0	0	0	0
153	CC	33365954	TALERO ACEVEDO BLANCA HELENA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
154	CC	3392779	VALERIO RAMIREZ NELSON	1	0			S									X								230301	2.243.439	359.000	0	0	0	0	EPS037	2.243.439	89.800	14-11	2.243.439	5	156.200	CCF10	2.243.439	89.800	2.243.439	0	0	0	0
155	CC	3839927	MERLANO MARTINEZ JOSE LUIS	1	0			S																	230301	5.700.000	912.000	0	0	28.500	28.500	CCFC33	5.700.000	228.000	14-11	5.700.000	5	396.800	CCF10	5.700.000	228.000	5.700.000	0	0	0	0
156	CC	40051557	GALINDO CASTRO JAUDELIZ SOOVAIDA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
157	CC	40051652	GUERRERO ORDOÑEZ BILVIA SORAIDA	1	0			S										X							230301	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS037	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
158	CC	40051652	GUERRERO ORDOÑEZ BILVIA SORAIDA	1	0			S													L				230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
159	CC	40051652	GUERRERO ORDOÑEZ BILVIA SORAIDA	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS037	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	1.328.600	0	0	0	0
160	CC	4046809	AVILA HERNANDEZ PLINIO RAFAEL	1	0			S													X				230301	186.667	29.900	0	0	0	0	EPS037	186.667	7.500	14-11	186.667	5	0	CCF10	186.667	7.500	186.667	0	0	0	0
161	CC	4046809	AVILA HERNANDEZ PLINIO RAFAEL	1	0			S																	230301	2.613.334	418.200	0	0	0	0	EPS037	2.613.334	104.600	14-11	2.613.334	5	181.900	CCF10	2.613.334	104.600	2.613.334	0	0	0	0
162	CC	4061660	LIBERATO BERMUDEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S									X								25-14	2.649.886	424.000	0	0	0	0	EPS002	2.649.886	106.000	14-11	2.649.886	5	184.500	CCF10	2.649.886	106.000	2.649.886	0	0	0	0
163	CC	4150201	ESGUERRA SALGADO GILDARDO	1	0			S													L				25-14	76.667	12.300	0	0	0	0	EPS002	76.667	3.100	14-11	76.667	5	0	CCF10	76.667	3.100	76.667	0	0	0	0
164	CC	4150201	ESGUERRA SALGADO GILDARDO	1	0			S													X				25-14	76.667	12.300	0	0	0	0	EPS002	76.667	3.100	14-11	76.667	5	0	CCF10	76.667	3.100	76.667	0	0	0	0
165	CC	4150201	ESGUERRA SALGADO GILDARDO	1	0			S																	25-14	2.146.667	343.500	0	0	0	0	EPS002	2.146.667	85.900	14-11	2.146.667	5	149.500	CCF10	2.146.667	85.900	2.146.667	0	0	0	0
166	CC	4297819	ARIAS AVILA ALIRIO	1	0			S													X				25-14	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS041	150.000	6.000	14-11	150.000	5	0	CCF10	150.000	6.000	150.000	0	0	0	0
167	CC	4297819	ARIAS AVILA ALIRIO	1	0			S									X								25-14	1.583.153	253.400	0	0	0	0	EPS041	1.583.153	63.400	14-11	1.583.153	5	110.200	CCF10	1.583.153	63.400	1.583.153	0	0	0	0
168	CC	43258408	MARIN MELENDEZ NINFA	1	0			S													X				25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	30/07/2025	88373367	$119.171.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
169	CC	43258408	MARIN MELENDEZ NINFA	1	0			S												L					25-14	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS041	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	1.328.600	0	0	0	0
170	CC	46644818	CERQUERA RUBIO MARTHA	1	0			S									X								230301	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS037	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
171	CC	46644818	CERQUERA RUBIO MARTHA	1	0			S								X									230301	1.705.860	273.000	0	0	0	0	EPS037	1.705.860	68.300	14-11	1.705.860	5	118.800	CCF10	1.705.860	68.300	1.705.860	0	0	0	0
172	CC	46646512	LONDOÑO TORRES MARY NELLY	1	0			S												L					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
173	CC	46646512	LONDOÑO TORRES MARY NELLY	1	0			S										X							230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
174	CC	46646512	LONDOÑO TORRES MARY NELLY	1	0			S								X									230301	1.347.261	215.600	0	0	0	0	EPS017	1.347.261	53.900	14-11	1.347.261	5	93.800	CCF10	1.347.261	53.900	1.347.261	0	0	0	0
175	CC	46646876	ESCOBAR BAREÑO GLADYS	1	0			S										X							25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS041	427.050	17.100	14-11	427.050	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
176	CC	46646876	ESCOBAR BAREÑO GLADYS	1	0			S												L					25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
177	CC	46646876	ESCOBAR BAREÑO GLADYS	1	0			S												X					25-14	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS041	759.200	30.400	14-11	759.200	5	0	CCF10	759.200	30.400	759.200	0	0	0	0
178	CC	46646876	ESCOBAR BAREÑO GLADYS	1	0			S																	25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS041	189.800	7.600	14-11	189.800	5	13.300	CCF10	189.800	7.600	189.800	0	0	0	0
179	CC	46647608	VELEZ ROMERO ALBA LUCIA	1	0			S												X					230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0
180	CC	46647608	VELEZ ROMERO ALBA LUCIA	1	0			S																	230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS037	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	1.328.600	0	0	0	0
181	CC	5854667	ALVAREZ SANCHEZ MARIO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF10	2.200.000	88.000	2.200.000	0	0	0	0
182	CE	588379	ESTRELLA MALDONADO HERNAN PATRICIO	1	0			S																	230301	7.740.067	1.238.500	0	0	38.800	38.800	EPS005	7.740.067	309.700	14-11	7.740.067	5	538.800	CCF10	7.740.067	309.700	7.740.067	0	0	0	0
183	CE	589542	CHIGUANO ONTANEDA JEOFFRE	1	0			S																	230301	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	480.000	14-11	12.000.000	5	835.200	CCF10	12.000.000	480.000	12.000.000	0	0	0	0
184	CE	597807	BERNAL CASTILLO ERMEL LEANDRO	1	0			S								X									230301	4.052.806	648.500	0	0	0	0	EPS005	4.052.806	162.200	14-11	4.052.806	5	282.100	CCF10	4.052.806	162.200	4.052.806	0	0	0	0
185	CC	6910403	MARTINEZ PACHON EINAR	1	0			S												X					230201	100.000	16.000	0	0	0	0	ESSC24	100.000	4.000	14-11	100.000	5	0	CCF10	100.000	4.000	100.000	0	0	0	0
186	CC	6910403	MARTINEZ PACHON EINAR	1	0			S								X									230201	1.751.002	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.751.002	70.100	14-11	1.751.002	5	121.900	CCF10	1.751.002	70.100	1.751.002	0	0	0	0
187	CC	6910507	RIAÑO MARTINEZ WILLIAM JAVIER	1	0			S												X					25-14	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS041	700.000	28.000	14-11	700.000	5	0	CCF10	700.000	28.000	700.000	0	0	0	0
188	CC	6910507	RIAÑO MARTINEZ WILLIAM JAVIER	1	0			S	X							X									25-14	1.008.467	161.400	0	0	0	0	EPS041	1.008.467	40.400	14-11	1.008.467	5	70.200	CCF10	1.008.467	40.400	1.008.467	0	0	0	0
189	CC	7187267	AUNTA HIGUERA WILLIAM FERNANDO	1	0			S												X					230301	216.667	34.700	0	0	1.100	1.100	EPS005	216.667	8.700	14-11	216.667	5	0	CCF10	216.667	8.700	216.667	0	0	0	0
190	CC	7187267	AUNTA HIGUERA WILLIAM FERNANDO	1	0			S																	230301	6.283.334	1.005.400	0	0	31.500	31.500	EPS005	6.283.334	251.400	14-11	6.283.334	5	437.400	CCF10	6.283.334	251.400	6.283.334	0	0	0	0
191	CC	7214748	RODRIGUEZ MALAVER MARCO JULIO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	3.560.000	142.400	14-11	3.560.000	5	247.800	CCF10	3.560.000	142.400	3.560.000	0	0	0	0
192	CC	72224724	SAUCEDO VILLALOBOS MANUEL SANTIAGO	1	0			S									X								25-14	2.320.522	371.300	0	0	0	0	EPS037	2.320.522	92.900	14-11	2.320.522	5	161.600	CCF10	2.320.522	92.900	2.320.522	0	0	0	0
193	CC	7251485	MARTINEZ BRIÑEZ POMPILIO	1	0			S									X								230301	2.539.565	406.400	0	0	0	0	EPS010	2.539.565	101.600	14-11	2.539.565	5	176.800	CCF10	2.539.565	101.600	2.539.565	0	0	0	0
194	CC	7254014	RESTREPO CADAVID CESAR AUGUSTO	1	0			S									X								230301	2.709.239	433.500	0	0	0	0	EPS037	2.709.239	108.400	14-11	2.709.239	5	188.600	CCF10	2.709.239	108.400	2.709.239	0	0	0	0
195	CC	7255190	ROJAS MEJIA EDGAR	1	0			S									X								25-14	1.692.521	270.900	0	0	0	0	EPS041	1.692.521	67.800	14-11	1.692.521	5	117.800	CCF10	1.692.521	67.800	1.692.521	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	30/07/2025	88373367	$119.171.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
196	CC	7316211	CANCELADO DELGADILLO JOSE RODRIGO	1	0			S								X									230301	2.103.173	336.600	0	0	0	0	EPS017	2.103.173	84.200	14-11	2.103.173	5	146.400	CCF10	2.103.173	84.200	2.103.173	0	0	0	0
197	CC	7316867	ARGUELLO NEIZA MAURICIO ADOLFO	1	0			S								X									230301	2.114.051	338.300	0	0	0	0	ESSC24	2.114.051	84.600	14-11	2.114.051	5	147.200	CCF10	2.114.051	84.600	2.114.051	0	0	0	0
198	CC	74185487	BARBOSA TORRES OSCAR	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
199	CC	74187478	NINO DUARTE CARLOS GREL	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF10	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
200	CC	74300591	URBANO BARRERA MIGUEL ANGEL	1	0			S												X					230201	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS017	606.667	24.300	14-11	606.667	5	0	CCF10	606.667	24.300	606.667	0	0	0	0
201	CC	74300591	URBANO BARRERA MIGUEL ANGEL	1	0			S								X									230201	2.538.203	406.200	0	0	0	0	EPS017	2.538.203	101.600	14-11	2.538.203	5	176.700	CCF10	2.538.203	101.600	2.538.203	0	0	0	0
202	CC	74347876	MONROY MORALES JOSE FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.519.565	243.200	0	0	0	0	EPS037	1.519.565	60.800	14-11	1.519.565	5	105.800	CCF10	1.519.565	60.800	1.519.565	0	0	0	0
203	CE	7467512	ZAMBRANO NAPA JENNRY ARTURO	1	0			S												X					230301	1.586.667	253.900	0	0	0	0	EPS037	1.586.667	63.500	14-11	1.586.667	5	0	CCF10	1.586.667	63.500	1.586.667	0	0	0	0
204	CE	7467512	ZAMBRANO NAPA JENNRY ARTURO	1	0			S																	230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS037	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	5	84.500	CCF10	1.213.334	48.600	1.213.334	0	0	0	0
205	CE	7613819	SIAVICHAY CAMACHO JULIO ALBERTO	1	0			S												X					230301	435.000	69.600	0	0	0	0	EPS005	435.000	17.400	14-11	435.000	5	0	CCF10	435.000	17.400	435.000	0	0	0	0
206	CE	7613819	SIAVICHAY CAMACHO JULIO ALBERTO	1	0			S												X					230301	725.000	116.000	0	0	0	0	EPS005	725.000	29.000	14-11	725.000	5	0	CCF10	725.000	29.000	725.000	0	0	0	0
207	CE	7613819	SIAVICHAY CAMACHO JULIO ALBERTO	1	0			S																	230301	3.190.000	510.400	0	0	0	0	EPS005	3.190.000	127.600	14-11	3.190.000	5	222.100	CCF10	3.190.000	127.600	3.190.000	0	0	0	0
208	CE	7652295	ÑAMU QUISPE JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	3.918.957	627.100	0	0	0	0	EPS005	3.918.957	156.800	14-11	3.918.957	5	272.800	CCF10	3.918.957	156.800	3.918.957	0	0	0	0
209	CC	79617998	BARRERA ROA ROLFE ANSISAR	1	0			S												X					230301	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS037	333.334	13.400	14-11	333.334	5	0	CCF10	333.334	13.400	333.334	0	0	0	0
210	CC	79617998	BARRERA ROA ROLFE ANSISAR	1	0			S																	230301	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPS037	1.666.667	66.700	14-11	1.666.667	5	116.100	CCF10	1.666.667	66.700	1.666.667	0	0	0	0
211	CC	79967731	ARAUJO GOMEZ LUIS MIGUEL	1	0			S								X									230301	2.245.435	359.300	0	0	0	0	EPS002	2.245.435	89.900	14-11	2.245.435	5	156.300	CCF10	2.245.435	89.900	2.245.435	0	0	0	0
212	CE	800394	CARDENAS VARGAS DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	3.842.300	614.800	0	0	0	0	EPS005	3.842.300	153.700	14-11	3.842.300	5	267.500	CCF10	3.842.300	153.700	3.842.300	0	0	0	0
213	CC	80231943	ANZOLA TEJEDOR JOSE EDIMER	1	0			S								X									25-14	2.163.913	346.300	0	0	0	0	EPS037	2.163.913	86.600	14-11	2.163.913	5	150.700	CCF10	2.163.913	86.600	2.163.913	0	0	0	0
214	CC	8047608	GRANDA LOZADA ALFONSO DE JESUS	1	0			S												X					230301	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS037	500.000	20.000	14-11	500.000	5	0	CCF10	500.000	20.000	500.000	0	0	0	0
215	CC	8047608	GRANDA LOZADA ALFONSO DE JESUS	1	0			S								X									230301	1.586.986	254.000	0	0	0	0	EPS037	1.586.986	63.500	14-11	1.586.986	5	110.500	CCF10	1.586.986	63.500	1.586.986	0	0	0	0
216	CC	80802775	AGUILAR LOPEZ EDI LEANDRO	1	0			S												L					230301	73.334	11.800	0	0	0	0	EPS037	73.334	3.000	14-11	73.334	5	0	CCF10	73.334	3.000	73.334	0	0	0	0
217	CC	80802775	AGUILAR LOPEZ EDI LEANDRO	1	0			S																	230301	2.126.667	340.300	0	0	0	0	EPS037	2.126.667	85.100	14-11	2.126.667	5	148.100	CCF10	2.126.667	85.100	2.126.667	0	0	0	0
218	CC	84070631	MATIAS CARMONA RODOMIRO ARCANGEL	1	0			S																	25-14	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	5	292.400	CCF10	4.200.000	168.000	4.200.000	0	0	0	0
219	CC	8740026	SAUMETH MOJICA JAIRO	1	0			S								X									25-14	2.142.174	342.800	0	0	0	0	EPS037	2.142.174	85.700	14-11	2.142.174	5	149.100	CCF10	2.142.174	85.700	2.142.174	0	0	0	0
220	CC	87514898	PANTOJA HERNÁNDEZ LUIS ALONSO	1	0			S								X									230301	2.661.685	425.900	0	0	0	0	EPS005	2.661.685	106.500	14-11	2.661.685	5	185.300	CCF10	2.661.685	106.500	2.661.685	0	0	0	0
221	CC	91002140	BETANCOURT ECHEVERRY CARLOS ARLEY	1	0			S								X									230301	1.682.579	269.300	0	0	0	0	EPS037	1.682.579	67.400	14-11	1.682.579	5	117.200	CCF10	1.682.579	67.400	1.682.579	0	0	0	0
222	CC	91505985	ROPERO PAEZ NELSON	1	0			S												X					25-14	533.334	85.400	0	0	0	0	EPS037	533.334	21.400	14-11	533.334	5	0	CCF10	533.334	21.400	533.334	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					160	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	30/07/2025	88373367	$119.171.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
223	CC	91505985	ROPERO PAEZ NELSON	1	0			S																	25-14	1.480.001	236.900	0	0	0	0	EPS037	1.480.001	59.300	14-11	1.480.001	5	103.100	CCF10	1.466.667	58.700	1.466.667	0	0	0	0
224	CC	92502711	GARCIA LARA WILLIAM RAFAEL	1	0			S								X									230301	1.627.122	260.400	0	0	0	0	EPS037	1.627.122	65.100	14-11	1.627.122	5	113.300	CCF10	1.627.122	65.100	1.627.122	0	0	0	0
225	CC	93368303	SANDOVAL MONROY FREDY	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS037	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	5	167.100	CCF10	2.400.000	96.000	2.400.000	0	0	0	0
226	CC	93416675	ARIAS RONCANCIO VICENTE FERRER	1	0			S										X							25-14	583.333	93.400	0	0	0	0	EPS037	583.333	23.400	14-11	583.333	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
227	CC	93416675	ARIAS RONCANCIO VICENTE FERRER	1	0			S																	25-14	2.916.667	466.700	0	0	0	0	EPS037	2.916.667	116.700	14-11	2.916.667	5	203.100	CCF10	2.916.667	116.700	2.916.667	0	0	0	0
228	CC	9499128	TORRES PULIDO JHONATAN JAVIER	1	0			S													X				230201	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS041	666.667	26.700	14-11	666.667	5	0	CCF10	666.667	26.700	666.667	0	0	0	0
229	CC	9499128	TORRES PULIDO JHONATAN JAVIER	1	0			S								X									230201	1.442.898	230.900	0	0	0	0	EPS041	1.442.898	57.800	14-11	1.442.898	5	100.500	CCF10	1.442.898	57.800	1.442.898	0	0	0	0
230	CC	9499211	BERNAL LOPEZ HUGO NORVAIRO	1	0			S																	230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS037	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	5	222.800	CCF10	3.200.000	128.000	3.200.000	0	0	0	0
231	CC	9530644	CIENDUA LOPEZ JORGE ELIECER	1	0			S								X									25-14	1.582.174	253.200	0	0	0	0	EPS037	1.582.174	63.300	14-11	1.582.174	5	110.200	CCF10	1.582.174	63.300	1.582.174	0	0	0	0
232	CE	977976	DE LA CRUZ TOCAGON SEGUNDO ENRIQUE	1	0			S								X									230301	6.470.761	1.035.400	0	0	32.400	32.400	EPS005	6.470.761	258.900	14-11	6.470.761	5	450.400	CCF10	6.470.761	258.900	6.470.761	0	0	0	0
233	CC	98138532	MORA ERASO NAIRO ANCIZAR	1	0			S								X									230301	2.186.583	349.900	0	0	0	0	ESSC18	2.186.583	87.500	14-11	2.186.583	5	152.200	CCF10	2.186.583	87.500	2.186.583	0	0	0	0
234	CC	98346286	ROSERO RAMOS JAIME SOLIER	1	0			S								X									230301	3.657.612	585.300	0	0	0	0	EPS037	3.657.612	146.400	14-11	3.657.612	5	254.600	CCF10	3.657.612	146.400	3.657.612	0	0	0	0
235	CE	983945	COLLAGUAZO RAMIREZ JULIO GUILLERMO	1	0			S								X									230301	3.871.841	619.500	0	0	0	0	EPS005	3.871.841	154.900	14-11	3.871.841	5	269.500	CCF10	3.871.841	154.900	3.871.841	0	0	0	0
236	CC	98652444	MACIAS HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO	1	0			S										X							25-14	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS017	1.120.000	44.800	14-11	1.120.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
237	CC	98652444	MACIAS HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO	1	0			S								X									25-14	2.105.949	337.000	0	0	0	0	EPS017	2.105.949	84.300	14-11	2.105.949	5	146.600	CCF10	2.105.949	84.300	2.105.949	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7755123			
Contratista:	SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANANA			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	900815676			
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN			
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT			
	Numero de Contrato:	973	Vigencia:	2021
	Base Gravable	$3452100623	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 34,522,000.00
	Fecha de Pago:	07/08/2025		

Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1685670746 BANCOLOMBIA

ecollect <pagos@ecollect.co>
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	900815676-900815676
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	137677420 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1685670746
Fecha y Hora	07/08/2025 02:47:11 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7755123 Descargar PDF aquí
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 34,522,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 34,522,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141170978140

(415)7707212489984(8020) 000014117097814 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 5 6 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 23 94 33 OF 401

42. Correo electrónico notificacionescontabilidad@sudinco.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 2 2 1	3 2 2 8 4 7 3 5 3 3	6 0 1 4 6 7 4 8 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 3 0 9 0 9	4 2 2 0	2 0 1 3 0 9 0 9		4 6 5 9	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	1 8	2 6	3 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
36- Establecimiento Permanente
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	1		
58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMON VELASTEGUI ANDRES EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170978140

(415)7707212489984(8020) **000014117097814 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 5 6 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 2 0 3	1 5 3 6
73. Fecha	2 0 1 3 0 9 2 4	2 0 1 5 0 7 2 8
74. Número de notaría	1 6	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 9 2 7	2 0 1 5 0 7 3 1
77. No. Matrícula mercantil	0 2 3 7 0 8 0 6	0 2 3 7 0 8 0 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 9 2 4
81. Hasta	2 9 9 9 0 9 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 1	2 0 1 3 0 9 0 9		-
2	7 9	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO SUDINCO		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001	ECUADOR 2 3 9	1790258688001

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141170978140

(415)7707212489984(8020) **000014117097814 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 5 6 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	5 4 2 6 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMON	VELASTEGUI	ANDRES	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 2 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	5 3 1 7 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	MESIAS	CESAR	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141170978140

(415)7707212489984(8020) **000014117097814 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 5 6 7 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 8 6 2 1 0		2 9 7 3 7 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ACEVEDO	AVENDAÑO	MARIA	JOSE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 6 0 6 0 0 0 6 3	9	BDO AUDIT S.A.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 7 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 5 7 8 3 8 1	1	1 8 3 1 8 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
BEDOYA	GRACIA	CARMEN	CLARIZA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 6 0 6 0 0 0 6 3	9	BDO AUDIT S.A.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 3 0 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 4 0 5 5 5 3	9	8 5 6 2 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINZON	QUINTERO	NELLY	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 0 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-II-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	6 (Día)	8 (Mes)	25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - OBUEO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 50 **DE** 1 al 31 de Julio de 2025 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 3.452.100.023

SEGUIMIENTO No. 50 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 972 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SIGNICO S.A. SISTEMA CIVIL OMNIANA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 188

PLAZO INICIAL: 392 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/08/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 359.671.764.334,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 46.095.103.064,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 405.867.087.398,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
				$ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023
EXPLANACIONES (Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46.980.120	15,39%	3,83%	% P		0,01%	0,02%	0,06%	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,06%	0,03%	0,22%
				$ P		$37.000	$50.000	$150.000	$27.181	$47.181	$49.198	$80.398	$80.398	$253.217	$44.618	$44.618	$46.739	$115.026	$227.851	$174.085	$188.792	$88.881	$661.656
				$ E	$0	$37.000	$87.000	$237.000	$264.181	$311.362	$360.560	$440.958	$521.356	$774.573	$819.191	$863.809	$910.548	$1.025.574	$1.253.425	$1.427.510	$1.616.302	$1.705.183	$2.366.839
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65.864.738	21,58%	11,19%	% P		0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,06%	0,20%	0,20%	0,21%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,12%	0,80%	0,16%	0,38%
	$98.534.372	32,29%	34.137.876,24	$ P		$0	$0	$50.000	$7.821	$7.821	$7.821	$597.411	$607.411	$617.411	$627.411	$640.982	$654.553	$668.124	$681.695	$547.015	$365.355	$2.452.734	$857.038	$1.164.035
				$ E	$0	$0	$20.000	$50.000	$57.821	$65.642	$73.463	$670.874	$678.695	$686.516	$694.337	$705.908	$717.479	$729.050	$740.621	$744.035	$744.035	$2.796.769	$3.653.807	$4.817.842
				% E	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,06%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,08%	0,03%	0,02%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,24%	0,05%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1 466.1)	$57.195.882	18,74%	19,88%	% P			0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,31%	0,31%	0,31%	0,32%	0,29%	0,38%	0,28%	0,32%	0,46%	1,31%	2,32%	1,78%	0,19%
	$90.749.203	29,74%	60.676.435,56	$ P				$30.000	$30.000	$30.000	$30.000	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192
				$ E	$0	$0	$0	$30.000	$60.000	$90.000	$120.000	$1.074.192	$1.194.192	$1.314.192	$1.434.192	$1.554.192	$1.674.192	$1.794.192	$1.914.192	$2.034.192	$2.154.192	$2.274.192	$2.394.192	$2.514.192
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,06%	0,09%	0,13%	1,13%	1,26%	1,39%	1,52%	1,64%	1,77%	1,90%	2,03%	2,15%	2,28%	2,41%	2,54%	2,66%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Ítems: 500.1)	$27.423	0,01%	0,01%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$47.795	0,02%	16.140,59	$ P								$1.438	$1.438	$1.438	$1.438	$1.438	$1.438	$18.867	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$632
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.438	$2.876	$4.314	$5.752	$7.190	$8.628	$27.495	$27.495	$27.495	$27.495	$27.495	$27.495	$27.495	$28.127
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)	$104.235.571	34,15%	25.792.717,79	% P																				
				$ P				$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$349.198	$349.198	$349.198	$349.198	$16.392	$19.258	$742.892	$1.427.678	$31.154	$466.216	$2.839.497	$1.251.141	$1.291.236
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$100.000	$0	$20.198	$0	$0	$15.698	$13.218	$4.288	$5.096	$4.490	$77.135	$607.624	$1.09.373	$355.858	$81.796
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1.689.546	0,55%	0,78%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$7.227.438	2,37%	2.379.870,07	$ P					$10.000	$984.673	$960.673	$146.901	$146.901	$146.901	$146.901	$618	$0	$0	$0	$193	$0	$294	$157.413	$62.266
				$ E	$0	$0	$0	$0	$10.000	$994.673	$1.955.346	$2.102.247	$2.249.148	$2.396.049	$2.542.950	$2.543.568	$2.543.568	$2.543.568	$2.543.568	$2.543.761	$2.543.761	$2.544.055	$2.701.468	$2.763.734
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,06%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%
OBRAS VARIAS (Ítems: 800.1; 800.2)	$160.793	0,05%	0,19%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$687.322	0,23%	582.952,13	$ P																					$4.252
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40.442.040	13,25%	2,48%	% P			0,00%	0,02%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,20%
	$20.135.228	6,60%	7.558.110,53	$ P			$50.000	$150.000	$150.000	$2.266	$12.266	$191.659	$191.659	$191.659	$191.659	$29.542	$29.542	$29.542	$78.447	$156.706	$189.791	$156.706	$157.336	$617.443
				$ E	$0	$4.221	$54.221	$204.221	$354.487	$356.753	$369.019	$560.678	$752.337	$944.996	$1.136.655	$1.166.197	$1.195.739	$1.225.281	$1.303.728	$1.460.434	$1.650.225	$1.806.931	$1.964.267	$2.581.710
				% E	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,01%	0,03%	0,01%	0,00%	0,01%	0,04%	0,01%	0,00%	0,03%	0,07%	0,04%	0,19%	0,07%	0,09%	0,03%
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0,00%	0,00%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	0,00%	-	$ P																					
				$ E																					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305.189.938,91	100,00%	46,80%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ **344.570.723,20**	112,90%	$ 142.829.280,17																						

Reprogramación No.1 | Reprogramación No.2 | Reprogramación No.3 | Reprogramación No.4 | Reprogramación No.5

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,01%	0,03%	0,16%	0,06%	0,39%	0,38%	0,78%	0,78%	0,77%	0,83%	0,34%	0,43%	0,56%	0,83%	0,82%	1,69%	4,17%	2,50%	1,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.000	$100.000	$500.000	$197.373	$1.187.961	$1.179.951	$2.302.957	$2.322.957	$2.342.957	$2.536.776	$1.024.769	$1.298.649	$1.704.282	$2.530.201	$1.880.054	$5.150.213	$12.729.694	$7.640.276	$4.468.794
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,01%	0,04%	0,21%	0,27%	0,66%	1,05%	1,83%	2,56%	3,33%	4,16%	4,50%	4,93%	5,49%	6,32%	6,87%	8,57%	12,74%	15,24%	16,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.000	$137.000	$637.000	$834.373	$2.022.335	$3.193.285	$5.496.238	$7.819.194	$10.162.151	$12.697.926	$8.340.112	$9.638.760	$11.343.022	$13.873.223	$14.888.827	$20.039.039	$32.768.733	$40.409.008	$44.894.793
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,01%	0,06%	0,22%	0,08%	0,22%	0,40%	0,38%	0,38%	0,16%	0,47%	0,59%	0,42%	0,14%	0,42%	0,71%	0,74%	1,67%	2,37%	0,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.926	$230.080	$656.229	$246.011	$868.883	$1.213.788	$901.929	$1.144.646	$496.373	$1.419.521	$1.788.086	$436.214	$1.298.021	$2.163.108	$2.273.637	$2.262.264	$3.078.412	$7.225.295	$2.177.678
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,01%	0,08%	0,30%	0,38%	0,76%	1,16%	1,54%	1,71%	1,91%	2,40%	2,99%	3,13%	3,56%	4,26%	5,01%	5,75%	6,76%	9,12%	9,84%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.926	$268.005	$924.230	$1.170.241	$2.139.121	$3.352.880	$4.254.809	$5.399.449	$5.895.822	$7.315.343	$9.113.429	$9.549.643	$10.845.664	$13.008.772	$15.282.409	$17.544.693	$20.623.106	$27.848.311	$30.025.990

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41.440.096 / $45.484.163	$ 38.930.757	85,61%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.080.000 / $1.080.000	$ -	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.524.575 / $1.714.976	$ 796.987	46,47%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.281.000 / $1.281.000	$ 1.268.678	99,04%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243.390 / $243.390	$ 241.049	99,04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $3.764.786	$ 3.242.214	86,12%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $715.305	$ 616.021	86,12%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7.772.765 / $7.772.765	$ 3.584.730	46,12%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340.000 / $340.000	$ 1.985	0,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53.681.825		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$62.396.364	$ 48.691.421	78,04%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358.871.764**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$406.967.087**	$ 191.520.702	47,06%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Dentro de las GGP se incluyen los ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los ítems No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5
FECHA	6 (Día)	8 (Mes)	25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - OBUEO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 50 **DE** 1 al 31 de Julio de 2025 (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 50 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 3.452.100.823

CONTRATO No: 973 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2021" MODULO 3
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SEGINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 992 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FOCHVIAL 168


PLAZO INICIAL: 702 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 20/08/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 765 (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 559.873.764.234,00 (Versión contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.967.087.398,00

PLAZO ACUMULADO: 99 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 765 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 66.906.322.964,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
				$ Valor programado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024
				% Ejecutado																				
EXPLANACIONES (Items: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46.980.120	15,39%	3,83%	% P	0,27%	0,08%	0,17%	0,18%	0,13%	0,05%	0,08%	0,08%	0,06%	0,06%	0,09%	0,19%	0,10%	0,12%	0,14%	0,13%	0,12%	0,30%	0,28%	0,05%
	$22.953.794	7,52%	11.685.777,27	$ P	$826.319	$236.997	$526.452	$534.495	$408.831	$150.464	$255.244	$249.882	$194.696	$174.379	$276.883	$571.489	$298.218	$357.520	$414.847	$410.896	$372.095	$910.206	$856.666	$157.905
				$ E	$826.319	$236.997	$526.452	$534.495	$408.831	$150.464	$255.244	$249.882	$194.696	$174.379	$276.883	$571.489	$298.218	$357.520	$414.847	$410.896	$372.095	$910.206	$856.666	$157.905
				% E	0,03%	0,17%	0,08%	0,09%	0,12%	0,24%	0,25%	0,08%	0,07%	0,19%	0,03%	0,09%	0,23%	0,15%	0,15%	0,19%	0,09%	0,04%	0,04%	0,01%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65.864.738	21,58%	11,19%	% P	0,48%	0,13%	0,21%	0,07%	0,23%	0,31%	0,05%	0,02%	0,27%	0,01%	0,40%	0,60%	0,55%	0,26%	0,41%	0,58%	0,35%	0,75%	0,06%	0,03%
	$98.534.372	32,29%	34.137.876,24	$ P	$1.467.618	$404.133	$652.915	$219.272	$703.691	$943.411	$145.314	$69.923	$820.497	$19.349	$1.216.555	$1.835.630	$1.671.722	$803.857	$1.262.498	$1.776.992	$1.082.330	$2.276.908	$169.819	$103.744
				$ E	$469.309	$240.997	$240.949	$68.928	$122.977	$572.563	$1.791.658	$179.959	$1.162.276	$240.146	$891.566	$1.495.784	$1.671.722	$2.484.279	$2.621.839	$1.776.979	$1.996.364	$173.048	$89.295	$127.870
				% E	0,15%	0,09%	0,08%	0,02%	0,04%	0,19%	0,59%	0,32%	0,40%	0,08%	0,29%	0,55%	0,90%	0,80%	0,85%	0,56%	0,36%	0,06%	0,03%	0,00%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 466.1)	$57.195.882	18,74%	19,88%	% P	0,24%	0,52%	0,40%	0,67%	0,11%	0,12%	0,24%	0,54%	0,61%	0,55%	0,59%	0,22%	0,74%	0,36%	0,49%	0,30%	0,67%	0,13%	0,49%	0,94%
	$90.749.203	29,74%	60.676.435,56	$ P	$728.478	$1.593.317	$1.228.094	$1.728.427	$324.816	$376.139	$732.424	$1.942.209	$1.875.503	$1.673.224	$1.802.611	$670.952	$2.294.782	$1.084.052	$1.503.302	$911.409	$2.096.763	$386.898	$1.491.539	$1.963.236
				$ E	$1.748.756	$1.797.832	$1.228.094	$1.728.427	$1.207.806	$1.376.139	$889.716	$1.942.209	$1.875.503	$1.673.224	$1.802.611	$1.938.302	$2.294.782	$1.084.052	$1.503.302	$1.787.409	$3.757.078	$0	$2.386	$0	$0
				% E	1,03%	0,52%	0,47%	0,44%	0,36%	0,72%	0,33%	0,21%	1,06%	0,31%	0,43%	1,16%	0,49%	0,28%	0,46%	0,43%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Items: 500.1)	$27.423	0,01%	0,01%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$47.795	0,02%	16.140,59	$ P	$790	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 847.2; 681.1)	$92.829.396	30,42%	8,45%	% P	0,57%	0,38%	0,67%	1,69%	1,71%	1,33%	0,56%	1,03%	0,70%	0,61%	0,12%	0,28%	0,16%	0,87%	0,85%	0,92%	0,90%	0,87%	1,23%	1,35%
	$104.235.571	34,15%	25.792.717,79	$ P	$1.728.037	$1.186.864	$3.040.036	$5.160.068	$6.326.343	$4.066.298	$1.696.364	$3.164.789	$3.126.495	$1.846.694	$362.306	$889.378	$474.482	$3.643.816	$3.987.861	$3.797.876	$3.764.428	$3.664.118	$3.766.994	$4.132.766
				$ E	$188.440	$278.160	$179.618	$252.042	$316.422	$566.222	$342.203	$1.098.214	$1.182.210	$4.172.286	$0	$1.834.491	$474.482	$924.400	$1.613.610	$1.118.841	$3.542.286	$3.542.286	$3.542.286	$424.480
				% E	0,06%	0,09%	0,06%	0,07%	0,10%	0,18%	0,11%	0,35%	0,38%	1,34%	0,00%	0,59%	0,15%	0,29%	0,52%	0,36%	0,35%	0,34%	0,34%	0,04%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1.889.546	0,59%	0,78%	% P	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,03%	0,13%	0,01%	0,04%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,08%
	$7.227.438	2,37%	2.379.870,07	$ P	$77.833	$16.096	$24.483	$16.656	$28.055	$149.116	$84.484	$366.605	$42.108	$123.425	$809.157	$0	$0	$0	$0	$153.264	$196.956	$119.363	$189.444	$243.012
				$ E	$77.833	$0	$0	$0	$0	$197.741	$81.859	$366.605	$42.108	$123.425	$809.157	$0	$0	$0	$0	$153.264	$0	$0	$0	$243.012
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,01%	0,04%	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%
OBRAS VARIAS (Items: 800.1; 800.2)	$160.793	0,05%	0,19%	% P	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,08%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	$687.322	0,23%	582.352,12	$ P	$5.352	$13.182	$38.587	$71.460	$32.541	$7.000	$11.131	$82.647	$151.352	$106.308	$52.099	$0	$0	$0	$0	$14.333	$17.460	$58.826	$44.506	$29.410
				$ E	$5.352	$0	$0	$0	$0	$7.000	$11.131	$82.647	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.333	$17.460	$0	$0	$29.410
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (Items: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40.442.040	13,25%	2,48%	% P	0,25%	0,17%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%
	$20.135.228	6,60%	7.558.110,53	$ P	$771.854	$507.474	$923.993	$448.381	$473.122	$434.619	$54.532	$133.440	$219.251	$166.513	$135.369	$165.566	$90.651	$92.468	$95.260	$94.193	$91.925	$87.013	$49.244	$48.763
				$ E	$771.854	$1.115.393	$467.763	$473.381	$473.122	$434.619	$54.532	$133.440	$181.248	$139.238	$0	$236.976	$90.651	$103.211	$284.884	$93.218	$91.778	$48.937	$0	$1.105
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0,00%	0,00%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	0,00%	-	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P																				
				$ E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305.189.938,91	100,00%	46,80%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 344.670.723,20	112,90%	$ 142.829.280,17																					

Reprogramación No.6 | Reprogramación No.7 | Reprogramación No.8

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,84%	1,29%	1,64%	2,68%	2,36%	2,02%	0,97%	1,84%	1,76%	1,36%	1,52%	1,34%	1,67%	1,63%	1,92%	2,02%	2,16%	2,13%	2,15%	2,19%
	VALOR (Miles de Pesos)	$5.607.230	$3.928.095	$5.013.619	$8.166.150	$7.194.299	$6.149.863	$2.959.481	$5.623.651	$5.329.628	$4.109.781	$4.653.964	$4.103.036	$4.789.835	$4.981.443	$5.868.668	$6.158.862	$6.547.932	$6.512.462	$6.559.208	$6.677.345
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	16,98%	12,46%	14,10%	16,77%	19,13%	21,15%	22,11%	23,96%	25,76%	27,06%	28,58%	23,84%	25,41%	27,04%	28,97%	30,98%	33,13%	35,26%	37,41%	39,60%
	VALOR (Miles de Pesos)	$58.902.023	$34.974.322	$43.022.140	$51.188.289	$58.382.589	$64.532.452	$67.492.052	$73.115.703	$78.444.733	$82.554.514	$87.208.480	$72.778.329	$77.568.164	$82.549.607	$88.418.275	$94.577.137	$101.125.069	$107.637.532	$114.196.740	$120.873.816
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1,33%	1,24%	0,86%	0,85%	0,73%	1,49%	1,58%	1,02%	0,85%	0,82%	0,72%	2,01%	2,05%	1,66%	1,86%	1,54%	2,19%	0,22%	0,13%	0,23%
	VALOR (Miles de Pesos)	$4.055.926	$3.776.006	$2.629.395	$2.594.643	$2.225.962	$4.542.386	$4.747.956	$3.101.929	$2.598.846	$2.492.742	$2.208.892	$7.655.662	$8.247.954	$6.764.936	$5.674.664	$4.694.455	$6.411.540	$684.172	$398.638	$687.811
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	11,17%	12,40%	13,27%	14,12%	14,84%	16,33%	17,88%	18,90%	20,96%	21,77%	22,50%	24,50%	27,05%	28,61%	30,47%	32,01%	34,11%	34,34%	34,47%	34,69%
	VALOR (Miles de Pesos)	$34.081.517	$37.857.523	$46.483.918	$43.078.561	$45.304.543	$49.846.929	$54.594.885	$57.695.814	$63.954.699	$66.447.491	$68.656.293	$76.311.975	$82.559.930	$87.324.866	$92.999.530	$97.694.015	$104.105.555	$104.789.728	$105.188.366	$105.876.177

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41.440.096 / $45.484.183	$ 38.939.757	85,61%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$1.080.000 / $1.080.000	$ -	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.524.575 / $1.714.976	$ 796.987	46,47%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.281.000 / $1.281.000	$ 1.268.678	99,04%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243.390 / $243.390	$ 241.049	99,04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $3.764.766	$ 3.242.214	86,12%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $715.305	$ 616.021	86,12%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7.772.765 / $7.772.765	$ 3.584.730	46,12%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340.000 / $340.000	$ 1.985	0,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53.681.825		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$62.396.364	$ 48.691.421	78,04%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358.871.764**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$406.967.087**	$ 191.520.702	47,06%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 600.3P; 600.4P; 6.5P; 6.9P; 6.7P; 6.8P; 660.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Ítems No previstos 233.1; 464.1.1; 672.4; 680.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los Ítem No previstos 662.2P; 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA: 6 (Día) / 8 (Mes) / 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 60 **DE** 1 al 31 de Julio de 2025 (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 60 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.452.100.623

CONTRATO No: 973 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODALO 3
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 999 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO PROVINCIA VIAL

PLAZO INICIAL: 702 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)**: $ 359.871.764.334,09 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.967.987.990,00

PLAZO ACUMULADO: 99 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 46.095.323.054,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
				$ Valor Ejecutado	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
				% Ejecutado	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026
EXPLANACIONES (Items: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46.980.120	15,39%	3,83%	% P	0,02%	0,01%	0,28%	0,02%	0,05%	0,03%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,04%	0,02%	0,02%	0,02%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,09%
	$22.963.794	7,52%	11.685.777,27	$ P	$61.908	$30.888	$857.191	$66.116	$165.289	$84.626	$198.347	$243.782	$236.101	$243.977	$233.164	$124.914	$75.492	$73.057	$63.316	$156.726	$156.726	$211.634	$211.634	$264.543
				$ E	$0	$0	$857.191	$151.306	$316.395	$151.306	$225.842	$243.782	$166.722	$166.722										
				% E	0,00%	0,00%	0,28%	0,11%	0,06%	0,03%	0,06%	0,09%	0,08%	0,05%										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items: 310.1, 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$95.864.738	21,58%	11,19%	% P	0,33%	0,00%	0,08%	0,08%	0,21%	0,20%	0,20%	0,30%	0,20%	0,30%	0,30%	0,23%	0,01%	0,01%	0,01%	0,35%	0,35%	0,46%	0,46%	0,58%
	$98.534.372	32,29%	34.137.876,24	$ P	$1.016.936	$8.260	$2.990.711	$253.441	$633.604	$910.165	$760.324	$917.567	$887.968	$917.567	$917.567	$695.777	$32.413	$31.367	$27.185	$1.054.692	$1.054.692	$1.406.256	$1.406.256	$1.757.819
				$ E	$0	$0	$1.673.869	$4.071	$2.153.595	$1.668.577	$1.445.188	$453.265	$156.256	$409.256										
				% E	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,71%	0,65%	0,43%	0,13%	0,23%	0,16%										
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 466.1)	$57.195.882	18,74%	19,88%	% P	1,28%	0,02%	0,55%	0,09%	0,23%	0,27%	0,27%	0,28%	0,30%	0,31%	0,31%	0,29%	0,08%	0,01%	0,07%	0,13%	0,13%	0,17%	0,17%	0,22%
	$90.749.203	29,74%	60.676.435,56	$ P	$3.906.467	$60.692	$1.673.869	$276.211	$690.527	$924.197	$828.432	$943.933	$913.182	$946.187	$946.187	$892.629	$232.657	$223.655	$202.777	$598.301	$598.301	$531.667	$531.667	$663.934
				$ E	$0	$0	$1.673.869	$4.071	$2.153.595	$1.668.577	$1.445.188	$453.265	$156.256	$409.256										
				% E	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,71%	0,65%	0,43%	0,13%	0,23%	0,16%										
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Items: 500.1)	$27.423	0,01%	0,01%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$47.795	0,02%	16.140,59	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 625.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 847.2; 681.1)	$92.829.396	30,42%	8,45%	% P	0,36%	0,00%	0,67%	0,16%	0,40%	0,48%	0,48%	0,40%	0,40%	0,36%	0,39%	0,29%	0,01%	0,01%	0,00%	0,40%	0,40%	0,54%	0,54%	0,67%
	$104.235.571	34,15%	25.792.717,79	$ P	$1.113.060	$8.411	$2.054.139	$495.753	$1.214.362	$1.469.503	$1.457.259	$1.229.392	$1.278.815	$1.198.643	$1.188.209	$790.368	$17.188	$18.884	$14.104	$1.225.515	$1.225.515	$1.634.021	$1.634.021	$2.042.526
				$ E	$224.043	$201.039	$2.054.139	$1.258.866	$1.232.272	$1.125.969	$1.035.563	$1.317.588	$1.051.973	$1.407.840										
				% E	0,07%	0,07%	0,67%	0,41%	0,40%	0,37%	0,34%	0,43%	0,34%	0,46%										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1.689.546	0,55%	0,78%	% P	0,14%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,06%	0,07%	0,07%	0,06%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%
	$7.227.438	2,37%	2.379.870,07	$ P	$436.693	$29.839	$0	$29.308	$73.269	$97.923	$97.923	$88.435	$109.912	$109.912	$217.111	$242.471	$34.671	$42.943	$93.730	$61.052	$61.052	$81.402	$81.402	$101.753
				$ E	$0	$0	$0	$0	$247.345	$0	$0	$0	$0	$0										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
OBRAS VARIAS (Items: 800.1; 800.2)	$160.793	0,05%	0,19%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$687.322	0,23%	582.952,13	$ P	$27.388	$371	$0	$3.021	$7.553	$9.064	$9.064	$203.399	$17.263	$17.838	$17.838	$30.278	$0	$0	$0	$4.189	$4.189	$5.585	$5.585	$6.981
				$ E	$0	$0	$0	$0	$192.365	$0	$0	$203.399	$17.263	$0										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,12%	0,01%	0,00%										
TRANSPORTES (Items: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40.442.040	13,25%	2,48%	% P	0,01%	0,02%	0,07%	0,03%	0,07%	0,07%	0,08%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,08%	0,08%	0,11%	0,11%	0,14%
	$20.135.228	6,60%	7.558.110,63	$ P	$39.112	$56.437	$218.777	$84.933	$210.984	$207.282	$252.199	$67.977	$99.788	$83.493	$73.563	$68.335	$56.788	$58.969	$46.092	$257.360	$257.360	$343.146	$343.146	$428.933
				$ E	$0	$0	$218.777	$84.933	$210.984	$207.282	$252.199	$67.977	$99.788	$83.493										
				% E	0,00%	0,00%	0,07%	0,03%	0,07%	0,07%	0,08%	0,02%	0,03%	0,03%										
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	0,00%	-	$ P																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305.189.938,91	100,00%	46,80%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 344.570.723,20**	112,90%	$ 142.829.280,17																					

Reprogramación | Reprogramación | Reprogramación

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACION 2		
REPROGRAMACION 3		
REPROGRAMACION 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,16%	0,07%	2,55%	0,39%	0,98%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,93%	0,15%	0,15%	0,15%	1,04%	1,04%	1,38%	1,38%	1,73%
	VALOR (Miles de Pesos)	$6.600.564	$203.797	$7.794.628	$1.197.883	$2.994.709	$3.593.649	$3.593.649	$3.593.649	$3.593.649	$3.593.649	$3.593.649	$2.844.972	$449.206	$449.206	$449.206	$3.199.833	$3.199.833	$4.213.111	$4.213.111	$5.266.389
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	41,76%	34,83%	37,43%	37,82%	38,80%	39,98%	41,16%	42,34%	43,51%	44,69%	45,87%	46,99%	47,09%	47,24%	48,28%	49,31%	50,69%	52,07%	53,80%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$127.454.180	$106.306.017	$114.229.831	$115.427.714	$118.422.422	$122.016.071	$125.609.720	$129.203.370	$132.797.019	$136.390.669	$139.984.317	$142.829.289	$143.278.496	$143.727.702	$144.176.908	$147.336.741	$150.496.575	$154.709.686	$158.922.797	$164.189.187
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,07%	0,11%	2,58%	1,67%	1,61%	1,83%	1,18%	1,28%	1,03%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$226.043	$332.993	$7.794.628	$5.082.803	$4.922.661	$4.891.734	$3.998.022	$3.660.893	$3.154.985	$3.379.104	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	34,77%	34,81%	37,43%	39,09%	40,71%	42,28%	43,46%	44,69%	45,69%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%
	VALOR (Miles de Pesos)	$106.102.220	$106.435.203	$114.229.831	$119.312.634	$124.234.635	$129.036.369	$132.834.391	$136.295.194	$139.450.177	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41.440.096	$ 38.939.757	85,61%
	$45.484.163		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.080.000	$	0,00%
	$1.080.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.524.575	$ 796.987	46,47%
	$1.714.976		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.281.000	$ 1.268.678	99,04%
	$1.281.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243.390	$ 241.049	99,04%
	$243.390		
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0	$ 3.242.214	86,12%
	$3.764.766		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0	$ 616.021	86,12%
	$715.305		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7.772.765	$ 3.584.730	46,12%
	$7.772.765		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340.000	$ 1.985	0,58%
	$340.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53.681.825	$ 48.691.421	78,04%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$62.396.364		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358.871.764**	$ 191.520.702	47,06%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$406.967.087**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Dentro de las GGP se incluyen los ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los ítems No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 6 (Día) / 8 (Mes) / 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - OBVCO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 **DE** 1 al 31 de Año de 2025 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.450.100.921

SEGUIMIENTO No. 50 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 979 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRA - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 3

CONTRATISTA: AUTOPISTAS VIAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 980 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO PROVIAS NR

PLAZO INICIAL: 702 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 15/09/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)**: $ 199.871.764.294,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.967.087.390,00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 46.095.323.064,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
				$ Valor programado	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
					2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2028
EXPLANACIONES (Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46.980.120	15,39%	3,83%	% P	0,10%	0,10%	0,08%	0,08%	0,07%	0,05%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,07%	0,09%	0,11%	0,11%	0,08%	0,08%	0,07%	0,05%	0,05%	0,06%
	$22.953.794	7,52%	11.685.777,27	$ P	$317.461	$317.461	$238.088	$238.088	$211.634	$158.726	$158.726	$162.472	$162.472	$216.630	$216.630	$270.787	$324.944	$324.944	$243.708	$243.708	$216.630	$162.472	$162.472	$176.982
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítems: 310.1, 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65.864.738	21,58%	11,19%	% P	0,69%	0,69%	0,52%	0,52%	0,46%	0,35%	0,35%	0,40%	0,40%	0,53%	0,53%	0,67%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,53%	0,40%	0,40%	0,32%
	$98.534.372	32,29%	34.137.876,24	$ P	$2.109.383	$2.109.383	$1.582.038	$1.582.038	$1.406.256	$1.054.692	$1.054.692	$1.223.536	$1.223.536	$1.631.773	$1.631.773	$2.039.716	$2.447.659	$2.447.659	$1.835.744	$1.835.744	$1.631.773	$1.223.836	$1.223.836	$880.302
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 484.1.1; 466.1)	$57.195.882	18,74%	19,88%	% P	0,26%	0,26%	0,20%	0,20%	0,17%	0,13%	0,13%	0,16%	0,16%	0,21%	0,21%	0,26%	0,31%	0,31%	0,23%	0,23%	0,21%	0,15%	0,15%	0,07%
	$90.749.203	29,74%	60.676.435,56	$ P	$796.807	$796.807	$597.451	$597.451	$531.067	$398.301	$398.301	$471.715	$471.715	$926.193	$926.193	$795.781	$992.230	$992.230	$795.872	$795.872	$926.193	$471.715	$471.715	$227.026
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Ítems: 500.1)	$27.423	0,01%	0,01%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$47.795	0,02%	16.140,59	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.899
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)	$92.829.396	30,42%	8,45%	% P	0,80%	0,80%	0,60%	0,60%	0,54%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,66%	0,66%	0,82%	0,99%	0,99%	0,74%	0,74%	0,66%	0,49%	0,40%	0,41%
	$104.235.571	34,16%	25.792.717,79	$ P	$3.451.031	$3.451.031	$2.438.273	$2.423.273	$2.434.501	$1.734.515	$1.734.515	$1.606.582	$1.606.582	$3.007.843	$3.007.843	$3.609.803	$3.011.764	$3.011.764	$3.266.823	$3.266.823	$3.007.843	$1.606.582	$1.606.582	$1.339.412
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1.689.546	0,55%	0,78%	% P	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
	$7.227.438	2,37%	2.379.870,07	$ P	$122.103	$122.103	$91.578	$91.578	$81.402	$61.052	$61.052	$62.073	$62.073	$82.765	$82.765	$103.456	$124.147	$124.147	$93.110	$93.110	$82.765	$62.073	$62.073	$58.860
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS (Ítems: 800.1; 800.2)	$160.793	0,05%	0,19%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$687.322	0,23%	582.352,12	$ P	$8.377	$8.377	$6.283	$6.283	$5.585	$4.189	$4.189	$4.834	$4.834	$6.446	$6.446	$8.057	$9.669	$9.669	$7.251	$7.251	$6.446	$4.834	$4.834	$3.843
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES (Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40.442.040	13,25%	2,48%	% P	0,17%	0,17%	0,13%	0,13%	0,11%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,09%	0,09%	0,12%	0,14%	0,14%	0,11%	0,11%	0,09%	0,07%	0,07%	0,07%
	$20.135.228	6,60%	7.558.110,53	$ P	$514.719	$514.719	$386.040	$386.040	$343.146	$257.360	$257.360	$216.679	$216.679	$289.905	$289.905	$361.131	$433.358	$433.358	$325.018	$325.018	$288.905	$216.679	$216.679	$211.070
				$ E																				
				% E																				
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	0,00%	-	$ P																				
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305.189.938,91	100,00%	46,80%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 344.570.723,20**	112,90%	$ 142.829.280,17																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,07%	2,07%	1,58%	1,58%	1,38%	1,04%	1,04%	1,19%	1,19%	1,59%	1,59%	1,99%	2,39%	2,39%	1,79%	1,79%	1,69%	1,19%	1,19%	1,19%	0,96%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$6.319.667	$6.319.667	$4.738.756	$4.738.756	$4.213.111	$3.159.833	$3.159.833	$3.646.885	$3.646.885	$4.862.513	$4.862.513	$6.078.142	$7.293.770	$7.293.770	$5.470.328	$5.470.328	$4.862.513	$3.646.885	$3.646.885	$3.646.885	$2.899.407	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	58,87%	57,94%	59,46%	61,06%	62,43%	63,46%	64,50%	65,69%	66,89%	68,48%	70,07%	72,07%	74,46%	76,85%	78,64%	80,43%	82,02%	83,22%	84,41%	85,36%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$170.908.894	$176.828.520	$181.566.271	$186.398.021	$190.521.132	$193.680.966	$196.840.799	$200.487.684	$204.134.569	$208.997.083	$213.859.596	$219.937.738	$227.231.508	$234.525.278	$239.995.606	$245.466.934	$250.329.447	$253.975.332	$257.622.217	$260.521.625		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41.440.096 / $45.484.163	$ 38.930.757	85,61%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.080.000 / $1.080.000	$ -	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.524.575 / $1.714.976	$ 796.987	46,47%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.281.000 / $1.281.000	$ 1.268.678	99,04%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243.390 / $243.390	$ 241.049	99,04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $3.764.766	$ 3.242.214	86,12%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $715.305	$ 616.021	86,12%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7.772.765 / $7.772.765	$ 3.584.730	46,12%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340.000 / $340.000	$ 1.985	0,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53.681.825		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$62.396.364	$ 48.691.421	78,04%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358.871.764**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$406.967.087**	$ 191.520.702	47,06%

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 6 (Día) 8 (Mes) 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 **DE** 1 al 31 de Julio de 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 50 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.452.100.023

CONTRATO No: 973 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "OBRAS PARA LA SEGURIDAD Y LA RECTIVACIÓN (OBRAS PARA)" MODALO 5

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 188

PLAZO INICIAL: 902 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/08/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 365 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)**: $ 399.873.764.934,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.987.087.398,00

PLAZO ACUMULADO: 1.355 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/09/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 46.995.323.064,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
				$ Valor programado	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	FEBRERO 2028	MARZO 2028	ABRIL 2028	MAYO 2028	JUNIO 2028	JULIO 2028	AGOSTO 2028	SEPTIEMBRE 2028	OCTUBRE 2028	NOVIEMBRE 2028	DICIEMBRE 2028	ENERO 2029	FEBRERO 2029	MARZO 2029	ABRIL 2029	MAYO 2029	JUNIO 2029	JULIO 2029	AGOSTO 2029	
EXPLANACIONES (Items: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46.980.120	15,39%	3,83%	% P	0,08%	0,08%	0,08%	0,10%	0,12%	0,12%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%	
	$22.953.794	7,52%	$ 11.685.777,27	$ P	$176.962	$236.976	$236.976	$294.970	$353.963	$353.963	$265.473	$265.473	$235.976	$176.962	$176.962	$448.844	$448.844	$448.844	$448.844	$448.844	$448.844	$0	$0	
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65.864.738	21,58%	11,19%	% P	0,32%	0,43%	0,43%	0,54%	0,64%	0,64%	0,48%	0,48%	0,43%	0,32%	0,32%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00%	0,00%	
	$98.534.372	32,29%	$ 34.137.876,24	$ P	$980.302	$1.307.069	$1.307.069	$1.633.836	$1.960.603	$1.960.603	$1.470.452	$1.470.452	$1.307.069	$980.302	$980.302	$2.081.803	$2.081.803	$2.081.803	$2.081.803	$2.081.803	$2.081.803	$0	$0	
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 466.1)	$57.195.882	18,74%	19,88%	% P	0,07%	0,10%	0,10%	0,12%	0,15%	0,15%	0,11%	0,11%	0,10%	0,07%	0,07%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	
	$90.749.203	29,74%	$ 60.676.435,58	$ P	$227.026	$302.702	$302.702	$378.377	$454.053	$454.053	$340.539	$340.539	$302.703	$227.026	$227.026	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Items: 500.1)	$27.423	0,01%	0,01%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$47.795	0,02%	$ 16.140,59	$ P	$1.899	$2.532	$2.532	$3.165	$3.799	$3.799	$2.849	$2.849	$2.532	$1.899	$1.899	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 847.2; 681.1)	$92.829.396	30,42%	8,45%	% P	0,41%	0,54%	0,54%	0,68%	0,81%	0,81%	0,61%	0,61%	0,54%	0,41%	0,41%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	
	$104.235.571	34,15%	$ 25.792.717,79	$ P	$1.239.417	$1.652.556	$1.652.556	$2.065.695	$2.478.834	$2.478.834	$1.859.125	$1.859.125	$1.652.556	$1.239.417	$1.239.417	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1.689.546	0,55%	0,78%	% P	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	
	$7.227.438	2,37%	$ 2.379.870,07	$ P	$58.860	$78.479	$78.479	$98.099	$117.719	$117.719	$88.289	$88.289	$78.479	$58.860	$58.860	$115.474	$115.474	$115.474	$115.474	$115.474	$115.474	$115.474	$115.474	
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS (Items: 800.1; 800.2)	$160.793	0,05%	0,19%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$687.322	0,23%	$ 582.352,12	$ P	$3.843	$5.125	$5.125	$6.406	$7.687	$7.687	$5.765	$5.765	$5.125	$3.843	$3.843	$3.391	$6.830	$6.830	$6.830	$6.830	$6.830	$6.830	$6.830	
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES (Items: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40.442.040	13,25%	2,48%	% P	0,07%	0,09%	0,09%	0,12%	0,14%	0,14%	0,10%	0,10%	0,09%	0,07%	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
	$20.135.228	6,60%	$ 7.558.110,53	$ P	$211.078	$281.438	$281.438	$281.438	$351.797	$422.157	$316.618	$316.618	$281.438	$211.078	$211.078	$104.995	$104.995	$104.995	$104.995	$104.995	$104.995	$104.995	$104.995	
				$ E																				
				% E																				
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$0	0,00%	$ -	$ P																			$0	
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305.189.938,91	100,00%	46,80%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 344.570.723,20**	112,90%	$ 142.829.280,17																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,95%	1,27%	1,27%	1,58%	1,90%	1,90%	1,43%	1,43%	1,27%	0,95%	0,95%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,96%	0,96%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.899.407	$3.866.876	$3.866.876	$4.832.345	$5.798.814	$5.798.814	$4.349.111	$4.349.111	$3.865.876	$2.899.407	$2.899.407	$5.467.764	$5.461.223	$5.461.223	$5.461.223	$5.461.223	$5.461.223	$5.461.223	$2.930.577	$2.930.577	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	86,81%	87,98%	88,95%	90,42%	92,33%	94,23%	95,66%	97,09%	98,36%	99,30%	100,25%	102,04%	103,83%	105,61%	107,40%	109,19%	110,98%	112,76%	114,54%	115,50%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$263.421.932	$267.288.808	$271.152.764	$275.985.129	$281.783.944	$287.582.758	$291.931.889	$296.280.979	$300.146.856	$303.046.263	$305.945.670	$311.403.464	$316.864.673	$322.325.900	$327.787.123	$333.248.346	$338.709.570	$341.640.148	$344.570.723		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	46,80%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	$142.829.280	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41.440.096 / $45.484.183	$ 38.939.757	85,61%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.080.000 / $1.080.000	$ -	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.524.575 / $1.714.976	$ 796.987	46,47%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.281.000 / $1.281.000	$ 1.268.678	99,04%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243.390 / $243.390	$ 241.049	99,04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $3.764.766	$ 3.242.214	86,12%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $715.305	$ 616.021	86,12%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7.772.765 / $7.772.765	$ 3.584.730	46,12%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340.000 / $340.000	$ 1.985	0,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53.681.825		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$62.396.364	$ 48.691.421	78,04%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$398.571.764**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$406.967.087**	$ 191.520.702	47,06%

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Dentro de las GPP se incluyen los Ítem No Previstos 850.3P, 850.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Ítems No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los Ítem No previstos 662.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Aprueba Firma:
Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
Representante legal o apoderado del Contratista SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrícula Profesional No.: 091037-0734114 CND

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor CONSORCIO ECOVISIÓN 188
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MAI- IN-1-ITA-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	25 (Día) / 7 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACÁ

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 60

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (Indicar mes año SI)

Resolución N° _____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) _____ **PAGA** _____

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISION 188

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

OBJETO INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

N° CONTRATO 970 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 25-jun-21 **FECHA DI TERMINACION** 31-ago-29

Valor Inicial Contrato Obra	$	159.871.744.109,00
Valor Adicional No.1	$	29.037.031.000,00
Valor Adicional No. 2	$	170.019.665.000,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor total	$	358.927.987.109,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	2.565.791.972,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	2.565.791.972,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2.565.791.972,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	24.944.654.104,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor total	$	24.944.654.104,00

Año N.	33%
V %	2%

N° CONTRATO 962 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 15-jun-21 **FECHA DE TERMINACION** 31-ago-29

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ (SEP/DIC/2022 _____

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCION	MITIGACION	CORRECCION	COMPENSACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALORTOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
DAGA1.3-03	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	Cumplimiento requerimientos legales	Proyectos Escuelas Verdes en cumplimiento a la Resolución 6720 del INVIAS, se desarrollara en una escuela por Ruta objeto del corredor vial. Se inicia en el desarrollo del Programa INVIAS Ruta Escuela de la Adaptación, dirigido a las escuelas del corredor vial para la sensibilización, educación y comunicación sobre el cambio climático					x	1	Global	$ 280.000.000,00	$ 280.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 280.000.000,00	N/A	"Plan de implementación del Programa de escuelas verde aprobado por la Interventoria y avalado por el INVIAS Informe de Implementación Facturas de compra" En el periodo no se ha ejecutado
PGA-3.1-09	GESTIÓN RECURSO HÍDRICO	Proyecto de manejo de aguas superficiales industriales	Los monitoreos ambientales establecidos por la autoridad ambiental competente para cuerpos de ocupación de cauce	x					1	Global	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 1.000.000.000,00	N/A	Actas administrativas de la Corporacion Factura de compra y soporte de pago. En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicio los tramites
PRSE-4.2-12	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	Proyecto de recuperación de Áreas Afectadas.	Compensaciones requerida por la ANLA,Aprovechamiento de Aprovechamiento forestal, levantamiento de veda y ocupación de cauce					X	44440	arbol	$ 26.097,00	$ 1.159.791.971,89		$ -	$ -		$ -	$ 1.159.791.971,89			0,00	$ -	$ -	$ -	19,00%	$ -	$ -	$ -	0,19	$ -	0,00	$ 1.159.791.971,89	N/A	Actas administrativas de la Corporacion APUS Aprobadas por la interventoria y avalados por el INVIAS Salvoconducto de movilización aprobada por la Corporación Informes de siembra Paz y salvo de la corporacion Se estima precio de una hectárea de reforestación a partir de la Resolución 0622 del 2021 Corpoboyacá En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicio los tramites
PRSE-4.2-12		Huella de carbono	Compra de bonos de huella de carbono					X	12000	Bono de carbono	$ 10.500,00			$ -	$ -		$ -	$ -	$ 126.000.000,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 126.000.000,00	N/A	Compra de bonos de carbono de hasta 12000 toneladas. No se ha ejecutado en el periodo
											SUBTOTAL	$ 2.439.791.971,89	$ 0,00	$ 126.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.439.791.971,89	$ 0,00	$ 126.000.000,00	0,00	$ 0,00	$ -	$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 1.406.000.000,00		

VALOR REEMBOLSO VIA SUBASTA	$	-
VALOR BÁSICO GESTIÓN	$	-
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$	-
VALOR IVA	$	-
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$	-

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma: _____
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
Representante Legal o Apoderado
Contratista SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matricula No. : 09102-073414 CND

Firma: _____
Nombre: MAURICIO GOMEZ CACEDO
Representante Legal o Apoderado
Interventoria: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No. :

Vo. Bo. Firma: _____
Nombre : BERNARDO ANDRES MUÑOZ GARCIA
Profesional Ambiental
Contratista de Obra: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matricula No. : 19239-276975 CAU

Vo. Bo. Firma: _____
Nombre : MAURICIO LIBARDO SANNA - ANGELA DANIELA DIAZ RICO
Profesional Ambiental
Interventoria: CONSORCIO ECOVISION 188
Matricula No. : 7624210118 VLL - 25239-326073 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	50	FECHA	21 JULIO 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	973 DE 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Boyacá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	962 DE 2021

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	8	AGOSTO	2022									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Refrigerios e Hidratación	Und	1000	$6.000	$ 6.000.000	X		$ 6.178.500			2,5%			300,79	$ 2.787.125	$ 3.391.375	
	Alquiler de sillas	Und	1000	$1.500	$ 1.500.000	X		$ 1.544.625		$ -	2,5%	$ -		0,00	$ -	$ 1.544.625	
	Alquiler de mesas	Und	250	$7.000	$ 1.750.000	X		$ 1.802.063		$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 1.802.063	
	Transporte para sillas y mesas ida y vuelta	Und	301	$4.000	$ 1.204.000	X		$ 1.239.819		$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 1.239.819	
	Alquiler de sonido incluye transporte	Und	90	$1.050.000	$ 94.500.000	X		$ 97.311.375	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,50	$ 1.574.000	$ 95.737.375	
	Alquiler de video Beam	Und	100	$154.000	$ 15.400.000	X		$ 15.858.150		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 15.858.150	
	Volantes tamaño 21,5*13,5 cm	Und	1000	$170	$ 170.000	X		$ 170.000		$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 170.000	
	Pasacalles	Und	57	$176.000	$ 10.032.000	X		$ 10.330.452		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.330.452	
	Folletos Informativos tamaño 28*42 cm	Und	2000	$1.372	$ 2.744.000	X		$ 2.825.634		$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 2.825.634	
	Cuñas Radiales 30 seg	Und	8000	$ 8.000	$ 64.000.000	X		$ 65.904.000		$ -	2,5%	$ -	$ -	1303.95	$ 8.292.393	$ 57.611.607	
	Cartillas	Und	1000	$10.274	$ 10.274.000	X		$ 10.579.652		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.579.652	
	Perifoneo	Hora	1400	$35.000	$ 49.000.000	X		$ 50.457.750		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 50.457.750	
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria y comunidad en el desarrollo de Talleres de sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, almuerzo)	Und	1000	$ 10.000	$ 10.000.000	X		$ 10.297.500			2,5%			368,00	$ 2.755.080	$ 7.542.420	
	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria Servicio transporte buseta 22 pasajeros	Und	99	$ 2.500.000	$ 247.500.000	X		$ 254.863.125		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 254.863.125	
	Talleres Pedagógicos Seguridad Vial (Entrega de chalecos reflectivos y paletas de señalización)	Und	40	$ 35.700	$ 1.428.000	X		$ 1.470.483		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.470.483	
	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit escolares temáticos)	Und	300	$ 25.100	$ 7.530.000	X		$ 7.754.018		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7.754.018	
	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit ambientales, puntos ecológicos)	Und	40	$ 249.900	$ 9.996.000	X		$ 10.293.381		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.293.381	
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS- OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Obras con participación Comunitaria	Global	1	$ 592.797.471	$ 592.797.471	X		$ 610.433.196		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 610.433.196	
	Ejecución Proyectos Productivos	Global	1	$ 82.170.922	$ 82.170.922	X		$ 84.615.507		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 84.615.507	
GERENCIA DE REGIONES	Línea Turística - Caminatas Ecológicas Pet Friendly (Kit - Gorras, Camisetas y Pañoletas)	Und	101	$ 30.600	$ 3.090.600	X		$ 3.182.545		$ -	2,5%	$ -	$ -	43,79	$ 1.340.000	$ 1.842.545	
	Línea Turística - Gastrotour INVIAS (Valla publicitaria)	Und	6	$ 20.000	$ 120.000	X		$ 123.570		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 123.570	
	Línea Deportiva (Kit -Uniformes medias y petos)	Und	100	$ 75.000	$ 7.500.000	X		$ 7.723.125	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	70,90	$ 5.317.447	$ 2.405.678	
	Línea Deportiva (Kit -Mallas, balones, pitos, tarjetas)	Und	20	$ 401.500	$ 8.030.000	X		$ 8.268.893		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 8.268.893	
	Línea Deportiva (medallas)	Und	40	$ 4.400	$ 176.000	X		$ 181.236	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	35,00	$ 171.500	$ 9.736	
	Línea Deportiva (Trofeos)	Und	4	$ 150.000	$ 600.000	X		$ 617.850	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,89	$ 284.000	$ 333.850	
	Línea Deportiva - Premio (Bono de $ 4.000.000) Categoría Fútbol y Ping Pong	Und	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000	X		$ 16.476.000	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,50	$ 4.000.000	$ 12.476.000	
	Línea Deportiva - (1 mesas de Ping Pong, 2 raquetas y 1 cajas de pelotas de Ping Pong)	Und	3	$ 1.660.500	$ 4.981.500	X		$ 5.129.700		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 5.129.700	
	Línea Deportiva - A la obra en Bici (1bicicletas y kit de protección)	Und	40	$ 730.000	$ 29.200.000	X		$ 30.068.700		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 30.068.700	
	Línea Deportiva - A la obra en Bici (Camisetas Jersey con reflectivos y casco)	Und	100	$ 145.000	$ 14.500.000	X		$ 14.931.375		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 14.931.375	
	Del Aula a la Obra (1 Casco y 1 chalecos reflectivo)	Und	50	$ 19.000	$ 950.000	X		$ 978.263		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 978.263	
GERENCIA DE REGIONES	Línea Social - Manos a la obra (1 cascos, 1 bota dielectrica,1 guante baqueta, y 1 gafa)	und	70	$ 69.646	$ 4.875.220	X		$ 5.020.258		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 5.020.258	
	Placas conmemorativas para Línea Deportiva y Social (diámetro de 17 cm)	Und	12	$ 77.000	$ 924.000	X		$ 951.489		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 951.489	
	Línea Social - Talleres de Embellecimiento y Muralismo- Kit de Pintura (1 Cuñete de pintura de 5 galones y 1 brocha 4")	Und	10	$ 249.500	$ 2.495.000	X		$ 2.569.226		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.569.226	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	8	AGOSTO 2022									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Franklin Valero - UMV-	Global	1	$ 27.479.811	$ 27.479.811	x		$ 28.297.335,38	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 28.297.335		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Franklin Valero - TDO	Global	1	$ 2.320.000	$ 2.320.000	x		$ 2.389.020	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.389.020		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UMV	Global	1	$ 45.990.778	$ 45.990.778	x		$ 47.359.004	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 47.359.004		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - TDO	Global	1	$ 2.320.000	$ 2.320.000	x		$ 2.389.020	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.389.020		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UME	Global	1	$ 10.440.000	$ 10.440.000	x		$ 10.750.590	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 10.750.590		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Omar Martinez - UMV-	Global	1	$ 83.416.968	$ 83.416.968	X		$ 85.898.623	0		2,5%	$	$	1	$ 85.898.623		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Omar Martinez- TDO	Global	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.677.350		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Laura Carolina Valero - UMV-	Global	1	$ 101.160.560	$ 101.160.560	X		$ 104.170.087	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 104.170.087		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Laura Carolina Valero - TDO	Global	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.677.350		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - UMV	Global	1	$ 97.876.224	$ 97.876.224	X		$ 100.788.042	0		2,5%	$	$	1	$ 100.788.042		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - TDO	Global	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	0		2,5%	$	$	1	$ 2.677.350		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - ARRTO	Global	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	0		2,5%	$	$	1	$ 2.677.350		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Provision Soco-predial UMV,UME,TDO,ARRTO,Htdo	Global	1	$ 609.318.121	$ 608.788.540	X		$ 609.318.121								$ 608.788.540,00	
														1			

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 1.932.430.878	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 421.746.009
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 2.354.176.887	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	17,91%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: ANDRÉS RAMÓN VELASTEGUI
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 0910370734114 CND

Firma
Nombre: WALTER LOPEZ MORALES
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 176435

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: CECILIA CORTÉS RODRÍGUEZ
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 129612

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	18	7	25
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	BOYACÁ
3. AÑO	**2025** MES 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009	TRAMO:	(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)
6. CONTRATO DE OBRA No:	973 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.		
8. CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	NIT	900.815.676-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN- 188	NIT	901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	962 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	99 MESES	12. FECHA DE INICIO:	2021/06/25	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	99 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	2029/08/31
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	3.165.433.082	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	3.165.433.082

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	358.871.764.334,00
21. VR. ANTICIPO:	$	2.185.885.000,00
22. VR. ADICIÓN No:	$	28.823.323.054,00
23. VR. ADICIÓN No:		
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	28.823.323.054,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	387.695.087.388,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE		$ 1.394.000	$ -
	27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICOY TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN		$ 2.788.000	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS		$ 1.045.000	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ 348.500	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		$ 1.074.000	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO		$ 805.500	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ 268.500	$ -
ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES		$ 754.000	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ 377.000	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		$ 377.000	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS		$ 320.000	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ 217.000	$ -
ACTIIVIDAD EJECUTADA INFORME GENERA DEL SECTOR RURAL	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM		$ 1.600.000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL		$ 960.000	
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS		$ 2.460.000	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO)		$ 1.340.000	$ -
	39. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DELIGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO		$ 2.680.000	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO		$ 670.000	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		$ 860.000	$ -
	41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMMLV		$ 430.000	$ -
	42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV		$ 640.000	$ -
	43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV		$ 320.000	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ 346.500	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		$ 231.000	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA		$ 346.500	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		$ 231.000	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 115.500	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ 115.000	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ 462.000	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 231.000	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		$ 231.000	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		$ 321.000	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 321.000	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 107.000	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		$ 749.000	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ 642.000	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SS (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ 150.000	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ 300.000	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		$ 150.000	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 150.000	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ 640.000	$ -
DIAGNÓSTICO PREDIAL	PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KILOMETRO		$ 4.650.000	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	18	7	25
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	BOYACÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009	TRAMO:	(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

6. CONTRATO DE OBRA No:	973 DE 2021
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

8. CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	NIT	900.815.676-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN- 188	NIT	901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	962 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	99 MESES	12. FECHA DE INICIO:	2021/06/25	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	99 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	2029/08/31
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	3.165.433.082	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	3.165.433.082

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)		**$ 0,00**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. (2,5% ADMISTRACION)	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

76. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
77. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
79. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	3.162.984.266
81. GESTIÓN PREDIAL	$	-
82. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
83. OTROS	$	-
84. IVA	$	-
85. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	3.162.984.266
86. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**2.448.816**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI		NOMBRES Y APELLIDOS	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO	
C.C. C.E. X	NUMERO	542.657	C.C. X C.E.	NUMERO	79.150.916
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	091037-0734114 CND	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	N/A
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: jul-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
4.628.712.871	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1.204.974.344	$ 659.136.054
	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02		54	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 3.423.738.527	$ 68.375.062
28.823.323.054	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	ADICIÓN No 1	$ 4.508.775.371	$ -
			20	PROPIOS	ADICIÓN No 1	$ 24.314.547.683	$ -
8.015.328.690	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 7.176.168.955	$ -
	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 839.159.735	$ -
15.128.000.000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 15.128.000.000	$ -
19.272.000.000	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 2	$ 19.272.000.000	$ -
727.511.116	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	VIGENCIA EXPIRADA 2021 RP 425821	$ 659.136.054	$ -
	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02		20	PROPIOS		$ 68.375.062	
37.029.702.970	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 35.498.884.651	$ -
	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1.530.818.319	$ -
46.287.128.713	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 21.373.605.815	$ -
	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02		16	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 23.000.000.000	$ -
	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1.913.522.898	$ -

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: jul-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

13.500.000.000	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 4.352.941.176	$ -
	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 9.147.058.824	$ -
40.416.554.455	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 2.234.130.474	$ -
	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 38.182.423.981	$ 12.497.333.412
			TOTAL			$ 112.897.067.585	$ 12.497.333.412

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 406.967.087.388,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 4.628.712.871	$ 358.871.764.334	110840 25/11/2021	X		
1	Ajustes	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 4.628.712.871	$ 358.871.764.334	127279 29/12/2021	X		
2	Parcial	jul-21	$ 37.925.826	$ 166.290	$ 38.092.116	$ -	$ 38.092.116			$ 4.590.620.755	$ 358.833.672.218	110840 25/11/2021	X		
3	Parcial	ago-21	$ 333.579.546	$ 20.673.810	$ 354.253.356	$ -	$ 354.253.356		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 4.236.367.399	$ 358.479.418.862	118914 18/12/2021	X		
2	Ajustes	jul-21	$ 520.861	$ 2.284	$ 523.145	$ -	$ 523.145		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 4.235.844.254	$ 358.478.895.717	127279 01/03/2022	X		
4	Parcial	sep-21	$ 713.711.394	$ 13.799.722	$ 727.511.116	$ -	$ 727.511.116		(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(12/12/2022)	$ -	$ 357.751.384.601	15560 24/02/2023	X		
3	Ajustes	ago-21	$ 2.763.334	$ 12.116	$ 2.775.450	$ -	$ 2.775.450			$ 4.233.068.804	$ 357.748.609.151	127277 07/03/2022	X		
5	Parcial	oct-21	$ 246.010.585	$ 1.078.662	$ 247.089.247	$ -	$ 247.089.247		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 3.985.979.557	$ 357.501.519.904	18976 01/03/2022	X		
4	Ajustes	sep-21	$ 16.117.547	$ 70.669	$ 16.188.216	$ -	$ 16.188.216			$ 3.969.791.341	$ 357.485.331.688	127281 24/02/2022	X		
1	Anticipo	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.185.885.000	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 1.783.906.341	$ 357.485.331.688	109706 24/11/2021	X		
6	Parcial	nov-21	$ 968.880.492	$ 4.248.168	$ 973.128.660	$ 486.378.007	$ 486.750.653	$ 1.699.506.993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 1.297.155.688	$ 356.512.203.028	125885 28/12/2021	X		
5	Ajustes	oct-21	$ 4.420.226	$ 19.381	$ 4.439.607	$ -	$ 4.439.607	$ 1.699.506.993		$ 1.292.716.081	$ 356.507.763.421	19054 01/03/2022	X		
6	Ajustes Provisional	nov-21	$ 22.581.721	$ 99.012	$ 22.680.733	$ -	$ 22.680.733	$ 1.699.506.993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 1.270.035.348	$ 356.485.082.688	20957 07/03/2022	X		
7	Parcial	dic-21	$ 2.061.141.235	$ 166.324.583	$ 2.227.465.818	$ 1.699.476.993	$ 527.988.825	$ 30.000		$ 742.046.523	$ 354.257.616.870	125896 28/12/2023	X		
7	Ajustes Provisional	dic-21	$ 13.303.929	$ 58.333	$ 13.362.262	$ -	$ 13.362.262	$ 30.000		$ 728.684.261	$ 354.244.254.608	21007 07/03/2022	X		
7	Ajustes	dic-21	$ 1.602.624	$ 7.027	$ 1.609.651	$ -	$ 1.609.651	$ 30.000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha: (05/07/2022)	$ 15.126.390.349	$ 383.065.968.011	141611 12/02/2023	X		
8	Parcial	ene-22	$ 901.929.125	$ 3.954.612	$ 905.883.737	$ 30.000	$ 905.853.737	$ -		$ 7.109.474.953	$ 382.160.084.274	41446 02/05/2022	X		
9	Parcial	feb-22	$ 1.144.639.720	$ 5.018.805	$ 1.149.658.525		$ 1.149.658.525	$ -	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha: (01/02/2022)	$ 5.959.816.428	$ 381.010.425.749	51700 24/05/2022	X		
10	Parcial	mar-22	$ 496.373.075	$ 2.176.405	$ 498.549.480		$ 498.549.480	$ -		$ 5.461.266.948	$ 380.511.876.269	52535 25/5/2022	X		
2	Anticipo	abr-22						$ 4.508.775.371	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 24.314.547.683	$ 380.511.876.269	12834810/02/2022	X		
11	Parcial	abr-22	$ 1.419.520.822	$ 6.224.053	$ 1.425.744.875	$ 298.099.373	$ 1.127.645.502	$ 4.210.675.998	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	$ 4.333.621.446	$ 379.086.131.394	66910 29/06/2022	X		
8	Ajustes Provisional	ene-22	$ 58.964.704	$ 258.538	$ 59.223.242		$ 59.223.242	$ 4.210.675.998	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 28.588.945.887	$ 379.026.908.152	131000 03/12/2022	X		
9	Ajustes Provisional	feb-22	$ 88.985.072	$ 390.165	$ 89.375.237		$ 89.375.237	$ 4.210.675.998		$ 28.499.570.650	$ 378.937.532.915	131001 05/12/2022	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: jul-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

12	Parcial	may-22	$ 1.860.787.403	$ 19.797.107	$ 1.880.584.510	$ 390.765.355	$ 1.489.819.155	$ 3.819.910.643	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	$ 2.843.802.291	$ 377.056.948.405	89194 24/08/2022	X		
13	Parcial	jun-22	$ 437.853.878	$ 2.224.230	$ 440.078.108	$ 92.014.750	$ 348.063.358	$ 3.727.895.893		$ 23.966.484.325	$ 376.616.870.297	94992 08/09/2022	X		
10	Ajustes Provisional	mar-22	$ 42.702.732	$ 187.235	$ 42.889.967		$ 42.889.967	$ 3.727.895.893		$ 23.923.594.358	$ 376.573.980.330	131004 03/12/2022	X		
11	Ajustes Provisional	abr-22	$ 113.376.511	$ 497.112	$ 113.873.623		$ 113.873.623	$ 3.727.895.893	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 23.809.720.735	$ 376.460.106.707	1063421 14/12/2022	X		
14	Parcial	jul-22	$ 1.296.021.421	$ 5.682.555	$ 1.301.703.976	$ 272.164.498	$ 1.029.539.478	$ 3.455.731.395		$ 22.780.181.257	$ 394.430.402.731	103063 29/09/2022	X		
15	Parcial	ago-22	$ 2.212.804.286	$ 18.926.677	$ 2.231.730.963	$ 110.640.214	$ 2.121.090.749	$ 3.345.091.181		$ 20.659.090.508	$ 392.198.671.768	109838 11/10/2022	X		
16	Parcial	sep-22	$ 2.273.657.335	$ 9.969.113	$ 2.283.626.448	$ 26.147.059	$ 2.257.479.389	$ 3.318.944.122		$ 18.401.611.119	$ 389.915.045.320	115403 29/10/2022	X		
17	Parcial	oct-22	$ 2.320.920.585	$ 21.063.962	$ 2.341.984.547	$ 26.690.587	$ 2.315.293.960	$ 3.292.253.535	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021) (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 727.511.116 $ 16.087.490.304	$ 387.573.060.773	130996 05/12/2022	X		
8	Ajustes Definitiva	ene-22	$ 61.550.880	$ 269.877	$ 61.820.757		$ 61.820.757			$ 16.025.669.547	$ 387.511.240.016	142114 27/12/2022	X		
9	Ajustes Definitiva	feb-22	$ 93.085.743	$ 408.145	$ 93.493.888		$ 93.493.888			$ 15.932.175.659	$ 387.417.746.128	142120 27/12/2022	X		
10	Ajustes Definitiva	mar-22	$ 50.152.833	$ 219.901	$ 50.372.734		$ 50.372.734			$ 15.881.802.925	$ 387.367.373.394	142125 27/12/2022	X		
11	Ajustes Definitiva	abr-22	$ 210.628.155	$ 923.523	$ 211.551.678		$ 211.551.678			$ 15.670.251.247	$ 387.155.821.716	142129 27/12/2022	X		
12	Ajustes Definitiva	may-22	$ 418.036.113	$ 1.832.928	$ 419.869.041		$ 419.869.041		(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 15.250.382.206	$ 386.735.952.675	137218 29/12/2022	X		
13	Ajustes Definitiva	jun-22	$ 99.327.588	$ 435.513	$ 99.763.101		$ 99.763.101			$ 15.150.619.105	$ 386.636.189.574			X	
14	Ajustes Definitiva	jul-22	$ 411.799.277	$ 1.805.581	$ 413.604.858		$ 413.604.858			$ 14.737.014.247	$ 386.222.584.716	137464 29/12/2022	X		
15	Ajustes Definitiva	ago-22	$ 689.270.316	$ 3.022.185	$ 692.292.501		$ 692.292.501			$ 14.044.721.746	$ 385.530.292.215	137452 29/12/2022	X		
3	Anticipo							$ 18.558.374.709	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021) (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	$ 8.044.721.746 $ 2.568.015.640	$ 385.530.292.215	112144 08/11/2022	X		
18	Parcial	nov-22	$ 3.078.412.249	$ 13.497.654	$ 3.091.909.903	$ 35.401.741	$ 3.056.508.162	$ 21.815.226.503		$ 4.988.213.584	$ 382.438.382.312	137395 29/12/2022	X		
16	Ajustes Definitiva	sep-22	$ 519.313.870	$ 2.276.992	$ 521.590.862		$ 521.590.862		(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 4.466.622.722	$ 381.916.791.450	137429 29/12/2022	X		
17	Ajustes Definitiva	oct-22	$ 412.986.755	$ 1.810.788	$ 414.797.543		$ 414.797.543			$ 4.051.825.179	$ 381.501.993.907	137425 27/12/2022	X		
18	Ajustes Provisional	nov-22	$ 943.049.453	$ 4.134.909	$ 947.184.362		$ 947.184.362			$ 3.104.640.817	$ 380.554.809.545	137420 29/12/2022	X		
19	Parcial	dic-22	$ 7.276.375.355	$ 41.402.139	$ 7.317.777.494	$ 416.936.308	$ 6.900.841.186	$ 21.398.290.195	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021) (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022) (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(01/02/2022) (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	$ 148.598.479 $ - $ 1.467.019.083	$ 373.237.032.051	142142 27/12/2022	X		
19	Ajustes Provisional	dic-22	$ 2.507.310.935	$ 10.993.594	$ 2.518.304.529		$ 2.518.304.529		(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022) (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 1.191.589 $ 18.219.522.965	$ 370.718.727.522	145010 19/02/2023	X		
20	Parcial	ene-23	$ 2.177.679.024	$ 9.548.285	$ 2.187.227.309	$ 124.781.008	$ 2.062.446.301	$ 21.273.509.187	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 16.157.076.664	$ 368.531.500.213	21590 09/03/2023	X		
	Anticipo 4							$ 5.756.172.974	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 10.400.903.690	$ 368.531.500.213	143093 01/02/2023	X		
21	Parcial	feb-23	$ 4.055.527.522	$ 17.781.928	$ 4.073.309.450	$ 297.270.167	$ 3.776.039.283	$ 26.732.411.994	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 6.624.864.407	$ 364.458.190.763	28010 23/03/2023	X		
22	Parcial	mar-23	$ 3.804.577.283	$ 21.984.897	$ 3.826.562.180	$ 302.080.472	$ 3.524.481.708	$ 26.430.331.522	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 3.100.382.699	$ 360.631.628.583	44790 29/05/2023	X		
20	Ajustes Definitiva N°18, 19 y 20	ene-23	$ 380.013.289	$ 1.666.212	$ 381.679.501		$ 381.679.501		(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 2.718.703.198	$ 360.249.949.082	49886 04/06/2023	X		
21	Ajustes Definitiva	feb-23	$ 755.951.273	$ 3.314.556	$ 759.265.829		$ 759.265.829		(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 1.959.437.369	$ 359.490.683.253	56695 23/06/2023	X		
23	Parcial	abr-23	$ 2.626.394.957	$ 11.515.732	$ 2.637.910.689	$ 210.111.597	$ 2.427.799.092	$ 26.220.219.925	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022) (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	$ - $ 36.561.341.247	$ 356.852.772.564	61051 24/06/2023	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: jul-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

22	Ajustes Definitiva	mar-23	$ 867.870.830	$ 3.805.280	$ 871.676.110		$ 871.676.110		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 35.689.665.137	$ 355.981.096.454	56720 23/06/2023	X		
24	Parcial	may-23	$ 2.716.129.555	$ 34.458.914	$ 2.750.588.469	$ 207.571.459	$ 2.543.017.010	$ 26.012.648.466	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023) (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 33.146.648.127	$ 353.230.507.985	62510 17/07/2023	X		
23	Ajustes Definitiva	abr-23	$ 680.973.214	$ 2.985.806	$ 683.959.020		$ 683.959.020		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 32.462.689.107	$ 352.546.548.965	66748 17/07/2023	X		
24	Ajustes Definitiva	may-23	$ 685.719.156	$ 3.006.615	$ 688.725.771		$ 688.725.771		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 31.773.963.336	$ 351.857.823.194	83210 19/10/2023	X		
25	Parcial	jun-23	$ 2.232.113.986	$ 10.925.155	$ 2.243.039.141	$ 178.078.559	$ 2.064.960.582	$ 25.834.569.907	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 29.709.002.754	$ 349.614.784.053	71891 27/07/2023	X		
26	Parcial	jul-23	$ 4.656.416.288	$ 25.281.151	$ 4.681.697.439	$ 363.390.848	$ 4.318.306.591	$ 25.471.179.059	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 25.390.696.163	$ 344.933.086.614	80679 27/08/2023	X		
27	Parcial	ago-23	$ 5.018.473.853	$ 23.051.728	$ 5.041.525.581	$ 379.828.499	$ 4.661.697.082	$ 25.091.350.560	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022) (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ - $ 20.730.190.670	$ 339.891.561.033	81660 21/09/2023	X		
25	Ajustes Definitiva	jun-23	$ 558.917.400	$ 2.450.638	$ 561.368.038		$ 561.368.038		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 20.168.822.632	$ 339.330.192.995	83212 19/10/2023	X		
26	Ajustes Definitiva	jul-23	$ 1.334.067.751	$ 5.849.374	$ 1.339.917.125		$ 1.339.917.125		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 18.828.905.507	$ 337.990.275.870	83215 20/10/2023	X		
28	Parcial	sep-23	$ 3.101.029.091	$ 13.596.820	$ 3.114.625.911	$ 248.082.327	$ 2.866.543.584	$ 24.843.268.233	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 15.962.361.923	$ 334.875.649.959	83217 23/10/2023	X		
27	Ajustes Definitiva	ago-23	$ 1.134.849.399	$ 4.975.878	$ 1.139.825.277		$ 1.139.825.277		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 14.822.536.646	$ 333.735.824.682	84872 17/11/2023	X		
28	Ajustes Definitiva	sep-23	$ 738.499.072	$ 3.238.034	$ 741.737.106		$ 741.737.106		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 14.080.799.540	$ 332.994.087.576	84876 17/11/2023	X		
29	Parcial	oct-23	$ 6.601.304.839	$ 27.442.626	$ 6.628.747.465	$ 500.707.570	$ 6.128.039.895	$ 24.342.560.663	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 7.952.759.645	$ 326.365.340.111	84868 17/11/2023	X		
29	Ajustes Definitiva	oct-23	$ 1.908.849.388	$ 8.369.570	$ 1.917.218.958		$ 1.917.218.958		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 6.035.540.687	$ 324.448.121.153	86935 06/12/2023	X		
30	Parcial	nov-23	$ 2.718.804.964	$ 10.929.715	$ 2.729.734.679	$ 249.274.196	$ 2.480.460.483	$ 24.093.286.467	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 3.555.080.204	$ 321.718.386.474	87005 07/12/2023	X		
30	Ajustes Provisional	nov-23	$ 740.800.643	$ 3.248.126	$ 744.048.769		$ 744.048.769		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 2.811.031.435	$ 320.974.337.705	87924 16/12/2023	X		
31	Parcial	dic-23	$ 2.208.892.420	$ 9.685.144	$ 2.218.577.564	$ 220.889.242	$ 1.997.688.322	$ 23.872.397.225	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 813.343.113	$ 318.755.760.141	87866 17/12/2023	X		
31	Ajustes Provisional	dic-23	$ 809.792.484	$ 3.550.629	$ 813.343.113		$ 813.343.113		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ -	$ 317.942.417.028	87869 17/12/2023	X		
30	Ajustes Definitiva	nov-23	$ 13.878.201	$ 60.851	$ 13.939.052		$ 13.939.052		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	$ 46.273.189.661	$ 317.928.477.976	1609 26/03/2024	X		
31	Ajustes Definitiva	dic-23	$ 10.489.475	$ 45.992	$ 10.535.467		$ 10.535.467		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	$ 46.262.654.194	$ 317.917.942.509	1850 03/04/2024	X		
32	Parcial	ene-24	$ 7.762.154.189	$ 33.567.223	$ 7.795.721.412	$ 765.568.238	$ 7.030.153.174	$ 23.106.828.987	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024) (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	$ 39.232.501.020	$ 310.122.221.097	1602 03/04/2024	X		
33	Parcial	feb-24	$ 7.707.685.770	$ 252.779.276	$ 7.960.465.046	$ 624.795.446	$ 7.335.669.600	$ 22.482.033.541	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	$ 31.896.831.420	$ 302.161.756.051	1838 06/04/2024	X		
32	Ajustes Definitiva	ene-24	$ 2.329.760.110	$ 10.215.102	$ 2.339.975.212		$ 2.339.975.212			$ 29.556.856.208	$ 299.821.780.839	2053 07/04/2024	X		
34	Parcial	mar-24	$ 4.951.782.058	$ 47.258.760	$ 4.999.040.818	$ 476.493.588	$ 4.522.547.230	$ 22.005.539.953		$ 25.034.308.978	$ 294.822.740.021	3038 24/04/2024	X		
33	Ajustes Definitiva	feb-24	$ 1.794.963.200	$ 7.870.223	$ 1.802.833.423		$ 1.802.833.423			$ 23.231.475.555	$ 293.019.906.598	3890 16/05/2024	X		
34	Ajustes Definitiva	mar-24	$ 1.306.182.169	$ 5.727.106	$ 1.311.909.275		$ 1.311.909.275		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024). (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 21.919.566.280	$ 291.707.997.323	4248 22/05/2024	X		
35	Parcial	abr-24	$ 5.795.416.060	$ 47.824.081	$ 5.843.240.141	$ 567.466.416	$ 5.275.773.725	$ 21.438.073.537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 16.643.792.555	$ 285.864.757.182	5222 05/06/2024	X		
36	Parcial	may-24	$ 5.888.441.545	$ 64.089.957	$ 5.952.531.502	$ 469.448.507	$ 5.483.082.995	$ 20.968.625.030	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 11.160.709.560	$ 279.912.225.680	5937 19/06/2024	X		
37	Parcial	jun-24	$ 6.824.588.311	$ 106.591.268	$ 6.931.179.579	$ 641.154.026	$ 6.290.025.553	$ 20.327.471.004	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 4.870.684.007	$ 272.981.046.101	6467 27/06/2024	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: jul-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÀEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

35	Ajustes Definitiva	abr-24	$ 1.659.772.168	$ 7.277.463	$ 1.667.049.631		$ 1.667.049.631		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 3.203.634.376	$ 271.313.996.470	12011 14/01/2025	X		
38	Parcial	jul-24	$ 684.172.341	$ 2.999.833	$ 687.172.174	$ 68.417.234	$ 618.754.940	$ 20.259.053.770	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 2.584.879.436	$ 270.626.824.296	9544 10/09/2024	X		
39	Parcial	ago-24	$ 890.707.845	$ 74.745.661	$ 965.453.506	$ 334.855.884	$ 630.597.622	$ 19.924.197.886	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 1.954.281.814	$ 269.661.370.790	11641 30/10/2024	X		
40	Parcial	sep-24	$ 687.811.177	$ 3.015.787	$ 690.826.964	$ 68.781.118	$ 622.045.846	$ 19.855.416.768	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 1.332.235.968	$ 268.970.543.826	13943 23/01/2025	X		
41	Parcial	oct-24	$ 410.059.762	$ 35.954.216	$ 446.013.978	$ 22.604.343	$ 423.409.635	$ 19.832.812.425	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 908.826.333	$ 268.524.529.848	16437 22/11/2024	X		
42	Parcial	nov-24	$ 600.262.326	$ 3.282.887	$ 603.545.213	$ 57.805.888	$ 545.739.325	$ 19.775.006.537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024) (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ 801.043.898 $ 13.062.043.110	$ 267.920.984.635	2254 11/04/2025	X		
36	Ajustes Definitiva	may-24	$ 1.444.784.292	$ 6.334.823	$ 1.451.119.115		$ 1.451.119.115		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024) (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ 437.956.890 $ 11.974.011.003	$ 266.469.865.520	19588 17/12/2024	X		
37	Ajustes Definitiva	jun-24	$ 2.497.246.489	$ 10.949.465	$ 2.508.195.954		$ 2.508.195.954		(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(10/12/2024)	$ 9.465.815.049	$ 263.961.669.566	19594 17/12/2024	X		
38	Ajustes Definitiva	jul-24	$ 141.376.036	$ 619.880	$ 141.995.916		$ 141.995.916		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 295.960.974	$ 263.819.673.650	19595 17/12/2024	X		
39	Ajustes Definitiva	ago-24	$ 46.604.099	$ 204.341	$ 46.808.440		$ 46.808.440		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 249.152.534	$ 263.772.865.210	19598 17/12/2024	X		
40	Ajustes Definitiva	sep-24	$ 138.829.823	$ 608.715	$ 139.438.538		$ 139.438.538		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 109.713.996	$ 263.633.426.672	19649 17/12/2024	X		
41	Ajustes Definitiva	oct-24	$ 41.667.954	$ 182.698	$ 41.850.652		$ 41.850.652		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 67.863.344	$ 263.591.576.020	19474 17/12/2024	X		
42	Ajustes Provisional	nov-24	$ 67.567.088	$ 296.256	$ 67.863.344		$ 67.863.344		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ -	$ 263.523.712.676	19484 17/12/2024	X		
43	Parcial	dic-24	$ 7.978.644.186	$ 69.139.547	$ 8.047.783.733	$ 830.907.330	$ 7.216.876.403	$ 18.944.099.207	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024) (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ 2.248.938.646	$ 255.475.928.943	19539 17/12/2024	X		
43	Ajustes Provisional	dic-24	$ 2.239.120.962	$ 9.817.684	$ 2.248.938.646		$ 2.248.938.646		(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ -	$ 253.226.990.297	3007 02/05/2025	X		
42	Ajustes Definitiva	nov-24	$ 404.089	$ 1.772	$ 405.861		$ 405.861		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	$ 40.416.148.594	$ 253.226.584.436	939 07/03/2025	X		
44	Parcial	ene-25	$ 5.200.415.635	$ 23.002.449	$ 5.223.418.084	$ 3.003.936.634	$ 2.219.481.450	$ 15.940.162.573	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	$ 38.196.667.144	$ 248.003.166.352	923 06/03/2025	X		
45	Parcial	feb-25	$ 4.922.000.754	$ 21.581.080	$ 4.943.581.834	$ 2.525.478.587	$ 2.418.103.247	$ 13.414.683.986	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025) (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 35.778.563.897	$ 243.059.584.518	1872 03/04/2025	X		
43	Ajustes Definitiva	dic-24	-$ 1.259.790	-$ 5.523	-$ 1.265.313		-$ 1.265.313		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 35.779.829.210	$ 243.060.849.831	4496 29/05/2025	X		
44	Ajustes Definitiva	ene-25	$ 829.196.445	$ 3.635.707	$ 832.832.152		$ 832.832.152		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 34.946.997.058	$ 242.228.017.679	4496 29/05/2025	X		
45	Ajustes Definitiva	feb-25	$ 1.523.192.610	$ 6.678.614	$ 1.529.871.224		$ 1.529.871.224		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 33.417.125.834	$ 240.698.146.455	3295 07/05/2025	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 **CONTRATISTA:** SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: jul-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

46	Parcial	mar-25	$ 4.931.829.029	$ 45.771.865	$ 4.977.600.894	$ 265.055.701	$ 4.712.545.193	$ 13.149.628.285	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 28.704.580.641	$ 235.720.545.561	3256 07/05/2025	X		
46	Ajustes Definitiva	mar-25	$ 1.880.155.548	$ 8.243.759	$ 1.888.399.307		$ 1.888.399.307		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 26.816.181.334	$ 233.832.146.254	6906 14/07/2025	X		
47	Parcial	abr-25	$ 4.018.402.074	$ 72.004.128	$ 4.090.406.202	$ 200.769.618	$ 3.889.636.584	$ 12.948.858.667	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 22.926.544.750	$ 229.741.740.052	4422 28/05/2025	X		
47	Ajustes Definitiva	abr-25	$ 1.393.858.328	$ 6.111.533	$ 1.399.969.861		$ 1.399.969.861		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 21.526.574.889	$ 228.341.770.191	7117 16/07/2025	X		
48	Parcial	may-25	$ 3.660.802.913	$ 16.051.213	$ 3.676.854.126	$ 206.469.284	$ 3.470.384.842	$ 12.742.389.383	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 18.056.190.047	$ 224.664.916.065	6376 04/07/2025	X		
49	Parcial	jun-25	$ 3.460.473.993	$ 63.794.761	$ 3.524.268.754	$ 178.887.536	$ 3.345.381.218	$ 12.563.501.847	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 14.710.808.829	$ 221.140.647.311	7251 18/07/2025	X		
48	Ajustes Definitiva	may-25	$ 1.135.341.663	$ 4.978.037	$ 1.140.319.700		$ 1.140.319.700		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 13.570.489.129	$ 220.000.327.611	7257 18/07/2025	X		
49	Ajustes Definitiva	jun-25	$ 1.068.470.883	$ 4.684.834	$ 1.073.155.717		$ 1.073.155.717		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 12.497.333.412	$ 218.927.171.894			X	
50	Parcial	jul-25	$ 3.452.100.623	$ 28.685.510	$ 3.480.786.133	$ 193.960.545	$ 3.286.825.588	$ 12.369.541.302	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 9.210.507.824	$ 215.446.385.761			X	
TOTALES			**$ 189.765.395.625**	**$ 1.755.306.002**	**$ 191.520.701.627**	**$ 18.639.666.752**	**$ 172.881.034.875**	**$ 12.369.541.302**		**$ 9.210.507.824**	**$ 215.446.385.761**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 142.829.280.173	$ 626.251.459	**$ 143.455.531.632**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTES	$ 38.939.756.920	$ 170.735.858	**$ 39.110.492.778**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.268.677.959	$ 241.048.812	**$ 1.509.726.771**
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$ 3.242.214.072	$ 616.020.674	**$ 3.858.234.746**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 3.067.921.769	$ 95.062.497	**$ 3.162.984.266**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 415.876.308	$ 5.869.701	**$ 421.746.009**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 1.668.424	$ 317.001	**$ 1.985.425**
VALOR TOTAL	$ 189.765.395.625	$ 1.755.306.002	**$ 191.520.701.627**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se realiza ajuste en informe financiero por glosa en acta parcial de obra N°42 correspondiente al mes de noviembre-24

Firma
Nombre: Inq Hernan Estrella
Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrícula No.: R2024056299

Firma
Nombre: Inq. Julio César Sánchez
Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 11

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN X **ACTUALIZACIÓN** **MODIFICACIÓN** **COMPLEMENTACIÓN** **AJUSTE** **REVISIÓN**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

El concepto de revisión y/o ajustes y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación de estudios y diseños de sectores y sitios críticos y/o atípicos se establece en aras de atender las necesidades que se presentan a lo largo del corredor de la Transversal de Boyacá, objeto del Contrato de Obra Pública No. 973 de 2021, así mismo llevar a cabo la ejecución de estudios y diseños de sectores y sitios críticos y/o atípicos a nivel de Fase III según la Modificación No. 2.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Según la propuesta de pagos sobre el rubro de estudios y diseños entregado por el contratista, se obtiene el siguiente resumen de aprobación:

VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TRAMO APROBADO	PORCENTAJE DE FACTURACIÓN	COMUNICACIÓN ENVIADA	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN	RADICADO INV.
PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6006						
IV	Estudio de Geología para Ingeniería	PC PR37+900	100%	DO-TB-2708-2025	055-2-2721-2025	
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR37+900	100%	DO-TB-2484-2025	055-2-2763-2025	
PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6007						
II	Diseño de Trazado y Diseño Geométrico y Seguridad Vial	PC PR1+230	100%	DO-TB-2838-2025	055-2-2778-2025	
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR1+230	100%	DO-TB-2485-2025	055-2-2762-2025	
VIII	Estudio Hidrológico, Hidráulico y Socavación	PC PR1+230	100%	DO-TB-2694-2025	055-2-2654-2025	

CONTRATO DE OBRA No: 973 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 25 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2029 (Año)

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 **CONTRATO No.** 962 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
973	25/06/2021	99 MESES	$ 358,871,764,334	$ 358,871,764,334
1	22/12/2021		$ 28,823,323,054	$ 387,695,087,388
2	29/08/2022		$ 19,272,000,000	$ 406,967,087,388

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: MODIFICACIÓN No. 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TRAMO APROBADO	FECHA DE APROBACIÓN	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN
		PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6006		
IV	Estudio de Geología para Ingeniería	PC PR37+900	26-jun-25	055-2-2721-2025
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR37+900	16-jul-25	055-2-2763-2025
		PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6007		
II	Diseño de Trazado y Diseño Geométrico y Seguridad Vial	PC PR1+230	21-jul-25	055-2-2778-2025
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR1+230	16-jul-25	055-2-2762-2025
VIII	Estudio Hidrológico, Hidráulico y Socavación	PC PR1+230	14-may-25	055-2-2654-2025

2. Planos.

VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	TRAMO APROBADO	FECHA DE APROBACIÓN	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN
		PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6006		
IV	Estudio de Geología para Ingeniería	PC PR37+900	26-jun-25	055-2-2721-2025
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR37+900	16-jul-25	055-2-2763-2025
		PUNTOS CRÍTICOS RUTA 6007		
II	Diseño de Trazado y Diseño Geométrico y Seguridad Vial	PC PR1+230	21-jul-25	055-2-2778-2025
VII	Estudio de Hidrogeología	PC PR1+230	16-jul-25	055-2-2762-2025
VIII	Estudio Hidrológico, Hidráulico y Socavación	PC PR1+230	14-may-25	055-2-2654-2025

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: **$ 86,866,499**

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.


2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:



Firma:
Nombre: ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
Representante legal o apoderado.
Contratista. SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrícula Profesional No.: 091037-0734114 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:



Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado.
Interventoría. CONSORCIO ECOVISIÓN - 188
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA — CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

RUBRO: ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS — PREACTA ESTUDIOS Y DISEÑOS.: No.11

PRESUPUESTO (PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA SEGÚN MODIFICACIÓN No. 2)
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE MEJORAMIENTO FASE III PUNTO CRÍTICO Y/O ATÍPICO PR37+900 RUTA 6006

No. de Orden	CANT. (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	PRIMA REGIONAL (3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)	TOTAL PRESENTA ACTA		SALDO POR COBRAR	
							CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
1	1	Director de Consultoría	$ 7,500,000	0.00	0.50	$3,750,000	0.30	$2,250,000	0.20	$ 1,500,000
2	1	Profesional SST	$ 3,000,000	0.00	1.00	$3,000,000	0.50	$1,500,000	0.50	$ 1,500,000
3	1	Dibujante	$ 2,500,000	0.00	1.00	$2,500,000	0.50	$1,250,000	0.50	$ 1,250,000
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A)					$9,250,000		$5,000,000		$ 4,250,000
	FACTOR MULTIPLICADOR = (B)					**2.1**		**2.1**		**2.1**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL GRUPO 1 = (A) * (B) = (C)					**$19,425,000**		**$10,500,000**		**$ 8,925,000**
	COSTOS POR VOLÚMENES TÉCNICOS ENTREGABLE									
	CANT. (1)	TITULO DEL VOLUMEN / Subactividades	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	FM (3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
	II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEGURIDAD VIAL					**$2,310,000**		**$0**		**$2,310,000**
4	1	Especialista en diseño geométrico	$ 6,000,000	2.10	0.10	$1,260,000		$0	0.10	$ 1,260,000
5	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.20	$1,050,000		$0	0.20	$ 1,050,000
	IV. ESTUDIO DE GEOLOGÍA					**$9,450,000**		**$9,450,000**		**$0**
6	1	Geólogo	$ 6,000,000	2.10	0.50	$6,300,000	0.50	$6,300,000	0.00	$ -
7	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.60	$3,150,000	0.60	$3,150,000	0.00	$ -
	V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES					**$9,450,000**		**$0**		**$9,450,000**
8	1	Especialista Geotecnia	$ 6,000,000	2.10	0.50	$6,300,000		$0	0.50	$ 6,300,000
9	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.60	$3,150,000		$0	0.60	$ 3,150,000
	VI. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES					**$13,755,000**		**$0**		**$13,755,000**
10	1	Especialista Geotecnia	$ 6,000,000	2.10	0.80	$10,080,000		$0	0.80	$ 10,080,000
11	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.70	$3,675,000		$0	0.70	$ 3,675,000
	VII. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA					**$6,615,000**		**$6,615,000**		**$0**
12	1	Especialista en Hidrogeología	$ 6,000,000	2.10	0.40	$5,040,000	0.40	$ 5,040,000	0.00	$ -
13	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.30	$1,575,000	0.30	$ 1,575,000	0.00	$ -
	VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN					**$14,280,000**		**$0**		**$14,280,000**
14	1	Especialista Hidrología e Hidráulica	$ 6,000,000	2.10	0.80	$10,080,000		$0	0.80	$ 10,080,000
15	1	Especialista junior	$ 2,500,000	2.10	0.80	$4,200,000		$ -	0.80	$ 4,200,000
	X. ESTUDIO ESTRUCTURAS					**$17,430,000**		**$0**		**$17,430,000**
16	1	Especialista en Estructuras	$ 6,000,000	2.10	0.80	$10,080,000		$ -	0.80	$ 10,080,000
17	1	Especialista en Estructuras (junior)	$ 2,500,000	2.10	0.70	$3,675,000		$ -	0.70	$ 3,675,000
18	1	Dibujante	$ 2,500,000	2.10	0.70	$3,675,000		$ -	0.70	$ 3,675,000
	XI. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS					**$2,625,000**		**$0**		**$2,625,000**
19	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.50	$2,625,000		$ -	0.50	$ 2,625,000
	XII. INFORME FINAL EJECUTIVO					**$1,260,000**		**$0**		**$1,260,000**
20	1	Especialista	$ 6,000,000	2.10	0.10	$1,260,000		$ -	0.10	$ 1,260,000
	TOTAL COSTOS DE VOLÚMENES (D)					**$77,175,000**		**$16,065,000**		**$61,110,000**
	OTROS COSTOS DIRECTOS									
	CANT. (8)	CONCEPTO	UNIDAD	($) (9)	UTILIZACIÓN TOTAL (10)	PARCIAL ($) (8) * (9) * (10) = (11)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
	OTROS COSTOS DIRECTOS					**$12,566,171**		**$6,955,668**		**$5,610,503**
21	1	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	und	$ 282,900	9.0	$ 2,546,100	5.00	$1,414,500	4.00	$ 1,131,600
22	1	Viáticos para profesional SST	und	$ 105,000	15.0	$ 1,575,000	3.00	$315,000	12.00	$ 1,260,000
23	1	Levantamiento topográfico (Topografía detallada y topo batimetría)	día	$ 800,000	6.0	$ 4,800,000	4.00	$3,200,000	2.00	$ 1,600,000
24	1	Amarre geodésico (incluye la materialización de dos mojones y georreferenciación de estos)	Par	$ 2,000,000	1.0	$ 2,000,000	1.00	$2,000,000	0.00	$ -
25	1	Edición de Informes Finales (Informe Final, incluye ploteo de planchas original en papel de seguridad y copias en papel bond y archivos en medio magnético)	Glb	$ 1,645,071	1.0	$ 1,645,071	0.02	$26,168	0.98	$ 1,618,903
	INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS					**$47,146,000**		**$9,596,000**		**$37,550,000**
26	1	Movilización de equipos de exploración	Glb	$ 6,000,000	1.0	$ 6,000,000		$0	1.00	$ 6,000,000
27	1	Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	mes	$ 8,500,000	0.7	$ 5,950,000		$0	0.70	$ 5,950,000
28	1	Líneas de refracción sísmica	und	$ 2,200,000	2.0	$ 4,400,000	1.00	$2,200,000	1.00	$ 2,200,000
29	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	m	$ 260,000	24.0	$ 6,240,000		$0	24.00	$ 6,240,000
30	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	m	$ 430,000	36.0	$ 15,480,000		$0	36.00	$ 15,480,000
31	1	Clasificación de suelos	und	$ 140,000	16.0	$ 2,240,000	4.00	$560,000	12.00	$ 1,680,000
32	1	Peso unitario del suelo	und	$ 83,000	10.0	$ 830,000	10.00	$830,000	0.00	$ -
33	1	Compresión inconfinada en Roca con deformación	und	$ 83,000	6.0	$ 498,000	6.00	$498,000	0.00	$ -
34	1	Corte directo CD	und	$ 450,000	4.0	$ 1,800,000	4.00	$1,800,000	0.00	$ -
35	1	Carga Puntual en Roca	und	$ 190,000	6.0	$ 1,140,000	6.00	$1,140,000	0.00	$ -
36	1	Compresión inconfinada en Roca con deformación	und	$ 428,000	6.0	$ 2,568,000	6.00	$2,568,000	0.00	$ -
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS GRUPO 3 = (E)					**$ 59,712,171**		**$ 16,551,668**		**$ 43,160,503**
	COSTO BÁSICO = (C) + (D)+ (E)= (F)					**$ 156,312,171**		**$ 43,116,668**		**$ 113,195,503**
	IVA = 19% * (F) = (G)					**$ 29,699,312**		**$ 8,192,167**		**$ 21,507,146**
	COSTO TOTAL = (F)+(G) + (H)					**$ 186,011,483**		**$ 51,308,835**		**$ 134,702,648**

VALOR ACTA PARCIAL EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

* Estos conceptos corresponden a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
* Se adjunta los soportes de pago correspondientes a la oferta económica, seguridad social, facturas de pago al consultor contratado OFB SAS, comunicados de entrega y comunicados de aprobación de los estudios y diseños a nivel Fase III del punto crítico y/o atípico PC 37+900 de la Ruta 6006.

Firma:
Nombre: Hernán Estrella Maldonado
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 2023049184

Firma:
Nombre: Julio Cesar Sánchez Cadavid
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0520246153 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA 31/07/2025 (Día / Mes / Año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA — CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

RUBRO: ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS — PREACTA ESTUDIOS Y DISEÑOS.: No.11

PRESUPUESTO (PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA SEGÚN MODIFICACIÓN No. 2)
ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PUNTO CRÍTICO Y/O ATÍPICO PR1+230 RUTA 6007

No. de Orden	CANT. (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	PRIMA REGIONAL (3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)	TOTAL ACTAS ANTERIORES		TOTAL PRESENTE ACTA		SALDO POR COBRAR	
							CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
1	1	Director de Consultoría	$ 7,500,000	0.00	0.30	$ 2,250,000	0.20	$ 1,500,000	0.05	$ 375,000	0.05	$ 375,000
2	1	Profesional SST	$ 3,000,000	0.00	0.50	$ 1,500,000	0.20	$ 600,000	0.20	$ 600,000	0.10	$ 300,000
3	1	Dibujante	$ 2,500,000	0.00	0.90	$ 2,250,000	0.20	$ 500,000	0.50	$ 1,250,000	0.20	$ 500,000
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A)					$ 6,000,000		$ 2,600,000		$ 2,225,000		$ 1,175,000
	FACTOR MULTIPLICADOR = (B)					2.1		2.1		2.1		2.1
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL GRUPO 1 = (A) * (B) = (C)					**$ 12,600,000**		**$ 5,460,000**		**$ 4,672,500**		**$ 2,467,500**
	COSTOS POR VOLÚMENES TÉCNICOS ENTREGABLE											
	CANT. (1)	TITULO DEL VOLUMEN / Subactividades	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	FM (3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
	II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEGURIDAD VIAL					**$ 4,095,000**		**$ -**		**$ 4,095,000**		**$ -**
4	1	Especialista en diseño geométrico	$ 6,000,000	2.10	0.20	$ 2,520,000		$ -	0.20	$ 2,520,000	0.00	$ -
5	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.30	$ 1,575,000		$ -	0.30	$ 1,575,000	0.00	$ -
	IV. ESTUDIO DE GEOLOGIA					**$ 10,710,000**		**$ 10,710,000**		**$ -**		**$ -**
6	1	Geólogo	$ 6,000,000	2.10	0.60	$ 7,560,000	0.60	$ 7,560,000		$ -	0.00	$ -
7	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.60	$ 3,150,000	0.60	$ 3,150,000		$ -	0.00	$ -
	V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES					**$ 11,235,000**		**$ 11,235,000**		**$ -**		**$ -**
8	1	Especialista Geotecnia	$ 6,000,000	2.10	0.60	$ 7,560,000	0.60	$ 7,560,000		$ -	0.00	$ -
9	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.70	$ 3,675,000	0.70	$ 3,675,000		$ -	0.00	$ -
	VI. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES					**$ 12,495,000**		**$ 12,495,000**		**$ -**		**$ -**
9	1	Especialista Geotecnia	$ 6,000,000	2.10	0.70	$ 8,820,000	0.70	$ 8,820,000		$ -	0.00	$ -
10	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.70	$ 3,675,000	0.70	$ 3,675,000		$ -	0.00	$ -
	VII. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA					**$ 5,355,000**		**$ -**		**$ 5,355,000**		**$ -**
11	1	Especialista en Hidrogeología	$ 6,000,000	2.10	0.30	$ 3,780,000		$ -	0.30	$ 3,780,000	0.00	$ -
12	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.30	$ 1,575,000		$ -	0.30	$ 1,575,000	0.00	$ -
	VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN					**$ 13,020,000**		**$ -**		**$ 13,020,000**		**$ -**
13	1	Especialista Hidrología e Hidráulica	$ 6,000,000	2.10	0.70	$ 8,820,000		$ -	0.70	$ 8,820,000	0.00	$ -
14	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.80	$ 4,200,000		$ -	0.80	$ 4,200,000	0.00	$ -
	X. ESTUDIO ESTRUCTURAS					**$ 10,710,000**		**$ -**		**$ -**		**$ 10,710,000**
15	1	Especialista en Estructuras	$ 6,000,000	2.10	0.60	$ 7,560,000		$ -		$ -	0.60	$ 7,560,000
16	1	Especialista en Estructuras (junior)	$ 2,500,000	2.10	0.60	$ 3,150,000		$ -		$ -	0.60	$ 3,150,000
	XI. ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS					**$ 2,100,000**		**$ -**		**$ -**		**$ 2,100,000**
17	1	Ing. Apoyo	$ 2,500,000	2.10	0.40	$ 2,100,000		$ -		$ -	0.40	$ 2,100,000
	XII. INFORME FINAL EJECUTIVO					**$ 3,780,000**		**$ -**		**$ -**		**$ 3,780,000**
18	1	Especialista	$ 6,000,000	2.10	0.30	$ 3,780,000		$ -		$ -	0.30	$ 3,780,000
	TOTAL COSTOS DE VOLÚMENES (D)					**$ 73,500,000**		**$ 34,440,000**		**$ 22,470,000**		**$ 16,590,000**
	OTROS COSTOS DIRECTOS											
	CANT. (8)	CONCEPTO	UNIDAD	($) (9)	UTILIZACIÓN TOTAL (10)	PARCIAL ($) (8) * (9) * (10) = (11)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
	OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 9,564,033**		**$ 9,564,033**		**$ -**		**$ -**
19	1	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	und	$ 282,900	9	$ 2,546,100	9	$ 2,546,100		$ -	0.00	$ -
20	1	Viáticos para profesional SST	und	$ 105,000	15	$ 1,575,000	15	$ 1,575,000		$ -	0.00	$ -
21	1	Levantamiento y topografía detallada (Incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	día	$ 800,000	3	$ 2,400,000	3	$ 2,400,000		$ -	0.00	$ -
22	1	Amarre geodésico (incluye la materialización de dos mojones y georreferenciación de estos)	Par	$ 2,000,000	1	$ 2,000,000	1	$ 2,000,000		$ -	0.00	$ -
23	1	Edición de Informes Finales (Informe Final, incluye ploteo de planchas original en papel de seguridad y copias en papel bond y archivos en medio magnético)	Glb	$ 1,042,933	1	$ 1,042,933	1.0	$ 1,042,933		$ -	0.00	$ -
	INVESTIGACIONES GEOTECNICAS					**$ 34,853,000**		**$ 31,576,187**		**$ 2,737,890**		**$ 538,923**
24	1	Movilización de equipos de exploración	Glb	$ 6,000,000	1	$ 6,000,000	0.83	$ 4,962,110	0.17	$ 1,037,890	0.00	$ -
25	1	Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	mes	$ 8,500,000	0.6	$ 5,100,000	0.34	$ 2,861,077	0.20	$ 1,700,000	0.06	$ 538,923
26	1	Líneas de refracción sísmica	und	$ 2,200,000	2	$ 4,400,000	2.00	$ 4,400,000		$ -	0.00	$ -
27	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	m	$ 260,000	16	$ 4,160,000	16.00	$ 4,160,000		$ -	0.00	$ -
28	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	m	$ 430,000	24	$ 10,320,000	24.00	$ 10,320,000		$ -	0.00	$ -
29	1	Clasificación de suelos	und	$ 140,000	11	$ 1,540,000	11.00	$ 1,540,000		$ -	0.00	$ -
30	1	Peso unitario del suelo	und	$ 83,000	6	$ 498,000	6.00	$ 498,000		$ -	0.00	$ -
31	1	Compresión inconfinada en Roca con deformación	und	$ 83,000	3	$ 249,000	3.00	$ 249,000		$ -	0.00	$ -
31	1	Corte directo CD	und	$ 450,000	3	$ 1,350,000	3.00	$ 1,350,000		$ -	0.00	$ -
32	1	Carga Puntual en Roca	und	$ 190,000	2	$ 380,000	2.00	$ 380,000		$ -	0.00	$ -
32	1	Compresión inconfinada en Roca con deformación	und	$ 428,000	2	$ 856,000	2.00	$ 856,000		$ -	0.00	$ -
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS GRUPO 3 = (E)					**$ 44,417,033**		**$ 41,140,220**		**$ 2,737,890**		**$ 538,923**
	COSTO BÁSICO = (C) + (D)+ (E)= (F)					**$ 130,517,033**		**$ 81,040,220**		**$ 29,880,390**		**$ 19,596,423**
	IVA = 19% * (F) = (G)					**$ 24,798,236**		**$ 15,397,642**		**$ 5,677,274**		**$ 3,723,320**
	COSTO TOTAL = (F)+(G) + (H)					**$ 155,315,269**		**$ 96,437,862**		**$ 35,557,664**		**$ 23,319,743**

VALOR ACTA PARCIAL EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

* Estos conceptos corresponden a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
* Se adjunta los soportes de pago correspondientes a la oferta económica, seguridad social, facturas de pago al consultor contratado OFB SAS, comunicados de entrega y comunicados de aprobación de los estudios y diseños a nivel Fase III del Punto Crítico y/o atípico PR1+230 de la Ruta 6007.

Firma:
Nombre: Hernán Estrella Maldonado
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 2023049184

Firma:
Nombre: Julio Cesar Sánchez Cadavid
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0520246153 ANT

Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Actividad Económica 4210 - Tarifa 7.6 x 1000
Resolución DIAN Nº 18764089334756 del 24/02/2025
Habilita Numeración Factura Electrónica Prefijo E21 del 456 al 500 Vencimiento 12 meses

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

NIT: 9008156761

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:	8002158072
DIRECCION:	Calle 25G # 73B-90
CIUDAD:	BOGOTA - BOGOTÁ, D.C. - 11001-11001
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	
CORREO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;
TELÉFONO:	6013811700

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No	E21-475
FECHA DE EMISIÓN:	25/08/2025 17:45:33
EXPEDICIÓN/AUTORIZACIÓN:	25/08/2025 18:00:32
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/09/2025
CONTACTO:	CORREO

CODIGO	CONCEPTOS		VR.TOTAL
SEC0001A	Acta de obra No. 50 Periodo: Julio 2025 (Utilidad)		77,979,313
SEC0001A	Acta de obra No. 50 Periodo: Julio 2025 (Estudios y Diseños)		72,997,058
SEC0002A	Acta de obra No. 50 Periodo: Julio 2025 (Administración No Gravado)		3,301,124,252
Acta de obra No. 50 Periodo: Julio 2025		3,379,103,565	
Valor Total Básico		3,379,103,565	
Costo Directo		2,599,310,435	
A.I.U (30%)		779,793,130	
Utilidad (3%)		77,979,313	
Estudios y diseños		72,997,058	
IVA de la Factura		28,685,510	
IVA 19% sobre 3% de Utilidad		14,816,069	
IVA 19% sobre Estudios y Diseños		13,869,441	
(-) Menos amortización Anticipo (5,74%)		193,960,545	
Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 11		3,286,825,588	

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
MODULO 3

SUBTOTAL	DESCUENTO	BASE GRAVABLE	TIPO IMPUESTO	TASA	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
3,452,100,623		150,976,371	IVA VENTAS Construcción 19%	19.000%	28,685,510	3,480,786,133
		3,301,124,252	IVA VENTAS - Excluido	0.000%	0	

TOTAL FACTURA 3,480,786,133

VALOR A PAGAR: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Condiciones de pago:
Crédito - Cuota No. 1 vence el 24/09/2025 por 3,480,786,133

ANTICIPOS

Id Pago	Valor Anticipo Amortizado	Fecha Pago	Observación	Neto a pagar descontado anticipo
ANTICIPO	193,960,545	21/11/2022	ANTICIPO	3,286,825,588

OBSERVACIONES: #$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

Esta Factura Electrónica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un título valor segun ley 1231 de 17-07-2008

CUFE: 29c45d9d462324ade238177bf788d1253bf6c0767bc945bac39c018033da37e36daa1762df6059efee3627fa7532a2e5
Ej0QUAHA+AGosMUfo/H3RrlmNHpLT3VG25UJ4gu5nF8eDjJzyObnNTEN1ZJWAgiCnHTKiDJJ3Kqxm+goBcCYgIKz/G1vMOgRivz4VFvUlPDo2QPmpyfK5wGvW7

Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Actividad Económica 4210 - Tarifa 7.6 x 1000
Resolución DIAN Nº 18764089334756 del 24/02/2025
Habilita Numeración Factura Electrónica Prefijo E21 del 456 al 500 Vencimiento 12 meses

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
NIT: 9008156761

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:	8002158072
DIRECCION:	Calle 25G # 73B-90
CIUDAD:	BOGOTA - BOGOTÁ, D.C. - 11001-11001
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	
CORREO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;
TELÉFONO:	6013811700

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No	E21-475
FECHA DE EMISIÓN:	25/08/2025 17:45:33
EXPEDICIÓN/AUTORIZACIÓN:	25/08/2025 18:00:32
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/09/2025
CONTACTO:	CORREO

Esta Factura Electrónica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un título valor segun ley 1231 de 17-07-2008

SELLO DIGITAL: 0LUHp4/lbk9pNI5bHBmQCxnGIYADlVUH6wsTymqaMbxAhlIQUGKA1yUlNQPtERv9iB7ROLFFccz+daH1/qtjHZGv+01Eh19jprPaCwJ/WCpwpGv6eFcpxDwZm4/GguimtuLvheMI91WZtl3GhH2BZQ0XrTNkM6h3jIPi1iToznJU7K5av/Pt2SqLALoYtk5peyBWI4iDFxxc4DUxc8qnuOmsCcXA==
