SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401
BOGOTA DC

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.6 * 1000 BOGOTA D.C

CLIENTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**	**FACTURA PROFORMA**	**00107**
NIT:	800.215.807-2	**FECHA DE EMISION:**	11/09/2025
DIRECCION:	CL 25 G 73 B 90		
CIUDAD:	Bogotá DC	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	
Teléfono:	6017056142		
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ldiazp@invias.gov.co	COD PCI: **#$24-02-00;Contrato 973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$**	

CONCEPTO		VALOR
Acta de obra No. 51 Periodo: Agosto 2025	3.940.108.063,00	**3.940.108.063,00**
Valor Total Básico	**3.940.108.063,00**	
Costo Directo	3.030.852.356,15	
A.I.U (30%)	909.255.706,85	
Utilidad (3%)	90.925.570,68	
		-
IVA de la Factura		**17.275.858**
IVA 19% sobre 3% de Utilidad	17.275.858,00	
(-) Menos amortización Anticipo (5,77%)	(227.344.235,00)	**(227.344.235,00)**
Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 11	3.730.039.686,00	

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3

VALOR EN LETRAS: **Tres Mil Setecientos Treinta Millones Treinta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/Cte**

SUBTOTAL	3.712.763.828,00
IVA	17.275.858,00
TOTAL	**3.730.039.686,00**

	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
	Identificación:	Identificación:
	FECHA:	FECHA:
_____	_____	_____
FIRMA EMISOR	FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO	FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 10 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 51 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.940.109.063,00 **MES** ago-2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 358.871.784.334,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 48.095.323.054,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 406.967.087.388,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12		Última Acta de de fecha Mayo 2025		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES												
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2	$ 1.816.892	$ 3.633.784,00	2,00	$ 3.633.784,00		$ -			$ -	
2	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95	$ 1.187.326	$ 112.795.970,00		$ -		$ -			$ -	
2.1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.187.326	$ -	93,00	$ 110.421.318,00		$ -			$ -	
2.2	1-11701	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.187.326	$ -	2,00	$ 2.374.652,00		$ -			$ -	
3	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	530	$ 113.989	$ 60.414.170,00	106,00	$ 12.082.834,00		$ -	106,00	$ 12.082.834,00		
3.1	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.989	$ -	3.732,00	$ 425.406.948,00		$ -	3.170,90	$ 361.447.720,00		
3.2	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113.989	$ -	30,00	$ 3.419.670,00		$ -	6,00	$ 683.934,00		
4	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	751	$ 69.636	$ 52.296.636,00	751,00	$ 52.296.636,00		$ -	263,00	$ 18.314.268,00		
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	4269	$ 4.475	$ 19.103.775,00		$ -		$ -			$ -	
5.1	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475	$ -	6.603,00	$ 29.548.425,00		$ -	6.550,00	$ 29.311.250,00		
5.2	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4.475	$ -	570,00	$ 2.550.750,00		$ -		$ -		
6	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240381	$ 60.000	$ 14.422.860.000,00	73.069,00	$ 4.384.140.000,00	2.361,00	$ 141.660.000,00	52.796,10	$ 3.167.766.000,00		
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2183358	$ 10.642	$ 23.235.295.836,00		$ -		$ -			$ -	
7.1	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.642	$ -	410.046,70	$ 4.363.716.981,00	8.848,40	$ 94.164.673,00	172.987,90	$ 1.840.937.234,00		
7.2	1-11701	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.642	$ -	10.268,00	$ 109.272.056,00		$ -		$ -		
8	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	683232	$ 9.747	$ 6.659.462.304,00	683.232,00	$ 6.659.462.304,00	518,00	$ 5.048.946,00	349.537,00	$ 3.406.937.139,00		
9	1	220.1		Terraplenes	m3	58850	$ 13.119	$ 772.053.150,00		$ -		$ -			$ -	
9.1	1-11601	220.1		Terraplenes	m3		$ 13.119	$ -	20.381,00	$ 267.378.339,00		$ -	11.011,60	$ 144.461.180,00		
9.2	1-11701	220.1		Terraplenes	m3		$ 13.119	$ -	12.469,00	$ 163.580.811,00		$ -		$ -		
10	1-11601	221-13		Pedraplen compacto	m3	2625	$ 18.609	$ 48.848.625,00	34.125,00	$ 635.032.125,00	883,00	$ 16.431.747,00	21.483,00	$ 399.777.147,00		
11	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59655	$ 10.393	$ 619.994.415,00	2.287,00	$ 23.768.791,00		$ -	2.287,00	$ 23.768.791,00		
11.1	1-11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		$ 10.393	$ -	69.383,00	$ 721.097.519,00		$ -	28.985,40	$ 301.245.264,00		
12	1-11601	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	730752	$ 1.332	$ 973.361.664,00	730.752,00	$ 973.361.664,00		$ -		$ -		
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												
13	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	375760	$ 927	$ 348.329.520,00	424.154,00	$ 393.190.758,00		$ -	424.154,00	$ 393.190.758,00		
13.1	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927	$ -	2.940.086,00	$ 2.725.459.722,00	80.555,60	$ 74.675.041,00	1.185.503,50	$ 1.098.961.747,00		
14	2-11602	311-13		Afirmado	m3	70266	$ 132.094	$ 9.281.717.004,00	201.266,00	$ 26.586.031.004,00	6.705,00	$ 885.690.270,00	134.697,90	$ 17.792.784.403,00		
15	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174216	$ 180.000	$ 31.358.880.000,00		$ -		$ -			$ -	
15.1	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180.000	$ -	202.635,00	$ 36.474.300.000,00	153,80	$ 27.684.000,00	49.376,40	$ 8.887.752.000,00		
15.2	2-11703	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180.000	$ -	4.496,00	$ 809.280.000,00		$ -		$ -		
16	2	330-13		Base granular clase A	m3	97790	$ 206.690	$ 20.212.215.100,00		$ -		$ -			$ -	
16.1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 206.690	$ -	128.534,00	$ 26.566.692.460,00	380,30	$ 78.604.207,00	33.393,40	$ 6.902.081.846,00		
16.2	2-11703	330-13		Base granular clase A	m3		$ 206.690	$ -	1.528,00	$ 315.822.320,00		$ -		$ -		
17	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21000	$ 222.076	$ 4.663.596.000,00	21.000,00	$ 4.663.596.000,00		$ -	584,30	$ 129.759.007,00		
				PAVIMENTOS ASFALTICOS												
18	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642636	$ 2.918	$ 1.875.211.848,00		$ -		$ -			$ -	
18.1	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.918	$ -	757.438,00	$ 2.210.204.084,00	8.651,00	$ 25.243.618,00	288.194,00	$ 840.950.092,00		
18.2	7-11703	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.918	$ -	6.111,00	$ 17.831.898,00		$ -		$ -		
19	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432950	$ 1.849	$ 800.524.550,00		$ -		$ -			$ -	
19.1	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849	$ -	530.904,00	$ 981.641.496,00	12.010,00	$ 22.206.490,00	142.753,00	$ 263.950.297,00		
19.2	7-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.849	$ -	6.111,00	$ 11.299.239,00		$ -		$ -		
20	7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25977	$ 863.363	$ 22.427.580.651,00		$ -		$ -			$ -	
20.1	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 863.363	$ -	4.730,10	$ 4.083.793.326,00		$ -			$ -	
20.2	7-11703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 863.363	$ -	611,00	$ 527.514.793,00		$ -			$ -	
21	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	25977	$ 879.613	$ 22.849.706.901,00		$ -		$ -			$ -	
21.1	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 879.613	$ -	36.251,00	$ 31.886.850.863,00	1.412,60	$ 1.242.541.324,00	22.027,00	$ 19.375.235.551,00		
21.2	7-11703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 879.613	$ -	458,30	$ 403.126.638,00		$ -			$ -	
22	7		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7350	$ 908.124	$ 6.674.711.400,00	1.602,90	$ 1.455.631.960,00		$ -	1.602,90	$ 1.455.631.960,00		
22.1	7-11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 908.124	$ -	42.947,10	$ 39.001.292.240,00	607,80	$ 551.957.767,00	35.784,20	$ 32.496.490.841,00		
22.2	7-11703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 908.124	$ -	2.231,10	$ 2.026.115.456,00		$ -	2.231,10	$ 2.026.115.457,00		
23	7		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	14600	$ 72.822	$ 1.063.201.200,00	1.477,00	$ 107.558.094,00		$ -	1.477,00	$ 107.558.094,00		
23.1	7-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	120	$ 72.822	$ -	50.386,00	$ 3.669.209.292,00		$ -	39.145,00	$ 2.850.617.190,00		
23.2	7-11703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72.822	$ -	1.807,00	$ 131.589.354,00		$ -	1.807,00	$ 131.589.354,00		
24	7-11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	18250	$ 78.894	$ 1.439.815.500,00	33.250,00	$ 2.623.225.500,00		$ -	29.765,10	$ 2.348.287.799,00		
25	7	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	15000	$ 4.342	$ 65.130.000,00		$ -		$ -			$ -	
25.1	7-11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.342	$ -	14.550,00	$ 63.176.100,00		$ -			$ -	
25.2	7-11703	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.342	$ -	450,00	$ 1.953.900,00		$ -			$ -	
				PAVIMENTOS DE CONCRETO												
26	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	35	$ 783.524	$ 27.423.340,00	61,00	$ 47.794.964,00		$ -	20,60	$ 16.140.594,00		
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
27	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	208626	$ 30.000	$ 6.258.780.000,00		$ -		$ -			$ -	
27.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30.000	$ -	177.799,70	$ 5.333.991.000,00	320,20	$ 9.606.000,00	39.724,00	$ 1.191.720.000,00		
27.2	5-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30.000	$ -	66,00	$ 1.980.000,00		$ -		$ -		
28	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	132210	$ 32.000	$ 4.230.720.000,00	98.790,00	$ 3.161.280.000,00	3,20	$ 102.400,00	5.599,10	$ 179.171.200,00		
29	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	$ 25.958	$ 3.893.700,00	3.417,00	$ 88.698.486,00		$ -		$ -		
30	5-11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120	$ 65.247	$ 7.829.640,00	713,00	$ 46.521.111,00		$ -	52,60	$ 3.431.992,00		
31	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	17520	$ 44.832	$ 785.456.640,00		$ -		$ -			$ -	
31.1	5-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44.832	$ -	16.698,00	$ 748.604.736,00	319,60	$ 14.328.307,00	6.967,80	$ 312.380.407,00		
31.2	5-11705	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44.832	$ -	822,00	$ 36.851.904,00		$ -		$ -		
32	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	52356	$ 65.112	$ 3.409.003.872,00	61.356,00	$ 3.995.011.872,00	24,60	$ 1.601.755,00	14.995,90	$ 976.413.038,00		
33	5-14101		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40	$ 2.233.592	$ 89.343.680,00	1.971,00	$ 4.402.409.832,00		$ -	1.221,60	$ 2.728.555.987,00		
34	5-11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3764	$ 368.509	$ 1.387.067.876,00	3.764,00	$ 1.387.067.876,00	325,00	$ 119.765.425,00	325,00	$ 119.765.425,00		
35	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4709	$ 1.254.085	$ 5.905.486.265,00	4.709,00	$ 5.905.486.265,00		$ -			$ -	
36	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4792	$ 871.252	$ 4.175.039.584,00		$ -		$ -			$ -	
36.1	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252	$ -	1.200,00	$ 1.045.502.400,00	1,90	$ 1.655.379,00	575,30	$ 501.231.273,00		
36.2	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252	$ -	4.730,00	$ 4.121.021.960,00	85,80	$ 74.753.422,00	2.026,50	$ 1.765.592.178,00		
36.3	5-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252	$ -	14,00	$ 12.197.528,00		$ -		$ -		
37	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2354	$ 1.033.388	$ 2.432.595.352,00	3.354,00	$ 3.465.983.352,00	36,30	$ 37.511.984,00	2.298,20	$ 2.374.932.300,00		
38	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411	$ 1.127.087	$ 463.232.757,00	411,00	$ 463.232.757,00		$ -			$ -	
39	6-14103		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	1412	$ 1.184.864	$ 1.673.027.968,00	1.412,00	$ 1.673.027.968,00		$ -			$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	4

FECHA: 10 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ | **ACTA No.** 51 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.940.109.063,00 | **MES** ago-2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188

PLAZO INICIAL: 932 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 358.871.764.334,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 48.095.323.054,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 406.967.087.388,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12	Última Acta de de fecha Mayo 2025	OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
40	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5444	$ 721.775	$ 3.929.343.100,00	5.444,00	$ 3.929.343.100,00	4,70	$ 3.392.343,00	229,70	$ 165.791.722,00
41	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas anciadas (f'c = 21 Mpa)	m3	5382	$ 972.051	$ 5.231.578.482,00	5.382,00	$ 5.231.578.482,00		$ -	117,40	$ 114.118.787,00
42	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1539	$ 539.260	$ 829.921.140,00		$ -		$ -		$ -
42.1	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260	$ -	1.509,00	$ 813.743.340,00	6,60	$ 3.559.116,00	872,00	$ 470.234.720,00
42.2	5-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260	$ -	16,00	$ 8.628.160,00		$ -		$ -
42.3	5-14101	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260	$ -	56,00	$ 30.198.560,00		$ -	3,00	$ 1.617.780,00
43	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1137	$ 485.168	$ 551.636.016,00	2.361,10	$ 1.145.530.165,00	236,90	$ 114.936.299,00	1.479,20	$ 717.660.504,00
44	4-14104		632.1P	Baranda Metálica	m	2915	$ 545.130	$ 1.589.053.950,00	2.915,00	$ 1.589.053.950,00		$ -		$ -
45	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2611800	$ 5.378	$ 14.046.260.400,00		$ -		$ -		$ -
45.1	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378	$ -	1.762.203,00	$ 9.477.127.734,00	10.931,00	$ 58.786.918,00	798.028,00	$ 4.291.794.984,00
45.2	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378	$ -	1.569,00	$ 8.438.082,00		$ -	1.127,00	$ 6.061.006,00
45.3	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378	$ -	891.348,00	$ 4.793.669.544,00		$ -	1.840,00	$ 9.895.520,00
46	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	256153	$ 5.483	$ 1.404.486.899,00		$ -		$ -		$ -
46.1	4-11604	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5.483	$ -	253.724,00	$ 1.391.168.692,00		$ -	9.898,00	$ 54.270.734,00
46.2	4-11705	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5.483	$ -	2.429,00	$ 13.318.207,00		$ -		$ -
47	4-11606	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	2143171	$ 2.237	$ 4.794.273.527,00	2.143.171,00	$ 4.794.273.527,00		$ -		$ -
48	5-14103	642-13		Apoyo elastómero	u	243	$ 2.720.318	$ 661.037.274,00	243,00	$ 661.037.274,00		$ -		$ -
49	5-14103		642.3P	Junta FREYSINET M80 o similar	m	871	$ 2.799.200	$ 2.438.103.200,00	871,00	$ 2.438.103.200,00		$ -		$ -
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1035	$ 628.687	$ 650.691.045,00	14,00	$ 8.801.618,00		$ -	14,00	$ 8.801.618,00
50.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628.687	$ -	1.375,00	$ 864.444.625,00		$ -	535,30	$ 336.536.151,00
50.2	5-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628.687	$ -	16,00	$ 10.058.992,00		$ -		$ -
51	5-11604		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	58240	$ 66.621	$ 3.880.007.040,00	60.740,00	$ 4.046.559.540,00		$ -		$ -
52	5		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83952	$ 38.113	$ 3.199.662.576,00		$ -		$ -		$ -
52.1	5-11604		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38.113	$ -	88.375,00	$ 3.368.236.375,00	126,30	$ 4.813.672,00	18.299,20	$ 697.437.411,00
52.2	5-11705		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38.113	$ -	1.527,00	$ 58.198.551,00		$ -		$ -
53	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3	5784	$ 666.880	$ 3.857.233.920,00		$ -		$ -		$ -
53.1	5-11604		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3		$ 666.880	$ -	10.014,30	$ 6.678.336.384,00	53,40	$ 35.611.392,00	4.733,00	$ 3.156.343.040,00
53.2	5-11705		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f´c 21 Mpa)	m3		$ 666.880	$ -	160,00	$ 106.700.800,00		$ -	62,00	$ 41.346.560,00
54	5-11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1400	$ 90.059	$ 126.082.600,00	10.525,00	$ 947.870.975,00		$ -	112,40	$ 10.122.632,00
55	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	482587	$ 5.200	$ 2.509.452.400,00		$ -		$ -		$ -
55.1	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 5.200	$ -	525.476,00	$ 2.732.475.200,00	2.010,00	$ 10.452.000,00	198.348,00	$ 1.031.409.600,00
55.2	7-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 5.200	$ -	18.852,00	$ 98.030.400,00		$ -		$ -
56	5	673-13		Material granular drenante	m3	51808	$ 152.050	$ 7.877.406.400,00		$ -		$ -		$ -
56.1	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152.050	$ -	42.293,20	$ 6.430.681.060,00	306,00	$ 46.527.300,00	11.725,00	$ 1.782.786.250,00
56.2	5-11705	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152.050	$ -	1.837,00	$ 279.315.850,00		$ -		$ -
57	5-11604	673-13		Material de apertura tipo SBG	m3	21350	$ 150.000	$ 3.202.500.000,00	22.628,30	$ 3.394.245.000,00	2,50	$ 375.000,00	7.005,60	$ 1.050.840.000,00
58	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	5157	$ 173.904	$ 896.822.928,00	6.232,00	$ 1.083.769.728,00	100,00	$ 17.390.400,00	6.186,10	$ 1.075.787.535,00
59	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1250	$ 265.893	$ 332.366.250,00	1.750,00	$ 465.312.750,00		$ -	1.748,00	$ 464.780.964,00
										$ -				
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						$ -				
60	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111199	$ 1.794	$ 199.491.006,00	305.221,90	$ 547.568.089,00		$ -	305.221,90	$ 547.568.088,00
60.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794	$ -	1.884.104,10	$ 3.380.082.755,00	50.759,00	$ 91.061.646,00	822.257,10	$ 1.475.129.238,00
60.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.794	$ -	3.275,00	$ 5.875.350,00		$ -		$ -
61	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487	$ 22.076	$ 10.751.012,00		$ -		$ -		$ -
61.1	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076	$ -	8.113,00	$ 179.102.651,00	522,90	$ 11.543.540,00	4.595,20	$ 101.443.635,00
61.2	7-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.076	$ -	41,00	$ 905.053,00		$ -		$ -
62	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11798	$ 8.346	$ 98.466.108,00	17.541,00	$ 146.397.186,00	1.646,00	$ 13.737.516,00	1.646,00	$ 13.737.516,00
63	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513	$ 399.581	$ 204.985.053,00		$ -		$ -		$ -
63.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399.581	$ -	577,00	$ 230.558.237,00		$ -	116,00	$ 46.351.396,00
63.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399.581	$ -	12,00	$ 4.794.972,00		$ -		$ -
64	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	471	$ 327.606	$ 154.302.426,00	593,00	$ 194.270.358,00		$ -		$ -
65	4	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	5	$ 559.793	$ 2.798.965,00		$ -		$ -		$ -
65.1	4-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559.793	$ -	36,00	$ 20.152.548,00		$ -		$ -
65.2	4-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559.793	$ -	2,00	$ 1.119.586,00		$ -		$ -
66	4-11607	730-13		Defensa metálica	m	4245	$ 230.532	$ 978.608.340,00	7.031,00	$ 1.620.870.492,00		$ -	527,10	$ 121.513.418,00
67	4-11607	730-13		Sección final	u	319	$ 103.189	$ 32.917.291,00	331,00	$ 34.155.559,00		$ -		$ -
68	4-11607	740-13		Captafaros	u	328	$ 22.031	$ 7.226.168,00	2.281,00	$ 50.252.711,00		$ -	138,00	$ 3.040.278,00
				OBRAS VARIAS										
69	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700	$ 17.838	$ 12.486.600,00	8.200,00	$ 146.271.600,00		$ -	2.325,00	$ 41.473.350,00
70	5	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4332	$ 34.235	$ 148.306.020,00		$ -		$ -		$ -
70.1	5-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34.235	$ -	15.234,00	$ 521.535.990,00		$ -	15.229,00	$ 521.364.815,00
70.2	5-11704	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34.235	$ -	570,00	$ 19.513.950,00		$ -	570,00	$ 19.513.950,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4

FECHA: 10 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ | **ACTA No.** 51 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.940.108.063,00 | **MES** ago-2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE – CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 358.871.764.334,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 48.095.323.054,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 406.967.087.388,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12		Última Acta de de fecha Mayo 2025		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				TRANSPORTES												
71	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	29933177	$ 1.100	$ 32.926.494.700,00		$ -		$ -		$ -		$ -
71.1	3-11608			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.100	$ -	8.286.584,40	$ 9.115.242.840,00	75.528,00	$ 83.080.800,00	1.329.657,20	$ 1.462.622.920,00		
71.2	3-11701			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.100	$ -	10.278,00	$ 11.305.800,00		$ -		$ -		$ -
72	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	6832314	$ 1.100	$ 7.515.545.400,00	280.416,00	$ 308.457.600,00		$ -	280.416,00	$ 308.457.600,00		
72.1	3-11608			Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.100	$ -	6.573.438,00	$ 7.230.781.800,00	7.789,90	$ 8.568.890,00	2.783.083,70	$ 3.061.392.070,00		
															$ -	$ -
				OBRAS NO PREVISTAS											$ -	$ -
73	650.3P		650.3P	Transporte de estructura metálica	Kg		$ 361	$ -	210.403,00	$ 75.955.483,00		$ -	65.635,90	$ 23.694.560,00		
74	650.4P		650.4P	Montaje de Estructura Metálica Puente Modular	Kg		$ 3.717	$ -	257.400,00	$ 956.755.800,00		$ -	112.632,50	$ 418.655.003,00		
75	730.1.3P		730.1.3P	Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m	m		$ 665.869	$ -	122,40	$ 81.502.366,00		$ -	122,40	$ 81.502.366,00		
76	730.2.1P		730.2.1P	Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, poste y espaciador para canal)	m		$ 752.076	$ -	250,00	$ 188.019.000,00		$ -	8,10	$ 6.091.816,00		
77	8.5P		8.5P	Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 624.680	$ -	513,00	$ 320.460.840,00		$ -	3,00	$ 1.874.040,00		
78	8.6P		8.6P	Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80.293	$ -	216,00	$ 17.343.288,00		$ -	216,00	$ 17.343.288,00		
79	8.7P		8.7P	Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla	u		$ 107.058	$ -	24,00	$ 2.569.392,00		$ -	24,00	$ 2.569.392,00		
80	8.8P		8.8P	Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80.293	$ -	50,00	$ 4.014.650,00		$ -	50,00	$ 4.014.650,00		
81	900.2.1P		900.2.1P	Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición	m3/km		$ 1.410	$ -	2.161.238,60	$ 3.047.346.426,00		$ -	1.783.105,70	$ 2.514.179.037,00		
82	233.1	233-13		Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2		$ 12.601	$ -	318.327,80	$ 4.011.248.608,00	876,00	$ 11.038.476,00	178.350,00	$ 2.247.388.350,00		
83	464.1.1	464-13		Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - Incluye riego de liga CRR-1	m2		$ 13.288	$ -	116.435,00	$ 1.547.188.280,00		$ -	46.806,00	$ 621.958.128,00		
84	672,4	672-13		Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m		$ 77.169	$ -	2.996,00	$ 231.198.324,00		$ -	1.481,50	$ 114.325.874,00		
85	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		$ 1.057	$ -	399.331,70	$ 422.093.607,00		$ -	286.763,10	$ 303.108.597,00		
86	662 2P		662 2P	Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).	m		$ 1.098.470	$ -	168,00	$ 184.542.960,00		$ -	136,90	$ 150.380.543,00		
87	8P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 0.75m con lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo XI).	u		$ 1.298.836	$ -	152,00	$ 197.423.072,00		$ -	57,00	$ 74.033.652,00		
				Ajustes al peso						$ 1,00					$ (3,00)	

SUB TOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 305.189.938.913,00		$ 344.570.723.204,00	$ 3.940.108.063,00	$ 146.769.388.236,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 41.440.096.041,00		$ 45.484.162.571,00		$ 40.022.599.705,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 1.080.000.000,00		$ 1.080.000.000,00		$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 347.710.034.954,00		$ 391.134.885.775,00	$ 3.940.108.063,00	$ 186.791.987.941,00
VALOR IVA (%IRA) (E)	$ 1.524.574.769,00		$ 1.714.976.038,00	$ 17.275.858,00	$ 819.011.024,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	$ 349.234.609.723,00		$ 392.849.861.814,00	$ 3.957.383.921,00	$ 187.610.998.965,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1.281.000.000,00		$ 1.281.000.000,00	$ -	$ 1.268.677.959,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 243.390.000,00		$ 243.390.000,00	$ -	$ 241.048.812,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	$ 1.524.390.000,00		$ 1.524.390.000,00	$ -	$ 1.509.726.771,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (L)	$ -		$ 3.764.765.515,00		$ 3.242.214.072,00
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (M)	$ -		$ 715.305.448,00	$ -	$ 616.020.674,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (N)	$ -		**$ 4.480.070.963,00**	$ -	$ 3.858.234.746,00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	$ 7.772.764.611,00		$ 7.772.764.611,00	$ -	$ 3.584.730.275,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 340.000.000,00		$ 340.000.000,00		$ 1.985.425,00
VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)	**$ 358.871.764.334,00**		**$ 406.967.087.388,00**	**$ 3.957.383.921,00**	**$ 196.565.676.182,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 3 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 31.009.208.054,00	7,60%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 227.344.235,00	5,77%
Valor Amortizado Acumulado	$ 18.867.010.987,00	60,84%
Valor Saldo por Amortizar	$ 12.142.197.067,00	39,16%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3.940.108.063,00	$ 17.275.858,00	$ 3.957.383.921,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS Y/O ATÍPICOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 3.940.108.063,00	$ 17.275.858,00	$ 3.957.383.921,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 268.343.842,00	$ 11.954.121.111,00
SB	$ 27.684.000,00	$ 8.887.752.000,00
B	$ 1.038.969.518,00	$ 26.316.777.761,00
P	$ 1.841.949.199,00	$ 62.534.525.357,00
OA	$ 555.169.112,00	$ 26.347.886.898,00
SCT	$ 116.342.702,00	$ 2.496.212.773,00
OV	$ -	$ 582.352.115,00
T	$ 91.649.690,00	$ 7.649.760.224,00
TOTAL	$ 3.940.108.063,00	$ 146.769.388.239,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Preliminares y explanación	$ 257.305.366,00	$ 9.706.048.827,00
2. Afirmados, subbases y bases	$ 1.077.691.994,00	$ 37.451.918.111,00
3. Pavimentos asfalticos / concreto	$ 1.841.949.199,00	$ 60.376.820.546,00
4. Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 305.747.881,00	$ 17.088.757.419,00
5. Obras de urbanismo	$ -	$ -
6. Obras geotécnicas y miligación ambiental	$ 211.909.247,00	$ 4.102.883.054,00
7. Señalización y control de transito	$ 116.342.702,00	$ 2.496.212.773,00
8. Transporte y sobre acarreos	$ 91.649.690,00	$ 7.649.760.224,00
TOTAL	$ 3.902.596.079,00	$ 138.872.400.954,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 10 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 51 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.940.108.063,00 **MES** ago-2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 973 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 358.871.784.334,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 48.095.323.054,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.967.087.388,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 12		Última Acta de fecha Mayo 2025		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vías Urbanas

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanación	$ -	$ 683.934,00
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base	$ -	$ -
3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases	$ -	$ 2.157.704.811,00
4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público	$ -	$ 19.513.950,00
5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito	$ -	$ 161.733.440,00
6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra	$ -	$ -
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal	$ -	$ -
8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal	$ -	$ -
9. Estabilización de terreno	$ -	$ -
10. Señalización vertical y horizontal	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ 2.339.636.135,00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Preliminares y cimentación	$ -	$ 2.730.173.767,00
2. Subestructura y cimentación	$ 37.511.984,00	$ 2.374.932.300,00
3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 452.245.083,00
4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -
5. Drenajes	$ -	$ -
TOTAL	$ 37.511.984,00	$ 5.557.351.150,00

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 257.305.366,00	$ 9.706.732.761,00
2 Sub-bases y bases	$ 1.066.653.518,00	$ 35.204.529.761,00
3 Transporte de materiales	$ 91.649.690,00	$ 7.673.454.784,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 58.786.918,00	$ 5.025.615.591,00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 462.155.726,00	$ 18.747.786.036,00
6 Concreto para estructura de puentes	$ 37.511.984,00	$ 2.376.550.080,00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 1.966.044.861,00	$ 68.034.719.226,00
TOTAL	$ 3.940.108.063,00	$ 146.769.388.239,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.940.108.063,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.712.763.628,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.730.039.686,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Tres Mil Setecientos Treinta Millones Treinta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMÓN VELASTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrícula Profesional No.: 091037-0734114 CND

Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 51

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021 **CONTRATO INTERVENTORIA** 962 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE – CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"".

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA **INTERVENTORIA:** CONSORCIO ECOVISIÓN+ 184

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA : $ 406,367,867,388.00

SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 12 Mayo 2023 Acta de fecha		CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		% EJECUTADO
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES																	
1	200.1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	2,00	$ 1,816,892.00	$ 3,633,784.00	2.00	$ 3,633,784	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	95,00	$ 1,187,326.00	$ 112,795,970.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
2,1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1,187,326.00	$ 0.00	93.00	$ 110,421,318	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
2,2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1,187,326.00	$ 0.00	2.00	$ 2,374,652	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	530,00	$ 113,989.00	$ 60,414,170.00	106.00	$ 12,082,834	106.00	$ 12,082,834		$ -	106.00	$ 12,082,834	100.00%
3,1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113,989.00	$ 0.00	3,730.00	$ 425,106,946	3,170.90	$ 361,447,726		$ -	3170.90	$ 361,447,726	84.97%
3,2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113,989.00	$ 0.00	30.00	$ 3,419,670	6.00	$ 683,934		$ -	6.00	$ 683,934	20.00%
4	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	751,00	$ 69,636.00	$ 52,296,636.00	751.00	$ 52,296,636	263.00	$ 18,314,268		$ -	263.00	$ 18,314,268	35.02%
5	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	4,269,00	$ 4,475.00	$ 19,103,775.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
5,1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4,475.00	$ 0.00	6,603.00	$ 29,548,425	6,550.00	$ 29,311,250		$ -	6550.00	$ 29,311,250	99.20%
5,2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		$ 4,475.00	$ 0.00	570.00	$ 2,550,750	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
6	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	240,381,00	$ 60,000.00	$ 14,422,860,000.00	72,069.00	$ 4,324,140,000	50,435.10	$ 3,026,106,000	2,761.00	$ 141,660,000	52796.10	$ 3,167,766,000	73.26%
7	210.2.2	210-13		Excavaciones en material comun de la Explanación y Canales	m3	2,183,356,00	$ 10,642.00	$ 23,235,295,836.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
7,1	210.2.2	210-13		Excavaciones en material comun de la Explanación y Canales	m3		$ 10,642.00	$ 0.00	410,046.70	$ 4,363,716,981	164,139.50	$ 1,746,772,559	8,848.40	$ 94,164,677	172987.90	$ 1,840,937,237	42.19%
7,2	210.2.2	210-13		Excavaciones en material comun de la Explanación y Canales	m3		$ 10,642.00	$ 0.00	10,259.00	$ 109,172,094	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
8	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	683,232,00	$ 9,747.00	$ 6,659,462,304.00	683,232.00	$ 6,659,462,304	349,019.00	$ 3,401,886,193	518.00	$ 5,045,946	349537.00	$ 3,406,937,139	51.16%
9	220.1	220.1		Terraplenes	m3	58,850,00	$ 13,119.00	$ 772,053,150.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
9,1	220.1	220.1		Terraplenes	m3		$ 13,119.00	$ 0.00	20,381.00	$ 267,378,339	11,011.60	$ 144,461,186		$ -	11011.60	$ 144,461,186	54.01%
9,2	220.1	220.1		Terraplenes	m3		$ 13,119.00	$ 0.00	12,469.00	$ 163,580,811	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
10	221.1	221-13		Pedraplen compacto	m3	2,625,00	$ 18,609.00	$ 48,848,625.00	34,125.00	$ 635,032,125	20,600.00	$ 383,345,400	883.00	$ 16,431,747	21483.00	$ 399,777,147	62.95%
11	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	59,655,00	$ 10,393.00	$ 619,994,415.00	2,267.00	$ 23,768,791	2,267.00	$ 23,768,791		$ -	2267.00	$ 23,768,791	100.00%
11,1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		$ 10,393.00	$ 0.00	69,383.00	$ 721,067,519	28,965.40	$ 301,245,262		$ -	28965.40	$ 301,245,262	41.78%
12	234.1	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	730,752,00	$ 1,332.00	$ 973,361,664.00	730,752.00	$ 973,361,664	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
Subtotal								$ 46,990,129,329.00	$ 10,842,545,607.00		$ 9,449,427,291.00		$ 257,265,366.00		$ 9,706,732,757.00		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
13	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	375,760,00	$ 927.00	$ 348,329,520.00	424,154.00	$ 393,190,758	424,154.00	$ 393,190,758		$ -	424154.00	$ 393,190,758	100.00%
13,1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927.00	$ 0.00	2,940,086.00	$ 2,725,459,272	1,104,947.90	$ 1,024,286,704	80,555.60	$ 74,671,541	1185503.50	$ 1,098,958,245	40.32%
14	311.1	311-13		Afirmado	m3	70,266,00	$ 132,094.00	$ 9,281,717,004.00	201,266.00	$ 26,586,031,004	127,992.90	$ 16,907,894,133	6,705.00	$ 885,690,270	134697.90	$ 17,793,784,403	66.93%
15	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	174,216,00	$ 180,000.00	$ 31,358,880,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
15,1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180,000.00	$ 0.00	262,635.00	$ 38,474,280,000	49,222.60	$ 8,860,068,000	153.40	$ 27,684,000	49376.40	$ 8,887,752,000	24.37%
15,2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 180,000.00	$ 0.00	4,496.00	$ 809,280,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
16	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	97,790,00	$ 208,690.00	$ 20,212,215,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
16,1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		$ 208,690.00	$ 0.00	128,534.00	$ 26,566,692,460	33,013.10	$ 6,823,477,639	360.30	$ 78,654,297	33393.40	$ 6,902,081,846	25.98%
16,2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		$ 208,690.00	$ 0.00	1,529.00	$ 319,072,326	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
17	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	21,000,00	$ 222,076.00	$ 4,663,596,000.00	21,000.00	$ 4,663,596,000	584.30	$ 129,758,007		$ -	584.30	$ 129,758,007	2.78%
Subtotal								$ 65,864,737,424.00	$ 99,534,372,244.00		$ 34,137,876,241.00		$ 1,066,653,318.00		$ 35,204,529,759.00		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 31

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021 **CONTRATO INTERVENTORÍA** 962 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"".

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ECOVISIÓN- 168

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA : $ 406,967,887,388,00

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES
SUCURSAL COLOMBIANA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 12 Mayo 2025 Acta de fecha		CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		% EJECUTADO
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
18	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	642,636.00	$ 2,918.00	$ 1,875,211,848.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
18.1	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,918.00	$ 0.00	757,439.00	$ 2,210,204,084	279,543.00	$ 815,706,474	8,651.00	$ 25,247,618	288194.00	$ 840,954,092	38.06%
18.2	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,918.00	$ 0.00	6,111.00	$ 17,831,899	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
19	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	432,950.00	$ 1,849.00	$ 800,524,550.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
19.1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,849.00	$ 0.00	530,904.00	$ 981,641,496	130,743.00	$ 241,743,807	12,010.00	$ 22,206,490	142753.00	$ 263,950,297	26.89%
19.2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,849.00	$ 0.00	6,111.00	$ 11,299,239	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
20	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	25,977.00	$ 863,363.00	$ 22,427,580,651.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
20.1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 863,363.00	$ 0.00	4,730.10	$ 4,083,783,326	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
20.2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 863,363.00	$ 0.00	611.00	$ 527,514,793	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
21	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	25,977.00	$ 879,613.00	$ 22,849,706,901.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
21.1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 879,613.00	$ 0.00	36,251.00	$ 31,886,859,863	28,614.40	$ 18,132,694,227	1,412.60	$ 1,242,541,324	22027.00	$ 19,375,235,551	60.76%
21.2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 879,613.00	$ 0.00	458.20	$ 403,126,636	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
22	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,350.00	$ 908,124.00	$ 6,674,711,400.00	1,602.90	$ 1,455,631,960	1,602.90	$ 1,455,631,960		$ -	1602.90	$ 1,455,631,960	100.00%
22.1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 908,124.00	$ 0.00	42,947.10	$ 39,001,292,240	35,176.40	$ 31,944,533,874	607.60	$ 551,967,787	35784.00	$ 32,496,490,841	83.32%
22.2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 908,124.00	$ 0.00	2,231.10	$ 2,026,115,456	2,231.10	$ 2,026,115,456		$ -	2231.10	$ 2,026,115,456	100.00%
23	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	14,600.00	$ 72,622.00	$ 1,060,201,200.00	1,477.00	$ 107,558,094	1,477.00	$ 107,558,094		$ -	1477.00	$ 107,558,094	100.00%
23.1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 72,622.00	$ 0.00	50,396.00	$ 3,659,209,292	39,145.00	$ 2,842,617,190		$ -	39145.00	$ 2,842,617,190	77.69%
23.2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		$ 72,622.00	$ 0.00	1,807.00	$ 131,289,354	1,807.00	$ 131,289,354		$ -	1807.00	$ 131,289,354	100.00%
24	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	18,250.00	$ 78,694.00	$ 1,436,615,500.00	33,250.00	$ 2,622,225,500	29,765.10	$ 2,348,287,799		$ -	29765.10	$ 2,348,287,799	89.52%
25	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin riteo	m	15,000.00	$ 4,342.00	$ 65,130,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
25.1	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin riteo	m		$ 4,342.00	$ 0.00	14,550.00	$ 63,176,100	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
25.2	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin riteo	m		$ 4,342.00	$ 0.00	450.00	$ 1,953,900	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
Subtotal								$ 57,155,882,050,00	$ 89,202,014,233.00		$ 60,054,477,433.00		$ 1,841,349,199,00		$ 61,894,426,634,00		
PAVIMENTOS DE CONCRETO																	
26	500.1	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	35.00	783,524.00	$ 27,423,340.00	61.00	$ 47,794,964	20.60	$ 16,140,594		$ -	20.60	$ 16,140,594	33.77%
Subtotal								$ 27,423,340,00	$ 47,794,964,00		$ 16,140,594,00		$ 0,00		$ 16,140,594,00		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
27	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	208,626.00	$ 30,000.00	$ 6,258,780,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
27.1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30,000.00	$ 0.00	177,799.70	$ 5,333,991,000	39,403.80	$ 1,182,114,000	320.20	$ 9,606,000	39724.00	$ 1,191,720,000	22.34%
27.2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 30,000.00	$ 0.00	66.00	$ 1,980,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
28	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	132,210.00	$ 32,000.00	$ 4,230,720,000.00	99,790.00	$ 3,161,280,000	5,565.90	$ 179,068,800	3.20	$ 102,400	5569.10	$ 179,171,200	5.67%
29	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	150.00	$ 25,958.00	$ 3,893,700.00	3,417.00	$ 88,696,486	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
30	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	120.00	$ 65,247.00	$ 7,829,640.00	713.00	$ 46,521,111	52.60	$ 3,431,992		$ -	52.60	$ 3,431,992	7.38%
31	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	17,520.00	$ 44,832.00	$ 785,456,640.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
31.1	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44,832.00	$ 0.00	16,696.00	$ 748,604,736	6,648.20	$ 298,052,102	319.60	$ 14,328,307	6967.80	$ 312,380,410	41.73%
31.2	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 44,832.00	$ 0.00	822.00	$ 36,851,904	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
32	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	52,356.00	$ 65,112.00	$ 3,409,003,872.00	61,356.00	$ 3,995,011,872	14,971.30	$ 974,811,786	24.60	$ 1,601,755	14995.90	$ 976,413,541	24.44%
33	621.1.1P		0	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	40.00	$ 2,233,592.00	$ 89,343,680.00	1,971.00	$ 4,402,409,832	1,221.60	$ 2,729,555,967		$ -	1221.60	$ 2,729,555,967	61.98%

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 51

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021 **CONTRATO INTERVENTORIA** 992 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"".

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A, SUCURSAL COLOMBIANA **INTERVENTORIA:** CONSORCIO ECOVISIÓN- 186

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA : $ 406.867.867.388,00

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES
SUCURSAL COLOMBIANA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 12 Acta de fecha Mayo 2025		CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		% EJECUTADO
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
34	623.1.2	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	3.764,00	$ 368.509,00	$ 1.387.067.876,00	3.764,00	$ 1.387.067.876	0,00	$ -	325,00	$ 119.765.425	325,00	$ 119.765.425	8,63%
35	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.709,00	$ 1.254.085,00	$ 5.905.486.265,00	4.709,00	$ 5.905.486.265	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
36	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4.792,00	$ 871.252,00	$ 4.175.039.584,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
36.1	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252,00	$ 0,00	1.200,00	$ 1.045.502.400	573,46	$ 499.575.897	1,90	$ 1.655.379	575,36	$ 501.231.276	47,94%
36.2	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252,00	$ 0,00	4.730,00	$ 4.121.021.960	1.940,70	$ 1.690.834.756	85,80	$ 74.753.427	2026,50	$ 1.765.592.179	42,84%
36.3	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 871.252,00	$ 0,00	14,00	$ 12.197.528	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
37	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2.354,00	$ 1.033.388,00	$ 2.432.595.352,00	2.354,00	$ 2.465.983.352	2.261,80	$ 2.337.420.317	36,30	$ 37.511.964	2298,20	$ 2.374.932.302	68,52%
38	630.3.3P		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	411,00	$ 1.127.087,00	$ 463.232.757,00	411,00	$ 463.232.757	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
39	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	1.412,00	$ 1.184.864,00	$ 1.673.027.968,00	1.412,00	$ 1.673.027.968	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
40	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5.444,00	$ 721.775,00	$ 3.929.343.100,00	5.444,00	$ 3.929.343.100	225,00	$ 162.399.375	4,70	$ 3.392.343	229,70	$ 165.791.718	4,22%
41	630.4.1P		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	5.382,00	972.051,00	$ 5.231.578.482,00	5.382,00	$ 5.231.578.482	117,40	$ 114.116.787		$ -	117,40	$ 114.116.787	2,18%
42	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1.539,00	$ 539.260,00	$ 829.921.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
42.1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260,00	$ 0,00	1.539,00	$ 813.743.340	865,40	$ 466.675.684	6,60	$ 3.559.116	872,00	$ 470.234.799	57,79%
42.2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260,00	$ 0,00	16,00	$ 8.628.160	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
42.3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 539.260,00	$ 0,00	56,00	$ 30.186.560	3,00	$ 1.617.780		$ -	3,00	$ 1.617.780	5,36%
43	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	1.137,00	$ 465.168,00	$ 551.636.016,00	2.361,10	$ 1.145.538.165	1.242,30	$ 602.724.287	236,90	$ 114.930.799	1479,20	$ 717.655.086	62,65%
44	632.1P		632.1P	Baranda Metálica	m	2.915,00	$ 545.130,00	$ 1.589.053.950,00	2.915,00	$ 1.589.053.950	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
45	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.611.800,00	$ 5.378,00	$ 14.046.260.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
45.1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ 0,00	1.762.203,00	$ 9.477.127.734	787.097,00	$ 4.233.067.666	10.931,00	$ 58.795.910	798028,00	$ 4.291.794.544	45,29%
45.2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ 0,00	1.569,00	$ 8.438.082	1.127,00	$ 6.061.006		$ -	1127,00	$ 6.061.006	71,83%
45.3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5.378,00	$ 0,00	891.349,00	$ 4.793.689.544	1.840,00	$ 9.895.520		$ -	1840,00	$ 9.895.520	0,21%
46	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	256.153,00	$ 5.483,00	$ 1.404.486.899,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
46.1	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5.483,00	$ 0,00	253.724,00	$ 1.391.188.692	9.896,00	$ 54.270.734		$ -	9896,00	$ 54.270.734	3,86%
46.2	640.2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg		$ 5.483,00	$ 0,00	2.429,00	$ 13.318.207	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
47	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tfm	2.143.171,00	$ 2.237,00	$ 4.794.273.527,00	2.143.171,00	$ 4.794.273.527	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
48	642.1	642-13		Apoyo elastómero	u	243,00	$ 2.720.318,00	$ 661.037.274,00	243,00	$ 661.037.274	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
49	642.3P		642.3P	Junta FREYSSINET M80 o similar	m	871,00	$ 2.799.200,00	$ 2.438.103.200,00	871,00	$ 2.438.103.200	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
50	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.035,00	$ 628.687,00	$ 650.691.045,00	14,00	$ 8.801.618	14,00	$ 8.801.618		$ -	14,00	$ 8.801.618	100,00%
50.1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628.687,00	$ 0,00	1.375,00	$ 864.444.625	535,36	$ 336.536.151		$ -	535,36	$ 336.536.151	38,93%
50.2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628.687,00	$ 0,00	16,00	$ 10.059.992	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
51	663.1P		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	58.240,00	$ 66.621,00	$ 3.880.007.040,00	60.740,00	$ 4.046.559.540	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
52	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	83.952,00	$ 38.113,00	$ 3.199.662.576,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
52.1	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38.113,00	$ 0,00	88.375,00	$ 3.368.236.375	18.172,90	$ 692.623.739	126,30	$ 4.813.672	18299,20	$ 697.437.410	20,71%
52.2	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		$ 38.113,00	$ 0,00	1.527,00	$ 58.198.551	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
53	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3	5.784,00	$ 666.860,00	$ 3.857.233.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
53.1	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3		$ 666.860,00	$ 0,00	10.014,30	$ 6.678.336.384	4.679,60	$ 3.120.731.648	53,40	$ 35.611.392	4733,00	$ 3.156.343.040	47,26%
53.2	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3		$ 666.860,00	$ 0,00	160,00	$ 106.697.600	62,00	$ 41.346.560		$ -	62,00	$ 41.346.560	38,75%

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 51

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021 **CONTRATO INTERVENTORIA** 982 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACA – OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ – PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ECOVISIÓN 186

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA : $ 405,847,987,388.00

SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 12 Mayo 2025 Acta de fecha		CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		% EJECUTADO
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
54	672.1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1,400.00	$ 90,059.00	$ 126,082,600.00	18,525.00	$ 647,875,975	112.46	$ 10,122,632		$ -	112.46	$ 10,122,632	1.07%
55	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	482,567.00	$ 5,200.00	$ 2,509,462,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
55.1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 5,200.00	$ 0.00	525,476.00	$ 2,732,475,200	196,338.00	$ 1,020,957,600	2,010.00	$ 10,452,000	198,348.00	$ 1,031,409,600	37.75%
55.2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 5,200.00	$ 0.00	18,852.00	$ 98,030,400	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
56	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	51,808.00	$ 152,050.00	$ 7,877,406,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
56.1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152,050.00	$ 0.00	42,293.20	$ 6,430,681,060	11,419.00	$ 1,736,258,950	306.00	$ 46,527,300	11725.00	$ 1,782,786,250	22.72%
56.2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		$ 152,050.00	$ 0.00	1,837.00	$ 279,315,850	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
57	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	21,350.00	$ 150,000.00	$ 3,202,500,000.00	22,628.30	$ 3,394,245,000	7,000.10	$ 1,050,465,000	2.50	$ 375,000	7000.60	$ 1,050,840,000	32.66%
58	674.2	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	5,157.00	$ 173,904.00	$ 896,822,928.00	6,232.00	$ 1,083,709,728	6,066.10	$ 1,054,397,135	100.00	$ 17,390,400	6166.10	$ 1,071,787,535	99.29%
59	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,250.00	$ 265,893.00	$ 332,366,250.00	1,750.00	$ 465,312,750	1,748.00	$ 464,780,964		$ -	1748.00	$ 464,780,964	99.89%
Subtotal								$ 92,839,394,481.00		$ 102,787,118,812.00		$ 25,885,661,812.00		$ 555,169,112.00		$ 25,440,830,926.00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
60	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	111,199.00	$ 1,794.00	$ 199,491,006.00	305,221.90	$ 547,568,089	305,221.90	$ 547,568,089		$ -	305221.90	$ 547,568,089	100.00%
60.1	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,794.00	$ 0.00	1,884,104.10	$ 3,380,092,355	771,496.10	$ 1,384,067,592	50,759.00	$ 91,061,646	822255.10	$ 1,475,129,237	43.64%
60.2	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,794.00	$ 0.00	3,275.00	$ 5,875,350	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
61	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	487.00	$ 22,076.00	$ 10,751,012.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
61.1	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22,076.00	$ 0.00	8,113.00	$ 179,102,651	4,072.20	$ 89,900,095	522.90	$ 11,542,540	4595.20	$ 101,442,635	56.64%
61.2	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22,076.00	$ 0.00	41.00	$ 905,053	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
62	4P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11,796.00	$ 8,346.00	$ 98,466,104.00	17,541.00	$ 146,397,186	0.00	$ -	1,646.00	$ 13,737,516	1646.00	$ 13,737,516	9.38%
63	5P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	513.00	$ 399,581.00	$ 204,985,053.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
63.1	5P	Manual de Señalización Vial 2019		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399,581.00	$ 0.00	577.00	$ 230,556,237	116.00	$ 46,351,396		$ -	116.00	$ 46,351,396	20.10%
63.2	5P	Manual de Señalización Vial 2019		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 399,581.00	$ 0.00	12.00	$ 4,794,972	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
64	6P	Manual de Señalización Vial 2020		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	471.00	$ 327,606.00	$ 154,302,426.00	593.00	$ 194,270,358	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
65	7P	Manual de Señalización Vial 2021		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	5.00	$ 559,793.00	$ 2,798,965.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
65.1	7P	Manual de Señalización Vial 2022		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559,793.00	$ 0.00	36.00	$ 20,152,548	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
65.2	7P	Manual de Señalización Vial 2023		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2		$ 559,793.00	$ 0.00	2.00	$ 1,119,586	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
66	730.1	730-13		Defensa metálica	m	4,245.00	$ 230,532.00	$ 978,608,340.00	7,031.00	$ 1,620,670,492	527.10	$ 121,513,417		$ -	527.10	$ 121,513,417	7.50%
67	730.2	730-13		Sección final	u	319.00	$ 103,189.00	$ 32,917,291.00	331.00	$ 34,155,559	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
68	740.1	740-13		Captafaros	u	328.00	$ 22,031.00	$ 7,226,168.00	2,281.00	$ 50,252,711	138.00	$ 3,040,278		$ -	138.00	$ 3,040,278	6.05%
Subtotal								$ 1,589,346,369.00		$ 6,416,185,547.00		$ 2,192,640,868.00		$ 116,342,702.00		$ 2,308,783,568.00	
OBRAS VARIAS																	
69	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	700.00	$ 17,838.00	$ 12,486,600.00	8,200.00	$ 146,271,600	2,325.00	$ 41,473,350		$ -	2325.00	$ 41,473,350	28.35%
70	800.2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	4,302.00	$ 34,235.00	$ 148,306,020.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
70.1	800.2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34,235.00	$ 0.00	15,234.00	$ 521,535,990	15,229.00	$ 521,364,815		$ -	15229.00	$ 521,364,815	99.97%
70.2	800.2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		$ 34,235.00	$ 0.00	570.00	$ 19,513,950	570.00	$ 19,513,950		$ -	570.00	$ 19,513,950	100.00%
Subtotal								$ 160,792,620.00		$ 687,321,540.00		$ 582,352,115.00		$ 0.00		$ 582,352,115.00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 51

CONTRATO DE OBRA No. 973 DE 2021 **CONTRATO INTERVENTORIA** 962 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"".

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA **INTERVENTORIA:** CONSORCIO ECOVISION- 186

VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA : $ 406,367,867,388.00

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES
SUCURSAL COLOMBIANA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 12 Mayo 2025 Acta de fecha		CANTIDADES (ACUMULADO ANTERIOR)		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		% EJECUTADO
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
TRANSPORTES																	
71	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m); medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	29,933,177.00	$ 1,100.00	$ 32,926,494,700.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
71.1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m); medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,100.00	$ 0.00	8,286,584.40	$ 9,115,242,840	1,254,129.20	$ 1,379,542,120	75,528.00	$ 83,080,800	1329657.20	$ 1,462,622,920	16.05%
71.2	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m); medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,100.00	$ 0.00	10,278.00	$ 11,305,800	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
72	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes; medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	6,832,314.00	$ 1,100.00	$ 7,515,545,400.00	280,416.00	$ 308,457,600	280,416.00	$ 308,457,600		$ -	280416.00	$ 308,457,600	100.00%
72.1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes; medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1,100.00	$ 0.00	6,573,438.00	$ 7,230,781,800	2,775,293.60	$ 3,052,823,160	7,789.90	$ 8,568,890	2783083.70	$ 3,061,392,050	42.34%
Subtotal								$ 40,442,040,100.00		$ 16,665,788,040.00		$ 4,740,822,960.00		$ 91,649,690.00		$ 4,832,472,650.00	
OBRAS NO PREVISTAS																	
73	650.3P	650-13		Transporte de estructura metalica	Kg		$ 361.00	$ 0.00	210,463.00	$ 75,956,443	65,635.90	$ 23,694,560		$ -	65635.90	$ 23,694,560	31.20%
74	650.4P	650-13		Montaje de Estructura Metálica Puente Modular	Kg		$ 3,717.00	$ 0.00	257,400.00	$ 956,755,800	112,632.50	$ 418,655,003		$ -	112632.50	$ 418,655,003	43.76%
75	730.1.3P	730-13		Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3.81 m	m		$ 665,869.00	$ 0.00	122.40	$ 81,502,366	122.40	$ 81,502,366		$ -	122.40	$ 81,502,366	100.00%
76	730.2.1P	730-13		Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, poste y espaciador para canal)	m		$ 752,076.00	$ 0.00	258.00	$ 194,019,000	8.10	$ 6,091,816		$ -	8.10	$ 6,091,816	3.24%
77	8.5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (60cm * 60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 624,680.00	$ 0.00	513.00	$ 320,460,840	3.00	$ 1,874,040		$ -	3.00	$ 1,874,040	0.58%
78	8.6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80,293.00	$ 0.00	216.00	$ 17,343,288	216.00	$ 17,343,288		$ -	216.00	$ 17,343,288	100.00%
79	8.7P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla	u		$ 107,058.00	$ 0.00	24.00	$ 2,569,392	24.00	$ 2,569,392		$ -	24.00	$ 2,569,392	100.00%
80	8.8P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación de carriles.	u		$ 80,293.00	$ 0.00	50.00	$ 4,014,650	50.00	$ 4,014,650		$ -	50.00	$ 4,014,650	100.00%
81	900.2.1P	900-13		Transporte de material de resacado desde el acopio temporal al sitio de disposición	m3/km		$ 1,410.00	$ 0.00	2,161,234.60	$ 3,047,346,426	1,783,105.70	$ 2,514,179,037		$ -	1783105.70	$ 2,514,179,037	82.50%
82	233.1	233-13		Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2		$ 12,691.00	$ 0.00	318,327.80	$ 4,011,248,698	177,474.00	$ 2,236,348,674	876.00	$ 11,038,476	178350.00	$ 2,247,388,350	56.03%
83	464.1.1	464-13		Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - Incluye riego de liga CRR-1	m2		$ 13,268.00	$ 0.00	116,435.00	$ 1,547,188,280	46,806.00	$ 621,056,128		$ -	46806.00	$ 621,056,128	40.20%
84	672.4	672-13		Bordillo de piezas prefabricadas de concreto, incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m		$ 77,169.00	$ 0.00	2,966.00	$ 231,196,324	1,481.50	$ 114,325,874		$ -	1481.50	$ 114,325,874	49.45%
85	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		$ 1,057.00	$ 0.00	399,331.70	$ 422,093,607	286,763.10	$ 303,108,597		$ -	286763.10	$ 303,108,597	71.81%
86	662.2P	662-13		Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).	m		$ 1,098,470.00	$ 0.00	168.00	$ 184,542,960	136.90	$ 150,380,543		$ -	136.90	$ 150,380,543	81.49%
87	8P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 0.75m con lámina retroreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 y retroreflectiva Tipo XI),	u		$ 1,298,836.00	$ 0.00	152.00	$ 197,423,072	57.00	$ 74,033,652		$ -	57.00	$ 74,033,652	37.50%
Subtotal								$ 0.00		$ 11,287,662,896.00		$ 6,570,080,829.00		$ 11,038,476.00		$ 6,581,119,294.00	
Ajuste al peso										$ 1.00		-$ 3.00				-$ 3.00	
SUBTOTAL OBRAS								$ 305,169,938,913.00		$ 344,570,723,204.00		$ 142,829,280,173.00		$ 3,940,109,863.89		$ 146,769,388,236.00	

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 305,169,938,913.00	$ 344,570,723,204	$ 142,829,280,173	$ 3,940,109,763	$ 146,769,388,236	42.56%
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 41,440,296,041.00	$ 45,484,382,571	$ 36,939,756,920	$ 1,082,842,785	$ 40,022,599,705	87.99%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,000,000,000.00	$ 1,000,000,000	$ -		$ -	0.00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,281,000,000.00	$ 1,281,000,000	$ 1,208,677,959		$ 1,208,677,959	99.94%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS	$ -	$ 3,764,765,515	$ 3,242,214,072		$ 3,242,214,072	86.12%
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 7,772,764,611.00	$ 7,772,764,611	$ 3,584,730,275		$ 3,584,730,275	46.12%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 340,000,000.00	$ 340,000,000	$ 1,985,425		$ 1,985,425	0.58%

RESIDENTE DE OBRA
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ECOVISION -186

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	2361,00
210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA - SECCIÓN TRANSVERSAL m2	ANCHO (m) (B)	ALTURA (m) (C)	VOLUMEN - SECCIÓN m3 (D=A*B*C)	TOTAL Redondeado especificacion INV 21.6	OBSERVACIONES
1	72+380,00	72+400,00	6006	10,00	16,01			91,20	68,40	
1	72+400,00	72+410,00	6006	10,00	23,12			189,31	142,00	
1	72+410,00	72+420,00	6006	10,00	26,24			243,83	182,90	Excavación, 75% corresponde a material en roca
1	72+420,00	72+430,00	6006	10,00	6,72			164,40	123,30	
1	72+430,00	72+440,00	6006	10,00	9,86			82,92	62,20	
1	72+440,00	72+450,00	6006	10,00	6,85			79,07	59,30	
1	53+750,00	53+750,00	6009		0,00			0,00	0,00	
1	53+750,00	53+750,00	6009		51,38			256,90	89,90	
1	53+750,00	53+750,00	6009		35,84			436,10	152,60	
1	53+750,00	53+750,00	6009		55,08			454,40	159,00	
1	53+750,00	53+750,00	6009		47,44			480,33	168,10	
1	53+750,00	53+750,00	6009		18,82			330,15	115,60	Atención emergencia Quebrada la Honda. Obras de encausamiento 35% corresponde a material roca. Secciones topográficas del PR0+000 - PR0+120
1	53+750,00	53+750,00	6009		16,17			170,99	59,80	
1	53+750,00	53+750,00	6009		25,73			209,84	73,40	
1	53+750,00	53+750,00	6009		41,53			345,02	120,80	
1	53+750,00	53+750,00	6009		71,67			566,03	198,10	
1	53+750,00	53+750,00	6009		34,91			532,91	186,50	
1	53+750,00	53+750,00	6009		29,23			308,79	108,10	
1	53+750,00	53+750,00	6009		0,00			135,35	47,40	
1	93+500,00	93+500,00	6009	23,00	704,11			487,21	243,60	Atención emergencia Quebrada La Tobasia. Obras de encausamiento 50% corresponde a material roca

TOTAL	2361,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	2361,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	2361,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	2361,00
210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3		











4/3

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3		2361,00











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

72+390.00

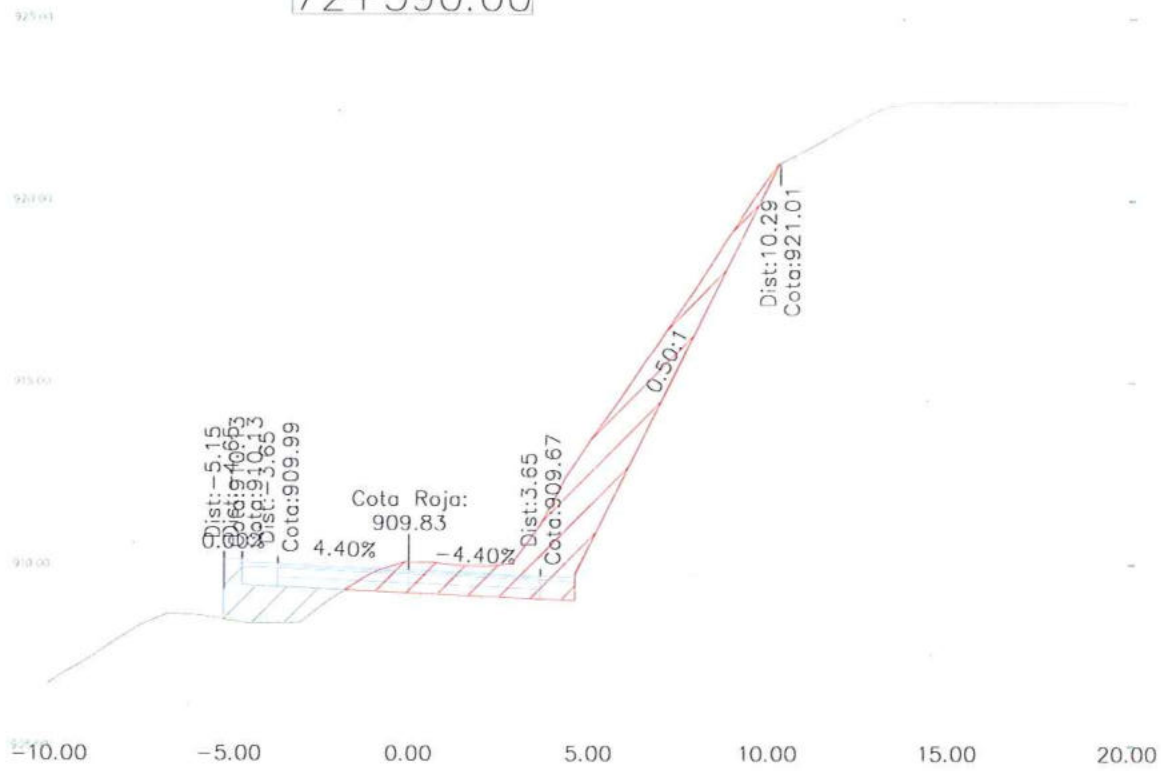

72+400.00

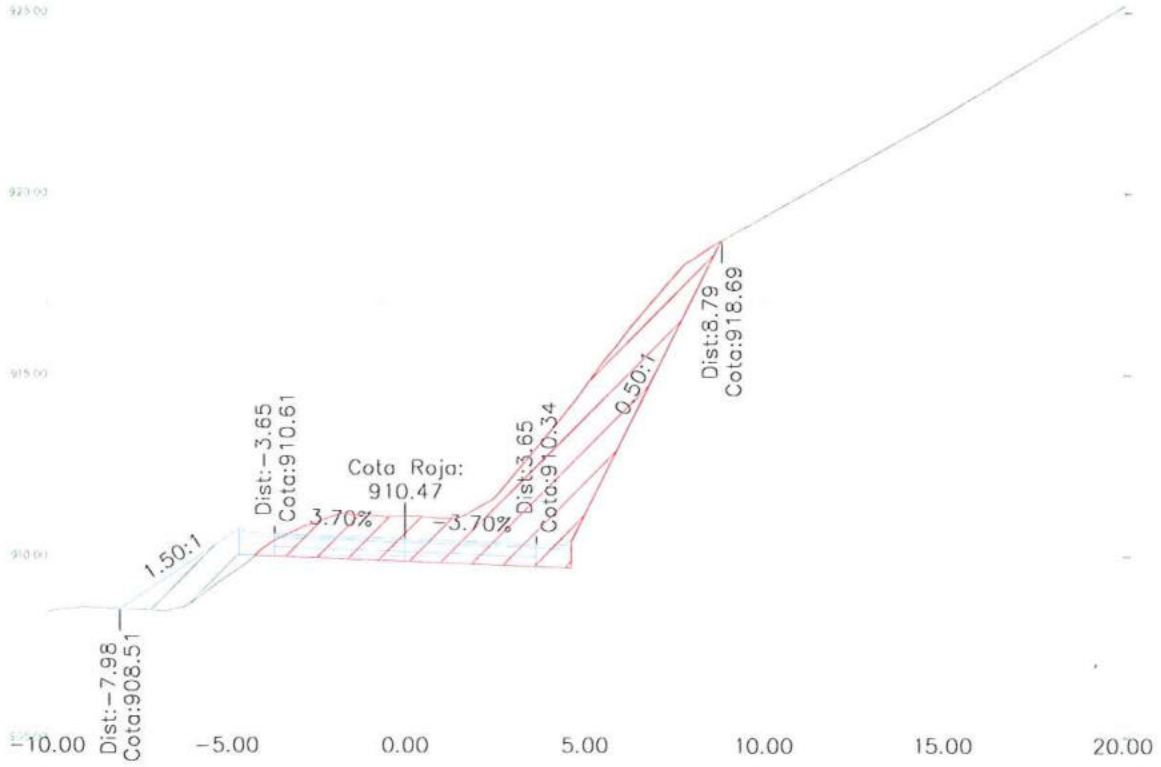


SUDINCO


SECCIONES TRANSVERSALES
EJE ALTA

1 - 4

72+410.00

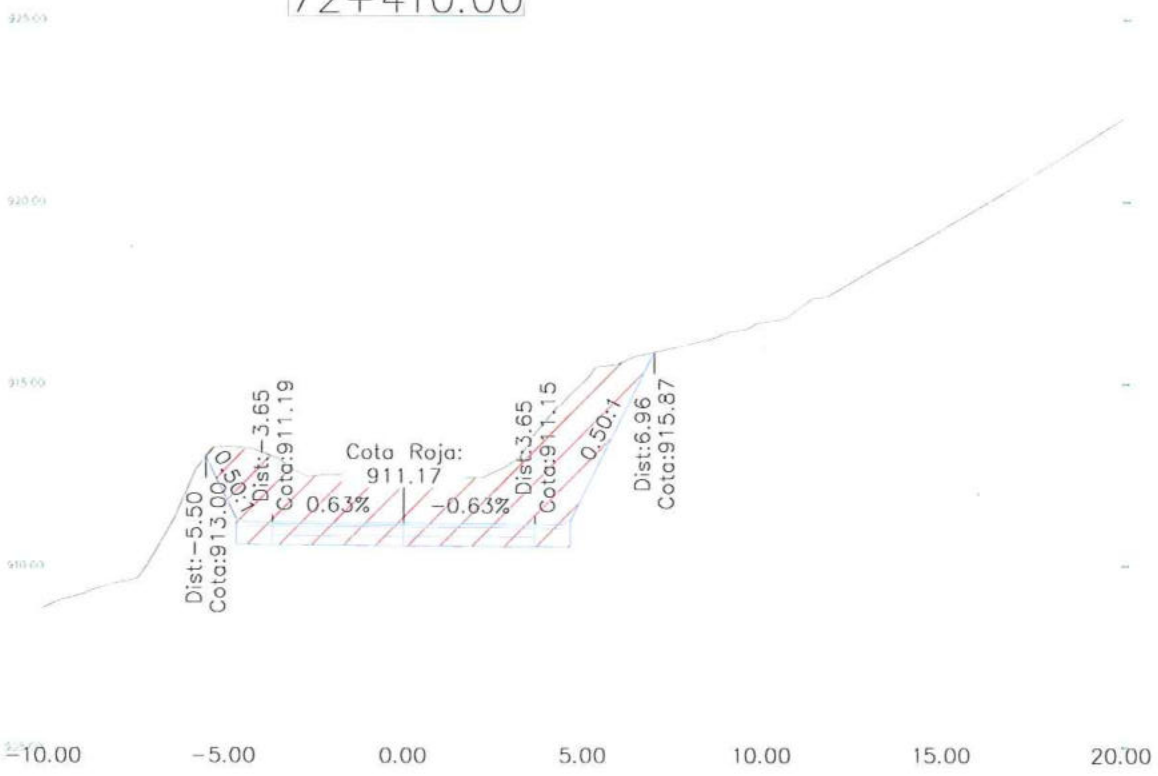

72+420.00

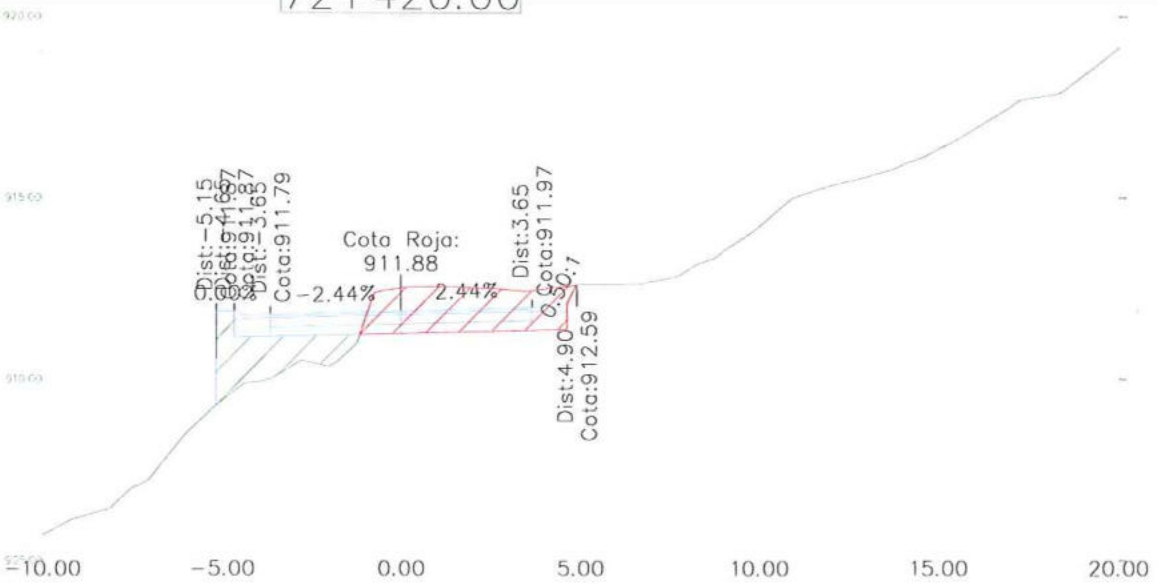


49

SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE ALTA

2 - 4

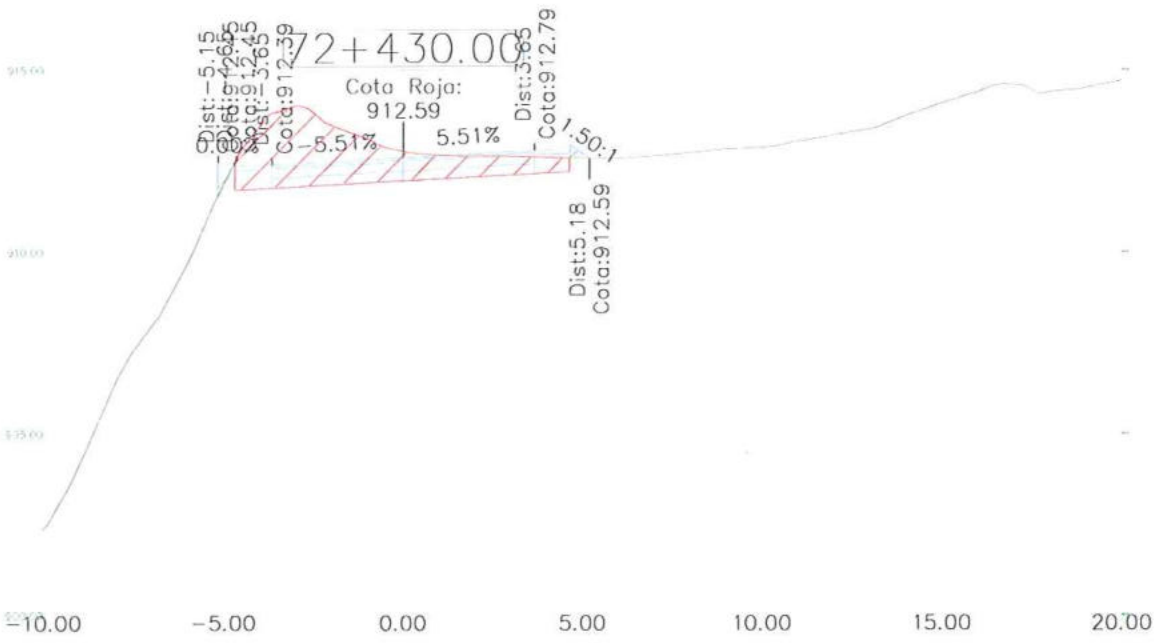


47


SUDINCO


3 - 4


72+440.00

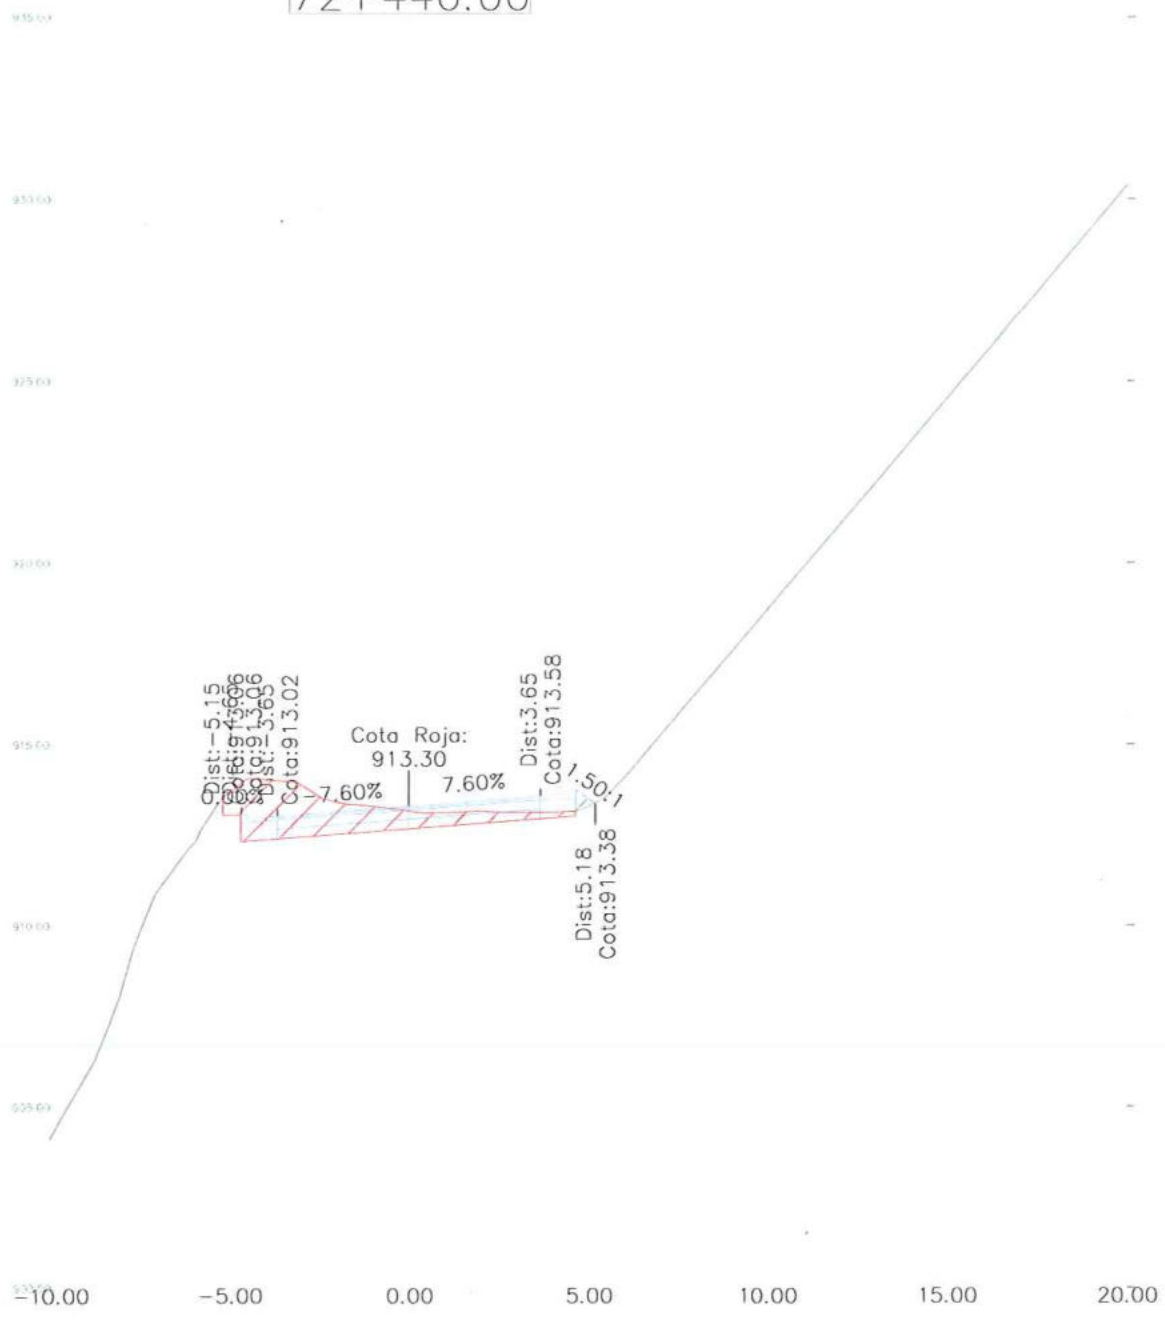
Dist:-5.15
Cota:913.06
Dist:-3.65
Cota:913.06
Dist:-1.65
Cota:913.02
7.60%
Cota Roja:
913.30
7.60%
Dist:3.65
Cota:913.58
1.50:1
Dist:5.18
Cota:913.38
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00

1 093 220 E
1 093 200 E
1 093 180 E
1 093 160 E
1 093 140 E
1 093 120 E
1 093 100 E
1 080 060 N
1 080 040 N
1 080 020 N
1 080 000 N
SUDINCO
DISEÑO GEOMETRICO RUTA 6009
MEJORAMIENTO
001

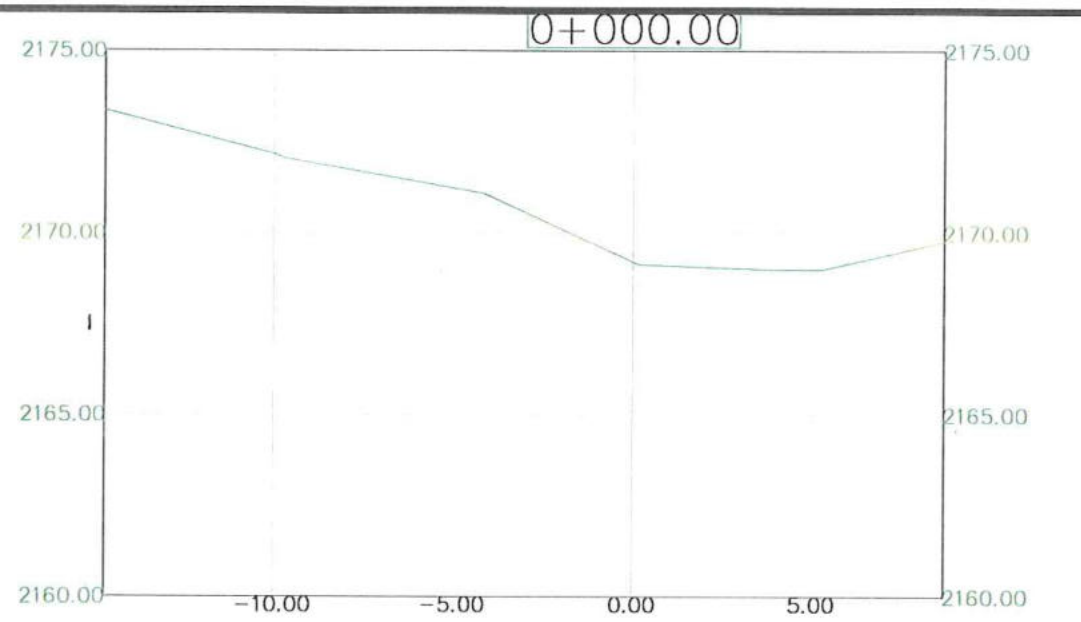

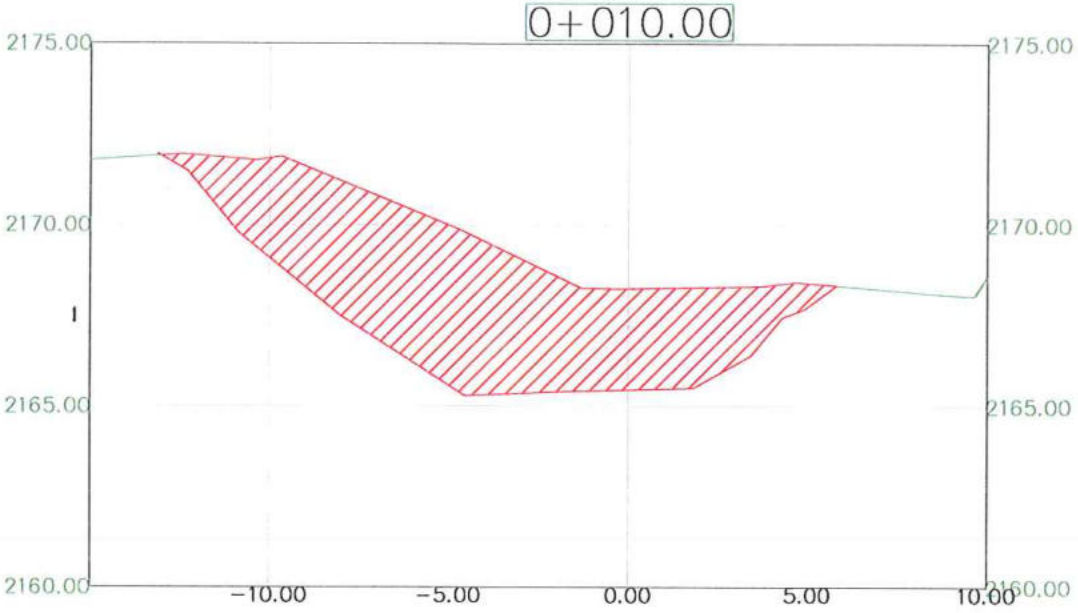


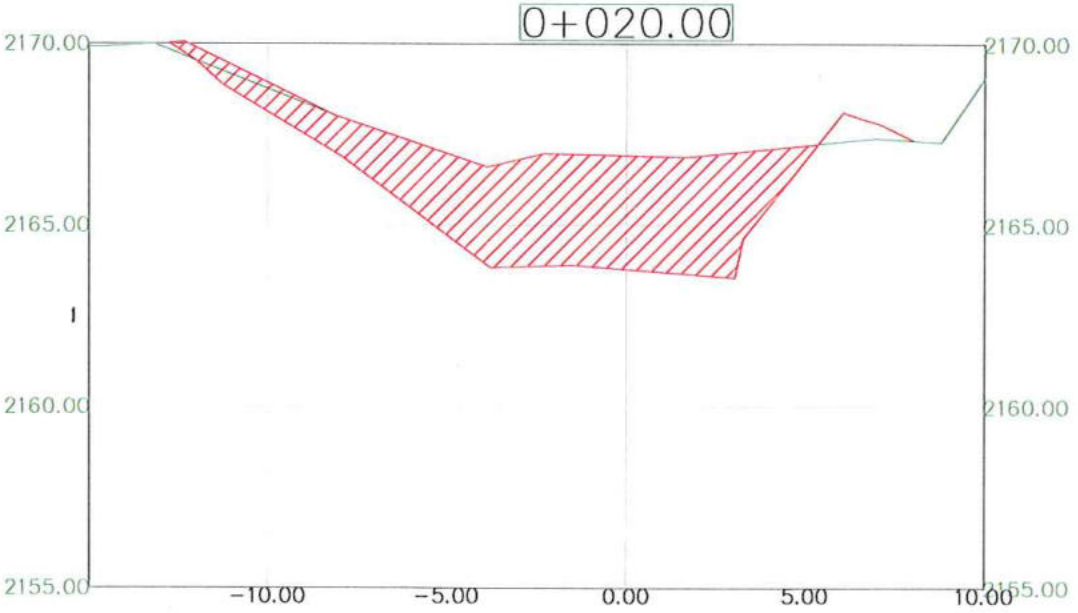



SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE HOJA

1 -05

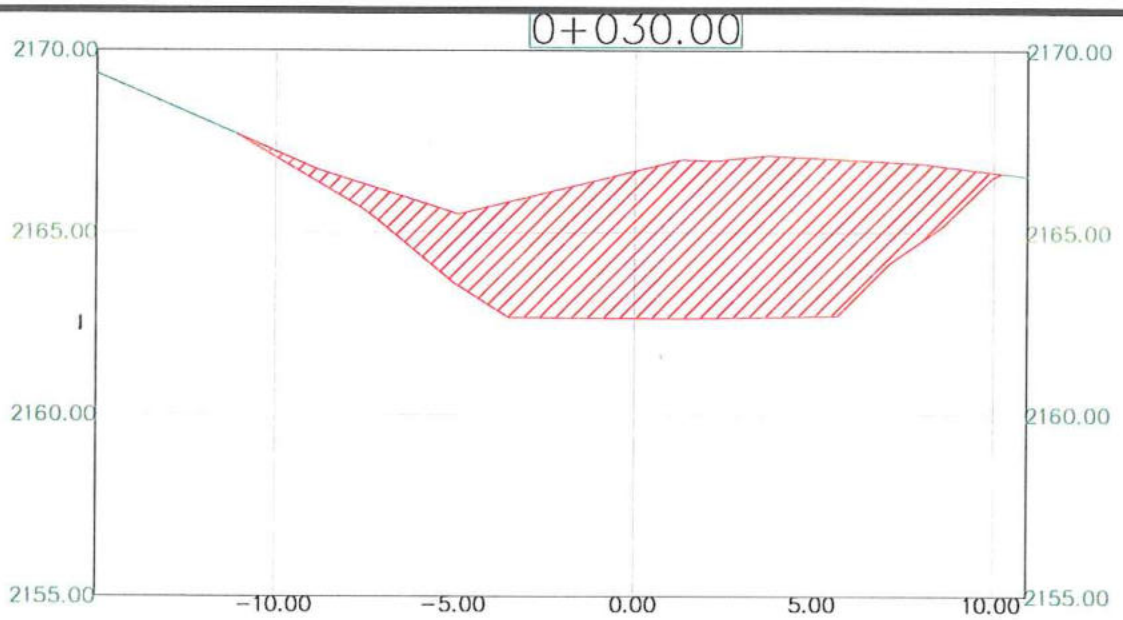

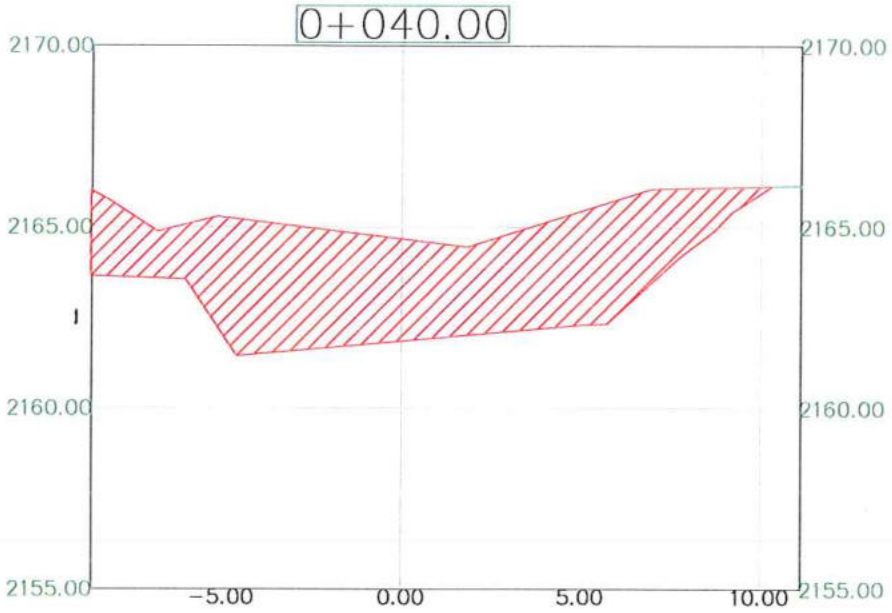


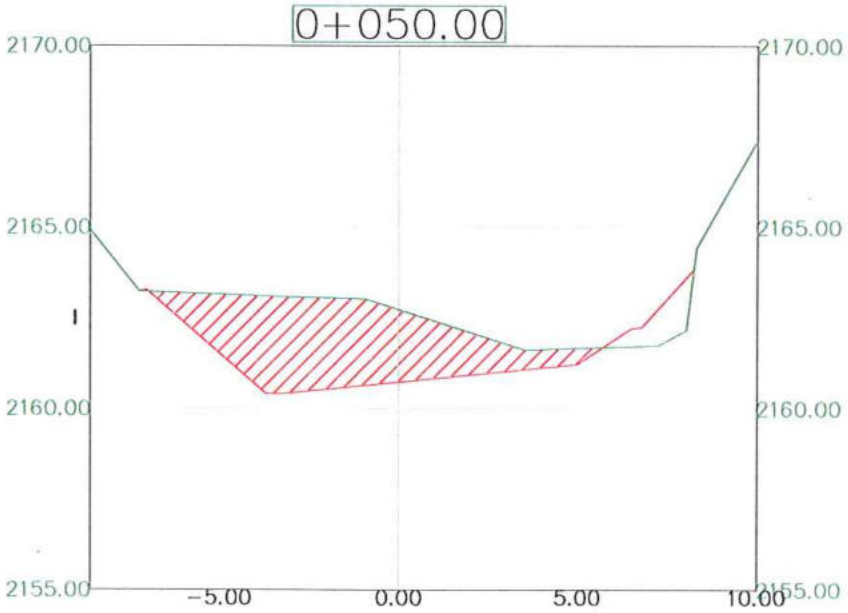



SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE 1 NORTE

2 -05

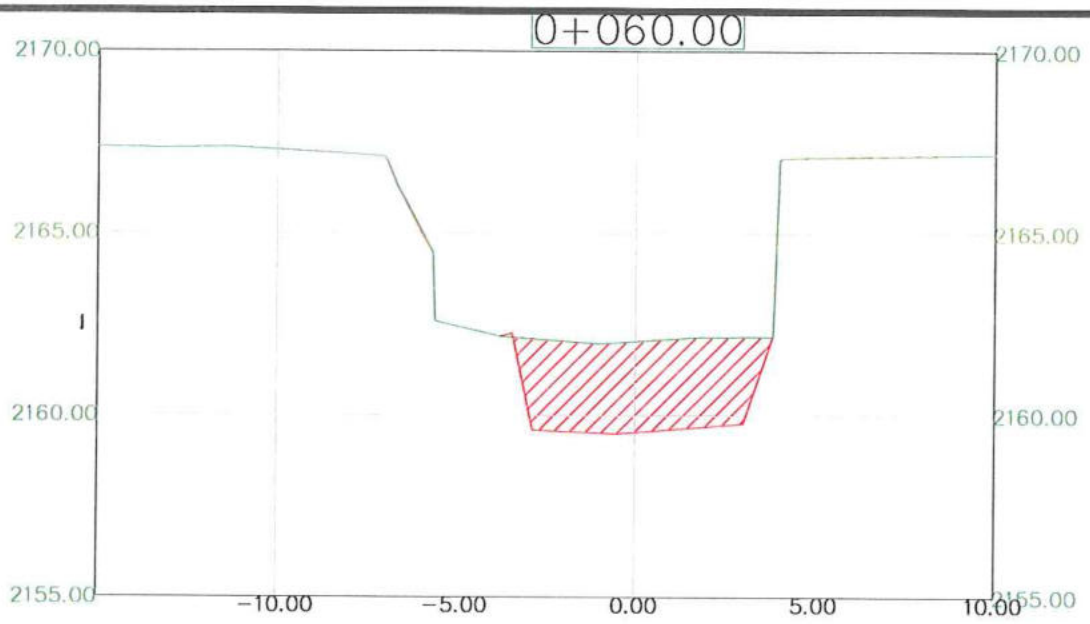

0+060.00
2170.00
2165.00
2160.00
2155.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00

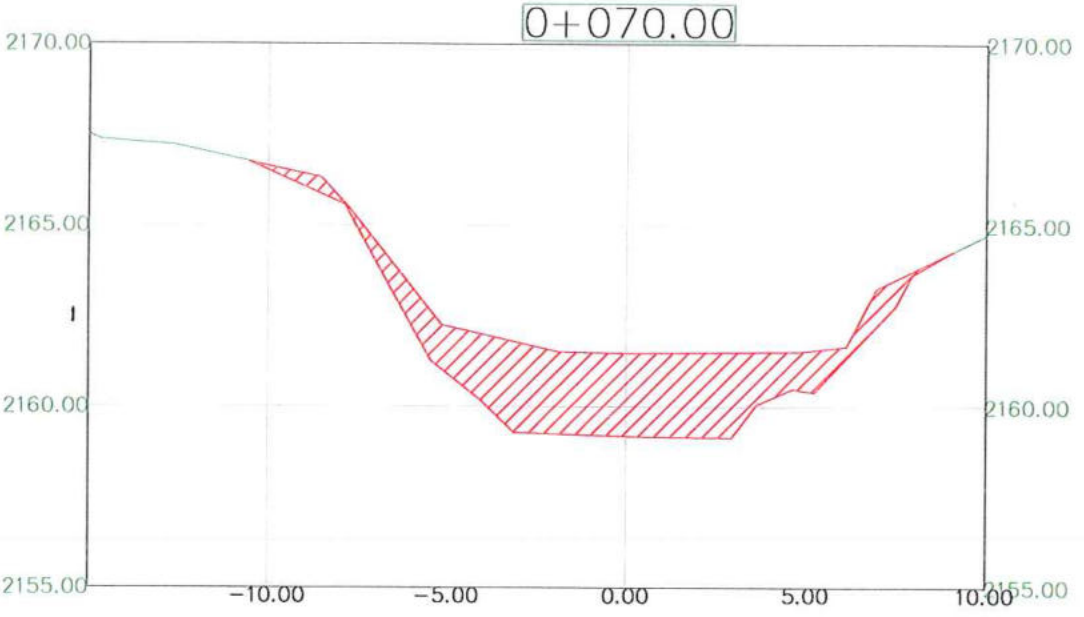

0+070.00
2170.00
2165.00
2160.00
2155.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00

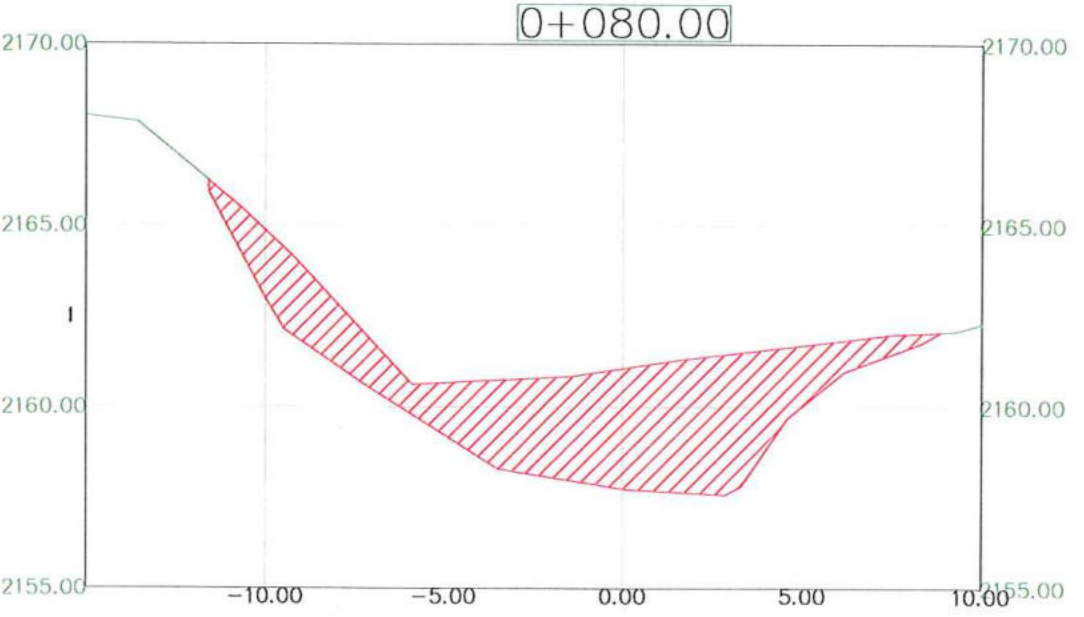

0+080.00
2170.00
2165.00
2160.00
2155.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00

SUDINCO

3 -05

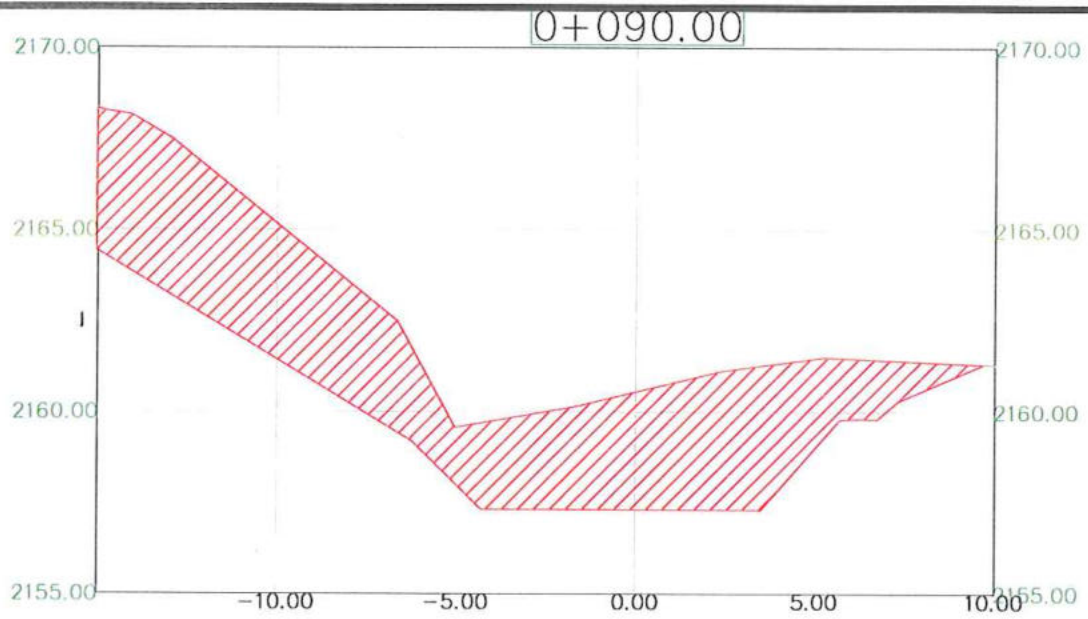


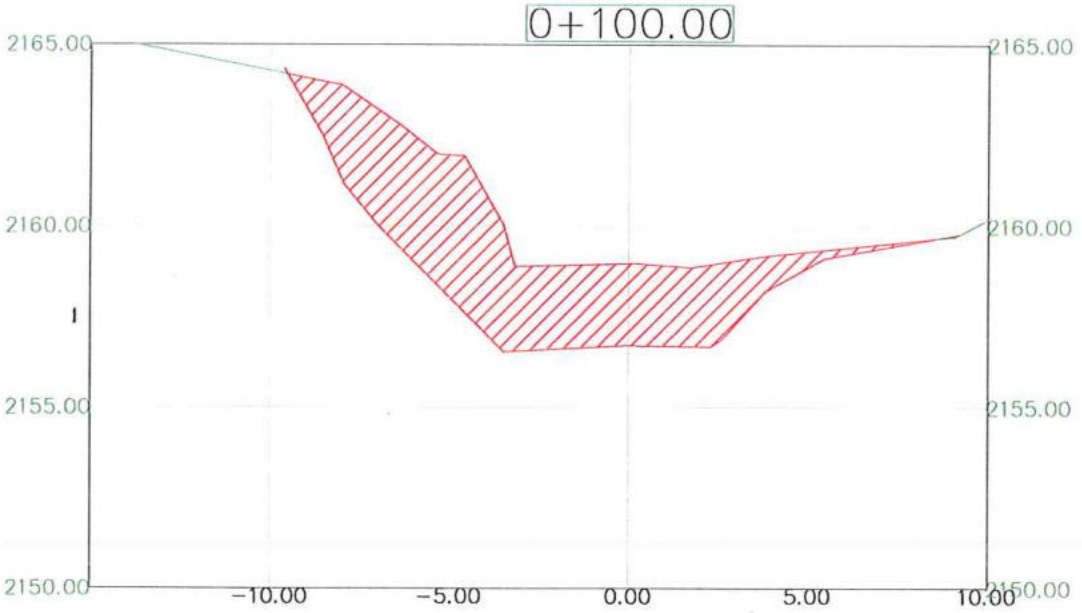

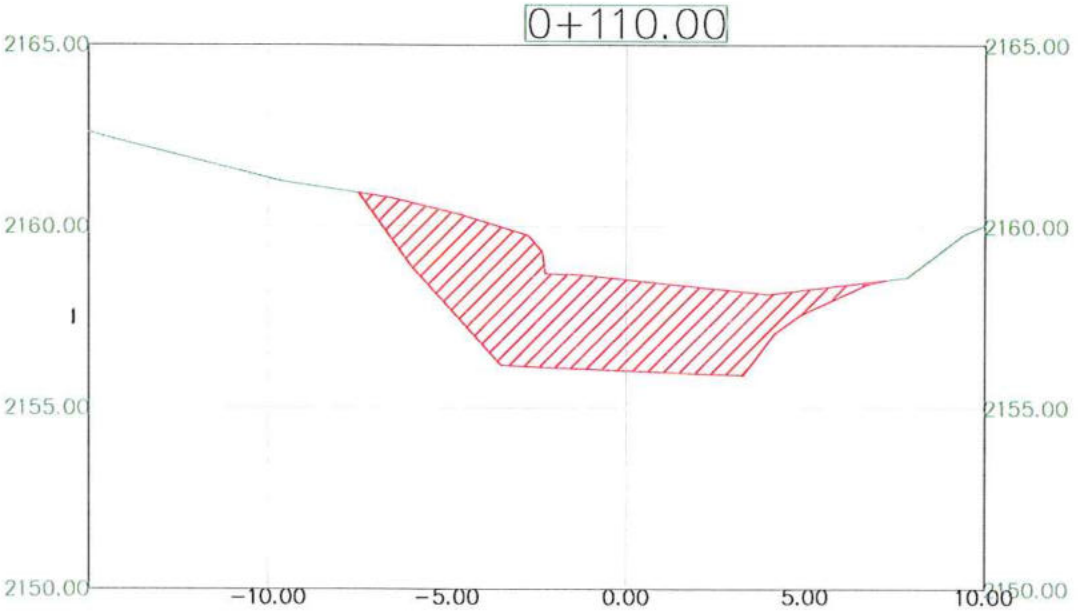

SUDINCO


SECCIONES TRANSVERSALES

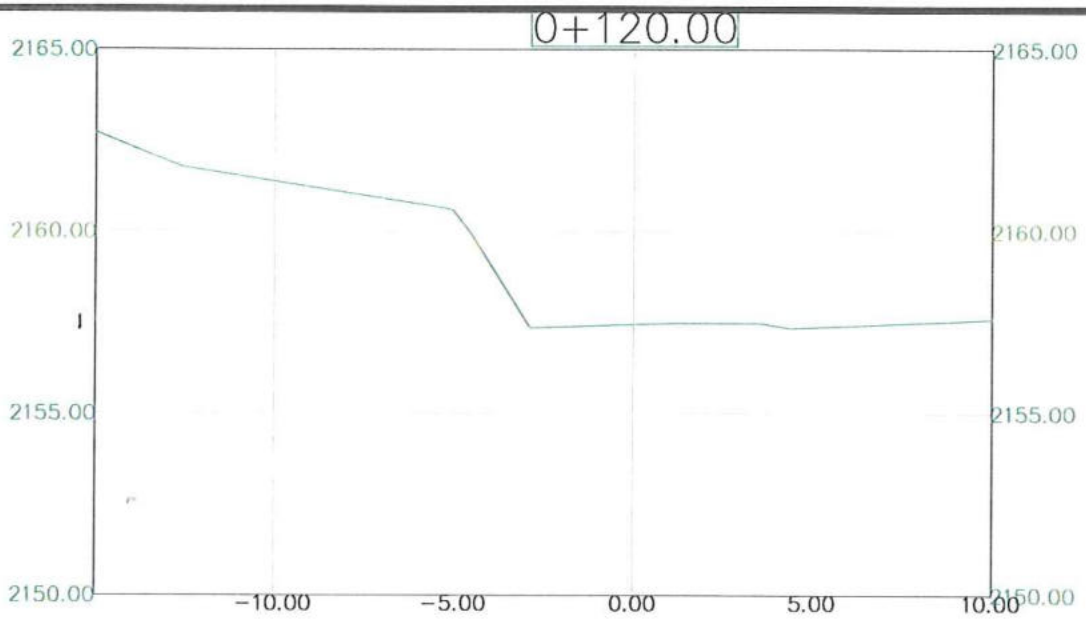

SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE NORTE

S -05

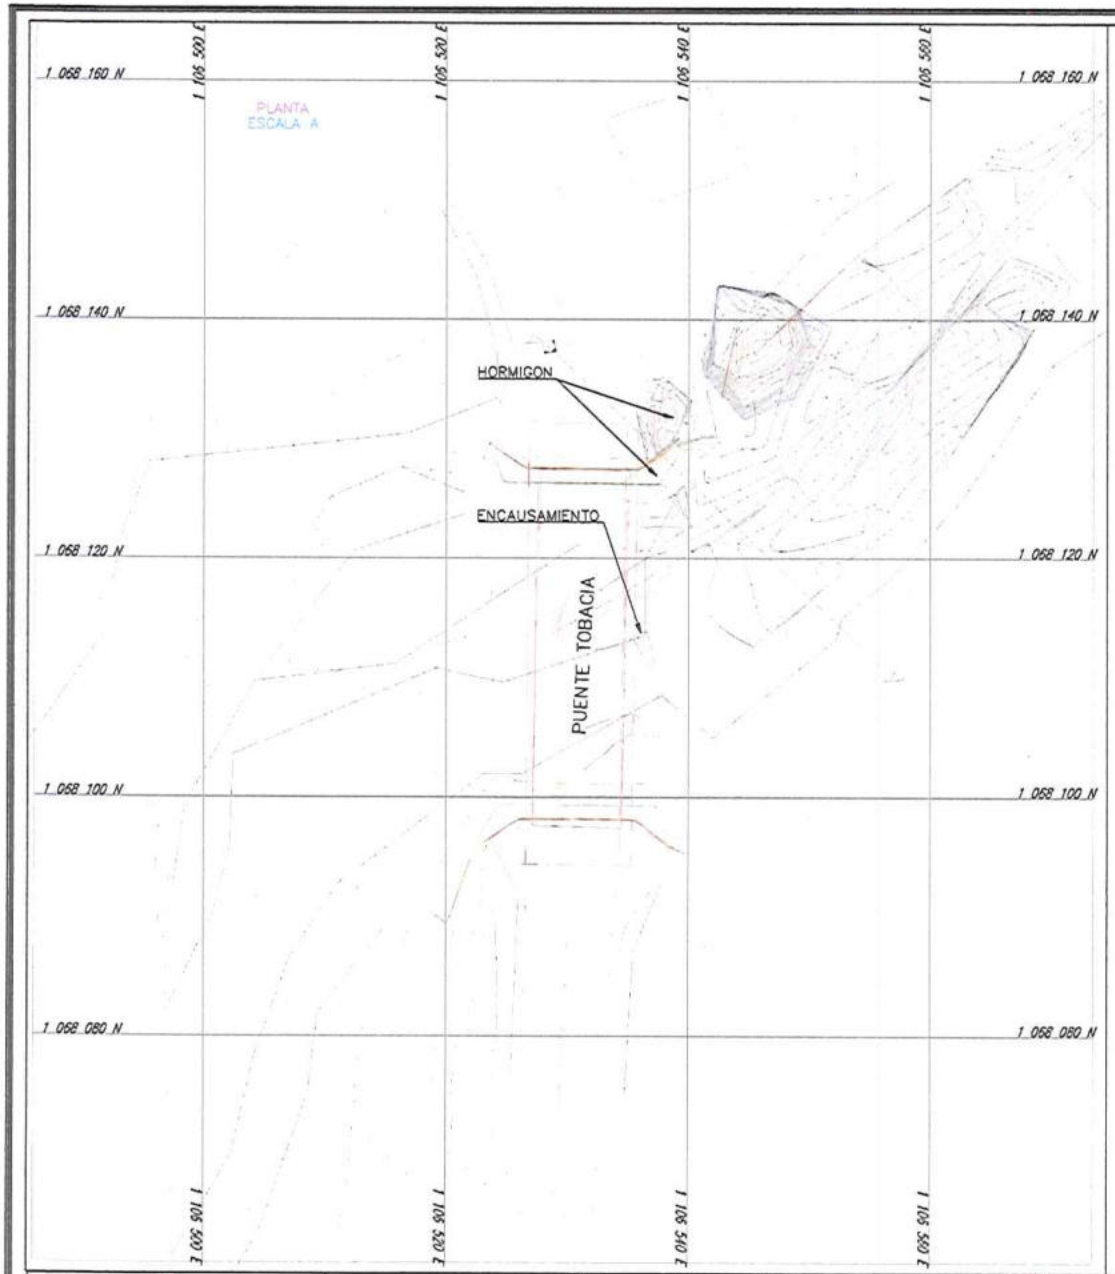

PERFIL A-A



Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
VOLUMEN DE CICLOPEO ZONA 2	1.000	1.000	21.59sq.m	1.04 Cu. M.	55.47 Cu. M.	54.43 Cu. M.<Fill>
VOLUMEN DE CICLOPEO ZONA 1	1.000	1.000	81.65sq.m	0.08 Cu. M.	321.17 Cu. M.	321.09 Cu. M.<Fill>
VOLUMEN DE ENCAUSAMIENTO	1.000	1.000	704.11sq.m	407.21 Cu. M.	0.11 Cu. M.	407.10 Cu. M.<Cut>
Totals			807.35sq.m	408.33 Cu. M.	376.75 Cu. M.	862.62 Cu. M.<Cut>

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUDINCO
CONSORCIO ECOVISION 180

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUENTE)-BOYACA - CHIQUINQUIRA - PAIPA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3".

PLANTA-PERFIL
PUENTE LA TOBACIA

1 -01

19/08/2025

CAD-PUENTE TOBACIA
k+500-ACTA-model.dwg

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	8848,40

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA - SECCIÓN TRANSVERSAL m2	ANCHO (m) (B)	ALTURA (m) (C)	VOLUMEN - SECCIÓN m3 (D=A*B*C)	TOTAL Redondeado especificacion INV 21,6	OBSERVACIONES
1	22+635,00	22+640,00	6006	5,00	2,16			0,00	0,00	Retiro de material de subrasante no competente para garantizar ancho de vía
1	22+640,00	22+645,00	6006	5,00	96,42			254,42	254,40	
1	22+645,00	22+650,00	6006	5,00	91,23			469,14	469,10	
1	22+650,00	22+655,00	6006	5,00	95,12			465,87	465,90	
1	22+655,00	22+660,00	6006	5,00	75,84			427,39	427,40	
1	22+660,00	22+665,00	6006	5,00	116,57			481,04	481,00	
1	22+665,00	22+670,00	6006	5,00	88,58			512,90	512,90	
1	22+670,00	22+675,00	6006	5,00	73,32			404,77	404,80	
1	22+675,00	22+680,00	6006	5,00	87,73			402,63	402,60	
1	22+680,00	22+685,00	6006	5,00	49,14			342,17	342,20	
1	22+685,00	22+690,00	6006	5,00	57,38			266,31	266,30	
1	22+690,00	22+695,00	6006	5,00	68,95			315,84	315,80	
1	22+695,00	22+700,00	6006	5,00	38,39			268,36	268,40	
1	22+700,00	22+705,00	6006	5,00	40,97			198,39	198,40	
1	22+705,00	22+710,00	6006	5,00	28,44			173,52	173,50	
1	22+710,00	22+715,00	6006	5,00	21,39			124,59	124,60	
1	22+715,00	22+720,00	6006	5,00	13,08			86,18	86,20	
1	22+720,00	22+725,00	6006	5,00	0,00			32,69	32,70	
1	24+350,00	24+350,00	6006	10,70	243,10			157,12	157,10	Excavación para conformación acceso
1	25+940,00	25+940,00	6006	30,00	490,32			220,91	220,90	Excavación para conformación acceso
1	55+950,00	55+960,00	6009	10,00		4,00	1,60	64,00	64,00	Excavación para conformación acceso costado derecho
1	54+660,00	54+680,00	6009	20,00		5,50	1,72	189,10	189,10	Excavación para conformación acceso costado derecho
1	53+750,00	53+750,00	6009		0,00			0,00	0,00	Atención emergencia Quebrada la Honda. Obras de encausamiento 65% corresponde a material comun. Secciones topográficas del PR0+000 - PR0+120
1	53+750,00	53+750,00	6009		51,38			256,90	167,00	
1	53+750,00	53+750,00	6009		35,84			436,10	283,50	
1	53+750,00	53+750,00	6009		55,08			454,40	295,40	
1	53+750,00	53+750,00	6009		47,44			480,33	312,20	
1	53+750,00	53+750,00	6009		18,82			330,15	214,60	
1	53+750,00	53+750,00	6009		16,17			170,99	111,10	
1	53+750,00	53+750,00	6009		25,73			209,84	136,40	
1	53+750,00	53+750,00	6009		41,53			345,02	224,30	
1	53+750,00	53+750,00	6009		71,67			566,03	367,90	
1	53+750,00	53+750,00	6009		34,91			532,91	346,40	
1	53+750,00	53+750,00	6009		29,23			308,79	200,70	
1	53+750,00	53+750,00	6009		0,00			135,35	88,00	
1	93+500,00	93+500,00	6009	23,00	704,11			487,21	243,60	Atención emergencia Quebrada La Tobasia. Obras de encausamiento 50% corresponde a material comun

TOTAL	8848,4
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	8848,4
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	8848,4

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO


CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	8848,40
210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA



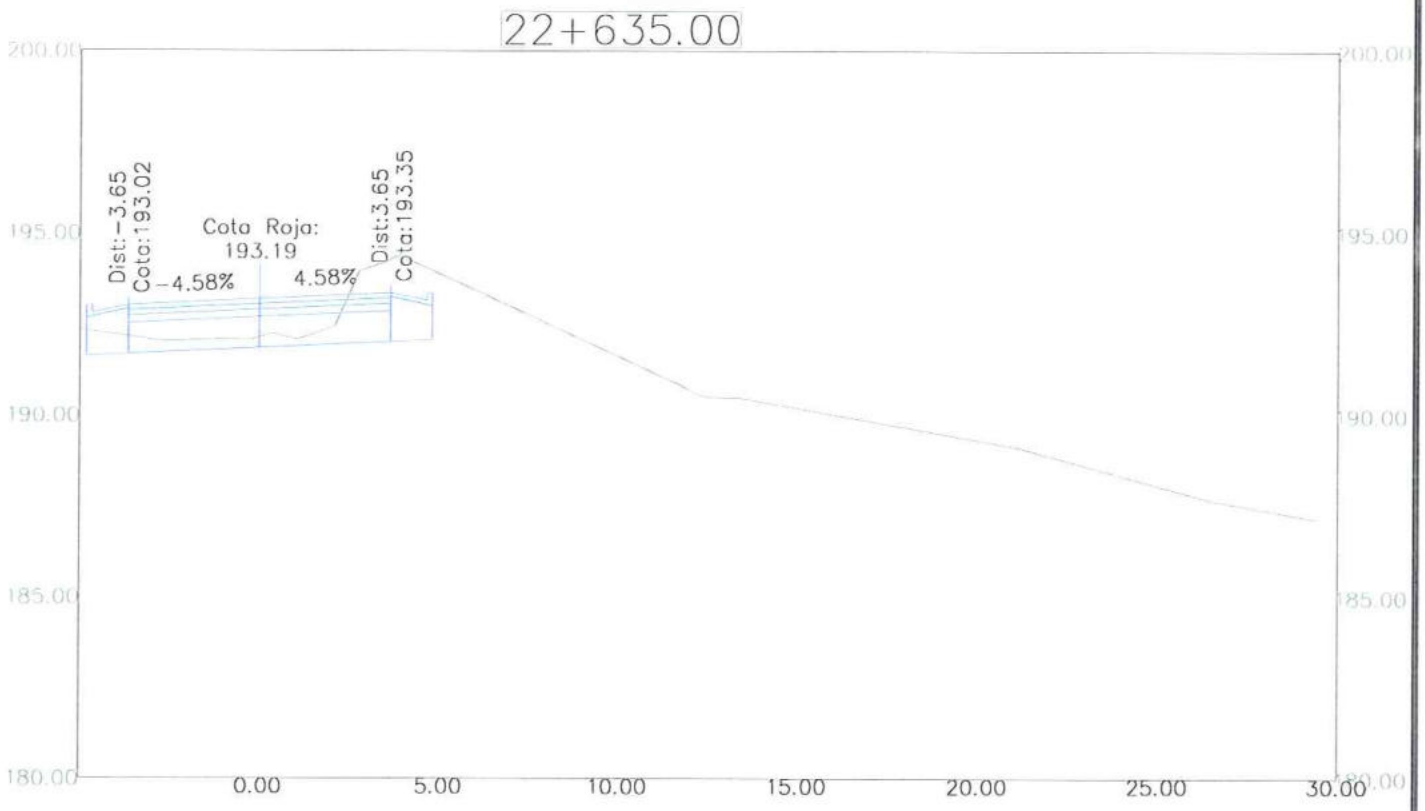

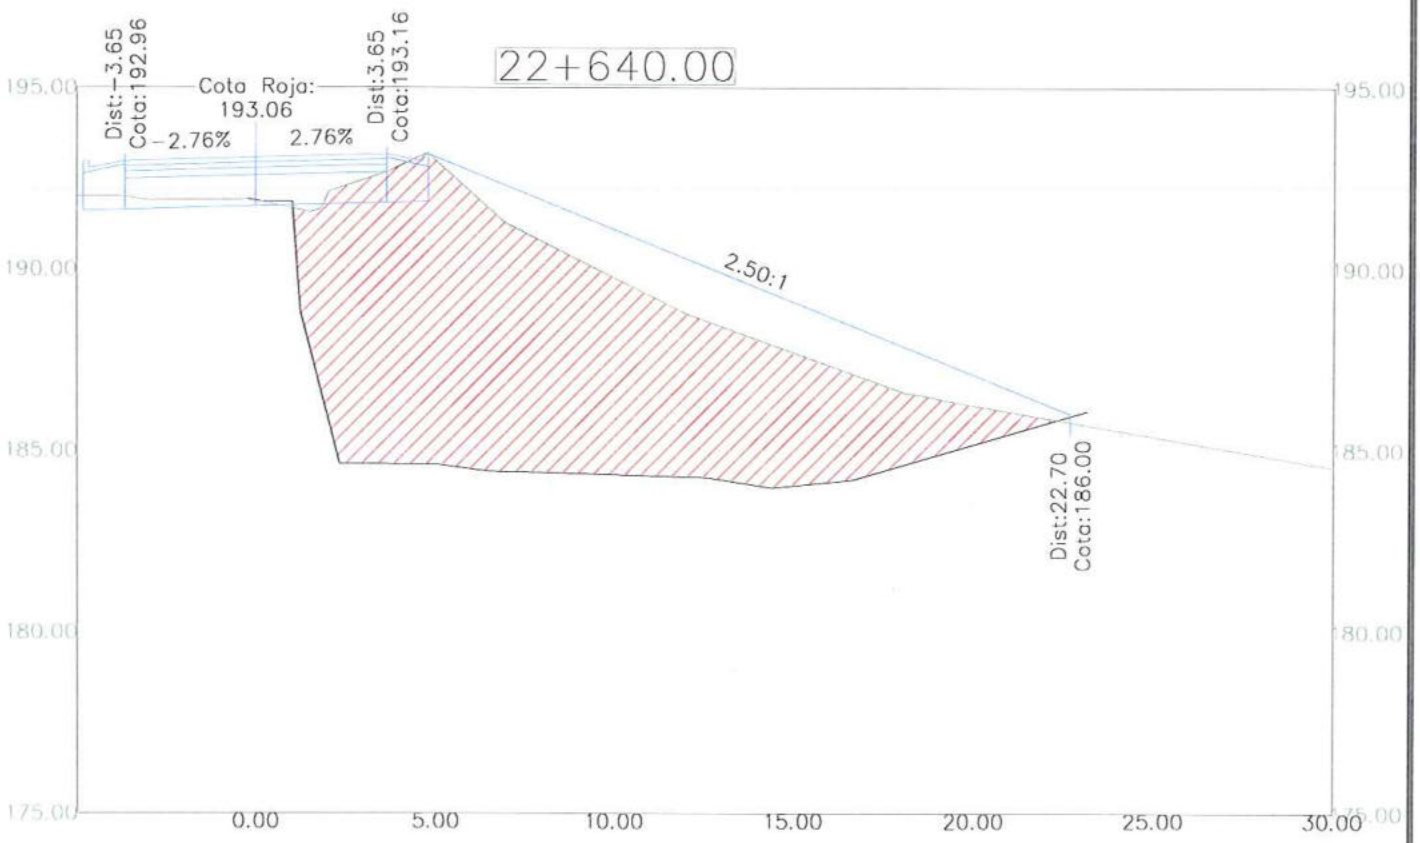
4/4


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE BAJA

1 -09

18-08-2025

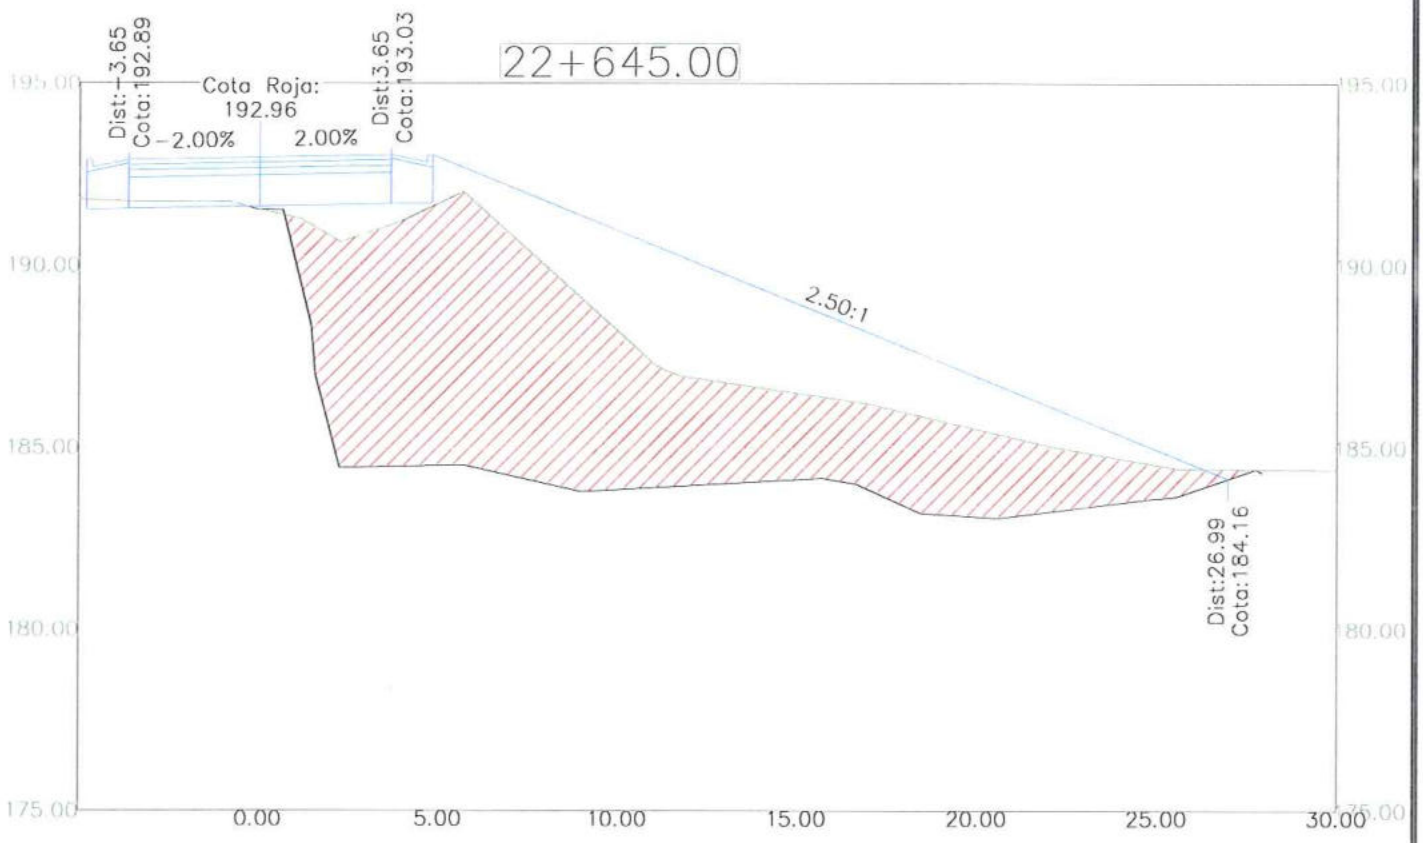

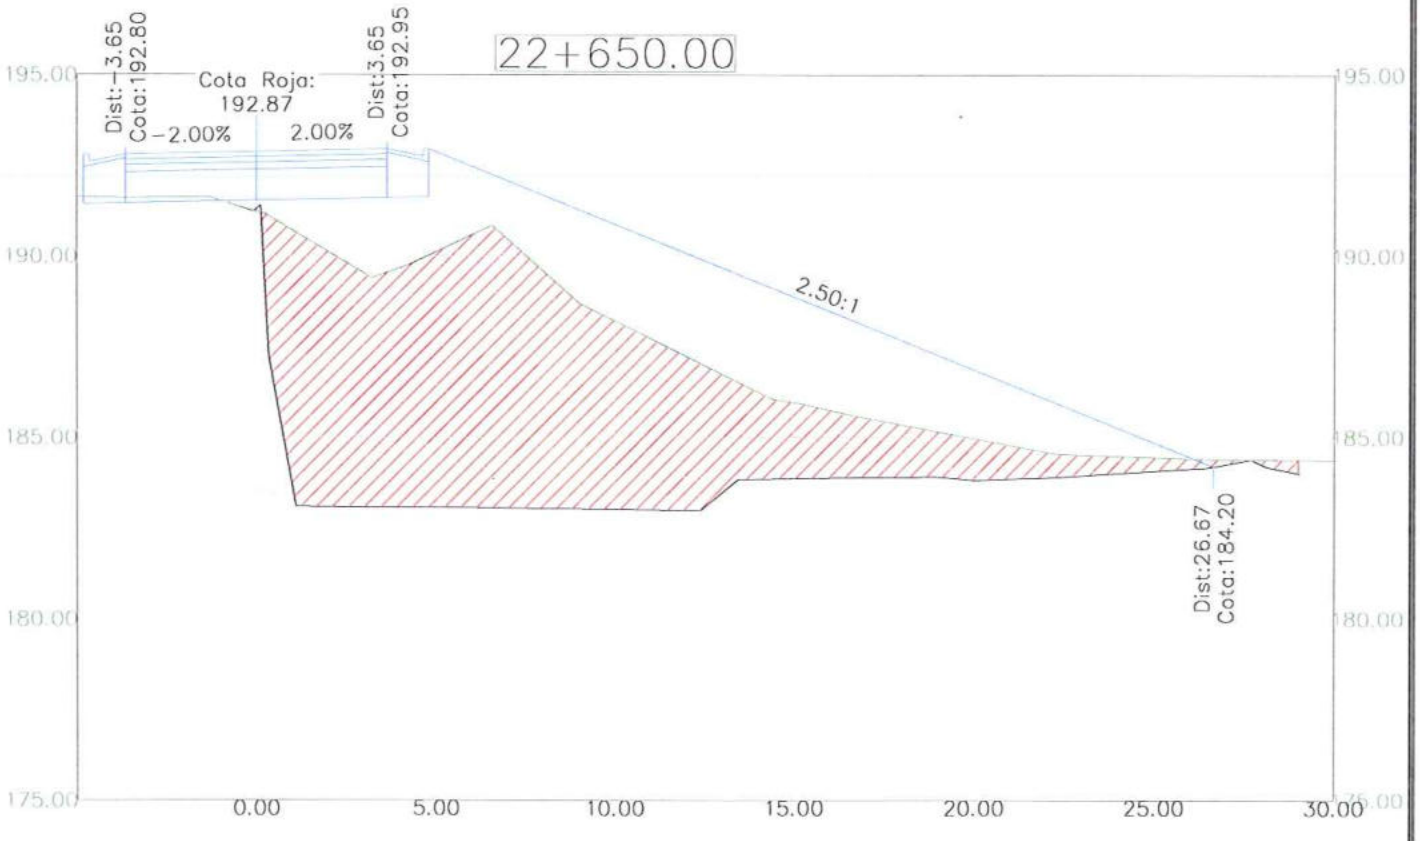


47


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES

2 -09


18-08-2025

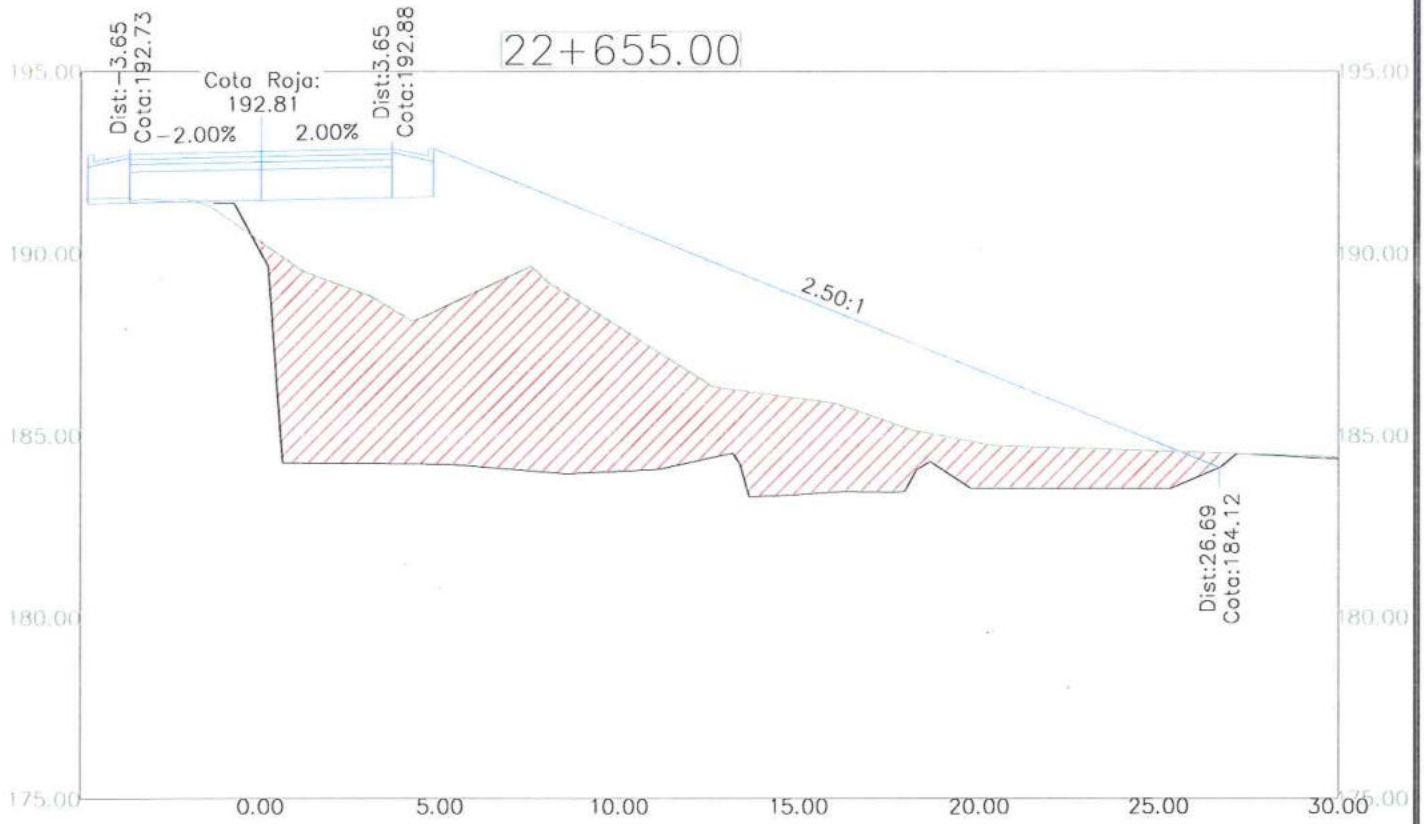

22+655.00
Dist:-3.65
Cota:192.73
Cota Roja:
192.81
Dist:3.65
Cota:192.88
-2.00%
2.00%
2.50:1
Dist:26.69
Cota:184.12
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

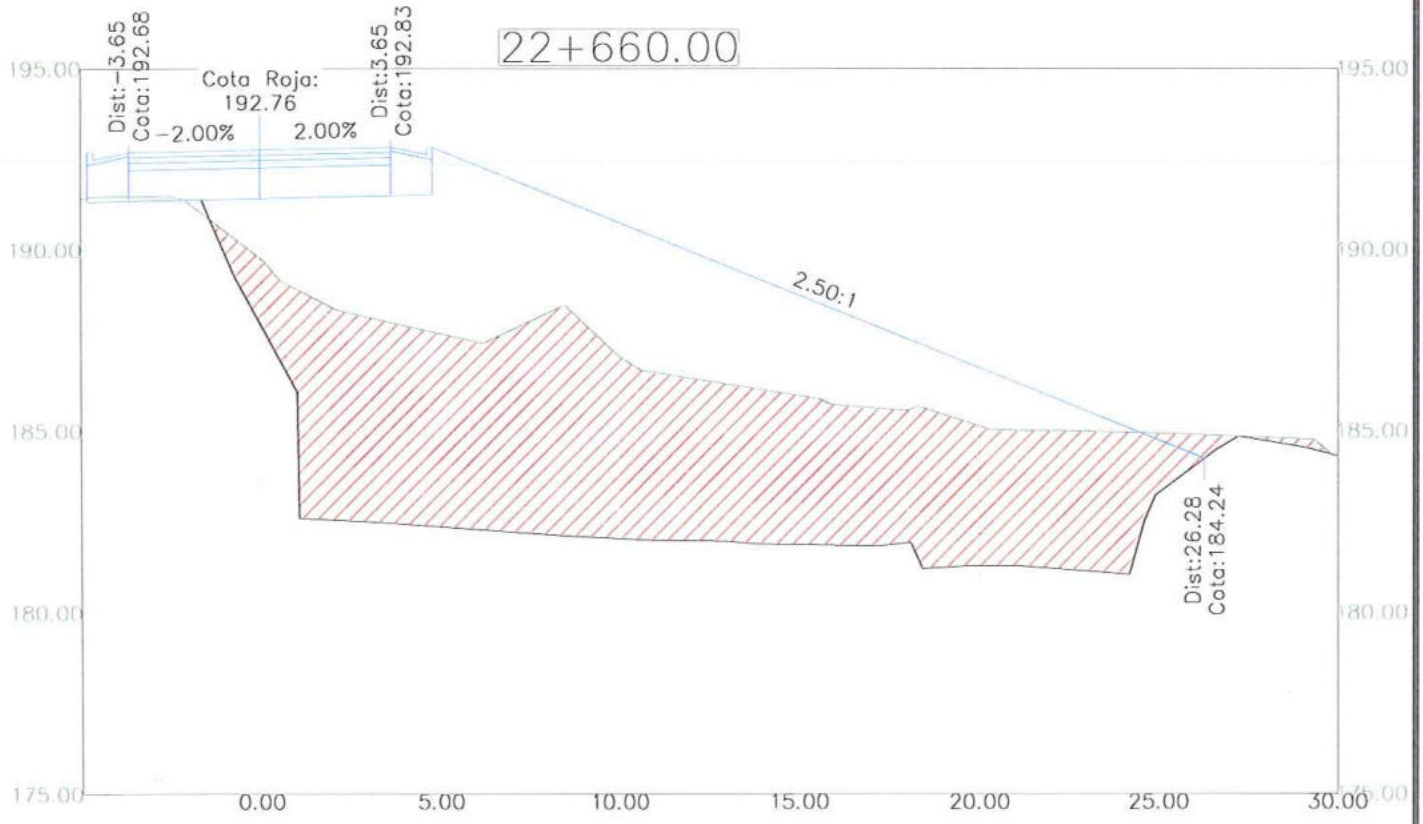

22+660.00
Dist:-3.65
Cota:192.68
Cota Roja:
192.76
Dist:3.65
Cota:192.83
-2.00%
2.00%
2.50:1
Dist:26.28
Cota:184.24
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00


SUDINCO

3 -09

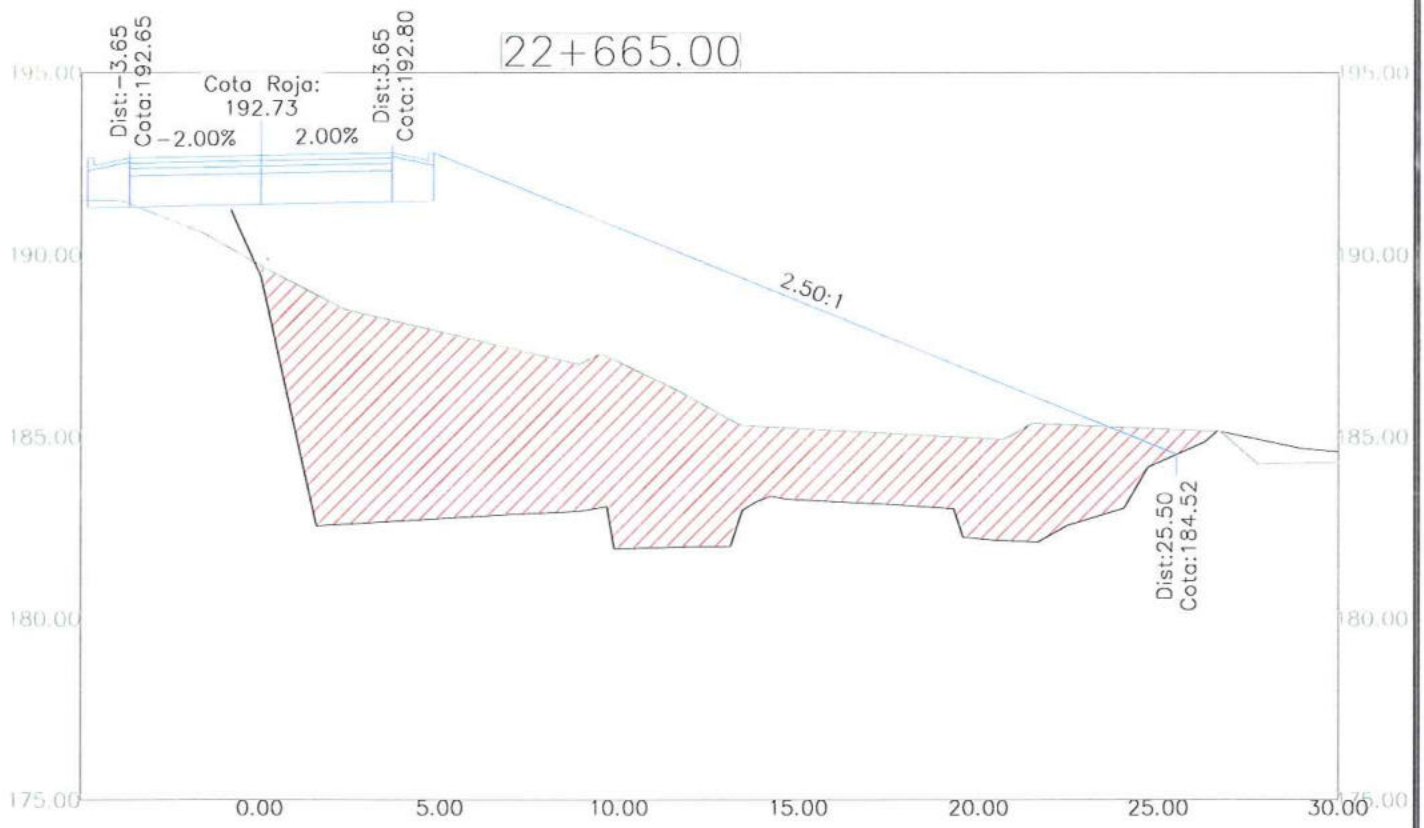
22+665.00
Dist:-3.65
Cota:192.65
Cota Roja:
192.73
Dist:3.65
Cota:192.80
-2.00%
2.00%
2.50:1
Dist:25.50
Cota:184.52
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

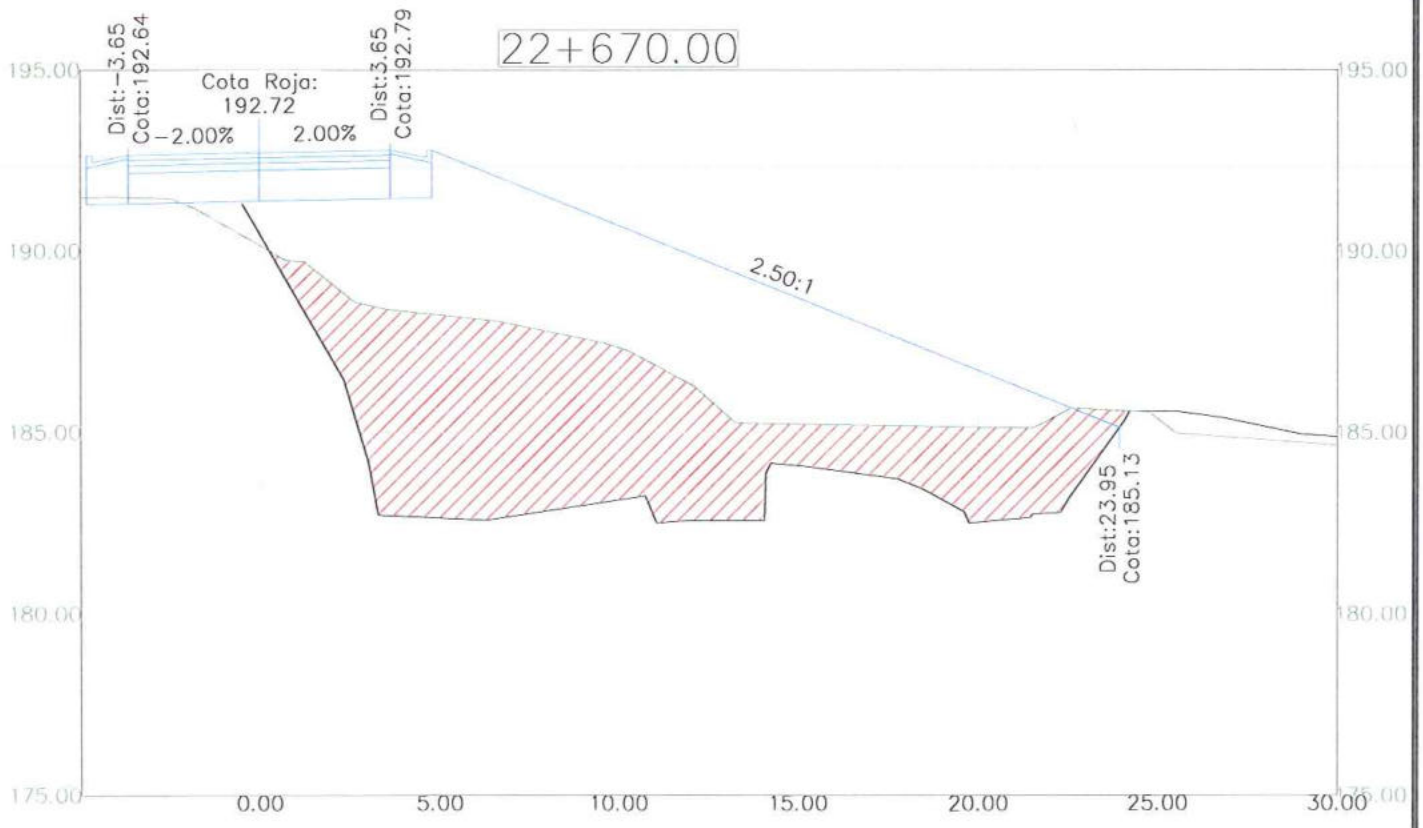

22+670.00
Dist:-3.65
Cota:192.64
Cota Roja:
192.72
Dist:3.65
Cota:192.79
-2.00%
2.00%
2.50:1
Dist:23.95
Cota:185.13
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

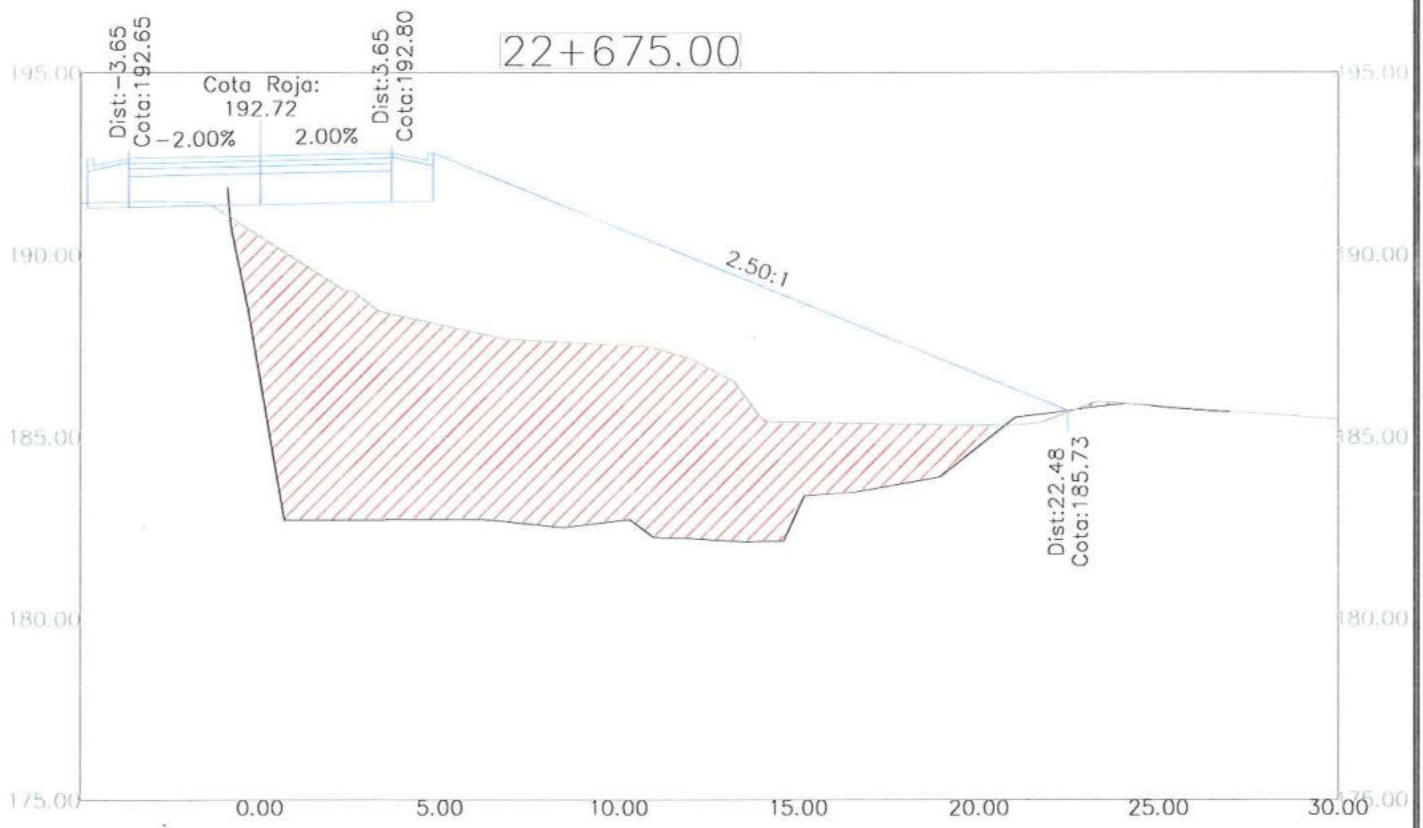

22+675.00
Dist:-3.65
Cota:192.65
Cota Roja:
192.72
Dist:3.65
Cota:192.80
-2.00%
2.00%
2.50:1
Dist:22.48
Cota:185.73
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

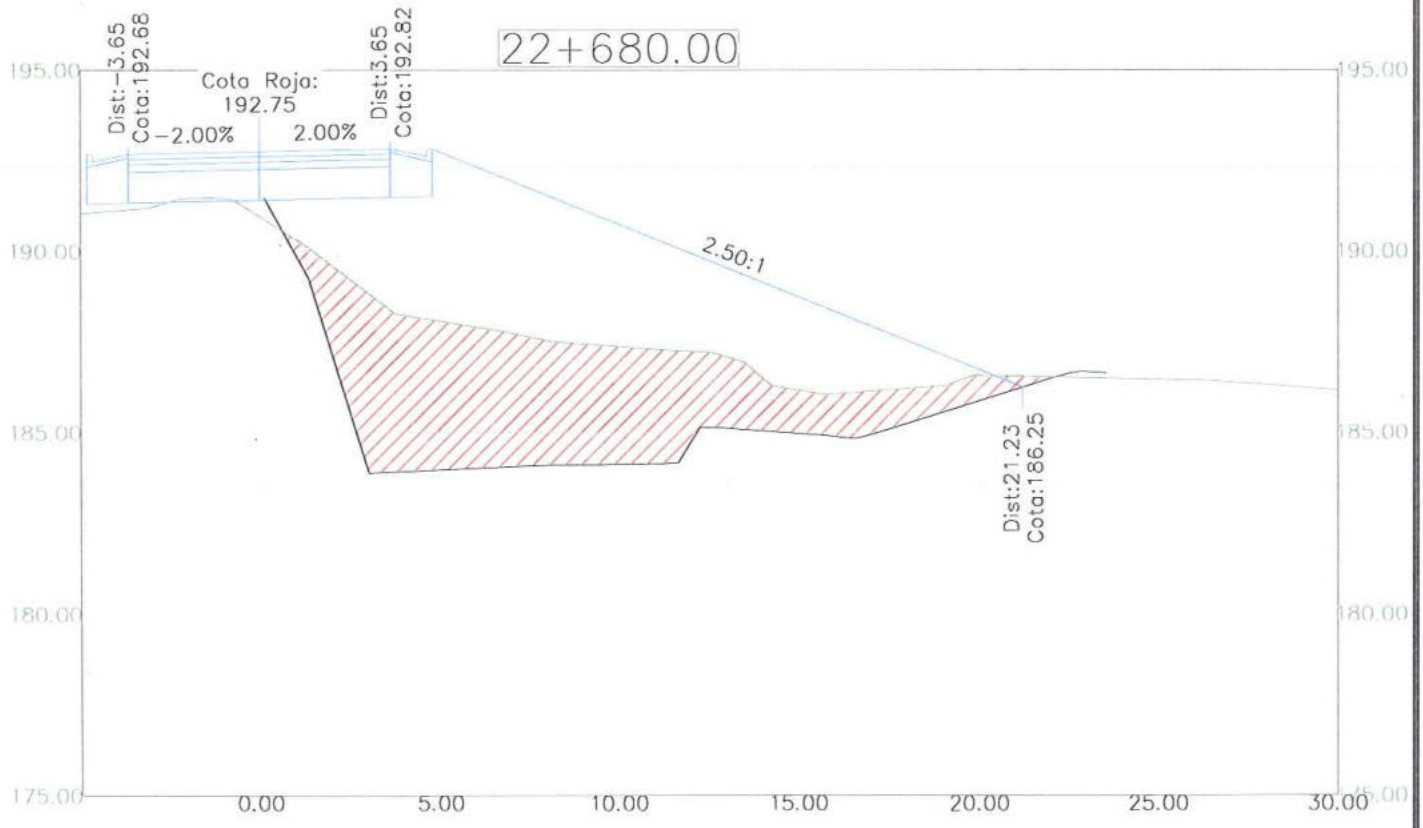
22+680.00
Dist:-3.65
Cota:192.68
Cota Roja:
192.75
Dist:3.65
Cota:192.82
-2.00%
2.00%
2.50:1
Dist:21.23
Cota:186.25
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

SUDINCO

5 -09

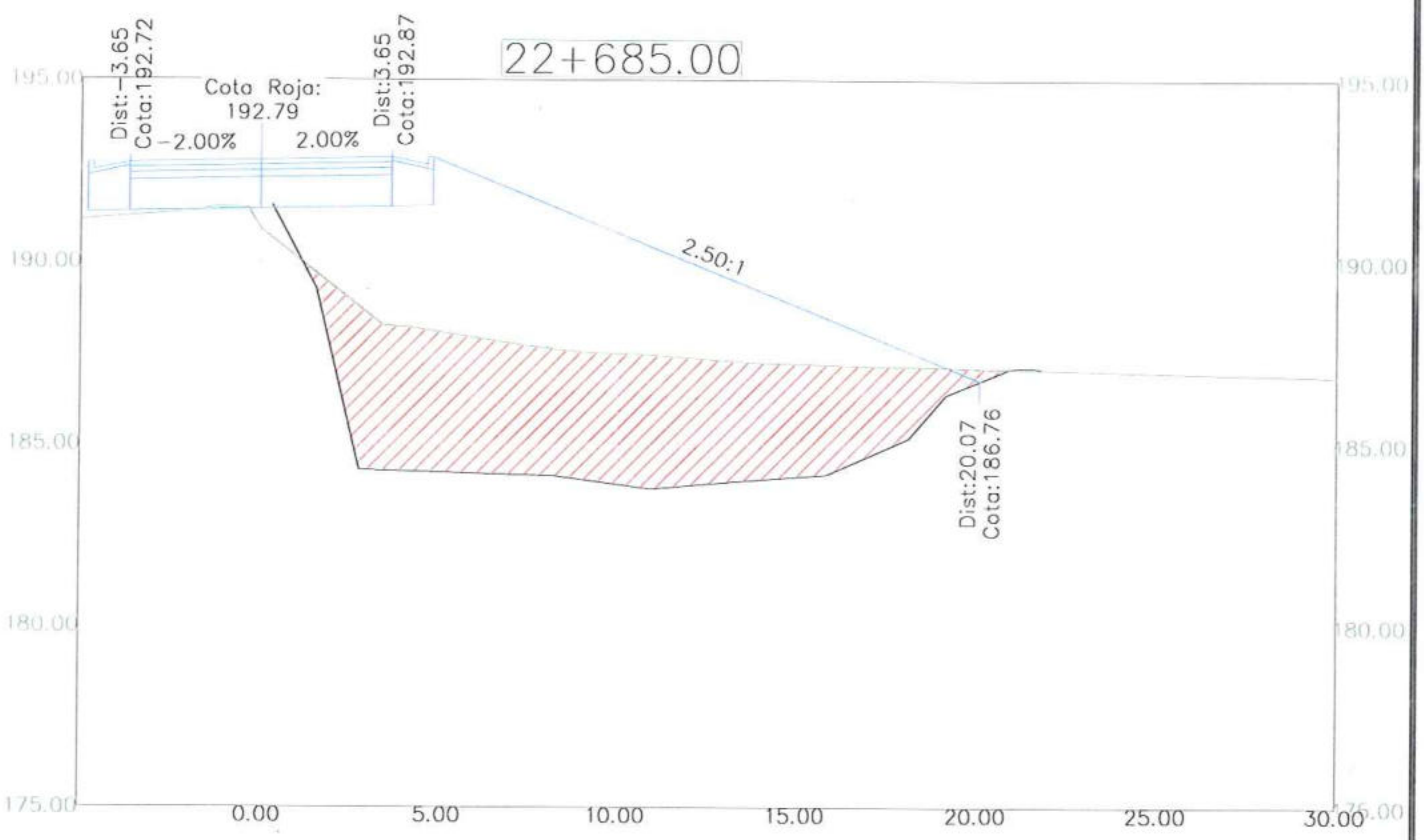


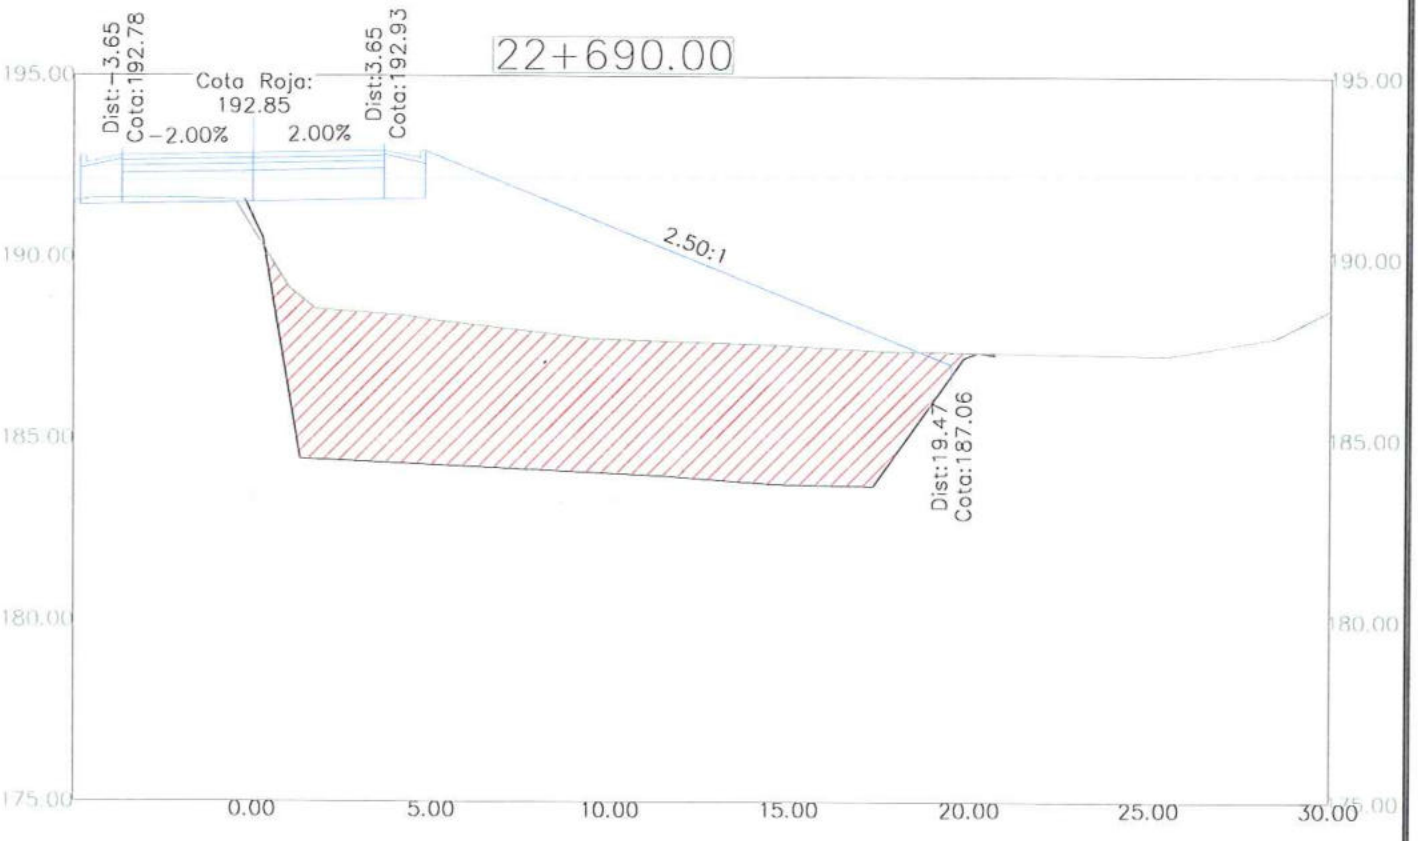


4J


SUDINCO

6 -09

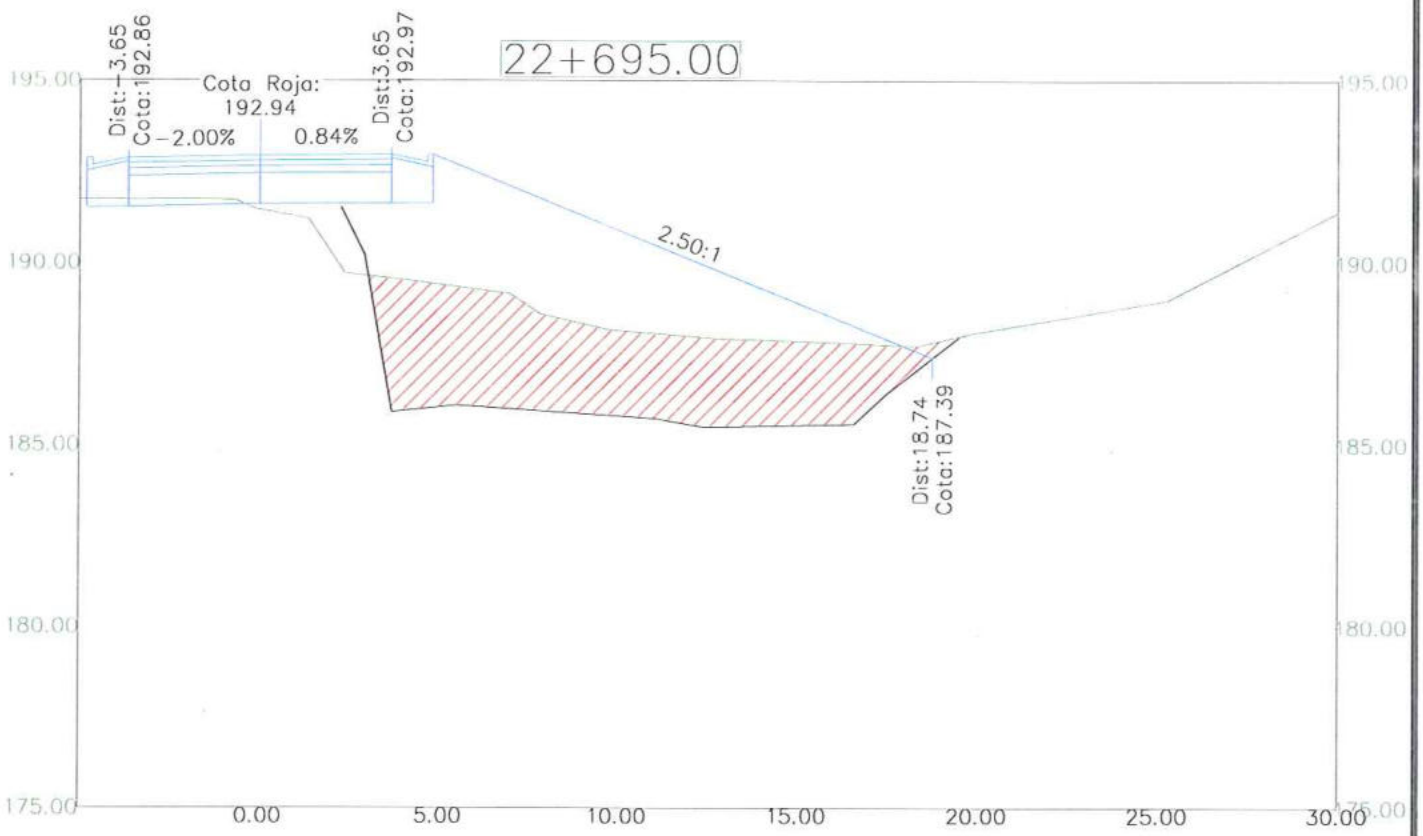

22+695.00
Dist:-3.65
Cota:192.86
Cota Roja:
192.94
Dist:3.65
Cota:192.97
-2.00%
0.84%
2.50:1
Dist:18.74
Cota:187.39
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

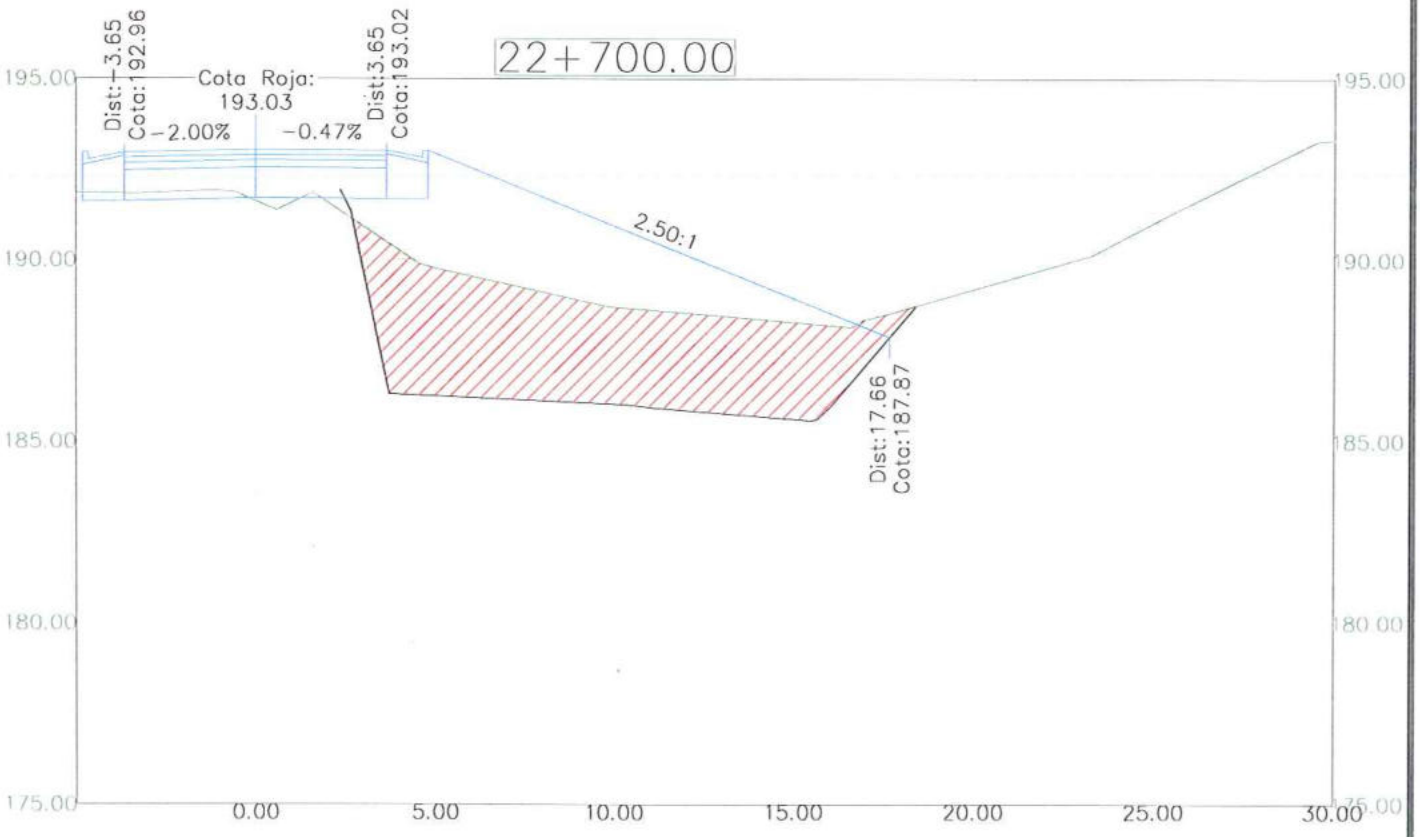
22+700.00
Dist:-3.65
Cota:192.96
Cota Roja:
193.03
Dist:3.65
Cota:193.02
-2.00%
-0.47%
2.50:1
Dist:17.66
Cota:187.87
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

22+705.00

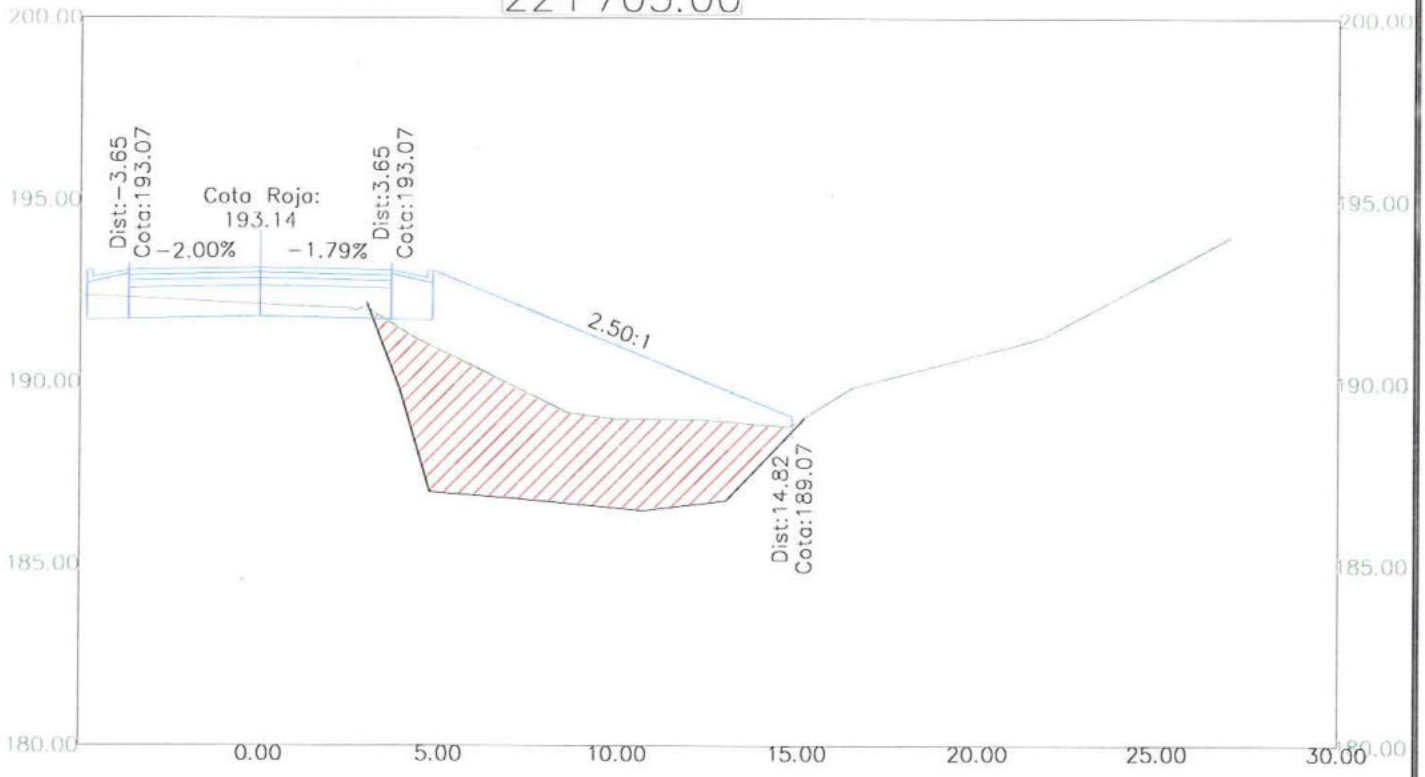

22+710.00

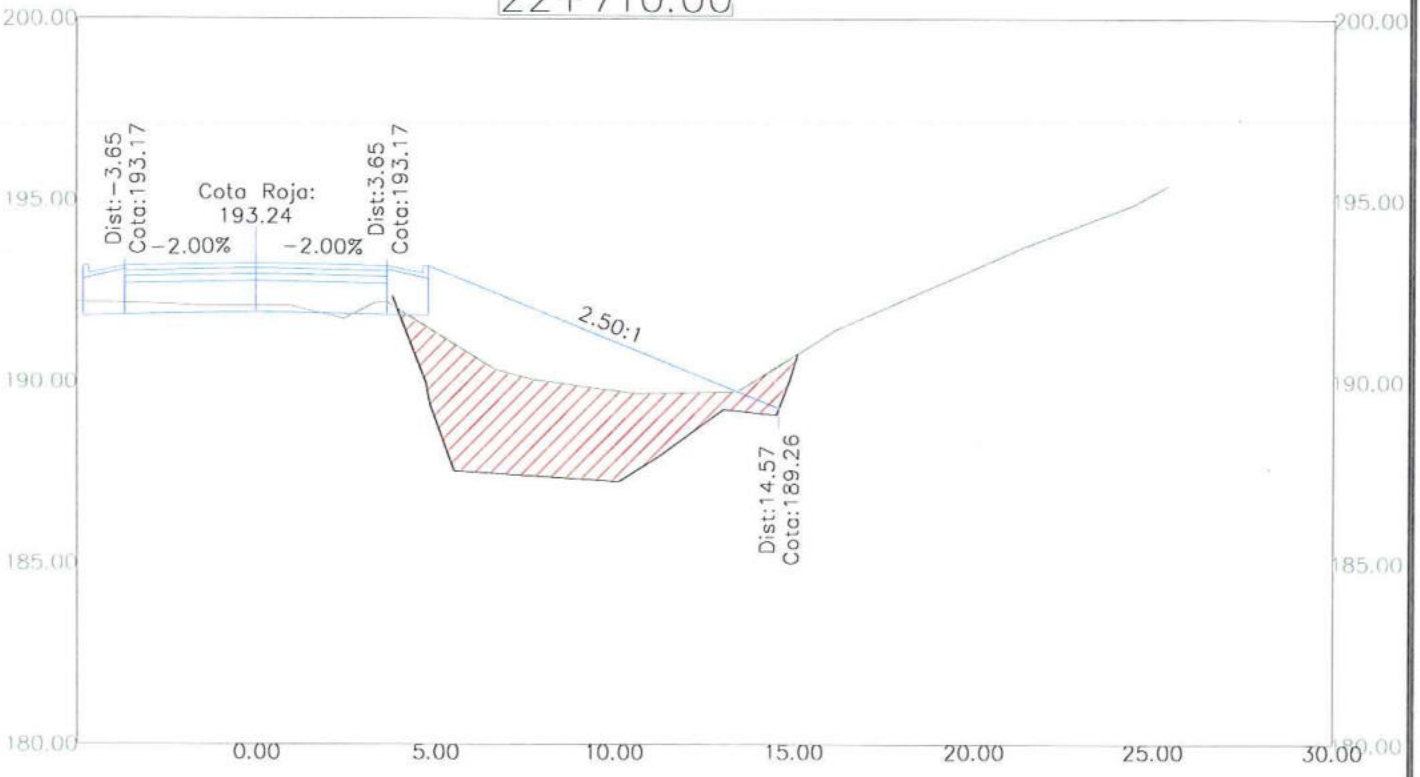


LMJ

SUDINCO


SECCIONES TRANSVERSALES

S -09

22+715.00

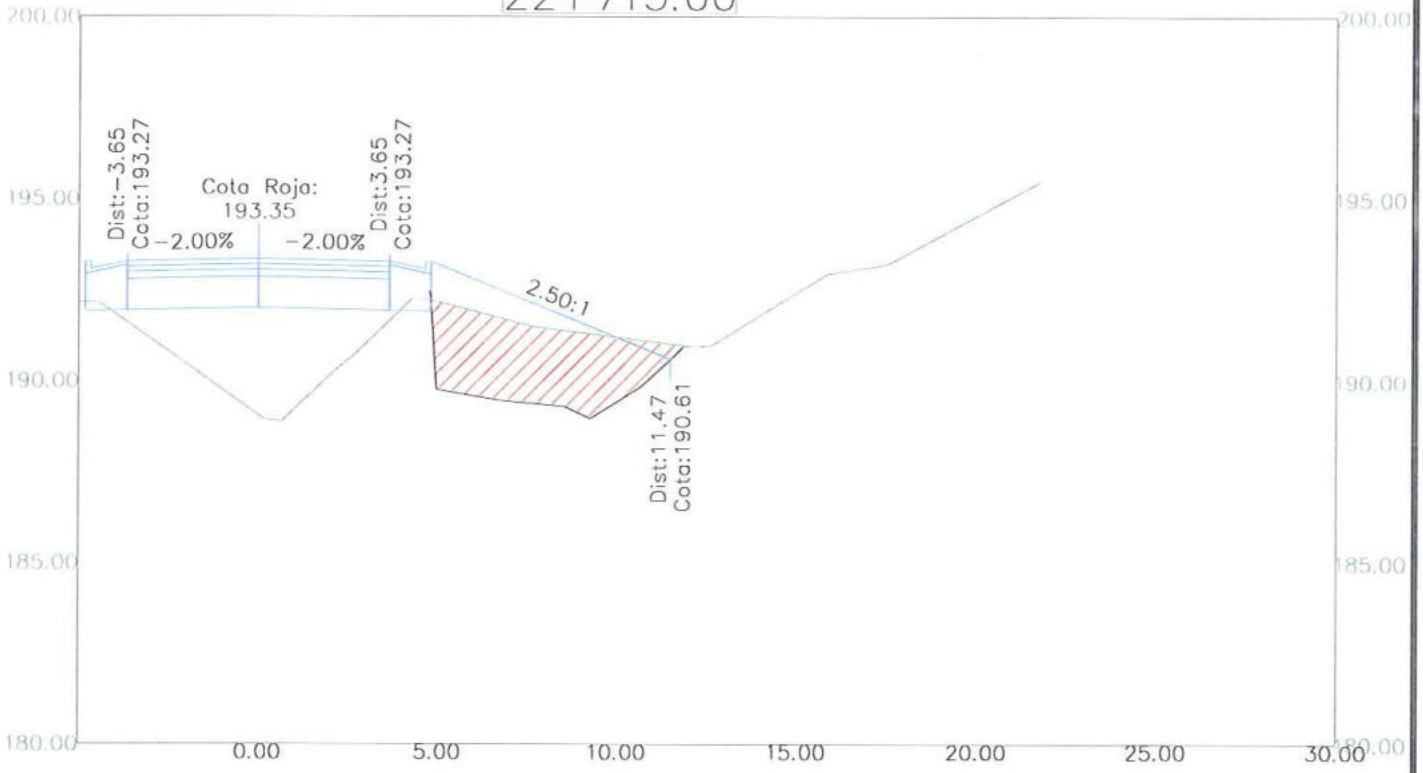


22+720.00

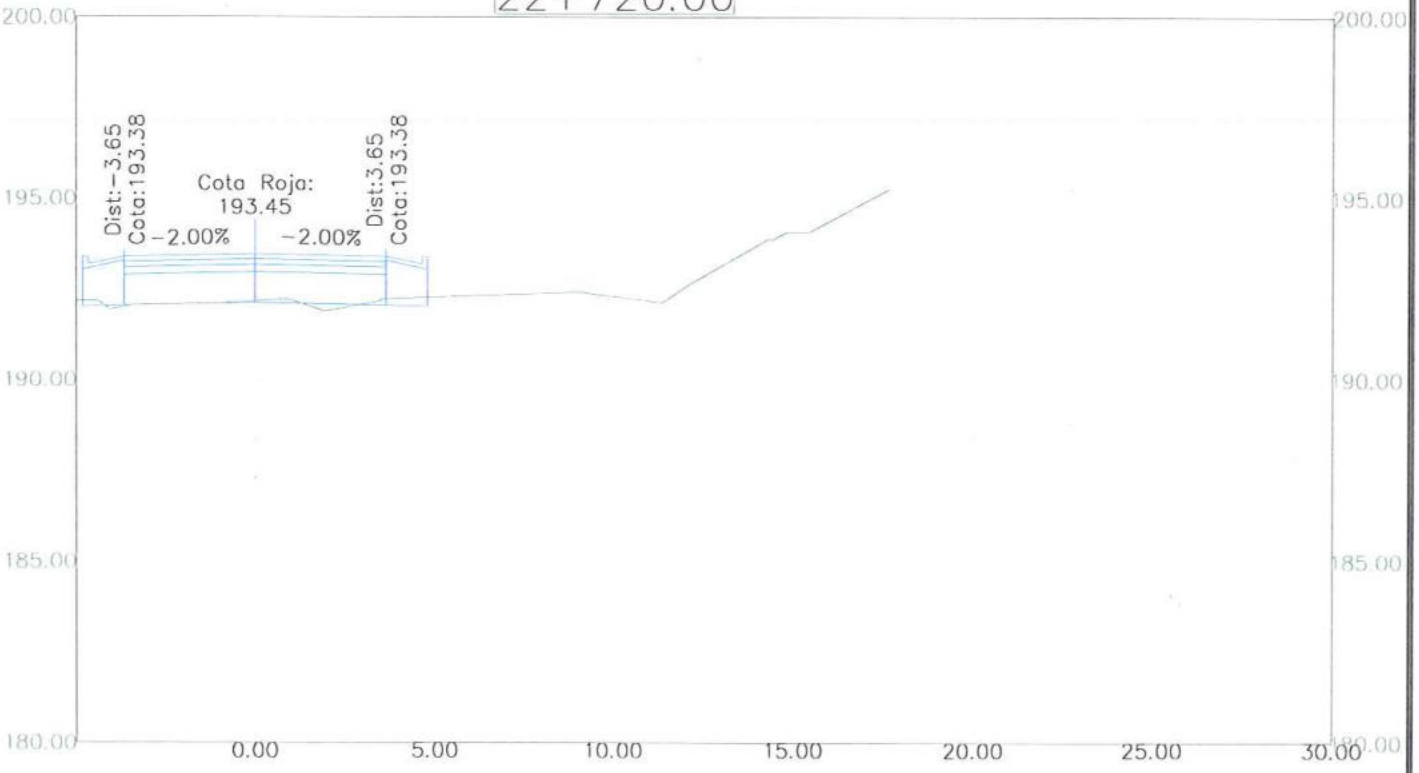

SUDINCO

9 -09

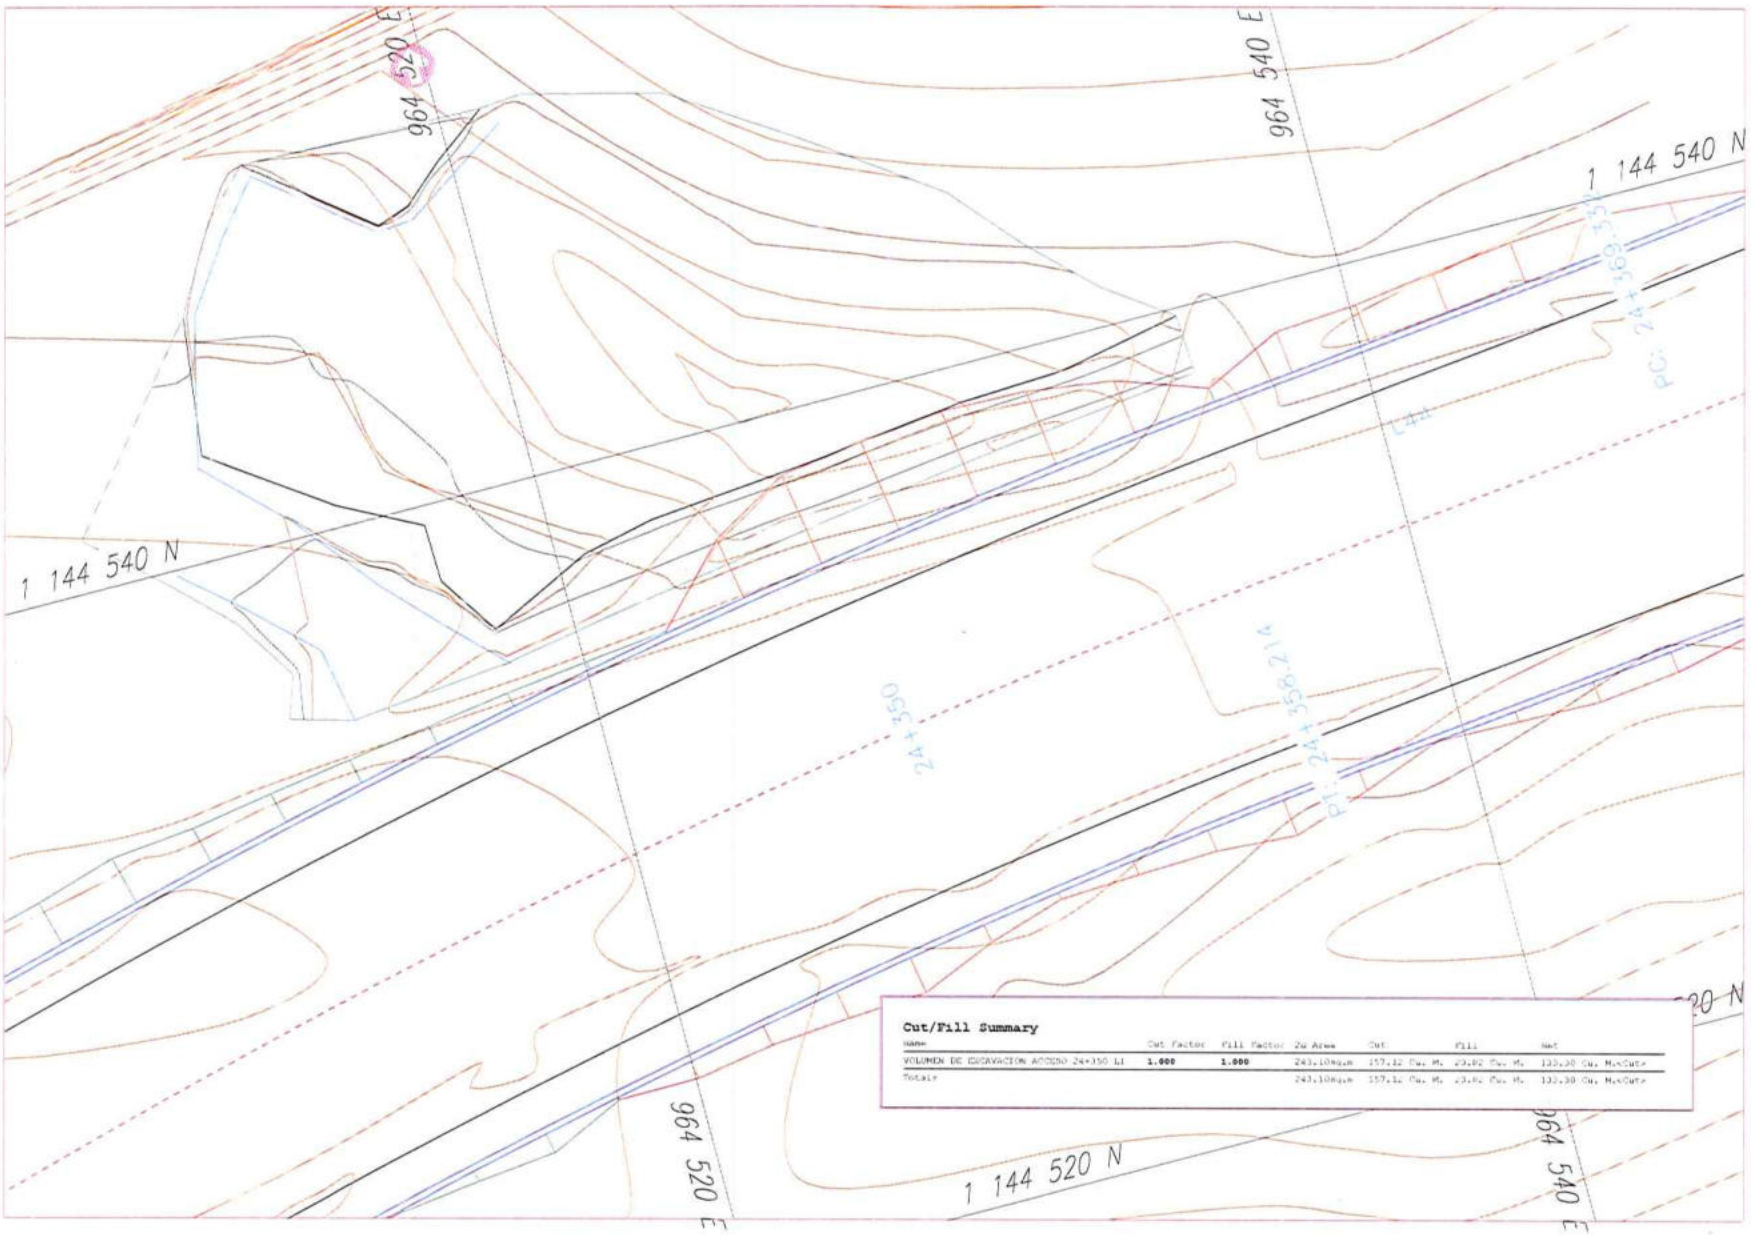

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUENTE BOYACÁ – DTANCHE – CHIQUINQUIRÁ – PAIPA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAPÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3".

DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6006
MEJORAMIENTO
6006 BAJA

SUDINCO

O.T.N. SAS
Consultores

001

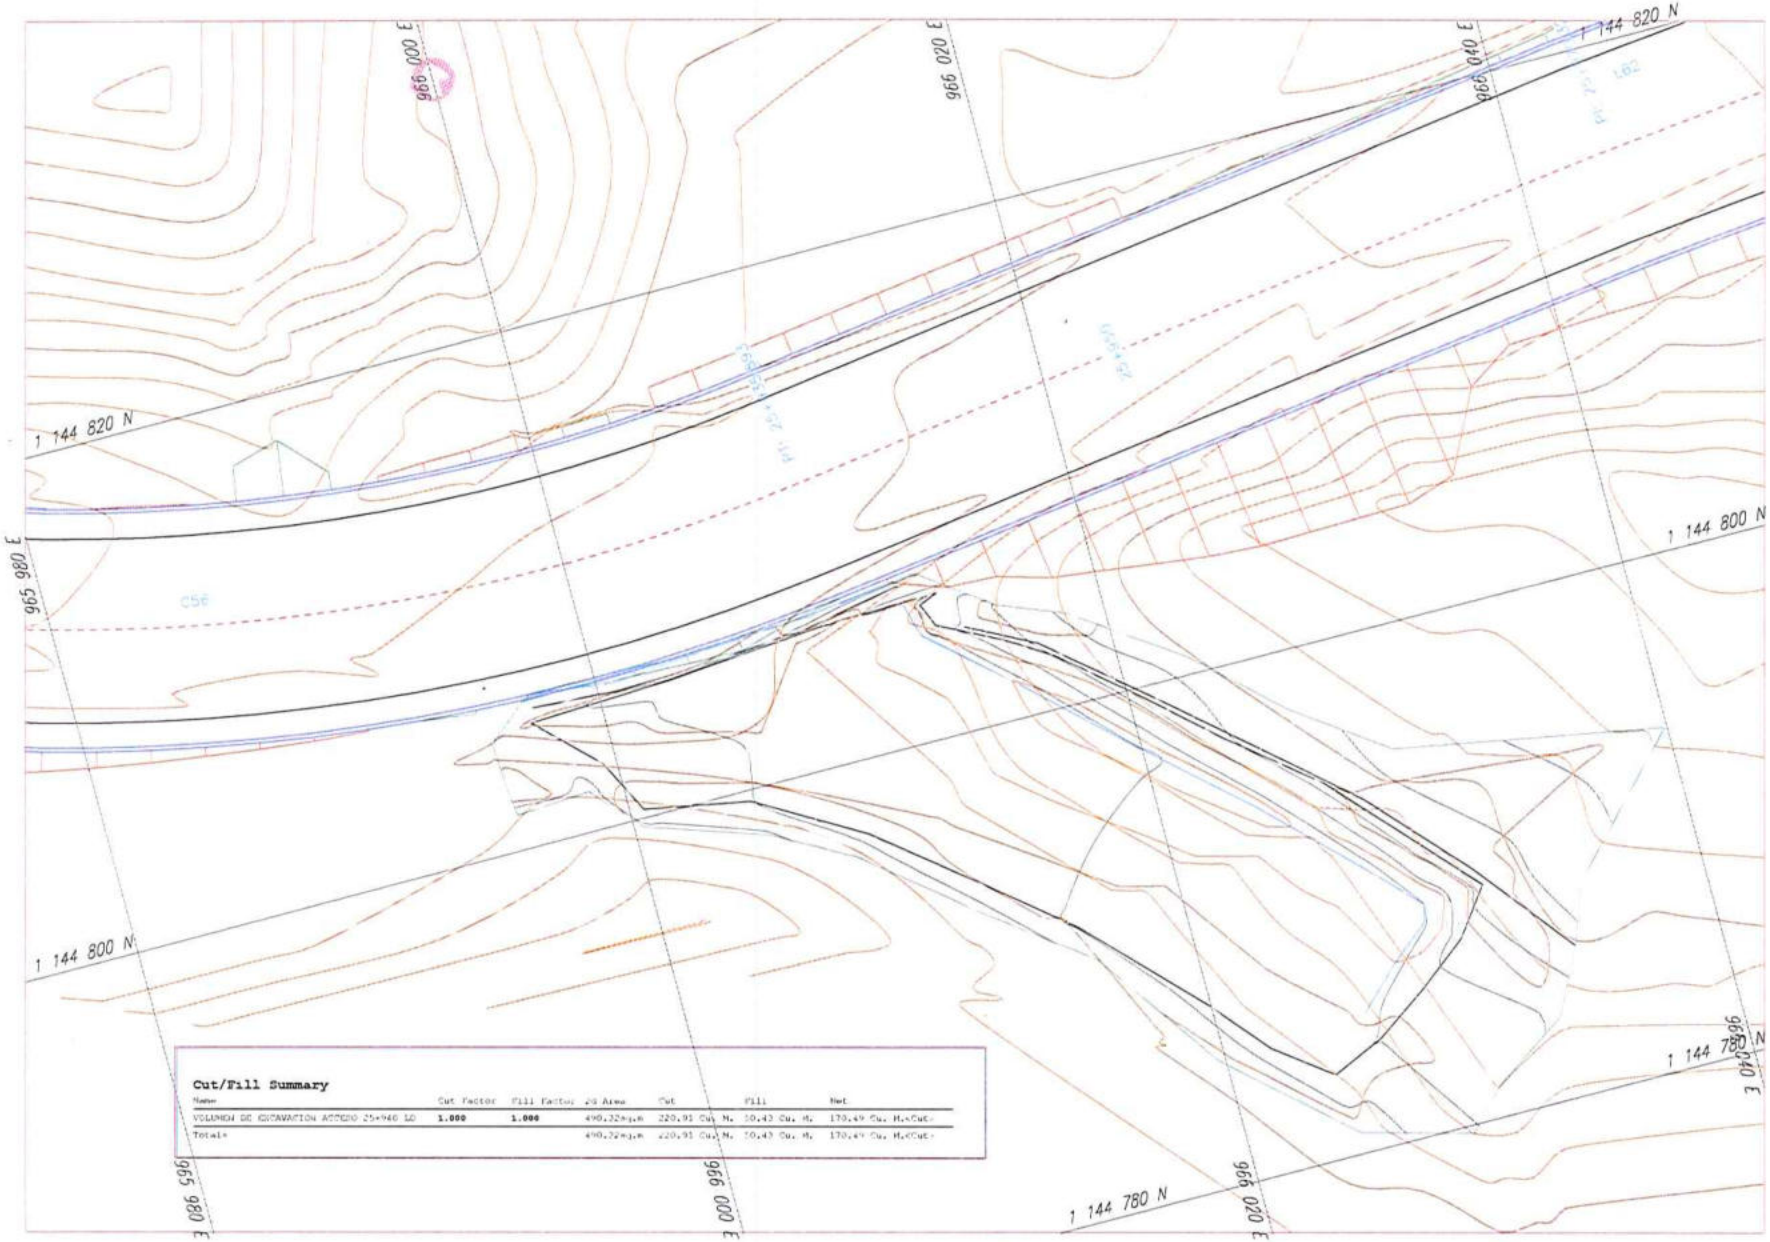

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2D Area	Cut	Fill	Net
VOLUMEN DE EXCAVACION ACCESO 25+940 LD	1.000	1.000	490.32m²	220.91 Cu. M.	50.43 Cu. M.	170.49 Cu. M.<Cut>
Total			490.32m²	220.91 Cu. M.	50.43 Cu. M.	170.49 Cu. M.<Cut>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA – OTANCHE – CHIQUINQUIRA – PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE DESAPARCELICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20,30" MÓDULO 3".

DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6006
MEJORAMIENTO
6006 BAJA

SUDINCO

G.F.B. SAS
Consultores

001

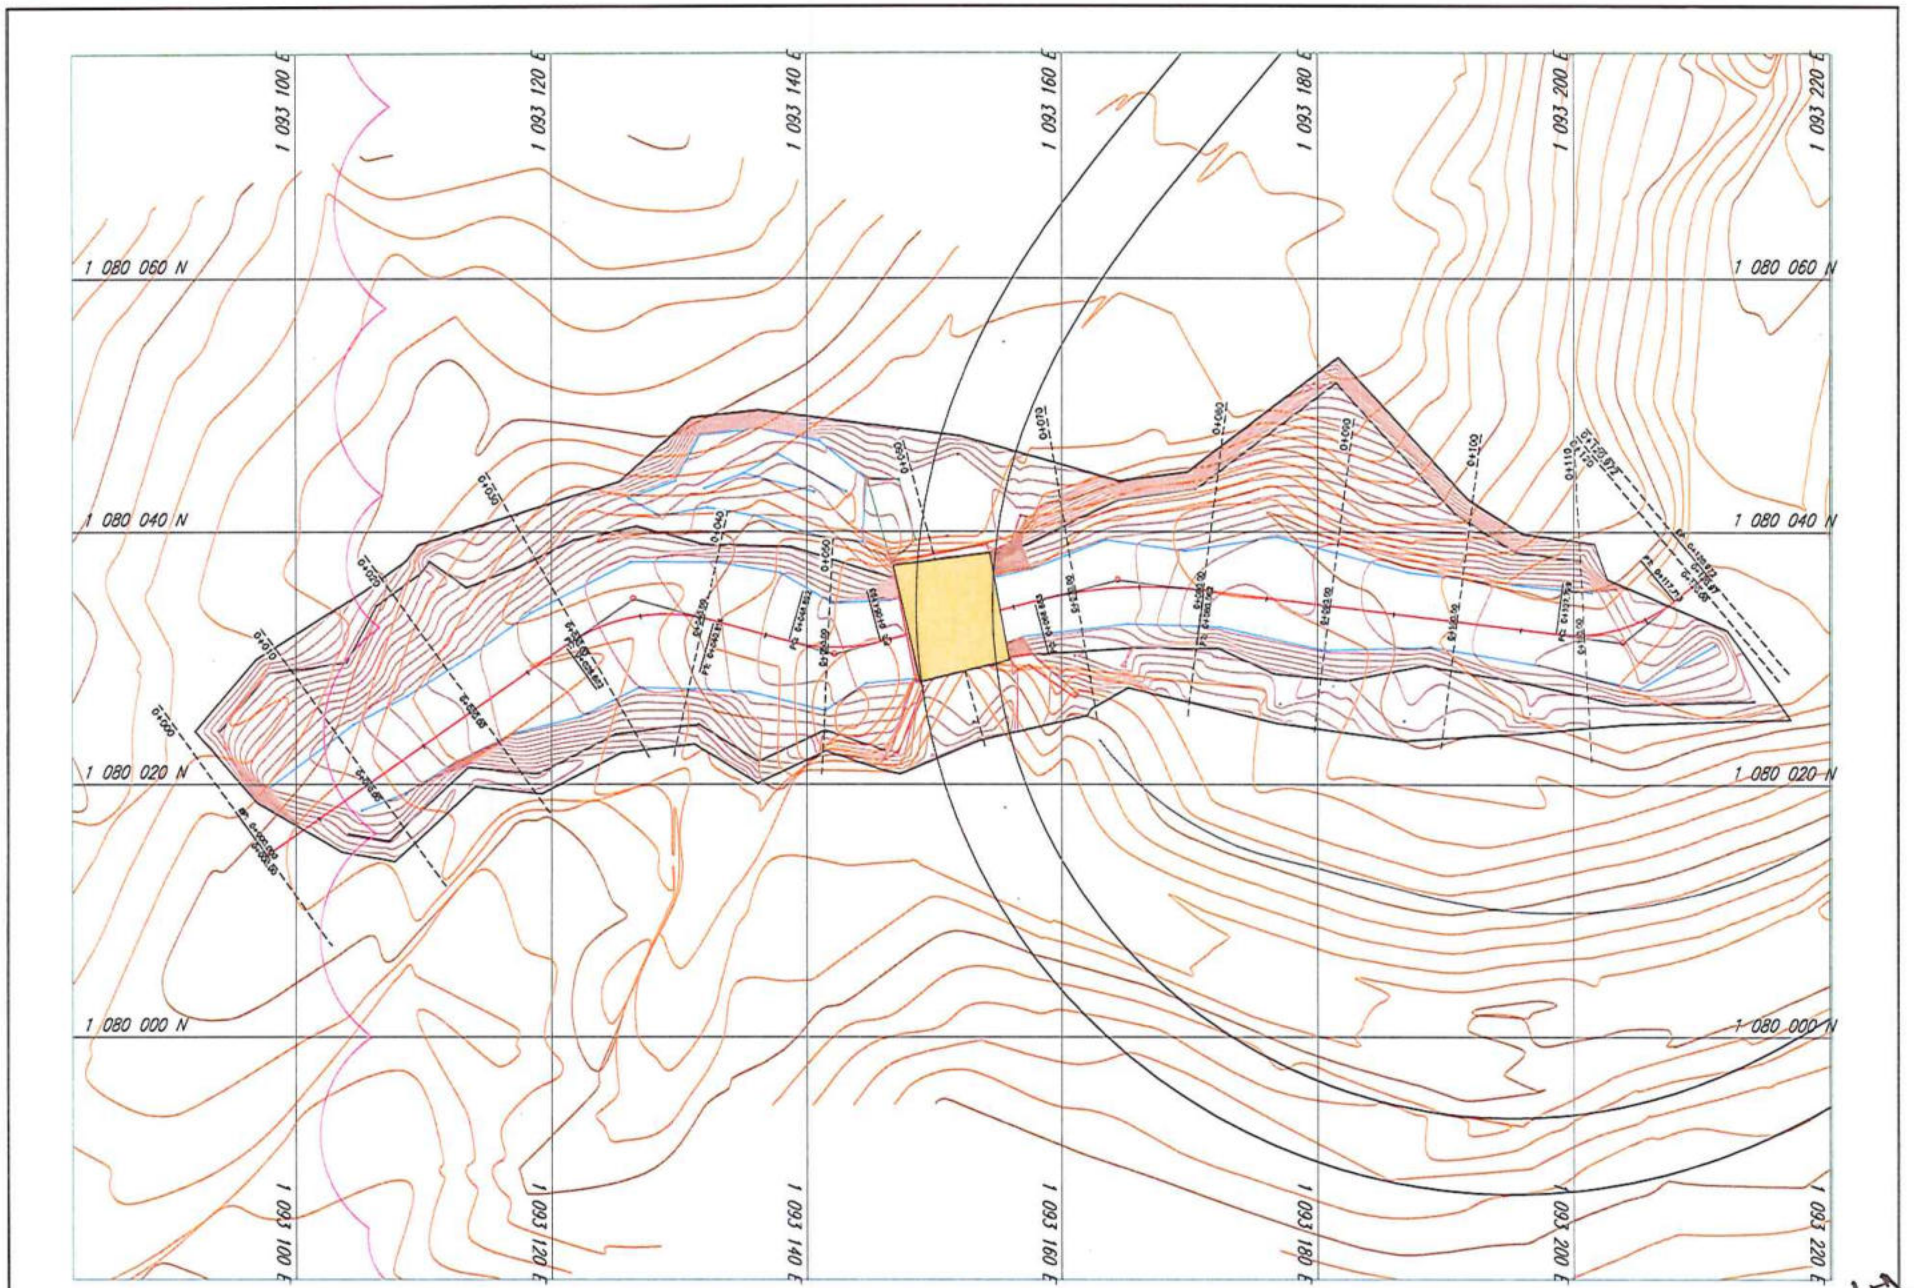


MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUENTE BOYACA – GUATAVITA – CHIQUINQUIRA – PAUTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONCESIONES VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030" MODULO 3".


DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6009
MEJORAMIENTO


SUDINCO

G.F.S. SAS
Consultores

001

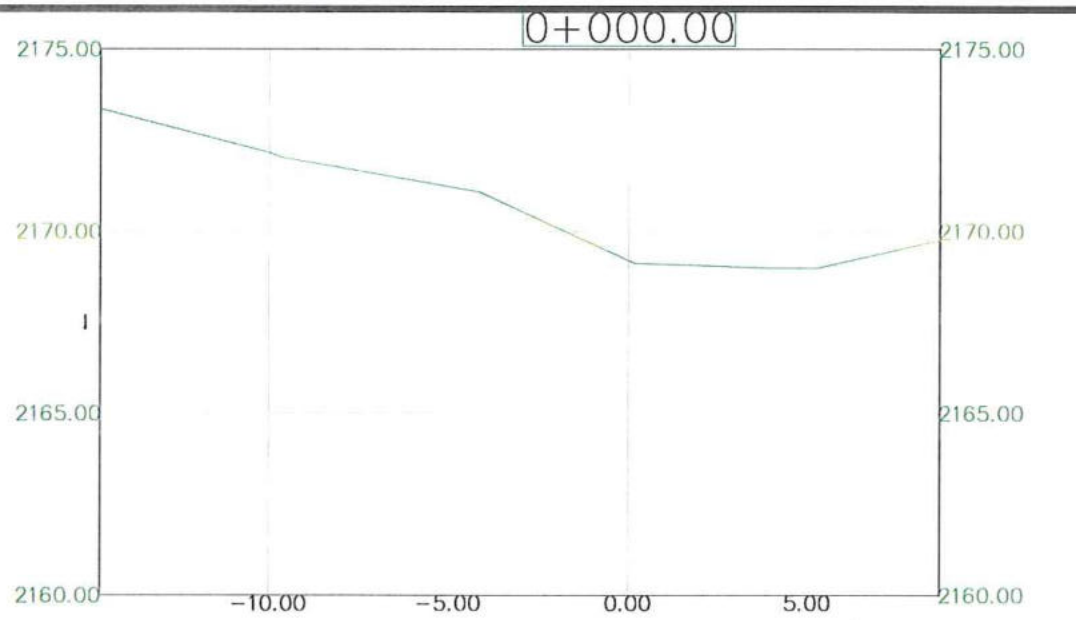

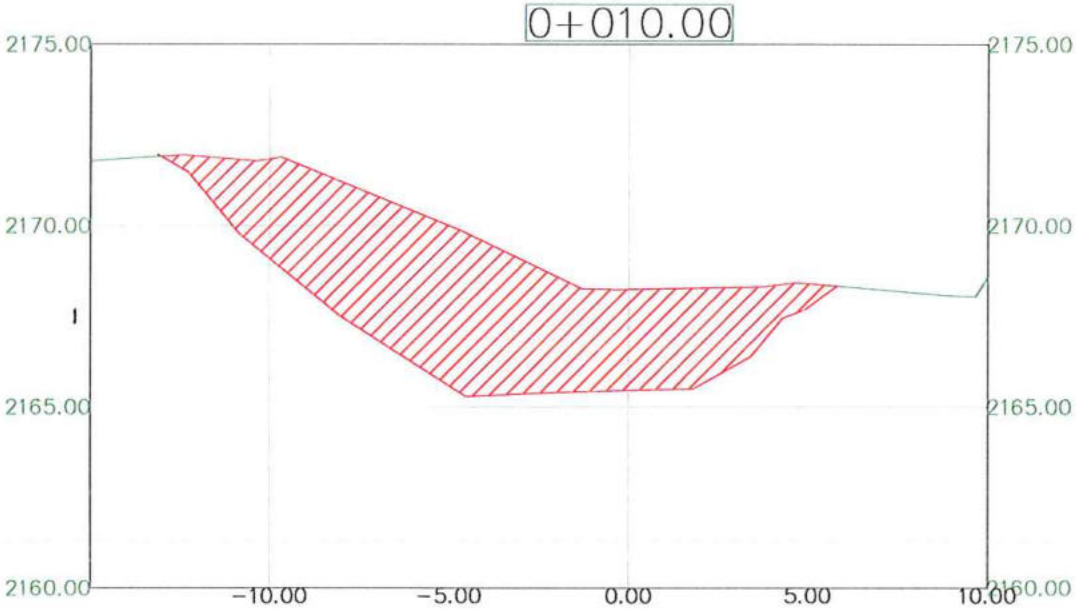


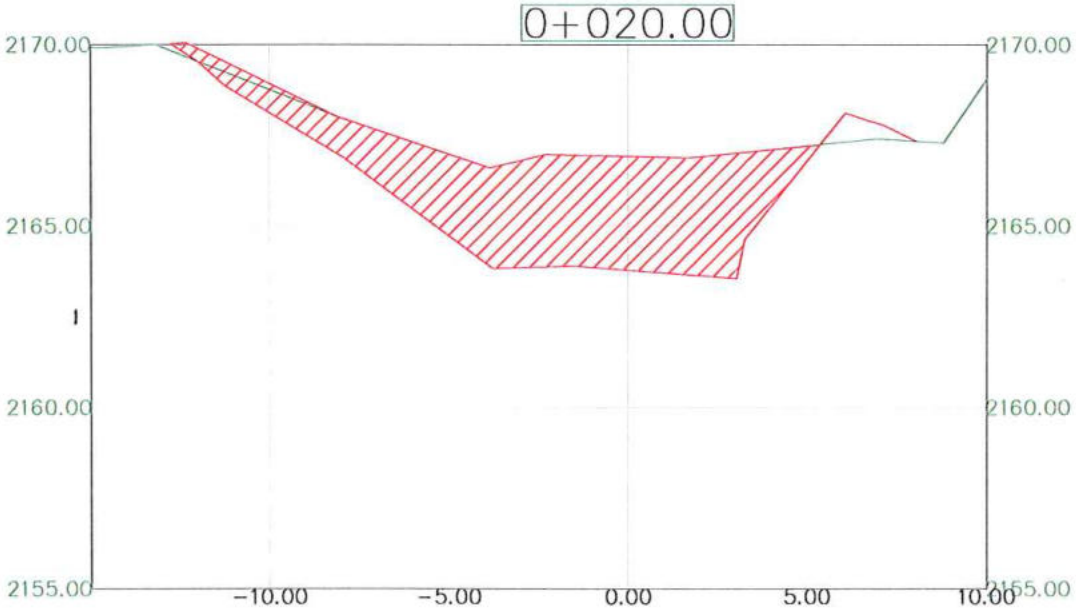



SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE NORTE

1 - 05

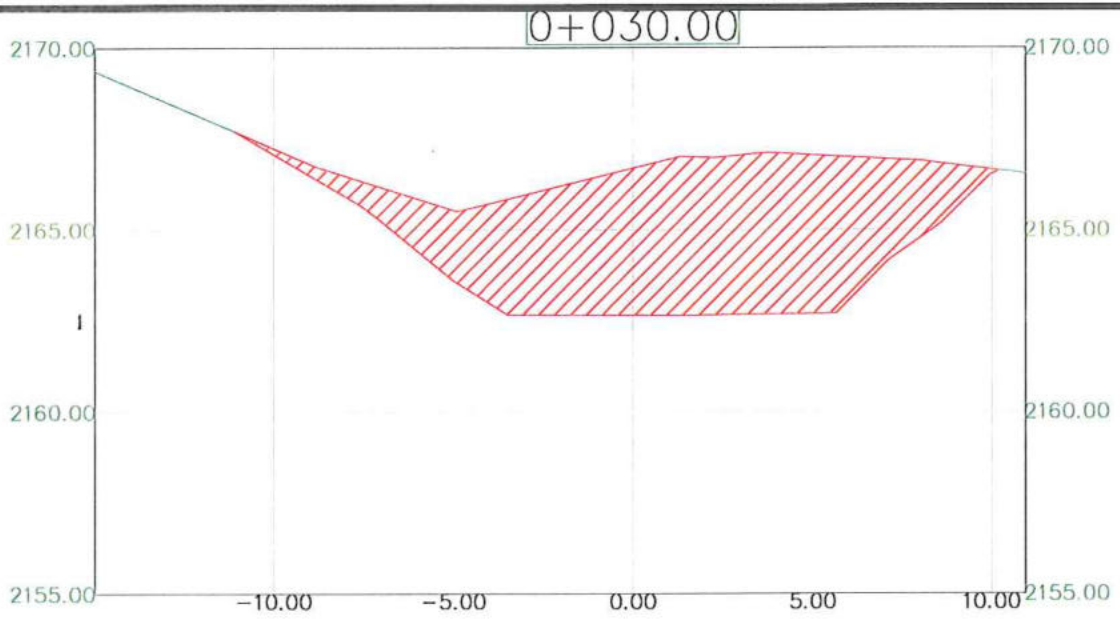

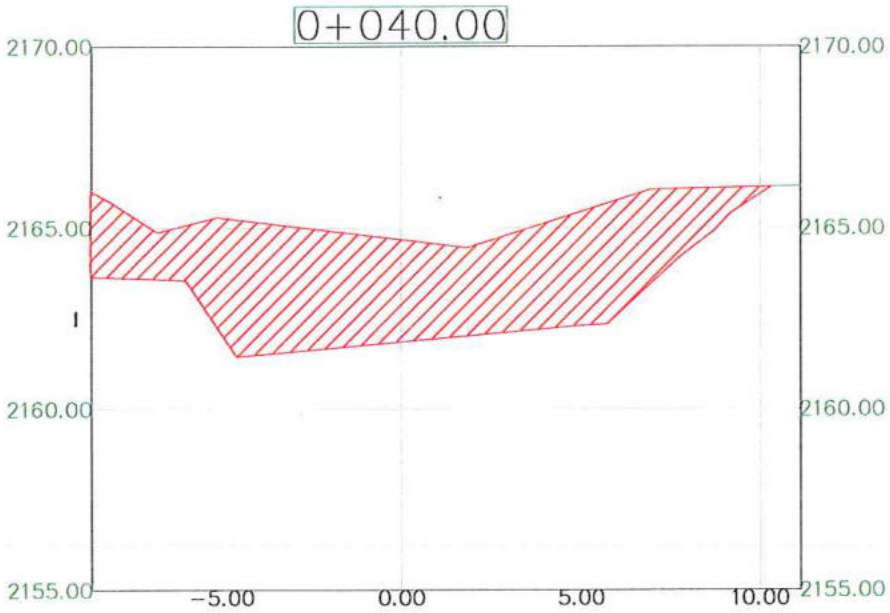


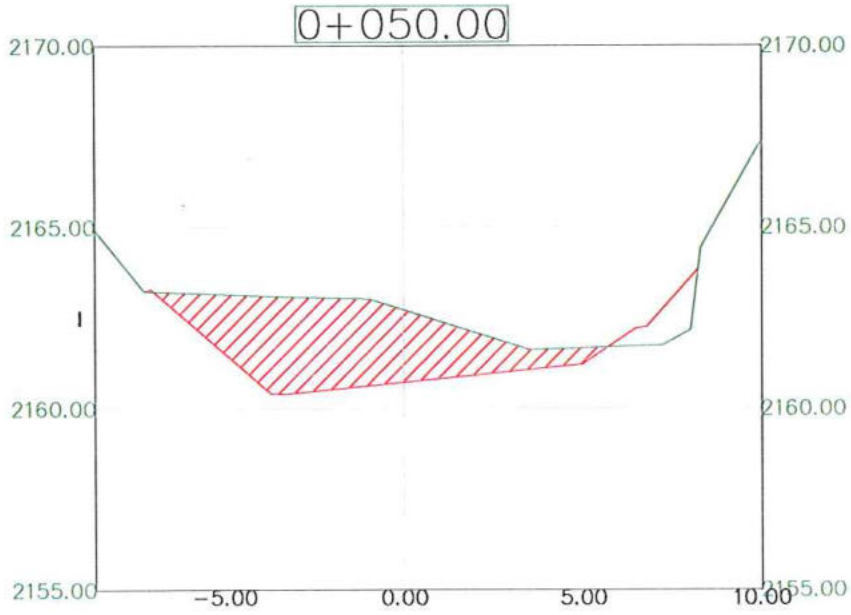



SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES

2 -05

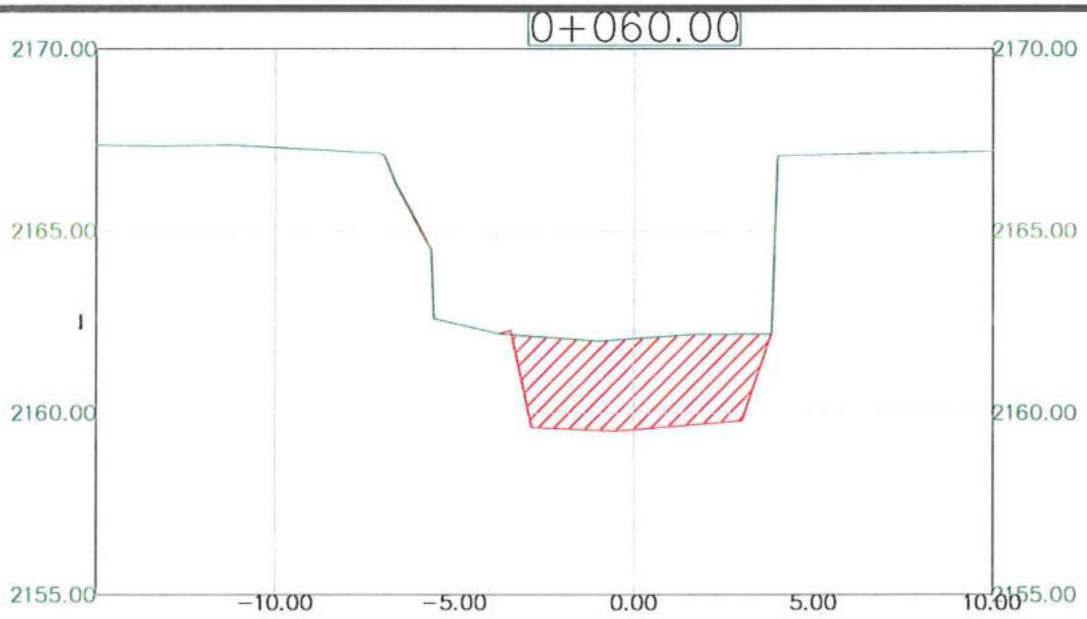

0+060.00
2170.00
2165.00
2160.00
2155.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00

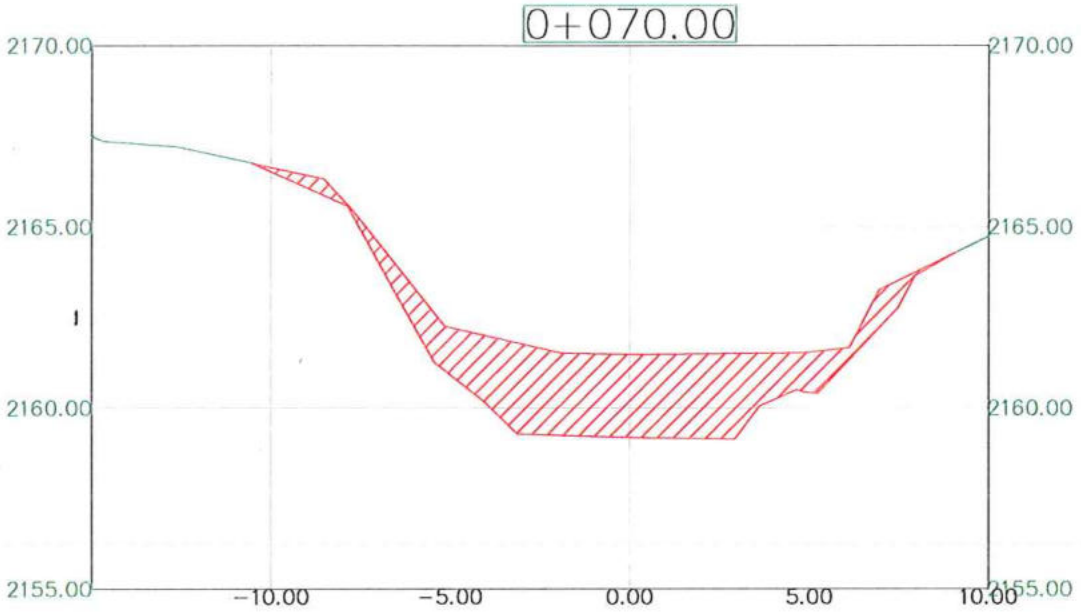

0+070.00
2170.00
2165.00
2160.00
2155.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00

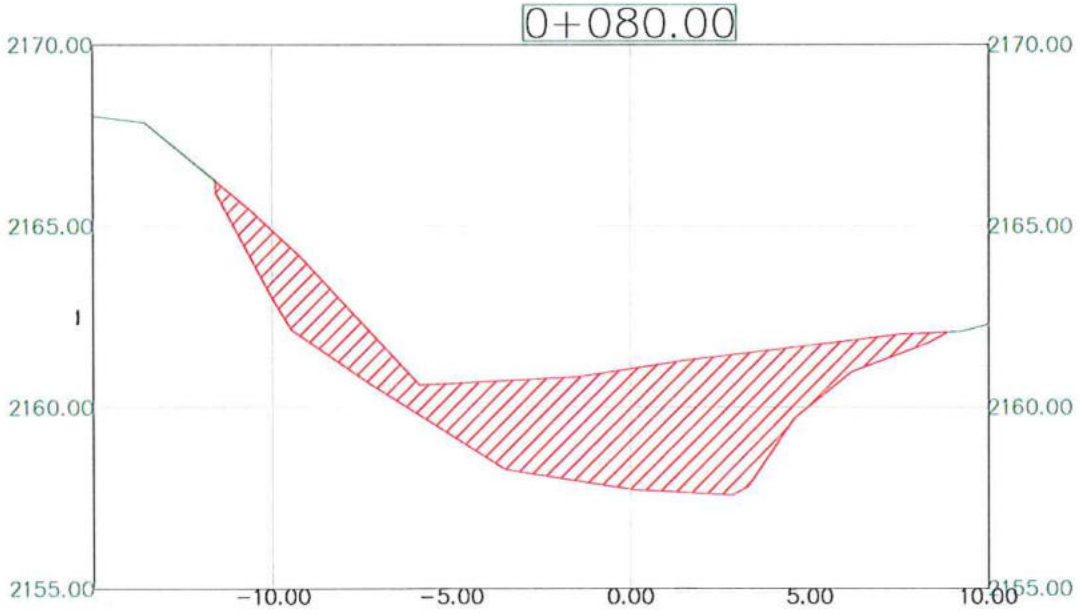

0+080.00
2170.00
2165.00
2160.00
2155.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00

SUDINCO

3 -05

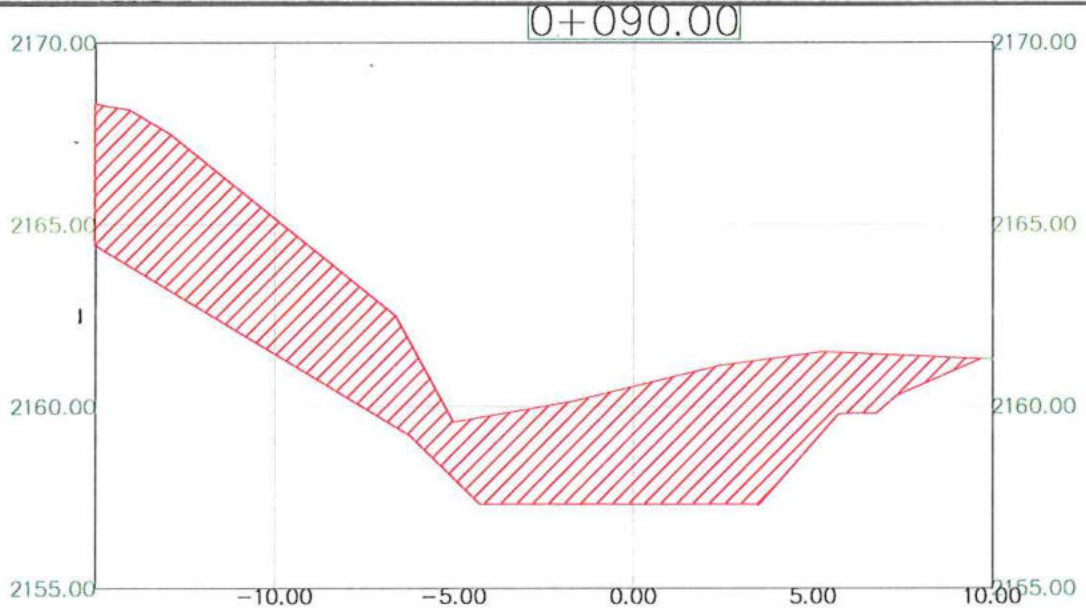

0+090.00
2170.00
2165.00
2160.00
2155.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00

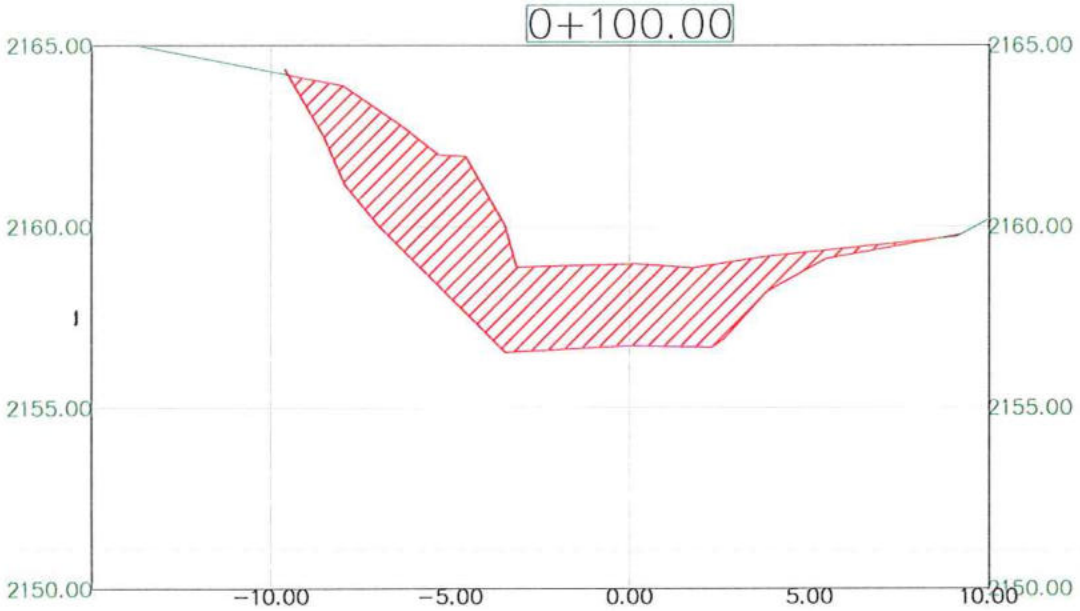
0+100.00
2165.00
2160.00
2155.00
2150.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00

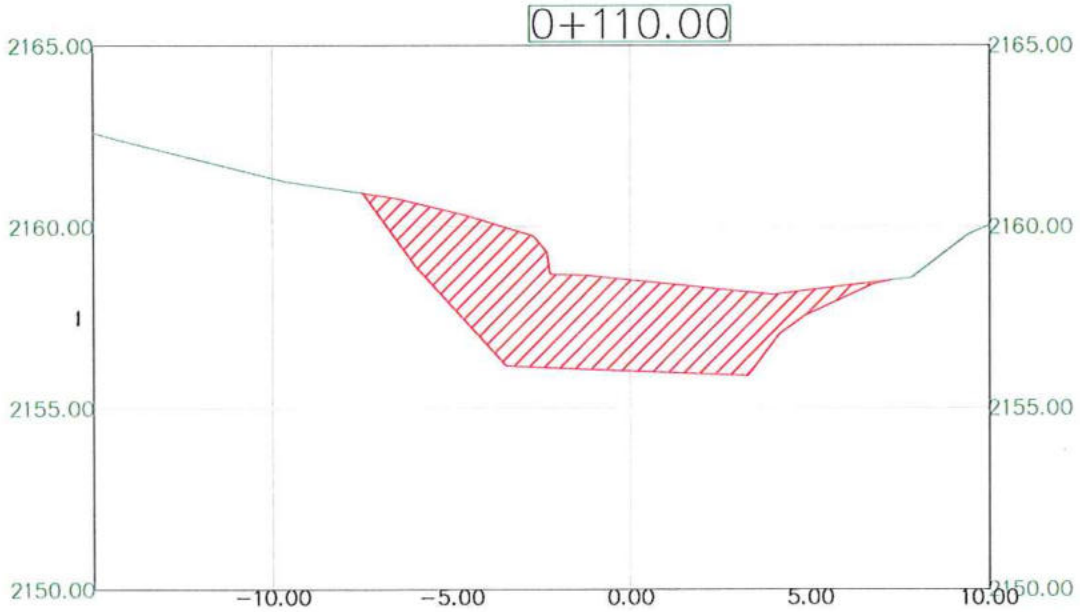
0+110.00
2165.00
2160.00
2155.00
2150.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00

SUDINCO


4 -05

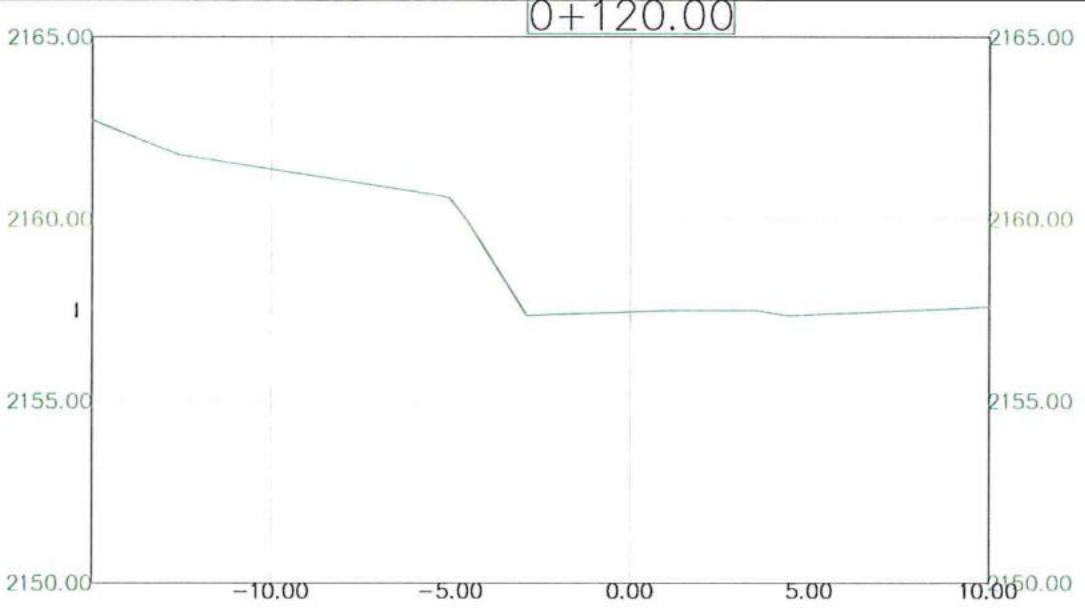

SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE 1 IZQUIERDA

5 -05

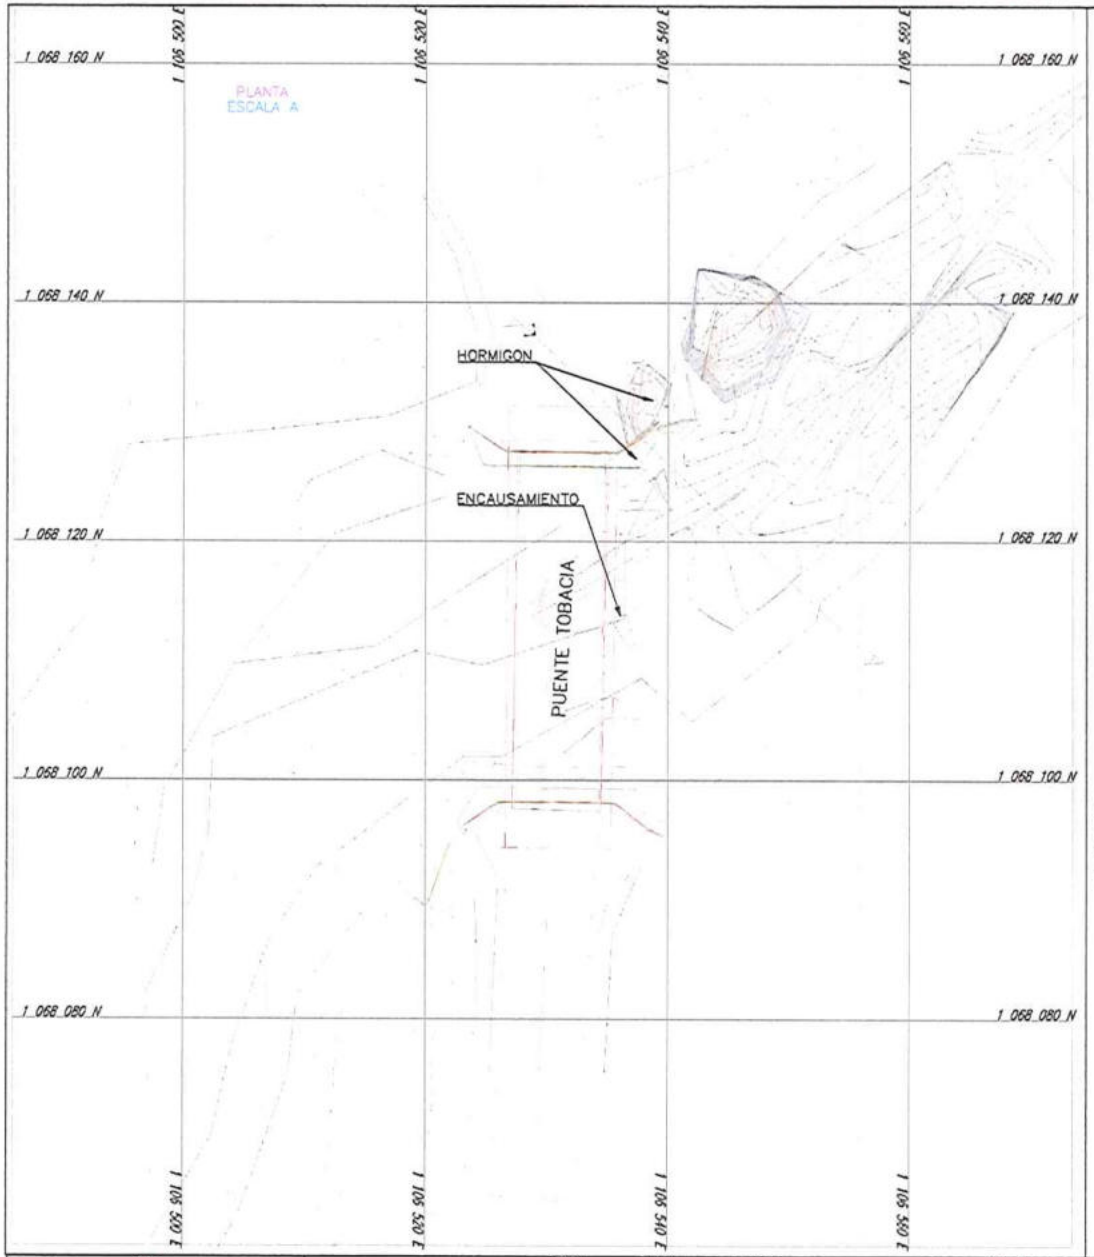

PERFIL A-A

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
VOLUMEN DE CICLOPEO ZONA 2	1.000	1.000	21.59sq.m	1.94 Cu. M.	55.47 Cu. M.	54.43 Cu. M.<Fill>
VOLUMEN DE CICLOPEO ZONA 1	1.000	1.000	81.65sq.m	0.08 Cu. M.	321.17 Cu. M.	321.09 Cu. M.<Fill>
VOLUMEN DE ENCAUSAMIENTO	1.000	1.000	704.11sq.m	407.21 Cu. M.	0.11 Cu. M.	407.10 Cu. M.<Cut>
Totals			807.35sq.m	408.33 Cu. M.	376.75 Cu. M.	862.62 Cu. M.<Cut>

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUDINCO

CONSORCIO ECOVISION 180

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - RÁQUIRA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2050" MÓDULO 3".

PLANTA-PERFIL
PUENTE LA TOBACIA

1 -01

19/05/2025

CAD--PUENTE TOBACIA
94+500-ACTA-1000BLUE.DWG

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
211.1	Remoción de Derrumbes	m3	518,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	FECHA	RUTA					VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
1	59+730,00	22/07/2025	6009					41,70	42,00	
1	56+980,00	22/07/2025	6009					62,60	63,00	
1	60+290,00	23/07/2025	6009					29,40	29,00	
1	52+360,00	24/07/2025	6009					125,40	125,00	
1	59+720,00	28/07/2025	6009					13,90	14,00	
1	23+790,00	29/07/2025	6006					58,40	58,00	
1	60+310,00	30/07/2025	6009					43,10	43,00	
1	59+720,00	31/07/2025	6009					13,90	14,00	
1	53+800,00	1/08/2025	6009					41,70	42,00	
1	20+630,00	9/08/2025	6006					29,20	29,00	
1	2+000,00	19/08/2025	6007					59,00	59,00	

TOTAL	518,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	518,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	518,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	SOPORTE DE ACTA No.	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	PERIODO:	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	CONTRATO:	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	CONTRATO:	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
211.1	Remoción de Derrumbes	m3		518,00



















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

SUDINCO	CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Codigo FO-C21-21-01 Version 00 Fecha 28-09-2021

PROYECTO: Transversal Boyacá

TRAMO: 6009

TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe

FUENTE: N.A UBICACIÓN: 59+730

SUBCONTRATISTA: SUDINCO

FECHA: 22 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

SALIDA	
LLEGADA	
INTERNO	1
SUBCONTRATO	

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	LCN790	CVV001	13.9m³	13.9m³	9:00	45+000	
2	LCN790	CVV001	13.9m³	27.8m³	11:00	45+000	
3	LCN790	CVV001	13.9m³	41.7m³	12:00	45+000	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	41.7m3			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:

Diana Lopez
Nombre
Cargo planillera

Aprobado por

Nombre Diego Rico
Cargo Ing Res OT

47

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Código: FO-021.21-01
Versión: 00
Fecha: 28/09/2021

PROYECTO: Transversal – Boyacá
TRAMO: 6009
TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe
FUENTE: N/A UBICACIÓN: PR 56 + 980
SUBCONTRATISTA: SUDINCO
FECHA: 22 JULIO 2023

TIPO DE CONTROL:

X	SALIDA
	LLEGADA
	INTERNO
	SUBCONTRATO

1

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	LCN790	CVV001	13.9m³	13.9m³	7:40	45+000	
2	KNZ486	CVV173	13.9m³	27.8m³	11:00	45+000	
3	LCN790	CVV001	13.9m³	41.7m³	12:00	45+000	
4	KNZ486	CVV173	13.9m³	55.6m³	1:50	45+000	
5	LP2434	CVV010	7m³	62.6m³	2:30	45+000	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	62.6m³			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:

Diana Lopez
Nombre
Cargo planillero

Aprobado por:

Nombre DIEGO LEO
Cargo INGENIERO

47

SUDINCO	CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Código: FO-021-21-01 Versión: 00 Fecha: 28/09/2021

PROYECTO: Transversal - Boyaca

TRAMO: 6009

TIPO MATERIAL: Remocion de derrumbe

FUENTE: N.A UBICACIÓN: 601290

SUBCONTRATISTA: SUDINCO

FECHA: 23 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

X SALIDA	1
LLEGADA	
INTERNO	
SUBCONTRATO	

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	KOK108	CUU199	14.7m³	14.7m³	9:00	45+000	
2	KOK108	CUU199	14.7m³	29.4m³	11:00	45+000	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	29.4m³			

	DESALOJO
	MATERIALES PETREOS
	MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por

Diana Lopez
Nombre
Cargo planillero

Aprobado por

Nombre Diego Ariza
Cargo Ing Res OT

4

SUDINCO	CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Código: FO-021-21-01 Versión: 00 Fecha: 28/09/2021

PROYECTO: Transversal - Boyaca

TRAMO: 6009

TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe

FUENTE: N/A UBICACIÓN PR 527+360

SUBCONTRATISTA: SUDINCO

FECHA: 24 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

X	SALIDA
	LLEGADA
	INTERNO
	SUBCONTRATO

1

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	KNZ797	CVV196	13.9m³	13.9m³	8:00	45+000	
2	LPZ434	CVV010	7m³	20.9m³	9:00	45+000	
3	KNZ797	CVV196	13.9m³	34.8m³	10:00	45+000	
4	LPZ434	CVV010	7m³	41.8m³	11:00	45+000	
5	KNZ797	CVV196	13.9m³	55.7m³	12:00	45+000	
6	LPZ434	CVV010	7m³	62.7m³	1:00	45+000	
7	KNZ797	CVV196	13.9m³	76.6m³	1:40	45+000	
8	LPZ434	CVV010	7m³	83.6m³	2:30	45+000	
9	KNZ797	CVV196	13.9m³	97.5m³	3:00	45+000	
10	LPZ434	CVV010	7m³	104.6m³	3:20	45+000	
11	KNZ797	CVV196	13.9m³	118.4m³	3:30	45+000	
12	LPZ434	CVV010	7m³	125.4m³	4:00	45+000	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	125.4m³			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por

Diana Lopez
Nombre
Cargo planillero

Aprobado por

Nombre DIEGO RICO
Cargo IMG RES OT

4

SUDINCO	CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Código: FO-021-21-01 Versión: 00 Fecha: 28/09/2021

PROYECTO: Transversal - Boyacá

TRAMO: 6009

TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe

FUENTE: N/A UBICACIÓN: PR 59+720

SUBCONTRATISTA: SUDINCO

FECHA: 28 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

- [x] SALIDA
- [ ] LLEGADA
- [ ] INTERNO
- [ ] SUBCONTRATO

1

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	LCN790	CUV001	13.9m³	13.9m³	9:20	45+00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	13.9m			

LM

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:

Diana Lopez
Nombre
Cargo planillera

Aprobado por:

Nombre DIEGO RICO
Cargo ING RESID

	CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Código: FO-021-21-01 Versión: 00 Fecha: 28/09/2021

PROYECTO: Transversal Baguio

TRAMO: Cox Baja

TIPO MATERIAL: Permite

FUENTE: UDA UBICACIÓN: 23+790

SUBCONTRATISTA: Indigo

FECHA: 29 Julio - 25

TIPO DE CONTROL:

☒SALIDA
☐LLEGADA
☐INTERNO
☐SUBCONTRATO

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	FNL487	CAN165	14.5	14.5		23+320	
2	FOR106	CHR205	14.7	29.2		23+500	
3	FNL487	CAN165	14.5	43.7		23+700	
4	FOR106	CHR205	14.7	58.4		23+900	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	58.4			

☐ DESALOJO
☐ MATERIALES PETREOS
☐ MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:

Nombre
Cargo

Aprobado por:

Nombre Diego Rios
Cargo Inv Ind 07

	CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Código: FO-021-21-01 Versión: 03 Fecha: 28/09/2021

PROYECTO: Ironversal - Bolaco

TRAMO: 6009

TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe

FUENTE: MP UBICACIÓN: 60+310

SUBCONTRATISTA: Vorinco

FECHA: 30 Julio 2025

TIPO DE CONTROL:

X SALIDA
☐ LLEGADA
☐ INTERNO
☐ SUBCONTRATO

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	XOF102	CXY109	14.5m³	14.5m³	8:00	451000	
2	WCN710	CXY001	13.9m³	28.4m³	9:00	451000	
3	XOF108	CXY107	14.7m³	43.1m³	10:00	451000	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	43.1m³			

☐ DESALOJO
☐ MATERIALES PETREOS
☐ MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:

Diana Lopez
Nombre
Cargo Acarillera

Aprobado por:

Nombre Diego Mo
Cargo Ing Res SI

67

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Código: FO-GC-01-01
Versión: 01
Fecha: 25/03/2021

PROYECTO: Transversal - Boyacá
TRAMO: 6009
TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe
FUENTE: N/A
UBICACIÓN: PR 39+720
SUBCONTRATISTA: Suministro
FECHA: 31 Julio 2023

TIPO DE CONTROL:

X SALIDA	1
LLEGADA	
INTERNO	
SUBCONTRATO	

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	LCN 790	000001	13.9m	13.9m	11.30	us1000	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	13.9m³			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:
Nombre: Diana Lopez
Cargo: planilla

Aprobado por:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]

LJ

SUDINCO

CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Código: FO-GA-21-01
Versión: 01
Fecha: 26/03/2021

PROYECTO: Transversal - Boyacá
TRAMO: 6009
TIPO MATERIAL: Remoción de derrumbe
FUENTE: N/A UBICACIÓN: PR 58+800
SUBCONTRATISTA: SUDINCO
FECHA: 01 Agosto 2025

TIPO DE CONTROL:
- [X] SALIDA
- [ ] LLEGADA
- [ ] INTERNO
- [ ] SUBCONTRATO

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	KNZ803	CUU190	13.9m³	13.9m³	8:00	Ustoco	
2	KNZ803	CUU190	13.9m³	27.8m³	9:00	Ustoco	
3	KNZ803	CUU190	13.9m³	41.7m³	10:00	Ustoco	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	41.7m³			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:
Diana Lopez
Nombre
Cargo planillera

Aprobado por:
Nombre Pedro Mesa
Cargo INGENIERO

	CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Código: FO-021-21-01 Versión: 09 Fecha: 28/07/2021

PROYECTO: Transversal Pajuel

TRAMO: 6006 Baja

TIPO MATERIAL: Arrande

FUENTE: Via UBICACIÓN: 201630

SUBCONTRATISTA: Jucinu

FECHA: 9 Agosto 25

TIPO DE CONTROL:

- ☐ SALIDA
- ☐ LLEGADA
- ☐ INTERNO
- ☐ SUBCONTRATO

Nº	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	Nº INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	FOX106	CAN205	14.7	14.7		IB1500	
2	KAR497	CAN165	14.5	29.2		IB1500	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	29.2			

- ☐ DESALOJO
- ☐ MATERIALES PETREOS
- ☐ MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:

Nombre
Cargo

Aprobado por:

Nombre Diego Ortiz
Cargo Ing Res OT

	CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Código: FO-021-21-01 Versión: 00 Fecha: 28/03/2021

PROYECTO: Transversal Rápido

TRAMO: 6007

TIPO MATERIAL: Derrumbe

FUENTE: MA UBICACIÓN: 21000

SUBCONTRATISTA: Subsuelo

FECHA: 19 de 8. 2021

TIPO DE CONTROL:

- [x] SALIDA
- [ ] LLEGADA
- [ ] INTERNO
- [ ] SUBCONTRATO

N°	VOLQUETA				SALIDA o LLEGADA		OBSERVACIONES
	PLACA	N° INTERNO	VOLUMEN (m³)	VOLUMEN ACUMULADO (m³)	HORA	LUGAR / ABSCISA	
1	SLK359		14.5	14.5	11:00	571800	
2	SZV296		15	29.5	11:05	571800	
3	XK359		14,5	44	1.30	571800	
4	SZV296		15	59	1.35	571800	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
			TOTAL	59			

- [ ] DESALOJO
- [ ] MATERIALES PETREOS
- [ ] MOVIMIENTOS INTERNOS

Realizado por:

Nombre: Valentina Ochoa
Cargo: Ing Residente Apo

Aprobado por:

Nombre: Valentina O.
Cargo: Ing Residente Ak

47

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERÍODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
221.1	Pedraplen compacto	m3	883,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA - SECCIÓN TRANSVERSAL m2(B)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
1	22+640,00	22+660,00	6006	20,00		13,60	1,00	272,00	272,00	
1	22+660,00	22+690,00	6006	30,00		13,60	1,00	408,00	408,00	
1	22+690,00	22+710,00	6006	20,00		13,60	0,40	108,80	109,00	
1	25+220,00	25+250,00	6006	30,00		3,30	0,90	89,10	89,00	
1	25+396,00	25+396,00	6006	6,00		1,80	0,50	5,40	5,00	

TOTAL	883,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	883,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	883,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
221.1	Pedraplen compacto	m3		883,00







RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
310.1	Conformación de la calzada existente	m2	80555,60

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ANCHO Promedio (m)		ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	72+090,00	72+350,00	6006	260,00		7,00		1.820,00	1820,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	70+400,00	70+648,00	6006	248,00		7,20		1.785,60	1785,60	Conformación para mejorar transitabilidad
2	70+000,00	70+090,00	6006	90,00		6,80		612,00	612,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	67+515,00	67+990,00	6006	475,00		9,00		4.275,00	4275,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	67+085,00	67+515,00	6006	430,00		8,00		3.440,00	3440,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	66+800,00	67+085,00	6006	285,00		8,40		2.394,00	2394,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	65+340,00	66+800,00	6006	1.460,00		7,90		11.534,00	11534,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	64+210,00	65+340,00	6006	1.130,00		8,90		10.057,00	10057,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	63+230,00	64+210,00	6006	980,00		8,60		8.428,00	8428,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	62+850,00	63+230,00	6006	380,00		8,10		3.078,00	3078,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	62+220,00	62+850,00	6006	630,00		8,50		5.355,00	5355,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	60+900,00	62+220,00	6006	1.320,00		8,60		11.352,00	11352,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	60+400,00	60+900,00	6006	500,00		8,55		4.275,00	4275,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	60+200,00	60+400,00	6006	200,00		8,55		1.710,00	1710,00	Conformación para mejorar transitabilidad
2	59+000,00	60+200,00	6006	1.200,00		8,70		10.440,00	10440,00	Conformación para mejorar transitabilidad

TOTAL	80.555,60
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	80.555,60
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	80.555,60

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	80555,60
310.1	Conformación de la calzada existente	m2		











47

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	SOPORTE DE ACTA No.	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	PERIODO:	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	CONTRATO:	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	CONTRATO:	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	80555,60
310.1	Conformación de la calzada existente	m2		
















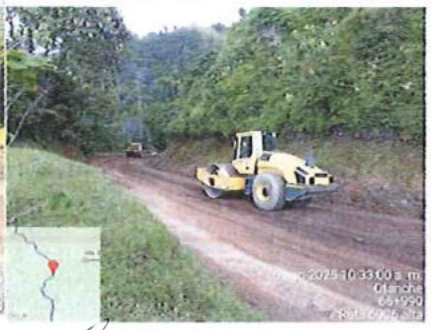



RESIDENTE SUDINCO

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
311.1	Afirmado	m3	6705,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	SECCIÓN TRANSVERSAL (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	0+305,00	0+477,00	6006	172,00	1,15	0,43		85,05	85,10	Relleno soporte cunetas costado izquierdo
2	0+477,00	0+695,00	6006	218,00	1,00	0,45		98,10	98,10	Relleno soporte cunetas costado izquierdo
2	23+920,00	23+930,00	6006	10,00			17,23	110,76	110,80	Construcción capa granular. Avance del 100% de sección de diseño este mes.
2	23+930,00	23+940,00	6006	10,00			21,76	195,52	195,50	
2	23+940,00	23+950,00	6006	10,00			4,40	129,88	129,90	
2	23+900,00	24+000,00	6006	100,00			2.134,34	2.740,43	2740,40	Liquidación desvío y acceso
2	23+900,00	24+000,00	6006	100,00				2.234,10	-2234,10	Descuento cantidad cobrada acta N°49
2	22+635,00	22+640,00	6006	5,00			2,16	0,00	0,00	Reemplazo de material de subrasante no competente para garantizar ancho de vía
2	22+640,00	22+645,00	6006	5,00			96,42	254,42	254,40	
2	22+645,00	22+650,00	6006	5,00			91,23	469,14	469,10	
2	22+650,00	22+655,00	6006	5,00			95,12	465,87	465,90	
2	22+655,00	22+660,00	6006	5,00			75,84	427,39	427,40	
2	22+660,00	22+665,00	6006	5,00			116,57	481,04	481,00	
2	22+665,00	22+670,00	6006	5,00			88,58	512,90	512,90	
2	22+670,00	22+675,00	6006	5,00			73,32	404,77	404,80	
2	22+675,00	22+680,00	6006	5,00			87,73	402,63	402,60	
2	22+680,00	22+685,00	6006	5,00			49,14	342,17	342,20	
2	22+685,00	22+690,00	6006	5,00			57,38	266,31	266,30	
2	22+690,00	22+695,00	6006	5,00			68,95	315,84	315,80	
2	22+695,00	22+700,00	6006	5,00			38,39	268,36	268,40	
2	22+700,00	22+705,00	6006	5,00			40,97	198,39	198,40	
2	22+705,00	22+710,00	6006	5,00			28,44	173,52	173,50	
2	22+710,00	22+715,00	6006	5,00			21,39	124,59	124,60	
2	22+715,00	22+720,00	6006	5,00			13,08	86,18	86,20	
2	22+720,00	22+725,00	6006	5,00			0,00	32,69	32,70	
2	23+910,00	23+920,00	6006	10,00	10,88	0,85		92,44	49,90	Avance del 54% de las actividades este mes, para un avance acumulado de la actividad igual a 100%
2	23+920,00	23+950,00	6006	30,00	10,88	0,85		277,31	277,30	Avance del 100% de las actividades este mes.
2	25+396,00	25+396,00	6006	6,00	1,80	0,30		3,24	3,20	Mejoramiento subrasante para instalación alcantarilla
5	50+188,10	50+190,00	6007	1,90	1,00	0,15		0,29	0,30	Costado Izquierdo - cuneta
5	50+184,70	50+188,00	6007	3,30	2,00	0,15		0,99	1,00	Costado Izquierdo - acceso
5	51+190,00	51+212,00	6007	22,00			27,49	11,21	11,20	Relleno muro
2	60+290,00	60+292,00	6009	2,00	3,00	0,30		1,80	1,80	Mejoramiento para instalación gaviones
2	60+292,00	60+295,00	6009	3,00	3,00	0,30		2,70	2,70	Mejoramiento para instalación gaviones
2	60+500,00	60+510,00	6009	10,00	5,00	0,21		10,50	5,70	Extendido de material para mejoramiento de transitabilidad

TOTAL	6705,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	6705,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	6705,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188


SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021


ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	6705,00
311.1	Afirmado	m3		







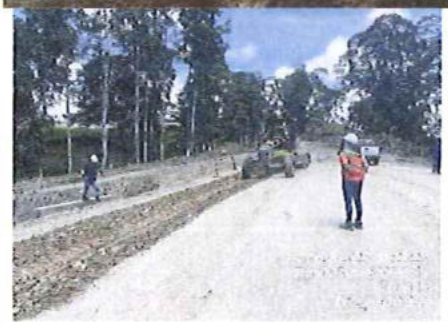


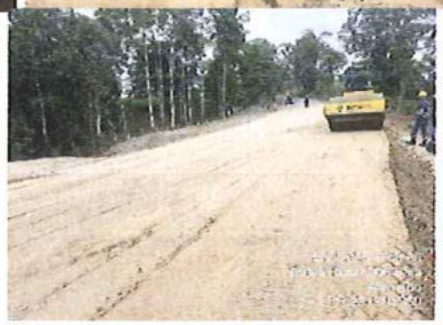







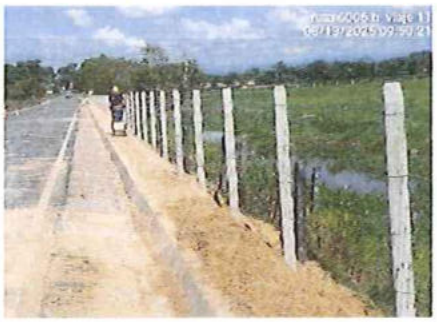









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA


23+850.00




23+890.00




23+930.00




23+970.00




23+860.00




23+900.00




23+940.00




23+980.00




23+870.00




23+910.00




23+950.00




23+990.00




23+880.00




23+920.00



23+960.00



24+000.00



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | REPUBLICA DE COLOMBIA | MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUDINCO | CFL 210 Consultores

CONSORCIO ECOVIASCH - 189

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA – OTANCHE – CHIQUINQUIRA – PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAPUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MÓDULO 3".


DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6006
MEJORAMIENTO
PR23+850 a PR24+000

PLANTA 1:500

PLANO 22 DE 79

Enero de 2024

5

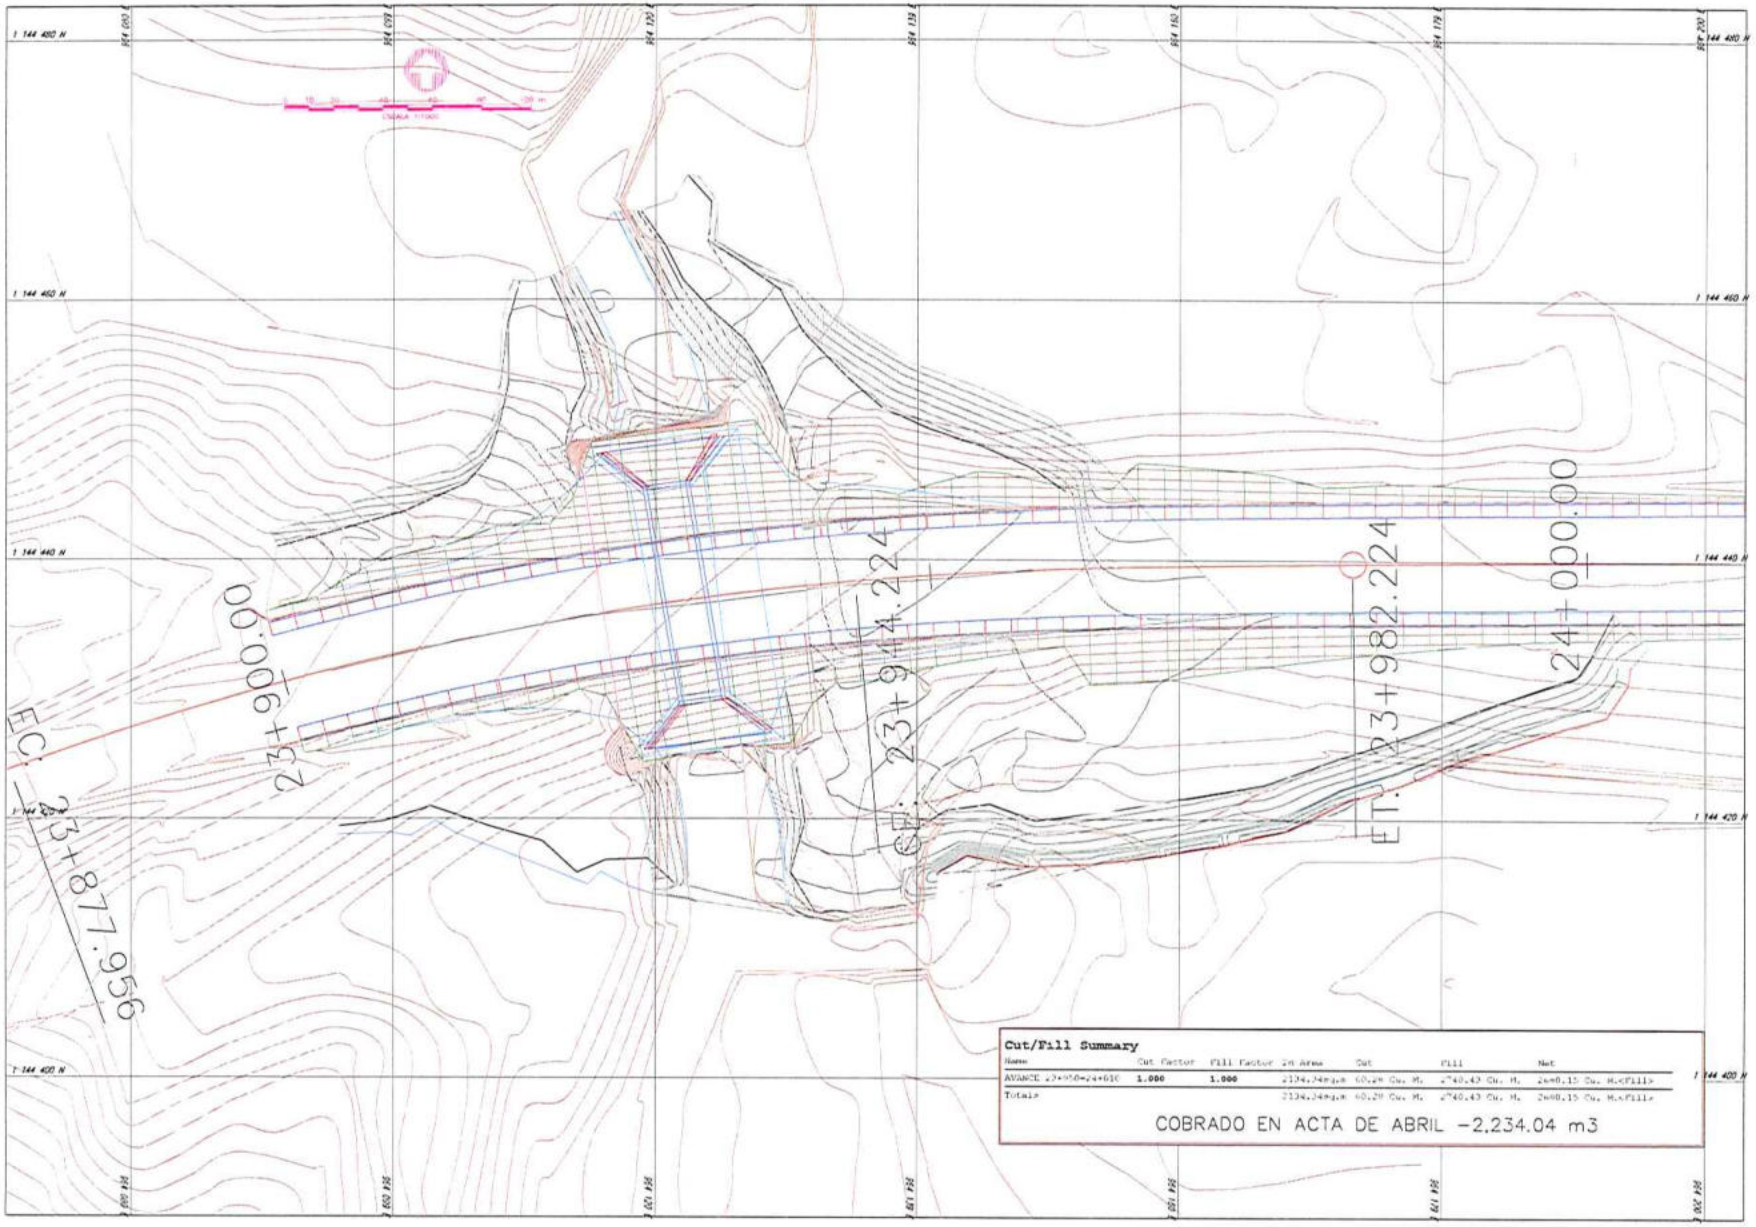

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	In Area	Cut	Fill	Net
AVANCE 23+950-24+010	1.000	1.000	2134.24sq.m	60.28 Cu. M.	2740.43 Cu. M.	2680.15 Cu. M.<Fill>
Totals			2134.24sq.m	60.28 Cu. M.	2740.43 Cu. M.	2680.15 Cu. M.<Fill>

COBRADO EN ACTA DE ABRIL -2,234.04 m3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA – OTANCHE – CHIQUINQUIRA – PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3".


DISEÑO GEOMÉTRICO RUTA 6006
MEJORAMIENTO
PR23+610 A PR31+600

SUDINCO

O.T.H. SAS
CONSULTORES

001

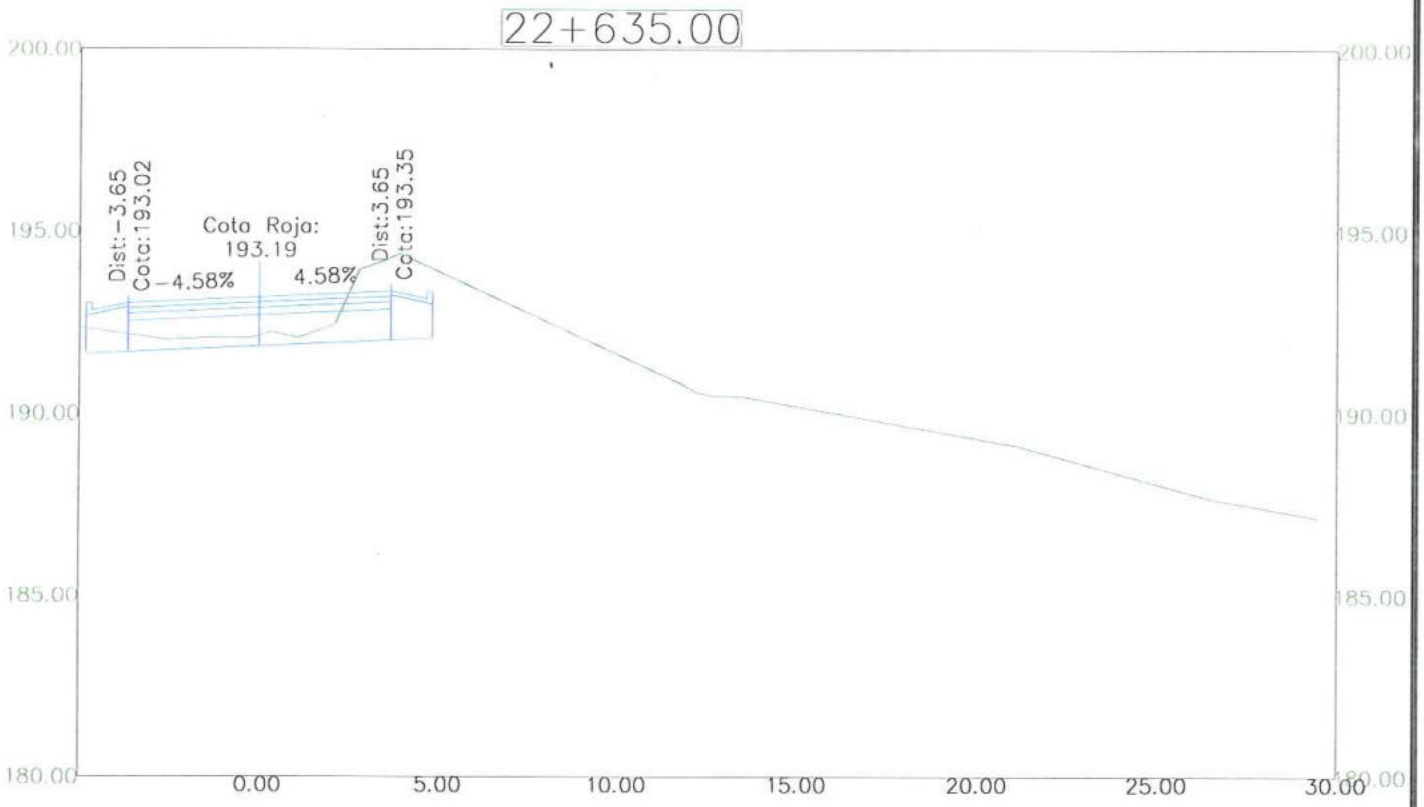

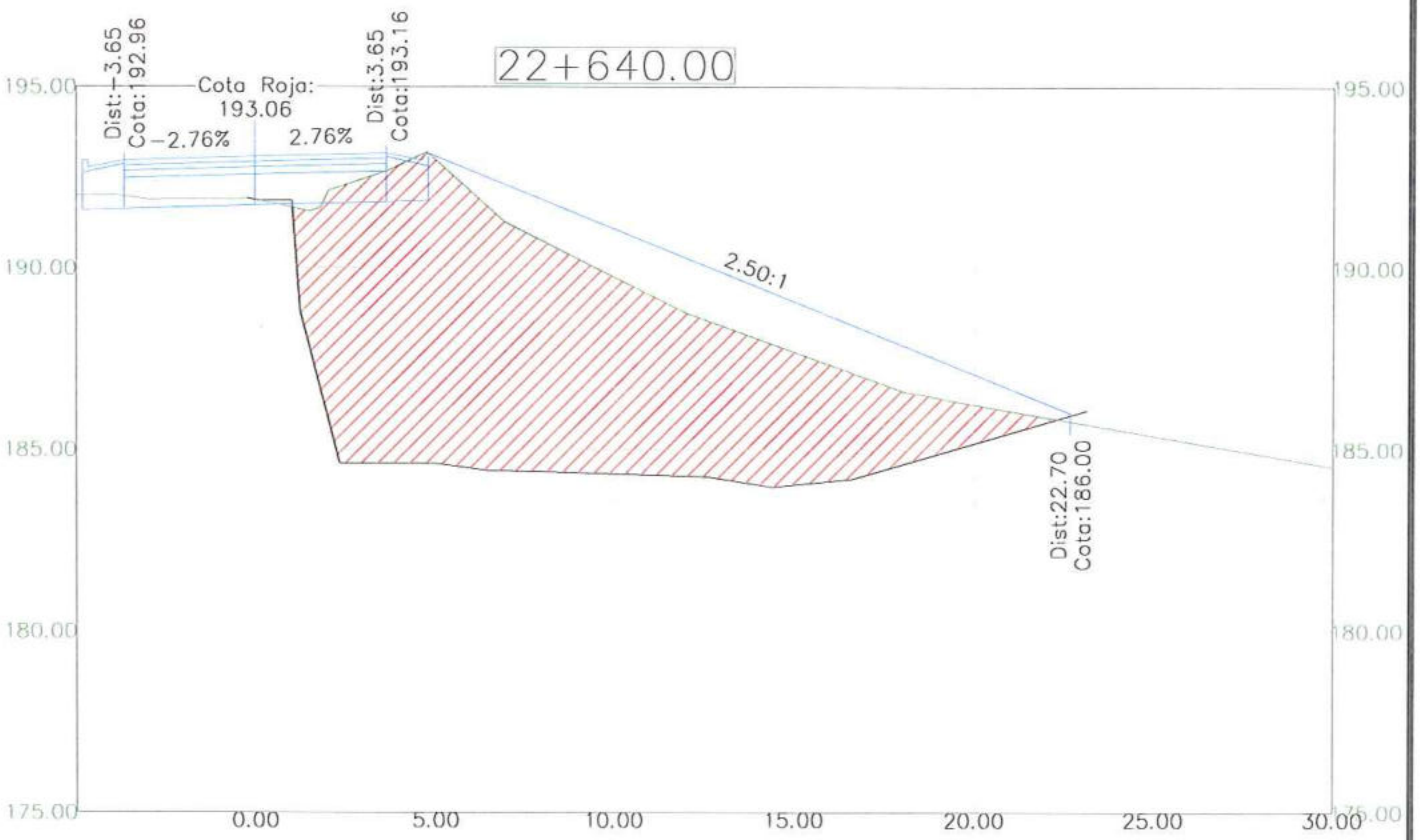



SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES


1 : 100


18-08-2023

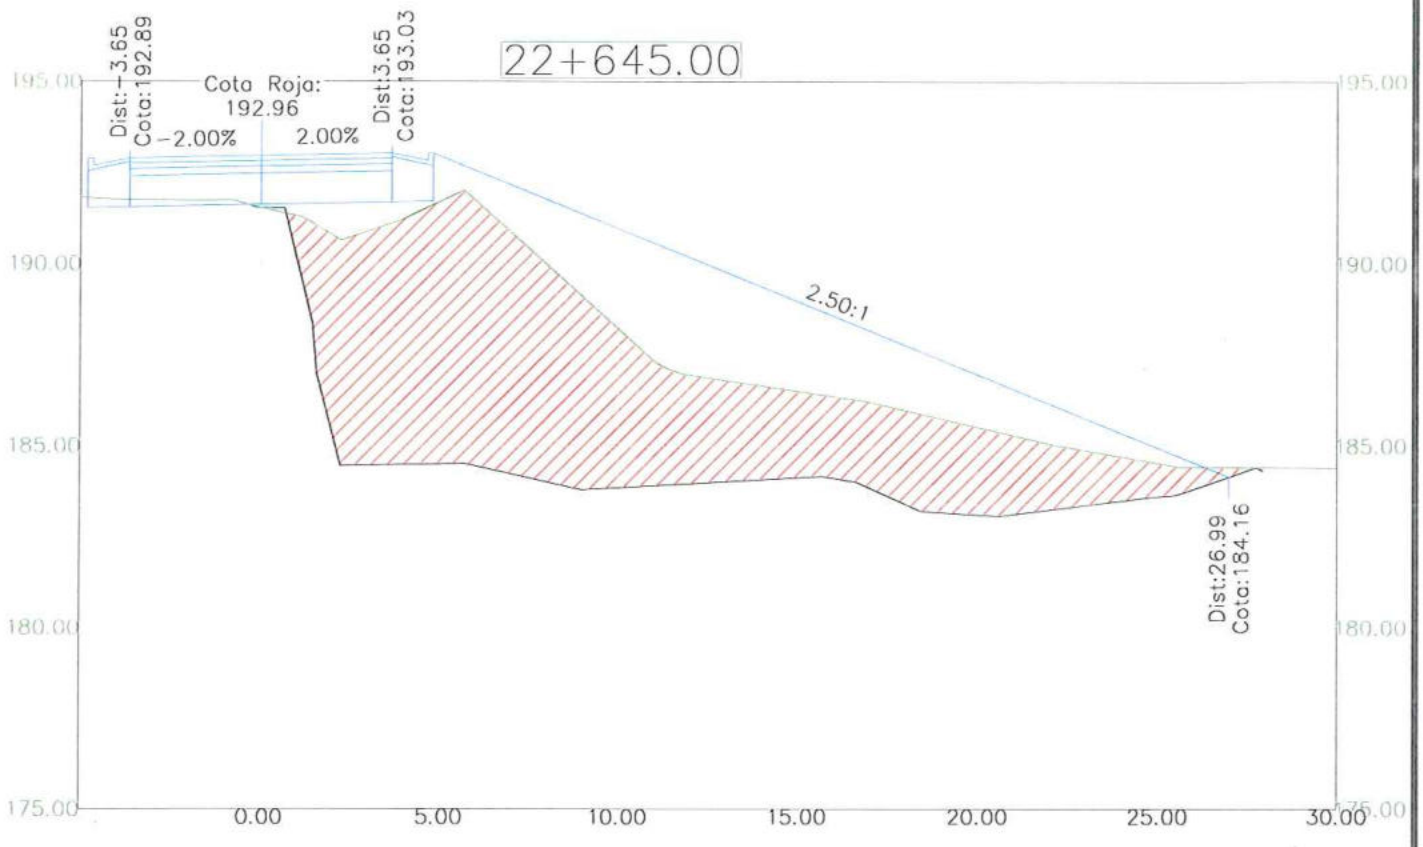
22+645.00
Dist:-3.65
Cota:192.89
Cota Roja:
192.96
Dist:3.65
Cota:193.03
-2.00%
2.00%
2.50:1
Dist:26.99
Cota:184.16
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

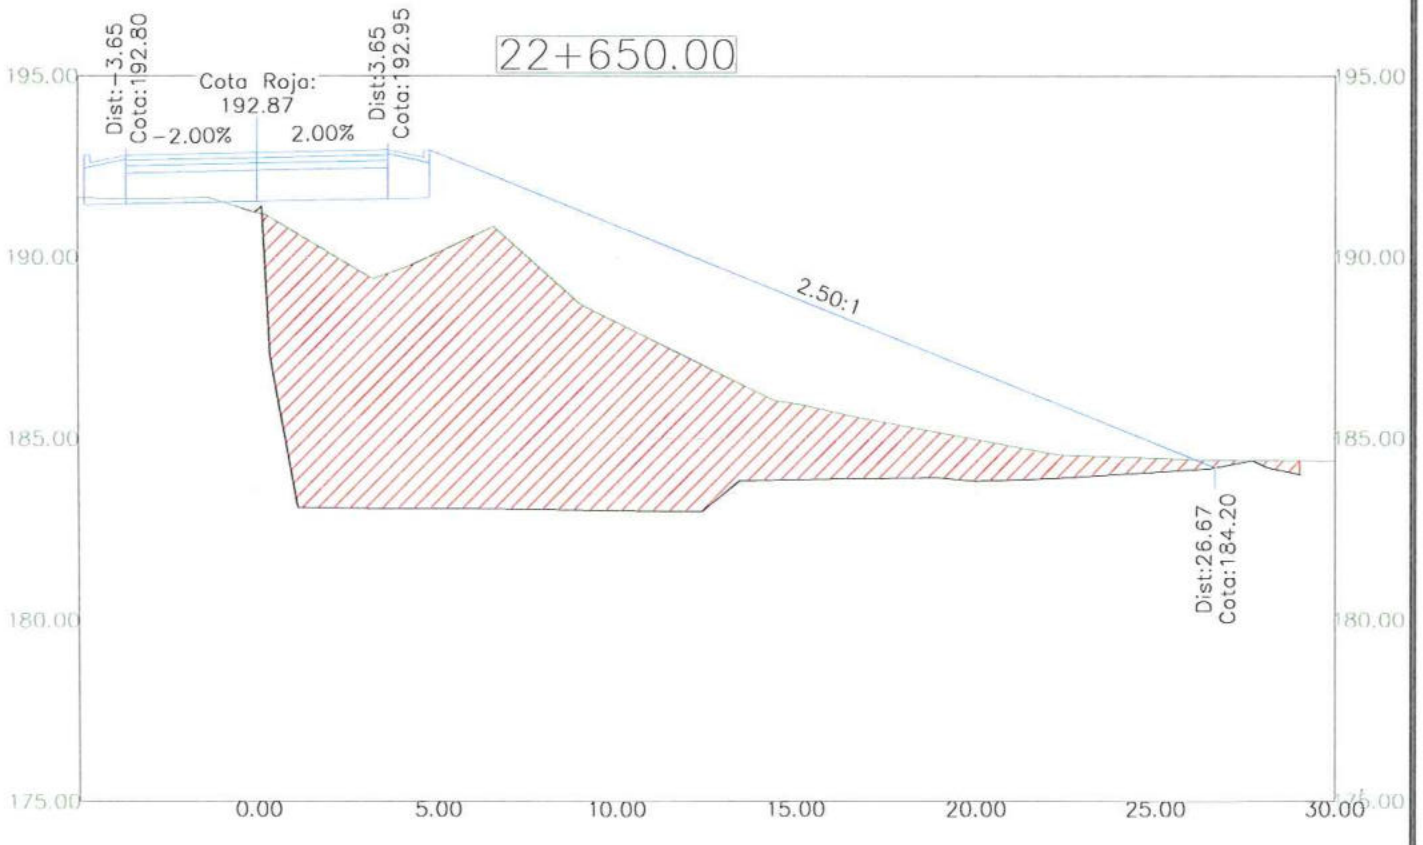
22+650.00
Dist:-3.65
Cota:192.80
Cota Roja:
192.87
Dist:3.65
Cota:192.95
-2.00%
2.00%
2.50:1
Dist:26.67
Cota:184.20
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

SUDINCO

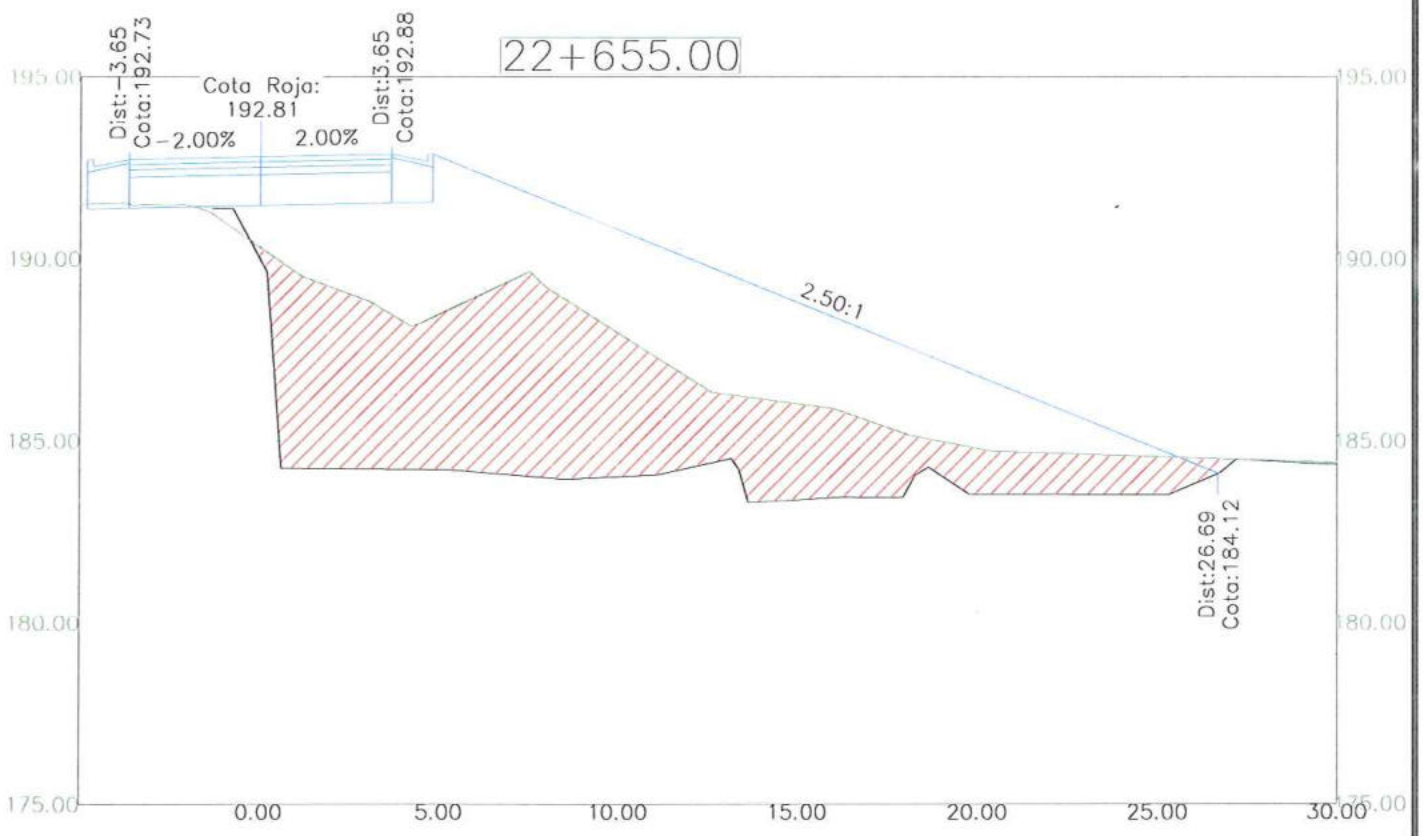

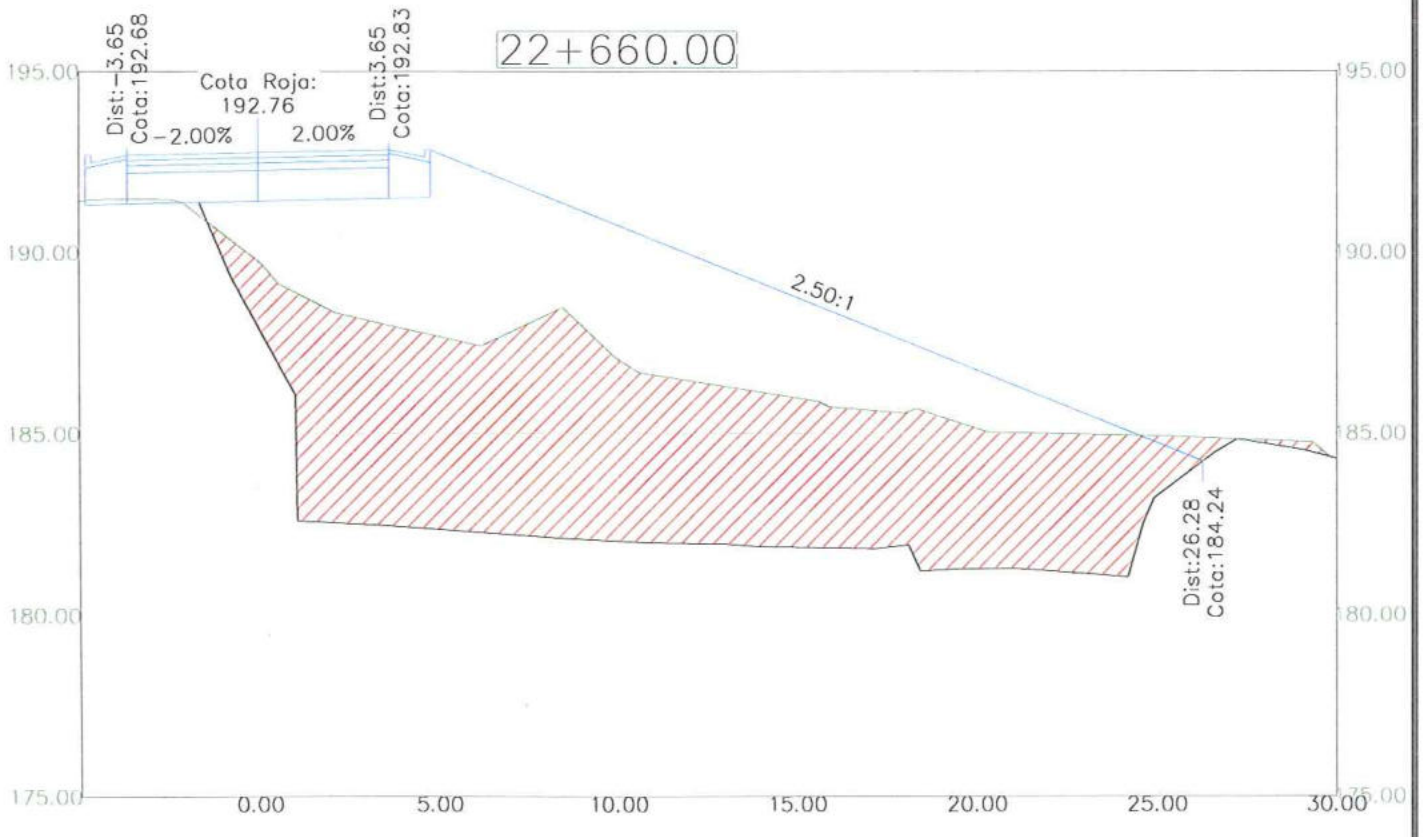



SUDINCO


SECCIONES TRANSVERSALES
ESCALA


3 -09

18-08-2025

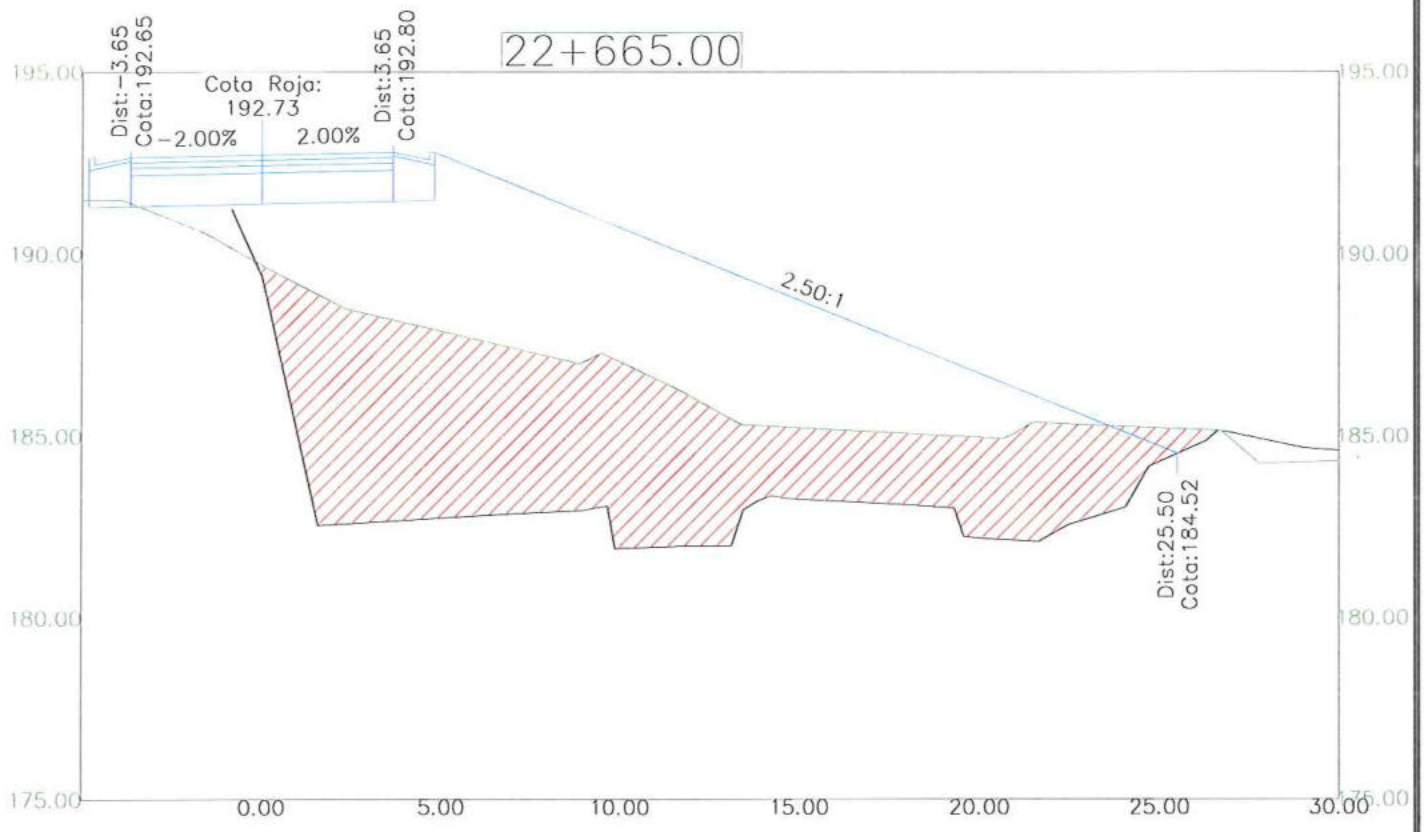
22+665.00
Dist:-3.65
Cota:192.65
Cota Roja:
192.73
-2.00%
2.00%
Dist:3.65
Cota:192.80
2.50:1
Dist:25.50
Cota:184.52
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

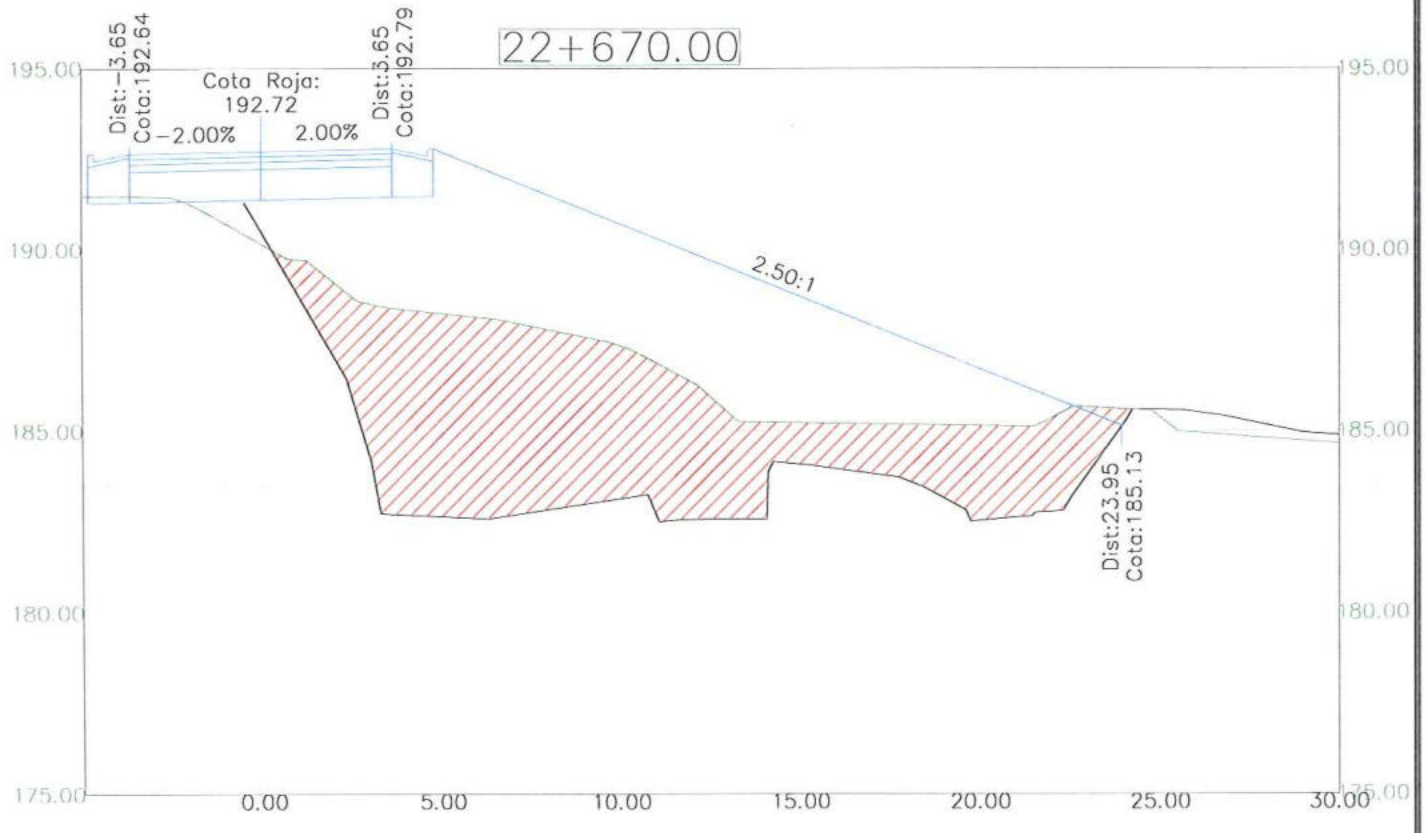
22+670.00
Dist:-3.65
Cota:192.64
Cota Roja:
192.72
-2.00%
2.00%
Dist:3.65
Cota:192.79
2.50:1
Dist:23.95
Cota:185.13
195.00
190.00
185.00
180.00
175.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

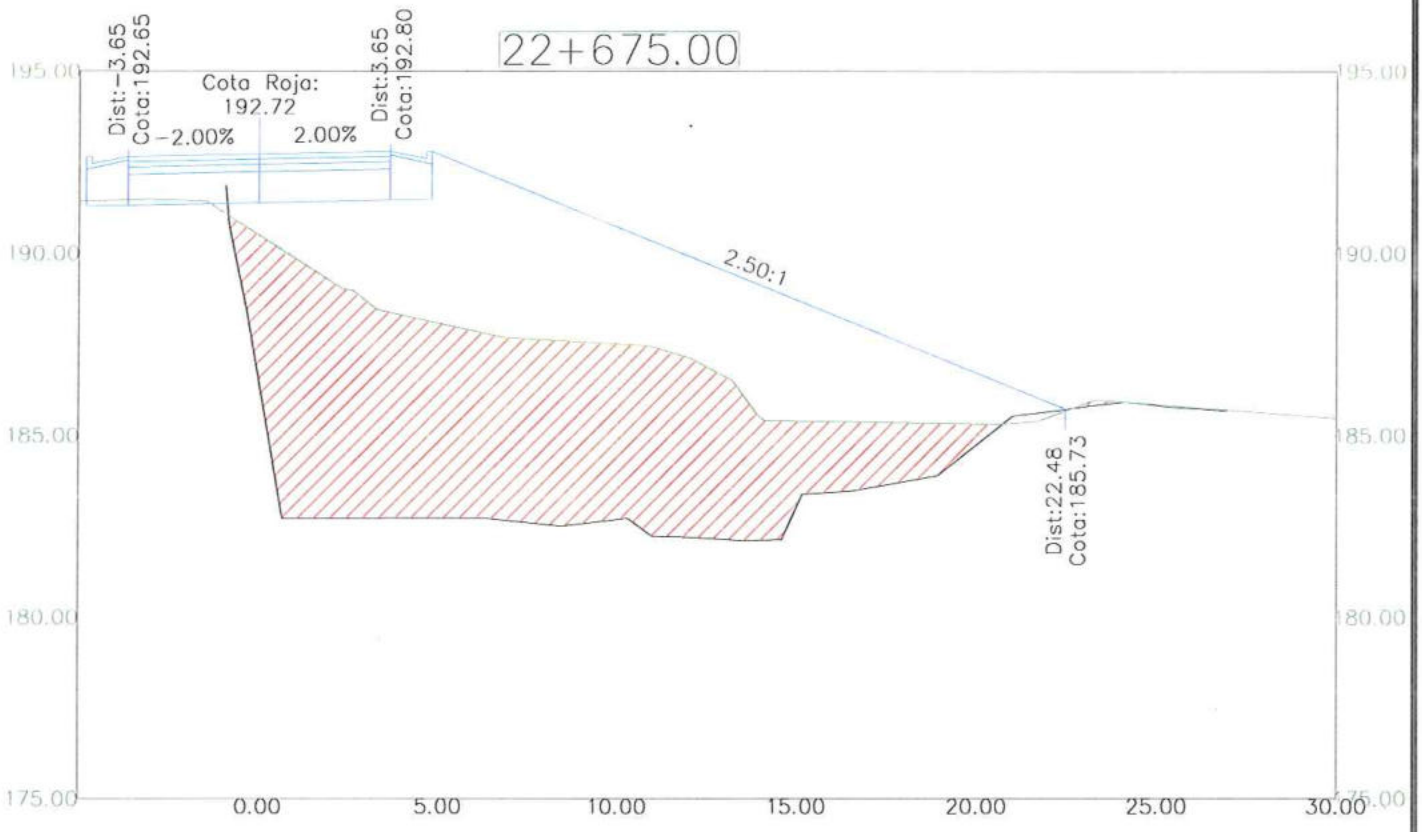


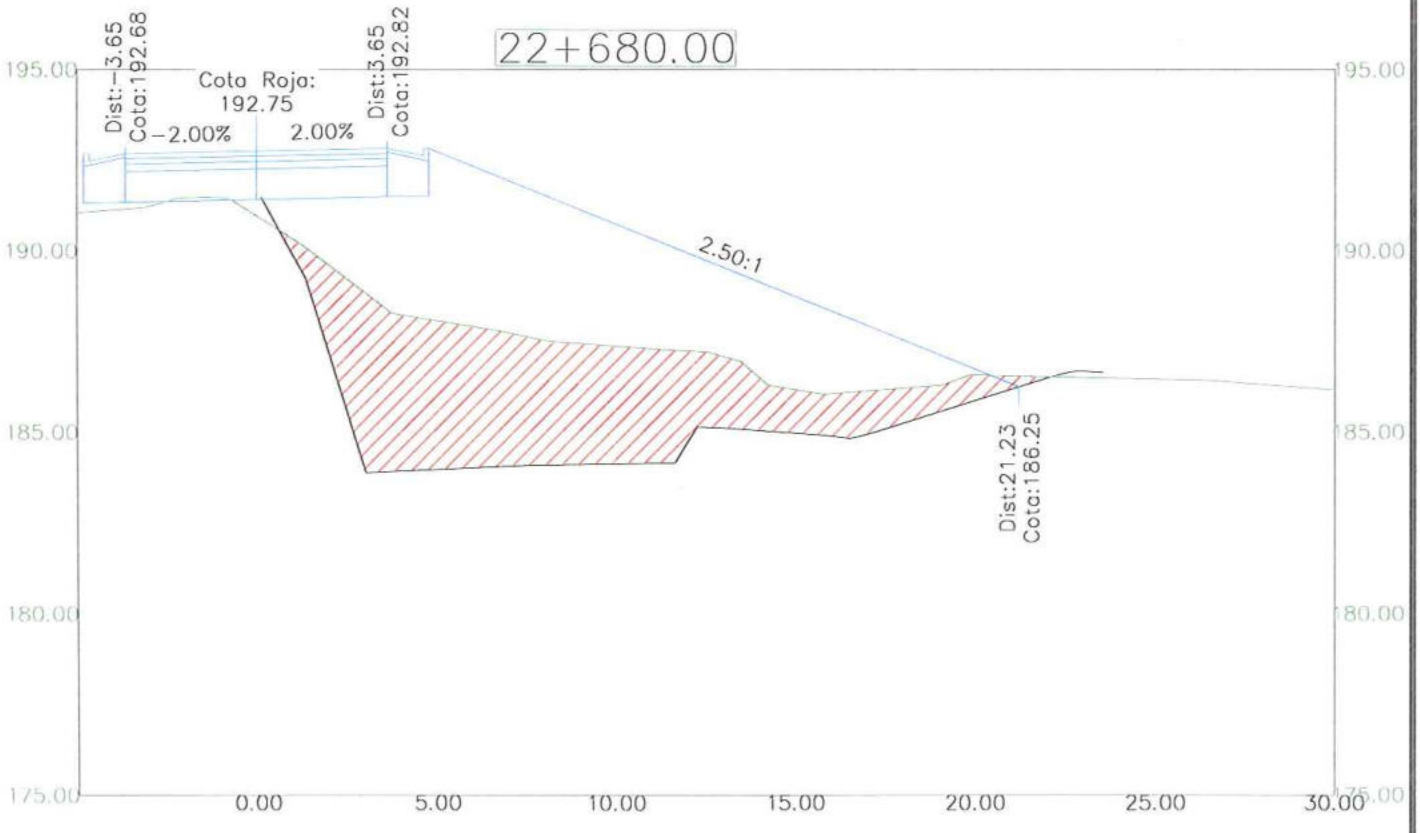


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES

5 -09

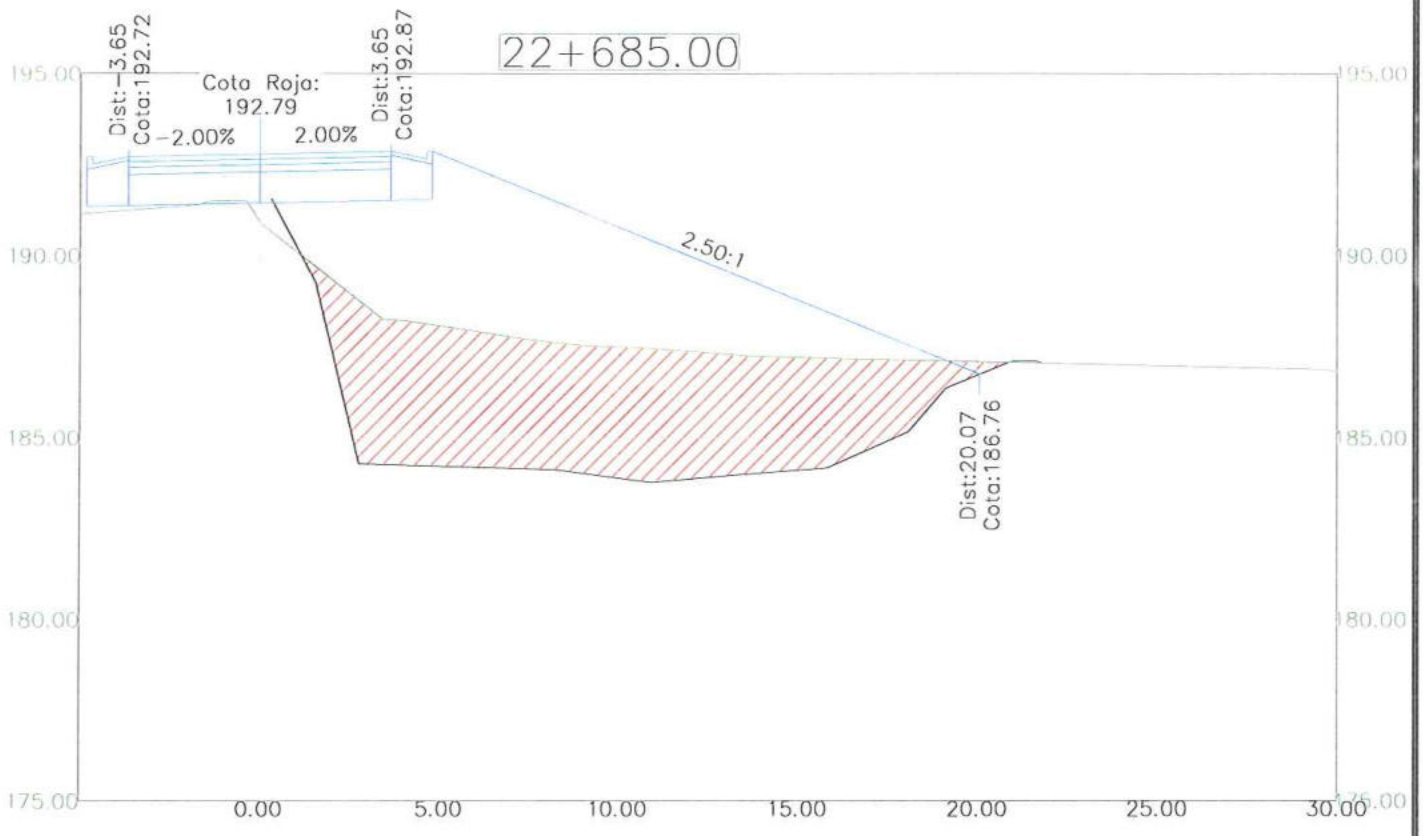

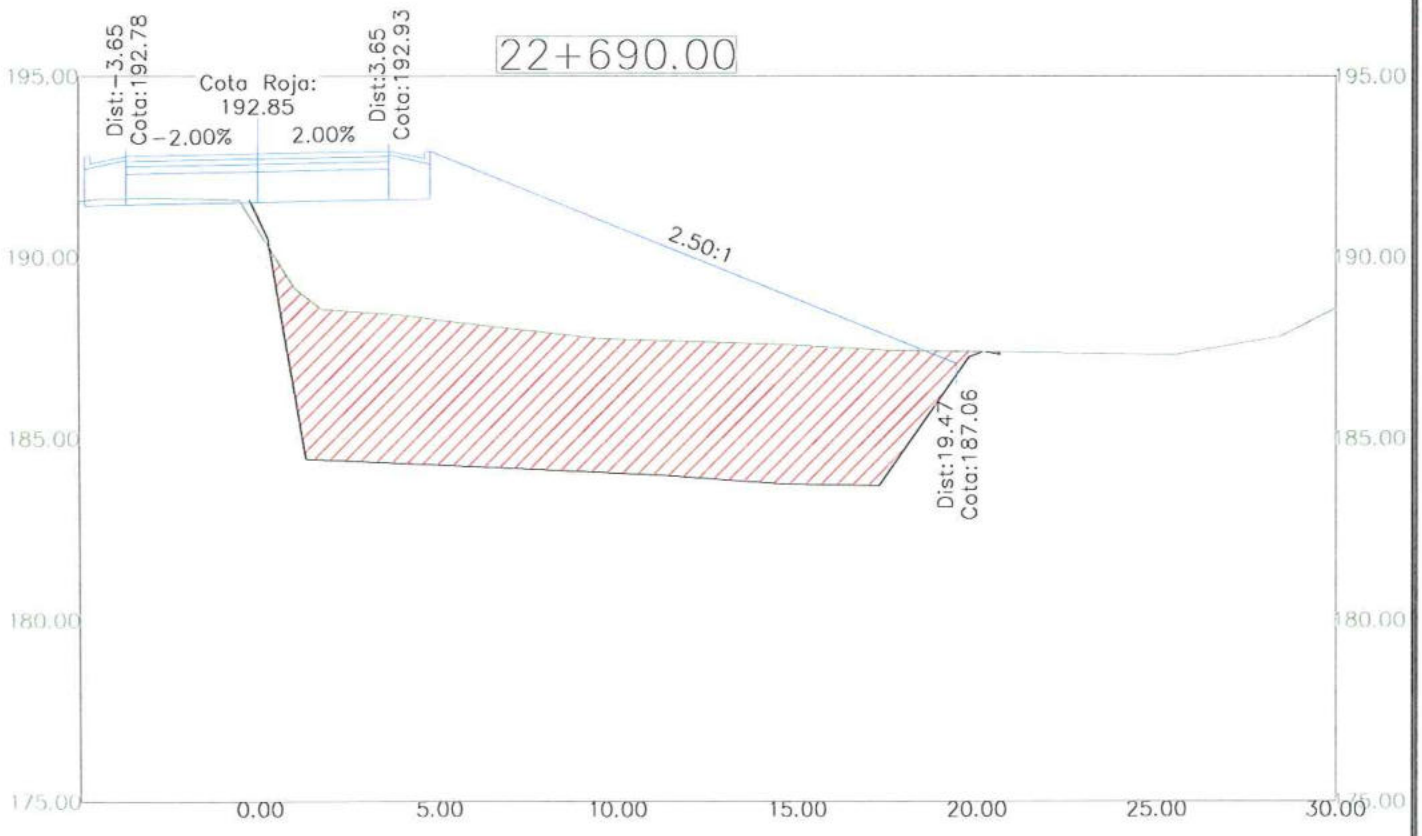



SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES

6 -09

18-09-2023

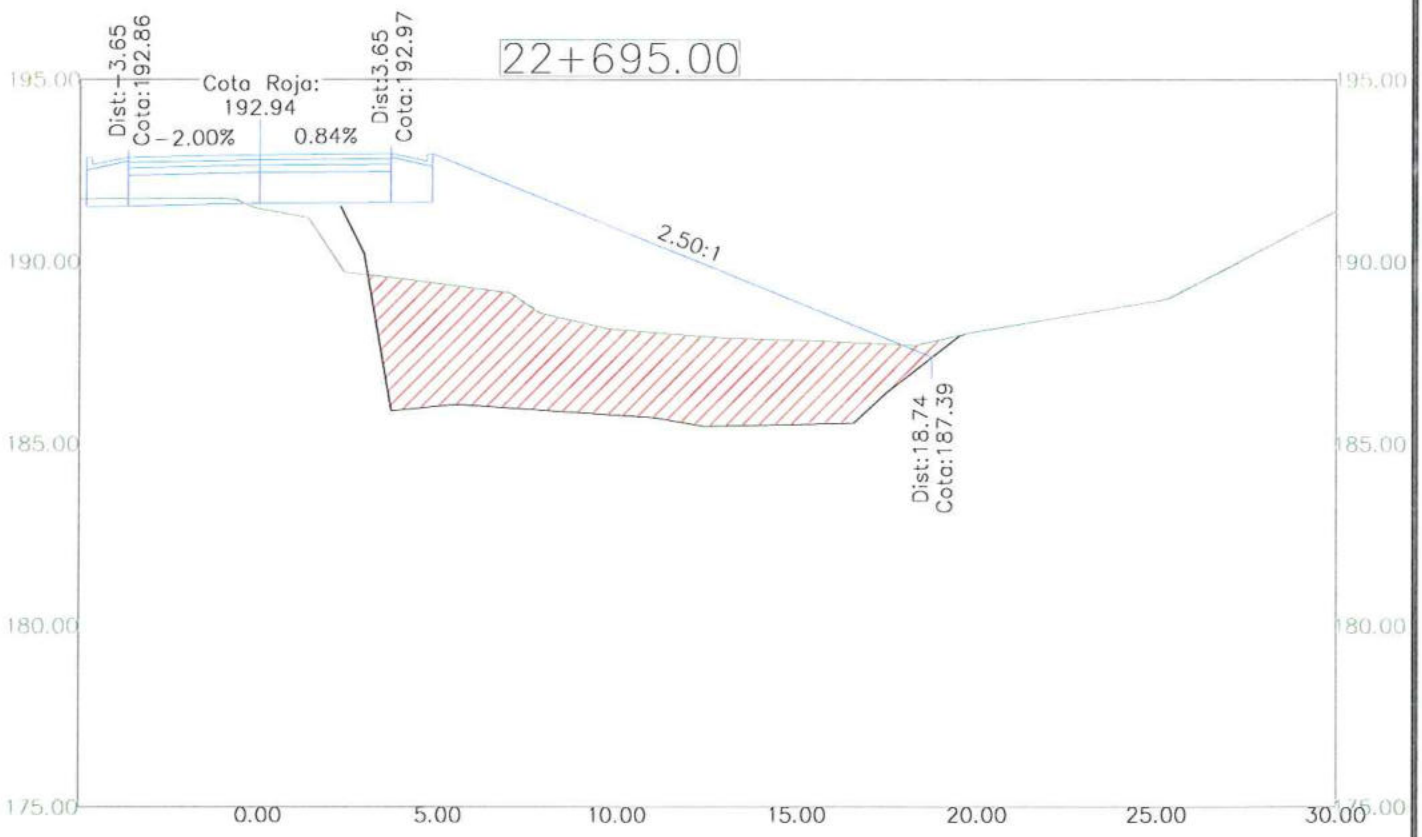

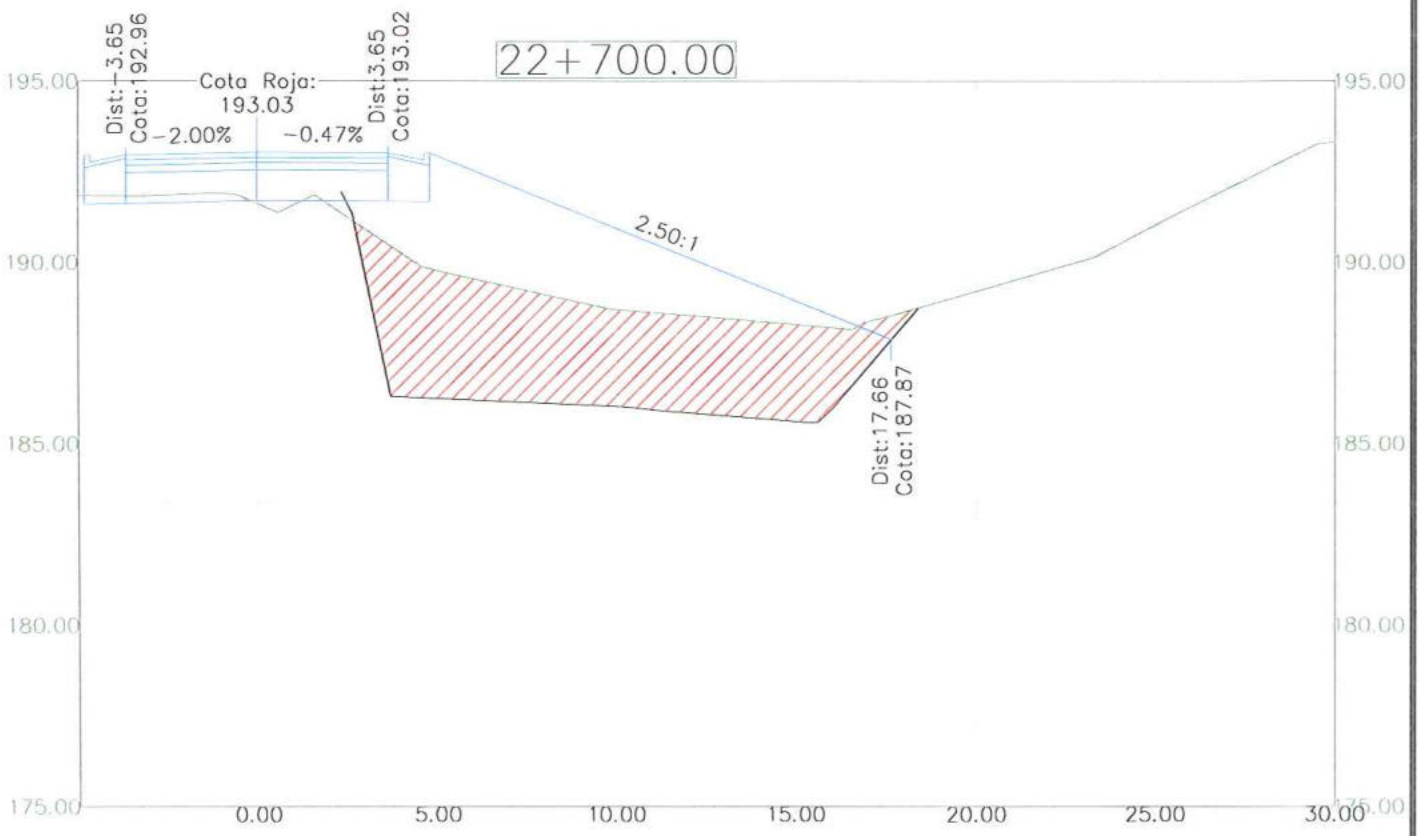

07


SUDINCO

SECCIONES TRANSVERSALES
EJE BAJA


7 - 09

18-08-2025


22+705.00

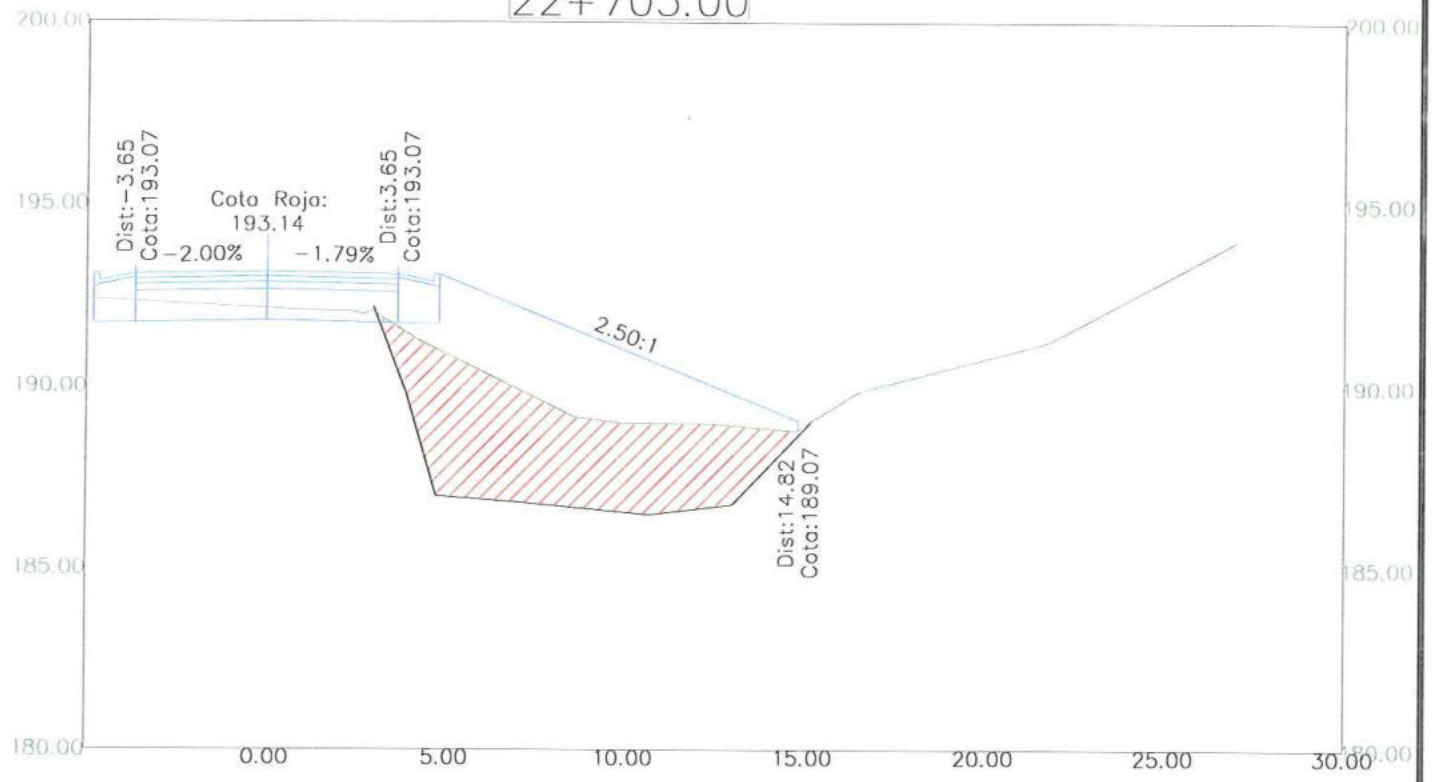


22+710.00

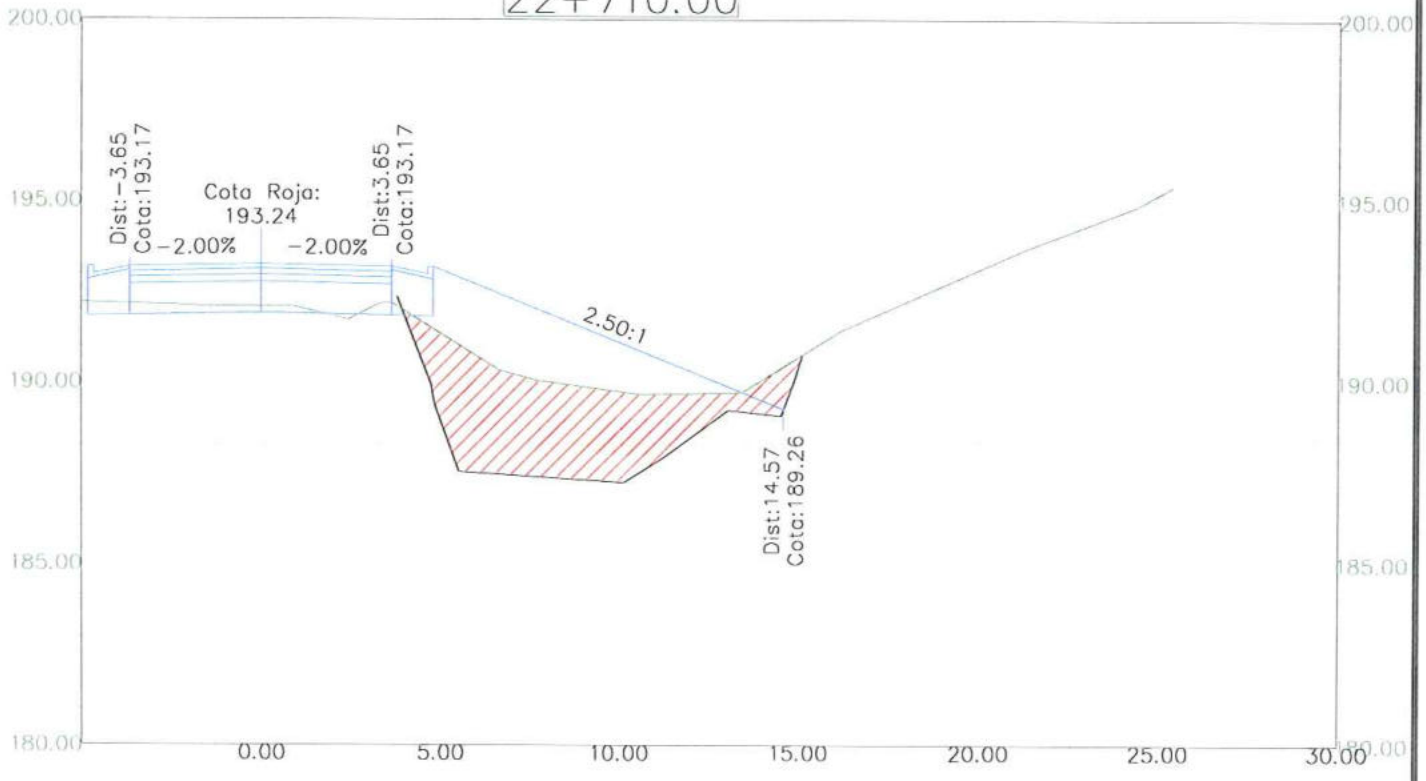

22+715.00

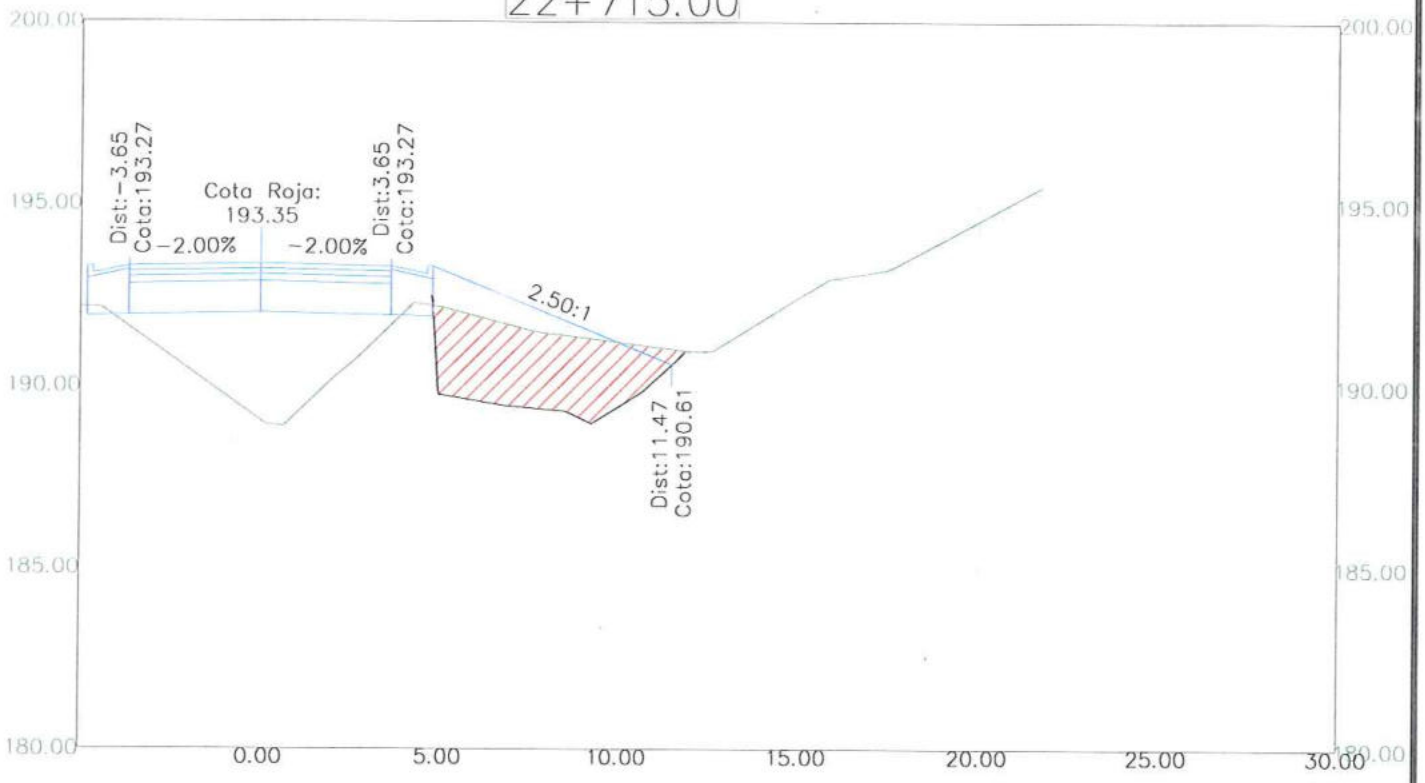

22+720.00

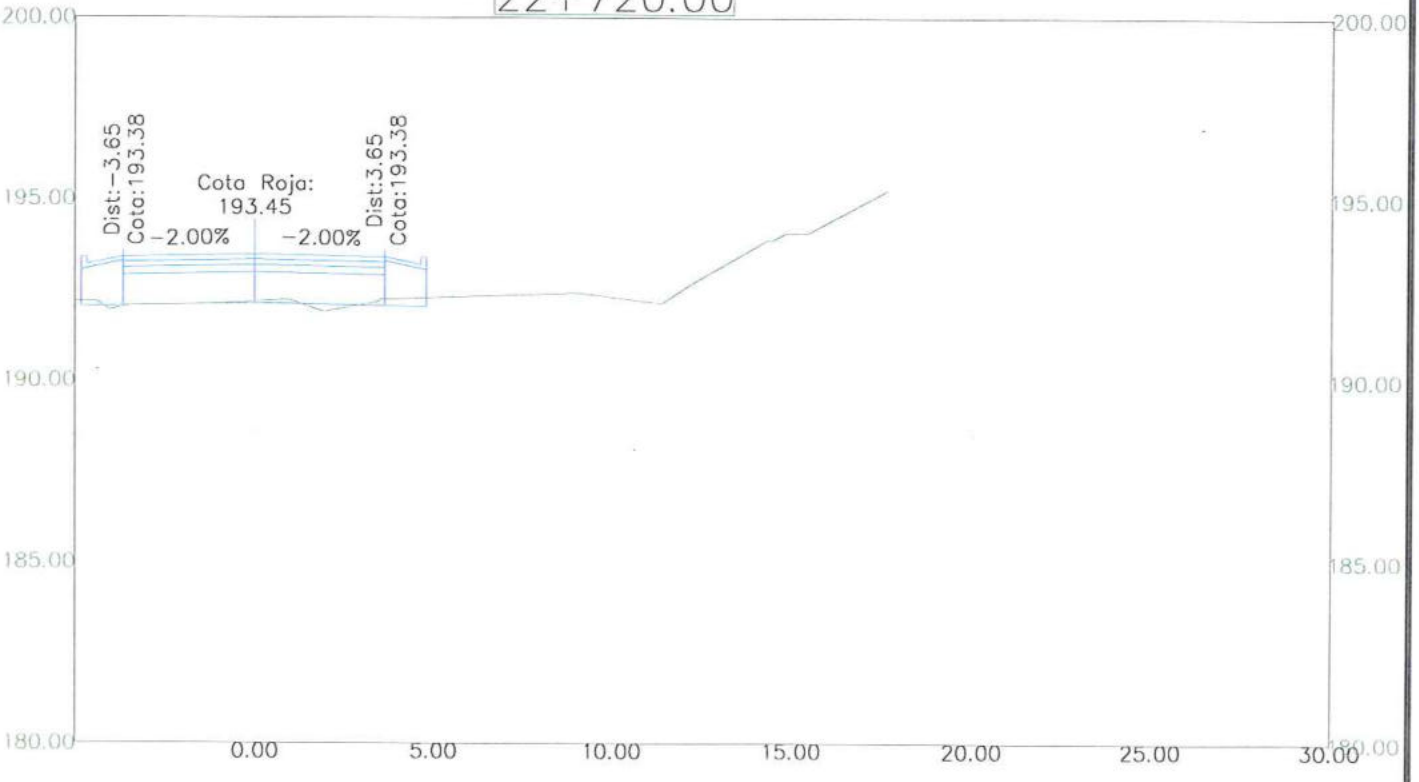


SUDINCO

9 -09

PLANTA MURO DE CONTENCION 51+190

PLANTA
ESCALA A

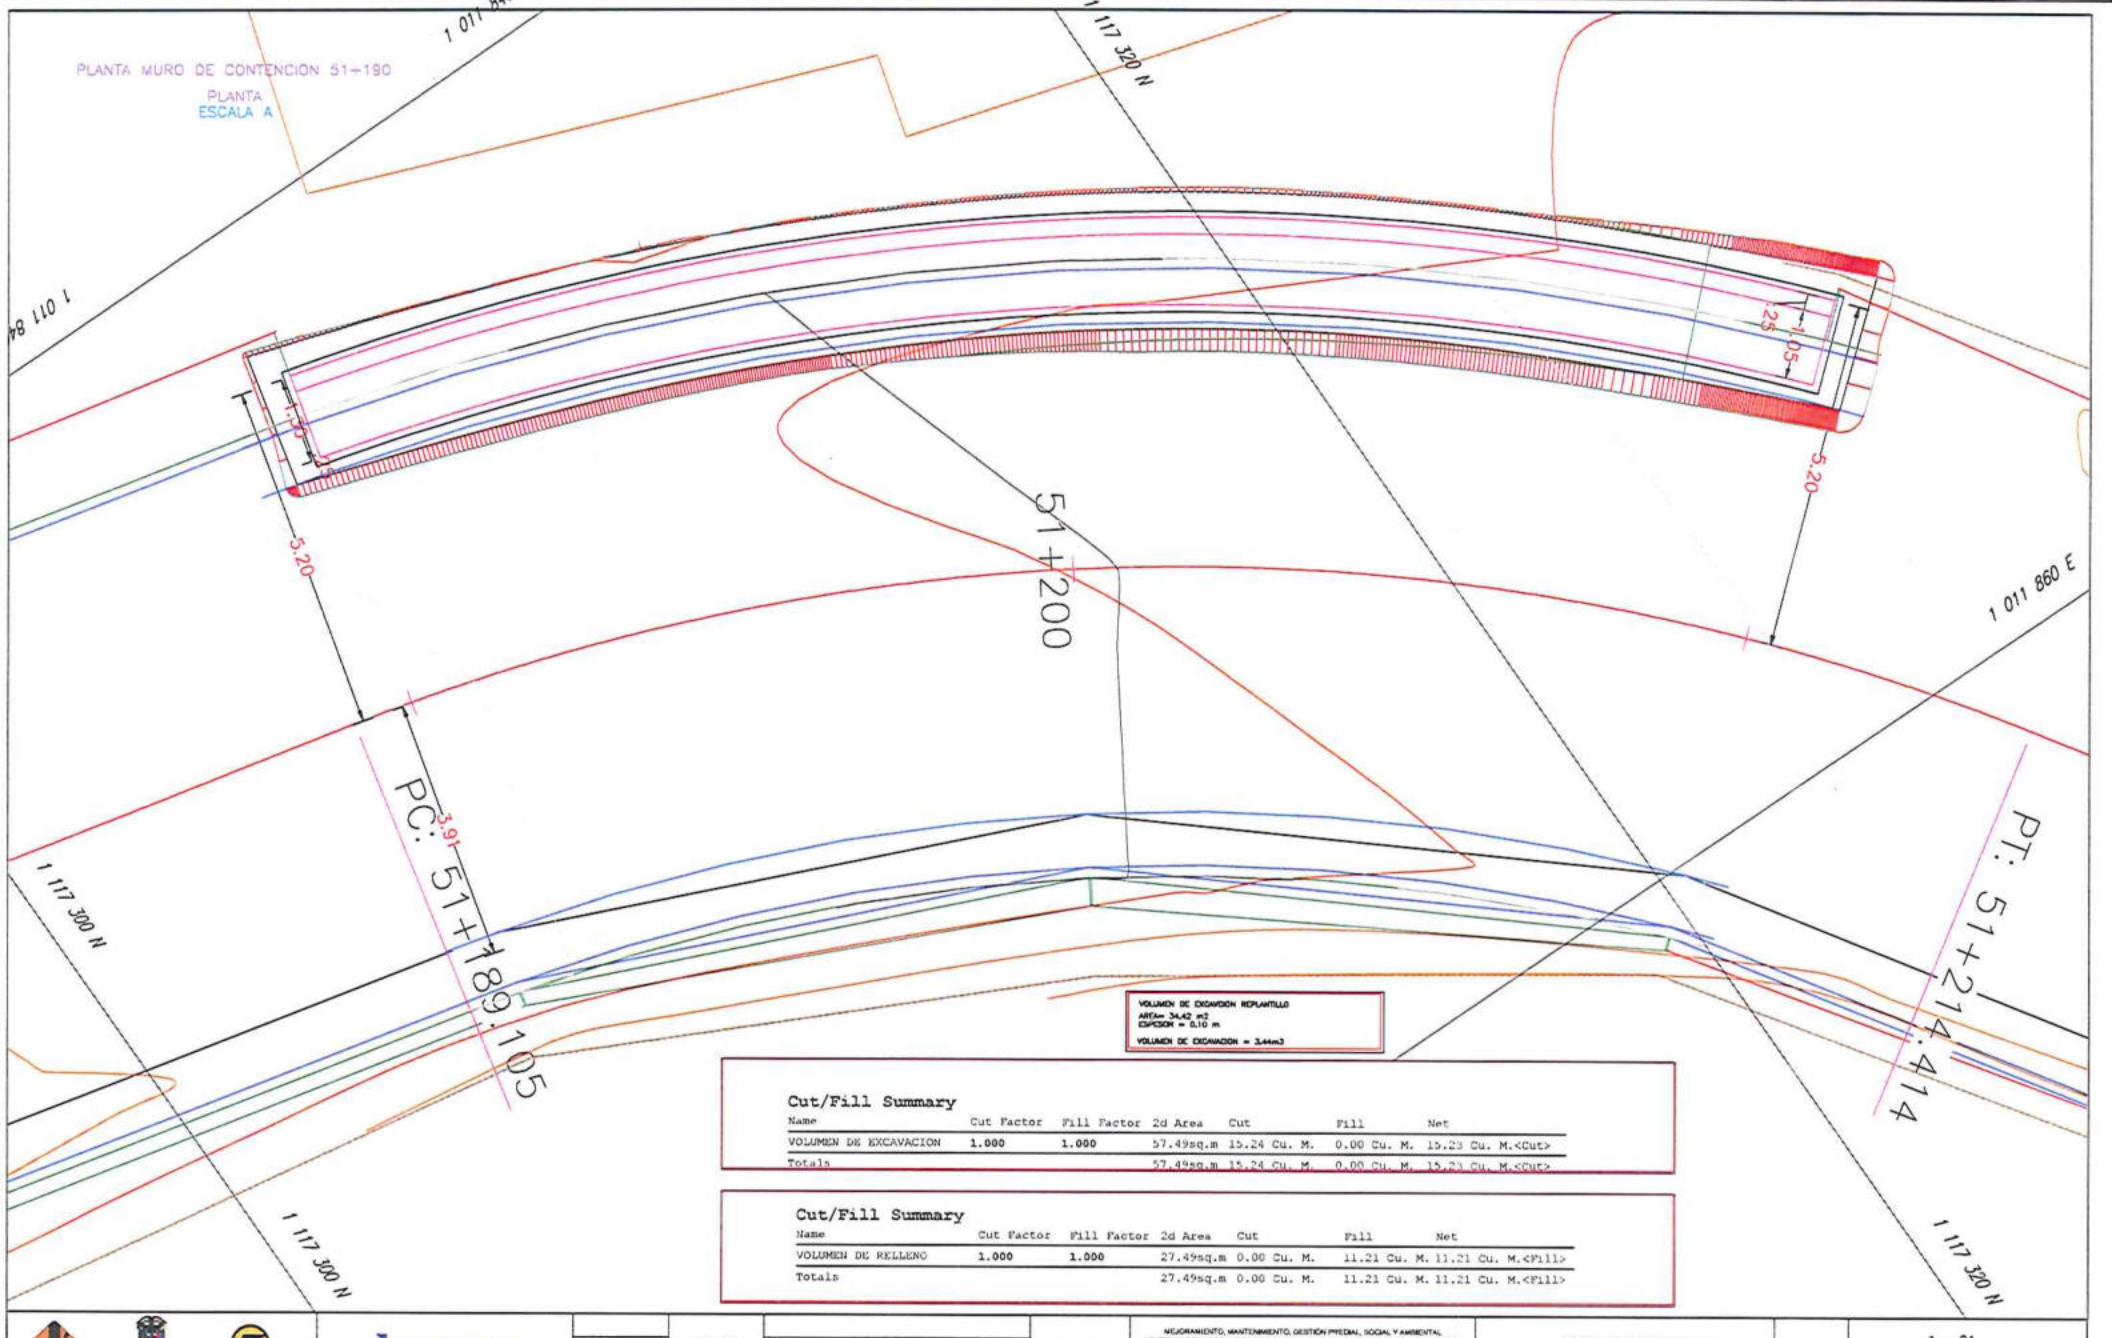

VOLUMEN DE EXCAVACION REPLANTILLO
AREA= 34.42 m2
ESPESOR = 0.10 m
VOLUMEN DE EXCAVACION = 3.44m3

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
VOLUMEN DE EXCAVACION	1.000	1.000	57.49sq.m	15.24 Cu. M.	0.00 Cu. M.	15.23 Cu. M.<Cut>
Totals			57.49sq.m	15.24 Cu. M.	0.00 Cu. M.	15.23 Cu. M.<Cut>

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
VOLUMEN DE RELLENO	1.000	1.000	27.49sq.m	0.00 Cu. M.	11.21 Cu. M.	11.21 Cu. M.<Fill>
Totals			27.49sq.m	0.00 Cu. M.	11.21 Cu. M.	11.21 Cu. M.<Fill>

SUDINCO

CONSORCIO CCOVISION 168

MEJORAMIENTO RUTA 6607

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUENTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAPUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3".

DISEÑO GEOMÉTRICO - MURO
51+190.00-51+212.00
6007

1 -01

05/08/2025

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	153,80
320.1	Subbase Granular clase A	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA - SECCIÓN TRANSVERSAL m2(B)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	23+900,00	23+910,00	6006	10,00	9,90	0,20		19,80	4,00	Avance del 20% en la construcción de la capa este mes para un avance acumulado del 100%
2	23+910,00	23+950,00	6006	40,00	9,90	0,20		79,20	79,20	Avance del 100% en la construcción de la capa este mes.
2	23+950,00	23+980,00	6006	30,00	9,90	0,20		59,40	11,90	Avance del 20% en la construcción de la capa este mes para un avance acumulado del 100%
2	56+900,00	56+960,00	6009	60,00	4,00	0,12		29,34	29,30	Adición material para garantizar transitabilidad en punto crítico
2	83+000,00	83+040,00	6009	40,00	5,66	0,13		29,43	29,40	Adición material para garantizar transitabilidad

TOTAL	153,8
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	153,8
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	153,8

RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	SOPORTE DE ACTA No.	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	PERIODO:	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	CONTRATO:	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	CONTRATO:	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
320.1	Subbase Granular clase A	m3		153,80



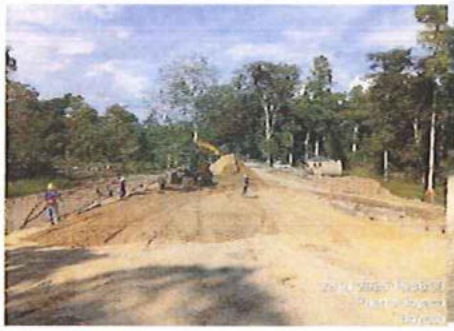









RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
330.1	Base granular clase A	m3	380,30	

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA - SECCIÓN TRANSVERSAL m2(B)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
2	21+610,00	22+060,00	6006	450,00	7,93	0,15		534,94	80,20	Avance del 15% este mes para un avance total acumulado del 100%
2	22+750,00	23+260,00	6006	510,00	7,93	0,15		606,26	90,90	Avance del 15% este mes para un avance total acumulado del 100%
2	23+660,00	23+870,00	6006	210,00	7,93	0,15		249,64	37,40	Avance del 15% este mes para un avance total acumulado del 100%
2	23+900,00	23+980,00	6006	80,00	7,93	0,15		95,10	80,80	Avance del 85% este mes para un avance total acumulado del 85%
2	24+000,00	24+080,00	6006	80,00	7,93	0,15		95,10	14,30	Avance del 15% este mes para un avance total acumulado del 100%
2	24+100,00	24+530,00	6006	430,00	7,93	0,15		511,16	76,70	Avance del 15% este mes para un avance total acumulado del 100%

TOTAL	380,3
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	380,3
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	380,3

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
330.1	Base granular clase A	m3		380,30











INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021


ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	380,30
330.1	Base granular clase A	m3		

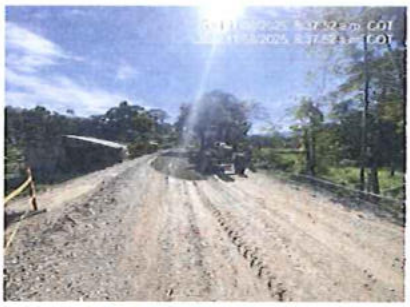







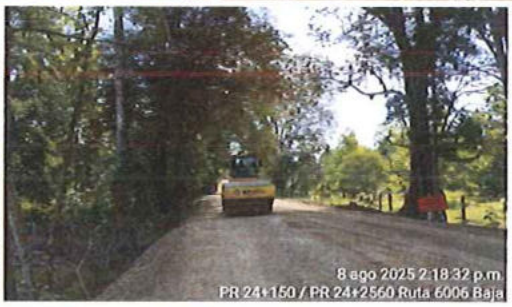



RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 992 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	8651,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO Promedio (m)		CANTIDAD	ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	21+620,00	21+940,00	6006	320,00	3,65			1.168,00	1168,00	Derecho
7	21+610,00	22+060,00	6006	450,00	3,65			1.642,50	1643,00	Izquierdo
7	21+940,00	22+060,00	6006	120,00	3,65			438,00	438,00	Derecho
7	22+750,00	23+010,00	6006	260,00	3,65			949,00	949,00	Izquierdo
7	22+750,00	23+260,00	6006	510,00	3,65			1.861,50	1862,00	Derecho
7	23+010,00	23+047,00	6006	37,00	3,65			135,05	135,00	Izquierdo
7	23+047,00	23+260,00	6006	213,00	3,65			777,45	777,00	Izquierdo
7	24+000,00	24+080,00	6006	80,00	7,30			584,00	584,00	Calzada
7	24+100,00	24+250,00	6006	150,00	7,30			1.095,00	1095,00	Calzada

TOTAL	8651,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	8651,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	8651,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021


ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		8651,00









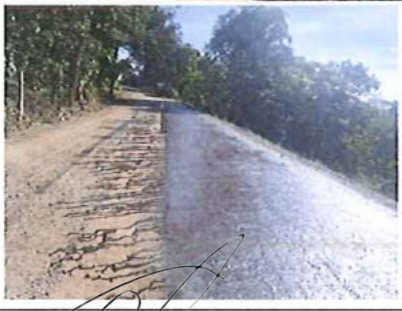


RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6005; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	12010,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO Promedio (m)			ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	20+630,00	21+050,00	6006	420,00	3,65			1.533,00	1533,00	Derecho
7	20+630,00	21+050,00	6006	420,00	3,65			1.533,00	1533,00	Izquierdo
7	21+106,00	21+346,00	6006	240,00	3,65			876,00	876,00	Derecho
7	21+346,00	21+386,00	6006	40,00	3,65			146,00	146,00	Derecho
7	21+110,00	21+370,00	6006	260,00	3,65			949,00	949,00	Izquierdo
7	21+610,00	22+060,00	6006	450,00	3,65			1.642,50	1643,00	Izquierdo
7	22+750,00	23+260,00	6006	510,00	3,65			1.861,50	1862,00	Derecho
7	21+620,00	22+060,00	6006	440,00	3,65			1.606,00	1606,00	Derecho
7	22+750,00	23+260,00	6006	510,00	3,65			1.861,50	1862,00	Izquierdo

TOTAL	12010,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	12010,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	12010,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA


INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	12010,00
421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		



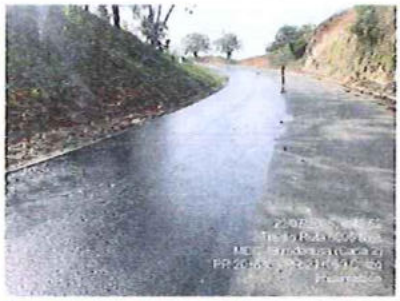



















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	1412,60
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO Promedio (m)	ESPESOR. (m)	CARRIL	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	20+630,00	21+050,00	6006	420,00	3,65	0,06	Derecho	91,98	92,00	Segunda capa
7	20+630,00	21+050,00	6006	420,00	3,65	0,06	Izquierdo	91,98	92,00	Segunda capa
7	21+106,00	21+346,00	6006	240,00	3,65	0,06	Derecho	52,56	52,60	Segunda capa
7	21+346,00	21+386,00	6006	40,00	3,65	0,06	Derecho	8,76	8,80	Segunda capa
7	21+110,00	21+370,00	6006	260,00	3,65	0,06	Izquierdo	56,94	56,90	Segunda capa
7	21+620,00	21+940,00	6006	320,00	3,65	0,08	Derecho	93,44	93,40	Primera capa
7	21+610,00	22+060,00	6006	450,00	3,65	0,08	Izquierdo	131,40	131,40	Primera capa
7	21+940,00	22+060,00	6006	120,00	3,65	0,08	Derecho	35,04	35,00	Primera capa
7	22+750,00	23+010,00	6006	260,00	3,65	0,08	Izquierdo	75,92	75,90	Primera capa
7	22+750,00	23+260,00	6006	510,00	3,65	0,08	Derecho	148,92	148,90	Primera capa
7	23+010,00	23+047,00	6006	37,00	3,65	0,08	Izquierdo	10,80	10,80	Primera capa
7	23+047,00	23+260,00	6006	213,00	3,65	0,08	Izquierdo	62,20	62,20	Primera capa
7	21+610,00	22+060,00	6006	450,00	3,65	0,06	Izquierdo	98,55	98,60	Segunda capa
7	22+750,00	23+260,00	6006	510,00	3,65	0,06	Derecho	111,69	111,70	Segunda capa
7	21+620,00	22+060,00	6006	440,00	3,65	0,06	Derecho	96,36	96,40	Segunda capa
7	22+750,00	23+260,00	6006	510,00	3,65	0,06	Izquierdo	111,69	111,70	Segunda capa
7	24+000,00	24+080,00	6006	80,00	7,30	0,08	Calzada	46,72	46,70	Primera capa
7	24+100,00	24+250,00	6006	150,00	7,30	0,08	Calzada	87,60	87,60	Primera capa

TOTAL	1412,6
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	1412,6
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	1412,6

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		1412,60











INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		1412,60











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	607,80

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO Promedio (m)	ESPESOR. (m)	CARRIL	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	53+264,00	59+285,00	6007					607,80	607,80	Material entregado a la Administración vial en cumplimiento al compromiso adquirido por INVAS el 26 de mayo-25 para actividades tapahuecos, incluido el suministro de emulsión y equipos para la actividad

TOTAL	607,8
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	607,8
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	607,8

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA


INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		607,80









4J

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	982 DE 2021

hoja 3 de 3

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		607,80







RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos | INFORME PARA PAGO | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006, 6007, 6008, 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 168

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
450.5P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheo	m3	0,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO Promedio (m)	PROFUND. (m)	CARRIL	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
	72+000	56+273	6007				Completo	521,4		El PR Inicial corresponde a la ubicación de la planta de asfalto ubicada en la ruta 6008 y el PR Final al controlde del tramo intervenido por la Administración vial
								521,4		

CONVERSIÓN DE ACUERDO CON EL APU:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	PRECIO +AIU	CANTIDAD	TOTAL ($)	
MEZCLA DENSA MDC-19	$ 613.306,22	$ 797.298,09	521,40	$ 415.711.222,04	
RETROEXCAVADORA	$ 220.000,00	$ 286.000,00	121,30	$ 34.691.800,00	Horas
VIBROCOMPACTADOR TIPO BENTIN	$ 75.600,00	$ 98.280,00	105,00	$ 10.319.400,00	Horas
TRANSPORTE MEZCLA	$ 126.334,00	$ 164.234,20	521,40	$ 85.631.711,88	
EMULSIÓN CRR-1	$ 2.057,00	$ 2.674,10	2.079,00	$ 5.559.453,90	
			SUBTOTAL	$ 551.913.587,82	
EQUIVALENTE AL ÍTEM 450.5P		$ 908.124,00		$ 607,75	
DISTANCIA TRANSPORTE (Km)	11,6				
VOLUMEN PARA PAGO (m3)	$ 607,75				
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO (m3)	$ 607,80				

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

SUDINCO - PAUNA

BENITEZ C. INGENIEROS — ORBE INGSAS

VALE Nº 2259

LUGAR Y FECHA: Tunja., 15 de julio 2025

OBRA: Sudinco Pauna.

MÁQUINA: KNZ794

OPERADOR: Cristian Cavo

ACTIVIDAD: MDC-19. | CANTIDAD: 14,0 m³

HORA SALIDA / HORA MÁQUINA	07:55 A.M. / P.M.	HORA LLEGADA / HORA MÁQUINA	A.M. / P.M.
ASFALTO TEMP. SALIDA	160 °C	ASFALTO TEMP. LLEGADA	°C

Despachado por: Oscar Vargas.

Recibido a Satisfacción por: 1056411023

C.C. Christian Cavo

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. INGENIEROS — ORBE INGSAS

VALE Nº 2272

LUGAR Y FECHA: Tunja 16 de julio 2025

OBRA: Sudinco Pauna

MÁQUINA: KNZ794.

OPERADOR: Cristian Cavo

ACTIVIDAD: MDC-19. | CANTIDAD: 14,0 m³

HORA SALIDA / HORA MÁQUINA	08:15 A.M. / P.M.	HORA LLEGADA / HORA MÁQUINA	A.M. / P.M.
ASFALTO TEMP. SALIDA	160 °C	ASFALTO TEMP. LLEGADA	°C

Despachado por: Oscar Vargas.

Recibido a Satisfacción por: 1056411023

C.C. Christian Cavo

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. INGENIEROS — ORBE INGSAS

VALE Nº 2274

LUGAR Y FECHA: Tunja, 16 de julio 2025

OBRA: Sudinco Pauna.

MÁQUINA: KNZ791

OPERADOR: Einer Martinez

ACTIVIDAD: MDC-19. | CANTIDAD: 14,0 m³

HORA SALIDA / HORA MÁQUINA	A.M. / P.M.	HORA LLEGADA / HORA MÁQUINA	A.M. / P.M.
ASFALTO TEMP. SALIDA	160 °C	ASFALTO TEMP. LLEGADA	°C

Despachado por: Oscar Vargas

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 80931943

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

U

SUDINCO - PAUNA.

BENITEZ C. ORBE INGENIEROS

VALE Nº 2286

LUGAR Y FECHA: TUNJA 17 DE JULIO DEL 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA.

MÁQUINA: LCN 791

OPERADOR: JOSE ANZOLA

ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19 — CANTIDAD: 14,5 hrs / m³

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO TEMP. SALIDA	160 °C	ASFALTO TEMP. LLEGADA	°C

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por:

C.C.

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. ORBE INGENIEROS

VALE Nº 2288

LUGAR Y FECHA: TUNJA. 17 DE JULIO DEL 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: KNZ 794

OPERADOR: CRISTIAN CARO

ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19 — CANTIDAD: 13,5 hrs / m³


HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA 09.00	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO TEMP. SALIDA	160 °C	ASFALTO TEMP. LLEGADA	°C

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por: 1056411023


C.C. Christian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

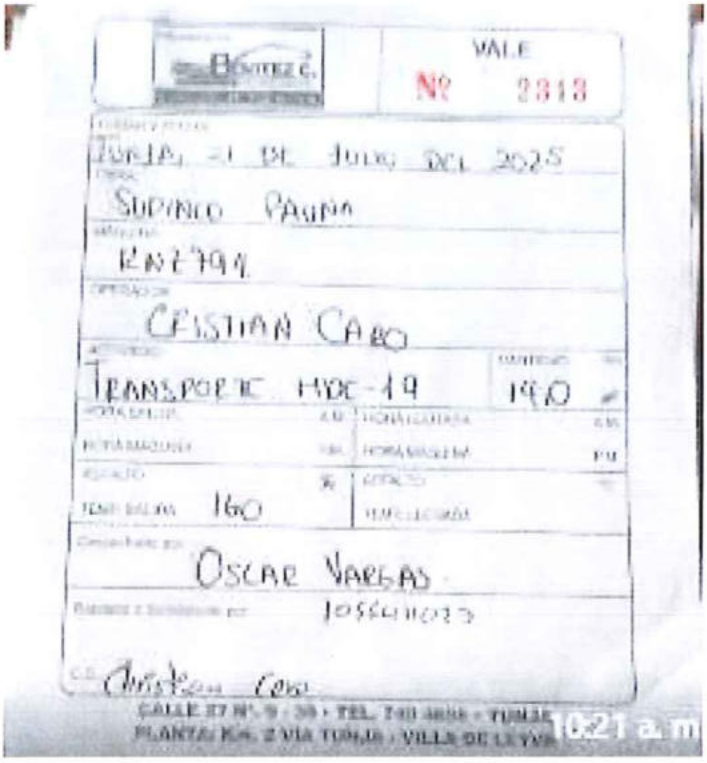

VALE
Nº 2313

TUNJA 21 DE JULIO DEL 2025
SUPINCO PAIPA
RNC794
CRISTIAN CABO
TRANSPORTE MDC-19 140
160
OSCAR VARGAS
1057601073
CRISTIAN CABO
CALLE 27 Nº. 9 - 39 - TEL. 740 4858 - TUNJA
PLANTA: Km. 2 VIA TUNJA - VILLA DE LEYVA
10:21 a. m

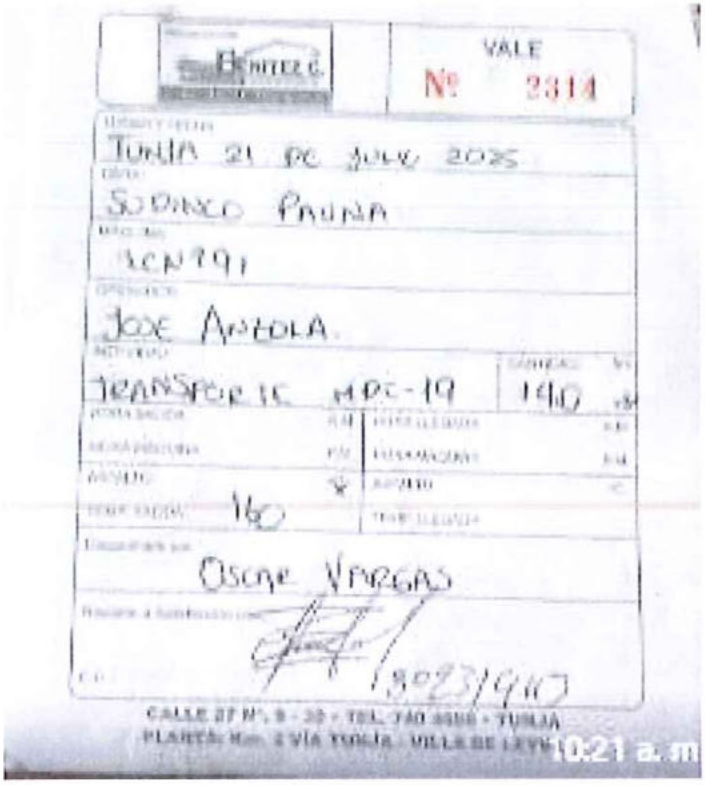

VALE
Nº 2314

TUNJA 21 DE JULIO 2025
SOGAMOSO PAIPA
RCN791
JOSE ARTOLA.
TRANSPORTE MDC-19 140
160
OSCAR VARGAS
1.057.601.073
CALLE 27 Nº. 9 - 39 - TEL. 740 4858 - TUNJA
PLANTA: Km. 2 VIA TUNJA - VILLA DE LEYVA
10:21 a. m

SUDINCO - PAUNA

BENITEZ C. INGENIEROS ORDENINGSAS

VALE Nº 2328

LUGAR Y FECHA: TUNJA 22 DE JULIO 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: KNZ 484.

OPERADOR: JOSE ANZOLA

ACTIVIDAD:	CANTIDAD: hrs
TRANSPORTE MDC-19	10,0 (G)

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO (G)		ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 80231943.

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. INGENIEROS ORDENINGSAS

VALE Nº 2329

LUGAR Y FECHA: TUNJA 22 DE JULIO 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA.

MÁQUINA: KNZ 794

OPERADOR: CRISTIAN CARO

ACTIVIDAD:	CANTIDAD: hrs
TRANSPORTE MDC-19	9,0 (G)

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO (G)		ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por: 1056411023

C.C. Christian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

LM

SUDINCO - PAUNA

BENITEZ C. ORDEINGSAS

VALE Nº 2334

LUGAR Y FECHA: Tunja 23 de Julio 2025.
OBRA: Sudinco Pauna
MÁQUINA: LCN791
OPERADOR: JOSE ANZOLA
ACTIVIDAD: MDC-19 | CANTIDAD: 14,0 hrs

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA 08:40	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: Oscar Vargas
Recibido a Satisfacción por:
C.C.

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. ORDEINGSAS

VALE Nº 2335

LUGAR Y FECHA: TUNJA 23 DE JULIO 2025.
OBRA: SUDINCO PAUNA.
MÁQUINA: KNZ794
OPERADOR: CRISTIAN CARO.
ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19. | CANTIDAD: 14,0 m³

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	G	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS.
Recibido a Satisfacción por: 1056411023
C.C. Christian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. ORDEINGSAS

VALE Nº 2349

LUGAR Y FECHA: TUNJA. 23 DE JULIO 2025.
OBRA: SUPINCO PAUNA
MÁQUINA: KNZ794
OPERADOR: CRISTIAN CARO.
ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19 | CANTIDAD: 14,0 m³

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	G	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS
Recibido a Satisfacción por: 1056411023
C.C. Christian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. ORDEINGSAS

VALE Nº 2348

LUGAR Y FECHA: TUNJA 24 DE JULIO 2025.
OBRA: SUDINCO PAUNA.
MÁQUINA: LCN791
OPERADOR: JOSE ANZOLA
ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19 | CANTIDAD: 14,0 m³

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	G	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS.
Recibido a Satisfacción por:
C.C.

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

SUDINCO - PAUNA

BENITEZ C. INGENIEROS

VALE
Nº 2363

LUGAR Y FECHA: Tunja, 25 de Julio 2025
OBRA: Sudinco. Pauna.
MÁQUINA: KN-2794.
OPERADOR: Cristian Cano.
ACTIVIDAD: MDC-19.
CANTIDAD: 14,0 hrs / m³
HORA SALIDA: 09:50 A.M. / P.M.
HORA MÁQUINA:
HORA LLEGADA: A.M. / P.M.
HORA MÁQUINA:
ASFALTO: % TEMP. SALIDA: 160
ASFALTO: °C TEMP. LLEGADA:
Despachado por: Oscar vargas.
Recibido a Satisfacción por: 1056410123
C.C. Christian Cano

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. INGENIEROS

VALE
Nº 2364

LUGAR Y FECHA: Tunja. 25 de julio 2025.
OBRA: Sudinco. Pauna
MÁQUINA: KNZ349.
OPERADOR: Jhon Cañon
ACTIVIDAD: MDC-19.
CANTIDAD: 14,0 hrs / m³
HORA SALIDA: 10:25 A.M. / P.M.
HORA MÁQUINA:
HORA LLEGADA: A.M. / P.M.
HORA MÁQUINA:
ASFALTO: % TEMP. SALIDA: 160
ASFALTO: °C TEMP. LLEGADA:
Despachado por: Oscar vargas.
Recibido a Satisfacción por:
C.C. JHON Cañon 1653339460

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

LM

SUDINCO PAUNA

BENITEZ C. ORDEN Y GOSS

VALE Nº 2376

LUGAR Y FECHA: TUNJA 31 DE JULIO 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: KNZ794

OPERADOR: CRISTIAN CARO.

ACTIVIDAD:	CANTIDAD: hrs
TRANSPORTE MDC-19	14,0

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por: 1056111623

C.C. Christian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. ORDEN Y GOSS

VALE Nº 2377

LUGAR Y FECHA: TUNJA 31 DE JULIO 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: ICN791

OPERADOR: JOSE ANZOLA

ACTIVIDAD:	CANTIDAD: hrs
TRANSPORTE MDC-19	14,0

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA 08:50	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 80231943

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. ORDEN Y GOSS

VALE Nº 2385

LUGAR Y FECHA: TUNJA 01 AGOSTO 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: ICN791

OPERADOR: JOSE ANZOLA

ACTIVIDAD:	CANTIDAD: hrs
TRANSPORTE MDC-19	14,0

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA 08:30	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por:

C.C.

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. ORDEN Y GOSS

VALE Nº 2386

LUGAR Y FECHA: TUNJA 01 DE AGOSTO 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA.

MÁQUINA: KNZ794

OPERADOR: CRISTIAN CARO

ACTIVIDAD:	CANTIDAD: hrs
TRANSPORTE MDC-19	14.0

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por: 1056111623

C.C. Christian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

SUDINCO PAUNA

BENITEZ C. ORDENAGAS

VALE Nº 2389

LUGAR Y FECHA: TUNJA 04 DE AGOSTO

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: KN7 794

OPERADOR: CRISTIAN CARO

ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19 | CANTIDAD: 14,6 m³ hrs

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA	160	TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por: 1056411023

C.C. Cristian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. ORDENAGAS

VALE Nº 2390

LUGAR Y FECHA: TUNJA, 04 AGOSTO 2025.

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: LCN 791

OPERADOR: JOSE ANZOLA

ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19 | CANTIDAD: 14,0 m³ hrs

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA	160	TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 80423443

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. ORDENAGAS

VALE Nº 2394

LUGAR Y FECHA: TUNJA 05 AGOSTO 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: LCN 791

OPERADOR: JOSE ANZOLA

ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19 | CANTIDAD: 14,0 m³ hrs

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA	160	TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 80423443

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. ORDENAGAS

VALE Nº 2395

LUGAR Y FECHA: TUNJA 05 AGOSTO 2025.

OBRA: SUDINCO PAUNA.

MÁQUINA: KN7 794.

OPERADOR: CRISTIAN CARO.

ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19 | CANTIDAD: 14,0 m³ hrs

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA	160	TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por: 1056411023

C.C. Cristian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

4

SUDINCO PAUNA

BENITEZ C. INGENIEROS ORDENES

VALE Nº 2400

LUGAR Y FECHA: TUNJA 06 DE AGOSTO 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: KNA

OPERADOR: CRISTIAN CARO

ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-10 | CANTIDAD: 8,0 m³ | hrs

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por: 1056411023

C.C. Christian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. INGENIEROS ORDENES

VALE Nº 2399

LUGAR Y FECHA: TUNJA 06 DE AGOSTO

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: LCN 791

OPERADOR: JOSE ANZOLA.

ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19 | CANTIDAD: 14,0 m³ | hrs

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 80231943

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

4J

SUDINCO - PAUNA

BENITEZ C. INGENIEROS

VALE
Nº 2402

LUGAR Y FECHA: Tunja, 11 de agosto 2025

OBRA: Sudmco Pauna

MÁQUINA: HCN 791.

OPERADOR: Jose Anzola

ACTIVIDAD: MDC-19

CANTIDAD: 14,5 m³ hrs

HORA SALIDA / HORA MÁQUINA	08:30 A.M. / P.M.	HORA LLEGADA / HORA MÁQUINA	A.M. / P.M.
ASFALTO / TEMP. SALIDA	160 °C	ASFALTO / TEMP. LLEGADA	°C

Despachado por: OSCar vargas

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 80231443

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. INGENIEROS

VALE
Nº 2404

LUGAR Y FECHA: Tunja, 11 de agosto 2025.

OBRA: Sudmco Pauna.

MÁQUINA: HNZ 794

OPERADOR: Cristian Cova.

ACTIVIDAD: MDC-19

CANTIDAD: 14,5 m³ hrs

HORA SALIDA / HORA MÁQUINA	09:32 A.M. / P.M.	HORA LLEGADA / HORA MÁQUINA	A.M. / P.M.
ASFALTO / TEMP. SALIDA	160 °C	ASFALTO / TEMP. LLEGADA	°C

Despachado por: OSCar vargas

Recibido a Satisfacción por: 1056911023

C.C. Cristian Cova

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

SUDINCO - PAUNA

BENITEZ C.

VALE Nº 2433

LUGAR Y FECHA: Tunja, 14 de Agosto 2025

OBRA: Sudinco Pauna

MÁQUINA: LCN 791

OPERADOR: Jose Anzola

ACTIVIDAD	CANTIDAD
MDC-19.	14,5 m³

HORA SALIDA / HORA MÁQUINA	09:30 A.M. / P.M.	HORA LLEGADA / HORA MÁQUINA	A.M. / P.M.
ASFALTO TEMP. SALIDA	160 °C	ASFALTO TEMP. LLEGADA	°C

Despachado por: Oscar Vargas

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 80231947

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C.

VALE Nº 2436

LUGAR Y FECHA: Tunja, 14 de Agosto 2025.

OBRA: Sudinco Pauna

MÁQUINA: KNZ 794

OPERADOR: Cristian Coro

ACTIVIDAD	CANTIDAD
MDC-19.	14,5 m³

HORA SALIDA / HORA MÁQUINA	10:29 A.M. / P.M.	HORA LLEGADA / HORA MÁQUINA	A.M. / P.M.
ASFALTO TEMP. SALIDA	160 °C	ASFALTO TEMP. LLEGADA	°C

Despachado por: Oscar Vargas

Recibido a Satisfacción por: 1056411023

C.C. Christian Coro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

SUDINCO PAUNA

BENITEZ C. INGENIEROS ORDENAGAS

VALE Nº 2448

LUGAR Y FECHA: Tunja. 15 de Agosto 2025

OBRA: Sudinco Pauna

MÁQUINA: LCN791.

OPERADOR: Jose Antole

ACTIVIDAD: MDC-19 | CANTIDAD: 14,5 hrs / m³

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MAQUINA 09:05	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: Oscar Vargas

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 80239403

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. INGENIEROS ORDENAGAS

VALE Nº 2449

LUGAR Y FECHA: TUNJA 15 AGOSTO 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: KN7794

OPERADOR: CRISTIAN CARO

ACTIVIDAD: MDC-19 | CANTIDAD: 14,5 hrs / m³

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA 09:30	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por: 1056111073

C.C. Christian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

LM

SUDINCO PAUNA

BENITEZ C. INGENIEROS ORBIGAS

VALE Nº 2455

LUGAR Y FECHA: TUNJA 19 AGOSTO 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: KN2-194

OPERADOR: CRISTIAN CAPO.

ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC 19 — CANTIDAD: 14,0 m³

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA 09-25	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°F	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: Oscar Vargas

Recibido a Satisfacción por: 1056411023

C.C. Christian Capo

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. INGENIEROS ORBIGAS

VALE Nº 2459

LUGAR Y FECHA: TUNJA 19 AGOSTO 2025

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: KN194

OPERADOR: JOSE ANGOLA

ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19 — CANTIDAD: 14,0 m³

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA 10:50	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°F	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 1056411023

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

SUDINCO PAUNA

BENITEZ C. INGENIEROS

VALE

Nº 2463

LUGAR Y FECHA: TUNJA 20 DE AGOSTO 2025.

OBRA: SUDINCO PAUNA.

MÁQUINA: LCN 791

OPERADOR: JOSE ANZOLA

ACTIVIDAD:	CANTIDAD: hrs / m^3
TRANSPORTE HDC-19	140


HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA 08:05	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO	°C	ASFALTO	°C
TEMP. SALIDA 160		TEMP. LLEGADA	

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 80231943

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

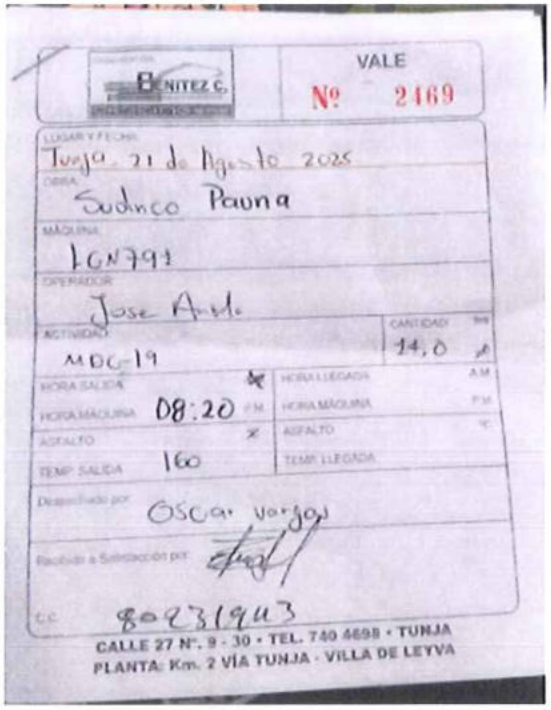

BENITEZ C.

VALE
Nº 2469

LUGAR Y FECHA: Tunja. 21 de Agosto 2025
OBRA: Sudnco Pauna
MÁQUINA: EGN791
OPERADOR: Jose Ardo
ACTIVIDAD: MDC-19
CANTIDAD: 14,0 Ton
HORA SALIDA: A.M.
HORA MÁQUINA: 08:20 P.M.
HORA LLEGADA: A.M.
HORA MÁQUINA: P.M.
ASFALTO: X
TEMP. SALIDA: 160
ASFALTO: °C
TEMP. LLEGADA:
Despachado por: OSCar Vargas
Recibió a Satisfacción por:
C.C. 80231943

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA



BENITEZ C.

VALE
Nº 2470

LUGAR Y FECHA: TUNJA 21 AGOSTO 2025.
OBRA: SUDINCO PAUNA
MÁQUINA: EN7794
OPERADOR: CRISTIAN CARO
ACTIVIDAD: TRANSPORTE MDC-19
CANTIDAD: 19,0 Ton
HORA SALIDA: 08:50 A.M.
HORA MÁQUINA: P.M.
HORA LLEGADA: A.M.
HORA MÁQUINA: P.M.
ASFALTO: X
TEMP. SALIDA: 160
ASFALTO: °C
TEMP. LLEGADA:
Despachado por: OSCAR VARGAS.
Recibió a Satisfacción por: 1056411023
C.C. Christian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

SUDINCO PAUNA

BENITEZ C. ORBEMASAS

VALE
Nº 2475

LUGAR Y FECHA: TUNJA 22 AGOSTO 2025.

OBRA: SUDINCO PAUNA

MÁQUINA: LCN7C11

OPERADOR: JOSE ANZOLA

ACTIVIDAD	CANTIDAD
TRANSPORTE HDC-19	14,0 m³

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA 08:00	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO TEMP. SALIDA 160	°C	ASFALTO TEMP. LLEGADA	°C

Despachado por: OSCAR VARGAS

Recibido a Satisfacción por:

C.C. 80931943

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

BENITEZ C. ORBEMASAS

VALE
Nº 2478

LUGAR Y FECHA: TUNJA 22 AGOSTO 2025

OBRA: SUDINCO - PAUNA

MÁQUINA: KNL794

OPERADOR: CRISTIAN CARO.

ACTIVIDAD	CANTIDAD
TRANSPORTE HDC-19	14,0 m³

HORA SALIDA	A.M.	HORA LLEGADA	A.M.
HORA MÁQUINA 09:15	P.M.	HORA MÁQUINA	P.M.
ASFALTO TEMP. SALIDA 160	°C	ASFALTO TEMP. LLEGADA	°C

Despachado por: OSCAR VARGAS.

Recibido a Satisfacción por: 1052411023

C.C. Cristian Caro

CALLE 27 Nº. 9 - 30 • TEL. 740 4698 • TUNJA
PLANTA: Km. 2 VÍA TUNJA - VILLA DE LEYVA

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FECHA	UNIDAD	CANTIDAD	FIRMA DE QUIEN ENTREGA	CARGO DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE	CARGO DE QUIEN RECIBE	OBSERVA
7-15-2025	Gal	55		Ing Res JR		ANVZ	1 canec
7-16-2025	Gal	55		Ing Res JR		ING. AUX 1 ANVZ	1 Canec
7-21-2025	Gal	110		Ing Res JR		ING. AUX 1 ANVZ	2 canec
7-24-2025	Gal	110		Ing Res JR		ING. AUX 1 ANVZ	2 Canec
08-01-25	Gal	~~110~~		Ing Res JR		ING. AUX 1 ANVZ	2 canec
08-05-2025	Gal	110		Ing Res JR		ING. AUX 1 ANVZ	2 canec
~~01-08-2025~~	~~Gal~~						

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006, 6007, 6008, 6009

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	320,20
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA SECCIÓN TRANSVERSAL (m2)	ANCHO PROMEDIO (m)	ALTURA PROMEDIO (m)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	22+658,00	22+700,00	6006	14,00		0,60	0,60	5,04	5,00	Excavación subdren manejo de agua relleno
5	22+670,00	22+677,00	6006	7,00		0,60	0,60	2,52	2,50	Excavación ramal subdren para relleno
5	23+850,00	23+926,00	6006	46,00		0,60	1,00	27,60	27,60	Excavación subdren vial - costado izquierdo
5	23+895,00	23+930,00	6006	35,00		0,60	1,00	21,00	21,00	Excavación subdren vial - costado derecho
5	25+396,00	25+396,00	6006	6,00		1,00	1,80	10,80	10,80	Excavación alcantarilla - costado derecho
5	24+087,00	24+087,00	6006	4,40		2,03	0,50	4,47	4,50	excavación losa inferior aletas descole
5	24+087,00	24+087,00	6006	4,40		0,50	0,40	0,88	0,90	excavación dentellón
5	24+087,00	24+087,00	6006	2,55		2,03	0,50	2,59	2,60	excavación zapata muro aletas encole
5	24+256,00	24+256,00	6006	4,40		2,03	0,50	4,47	4,50	excavación losa inferior aletas descole
5	24+256,00	24+256,00	6006	4,40		0,50	0,40	0,88	0,90	excavación dentellón
5	24+256,00	24+256,00	6006	2,55		2,03	0,50	2,59	2,60	excavación zapata muro aletas encole
5	51+190,00	51+212,00	6007	22,00	57,49			15,24	15,20	Excavación mureta
5	51+190,00	51+212,00	6007	22,00		1,56	0,10	3,44	3,40	Excavación para solado
5	57+910,00	57+928,00	6009	18,00		3,50	2,19	138,00	138,00	Excavación gaviones
5	59+383,00	59+387,50	6009	4,50		1,65	1,00	7,43	7,40	Excavación replanteo cuneta
5	59+720,00	59+720,00	6009	4,00		2,50	2,09	20,90	20,90	Excavación descole Box
5	60+030,00	60+030,00	6009	8,00		1,50	1,74	20,88	20,90	Excavación alcantarilla
5	60+292,00	60+295,00	6009	3,00		3,50	3,00	31,50	31,50	Excavación muro gaviones

TOTAL	320,2
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	320,2
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	320,2

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	320,20
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		




RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PLANTA MURO DE CONTENCION 51+190

PLANTA
ESCALA A

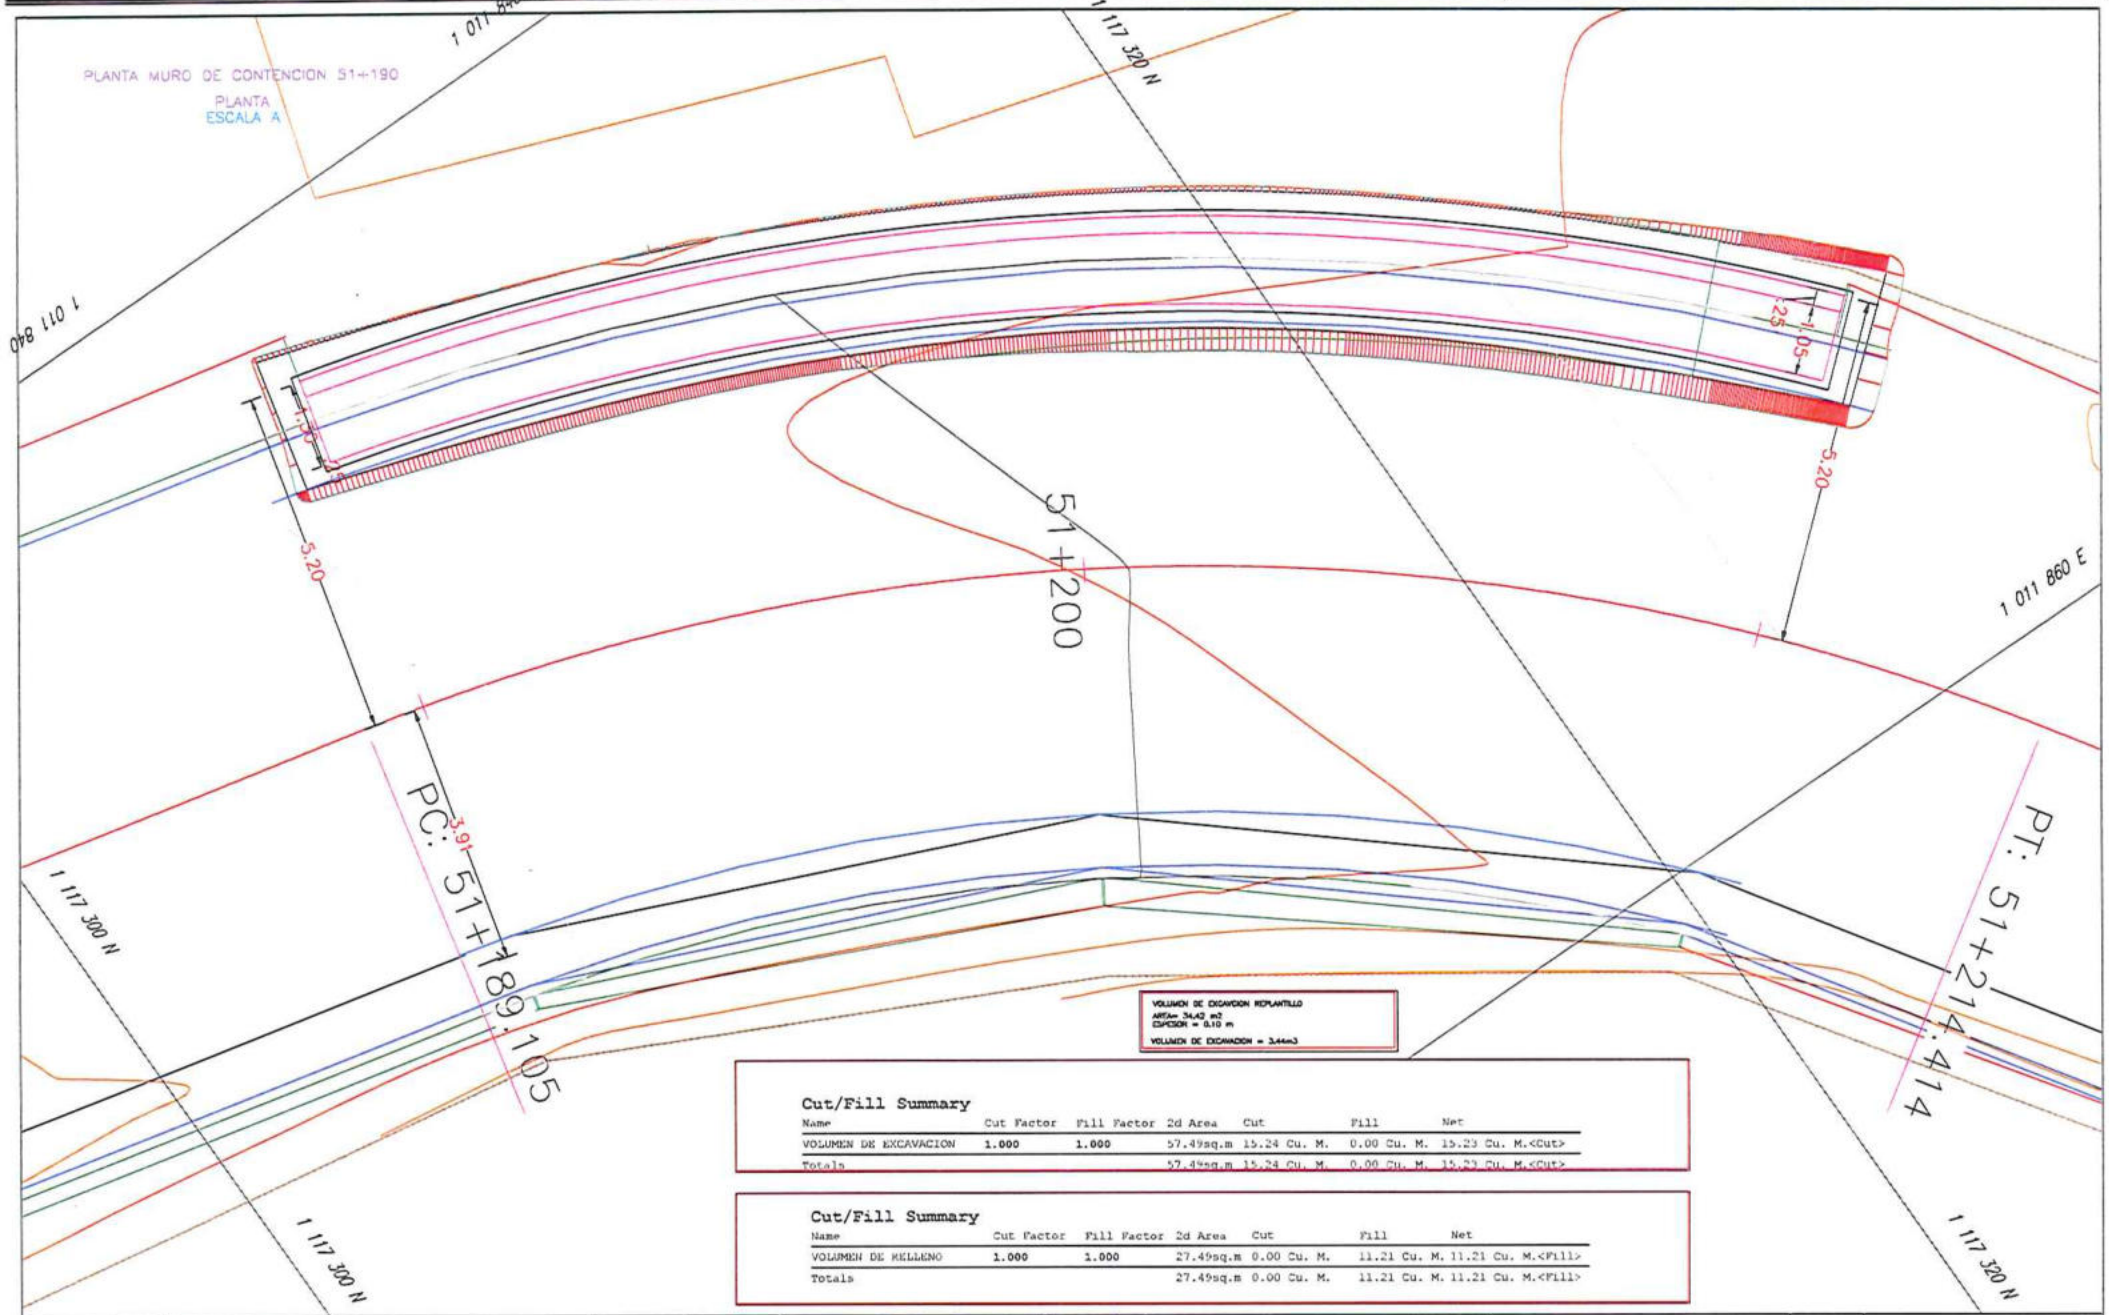

VOLUMEN DE EXCAVACION REPLANTILLO
AREA= 34.42 m2
ESPESOR = 0.10 m
VOLUMEN DE EXCAVACION = 3.44m3

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
VOLUMEN DE EXCAVACION	1.000	1.000	57.49sq.m	15.24 Cu. M.	0.00 Cu. M.	15.23 Cu. M.<Cut>
Totals			57.49sq.m	15.24 Cu. M.	0.00 Cu. M.	15.23 Cu. M.<Cut>

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
VOLUMEN DE RELLENO	1.000	1.000	27.49sq.m	0.00 Cu. M.	11.21 Cu. M.	11.21 Cu. M.<Fill>
Totals			27.49sq.m	0.00 Cu. M.	11.21 Cu. M.	11.21 Cu. M.<Fill>

SUDINCO

CONSORCIO ECOVISION 189

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUENTO BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE GRNAPUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3".

DISEÑO GEOMÉTRICO - MURO
51+190.00-51+212.00
6007

1 -01

05/08/2025

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	3,20
600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA SECCIÓN CORTE (m2)	ANCHO PROMEDIO (m)	ALTURA PROMEDIO (m)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	63+426,00	63+430,00	6009	4,00		0,80	1,00	3,20	3,20	subdren vial - costado derecho

TOTAL	3,2
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	3,2
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	3,2

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3		3,20



RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	319,60
610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	SECCIÓN PROMEDIO RELLENO (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	52+510,00	52+827,00	6007	317,00	0,70	0,40		88,76	88,80	Relleno espaldar cunetas costado derecho
5	50+490,00	50+700,00	6007	210,00	0,70	0,40		58,80	58,80	Relleno espaldar cunetas costado derecho
5	60+090,00	60+140,00	6009	50,00	2,00	0,60		60,00	60,00	Relleno espaldar cunetas costado derecho
5	93+500,00	93+500,00	6009	20,00	4,00	1,40		112,00	112,00	Relleno atención emergencia Quebrada Tobacia

TOTAL	319,6
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	319,6
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	319,6

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6005; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	319,60
610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		



RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3		24,60

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	SECCIÓN PROMEDIO RELLENO (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	24+087,00	24+087,00	6006	4,00	1,20	0,90		4,32	4,30	Relleno aletas descole
5	24+256,00	24+256,00	6006	4,00	2,00	1,20		9,60	9,60	Relleno aletas descole
5	60+190,00	60+190,00	6009	5,00	3,00	0,71		10,65	10,70	Relleno encole Box Culvert

TOTAL	24,6
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	24,6
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	24,6

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA


INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	24,60
610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3		





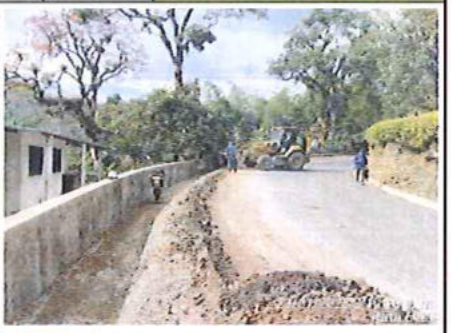





RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
623.1.2	Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	325,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	COSTADO			LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°1 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°2 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°3 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°4 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°5 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°6 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°7 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°8 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°9 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°10 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°11 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°12 Muro 9N
5	59+800,00	59+860,00	6009	25,00	Izquierdo			25,00	25,00	Anclaje N°13 Muro 9N

TOTAL	325,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	325,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	325,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	325,00
623.1.2	Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m		










RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	87,70

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	23+029,00	23+038,00	6006	9,00	0,35	1,10	3,15	3,47	3,50	Vástago Módulo 2 Muro
5	23+020,00	23+030,00	6006	10,00			0,19	1,90	1,90	New Jersey Módulo 1 Murete Costado izquierdo
5	23+030,00	23+039,00	6006	9,00			0,19	1,71	1,70	New Jersey Módulo 2 Murete Costado izquierdo
5	23+039,00	23+048,00	6006	9,00			0,19	1,71	1,70	New Jersey Módulo 3 Murete Costado izquierdo
5	23+048,00	23+057,00	6006	9,00			0,19	1,71	1,70	New Jersey Módulo 4 Murete Costado izquierdo
5	23+057,00	23+066,00	6006	9,00			0,19	1,71	1,70	New Jersey Módulo 5 Murete Costado izquierdo
5	51+190,00	51+212,00	6007	22,00	0,30	1,20	6,60	7,92	7,90	Vástago murete
5	53+720,00	53+720,00	6009	14,00	1,15	1,65	16,10	26,60	26,60	Protección estribo atención a emergencia Quebrada Honda
5	57+767,92	57+778,74	6009	10,80	0,30	1,90	3,24	6,16	6,20	Vástago Módulo 1 Muro
5	57+778,74	57+789,56	6009	10,80	0,30	1,94	3,24	6,29	6,30	Vástago Módulo 2 Muro
5	57+789,56	57+800,38	6009	10,80	0,30	1,97	3,24	6,37	6,40	Vástago Módulo 3 Muro
5	57+800,38	57+811,18	6009	10,80	0,30	1,90	3,24	6,16	6,20	Vástago Módulo 4 Muro
5	59+724,00	59+724,00	6009	1,80	0,30	1,90	0,54	1,03	1,00	Cabezote Box Culvert costado derecho
5	59+724,00	59+724,00	6009	3,00	1,00	0,30	3,00	0,90	0,90	Losa inferior prolongación Box Culvert costado izquierdo
5	59+753,20	59+800,00	6009	46,80			0,19	8,89	8,90	New Jersey Muro Costado izquierdo
5	59+937,67	60+014,67	6009	27,00			0,19	5,13	5,10	New Jersey Muro Costado izquierdo

TOTAL	87,7
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	87,7
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	87,7

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	87,70
630.3	Concreto clase 28 MPA	m3		





















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	36,30

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PROFUND. (m)	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	24+087,00	24+087,00	6006	4,20	0,20	0,40	0,84	0,34	0,30	Dentellón aletas encole alcantarilla
5	24+087,00	24+087,00	6006	1,92	3,20	0,20	6,14	1,23	1,20	Losa inferior aletas encole alcantarilla
5	24+087,00	24+087,00	6006	2,10	1,60	0,20	3,36	0,67	0,70	Zapata muro entre aletas encole alcantarilla
5	24+087,00	24+087,00	6006	1,60	0,20	1,70	0,32	1,09	1,10	Aletas encole Alcantarilla (x2)
5	24+087,00	24+087,00	6006	2,10	0,20	2,40	0,42	1,01	1,00	Muro Aletas encole Alcantarilla
5	24+256,00	24+256,00	6006	4,20	0,20	0,40	0,84	0,34	0,30	Dentellón aletas descole alcantarilla
5	24+256,00	24+256,00	6006	1,92	3,20	0,20	6,14	1,23	1,20	Losa inferior aletas descole alcantarilla
5	24+256,00	24+256,00	6006	2,10	1,60	0,20	3,36	0,67	0,70	Zapata muro entre aletas encole alcantarilla
5	24+256,00	24+256,00	6006	1,60	0,20	1,70	0,32	1,09	1,10	Aletas descole Alcantarilla (x2)
5	24+256,00	24+256,00	6006	2,10	0,20	2,40	0,42	1,01	1,00	Muro Aletas descole Alcantarilla
5	57+789,56	57+800,38	6009	10,80	1,40	0,70	15,12	10,58	10,60	Zapata Módulo 3 Muro
5	57+800,38	57+811,18	6009	10,80	1,40	0,70	15,12	10,58	10,60	Zapata Módulo 4 Muro
5	59+724,00	59+724,00	6009	3,80	0,30	0,95	1,14	1,08	1,10	Realce aleta 1 encole
5	59+724,00	59+724,00	6009	4,00	0,30	1,35	1,20	1,62	1,60	Realce aleta 2 encole
5	59+724,00	59+724,00	6009	2,60	1,86	0,30	4,84	1,45	1,50	Realce aleta 3 encole
5	60+190,00	60+190,00	6009	4,00	0,30	1,88	1,20	2,25	2,30	Aleta encole Box costado derecho

TOTAL	36,3	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	36,3	
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	36,3	

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		36,30













LM

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	36,30
630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
630.4	Concreto clase 21 MPA	m3		4,70

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	50+324,00	50+324,00	6007	2,90	1,60	0,15		0,70	0,70	Canal entrega a descole
5	50+316,00	50+333,00	6007	11,10	1,50	0,15		2,50	2,50	andén
5	50+309,00	50+316,20	6007	7,20	0,30	0,10		0,22	0,20	bordillo canal
5	51+650,00	51+650,00	6007	4,00	4,00	0,08		1,28	1,30	losa muro G6

TOTAL	4,7
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	4,7
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	4,7

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
630.4	Concreto clase 21 MPA	m3		4,70





RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	6,60

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	24+087,00	24+087,00	6006	3,30	2,10	0,10	0,21	0,69	0,70	Solado losa aletas descole alcantarilla
5	24+256,00	24+256,00	6006	3,30	2,10	0,10	0,21	0,69	0,70	Solado losa aletas descole alcantarilla
5	60+030,00	60+030,00	6009	8,00	1,40	0,10	0,14	1,12	1,10	Solado tubería
5	60+030,00	60+030,00	6009	8,00	1,00	0,34	0,34	2,72	2,70	atraque tubería
5	63+274,00	63+274,00	6009	4,00	1,00	0,34	0,34	1,36	1,40	atraque tubería

TOTAL	6,6
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	6,6
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	6,6

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	6,60
630.6	Concreto clase 14 MPA	m3		





RESIDENTE DE OBRA

Luisa Ma. M

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
630.7	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	236,90

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA SECCIÓN TRANSVERSAL (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	59+383,00	59+387,50	6009	4,50	1,65	1,00		7,43	7,40	ciclópeo nivelación para soporte cuneta
5	59+720,00	59+720,00	6009	2,60	2,00	0,51		2,65	2,70	ciclópeo nivelación encole Box Culvert
5	93+500,00	93+500,00	6009	2,00	2,70	1,00		5,40	5,40	Volumen de ciclópeo Zona 1. Atención a emergencia Quebrada la Tobasia
5	93+500,00	93+500,00	6009	8,00	2,70	2,50		54,00	54,00	Volumen de ciclópeo Zona 2. Atención a emergencia Quebrada la Tobasia
5	93+500,00	93+500,00	6009	3,80	3,50	1,15		15,30	15,30	Volumen de ciclópeo Zona 3A. Atención a emergencia Quebrada la Tobasia
5	93+500,00	93+500,00	6009	4,00	2,00	1,20		9,60	9,60	Volumen de ciclópeo Zona 4A. Atención a emergencia Quebrada la Tobasia
5	93+500,00	93+500,00	6009	4,00	4,50	3,50		31,50	31,50	Volumen de ciclópeo Zona 5. Atención a emergencia Quebrada la Tobasia
5	93+500,00	93+500,00	6009	4,00	2,00	3,50		28,00	28,00	Volumen de ciclópeo Zona 6. Atención a emergencia Quebrada la Tobasia
5	93+500,00	93+500,00	6009	5,50	3,70	3,90		79,37	79,40	Volumen de ciclópeo Zona 3B. Atención a emergencia Quebrada la Tobasia
5	93+500,00	93+500,00	6009	4,00	1,50	0,60		3,60	3,60	Volumen de ciclópeo Zona 4B. Atención a emergencia Quebrada la Tobasia

TOTAL	236,9
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	236,9
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	236,9

RESIDENTE DE OBRA

Luisa Ma. M

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
630.7	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		236,90














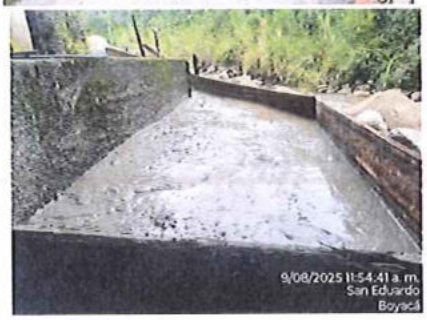





4/7

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO


CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	236,90
630.7	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		





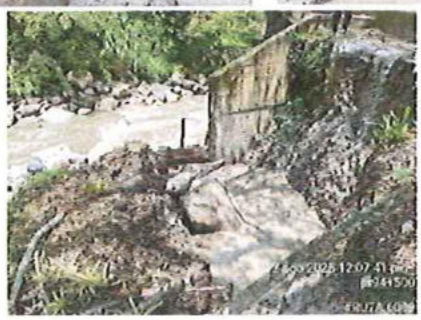

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | INFORME PARA PAGO | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERÍODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 168
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	10931,00	

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	ELEMENTO	LONGITUD m (A)	DIAMETRO # (B)	PESO UNITARIO Kg (C)	CANTIDAD Und (D)	PESO TOTAL (E=A*C*D)	OBSERVACIONES
4	23+020,00	23+030,00	6006	New Jersey módulo 1	9,90	4	1,00	8,00	79,20	
4					2,26	4	1,00	84,00	189,84	
4	23+030,00	23+039,00	6006	New Jersey módulo 2	8,90	4	1,00	8,00	71,20	
4					2,26	4	1,00	75,00	169,50	
4	23+039,00	23+048,00	6006	New Jersey módulo 3	8,90	4	1,00	8,00	71,20	
4					2,26	4	1,00	75,00	169,50	
4	23+048,00	23+057,00	6006	New Jersey módulo 4	8,90	4	1,00	8,00	71,20	
4					2,26	4	1,00	75,00	169,50	
4	23+057,00	23+066,00	6006	New Jersey módulo 5	8,90	4	1,00	8,00	71,20	
4					2,26	4	1,00	75,00	169,50	
4	23+020,00	23+066,00	6006						-1162,35	Descuento New Jersey cobrado acta N°50
4	24+087,00	24+087,00	6006	Descole Alcantarilla	1,70	5	1,55	24,00	63,24	
4					1,65	4	1,00	24,00	39,60	
4					2,00	4	1,00	10,00	20,00	
4					1,80	4	1,00	10,00	18,00	
4					2,03	4	1,00	4,00	8,12	
4					1,33	4	1,00	8,00	10,64	
4					1,85	5	1,55	10,00	28,68	
4					1,90	5	1,55	5,00	14,73	
4					3,20	5	1,55	6,00	29,76	
4					3,08	5	1,55	8,00	38,19	
4					1,65	4	1,00	10,00	16,50	
4					4,10	4	1,00	4,00	16,40	
4					3,80	4	1,00	4,00	15,20	
4					3,08	5	1,55	8,00	38,19	
4					4,00	4	1,00	4,00	16,00	
4					1,65	4	1,00	9,00	14,85	
4					1,33	4	1,00	8,00	10,64	
4					1,90	4	1,00	11,00	20,90	
4					1,25	4	1,00	11,00	13,75	
4					1,60	4	1,00	11,00	17,60	
4	24+256,00	24+256,00	6006	Descole Alcantarilla	1,70	5	1,55	24,00	63,24	
4					1,65	4	1,00	24,00	39,60	
4					2,00	4	1,00	10,00	20,00	
4					1,80	4	1,00	10,00	18,00	
4					2,03	4	1,00	4,00	8,12	
4					1,33	4	1,00	8,00	10,64	
4					1,85	5	1,55	10,00	28,68	
4					1,90	5	1,55	5,00	14,73	
4					3,20	5	1,55	6,00	29,76	
4					3,08	5	1,55	8,00	38,19	
4					1,65	4	1,00	10,00	16,50	
4					4,10	4	1,00	4,00	16,40	
4					3,80	4	1,00	4,00	15,20	
4					3,08	5	1,55	8,00	38,19	
4					4,00	4	1,00	4,00	16,00	
4					1,65	4	1,00	9,00	14,85	
4					1,33	4	1,00	8,00	10,64	
4					1,90	4	1,00	11,00	20,90	
4					1,25	4	1,00	11,00	13,75	
4					1,60	4	1,00	11,00	17,60	
4	50+309,00	50+309,00	6007	Realce cabezal encole	2,60	4	1,00	2,00	5,20	
4					1,50	5	1,55	14,00	32,55	
4	57+789,50	57+800,30	6009	Módulo 3 Muro	3,00	6	2,24	109,00	732,48	
4					3,00	4	1,00	46,00	138,00	
4					11,10	4	1,00	14,00	155,40	
4					8,30	4	1,00	2,00	16,60	
4					3,30	4	1,00	2,00	6,60	
4					11,10	4	1,00	20,00	222,00	
4					2,45	4	1,00	28,00	68,60	
4					0,90	4	1,00	56,00	50,40	

LM

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008, 6009

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	10931,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	ELEMENTO	LONGITUD m (A)	DIAMETRO # (B)	PESO UNITARIO Kg (C)	CANTIDAD Und (D)	PESO TOTAL (E=A*C*D)	OBSERVACIONES
4	57+800,30	57+811,10	6009	Módulo 4 Muro	3,00	6	2,24	109,00	732,48	
4					3,00	4	1,00	46,00	138,00	
4					11,10	4	1,00	14,00	155,40	
4					6,90	4	1,00	2,00	13,80	
4					2,80	4	1,00	2,00	5,60	
4					11,10	4	1,00	20,00	222,00	
4					2,45	4	1,00	28,00	68,60	
4					0,90	4	1,00	56,00	50,40	
4	57+767,90	57+778,70	6009	New Jersey Módulo 1 Muro	2,26	4	1,00	90,00	203,40	
4					10,70	4	1,00	8,00	85,60	
4	57+778,70	57+789,50	6009	New Jersey Módulo 2 Muro	2,26	4	1,00	90,00	203,40	
4					10,70	4	1,00	8,00	85,60	
4	57+789,50	57+800,30	6009	New Jersey Módulo 3 Muro	2,26	4	1,00	90,00	203,40	
4					10,70	4	1,00	8,00	85,60	
4	57+800,30	57+811,10	6009	New Jersey Módulo 4 Muro	2,26	4	1,00	90,00	203,40	
4					10,70	4	1,00	8,00	85,60	
4	59+755,00	59+800,00	6009	New Jersey Muro 9NB	46,80	4	1,00	8,00	374,40	
4	53+382,00	53+400,00	6009	Anillos pilote 1 L=10 m	1,50	4	1,00	160,00	240,00	
4					4,87	4	1,00	40,00	194,80	
4	53+382,00	53+400,00	6009	Anillos pilote 2 L=11 m	1,50	4	1,00	176,00	264,00	
4					4,87	4	1,00	44,00	214,28	
4	53+382,00	53+400,00	6009	Anillos pilote 3 L=11 m	1,50	4	1,00	176,00	264,00	
4					4,87	4	1,00	44,00	214,28	
4	53+382,00	53+400,00	6009	Anillos pilote 4 L=8 m	1,50	4	1,00	128,00	192,00	
4					4,87	4	1,00	32,00	155,84	
4	53+382,00	53+400,00	6009	Anillos pilote 5 L=11 m	1,50	4	1,00	176,00	264,00	
4					4,87	4	1,00	44,00	214,28	
4	53+382,00	53+400,00	6009	Caisson 3	8,00	8	3,97	46,00	1460,96	
4					4,30	4	1,00	153,00	657,90	
4					7,00	8	3,97	46,00	1278,34	

Los cálculos del acero presentados en la memoria se realizan de acuerdo a los valores establecidos en la tabla 640-1 de la norma INVIAS.

TOTAL	10930,6
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	10931,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	10931,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008, 6009

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	10931,00
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		













LM

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025


CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021


ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		10931,00





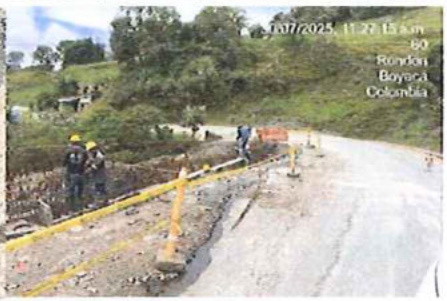



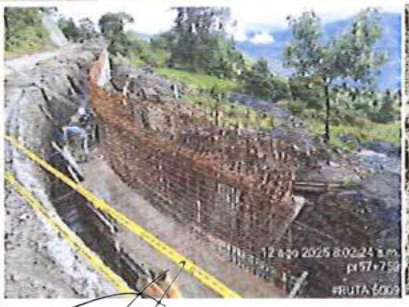




RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 1							
OBRA:	Muro de Concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 1						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		9,90	8,00	79,20	79,20	
	1/2"		2,26	84,00	189,84	189,84	
Total acero de refuerzo New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 1						269,04	

U3

New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 2							
OBRA:	Muro de Concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 2						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		8,90	8,00	71,20	71,20	
	1/2"		2,26	75,00	169,50	169,50	
Total acero de refuerzo New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 2						240,70	

New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 3							
OBRA:	Muro de Concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 3						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		8,90	8,00	71,20	71,20	
	1/2"		2,26	75,00	169,50	169,50	
Total acero de refuerzo New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 3						240,70	


67

New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 4							
OBRA:	Muro de Concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 4						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		8,90	8,00	71,20	71,20	
	1/2"		2,26	75,00	169,50	169,50	
Total acero de refuerzo New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 4						240,70	

Lm

New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 5










OBRA:	Muro de Concreto
ESTRUCTURA:	New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 5

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		8,90	8,00	71,20	71,20	
	1/2"		2,26	75,00	169,50	169,50	

Total acero de refuerzo New Jersey Muro de Concreto PR23+020 - PR23+066 Módulo 5	240,70	


Aletas descole Alcantarilla PR24+087

OBRA:	Alcantarilla
ESTRUCTURA:	Aletas descole Alcantarilla PR24+087

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	5/8"		1,70	24,00	40,80	63,24	
	1/2"		1,65	24,00	39,60	39,60	
	1/2"		2,00	10,00	20,00	20,00	
	1/2"		1,80	10,00	18,00	18,00	
	1/2"		2,03	4,00	8,12	8,12	
	1/2"		1,33	16,00	21,28	21,28	
	5/8"		1,85	10,00	18,50	28,68	
	5/8"		1,90	5,00	9,50	14,73	
	5/8"		3,20	6,00	19,20	29,76	
	5/8"		3,08	16,00	49,28	76,38	
	1/2"		1,65	19,00	31,35	31,35	
	1/2"		4,10	4,00	16,40	16,40	
	1/2"		3,80	4,00	15,20	15,20	
	1/2"		4,00	4,00	16,00	16,00	

Aletas descole Alcantarilla PR24+087











OBRA:	Alcantarilla
ESTRUCTURA:	Aletas descole Alcantarilla PR24+087

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		1,90	11,00	20,90	20,90	
	1/2"		1,25	11,00	13,75	13,75	
	1/2"		1,60	11,00	17,60	17,60	

Total acero de refuerzo Aletas descole Alcantarilla PR24+087	450,98

Aletas descole Alcantarilla PR24+256

OBRA:	Alcantarilla
ESTRUCTURA:	Aletas descole Alcantarilla PR24+256

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	5/8"		1,70	24,00	40,80	63,24	
	1/2"		1,65	24,00	39,60	39,60	
	1/2"		2,00	10,00	20,00	20,00	
	1/2"		1,80	10,00	18,00	18,00	
	1/2"		2,03	4,00	8,12	8,12	
	1/2"		1,33	16,00	21,28	21,28	
	5/8"		1,85	10,00	18,50	28,68	
	5/8"		1,90	5,00	9,50	14,73	
	5/8"		3,20	6,00	19,20	29,76	
	5/8"		3,08	16,00	49,28	76,38	
	1/2"		1,65	19,00	31,35	31,35	
	1/2"		4,10	4,00	16,40	16,40	
	1/2"		3,80	4,00	15,20	15,20	
	1/2"		4,00	4,00	16,00	16,00	

Aletas descole Alcantarilla PR24+256							
OBRA:	Alcantarilla					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	Aletas descole Alcantarilla PR24+256						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		1,90	11,00	20,90	20,90	
	1/2"		1,25	11,00	13,75	13,75	
	1/2"	0.15 1.30 0.15 Z3	1,60	11,00	17,60	17,60	
Total acero de refuerzo Aletas descole Alcantarilla PR24+256						450,98	







Realce cabezal encole PR50+309							
OBRA:	Cabezal encole					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	Realce cabezal encole PR50+309						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		2,60	2,00	5,20	5,20	
	5/8"		1,50	14,00	21,00	32,55	
Total acero de refuerzo Realce cabezal encole PR50+309						37,75	

Ug

Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 Modulo 3

OBRA:	Muro de Concreto
ESTRUCTURA:	Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 Modulo 3





SUDINCO

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	3/4"		3,00	109,00	327,00	732,48	
	1/2"		3,00	46,00	138,00	138,00	
	1/2"		11,10	14,00	155,40	155,40	
	1/2"		8,30	2,00	16,60	16,60	
	1/2"		3,30	2,00	6,60	6,60	
	1/2"		11,10	20,00	222,00	222,00	
	1/2"		2,45	28,00	68,60	68,60	
	1/2"		0,90	56,00	50,40	50,40	


Total acero de refuerzo Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 Modulo 3	1390,08	

Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 Modulo 4


OBRA:	Muro de Concreto
ESTRUCTURA:	Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 Modulo 4

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	3/4"		3,00	109,00	327,00	732,48	
	1/2"		3,00	46,00	138,00	138,00	
	1/2"		11,10	14,00	155,40	155,40	
	1/2"		6,90	2,00	13,80	13,80	
	1/2"		2,80	2,00	5,60	5,60	
	1/2"		11,10	20,00	222,00	222,00	
	1/2"		2,45	28,00	68,60	68,60	
	1/2"		0,90	56,00	50,40	50,40	


Total acero de refuerzo Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 Modulo 4	1386,28	

Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 1							
OBRA:	Muro de concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 1						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		10,70	8,00	85,60	85,60	
	1/2"		2,26	90,00	203,40	203,40	
Total acero de refuerzo Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 1						289,00	

Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 2							
OBRA:	Muro de concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 2						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		10,70	8,00	85,60	85,60	
	1/2"		2,26	90,00	203,40	203,40	
Total acero de refuerzo Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 2						289,00	

Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 3							
OBRA:	Muro de concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 3						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		10,70	8,00	85,60	85,60	
	1/2"		2,26	90,00	203,40	203,40	
Total acero de refuerzo Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 3						289,00	

47

Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 4							
OBRA:	Muro de concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 4						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		10,70	8,00	85,60	85,60	
	1/2"		2,26	90,00	203,40	203,40	
Total acero de refuerzo Muro de Concreto PR 57+767 - PR57+811 New Jersey Módulo 4						289,00	

Muro de Concreto PR 59+755 - PR59+800 New Jersey							
OBRA:	Muro de concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	Muro de Concreto PR 59+755 - PR59+800 New Jersey						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		46,80	8,00	374,40	374,40	
Total acero de refuerzo Muro de Concreto PR 59+755 - PR59+800 New Jersey						374,40	

47

Anillos Pilote 1 Muro PR53+382 - PR53+400							
OBRA:	Muro de concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	Anillos Pilote 1 Muro PR53+382 - PR53+400						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		1,50	160,00	240,00	240,00	
	1/2"		4,87	40,00	194,80	194,80	
Total acero de refuerzo Anillos Pilote 1 Muro PR53+382 - PR53+400						434,80	

LM

Anillos Pilote 2 Muro PR53+382 - PR53+400

OBRA:	Muro de concreto
ESTRUCTURA:	Anillos Pilote 2 Muro PR53+382 - PR53+400

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		1,50	176,00	264,00	264,00	
	1/2"		4,87	44,00	214,28	214,28	

Total acero de refuerzo Anillos Pilote 2 Muro PR53+382 - PR53+400	478,28

LM

Anillos Pilote 3 Muro PR53+382 - PR53+400							
OBRA:	Muro de concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	Anillos Pilote 3 Muro PR53+382 - PR53+400						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		1,50	176,00	264,00	264,00	
	1/2"		4,87	44,00	214,28	214,28	
Total acero de refuerzo Anillos Pilote 3 Muro PR53+382 - PR53+400						478,28	

Anillos Pilote 3 Muro PR53+382 - PR53+400

OBRA:	Muro de concreto
ESTRUCTURA:	Anillos Pilote 3 Muro PR53+382 - PR53+400

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		1,50	128,00	192,00	192,00	
	1/2"		4,87	32,00	155,84	155,84	

Total acero de refuerzo Anillos Pilote 3 Muro PR53+382 - PR53+400	347,84

Anillos Pilote 4 Muro PR53+382 - PR53+400							
OBRA:	Muro de concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	Anillos Pilote 4 Muro PR53+382 - PR53+400						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		1,50	128,00	192,00	192,00	
	1/2"		4,87	32,00	155,84	155,84	
Total acero de refuerzo Anillos Pilote 4 Muro PR53+382 - PR53+400						347,84	

Anillos Pilote 5 Muro PR53+382 - PR53+400							
OBRA:	Muro de concreto					SUDINCO	
ESTRUCTURA:	Anillos Pilote 5 Muro PR53+382 - PR53+400						
No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
	1/2"		1,50	176,00	264,00	264,00	
	1/2"		4,87	44,00	214,28	214,28	

Total acero de refuerzo Anillos Pilote 5 Muro PR53+382 - PR53+400	478,28

Pilote 3 Muro PR53+382 - PR53+400

OBRA:	Muro de concreto	SUDINCO
ESTRUCTURA:	Pilote 3 Muro PR53+382 - PR53+400	

No. de Serie	#	ESQUEMA	LONGITUD [m]	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL [m]	PESO [kg]	OBSERVACIONES
P1	1"		8,00	46,00	368,00	1460,96	
P2	1/2"	0.4 / 1.10	4,30	153,00	657,90	657,90	
P3	1"		7,00	46,00	322,00	1278,34	

Total acero de refuerzo Pilote 3 Muro PR53+382 - PR53+400	3397,20

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	126,30
663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL		RUTA	LONGITUD (m)			CANTIDAD	LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	22+686,00	22+700,00	6006	14,00				14,00	14,00	subdren manejo de agua relleno
5	22+670,00	22+677,00	6006	7,00				7,00	7,00	ramal subdren para relleno
5	23+880,00	23+926,00	6006	46,00				46,00	46,00	subdren vial - costado izquierdo
5	23+895,00	23+930,00	6006	35,00				35,00	35,00	subdren vial - costado derecho
5	63+425,00	63+430,00	6009	5,00				5,00	5,00	subdren vial costado derecho
5	60+190,00	60+190,00	6009	9,00				9,00	9,00	subdren Box Culvert costado menores
5	60+190,00	60+190,00	6009	10,30				10,30	10,30	subdren Box Culvert costado mayores

TOTAL	126,3
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	126,3
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	126,3

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO – SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIANA

CARRETERA: TRANSVERSA BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m		126,30











RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006, 6007, 6008, 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 952 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	53,40
671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	50+309,00	50+318,00	6007	9,00	1,00	0,13	9,00	1,17	1,20	Costado Derecho
5	50+188,10	50+190,00	6007	1,90	1,00	0,13	1,90	0,25	0,20	Costado Izquierdo
5	50+184,70	50+168,00	6007	3,30	2,00	0,20	6,60	1,32	1,30	Costado Izquierdo - acceso
5	50+190,00	50+225,50	6007	35,50	1,00	0,13	35,50	4,62	4,60	Costado Izquierdo
5	59+830,00	59+830,00	6009	3,00	1,00	0,13	3,00	0,40	0,40	Costado Izquierdo
5	59+839,80	59+871,00	6009	31,20	1,00	0,13	31,20	4,06	4,10	Costado Derecho
5	59+305,00	59+322,50	6009	17,50	1,00	0,13	17,50	2,28	2,30	Costado Izquierdo
5	59+350,00	59+354,00	6009	4,00	1,00	0,13	4,00	0,52	0,50	Costado Izquierdo
5	59+354,00	59+358,60	6009	4,60	2,00	0,20	9,20	1,84	1,80	Costado Izquierdo - acceso
5	59+358,60	59+376,20	6009	17,60	1,00	0,13	17,60	2,29	2,30	Costado Izquierdo
5	59+330,00	59+358,90	6009	28,90	1,00	0,13	28,90	3,50	3,50	Costado Derecho
5	59+382,00	59+410,00	6009	28,00	1,00	0,13	28,00	3,64	3,60	Costado Derecho
5	59+357,00	59+360,00	6009	3,00	1,00	0,13	3,00	0,39	0,40	Costado Derecho
5	59+382,00	59+400,00	6009	18,00	1,00	0,13	18,00	2,34	2,30	Costado Izquierdo
5	59+350,00	59+360,00	6009	10,00	1,00	0,13	10,00	1,30	1,30	Costado Derecho
5	59+358,00	59+360,00	6009	2,00	1,00	0,13	2,00	0,26	0,30	Costado Izquierdo
5	59+420,00	59+450,00	6009	30,00	1,00	0,13	30,00	3,90	3,90	Costado Izquierdo
5	56+805,00	56+838,20	6009	31,20	1,00	0,13	31,20	4,06	4,10	Costado Derecho
5	56+788,00	56+803,00	6009	15,00	1,00	0,13	15,00	1,95	2,00	Costado Derecho
5	56+742,40	56+788,00	6009	45,60	1,00	0,13	45,60	5,93	5,90	Costado Derecho
5	56+810,40	56+820,00	6009	9,60	1,00	0,13	9,60	1,25	1,20	Costado Izquierdo
5	56+772,00	56+820,00	6009	48,00	1,00	0,13	48,00	6,24	6,20	Costado Izquierdo

TOTAL	53,4
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	53,4
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	53,4

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6005, 6007, 6008, 6009
SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	53,40
671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluya la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3		



















69

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 Mpa)	m3		53,40













RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	2010,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)		TOTAL	OBSERVACIONES
7	22+640,00	22+700,00	6006	60,00	13,50		1.620,00		1620,00	Colchón drenante terraplén
7	22+686,00	22+700,00	6006	14,00	3,50		49,00		49,00	subdren manejo de agua relleno
7	22+670,00	22+677,00	6006	7,00	3,50		24,50		25,00	ramal subdren para relleno
7	23+880,00	23+926,00	6006	46,00	3,50		161,00		161,00	subdren vial - costado izquierdo
7	23+895,00	23+926,00	6006	31,00	3,50		108,50		109,00	subdren vial - costado derecho
7	63+425,00	63+430,00	6009	5,00	3,50		17,50		18,00	subdren vial costado derecho
7	60+190,00	60+190,00	6009	4,00	3,50		14,00		14,00	subdren Box Culvert cara anterior
7	60+190,00	60+190,00	6009	4,00	3,50		14,00		14,00	subdren Box Culvert cara posterior

TOTAL	2010,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	2010,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	2010,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	2010,00
673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2		













RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 168

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
673.2	Material granular drenante	m3	306,00	

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	SECCIÓN (m2/m)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	22+640,00	22+700,00	6006	60,00	13,50	0,30	810,00	243,00	243,00	Colchón drenante terraplén
5	22+686,00	22+700,00	6006	14,00	0,60	0,60	8,40	5,04	5,00	subdren manejo de agua relleno
5	22+670,00	22+677,00	6006	7,00	0,60	0,60	4,20	2,52	3,00	ramal subdren para relleno
5	23+880,00	23+926,00	6006	46,00	0,60	1,00	27,60	27,60	28,00	subdren vial - costado izquierdo
5	23+895,00	23+926,00	6006	31,00	0,60	1,00	18,60	18,60	19,00	subdren vial - costado derecho
5	63+425,00	63+430,00	6009	5,00	1,00	0,80	5,00	4,00	4,00	subdren vial costado derecho
5	60+190,00	60+190,00	6009	4,00	1,00	0,60	4,00	2,40	2,00	subdren Box Culvert cara anterior
5	60+190,00	60+190,00	6009	4,00	1,00	0,60	4,00	2,40	2,00	subdren Box Culvert cara posterior

TOTAL	306,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	306,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	306,0

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 183	**CONTRATO:**	952 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
673.2	Material granular drenante	m3		305,00















RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	2,50
673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTOS	VOLUMEN (m3)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	23+880,00	23+926,00	6006	46,00	0,60	0,05		1,38	1,40	Filtro Costado izquierdo
5	23+895,00	23+930,00	6006	35,00	0,60	0,05		1,05	1,10	Filtro Costado derecho

TOTAL	2,5
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	2,5
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	2,5

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	2,50
673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3		





RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	100,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	COSTADO			LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
5	51+830,00	51+830,00	6007	20,00	Derecho			20,00	20,00	Dren 3 talud izquierdo
5	51+830,00	51+830,00	6007	20,00	Derecho			20,00	20,00	Dren 4 talud izquierdo
5	51+830,00	51+830,00	6007	20,00	Derecho			20,00	20,00	Dren 5 talud izquierdo
5	51+830,00	51+830,00	6007	20,00	Derecho			20,00	20,00	Dren 6 talud izquierdo
5	51+830,00	51+830,00	6007	20,00	Derecho			20,00	20,00	Dren 7 talud izquierdo

TOTAL	100,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	100,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	100,0

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSA BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021
hoja 2 de 2

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	100,00
674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m		








RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	50759,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	BORDE IZQUIERDO	CENTRAL I	CENTRAL D	BORDE DERECHO	LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
8	5+000,00	8+631,00	6006	3.631,00	X			X	7.262,00	7262,00	Líneas borde calzada
8	5+000,00	5+132,00	6006	132,00		X	X		181,50	181,50	Línea discontinua y continua eje
8	5+132,00	5+415,00	6006	283,00		X	X		566,00	566,00	Doble Línea continua eje
8	5+415,00	5+535,00	6006	120,00		X	X		165,00	165,00	Línea discontinua y continua eje
8	5+535,00	5+601,00	6006	66,00		X			24,75	24,80	Línea discontinua eje
8	5+601,00	5+721,00	6006	120,00		X	X		165,00	165,00	Línea discontinua y continua eje
8	5+721,00	5+792,00	6006	71,00		X	X		142,00	142,00	Doble Línea continua eje
8	5+792,00	5+910,00	6006	118,00		X	X		162,25	162,30	Línea discontinua y continua eje
8	5+910,00	6+167,00	6006	257,00		X			96,38	96,40	Línea discontinua eje
8	6+167,00	6+287,00	6006	120,00		X	X		165,00	165,00	Línea discontinua y continua eje
8	6+287,00	6+567,00	6006	280,00		X	X		560,00	560,00	Doble Línea continua eje
8	6+567,00	6+687,00	6006	120,00		X	X		165,00	165,00	Línea discontinua y continua eje
8	6+687,00	7+127,00	6006	440,00		X			165,00	165,00	Línea discontinua eje
8	7+127,00	7+247,00	6006	120,00		X	X		165,00	165,00	Línea discontinua y continua eje
8	7+247,00	7+368,00	6006	121,00		X	X		242,00	242,00	Doble Línea continua eje
8	7+368,00	8+631,00	6006	1.263,00		X	X		2.526,00	2526,00	Doble Línea continua eje
8	20+630,00	21+050,00	6006	420,00		X	X		840,00	840,00	Doble Línea continua eje
8	21+100,00	21+380,00	6006	280,00		X	X		560,00	560,00	Doble Línea continua eje
8	73+120,00	74+910,00	6006	1.790,00		X	X		3.580,00	3580,00	Doble Línea continua eje
8	50+226,00	53+226,00	6007	3.000,00	X	X	X	X	12.000,00	12000,00	Líneas de borde y eje
8	54+000,00	56+000,00	6007	2.000,00	X			X	4.000,00	4000,00	Líneas borde calzada
8	75+000,00	79+300,00	6007	4.300,00	X			X	8.600,00	8600,00	Líneas borde calzada
8	81+400,00	85+063,00	6007	3.663,00	X			X	7.326,00	7326,00	Líneas borde calzada
8	88+000,00	88+550,00	6007	550,00	X			X	1.100,00	1100,00	Líneas borde calzada

TOTAL	50.759,00
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	50.759,00
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	50.759,00

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos · Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ		51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009		21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA		973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188		962 DE 2021 hoja 2 de 3


ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		50759,00












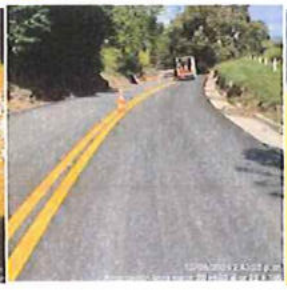


INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ		51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009		21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA		973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188		962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
IP	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		50759,00



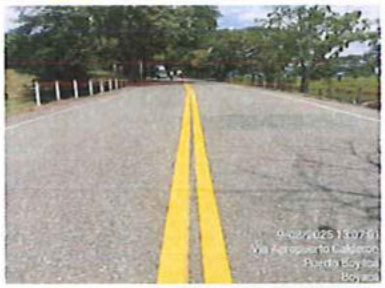




RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	522,90

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD	COSTADO	ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	PR 050+150	PR 050+150	6007				Calzada	10,40	10,40	Marca Vial-Línea de Pare
7	PR 050+150	PR 050+150	6007				Calzada	17,60	17,60	Marca Vial-Cebra
7	PR 050+150	PR 050+150	6007				Calzada	4,80	4,80	Marca Vial-Flechas frente
7	PR 050+150	PR 050+150	6007				Calzada	1,40	1,40	Marca Vial-Ceda el paso
7	PR 050+400	PR 050+400	6007				Calzada	6,30	6,30	Pictograma SR 30/30
7	PR 050+760	PR 050+760	6007				Calzada	6,30	6,30	Pictograma SR 30/30
7	PR 052+030	PR 052+030	6007				Calzada	6,30	6,30	Pictograma SR 30/30
7	PR 051+030	PR 051+030	6007				Calzada	8,00	8,00	Texto despacio
7	PR 051+240	PR 051+240	6007				Calzada	6,30	6,30	Pictograma SR 30/30
7	PR 051+370	PR 051+370	6007				Calzada	8,00	8,00	Texto despacio
7	PR 052+015	PR 052+015	6007				Calzada	8,00	8,00	Texto despacio
7	PR 052+030	PR 052+030	6007				Calzada	3,20	3,20	Pictograma SR 30/30
7	PR 052+100	PR 052+100	6007				Calzada	8,00	8,00	Texto despacio
7	PR 052+640	PR 052+640	6007				Calzada	8,00	8,00	Texto despacio
7	PR 053+170	PR 053+170	6007				Calzada	2,40	2,40	Marca Vial-Flechas frente
7	PR 051+280	PR 051+280	6007				Calzada	8,20	8,20	Texto despacio
7	PR 051+220	PR 051+220	6007				Calzada	25,00	25,00	New jersey
7	PR 051+070	PR 051+070	6007				Calzada	1,30	1,30	Cabezote
7	PR 051+100	PR 051+100	6007				Calzada	39,40	39,40	New jersey
7	PR 051+000	PR 051+000	6007				Calzada	1,20	1,20	Cabezote
7	PR 050+884	PR 050+884	6007				Calzada	22,50	22,50	New jersey
7	PR 050+868	PR 050+868	6007				Calzada	1,20	1,20	Cabezote
7	PR 050+663	PR 050+663	6007				Calzada	98,90	98,90	New jersey
7	PR 050+618	PR 050+618	6007				Calzada	2,20	2,20	Cabezote
7	PR 050+430	PR 050+430	6007				Calzada	15,80	15,80	New jersey
7	PR 050+314	PR 050+314	6007				Calzada	1,30	1,30	Cabezote
7	PR 050+280	PR 050+280	6007				Calzada	1,30	1,30	Cabezote
7	PR 050+314	PR 050+314	6007				Calzada	2,20	2,20	Cabezote
7	PR 050+314	PR 050+314	6007				Calzada	46,00	46,00	New jersey
7	PR 050+790	PR 050+790	6007				Calzada	2,20	2,20	Cabezote
7	PR 050+868	PR 050+868	6007				Calzada	1,60	1,60	Cabezote
7	PR 051+000	PR 051+000	6007				Calzada	1,70	1,70	Cabezote
7	PR 051+070	PR 051+070	6007				Calzada	1,20	1,20	Cabezote
7	PR 051+100	PR 051+100	6007				Calzada	1,40	1,40	Cabezote
7	PR 051+160	PR 051+160	6007				Calzada	5,10	5,10	Cabezote
7	PR 051+370	PR 051+370	6007				Calzada	1,30	1,30	Cabezote

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	522,90
2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD	COSTADO	ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	PR 051+450	PR 051+450	6007				Calzada	2,00	2,00	Cabezote
7	PR 051+705	PR 051+705	6007				Calzada	6,30	6,30	Cabezote
7	PR 051+765	PR 051+765	6007				Calzada	1,10	1,10	Cabezote
7	PR 051+825	PR 051+825	6007				Calzada	1,10	1,10	Cabezote
7	PR 052+117	PR 052+117	6007				Calzada	1,90	1,90	Cabezote
7	PR 052+260	PR 052+260	6007				Calzada	1,50	1,50	Cabezote
7	PR 052+335	PR 052+335	6007				Calzada	1,40	1,40	Cabezote
7	PR 052+380	PR 052+380	6007				Calzada	1,40	1,40	Cabezote
7	PR 052+414	PR 052+414	6007				Calzada	1,10	1,10	Cabezote
7	PR 052+500	PR 052+500	6007				Calzada	1,90	1,90	Cabezote
7	PR 052+513	PR 052+513	6007				Calzada	1,90	1,90	Cabezote
7	PR 052+676	PR 052+676	6007				Calzada	1,60	1,60	Cabezote
7	PR 052+778	PR 052+778	6007				Calzada	1,30	1,30	Cabezote
7	PR 052+835	PR 052+835	6007				Calzada	1,30	1,30	Cabezote
7	PR 053+130	PR 053+130	6007				Calzada	1,30	1,30	Cabezote
7	PR 052+590	PR 052+590	6007				Derecho	0,80	0,80	Cabezote
7	PR 053+230	PR 053+230	6007				Izquierdo	1,40	1,40	Cabezote
7	PR 052+835	PR 052+835	6007				Izquierdo	1,20	1,20	Cabezote
7	PR 052+778	PR 052+778	6007				Izquierdo	0,90	0,90	Cabezote
7	PR 052+676	PR 052+676	6007				Izquierdo	2,20	2,20	Cabezote
7	PR 052+600	PR 052+600	6007				Izquierdo	31,50	31,50	New jersey
7	PR 052+513	PR 052+513	6007				Izquierdo	14,60	14,60	Cabezote
7	PR 052+500	PR 052+500	6007				Izquierdo	1,30	1,30	Cabezote
7	PR 052+380	PR 052+380	6007				Izquierdo	1,50	1,50	Cabezote
7	PR 052+216	PR 052+216	6007				Izquierdo	44,30	44,30	New jersey
7	PR 052+117	PR 052+117	6007				Izquierdo	1,40	1,40	Cabezote
7	PR 051+825	PR 051+825	6007				Izquierdo	1,00	1,00	Cabezote
7	PR 051+765	PR 051+765	6007				Izquierdo	1,40	1,40	Cabezote
7	PR 051+705	PR 051+705	6007				Izquierdo	1,70	1,70	Cabezote
7	PR 051+665	PR 051+665	6007				Izquierdo	0,90	0,90	Cabezote
7	PR 051+450	PR 051+450	6007				Izquierdo	2,60	2,60	Cabezote
7	PR 051+370	PR 051+370	6007				Izquierdo	1,10	1,10	Cabezote

TOTAL	522,9
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	522,9
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	522,9

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	982 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		522,90














4

INVIAS	La movilidad es de todos Mintransporte	REGISTRO FOTOGRAFICO	SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	982 DE 2021

hoja 4 de 4

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		522,90














RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	1646,00
4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD (m)	BORDE IZQUIERDO	CENTRAL I	CENTRAL D	BORDE DERECHO	UNIDADES (u)	TOTAL	OBSERVACIONES
8	5+000,00	8+631,00	6006	3.631,00	256			256	512,00	512,00	Tachas borde de calzada
8	50+226,00	53+226,00	6007	3.000,00	378	378		378	1.134,00	1134,00	Tachas borde y eje de calzada

TOTAL	1.646,00
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	1.646,00
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	1.646,00

RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | REGISTRO FOTOGRAFICO | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ		51
TRAMO:	RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009		21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA		973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188		962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		1646,00



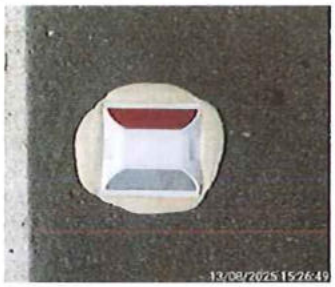







RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte

INFORME PARA PAGO

SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA
900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m): medida a partir de cien metros (100 m)	m3-km	75528.00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD km		RUTA	VOLUMEN EXPLANACION MATERIAL COMUN	VOLUMEN EXPLANACION EN ROCA	VOLUMEN EXCAVACIÓN REPARACIÓN PAVIMENTO	MEJORAMIENTO	TOTAL	OBSERVACIONES
3	72+380	22+650	49.60		6006		88.92			4410.40	Material transportado para uso de mejoramiento de subrasante
3	72+400	22+650	49.70		6006		184.60			9174.60	
3	72+410	22+650	49.70		6006		237.77			11817.20	
3	72+420	22+650	49.70		6006		160.29			7966.40	
3	72+430	22+650	49.70		6006		80.86			4018.70	
3	72+440	22+650	49.70		6006		77.09			3831.40	
3	22+635	18+500	4.00		6006	0.00				0.00	
3	22+640	18+500	4.00		6006	330.72				1322.90	
3	22+645	18+500	4.00		6006	609.83				2439.30	
3	22+650	18+500	4.10		6006	605.67				2483.20	
3	22+655	18+500	4.10		6006	555.62				2278.00	
3	22+660	18+500	4.10		6006	625.30				2563.70	
3	22+665	18+500	4.10		6006	666.77				2733.80	
3	22+670	18+500	4.10		6006	526.24				2157.60	
3	22+675	18+500	4.10		6006	523.38				2145.90	
3	22+680	18+500	4.10		6006	444.56				1823.90	
3	22+685	18+500	4.10		6006	345.19				1419.43	
3	22+690	18+500	4.10		6006	410.54				1683.20	
3	22+695	18+500	4.10		6006	348.92				1430.60	
3	22+700	18+500	4.10		6006	257.92				1057.50	
3	22+705	18+500	4.10		6006	225.55				924.80	
3	22+710	18+500	4.10		6006	161.98				664.10	
3	22+715	18+500	4.10		6006	112.06				459.40	
3	22+720	18+500	4.10		6006	42.51				174.30	
3	24+350	18+500	5.80		6006	204.23				1184.50	
3	25+840	18+500	7.30		6006	287.17				2096.30	
3	55+950	45+000	10.90		6009	83.20				906.90	
3	54+680	45+000	9.60		6009	245.83				2360.00	
		TOTAL									

El transporte es calculado a partir de las secciones reportadas en el ítem 210.2.2.1 con un factor de expansión de 30%

TOTAL	75.528.00
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	75.528.00
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	75.528.00

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos | Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BYG1, 6006, 6007, 6008, 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

hoja 2 de 2

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		
900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	CANTIDAD PRESENTE ACTA	75528.00













RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

INVIAS | La movilidad es de todos – Mintransporte | **INFORME PARA PAGO** | SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		7.789,90

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD km	FECHA	RUTA		VOLUMEN	VOLUMEN APROXIMADO (E-INVIAS 900.2.6)	TOTAL	OBSERVACIONES
3	59+730,00	45+000,00	14,60	22/07/2025	6009		41,70	42,00	613,20	
3	56+980,00	45+000,00	11,90	22/07/2025	6009		62,60	63,00	749,70	
3	60+290,00	45+000,00	15,20	23/07/2025	6009		29,40	29,00	440,80	
3	52+360,00	45+000,00	7,30	24/07/2025	6009		125,40	125,00	912,50	
3	59+720,00	45+000,00	14,60	28/07/2025	6009		13,90	14,00	204,40	
3	23+790,00	18+500,00	5,20	29/07/2025	6006		58,40	58,00	301,60	
3	60+310,00	45+000,00	15,20	30/07/2025	6009		43,10	43,00	653,60	
3	59+720,00	45+000,00	14,60	31/07/2025	6009		13,90	14,00	204,40	
3	53+800,00	45+000,00	8,70	1/08/2025	6009		41,70	42,00	365,40	
3	20+630,00	18+500,00	2,00	9/08/2025	6006		29,20	29,00	58,00	
3	2+000,00	57+800,00	55,70	19/08/2025	6007		59,00	59,00	3286,30	

TOTAL	7.789,90
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	7.789,90
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	7.789,90

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS	La movilidad es de todos – Mintransporte	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	SUDINCO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01; 6006; 6007; 6008; 6009
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 188

SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO: 973 DE 2021
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
900.30	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		7789,90











RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INFORME PARA PAGO

CARRETERA: TRANSVERSAL BOYACÁ
TRAMO: RUTAS 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009
SOPORTE DE ACTA No. 51
PERIODO: 21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO: 973 DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECOVISION 183
CONTRATO: 962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
233.1	Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2		876,00

GRUPO DE AJUSTES	PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	LONGITUD m (A)	AREA LLENO m2(B)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	ÁREA (m2)	TOTAL	OBSERVACIONES
7	23+910,00	23+950,00	6006	40,00		7,30		292,00	292,00	refuerzo a capas granulares (afirmado) según diseño
7	23+900,00	23+980,00	6006	80,00		7,30		584,00	584,00	refuerzo a capas granulares (entre subbase y base) según diseño

TOTAL	876,0
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	876,0
CANTIDAD TOTAL PARA PAGO	876,0

RESIDENTE OBRA


RESIDENTE INTERVENTORIA

INVIAS | La movilidad es de todos Mintransporte | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | SUDINCO

CARRETERA:	TRANSVERSAL BOYACÁ	**SOPORTE DE ACTA No.**	51
TRAMO:	RUTAS 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009	**PERIODO:**	21 DE JULIO DE 2025 A 23 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	**CONTRATO:**	973 DE 2021
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ECOVISION 188	**CONTRATO:**	962 DE 2021

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PRESENTE ACTA	
233.1	Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.	m2		876,00



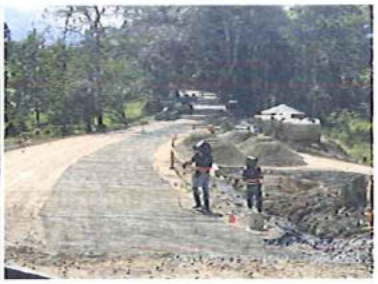

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 10 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ PERIODO MES: ago/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 51 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.940.108.063

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO GÒMEZ CAICEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11-sep-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO GÒMEZ CAICEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11-sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO M.	Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO M.	Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12-sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LAUREN IGUARAN		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	26-09-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA **NIT.** 900.815.676-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3.730.039.686 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Tres Mil Setecientos Treinta Millones Treinta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.51 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 al 31 de Agosto de 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO	Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO		Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO	Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO	Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS	Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No. 01102-0621 CPITVC	Matrícula No. 01102-0621 CPITVC	Matricula profesional No.: 25202104893 CND	Matrícula: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **973 DE 2021**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	51	1 al 31 de Agosto de 2025
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	86825	RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 3.730.039.686
				TOTAL ACTA	$ 3.730.039.686

NOTA:
1. El valor total del acta es de $ 3.957.383.921, se descuenta $ 227.344.235 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de $ 3.730.039.686.

Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)
Matrícula No: 01102-0621 CPITVC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtedwin	EDWIN ANIBAL TARAZONA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-11:42 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13625 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	86825	**Fecha Registro:**	2025-02-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	55.544.554.455,00	**Valor Total Operaciones:**	-15.128.000.000,00			**Valor Actual:**	40.416.554.455,00	**Saldo x Obligar:**	40.416.554.455,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900815676	**Razón Social:**	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35195494	**Nombre:**	CATALINA TELLEZ POSADA	**Cargo:**	DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	973/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-02-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	11	CSF		38.182.423.981,00	0,00		
					Total:	38.182.423.981,00	0,00	38.182.423.981,00	38.182.423.981,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	16	CSF	2025-02-20	15.128.000.000,00	-15.128.000.000,00		
					Total:	15.128.000.000,00	-15.128.000.000,00	0,00	0,00

11-21 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	16	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.234.130.474,00	0,00		
					Total:	2.234.130.474,00	0,00	2.234.130.474,00	2.234.130.474,00

Objeto:	SMCN CON 973/2021 VIGENCIAS FUTURAS P:31/08/2030 Sol_77_10_02_25 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) DEPTO BOYACÁ,

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-30	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	416.554.455,00	416.554.455,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de Obra N°: 51 Valor básico $ 3.940.108.063 Período: 1 al 31 de Agosto de 2025

Valor Incluido IVA $ 3.957.383.921

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45BY01	Puerto Boyacá	$ -	$ -	$ -	$ -
2	6006	Dos y Medio - Otanche	$ 2.609.443.391	$ -	$ 76.251.464	$ 2.685.694.855
3	6007	Otanche - Chiquinquirá	$ 122.355.286	$ -	$ 558.586.265	$ 680.941.551
4	6008	Chiquinquirá - Tunja	$ -	$ -	$ -	$ -
5	6009	Tunja - Páez	$ 319.798.904	$ -	$ 270.948.611	$ 590.747.515
						$ -
						$ -
		TOTALES	**$ 3.051.597.581**	**$ -**	**$ 905.786.340**	**$ 3.957.383.921**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891800466-4	Puerto Boyacá	Boyacá	$ 2.531.560.906	$ 2.520.509.441
891801362-1	Otanche	Boyacá	$ 154.133.949	$ 153.461.081
891801369-2	San Pablo de Borbur	Boyacá	$ 4.208.375	$ 4.190.003
891801368-5	Pauna	Boyacá	$ 676.733.176	$ 673.778.915
800024789-8	Maripí	Boyacá	$ -	$ -
800099721-1	Briceño	Boyacá	$ -	$ -
891801796-4	Caldas	Boyacá	$ -	$ -
891800475-0	Chiquinquirá	Boyacá	$ -	$ -
800028436-1	Tinjacá	Boyacá	$ -	$ -
800030988-1	Sutamarchán	Boyacá	$ -	$ -
800019846-1	Sáchica	Boyacá	$ -	$ -
800016757-9	Samacá	Boyacá	$ -	$ -
891802089-1	Cucaita	Boyacá	$ -	$ -
800019277-9	Sora	Boyacá	$ -	$ -
891800846-1	Tunja	Boyacá	$ -	$ -
800015909-7	Soracá	Boyacá	$ -	$ -
800023383-7	Boyacá	Boyacá	$ -	$ -
891801280-6	Ramiriquí	Boyacá	$ -	$ -
891801988-1	Ciénaga	Boyacá	$ -	$ -
891801770-3	Rondón	Boyacá	$ 272.124.714	$ 270.936.761
891802106-7	Zetaquirá	Boyacá	$ 180.461.986	$ 179.674.184
800029660-1	Miraflores	Boyacá	$ 5.315.203	$ 5.292.000
800099390-5	Berbeo	Boyacá	$ 132.845.612	$ 132.265.678
800049508-3	Páez	Boyacá	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ		**$ 3.957.383.921**	**$ 3.940.108.063**

NIT	DEPARTAMENTO 2	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	N.A.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrícula: 091037-0734114 CND

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula: N/A


DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la firma SUDINCO SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT No. 9 0 0. 8 1 5. 6 7 6 -1 y de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que la Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por ende, el suscrito representante legal de Sudinco SA Sucursal Colombiana informa a la interventoría que la planilla de seguridad social correspondiente al periodo de agosto de 2025 se encuentra debidamente cancelada.

Dada en Bogotá D.C. a los (10) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,



Ing. ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
C.E. No. 542657
Representante Legal
SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S	TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					151	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89311534	$113.958.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	1
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	176.200	0		0		0	0	0	0	176.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	605.200	0		0		0	0	0	0	605.200	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.403.500	0		0		0	0	0	0	3.403.500	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	374.600	0		0		0	0	0	0	374.600	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	229.200	0		0		0	0	0	0	229.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.309.000	0		0		0	0	0	0	1.309.000	17
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	6.217.600	0		0		0	0	0	0	6.217.600	68
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.743.600	0		0		0	0	0	0	1.743.600	26
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	102.900	0		0		0	0	0	0	102.900	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	344.700	0		0		0	0	0	0	344.700	5
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.384.700	0	0	28.600	28.600	0	0		6.441.900	17
230301	Porvenir	800224808-8	40.239.900	0	0	189.200	189.200	0	0		40.618.300	98
231001	Colfondos	800227940-6	2.679.800	0	0	0	0	0	0		2.679.800	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	10.586.000	0	0	0	0	0	0		10.586.000	28

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	23.862.800				23.862.800	0	0	23.862.800			238.628	23.862.800	151

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	14.787.000	0	0	14.787.000	151

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S	TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					151	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89311534	$113.958.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	14.982.500	14.982.500
Pensión	4	60.326.000	60.326.000
Riesgos Laborales	1	23.862.800	23.862.800
CCF	1	14.787.000	14.787.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	19	113.958.300	113.958.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					151	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89311534	$113.958.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002539557	BARRERA CHAVEZ CARLOS ALBERTO	1	0			S												X					230301	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS041	150.000	6.000	14-11	150.000	5	0	CCF10	150.000	6.000	150.000	0	0	0	0
2	CC	1002539557	BARRERA CHAVEZ CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS041	1.350.000	54.000	14-11	1.350.000	5	94.000	CCF10	1.350.000	54.000	1.350.000	0	0	0	0
3	CC	1002624092	LEON GOMEZ ANDREY SEBASTIAN	1	0			S								X									230301	2.733.864	437.500	0	0	0	0	EPS041	2.733.864	109.400	14-11	2.733.864	5	190.300	CCF10	2.733.864	109.400	2.733.864	0	0	0	0
4	CC	1002690747	ROJAS MONTES JEAN CARLOS	1	0			S								X									230301	2.245.501	359.300	0	0	0	0	EPS037	2.245.501	89.900	14-11	2.245.501	5	156.300	CCF10	2.245.501	89.900	2.245.501	0	0	0	0
5	CC	1002702934	RODRIGUEZ MUÑOZ JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
6	CC	1003698704	GOMEZ MIRANDA JUAN ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.901.989	304.400	0	0	0	0	EPS037	1.901.989	76.100	14-11	1.901.989	5	132.400	CCF10	1.901.989	76.100	1.901.989	0	0	0	0
7	CC	1004738984	MUÑOZ OSORIO JERSSON	1	0			S												L					230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS041	66.667	2.700	14-11	66.667	5	0	CCF10	66.667	2.700	66.667	0	0	0	0
8	CC	1004738984	MUÑOZ OSORIO JERSSON	1	0			S								X									230301	2.571.515	411.500	0	0	0	0	EPS041	2.571.515	102.900	14-11	2.571.515	5	179.000	CCF10	2.571.515	102.900	2.571.515	0	0	0	0
9	CC	1006858110	BEJARANO ALZATE LINA VANESSA	1	0			S												X					230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-11	86.667	5	0	CCF10	86.667	3.500	86.667	0	0	0	0
10	CC	1006858110	BEJARANO ALZATE LINA VANESSA	1	0			S		X															230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS017	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	5	84.500	CCF10	1.213.334	48.600	1.213.334	0	0	0	0
11	CC	1006858110	BEJARANO ALZATE LINA VANESSA	1	0			S	X																230301	480.000	76.800	0	0	0	0	EPS017	480.000	19.200	14-11	480.000	5	33.500	CCF10	173.334	7.000	173.334	0	0	0	0
12	CC	1007134193	CABRERA FUENTES ENRIQUE DE JESUS	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF10	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0
13	CC	1007426667	VANEGAS ESCOBAR EDILSON ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
14	CC	1007492600	VELASQUEZ ARIAS JHONATAN ALEXANDER	1	0			S											X						25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1007492600	VELASQUEZ ARIAS JHONATAN ALEXANDER	1	0			S								X									25-14	1.544.066	247.100	0	0	0	0	EPS041	1.544.066	61.800	14-11	1.544.066	5	107.500	CCF10	1.544.066	61.800	1.544.066	0	0	0	0
16	CC	1010124055	CASTRO ROMERO JEISON ANDRES	1	0			S												X					230301	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS041	266.667	10.700	14-11	266.667	5	0	CCF10	266.667	10.700	266.667	0	0	0	0
17	CC	1010124055	CASTRO ROMERO JEISON ANDRES	1	0			S																	230301	1.733.334	277.400	0	0	0	0	EPS041	1.733.334	69.400	14-11	1.733.334	5	120.700	CCF10	1.733.334	69.400	1.733.334	0	0	0	0
18	CC	1013628167	GUTIERREZ AGUIRRE GINA DURLEY	1	0			S								X									230301	1.635.083	261.700	0	0	0	0	EPS017	1.635.083	65.500	14-11	1.635.083	5	113.900	CCF10	1.635.083	65.500	1.635.083	0	0	0	0
19	CC	1014298209	ROLDAN SANCHEZ YULY TATIANA	1	0			S													X				230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS041	142.350	5.700	14-11	142.350	5	0	CCF10	142.350	5.700	142.350	0	0	0	0
20	CC	1014298209	ROLDAN SANCHEZ YULY TATIANA	1	0			S																	230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS041	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	5	89.200	CCF10	1.281.150	51.300	1.281.150	0	0	0	0
21	CC	10171521	RODRIGUEZ LOPEZ RICARDO	1	0			S													L				25-14	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS017	50.000	2.000	14-11	50.000	5	0	CCF10	50.000	2.000	50.000	0	0	0	0
22	CC	10171521	RODRIGUEZ LOPEZ RICARDO	1	0			S								X									25-14	1.868.977	299.100	0	0	0	0	EPS017	1.868.977	74.800	14-11	1.868.977	5	130.100	CCF10	1.868.977	74.800	1.868.977	0	0	0	0
23	CC	1017249673	DELGADO HINCAPIE BRAYAN ESTEBAN	1	0			S								X									25-14	1.463.940	234.300	0	0	0	0	EPS037	1.463.940	58.600	14-11	1.463.940	5	101.900	CCF10	1.463.940	58.600	1.463.940	0	0	0	0
24	CC	10176383	ROJAS CHARRY JOSE EUSEBIO	1	0			S								X									230301	2.581.364	413.100	0	0	0	0	EPS041	2.581.364	103.300	14-11	2.581.364	5	179.700	CCF10	2.581.364	103.300	2.581.364	0	0	0	0
25	CC	10184130	HURTADO ORTIZ EBER ALEXANDER	1	0			S													X				230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
26	CC	10184130	HURTADO ORTIZ EBER ALEXANDER	1	0			S													X				230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
27	CC	10184130	HURTADO ORTIZ EBER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS017	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	1.328.600	0	0	0	0
28	CC	1022369705	GOMEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA	1	0			S											X						230201	570.000	91.200	0	0	2.900	2.900	EPS037	570.000	22.800	14-11	570.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	1022369705	GOMEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA	1	0			S																	230201	5.130.000	820.800	0	0	25.700	25.700	EPS037	5.130.000	205.200	14-11	5.130.000	5	357.100	CCF10	5.130.000	205.200	5.130.000	0	0	0	0
30	CC	1024487963	GUZMAN CASTRO EDGAR ANTONIO	1	0			S											X						230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
31	CC	1024490247	MUÑOZ MEDINA ROBINSON	1	0			S																	230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	ESSC62	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	5	222.800	CCF10	3.200.000	128.000	3.200.000	0	0	0	0
32	CC	1030521591	VANEGAS MORENO JUAN CARLOS	1	0			S																	231001	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF10	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0
33	CC	1032458041	RICO MORENO DIEGO ALFONSO	1	0			S													X				230301	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS005	150.000	6.000	14-11	150.000	5	0	CCF10	150.000	6.000	150.000	0	0	0	0
34	CC	1032458041	RICO MORENO DIEGO ALFONSO	1	0			S																	230301	4.350.000	696.000	0	0	0	0	EPS005	4.350.000	174.000	14-11	4.350.000	5	302.800	CCF10	4.350.000	174.000	4.350.000	0	0	0	0
35	CC	1036220316	SALCEDO AMAYA KENER ALEXIS	1	0			S								X									230301	1.885.813	301.800	0	0	0	0	EPS017	1.885.813	75.500	14-11	1.885.813	5	131.300	CCF10	1.885.813	75.500	1.885.813	0	0	0	0
36	CC	1036222427	CIFUENTES VALENCIA JHON EDUER	1	0			S								X									230201	1.509.233	241.500	0	0	0	0	EPS037	1.509.233	60.400	14-11	1.509.233	5	105.100	CCF10	1.509.233	60.400	1.509.233	0	0	0	0
37	CC	1036224858	FONSECA RIOS JHON HARLINZON	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
38	CC	1049612325	LEON GARCIA LUIS EMBER	1	0			S		X															230301	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS037	50.000	2.000	14-11	50.000	5	3.500	CCF10	50.000	2.000	50.000	0	0	0	0
39	CC	1049625844	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	5.600.000	896.000	0	0	0	0	EPS005	5.600.000	224.000	14-11	5.600.000	5	389.800	CCF10	5.600.000	224.000	5.600.000	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 151 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89311534	$113.958.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1049656277	SANDOVAL BLANCO JOSE LUIS	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF10	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0
41	CC	1052338455	PUENTES COCA MANUEL EDILSON	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0
42	CC	1052391984	ACERO ACERO NACIM YANINE	1	0			S												X					25-14	725.000	116.000	0	0	0	0	EPS037	725.000	29.000	14-11	725.000	5	0	CCF10	725.000	29.000	725.000	0	0	0	0
43	CC	1052391984	ACERO ACERO NACIM YANINE	1	0			S												X					25-14	3.625.000	580.000	0	0	0	0	EPS037	3.625.000	145.000	14-11	3.625.000	5	252.300	CCF10	3.625.000	145.000	3.625.000	0	0	0	0
44	CC	1053323821	CAICEDO VELASQUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S												X					230301	420.000	67.200	0	0	0	0	EPS037	420.000	16.800	14-11	420.000	5	0	CCF10	420.000	16.800	420.000	0	0	0	0
45	CC	1053323821	CAICEDO VELASQUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS037	780.000	31.200	14-11	780.000	5	54.300	CCF10	780.000	31.200	780.000	0	0	0	0
46	CC	1053339460	CAÑON NEIZA JOHN ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.598.182	255.800	0	0	0	0	EPS041	1.598.182	64.000	14-11	1.598.182	5	111.300	CCF10	1.598.182	64.000	1.598.182	0	0	0	0
47	CC	1053684347	LOPEZ GUERRERO DIANA PATRICIA	1	0			S												X					230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0
48	CC	1053684347	LOPEZ GUERRERO DIANA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS041	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	1.328.600	0	0	0	0
49	CC	1053684532	BORDA GALINDO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S												X					230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS041	189.800	7.600	14-11	189.800	5	0	CCF10	189.800	7.600	189.800	0	0	0	0
50	CC	1053684532	BORDA GALINDO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.476.342	236.300	0	0	0	0	EPS041	1.476.342	59.100	14-11	1.476.342	5	102.800	CCF10	1.476.342	59.100	1.476.342	0	0	0	0
51	CC	1054544059	RAMIREZ GORDILLO JUAN GUILLERMO	1	0			S												L					25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
52	CC	1054544059	RAMIREZ GORDILLO JUAN GUILLERMO	1	0			S								X									25-14	1.813.129	290.200	0	0	0	0	EPS017	1.813.129	72.600	14-11	1.813.129	5	126.200	CCF10	1.813.129	72.600	1.813.129	0	0	0	0
53	CC	1054552172	GONZALEZ AGUDELO DARWIN ALVARO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
54	CC	1055246594	MURCIA JOHN JAIRO	1	0			S								X									230301	3.137.522	502.100	0	0	0	0	EPS008	3.137.522	125.600	14-11	3.137.522	5	218.400	CCF10	3.137.522	125.600	3.137.522	0	0	0	0
55	CC	1055315226	VARGAS RODRIGUEZ DIMAS FERNEY	1	0			S												X					230301	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS041	600.000	24.000	14-11	600.000	5	0	CCF10	600.000	24.000	600.000	0	0	0	0
56	CC	1055315226	VARGAS RODRIGUEZ DIMAS FERNEY	1	0			S	X							X									230301	1.009.394	161.600	0	0	0	0	EPS041	1.009.394	40.400	14-11	1.009.394	5	70.300	CCF10	1.009.394	40.400	1.009.394	0	0	0	0
57	CC	1055550117	BUITRAGO GUTIERREZ DUVAN ANDREY	1	0			S								X									230301	1.636.701	261.900	0	0	0	0	EPS041	1.636.701	65.500	14-11	1.636.701	5	114.000	CCF10	1.636.701	65.500	1.636.701	0	0	0	0
58	CC	1055550512	PEÑA GOMEZ BREINER CLEVERSON	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS041	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0
59	CC	1055550717	BAUTISTA GALINDO WILMAR	1	0			S								X									230301	2.792.045	446.800	0	0	0	0	EPS037	2.792.045	111.700	14-11	2.792.045	5	194.400	CCF10	2.792.045	111.700	2.792.045	0	0	0	0
60	CC	1055550893	CARRILLO ORDOÑEZ ELKIN ELIECER	1	0			S								X									230301	2.392.273	382.800	0	0	0	0	EPS037	2.392.273	95.700	14-11	2.392.273	5	166.600	CCF10	2.392.273	95.700	2.392.273	0	0	0	0
61	CC	1055550971	ARIZA ORDOÑEZ LUIS CAMILO	1	0			S								X									230301	1.517.645	242.900	0	0	0	0	EPS041	1.517.645	60.800	14-11	1.517.645	5	105.700	CCF10	1.517.645	60.800	1.517.645	0	0	0	0
62	CC	1055550981	TRIANA ORDOÑEZ JOSE GERMAN	1	0			S												X					230201	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS037	400.000	16.000	14-11	400.000	5	0	CCF10	400.000	16.000	400.000	0	0	0	0
63	CC	1055550981	TRIANA ORDOÑEZ JOSE GERMAN	1	0			S																	230201	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS037	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	5	181.000	CCF10	2.600.000	104.000	2.600.000	0	0	0	0
64	CC	1055551646	ANZOLA PEREZ LINA YICETH	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
65	CC	1055552123	CIFUENTES JIMENEZ CRISTIAN ALEXIS	1	0			S								X									230201	3.062.818	490.100	0	0	0	0	EPS037	3.062.818	122.600	14-11	3.062.818	5	213.200	CCF10	3.062.818	122.600	3.062.818	0	0	0	0
66	CC	1055554115	CARRILLO ARIZA SARAY CAMILA	1	0			S												X					25-14	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS017	66.667	2.700	14-11	66.667	5	0	CCF10	66.667	2.700	66.667	0	0	0	0
67	CC	1055554115	CARRILLO ARIZA SARAY CAMILA	1	0			S																	25-14	1.933.334	309.400	0	0	0	0	EPS017	1.933.334	77.400	14-11	1.933.334	5	134.600	CCF10	1.933.334	77.400	1.933.334	0	0	0	0
68	CC	1056411023	CARO RODRIGUEZ CHRISTIAN ALEXANDER	1	0			S								X									231001	2.167.159	346.800	0	0	0	0	EPS037	2.167.159	86.700	14-11	2.167.159	5	150.900	CCF10	2.167.159	86.700	2.167.159	0	0	0	0
69	CC	1056412021	PEÑA SIERRA YENY PATRICIA	1	0			S								X									230201	1.447.764	231.700	0	0	0	0	EPS041	1.447.764	58.000	14-11	1.447.764	5	100.800	CCF10	1.447.764	58.000	1.447.764	0	0	0	0
70	CC	1056768150	VALERO WALTEROS OSCAR JAVIER	1	0			S								X									230301	2.793.818	447.100	0	0	0	0	EPS037	2.793.818	111.800	14-11	2.793.818	5	194.500	CCF10	2.793.818	111.800	2.793.818	0	0	0	0
71	CC	1056769743	USUGA USUGA JESUS ANTONIO	1	0			S								X									230301	2.855.114	456.900	0	0	0	0	EPS037	2.855.114	114.300	14-11	2.855.114	5	198.800	CCF10	2.855.114	114.300	2.855.114	0	0	0	0
72	CC	1056770155	DIAZ ROJAS LUIS FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.536.733	245.900	0	0	0	0	EPS017	1.536.733	61.500	14-11	1.536.733	5	107.000	CCF10	1.536.733	61.500	1.536.733	0	0	0	0
73	CC	1056770370	OSPINA HENAO DANIEL ARTURO	1	0			S												L					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
74	CC	1056770370	OSPINA HENAO DANIEL ARTURO	1	0			S								X									230301	1.580.516	252.900	0	0	0	0	EPS037	1.580.516	63.300	14-11	1.580.516	5	110.100	CCF10	1.580.516	63.300	1.580.516	0	0	0	0
75	CC	1056770893	TIQUE ARIAS CRISTIAN DAVID	1	0			S	X																230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
76	CC	1056772194	BENAVIDES ARANGO LILIANA	1	0			S								X									230301	1.626.995	260.400	0	0	0	0	EPS037	1.626.995	65.100	14-11	1.626.995	5	113.300	CCF10	1.626.995	65.100	1.626.995	0	0	0	0
77	CC	1056773544	PARRA DIAZ YEISON EDUARDO	1	0			S								X									231001	2.625.000	420.000	0	0	0	0	EPS037	2.625.000	105.000	14-11	2.625.000	5	182.700	CCF10	2.625.000	105.000	2.625.000	0	0	0	0
78	CC	1056773652	RONCANCIO SALAZAR ANYI PAOLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
79	CC	1056778308	BERNAL RODRIGUEZ CESAR TIBERIO	1	0			S								X									230301	1.552.909	248.500	0	0	0	0	EPS017	1.552.909	62.200	14-11	1.552.909	5	108.100	CCF10	1.552.909	62.200	1.552.909	0	0	0	0
80	CC	1056780335	ANGARITA RAMIREZ JUAN DIEGO	1	0			S								X									230301	2.063.636	330.200	0	0	0	0	EPS037	2.063.636	82.600	14-11	2.063.636	5	143.700	CCF10	2.063.636	82.600	2.063.636	0	0	0	0
81	CC	1056781404	RODRIGUEZ VEGA JEISON NORBEY	1	0			S								X									230301	1.749.934	280.000	0	0	0	0	EPS037	1.749.934	70.000	14-11	1.749.934	5	121.800	CCF10	1.749.934	70.000	1.749.934	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					151	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89311534	$113.958.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
82	CC	1056782087	VERA REAL JOSE MANUEL	1	0			S								X									230301	1.725.023	276.100	0	0	0	0	EPS037	1.725.023	69.100	14-11	1.725.023	5	120.100	CCF10	1.725.023	69.100	1.725.023	0	0	0	0
83	CC	1056784678	OSMA OQUENDO CRISTIAN HEBERTO	1	0			S												L					230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS017	66.667	2.700	14-11	66.667	5	0	CCF10	66.667	2.700	66.667	0	0	0	0
84	CC	1056784678	OSMA OQUENDO CRISTIAN HEBERTO	1	0			S								X									230301	2.513.333	402.200	0	0	0	0	EPS017	2.513.333	100.600	14-11	2.513.333	5	175.000	CCF10	2.513.333	100.600	2.513.333	0	0	0	0
85	CC	1056786778	SUAREZ CAÑAS JUAN DANIEL	1	0			S								X									230301	1.560.997	249.800	0	0	0	0	EPS037	1.560.997	62.500	14-11	1.560.997	5	108.700	CCF10	1.560.997	62.500	1.560.997	0	0	0	0
86	CC	1057410711	CARO SUAREZ ROCIO AZUCENA	1	0			S												X					25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	ESSC24	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0
87	CC	1057410711	CARO SUAREZ ROCIO AZUCENA	1	0			S												X					25-14	237.250	38.000	0	0	0	0	ESSC24	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF10	237.250	9.500	237.250	0	0	0	0
88	CC	1057410711	CARO SUAREZ ROCIO AZUCENA	1	0			S								X									25-14	1.196.495	191.500	0	0	0	0	ESSC24	1.196.495	47.900	14-11	1.196.495	5	83.300	CCF10	1.196.495	47.900	1.196.495	0	0	0	0
89	CC	1057412400	CIFUENTES HEREDIA ANGELA JULIETH	1	0			S												X					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
90	CC	1057412400	CIFUENTES HEREDIA ANGELA JULIETH	1	0			S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	ESSC24	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF10	1.376.050	55.100	1.376.050	0	0	0	0
91	CC	1070004440	SOLER ORDUZ JOHAN STIVEN	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	ESSC24	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0
92	CC	1073382738	MATALLANA HERNANDEZ ALBA LIDIA	1	0			S										X							231001	94.900	15.200	0	0	0	0	CCFC55	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
93	CC	1073382738	MATALLANA HERNANDEZ ALBA LIDIA	1	0			S																	231001	1.328.600	212.600	0	0	0	0	CCFC55	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	1.328.600	0	0	0	0
94	CC	1075539909	RAMIREZ DUSSAN CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230301	3.927.272	628.400	0	0	0	0	EPS002	3.927.272	157.100	14-11	3.927.272	5	273.400	CCF10	3.927.272	157.100	3.927.272	0	0	0	0
95	CC	1085336564	REVELO CORDOBA NATALIA KATERINE	1	0			S												X					230301	1.283.334	205.400	0	0	0	0	EPS037	1.283.334	51.400	14-11	1.283.334	5	0	CCF10	1.283.334	51.400	1.283.334	0	0	0	0
96	CC	1085336564	REVELO CORDOBA NATALIA KATERINE	1	0			S																	230301	2.216.667	354.700	0	0	0	0	EPS037	2.216.667	88.700	14-11	2.216.667	5	154.300	CCF10	2.216.667	88.700	2.216.667	0	0	0	0
97	CC	1088971630	MUÑOZ GARCIA BERNARDO ANDRES	1	0			S																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF10	4.500.000	180.000	4.500.000	0	0	0	0
98	CC	1090521048	PEREZ SOLER ANDRES CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
99	CC	1090986420	DUARTE CORONEL CRISTIAN DANILO	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	CCFC50	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF10	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0
100	CC	1094909178	ALGARIN BEDOYA JAIDER JOSE	1	0			S								X									230301	2.534.545	405.600	0	0	0	0	EPS037	2.534.545	101.400	14-11	2.534.545	5	176.500	CCF10	2.534.545	101.400	2.534.545	0	0	0	0
101	CC	1096183231	VILLARREAL RUEDA LUIS ALFONSO	1	0			S												X					230301	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS037	500.000	20.000	14-11	500.000	5	0	CCF10	500.000	20.000	500.000	0	0	0	0
102	CC	1096183231	VILLARREAL RUEDA LUIS ALFONSO	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF10	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0
103	CC	1098221006	AGUILLON JAIMES EVER JESUS	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	5	278.400	CCF10	4.000.000	160.000	4.000.000	0	0	0	0
104	CC	1099548609	ARIZA GONZALEZ LUZ MYRIAM	1	0			S												X					231001	373.334	59.800	0	0	0	0	EPS037	373.334	15.000	14-11	373.334	5	0	CCF10	373.334	15.000	373.334	0	0	0	0
105	CC	1099548609	ARIZA GONZALEZ LUZ MYRIAM	1	0			S																	231001	2.426.667	388.300	0	0	0	0	EPS037	2.426.667	97.100	14-11	2.426.667	5	168.900	CCF10	2.426.667	97.100	2.426.667	0	0	0	0
106	CC	1117547523	RICAURTE MUÑOZ ANGELICA MARIA	1	0			S								X									25-14	3.423.000	547.700	0	0	0	0	EPS037	3.423.000	137.000	14-11	3.423.000	5	238.300	CCF10	3.423.000	137.000	3.423.000	0	0	0	0
107	CC	11185056	LOPEZ MORALES WALTER LAVESI	1	0			S																	231001	4.800.000	768.000	0	0	0	0	EPS008	4.800.000	192.000	14-11	4.800.000	5	334.100	CCF10	4.800.000	192.000	4.800.000	0	0	0	0
108	CC	1118801937	ZUÑIGA ORTIZ HAROLD EMIR	1	0			S								X									230301	2.977.841	476.500	0	0	0	0	CCFC55	2.977.841	119.200	14-11	2.977.841	5	207.300	CCF10	2.977.841	119.200	2.977.841	0	0	0	0
109	CC	12264537	PATIÑO TOQUICA JAIME	1	0			S	X							X									230301	685.606	109.700	0	0	0	0	EPS037	685.606	27.500	14-11	685.606	5	47.800	CCF10	685.606	27.500	685.606	0	0	0	0
110	CC	1233690646	ORTIZ CORTES PAULA VALENTINA	1	0			S												X					230201	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS037	266.667	10.700	14-11	266.667	5	0	CCF10	266.667	10.700	266.667	0	0	0	0
111	CC	1233690646	ORTIZ CORTES PAULA VALENTINA	1	0			S																	230201	3.733.334	597.400	0	0	0	0	EPS037	3.733.334	149.400	14-11	3.733.334	5	259.900	CCF10	3.733.334	149.400	3.733.334	0	0	0	0
112	CC	12523657	QUIÑONEZ VILLEGAS DAYGER MANUEL	1	0			S																30	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	0	CCF10	0	0	0	0	0	0	0
113	CC	13064359	SANTACRUZ PANTOJA HECTOR HERNANDO	1	0			S																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF10	4.500.000	180.000	4.500.000	0	0	0	0
114	CC	13567075	BASTIDAS CAMPO MILTON	1	0			S												X					230201	720.000	115.200	0	0	0	0	EPS037	720.000	28.800	14-11	720.000	5	0	CCF10	720.000	28.800	720.000	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					151	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89311534	$113.958.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
115	CC	13567075	BASTIDAS CAMPO MILTON	1	0			S												X					230201	450.000	72.000	0	0	0	0	EPS037	450.000	18.000	14-11	450.000	5	0	CCF10	450.000	18.000	450.000	0	0	0	0
116	CC	13567075	BASTIDAS CAMPO MILTON	1	0			S																	230201	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS037	1.530.000	61.200	14-11	1.530.000	5	106.500	CCF10	1.530.000	61.200	1.530.000	0	0	0	0
117	CC	1417240	ROMERO CARLOS AUGUSTO	1	0			S								X									230301	1.968.408	315.000	0	0	0	0	EPS037	1.968.408	78.800	14-11	1.968.408	5	137.100	CCF10	1.968.408	78.800	1.968.408	0	0	0	0
118	CC	14273389	OROZCO ROJAS JOSE RICARDO	1	0			S												L					230301	160.000	25.600	0	0	0	0	EPS010	160.000	6.400	14-11	160.000	5	0	CCF10	160.000	6.400	160.000	0	0	0	0
119	CC	14273389	OROZCO ROJAS JOSE RICARDO	1	0			S												L					230301	106.667	17.100	0	0	0	0	EPS010	106.667	4.300	14-11	106.667	5	0	CCF10	106.667	4.300	106.667	0	0	0	0
120	CC	14273389	OROZCO ROJAS JOSE RICARDO	1	0			S								X									230301	1.837.334	294.000	0	0	0	0	EPS010	1.837.334	73.500	14-11	1.837.334	5	127.900	CCF10	1.837.334	73.500	1.837.334	0	0	0	0
121	CC	14321265	TUNAROSA VALENCIA MARIO	1	0			S												L					230301	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS037	50.000	2.000	14-11	50.000	5	0	CCF10	50.000	2.000	50.000	0	0	0	0
122	CC	14321265	TUNAROSA VALENCIA MARIO	1	0			S								X									230301	2.133.523	341.400	0	0	0	0	EPS037	2.133.523	85.400	14-11	2.133.523	5	148.500	CCF10	2.133.523	85.400	2.133.523	0	0	0	0
123	CC	14326002	ALVAREZ RIOS JULIO CESAR	1	0			S								X									230301	1.917.818	306.900	0	0	0	0	EPS017	1.917.818	76.800	14-11	1.917.818	5	133.500	CCF10	1.917.818	76.800	1.917.818	0	0	0	0
124	CC	14326049	CAMARGO HERNANDEZ LUIS ALVARO	1	0			S								X									230201	1.704.727	272.800	0	0	0	0	EPS037	1.704.727	68.200	14-11	1.704.727	5	118.700	CCF10	1.704.727	68.200	1.704.727	0	0	0	0
125	CC	15329674	FRANCO SANTOS MARX ALAIN	1	0			S												X					230301	3.833.334	613.400	0	0	0	0	EPS037	3.833.334	153.400	14-11	3.833.334	5	0	CCF10	3.833.334	153.400	3.833.334	0	0	0	0
126	CC	15329674	FRANCO SANTOS MARX ALAIN	1	0			S																	230301	820.001	131.300	0	0	0	0	EPS037	820.001	32.900	14-11	820.001	5	57.100	CCF10	766.667	30.700	766.667	0	0	0	0
127	CC	21854909	AGUIRRE DIOSA FRANCY ELENA	1	0			S								X									230301	1.853.461	296.600	0	0	0	0	EPS002	1.853.461	74.200	14-11	1.853.461	5	129.100	CCF10	1.853.461	74.200	1.853.461	0	0	0	0
128	CC	23756114	VEGA RAMIREZ ALBA LUCIA	1	0			S												X					231001	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	7.600	14-11	189.800	5	0	CCF10	189.800	7.600	189.800	0	0	0	0
129	CC	23756114	VEGA RAMIREZ ALBA LUCIA	1	0			S								X									231001	1.241.788	198.700	0	0	0	0	EPS037	1.241.788	49.700	14-11	1.241.788	5	86.500	CCF10	1.241.788	49.700	1.241.788	0	0	0	0
130	CC	3133873	RODRIGUEZ GALLEGO HAROL AUGUSTO	1	0			S												X					230301	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS037	466.667	18.700	14-11	466.667	5	0	CCF10	466.667	18.700	466.667	0	0	0	0
131	CC	3133873	RODRIGUEZ GALLEGO HAROL AUGUSTO	1	0			S																	230301	3.033.334	485.400	0	0	0	0	EPS037	3.033.334	121.400	14-11	3.033.334	5	211.200	CCF10	3.033.334	121.400	3.033.334	0	0	0	0
132	CC	3133974	MOSQUERA MINA JHON EDUAR	1	0			S								X									230301	2.123.280	339.800	0	0	0	0	EPS037	2.123.280	85.000	14-11	2.123.280	5	147.800	CCF10	2.123.280	85.000	2.123.280	0	0	0	0
133	CC	3134121	RODRIGUEZ TORRES LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.493.381	239.000	0	0	0	0	EPS017	1.493.381	59.800	14-11	1.493.381	5	104.000	CCF10	1.493.381	59.800	1.493.381	0	0	0	0
134	CC	33365954	TALERO ACEVEDO BLANCA ROSA ELENA	1	0			S												X					25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0
135	CC	33365954	TALERO ACEVEDO BLANCA ROSA ELENA	1	0			S												X					25-14	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS041	237.250	9.500	14-11	237.250	5	0	CCF10	237.250	9.500	237.250	0	0	0	0
136	CC	33365954	TALERO ACEVEDO BLANCA ROSA ELENA	1	0			S								X									25-14	1.099.438	176.000	0	0	0	0	EPS041	1.099.438	44.000	14-11	1.099.438	5	76.600	CCF10	1.099.438	44.000	1.099.438	0	0	0	0
137	CC	3392779	VALERIO RAMIREZ NELSON	1	0			S								X									230301	2.592.727	414.900	0	0	0	0	EPS037	2.592.727	103.800	14-11	2.592.727	5	180.500	CCF10	2.592.727	103.800	2.592.727	0	0	0	0
138	CC	3839927	MERLANO MARTINEZ JOSE LUIS	1	0			S												X					230301	1.520.000	243.200	0	0	7.600	7.600	CCFC33	1.520.000	60.800	14-11	1.520.000	5	0	CCF10	1.520.000	60.800	1.520.000	0	0	0	0
139	CC	3839927	MERLANO MARTINEZ JOSE LUIS	1	0			S												X					230301	4.180.000	668.800	0	0	20.900	20.900	CCFC33	4.180.000	167.200	14-11	4.180.000	5	291.000	CCF10	4.180.000	167.200	4.180.000	0	0	0	0
140	CC	40051557	GALINDO CASTRO JAUDELIZ SOOVEIDA	1	0			S												X					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
141	CC	40051557	GALINDO CASTRO JAUDELIZ SOOVEIDA	1	0			S												X					230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS037	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF10	1.376.050	55.100	1.376.050	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					151	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89311534	$113.958.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
142	CC	40051652	GUERRERO ORDOÑEZ BILVIA SORAIDA	1	0			S								X									230301	1.658.054	265.300	0	0	0	0	EPS037	1.658.054	66.400	14-11	1.658.054	5	115.500	CCF10	1.658.054	66.400	1.658.054	0	0	0	0
143	CC	4046809	AVILA HERNANDEZ PLINIO RAFAEL	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS037	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	5	194.900	CCF10	2.800.000	112.000	2.800.000	0	0	0	0
144	CC	4061660	LIBERATO BERMUDEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S								X									25-14	2.692.568	430.900	0	0	0	0	EPS002	2.692.568	107.800	14-11	2.692.568	5	187.500	CCF10	2.692.568	107.800	2.692.568	0	0	0	0
145	CC	4150201	ESGUERRA SALGADO GILDARDO	1	0			S												X					25-14	76.667	12.300	0	0	0	0	EPS002	76.667	3.100	14-11	76.667	5	0	CCF10	76.667	3.100	76.667	0	0	0	0
146	CC	4150201	ESGUERRA SALGADO GILDARDO	1	0			S								X									25-14	2.262.538	362.100	0	0	0	0	EPS002	2.262.538	90.600	14-11	2.262.538	5	157.500	CCF10	2.262.538	90.600	2.262.538	0	0	0	0
147	CC	4297819	ARIAS AVILA ALIRIO	1	0			S												X					25-14	250.000	40.000	0	0	0	0	EPS041	250.000	10.000	14-11	250.000	5	0	CCF10	250.000	10.000	250.000	0	0	0	0
148	CC	4297819	ARIAS AVILA ALIRIO	1	0			S	X																25-14	850.000	136.000	0	0	0	0	EPS041	850.000	34.000	14-11	850.000	5	59.200	CCF10	850.000	34.000	850.000	0	0	0	0
149	CC	43258408	MARIN MELENDEZ NINFA	1	0			S												X					25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
150	CC	43258408	MARIN MELENDEZ NINFA	1	0			S												X					25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
151	CC	43258408	MARIN MELENDEZ NINFA	1	0			S								X									25-14	1.336.688	213.900	0	0	0	0	EPS041	1.336.688	53.500	14-11	1.336.688	5	93.100	CCF10	1.336.688	53.500	1.336.688	0	0	0	0
152	CC	46644818	CERQUERA RUBIO MARTHA	1	0			S								X									230301	2.180.543	348.900	0	0	0	0	EPS037	2.180.543	87.300	14-11	2.180.543	5	151.800	CCF10	2.180.543	87.300	2.180.543	0	0	0	0
153	CC	46646512	LONDOÑO TORRES MARY NELLY	1	0			S												L					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
154	CC	46646512	LONDOÑO TORRES MARY NELLY	1	0			S												X					230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0
155	CC	46646512	LONDOÑO TORRES MARY NELLY	1	0			S								X									230301	1.480.440	236.900	0	0	0	0	EPS017	1.480.440	59.300	14-11	1.480.440	5	103.100	CCF10	1.480.440	59.300	1.480.440	0	0	0	0
156	CC	46646876	ESCOBAR BAREÑO GLADYS	1	0			S												X					25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF10	47.450	1.900	47.450	0	0	0	0
157	CC	46646876	ESCOBAR BAREÑO GLADYS	1	0			S								X									25-14	1.416.490	226.700	0	0	0	0	EPS041	1.416.490	56.700	14-11	1.416.490	5	98.600	CCF10	1.416.490	56.700	1.416.490	0	0	0	0
158	CC	46647608	VELEZ ROMERO ALBA LUCIA	1	0			S												X					230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	3.800	94.900	0	0	0	0
159	CC	46647608	VELEZ ROMERO ALBA LUCIA	1	0			S																	230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS037	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	1.328.600	0	0	0	0
160	CC	5854667	ALVAREZ SANCHEZ MARIO ALEXANDER	1	0			S								X									25-14	2.272.000	363.600	0	0	0	0	EPS037	2.272.000	90.900	14-11	2.272.000	5	158.200	CCF10	2.272.000	90.900	2.272.000	0	0	0	0
161	CE	588379	ESTRELLA MALDONADO HERNAN PATRICIO	1	0			S																	230301	7.740.067	1.238.500	0	0	38.800	38.800	EPS005	7.740.067	309.700	14-11	7.740.067	5	538.800	CCF10	7.740.067	309.700	7.740.067	0	0	0	0
162	CE	589542	CHIGUANO ONTANEDA JEOFFRE	1	0			S																	230301	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	480.000	14-11	12.000.000	5	835.200	CCF10	12.000.000	480.000	12.000.000	0	0	0	0
163	CE	597807	BERNAL CASTILLO ERMEL LEANDRO	1	0			S								X									230301	3.843.636	615.000	0	0	0	0	EPS005	3.843.636	153.800	14-11	3.843.636	5	267.600	CCF10	3.843.636	153.800	3.843.636	0	0	0	0
164	CC	6910403	MARTINEZ PACHON EINAR	1	0			S												L					230201	50.000	8.000	0	0	0	0	ESSC24	50.000	2.000	14-11	50.000	5	0	CCF10	50.000	2.000	50.000	0	0	0	0
165	CC	6910403	MARTINEZ PACHON EINAR	1	0			S								X									230201	1.800.795	288.200	0	0	0	0	ESSC24	1.800.795	72.100	14-11	1.800.795	5	125.400	CCF10	1.800.795	72.100	1.800.795	0	0	0	0
166	CC	7187267	AUNTA HIGUERA WILLIAM FERNANDO	1	0			S												X					230301	1.950.000	312.000	0	0	9.800	9.800	EPS005	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	5	0	CCF10	1.950.000	78.000	1.950.000	0	0	0	0
167	CC	7187267	AUNTA HIGUERA WILLIAM FERNANDO	1	0			S																	230301	4.550.000	728.000	0	0	22.800	22.800	EPS005	4.550.000	182.000	14-11	4.550.000	5	316.700	CCF10	4.550.000	182.000	4.550.000	0	0	0	0
168	CC	7214748	RODRIGUEZ MALAVER MARCO JULIO	1	1			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	118.667	4.800	14-11	118.667	5	8.300	CCF10	118.667	4.800	118.667	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 151 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89311534	$113.958.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
169	CC	72224724	SAUCEDO VILLALOBOS MANUEL SANTIAGO	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF10	2.200.000	88.000	2.200.000	0	0	0	0
170	CC	7251485	MARTINEZ BRIÑEZ POMPILIO	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF10	2.200.000	88.000	2.200.000	0	0	0	0
171	CC	7254014	RESTREPO CADAVID CESAR AUGUSTO	1	0			S								X									230301	2.855.114	456.900	0	0	0	0	EPS037	2.855.114	114.300	14-11	2.855.114	5	198.800	CCF10	2.855.114	114.300	2.855.114	0	0	0	0
172	CC	7255190	ROJAS MEJIA EDGAR	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS041	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0
173	CC	7316211	CANCELADO DELGADILLO JOSE RODRIGO	1	0			S								X									230301	2.214.819	354.400	0	0	0	0	EPS017	2.214.819	88.600	14-11	2.214.819	5	154.200	CCF10	2.214.819	88.600	2.214.819	0	0	0	0
174	CC	7316867	ARGUELLO NEIZA MAURICIO ADOLFO	1	0			S												X					230301	823.334	131.800	0	0	0	0	ESSC24	823.334	33.000	14-11	823.334	5	0	CCF10	823.334	33.000	823.334	0	0	0	0
175	CC	7316867	ARGUELLO NEIZA MAURICIO ADOLFO	1	0			S								X									230301	1.383.837	221.500	0	0	0	0	ESSC24	1.383.837	55.400	14-11	1.383.837	5	96.400	CCF10	1.306.394	52.300	1.306.394	0	0	0	0
176	CC	74185487	BARBOSA TORRES OSCAR	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0
177	CC	74187478	NIÑO DUARTE CARLOS GREL	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF10	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
178	CC	74300591	URBANO BARRERA MIGUEL ANGEL	1	0			S								X									230201	2.865.909	458.600	0	0	0	0	EPS017	2.865.909	114.700	14-11	2.865.909	5	199.500	CCF10	2.865.909	114.700	2.865.909	0	0	0	0
179	CC	74347876	MONROY MORALES JOSE FERNANDO	1	0			S												X					230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS037	200.000	8.000	14-11	200.000	5	0	CCF10	200.000	8.000	200.000	0	0	0	0
180	CC	74347876	MONROY MORALES JOSE FERNANDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
181	CE	7467512	ZAMBRANO NAPA JENRRY ARTURO	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS037	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	5	194.900	CCF10	2.800.000	112.000	2.800.000	0	0	0	0
182	CE	7613819	SIAVICHAY CAMACHO JULIO ALBERTO	1	0			S													L				230301	145.000	23.200	0	0	0	0	EPS005	145.000	5.800	14-11	145.000	5	0	CCF10	145.000	5.800	145.000	0	0	0	0
183	CE	7613819	SIAVICHAY CAMACHO JULIO ALBERTO	1	0			S																	230301	4.205.000	672.800	0	0	0	0	EPS005	4.205.000	168.200	14-11	4.205.000	5	292.700	CCF10	4.205.000	168.200	4.205.000	0	0	0	0
184	CE	7652295	ÑAMU QUISPE JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	5	264.500	CCF10	3.800.000	152.000	3.800.000	0	0	0	0
185	CC	79617998	BARRERA ROA ROLFE ANSISAR	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF10	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0
186	CC	79967731	ARAUJO GOMEZ LUIS MIGUEL	1	0			S													X				230301	1.246.667	199.500	0	0	0	0	EPS002	1.246.667	49.900	14-11	1.246.667	5	0	CCF10	1.246.667	49.900	1.246.667	0	0	0	0
187	CC	79967731	ARAUJO GOMEZ LUIS MIGUEL	1	0			S								X									230301	1.061.333	169.900	0	0	0	0	EPS002	1.061.333	42.500	14-11	1.061.333	5	73.900	CCF10	1.061.333	42.500	1.061.333	0	0	0	0
188	CE	800394	CARDENAS VARGAS DIEGO ALEJANDRO	1	0			S													X				230301	256.154	41.000	0	0	0	0	EPS005	256.154	10.300	14-11	256.154	5	0	CCF10	256.154	10.300	256.154	0	0	0	0
189	CE	800394	CARDENAS VARGAS DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	3.586.147	573.800	0	0	0	0	EPS005	3.586.147	143.500	14-11	3.586.147	5	249.600	CCF10	3.586.147	143.500	3.586.147	0	0	0	0
190	CC	80231943	ANZOLA TEJEDOR JOSE EDIMER	1	0			S								X									25-14	2.805.136	448.900	0	0	0	0	EPS037	2.805.136	112.300	14-11	2.805.136	5	195.300	CCF10	2.805.136	112.300	2.805.136	0	0	0	0
191	CC	8047608	GRANDA LOZADA ALFONSO DE JESUS	1	0			S								X									230301	2.105.795	337.000	0	0	0	0	EPS037	2.105.795	84.300	14-11	2.105.795	5	146.600	CCF10	2.105.795	84.300	2.105.795	0	0	0	0
192	CC	80802775	AGUILAR LOPEZ EDI LEANDRO	1	0			S													X				230301	1.466.667	234.700	0	0	0	0	EPS037	1.466.667	58.700	14-11	1.466.667	5	0	CCF10	1.466.667	58.700	1.466.667	0	0	0	0
193	CC	80802775	AGUILAR LOPEZ EDI LEANDRO	1	0			S																	230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS037	800.000	32.000	14-11	800.000	5	55.700	CCF10	733.334	29.400	733.334	0	0	0	0
194	CC	84070631	MATIAS CARMONA RODOMIRO ARCANGEL	1	0			S																	25-14	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	5	292.400	CCF10	4.200.000	168.000	4.200.000	0	0	0	0
195	CC	8740026	SAUMETH MOJICA JAIRO	1	0			S								X									25-14	2.374.091	379.900	0	0	0	0	EPS037	2.374.091	95.000	14-11	2.374.091	5	165.300	CCF10	2.374.091	95.000	2.374.091	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900815676-1	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S		TV 23 # 94-33 OF 401 CHICO NORTE III	4674857	rrhhcolombia@sudinco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					151	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89311534	$113.958.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
196	CC	87514898	PANTOJA HERNANDEZ LUIS ALONSO	1	0			S								X								230301	3.355.114	536.900	0	0	0	0	EPS005	3.355.114	134.300	14-11	3.355.114	5	233.600	CCF10	3.355.114	134.300	3.355.114	0	0	0	0
197	CC	91002140	BETANCOURT ECHEVERRY CARLOS ARLEY	1	0			S												X					230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS037	100.000	4.000	14-11	100.000	5	0	CCF10	100.000	4.000	100.000	0	0	0	0
198	CC	91002140	BETANCOURT ECHEVERRY CARLOS ARLEY	1	0			S												X					230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS037	300.000	12.000	14-11	300.000	5	0	CCF10	300.000	12.000	300.000	0	0	0	0
199	CC	91002140	BETANCOURT ECHEVERRY CARLOS ARLEY	1	0			S												X					230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS037	300.000	12.000	14-11	300.000	5	0	CCF10	300.000	12.000	300.000	0	0	0	0
200	CC	91002140	BETANCOURT ECHEVERRY CARLOS ARLEY	1	0			S												X					230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS037	200.000	8.000	14-11	200.000	5	0	CCF10	200.000	8.000	200.000	0	0	0	0
201	CC	91002140	BETANCOURT ECHEVERRY CARLOS ARLEY	1	0			S								X									230301	634.091	101.500	0	0	0	0	EPS037	634.091	25.400	14-11	634.091	5	44.200	CCF10	634.091	25.400	634.091	0	0	0	0
202	CC	91505985	ROPERO PAEZ NELSON	1	0			S												X					25-14	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS037	400.000	16.000	14-11	400.000	5	0	CCF10	400.000	16.000	400.000	0	0	0	0
203	CC	91505985	ROPERO PAEZ NELSON	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0
204	CC	92502711	GARCIA LARA WILLIAN RAFAEL	1	0			S								X									230301	2.033.016	325.300	0	0	0	0	EPS037	2.033.016	81.400	14-11	2.033.016	5	141.500	CCF10	2.033.016	81.400	2.033.016	0	0	0	0
205	CC	93368303	SANDOVAL MONROY FREDY	1	0			S												X					230301	240.000	38.400	0	0	0	0	EPS037	240.000	9.600	14-11	240.000	5	0	CCF10	240.000	9.600	240.000	0	0	0	0
206	CC	93368303	SANDOVAL MONROY FREDY	1	0			S								X									230301	2.173.636	347.800	0	0	0	0	EPS037	2.173.636	87.000	14-11	2.173.636	5	151.300	CCF10	2.173.636	87.000	2.173.636	0	0	0	0
207	CC	93416675	ARIAS RONCANCIO VICENTE FERRER	1	0			S								X									25-14	3.729.091	596.700	0	0	0	0	EPS037	3.729.091	149.200	14-11	3.729.091	5	259.600	CCF10	3.729.091	149.200	3.729.091	0	0	0	0
208	CC	9499128	TORRES PULIDO JHONATAN JAVIER	1	0			S												X					230201	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS041	400.000	16.000	14-11	400.000	5	0	CCF10	400.000	16.000	400.000	0	0	0	0
209	CC	9499128	TORRES PULIDO JHONATAN JAVIER	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS041	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0
210	CC	9499211	BERNAL LOPEZ HUGO NORVAIRO	1	0			S								X									230201	3.741.818	598.700	0	0	0	0	EPS037	3.741.818	149.700	14-11	3.741.818	5	260.500	CCF10	3.741.818	149.700	3.741.818	0	0	0	0
211	CC	9530644	CIENDUA LOPEZ JORGE ELIECER	1	0			S												X					25-14	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS037	150.000	6.000	14-11	150.000	5	0	CCF10	150.000	6.000	150.000	0	0	0	0
212	CC	9530644	CIENDUA LOPEZ JORGE ELIECER	1	0			S																	25-14	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS037	1.350.000	54.000	14-11	1.350.000	5	94.000	CCF10	1.350.000	54.000	1.350.000	0	0	0	0
213	CE	977976	DE LA CRUZ TOCAGON SEGUNDO ENRIQUE	1	0			S												X					230301	366.667	58.700	0	0	1.900	1.900	EPS005	366.667	14.700	14-11	366.667	5	0	CCF10	366.667	14.700	366.667	0	0	0	0
214	CE	977976	DE LA CRUZ TOCAGON SEGUNDO ENRIQUE	1	0			S												X					230301	2.200.000	352.000	0	0	11.000	11.000	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	0	CCF10	2.200.000	88.000	2.200.000	0	0	0	0
215	CE	977976	DE LA CRUZ TOCAGON SEGUNDO ENRIQUE	1	0			S								X									230301	3.277.083	524.400	0	0	16.400	16.400	EPS005	3.277.083	131.100	14-11	3.277.083	5	228.100	CCF10	3.277.083	131.100	3.277.083	0	0	0	0
216	CC	98138532	MORA ERASO NAIRO ANCIZAR	1	0			S								X									230301	2.571.920	411.600	0	0	0	0	ESSC18	2.571.920	102.900	14-11	2.571.920	5	179.100	CCF10	2.571.920	102.900	2.571.920	0	0	0	0
217	CC	98346286	ROSERO RAMOS JAIME SOLIER	1	0			S																	230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS037	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	5	222.800	CCF10	3.200.000	128.000	3.200.000	0	0	0	0
218	CE	983945	COLLAGUAZO RAMIREZ JULIO GUILLERMO	1	0			S												X					230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	0	CCF10	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0
219	CE	983945	COLLAGUAZO RAMIREZ JULIO GUILLERMO	1	0			S								X									230301	1.900.363	304.100	0	0	0	0	EPS005	1.900.363	76.100	14-11	1.900.363	5	132.300	CCF10	1.900.363	76.100	1.900.363	0	0	0	0
220	CC	98652444	MACIAS HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO	1	0			S								X									25-14	2.983.273	477.400	0	0	0	0	EPS017	2.983.273	119.400	14-11	2.983.273	5	207.700	CCF10	2.983.273	119.400	2.983.273	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7769656
Contratista:	SUDINCO SUCURSAL COLOMBIANANA
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	900815676
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT



Numero de Contrato:	973	Vigencia:	2021
Base Gravable	$3940108063	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 39,402,000.00
Fecha de Pago:	10/09/2025		

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

Firmado digitalmente por Verificacion Estampilla
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Verificacion Estampilla, o=UPTC, ou=Estampilla, email=verificacion.estampilla@uptc.edu.co, c=CO
Fecha: 2025.09.10 16:56:20 -05'00'

Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1767657736 BANCOLOMBIA

ecollect <pagos@ecollect.co>
para clarraga, ingresos, control.pagoestampillas

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	900815676-900815676
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	141090144 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1767657736
Fecha y Hora	10/09/2025 04:12:24 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7769656 Descargar PDF aquí
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 39,402,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 39,402,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141170978140

(415)7707212489984(8020) 000014117097814 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 5 6 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SUDINCO SA SUCURSAL COLOMBIANA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 23 94 33 OF 401

42. Correo electrónico notificacionescontabilidad@sudinco.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 2 2 1	3 2 2 8 4 7 3 5 3 3	6 0 1 4 6 7 4 8 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 3 0 9 0 9	4 2 2 0	2 0 1 3 0 9 0 9	4 6 5 9	4 2 9 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	1 8	2 6	3 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
36- Establecimiento Permanente
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMON VELASTEGUI ANDRES EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170978140

(415)7707212489984(8020) **000014117097814 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 5 6 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 2 0 3	1 5 3 6
73. Fecha	2 0 1 3 0 9 2 4	2 0 1 5 0 7 2 8
74. Número de notaría	1 6	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 9 2 7	2 0 1 5 0 7 3 1
77. No. Matrícula mercantil	0 2 3 7 0 8 0 6	0 2 3 7 0 8 0 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 9 2 4	
81. Hasta	2 9 9 9 0 9 2 4	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 1	2 0 1 3 0 9 0 9		-
2	7 9	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO SUDINCO		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001	ECUADOR 2 3 9	1790258688001

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES SUDINCO S A

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170978140

(415)7707212489984(8020) **000014117097814 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 5 6 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	5 4 2 6 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMON	VELASTEGUI	ANDRES	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 2 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	5 3 1 7 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	MESIAS	CESAR	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141170978140

(415)7707212489984(8020) **000014117097814 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 5 6 7 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 8 6 2 1 0		2 9 7 3 7 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ACEVEDO	AVENDAÑO	MARIA	JOSE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 6 0 6 0 0 0 6 3	9	BDO AUDIT S.A.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 7 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 5 7 8 3 8 1	1	1 8 3 1 8 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
BEDOYA	GRACIA	CARMEN	CLARIZA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 6 0 6 0 0 0 6 3	9	BDO AUDIT S.A.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 3 0 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 4 0 5 5 5 3	9	8 5 6 2 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINZON	QUINTERO	NELLY	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 0 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 5

FECHA: 10 (Día) / 9 (Mes) / 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - OBUEO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 **DE** 1 al 31 de Agosto de 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 51 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.940.126.053

CONTRATO No: 372 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTRATISTA: SUCESIONES CIVIL INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCINCO S.A. SUCESIONES CIVIL OMNIA S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 982 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 188

PLAZO INICIAL: 392 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/08/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/S (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/S (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 359.871.764.334,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 46.066.329.064,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.967.087.398,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023
EXPLANACIONES (Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46.980.120	15,39%	3,92%	% P		0,01%	0,02%	0,06%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,22%
	$22.953.794	7,52%	11.954.121,11	$ E		$37.000	$50.000	$150.000	$197.373	$1.187.961	$1.179.961	$2.302.967	$2.322.967	$2.342.967	$2.536.776	$1.024.769	$1.298.649	$1.704.292	$2.530.291	$1.880.054	$5.150.213	$12.729.694	$8.640.276	$4.468.794
				% E	0,00%	0,01%	0,04%	0,21%	0,27%	0,68%	1,68%	1,98%	2,96%	3,33%	4,16%	4,29%	4,70%	5,26%	5,72%	5,98%	6,70%	7,03%	7,50%	14,71%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65.864.738	21,58%	11,54%	% P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,20%	0,20%	0,21%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,12%	0,80%	0,18%	0,38%
	$98.534.372	32,29%	35.204.529,76	$ P		$0	$0	$50.000	$7.921	$7.921	$7.921	$697.411	$697.411	$617.411	$617.411	$0	$0	$0	$0	$14.600	$47.010	$365.355	$2.452.734	$1.167.039
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,06%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,08%	0,03%	0,02%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,24%	0,05%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1 466.1)	$57.195.882	18,74%	20,49%	% P			0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,31%	0,31%	0,31%	0,32%	0,29%	0,38%	0,28%	0,32%	0,46%	1,31%	2,32%	1,78%	0,19%
	$90.749.203	29,74%	62.518.384,76	$ P					$30.000	$30.000	$30.000	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192	$954.192
				$ E		$0	$0	$0	$46.263	$0	$46.263	$1.607.834	$425.047	$427.940	$396.272	$1.078.340	$1.391.963	$1.219.333	$1.440.257	$1.391.963	$1.219.333	$1.440.257	$1.391.963	$1.391.963
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,15%	0,33%	0,21%	0,22%	0,13%	0,35%	0,46%	0,08%	0,34%	0,57%	0,61%	0,24%	0,79%	1,88%	0,58%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Ítems: 500.1)	$27.423	0,01%	0,01%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$47.795	0,02%	16.140,59	$ P												$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$632
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)	$92.829.396	30,42%	8,63%	% P					0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,01%	0,01%	0,24%	0,37%	0,01%	0,15%	0,93%	0,41%	0,46%
	$104.235.571	34,15%	26.347.886,96	$ P					$100.000	$100.000	$100.000	$349.188	$349.188	$349.188	$349.188	$16.392	$19.268	$42.882	$1.427.678	$31.154	$466.216	$2.839.497	$1.251.141	$1.291.230
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$1.263	$0	$20.186	$0	$0	$15.668	$13.218	$4.288	$5.096	$4.466	$77.135	$607.634	$1.09.373	$355.656	$61.796
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,20%	0,05%	0,12%	0,03%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1.689.546	0,55%	0,82%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	$7.227.438	2,37%	2.496.212,77	$ P					$10.000	$984.673	$960.673	$146.901	$146.901	$146.901	$146.901	$618	$0	$0	$0	$195	$0	$294	$157.413	$62.266
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,48%	0,53%	0,44%	0,15%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,01%	0,02%	0,01%
OBRAS VARIAS (Ítems: 800.1; 800.2)	$160.793	0,05%	0,19%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$687.322	0,23%	582.352,13	$ P												$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.292
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40.442.040	13,25%	2,51%	% P			0,00%	0,02%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,20%
	$20.135.228	6,60%	7.649.760,22	$ P		$0	$50.000	$150.000	$150.000	$2.266	$12.266	$191.659	$191.659	$191.659	$191.659	$29.542	$29.542	$29.542	$76.447	$156.706	$189.791	$156.706	$157.336	$617.443
				% E	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	0,01%	0,03%	0,01%	0,00%	0,01%	0,04%	0,01%	0,00%	0,03%	0,07%	0,04%	0,19%	0,07%	0,06%	0,03%
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0,00%	0,00%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	0,00%	-	$ P																				
				$ E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305.189.938,91	100,00%	48,09%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ **344.570.723,20**	112,90%	$ 146.769.388,24																					

Reprogramación No.1 | Reprogramación No.2 | Reprogramación No.3 | Reprogramación No.4 | Reprogramación No.5

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,01%	0,03%	0,16%	0,06%	0,39%	0,38%	0,76%	0,76%	0,77%	0,83%	0,34%	0,43%	0,56%	0,83%	0,62%	1,69%	4,17%	2,50%	1,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.000	$100.000	$500.000	$197.373	$1.187.961	$1.179.961	$2.302.967	$2.322.967	$2.342.967	$2.536.776	$1.024.769	$1.298.649	$1.704.292	$2.530.291	$1.880.054	$5.150.213	$12.729.694	$7.640.276	$4.468.794
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,01%	0,04%	0,21%	0,27%	0,68%	1,68%	1,98%	2,96%	3,33%	4,16%	4,29%	4,70%	5,26%	5,72%	5,98%	6,70%	7,03%	7,50%	14,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.000	$137.000	$637.000	$834.373	$2.022.335	$3.193.281	$5.496.238	$7.819.194	$10.162.151	$12.697.926	$8.340.112	$9.638.760	$11.343.022	$13.873.223	$14.888.827	$20.039.039	$32.768.733	$40.409.008	$44.894.793
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,01%	0,00%	0,22%	0,08%	0,22%	0,49%	0,33%	0,33%	0,16%	0,47%	0,59%	0,42%	0,14%	0,71%	0,74%	0,74%	1,67%	2,37%	1,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.926	$230.080	$656.229	$246.011	$868.883	$1.213.788	$901.929	$1.144.640	$496.373	$1.419.521	$1.788.086	$436.214	$1.298.021	$2.163.108	$2.273.637	$2.262.264	$3.078.412	$7.225.295	$2.177.678
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,01%	0,06%	0,30%	0,38%	0,76%	1,10%	1,39%	1,71%	1,91%	2,40%	2,99%	3,13%	3,58%	4,26%	5,01%	5,75%	6,76%	9,12%	9,84%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$37.926	$268.005	$924.230	$1.170.241	$2.139.121	$3.352.909	$4.254.839	$5.399.449	$5.895.822	$7.315.343	$9.103.429	$9.540.643	$10.845.664	$13.008.772	$15.282.409	$17.544.673	$20.623.106	$27.848.311	$30.025.990

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41.440.098 / $45.484.163	$ 40.022.600	87,99%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.080.000 / $1.080.000	$ -	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.524.575 / $1.714.976	$ 819.011	47,76%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.281.000 / $1.281.000	$ 1.268.678	99,04%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243.390 / $243.390	$ 241.049	99,04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $3.764.766	$ 3.242.214	86,12%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $715.305	$ 616.021	86,12%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7.772.765 / $7.772.765	$ 3.584.730	46,12%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340.000 / $340.000	$ 1.985	0,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53.681.825		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$62.396.364	$ 49.796.288	79,81%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358.871.764**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$406.967.087**	$ 196.565.676	48,30%

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Dentro de las GGP se incluyen los ítem No Previstos 650.3P; 650.4P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los ítems No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P; 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-II-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 10 (Día) / 9 (Mes) / 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - OSUCO CENTRO
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 40 **DE** 1 al 31 de Agosto de 2025 (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 40 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.940.106.063

CONTRATO No: 972 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUENTE BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA IGUALDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3
CONTRATISTA: SUCURSAL COLOMBIANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 992 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO RECONSTRUIR 108


PLAZO INICIAL: 702 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 20/08/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 765 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 559.973.764.334,00 (Revisión contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.967.087.588,00

PLAZO ACUMULADO: 99 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 765 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 66.006.570.004,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 21 FEBRERO 2023	MES 22 MARZO 2023	MES 23 ABRIL 2023	MES 24 MAYO 2023	MES 25 JUNIO 2023	MES 26 JULIO 2023	MES 27 AGOSTO 2023	MES 28 SEPTIEMBRE 2023	MES 29 OCTUBRE 2023	MES 30 NOVIEMBRE 2023	MES 31 DICIEMBRE 2023	MES 32 ENERO 2024	MES 33 FEBRERO 2024	MES 34 MARZO 2024	MES 35 ABRIL 2024	MES 36 MAYO 2024	MES 37 JUNIO 2024	MES 38 JULIO 2024	MES 39 AGOSTO 2024	MES 40 SEPTIEMBRE 2024
EXPLANACIONES (Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46.980.120 / $46.980.120	15,39% / 15,39%	3,92% / 3,92%	% P	0,27%	0,08%	0,17%	0,18%	0,13%	0,05%	0,08%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%	0,19%	0,10%	0,12%	0,14%	0,13%	0,12%	0,30%	0,28%	0,05%
	$22.953.794 / $22.953.794	7,52% / 7,52%	11.954.121,11 / 11.954.121,11	$ P	$826.319	$236.997	$526.452	$534.495	$408.831	$150.464	$235.244	$249.882	$194.696	$174.379	$276.883	$571.489	$298.218	$357.520	$414.647	$410.896	$372.095	$910.206	$856.666	$157.905
				$ E	$826.319	$236.997	$526.452	$534.495	$408.831	$150.464	$235.244	$249.882	$194.696	$174.379	$276.883	$571.489	$298.218	$357.520	$414.647	$410.896	$372.095	$910.206	$856.666	$157.905
				% E	0,03%	0,17%	0,08%	0,09%	0,12%	0,26%	0,26%	0,09%	0,07%	0,19%	0,03%	0,09%	0,23%	0,15%	0,15%	0,19%	0,09%	0,04%	0,04%	0,01%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65.864.738 / $98.534.372	21,58% / 32,29%	11,54% / 35.204.529,76	% P	0,48%	0,13%	0,21%	0,07%	0,23%	0,31%	0,05%	0,02%	0,27%	0,01%	0,40%	0,60%	0,55%	0,26%	0,41%	0,58%	0,35%	0,75%	0,06%	0,03%
	$51.467.618 / $98.534.372	$404.133 / $240.949	$652.015 / $48.928	$ P	$1.467.618	$404.133	$652.015	$219.272	$703.691	$943.411	$145.314	$69.923	$820.497	$19.349	$1.216.555	$1.835.630	$1.671.722	$803.857	$1.262.498	$1.776.902	$1.082.330	$2.276.908	$169.819	$103.744
				$ E	$468.309	$240.949	$48.928	$122.973	$172.563	$1.791.603	$179.356	$1.162.256	$261.346	$691.566	$1.835.630	$1.671.722	$2.484.278	$2.481.835	$1.776.902	$1.082.330	$2.276.908	$169.819	$103.744
				% E	0,15%	0,09%	0,04%	0,02%	0,04%	0,19%	0,09%	0,32%	0,40%	0,00%	0,26%	0,55%	0,90%	0,82%	0,85%	0,56%	0,36%	0,06%	0,03%	0,00%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 466.1)	$57.195.882 / $90.749.203	18,74% / 29,74%	20,49% / 62.518.384,76	% P	0,24%	0,52%	0,40%	0,67%	0,11%	0,12%	0,24%	0,54%	0,61%	0,55%	0,59%	0,22%	0,74%	0,36%	0,49%	0,30%	0,67%	0,13%	0,49%	0,64%
	$9.748.705 / $90.749.203	$1.997.337 / $1.997.337	$1.228.054 / $1.228.054	$ P	$729.478	$1.993.317	$1.228.054	$1.728.427	$324.816	$376.139	$732.424	$1.942.209	$1.875.503	$1.673.224	$1.802.611	$670.952	$2.294.782	$1.084.082	$1.505.392	$911.409	$2.056.763	$386.898	$1.491.539	$1.963.230
				$ E	$9.748.705	$1.997.337	$1.228.054	$1.728.427	$1.728.427	$376.139	$732.424	$1.942.209	$1.875.503	$1.673.224	$1.802.611	$1.938.392	$2.294.782	$1.084.082	$1.505.392	$911.409	$2.056.763	$386.898	$1.491.539	$1.963.230
				% E	1,03%	0,52%	0,47%	0,44%	0,36%	0,72%	0,33%	0,21%	1,06%	0,31%	0,43%	1,16%	0,49%	0,28%	0,46%	0,43%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Ítems: 500.1)	$90.749.203 / $47.795	29,74% / 0,02%	62.518.384,76 / 16.140,58	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$790 / $47.795	$0 / $0	$0 / $0	$ P	$790	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)	$92.829.396 / $104.235.571	30,42% / 34,15%	8,63% / 26.347.886,90	% P	0,57%	0,38%	0,67%	1,69%	1,71%	1,33%	0,56%	1,03%	0,70%	0,61%	0,12%	0,28%	0,16%	0,87%	0,85%	0,92%	0,90%	0,87%	1,23%	1,35%
	$1.739.037 / $104.235.571	$1.166.864 / $276.810	$3.040.035 / $276.810	$ P	$1.739.037	$1.166.864	$3.040.035	$5.180.068	$5.326.343	$4.066.295	$1.696.364	$3.164.789	$3.126.495	$1.846.694	$362.306	$889.376	$474.482	$3.643.816	$3.987.861	$3.797.876	$3.764.428	$3.664.118	$3.742.896	$4.132.766
				$ E	$188.440	$276.810	$276.810	$276.810	$276.810	$466.272	$466.272	$1.058.210	$1.058.210	$4.738.286	$0	$1.834.401	$474.482	$3.643.816	$3.987.861	$3.797.876	$3.764.428	$3.664.118	$3.742.896	$4.132.766
				% E	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,09%	0,09%	0,20%	0,20%	0,91%	0,00%	0,35%	0,09%	0,70%	0,77%	0,73%	0,72%	0,70%	0,72%	0,79%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1.889.546 / $77.227.438	0,55% / 2,37%	0,82% / 2.496.212,77	% P	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,03%	0,13%	0,01%	0,04%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	0,06%	0,08%
	$77.833 / $77.227.438	$16.056 / $0	$24.483 / $0	$16.056 / $0	$28.055 / $0	$149.116 / $107.745	$84.484 / $61.004	$366.605 / $84.780	$42.108 / $29.535	$123.425 / $104.588	$809.157 / $0	$0 / $0	$0 / $0	$0 / $0	$0 / $0	$0 / $0	$0 / $0	$153.264 / $0	$196.956 / $0	$119.363 / $0	$189.444 / $0	$243.012 / $0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,01%	0,04%	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
OBRAS VARIAS (Ítems: 800.1; 800.2)	$160.793 / $687.322	0,05% / 0,23%	0,19% / 582.352,12	% P	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,08%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$5.352 / $687.322	$13.182 / $0	$38.587 / $0	$71.460 / $0	$32.541 / $0	$7.000 / $1.960	$11.131 / $3.076	$82.647 / $0	$151.352 / $0	$106.308 / $0	$52.099 / $0	$0 / $0	$0 / $0	$0 / $0	$0 / $0	$14.337 / $0	$27.450 / $0	$58.826 / $0	$44.508 / $0	$29.415 / $0	$0 / $0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40.442.040 / $20.135.228	13,25% / 6,60%	2,51% / 7.649.760,23	% P	0,25%	0,17%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
	$771.854 / $20.135.228	$507.474 / $1.115.353	$923.993 / $467.763	$446.381 / $173.383	$473.122 / $100.000	$434.615 / $99.000	$54.532 / $11.364	$313.440 / $151.464	$219.251 / $101.268	$166.513 / $81.268	$135.369 / $0	$165.568 / $26.976	$90.651 / $14.500	$92.468 / $13.211	$85.260 / $0	$94.193 / $24.884	$83.218 / $21.218	$91.922 / $23.778	$87.013 / $48.938	$49.244 / $0	$48.763 / $4.100
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS ITEMS	$0 / $0	0,00% / 0,00%	0,00% / -	% P																				
				$ P																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305.189.938,91	100,00%	48,09%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A´)	$ 344.670.723,20	112,90%	$ 146.769.388,24																					

Reprogramación No.6 | Reprogramación No.7 | Reprogramación No.8

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,84%	1,29%	1,64%	2,68%	2,36%	2,02%	0,97%	1,84%	1,75%	1,35%	1,52%	1,34%	1,67%	1,63%	1,92%	2,02%	2,16%	2,13%	2,15%	2,19%
	VALOR (Miles de Pesos)	$5.607.230	$3.928.095	$5.013.619	$8.166.150	$7.194.299	$6.149.863	$2.959.481	$5.623.651	$5.329.026	$4.109.781	$4.653.964	$4.103.036	$4.789.835	$4.981.443	$5.868.688	$6.158.862	$6.547.932	$6.512.462	$6.559.200	$6.677.346
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	16,58%	12,46%	14,10%	16,77%	19,13%	21,15%	22,11%	23,96%	25,70%	27,05%	28,58%	23,84%	25,41%	27,04%	28,97%	30,98%	33,13%	35,26%	37,41%	39,60%
	VALOR (Miles de Pesos)	$50.562.023	$39.934.222	$45.022.448	$51.188.289	$58.382.589	$64.532.572	$67.492.052	$73.115.703	$78.444.730	$82.554.514	$87.208.480	$72.759.516	$77.549.350	$82.530.793	$88.399.270	$94.558.137	$101.106.069	$107.618.072	$114.176.271	$120.853.616
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1,33%	1,24%	0,86%	0,85%	0,73%	1,49%	1,58%	1,02%	0,85%	0,82%	0,72%	2,01%	2,05%	1,66%	1,86%	1,54%	2,19%	0,22%	0,13%	0,23%
	VALOR (Miles de Pesos)	$4.055.926	$3.776.006	$2.629.395	$2.594.643	$2.225.962	$4.542.386	$4.747.956	$3.101.929	$2.693.845	$2.492.742	$2.208.892	$7.655.682	$6.247.954	$4.764.936	$5.674.664	$4.694.455	$6.411.540	$684.172	$398.638	$687.811
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	11,17%	12,40%	13,27%	14,12%	14,84%	16,33%	17,89%	18,98%	20,96%	21,77%	22,50%	24,00%	27,05%	28,61%	30,47%	32,01%	34,11%	34,34%	34,47%	34,69%
	VALOR (Miles de Pesos)	$34.081.517	$37.857.523	$46.483.918	$43.078.561	$45.304.543	$49.846.929	$54.594.885	$57.695.814	$63.954.699	$66.447.491	$68.656.293	$76.311.975	$82.559.930	$87.324.866	$92.999.530	$97.694.015	$104.105.555	$104.789.728	$105.188.366	$105.876.177

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41.440.096 / $45.484.183	$ 40.022.600	87,99%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$1.080.000 / $1.080.000	$ -	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.524.575 / $1.714.976	$ 819.011	47,76%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.281.000 / $1.281.000	$ 1.268.678	99,04%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243.390 / $243.390	$ 241.049	99,04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $3.764.766	$ 3.242.214	86,12%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $715.305	$ 616.021	86,12%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7.772.765 / $7.772.765	$ 3.584.730	46,12%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340.000 / $340.000	$ 1.985	0,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53.681.825		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B´)	$62.396.364	$ 49.796.288	79,81%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358.871.764**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$406.967.087**	$ 196.565.676	48,30%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 680.3P, 680.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 680.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Ítems No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 680.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los Ítem No previstos 680.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA: 10 (Día) / 9 (Mes) / 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 47 **DE** 1 al 31 de Agosto de 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 47 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.940.109.663

CONTRATO No: 973 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 969 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO PROVIMOBRAS

PLAZO INICIAL: 702 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/08/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)**: $ 359.871.764.334,09 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 456.041.097.166,00

PLAZO ACUMULADO: 99 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluya las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 48.095.323.054,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (Items: 200.1; 200.2; 201.7, 201.15, 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1, 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46.980.120	15,39%	3,92%
	$22.963.794	7,52%	11.954.121,11
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items: 310.1, 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65.864.738	21,58%	11,54%
	$98.534.372	32,29%	35.204.529,76
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items: 420.2, 421.1, 450.1P, 450.2P, 450.9P, 460.1P; 465.1; 464.1.1 466.1)	$57.195.882	18,74%	20,49%
	$90.749.203	29,74%	62.518.384,76
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Items: 500.1)	$27.423	0,01%	0,01%
	$47.795	0,02%	16.140,59
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 847.2; 681.1)	$92.829.396	30,42%	8,63%
	$104.235.571	34,15%	26.347.886,90
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1.689.546	0,55%	0,82%
	$7.227.438	2,37%	2.496.212,77
OBRAS VARIAS (Items: 800.1; 800.2)	$160.793	0,05%	0,19%
	$687.322	0,23%	582.352,12
TRANSPORTES (Items: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40.442.040	13,25%	2,51%
	$20.135.228	6,60%	7.649.760,22
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0,00%	0,00%
	$0	0,00%	-
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305.189.938,91	100,00%	48,09%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ **344.570.723,20**	112,90%	$ 146.769.388,24

% Programado	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
$ Valor programado	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
$ Valor Ejecutado	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
% Ejecutado	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026
% P	0,02%	0,01%	0,28%	0,02%	0,00%	0,03%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,04%	0,02%	0,02%	0,02%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,09%
$ P	$61.908	$30.888	$857.191	$66.116	$165.293	$84.525	$190.347	$243.782	$226.101	$243.377	$233.154	$124.914	$76.492	$73.057	$63.316	$156.726	$156.726	$211.634	$211.634	$264.543
$ E	$0	$0	$857.191	$335.306	$175.835	$427.305	$421.185	$275.180	$282.626	$197.248	$241.886									
% E	0,00%	0,00%	0,28%	0,11%	0,06%	0,06%	0,06%	0,09%	0,06%	0,05%	0,06%									
% P	0,33%	0,00%	0,98%	0,08%	0,21%	0,30%	1,35%	1,36%	0,20%	0,30%	0,30%	0,23%	0,01%	0,01%	0,01%	0,35%	0,35%	0,46%	0,46%	0,58%
$ P	$1.016.936	$0.260	$2.990.711	$253.441	$633.604	$910.168	$760.324	$917.587	$867.866	$917.587	$917.587	$695.777	$32.413	$31.367	$27.185	$1.054.692	$1.054.692	$1.406.256	$1.406.256	$1.757.819
$ E	$0	$0	$2.990.711	$1.111.000	$1.111.000	$1.111.000	$1.111.000	$1.111.000	$1.111.000	$1.111.000	$1.111.000									
% E	0,00%	0,04%	0,98%	1,11%	0,30%	0,44%	0,26%	0,26%	0,36%	0,40%	0,35%									
% P	1,28%	0,02%	0,55%	0,00%	0,29%	0,27%	0,27%	0,26%	0,30%	0,31%	0,31%	0,29%	0,08%	0,07%	0,07%	0,13%	0,13%	0,17%	0,17%	1,22%
$ P	$5.986.407	$0.592	$1.673.093	$279.211	$698.267	$924.197	$893.632	$949.932	$913.180	$949.197	$949.197	$892.025	$232.027	$225.592	$202.777	$398.261	$398.261	$531.667	$531.667	$663.934
$ E	$0	$0	$1.673.093	$1.400.000	$2.100.000	$3.024.197	$3.917.829	$4.867.761	$5.780.941	$6.729.938	$7.679.135	$8.571.160	$8.803.187	$9.028.779	$9.231.556	$9.629.817	$10.028.078	$10.559.745	$11.091.412	$11.755.346
% E	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,71%	0,65%	0,40%	0,17%	0,27%	0,16%	0,67%									
% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0									
% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
% P	0,36%	0,00%	0,67%	0,16%	0,40%	0,48%	0,48%	0,40%	0,42%	0,36%	0,38%	0,28%	0,01%	0,01%	0,00%	0,40%	0,40%	0,54%	0,54%	0,67%
$ P	$1.113.060	$0.411	$2.054.139	$495.753	$1.214.392	$1.468.501	$1.457.259	$1.229.392	$1.278.515	$1.186.643	$1.186.269	$790.368	$17.188	$18.884	$14.104	$1.228.515	$1.228.515	$1.634.021	$1.634.021	$2.042.526
$ E	$228.040	$201.035	$2.054.139	$1.238.868	$1.232.272	$1.125.969	$1.035.583	$1.317.588	$1.051.973	$1.407.888	$555.160									
% E	0,07%	0,07%	0,67%	0,41%	0,40%	0,37%	0,34%	0,43%	0,34%	0,46%	0,18%									
% P	0,14%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,06%	0,07%	0,07%	0,08%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
$ P	$435.693	$29.839	$0	$29.308	$73.269	$87.823	$87.823	$87.823	$87.823	$87.823	$87.823	$242.671	$34.671	$42.943	$93.736	$61.052	$61.052	$81.402	$81.402	$101.753
$ E	$0	$0	$0	$0	$267.345	$0	$0	$0	$0	$0	$116.878	$116.878								
% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%									
% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$27.388	$371	$0	$3.021	$7.553	$9.064	$9.064	$203.199	$17.263	$17.838	$17.838	$30.278	$0	$0	$0	$4.189	$4.189	$5.585	$5.585	$6.981
$ E	$0	$0	$0	$0	$16.585	$0	$0	$203.199	$18.738	$0	$0									
% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,01%	0,00%	0,00%									
% P	0,01%	0,00%	0,07%	0,03%	0,07%	0,07%	0,08%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,08%	0,08%	0,11%	0,11%	0,14%
$ P	$39.112	$56.432	$210.777	$56.933	$210.064	$267.262	$267.262	$67.977	$68.795	$82.492	$73.393	$68.335	$68.795	$68.998	$48.092	$257.369	$257.369	$343.166	$343.166	$428.932
$ E	$0	$0	$210.777	$59.000	$269.064	$267.262	$267.262	$68.000	$68.795	$82.492	$73.393									
% E	0,00%	0,00%	0,07%	0,04%	0,02%	0,09%	0,09%	0,05%	0,03%	0,03%	0,03%									
% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P																				
$ E																				
% E																				

Reprogramación | Reprogramación | Reprogramación

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		

		MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,16%	0,07%	2,65%	0,39%	0,98%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,93%	0,15%	0,15%	0,15%	1,04%	1,04%	1,38%	1,38%	1,73%
	VALOR (Miles de Pesos)	$6.600.564	$203.797	$7.794.628	$1.197.803	$2.994.709	$3.593.649	$3.593.649	$3.593.649	$3.593.649	$3.593.649	$3.593.649	$2.844.972	$449.206	$449.206	$449.206	$3.159.833	$3.159.833	$4.213.111	$4.213.111	$5.266.389
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	41,76%	34,93%	37,43%	37,82%	38,80%	39,98%	41,16%	42,34%	43,51%	44,69%	45,87%	46,80%	46,95%	47,09%	47,24%	48,28%	49,31%	50,69%	52,07%	53,80%
	VALOR (Miles de Pesos)	$127.454.180	$106.306.017	$114.229.831	$115.427.714	$118.422.422	$122.016.071	$125.609.720	$129.203.370	$132.797.019	$136.390.669	$139.984.317	$142.829.289	$143.278.496	$143.727.702	$144.176.908	$147.336.741	$150.496.575	$154.709.686	$158.922.797	$164.189.187
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,07%	0,11%	2,98%	1,87%	1,61%	1,87%	1,18%	1,20%	1,03%	1,11%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$226.043	$332.983	$7.794.628	$5.082.803	$4.922.001	$4.891.734	$3.988.022	$3.660.893	$3.154.985	$3.379.104	$3.940.198	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	34,77%	34,91%	37,43%	39,09%	40,71%	42,28%	43,46%	44,66%	45,69%	46,80%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$106.102.220	$106.435.203	$114.229.831	$119.312.634	$124.234.635	$129.036.369	$132.634.391	$136.295.194	$139.450.177	$142.829.280	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41.440.098	$ 40.022.600	87,99%
	$45.464.163		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.080.000	$	0,00%
	$1.080.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.524.575	$ 819.011	47,76%
	$1.714.976		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.281.000	$ 1.268.678	99,04%
	$1.281.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243.390	$ 241.049	99,04%
	$243.390		
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATIPICOS	$0	$ 3.242.214	86,12%
	$3.764.766		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0	$ 616.021	86,12%
	$715.305		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7.772.765	$ 3.584.730	46,12%
	$7.772.765		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340.000	$ 1.985	0,58%
	$340.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53.681.825		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$62.396.364	$ 49.796.288	79,81%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358.871.764**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$406.967.087**	$ 196.565.676	48,30%

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Dentro de las GGP se incluyen los ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los ítems No previstos 233.1, 494.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 10 (Día) / 9 (Mes) / 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - ORIENTE-CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 **DE** 14 (Indicar mes y año) de Agosto de 2025

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.940.139.093

CONTRATO No: 372 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODALO 3

CONTRATISTA: ASOINTERCONVIAL INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 369 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVIAS 2021

PLAZO INICIAL: 702 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 15/09/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 169.871.784.356,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.967.087.980,00

PLAZO ACUMULADO: 90 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 46.096.323.064,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 61 JUNIO 2026	MES 62 JULIO 2026	MES 63 AGOSTO 2026	MES 64 SEPTIEMBRE 2026	MES 65 OCTUBRE 2026	MES 66 NOVIEMBRE 2026	MES 67 DICIEMBRE 2026	MES 68 ENERO 2027	MES 69 FEBRERO 2027	MES 70 MARZO 2027	MES 71 ABRIL 2027	MES 72 MAYO 2027	MES 73 JUNIO 2027	MES 74 JULIO 2027	MES 75 AGOSTO 2027	MES 76 SEPTIEMBRE 2027	MES 77 OCTUBRE 2027	MES 78 NOVIEMBRE 2027	MES 79 DICIEMBRE 2027	MES 80 ENERO 2028
EXPLANACIONES (Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46.980.120 / $22.953.794	15,39% / 7,52%	3,92% / 11.954.121,11	% P	0,10%	0,10%	0,08%	0,08%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,09%	0,11%	0,11%	0,08%	0,08%	0,07%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%
				$ P	$317.451	$317.451	$238.088	$238.088	$211.634	$158.726	$158.726	$162.472	$162.472	$216.630	$216.630	$270.787	$324.944	$324.944	$243.708	$243.708	$216.630	$162.472	$162.472	$176.982
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítems: 310.1, 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65.864.738 / $98.534.372	21,58% / 32,29%	11,54% / 35.204.529,76	% P	0,69%	0,69%	0,52%	0,52%	0,46%	0,35%	0,35%	0,40%	0,40%	0,53%	0,53%	0,67%	0,80%	0,80%	0,80%	0,60%	0,53%	0,40%	0,40%	0,32%
				$ P	$2.109.383	$2.109.383	$1.582.038	$1.582.038	$1.406.256	$1.054.692	$1.054.692	$1.223.536	$1.223.536	$1.631.773	$1.631.773	$2.039.716	$2.447.659	$2.447.659	$1.835.744	$1.835.744	$1.631.773	$1.223.830	$1.223.830	$880.302
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 466.1)	$57.195.882 / $90.749.203	18,74% / 29,74%	20,49% / 62.518.384,76	% P	0,26%	0,26%	0,20%	0,20%	0,17%	0,13%	0,13%	0,16%	0,16%	0,21%	0,21%	0,26%	0,31%	0,31%	0,23%	0,23%	0,21%	0,15%	0,15%	0,07%
				$ P	$796.801	$796.801	$597.601	$597.601	$531.067	$398.301	$398.301	$471.115	$471.115	$626.153	$626.153	$785.191	$942.230	$942.230	$706.672	$706.672	$626.153	$471.115	$471.115	$267.026
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Ítems: 500.1)	$27.423 / $47.795	0,01% / 0,02%	0,01% / 16.140,59	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.899
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)	$92.829.396 / $104.235.571	30,42% / 34,16%	8,63% / 26.347.886,90	% P	0,80%	0,80%	0,60%	0,60%	0,54%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,66%	0,66%	0,82%	0,99%	0,99%	0,74%	0,74%	0,66%	0,49%	0,40%	0,41%
				$ P	$3.451.031	$3.451.031	$2.438.273	$1.825.273	$1.634.501	$1.226.514	$1.226.514	$1.506.582	$1.506.582	$2.007.843	$2.007.843	$2.509.803	$3.011.764	$3.011.764	$2.288.823	$2.288.823	$2.007.843	$1.506.582	$1.506.582	$1.259.412
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1.689.546 / $7.227.438	0,55% / 2,37%	0,82% / 2.496.212,77	% P	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
				$ P	$122.103	$122.103	$91.578	$91.578	$81.402	$61.052	$61.052	$62.073	$62.073	$82.765	$82.765	$103.456	$124.147	$124.147	$93.110	$93.110	$82.765	$62.073	$62.073	$58.860
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS (Ítems: 800.1; 800.2)	$160.793 / $687.322	0,05% / 0,23%	0,19% / 582.352,12	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$8.377	$8.377	$6.283	$6.283	$5.585	$4.189	$4.189	$4.834	$4.834	$6.446	$6.446	$8.057	$9.669	$9.669	$7.251	$7.251	$6.446	$4.834	$4.834	$3.843
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES (Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40.442.040 / $20.135.228	13,25% / 6,60%	2,51% / 7.649.760,22	% P	0,17%	0,17%	0,13%	0,13%	0,11%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,09%	0,09%	0,12%	0,14%	0,14%	0,11%	0,11%	0,09%	0,07%	0,07%	0,07%
				$ P	$514.719	$514.719	$386.040	$386.040	$343.146	$257.360	$257.360	$216.679	$216.679	$289.905	$289.905	$361.131	$433.358	$433.358	$325.018	$325.018	$288.905	$216.679	$216.679	$211.079
				$ E																				
				% E																				
TOTAL OTROS ITEMS	$0 / $0	0,00% / 0,00%	0,00% / -	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P																				
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305.189.938,91	100,00%	48,09%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 344.570.723,20**	112,90%	$ 146.769.388,24																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGRAMACION INICIAL		
REPROGRAMACIÓN 1		
REPROGRAMACIÓN 2		
REPROGRAMACIÓN 3		
REPROGRAMACIÓN 4		
REPROGRAMACIÓN 5		
REPROGRAMACIÓN 6		
REPROGRAMACIÓN 7		
REPROGRAMACIÓN 8		
REPROGRAMACIÓN 9		
REPROGRAMACIÓN 10		
REPROGRAMACIÓN 11		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,07%	2,07%	1,58%	1,58%	1,38%	1,04%	1,04%	1,19%	1,19%	1,59%	1,59%	1,99%	2,39%	2,39%	1,79%	1,79%	1,69%	1,19%	1,19%	1,19%	0,99%
	VALOR (Miles de Pesos)	$8.319.667	$8.319.667	$4.738.756	$4.738.756	$4.213.111	$3.159.833	$3.159.833	$3.646.885	$3.646.885	$4.862.513	$4.862.513	$6.078.142	$7.293.770	$7.293.770	$5.470.328	$5.470.328	$4.862.513	$3.646.885	$3.646.885	$3.646.885	$2.898.407
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	58,87%	57,94%	59,46%	61,06%	62,43%	63,46%	64,50%	65,69%	66,88%	68,46%	70,07%	72,07%	74,46%	76,85%	78,64%	80,43%	82,02%	83,22%	84,41%	85,36%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$170.908.894	$176.628.520	$181.568.271	$186.398.021	$190.521.122	$193.680.968	$196.840.799	$200.487.684	$204.134.569	$208.997.083	$213.859.596	$219.937.738	$227.231.508	$234.525.278	$239.995.606	$245.465.934	$250.328.447	$253.975.332	$257.622.217	$260.521.625	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%	48,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41.440.096 / $45.484.163	$ 40.022.600	87,99%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.080.000 / $1.080.000	$ -	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.524.575 / $1.714.976	$ 819.011	47,76%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.281.000 / $1.281.000	$ 1.268.678	99,04%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243.390 / $243.390	$ 241.049	99,04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $3.764.766	$ 3.242.214	86,12%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $715.305	$ 616.021	86,12%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7.772.765 / $7.772.765	$ 3.584.730	46,12%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340.000 / $340.000	$ 1.985	0,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53.681.825		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$62.396.364	$ 49.796.288	79,81%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358.871.764**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$406.967.087**	$ 196.565.676	48,30%

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 10 (Día) / 9 (Mes) / 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - OBUEO CENTRO
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** 1 al 31 de Agosto de 2025 (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 61 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.940.128.093

CONTRATO No: 972 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PAIPA) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "OBS PARA LA SEGURIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN ANDC" MODALO 5
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 992 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 188

PLAZO INICIAL: 992 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/FEBRERO/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 365 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.873.764.135,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406.967.087.388,00

PLAZO ACUMULADO: 99 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 26/5 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 46.095.329.004,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	MES 81 FEBRERO 2028	MES 82 MARZO 2028	MES 83 ABRIL 2028	MES 84 MAYO 2028	MES 85 JUNIO 2028	MES 86 JULIO 2028	MES 87 AGOSTO 2028	MES 88 SEPTIEMBRE 2028	MES 89 OCTUBRE 2028	MES 90 NOVIEMBRE 2028	MES 91 DICIEMBRE 2028	MES 92 ENERO 2029	MES 93 FEBRERO 2029	MES 94 MARZO 2029	MES 95 ABRIL 2029	MES 96 MAYO 2029	MES 97 JUNIO 2029	MES 98 JULIO 2029	MES 99 AGOSTO 2029	
EXPLANACIONES (Items: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)	$46.980.120	15,39%	3,92%	% P	0,08%	0,08%	0,08%	0,10%	0,12%	0,12%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%	120%
	$22.953.794	7,52%	$ 11.954.121,11	$ P	$176.982	$238.976	$238.976	$294.970	$353.963	$353.963	$265.473	$265.473	$255.976	$176.982	$176.982	$448.844	$448.844	$448.844	$448.844	$448.844	$448.844	$448.844	$0	$0	
				$ E																					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)	$65.864.738	21,58%	11,54%	% P	0,32%	0,43%	0,43%	0,54%	0,64%	0,64%	0,48%	0,48%	0,43%	0,32%	0,32%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00%	0,00%	110%
	$98.534.372	32,29%	$ 35.204.529,76	$ P	$980.302	$1.307.069	$1.307.069	$1.633.836	$1.960.603	$1.960.603	$1.470.452	$1.470.452	$1.307.069	$980.302	$980.302	$2.091.803	$2.091.803	$2.091.803	$2.091.803	$2.091.803	$2.091.803	$2.091.803	$0	$0	
				$ E																					
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 466.1)	$57.195.882	18,74%	20,49%	% P	0,07%	0,10%	0,10%	0,12%	0,15%	0,15%	0,11%	0,11%	0,10%	0,07%	0,07%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	100%
	$90.749.203	29,74%	$ 62.518.384,76	$ P	$227.036	$302.703	$302.703	$378.377	$454.053	$454.053	$340.538	$340.538	$302.703	$227.036	$227.036	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	$1.414.127	
				$ E																					
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Items: 500.1)	$27.423	0,01%	0,01%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90%
	$47.795	0,02%	$ 16.140,59	$ P	$1.899	$2.532	$2.532	$3.165	$3.799	$3.799	$2.849	$2.849	$2.532	$1.899	$1.899	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E																					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)	$92.829.396	30,42%	8,63%	% P	0,41%	0,54%	0,54%	0,68%	0,81%	0,81%	0,61%	0,61%	0,54%	0,41%	0,41%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	80%
	$104.235.571	34,15%	$ 26.347.886,96	$ P	$1.239.417	$1.652.556	$1.652.556	$2.065.695	$2.478.834	$2.478.834	$1.859.125	$1.859.125	$1.652.556	$1.239.417	$1.239.417	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	$1.289.151	
				$ E																					
				% E																					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)	$1.689.546	0,55%	0,82%	% P	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	70%
	$7.227.438	2,37%	$ 2.496.212,77	$ P	$58.860	$78.479	$78.479	$98.099	$117.719	$117.719	$88.289	$88.289	$78.479	$58.860	$58.860	$115.474	$115.474	$115.474	$115.474	$115.474	$115.474	$115.474	$115.474	$115.474	
				$ E																					
OBRAS VARIAS (Items: 800.1; 800.2)	$160.793	0,05%	0,19%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60%
	$687.322	0,23%	$ 582.352,12	$ P	$3.843	$5.125	$5.125	$6.406	$7.687	$7.687	$5.765	$5.765	$5.125	$3.843	$3.843	$3.391	$6.830	$6.830	$6.830	$6.830	$6.830	$6.830	$6.830	$6.830	
				$ E																					
				% E																					
TRANSPORTES (Items: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)	$40.442.040	13,25%	2,51%	% P	0,07%	0,09%	0,09%	0,12%	0,14%	0,14%	0,10%	0,10%	0,09%	0,07%	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	50%
	$20.135.228	6,60%	$ 7.649.760,22	$ P	$211.078	$281.438	$281.438	$351.797	$422.157	$422.157	$316.618	$316.618	$281.438	$211.078	$211.078	$104.998	$104.998	$104.998	$104.998	$104.998	$104.998	$104.998	$104.998	$104.998	
				$ E																					
				% E																					
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40%
	$0	0,00%	$ -	$ P																				$0	
				$ E																					
				% E																					0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 305.189.938,91	100,00%	48,09%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 344.570.723,20**	112,90%	$ 146.769.388,24																						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO BARRAS	PROGRAMADO $ Valor	EJECUTADO $ Valor
PROGRAMACION INICIAL			
REPROGRAMACIÓN 1			
REPROGRAMACIÓN 2			
REPROGRAMACIÓN 3			
REPROGRAMACIÓN 4			
REPROGRAMACIÓN 5			
REPROGRAMACIÓN 6			
REPROGRAMACIÓN 7			
REPROGRAMACIÓN 8			
REPROGRAMACIÓN 9			
REPROGRAMACIÓN 10			
REPROGRAMACIÓN 11			

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,95%	1,27%	1,27%	1,58%	1,90%	1,90%	1,43%	1,43%	1,27%	0,95%	0,95%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,96%	0,96%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.899.407	$3.865.876	$3.865.876	$4.832.345	$5.798.814	$5.798.814	$4.349.111	$4.349.111	$3.865.876	$2.899.407	$2.899.407	$5.467.784	$5.461.223	$5.461.223	$5.461.223	$5.461.223	$5.461.223	$2.930.577	$2.930.577	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		86.81%	87.96%	88.95%	90.42%	92.32%	94.22%	95.65%	97.08%	98.35%	99.30%	100.25%	102.04%	103.83%	105.61%	107.40%	109.19%	110.98%	111.94%	112.90%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$263.421.932	$267.286.908	$271.152.784	$275.985.129	$281.783.944	$287.582.758	$291.931.869	$296.280.979	$300.146.856	$303.046.263	$305.946.670	$311.403.454	$316.864.677	$322.325.900	$327.787.123	$333.248.346	$338.709.570	$341.640.148	$344.570.723	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	46,09%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	$146.769.388	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$41.440.096 / $45.484.163	$ 40.022.600	87,99%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.080.000 / $1.080.000	$	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.524.575 / $1.714.976	$ 819.011	47,76%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.281.000 / $1.281.000	$ 1.268.678	99,04%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$243.390 / $243.390	$ 241.049	99,04%
ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $3.764.766	$ 3.242.214	86,12%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$0 / $715.305	$ 616.021	86,12%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$7.772.765 / $7.772.765	$ 3.584.730	46,12%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$340.000 / $340.000	$ 1.985	0,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$53.681.825	$ 49.796.288	79,81%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$62.396.364		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$358.871.764**	$ 196.565.676	48,30%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$406.967.087**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 680.3P, 680.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Ítems No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los Ítem No previstos 662.2P, 8P incluidos con el Acta de Modificación N°10.

Aprueba Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI
Representante legal o apoderado del Contratista SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrícula Profesional No.: 091037-0734114 CND

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor CONSORCIO ECOVISIÓN 188
Matrícula Profesional No.:: N/A

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MAI- IN-1-ITS-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	25 (Día)	8 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACÁ

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 53

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución ej.: 0000, y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

PAGA

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCTORES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

N° CONTRATO 970 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 25-Jun-21 **FECHA DE TERMINACION** 31-ago-22

Valor Inicial Contrato Obra	$	159.871.744.330,00
Valor Adicional No. 1	$	29.637.221.600,00
Valor Adicional No. 2	$	170.019.665.000,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor total	$	359.527.887.330,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	2.565.791.972,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	2.565.791.972,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2.565.791.972,00

Anz %:	35%	
V %:	0%	

INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISION 188

OBJETO INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

N° CONTRATO 962 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 15-Jun-21 **FECHA DE TERMINACION** 31-ago-23

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	24.944.814.104,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor total	$	24.944.814.104,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ 25/FEB/2022 _____

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCION	MITIGACION	CORRECCION	COMPENSACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
DADA1.3-03	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	Cumplimiento requerimientos legales	Proyectos Escuelas Verdes en cumplimiento a la Resolución 6720 del INVIAS, se desarrollara en una escuela por Ruta objeto del mejoramiento vial. Se incluye el desarrollo del Programa INVIAS: Ruta Escuela de la Adaptación, dirigido a las escuelas del corredor vial para la sensibilización, educación y comunicación sobre el cambio climático			x			1	Global	$ 280.000.000,00	$ 280.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000.000,00	$ -	$ -
PGA-2.1-04	GESTIÓN RECURSO HÍDRICO	Proyecto de manejo de aguas superficiales industriales	Los monitoreos ambientales establecidos por la autoridad ambiental competente por permisos de ocupación de cauce	x					1	Global	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -
PRSE-4.2-12	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	Proyecto de recuperación de Áreas Afectadas.	Compensaciones requerida por la ANLA y/o ANLA por permisos de aprovechamiento forestal, levantamiento de veda y ocupación de cauce					X	44440	arbol	$ 26.097,00	$ 1.159.791.971,89		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.159.791.971,89		$ -
PRSE-4.2-12		Huella de carbono	Compra de bonos de huella de carbono					X	12000	Bono de carbono	$ 10.500,00			$ 126.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 126.000.000,00
											SUBTOTAL	$ 2.439.791.971,89	$ 0,00	$ 126.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.439.791.971,89	$ 0,00	$ 126.000.000,00

	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -
	0,00	$ -	$ -		0,00%	$ -	$ -	$ -
	0,00	$ -	$ -	$ -	19,00%	$ -	$ -	$ -
	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL	$ 0,00	$ -	$ -	$ 0,00				

	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)
	0,00	$ -
	0,00	$ -
	0,00	$ -
	0,00	$ -

	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)
	0,00	$ 280.000.000,00
	0,00	$ 1.000.000.000,00
	0,19	$ 1.159.791.971,89
	0,00	$ 126.000.000,00

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
N/A	"Plan de implementación del Programa de escuelas verde aprobado por la Interventoria y avalado por el INVIAS Informe de implementación Facturas de compra" En el periodo no se ha ejecutado
N/A	Actas administrativas de la Corporacion Factura de compra y soporte de pago. En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicio los tramites
N/A	Actas administrativas de la Corporacion APUS Aprobados por la interventoria y avalados por el INVIAS Informes de cumplimiento aprobada por la Corporacion Informes de siembra Paz y salvo de la corporacion Se estima precio de una hectárea de reforestación a partir de la Resolución 0622 del 2021 Corpoboyacá En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicio los tramites
N/A	Compra de bonos de carbono de hasta 12000 toneladas. No se ha ejecutado en el periodo

VALOR REEMBOLSO VIA SUBASTA	$ -
VALOR BIENES VIA SUBASTA	$ -
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ -

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RAMON VILLASTIGUI
Representante Legal o Apoderado
Contratista SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matricula No. : 09102704134 CND

Firma:
Nombre: MAURICIO GOMEZ CACEDO
Representante Legal o Apoderado
Interventoria: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. :

Vo. Bo. Firma:
Nombre : BERNARDO ANDRES MUÑOZ GARCIA
Profesional Ambiental
Contratista de Obra: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matricula No. : 19239-279875 CAU

Vo. Bo. Firma:
Nombre : MAURICIO LORDEROS SUAMA - ANGELA DANIELA DIAZ RICO
Profesional Ambiental
Interventoria: CONSORCIO ECOVISION 188
Matricula No. : 7624210118 VLL - 25239-329373 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	51	FECHA	21 AGOSTO 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	973 DE 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Boyacá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	962 DE 2021

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	8	AGOSTO	2022									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Refrigerios e Hidratación	Und	1000	$6.000	$ 6.000.000	X		$ 6.178.500			2,5%			300,79	$ 2.787.125	$ 3.391.375	
	Alquiler de sillas	Und	1000	$1.500	$ 1.500.000	X		$ 1.544.625		$ -	2,5%	$ -		0,00	$ -	$ 1.544.625	
	Alquiler de mesas	Und	250	$7.000	$ 1.750.000	X		$ 1.802.063		$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 1.802.063	
	Transporte para sillas y mesas ida y vuelta	Und	301	$4.000	$ 1.204.000	X		$ 1.239.819		$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 1.239.819	
	Alquiler de sonido incluye transporte	Und	90	$1.050.000	$ 94.500.000	X		$ 97.311.375	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,50	$ 1.574.000	$ 95.737.375	
	Alquiler de video Beam	Und	100	$154.000	$ 15.400.000	X		$ 15.858.150		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 15.858.150	
	Volantes tamaño 21,5*13,5 cm	Und	1000	$170	$ 170.000	X		$ 170.000		$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ 170.000	
	Pasacalles	Und	57	$176.000	$ 10.032.000	X		$ 10.330.452		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.330.452	
	Folletos Informativos tamaño 28*42 cm	Und	2000	$1.372	$ 2.744.000	X		$ 2.825.634		$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 2.825.634	
	Cuñas Radiales 30 seg	Und	8000	$ 8.000	$ 64.000.000	X		$ 65.904.000		$ -	2,5%	$ -	$ -	1303.95	$ 8.292.393	$ 57.611.607	
	Cartillas	Und	1000	$10.274	$ 10.274.000	X		$ 10.579.652		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.579.652	
	Perifoneo	Hora	1400	$35.000	$ 49.000.000	X		$ 50.457.750		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 50.457.750	
PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria y comunidad en el desarrollo de Talleres de sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, almuerzo)	Und	1000	$ 10.000	$ 10.000.000	X		$ 10.297.500			2,5%			368,00	$ 2.755.080	$ 7.542.420	
	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria Servicio transporte buseta 22 pasajeros	Und	99	$ 2.500.000	$ 247.500.000	X		$ 254.863.125		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 254.863.125	
	Talleres Pedagógicos Seguridad Vial (Entrega de chalecos reflectivos y paletas de señalización)	Und	40	$ 35.700	$ 1.428.000	X		$ 1.470.483		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.470.483	
	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit escolares temáticos)	Und	300	$ 25.100	$ 7.530.000	X		$ 7.754.018		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7.754.018	
	Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit ambientales, puntos ecológicos)	Und	40	$ 249.900	$ 9.996.000	X		$ 10.293.381		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.293.381	
PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS- OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Obras con participación Comunitaria	Global	1	$ 592.797.471	$ 592.797.471	X		$ 610.433.196		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 610.433.196	
	Ejecución Proyectos Productivos	Global	1	$ 82.170.922	$ 82.170.922	X		$ 84.615.507		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 84.615.507	
GERENCIA DE REGIONES	Línea Turística - Caminatas Ecológicas Pet Friendly (Kit - Gorras, Camisetas y Pañoletas)	Und	101	$ 30.600	$ 3.090.600	X		$ 3.182.545		$ -	2,5%	$ -	$ -	43,79	$ 1.340.000	$ 1.842.545	
	Línea Turística - Gastrotour INVIAS (Valla publicitaria)	Und	6	$ 20.000	$ 120.000	X		$ 123.570		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 123.570	
	Línea Deportiva (Kit -Uniformes medias y petos)	Und	100	$ 75.000	$ 7.500.000	X		$ 7.723.125	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	70,90	$ 5.317.447	$ 2.405.678	
	Línea Deportiva (Kit -Mallas, balones, pitos, tarjetas)	Und	20	$ 401.500	$ 8.030.000	X		$ 8.268.893		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 8.268.893	
	Línea Deportiva (medallas)	Und	40	$ 4.400	$ 176.000	X		$ 181.236	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	35,00	$ 171.500	$ 9.736	
	Línea Deportiva (Trofeos)	Und	4	$ 150.000	$ 600.000	X		$ 617.850	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,89	$ 284.000	$ 333.850	
	Línea Deportiva - Premio (Bono de $ 4.000.000) Categoría Fútbol y Ping Pong	Und	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000	X		$ 16.476.000	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,50	$ 4.000.000	$ 12.476.000	
	Línea Deportiva - (1 mesas de Ping Pong, 2 raquetas y 1 cajas de pelotas de Ping Pong)	Und	3	$ 1.660.500	$ 4.981.500	X		$ 5.129.700		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 5.129.700	
	Línea Deportiva - A la obra en Bici (1bicicletas y kit de protección)	Und	40	$ 730.000	$ 29.200.000	X		$ 30.068.700		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 30.068.700	
	Línea Deportiva - A la obra en Bici (Camisetas Jersey con reflectivos y casco)	Und	100	$ 145.000	$ 14.500.000	X		$ 14.931.375		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 14.931.375	
	Del Aula a la Obra (1 Casco y 1 chalecos reflectivo)	Und	50	$ 19.000	$ 950.000	X		$ 978.263		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 978.263	
GERENCIA DE REGIONES	Línea Social - Manos a la obra (1 cascos, 1 bota dielectrica,1 guante baqueta, y 1 gafa)	und	70	$ 69.646	$ 4.875.220	X		$ 5.020.258		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 5.020.258	
	Placas conmemorativas para Línea Deportiva y Social (diámetro de 17 cm)	Und	12	$ 77.000	$ 924.000	X		$ 951.489		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 951.489	
	Línea Social - Talleres de Embellecimiento y Muralismo- Kit de Pintura (1 Cuñete de pintura de 5 galones y 1 brocha 4")	Und	10	$ 249.500	$ 2.495.000	X		$ 2.569.226		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.569.226	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	8	AGOSTO 2022									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Franklin Valero - UMV-	Global	1	$ 27.479.811	$ 27.479.811	x		$ 28.297.335,38	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 28.297.335		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Franklin Valero - TDO	Global	1	$ 2.320.000	$ 2.320.000	x		$ 2.389.020	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.389.020		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UMV	Global	1	$ 45.990.778	$ 45.990.778	x		$ 47.359.004	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 47.359.004		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - TDO	Global	1	$ 2.320.000	$ 2.320.000	x		$ 2.389.020	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.389.020		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 198A-D-TU-MCTB Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UME	Global	1	$ 10.440.000	$ 10.440.000	x		$ 10.750.590	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 10.750.590		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Omar Martinez - UMV-	Global	1	$ 83.416.968	$ 83.416.968	X		$ 85.898.623	0		2,5%	$	$	1	$ 85.898.623		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Omar Martinez- TDO	Global	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.677.350		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Laura Carolina Valero - UMV-	Global	1	$ 101.160.560	$ 101.160.560	X		$ 104.170.087	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 104.170.087		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB Laura Carolina Valero - TDO	Global	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	0		2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.677.350		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - UMV	Global	1	$ 97.876.224	$ 97.876.224	X		$ 100.788.042	0		2,5%	$	$	1	$ 100.788.042		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - TDO	Global	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	0		2,5%	$	$	1	$ 2.677.350		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediа	Reconocimiento de factores -FCS/ ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB Nancy Blanco Tellez - ARRTO	Global	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	0		2,5%	$	$	1	$ 2.677.350		
PGS - 6.9 Gestiòn Socioprediał	Provision Soco-predial UMV,UME,TDO,ARRTO,Htdo	Global	1	$ 609.318.121	$ 608.788.540	X		$ 609.318.121								$ 608.788.540,00	
														1			

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 1.932.430.878	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 421.746.009
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 2.354.176.887	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	17,91%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: ANDRÉS RAMON VELASTEGUI
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 0910370734114 CND

Firma
Nombre: WALTER LOPEZ MORALES
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 176435

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: CECILIA CORTÉS RODRÍGUEZ
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 129612

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	18	8	25
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	BOYACÁ
3. AÑO	**2025** MES 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009	TRAMO:	(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)
6. CONTRATO DE OBRA No:	973 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.		
8. CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	NIT	900.815.676-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN- 188	NIT	901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	962 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	99 MESES	12. FECHA DE INICIO:	2021/06/25	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	99 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	2029/08/31
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	3.165.433.082	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	3.165.433.082

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	358.871.764.334,00
21. VR. ANTICIPO:	$	2.185.885.000,00
22. VR. ADICIÓN No:	$	28.823.323.054,00
23. VR. ADICIÓN No:		
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	28.823.323.054,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	387.695.087.388,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE		$ 1.394.000	$ -
	27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICOY TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN		$ 2.788.000	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS		$ 1.045.000	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ 348.500	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		$ 1.074.000	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO		$ 805.500	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ 268.500	$ -
ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES		$ 754.000	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ 377.000	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		$ 377.000	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS		$ 320.000	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ 217.000	$ -
ACTIIVIDAD EJECUTADA INFORME GENERA DEL SECTOR RURAL	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM		$ 1.600.000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL		$ 960.000	
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS		$ 2.460.000	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO)		$ 1.340.000	$ -
	39. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DELIGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO		$ 2.680.000	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO		$ 670.000	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		$ 860.000	$ -
	41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMMLV		$ 430.000	$ -
	42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV		$ 640.000	$ -
	43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV		$ 320.000	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ 346.500	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		$ 231.000	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA		$ 346.500	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		$ 231.000	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 115.500	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ 115.000	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ 462.000	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 231.000	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		$ 231.000	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		$ 321.000	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 321.000	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 107.000	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		$ 749.000	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ 642.000	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SS (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ 150.000	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ 300.000	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		$ 150.000	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 150.000	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ 640.000	$ -
DIAGNÓSTICO PREDIAL	PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KILOMETRO		$ 4.650.000	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 18 / 8 / 25 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	BOYACÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009	TRAMO:	(PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)
6. CONTRATO DE OBRA No:	973 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.		
8. CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA	NIT	900.815.676-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN- 188	NIT	901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	962 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	99 MESES	12. FECHA DE INICIO:	2021/06/25	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	99 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	2029/08/31
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	3.165.433.082	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	3.165.433.082

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)		**$ 0,00**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. (2,5% ADMISTRACION)	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

76. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
77. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
79. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	3.162.984.266
81. GESTIÓN PREDIAL	$	-
82. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
83. OTROS	$	-
84. IVA	$	-
85. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	3.162.984.266
86. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**2.448.816**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI		NOMBRES Y APELLIDOS	MAURICIO GÓMEZ CAICEDO	
C.C. C.E. X	NUMERO	542.657	C.C. X C.E.	NUMERO	79.150.916
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	091037-0734114 CND	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	N/A
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	6

FECHA 10 9 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 **CONTRATISTA:** SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
4.628.712.871	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1.204.974.344	$ 659.136.054
	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02		54	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 3.423.738.527	$ 68.375.062
28.823.323.054	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	54	NACIÓN	ADICIÓN No 1	$ 4.508.775.371	$ -
			20	PROPIOS	ADICIÓN No 1	$ 24.314.547.683	$ -
8.015.328.690	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 7.176.168.955	$ -
	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 839.159.735	$ -
15.128.000.000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 15.128.000.000	$ -
19.272.000.000	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	ADICIÓN No 2	$ 19.272.000.000	$ -
727.511.116	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	20	PROPIOS	VIGENCIA EXPIRADA 2021 RP 425821	$ 659.136.054	$ -
	(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02		20	PROPIOS		$ 68.375.062	
37.029.702.970	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 35.498.884.651	$ -
	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1.530.818.319	$ -
46.287.128.713	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 21.373.605.815	$ -
	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02		16	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 23.000.000.000	$ -
	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1.913.522.898	$ -

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: ago-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

13.500.000.000	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 4.352.941.176	$ -
	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 9.147.058.824	$ -
40.416.554.455	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.	16	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 2.234.130.474	$ -
	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02		11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 38.182.423.981	$ 8.122.917.190
			TOTAL			$ 112.897.067.585	$ 8.122.917.190

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 406.967.087.388,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 4.628.712.871	$ 358.871.764.334	110840 25/11/2021	X		
1	Ajustes	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 4.628.712.871	$ 358.871.764.334	127279 29/12/2021	X		
2	Parcial	jul-21	$ 37.925.826	$ 166.290	$ 38.092.116	$ -	$ 38.092.116			$ 4.590.620.755	$ 358.833.672.218	110840 25/11/2021	X		
3	Parcial	ago-21	$ 333.579.546	$ 20.673.810	$ 354.253.356	$ -	$ 354.253.356		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 4.236.367.399	$ 358.479.418.862	118914 18/12/2021	X		
2	Ajustes	jul-21	$ 520.861	$ 2.284	$ 523.145	$ -	$ 523.145		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 4.235.844.254	$ 358.478.895.717	127279 01/03/2022	X		
4	Parcial	sep-21	$ 713.711.394	$ 13.799.722	$ 727.511.116	$ -	$ 727.511.116		(No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(12/12/2022)	$ -	$ 357.751.384.601	15560 24/02/2023	X		
3	Ajustes	ago-21	$ 2.763.334	$ 12.116	$ 2.775.450	$ -	$ 2.775.450		(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 4.233.068.804	$ 357.748.609.151	127277 07/03/2022	X		
5	Parcial	oct-21	$ 246.010.585	$ 1.078.662	$ 247.089.247	$ -	$ 247.089.247			$ 3.985.979.557	$ 357.501.519.904	18976 01/03/2022	X		
4	Ajustes	sep-21	$ 16.117.547	$ 70.669	$ 16.188.216	$ -	$ 16.188.216			$ 3.969.791.341	$ 357.485.331.688	127281 24/02/2022	X		
1	Anticipo	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.185.885.000	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 1.783.906.341	$ 357.485.331.688	109706 24/11/2021	X		
6	Parcial	nov-21	$ 968.880.492	$ 4.248.168	$ 973.128.660	$ 486.378.007	$ 486.750.653	$ 1.699.506.993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 1.297.155.688	$ 356.512.203.028	125885 28/12/2021	X		
5	Ajustes	oct-21	$ 4.420.226	$ 19.381	$ 4.439.607	$ -	$ 4.439.607	$ 1.699.506.993	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 1.292.716.081	$ 356.507.763.421	19054 01/03/2022	X		
6	Ajustes Provisional	nov-21	$ 22.581.721	$ 99.012	$ 22.680.733	$ -	$ 22.680.733	$ 1.699.506.993		$ 1.270.035.348	$ 356.485.082.688	20957 07/03/2022	X		
7	Parcial	dic-21	$ 2.061.141.235	$ 166.324.583	$ 2.227.465.818	$ 1.699.476.993	$ 527.988.825	$ 30.000		$ 742.046.523	$ 354.257.616.870	125896 28/12/2023	X		
7	Ajustes Provisional	dic-21	$ 13.303.929	$ 58.333	$ 13.362.262	$ -	$ 13.362.262	$ 30.000		$ 728.684.261	$ 354.244.254.608	21007 07/03/2022	X		
7	Ajustes	dic-21	$ 1.602.624	$ 7.027	$ 1.609.651	$ -	$ 1.609.651	$ 30.000	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha: (05/07/2022)	$ 15.126.390.349	$ 383.065.968.011	141611 12/02/2023	X		
8	Parcial	ene-22	$ 901.929.125	$ 3.954.612	$ 905.883.737	$ 30.000	$ 905.853.737	$ -	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha: (01/02/2022)	$ 7.109.474.953	$ 382.160.084.274	41446 02/05/2022	X		
9	Parcial	feb-22	$ 1.144.639.720	$ 5.018.805	$ 1.149.658.525		$ 1.149.658.525	$ -		$ 5.959.816.428	$ 381.010.425.749	51700 24/05/2022	X		
10	Parcial	mar-22	$ 496.373.075	$ 2.176.405	$ 498.549.480		$ 498.549.480	$ -		$ 5.461.266.948	$ 380.511.876.269	52535 25/5/2022	X		
2	Anticipo	abr-22						$ 4.508.775.371	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 24.314.547.683	$ 380.511.876.269	12834810/02/2022	X		
11	Parcial	abr-22	$ 1.419.520.822	$ 6.224.053	$ 1.425.744.875	$ 298.099.373	$ 1.127.645.502	$ 4.210.675.998	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	$ 4.333.621.446	$ 379.086.131.394	66910 29/06/2022	X		
8	Ajustes Provisional	ene-22	$ 58.964.704	$ 258.538	$ 59.223.242		$ 59.223.242	$ 4.210.675.998	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 28.588.945.887	$ 379.026.908.152	131000 03/12/2022	X		
9	Ajustes Provisional	feb-22	$ 88.985.072	$ 390.165	$ 89.375.237		$ 89.375.237	$ 4.210.675.998		$ 28.499.570.650	$ 378.937.532.915	131001 05/12/2022	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: ago-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

12	Parcial	may-22	$ 1.860.787.403	$ 19.797.107	$ 1.880.584.510	$ 390.765.355	$ 1.489.819.155	$ 3.819.910.643	(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022)	$ 2.843.802.291	$ 377.056.948.405	89194 24/08/2022	X		
13	Parcial	jun-22	$ 437.853.878	$ 2.224.230	$ 440.078.108	$ 92.014.750	$ 348.063.358	$ 3.727.895.893		$ 23.966.484.325	$ 376.616.870.297	94992 08/09/2022	X		
10	Ajustes Provisional	mar-22	$ 42.702.732	$ 187.235	$ 42.889.967		$ 42.889.967	$ 3.727.895.893		$ 23.923.594.358	$ 376.573.980.330	131004 03/12/2022	X		
11	Ajustes Provisional	abr-22	$ 113.376.511	$ 497.112	$ 113.873.623		$ 113.873.623	$ 3.727.895.893	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 23.809.720.735	$ 376.460.106.707	1063421 14/12/2022	X		
14	Parcial	jul-22	$ 1.296.021.421	$ 5.682.555	$ 1.301.703.976	$ 272.164.498	$ 1.029.539.478	$ 3.455.731.395		$ 22.780.181.257	$ 394.430.402.731	103063 29/09/2022	X		
15	Parcial	ago-22	$ 2.212.804.286	$ 18.926.677	$ 2.231.730.963	$ 110.640.214	$ 2.121.090.749	$ 3.345.091.181		$ 20.659.090.508	$ 392.198.671.768	109838 11/10/2022	X		
16	Parcial	sep-22	$ 2.273.657.335	$ 9.969.113	$ 2.283.626.448	$ 26.147.059	$ 2.257.479.389	$ 3.318.944.122		$ 18.401.611.119	$ 389.915.045.320	115403 29/10/2022	X		
17	Parcial	oct-22	$ 2.320.920.585	$ 21.063.962	$ 2.341.984.547	$ 26.690.587	$ 2.315.293.960	$ 3.292.253.535	(No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(25/05/2021)	$ 727.511.116	$ 387.573.060.773	130996 05/12/2022	X		
									(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 16.087.490.304					
8	Ajustes Definitiva	ene-22	$ 61.550.880	$ 269.877	$ 61.820.757		$ 61.820.757			$ 16.025.669.547	$ 387.511.240.016	142114 27/12/2022	X		
9	Ajustes Definitiva	feb-22	$ 93.085.743	$ 408.145	$ 93.493.888		$ 93.493.888			$ 15.932.175.659	$ 387.417.746.128	142120 27/12/2022	X		
10	Ajustes Definitiva	mar-22	$ 50.152.833	$ 219.901	$ 50.372.734		$ 50.372.734			$ 15.881.802.925	$ 387.367.373.394	142125 27/12/2022	X		
11	Ajustes Definitiva	abr-22	$ 210.628.155	$ 923.523	$ 211.551.678		$ 211.551.678			$ 15.670.251.247	$ 387.155.821.716	142129 27/12/2022	X		
12	Ajustes Definitiva	may-22	$ 418.036.113	$ 1.832.928	$ 419.869.041		$ 419.869.041		(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 15.250.382.206	$ 386.735.952.675	137218 29/12/2022	X		
13	Ajustes Definitiva	jun-22	$ 99.327.588	$ 435.513	$ 99.763.101		$ 99.763.101			$ 15.150.619.105	$ 386.636.189.574			X	
14	Ajustes Definitiva	jul-22	$ 411.799.277	$ 1.805.581	$ 413.604.858		$ 413.604.858			$ 14.737.014.247	$ 386.222.584.716	137464 29/12/2022	X		
15	Ajustes Definitiva	ago-22	$ 689.270.316	$ 3.022.185	$ 692.292.501		$ 692.292.501			$ 14.044.721.746	$ 385.530.292.215	137452 29/12/2022	X		
3	Anticipo							$ 18.558.374.709	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 8.044.721.746	$ 385.530.292.215	112144 08/11/2022	X		
									(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	$ 2.568.015.640					
18	Parcial	nov-22	$ 3.078.412.249	$ 13.497.654	$ 3.091.909.903	$ 35.401.741	$ 3.056.508.162	$ 21.815.226.503		$ 4.988.213.584	$ 382.438.382.312	137395 29/12/2022	X		
16	Ajustes Definitiva	sep-22	$ 519.313.870	$ 2.276.992	$ 521.590.862		$ 521.590.862		(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 4.466.622.722	$ 381.916.791.450	137429 29/12/2022	X		
17	Ajustes Definitiva	oct-22	$ 412.986.755	$ 1.810.788	$ 414.797.543		$ 414.797.543			$ 4.051.825.179	$ 381.501.993.907	137425 27/12/2022	X		
18	Ajustes Provisional	nov-22	$ 943.049.453	$ 4.134.909	$ 947.184.362		$ 947.184.362			$ 3.104.640.817	$ 380.554.809.545	137420 29/12/2022	X		
19	Parcial	dic-22	$ 7.276.375.355	$ 41.402.139	$ 7.317.777.494	$ 416.936.308	$ 6.900.841.186	$ 21.398.290.195	(No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/12/2021)	$ 148.598.479	$ 373.237.032.051	142142 27/12/2022	X		
									(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(01/02/2022) (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(01/02/2022)	$ -					
									(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	$ 1.467.019.083					
19	Ajustes Provisional	dic-22	$ 2.507.310.935	$ 10.993.594	$ 2.518.304.529		$ 2.518.304.529		(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022)	$ 1.191.589	$ 370.718.727.522	145010 19/02/2023	X		
									(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 18.219.522.965					
20	Parcial	ene-23	$ 2.177.679.024	$ 9.548.285	$ 2.187.227.309	$ 124.781.008	$ 2.062.446.301	$ 21.273.509.187	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 16.157.076.664	$ 368.531.500.213	21590 09/03/2023	X		
	Anticipo 4							$ 5.756.172.974	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 10.400.903.690	$ 368.531.500.213	143093 01/02/2023	X		
21	Parcial	feb-23	$ 4.055.527.522	$ 17.781.928	$ 4.073.309.450	$ 297.270.167	$ 3.776.039.283	$ 26.732.411.994	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 6.624.864.407	$ 364.458.190.763	28010 23/03/2023	X		
22	Parcial	mar-23	$ 3.804.577.283	$ 21.984.897	$ 3.826.562.180	$ 302.080.472	$ 3.524.481.708	$ 26.430.331.522	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 3.100.382.699	$ 360.631.628.583	44790 29/05/2023	X		
20	Ajustes Definitiva N°18, 19 y 20	ene-23	$ 380.013.289	$ 1.666.212	$ 381.679.501		$ 381.679.501		(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 2.718.703.198	$ 360.249.949.082	49886 04/06/2023	X		
21	Ajustes Definitiva	feb-23	$ 755.951.273	$ 3.314.556	$ 759.265.829		$ 759.265.829		(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ 1.959.437.369	$ 359.490.683.253	56695 23/06/2023	X		
23	Parcial	abr-23	$ 2.626.394.957	$ 11.515.732	$ 2.637.910.689	$ 210.111.597	$ 2.427.799.092	$ 26.220.219.925	(No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(28/09/2022)	$ -	$ 356.852.772.564	61051 24/06/2023	X		
									(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 36.561.341.247					

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: ago-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

22	Ajustes Definitiva	mar-23	$ 867.870.830	$ 3.805.280	$ 871.676.110		$ 871.676.110		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 35.689.665.137	$ 355.981.096.454	56720 23/06/2023	X		
24	Parcial	may-23	$ 2.716.129.555	$ 34.458.914	$ 2.750.588.469	$ 207.571.459	$ 2.543.017.010	$ 26.012.648.466	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023) (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 33.146.648.127	$ 353.230.507.985	62510 17/07/2023	X		
23	Ajustes Definitiva	abr-23	$ 680.973.214	$ 2.985.806	$ 683.959.020		$ 683.959.020		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 32.462.689.107	$ 352.546.548.965	66748 17/07/2023	X		
24	Ajustes Definitiva	may-23	$ 685.719.156	$ 3.006.615	$ 688.725.771		$ 688.725.771		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 31.773.963.336	$ 351.857.823.194	83210 19/10/2023	X		
25	Parcial	jun-23	$ 2.232.113.986	$ 10.925.155	$ 2.243.039.141	$ 178.078.559	$ 2.064.960.582	$ 25.834.569.907	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 29.709.002.754	$ 349.614.784.053	71891 27/07/2023	X		
26	Parcial	jul-23	$ 4.656.416.288	$ 25.281.151	$ 4.681.697.439	$ 363.390.848	$ 4.318.306.591	$ 25.471.179.059	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 25.390.696.163	$ 344.933.086.614	80679 27/08/2023	X		
27	Parcial	ago-23	$ 5.018.473.853	$ 23.051.728	$ 5.041.525.581	$ 379.828.499	$ 4.661.697.082	$ 25.091.350.560	(No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(05/07/2022) (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ - $ 20.730.190.670	$ 339.891.561.033	81660 21/09/2023	X		
25	Ajustes Definitiva	jun-23	$ 558.917.400	$ 2.450.638	$ 561.368.038		$ 561.368.038		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 20.168.822.632	$ 339.330.192.995	83212 19/10/2023	X		
26	Ajustes Definitiva	jul-23	$ 1.334.067.751	$ 5.849.374	$ 1.339.917.125		$ 1.339.917.125		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 18.828.905.507	$ 337.990.275.870	83215 20/10/2023	X		
28	Parcial	sep-23	$ 3.101.029.091	$ 13.596.820	$ 3.114.625.911	$ 248.082.327	$ 2.866.543.584	$ 24.843.268.233	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 15.962.361.923	$ 334.875.649.959	83217 23/10/2023	X		
27	Ajustes Definitiva	ago-23	$ 1.134.849.399	$ 4.975.878	$ 1.139.825.277		$ 1.139.825.277		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 14.822.536.646	$ 333.735.824.682	84872 17/11/2023	X		
28	Ajustes Definitiva	sep-23	$ 738.499.072	$ 3.238.034	$ 741.737.106		$ 741.737.106		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 14.080.799.540	$ 332.994.087.576	84876 17/11/2023	X		
29	Parcial	oct-23	$ 6.601.304.839	$ 27.442.626	$ 6.628.747.465	$ 500.707.570	$ 6.128.039.895	$ 24.342.560.663	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 7.952.759.645	$ 326.365.340.111	84868 17/11/2023	X		
29	Ajustes Definitiva	oct-23	$ 1.908.849.388	$ 8.369.570	$ 1.917.218.958		$ 1.917.218.958		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 6.035.540.687	$ 324.448.121.153	86935 06/12/2023	X		
30	Parcial	nov-23	$ 2.718.804.964	$ 10.929.715	$ 2.729.734.679	$ 249.274.196	$ 2.480.460.483	$ 24.093.286.467	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 3.555.080.204	$ 321.718.386.474	87005 07/12/2023	X		
30	Ajustes Provisional	nov-23	$ 740.800.643	$ 3.248.126	$ 744.048.769		$ 744.048.769		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 2.811.031.435	$ 320.974.337.705	87924 16/12/2023	X		
31	Parcial	dic-23	$ 2.208.892.420	$ 9.685.144	$ 2.218.577.564	$ 220.889.242	$ 1.997.688.322	$ 23.872.397.225	(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ 813.343.113	$ 318.755.760.141	87866 17/12/2023	X		
31	Ajustes Provisional	dic-23	$ 809.792.484	$ 3.550.629	$ 813.343.113		$ 813.343.113		(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-02 Fecha:(23/02/2023)	$ -	$ 317.942.417.028	87869 17/12/2023	X		
30	Ajustes Definitiva	nov-23	$ 13.878.201	$ 60.851	$ 13.939.052		$ 13.939.052		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	$ 46.273.189.661	$ 317.928.477.976	1609 26/03/2024	X		
31	Ajustes Definitiva	dic-23	$ 10.489.475	$ 45.992	$ 10.535.467		$ 10.535.467		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024)	$ 46.262.654.194	$ 317.917.942.509	1850 03/04/2024	X		
32	Parcial	ene-24	$ 7.762.154.189	$ 33.567.223	$ 7.795.721.412	$ 765.568.238	$ 7.030.153.174	$ 23.106.828.987	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Fecha:(08/03/2024) (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	$ 39.232.501.020	$ 310.122.221.097	1602 03/04/2024	X		
33	Parcial	feb-24	$ 7.707.685.770	$ 252.779.276	$ 7.960.465.046	$ 624.795.446	$ 7.335.669.600	$ 22.482.033.541	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024)	$ 31.896.831.420	$ 302.161.756.051	1838 06/04/2024	X		
32	Ajustes Definitiva	ene-24	$ 2.329.760.110	$ 10.215.102	$ 2.339.975.212		$ 2.339.975.212			$ 29.556.856.208	$ 299.821.780.839	2053 07/04/2024	X		
34	Parcial	mar-24	$ 4.951.782.058	$ 47.258.760	$ 4.999.040.818	$ 476.493.588	$ 4.522.547.230	$ 22.005.539.953		$ 25.034.308.978	$ 294.822.740.021	3038 24/04/2024	X		
33	Ajustes Definitiva	feb-24	$ 1.794.963.200	$ 7.870.223	$ 1.802.833.423		$ 1.802.833.423			$ 23.231.475.555	$ 293.019.906.598	3890 16/05/2024	X		
34	Ajustes Definitiva	mar-24	$ 1.306.182.169	$ 5.727.106	$ 1.311.909.275		$ 1.311.909.275		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(08/03/2024). (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 21.919.566.280	$ 291.707.997.323	4248 22/05/2024	X		
35	Parcial	abr-24	$ 5.795.416.060	$ 47.824.081	$ 5.843.240.141	$ 567.466.416	$ 5.275.773.725	$ 21.438.073.537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 16.643.792.555	$ 285.864.757.182	5222 05/06/2024	X		
36	Parcial	may-24	$ 5.888.441.545	$ 64.089.957	$ 5.952.531.502	$ 469.448.507	$ 5.483.082.995	$ 20.968.625.030	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 11.160.709.560	$ 279.912.225.680	5937 19/06/2024	X		
37	Parcial	jun-24	$ 6.824.588.311	$ 106.591.268	$ 6.931.179.579	$ 641.154.026	$ 6.290.025.553	$ 20.327.471.004	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 4.870.684.007	$ 272.981.046.101	6467 27/06/2024	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: ago-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

35	Ajustes Definitiva	abr-24	$ 1.659.772.168	$ 7.277.463	$ 1.667.049.631		$ 1.667.049.631		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 3.203.634.376	$ 271.313.996.470	12011 14/01/2025	X		
38	Parcial	jul-24	$ 684.172.341	$ 2.999.833	$ 687.172.174	$ 68.417.234	$ 618.754.940	$ 20.259.053.770	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 2.584.879.436	$ 270.626.824.296	9544 10/09/2024	X		
39	Parcial	ago-24	$ 890.707.845	$ 74.745.661	$ 965.453.506	$ 334.855.884	$ 630.597.622	$ 19.924.197.886	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 1.954.281.814	$ 269.661.370.790	11641 30/10/2024	X		
40	Parcial	sep-24	$ 687.811.177	$ 3.015.787	$ 690.826.964	$ 68.781.118	$ 622.045.846	$ 19.855.416.768	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 1.332.235.968	$ 268.970.543.826	13943 23/01/2025	X		
41	Parcial	oct-24	$ 410.059.762	$ 35.954.216	$ 446.013.978	$ 22.604.343	$ 423.409.635	$ 19.832.812.425	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 908.826.333	$ 268.524.529.848	16437 22/11/2024	X		
42	Parcial	nov-24	$ 600.262.326	$ 3.282.887	$ 603.545.213	$ 57.805.888	$ 545.739.325	$ 19.775.006.537	(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024) (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ 801.043.898 $ 13.062.043.110	$ 267.920.984.635	2254 11/04/2025	X		
36	Ajustes Definitiva	may-24	$ 1.444.784.292	$ 6.334.823	$ 1.451.119.115		$ 1.451.119.115		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024) (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ 437.956.890 $ 11.974.011.003	$ 266.469.865.520	19588 17/12/2024	X		
37	Ajustes Definitiva	jun-24	$ 2.497.246.489	$ 10.949.465	$ 2.508.195.954		$ 2.508.195.954		(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(10/12/2024)	$ 9.465.815.049	$ 263.961.669.566	19594 17/12/2024	X		
38	Ajustes Definitiva	jul-24	$ 141.376.036	$ 619.880	$ 141.995.916		$ 141.995.916		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 295.960.974	$ 263.819.673.650	19595 17/12/2024	X		
39	Ajustes Definitiva	ago-24	$ 46.604.099	$ 204.341	$ 46.808.440		$ 46.808.440		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 249.152.534	$ 263.772.865.210	19598 17/12/2024	X		
40	Ajustes Definitiva	sep-24	$ 138.829.823	$ 608.715	$ 139.438.538		$ 139.438.538		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 109.713.996	$ 263.633.426.672	19649 17/12/2024	X		
41	Ajustes Definitiva	oct-24	$ 41.667.954	$ 182.698	$ 41.850.652		$ 41.850.652		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ 67.863.344	$ 263.591.576.020	19474 17/12/2024	X		
42	Ajustes Provisional	nov-24	$ 67.567.088	$ 296.256	$ 67.863.344		$ 67.863.344		(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.16 Fecha:(08/03/2024)	$ -	$ 263.523.712.676	19484 17/12/2024	X		
43	Parcial	dic-24	$ 7.978.644.186	$ 69.139.547	$ 8.047.783.733	$ 830.907.330	$ 7.216.876.403	$ 18.944.099.207	(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401021-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024) (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ 2.248.938.646	$ 255.475.928.943	19539 17/12/2024	X		
43	Ajustes Provisional	dic-24	$ 2.239.120.962	$ 9.817.684	$ 2.248.938.646		$ 2.248.938.646		(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-2401029-02 Recurso No.11 Fecha:(30/12/2024)	$ -	$ 253.226.990.297	3007 02/05/2025	X		
42	Ajustes Definitiva	nov-24	$ 404.089	$ 1.772	$ 405.861		$ 405.861		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	$ 40.416.148.594	$ 253.226.584.436	939 07/03/2025	X		
44	Parcial	ene-25	$ 5.200.415.635	$ 23.002.449	$ 5.223.418.084	$ 3.003.936.634	$ 2.219.481.450	$ 15.940.162.573	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025)	$ 38.196.667.144	$ 248.003.166.352	923 06/03/2025	X		
45	Parcial	feb-25	$ 4.922.000.754	$ 21.581.080	$ 4.943.581.834	$ 2.525.478.587	$ 2.418.103.247	$ 13.414.683.986	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 Recurso No.16 Fecha:(20/02/2025) (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 35.778.563.897	$ 243.059.584.518	1872 03/04/2025	X		
43	Ajustes Definitiva	dic-24	-$ 1.259.790	-$ 5.523	-$ 1.265.313		-$ 1.265.313		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 35.779.829.210	$ 243.060.849.831	4496 29/05/2025	X		
44	Ajustes Definitiva	ene-25	$ 829.196.445	$ 3.635.707	$ 832.832.152		$ 832.832.152		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 34.946.997.058	$ 242.228.017.679	4496 29/05/2025	X		
45	Ajustes Definitiva	feb-25	$ 1.523.192.610	$ 6.678.614	$ 1.529.871.224		$ 1.529.871.224		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 33.417.125.834	$ 240.698.146.455	3295 07/05/2025	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: ago-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"" MÓDULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

46	Parcial	mar-25	$ 4.931.829.029	$ 45.771.865	$ 4.977.600.894	$ 265.055.701	$ 4.712.545.193	$ 13.149.628.285	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 28.704.580.641	$ 235.720.545.561	3256 07/05/2025	X		
46	Ajustes Definitiva	mar-25	$ 1.880.155.548	$ 8.243.759	$ 1.888.399.307		$ 1.888.399.307		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 26.816.181.334	$ 233.832.146.254	6906 14/07/2025	X		
47	Parcial	abr-25	$ 4.018.402.074	$ 72.004.128	$ 4.090.406.202	$ 200.769.618	$ 3.889.636.584	$ 12.948.858.667	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 22.926.544.750	$ 229.741.740.052	4422 28/05/2025	X		
47	Ajustes Definitiva	abr-25	$ 1.393.858.328	$ 6.111.533	$ 1.399.969.861		$ 1.399.969.861		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 21.526.574.889	$ 228.341.770.191	7117 16/07/2025	X		
48	Parcial	may-25	$ 3.660.802.913	$ 16.051.213	$ 3.676.854.126	$ 206.469.284	$ 3.470.384.842	$ 12.742.389.383	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 18.056.190.047	$ 224.664.916.065	6376 04/07/2025	X		
49	Parcial	jun-25	$ 3.460.473.993	$ 63.794.761	$ 3.524.268.754	$ 178.887.536	$ 3.345.381.218	$ 12.563.501.847	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 14.710.808.829	$ 221.140.647.311	7251 18/07/2025	X		
48	Ajustes Definitiva	may-25	$ 1.135.341.663	$ 4.978.037	$ 1.140.319.700		$ 1.140.319.700		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 13.570.489.129	$ 220.000.327.611	7257 18/07/2025	X		
49	Ajustes Definitiva	jun-25	$ 1.068.470.883	$ 4.684.834	$ 1.073.155.717		$ 1.073.155.717		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 12.497.333.412	$ 218.927.171.894	9173 28/08/2025		X	
50	Parcial	jul-25	$ 3.452.100.623	$ 28.685.510	$ 3.480.786.133	$ 193.960.545	$ 3.286.825.588	$ 12.369.541.302	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 9.210.507.824	$ 215.446.385.761	8986 26/08/2025		X	
50	Ajustes Definitiva	jul-25	$ 1.082.842.785	$ 4.747.849	$ 1.087.590.634		$ 1.087.590.634		(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 8.122.917.190	$ 214.358.795.127			X	
51	Parcial	ago-25	$ 3.940.108.063	$ 17.275.858	$ 3.957.383.921	$ 227.344.235	$ 3.730.039.686	$ 12.142.197.067	(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso No.11 Fecha:(20/02/2025)	$ 4.392.877.504	$ 210.401.411.206			X	
TOTALES			**$ 194.788.346.473**	**$ 1.777.329.709**	**$ 196.565.676.182**	**$ 18.867.010.987**	**$ 177.698.665.195**	**$ 12.142.197.067**		**$ 4.392.877.504**	**$ 210.401.411.206**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 146.769.388.236	$ 643.527.317	**$ 147.412.915.553**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTES	$ 40.022.599.705	$ 175.483.707	**$ 40.198.083.412**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.268.677.959	$ 241.048.812	**$ 1.509.726.771**
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS	$ 3.242.214.072	$ 616.020.674	**$ 3.858.234.746**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 3.067.921.769	$ 95.062.497	**$ 3.162.984.266**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 415.876.308	$ 5.869.701	**$ 421.746.009**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 1.668.424	$ 317.001	**$ 1.985.425**
VALOR TOTAL	$ 194.788.346.473	$ 1.777.329.709	**$ 196.565.676.182**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se realiza ajuste en informe financiero por glosa en acta parcial de obra N°42 correspondiente al mes de noviembre-24

Firma
Nombre: Ing Hernan Estrella
Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matrícula No.: R2024056299

Firma
Nombre: Ing. Julio César Sánchez
Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO ECOVISIÓN-188
NIT: 901.481.141-1

055-2-2861-2025

Puerto Boyacá, 11 de agosto 2025

Ingeniero
FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Director Territorial Boyacá (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Tunja

Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

Asunto: Entrega Acta parcial de obra N°51- Agosto de 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Interventoría hace entrega del acta parcial de obra N°50 correspondiente al mes de julio de 2025 del desarrollo del contrato de obra N°973 de 2021 con base a los lineamientos del manual de Interventoría actual.

A la presente se anexan en total de quince (15) documentos, solicitamos de manera comedida la aprobación para continuar con los trámites correspondientes.

Atentamente,

JULIO CÉSAR SÁNCHEZ C.
Director de interventoría
Consorcio Ecovisión 188

Anexo: 15 archivos
Copia: Apoyo a la supervisión
Elaboró: LMMM

Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Actividad Económica 4210 - Tarifa 7.6 x 1000
Resolución DIAN Nº 18764089334756 del 24/02/2025
Habilita Numeración Factura Electrónica Prefijo E21 del 456 al 500 Vencimiento 12 meses

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
NIT: 9008156761

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:	8002158072
DIRECCION:	Calle 25G # 73B-90
CIUDAD:	BOGOTA - BOGOTÁ, D.C. - 11001-11001
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	
CORREO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;
TELÉFONO:	6013811700

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No	E21-479
FECHA DE EMISIÓN:	19/09/2025 15:56:44
EXPEDICIÓN/AUTORIZACIÓN:	19/09/2025 16:04:39
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/10/2025
CONTACTO:	CORREO

CODIGO	CONCEPTOS		VR.TOTAL
	.		
SEC0001A	Acta de obra No. 51 Periodo: Agosto 2025 (Utilidad)		90,925,571
SEC0002A	Acta de obra No. 51 Periodo: Agosto 2025 (Administración No Gravado)		3,849,182,492
Acta de obra No. 51 Periodo: Agosto 2025		3,940,108,063	
Valor Total Básico		3,940,108,063	
Costo Directo		3,030,852,356	
A.I.U (30%)		909,255,707	
Utilidad (3%)		90,925,571	
IVA de la Factura		17,275,858	
IVA 19% sobre 3% de Utilidad		17,275,858	
(-) Menos amortización Anticipo (5,77%)		227,344,235	
Girar por registro 86825 Rubro C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 Recurso 11		3,730,039,686	

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE
BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
MODULO 3

SUBTOTAL	DESCUENTO	BASE GRAVABLE	TIPO IMPUESTO	TASA	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
3,940,108,063		90,925,571	IVA VENTAS Construcción 19%	19.000%	17,275,858	3,957,383,921
		3,849,182,492	IVA VENTAS - Excluido	0.000%	0	

TOTAL FACTURA 3,957,383,921

VALOR A PAGAR: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE

Condiciones de pago:
Crédito - Cuota No. 1 vence el 19/10/2025 por 3,957,383,921

ANTICIPOS

Id Pago	Valor Anticipo Amortizado	Fecha Pago	Observación	Neto a pagar descontado anticipo
ANTICIPO	227,344,235	21/11/2022	ANTICIPO	3,730,039,686

OBSERVACIONES: #$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

Esta Factura Electrónica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un título valor segun ley 1231 de 17-07-2008

CUFE: 82a63b6770df4602fc11c981b55a3cb855c890b25d0beb22bacb9095bc8b577223fa2395f297ad298ff532f6e3f3d2ae

SELLO DIGITAL: n7vwKCB7rSkAFzSnWzcUd3grWtjMAnpSa1G14DcJaC0C1RIngqs6q1N9qNk39JcaqYDV6Tcwu9DridtlvuUbMduVvehnXF3qi47EpTV21TrzvDMXGA+DZht2FFq2M
ohxkp7CP23RFhePsW4bq0dcGOosHZ3eQzRN+CXgLqLH80z6aTfB0y/TDGNS807IHJ7Z8G3yHI0u0i363ISojoSRRIUf1ulD4hF3rgMndwM0vFNqqu3riiNuRqqQtMT+
o1//vwBD6LPt4/zR8cJ76sGXeFKFmfB8WC9M7cgOwbde13eT0uEC/rmtPcpuEYHcJkRDV9X5Jdh0z1xxetMUWGaafQ==

Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores
Actividad Económica 4210 - Tarifa 7.6 x 1000
Resolución DIAN Nº 18764089334756 del 24/02/2025
Habilita Numeración Factura Electrónica Prefijo E21 del 456 al 500 Vencimiento 12 meses

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
NIT: 9008156761

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:	8002158072
DIRECCION:	Calle 25G # 73B-90
CIUDAD:	BOGOTA - BOGOTÁ, D.C. - 11001-11001
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA:	
CORREO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;
TELÉFONO:	6013811700

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No	E21-479
FECHA DE EMISIÓN:	19/09/2025 15:56:44
EXPEDICIÓN/AUTORIZACIÓN:	19/09/2025 16:04:39
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/10/2025
CONTACTO:	CORREO

Esta Factura Electrónica de Venta, se asimila en todos sus efectos a un título valor segun ley 1231 de 17-07-2008

CONSORCIO ECOVISIÓN-188
NIT: 901.481.141-1

EL SUSCRITO INTERVENTOR - CONTRATO No: 962 de 2021

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

HACE CONSTAR:

Que la empresa SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA – SUDINCO identificada con NIT: 900.815.676-1, ha venido cumpliendo con el pago actualizado de los aportes a Salud, Pensiones, ARP y Parafiscales (Art. 50 Ley 789 de 2002 y Art. 23 Ley 1150 de 2007).

Lo anterior teniendo en cuenta la declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales en la que manifiesta encontrarse a paz y salvo por concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, suscrita el 10 de septiembre de 2025 por el Representante Legal ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI.

Bogotá, 11 de septiembre de 2025

MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal
Consorcio ECOVISIÓN-188
Interventor.
