23/12/2025.	Martes, Soleado. Se realiza aplicación de pintura a dos manos en la zona de bombas de la EBAR. finalizan actividades de instalación de tubería de línea de impulsión adicionalmente, se suspenden actividades de construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias en bendición. Residente obra — Residente interventoría
24/12/2025	Miercoles, Nublado lluvioso. Se realiza cerramiento de todos los frentes de obra, dejando su respectiva señalización por temporada de fin de año se suspende actividades de obra hasta el 05 de enero del año 2026. Residente obra — Residente interventoría
25/12/2025.	Jueves, festivo día no trabajado. Residente obra — Residente interventoría
26/12/2025.	Viernes, Soleado. Se realizan labores de planificación y labores administrativas de cierre de años Residente obra — Residente interventoría

27/12/2025	Sabado, soleado lluviaso. Continuan labores de planificacion y labores administrativas de cierre de año. Presidente obra. Residente interventoria.
28/12/2025	Domingo, dia no laborado. Presidente obra. Residente interventoría.
29/12/2025	Lunes, Nublado soleado. Continuan labores de planificación y labores administrativas de cierre de año. Presidente obra. Residente interventoría.
30/12/2025	Martes, Soleado. continuan labores de planificacion y labores. administrativas de cierr de año. Presidente obra. Residente interventoría.
31/12/2025	Miercoles, soleado. finalizan labores de planificación y labores administrativos de cierr de año. Presidente obra. Residente interventora.

6 ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Las actividades ejecutadas pertenecientes al Plan integral de salud ocupacional, ambiental y seguridad industrial se encuentran especificadas y detalladas en el informe anexo referente a este componente.

6.1 ANEXOS:

6.1.1 INFORME PARCIAL No. 21 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA Y SALUD OCUPACIONAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ANEXOS 6.1



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME PARCIAL No. 21 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA Y SALUD OCUPACIONAL



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME PARCIAL 21. DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

OBJETIVOS 5

OBJETIVO GENERAL 5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5

1 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 6

1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL QUE SOLUCIONAR CON EL PROYECTO 7

2 EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 9

2.1 FICHA MA-G1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES 9

2.2 FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 14

2.3 FICHA MA-G3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 15

2.4 FICHA MA-G4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). 17

2.5 FICHA MA-PM-G6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA 19

2.6 FICHA MA-S1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO 19

2.7 MA-S2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO 23

2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL 26

2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO 26

2.10 FICHA MA-PM-S5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 32

3 AVANCE PRESUPUESTO PAGA 36

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Relación de personal de obra 23
Tabla 2. Relación de planillas de seguridad social personal de obra 27
Tabla 3. Relación de dotación entregada 27
Tabla 4. Relación de equipos utilizados 32

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado actual de pozos de inspección sistema de alcantarillado sanitario Bendición 7
Ilustración 2. Estado actual de vertimiento de aguas negras en ciudadela Bendición 8
Ilustración 3. Puntos ecológicos instalados 9
Ilustración 4. Recolección de residuos solidos 10
Ilustración 5. Instalación de baños portátiles en obra 12
Ilustración 6.Mantenimiento a unidades sanitarias 13
Ilustración 7. Cerramiento perimetral en campamento de obra y EBAR 14
Ilustración 8. Adecuación de espacios para disposición de materiales y maquinaria en campamento de obra 16
Ilustración 9. Relleno en material seleccionado de excavación 17
Ilustración 10. Registro fotográfico de charlas diarias y capacitaciones 20
Ilustración 11. Instalaciones de campamento de obra 26
Ilustración 12. Entrega de dotación a personal vinculado 28
Ilustración 13. Charlas diarias 30
Ilustración 14. Hidratación personal de obra 30
Ilustración 15. Inspecciones preoperacionales 33

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato de obra pública 041 de 2023, presentamos el informe ambiental y SST correspondiente al período comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. En este informe se detallan los avances y logros alcanzados en la implementación del Plan de Manejo Ambiental y las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

El enfoque principal de este informe se centra en la ejecución del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. Durante este período, hemos trabajado diligentemente para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y las normativas aplicables en estas áreas críticas.

En cuanto al Plan de Manejo Ambiental, hemos implementado medidas para mitigar los posibles impactos negativos en el entorno natural durante la ejecución de las actividades de obra. Estas medidas incluyen el control adecuado de residuos, la preservación de áreas verdes y la promoción de prácticas sostenibles. Nuestro compromiso es preservar la biodiversidad y los recursos naturales, minimizando al máximo los efectos negativos en el entorno en el que trabajamos.

La seguridad y la salud ocupacional de nuestro equipo de trabajo son aspectos fundamentales. Por lo tanto, hemos implementado medidas de seguridad, capacitaciones, inspecciones periódicas y promovido una cultura de prevención y cuidado. Nuestro objetivo es asegurar un entorno laboral seguro y saludable para todos los involucrados en el proyecto, fomentando así el bienestar y la protección de nuestro equipo.

En este informe, compartiremos los avances y resultados obtenidos durante el periodo mencionado. Destacaremos los logros alcanzados y los desafíos encontrados. Además, presentaremos las medidas implementadas para asegurar la efectividad de nuestros planes de gestión.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar de manera efectiva las actividades correspondientes al contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. Esto implica garantizar la seguridad del personal de obra mediante acciones de seguridad y capacitación adecuada. Además, se aplicará el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para prevenir, evitar y controlar los impactos negativos en el medio físico, biótico y socioeconómico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Implementar medidas efectivas de protección ambiental, como la adecuada gestión de residuos, la prevención de la contaminación del suelo, agua, y la conservación de la biodiversidad local.
- ✓ Fomentar la sostenibilidad en cada uno de los procesos de obra optimizando el uso de los recursos naturales empleando fuentes y estrategias renovables con el fin de reducir todos los aspectos contaminantes.
- ✓ Implementar el programa de seguridad y salud ocupacional cumpliendo estándares de regulación vigente para crear un ambiente laboral seguro y saludable.
- ✓ Capacitar al personal técnico en procedimientos de seguridad y uso adecuado de equipos de protección personal, minimizando los riesgos de accidentes y lesiones.
- ✓ Crear estrategias para garantizar el control del estado de los equipos y maquinaria utilizada en las labores de obra.

1 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

La Ciudadela "La Bendición" actualmente cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario parcialmente terminado, el sistema que se caracteriza por funcionar a gravedad. Drena desde el norte (en límite con el núcleo urbano 2) hacía el sur, además en sentido occidente- oriente. El punto más bajo de la red se ubica entre las manzanas 107 y 113, a la altura de las coordenadas Norte 1.076.811,970 y Este 851.417,776 origen Magna Sirgas 3º Este, da cobertura a algunas de las manzanas que conforman la ciudadela, sin embargo, el sistema construido no presta servicio debido a que las redes no cuentan con descole o descarga final que permita el flujo continuo de agua residual en las tuberías, por tal motivo, cualquier flujo que ingresa al sistema queda estancado y se acumula dentro de las redes.

No se cuenta con un sistema de alcantarillado en funcionamiento y dando cobertura a la totalidad de las viviendas existentes en la Ciudadela la Bendición. Por el contrario, el sistema actual está compuesto por solo 94 tramos de tuberías en diámetros de 8, 10, y 12 pulgadas respectivamente. Que en conjunto suman 5.907,3 metros lineales; los cuales, al hacer comparación con el número de vías existentes, permiten determinar de manera indirecta el porcentaje de cobertura el cual solo asciende al 27.60% dado que la totalidad de vías en afirmado asciende a 21.400 aproximadamente.

No se cuenta con estructuras de descarga a donde se puedan entregar las aguas residuales generadas; su última estructura en sentido de flujo del agua corresponde a un pozo de inspección con profundidad media de 5.74 metros, razón por la cual parte del sistema se encuentra colmatado y sobrecargado.

Durante los recorridos se identificó la presencia de agua residual dentro del sistema construido, encontrando tramos completamente inundados y pozos colmatados, lo que demuestra que efectivamente existen usuarios conectados a las redes entregando agua residual al sistema. La consultoría realizó encuestas a la población de la ciudadela entre otros, con el objetivo de determinar la cantidad de conexiones existentes al alcantarillado, sin embargo, la comunidad encuestada negó la existencia de conexiones, manifestado en el total de encuestas que no poseen conexión al alcantarillado. Se concluye, que la comunidad se niega a confirmar la existencia de conexiones a la red de alcantarillado, debido a que: i) son conocedores de que el sistema existente actualmente no tiene funcionalidad, y a pesar de ello realizaron conexiones, y ii) debido a que las conexiones realizadas corresponden a conexiones artesanales no autorizadas, lo que genera temor en la comunidad, asociando esta conexión no autorizada con posibles sanciones.

Ilustración 1. Estado actual de pozos de inspección sistema de alcantarillado sanitario Bendición



1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL QUE SOLUCIONAR CON EL PROYECTO

La problemática ambiental que se presenta actualmente en la Ciudadela La Bendición del Municipio de Yopal se debe a la carencia de un sistema de tratamiento de agua residual doméstica, en este momento las aguas residuales domésticas generadas son parcialmente recolectadas en pozos sépticos (aproximadamente 2.600) propios de las viviendas, el restante de las aguas residuales domésticas generadas son direccionadas hacia una laguna natural que limita con la urbanización mencionada. Su conducción se realiza mediante cunetas a lo largo de las vías de la ciudadela, lo cual constituye un factor ambiental que demanda su atención con prontitud al representar un foco de contaminación, olores ofensivos y proliferación de vectores.

Ilustración 2. Estado actual de vertimiento de aguas negras en ciudadela Bendición



2 EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

A partir de los impactos ambientales identificados se definieron las medidas de manejo a implementar durante la ejecución del proyecto, las cuales están enfocadas hacia la prevención, corrección, mitigación, control y compensación, de los posibles impactos que se puedan generar, estas medidas de manejo se presentan en fichas las cuales se relacionan a continuación:

2.1 FICHA MA-G1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.

Para el periodo de reporte de acuerdo con lo evidenciando en las acciones de esta ficha, se cuenta con dos (02) puntos ecológicos; uno en el campamento de obra y otro en la zona de la EBAR. Se manejan estrategias de almacenamiento temporal en bolsas de blanco, negro y verde con el fin de establecer en cada frente durante el día tenga donde disponer los residuos contaminados como (bolsas de cemento, estopas, guantes, entre otros residuos contaminados), y en la bolsa negra los residuos reciclables (botellas, bolsas entre otros).

En cuanto a los residuos ordinarios, la obra solo genera residuos como bolsas producto de la hidratación, la recolección y transporte final de estos desechos está a cargo de la empresa SERPET JR.

Ilustración 3. Puntos ecológicos instalados



Punto ubicado en campamento de obra



Punto ubicado en la EBAR

Por otra parte, se tiene un sitio de acopio de almacenamiento de residuos, el cual está ubicado dentro del campamento de obra. Estos materiales se almacenarán hasta alcanzar un volumen mínimo para posteriormente ser transportado por la empresa SERPET JR quien los conducirá a un sitio de

disposición final. Durante el periodo consolidado, se llevó a cabo la recolección, almacenamiento y disposición de un total de 78 kilogramos de incinerables y 135 kilogramos de materiales ordinarios. Estos residuos fueron gestionados y puestos a disposición de la empresa SERPET JR, asegurando un manejo adecuado y responsable de los mismos. Este proceso incluyó varias etapas, desde la recolección inicial hasta el almacenamiento seguro y la disposición final, cumpliendo con todas las normativas y estándares ambientales vigentes.

Ilustración 4. Recolección de residuos solidos





Ver anexo 1. Manifiesto de control y certificado de recolección de residuos solidos

Dada la situación actual, donde las actividades de construcción física continúan, se tiene el uso continuo de las baterías sanitarias portátiles. Esta medida es fundamental para garantizar que los trabajadores del sitio tengan acceso adecuado a servicios higiénicos. La implementación de baños portátiles es una solución práctica y eficiente que permite satisfacer las necesidades básicas del personal, asegurando así el bienestar y la comodidad de todos los involucrados en el proyecto de construcción. Además, esta acción demuestra el compromiso de la empresa con la salud y la seguridad de sus empleados, proporcionando las condiciones necesarias para mantener un ambiente de trabajo digno y funcional.

Para lograr este objetivo, se ha habilitado una unidad sanitaria en la zona de la EBAR, brindando servicio a quienes trabajan en esa área. Esta instalación sanitaria ha sido implementada con el

propósito de ofrecer soluciones higiénicas y seguras, asegurando que todos los trabajadores cuenten con los recursos necesarios para mantener su bienestar mientras se encuentran laborando.

Ilustración 5. Instalación de baños portátiles en obra



Además, se han planificado regularmente actividades de limpieza y mantenimiento para las unidades sanitarias portátiles, con el fin de garantizar que estas instalaciones se mantengan en condiciones óptimas de higiene y adecuación para su uso. Estas acciones preventivas son cruciales para asegurar que todos los usuarios dispongan de un entorno limpio y seguro, minimizando así cualquier riesgo sanitario. Con un enfoque constante en la limpieza y el mantenimiento, se busca proporcionar una experiencia satisfactoria y saludable para todos los que utilicen estas instalaciones.

Para este periodo, se ha recolectado un total de **3 litros** de residuos sanitarios.

Ilustración 6.Mantenimiento a unidades sanitarias



Ver anexo 2. Manifiesto de control y certificado mantenimientos de unidades sanitarias portátiles

2.2 FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE.

Uno de los mitigantes utilizados para el manejo de material particulado es el uso de cerramiento perimetral teniendo en cuenta el movimiento de equipos para el cargue y descargue de material en el campamento y en la zona de la EBAR, se realizó esta actividad mediante malla electrosoldada y lona verde, esto con el fin de garantizar la disminución de material particulado y la reducción parcial del ruido, contribuyendo a las comunidades aledañas al proyecto.

En relación con la ficha mencionada, el contratista lleva a cabo inspecciones preoperacionales exhaustivas de la maquinaria, los vehículos y los equipos que son utilizados por el constructor durante la ejecución de las diversas actividades de obra. Estas inspecciones tienen como principal objetivo garantizar que dichos elementos se mantengan en condiciones óptimas para su uso, asegurando su correcto funcionamiento. Al hacer esto, se busca minimizar cualquier posible alteración en el desempeño de los equipos, evitando de manera proactiva la ocurrencia de actos que pudieran provocar contaminación ambiental, ya sea por fugas, emisiones indebidas o mal manejo de estos. Este proceso forma parte integral del compromiso del contratista con las buenas prácticas en la gestión de los recursos técnicos, promoviendo un desarrollo sostenible y responsable de las obras en curso.

Ilustración 7. Cerramiento perimetral en campamento de obra y EBAR










Ver anexo 3. Inspecciones preoperacionales

2.3 FICHA MA-G3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Actualmente, el contratista de obra tiene adecuado unos espacios para el almacenamiento del material utilizado en el desarrollo de las actividades del presente contrato, entre ellos se tiene una bodega para maquinaria, una bodega para almacenamiento de cemento, tres (03) tanques de almacenamiento de combustible. Estos están debidamente identificados con el tipo de combustible que contienen y su forma de apagado en caso de emergencia. Adicional se tiene una bodega para acopio de material en general con esto, el contratista garantiza el control del material entrante y saliente y a su vez, almacena de manera organizada el material de obra con el fin de no afectar su calidad antes de su respectivo uso.

Ilustración 8. Adecuación de espacios para disposición de materiales y maquinaria en campamento de obra







2.4 FICHA MA-G4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).

Durante el periodo consolidado en relación a esta ficha el contratista de obra maneja la alternativa de reincorporación del material de excavación en actividades que se ameriten como accesos, paisajismo entre otras actividades que no requieran contar con los parámetros exigidos por la norma, de acuerdo a ello no se dispondrá dicho material de excavación para este periodo; no obstante el contratista de obra inicio el trámite de gestor de RCD, con la finalidad de tener una opción amigable con el ambiente en dado caso que se llegase a requerir por lo volúmenes que saldrán del proyecto.

Ilustración 9. Relleno en material seleccionado de excavación

















Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare





2.5 FICHA MA-PM-G6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA

Para el cumplimiento de estas acciones enmarcadas en la ficha para este periodo consolidado se realizó algunas charlas donde relaciono algunos temas de importancia para la protección de la fauna de la zona, con la finalidad de concientizar y educar al personal acerca de la importancia de preservar y cuidar a nuestras especies faunísticas. Para este periodo se realizó el siguiente tema:

- ✓ Proteger la fauna – medios y procesos

Esta charla se encuentra consolidada en las capacitaciones y charlas al personal del proyecto ver ficha *Ma-S1 capacitación al personal del proyecto.*

2.6 FICHA MA-S1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO

Con relación al periodo consolidado correspondiente del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, se realizó la divulgación de charlas de seguridad, salud en el trabajo y ambiental al personal vinculado a la obra, donde se ha brindado información clara sobre cada uno de los temas abordados en las capacitaciones con el propósito de continuar creando concientización sobre la importancia del autocuidado y la conservación de los recursos naturales. Dentro de los temas relacionados por el contratista de obra y verificados en sitio por la interventoría se tiene:


Periodo diciembre 2025:

- ✓ Riesgos principales en zonas habitadas


- ✓ Derrumbes en excavaciones
- ✓ Uso adecuado de EPPS
- ✓ Manipulación segura en zonas estrechas
- ✓ Manejo de residuos
- ✓ Contaminación del ambiente y afectación de la fauna
- ✓ Protección en manos y ojos
- ✓ Control de derrames de lubricantes y aceites
- ✓ Contaminación visual y auditiva

Ilustración 10. Registro fotográfico de charlas diarias y capacitaciones



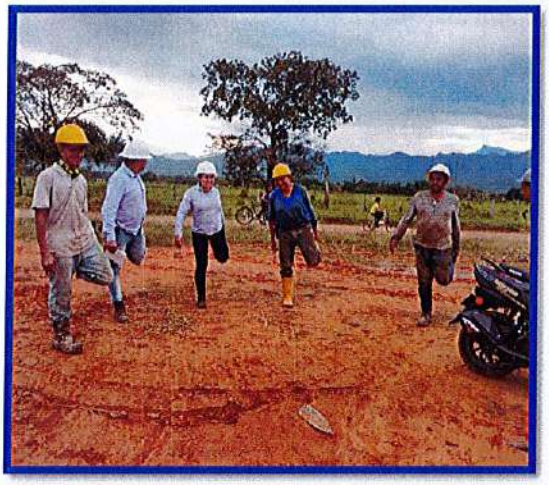



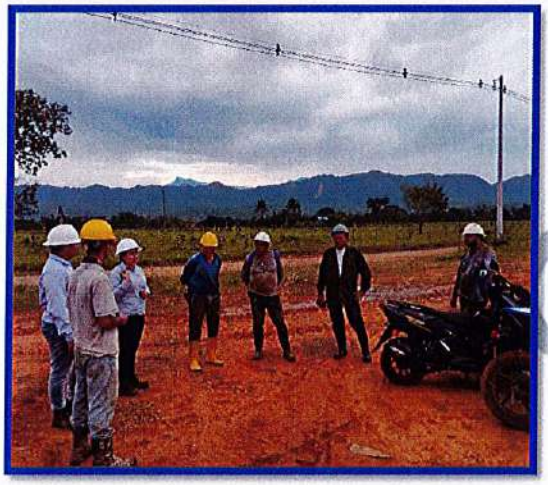














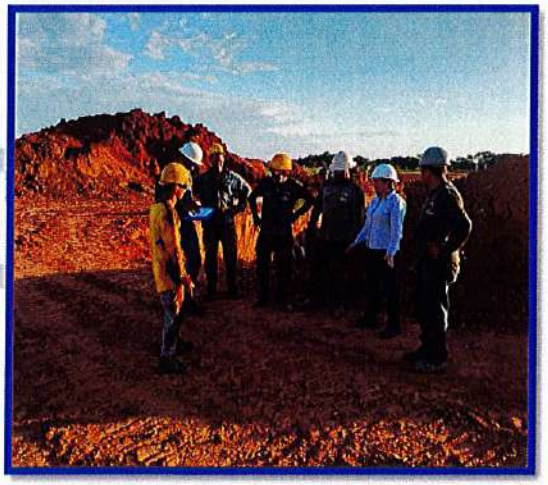

Ver anexo 4. Planilla de asistencia capacitaciones y charlas diarias anexo a la ficha 1.1 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/ SALUD EN EL TRABAJO.

2.7 MA-S2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO

Tabla 1. Relación de personal de obra

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	% DEDIC.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
1	86.039.937	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	OFICIAL DE OBRA	100%	15/01/2024		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO
2	88.215.115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	MAESTRO DE OBRA	100%	1/02/2024		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO
3	1.118.560.603	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	MAESTRO DE OBRA	100%	9/06/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
4	1.006.414.242	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	CONTROLADOR VIAL	100%	1/09/2025		CAPRESOCA	COLFONDOS	POSITIVA	ACTIVO
5	1.121.956.235	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	MAESTRO DE OBRA	100%	1/10/2025		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
6	74.181.863	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	GERENTE DE PROYECTO	50%	22/12/2023		SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	ACTIVO
7	9.600.701	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	MAESTRO DE OBRA	100%	1/04/2024		NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO
8	1.118.542.443	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	PROFESIONAL AMBIENTAL	100%	2/10/2025		NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONTRATO DE OBRA No. 041-2023
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	INFORME PARCIAL No. 21 DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
NIT. 901.767.095-1	**PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	% DEDIC.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
9	1.049.621.180	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	50%	13/02/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
10	1.118.548.824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	DIRECTOR DE OBRA	100%	19/03/2024		SANITAS	SKANDIA	POSITIVA	ACTIVO
11	9.532.276	HURTADO PINEDA ALVARO	OFICIAL DE OBRA	100%	5/03/2024		CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
12	46.364.728	HURTADO PINEDA YOLIMA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	100%	13/02/2024		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
13	9.430.088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	20%	13/02/2024		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
14	13.741.812	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	MAESTRO DE OBRA	100%	1/09/2025		NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	ACTIVO
15	7.227.214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20%	13/02/2024		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO
16	1.118.573.398	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	ASISTENTE SISO	100%	1/04/2024		NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
17	74.755.228	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	CONTROLADOR VIAL	100%	26/08/2024		SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	ACTIVO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONTRATO DE OBRA No. 041-2023
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	INFORME PARCIAL No. 21 DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
NIT. 901.767.095-1	**PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	% DEDIC.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
18	91.240.944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	100%	13/02/2024		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	ACTIVO
19	9.651.535	RIAÑO LUIS OCTAVIO	CONTROLADOR VIAL	100%	1/04/2024		NUEVA EPS	PENSIONADO	POSITIVA	ACTIVO
20	91.262.131	RIVERA JORGE REINALDO	RESIDENTE EBAR	100%	8/07/2025		NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	ACTIVO
21	74.814.415	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	CONTROLADOR VIAL	100%	1/09/2025		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
22	1.118.563.927	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANA	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	100%	7/01/2025		CAPRESOCA	PROTECCIÓN	POSITIVA	ACTIVO
23	1.015.417.280	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	RESIDENTE DE OBRA	100%	1/10/2024		SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	ACTIVO
24	1.116.545.333	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	INSPECTOR DE OBRA	100%	13/02/2024		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
25	47.435.477	TARACHE CECILIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	100%	14/03/2024		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	ACTIVO
26	1.136.883.799	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	100%	13/02/2024		SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	ACTIVO

2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL

De acuerdo con las acciones inmersas en la ficha, se relaciona que se tiene informada a las comunidades y autoridades locales sobre el proyecto a desarrollar, se tiene un sitio de atención e información el cual se encuentra anexo al informe mensual de obra denominado **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA.** Este documento muestra la guía a realizar para el todo el manejo social que involucre el proyecto, en consecuencia, se presentan informes parciales mes a mes con el fin de mostrar la ejecución al plan de gestión social, tales documentos son los **informes de gestión social.**

Ilustración 11. Instalaciones de campamento de obra



VER INFORME DE GESTIÓN SOCIAL EN EL ANEXO 7.1 DEL INFORME PARCIAL No. 21

2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores, prevenir accidentes laborales y establecer un entorno seguro en el lugar de trabajo, se llevan a cabo diversas actividades. Estas incluyen la capacitación del personal al momento de su ingreso, la entrega de la dotación correspondiente y charlas periódicas con el fin de concientizar sobre la prevención de accidentes

- ✓ **Afiliación a seguridad social**: se garantiza la protección a los trabajadores y a su familia en el cubrimiento económico, en caso de que sufra una eventualidad en términos de salud, entre otros.

Tabla 2. Relación de planillas de seguridad social personal de obra

MES DE DICIEMBRE DE 2025		
CLAVE PLANILLA	PENSIÓN	SALUD
9495673505	2025-12	2026-01
9495673260	2025-12	2026-01

✓ **Dotación**

A continuación, se relaciona el personal al cual se le realizo la entrega de dotación para el presente periodo:


Tabla 3. Relación de dotación entregada

No.	DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	TIPO DE DOTACIÓN
1	86.039.937	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	OFICIAL DE OBRA	REPOSICIÓN
2	88.215.115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	MAESTRO DE OBRA	REPOSICIÓN
3	1.006.414.242	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	CONTROLADOR VIAL	REPOSICIÓN
4	1.118.560.603	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	MAESTRO DE OBRA	REPOSICIÓN
5	1.121.956.235	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	MAESTRO DE OBRA	REPOSICIÓN
6	74.181.863	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	GERENTE DE PROYECTO	REPOSICIÓN
7	1.118.542.443	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	PROFESIONAL AMBIENTAL	REPOSICIÓN
8	9.600.701	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	MAESTRO DE OBRA	REPOSICIÓN
9	1.049.621.180	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	REPOSICIÓN
10	1.118.548.824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	DIRECTOR DE OBRA	REPOSICIÓN
11	9.532.276	HURTADO PINEDA ALVARO	OFICIAL DE OBRA	REPOSICIÓN
12	46.364.728	HURTADO PINEDA YOLIMA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	REPOSICIÓN
13	13741812	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	MAESTRO DE OBRA	REPOSICIÓN
14	9430088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	REPOSICIÓN
15	7227214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	REPOSICIÓN
16	1118573398	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	ASISTENTE SISO	REPOSICIÓN
17	74755228	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	CONTROLADOR VIAL	REPOSICIÓN
18	91240944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	REPOSICIÓN
19	9651535	RIVERA JORGE REINALDO	INGENIERO RESIDENTE EBAR	REPOSICIÓN
20	91262131	RIAÑO LUIS OCTAVIO	CONTROLADOR VIAL	REPOSICIÓN
21	74814415	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	CONTROLADOR VIAL	REPOSICIÓN
22	1118563927	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	REPOSICIÓN
23	1015417280	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	RESIDENTE DE OBRA	REPOSICIÓN

No.	DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	TIPO DE DOTACIÓN
24	1116545333	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	INSPECTOR DE OBRA	REPOSICIÓN
25	47435477	TARACHE CECILIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	REPOSICIÓN
26	1136883799	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	REPOSICIÓN

Ilustración 12. Entrega de dotación a personal vinculado



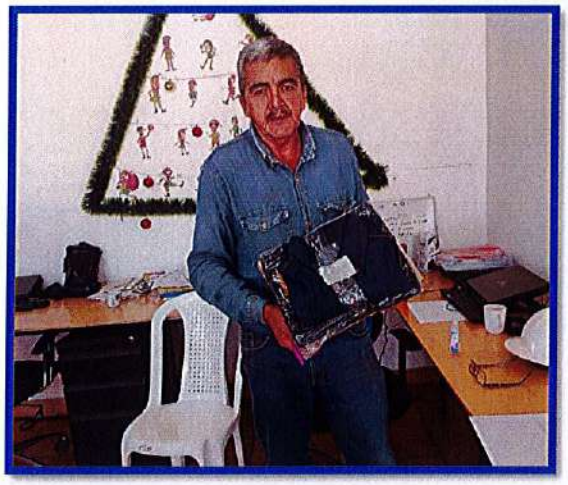







Anexo 5. Planilla de entrega de dotación

- ✓ **Charlas diarias**

De acuerdo con lo expuesto en la ficha en mención, el contratista de obra realiza inducción al personal del proyecto con el fin de dar pautas en cuanto a reglamento interno del trabajo, temas importantes para la realización de sus actividades y otros temas que hacen parte de la información necesaria que se debe dar al personal para que realicen sus tareas conforme lo estipulado. Como se relaciona en la *FICHA MA-S1 capacitación al personal del proyecto;* Capacitación ambiental al personal de obra; Como se pueden observar en la ficha en mención en el **anexo 4. Planilla de asistencia capacitaciones y charlas diarias**

Ilustración 13. Charlas diarias



Ver ilustración 09. Registro fotográfico de charlas diarias y capacitaciones

- ✓ **Hidratación**

Además, considerando las altas temperaturas en la zona del proyecto, se ha implementado la distribución de bolsas de agua al personal de obra. Esta medida tiene como objetivo principal mitigar la deshidratación de los obreros, asegurando su bienestar y salud mientras realizan sus tareas diarias. La provisión de agua es esencial para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, especialmente en condiciones climáticas adversas.

Ilustración 14. Hidratación personal de obra












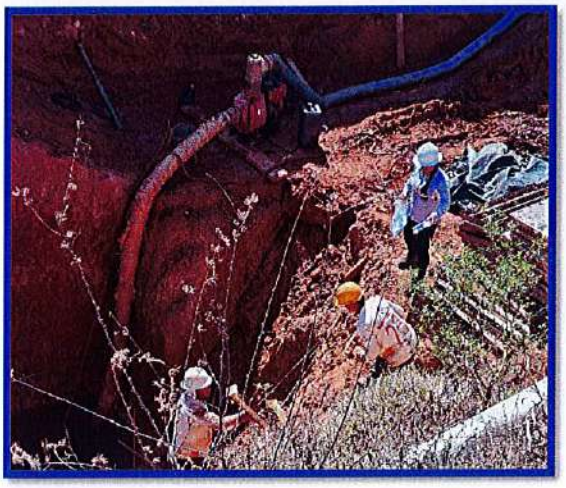



De igual manera, se realizan pruebas de laboratorio al agua suministrada para asegurarse de que cumple con los estándares óptimos para el consumo humano. Esta medida es fundamental para garantizar que el agua distribuida al personal de obra no solo prevenga la deshidratación, sino que también sea segura y saludable para su consumo. El control de la calidad del agua subraya el compromiso con el bienestar y la salud de todos los trabajadores involucrados en el proyecto.

Ver anexo 6. Informe de laboratorio agua suministrada para hidratación de personal de obra

2.10 FICHA MA-PM-S5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

A la fecha de este informe ya se ha requerido el uso de maquinaria la cual se relaciona en la tabla 3, dentro de las acciones que se deben tener en cuenta para el momento en que usemos las mismas se encuentra:

- ✓ Realizar inspecciones preoperacionales de toda la maquinaria anexa al proyecto. Cuya evidencia se puede ver reflejada en los anexos que componen el presente informe.
- ✓ Se verificará e inspeccionará la zona de trabajo antes del inicio de las tareas. Cuando se trabaje cerca de líneas eléctricas se guardarán las distancias mínimas.
- ✓ Se tendrá especial cuidado cuando se trabaje en zonas con altas pendientes y en zonas de alta pluviosidad, donde hay mayor presencia de riesgos.
- ✓ Los vehículos de obra tendrán certificados de emisiones de gases y SOAT vigentes.

Tabla 4. Relación de equipos utilizados

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Estación total (topografía)	1
Nivel automático (topografía)	1
Excavadora de oruga	5
Retroexcavadora	4
Grúa	1
Minicargador	1
Vibro compactador	1
Volqueta sencilla	6
Volquea Doble	8

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Camión turbo	1
Carro tanque	1

Ilustración 15. Inspecciones preoperacionales




CAT
CAT








SMP763







Ver en el anexo 3. Inspecciones preoperacionales de la *FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE.*

CONSORCIO BENDICIÓN 23

3 AVANCE PRESUPUESTO PAGA

PRESUPUESTO PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL												
ITEM	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CAN	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
RECURSO HÍDRICO							EJECUTADO PARCIAL 21		EJECUTADO ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
1	MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES						AVANCE	VALOR	AVANCE	VALOR	CANT.	VALOR
1.1	703	Unidades sanitarias portátil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposición de ARD)	mes	24	$ 1.580.020,00	$ 37.920.480,00	1,00	$ 1.580.020,00	22,60	$ 35.708.452,00	1,40	$ 2.212.028,00
ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS												
2	MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCONALES Y ESPECIALES											
2.1	7332	Punto ecológico en frente de obra, incluye, suministro, instalación y desmonte	Und	2	$ 788.580,00	$ 1.577.160,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.577.160,00	0,00	$ -
2.2	6973	Mantenimiento punto ecológico en frente de obra	mes	24	$ 136.760,00	$ 3.282.240,00	1,00	$ 136.760,00	22,60	$ 3.090.776,00	1,40	$ 191.464,00
3	MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN											
3.1	5460	Punto de acopio de materiales de construcción (incluye suministro, instalación y desmonte)	Und	2	$ 1.262.190,00	$ 2.524.380,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.524.380,00	0,00	$ -
3.2	6373	Mantenimiento punto acopio de materiales de construcción	mes	24	$ 221.900,00	$ 5.325.600,00	1,00	$ 221.900,00	22,60	$ 5.014.940,00	1,40	$ 310.660,00
TOTAL						$ 50.629.860,00		$ 1.938.680,00		$47.915.708,00		$2.714.152,00

Cristhian Fuentes

CRISTHIAN ESLEYDER FUENTES CAÑAS
PROFESIONAL AMBIENTAL

JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ
PROFESIONAL SG-SST

ANEXO 1

MANIFIESTO DE CONTROL Y CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Código:	Op-PQ1-F03
Versión:	0
Fecha:	24/04/2010

SERPET JR Y CIA S.A.S.
SERVICIOS PETROLEROS Y AMBIENTALES

CCS Consejo Colombiano de Seguridad

CONTROL DE RECOLECCIÓN MANEJO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

S 4703

O. T. No. 6743

CAMPO: Base Yopal

FECHA: 17-12-2025

EMPRESA: Consorcio Bendición

CLASE DE MATERIALES	CANTIDAD ESTIMADA POR KILOS	APROBACIÓN DEL SERVICIO
CANECAS METÁLICAS CON RESIDUOS		
CANECAS METÁLICAS SIN RESIDUOS		
CANECAS PLÁSTICAS CON RESIDUOS		
CANECAS PLÁSTICAS SIN RESIDUOS		
GALONES PLÁSTICOS CON RESIDUOS		
GALONES PLÁSTICOS SIN RESIDUOS		
GALONES PLÁSTICOS SIN RESIDUOS		
CARTÓN		
MADERA		
DESECHABLES		
VIDRIO		
PAPEL DE OFICINA		
PLÁSTICO DE BAJA DENSIDAD		
VIRUTA DE TORNO		
CHATARRA		
INCINERABLES (ESTOPAS, TRAPOS, ETC.)	78 KG	
RESIDUOS QUIRÚRGICOS (INCINERABLES)		
CONTAMINADOS (FILTROS)		
CONTAMINADOS (TIERRA)		
RESIDUOS QUÍMICOS		
RESIDUOS TÓXICOS		
RESIDUOS ORGÁNICOS (CANECAS 55 GLS)		
OTROS		
Ordinario	135 KG	
TOTAL KILOS	213 KG	

OBSERVACIONES:	
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA:	QUIEN RECIBE EN RJC SERVICES SAS
VEHICULO PLACAS:	CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

SERPET JR Y CIA S.A.S.
SERVICIOS PETROLEROS Y AMBIENTALES

- Manejo de Residuos Industriales
- Alquiler de Maquinaria
- Carromachos
- Camiones de Vacío
- Volquetas selladas
- Camión Grúa
- Frack Tank

Código	Op-PQ1 FQ2
Versión	1
Fecha	21/04/2010

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC® Registro Unificado para Contratistas

Ciudad y Fecha: Yopal 17 - 12 - 2025

Placa: TZZ175

Kilometraje inicial: _____ Kilometraje final: _____

Hora inicio: _____ Hora finalización: _____

ORDEN DE TRABAJO No. 6743

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	HORAS TRABAJADAS DE	HORAS TRABAJADAS A	TOTAL HORAS
CAMPO: Dore Yopal	00:00	01:00	
EMPRESA: Consacio Bendición	01:00	02:00	
MUNICIPIO: Yopal	02:00	03:00	
	03:00	04:00	
Recolección y Trasporte	04:00	05:00	
de Residuos Solidos	05:00	06:00	
para disposición final	06:00	07:00	
base mercedes	07:00	08:00	
	08:00	09:00	
	09:00	10:00	
	10:00	11:00	
	11:00	12:00	
Trabajo	12:00	13:00	
conductor	13:00	14:00	
Andrson Vargas	14:00	15:00	
Auxiliar	15:00	16:00	
Miler Rodriguez	16:00	17:00	
	17:00	18:00	
	18:00	19:00	
	19:00	20:00	
	20:00	21:00	
	21:00	22:00	
	22:00	23:00	
No. de combustible:	23:00	24:00	
		Total horas trabajadas	

Nombre: Jose Hernandez M.

Teléfono: 3103323375

Julian Vargas
Firma Conductor

Powered by CamScanner

ANEXO 2

MANIFIESTO DE CONTROL Y CERTIFICADO MANTENIMIENTOS DE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

ISOLVE	PLANILLA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES	FO-SGI-13 VERSIÓN 04 PAGINA 1 DE 1 3/09/2020

CLIENTE: Consorcio Bendicion

UBICACIÓN: La Bendicion yopal

ID USP: Consorcio Bendicion

COLOR: Azul

MES: Diciembre

ÍTEM	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD RESIDUO LITROS	OBSERVACIONES	NOMBRE (CLIENTE)	NOMBRE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO
1	19	☐ INSTALACION ☒ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO	3		Jez Mey Conte	
2		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
3		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
4		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
5		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
6		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
7		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
8		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
9		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
10		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
11		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
12		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
13		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
14		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
15		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				
16		☐ INSTALACION ☐ MANTENIMIENTO ☐ RETIRO ☐ TRASLADO				

REVISADO Y APROBADO POR:

CARGO:

© ISOLVE - Información Confidencial prohibida su difusión y reproducción no autorizada

446

Powered by CamScanner

ANEXO 3

INSPECCIONES PREOPERACIONALES



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza. SERIE No.: 775

CARGO: Profesional SST. MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 1 al 7 Diciembre MARCA: Hyunday

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración				X		X		X		X		X		X		X
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR:	Julian Mendoza	**SERIE No.:**	320D
CARGO:	Profesional SST.	**MODELO:**	2024.
FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:	1 al 4 Diciem.	**MARCA:**	caterpilla.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras																
Sistema eléctrico																
B. CABINA																
Asiento																
Cinturón de seguridad																
Radio transmisión																
Bocina																
Vidrio lateral derecho																
Vidrio lateral izquierdo																
Vidrio lateral frontal																
Vidrio lateral trasero																
Alarma de retroceso																
Limpieza exterior																
Relojes indicadores																
Limpia parabrisas																
Niveles aceite hidráulico																
Mandos operacionales																
Panel de control																
Niveles agua radiador																
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas																
Filtraciones aceite																
Filtraciones de agua																
Radiador de filtro hidráulico																
Filtro de combustible																
Filtro de aceite																
Orugas																
Dientes de las orugas																
Marco de protección de los rodamientos de las orugas																
Exosto																
Rodamientos de oruga fijos																
Ajustadores de oruga hidráulicos																
Tanque de reserva del radiador																
Ventilador de refrigeración																
Motor de arranque																
Cubiertas laterales del motor																
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza **SERIE No.:** 715

CARGO: Profesional SST **MODELO:** 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 7 al 7 Diciembre **MARCA:** Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración				X		X		X		X		X		X		X
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: Hx 80

CARGO: Profesional SST. — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 1 al 7 Diciembre — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ITEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: Hx80

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 7 al 7 de diciembre — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral Izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: 320 GX

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2023

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 1 al 7 de Diciembre — MARCA: Caterpillar

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		V	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		V	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza. MARCA: Caterpilla.

CARGO: Profesional SST. SERIE N°: 420F

MODELO: 2012

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 1al 7 dici- 2025.

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.		X		X		X		X		X		X		X
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	X
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.		X		X		X		X		X		X		X
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.		X		X		X		X		X		X		X
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.		X		X		X		X		X		X		X
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X				X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		V		V		X		X		X		V		X
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza
CARGO: Profesional SST
MARCA: Caterpilla.
SERIE N°:
MODELO: 416 E.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 1 al 7 dic. 2025

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.	X		X		X		X		X		X		X	
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X		X		X		X		X		X		X	
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 9
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alirio Ramirez	Supervisor:	Julian Mendoza.
Periodo de Inspección:	19/7/24-2025	Firma del Conductor:	
Placas:	SPO 697	Marca/Modelo:	Freight liner
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X		X	
2															
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X		X	
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X		X	
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X		X	
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X		X	
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X		X	
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X		X	
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X		X	
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, delaminadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X		X	
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X		X	
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X		X	
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolíquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		Y		X		X		Y	
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X		X	
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X		X	
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X		X	
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X		X	
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X		X	
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X		X	

Vo.Bo. SUPERVISOR	

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 1 AL 7 Dic AÑO: 2025 MODELO _____ SERIE CA250

OPERADOR dina jiménez UBICACIÓN campamento MARCA: Dinapac

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viaje	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X		X	
	Guardas	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 1 AL 7 Dici AÑO: 2025 MODELO 2005 SERIE C550038

OPERADOR Oscar Samper. UBICACIÓN Bendición MARCA: Dynapac

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs POS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X		X	
	Guardas	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE	VERSIÓN 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	FECHA
		12/02/2024

SEMANA DEL 1 AL 7 DE Diciembre DEL 2025 Km. Inicial _____ Km. Final _____

MARCA Hyunday MODELO 2009 PLACA SMP763 UBICACIÓN Campamento

OPERADOR Anderso Zamir C.C. 1.121.917.468

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales delanteras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales traseras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	De stop y señal trasera	X		X		X		X		X		Y		X	
CABINA	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		Y		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección/suspensión (Terminales)	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio frontal (en buen estado)	X		X		X		X		X		X		X	
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios (10 O 20 lbs)	X		X		X		X		X		P		X	
	Silletería y tapicería	X		X		X		X		X		X		X	
	refrigerante, horómetro, aire)	X		X		X		X		Y		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduros profundos y sin obultamientos)	X		X		X		X		X		X		X	
	llanta de repuesto inflada, en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X		X	
	Control fugas de aire	X		X		X		X		X		Y		X	
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		Y		X	
	Cadena del cardán	X		X		X		X		X		X		X	
	Acoples rápidos	X		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras	X		Y		X		X		X		X		Y	
	Estado general del tanque	X		X		X		X		X		X		Y	
	* Soporte del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte)	X		X		X		X		X		X		Y	
	Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Instalación de puesta a tierra	Y		Y		X		X		X		X		Y	
OTROS	Documentos del vehículo		X		X		X		X		X		X		X
	Documentos del conductor		X		X		X		X		X		X		X
	Kit ambiental		X		Y		X		Y		X		Y		Y

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

KILOMETRAJE INICIAL							
KILOMETRAJE FINAL							
FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL							
V°. B° SUPERVISOR.							
V° B° COORDINADOR SSI							

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

459

CONSORCIO BENDICION 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO– PLANCHON	Fecha: 12/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO N° _____ PLACAS N° SBY380 MODELO 1979 MARCA Dogshe
INSPECCIONADO POR Julian Mendoza
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 2 AL 7 MES Diciem DE 2024



ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Luces		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras altas / bajas	2		X		X		X		Y		X		Y		Y
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2		X		X		X		X		X		X		X
Direccionales de parqueo (giro)	2		X		X		X		X		X		X		X
De stop y señal trasera	2		X		X		X		X		X		X		X
cabina		X		X		X		X		X		X		X	
Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio	completa		X		X		X		X		X		X		X
Freno de emergencia	completa		X		X		X		X		X		X		X
Dirección/suspensión (terminales)	completa	X		X		X		X		X		Y		Y	
Cinturón de seguridad	2		X		X		X		X		X		Y		X
Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X		X	
Extintor	1		X		X		X		X						
Asiento en buena condición	2		X		X		X		X		X		X		X
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)	completo		X		X		X		X		X		X		X
Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)			X		X		X		X		X		X		X
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo		X		X		X		X		X		X		X
Batería y cables	completo		X		X		X		X		X		X		X
Carrocería			X		X		Y		X		X		Y		X
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas		X		X		X		X		X		X		X
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo		X		X		X		X		X		X		Y
Chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo		X		X		X		X		X		X		X
Conexiones eléctricas	completo		X		X		X		X		X		X		X
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)			X		X		X		X		X		X		X
Estado de compuertas de carrocería	completo		X		X		X		X		X		X		X
Llantas		X		X		X		X		X		X		X	
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Estado mecánico		X		X		X		X		Y		X		X	
Control de fugas hidráulicas	completo		X		X		X		X		X		X		Y
pasadores, suspensión	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas de aire	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras neumáticas y acoples	completo	X		X		X		Y		X		X		X	
Grapas y anclaje de chasis	completo		X		X		X		X		X		X		X
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: _____


NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 13/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 8

EQUIPO N° _____ PLACAS N° SBY380 MODELO 1979 MARCA Dogshe
INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 8 AL 14 MES Diciem DE 2025



ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Luces		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras altas / bajas	2		X		X		X		X		X		X		X
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2		X		X		X		X		X		X		X
Direccionales de parqueo (giro)	2		X		X		X		X		X		X		X
De stop y señal trasera	2		X		X		X		X		X		X		X
cabina		X		X		X		X		X		X		X	
Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio	completa		X		X		X		X		X		X		X
Freno de emergencia	completa		X		X		X		X		X		X		V
Dirección/suspensión (terminales)	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	2		X		X		X		X		X		X		X
Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X		X	
Extintor	1		X		X		X		X		X		X		X
Asiento en buena condición	2		X		X		X		X		X		X		X
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)	completo		X		X		X		X		X		X		X
Motor(-refrigerantes-horlmetro-aire)			X		X		X		X		X		X		X
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo		X		X		X		X		X		X		X
Batería y cables	completo		X		X		X		X		X		X		X
Carrocería			X		X		X		X		X		X		X
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas		X		X		X		X		X		X		X
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo		X		X		X		X		X		X		X
Chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo		X		X		X		X		X		X		X
Conexiones eléctricas	completo		X		X		X		X		X		X		X
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)			X		X		X		X		X		X		X
Estado de compuertas de carrocería	completo		X		X		X		X		X		X		X
Llantas		X		X		X		X		X		X		X	
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Estado mecánico		X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	completo		X		X		X		X		X		X		X
pasadores, suspensión	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas de aire	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras neumáticas y acoples	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Grapas y anclaje de chasis	completo		X		X		X		X		X		X		X
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: _____

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE	VERSIÓN 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	FECHA 12/02/2024

SEMANA DEL 8 AL 14 DE Diciembre DEL 2023 Km. Inicial _____ Km. Final _____
MARCA Hyundai MODELO 2009 PLACA SMP763 UBICACIÓN campamento
OPERADOR Anderso Zamir C.C. 1.127.917.468

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales delanteras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales traseras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	De stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección/suspensión (Terminales)	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio frontal (en buen estado)	X		X		X		X		X		X		X	
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios (10 O 20 lbs)	X		X		X		X		X		X		X	
	Silletería y tapicería	X		X		X		X		X		X		X	
	refrigerante, horómetro, aire)	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X		X	
	llanta de repuesto inflada, en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X		X	
	Control fugas de aire	X		X		X		X		X		X		X	
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X		X	
	Cadena del cardán	X		X		X		X		X		X		X	
	Acoples rápidos	X		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	* Soporte del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte)	X		X		X		X		X		X		X	
	Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Instalación de puesta a tierra	X		X		X		X		X		X		X	
OTROS	Documentos del vehículo		X		X		X		X		X		X		X
	Documentos del conductor		X		X		X		X		X		X		X
	Kit ambiental		X		X		X		X		X		X		X

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

KILOMETRAJE INICIAL							
KILOMETRAJE FINAL							
FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL							
V°. B° SUPERVISOR.							
V° B° COORDINADOR SST							

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alirio Ramirez	Supervisor:	Julian Mendoza
Periodo de Inspección:	8-14 Dic-2025	Firma del Conductor:	
Placas:	SPO 691	Marca/Modelo:	Freight liner
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si es Bueno o M si es Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		V		X	
2		X		X		X		X		X		X		X	
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X		X	
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y al central.	X		X		X		X		V		X		X	
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X		X	
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Manlaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X		X	
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		V		V	
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		V		X	
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		V		X	
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		V		X	
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X		X	
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X		X	
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X		X	
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X		X	
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X		X	
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X		X	
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o ruidos extraños	X		X		X		X		X		X		X	
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X		X	
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X		X	
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [N] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — MARCA: caterpilla.

CARGO: Profesional SST — SERIE N°: 416E

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 8 al 14 Dic. 2025 — MODELO:

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presenten alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.	X		X		X		X		X		X		X	
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X		X		X		X		X		X		X	
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — MARCA: Caterpilla.

CARGO: Profesional SST — SERIE N°: 420F

MODELO: 2012

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 8 al 14 DIC 2025

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.		X		X		X		X		X		X		X
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.		X		X		X		X		X		X		X
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.		X		X		X		X		X		X		X
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.		X		X		X		X		X		X		X
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 8 AL 14 Dici. AÑO: 2025 MODELO _____ SERIE CA250

OPERADOR dina Jimenez UBICACIÓN campamento MARCA: Dmapac

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X		X	
	Guardas	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR:	Julian Mendoza.	**SERIE No.:**	320 D
CARGO:	Profesional SST	**MODELO:**	2024
FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:	8 al 14 Diciembre	**MARCA:**	Caterpillar

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: 320 GX

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2023

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 8 al 14 Diciembre — MARCA: caterpillar

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	

Vo. Bo. Supervisor	

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza **SERIE No.:** Hx80

CARGO: Profesional SST **MODELO:** 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 8 al 14 de diciembre **MARCA:** Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza **SERIE No.:** Hx80

CARGO: Profesional SST **MODELO:** 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 8 al 14 diciembre **MARCA:** Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza **SERIE No.:** 775

CARGO: Profesional SST **MODELO:** 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 8 al 14 diciembre. **MARCA:** Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo, Bo, Supervisor																

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: Hx 60 PRO

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 8 al 14 Diciembre — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras																
Sistema eléctrico																
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza **SERIE No.:** Hx 60 pro

CARGO: Profesional SST **MODELO:** 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 15 al 21 Diciembre. **MARCA:** Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema eléctrico			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
B. CABINA																
Asiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Radio transmisión			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Bocina			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio lateral derecho			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio lateral izquierdo			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio lateral frontal			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio lateral trasero			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Limpieza exterior			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Relojes indicadores			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Limpia parabrisas			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles aceite hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mandos operacionales			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Panel de control			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles agua radiador			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtraciones aceite			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtraciones de agua			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Radiador de filtro hidráulico			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aceite			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Orugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Dientes de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Exosto			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Rodamientos de oruga fijos			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ajustadores de oruga hidráulicos			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de reserva del radiador			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ventilador de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor de arranque			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cubiertas laterales del motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza **SERIE No.:** 715

CARGO: Profesional SST **MODELO:** 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 15 al 21 Diciembre **MARCA:** Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral Izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: HX80

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 15 al 21 Diciembre — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		Y		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: HX80

CARGO: Profesional SST. — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 15 al 21 diciembre — MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			C		C		C		C		C		C		C	
Sistema eléctrico			C		C		C		C		C		C		C	
B. CABINA																
Asiento			C		C		C		C		C		C		C	
Cinturón de seguridad			C		C		C		C		C		C		C	
Radio transmisión			C		C		C		C		C		C		C	
Bocina			C		C		C		C		C		C		C	
Vidrio lateral derecho			C		C		C		C		C		C		C	
Vidrio lateral Izquierdo			C		C		C		C		C		C		C	
Vidrio lateral frontal			C		C		C		C		C		C		C	
Vidrio lateral trasero			C		C		C		C		C		C		C	
Alarma de retroceso			C		C		C		C		C		C		C	
Limpieza exterior			C		C		C		C		C		C		C	
Relojes indicadores			C		C		C		C		C		C		C	
Limpia parabrisas			C		C		C		C		C		C		C	
Niveles aceite hidráulico			C		C		C		C		C		C		C	
Mandos operacionales			C		C		C		C		C		C		C	
Panel de control			C		C		C		C		C		C		C	
Niveles agua radiador			C		C		C		C		C		C		C	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			C		C		C		C		C		C		C	
Filtraciones aceite			C		C		C		C		C		C		C	
Filtraciones de agua			C		C		C		C		C		C		C	
Radiador de filtro hidráulico			C		C		C		C		C		C		C	
Filtro de combustible			C		C		C		C		C		C		C	
Filtro de aceite			C		C		C		C		C		C		C	
Orugas			C		C		C		C		C		C		C	
Dientes de las orugas			C		C		C		C		C		C		C	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			C		C		C		C		C		C		C	
Exosto			C		C		C		C		C		C		C	
Rodamientos de oruga fijos			C		C		C		C		C		C		C	
Ajustadores de oruga hidráulicos			C		C		C		C		C		C		C	
Tanque de reserva del radiador			C		C		C		C		C		C		C	
Ventilador de refrigeración			C		C		C		C		C		C		C	
Motor de arranque			C		C		C		C		C		C		C	
Cubiertas laterales del motor			C		C		C		C		C		C		C	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: 320 GX

CARGO: Profesional SST — MODELO: 2023

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 15 al 21 Diciembre — MARCA: caterpilla.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo, Bo, Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza — SERIE No.: 320D

CARGO: Profesional SST. — MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 15 al 21 Diciembre — MARCA: caterpillar

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras			X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento			X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión			X		X		X		X		X		X		X	
Bocina			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral Izquierdo			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal			X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero			X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior			X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores			X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales			X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control			X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador			X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua			X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible			X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite			X		X		X		X		X		X		X	
Orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas			X		X		X		X		X		X		X	
Exosto			X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos			X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos			X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador			X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración			X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque			X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor			X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE	VERSIÓN 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	FECHA 12/02/2024

SEMANA DEL 15 AL 21 DE Diciembre DEL 2025 Km. Inicial _____ Km. Final _____
MARCA Hyundai MODELO 2004 PLACA SMP783 UBICACIÓN campamento
OPERADOR Anderson Zamir C.C. 1.121 917 488

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales delanteras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales traseras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	De stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección/suspensión (Terminales)	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio frontal (en buen estado)	X		X		X		X		X		X		X	
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios (10 O 20 lbs)	X		X		X		X		X		X		X	
	Silletería y tapicería	X		X		X		X		X		X		X	
	refrigerante, horómetro, aire)	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X		X	
	llanta de repuesto inflada, en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X		X	
	Control fugas de aire	X		X		X		X		X		X		X	
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X		X	
	Cadena del cardán	X		X		X		X		X		X		X	
	Acoples rápidos	X		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	* Soporte del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte)	X		X		X		X		X		X		X	
	Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Instalación de puesta a tierra	X		X		X		X		X		X		X	
OTROS	Documentos del vehículo		X		X		X		X		X		X		X
	Documentos del conductor		X		X		X		X		X		X		X
	Kit ambiental		X		X		X		X		X		X		X

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

KILOMETRAJE INICIAL							
KILOMETRAJE FINAL							
FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL							
V°. B° SUPERVISOR.							
V° B° COORDINADOR SST							

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 8
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	13/02/2024

Conductor:	Alirio Ramirez	Supervisor:	Julian Mendoza
Periodo de Inspección:	15 al 21 Dic 2025	Firma del Conductor:	
Placas:	SPO 671	Marca/Modelo:	freightliner.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X		X	
2		X		X		X		X		X		X		Y	
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X		X	
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y al central.	X		X		X		X		X		X		X	
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X		Y	
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X		X	
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X		X	
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X		X	
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X		X	
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X		X	
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X		X	
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X		X	
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X		X	
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X		X	
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X		X	
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Guiza de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X		X	
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores sospechosos.	X		X		X		X		X		X		X	
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X		X	
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X		X	
	V o Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza. MARCA: Caterpillar.

CARGO: Profesional SST SERIE N°: 420 F

MODELO: 2012

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 15 al 21 Dic 2025

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.		X		X		X		X		X		X		X
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.		X		X		X		X		X		X		X
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.		X		X		X		X		X		X		X
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.		X		X		X		X		X		X		X
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.		X		X		X		X		X		X		X
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Mendoza. MARCA: caterpillar

CARGO: Profesional SST SERIE Nº: 416 E

MODELO:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 15 al 21 dici 2025

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde as el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.	X		X		X		X		X		X		X	
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X		X		X		X		X		X		X	
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO-- PLANCHON	Fecha : 12/03/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO N° _____ PLACAS N° SBY380 MODELO 1979 MARCA DogShe
INSPECCIONADO POR Julian Mendez
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 15 AL 21 MES Diciem. DE 2025



ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Luces		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras altas / bajas	2														
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2														
Direccionales de parqueo (giro)	2														
De stop y señal trasera	2														
cabina															
Espejo central convexo	1														
Espejos laterales	2														
Alarma de retroceso	1														
Pito	1														
Freno de servicio	completa														
Freno de emergencia	completa														
Dirección/suspensión (terminales)	completa														
Cinturón de seguridad	2														
Vidrio frontal (en buen estado)	1														
Limpia brisas	1														
Extintor	1														
Asiento en buena condición	2														
Indicaciones (hidraulico voltimetro)	completo														
Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)															
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo														
Batería y cables	completo														
Carrocería															
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas														
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo														
Chasis	completo														
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo														
Conexiones eléctricas	completo														
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)															
Estado de compuertas de carrocería	completo														
Llantas															
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas														
Estado mecánico															
Control de fugas hidráulicas	completo														
pasadores, suspensión	completo														
Control de fugas de aire	completo														
Mangueras neumáticas y acoples	completo														
Grapas y anclaje de chasis	completo														
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: _____

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 15 AL 21 AÑO: 2025 MODELO _____ SERIE CA250

OPERADOR dina Jimenez UBICACIÓN campamento MARCA: Dimapac

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X		X	
	Guardas	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

4A

ANEXO 4

PLANILLA CHARLAS Y/O CAPACITACIONES



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	02 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:10
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Riesgos Runakulcs en zonas habitadas

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	1.006.414.242	CONTROLADOR VIAL	
5	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	1.121.956.235	MAESTRO DE OBRA	
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
8	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
9	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
10	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
11	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
12	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
13	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
14	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	13.741.812	MAESTRO DE OBRA	
15	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
16	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
17	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
18	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
19	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
20	RIVERA JORGE REINALDO	91.262.131	RESIDENTE DE EBAR	
21	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
22	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
23	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
24	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	02 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:10
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Riesgos Prioritarios en Zonas habitadas

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	CECILIA
26	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	24 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Derrumbes en excavaciones

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	1.006.414.242	CONTROLADOR VIAL	
5	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	1.121.956.235	MAESTRO DE OBRA	
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
8	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
9	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
10	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
11	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
12	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
13	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
14	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	13.741.812	MAESTRO DE OBRA	
15	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
16	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
17	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
18	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
19	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
20	RIVERA JORGE REINALDO	91.262.131	RESIDENTE DE EBAR	
21	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
22	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
23	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
24	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	04 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Reinbros en excavaciones

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	CECILIA
26	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD				
	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	05 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:40
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Uso adecuado EPPS

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	1.006.414.242	CONTROLADOR VIAL	
5	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	1.121.956.235	MAESTRO DE OBRA	
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
8	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
9	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
10	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
11	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
12	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
13	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
14	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	13.741.812	MAESTRO DE OBRA	
15	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
16	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
17	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
18	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
19	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
20	RIVERA JORGE REINALDO	91.262.131	RESIDENTE DE EBAR	
21	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
22	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
23	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
24	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	03 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:10

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Uso adecuado de EPS

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	CECILIA
26	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD				
	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	09 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:10	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Manipulación Segura en Zonas estrechas

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	1.006.414.242	CONTROLADOR VIAL	Jaider Betancourt
5	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	1.121.956.235	MAESTRO DE OBRA	
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
8	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	Cristhian Fuentes
9	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	Diego A.
10	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
11	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
12	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
13	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
14	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	13.741.812	MAESTRO DE OBRA	
15	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
16	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
17	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	Lisa Montero
18	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
19	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
20	RIVERA JORGE REINALDO	91.262.131	RESIDENTE DE EBAR	
21	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
22	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
23	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
24	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	09 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Manipulación Segura en Zonas estrechas

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	Cecilia
26	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD			FIRMA	
	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ		
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	11	12	25	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:10

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Manejo de residuos

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	1.006.414.242	CONTROLADOR VIAL	
5	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	1.121.956.235	MAESTRO DE OBRA	
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
8	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
9	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
10	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
11	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
12	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
13	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
14	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	13.741.812	MAESTRO DE OBRA	
15	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
16	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
17	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
18	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
19	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
20	RIVERA JORGE REINALDO	91.262.131	RESIDENTE DE EBAR	
21	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
22	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
23	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
24	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	

CONSORCIO BENDICIÓN 23		Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	01	12	23	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:10

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Manejo de residuos

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	CECILIA
26	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23		Versión: 0
CONSORCIO BENDICIÓN 23	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	12 / 12 / 23	HORA DE INICIO:	07:05	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:15
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Contaminacion del ambiente y afectacion de la fauna

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	1.006.414.242	CONTROLADOR VIAL	
5	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	1.121.956.235	MAESTRO DE OBRA	
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
8	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
9	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
10	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
11	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
12	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
13	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
14	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	13.741.812	MAESTRO DE OBRA	
15	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
16	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
17	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
18	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
19	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
20	RIVERA JORGE REINALDO	91.262.131	RESIDENTE DE EBAR	
21	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
22	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
23	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
24	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 06/11/2022

FECHA	12 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:05	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:15
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	x	Reunion		Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:

TEMA: Contaminación del ambiente y afectación de la Fauna

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	CECILIA
26	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	15 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Protección en manos y ojos

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	1.006.414.242	CONTROLADOR VIAL	
5	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	1.121.956.235	MAESTRO DE OBRA	
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
8	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
9	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
10	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
11	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
12	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
13	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
14	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	13.741.812	MAESTRO DE OBRA	
15	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
16	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
17	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
18	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
19	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
20	RIVERA JORGE REINALDO	91.262.131	RESIDENTE DE EBAR	
21	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
22	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
23	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
24	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	

CONSORCIO BENDICIÓN 23		Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	15 / 12 / 22	HORA DE INICIO:	07:10	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:
TEMA:	Protección en manos y dedos				

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	CECILIA
26	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD			FIRMA	
	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ		
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23		Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	17 / 12 / 23	HORA DE INICIO:	07:10	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Control de derrames de lubricantes y aceites

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	1.006.414.242	CONTROLADOR VIAL	
5	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	1.121.956.235	MAESTRO DE OBRA	
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
8	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
9	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
10	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
11	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
12	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
13	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
14	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	13.741.812	MAESTRO DE OBRA	
15	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
16	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
17	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
18	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
19	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
20	RIVERA JORGE REINALDO	91.262.131	RESIDENTE DE EBAR	
21	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
22	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
23	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
24	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	

CONSORCIO BENDICIÓN 23		Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	17	12	25	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Control de derrames de lubricantes y aceites

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	CECILIA
26	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD			FIRMA	
	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ		
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23		Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	04 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:05	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:15
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:

TEMA: Contaminación Visual y auditiva.

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
3	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL	1.118.560.603	MAESTRO DE OBRA	
4	BETANCOURT CEPEDA JAIDER ARBEY	1.006.414.242	CONTROLADOR VIAL	
5	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE	1.121.956.235	MAESTRO DE OBRA	
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
8	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	1.118.542.443	PROFESIONAL AMBIENTAL	
9	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
10	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
11	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
12	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
13	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
14	MEDRANO DUARTE OSCAR ALFONSO	13.741.812	MAESTRO DE OBRA	
15	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
16	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
17	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
18	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	CONTROLADOR VIAL	
19	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
20	RIVERA JORGE REINALDO	91.262.131	RESIDENTE DE EBAR	
21	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
22	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	1.015.417.280	RESIDENTE DE OBRA	
23	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	74.814.415	MAESTRO DE OBRA	
24	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	

CONSORCIO BENDICIÓN 23		Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	24 / 12 / 25	HORA DE INICIO:	07:05	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:15
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Contaminación Visual y auditiva.

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	CECILIA
26	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD			FIRMA	
	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ		
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

ANEXO 5

PLANILLA DE ENTREGA DE DOTACIÓN



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL
C.C. No.	86.039.937
CARGO:	OFICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	39	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	39	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	86.039.937
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	OFICIAL DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES
C.C. No.	1.118.573.622
CARGO:	OFICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	39	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	39	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.118.573.622
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	OFICIAL DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE
C.C. No.	88.215.115
CARGO:	MAESTRO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	34	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	40	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	40	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	88.215.115
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	MAESTRO DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL
C.C. No.	1.118.560.603
CARGO:	MAESTRO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	39	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	39	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	BELLO SIERRA MIGUEL ANGEL
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.118.560.603
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	MAESTRO DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE
C.C. No.	1.121.956.235
CARGO:	MAESTRO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	40	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	40	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	BETANCOURT CRUZ JUAN JOSE
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.121.956.235
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	MAESTRO DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL
C.C. No.	74.181.863
CARGO:	GERENTE DE PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	34	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	38	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	38	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	74.181.863
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	GERENTE DE PROYECTO
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT
C.C. No.	1.019.082.927
CARGO:	MAESTRO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	39	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	39	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.019.082.927
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	MAESTRO DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO
C.C. No.	9.600.701
CARGO:	MAESTRO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	38	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	38	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	9.600.701
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	MAESTRO DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER
C.C. No.	1.118.542.443
CARGO:	PROFESIONAL AMBIENTAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	38	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	38	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.118.542.443
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	PROFESIONAL AMBIENTAL
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	GARCIA MENDIVELSO DIEGO ANDRES
C.C. No.	1.049.621.180
CARGO:	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	34	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	39	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	39	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	GARCIA MENDIVELSO DIEGO ANDRES
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.049.621.180
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA
FIRMA		**FIRMA**	

514

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER
C.C. No.	1.118.548.824
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	38	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	38	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.118.548.824
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	DIRECTOR DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	HURTADO PINEDA ALVARO
C.C. No.	9.532.276
CARGO:	OFICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	34	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	40	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	40	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	HURTADO PINEDA ALVARO
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	9.532.276
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	OFICIAL DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	HURTADO PINEDA YOLIMA
C.C. No.	46.364.728
CARGO:	PROFESIONAL AREA SOCIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	S	
2	PANTALON	2	10	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	37	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	37	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	HURTADO PINEDA YOLIMA
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	46.364.728
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	PROFESIONAL AREA SOCIAL
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO
C.C. No.	9.430.088
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	39	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	39	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	9.430.088
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID
C.C. No.	7.227.214
CARGO:	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	34	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	40	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	40	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	7.227.214
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA
C.C. No.	1.118.573.398
CARGO:	ASISTENTE SISO

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	S	
2	PANTALON	2	37	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	10	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	10	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.118.573.398
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	ASISTENTE SISO
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO
C.C. No.	74.755.228
CARGO:	CONTROLADOR VIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	L	
2	PANTALON	2	34	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	39	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	39	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	74.755.228
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	CONTROLADOR VIAL
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN
C.C. No.	91.240.944
CARGO:	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	34	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	40	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	40	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	91.240.944
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	RIAÑO LUIS OCTAVIO
C.C. No.	9.651.535
CARGO:	CONTROLADOR VIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	L	
2	PANTALON	2	34	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	40	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	40	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	RIAÑO LUIS OCTAVIO
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	9.651.535
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	CONTROLADOR VIAL
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	RIVERA JORGE REINALDO
C.C. No.	91.262.131
CARGO:	RESIDENTE EBAR

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	L	
2	PANTALON	2	34	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	39	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	39	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	RIVERA JORGE REINALDO
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	91.262.131
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	RESIDENTE EBAR
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER
C.C. No.	74.814.415
CARGO:	MAESTRO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	34	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	40	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	40	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	74.814.415
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	MAESTRO DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA
C.C. No.	1.118.563.927
CARGO:	RESIDENTE ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	S	
2	PANTALON	2	8	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	36	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	36	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.118.563.927
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	RESIDENTE ADMINISTRATIVO
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO
C.C. No.	1.015.417.280
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	L	
2	PANTALON	2	34	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	39	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	39	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.015.417.280
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	RESIDENTE DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO
C.C. No.	1.116.545.333
CARGO:	INSPECTOR DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	38	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	38	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.116.545.333
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	INSPECTOR DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	TARACHE CECILIA
C.C. No.	47.435.477
CARGO:	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	S	
2	PANTALON	2	8	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	36	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	36	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	TARACHE CECILIA
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	47.435.477
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
	CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.


DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA
C.C. No.	1.136.883.799
CARGO:	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	S	
2	PANTALON	2	8	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	36	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	36	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.
Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.
Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.136.883.799
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA
FIRMA		**FIRMA**	

ANEXO 6

INFORME DE LABORATORIO AGUA SUMINISTRADA PARA HIDRATACIÓN DE PERSONAL DE OBRA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

INFORME DE RESULTADOS DE ALIMENTOS
3959-25

Datos del Solicitante	
Cliente	Agua Pura Super Kristal
NIT/C.C.	47427841-2
Dirección	Carrera 8 N° 22-110
Municipio	Yopal
Teléfono	6356355
Datos de la Muestra	
Municipio de Recolección	Yopal
Dirección de Toma de Muestra	Carrera 8 No. 22 - 110
Lugar de Toma de Muestra	Área de Producción
Tipo de Alimento	Agua Envasada
Cantidad y/o Presentación	18,9L
Marca del Producto	Super Kristal
Registro Sanitario	RSA-0032557-2024
Lote	06-11-2025
Fecha de producción	2025-11-06
Fecha de Vencimiento	2025-12-06
Recolectada por	Aqualim; Luis Fernando Cataño Padilla
Plan y Procedimiento de Muestreo	304-25; PGL-MST-13
Fecha y Hora de Recolección	2025-11-06 16:45
Fecha y Hora de Recepción	2025-11-06 17:48
Fecha y hora de Emisión del Resultado	2025-11-14 10:26

Análisis de Laboratorio

Fecha de Análisis	Parámetro	Resultado	Unidades	Método	Técnica	Norma Agua Envasada Res. 1407:2022
2025-11-08	Mesofilos	0	UFC/mL	SM 9215	Recuento en Placa	-
2025-11-07	Pseudomonas Aeruginosa	<1	NMP/100mL	SM 9213 F MODIFICADO	Sustrato Enzimático Multiceldа	<1
2025-11-07	Escherichia Coli	0	UFC/100 mL	SM 9222 J	Filtración por Membrana	<1
2025-11-07	Coliformes Totales	0	UFC/100 mL	SM 9222 J	Filtración por Membrana	<1

Parámetro no Acreditado, * Parámetros Acreditados por el IDEAM; • Parámetros Subcontratados; •* Parámetros Subcontratados Acreditados ; (ISC): Corresponden a información suministrada por el cliente; SM: Standard Methods for the Examination of Water And Wastewater.

LCM: Límite de cuantificación del método; NMP: Número Más Probable; UFC: Unidades Formadoras de Colonias

OBSERVACIONES:

Cotización 52-25V1; Item 10

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización escrita por AQUALIM. Los resultados son válidos únicamente para las muestras analizadas en el laboratorio AQUALIM. El laboratorio no es responsable del origen o la fuente de donde han sido extraídas las muestras y de la información que sea suministrada por el cliente (ISC) que pueda afectar la validez de los resultados.
AQUALIM se encuentra autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 0229 de 19 de febrero de 2024 para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano.

532

ERIKA ROCIO CELY RINCÓN
DIRECTOR DEL LABORATORIO
Revisó y Aprobó

Fin del Resultado

LABORATORIO AMBIENTAL
LABORATORIO AMBIENTAL

Carrera 23 No. 19 - 15 Yopal - Casanare
Cel.: 310 349 0629 - 320 301 7075
gerencia@aqualim.com - cotizaciones@aqualim.com
www. aqualim.com

533

7 ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Las actividades ejecutadas pertenecientes al Plan de gestión social se encuentran especificadas y detalladas en el informe anexo referente a este componente.

7.1 ANEXOS

7.1.1 INFORME PARCIAL No. 21 DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ANEXOS 7.1



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME PARCIAL No. 21 DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME PARCIAL No. 21 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVOS 5
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
1 PRELIMINARES DE OBRA 6
1.1 DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 6
1.2 DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL 9
1.2.1 ACTORES INVOLUCRADOS 9
2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN 10
2.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 10
2.2 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL 14
2.3 INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 15
2.4 PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 16
2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 17
2.5.1 QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD 18
2.5.2 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRAMITE 18
2.6 DIALOGOS CON LA COMUNIDAD 18
2.7 VISITA GOBERNACIÓN DE CASANARE 20
2.8 REUNIÓN CON LA COMUNIDAD 22

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del proyecto 6
Ilustración 2 Socialización del proyecto 13
Ilustración 3. Interrupción de actividades por parte de la comunidad y reunión 19
Ilustración 4. Socialización inicio de actas de vecindad 19
Ilustración 5. Reunión con la comunidad y entidades gubernamentales 20
Ilustración 6. Visita gobernación y ACUATODOS 21
Ilustración 7. Acta de reunión con propietarios de Alameda 22
Ilustración 8. Reunión veeduría y lideres ALAMEDA con representantes de OBRA, INTER Y SUPERVISIÓN en ACUTODOS SA ESP 24

538

Ilustración 9. Mesa de trabajo alameda Martha Mojica 25
Ilustración 10. Reunión con comunidad de ciudadela la Bendición para tratar el estado de las vías. 26
Ilustración 11. Reunión con comunidad para atender inquietudes en las instalaciones de ACUATODOS SA 27

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Inventario de establecimientos 7
Tabla 2. Relación de actas de reunión con comunidad en general 27

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INTRODUCCIÓN

En desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023, se elabora el presente informe de actividades realizadas del plan de gestión social durante la etapa constructiva, el cual contiene el acompañamiento y seguimiento a las actividades de comunicación y participación a la comunidad durante la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El plan busca mitigar los impactos generados en el momento de ejecución de las obras, cambios abruptos tanto en el trabajador como en las rutinas diarias de los habitantes del sector, así como también atender a los intereses y expectativas de la comunidad frente a la ejecución de las obras. De igual manera, el plan de gestión social busca impactar positivamente en la comunidad permitiendo vincularla mediante su participación ciudadana en la ejecución de la obra de una manera voluntaria, comprometida y desinteresada, haciendo que se sientan beneficiarios de la misma.

El presente documento, será un compendio de las actividades del plan de gestión social realizadas por el contratista a través de todo el desarrollo de la obra, por lo cual, contiene cada una de las actividades ejecutadas e implementadas relacionadas con el plan desde el inicio de la obra.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer procedimientos y estrategias que permitan prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de manera oportuna los impactos negativos, así como potenciar los impactos positivos que se generen derivados de las obras civiles relacionadas con la **CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**, así como garantizar la participación activa de la comunidad y promover el reconocimiento, apropiación, cuidado y sostenibilidad de las obras dirigidas a mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el sector.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- ✓ Dar a conocer el proyecto a ejecutar a la comunidad de La Ciudadela La Bendición y Alameda Martha Mojica, así como las actividades que se desarrollaran antes, durante y después de la obra.
- ✓ Socializar a la comunidad sobre el inicio de la ejecución del proyecto, así como informar todos los aspectos técnicos y generalidades del mismo junto con los actores y entidades públicas involucradas.
- ✓ Dar respuesta de manera oportuna a las inquietudes de la comunidad frente al proyecto.
- ✓ Dar claridad frente a la vinculación de mano de obra local y los aspectos a tener en cuenta sobre la misma para así evitar la creación de las falsas expectativas por la demanda laboral con ocasión a la ejecución del proyecto.
- ✓ Ser responsable con las actividades a ejecutar sobre el espacio público, socializando las políticas y medidas diseñadas para la adecuada intervención de éste y respetando su uso.
- ✓ Disminuir al máximo el impacto generado en el tráfico y en los distintos actores viales por las labores constructivas que se desarrollan en el sector.
- ✓ Establecer estrategias que permitan minimizar la afectación de viviendas por el tránsito de maquinaria pesada.
- ✓ Mantener informadas a las comunidades y demás actores que intervengan en el desarrollo del proyecto en cuanto a las medidas de manejo ambiental.
- ✓ Evitar especulaciones y desinformación de la comunidad frente al proyecto y sus impactos a nivel socioeconómico y ambiental.

1 PRELIMINARES DE OBRA

1.1 DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO

El área de estudio corresponde al asentamiento humano denominado Ciudadela La Bendición y la zona suroccidental, la cual se encuentra ubicada al sur del casco urbano del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a 3.8 km de distancia, partiendo de la Diagonal 47, sobre la vía que conduce al Centro Poblado de Santa Fe de Morichal, limita al Norte con la Comuna VI y Oriente con el Caño Usivar, tiene una extensión de 745.794,30 m².

Ilustración 1 Localización del proyecto

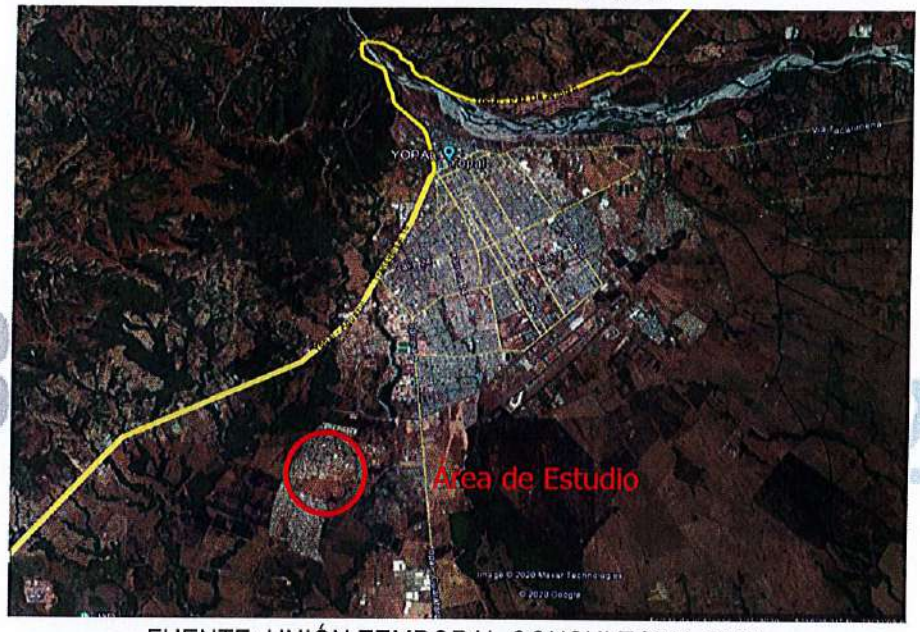

FUENTE: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORIA GHC.

Para la realización del diagnóstico de la zona de influencia directa del proyecto se inició con una inspección ocular en el sector de ciudadela la bendición en donde se identificó que no existen industrias o fábricas de ninguna clase, en consecuencia, no hay generación de aguas residuales industriales.

Se observó y cuantificó que el sector comercial de la Ciudadela La Bendición lo conforman establecimientos de comercio tales como: supermercados, tiendas, expendio de carnes, restaurantes, peluquerías, bares, talleres y panaderías; donde el establecimiento que más prevalece su economía son las tiendas, ya que ocupa el 32.53% de la totalidad de la zona comercial.

En total se cuantificaron ochenta y tres (83) establecimientos comerciales, A continuación, se ilustra en la Tabla *1.* Inventario de establecimientos, el conteo de establecimientos comerciales realizados en la Ciudadela La Bendición.


Tabla 1. Inventario de establecimientos

ESTABLECIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Tiendas	27	32,53%
Supermercados	15	18,07%
Talleres	11	13,25%
Expendio de carnes	10	12,05%
Restaurantes	6	7,23%
Bares	6	7,23%
Panaderías	5	6,02%
Peluquerías	3	3,61%
TOTAL	**83**	**100,00%**

FUENTE: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORIA GHC.

Además, en el diagnóstico de la zona de influencia directa del proyecto se identificaron áreas públicas existentes tales como parques, vías, andenes, antejardines senderos peatonales, mobiliario urbano (bancas, señalización luminarias) y se determinó el estado actual zonas recreativas o zonas verdes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO- INSPECCIÓN DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA DIRECTA DEL PROYECTO

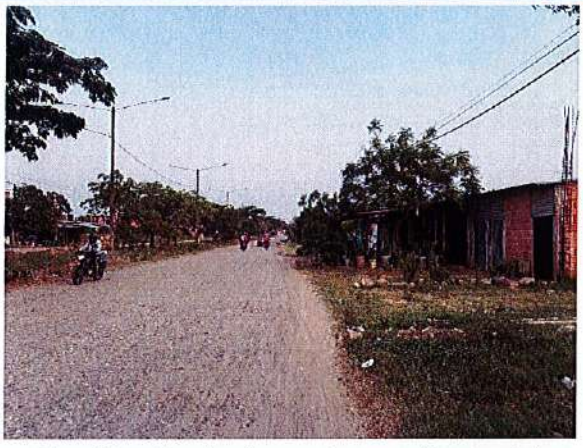

Identificación de vías en la zona directa del proyecto



Identificación de senderos en la zona directa del proyecto

REGISTRO FOTOGRÁFICO- INSPECCIÓN DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA DIRECTA DEL PROYECTO



Identificación de vías en la zona directa del proyecto



Identificación de andenes en la zona directa del proyecto



Identificación de mobiliario urbano en la zona directa del proyecto



Identificación de establecimientos comerciales en la zona directa del proyecto



Identificación de antejardines en la zona directa del proyecto



Identificación de zonas verdes y parques recreativos en la zona directa del proyecto

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Cabe resaltar que los trabajos de obra contemplan la intervención de calzadas, igualmente se pueden presentar alteraciones en la prestación de los servicios públicos, el acceso a las viviendas, garajes, además se pueden presentar riesgos de accidentes, razón por la que se hace necesario formular acciones que permitan mitigar los impactos de carácter negativo, a fin de evitar en la etapa constructiva del proyecto genere molestias en la comunidad.

1.2 DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL

1.2.1 ACTORES INVOLUCRADOS

Veeduría ciudadana: Mediante correo electrónico emitido el lunes 15 de enero de 2024 la veeduría ciudadana La Bendición envió carta de presentación al consorcio, realizando la presentación de su objeto el cual corresponde a "CONTROL SOCIAL A LOS PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y ADMINISTRACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL, LA GOBERNACION DE CASANARE, LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) Y LOS DEMAS ENTES GUBERNAMENTALES EN LO RELACIONADO CON LA ESCRITURACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, AL PROCESO DE CIUDADELA LA BENDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE". De acuerdo a la Resolución No. 067 de 2020 emitida por la personería de Yopal. Manifestaron en la carta de presentación el deber que los asiste a realizar control social a la ejecución e inversión de los recursos públicos en beneficio de la comunidad de la Ciudadela La Bendición.

2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN

2.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

FECHA DE LA SOCIALIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2024

LUGAR: CIUDADELA LA BENDICIÓN

HORA: 6:30 PM A 9:00 PM

ASISTENTES MESA PROTOCOLARIA:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Julio Cesar Cuevas Jiménez	Subgerente Técnico y Operativo	ACUATODOS S.A. E.S. P
Leonardo Cárdenas Niño	Director del proyecto	Obra- Consorcio Bendición 23
Fabian Leonardo Carreño	Profesional de apoyo	Obra- Consorcio Bendición 23
Gabriel Andrés Durán Moreno	Coordinador de interventoría	Interventoría Consorcio PR-HK
Boris Andrés Roa Pineda	Director de interventoría	Interventoría Consorcio PR-HK
Roberto Rios Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A E.S. P
Ociel Ortiz Zuluaga	Concejal-representante de la comunidad	Concejo Municipal de Yopal
Pedro Felipe Becerra Vargas	Concejal	Concejo Municipal de Yopal
Elmer Dumar Montaña Torres	Concejal	Concejo Municipal de Yopal
Wilder Andrés Ávila	Diputado	Asamblea Departamental de Casanare

OBJETIVOS DE LA SOCIALIZACIÓN: Realizar la socialización del proyecto que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y presentación de los asistentes de la mesa protocolaria.
2. Himnos de Colombia, Casanare y Yopal.
3. Palabras de bienvenida, descripción general del proyecto por parte del subgerente Técnico y Operativo de ACUATODOS S.A. E.S.P, Julio Cesar Cuevas Jiménez
4. Presentación del proyecto, fases, alcance total del mismo y aspectos a tener en cuenta para la vinculación de la mano de obra local por parte del Contratista, representado por el arquitecto Leonardo Cárdenas Niño.
5. Intervención por parte del coordinador de interventoría, el ingeniero Gabriel Andrés Durán Moreno.
6. Intervención por parte del concejal y representante de la comunidad de la Bendición Ociel Ortiz Zuluaga.
7. Intervención por parte del concejal Pedro Felipe Becerra Vargas, Elmer Dumar Montaña Torres y el diputado Wilder Andrés Ávila.
8. Intervención por parte de veeduría, ediles, presidentes de juntas de acción comunal, lideres sociales y representantes de la comunidad de La ciudadela La Bendición, Alameda Martha Mojica y San Rafael de Morichal.
9. Despedida.

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN

Se da inicio a la socialización siendo las 6:30 pm con la presentación de todos los asistentes en la mesa protocolaria mismos que se relacionan en el cuadro de asistentes.

El ingeniero Julio Cesar Cuevas Jiménez subgerente técnico y operativo de la empresa contratante ACUATODOS S.A. E.S.P manifiesta a la comunidad y los asistentes a la socialización el valor total de los recursos invertidos que corresponden al contrato de obra pública, al contrato de consultoría para la interventoría y al contrato de apoyo a la supervisión, manifiesta que ACUATODOS S.A E.S.P empresa contratante será exigente para que así se garantice que las obras se cumplan en su totalidad y se cumplan la normatividad y los aspectos técnicos propuestos.

Realiza su intervención el contratista de obra, representado por el arquitecto Leonardo Cárdenas Niño en calidad de director del proyecto, inicia describiendo la información general del proyecto correspondiente al objeto del contrato, valor total del proyecto y de sus contratos derivados, plazos de ejecución y fuente de financiación, realizó la descripción de los capítulos principales y el alcance de la obra, constituidas en la construcción de la EBAR, construcción de pozos y cámaras de inspección, instalación de tubería sanitaria y la instalación de la tubería de impulsión, indicó los aspectos a tener en cuenta en las situaciones asociadas a la ejecución del contrato como la vinculación de la mano de

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

obra local, dio a conocer los canales oficiales para la atención al público en general y finalmente dio a conocer el diseño de la valla informativa del proyecto, además de realizar una explicación de las fases de intervención del proyecto que se tienen proyectadas.

A continuación, se relacionan algunos de los aspectos más relevantes de la presentación del contratista:

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

PROYECTO BPIN	2023000850036
NOMBRE:	"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
APROBACION:	DECRETO DEPARTAMENTAL 0358 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR:	$ 88.842.008.646,00
FUENTES DE FINANCIACION:	$ 88.842.008.646,00 (100%) – REGALIAS ASIGNACIONES DIRECTAS GOBERNACION
ENTIDAD EJECUTORA:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."
PLAZO DE EJECUCION	26 MESES

CONTRATOS DEL PROYECTO

OBRA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 041 DE 2023
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23
VALOR:	$ 83.611.009.207,00
PLAZO DE EJECUCION:	24 MESES
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 DE FEBRERO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CONTRATOS DEL PROYECTO

INTERVENTORÍA	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 042 DE 2023
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
CONTRATISTA:	CONSORCIO PR-HK
VALOR:	$ 5.067.882.690,00
PLAZO DE EJECUCION:	25 MESES
FECHA DE INICIO:	19 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 DE FEBRERO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CONTRATOS DEL PROYECTO

SUPERVISIÓN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 049 DE 2023
OBJETO:	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
CONTRATISTA:	ROBERTO ANDRÉS RIOS FIGUEROA
VALOR:	$ 130.890.960,00
PLAZO DE EJECUCION:	26 MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE MARZO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

DESCRIPCIÓN DE CAPITULOS PRINCIPALES

ITEM	DESCRIPCION
CAP-1	SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO REDES INTERNAS
CAP-2	EMISARIOS ENTREGA EBAR
CAP-3	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)

UBICACIÓN DEL PROYECTO



Ejemplos de trabajos a realizar:



Atención a la comunidad

CONTRATISTA DE OBRA

Consorcio BENDICIÓN 23
Director de proyecto: Leonardo Ariel Cárdenas Niño
Contacto: 3248217630
Atención al público: Vía San Rafael de Morichal con calle 79
Correo: consorciobendicion23@theos.com.co

INTERVENTORÍA

Consorcio PR-HK
Coordinador de interventoría: Gabriel Andrés Duran Moreno
Contacto: 3219726100
Atención al público: Carrera 7 Oeste con Calle 67 Ciudadela la Bendición
Correo: consorcioprhk@proycon.com.co

ENTIDAD CONTRATANTE

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Profesional apoyo a la supervisión: Roberto Andrés Ríos
Correo: contactenos@espacuatodos.gov.co

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

El coordinador de interventoría realiza su intervención, socializa a los asistentes los canales de comunicación y manifiesta que estará en disposición de atender cualquier asunto relacionado con el control y seguimiento de la ejecución del contrato de obra.

El concejal Ociel Ortiz realiza su intervención, manifiesta a la comunidad la importancia y magnitud del proyecto, manifiesta servir a la comunidad como veedor del cumplimiento del contrato estipulado, así como de velar por el cumplimiento de la vinculación de la mano de obra local, del mismo modo los demás concejales y el honorable Diputado manifestaron el compromiso de velar por el desarrollo oportuno y legal de este proyecto.

La comunidad representada por los respectivos ediles, presidentes de juntas, veeduría entre otros manifestaron la importancia de la vinculación de la mano de obra local e indicaron que estarán atentos al cumplimiento general del contrato en todas sus fases.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ilustración 2 Socialización del proyecto








Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

2.2 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL


El día 20 de febrero de 2024 luego de la socialización inicial del proyecto se programó una reunión con la comunidad de ciudadela La Bendición y beneficiarios del proyecto Alameda Martha Mojica en donde se les informó el proceso de vinculación de mano de obra local calificada y no calificada, se les menciono que para mayor organización en el proceso de recepción de hojas de vida se debe hacer la entrega en el punto de atención a la comunidad, ubicado en el campamento de obra, además se le menciono a la comunidad de AMM que si es posible eligieran a una persona como vocero(a) de los beneficiaros de este sector para mantener información constante con la persona designada y fuera está la encargada de transmitir la información a los demás en aras de brindar organización y claridad en el proceso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN CON LA COMUNIDAD SOBRE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL






Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

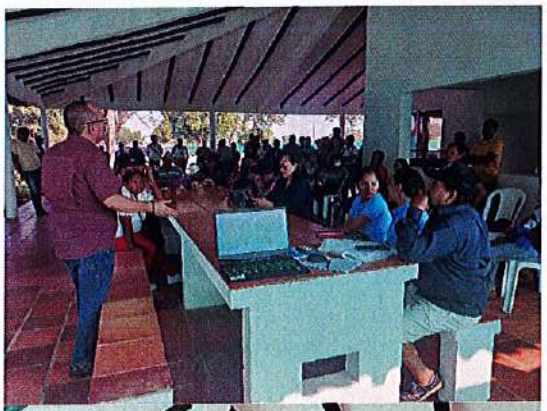




2.3 INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA


El día 28 de febrero de 2024 se realizó la instalación de la valla informativa del proyecto en la vía que conduce a San Rafael de Morichal entrada principal de Alameda Martha Mojica con las especificaciones técnicas y diseño suministrado por ACUATODOS S.A E.S.P.



FUENTE: AUTOR, 2024

2.4 PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD


La oficina destinada para la atención a la comunidad se encuentra ubicada en la vía San Rafael de Morichal con calle 79 en la cual el profesional del área social atenderá, recibirá y tramitará todos los PQRS que sean radicados con ocasión de la ejecución del proyecto.

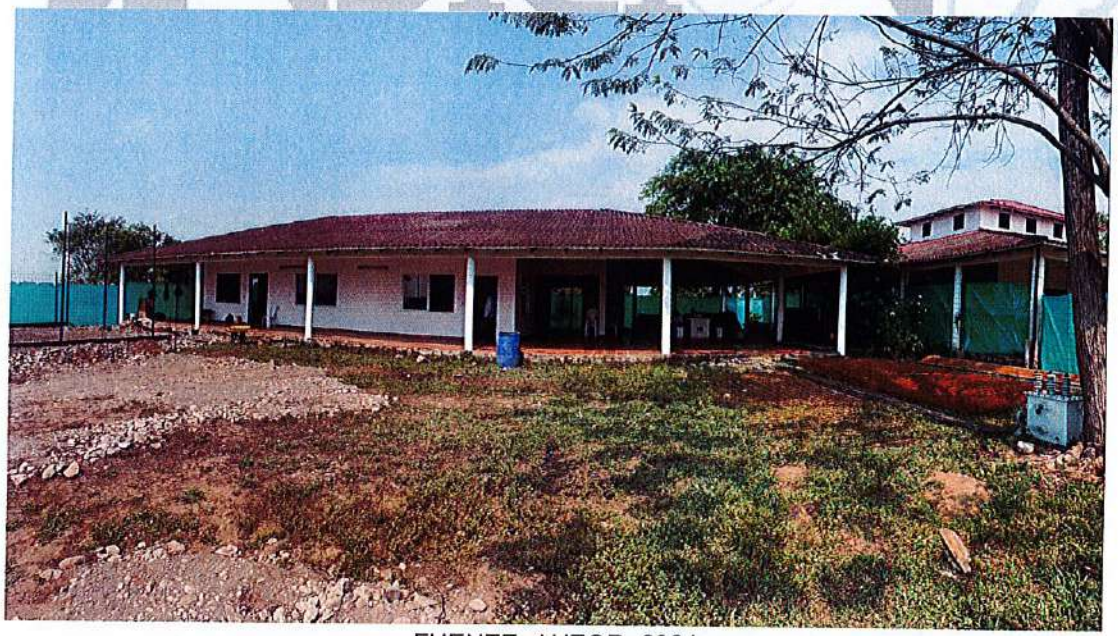

FUENTE: AUTOR, 2024

2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Con la finalidad de tramitar y gestionar las solicitudes de información, quejas y reclamos presentados por la comunidad o las autoridades competentes relacionadas con la actividad del proyecto, se realiza la instalación de un buzón de sugerencias el cual está dotado de un formato de sugerencias, quejas, reclamos y solicitudes que podrá diligenciar cualquier persona natural o jurídica con el fin de exponer sus opiniones, inquietudes o solicitudes con respecto al desarrollo de la obra.

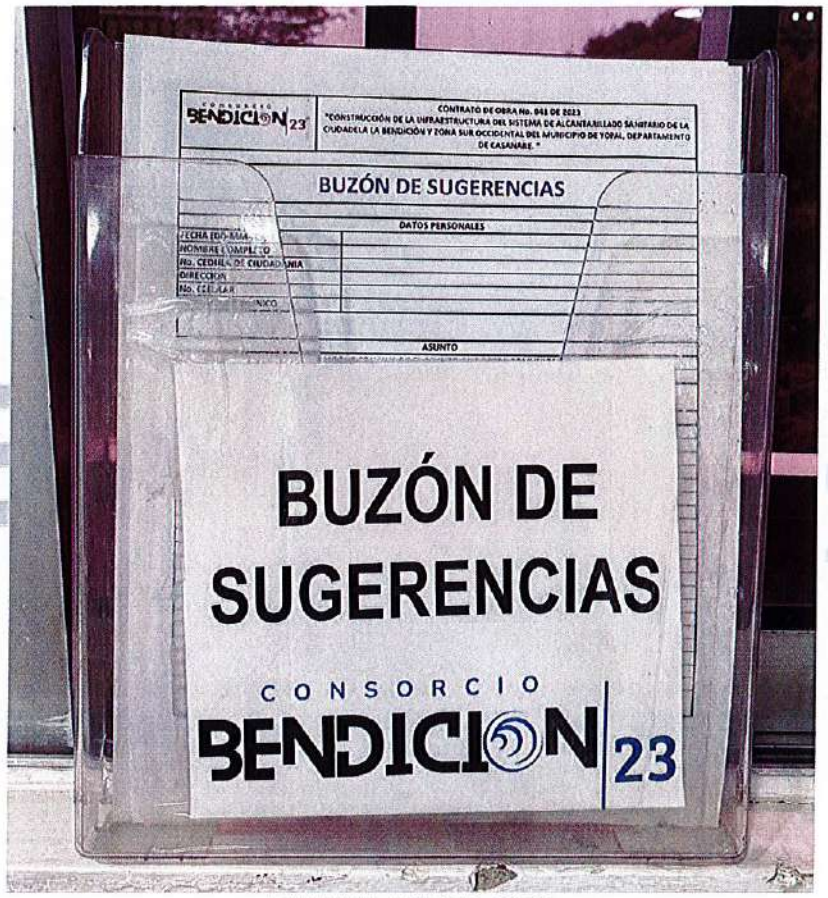

FUENTE: AUTOR, 2024

2.5.1 QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD

QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	OBSERVACIONES
RECIBIDAS	-	-	-	
ENVIADAS	-	-	-	
SEGUIMIENTO	-	-	-	

2.5.2 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRAMITE

FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVÍA	ASUNTO	SE LE DIO TRAMITE (SI, NO)	¿CUAL?
-	-	-	-	-

CONSORCIO BENDICIÓN 23

2.6 DIALOGOS CON LA COMUNIDAD

El proyecto estaba progresando sin inconvenientes hasta el miércoles 13 de marzo de 2024, cuando, lamentablemente, se presentó un incidente. Un grupo de personas ingresó sin autorización al área designada para las excavaciones de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) aproximadamente a las 8:00 a.m. Este evento inesperado provocó una interrupción en el flujo normal de las operaciones y las actividades de construcción se vieron afectadas temporalmente.

La oposición de este grupo de personas al proyecto llevó al CONSORCIO BENDICION 23 a tomar medidas preventivas para salvaguardar sus recursos. En respuesta a la invasión del sitio de construcción, el consorcio actuó con prontitud y retiró la maquinaria que estaba en uso para evitar daños o complicaciones adicionales. Esta acción refleja un compromiso con la seguridad y la gestión de riesgos, así como con la resolución de conflictos de manera pacífica y eficiente. Pasados los días, con diálogos entre la comunidad y las entidades gubernamentales se llegó a un común acuerdo que permitió la reanudación de las actividades el día 20 de marzo de 2024.

Ilustración 3. Interrupción de actividades por parte de la comunidad y reunión





- **SOCIALIZACIÓN INICIO DE ACTAS DE VECINDAD**

El día 26 de marzo de 2024 se realizó una socialización con la comunidad para informar el inicio del llenado de los formatos de actas de vecindad con el fin de verificar el estado actual de las viviendas antes de iniciar actividades de obra, con esto, se pretende establecer posibles responsabilidades por afectaciones a las viviendas después de la intervención de cada tramo.

Ilustración 4. Socialización inicio de actas de vecindad





- **REUNIÓN CON LA COMUNIDAD PARA TRATAR TEMA DE LA EBAR**

El 18 de abril del año en curso se realizó una reunión pactada con la comunidad donde se contó con la presencia del Gobernador de Casanare, Cesar Augusto Ortiz Zorro en el que se escuchó a la comunidad y se llegó a un común acuerdo.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Ilustración 5. Reunión con la comunidad y entidades gubernamentales



2.7 VISITA GOBERNACIÓN DE CASANARE

El sábado 06 de Julio del año en curso se realizó una visita por parte de la gobernación de Casanare y de ACUATODOS S.A ESP, donde se contó con la presencia del señor gobernador Cesar Ortiz Zorro y el gerente de la empresa departamental de servicios públicos ACUATODOS SA ESP el ingeniero Julio Cesar Cuevas, representantes de la dirección técnica de obra e interventoría. Se visitaron todos los frentes de obra con el fin de verificar el avance del proyecto 041 de 2023.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Ilustración 6. Visita gobernación y ACUATODOS













2.8 REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

El 24 de septiembre de 2024 se llevó a cabo una reunión en la comunidad de Alameda Martha Mojica, con el propósito de informar a los propietarios de los lotes en la zona nororiental de Alameda acerca de la necesidad de reubicar las cercas que demarcan los linderos de cada predio, especialmente los que se encuentran por la carrera 7 Oeste. Esto es necesario debido a que algunos lotes están invadiendo la vía pública. Durante la reunión, la comunidad mostró su comprensión y apoyo a la solicitud, comprometiéndose no solo a reubicar las cercas, sino también a marcar cada lote con su respectivo número y manzana para una mejor organización y delimitación de los terrenos.

Ilustración 7. Acta de reunión con propietarios de Alameda

CONSORCIO BENDICIÓN 23 — ACTA DE REUNIÓN — VERSIÓN 1

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. DATOS GENERALES

No. ACTA:

FECHA DE LA REUNIÓN:	HORA DE INICIO:	HORA DE INICIO:
24 - 09 - 2024	4:00 AM ☐ PM ☒	AM ☐ PM ☐

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Carrera 7 Oeste Alameda Martha Mojica

TEMAS DE LA REUNIÓN:

Traslado de Cercas y notificacion a lideres y Comunidad en general

ASISTENTES:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / INSTITUCIÓN
1	Victor Rafa Vago	Residente Obra	Consorcio Bendicion
2	Angela Monteneg	Insp interventoria	Consorcio PP-III
3	[illegible]	Asesor Ete. 7	A M M.
4	[illegible]	ADM ET. 3	AMM
5	[illegible]	ADM ET 1	A.M.M.
6	VEENOY.	REPRESENTANTE	VEENOY.
7	Rosa Yolanda Abril M.	ADM Sydeate 2	AM M.
8	Dora Cacquillo Gonzale	Beneficiaria M2	AMM
9	Mabel Maldonado T.	Beneficiaria	AM M
10	Dora Maria Pichada	Beneficiaria	AMA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Notificar el traslado de las Cercas de la Carrera 7 oeste Sobre calzada Martha Mojica 1-243

ORDEN DEL DÍA:

Primero: Presentacion del Personal Responsable de obra y Comunidad

558

CONSORCIO BENDICIÓN 23 — ACTA DE REUNIÓN — VERSIÓN 1

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Segundo: Explicación del tema
Tercero: Socialización y Sugerencias de la Comunidad

2) DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se hizo la explicación del Porque se debe mover las Cerca de algunos predios Sobre la carrera 7 oeste Son el fin de Salvaguardar el estado de las Cercas existentes.
El Contratista de obra notifica que realizara el traslado de Cerramiento existente
La Comunidad Sugiere y recomienda Marcar los Postes por numero de lote y manzana.
La Comunidad da la posibilidad de que los propietarios que deseen retirar ellos y Salvaguardar el cerramiento. Sea posible.
La Comunidad recomienda referenciar los Mojones de cada Cerramiento.

El 26 de febrero de 2025 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de ACUATODOS SA ESP. Este encuentro contó con la presencia de varias figuras claves, tales como el gerente de ACUATODOS SA ESP, el ingeniero Julio Cesar Cuevas; el supervisor del contrato 041 de 2023, el ingeniero Robert Asís Hernández Cachay; el apoyo a la supervisión, el ingeniero Roberto Andrés Ríos Figueroa; el gerente del contrato 041 de 2023, el arquitecto Leonardo Cárdenas; el representante legal de la Veeduría denominada "ALAMEDA MARTHA MOJICA", el señor Carlos Wilson Salazar, representantes de la interventoría y los líderes de las diferentes etapas de Alameda Martha Mojica.

559

El objetivo principal de esta reunión fue esclarecer y definir los canales de comunicación que deben mantenerse entre la comunidad general de ALAMEDA y los propietarios de los lotes de la zona. Además de este propósito central, también se abordaron otros temas técnicos relevantes para el proyecto, tales como los avances actuales de la obra, especificaciones técnicas, y otros aspectos clave que necesitan atención para asegurar el progreso exitoso del proyecto. De esta manera, todos los participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes, plantear sugerencias y recibir información detallada sobre el estado y proyecciones de la obra.

Esta reunión fue crucial para garantizar una comunicación eficaz y fluida entre todas las partes involucradas, asegurando así que todos los interesados estén informados y puedan colaborar de manera coordinada para el éxito del proyecto en Alameda Martha Mojica

Ilustración 8. Reunión veeduría y lideres ALAMEDA con representantes de OBRA, INTER Y SUPERVISIÓN en ACUTODOS SA ESP



El día domingo 9 de marzo de 2025 tuvo lugar una mesa de trabajo organizada con la comunidad de Alameda Martha Mojica. Este encuentro se llevó a cabo con el propósito principal de atender las inquietudes que los miembros de la comunidad habían expresado en relación al proyecto en cuestión. Durante la reunión, se generó un espacio de diálogo y participación, buscando brindar claridad y resolver todas las dudas planteadas por los asistentes. Este tipo de iniciativas refuerzan la importancia de la comunicación abierta y la colaboración entre la comunidad y las partes involucradas en el desarrollo del proyecto.

En este encuentro, se brindó un espacio abierto para escuchar las opiniones, preocupaciones e inquietudes de la comunidad en general. Se fomentó un ambiente de participación activa donde cada miembro tuvo la oportunidad de expresar sus puntos de vista y plantear sus dudas sobre el proyecto. Todas las inquietudes generadas fueron atendidas con el compromiso de ofrecer respuestas claras y satisfactorias, fortaleciendo así la comunicación y el entendimiento mutuo entre los asistentes y las partes responsables del proyecto.

560

Ilustración 9. Mesa de trabajo alameda Martha Mojica



El 22 de abril de 2025 se llevó a cabo una importante reunión en la Ciudadela La Bendición, en la que participaron diversos actores clave para abordar la problemática del estado de las vías en la comunidad. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la comunidad, contratistas de obra, el equipo de interventoría y personal del banco de maquinaria de la Gobernación de Casanare.

El propósito de la reunión fue generar un espacio de diálogo y concertación para buscar soluciones viables y efectivas que permitan mejorar el estado actual de las vías en la Ciudadela La Bendición. A lo largo de la jornada, los asistentes expusieron sus preocupaciones y necesidades, resaltando la importancia de contar con vías en óptimas condiciones para garantizar la movilidad de los habitantes y el acceso a servicios esenciales.

Este acercamiento fue clave para fortalecer el compromiso de las autoridades y las entidades responsables con la comunidad. Se discutieron posibles estrategias y planes de acción que permitirían ejecutar intervenciones necesarias en el menor tiempo posible. Asimismo, se enfatizó la necesidad de mantener un canal de comunicación abierto y constante entre los involucrados para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la eficacia de las soluciones planteadas.

En conclusión, la reunión representó un paso fundamental para atender las necesidades de la Ciudadela La Bendición en materia de infraestructura vial, consolidando el trabajo conjunto entre la comunidad y las entidades responsables para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Ilustración 10. Reunión con comunidad de ciudadela la Bendición para tratar el estado de las vías



El 24 de abril de 2025 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de ACUATODOS S.A. E.S.P., con la participación de diversos actores clave en el desarrollo y supervisión de obras de infraestructura. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la supervisión, contratistas de obra, el equipo de interventoría y miembros de la veeduría Alameda Martha Mojica liderada por el señor Carlos Salazar en calidad de representante legal.

El propósito de la reunión fue atender y resolver inquietudes técnicas planteadas por los veedores en relación con algunas estructuras de pozos que presentaban signos de socavación. Durante la jornada, el contratista de obra respondió a cada una de las dudas expuestas, proporcionando explicaciones detalladas sobre las condiciones de las estructuras y las medidas correctivas que se implementarían para garantizar su estabilidad y seguridad.

Este espacio de diálogo permitió fortalecer la relación entre la comunidad y los responsables de la obra, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada para asegurar la calidad y

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

durabilidad de las intervenciones. Como resultado del encuentro, se establecieron compromisos concretos orientados a mejorar la estabilidad de las estructuras y garantizar que, al momento de la entrega de la obra, se cumplan los estándares de calidad exigidos.

La reunión representó un paso significativo en el proceso de supervisión y control ciudadano, asegurando que las inquietudes de la comunidad sean atendidas de manera efectiva y que las obras se desarrollen con transparencia y responsabilidad.

Ilustración 11. Reunión con comunidad para atender inquietudes en las instalaciones de ACUATODOS SA



Con el objetivo principal de responder de manera efectiva y oportuna a las necesidades manifestadas por la comunidad, se han establecido espacios permanentes de escucha activa, en los cuales se reciben, analizan y atienden cada una de las inquietudes y problemáticas que afectan directamente a los habitantes. Esta estrategia busca facilitar un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes involucradas, fortaleciendo así la comunicación y promoviendo una convivencia sana y armoniosa durante el desarrollo de las actividades contempladas en el presente contrato:


Tabla 2. Relación de actas de reunión con comunidad en general

ACTA No.	FECHA	OBJETO	CONCLUSIONES	COMPROMISOS
1	09/07/2025	Socialización de trabajos de instalación de colectores	Se informa a la comunidad la ruta a seguir para el mes de Julio 2025	N/A
2	09/07/2025	Atención a la comunidad y verificación técnica de materiales	Supervisión e interventoría aprueban el uso del ladrillo	Fortalecer atención a la comunidad y gestión social
3	09/07/2025	Visita a campo con comunidad	Se realiza visita por los frentes de obra y se identifican algunos daños a revisar por parte del contratista de obra	La comunidad se compromete a realizar un listado de pendientes al contratista de obra

Ver anexo 5.14.15, Actas de reunión del informa parcial de obra No. 16

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare




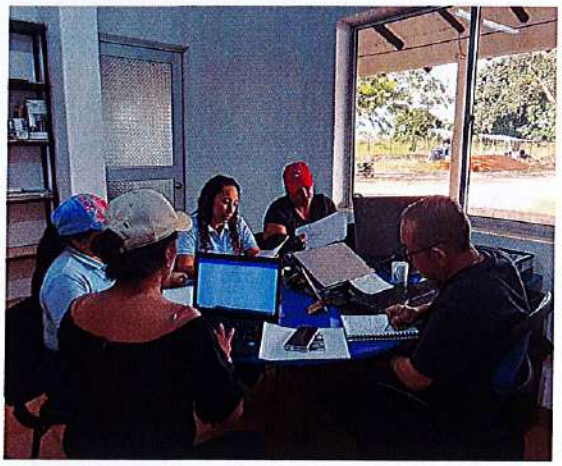

De igual forma, con el propósito de transmitir la información a la comunidad de manera clara, directa y oportuna, se realizan visitas puerta a puerta en los sectores específicos que serán intervenidos en los próximos días. Durante estas jornadas, se comunica a los residentes sobre la presencia de maquinaria pesada, obreros y demás personal técnico necesario para ejecutar actividades tales como la construcción de acometidas domiciliarias y pozos de inspección. Esta estrategia busca preparar adecuadamente a los habitantes del sector para minimizar inconvenientes, resolver inquietudes previas y garantizar que las labores se desarrollen en un ambiente de entendimiento y cooperación mutua.





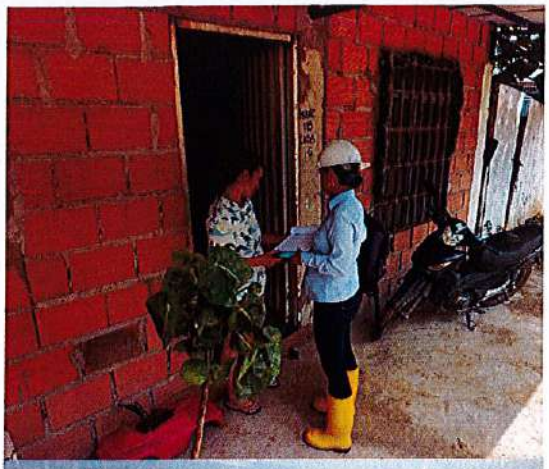






El día 18 de diciembre del año 2025 se llevó a cabo una visita de la comunidad del sector Ciudadela La Bendición a los diferentes frentes de obra vinculados a la ejecución del contrato No. 048 de 2023. Esta actividad fue coordinada entre el contratista, la interventoría y los representantes de la comunidad, con el propósito de fortalecer los canales de comunicación entre las partes interesadas en el proyecto y fomentar un ejercicio de veeduría y transparencia frente al desarrollo de las obras.

Durante el recorrido, se presentó a los asistentes el estado actual de avance del proyecto, explicando de manera detallada las actividades que se han venido ejecutando en cada frente de trabajo, los componentes intervenidos y los resultados obtenidos hasta la fecha. De igual forma, se socializaron las principales dificultades que han incidido en el cronograma, particularmente aquellas asociadas al retraso en la ejecución de algunas actividades, derivadas de factores operativos, climáticos y logísticos, con el fin de que la comunidad comprendiera el contexto real en el que se ha desarrollado la obra.

Finalmente, se informó a la comunidad que, en atención a la temporada de fin de año, las actividades de campo se suspenderían temporalmente a partir del día 24 de diciembre, retomándose nuevamente el día 5 de enero de 2026. Esta programación fue debidamente explicada, aclarando que la pausa corresponde a una interrupción operativa prevista, y que una vez reiniciadas las labores se continuará trabajando en el cumplimiento de las metas físicas y contractuales establecidas.

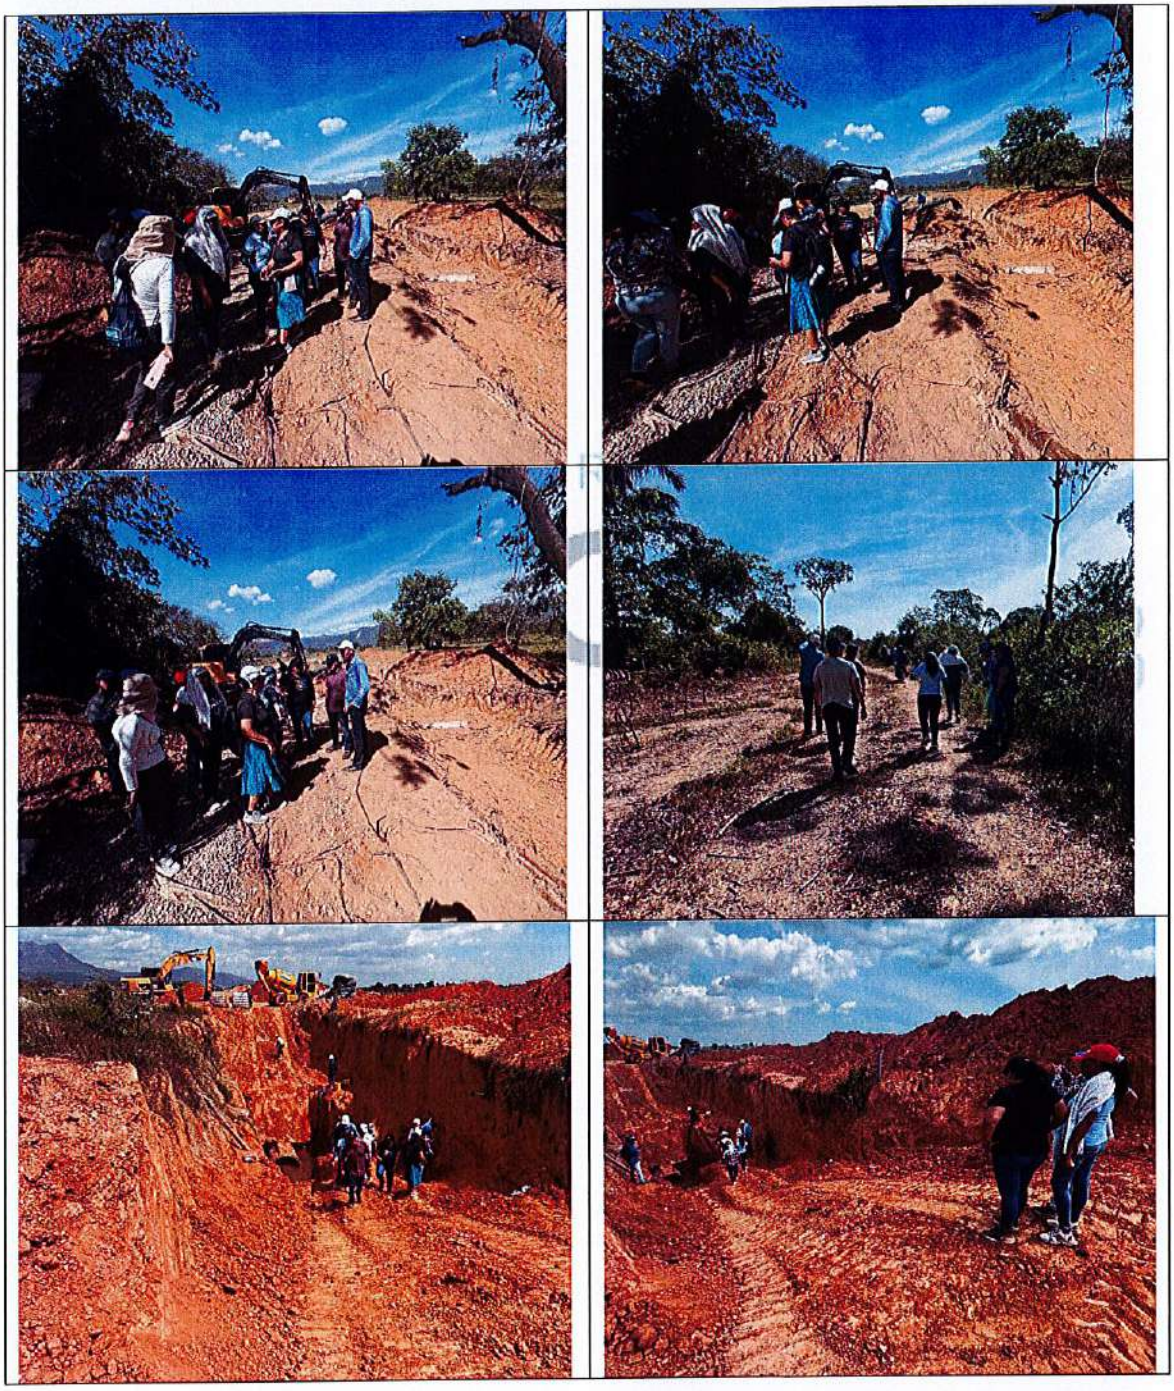





Firma:

YOLIMA HURTADO P.

PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
YOLIMA HURTADO PINEDA
C.C. 46.364.728 DE SOGAMOSO

8 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El plan de manejo de tránsito (PMT) del proyecto se aprobó según resolución No. 01504 DEL 26 DE ENERO DE 2024, se actualiza por primera vez su vigencia mediante resolución No. 05224 DEL 30 DE MAYO DE 2024, se actualiza por tercera vez mediante resolución No. 08247 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 y se actualiza por cuarta ver mediante resolución 05570 del 02 de Julio de 2025 "Por la cual se concede permiso para cierres totales y parciales de vías urbanas del municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCODENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

8.1 ANEXOS

8.1.1 INFORME PARCIAL No. 21 DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ANEXOS 8.1



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME PARCIAL No. 21 DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INFORME PARCIAL DE OBRA No. 21 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT

PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

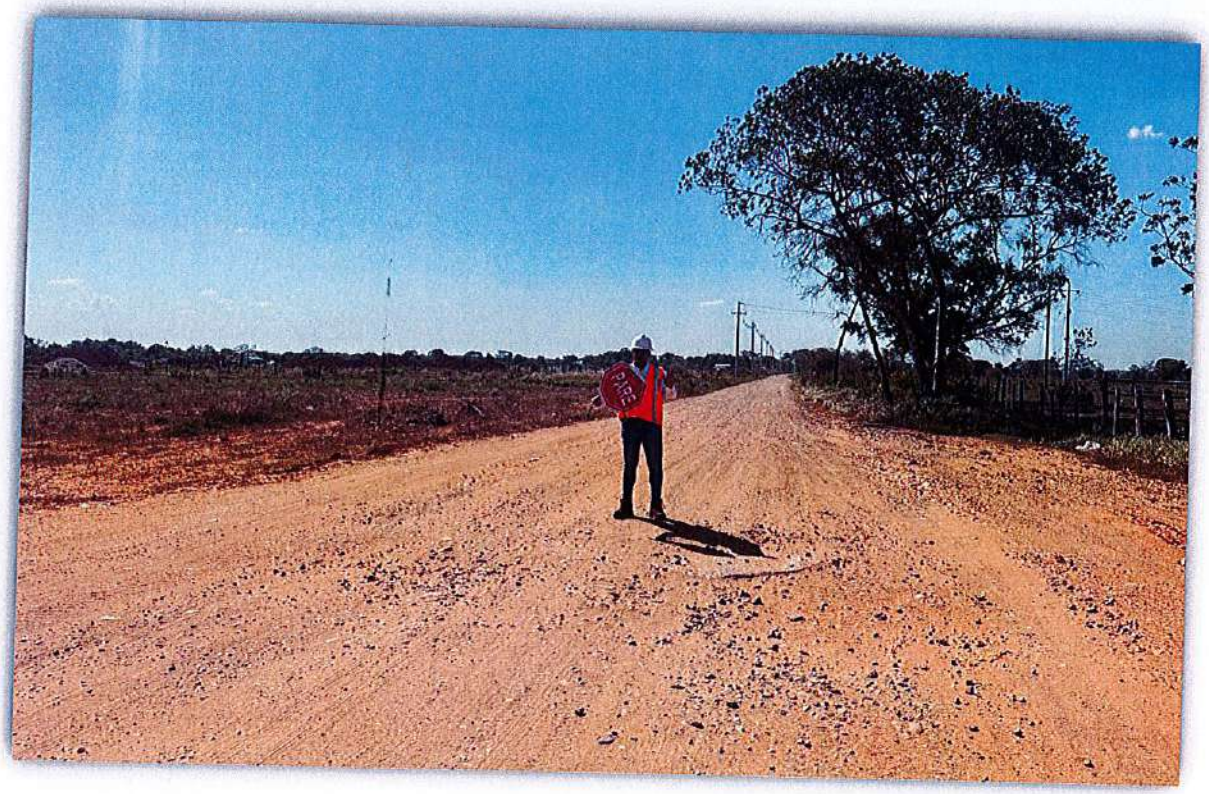

CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ENERO 2026
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVOS 4
OBJETIVO GENERAL 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 5
1.1 FICHA TECNICA 5
2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6
2.1 TRAMOS A INTERVENIR 7
2.2 DURACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO EN LA VÍA 9
2.3 CONDICIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS 9
2.4 VOLÚMENES DE TRÁNSITO 9
3 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 10
3.1 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA 10
3.2 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 11
4 AVANCE PRESUPUESTO PMT 13
5 CONCLUSIONES 15

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información general del proyecto 5
Tabla 2. Tramos a intervenir en PPAMM 7

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Instalación de señalización vial para canalización del tránsito vehicular 10
Ilustración 2. Señalización y demarcación de zonas de excavación 11
Ilustración 3. Valor ejecutado presupuesto del PMT a corte de parcial 21 15

INTRODUCCIÓN

En desarrollo del contrato de obra pública No. 041 del 15 de noviembre de 2023, se elabora el presente informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la implementación del Plan de Manejo de Transito durante la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El plan busca garantizar y brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, implementando las estrategias y alternativas establecidas en el Plan de Manejo de Transito- PMT para la regulación del tránsito y necesarias para minimizar el impacto en la movilización de los usuarios de las vías causado por la ejecución de la obra.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Mitigar el impacto generado por las obras durante la construcción del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los conductores, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Generar el menor impacto en la movilidad en los tramos viales intervenidos para la ejecución de la obra
- ✓ Procurar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores.
- ✓ Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales.
- ✓ Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura.
- ✓ Implementar rutas alternativas con elementos de control y operación del tránsito.
- ✓ Prestar atención continua a la seguridad en las vías dentro del área de influencia de la obra en ejecución.

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 FICHA TECNICA

Tabla 1. Información general del proyecto

CONTRATO DE OBRA No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. ROBERTO ANDRÉS RÍOS FIGUEROA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23
DIRECTOR DE OBRA:	ING. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
RESIDENTE DE OBRA:	ING. NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 83.611.009.207,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%):	$ 41.805.504.603,50
PLAZO:	VEINTICUATRO (24) MESES
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PR-HK R/L OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ
DATOS DEL CONSORCIO	
DIRECCIÓN	CONDOMINIO CASA VIEJA MANZANA A CASA 4
TELÉFONO	6334412
CORREO ELECTRÓNICO	consorciobendicion23@theos.com.co

2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Las actividades a desarrollar para efectos del cumplimiento del objeto del presente proyecto son las siguientes:

- Construcción de redes de alcantarillado sanitario
- Construcción pozos de inspección alcantarillado sanitario
- Construcción cámaras de inspección alcantarillado sanitario
- Construcción de acometidas domiciliarias de alcantarillado
- Construcción de estación de bombeo de aguas residuales (EBAR)
- Instalación de tubería a presión para línea de impulsión
- Construcción de caseta eléctrica para EBAR
- Instalación de red de media tensión para caseta eléctrica de EBAR
- Construcción de una subestación eléctrica
- Construcción de alumbrado público para zona de EBAR
- Implementación del Plan de Manejo Ambiental
- Implementación Plan de Manejo de Transito
- Certificado RETIE
- Certificado RETILAP

CONSORCIO BENDICIÓN 23

2.1 TRAMOS A INTERVENIR

✓ PLAN PARCIAL ALAMEDA MARTHA MOJICA (PPAMM)

Tabla 2. Tramos a intervenir en PPAMM

No	Calle / Carrera	Desde	Hasta
1	Calle 90	Carrera 7 Oeste	Carrera 1
2	Calle 90A	Carrera 2A Oeste	Carrera 1
3	Calle 90B	Carrera 2A Oeste	Carrera 1C Oeste
4	Calle 90C	Carrera 2A Oeste	Carrera 1C Oeste
5	Calle 91	Transversal 1	Carrera 1C Oeste
6	Calle 90A	Carrera 1B Oeste	Carrera 1
7	Calle 90B	Carrera 1B Oeste	Carrera 1
8	Transversal 1	Carrera 4 Oeste	Carrera 1
9	Calle 90C	Carrera 7B Oeste	Carrera 7 Oeste
10	Calle 92	Carrera 7B Oeste	Carrera 4 Oeste
11	Calle 92B	Carrera 7B Oeste	Carrera 4 Oeste
12	Calle 92B BIS	Carrera 8 Oeste	Carrera 3 Oeste
13	Calle 92C	Carrera 7A Oeste	Carrera 3 Oeste
14	Calle 93	Carrera 7A Oeste	Carrera 3 Oeste
15	Calle 93A	Carrera 7A Oeste	Carrera 7 Oeste
16	Calle 93B	Carrera 7 Oeste	Carrera 3 Oeste
17	Calle 94	Carrera 7A Oeste	Carrera 3 Oeste
18	Calle 94A	Carrera 7 Oeste	Carrera 3 Oeste
19	Calle 94B	Carrera 7 Oeste	Carrera 3 Oeste
20	Calle 95	Carrera 8 Oeste	Carrera 1
21	Calle 95A	Carrera 7 BIS Oeste	Carrera 4 Oeste
22	Calle 95B	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
23	Calle 95C	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
24	Calle 95D	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
25	Calle 96	Carrera 7 BIS Oeste	Carrera 4 Oeste
26	Calle 96A	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
27	Calle 97	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
28	Calle 97A	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
29	Calle 97B	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
30	Transversal 3 Oeste	Calle 92	Calle 92B BIS
31	Transversal 3A Oeste	Carrera 4 Oeste	Calle 92B BIS

No	Calle / Carrera	Desde	Hasta
32	Carrera 8	Calle 90	Calle 95
33	Carrera 7B Oeste	Calle 90C	Calle 92B
34	Carrera 7A Oeste	Calle 90C	Calle 95
35	Carrera 7 BIS Oeste	Calle 90C	Calle 92B
36	Carrera 7 BIS Oeste	Calle 93A	Calle 95
37	Carrera 7 BIS Oeste	Calle 95A	Calle 96
38	Carrera 7 Oeste	Calle 90	Calle 97B
39	Carrera 6 Oeste	Calle 92	Calle 92B
40	Carrera 5 Oeste	Calle 92	Calle 92B
41	Carrera 4 Oeste	Calle 92	Calle 93
42	Carrera 4 Oeste	Calle 92B BIS	Calle 95
43	Carrera 6 Oeste	Calle 93	Calle 93B
44	Carrera 5 Oeste	Calle 93	Calle 93B
45	Carrera 4 Oeste	Calle 93	Calle 97B
46	Carrera 3B Oeste	Calle 93	Calle 93B
47	Carrera 3A Oeste	Calle 93	Calle 93B
48	Carrera 4 Oeste	Calle 90	Transversal 1
49	Carrera 3 Oeste	Calle 90	Transversal 1
50	Carrera 2A Oeste	Calle 90	Transversal 1
51	Carrera 2 Oeste	Calle 90	Calle 90C
52	Carrera 1C Oeste	Calle 90	Transversal 1
53	Carrera 1B BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
54	Carrera 1B Oeste	Calle 90	Transversal 1
55	Carrera 1B Oeste	Calle 90	Transversal 1
56	Carrera 1A BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
57	Carrera 1A Oeste	Calle 90A	Transversal 1
58	Carrera 1 BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
59	Carrera 1	Calle 90	Calle 95
57	Carrera 1A Oeste	Calle 90A	Transversal 1
58	Carrera 1 BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
59	Carrera 1	Calle 90	Calle 95

CONSORCIO BENDICIÓN 23

- ✓ **CIUDADELA LA BENDICIÓN**

En la ciudadela la bendición, se proyecta intervenir el 100% de las vías de esta zona. No se tiene listado de vías a intervenir debido a que a la fecha no se tienen nomenclaturas oficiales para este sector, por tanto, la ubicación de referencia utilizada esta plasmada en los planos de la etapa de formulación.

2.2 DURACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO EN LA VÍA

Las actividades de obra se realizarán durante 24 meses a partir del acta de inicio de obra. En el transcurso de las obras se dará ingreso y salida de volquetas y vehículos con materiales de construcción.

Los trabajos se ejecutarán durante las 07:00 y las 17:00 horas con cierre de la vía residencial, con el control y vigilancia del auxiliar de tránsito. Se laborará de lunes a sábado, en el horario diurno, siempre y cuando no se presenten imprevistos que generen atrasos en el cronograma de la obra y haga necesario realizar trabajos en horario nocturno, se dejara al final de cada día las zonas donde se estarán realizando trabajos con su respectiva señalización.

Los domingos no se trabajará, sin embargo, por razones de retrasos o situaciones particulares podrían llevarse a cabo algunas actividades constructivas, que se informarían con anterioridad.

2.3 CONDICIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS

El 100% de los tramos a intervenir se encuentran despavimentos, algunos tramos cuentan con mejoramientos, en condición general el nivel de servicio de los tramos es malo.

2.4 VOLÚMENES DE TRÁNSITO


Teniendo en cuenta la condición de las vías a intervenir, se tiene un volumen bajo de transitabilidad.

3 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

3.1 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA

Se instala de manera obligatoria la señalización en todos los accesos y áreas intervenidas de la obra, con el fin de no ocasionar accidentes o incidentes y/o interrumpir la movilidad vial de la zona de influencia del proyecto, adicionalmente se implementaron las señales verticales a lo largo de los tramos para informar a la comunidad de la ejecución de las actividades, los desvíos y las rutas para los peatones y ciclistas.

Ilustración 1. Instalación de señalización vial para canalización del tránsito vehicular

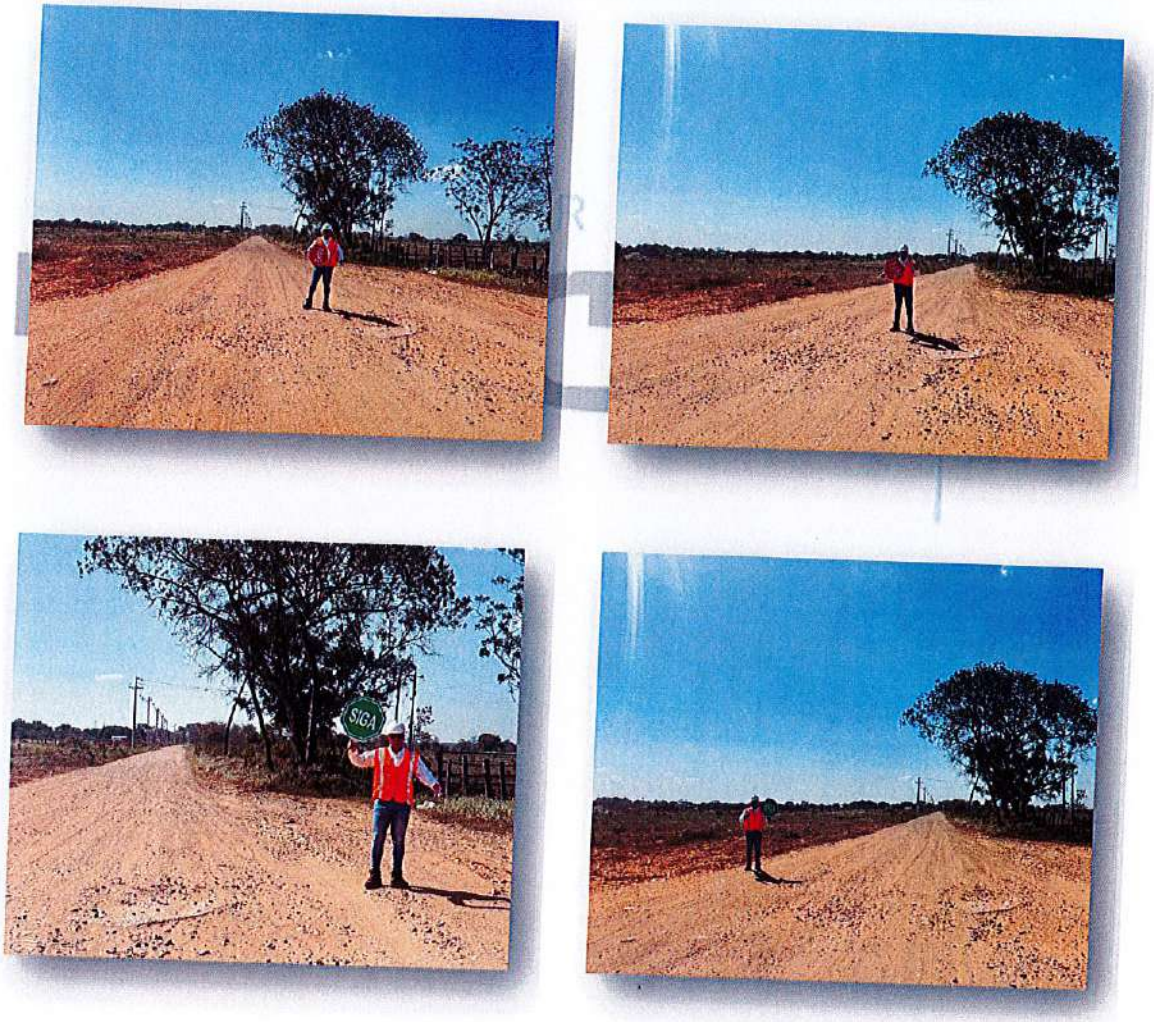

3.2 INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Durante el presente periodo se realizaron labores para la construcción del alcantarillado sanitario, las cuales comprenden la construcción de colectores en tubería polietileno de alta densidad de diámetros variados, se adelantó la construcción de cajas de inspección y demás actividades para la construcción de acometidas domiciliarias, además, se adelantan labores de construcción de pozos y cámaras de inspección. Paralelamente, se construyen acometidas domiciliarias. Cada actividad comprende las labores necesarias de replanteo y localización de tubería, excavación mecánica, excavación manual, encamado de la tubería con arena sucia de rio debidamente apisonada y relleno en material seleccionado de la excavación y/o material subbase triturada. Con el fin de prevenir accidentes laborales durante la ejecución de las actividades mencionadas anteriormente se realiza la demarcación y señalización de áreas de trabajo.

Ilustración 2. Señalización y demarcación de zonas de excavación











4 AVANCE PRESUPUESTO PMT

BALANCE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO												
PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDAD PARCIAL 21		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDAD POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) (A)										
	DISPOSITIVOS DE CONTROL										
1,1	Barricada metálica tipo IDU con cerrado reflectivo naranja y blanco grado Ingeniería, medidas: 2.40m x 1.50m - 3 bandejas de 20 cm x 2.40 m con tablero de desvió de 60 cm.	und	4,00	$ 707.407,00	$ 2.829.628,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.829.628,00	-	$ -
1,2	Paleta PARE - SIGA 45 cm	und	4,00	$ 72.282,00	$ 289.128,00	0,00	$ -	4,00	$ 289.128,00	-	$ -
1,3	Colombina o baliza de señalización H=1.30 m	und	20,00	$ 52.486,00	$ 1.049.720,00	0,00	$ -	20,00	$ 1.049.720,00	-	$ -
1,4	Barrera o maletín plástico rellenable (tipo New Jersey) 2.0 x 1.0 x 0.50 m	und	4,00	$ 540.809,00	$ 2.163.236,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.163.236,00	-	$ -
1,5	Cono de señalización vial, doble reflectivo H=70 cm	und	20,00	$ 61.638,00	$ 1.232.760,00	0,00	$ -	20,00	$ 1.232.760,00	-	$ -
1,6	Cinta de Señalización - peligro no pase -	m	2800,00	$ 68,00	$ 190.400,00	0,00	$ -	2.800,00	$ 190.400,00	-	$ -
	SEÑALIZACION										
1,7	Señales móviles de aproximación, con trípode tipo SIO, SP, SI, SR de (100x50 - 75x75 - 80x50) lámina galvanizada cal. 20 y ángulos de 1" x 1/2" x 1/8".	und	32,00	$ 278.941,00	$ 8.926.112,00	0,00	$ -	32,00	$ 8.926.112,00	-	$ -
	EQUIPOS VARIOS										
1,8	Chaleco reflectivo	und	8,00	$ 23.343,00	$ 186.744,00	0,00	$ -	8,00	$ 186.744,00	-	$ -
1,9	Pitos para auxiliares de transito	und	8,00	$ 5.900,00	$ 47.200,00	0,00	$ -	8,00	$ 47.200,00	-	$ -
1,10	Ploteo planos PMT específicos	und	10,00	$ 5.000,00	$ 50.000,00	1,00	$ 5.000,00	8,00	$ 40.000,00	1,00	$ 5.000,00

BALANCE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL							CANTIDAD PARCIAL 21		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDAD POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL		CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1,11	Papelería, impresión de informes	mes	12,00	$ 230.000,00	$ 2.760.000,00		1,00	$ 230.000,00	10,00	$ 2.300.000,00	1,00	$ 230.000,00
SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)					**$ 19.724.928,00**			**$ 235.000,00**		**$ 19.489.928,00**		**$ 235.000,00**
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CIERRES SIMULTANEOS	VR. UNITARIO	MESES							
	PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIARES DE TRANSITO Y BRIGADAS (B)											
1.12	Paleteros (2)	mes	2,00	$ 5.072.160,00	24	1,00	$ 243.463.680,00	1,00	$ 10.144.320,00	21,00	$ 213.030.720,00	3,00	$ 30.432.960,00
SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PERSONAL)							$ 243.463.680,00	1,00	$ 10.144.320,00	-	$ 81.154.560,00		$ 30.432.960,00
VALOR COSTOS DIRECTOS (A) + (B)							$ 263.188.608,00		$ 10.379.320,00	-	$ 232.520.648,00		$ 30.667.960,00
VALOR TOTAL PMT (AJUSTADO AL PESO)							**$ 263.188.608,00**		**$ 10.379.320,00**		**$ 232.520.648,00**		**$ 30.667.960,00**

Firma:

DIRECTOR DE OBRA
DANIEL GIL CHAPPARO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL


Firma:

RESIDENTE DE OBRA
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C. 1.015.417.280 DE BOGOTA

5 CONCLUSIONES

✓ A la fecha de la presente parcial se ha ejecutado un 88.35% del valor total del presupuesto del PTM, tal como se relaciona en la siguiente gráfica:

Ilustración 3. Valor ejecutado presupuesto del PMT a corte de parcial 21

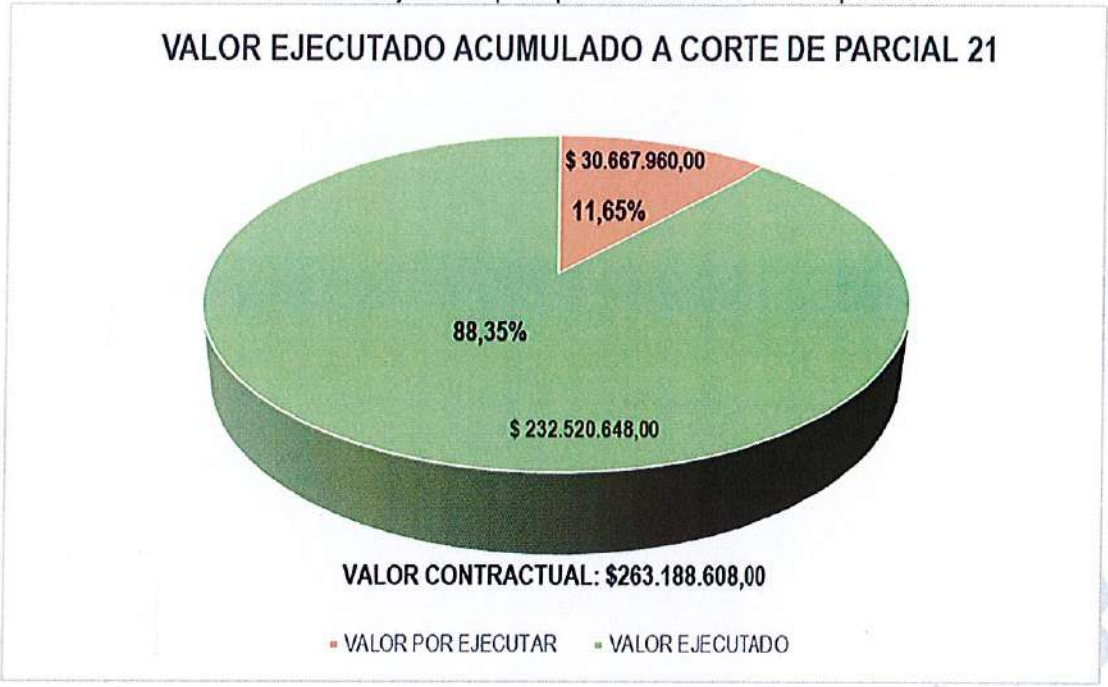

✓ A la fecha, no se han presentado inconvenientes ni accidentes en la ejecución del presente plan de manejo de tránsito.

Firma:

DIRECTOR DE OBRA
DANIEL GIL CHAPPARO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

RESIDENTE DE OBRA
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C. 1.015.417.280 DE BOGOTA

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el informe parcial No.21 se llevaron a cabo acciones relacionadas con la ejecución de la obra. Estas acciones incluyeron:

  - **Construcción de acometidas domiciliarias:** Se adelantan actividades de construcción de acometidas domiciliarias donde se incluye construcción de cajas domiciliarias y empalme entre las cajas y el colector principal ubicado frente a cada vivienda, a su vez, se realizaron actividades de reparación de placas de concreto y algunas acometidas de agua potable, gas y energía eléctrica que se vieron afectadas producto de los trabajos.

  - **Pozos de inspección:** Se han construido pozos de inspección con diámetro de 1.50 y alturas que varían entre 1.0 y 7.0 metros. Estos pozos son esenciales para el mantenimiento y la supervisión de las redes de tuberías sanitarias, permitiendo un acceso seguro y eficiente para las inspecciones y reparaciones necesarias. La construcción de estos pozos incluye la excavación, el refuerzo de las paredes, la instalación de tapas de manhole.

  - **Construcción de placa superior de EBAR:** Se realizaron actividades de amarre de acero y fundación de placa superior del Nivel 0.00 de la EBAR.

  - **Tubería de impulsión:** Se realizó instalación de tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=560 mm = 22" para la línea de impulsión que va desde la EBAR hasta la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal.

  - **Paso elevado línea de impulsión:** Se realizo construcción de paso elevado de la línea de impulsión sobre el caño USIVAR.

- A la fecha del informe parcial No.21, se ha logrado un avance del 83,30%. Es importante señalar que, según el cuadro de avance de obra, han transcurrido 688 días, lo que corresponde al 94,12% del tiempo desde la fecha de inicio del contrato.

- En cuanto al plan de manejo integral de salud ocupacional, ambiental y seguridad industrial, a la fecha se cuenta con personal de mano de obra calificada, a este personal contratado se le han realizado las respectivas afiliaciones a ARL y EPS, se les realizó su respectivo pago

de seguridad social, se les realizo entrega de dotación y EPP's y se realizaron charlas preoperacionales periódicas.

- En cuanto al avance al plan de plan de gestión social para el presente periodo, se ha anexado un informe donde se detalla el manejo social que se le ha dado al proyecto.

Firma:

DIRECTOR DE OBRA
DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

RESIDENTE DE OBRA
NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA
C.C. 1.015.417.280 DE BOGOTA

CONSORCIO BENDICIÓN 23
