Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: PM-FT-01** **Versión: 05** Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				**Agosto 27 de 2025**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	9:00 am	**Hora de finalización**	10:00 pm
	27	08	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Carlos Andrés Vasquez	Fundación Pies Descalzos
Juan Andrés Lemus	Director Financiero y de Infraestructura educativa - Fundación Pies Descalzos
Gina Acosta	Fundación Pies Descalzos
Claudia Arzayús	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional
Enrique Bolívar	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional- Supervisor Convenio.
Jose Luis Obando	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional
Carolina Sanchez	Jefe Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento convenio de Asociación CO1.PCCNTR 6493103 con la Fundación de Pies Descalzos y la Secretaría de Educación de Uribia, dentro de la cual nos desplazaremos hasta la Alta Guajira para visitar la IE. Villa Fátima, compromiso de presidencia regiones.

Documento Confidencial

TEMAS TRATADOS	
1	Las sedes que se van a atender en es convenio y los respectivos alcances definidos: **I.E. Villa Fátima sede principal**, ubicada en el corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, matrícula de 559 estudiantes para los estudiantes de 5 a 11 grado, se requieren 22 aulas, baterías sanitarias, aula múltiple, cocina. Institución educativa que esta en un compromiso de Regiones de Presidencia. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 240 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple, cocina (revisión). **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi, corregimiento de Villa Parashi**, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 696 estudiantes, se requieren 15 aulas adicionales, aula múltiple, cocina (estudio). **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, corregimiento de Villa Parashi, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 350 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple, cocina (estudio) **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, zona rural, tiene matrícula 2.300 estudiantes, se requiere 46 aulas y baterías sanitarias. **I.E. Norberto Iguaran nuevo lote** en la pista para preescolar en el municipio de Maicao I.E. para

	preescolar. 6 aulas, baterías sanitas, un aula múltiple con cocina y sala profesores. **I.E. Simón Bolívar**, en el municipio de Belén de Bajirá, 6 aulas, baterías sanitarias 1 aula multiuso y zona administrativa **IE colegio nuevo Tibú** : 14 aulas Básica media, 12 aulas Básica Primaria, 6 aulas preescolar, 7 baterías sanitarias, 1 Comedor, 1Cocina, 1 Biblioteca, 1 Laboratorio Física, 1 Laboratorio Química, 2 aulas de tecnología2 aulas polivalentes, 1 sala profesores, 1 Área administrativa, 1 Enfermería, Áreas recreativas, Parqueaderos y Dotación de todos los espacios con mobiliario y dotación cocina. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana** de Nortechón del municipio de Uribia. Alcance, Dos (2) áreas recreativas, de las cuales una lleva cubierta (Cancha multiuso).
2	**Avances de los proyectos:** **IE colegio nuevo Tibú**, vereda la Cuatro, el porcentaje de avance ejecución **100 %**, septiembre 2025, Pendiente fechas de acto protocolario. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, este proyecto se está ejecutando por etapas para que se pueda continuar prestando el servicio, el porcentaje de avance ejecución **85%**, se estima finalizar en el mes de septiembre 2025. Estamos en fase de baterías sanitarias, son 6 bloques en esta primera etapa. **I.E. Villa Fátima sede principal**, el porcentaje de avance ejecución **99.5%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, se estima finalización en el mes de septiembre 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, se estima finalización en el mes de junio 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda. **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi**, **el p**orcentaje de avance ejecución **75 %**, están en etapa de cimentación y están en etapa de fundición de placas, se está replanteando en terreno un bloque, se estima finalización en el mes de octubre 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda, ya los estudios muestran que no hay agua, se esta revisando otras posibilidades. **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, levantamiento de muros, se estima finalización en el mes de septiembre 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda. **I.E. Norberto Iguaran municipio de Maicao**, el porcentaje de avance ejecución **30%**, en epata de cimentación , se estima finalizar en el mes de octubre-noviembre 2025. **I.E. Simón Bolívar, Belén de Bajirá** el porcentaje de avance ejecución 35**%**, en epata de construcción de zapatas . se estima finalizar en el mes de octubre-noviembre 2025. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón** del municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución 5**%**, se estima finalizar en el mes de

	noviembre 2025. **Adición de recursos:** Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua Sede Principal Carasua, ya se cuenta con licencia de construcción, se inicia tramites de logística para inicio de obras.
3	Nuevos proyectos (8) validados por el Despacho del Ministro y que se presentan a comité para ser beneficiados con los recursos adicionados al convenio y de los cuales 7 proyectos están priorizados en comité No. 6 de Infraestructura Educativa y uno que será llevado al próximo comité, para ser financiados con los recursos adicionados al convenio: **Municipio de Uribia:** • Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua Sede Principal Carasua • Institucion Educativa Alfonso Lopez Pumarejo Sede Mariela Ines Ipuana • Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa Sede Principal Sutalu • Institucion Etnoeducativa Integral Rural Mapuain Sede Principal Mapuain **Municipio Riohacha:** • Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia • Institucion Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero **Municipio Fonseca:** • Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Perez sede institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez **Quibdó - Chocó:** • IE Antonio Ricaurte sede principal
4	Con respecto al cambio de sede Se informa que se realizó la consulta a cobertura del MEN sobre la matricula de la sede Aralia, de acuerdo a la solicitud realizada por el Sed Riohacha en el cual solicita hacer un cambio de sede para ser atendida por el MEN. De acuerdo a reporte que nos envían con matrícula, de acuerdo al SIMAT la matricula a crecido en los últimos años, no se ve el decrecimiento de la matricula. Se debe revisar el tema con matrícula y ETC para tomar una decisión sobre si se va a realizar este cambio o se disminuiría el alcance del mismo.
5	Carasua ya cuenta con licencia, la idea es avanzar en toda la logística, por temas de ola invernal, poder empezar a llevar materiales para iniciar, en el caso se Mampuain tener cuidado con los temas de la comunidad, está en trámite de licencias. De acuerdo con la visita realizada a

	Carasua, el alcance estimado que se propone es 24 aulas, 7 espacios para dormitorio, comedor (aula multiple), cocina, baterías sanitarias, biblioteca y enfermería, esto puede ser alrededor de 3700 m², con un estimado de alrededor de $10.000 millones, este dato aun es muy preliminar.
6	Nuevos proyectos (8) validados por el Despacho del Ministro y presentados al comité para ser beneficiados con los recursos adicionados al Convenio CO1.PCCNTR 6493103, de los cuales 7 proyectos están priorizados en comité No. 6 de Infraestructura Educativa y uno que será llevado al próximo comité, para ser financiados con los recursos adicionados al convenio: **Municipio de Uribia:** • Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua Sede Principal Carasua • Institucion Educativa Alfonso Lopez Pumarejo Sede Mariela Ines Ipuana • Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa Sede Principal Sutalu • Institucion Etnoeducativa Integral Rural Mapuain Sede Principal Mapuain **Municipio Riohacha:** • Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia • Institucion Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero **Municipio Fonseca:** • Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Perez sede institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez **Quibdó – Chocó:** • IE Antonio Ricaurte sede principal Los proyectos mas importante para iniciar es Carasua , Mampuain y Ipuena y para la Fundación Incluir el proyecto de Quibdó.
7	Se solicita enviar el informe del mes de agosto de 2025, incluido el informe de ejecución financiera en el formato MEN.
8	Se le solicitó la SED Uribia para que vaya iniciando el envío de la documentación de las sedes priorizadas, para diligenciar los formatos de viabilidad y se procedieron la topografía y estudios de suelos y Carasua lleva los diseños más adelantados. Ya se cuenta con información de Riohacha y Fonseca. Una reunión con la Armada para apoyar en logística para el proyecto de Carasua y poder apoyar llevar materiales al proyecto y que es lo que genera mayores costos de transporte. Por ahora el cemento no estaría por temas de cuidado en el trasporte por agua. Enrique solicita revisar el tema de poder instalar energía solar en una de las aulas en las cuales el MEN instalo unos temas de tecnología.


9	Las tres prioridades en este momentos para iniciar obras son Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua Sede Principal Carasua, Institucion Etnoeducativa Integral Rural Mapuain Sede Principal Mapuain, sede visitada por el Ministro y el IE Antonio Ricaurte sede principal del municipio de Quibdó. Para el tema de Mampuain se revisa el alcance y la implantación de las aulas, se establece que se deberán demoler algunos espacios para implantar las nuevas aulas. Revisar y hacer una propuesta para reemplazar sobre lo que ya está para hacer una intervención integral, bloques pequeños para dar forma al proyecto. Se solicita socializar y consensuar el alcance y diseños con la rectora.
10	El mobiliario ya se encuentra en Uribia y estaría pendiente de su distribución.
11	Revisar para el colegio de Tibú y que pueda convertirse en Colegio Universidad, si esto se da llegaría el ISER, Juan Andres pone en contexto a La jefe de la Oficina de Infraestructura informando la ubicación se la sede, la cual está en un lote de Ecopetrol que cedió a la Alcaldía de Tibú 12 hectáreas, el colegio ocupa 2 hectáreas.
12	Para Mapuain, se solicita el tema de instalación de paneles solares para las aulas de tecnología donde se instaló la oficina de innovación hace unos días. Se indica que varios de los espacios en esta sede ya cuentan con paneles solares. La Fundacion revisara el tema al igual que la implantación. Instalar en la zona de servicios y zona tic.
13	Se deberá presentar el ejercicio para el tema de Aralia para poder definir con el Despacho. Propuesta de disminuir el alcance con 4 aulas comedor cocina, podría ser una propuesta.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se programa próximo comité técnico para el 27-08-2025
2	Proyectos están en estudios y diseños, implantaciones, se va avanzando en Mampuain y Quibdó.
3	Se definen los (8) nuevos proyectos validados por el Despacho del Ministro y presentados al comité para ser beneficiados con los recursos adicionados al Convenio CO1.PCCNTR 6493103, de los cuales 7 proyectos están priorizados en comité No. 6 de Infraestructura Educativa y uno que será llevado al próximo comité
4	Se solicita enviar el informe del mes de agosto de 2025, incluido el informe de ejecución financiera en el formato MEN
5	Revisar para el colegio de Tibú y que pueda convertirse en Colegio Universidad, si esto se da llegaría el ISER, Juan Andres pone en contexto a La jefe de la Oficina de Infraestructura informando la ubicación se la sede, la cual esta en un lote de Ecopetrol que cedió a la Alcaldía de Tibú 12 hectáreas, el colegio ocupa 2 hectáreas.
6	Se programará una mesa de trabajo con la ETC Uribia para temas de matrícula para Juyasirain, para saber como van a establecer el tema del servicio educativo, para temas de Calidad. Nos informa Juan que la rectora de esta sede renunció.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

	Hora de inicio	Hora de finalización	NOMBRE2	DOCUMEN	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRÓNI	CELULAR
1	8/27/25 9:37:09	8/27/25 10:24:24	GINA PAOLA ACOSTA	52253646	FUNDACION PIES DESC	COORDINADORA ADM	tesoreria@fpd.ong	3175016109
2	8/27/25 10:23:43	8/27/25 10:24:25	José Luis Obando Martínez	98389954	MEN	Profesional Especializ	jobando@mineducaci	3203696384
3	8/27/25 10:23:32	8/27/25 10:24:27	JUAN ANDRES LEMUS	13542371	FUNDACION PIES DESC	DIRECTOR FINANCIERC	juanandres@fpd.ong	3175130552
4	8/27/25 10:24:03	8/27/25 10:25:13	CLAUDIA ARZAYUS	38655368	MEN	OFICINA DE INFRAESTF	carzayus@mineducaci	3164417801
5	8/27/25 10:24:00	8/27/25 10:25:16	Carlos Andrés Vásquez Quinter	79797289	Fundación Pies Descal	Arquitecto	carlosv@carlosvasque	3204938181
6	8/27/25 10:23:35	8/27/25 10:39:22	Enrique Bolívar Guzmán	79811735	Ministerio de Educació	Profesional Especializ	ebolivar@mineducaci	3167486156

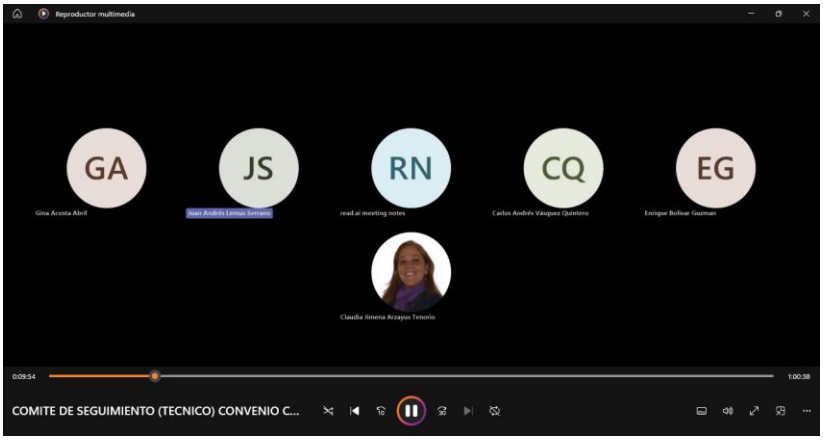

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)
N/A

No Controlado


Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Se establece informe mensual de avance físico y financiero del proyecto del mes de agosto 2025	30-08-2025	La Fundación


ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	


Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Registro Fotografica avcances proyecto:



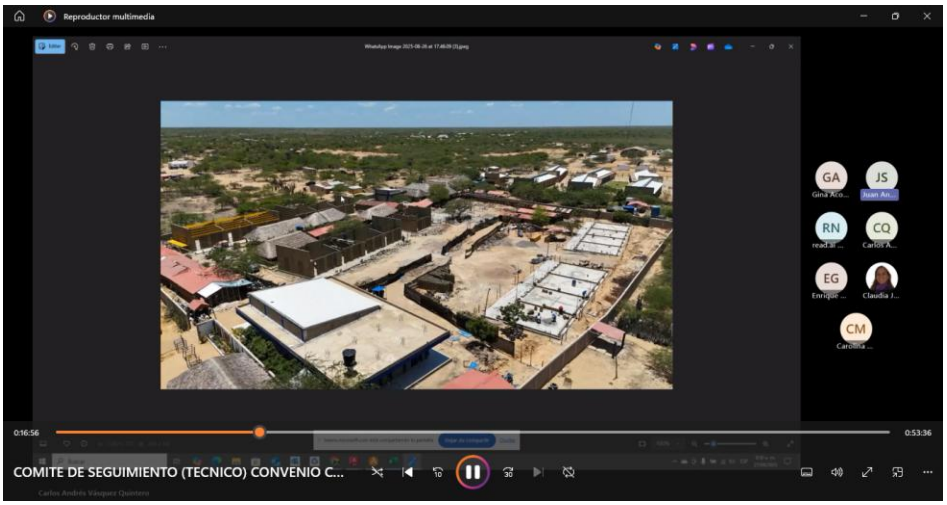


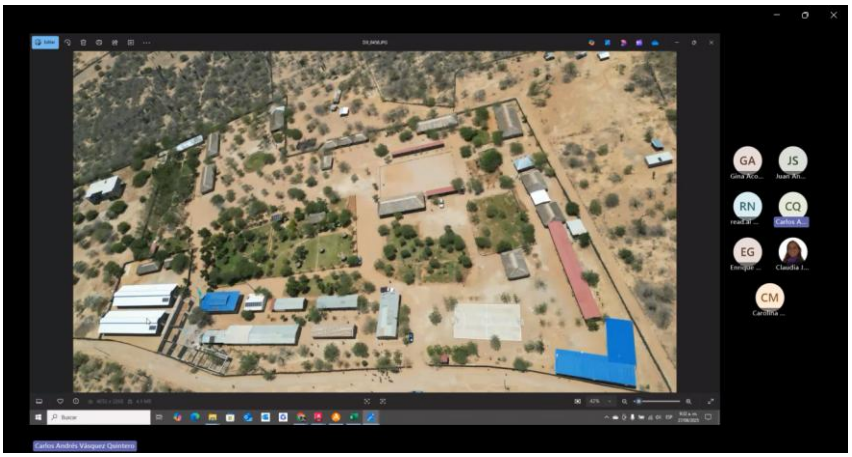

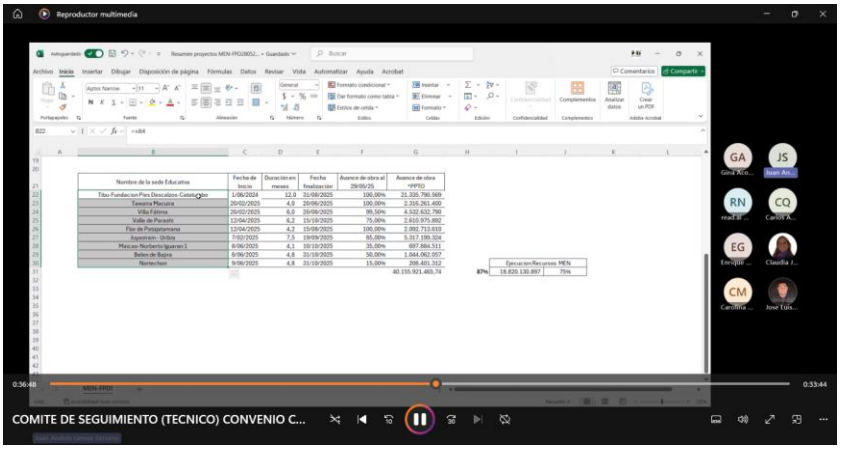
Reproductor multimedia
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...

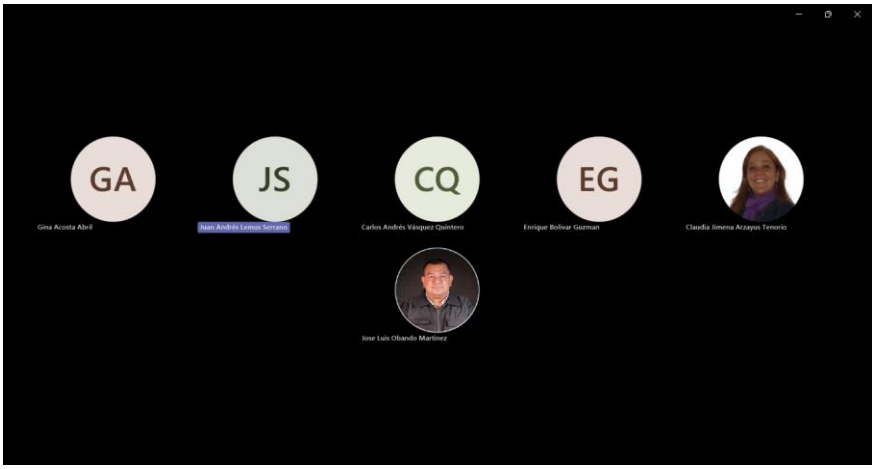
GA
JS
CQ
EG
Gina Acosta Abril
Juan Andrés Lemus Serrano
Carlos Andrés Vásquez Quintero
Enrique Bolivar Guzman
Claudia Jimena Arzayus Tenorio
Jose Luis Obando Martinez
