Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: PM-FT-01** **Versión: 05** Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				**Visita Julio 31 de 2025**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	9:00 am	**Hora de finalización**	10:00 pm
	31	07	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Carlos Andrés Vasquez	Fundación Pies Descalzos
Juan Andrés Lemus	Director Financiero y de Infraestructura educativa - Fundación Pies Descalzos
Claudia Arzayús	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional
Enrique Bolívar	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional- Supervisor Convenio.
Jose Luis Obando	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento nuevo convenio de Asociación CO1.PCCNTR 6493103 con la Fundación de Pies Descalzos y la Secretaría de Educación de Uribia, dentro de la cual nos desplazaremos hasta la Alta Guajira para visitar la IE. Villa Fátima, compromiso de presidencia regiones.

No Clasificada

TEMAS TRATADOS	
1	Las sedes que se van a atender en es convenio y los respectivos alcances definidos: **I.E. Villa Fátima sede principal**, ubicada en el corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, matrícula de 559 estudiantes para los estudiantes de 5 a 11 grado, se requieren 22 aulas, baterías sanitarias, aula múltiple, cocina y pozo de agua profunda (revisiones). Institución educativa que esta en un compromiso de Regiones de Presidencia. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 240 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple, cocina y pozo de agua profunda (revisión). **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi, corregimiento de Villa Parashi**, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 696 estudiantes, se requieren 15 aulas adicionales, aula múltiple, cocina y pozo de agua profunda (estudio). **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, corregimiento de Villa Parashi, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 350 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple, cocina y pozo de agua profunda (estudio) **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, zona rural, tiene matrícula 2.300 estudiantes, se requiere 46 aulas y baterías sanitarias. **I.E. Norberto Iguaran nuevo lote** en la pista para preescolar en el municipio de Maicao I.E. para preescolar. 6 aulas, baterías sanitas, un aula múltiple con cocina y sala profesores. **I.E. Simón Bolívar**, en el municipio de Belén de Bajirá, 6 aulas, baterías sanitarias 1 aula

	multiuso y zona administrativa **IE colegio nuevo Tibú** : 14 aulas Básica media, 12 aulas Básica Primaria, 6 aulas preescolar, 7 baterías sanitarias, 1 Comedor, 1Cocina, 1 Biblioteca, 1 Laboratorio Física, 1 Laboratorio Química, 2 aulas de tecnología2 aulas polivalentes, 1 sala profesores, 1 Área administrativa, 1 Enfermería, Áreas recreativas, Parqueaderos y Dotación de todos los espacios con mobiliario y dotación cocina. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana** de Nortechón del municipio de Uribia. Alcance, Dos (2) áreas recreativas, de las cuales una lleva cubierta (Cancha multiuso).
2	**Avances de los proyectos:** **IE colegio nuevo Tibú**, vereda la Cuatro, el porcentaje de avance ejecución **99,5 %**, se estima finalizar y entregar la primera semana de julio 2025, faltan obras de urbanismo y mampostería, carpintería bloque 11. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, este proyecto se está ejecutando por etapas para que se pueda continuar prestando el servicio, el porcentaje de avance ejecución **77%**, se estima finalizar en el mes de septiembre 2025. Estamos en fase de baterías sanitarias, son 6 bloques en esta primera etapa. **I.E. Villa Fátima sede principal**, el porcentaje de avance ejecución **90%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, se estima finalización en el mes de julio 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, se estima finalización en el mes de junio 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda. **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi**, **el p**orcentaje de avance ejecución **50 %**, están en etapa de cimentación y están en etapa de fundición de placas, se está replanteando en terreno un bloque, se estima finalización en el mes de octubre 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda. **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, el porcentaje de avance ejecución **90%**, levantamiento de muros, se estima finalización en el mes de septiembre 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda. **I.E. Norberto Iguaran municipio de Maicao**, el porcentaje de avance ejecución **7%**, en epata de cimentación , se estima finalizar en el mes de octubre-noviembre 2025. **I.E. Simón Bolívar, Belén de Bajirá** el porcentaje de avance ejecución 20**%**, en epata de construcción de zapatas . se estima finalizar en el mes de octubre-noviembre 2025. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón** del municipio de Uribia, se aprobó la licencia de construcción, inicia la última semana de julio 2025.

3

Se presenta balance financiero con corte al acta informando los recursos comprometidos para cada uno de los proyectos a la fecha de la siguiente manera

Sede	DANE sede	Número de Estudiantes	Aulas Requeridas	Área Neta Aulas	Área Construida Comedor con Cocina	Otras áreas, circulaciones, baterías sanitarias y	Área Neta Construida Aprox	Valor total Diseño y Construcción	Valor Diseño y Construcción/ mts2	Valor Adicionales, pozo de agua, dotación	Valor Total Proyecto
Por definir Nombre		1.080	36	2376	1500	5724	9.600,00	20.530.790.569	2.138.624	805.000.000	21.337.929.193
TAGUAIRA	244847800501	265	8	582,48	186,84	46,21	815,53	2.039.753.532	2.501.139	268.800.000	2.311.054.671
SEDE PRINCIPAL VILLAFATIMA	444847000134	583	22	1601,82	366,91	61,22	2.029,95	4.331.752.686	2.133.921	414.400.000	4.748.286.607
SEDE PRINCIPAL VALLE DE PARASHI	244847004041	760	15	1092,15	463,31	61,2	1.616,66	3.399.927.798	2.103.057	168.000.000	3.570.030.855
SEDE PRINCIPAL ALIAPA	244847800312	370	8	582,48	278,81	53,32	914,61	2.077.257.806	2.271.195	89.600.000	2.169.129.002
SEDE PRINCIPAL JUYASIRAIN	244847800037	3.178	46	3349,26	0	122,44	3.471,70	5.954.655.681	1.715.199	515.200.000	6.471.570.880
SEDE NORBERTO IGUARAN WEEBER	144430002505	210	6	582,48	309	46,21	937,69	1.904.355.746	2.030.901	89.600.000	1.995.986.647
IE SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL	227615001311	842	6	490,14	162,32	65,93	718,39	1.964.924.114	2.735.177	67.200.000	2.034.859.291
SEDE PRINCIPAL	244847800054	1.200	0			1138	1.138,00	1.366.942.080	1.201.179		1.368.143.259
		8.488	**149**	**10.657**	**3.267**	**6.181**	**21.243**	**43.570.360.012**	**2.051.091**	**2.417.800.000**	**46.006.990.404**

Valor Total	46.335.790.569
Diferencia	328.800.165

4

Se realizó visita técnica del convenio al proyecto de Belén de Bajirá el 29 de julio de 2025, en el cual se realizó recorrido por la obra con la Fundación, ETC Chocó y el MEN.

5

Ya se cuenta con diseño de la cancha cubierta para el compromiso de Nortechón, se está tramitando la licencia de construcción, se estima un valor de $ 1.368 millones, se estima tener licencia este mes de julio 2025.

No Clasificado

6

Se revisa a fondo el estado de la obra del colegio nuevo de Tibú, trabajo en obras urbanismo, sembrando pasto, matas, faltan algunos espejos y alguna ventanearía, las jardineras están sembradas, nivelaciones de terreno, finalizando los espacios deportivos, nos muestra registro fotográfico, se dejarán zonas verdes con mobiliario de bancas y cubos en concreto como amoblamiento. El mobiliario escolar ya esta allí y se está realizando la dotación de libros y computadores. Pendiente de la fecha de entrega. Informan que se realizó paro minero y ha causado atrasos en materiales.

7


En relación al tema de los pozos de agua profunda, en I.E Villa Fátima sede Taguaira, el estudio mostró que hay agua por lo cual se va a hacer el pozo de agua profunda, para las sedes I.E Villa Fátima sede principal, I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi y I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana, definitivamente la tomografía mostró que no hay agua por lo cual no es posible hacer pozos de agua profunda, por lo cual se están trabajando con pozos artesanales con gente de la región.

Se empieza a trabajar en la sede de Carasua, la cual nos informaron que sería la primera priorizada dentro de los recursos de adición, se envió a la UG FFIE oficio para informar que esta se va a ejecutar dentro del convenio CO1.PCCNTR 6493103, se está a la esperando la lista definitiva de los priorizados del despacho para avanzar en la prefactibilidad, los estudios y diseños de las nuevas sedes. Durante el seguimiento a obras en la Alta Guajira, se aprovechó la visita de seguimiento a la Alta Guajira, se realizó visita a la I.E. Carasua, se estima que el alcance que se propone es 24 aulas, comedor, cocina, baterías sanitarias, biblioteca, enfermería y dormitorio, esto puede ser alrededor de 3700 m², con un estimado de alrededor de $10.000

	millones, este dato aun es muy preliminar.
8	A la fecha se han venido realizando algunas visitas con la Fundación Pies Descalzos y la ETC Uribia durante las visitas de seguimiento al convenio. Adicionalmente estas tres (3 sedes), para apoyar este tema de que ya se revisó que están priorizadas en la base anexa del convenio y dentro de la base Actual de priorizaciones de la Oficina de infraestructura y en el caso de esta sede, ya fue aprobada en Comité No. 6 de Infraestructura Educativa: Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena Carasua Madre Laura Institución Ematrículaiva Integral Rural Isidro Ibarra Fernandez
9	Se solicita enviar el informe del mes de julio de 2025, incluido el informe de ejecución financiera en el formato MEN.
10	Se programa próximo comité técnico para el 13-08-2025 (visita de seguimiento)
11	Se realizará la propuesta al Despacho para realizar la entrega y acto protocolario de Villa Fátima sede principal, Villa Fátima sede Taguaira y Centro Etnoeducativo Integral Rural Valle de Parashi, propuesta la tercera o cuarta semana del mes de agosto 2025.
13	Se ira avanzando para solicitar a la ETC Uribia la documentación de Carasua sin levantar expectativas con la comunidad.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se está en trámite de licencia para el proyecto de las Dos (2) áreas recreativas, de las cuales una lleva cubierta (Cancha multiuso) **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón** del municipio de Uribia
3	Presentar al Despacho listado de sedes visitadas para la definición de los proyectos a atender con la adición de recurso al convenio.
4	Se programa próximo comité técnico para el 13-08-2025
5	Se solicita enviar el informe del mes de julio de 2025, incluido el informe de ejecución financiera en el formato MEN.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se establece informe mensual de avance físico y financiero del proyecto del mes de julio 2025	15-08-2025	La Fundación

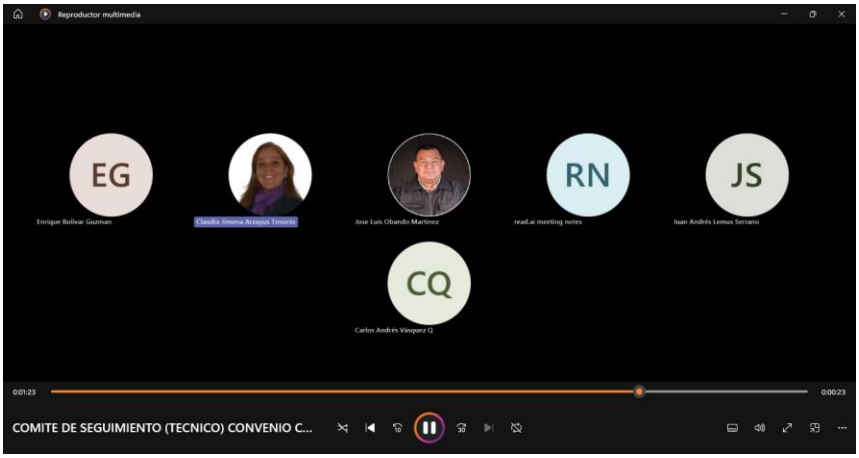

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)
N/A

No Clasificada

Licencia proyecto de las Dos (2) áreas recreativas, de las cuales una lleva cubierta (Cancha multiuso) **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón** del municipio de Uribia	15-08-2025	La Fundación y la ETC Uribia

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor		**Servidor**	

Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificada
