Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: PM-FT-01** **Versión: 05** Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				**Acta de Seguimiento**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	9:30 am	**Hora de finalización**	10:30 pm
	7	10	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Carlos Andrés Vasquez	Fundación Pies Descalzos
Juan Andrés Lemus	Director Financiero y de Infraestructura educativa - Fundación Pies Descalzos
Claudia Arzayús	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional
Gina Acosta Abril	Apoyo Administrativo y Financiero Fundación Pies Descalzos

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento convenio de Asociación CO1.PCCNTR 6493103 con la Fundación de Pies Descalzos para " Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de la infraestructura educativa", que van dirigidos a los departamentos de La Guajira y Norte de Santander.

No verificado

TEMAS TRATADOS	
1	Las sedes que están siendo atendidas el convenio y los respectivos alcances definidos: **I.E. Villa Fátima sede principal**, ubicada en el corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, matrícula de 559 estudiantes para los estudiantes de 5 a 11 grado, se requieren 22 aulas, baterías sanitarias, aula múltiple (comedor), cocina, dotación y pozo de agua profunda (revisiones). Institución educativa que esta en un compromiso de Regiones de Presidencia. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 240 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple (comedor), cocina, dotación y pozo de agua profunda. **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi, corregimiento de Villa Parashi**, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 696 estudiantes, se requieren 15 aulas adicionales, aula múltiple (comerdor), cocina y pozo de agua profunda (estudio). **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, corregimiento de Villa Parashi, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 350 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple (comedor), cocina, dotación y pozo de agua profunda (estudio) **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, zona rural, tiene matrícula 2.300 estudiantes, se requiere 46 aulas, dotación y baterías sanitarias. **I.E. Norberto Iguaran nuevo lote** en la pista para preescolar en el municipio de Maicao I.E. para preescolar. 6 aulas, baterías sanitas, un aula multiuso (Comedor) con cocina y sala profesores.

	I.E. Simón Bolívar, en el municipio de Belén de Bajirá, 6 aulas, baterías sanitarias 1 aula multiuso, dotación y zona administrativa **IE colegio nuevo Tibú** : 14 aulas Básica media, 12 aulas Básica Primaria, 6 aulas preescolar, 7 baterías sanitarias, 1 Comedor, 1Cocina, 1 Biblioteca, 1 Laboratorio Física, 1 Laboratorio Química, 2 aulas de tecnología2 aulas polivalentes, 1 sala profesores, 1 Área administrativa, 1 Enfermería, Áreas recreativas, Parqueaderos y Dotación de todos los espacios con mobiliario y dotación cocina. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana** de Nortechón del municipio de Uribia. Alcance, Dos (2) áreas recreativas, de las cuales una lleva cubierta (Cancha multiuso). **Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua**, Matrícula de 730 estudiantes. Alcance: 24 aulas, 7 espacios para alojamiento,1 Aula Taller Lectura, 1 Administración y Enfermería, Baterías Sanitarias, comedor cocina y dotación.
2	**Avances de los proyectos:** **IE colegio nuevo Tibú**, vereda la Cuatro, el porcentaje de avance ejecución **100%**, Finalizó el 31 de agosto 2025. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, este proyecto se está ejecutando por etapas para que se pueda continuar prestando el servicio, el porcentaje de avance ejecución **95%**, se estima finalizar en el mes de octubre 2025. Estamos en fase II. **I.E. Villa Fátima sede principal**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, se estima finalización en el mes de septiembre 2025. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, finalizó en el mes de julio 2025. Se está finalizando el pozo de agua profunda. **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi**, **el p**orcentaje de avance ejecución **90 %**, están en etapa de cubiertas, se estima finalización en el mes de octubre 2025. **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, levantamiento de muros, se estima finalización en el mes de agosto 2025. **I.E. Norberto Iguaran municipio de Maicao**, el porcentaje de avance ejecución **70 %,** en epata de cimentación , se estima finalizar en el mes de novirmbre 2025. **I.E. Simón Bolívar, Belén de Bajirá** el porcentaje de avance ejecución **65%**, terminado armado de vigas y empiezan a fundir vías aéreas, se estima finalizar en el mes de noviembre 2025. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón** del municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución **40%**, la cubierta para instalar llega a mediado de septiembre, se estima finalizar en el mes de octubre 2025. **Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua**, Alta Guajira Municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución **7%,** están en replanteo, excavaciones,

	fundiendo vigas de cimentación y las primeras placas, se estima fecha de terminación febrero 2026. Se ha avanzado en el tema de la armada para el apoyo con transporte de materiales a la zona. **Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Manpuain**, Ya se cuenta com licencia de Construcción, el porcentaje de avance ejecución 3**%,** processo de movimento de Tierra y excavaciones. **En estudios y diseños:** **Municipio Uribia** • I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia expedida Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia expedida **Municipio Rioacha:** Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia en trâmite, Inicio obras noviembre- diciembre. Institución Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero, , estudios diseños 100% y cuenta con Licencia en trámite, Inicio obras noviembre- diciembre, **Municipio Fonseca:** • Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia expedida Inicio obras noviembre- diciembre **Quibdó – Chocó:** • IE Antonio Ricaurte sede principal, cuenta con licencia vigente y alcance del proyecto, este es menor al prediseñado, comedor cocina, biblioteca, zona administrativa y dos aulas polivalentes, para varios usos. Cuenta con los estudios y diseños, se estima iniciar en el mes de noviembre.
3	Juan Andres informa que los proyectos que se están finalizando están siendo entregados a la comunidad con acta para ser puestas de uso de manera inmediata y poder aprovechas estas infraestructuras. Se solicita nos puedan enviar copia de las actas de entrega de I.E. Villa Fátima sede principal, I.E. Villa Fátima sede Taguaira, I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana. Pendiente de La I.E. Pues Descalzos Tibú – Catatumbo a que se realice entrega oficial. Se solicita el envío de las actas de socialización de los proyectos del último trimestre.
4	Nos informan que ya la dotación fue en las obras finalizadas en las sedes de la Alta Guajira.

No clasificado

5	Se informa que el Viceministerio de Superior John Espitia solicita acompañamiento para realizar visita al proyecto de Tibú con las IAS interesadas en el tema de colegio universidad patra Tibú posiblemente para última semana de octubre 2025.
6	Se establece programar visita de seguimiento a la Guajira en el mes de octubre de 2025, una vez lo permita la temporada de lluvias.
7	Se solicita enviar los informes de septiembre 2025, y los formatos de seguimiento financieros, actas de entrega y acta de socialización de los proyectos.
8	Se continua a la espera de que el Despacho informe la fecha del acto protocolario el acto protocolario de Villa Fátima sede principal, Villa Fátima sede Taguaira y Centro Etnoeducativo Integral Rural Valle de Parashi.
9	Se recomienda el tema de pago en el mes de octubre ya se solicitó PAC, par lo cual estas pendientes dos de las licencias de construcción del municipio de Riohacha.
10	Las condiciones de los dos pagos pendientes son las siguientes: Un segundo desembolso por valor del 50% del valor aportado por el MEN contra la entrega de estudios, diseños, licencias y acta de inicio de los proyectos de la adición. Octubre **$ 8.050.000.000 (50%)** Un tercer desembolso por valor del 20 % del valor aportado por el MEN contra el 35 % de avance físico de las obras adicionales del proyecto. Diciembre **$ 3.220.000.000 (20%)**

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se está en trámite de licencia para losdos proyecto de Riohacha
2	Se solicita enviar informe del mes de Septiembre 2025 y los formatos financieros, este debe aportarse también al trámite de la cuenta.
3	Pendientes que el Despacho defina la fecha del acto protocolario de La Guajira, se estima para finales de octubre.
4	Se programa próximo comité técnico para el 29-10-2025
5	Se establece programar visita de seguimiento a la Guajira en el mes de octubre de 2025, una vez lo permita la temporada de lluvias.
6	


Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se establece informe mensual de avance físico y financiero del proyecto del mes de septiembre 2025	19-10-2025	La Fundación

La Sed Uribia envió el 6 de octubre las licencias de construcción de los proyectos (I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana, Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Mapuain y Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu del municipio de Uribia)	10-10-2025	La Fundación y la ETC Uribia
Se establece programar visita de seguimiento a la Guajira en el mes de octubre de 2025, una vez lo permita la temporada de lluvias.	31-10-2025	MEN, ETC Uribia y La Fundación
Tramite licencias proyectos de Riohacha		La Fundación y la ETC Riohacha

No Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

	Hora de inicio	Hora de finalización	NOMBRE2	DOCUME	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRÓNI	CELULAR
1	10/7/25 11:36:08	10/7/25 11:36:47	CLAUDIA ARZAYUS	38655368	MEN	OFICINA INFRAESTRUC	carzayus@mineducaci	3164417801
2	10/7/25 11:49:23	10/7/25 11:50:20	JUAN ANDRES	13542371	FUNDACIÓN PIES DESC	For financiero	juanandres@fod.ong	3175130552
3	10/7/25 12:00:51	10/7/25 12:01:48	Carlos Andrés Vásque	79797289	Fundación Pies Descal	Arquitecto	carlosv@carlosvasque	3204938181
4	10/7/25 11:46:31	10/7/25 12:15:00	José Luis Obando Mart	98389954	MEN	Profesional Especializ	jobando@mineducaci	3203696384

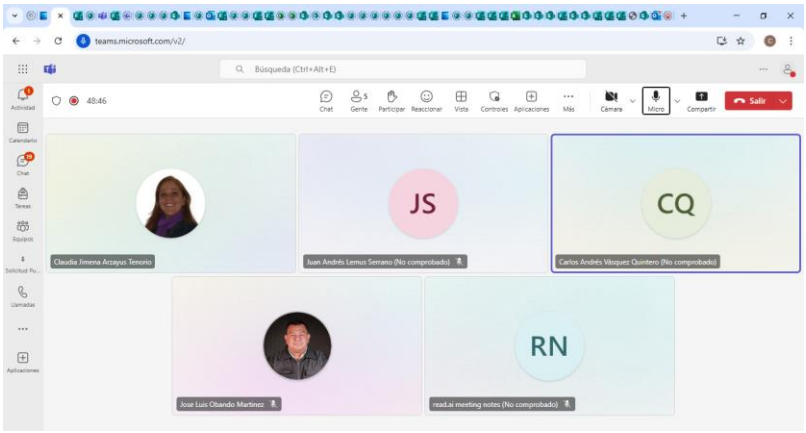


No Controlado


Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)
N/A

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	


Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	


I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain

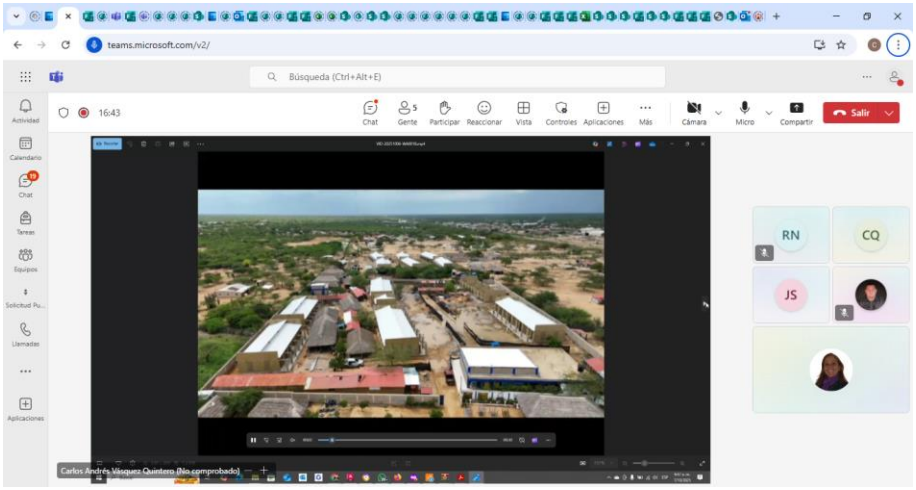

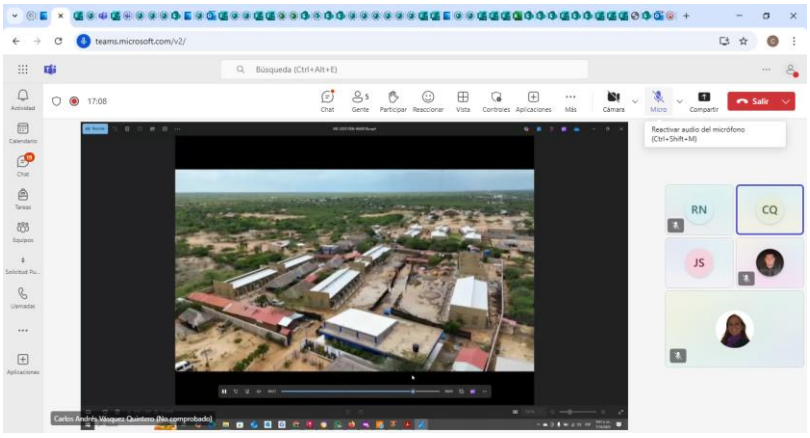



Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón

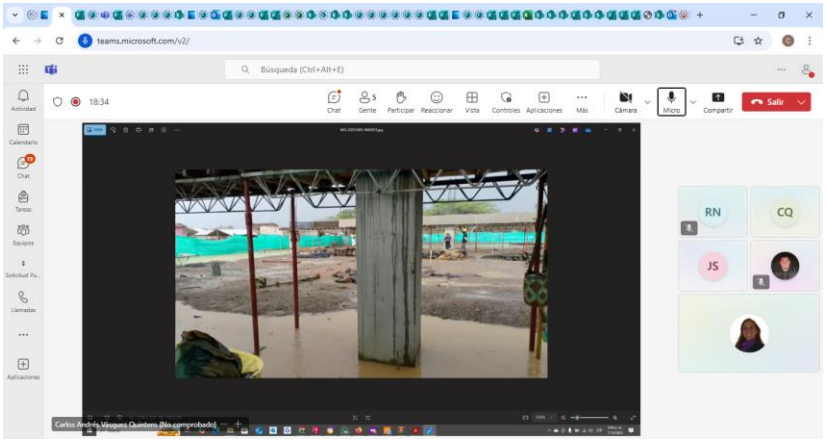


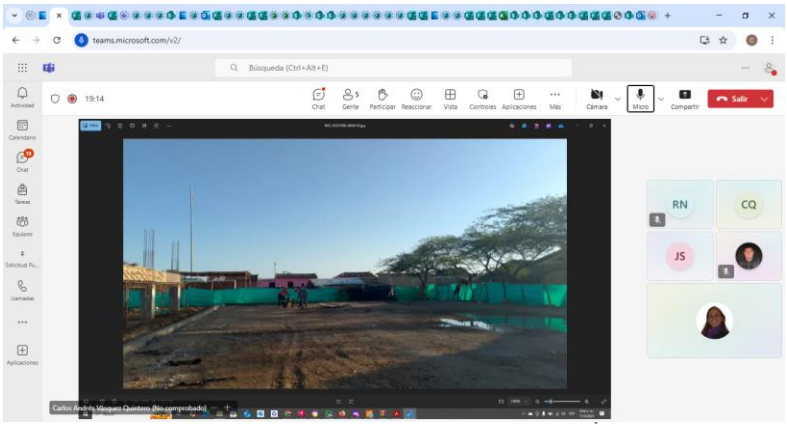



I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi

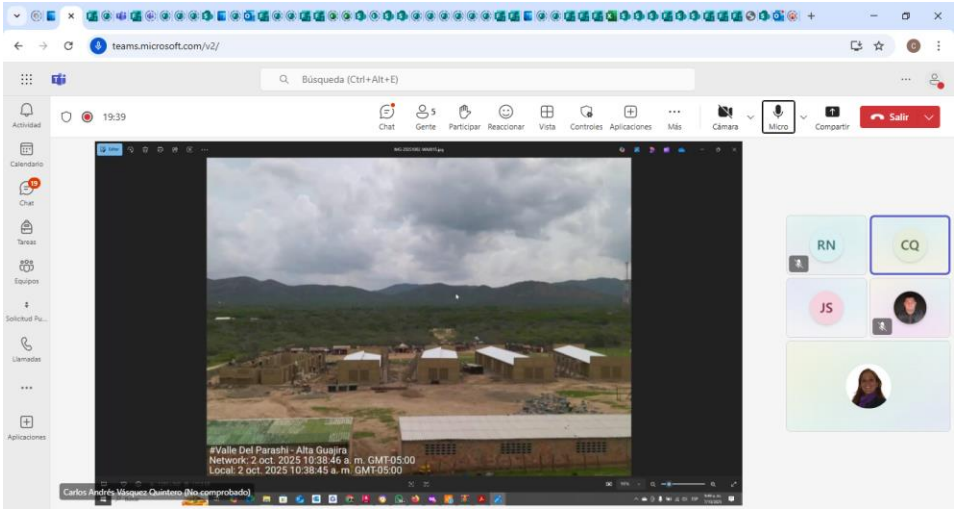

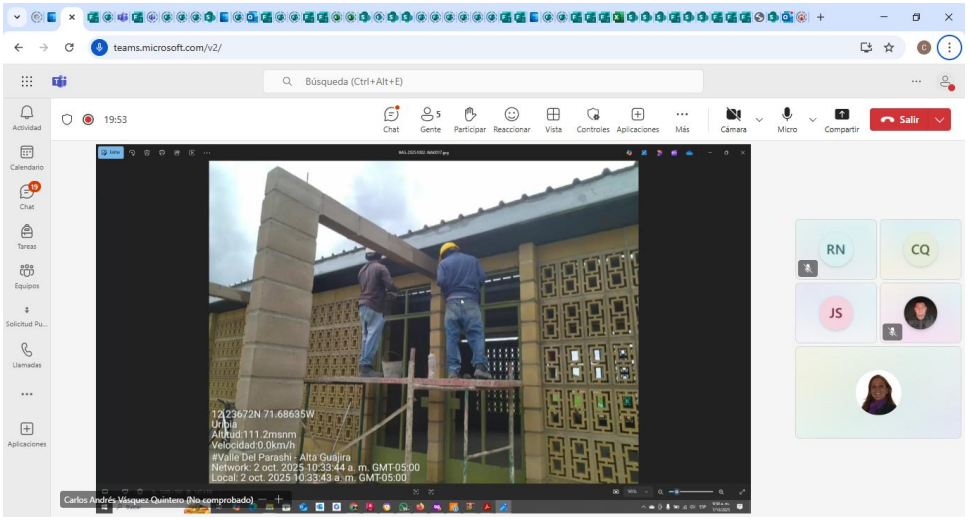

teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
19:53
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
RN
CQ
JS
12.23672N 71.68635W
Urbia
Altitud:111.2msnm
Velocidad:0.0km/h
#Valle Del Parashi - Alta Guajira
Network: 2 oct. 2025 10:33:44 a. m. GMT-05:00
Local: 2 oct. 2025 10:33:43 a. m. GMT-05:00
Carlos Andrés Vásquez Quintero (No comprobado)

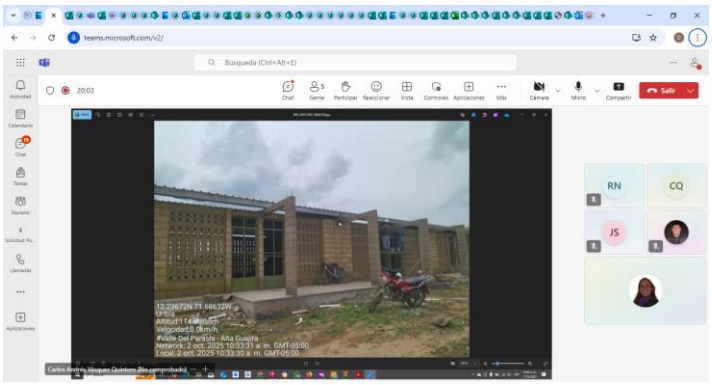

teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
20:03
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
RN
CQ
JS

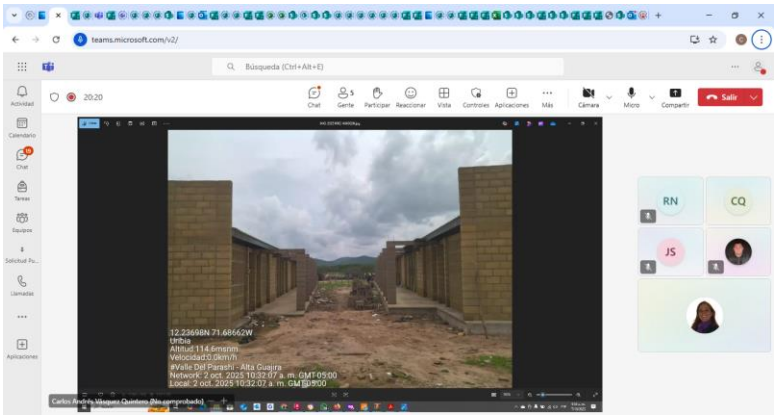
teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
20:20
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
RN
CQ
JS
12.23698N 71.68662W
Urbia
Altitud:114.6msnm
Velocidad:0.0km/h
#Valle Del Parashi - Alta Guajira
Network: 2 oct. 2025 10:32:07 a. m. GMT-05:00
Local: 2 oct. 2025 10:32:07 a. m. GMT-05:00

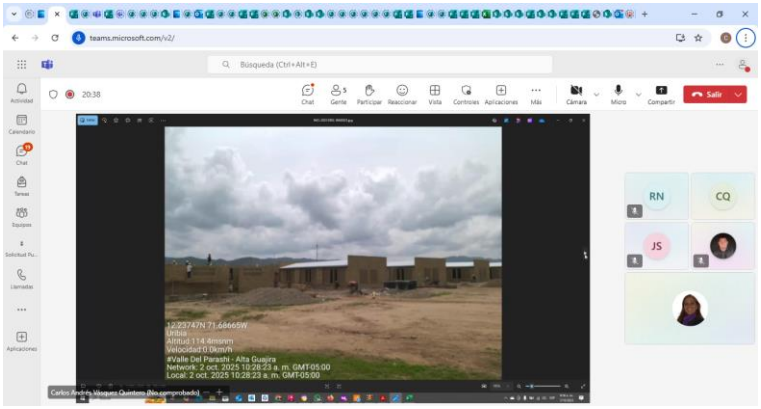



I.E. Norberto Iguaran municipio de Maicao

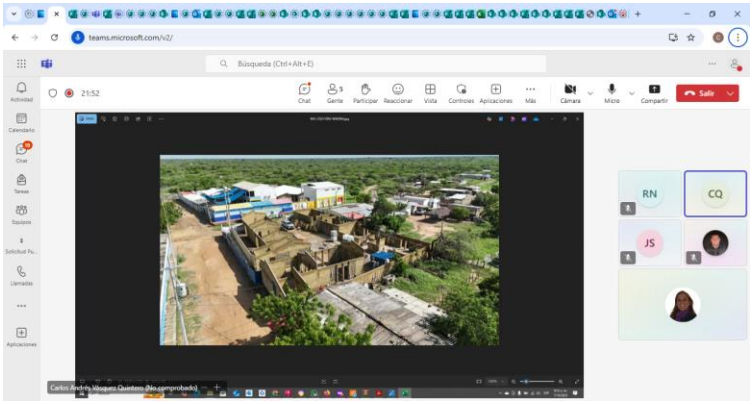


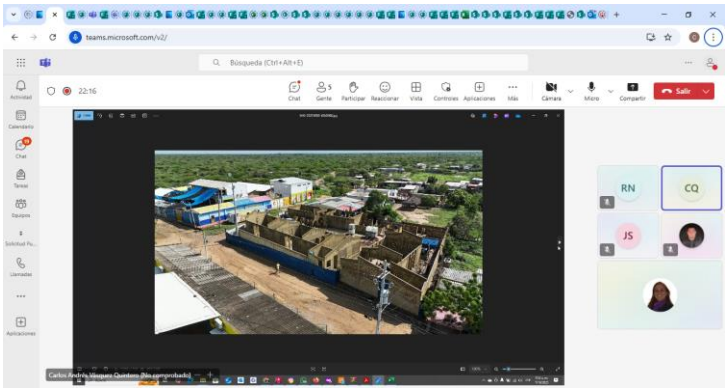


I.E. Simón Bolívar, Belén de Bajirá

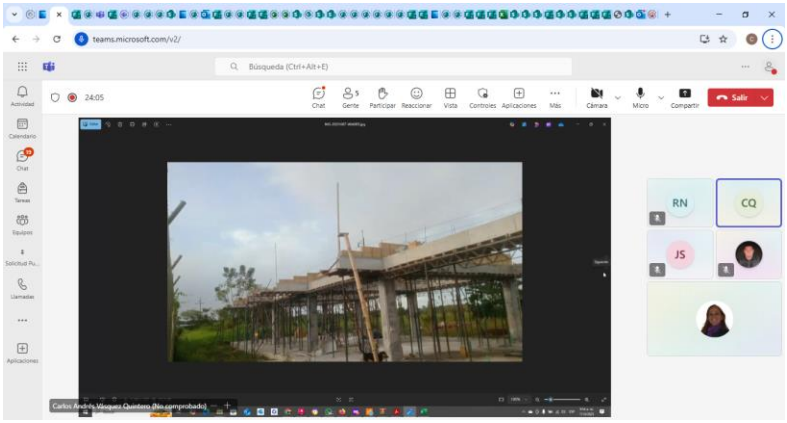


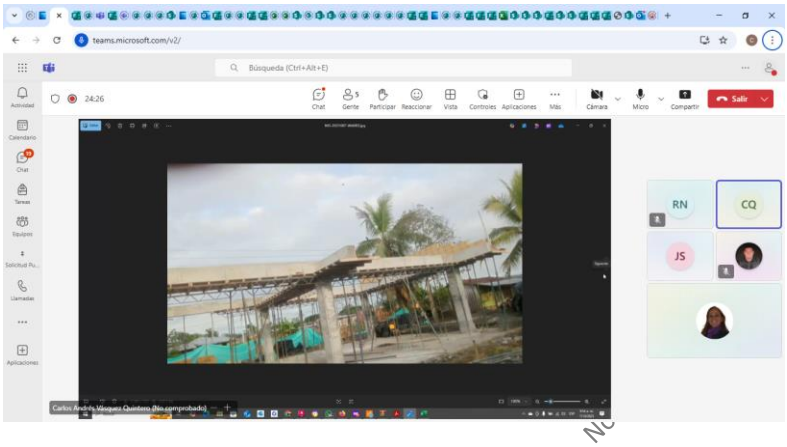


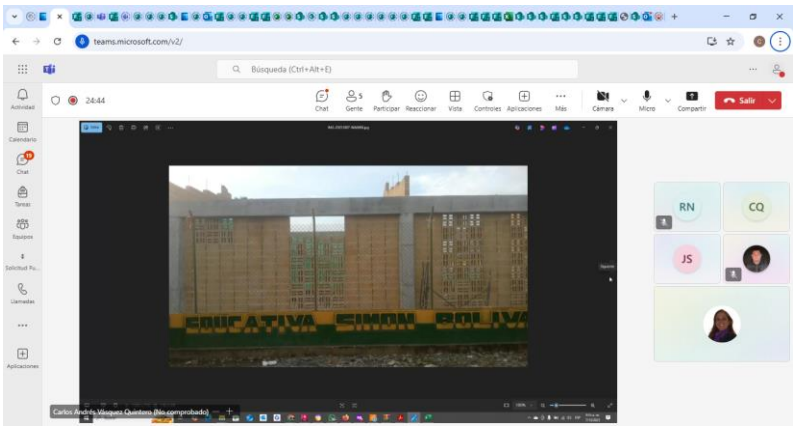


Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua

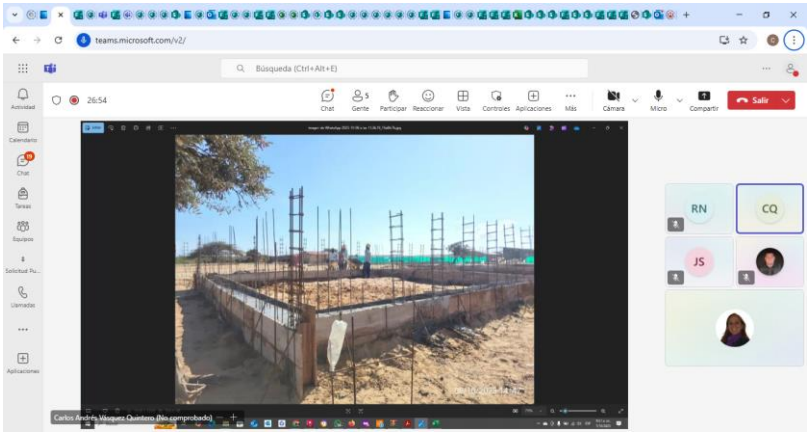

teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
26:54
Salir
RN
CQ
JS

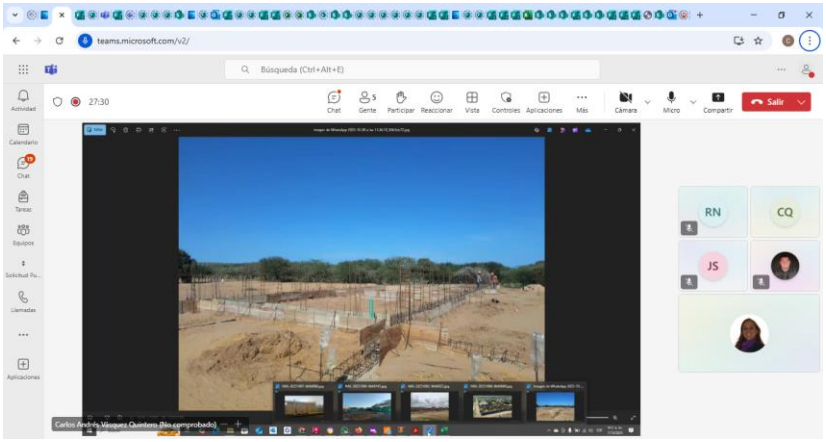

teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
27:30
Salir
RN
CQ
JS

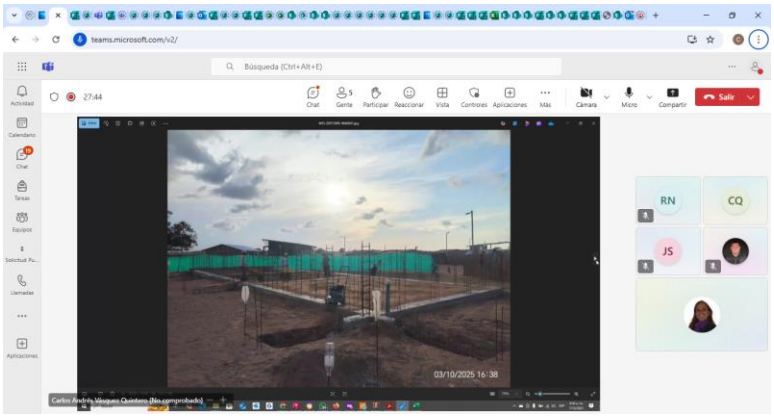
teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
27:44
Salir
RN
CQ
JS
03/10/2025 16:38

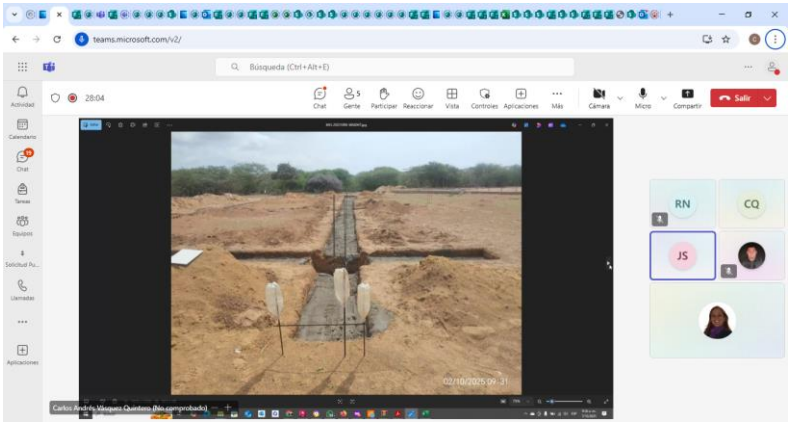


Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Manpuain,

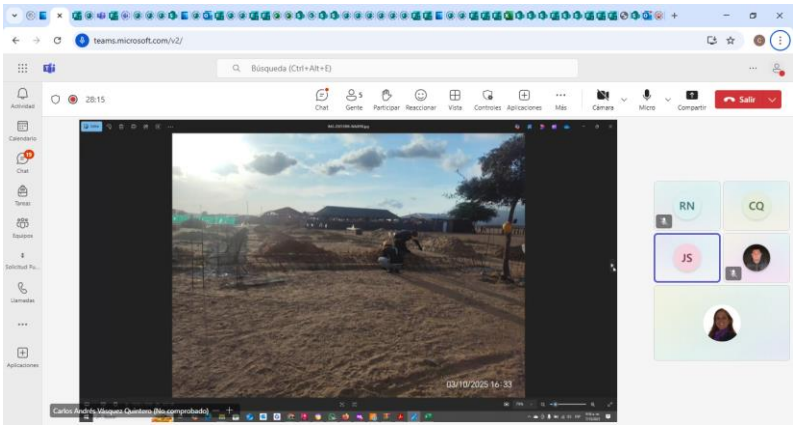

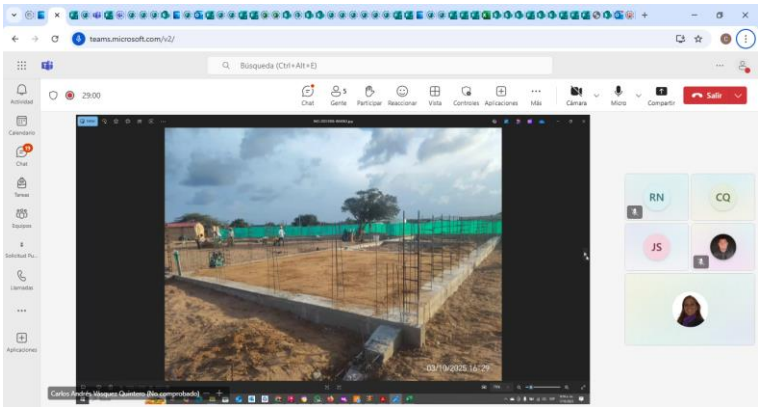

Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Manpuain,

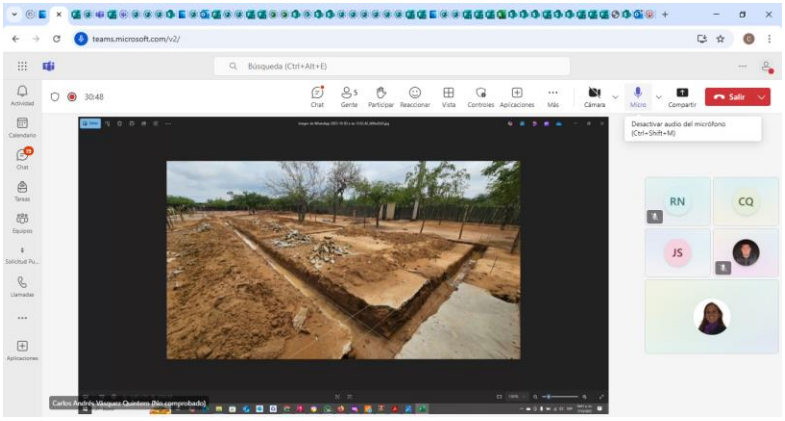

No Clasificado
