Educación

Somos la Revolución del Cambio

CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FUNDACIÓN PIES DESCALZOS
($ 46.335.790.569)
Adición recursos ($ 23.000.000)
Total Valor convenio
($ 69.335.790.569)

Proyecto Convenio Inicial, 9 proyectos:
La Guajira: Uribia (6) (zona Rural (2), Alta Guajira (4) y Maicao (1).
Norte de Santander: 1 Tibú
Chocó: 1 Belén de Bajirá

Proyectos Convenio Adición, 8 proyectos:
La Guajira: Uribia (zona rural (2), Alta Guajira (1), Riohacha (2) y Fonseca (1)
Chocó; Quibdó (1)

Finaliza 30-04-2026

CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103

Uribia: (Alta Guajira (4), zona rural (2):

- **I.E. Villa Fátima sede principal**, Alta Guajira Matrícula de 583 estudiantes. Alcance: 22 aulas, baterías sanitaria, aula múltiple, cocina y dotación (Área estimada de intervención 2.029 m2). Inversión estimada **$ 4.555.409.840**. Avance **100%** de ejecución, fechas de finalización septiembre 2025.

- **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, Alta Guajira matrícula 265 estudiantes. Alcance: 8 aulas, baterías sanitaria, aula múltiple, cocina y dotación (Área estimada de intervención 815 m2). Inversión estimada **$ 2.316.261.400** . Avance **100%** finalizada en julio 2025.

- **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi**, Alta Guajira matrícula 760 estudiantes. Alcance: 15 aulas adicionales, aula múltiple, cocina y dotación. (Área estimada de intervención 1.616 m2). Inversión estimada **$ 3.481.301.189** . Avance **90 %** ejecución, fechas estimada de finalización octubre 2025.

- **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, Alta Guajira matrícula 370 estudiantes. Alcance: 8 aulas adicionales, aula múltiple, cocina y dotación (Área estimada de intervención 914 m2). Inversión estimada **$ 2.092.713.610** . Avance **100%** finalizada en agosto 2025.

- **Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua**, Matrícula de 730 estudiantes. Alcance: 24 aulas, 7 espacios para alojamiento, 1 Aula Taller Lectura, 1 Administración y Enfermería, Baterías Sanitarias, comedor cocina y dotación, (Área estimada de intervención 4.123 m2). Inversión estimada **$ 9.738.910.720.** Avance **7 %** finalizada estimada febrero 2025.

CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103

- **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** zona rural, Matrícula 3.178 estudiantes. Alcance: 46 aulas, baterías sanitarias y dotaciones (Área estimada de intervención 3.471 m2). Inversión estimada $ 6.255.528.617 Avance **95 %** de ejecución, fechas estimada de finalización octubre 2025.

- **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón del municipio de Uribia.** , Matrícula 3.178 estudiantes. Alcance, Dos (2) áreas recreativas, de las cuales una lleva cubierta (Cancha multiuso) (Área estimada de intervención 1.138 m2). Inversión estimada **$ 1.389.342.080** . Avance **40%** de ejecución, fechas estimada de finalización octubre 2025.

- **Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Manpuain,** Ya se cuenta com licencia de Construcción, el porcentaje de avance ejecución **3%**, se estima finalizar febrero 2026.

Maicao

- **I.E. Norberto Iguaran municipio de Maicao** nuevo lote en la pista para preescolar en el municipio de Maicao, Alcance 6 aulas, baterías sanitas, un aula múltiple con cocina, sala profesores y dotación (Área estimada de intervención 937 m2). Inversión estimada **$ 1.993.955.746**. Avance **70%** fechas estimada de finalización octubre 2025.

.

CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103

Tibú

- **IE colegio nuevo Tibú:** Matrícula de 1.060 estudiantes. Alcance IE colegio nuevo Tibú : 14 aulas Básica media, 12 aulas Básica Primaria, 6 aulas preescolar, 7 baterías sanitarias, 1 Comedor, 1Cocina, 1 Biblioteca, 1 Laboratorio Física, 1 Laboratorio Química, 2 aulas de tecnología2 aulas polivalentes, 1 sala profesores, 1 Área administrativa, 1 Enfermería, Áreas recreativas, Parqueaderos y Dotación de todos los espacios con mobiliario y dotación cocina. (Área estimada de intervención 9.600 m2). Inversión estimada **$ 21.335.790.569**. Avance **100%** de ejecución, finalizada agosto 2025.

Belén de Bajirá

- **I.E. Simón Bolívar,** Matrícula 842 estudiantes Alcance: 6 aulas, baterías sanitarias 1 aula multiuso y zona administrativa (Área estimada de intervención 718 m2). Inversión estimada **$ 2.088.124.114** Avance **65 %** fechas estimada de finalización octubre 2025.

CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103

En estudios y diseños:

Municipio Uribia

- I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana, estúdios y diseños al 100% com licencia de Construcción.
- Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu, estúdios y diseños al 100% com licencia de Construcción.

Municipio Rioacha:

- Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia en trámite
- Institución Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia en trámite

Municipio Fonseca:

- Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez, estúdios y diseños al 100% com licencia de Construcción.

Quibdó – Chocó:

- IE Antonio Ricaurte sede principal, Cuenta con los estudios y diseños, se estima iniciar en el mes de noviembre.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTOS CONVENIO

CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103 COLEGIO NUEVO MUNICIPIO DE TIBÚ (TERMINADO SEPTIEMBRE 2025)













CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103 COLEGIO NUEVO MUNICIPIO DE TIBÚ (TERMINADO SEPTIEMBRE 2025)













CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103
COLEGIO NUEVO MUNICIPIO DE TIBÚ (TERMINADO)








CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103
I.E VILLA FÁTIMA SEDE PRINCIPAL
URIBIA- ALTA GUAJIRA (TERMINADO SEPTIEMBRE 2025)















CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103
I.E VILLA FÁTIMA SEDE TAGUAIRA
URIBIA- ALTA GUAJIRA (TERMINADO JULIO)

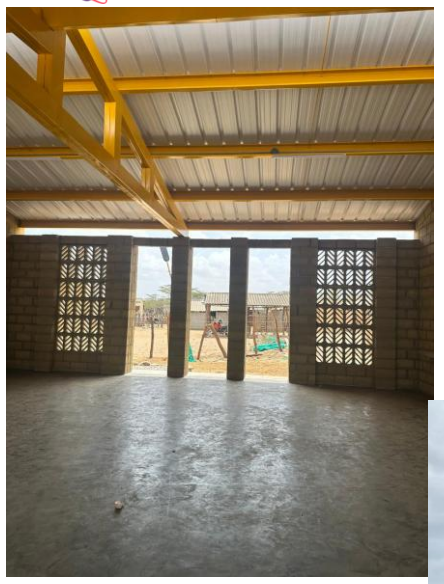

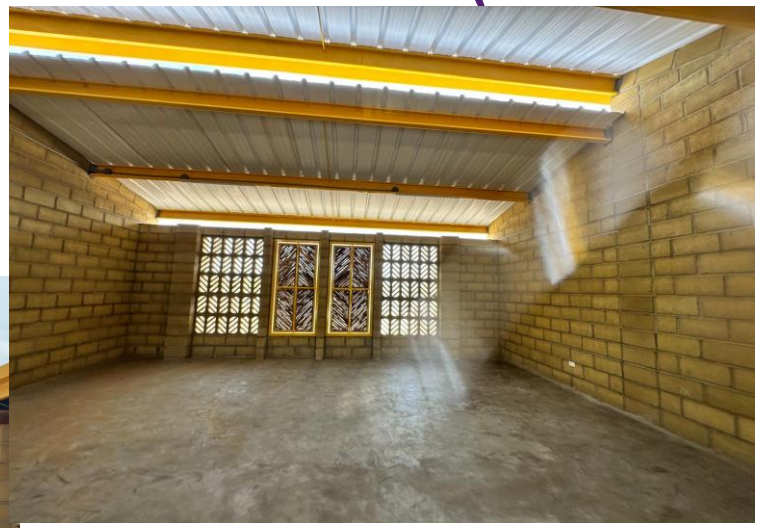












CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103
I.E. CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL LA FLOR DE PATAJATAMANA URIBIA- ALTA GUAJIRA (TERMINADO AGOSTO)










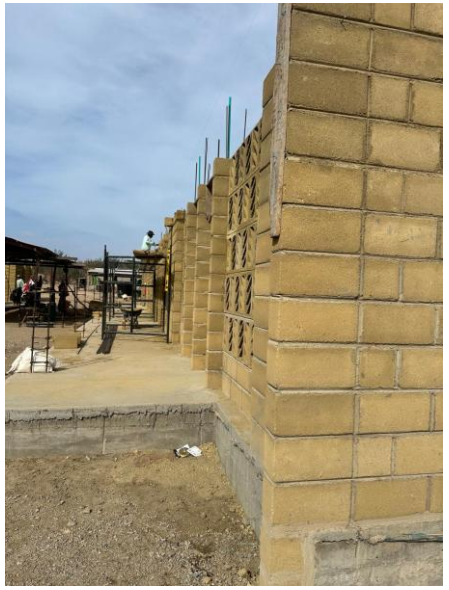







CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103
I.E. ETNOEDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA JUYASIRAIN DEL MUNICIPIO DE URIBIA RURAL (ACTUAL 95%)

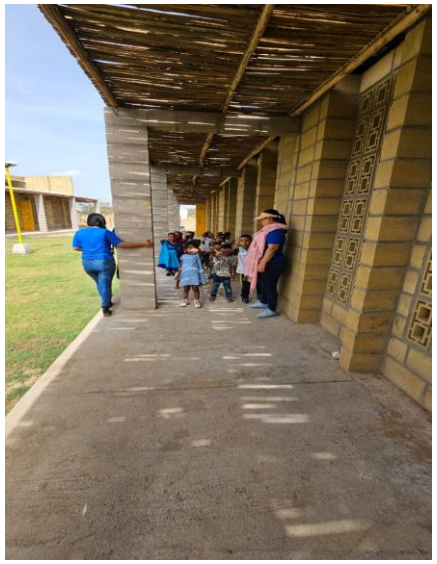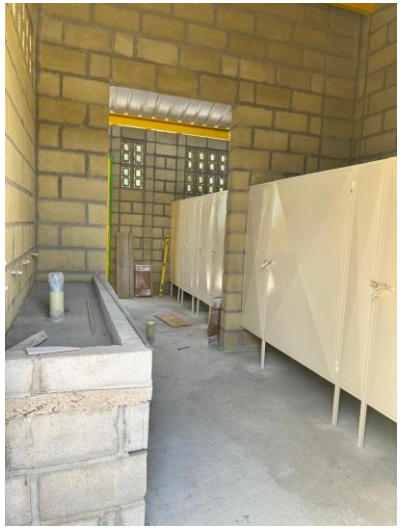

CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103
I.E. CENTRO EDUCATIVO RURAL VALLE DEL PARASHI
URIBIA- ALTA GUAJIRA (EJECUCIÓN 90%)

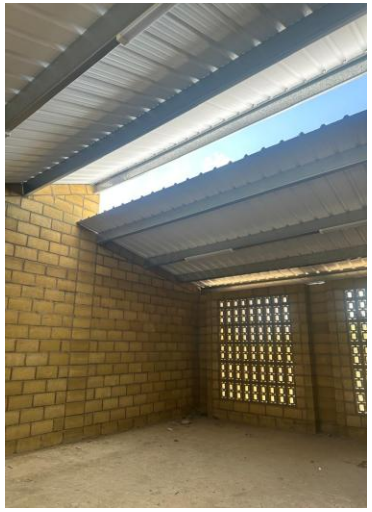











CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103
I.E. NORBERTO IGUARAN MUNICIPIO DE MAICAO











CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103
I.E. SIMÓN BOLÍVAR. BELÉN DE BAJIRÁ











CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103 INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA MARCO TULIO MONTIEL URIANA DE NORTECHÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA









CONVENIO ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR 6493103 (ADICIÓN)
NUEVA SEDES LA GUAJIRA

Municipio Uribia

- Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena Carasua Madre Laura(Alta Guajira)
- I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana
- Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Mapuain
- Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu

Municipio Rioacha:

- Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal
- Institución Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero

Municipio Fonseca:

- Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez

Quibdó – Chocó:

- IE Antonio Ricaurte sede principal

Somos la Revolución del Cambio

GRACIAS

www.mineducacion.gov.co

mineducacion @mineducacion @mineducacion

Ministerio de Educación Nacional mineducacioncol
