Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: PM-FT-01** **Versión: 05** Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				**Visita Agosto 13de 2025**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	9:00 am	**Hora de finalización**	10:00 pm
	13	08	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Carlos Andrés Vasquez	Fundación Pies Descalzos
Juan Andrés Lemus	Director Financiero y de Infraestructura educativa - Fundación Pies Descalzos
Claudia Arzayús	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional
Enrique Bolívar	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional- Supervisor Convenio.
Jose Luis Obando	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento convenio de Asociación CO1.PCCNTR 6493103 con la Fundación de Pies Descalzos y la Secretaría de Educación de Uribia, dentro de la cual nos desplazaremos hasta la Alta Guajira para visitar la IE. Villa Fátima, compromiso de presidencia regiones.

No Clasificada

TEMAS TRATADOS	
1	Las sedes que se van a atender en es convenio y los respectivos alcances definidos: **I.E. Villa Fátima sede principal**, ubicada en el corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, matrícula de 559 estudiantes para los estudiantes de 5 a 11 grado, se requieren 22 aulas, baterías sanitarias, aula múltiple, cocina. Institución educativa que esta en un compromiso de Regiones de Presidencia. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 240 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple, cocina (revisión). **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi, corregimiento de Villa Parashi**, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 696 estudiantes, se requieren 15 aulas adicionales, aula múltiple, cocina (estudio). **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, corregimiento de Villa Parashi, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 350 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple, cocina (estudio) **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, zona rural, tiene matrícula 2.300 estudiantes, se requiere 46 aulas y baterías sanitarias. **I.E. Norberto Iguaran nuevo lote** en la pista para preescolar en el municipio de Maicao I.E. para preescolar. 6 aulas, baterías sanitas, un aula múltiple con cocina y sala profesores. **I.E. Simón Bolívar**, en el municipio de Belén de Bajirá, 6 aulas, baterías sanitarias 1 aula

	multiuso y zona administrativa **IE colegio nuevo Tibú** : 14 aulas Básica media, 12 aulas Básica Primaria, 6 aulas preescolar, 7 baterías sanitarias, 1 Comedor, 1Cocina, 1 Biblioteca, 1 Laboratorio Física, 1 Laboratorio Química, 2 aulas de tecnología2 aulas polivalentes, 1 sala profesores, 1 Área administrativa, 1 Enfermería, Áreas recreativas, Parqueaderos y Dotación de todos los espacios con mobiliario y dotación cocina. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana** de Nortechón del municipio de Uribia. Alcance, Dos (2) áreas recreativas, de las cuales una lleva cubierta (Cancha multiuso).
2	**Avances de los proyectos:** **IE colegio nuevo Tibú**, vereda la Cuatro, el porcentaje de avance ejecución **99,7 %**, se estima finalizar y entregar la primera semana de julio 2025, faltan obras de urbanismo y mampostería, carpintería bloque 11. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, este proyecto se está ejecutando por etapas para que se pueda continuar prestando el servicio, el porcentaje de avance ejecución **85%**, se estima finalizar en el mes de septiembre 2025. Estamos en fase de baterías sanitarias, son 6 bloques en esta primera etapa. **I.E. Villa Fátima sede principal**, el porcentaje de avance ejecución **95%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, se estima finalización en el mes de septiembre 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, se estima finalización en el mes de junio 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda. **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi**, **el p**orcentaje de avance ejecución **75 %**, están en etapa de cimentación y están en etapa de fundición de placas, se está replanteando en terreno un bloque, se estima finalización en el mes de octubre 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda. **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, levantamiento de muros, se estima finalización en el mes de septiembre 2025. Se retoma el tema del pozo de agua profunda. **I.E. Norberto Iguaran municipio de Maicao**, el porcentaje de avance ejecución **25%**, en epata de cimentación , se estima finalizar en el mes de octubre-noviembre 2025. **I.E. Simón Bolívar, Belén de Bajirá** el porcentaje de avance ejecución 30**%**, en epata de construcción de zapatas . se estima finalizar en el mes de octubre-noviembre 2025. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón** del municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución 5**%**, se estima finalizar en el mes de noviembre 2025.

3	Nuevos proyectos (8) validados por el Despacho del Ministro y que se presentan a comité para ser beneficiados con los recursos adicionados al convenio y de los cuales 7 proyectos están priorizados en comité No. 6 de Infraestructura Educativa y uno que será llevado al próximo comité, para ser financiados con los recursos adicionados al convenio: **Municipio de Uribia:** • Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua Sede Principal Carasua • Institucion Educativa Alfonso Lopez Pumarejo Sede Mariela Ines Ipuana • Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa Sede Principal Sutalu • Institucion Etnoeducativa Integral Rural Mapuain Sede Principal Mapuain **Municipio Riohacha:** • Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia • Institucion Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero **Municipio Fonseca:** • Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Perez sede institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez **Quibdó - Chocó:** • IE Antonio Ricaurte sede principal
4	Se recomienda a la Fundación tener en cuenta la forma de pago y productos que se deberán presentar para los pagos correspondientes a la adición para la de **DIECISÉISMIL CIEN MILLONES ($16.100.000.000),** se desembolsará de la siguiente forma: • Un primer desembolso por valor del 30 % del valor adicional aportado por el MEN, **contra la entrega de las viabilidades técnicas y jurídicas de las nuevas sedes a incluir en la adición del convenio (Agosto 2026).** • Un segundo desembolso por valor del 50% del valor aportado por el MEN contra la entrega de estudios, diseños, licencias y acta de inicio de los proyectos de la adición (**octubre 2026**) • Un tercer desembolso por valor del 20 % del valor aportado por el MEN contra el 35 % de avance físico de las obras adicionales del proyecto (**diciembre 2026**) Por lo cual la Fundación informa que podrá tramitarse el pago del mes de agosto y que una vez tenga las visibilidad de todos los proyectos enviaran la cuenta al Ministerio.
	Se empieza a trabajar en la sede de Carasua, la cual nos informaron que sería la primera priorizada dentro de los recursos de adición, ya se envió a la UG FFIE oficio para informar que esta se va a ejecutar dentro del convenio CO1.PCCNTR 6493103, ya estaríamos esperando la

	lista definitiva de los priorizados del despacho para avanzar en la prefactibilidad, los estudios y diseños de las nuevas sedes. De acuerdo con la visita realizada a Carasua, el alcance estimado que se propone es 24 aulas, 7 espacios para dormitorio, comedor (aula multiple), cocina, baterías sanitarias, biblioteca y enfermería, esto puede ser alrededor de 3700 m², con un estimado de alrededor de $10.000 millones, este dato aun es muy preliminar.
5	Nuevos proyectos (8) validados por el Despacho del Ministro y presentados al comité para ser beneficiados con los recursos adicionados al Convenio CO1.PCCNTR 6493103, de los cuales 7 proyectos están priorizados en comité No. 6 de Infraestructura Educativa y uno que será llevado al próximo comité, para ser financiados con los recursos adicionados al convenio: **Municipio de Uribia:** • Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua Sede Principal Carasua • Institucion Educativa Alfonso Lopez Pumarejo Sede Mariela Ines Ipuana • Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa Sede Principal Sutalu • Institucion Etnoeducativa Integral Rural Mapuain Sede Principal Mapuain **Municipio Riohacha:** • Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia • Institucion Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero **Municipio Fonseca:** • Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Perez sede institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez **Quibdó – Chocó:** • IE Antonio Ricaurte sede principal Los proyectos mas importante para iniciar es Carasua , Mampuain y Ipuena y para la Fundación Incluir el proyecto de Quibdó.
6	Se solicita enviar el informe del mes de agosto de 2025, incluido el informe de ejecución financiera en el formato MEN.
7	Se le solicitó la SED Uribia para que vaya iniciando el envío de la documentación de las sedes priorizadas, para diligenciar los formatos de viabilidad y se procedieron la topografía y estudios de suelos y Carasua lleva los diseños más adelantados. Ya se cuenta con información de Riohacha y Fonseca. Una reunión con la Armada para apoyar en logística para el proyecto de Carasua y poder apoyar llevar materiales al proyecto y que es lo que genera mayores costos de transporte. Por ahora el cemento no estaría por temas de cuidado en el trasporte por agua.

	Enrique solicita revisar el tema de poder instalar energía solar en una de las aulas en las cuales el MEN instalo unos temas de tecnología.
8	La fundación informa sobre temas de los pozos de la alta Guajira, estudios geoeléctricos y tomología no muestra aguas subterraneas para Parashi y Flor de Patajamana, se están buscando tras soluciones con pozos artesianos si hay aguar menos profundas
9	El mobiliario se empieza a ser despachado del 19 de agosto, para las sedes ya finalizadas en la Alta Guajira
10	Se ira avanzando para solicitar a la ETC Uribia la documentación de Carasua sin levantar expectativas con la comunidad.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se solicita tramitar este mes el primer desembolso por valor del 30 % del valor adicional aportado por el MEN, **contra la entrega de las viabilidades técnicas y jurídicas de las nuevas sedes a incluir en la adición del convenio (Agosto 2026).**
2	Se programa próximo comité técnico para el 27-08-2025
3	Se definen los (8) nuevos proyectos validados por el Despacho del Ministro y presentados al comité para ser beneficiados con los recursos adicionados al Convenio CO1.PCCNTR 6493103, de los cuales 7 proyectos están priorizados en comité No. 6 de Infraestructura Educativa y uno que será llevado al próximo comité
4	Se solicita enviar el informe del mes de agosto de 2025, incluido el informe de ejecución financiera en el formato MEN
5	.
6	

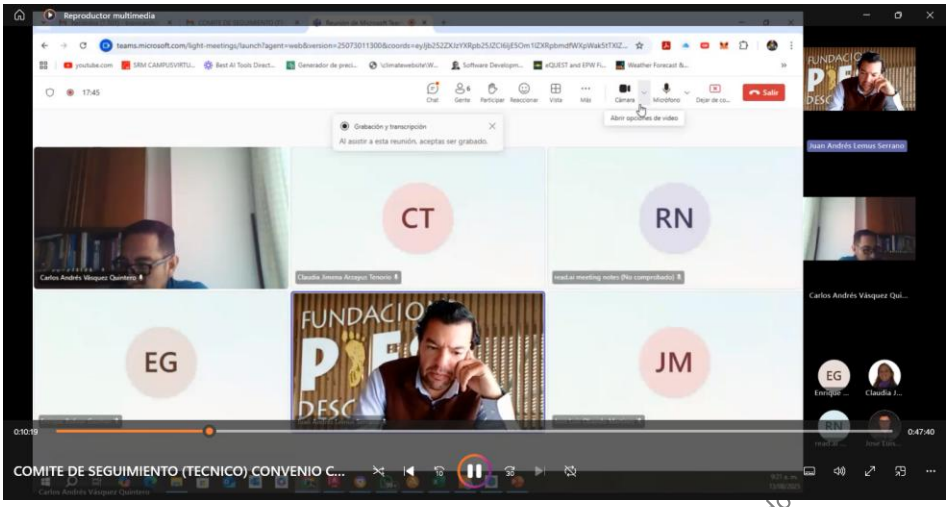
No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se establece informe mensual de avance físico y financiero del proyecto del mes de agosto 2025	15-08-2025	La Fundación
Presentar el primer pago de la adición de recursos	30-08-2025	La Fundación

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

	Hora de inicio	Hora de finalización	NOMBRE2	DOCUMENTO	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRÓNI	CELULAR
1	8/13/25 9:19:14	8/13/25 9:20:07	José Luis Obando Mart	98389954	MEN	Profesional Especializ	jobando@mineducaci	3203696384
2	8/13/25 9:19:16	8/13/25 9:20:09	José Luis Obando Mart	98389954	MEN	Profesional Especializ	jobando@mineducaci	3203696384
3	8/13/25 10:08:19	8/13/25 10:09:31	JUAN ANDRES LEMUS S	13542371	FUNDACION PIES DESC	DIRECTOR FINANCIERC	juanandres@fpd.ong	3175130552
4	8/13/25 10:09:16	8/13/25 10:09:57	CLAUDIA ARZAYUS	38655368	MEN	OFICINA DE INFRAESTF	carzayus@mineducaci	3164417801
5	8/13/25 10:09:33	8/13/25 10:11:07	Carlos Andrés Vásque	79797289	Fundación Pies Descal	Arquitecto	carlosv@carlosvasque	3204938181



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)
N/A

No Controlado

ESPACIO PARA FIRMAS

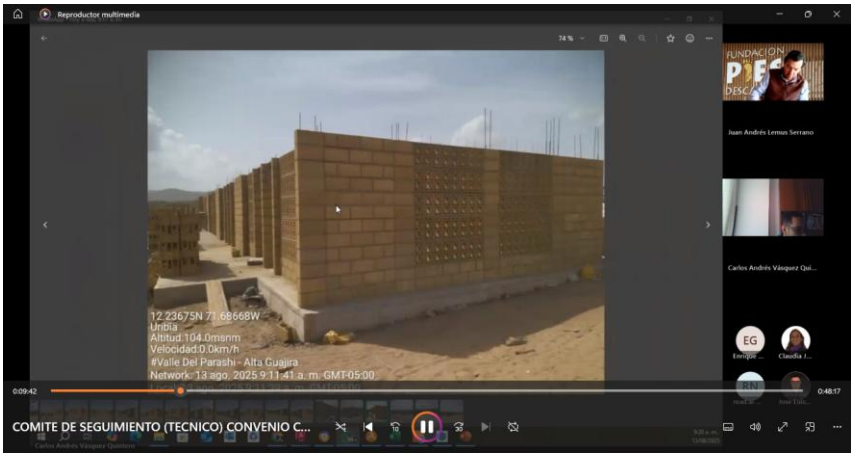
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	

Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

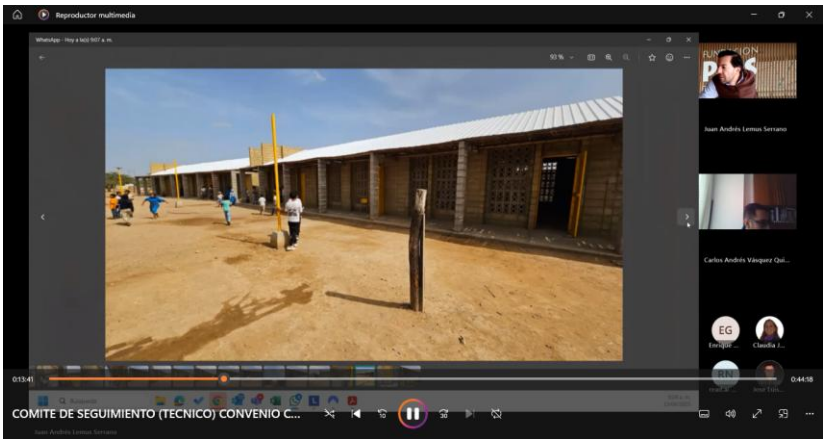
Registro Fotografica avcances proyecto:

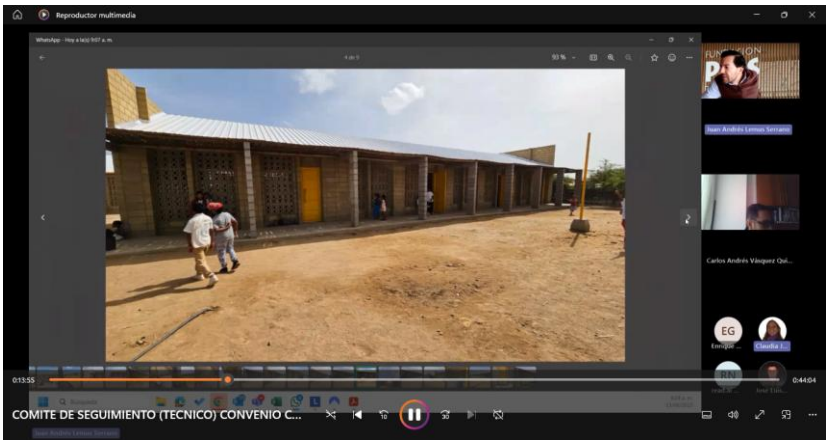




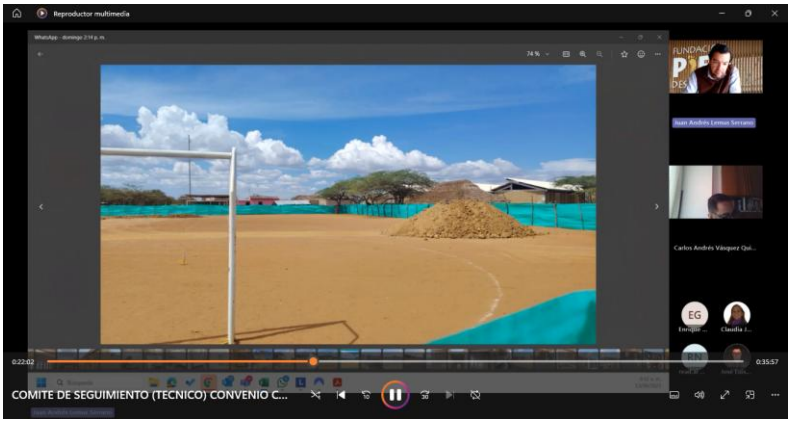


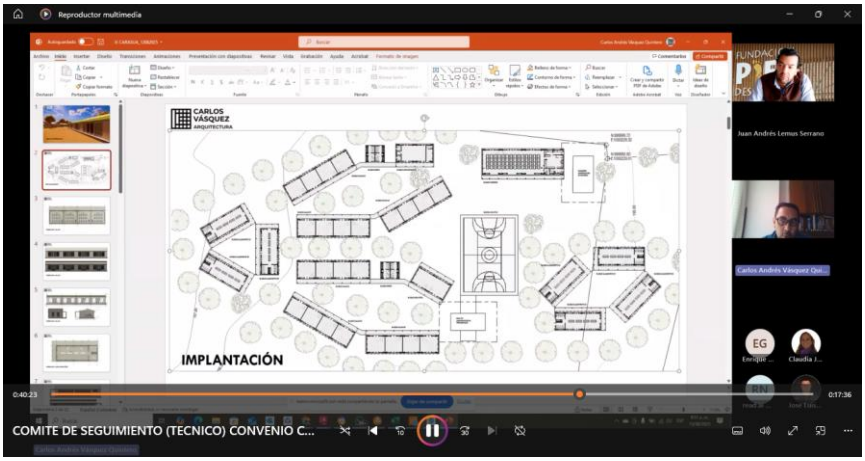

Reproductor multimedia
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
CARLOS VÁSQUEZ ARQUITECTURA
IMPLANTACIÓN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...
