Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: PM-FT-01** **Versión: 05** Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				**Acta de Seguimiento**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	9:00 am	**Hora de finalización**	10:00 pm
	11	12	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Carlos Andrés Vasquez	Fundación Pies Descalzos
Claudia Arzayús	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional
Keyla Flores	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento convenio de Asociación CO1.PCCNTR 6493103 con la Fundación de Pies Descalzos para " Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de la infraestructura educativa", que van dirigidos a los departamentos de La Guajira y Norte de Santander.

TEMAS TRATADOS	
1	Las sedes que están siendo atendidas el convenio y los respectivos alcances definidos: **I.E. Villa Fátima sede principal**, ubicada en el corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, matrícula de 559 estudiantes para los estudiantes de 5 a 11 grado, se requieren 22 aulas, baterías sanitarias, aula múltiple (comedor), cocina, dotación y pozo de agua profunda (revisiones). Institución educativa que esta en un compromiso de Regiones de Presidencia. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 240 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple (comedor), cocina y dotación. **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi, corregimiento de Villa Parashi**, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 696 estudiantes, se requieren 15 aulas adicionales y aula múltiple (comerdor), cocina, baterías sanitarias y dotaciones **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, corregimiento de Villa Parashi, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 350 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple (comedor), cocina y dotación. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, zona rural, tiene matrícula 2.300 estudiantes, se requiere 46 aulas, dotación y baterías sanitarias. **I.E. Norberto Iguaran nuevo lote** en la pista para preescolar en el municipio de Maicao I.E. para preescolar. 6 aulas, baterías sanitas, un aula multiuso (Comedor) con cocina y sala profesores. **I.E. Simón Bolívar**, en el municipio de Belén de Bajirá, 6 aulas, baterías sanitarias 1 aula multiuso, dotación y zona administrativa

No Clasificada

	IE colegio nuevo Tibú : 14 aulas Básica media, 12 aulas Básica Primaria, 6 aulas preescolar, 7 baterías sanitarias, 1 Comedor, 1Cocina, 1 Biblioteca, 1 Laboratorio Física, 1 Laboratorio Química, 2 aulas de tecnología2 aulas polivalentes, 1 sala profesores, 1 Área administrativa, 1 Enfermería, Áreas recreativas, Parqueaderos y Dotación de todos los espacios con mobiliario y dotación cocina. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana** de Nortechón del municipio de Uribia. Alcance, Dos (2) áreas recreativas, de las cuales una lleva cubierta (Cancha multiuso). **Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua**, Matrícula de 730 estudiantes. Alcance: 24 aulas, 7 espacios para alojamiento,1 Aula Taller Lectura, 1 Administración y Enfermería, Baterías Sanitarias, comedor cocina y dotación. **Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal** Matricula 2082 estudiantes. Alcance: 16 aulas, baterías sanitarias, comedor – cocina y dotaciones. **Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez – Fonseca,** Matricula 411 estudiantes. Alcance: 8 aulas, baterías sanitarias y comedor - cocina. **IE Antonio Ricaurte sede principal – Quibdò** Matricula 960 estudiantes, Alcance: comedor cocina, biblioteca, zona administrativa, tienda escolar, portería, dos aulas polivalentes para varios usos y cancha múltiple sencilla). **I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana – Uribia** Matricula 320 estudiantes Alcance: Alcance 6 aulas, comedor – cocina, batería sanitária y dotación. **Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu – Uribia Matricula 300 estudiantes Alcance:** 10 aulas, comedor – cocina, bateria sanitaria y dotación. **Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal**, Matricula 235 estudiantes. Alcance estimado 4 aulas, bateria sanitária, comedor – cocina y dotaciones **Institución Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero,** Matricula 409 estudiantes. Alcance estimado 8 aulas, bateria sanitária, comedor – cocina y dotaciones.
2	**Avances de los proyectos:** **IE colegio nuevo Tibú**, vereda la Cuatro, el porcentaje de avance ejecución **100%**, Finalizó el 31 de agosto 2025. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, este proyecto se está ejecutando por etapas para que se pueda continuar prestando el servicio, el porcentaje de avance ejecución **95%**, se estima finalizar en el mes de octubre 2025. Estamos en fase II. **I.E. Villa Fátima sede principal**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, se estima finalización en el mes de septiembre 2025. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, finalizó en el mes de julio 2025. Se está finalizando el pozo de agua profunda.

No clasificado

	I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi, **el p**orcentaje de avance ejecución **100 %**, están en etapa de cubiertas, se estima finalización en el mes de octubre 2025. **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, levantamiento de muros, se estima finalización en el mes de agosto 2025. **I.E. Norberto Iguaran municipio de Maicao**, el porcentaje de avance ejecución **100 %**, se estima finalizar en el mes de novermbre 2025. **I.E. Simón Bolívar, Belén de Bajirá** el porcentaje de avance ejecución 98**%**, terminado armado de vigas y empiezan a fundir vías aéreas, se estima finalizar en el mes de diciembre 2025. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón** del municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución **96%**, la cubierta para instalar llega a mediado de septiembre, se estima finalizar en el mes de diciembre 2025. **Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua**, Alta Guajira Municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución **45%.** **Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Manpuain**, Ya se cuenta con licencia de Construcción, el porcentaje de avance ejecución 55**%.** **Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez – Fonseca,** el porcentaje de avance ejecución 25**%** **IE Antonio Ricaurte sede principal – Quibdò** el porcentaje de avance ejecución 15**%** **I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana**, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia expedida, se estima inicio en el mes de enero 2026 **Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu**, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia expedida, en processo de contratación se estima iniciar en el mes de enero 2026 **Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal**, estudios diseños 100% y a la espera de entrega por parte del municipio de la Licencia, en processo de contratación se estima inicio en el mes de febrero 2026 **Institución Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero**, , estudios diseños 100% y a la espera de entrega por parte del municipio de la Licencia, en processo de contratación se estima inicio en el mes de febrero 2026
3	Los proyectos que se están finalizando están siendo entregados a la comunidad con acta para ser puestas de uso de manera inmediata y poder aprovechas estas infraestructuras. Próximo comité seria para el mes de enero 2026, no se deja fecha establecida.
4	Se solicitó a la Fundación poder facturar a principios del mes de diciembre el ultimo desembolso por los tiempos que de señora la factura en aparecer el sistema está pendiente entregar los informes de noviembre y de parcial de diciembre que soportaran en desembolso correspondiente al séptimo desembolso (Un tercer desembolso por valor del 20 % del valor aportado por el MEN contra el 35 % de avance físico de las obras adicionales del proyecto).

No Controlado

5	Se continua a la espera de que el Despacho informe la fecha del acto protocolario el acto protocolario de Villa Fátima sede principal, Villa Fátima sede Taguaira y Centro Etnoeducativo Integral Rural Valle de Parashi.

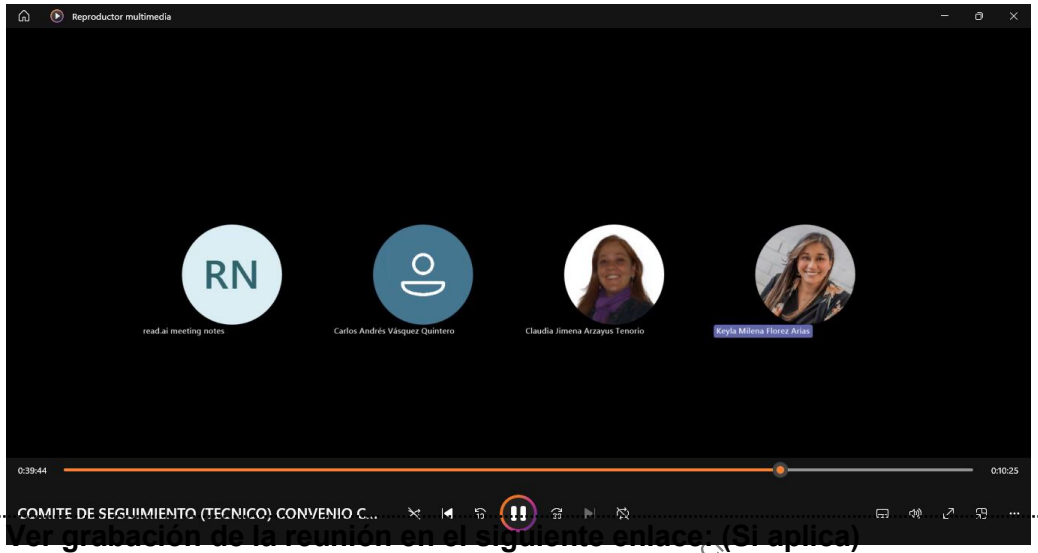
CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se está a la espera de la entrega de las licencias para los dos proyectos de Riohacha, pendiente tramites de pago de expensas del municipio
2	Se solicita enviar informe del mes de noviembre 2025 y 15 de diciembre de 2025 los formatos financieros, este debe aportarse también al trámite de la cuenta.
3	Pendientes que el Despacho defina la fecha del acto protocolario de La Guajira, se estima para finales de octubre.
4	Se programa próximo comité técnico para el mes de enero 2026, fecha por definir
5	Se establece programar visita de seguimiento a la Guajira una vez se regrese de temporada de diciembre y están contratos firmados de profesionales MEN.
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se establece informe mensual de avance físico y financiero del proyecto del mes de noviembre - diciembre 2025	20-12-2025	La Fundación
Entrega de licencias las licencia para los dos proyectos de Riohacha, pendiente tramites de pago de expensas del municipio	30-12-2025	ETC Riohacha
Se establece programar visita de seguimiento a la Guajira en el mes de enero de 2025.	30-01-2026	MEN, ETC Uribia y La Fundación

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

1. Resumen								
Título de la r	COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR.2493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (11-1							
Participantes	4							
Hora de inici	12/11/25, 8:59:52 AM							
Hora de final	12/11/25, 10:00:37 AM							
Duración de	1 h 44 s							
Tiempo med	59 min 8 s							
2. Participantes								
Nombre	Primera entr	Última salid	Duración de	Correo electr	Id. de partici	Rol		
Claudia Jime	12/11/25, 8:5	12/11/25, 10:	1 h 11 s	CArzayus@m	CArzayus@m	Organizador		
read.ai meet	12/11/25, 9:0	12/11/25, 10:	1 h 24 s			Moderador		
Keyla Milena	12/11/25, 9:0	12/11/25, 9:5	58 min 43 s	kflorez@min	kflorez@min	Moderador		
Carlos André	12/11/25, 9:0	12/11/25, 10:	57 min 15 s			Moderador		
3. Actividades de la reunión								
Nombre	Hora de entr	Hora de sali	Duración	Correo electr	Rol			
Claudia Jime	12/11/25, 8:5	12/11/25, 10:	1 h 11 s	CArzayus@m	Organizador			
read.ai meet	12/11/25, 9:0	12/11/25, 10:	1 h 24 s		Moderador			
Keyla Milena	12/11/25, 9:0	12/11/25, 9:5	58 min 43 s	kflorez@min	Moderador			
Carlos André	12/11/25, 9:0	12/11/25, 10:	57 min 15 s		Moderador			



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)
N/A

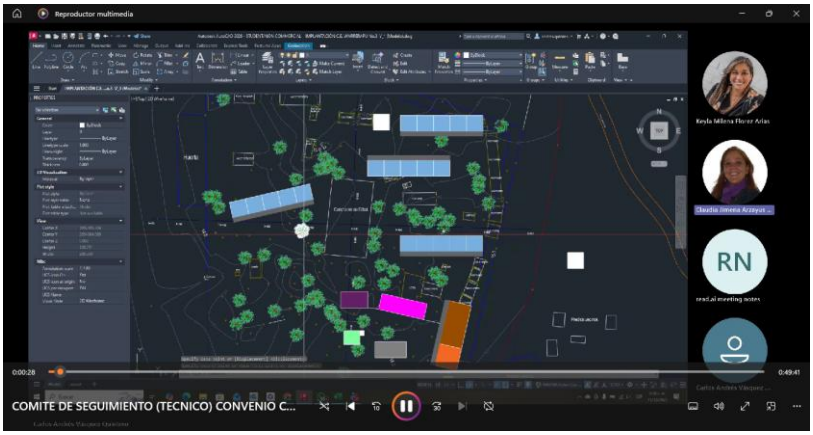
No Ci

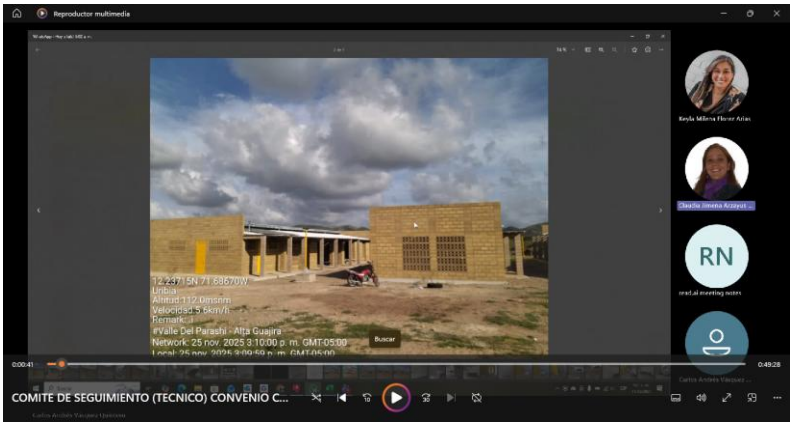
ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	

Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

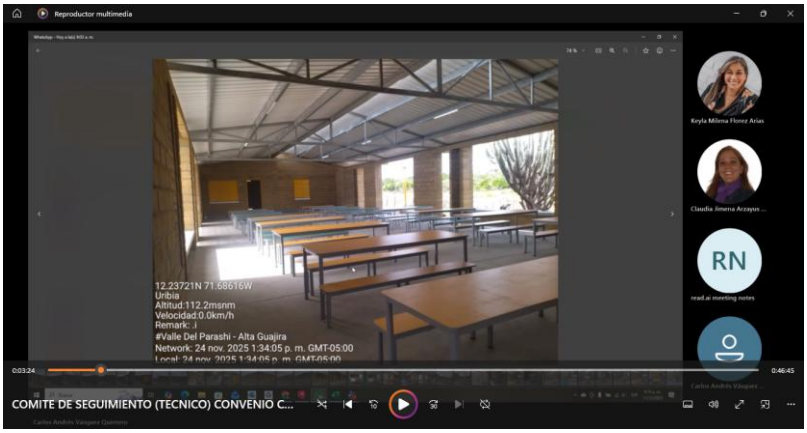


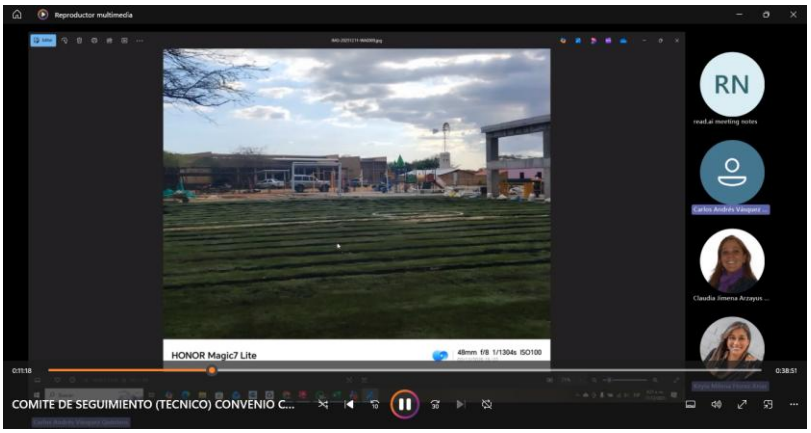


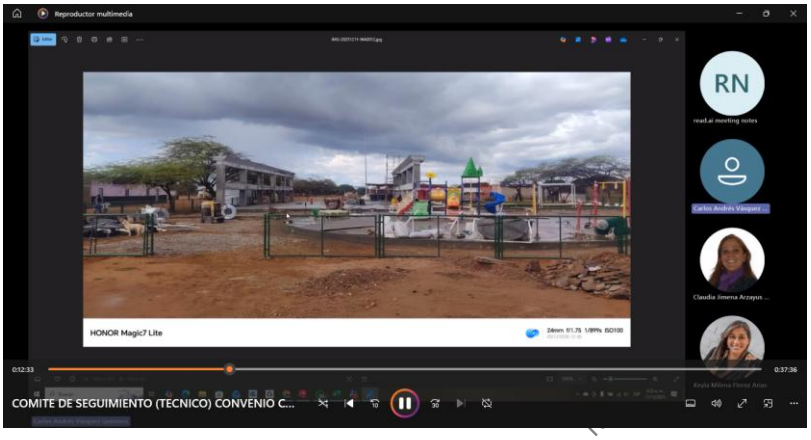


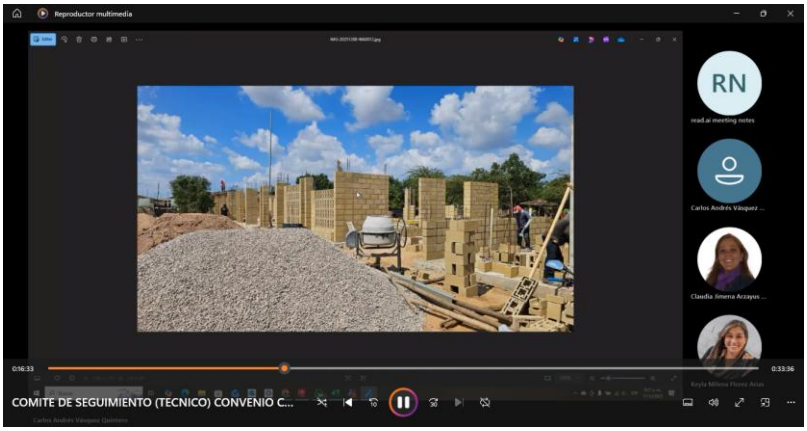

Reproductor multimedia
12.23662N 71.68672W
Uribia
Altitud:105.9msnm
Velocidad:0.0km/h
Remark: .i
#Valle Del Parashi - Alta Guajira
Network: 25 nov. 2025 6:23:19 a. m. GMT-05:00
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...

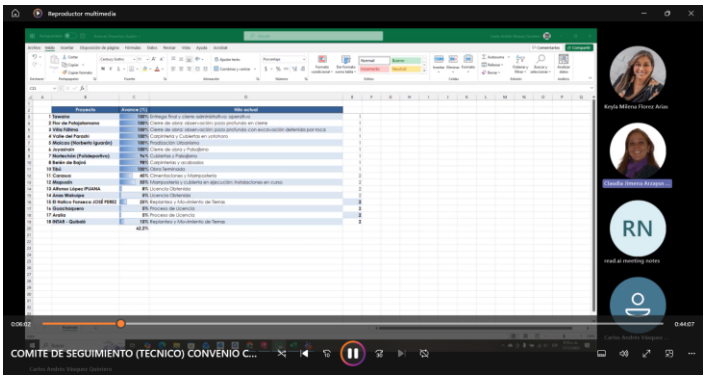

Reproductor multimedia
12.23737N 71.68635W
Uribia
Altitud:107.6msnm
Velocidad:0.0km/h
Remark: .i
#Valle Del Parashi - Alta Guajira
Network: 25 nov. 2025 6:30:41 a. m. GMT-05:00
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
12.23721N 71.68616W
Uribia
Altitud:112.2msnm
Velocidad:0.0km/h
Remark: .i
#Valle Del Parashi - Alta Guajira
Network: 24 nov. 2025 1:34:05 p. m. GMT-05:00
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
RN
HONOR Magic7 Lite
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...

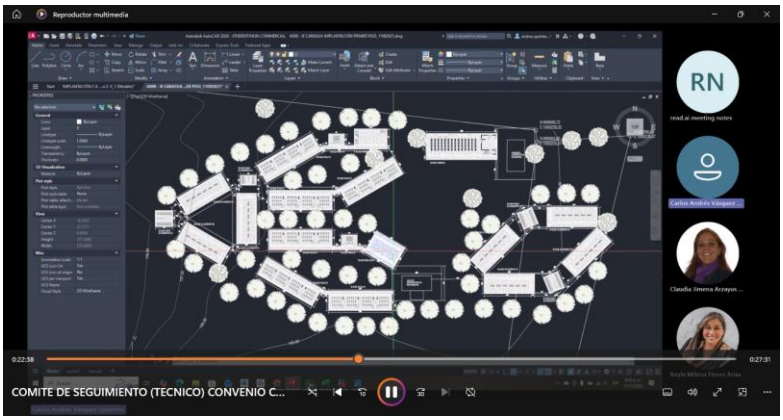

Reproductor multimedia
RN
HONOR Magic7 Lite
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...

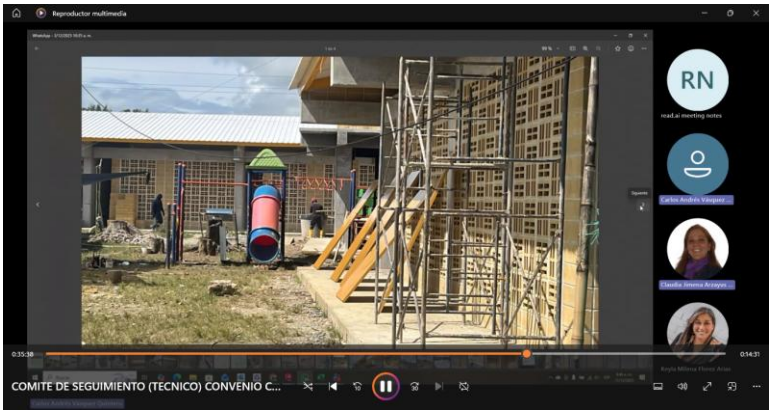




No Clasificado


Reproductor multimedia
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...
