Acta No				Acta de Seguimiento		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	9:00 am	**Hora de finalización**	10:00 pm
	22	10	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Carlos Andrés Vasquez	Fundación Pies Descalzos
Juan Andrés Lemus	Director Financiero y de Infraestructura educativa - Fundación Pies Descalzos
Claudia Arzayús	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional
Gina Acosta Abril	Apoyo Administrativo y Financiero Fundación Pies Descalzos
Jose Luis Obando	Fundación Pies Descalzos
Enrique Bolivar	Supervisor Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Seguimiento convenio de Asociación CO1.PCCNTR 6493103 con la Fundación de Pies Descalzos para " Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de la infraestructura educativa", que van dirigidos a los departamentos de La Guajira y Norte de Santander.

No Clasificado

TEMAS TRATADOS

1	Las sedes que están siendo atendidas el convenio y los respectivos alcances definidos: **I.E. Villa Fátima sede principal**, ubicada en el corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, matrícula de 559 estudiantes para los estudiantes de 5 a 11 grado, se requieren 22 aulas, baterías sanitarias, aula múltiple (comedor), cocina, dotación y pozo de agua profunda (revisiones). Institución educativa que esta en un compromiso de Regiones de Presidencia. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 240 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple (comedor), cocina y dotación. **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi, corregimiento de Villa Parashi**, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 696 estudiantes, se requieren 15 aulas adicionales y aula múltiple (comerdor), cocina, baterías sanitarias y dotaciones **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, corregimiento de Villa Parashi, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 350 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple (comedor), cocina y dotación. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, zona rural, tiene matrícula 2.300 estudiantes, se requiere 46 aulas, dotación y baterías sanitarias. **I.E. Norberto Iguaran nuevo lote** en la pista para preescolar en el municipio de Maicao I.E. para

	preescolar. 6 aulas, baterías sanitas, un aula multiuso (Comedor) con cocina y sala profesores. **I.E. Simón Bolívar**, en el municipio de Belén de Bajirá, 6 aulas, baterías sanitarias 1 aula multiuso, dotación y zona administrativa **IE colegio nuevo Tibú** : 14 aulas Básica media, 12 aulas Básica Primaria, 6 aulas preescolar, 7 baterías sanitarias, 1 Comedor, 1Cocina, 1 Biblioteca, 1 Laboratorio Física, 1 Laboratorio Química, 2 aulas de tecnología2 aulas polivalentes, 1 sala profesores, 1 Área administrativa, 1 Enfermería, Áreas recreativas, Parqueaderos y Dotación de todos los espacios con mobiliario y dotación cocina. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana** de Nortechón del municipio de Uribia. Alcance, Dos (2) áreas recreativas, de las cuales una lleva cubierta (Cancha multiuso). **Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua**, Matrícula de 730 estudiantes. Alcance: 24 aulas, 7 espacios para alojamiento,1 Aula Taller Lectura, 1 Administración y Enfermería, Baterías Sanitarias, comedor cocina y dotación. **Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal** Matricula 2082 estudiantes. Alcance: 16 aulas, baterías sanitarias, comedor – cocina y dotaciones. **Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez – Fonseca,** Matricula 411 estudiantes. Alcance: 8 aulas, baterías sanitarias y comedor - cocina. **IE Antonio Ricaurte sede principal – Quibdò** Matricula 960 estudiantes, Alcance: comedor cocina, biblioteca, zona administrativa, tienda escolar, portería, dos aulas polivalentes para varios usos y cancha múltiple sencilla). **I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana – Uribia** Matricula 320 estudiantes Alcance: Alcance 6 aulas, comedor – cocina, batería sanitária y dotación. **Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu – Uribia Matricula 300 estudiantes Alcance:** 10 aulas, comedor – cocina, bateria sanitaria y dotación. **Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal**, Matricula 235 estudiantes. Alcance estimado 4 aulas, bateria sanitária, comedor – cocina y dotaciones **Institución Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero,** Matricula 409 estudiantes. Alcance estimado 8 aulas, bateria sanitária, comedor – cocina y dotaciones.
2	**Avances de los proyectos:** **IE colegio nuevo Tibú**, vereda la Cuatro, el porcentaje de avance ejecución **100%**, Finalizó el 31 de agosto 2025. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, este proyecto se está ejecutando por etapas para que se pueda continuar prestando el servicio, el porcentaje de avance ejecución **100%**, se estima finalizar en el mes de octubre 2025. Estamos en fase II. **I.E. Villa Fátima sede principal**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, se estima finalización en el mes de septiembre 2025.

No clasificada

I.E Villa Fátima sede Taguaira, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, finalizó en el mes de julio 2025. Se está finalizando el pozo de agua profunda.

I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi, **el p**orcentaje de avance ejecución **97 %**, están en etapa de cubiertas, se estima finalización en el mes de octubre 2025.

I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana, el porcentaje de avance ejecución **100%**, levantamiento de muros, se estima finalización en el mes de agosto 2025.

I.E. Norberto Iguaran municipio de Maicao, el porcentaje de avance ejecución **75 %**, se estima finalizar en el mes de noviembre 2025.

I.E. Simón Bolívar, Belén de Bajirá el porcentaje de avance ejecución **70%**, terminado armado de vigas y empiezan a fundir vías aéreas, se estima finalizar en el mes de noviembre 2025.

Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón del municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución **45%**, la cubierta para instalar llega a mediado de septiembre, se estima finalizar en el mes de octubre 2025.

Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua, Alta Guajira Municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución **9%,** están fundiendo vigas de cimentación y las primeras placas, se estima fecha de terminación abril 2026. Armada está llevando algunos de los materiales para el proyecto de Carasua.

Se ha avanzado en el tema de la armada para el apoyo con transporte de materiales a la zona.

Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Manpuain, Ya se cuenta com licencia de Construcción, el porcentaje de avance ejecución **5%,** proceso de movimento de Tierra y excavaciones.

No clasificada

En estudios y diseños:

Municipio Uribia

- I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia expedida

Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia expedida

Municipio Rioacha:

Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal, estudios diseños 100%, a la espera de entrega de licencias por parte del municipio a la espera de pago expensas se estima Inicio obras diciembre. - enero

Institución Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero, , estudios diseños 100% a la espera de entrega de licencias por parte del municipio a la espera de pago expensas se estima Inicio obras diciembre. - enero

Municipio Fonseca:

- Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia expedida Inicio obras noviembre- diciembre

	Quibdó – Chocó: • IE Antonio Ricaurte sede principal, cuenta con licencia vigente y alcance del proyecto, este es menor al prediseñado, comedor cocina, biblioteca, zona administrativa y dos aulas polivalentes, para varios usos. Cuenta con los estudios y diseños, se estima iniciar en el mes de noviembre.
3	Juan Andres informa que los proyectos que se están finalizando están siendo entregados a la comunidad con acta para ser puestas de uso de manera inmediata y poder aprovechas estas infraestructuras. Se solicita nos puedan enviar copia de las actas de entrega de I.E. Villa Fátima sede principal, I.E. Villa Fátima sede Taguaira, I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana. Pendiente de La I.E. Pues Descalzos Tibú – Catatumbo a que se realice entrega oficial. Se solicita el envío de las actas de socialización de los proyectos del último trimestre.
4	Sobre las licencias de los proyectos de Riohacha, los cuales contamos con el documento de aprobación técnica y faltaría el pago de expensas Nos informan que ya la dotación fue en las obras finalizadas en las sedes de la Alta Guajira. La fundación informa que están en temporada de lluvias ´por lo cual el acceso a la Alta Guajira esta complejo.
5	En convenio inicial está en un 94% de avance del proyecto inicial. Se debe manejar un lenguaje para los proyectos referente al convenio
6	Se establece programar visita de seguimiento a la Guajira en el mes de octubre de 2025, una vez lo permita la temporada de lluvias.
7	Se solicita enviar los informes de otubre 2025, y los formatos de seguimiento financieros, actas de entrega y acta de socialización de los proyectos.
8	Se continua a la espera de que el Despacho informe la fecha del acto protocolario el acto protocolario de Villa Fátima sede principal, Villa Fátima sede Taguaira y Centro Etnoeducativo Integral Rural Valle de Parashi.
9	Se recomienda el tema de pago en el mes de octubre ya se solicitó PAC, par lo cual estas pendientes dos de las licencias de construcción del municipio de Riohacha.
10	Las condiciones de los dos pagos pendientes son las siguientes: Un segundo desembolso por valor del 50% del valor aportado por el MEN contra la entrega de estudios, diseños, licencias y acta de inicio de los proyectos de la adición. Octubre **$ 8.050.000.000 (50%)** Un tercer desembolso por valor del 20 % del valor aportado por el MEN contra el 35 % de avance físico de las obras adicionales del proyecto. Diciembre **$ 3.220.000.000 (20%)**


11	El proyecto de Aralia, se solicita definir que vamos a hacer con el proyecto, ya que Sed Riohacha esta solicitando cambiar la sede a tender y enviaron comunicaciones. Es proyecto fue identificado por el despacho, nos preocupa hacer una intervención donde no se requiera y dice que le están haciendo un seguimiento a la sede por baja matricula. Una propuesta sería disminuir el alcance del proyecto para poder atender la otra sede y se propone hacer una visita para ver las condiciones de la otra sede propuesta. Esperamos que el Viceministerio y el Despacho poder definir el tema, se solicitará un espacio.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se está en trámite de licencia para los dos proyectos de Riohacha
2	Se solicita enviar informe del mes de octubre 2025 y los formatos financieros, este debe aportarse también al trámite de la cuenta.
3	Pendientes que el Despacho defina la fecha del acto protocolario de La Guajira, se estima para finales de octubre.
4	Se programa próximo comité técnico para el 5-11-2025
5	Se establece programar visita de seguimiento a la Guajira, una vez lo permita la temporada de lluvias.
6	

No Clasificado

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se establece informe mensual de avance físico y financiero del proyecto del mes de octubre 2025	30-10-2025	La Fundación
La Sed Uribia envió el 6 de octubre las licencias de construcción de los proyectos (I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana, Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Mapuain y Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu del municipio de Uribia)	30-10-2025	La Fundación y la ETC Uribia
Se establece programar visita de seguimiento a la Guajira una vez lo permita la temporada de lluvias.	31-10-2025	MEN, ETC Uribia y La Fundación
Tramite licencias proyectos de Riohacha	15-11-2026	La Fundación y la ETC Riohacha

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

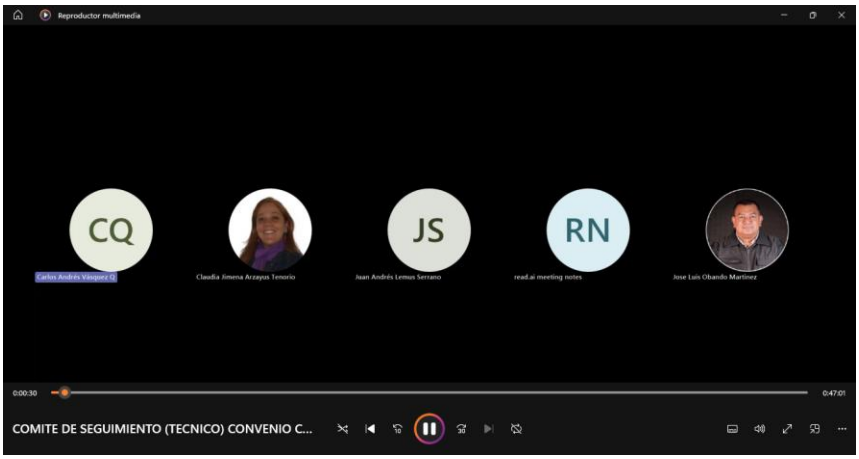



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)
N/A


No Clasificado


ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

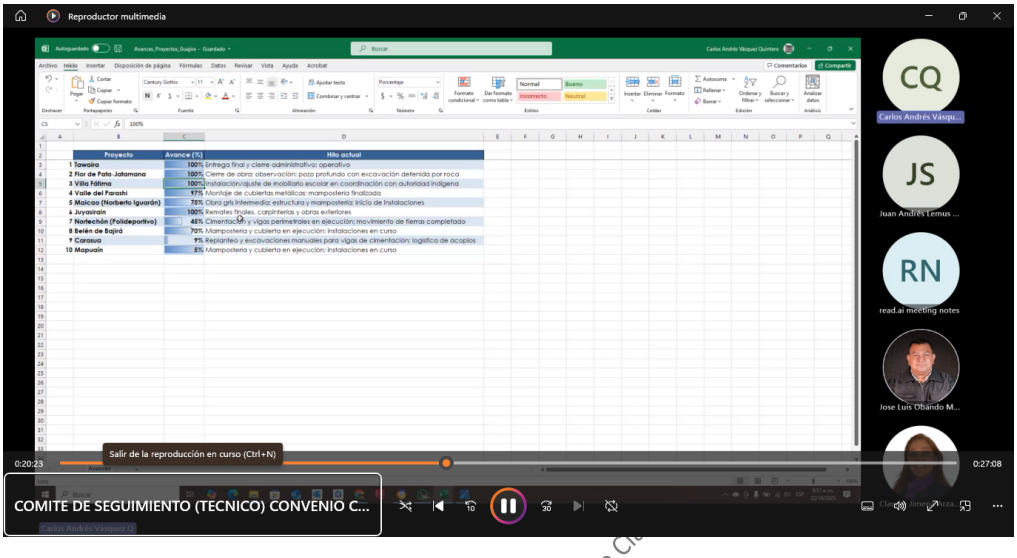


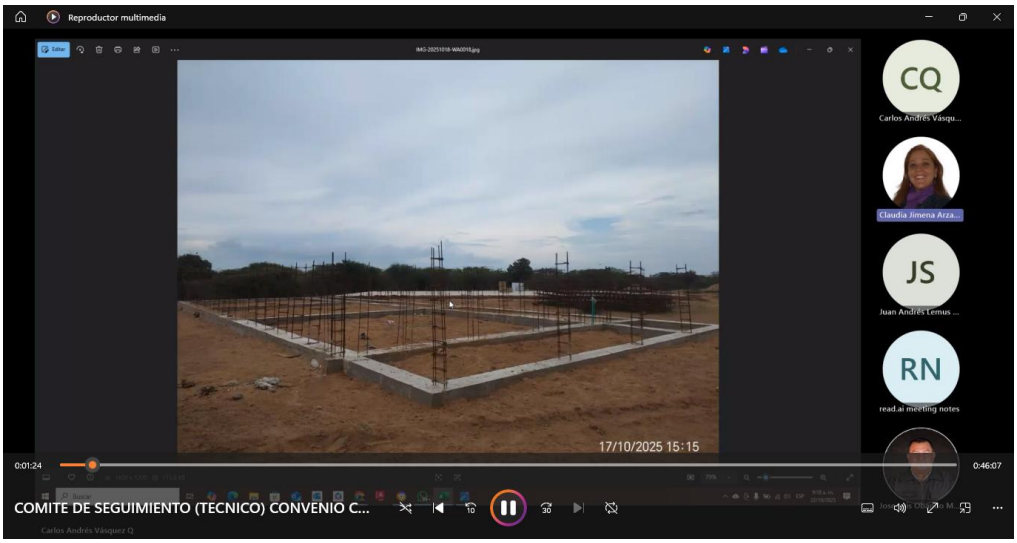

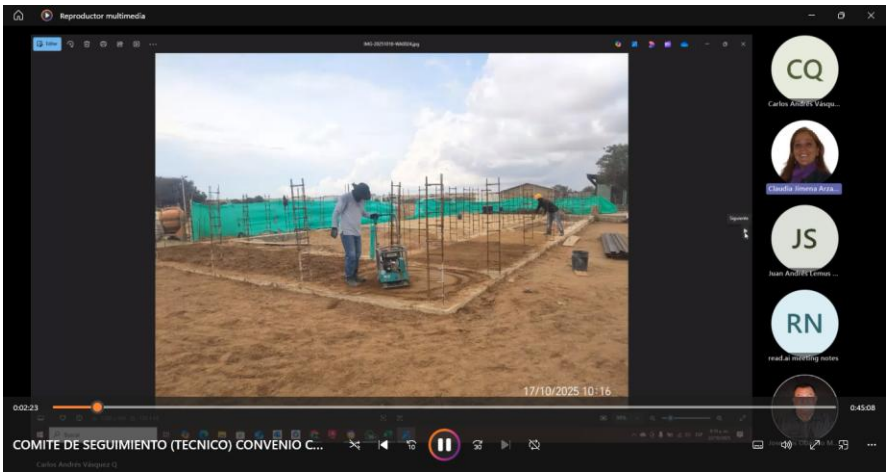
Reproductor multimedia
CQ
JS
RN
17/10/2025 10:16
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...

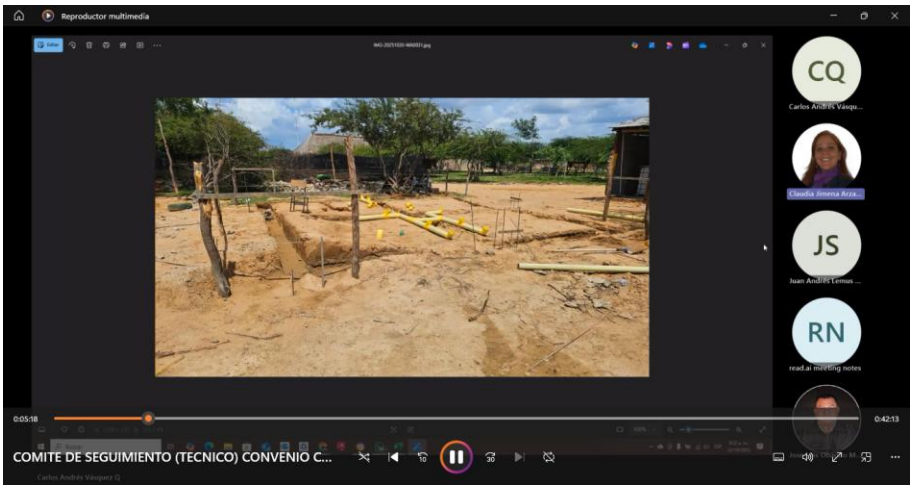
Reproductor multimedia
CQ
JS
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...



Reproductor multimedia
CQ
JS
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...

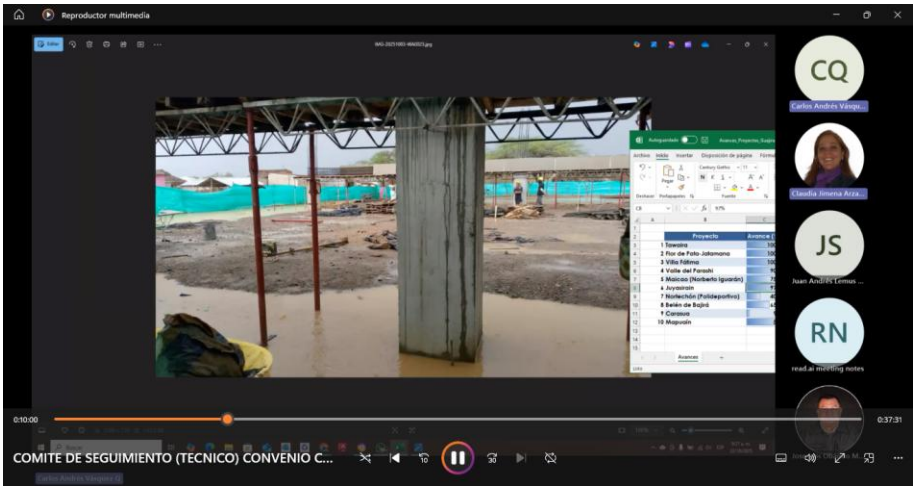
Reproductor multimedia
CQ
JS
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
CQ
JS
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...



Reproductor multimedia
CQ
JS
RN
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...

I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain

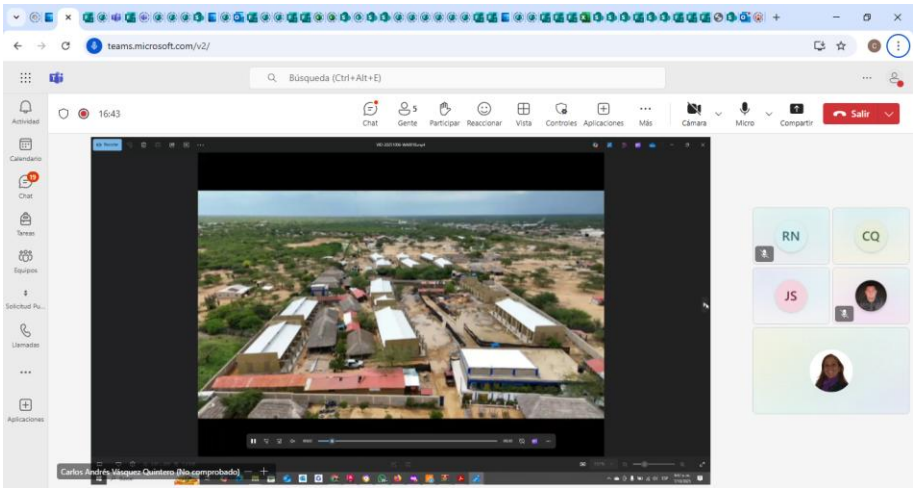




Reproductor multimedia
CQ
JS
RN
12.23780N 71.68661W
Uribia
Altitud:110.6msnm
Velocidad:0.0km/h
#Valle Del Parashi - Alta Guajira
Network: 20 oct. 2025 12:47:41 p. m. GMT-05:00
0:19:02
0:28:29
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...

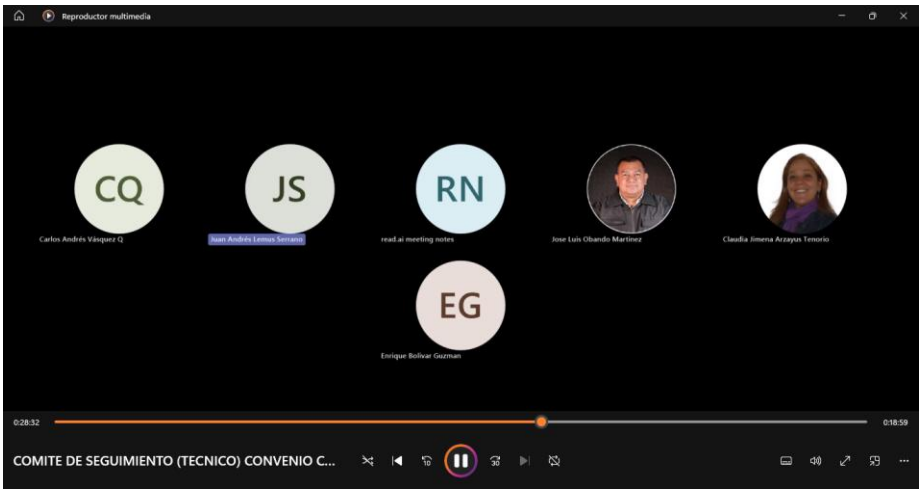
Reproductor multimedia
CQ
Carlos Andrés Vásquez Q
JS
Juan Andrés Lemus Serrano
RN
read.ai meeting notes
Jose Luis Olbando Martinez
Claudia Jimena Arzayus Tenorio
EG
Enrique Bolivar Guzman
0:28:32
0:18:59
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...
