Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: PM-FT-01** **Versión: 05** Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				**Acta de Seguimiento**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	9:00 am	**Hora de finalización**	10:0 pm
	5	11	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Carlos Andrés Vasquez	Fundación Pies Descalzos
Claudia Arzayús	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional
Juan Andres Lemus	Fundación Pies Descalzos
Enrique Bolívar	Supervisor Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento convenio de Asociación CO1.PCCNTR 6493103 con la Fundación de Pies Descalzos para " Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de la infraestructura educativa", que van dirigidos a los departamentos de La Guajira y Norte de Santander.

TEMAS TRATADOS	
1	Las sedes que están siendo atendidas el convenio y los respectivos alcances definidos: **I.E. Villa Fátima sede principal**, ubicada en el corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, matrícula de 559 estudiantes para los estudiantes de 5 a 11 grado, se requieren 22 aulas, baterías sanitarias, aula múltiple (comedor), cocina, dotación y pozo de agua profunda (revisiones). Institución educativa que esta en un compromiso de Regiones de Presidencia. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 240 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple (comedor), cocina y dotación. **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi, corregimiento de Villa Parashi**, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 696 estudiantes, se requieren 15 aulas adicionales y aula múltiple (comerdor), cocina, baterías sanitarias y dotaciones **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, corregimiento de Villa Parashi, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 350 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple (comedor), cocina y dotación. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, zona rural, tiene matrícula 2.300 estudiantes, se requiere 46 aulas, dotación y baterías sanitarias. **I.E. Norberto Iguaran nuevo lote** en la pista para preescolar en el municipio de Maicao I.E. para preescolar. 6 aulas, baterías sanitas, un aula multiuso (Comedor) con cocina y sala profesores. **I.E. Simón Bolívar**, en el municipio de Belén de Bajirá, 6 aulas, baterías sanitarias 1 aula multiuso, dotación y zona administrativa

No Clasificada

	IE colegio nuevo Tibú : 14 aulas Básica media, 12 aulas Básica Primaria, 6 aulas preescolar, 7 baterías sanitarias, 1 Comedor, 1Cocina, 1 Biblioteca, 1 Laboratorio Física, 1 Laboratorio Química, 2 aulas de tecnología2 aulas polivalentes, 1 sala profesores, 1 Área administrativa, 1 Enfermería, Áreas recreativas, Parqueaderos y Dotación de todos los espacios con mobiliario y dotación cocina. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana** de Nortechón del municipio de Uribia. Alcance, Dos (2) áreas recreativas, de las cuales una lleva cubierta (Cancha multiuso). **Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua**, Matrícula de 730 estudiantes. Alcance: 24 aulas, 7 espacios para alojamiento,1 Aula Taller Lectura, 1 Administración y Enfermería, Baterías Sanitarias, comedor cocina y dotación. **Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal** Matricula 2082 estudiantes. Alcance: 16 aulas, baterías sanitarias, comedor – cocina y dotaciones. **Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez – Fonseca,** Matricula 411 estudiantes. Alcance: 8 aulas, baterías sanitarias y comedor - cocina. **IE Antonio Ricaurte sede principal – Quibdò** Matricula 960 estudiantes, Alcance: comedor cocina, biblioteca, zona administrativa, tienda escolar, portería, dos aulas polivalentes para varios usos y cancha múltiple sencilla). **I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana – Uribia** Matricula 320 estudiantes Alcance: Alcance 6 aulas, comedor – cocina, batería sanitária y dotación. **Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu – Uribia Matricula 300 estudiantes Alcance:** 10 aulas, comedor – cocina, bateria sanitaria y dotación. **Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal**, Matricula 235 estudiantes. Alcance estimado 4 aulas, bateria sanitária, comedor – cocina y dotaciones **Institución Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero,** Matricula 409 estudiantes. Alcance estimado 8 aulas, bateria sanitária, comedor – cocina y dotaciones.
2	**Avances de los proyectos:** **IE colegio nuevo Tibú**, vereda la Cuatro, el porcentaje de avance ejecución **100%**, Finalizó el 31 de septiembre 2025. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, este proyecto se está ejecutando por etapas para que se pueda continuar prestando el servicio, el porcentaje de avance ejecución **100%**, obra finalizada en el mes de octubre 2025. **I.E. Villa Fátima sede principal**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, obra finalizada en el mes de septiembre 2025. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, finalizó en el mes de julio 2025. **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi**, **el p**orcentaje de avance ejecución **99 %**, están en etapa de cubiertas, obra finalizada en el mes de noviembre 2025.

No clasificado

I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana, el porcentaje de avance ejecución **100%**, levantamiento de muros, se estima finalización en el mes de agosto 2025.

I.E. Norberto Iguaran municipio de Maicao, el porcentaje de avance ejecución 8**0 %**, se estima finalizar en el mes de diciembre 2025.

I.E. Simón Bolívar, Belén de Bajirá el porcentaje de avance ejecución **75%**, terminado armado de vigas y empiezan a fundir vías aéreas, se estima finalizar en el mes de diciembre 2025.

Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón del municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución **60 %**, la cubierta para instalar llega a mediado de octubre, se estima finalizar en el mes de noviembre 2025.

Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua, Alta Guajira Municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución **10%.**

Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Manpuain, Ya se cuenta con licencia de Construcción, el porcentaje de avance ejecución **10%.**

Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez – Fonseca, estúdios, diseños y licencia de Construcción, se encuentra en contratación.

IE Antonio Ricaurte sede principal – Quibdò, se encuentra contratado.

I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia expedida, obra contratada y a la espera de inicio de obra.

Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia expedida, en proceso de contratación se estima iniciar en el mes de enero 2026.

No Clasificado

Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal, estudios diseños 100% y a la espera de entrega por parte del municipio de la Licencia, en processo de contratación se estima inicio en el mes de febrero 2026

Institución Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero, , estudios diseños 100% y a la espera de entrega por parte del municipio de la Licencia, en processo de contratación se estima inicio en el mes de febrero 2026

En estudios y diseños:

Municipio Uribia

Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu, estudios diseños 100% y cuenta con Licencia expedida. En proceso de contratación, inicio en enero 2026. (Alcance 10 aulas, comedor – cocina, bateria sanitária y dotación)

Municipio Rioacha:

Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal, estudios diseños 100% y a la espera de la entra de la licencia por parte del municipio, En proceso de contratación, inicio en enero 2026

Institución Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero, estudios diseños 100% y a la espera de la entra de la licencia por parte del municipio, En proceso de contratación, inicio en

	enero 2026
3	Juan Andres informa que se les está solicitando a los constructores socializar que están aulas están pensadas para los temas bioclimáticos para el clima que mayormente hay en la Guajira que es el clima caliente. Se va a empezar a crear un traslapo mayor en las cubiertas de las aulas que están en proceso, para tema de lluvias.
4	Se establece programar visita de seguimiento a la Guajira una vez pasa la ola invernal en la zona de la Gaujira.
5	Se solicita enviar los informes de octubre 2025, y los formatos de seguimiento financieros, actas de entrega y acta de socialización de los proyectos.
6	Se continua a la espera de que el Despacho informe la fecha del acto protocolario el acto protocolario de Villa Fátima sede principal, Villa Fátima sede Taguaira y Centro Etnoeducativo Integral Rural Valle de Parashi.
7	Se recomienda agilizar obras para completar el % que se debe alcanzar para el desembolso del próximo mes de diciembre ya se solicitó PAC, por lo cual se recomienda que de debe alcanzar el 35% avance conjunto de los proyectos de la adición. Las condiciones del tercer pago pendiente es la siguientes: Un tercer desembolso por valor del 20 % del valor aportado por el MEN contra el 35 % de avance físico de las obras adicionales del proyecto. Diciembre $ 3.220.000.000 (20%) Se debe enviar documentos entre el 11 y 12 de diciembre.
8	Ya la mayoría de los proyectos que no han iniciado, están en procesos de contratación, ya se recibieron ofertas para Ipuana e Intar , para iniciar lo antes posible las obras. La Fundación informa que el desembolso No. 6 tramitado al MEN aun no ha sido efectivo, se entrará a revisar el tema para agilizar el pago.
	Posible visita del Ministro para el 12 de noviembre al proyecto de Tibú.
	Por favor solicitamos nos puedan ayudar con la información y presupuesto para el nuevo convenio, que será enfocado en la Guajira, se envía un listado inicial para sedes SIMES, se pregunto a las ETC Maicao y Uribia cuales son las sedes que están más deterioradas para posiblemente ser atendidas en un nuevo convenio, En Manaure son 8 sede priorizadas en el listado en Manure de SIMES. Buscaremos como cerrar más el listado de acuerdo con las necesidades.

No clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se tramitaron las licencias para los dos proyectos de Riohacha, a la espera del documento final completo una vez el pago de expensas por parte del Municipio de Riohacha.

2	Se solicita enviar informe del mes de octubre y los formatos financieros, este debe aportarse también al trámite de la cuenta.
3	Pendientes que el Despacho defina la fecha del acto protocolario de La Guajira.
4	Se programa próximo comité técnico para el 11-12-2025
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se establece informe mensual de avance físico y financiero del proyecto del mes de noviembre 2025	30-11-2025	La Fundación
Se establece programar visita de seguimiento a la Guajira en el mes de diciembre 3-5 de 2025.	10-12-2025	MEN, ETC Uribia y La Fundación
Entrega documento final licencias proyectos de Riohacha	30-11-2025	La Fundación y la ETC Riohacha

No Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

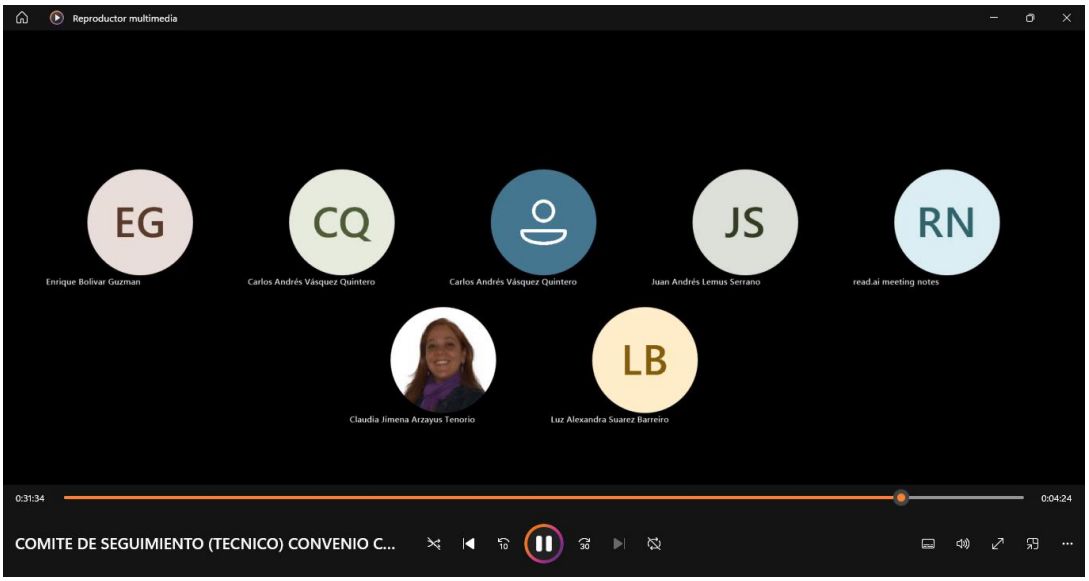
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

ID	Hora de inicio	Hora de finalizació	Nombre2	Documento	Entidad	Cargo	Correo Electrónico2	Celular
1	11/5/25 9:47:57	11/5/25 9:48:33	CLAUDIA ARZAYUS	386555368	MEN	OFICINA DE INFRAESTF	carzayus@mineducaci	3164417801
2	11/5/25 9:47:43	11/5/25 9:48:57	Enrique Bolívar Guzmá	79811735	Min. Educación	Profesional Especializa	ebolivar@mineducaci	3167486156
3	11/5/25 9:52:59	11/5/25 9:53:38	JUAN ANDRES LEMUS	13542371	FUNDACION PIES DESC	DIRECTOR FINANCIERC	juanandres@fpd.ong	3175130552
4	11/5/25 9:47:49	11/5/25 9:56:56	Carlos Andrés Vásque	79797289	Fundación Pies Descal	Arquitecto	carlosv@carlosvasque	3204938181
5	11/5/25 11:33:46	11/5/25 11:34:53	Alexandra Suarez	52268627	MEN	Contratista	Lusuarezb@mineduca	3212003645



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)
N/A

No Controlado

ESPACIO PARA FIRMAS

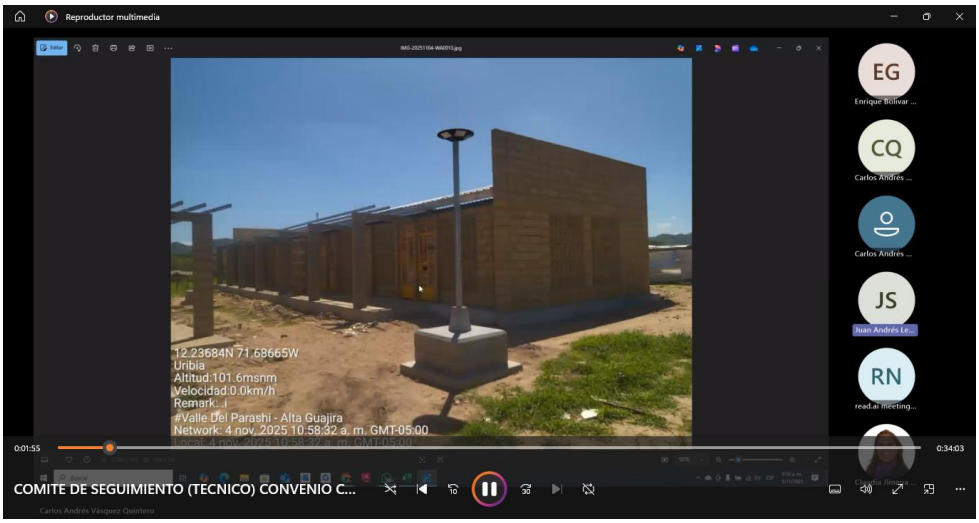
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

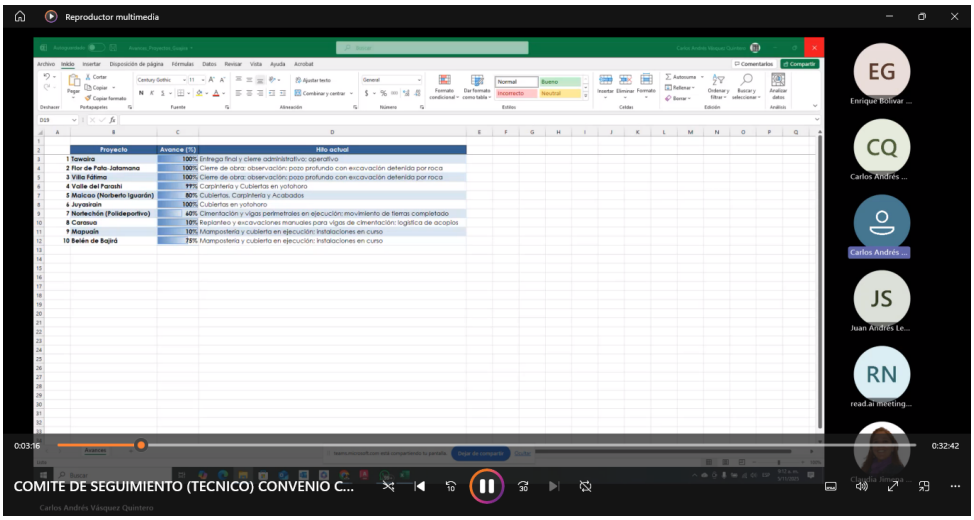
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	

Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

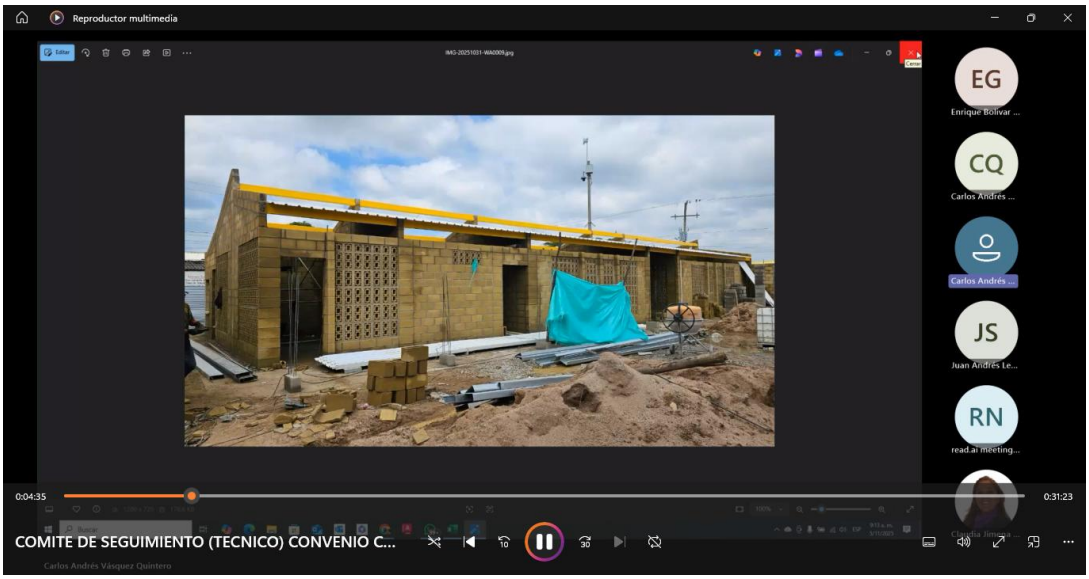





Reproductor multimedia
12.23684N 71.68665W
Uribia
Altitud:101.6msnm
Velocidad:0.0km/h
Remark:...
#Valle Del Parashi - Alta Guajira
Network: 4 nov. 2025 10:58:32 a. m. GMT-05:00
0:01:55
0:34:03
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...

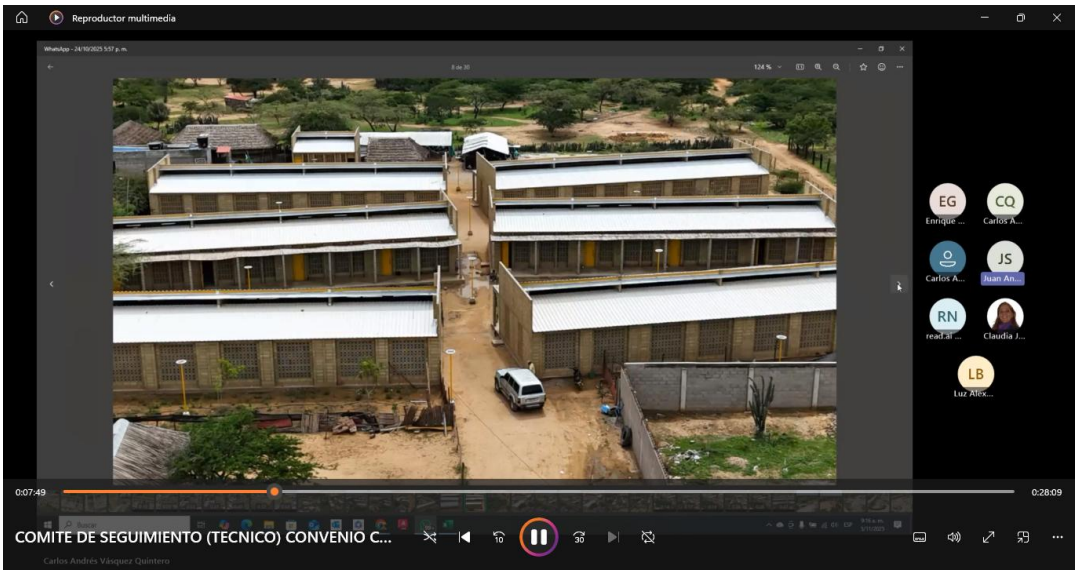

Reproductor multimedia
0:03:16
0:32:42
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...

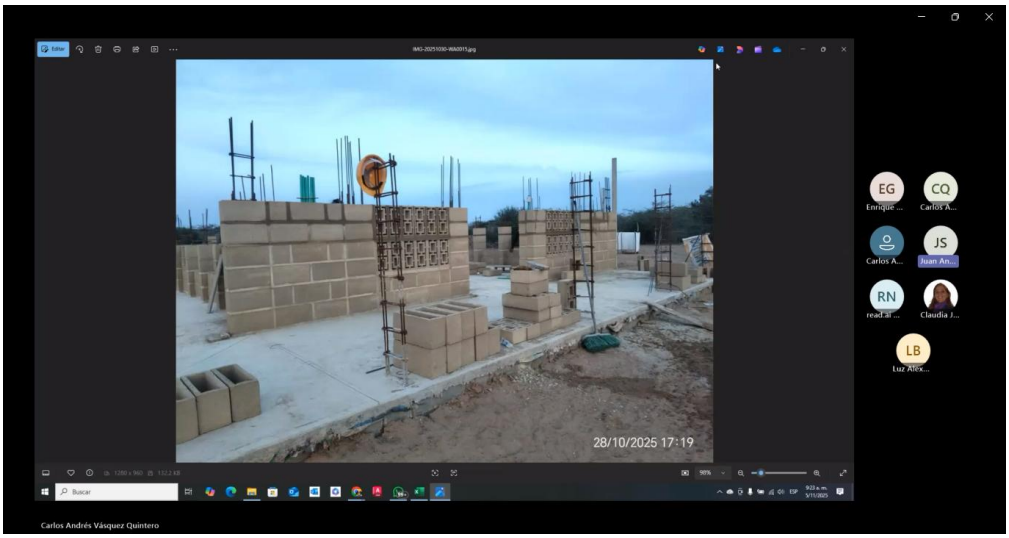

Reproductor multimedia
0:03:45
0:32:13
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...

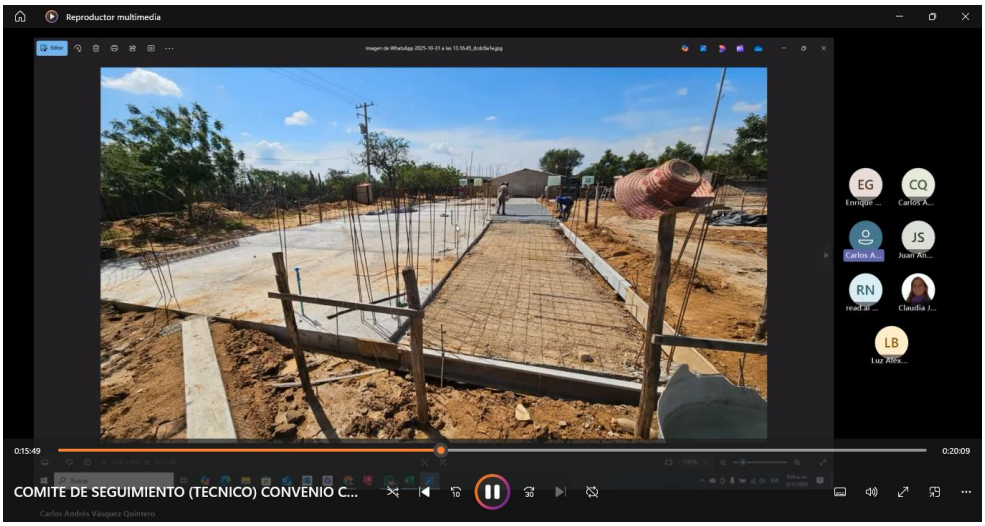

Reproductor multimedia
EG
CQ
JS
RN
0:04:35
0:31:23
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
EG
CQ
JS
RN
LB
0:07:00
0:28:58
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
0:07:29
0:28:29
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


Reproductor multimedia
0:07:49
0:28:09
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...


28/10/2025 17:19
Carlos Andrés Vásquez Quintero


Reproductor multimedia
COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO C...
