

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**RE PROGRAMACION DE GACAR SAI**	**281 días**	**mar 8/4/25**	**lun 6/4/26**
1		**PRELIMINARES GENERALES**	**26 días**	**mar 8/4/25**	**vie 9/5/25**
2		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	7 días	mar 8/4/25	mié 16/4/25
3		CERRAMIENTO PROVISIONAL	15 días	mié 16/4/25	lun 5/5/25
4		SEÑALIZACIO PREVENTIVA	4 días	mar 6/5/25	vie 9/5/25
5		**GUARDIA**	**281 días**	**mar 8/4/25**	**lun 6/4/26**
6		**PRELIMINARES**	**62.5 días**	**lun 12/5/25**	**vie 1/8/25**
7		INCIO PRELIMINARES	0 días	lun 12/5/25	lun 12/5/25
8		DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	7 días	jue 24/7/25	vie 1/8/25
9		DEMOLICIÓN EDIFICACION EXISTENTE	19 días	mar 1/7/25	jue 24/7/25
10		CAMPAMENTO DE 36 M2	7 días	lun 12/5/25	mar 20/5/25
11		FIN PRELIMINARES	0 días	vie 1/8/25	vie 1/8/25
12		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**7 días**	**sáb 2/8/25**	**mar 12/8/25**
13		INICIO MOVIMIENTO DE TIERRA	0 días	sáb 2/8/25	sáb 2/8/25
14		EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION	4 días	sáb 2/8/25	vie 8/8/25
15		RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	3 días	mar 5/8/25	sáb 9/8/25
16		TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.	2 días	lun 11/8/25	mar 12/8/25
17		FIN MOVIMIENTO DE TIERRA	0 días	mar 12/8/25	mar 12/8/25
18		**CIMENTACIÓN**	**41.5 días**	**lun 11/8/25**	**jue 2/10/25**
19		INICIO CIMENTACION	0 días	lun 11/8/25	lun 11/8/25
20		COMPACTACION DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	1 día	lun 11/8/25	lun 11/8/25
21		SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	1 día	mar 12/8/25	mar 12/8/25

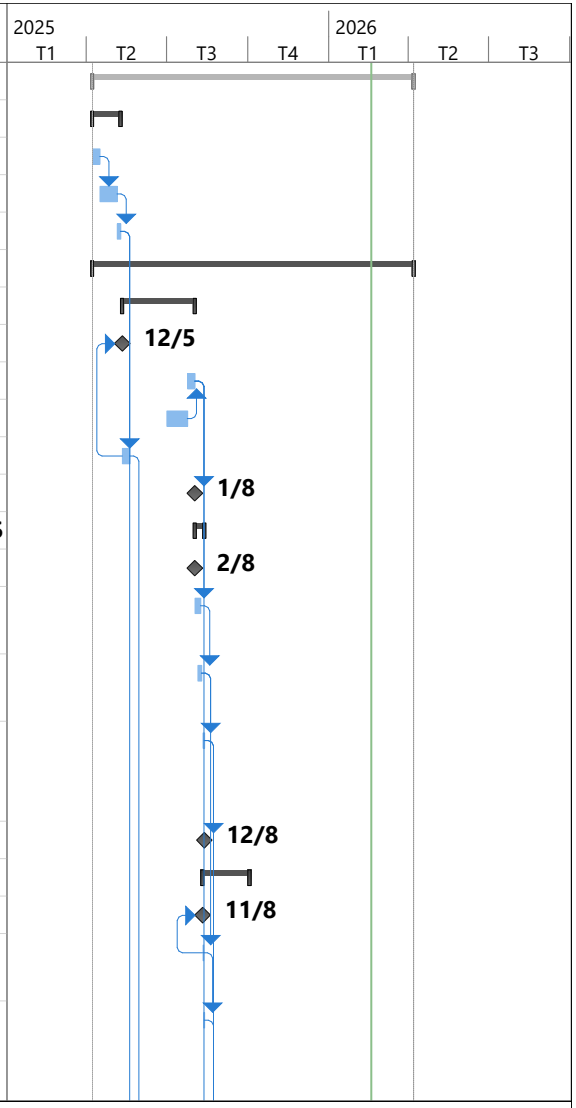

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
22		ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	2 días	mié 13/8/25	jue 14/8/25
23		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS , SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	4 días	lun 29/9/25	jue 2/10/25
24		VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	4 días	vie 22/8/25	mié 27/8/25
25		RELLENO EN MATERAL RECEBO TIPO SUB BASE LOCAL MEJORADA CON CEMENTO PARA ALCANZAR PROCTOR 95%	5 días	vie 15/8/25	vie 22/8/25
26		FIN DE CIMENTACION	0 días	jue 2/10/25	jue 2/10/25
27		**ESTRUCTURA**	**96 días**	**vie 11/7/25**	**mié 12/11/2**
28		**ESTRUCTURA DE CONCRETO**	**69.5 días**	**vie 15/8/25**	**mié 12/11/2**
29		INICIO ESTRUCTURA DE CONCRETO	0 días	vie 15/8/25	vie 15/8/25
30		COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	10 días	vie 15/8/25	sáb 27/9/25

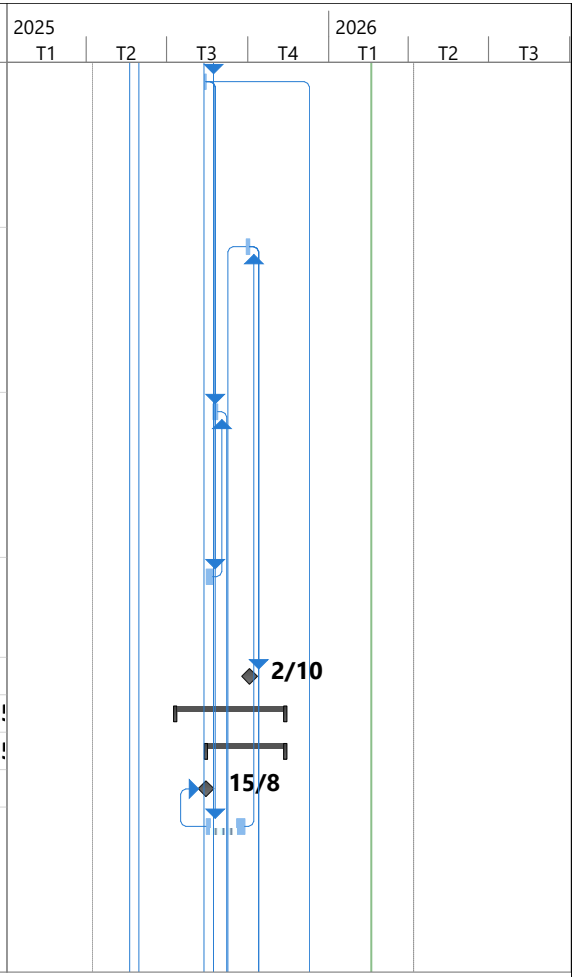

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
31		VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	7 días	vie 3/10/25	sáb 11/10/25
32		CONSTRUCCION DE PLACA ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADA Y RESISTENTE A LOS SULFATOS E=0.15 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE REFUERZO	11 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25
33		IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL, LOSA , VIGA CANAL	3 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25
34		PLANTILLA DE NIVELACION DE LOSA EN MORTERO 1	3 días	mié 5/11/25	sáb 8/11/25
35		VIGAS CANAL EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	1 día	jue 16/10/25	jue 16/10/25
36		FIN ESTRUCTURA DE CONCRETO	0 días	jue 16/10/25	jue 16/10/25
37		**ACERO REFUERZO ANCLAJES**	**70 días**	**vie 11/7/25**	**vie 10/10/25**
38		INICIO ACERO REFUERZO	0 días	vie 1/8/25	vie 1/8/25
39		ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.	70 días	vie 11/7/25	vie 10/10/25
40		MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO	7 días	lun 29/9/25	mar 7/10/25
41		FIN ACERO REFUERZO	0 días	vie 10/10/25	vie 10/10/25
42		**MAMPOSTERIA**	**34.5 días**	**mar 4/11/25**	**mié 17/12/2**
43		INICIO MAMPOSTERIA	0 días	mar 4/11/25	mar 4/11/25

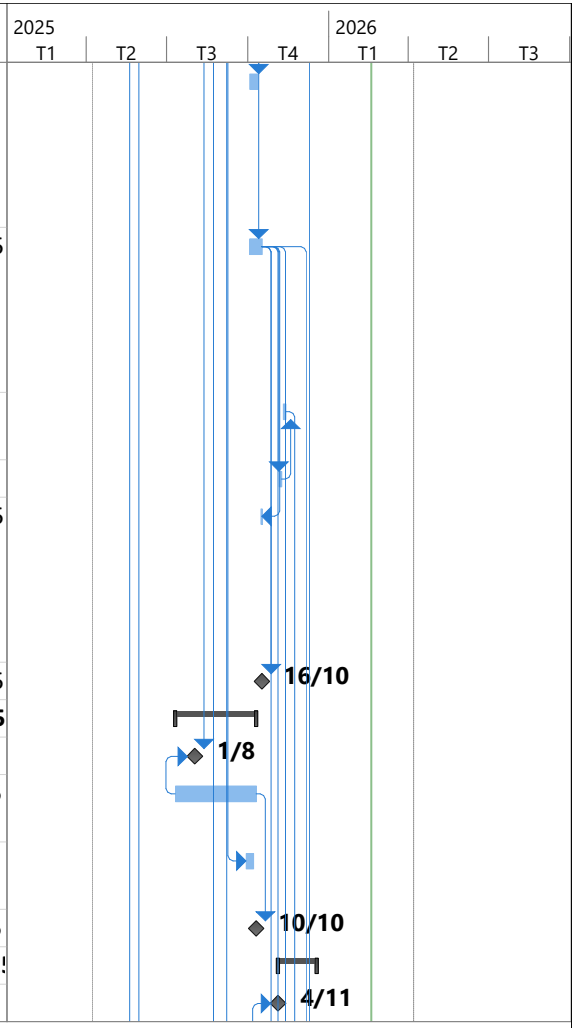

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
44		MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.	34 días	mar 4/11/25	mié 17/12/25
45		MURO EN BLOQUE NO 5 PERFORACION VERTICAL DE 33x23x11,5 INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.	25 días	mar 4/11/25	vie 5/12/25
46		DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO	5 días	jue 11/12/25	mié 17/12/25
47		ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO)	5 días	vie 5/12/25	jue 11/12/25
48		PORTICO EN MURO DE BLOQUE ESTRUCTURAL E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES. Y PLACA DE CONCRETO DE 4000 PSI e: 0.15m	10 días	mar 4/11/25	lun 17/11/25
49		FIN MAMPOSTERIA	0 días	jue 11/12/25	jue 11/12/25
50		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**91.5 días**	**jue 28/8/25**	**lun 22/12/25**
51		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**70 días**	**jue 28/8/25**	**mar 25/11/2**
52		INICIO INSTALACIONES SANITARIAS	0 días	jue 28/8/25	jue 28/8/25
53		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SUCORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	sáb 30/8/25	lun 1/9/25
54		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	vie 29/8/25	vie 29/8/25
55		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	jue 28/8/25	jue 28/8/25
56		PUNTO SANITARIO Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	lun 1/9/25	mar 2/9/25
57		PUNTO SANITARIO Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	vie 29/8/25	vie 29/8/25
58		SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	1 día	sáb 30/8/25	lun 1/9/25

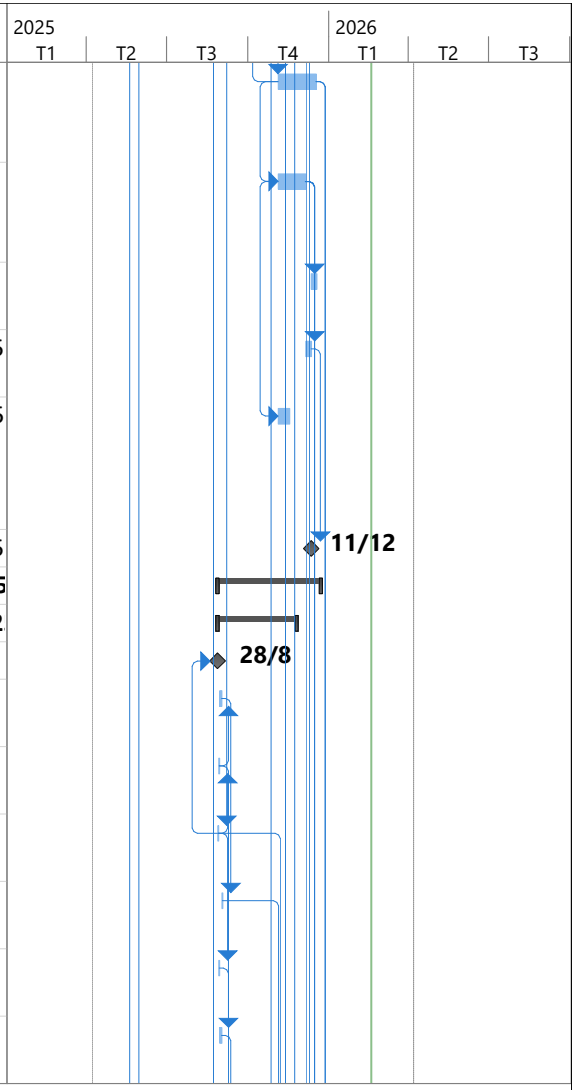

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
59		TAPÓN DE PRUEBA DE Ø3"	1 día	lun 1/9/25	mar 2/9/25
60		TAPÓN DE PRUEBA DE Ø4"	1 día	sáb 30/8/25	lun 1/9/25
61		TUBERIA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25
62		CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS P: 0- 0.5 m	5 días	mié 12/11/25	mar 18/11/25
63		CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS P: 0.5 - 1.0 m	5 días	mié 19/11/25	mar 25/11/25
64		FIN DE INSTALACIONES SANITARIAS	0 días	mar 25/11/25	mar 25/11/25
65		**VENTILACIÓN SANITARIA**	**2 días**	**mié 5/11/25**	**jue 6/11/25**
66		INICIO VENTILACION SANITARIA	0 días	mié 5/11/25	mié 5/11/25
67		TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	1 día	mié 5/11/25	mié 5/11/25
68		TUBERIA DE VENTILACIÓN Ø2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25
69		FIN VENTILACION SANITARIA	0 días	jue 6/11/25	jue 6/11/25
70		**INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AGUA FRIA**	**27.5 días**	**vie 7/11/25**	**jue 11/12/25**
71		INICIO INSTALACIONES HIDRAULICAS	0 días	vie 7/11/25	vie 7/11/25
72		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	vie 7/11/25	vie 7/11/25
73		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	1 día	sáb 8/11/25	lun 10/11/25
74		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	2 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25
75		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	5 días	vie 5/12/25	jue 11/12/25
76		REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"	1 día	lun 10/11/25	mar 11/11/25
77		REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"PARA EXTERIOR	1 día	mié 12/11/25	jue 13/11/25
78		VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø1"	1 día	jue 13/11/25	vie 14/11/25

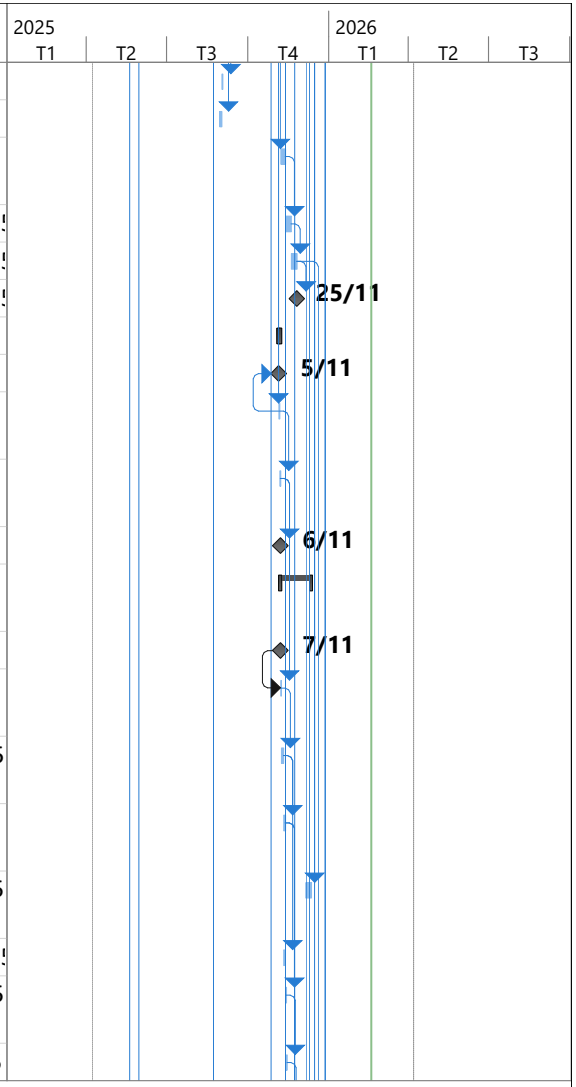

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
79		CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1" .	1 día	vie 14/11/25	sáb 15/11/25
80		DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	2 días	lun 17/11/25	mar 18/11/25
81		CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	1 día	mié 12/11/25	jue 13/11/25
82		FIN INSTALACIONES HIDRAULICAS	0 días	mar 18/11/25	mar 18/11/25
83		**INSTALACIÓN AGUAS LLUVIAS**	**3 días**	**jue 13/11/25**	**lun 17/11/25**
84		INICIO INSTALACION AGUAS LLUVIAS	0 días	jue 13/11/25	jue 13/11/25
85		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4"	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25
86		SIFON CON REJILLA TRAGANTE Ø 4"ALUMINIO	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25
87		IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA EN FRIO	1 día	sáb 15/11/25	lun 17/11/25
88		FIN DE INSTALACION AGUAS LLUVIAS	0 días	lun 17/11/25	lun 17/11/25
89		**DRENAJE AIRES ACONDICIONADOS**	**4.5 días**	**mié 17/12/25**	**lun 22/12/25**
90		INICIO DRENAJE AIRES ACONDICIONADO	0 días	mié 17/12/25	mié 17/12/25
91		TUBO AISLACIÓN RUBATEX 3/4"	1 día	mié 17/12/25	jue 18/12/25
92		TUBO AISLACIÓN RUBATEX 1"	2 días	jue 18/12/25	sáb 20/12/25
93		SOPORTE TUBERIA 3/4"	1 día	jue 18/12/25	vie 19/12/25
94		SOPORTE TUBERIA 1"	1 día	lun 22/12/25	lun 22/12/25
95		FIN DREANAJE AIRES ACONDICIONADO	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25
96		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**90.5 días**	**vie 12/12/25**	**lun 6/4/26**
97		**INFRAESTRUCTURA**	**89 días**	**lun 15/12/25**	**lun 6/4/26**
98		INICIO INFRAESTRCUTURA	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25
99		CAJA DE INSPECCIÓN, SEGÚN NORMA CODENSA CS275.	5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25
100		CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR, SEGÚN NORMA CODENSA CS280	3 días	sáb 20/12/25	mié 24/12/25

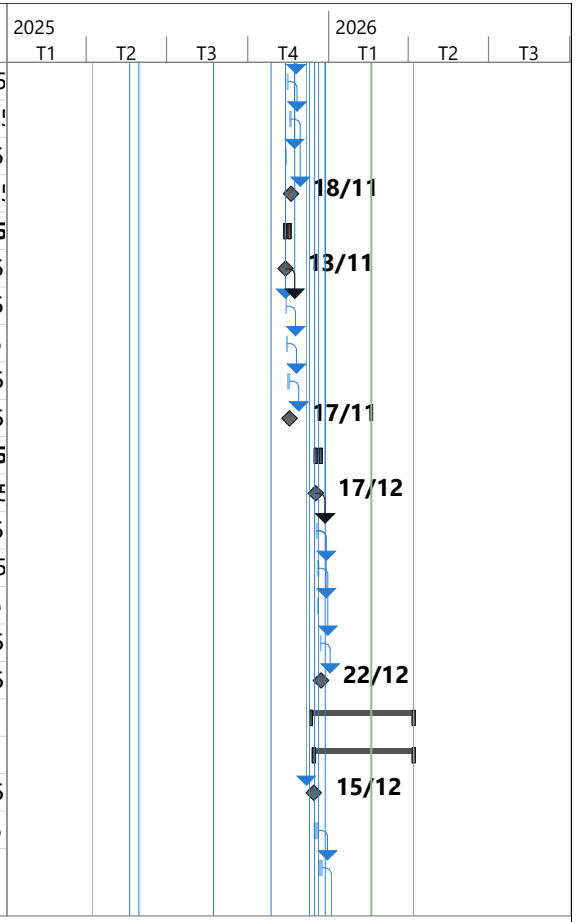

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
101		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA, 13.2 KV – 208/120 KV INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, POSTE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 12 MTS, CABLE DESNUDO 1/0 Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA	35 días	vie 20/2/26	lun 6/4/26
102		FIN INFRAESTRUCTURA	0 días	mié 24/12/25	mié 24/12/25
103		**BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA**	**6 días**	**vie 12/12/25**	**vie 19/12/25**
104		INICIO BANCO DE DUCTERIAS	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25
105		BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO PVC - TDP DE 2XØ1-1/2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	4 días	vie 12/12/25	mié 17/12/25
106		DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4"INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	2 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25
107		DUCTO PVC 1XØ3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	2 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25
108		FIN BANCO DUCTERIAS	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25
109		**TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL**	**3 días**	**vie 19/12/25**	**mar 23/12/25**
110		INICIO TABLERO ELECTRICO	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25

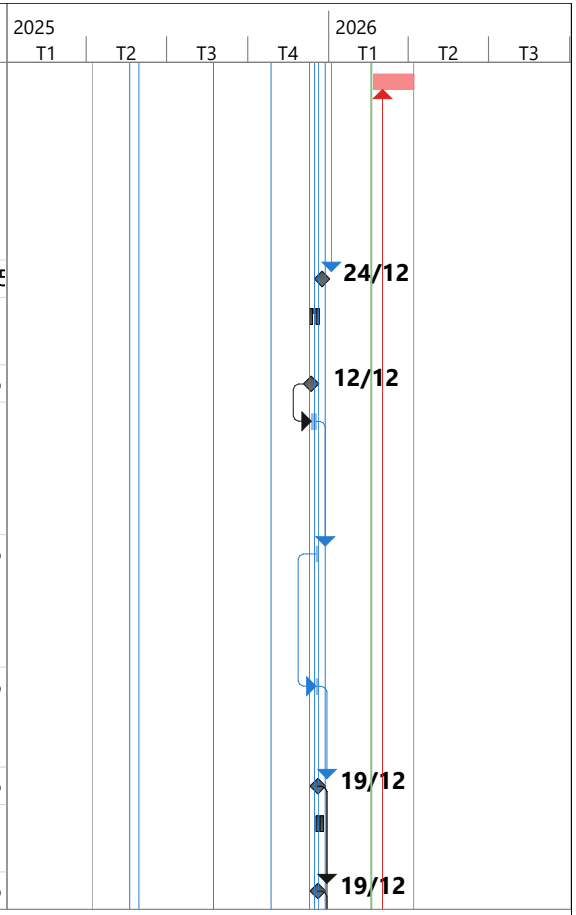

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
111		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO TRN, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMI	3 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25
112		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO TRR, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	3 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25
113		COFRE METÁLICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED, CON PUERTA, INCLUYE LLAVE MANUAL CONMUTABLE DE TRES POSICIONES (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 32A/10KA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	3 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25
114		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO TRS, ENCHUFABLES, OCHO (08) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	3 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25
115		FIN TABLERO ELECTRICO	0 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25
116		**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**	**4 días**	**vie 19/12/25**	**mié 24/12/25**
117		INICIO ACOMETIDA ELECTRICAS	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25
118		ACOMETIDA EN CABLE 3N°4 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°4 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°8 CU-AWG-DESN TIERRA, INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1 día	vie 19/12/25	sáb 20/12/25

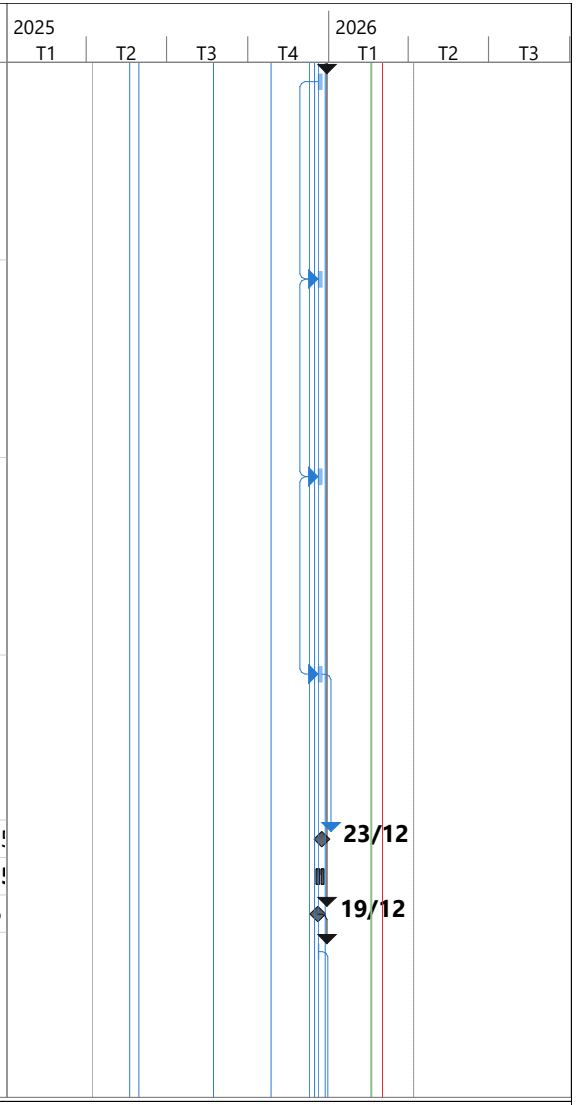

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
119		ACOMETIDA EN CABLE 2N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZARSU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	1 día	lun 22/12/25	lun 22/12/25
120		ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	2 días	lun 22/12/25	mar 23/12/25
121		ACOMETIDA EN CABLE 2N°2 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°2 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°4 CU-AWG-DESN TIERRA, INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1 día	mié 24/12/25	mié 24/12/25
122		FINALIZACION ACOMETIDA ELECTRICA	0 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25
123		**SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)**	**9 días**	**sáb 13/12/25**	**mié 24/12/25**
124		INICIO SALIDAS ELECTRICAS	0 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25
125		INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4"", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIO	1 día	mié 24/12/25	mié 24/12/25

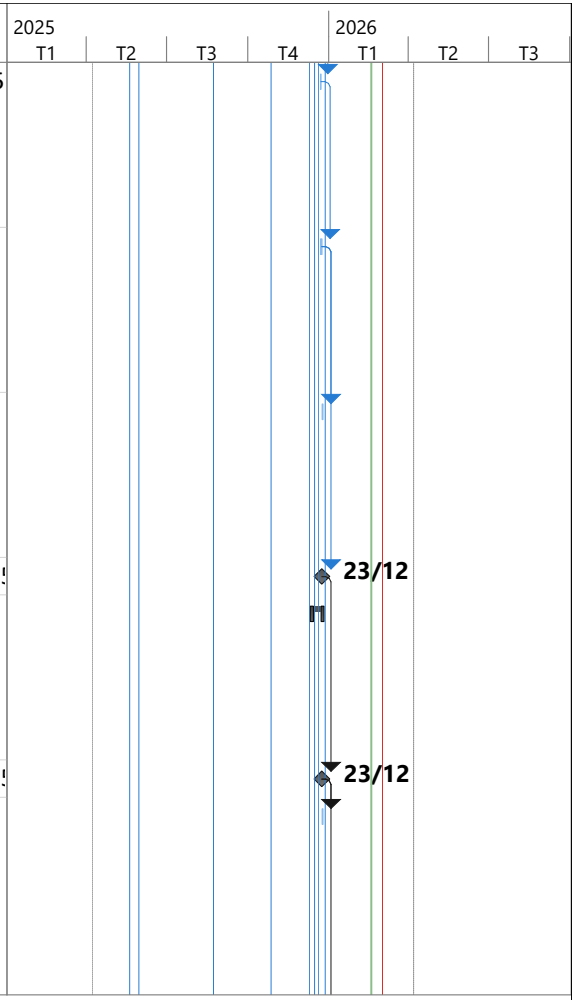

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
126		INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4"Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	1 día	mié 24/12/25	mié 24/12/25
127		SALIDA CON ARRANCADOR DIRECTO EN CAJA PLÁSTICA TESYS LE1M35M714, 1.5 KW, COFRE DE DOBLE AISLAMIENTO, PROTECCIÓN IP 65 CON BORNA DE TIERRA, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	1 día	mié 24/12/25	mié 24/12/25
128		TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 20A/120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4"", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE,	2 días	mar 23/12/25	mié 24/12/25
129		TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 20A/120V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4"", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	2 días	mar 23/12/25	mié 24/12/25
130		TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 20A/120V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4"", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLER	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25

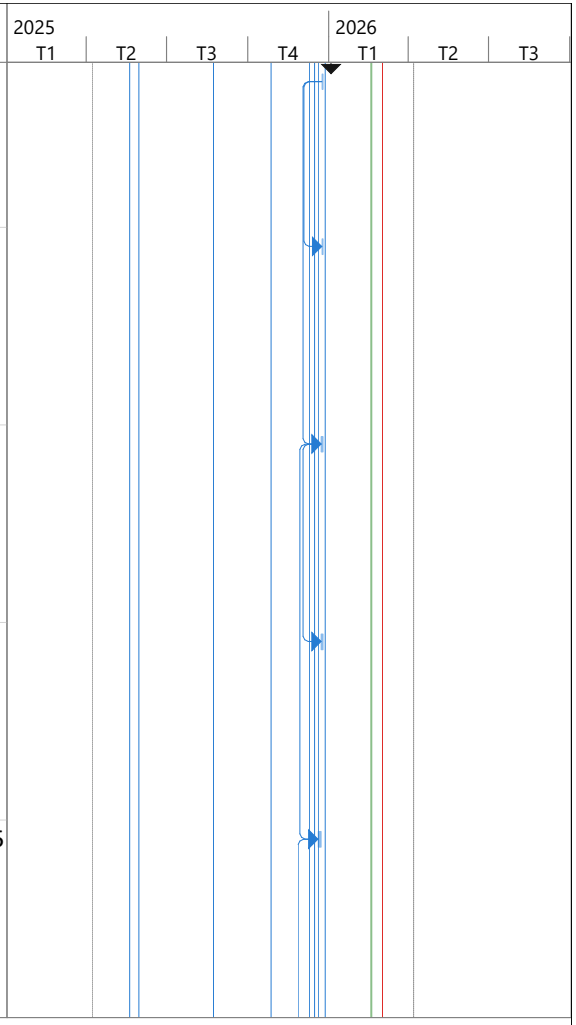

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
131		TOMACORRIENTE BIFÁSICA DE INCRUSTAR 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20R CON CLAVIJA 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20P, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIO	2 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25
132		LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	2 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25
133		LUMINARIA LED SYLVANIA PANEL REDONDO 12W NW, 4000K, 750LM, 100-240V, IP20, FP>0.5, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TER	2 días	sáb 13/12/25	mar 16/12/25
134		LUMINARIA SCHREDER PONTO, COLORES BLANCO, ROJO O VERDE, TIPO BALIZAMIENTO (1 LED), POTENCIA 1,2 W, , TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, IP 67, IK 10, INCLUYE DRIVER, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	3 días	sáb 13/12/25	mié 17/12/25
135		LUMINARIA SCHREDER PONTO, COLORES BLANCO, TIPO PROYECCIÓN (3 LED), POTENCIA 1,2 W, , TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, IP 67, IK 10, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	3 días	lun 15/12/25	jue 18/12/25

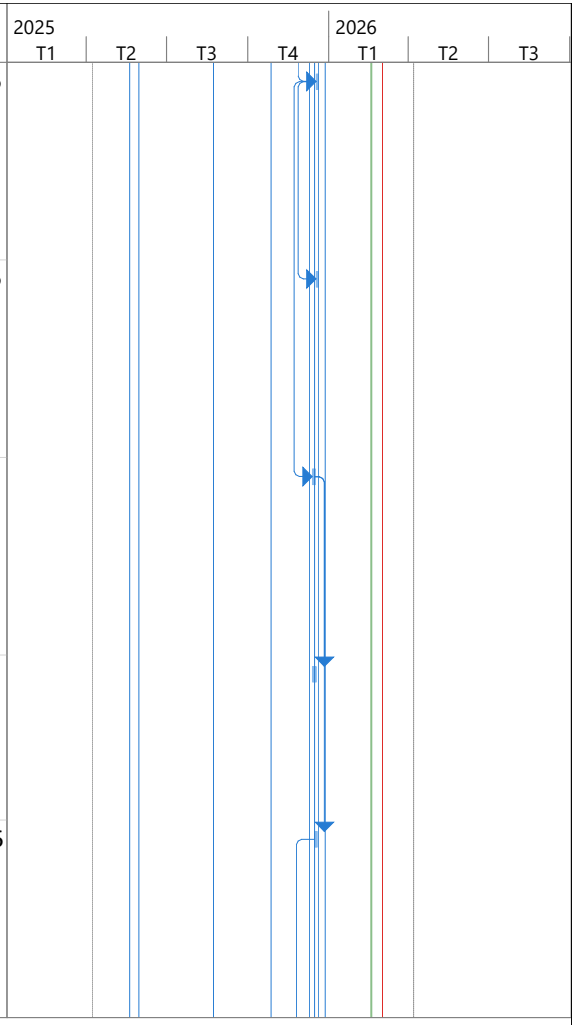

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
136		LUMINARIA SCHREDER PONTO, COLORES BLANCO, TIPO PROYECCIÓN (3 LED), POTENCIA 1,2 W, , TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, IP 67, IK 10, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	2 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25
137		LUMINARIA EMERGENCIA IP65 BULKHEAD-LE, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	3 días	lun 15/12/25	jue 18/12/25
138		LUMINARIA DE EMERGENCIA LED EMERG R3 2X1W P28760 DE SYLVANIA 6000K, 2x100LM, 2W, AUTONOMÍA 180 MIN, BATERIA Ni-MH 3.6V 1000 mAH, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	3 días	lun 15/12/25	jue 18/12/25
139		FIN SALIDAS ELECTRICAS	0 días	jue 18/12/25	jue 18/12/25
140		**PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA**	**12 días**	**lun 15/12/25**	**lun 29/12/25**
141		INICIO PROTECCIONES	0 días	jue 18/12/25	jue 18/12/25
142		PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8" , INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMÉRICO, CONECTOR BIMETÁLICO, ACCESORIOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25
143		ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	3 días	mar 23/12/25	vie 26/12/25

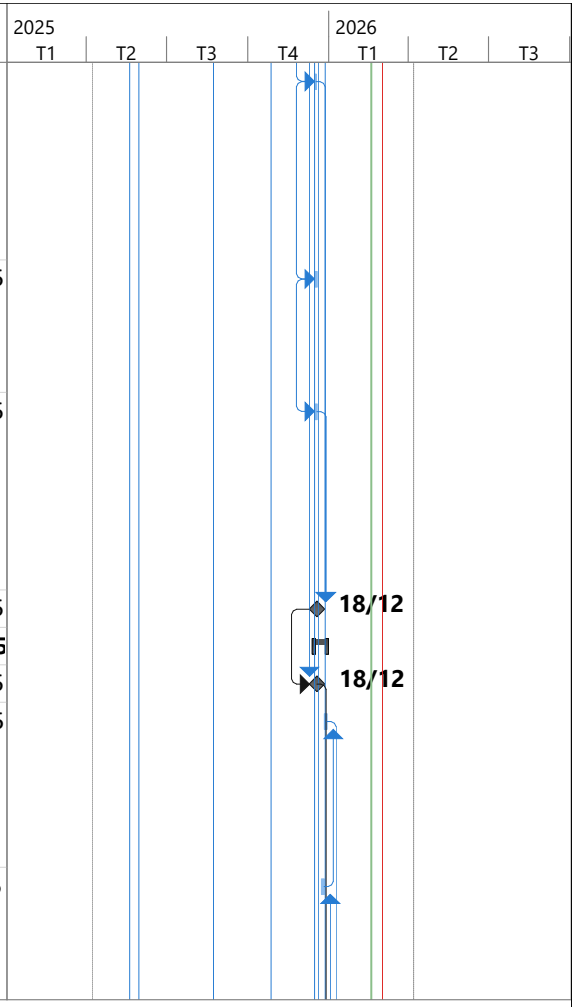

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
144		PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA (01) VARILLAS CW 5/8"COBRE- 99%, INCLUYE EXCAVACION, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, UNA (01) BOLSAS 25KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO, CAJA DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30)M CON TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU C	3 días	jue 18/12/25	lun 22/12/25
145		BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG DESNUDO,TUBERIA PVC DE 1"EMBEBIDA INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, DUCTERIA, CONECTOR BIMETÁLICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMI	4 días	jue 18/12/25	mar 23/12/25
146		CABLE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y	3 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25
147		FIN PROTECCIONES	0 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25
148		**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**	**13 días**	**lun 15/12/25**	**mar 30/12/2**
149		INICIO VOZ Y DATOS	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25
150		PUNTO DE VOZ Y PUNTO DE DATOS (cableado horizontal, Salida de Telecomunicaciones Jack RJ45 tanto para el puesto de trabajo como para el herraje, Face plate, Patch Cord de área de trabajo, Patch Cord de administración).	2 días	mié 24/12/25	vie 26/12/25
151		HERRAJE PATCH PANEL BLINDADO	1 día	lun 29/12/25	lun 29/12/25
152		ORGANIZADOR HORIZONTAL	2 días	lun 29/12/25	mar 30/12/2
153		GABINETE DE PISO	1 día	vie 26/12/25	sáb 27/12/25
154		EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION	3 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25

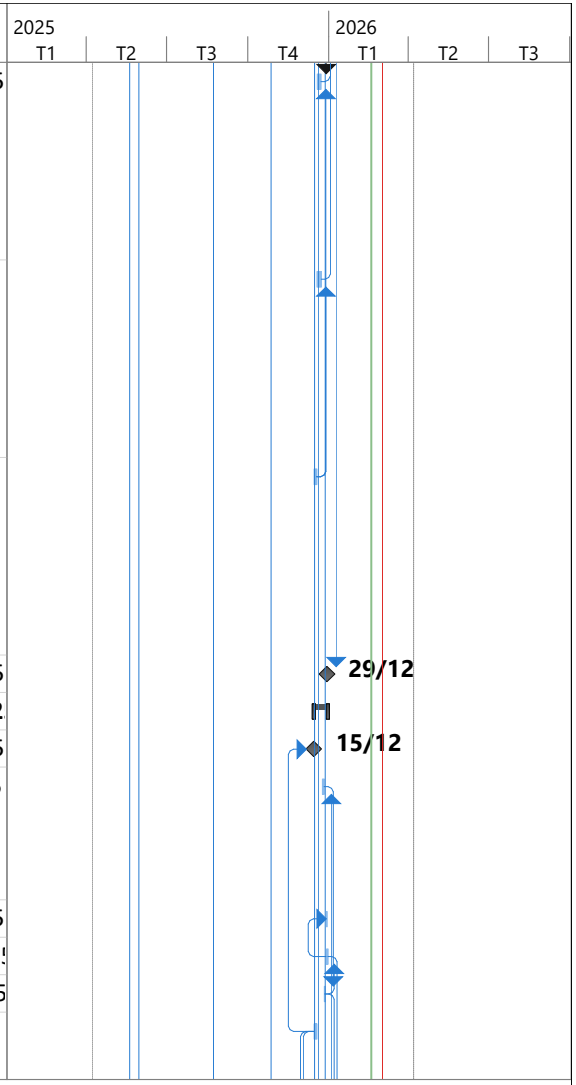

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
155		CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN (CS274) PARA DUCTIFICACION DE FIBRA OPTICA, 60 CM DE ANCHO *60 CM DE LARGO Y 100 CM DE FONDO, CON SU RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN Y PINTURAS DE LAS TAPAS	1 día	mar 23/12/25	mié 24/12/25
156		BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO PVC - TDP DE 2XØ2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	4 días	sáb 20/12/25	jue 25/12/25
157		FIN VOZ Y DATOS	0 días	mar 30/12/25	mar 30/12/25
158		**INSTALACIONES MECANICAS**	**8 días**	**mié 17/12/25**	**vie 26/12/25**
159		INICIO INSTALACIONES MECANICAS	0 días	mié 17/12/25	mié 17/12/25
160		INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN VARIABLE VRF CON UNA EXTERIOR MODULAR BOMBA DE CALOR Y DESCARGA VERTICAL DE 9.6TR, DOS UNIDADES INTERIORES TIPO CASSETTE 4 VÍAS INCLUYE CONTROL ALÁMBRICO, DUCTERIA PARA CABLEADO, CABLEADO ELÉ	2 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25
161		UNIDAD INTERIOR VRF TIPO CASSETTE 4 VÍAS CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 54.600 BTU/h INCLUYE PANEL	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25
162		UNIDAD EXTERIOR VRF MODULAR BOMBA DE CALOR INVERTER DESCARGA VERTICAL 9.6 TR 220V/3ph/60Hz	2 días	mar 23/12/25	mié 24/12/25
163		RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN VARIABLE EN LA UNIDAD EXTERIOR	1 día	mar 23/12/25	mar 23/12/25
164		SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12.000 BTUINCLUYE ACCESORIOS Y MÓDULOS DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO	2 días	jue 25/12/25	vie 26/12/25
165		FIN INSTALACIONES MECANICAS	0 días	vie 26/12/25	vie 26/12/25
166		**PAÑETES**	**5 días**	**lun 15/12/25**	**vie 19/12/25**

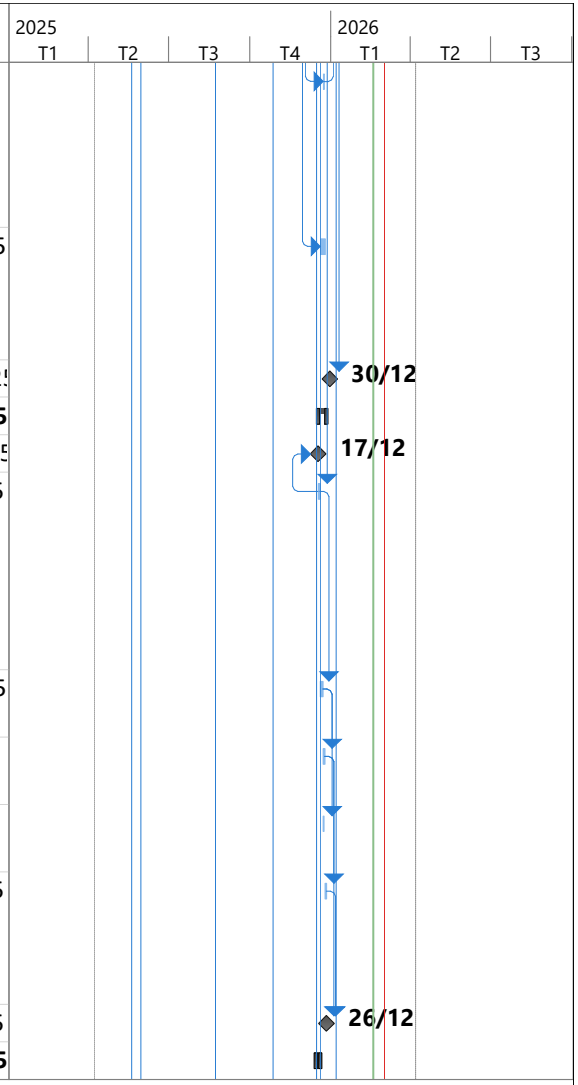

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
167		INICIO PAÑETES	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25
168		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25
169		FIN PAÑETES	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25
170		**CIELO RASOS**	**13 días**	**mar 16/12/2**	**mié 31/12/2**
171		INICIO CIELO RASO	0 días	mar 16/12/2	mar 16/12/2
172		MARQUESINA ARQUITECTÓNICA METÁLICA CON CIELO RASO EXTERIOR EN PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (ACM), SOBRE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA CON UN AREA DE 220 M2 Y REMATES CURVOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL h= .60 Y REMATES LATERALE PLANOS H= .60 SEGUN DISEÑOS INCL	13 días	mar 16/12/25	mié 31/12/25
173		ALUCOBOND E=4MM, INCLUYE SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	5 días	mar 23/12/25	lun 29/12/25
174		FIN CIELO RASO	0 días	mié 31/12/2	mié 31/12/2
175		**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**7 días**	**vie 19/12/25**	**lun 29/12/25**
176		INICIO ACABADO E IMPERMEABILZIACIONES	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25
177		ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E= 0.04 MTS (PREPARACION DE SUPERFICIE)	2 días	sáb 20/12/25	mar 23/12/25
178		PISO EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	2 días	sáb 20/12/25	mar 23/12/25
179		GUARDAESCOBA EN PORCELANATO STORM LAVA 60X120 MATE H= 10CM RECTIFICADO ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1 día	mar 23/12/25	mié 24/12/25

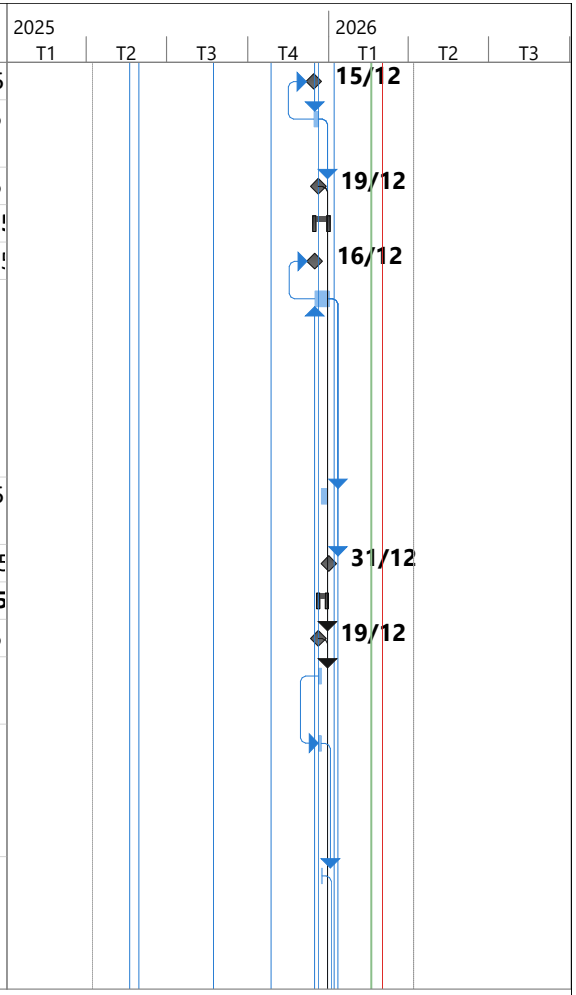

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
180		CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1 día	vie 26/12/25	sáb 27/12/25
181		CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	2 días	mié 24/12/25	vie 26/12/25
182		BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL ANCHO DE CADA MARCO BAJO PUERTAS O POR CAMBIO DE MATERIAL	1 día	lun 29/12/25	lun 29/12/25
183		FIN DE ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	0 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25
184		**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**6 días**	**vie 19/12/25**	**sáb 27/12/25**
185		INICIO ACABADOS MUROS	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25
186		ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	6 días	sáb 20/12/25	sáb 27/12/25
187		FIN ACABADOS MUROS	0 días	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25
188		**CARPINTERIA MADERA**	**1 día**	**lun 29/12/25**	**lun 29/12/25**
189		INICIO CARPINTERIA MADERA	0 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25
190		PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.	1 día	lun 29/12/25	lun 29/12/25
191		FIN CARPINTERIA MADERA	0 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25
192		**CARPINTERIA METALICA**	**7 días**	**sáb 20/12/25**	**lun 29/12/25**
193		INICIO CARPINTERIA METALICA	0 días	sáb 20/12/25	sáb 20/12/25

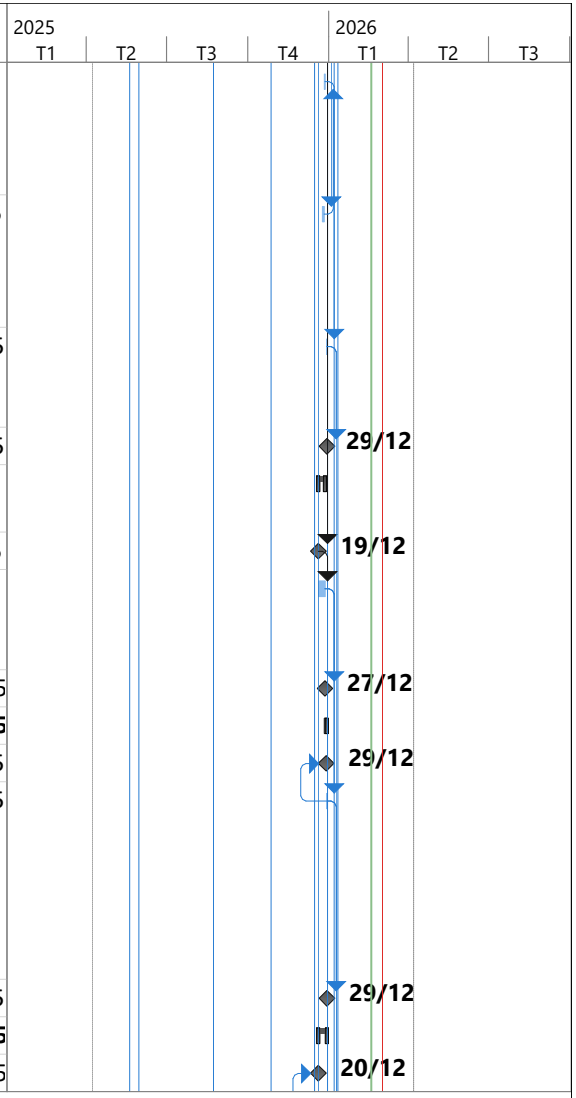

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
194		PUERTA EN ALUMINIO	2 días	sáb 20/12/25	mar 23/12/25
195		VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 3 1a/a" LAMINADO 6+4 PVB .76 VIDRIO INCOLORO	3 días	mar 23/12/25	vie 26/12/25
196		VENTANERIA PROYECTANTE ALMA VIDRIO 6MM INCOLORO	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25
197		BARANDA ACERO INOX. Y VIDRIO TEMPLADO DE 1.10M DE ALTURA PASAMANOS SUPERIOR EN 2"" ACERO INOXIDABLE 304 PARALES EN 2"" A. INOX. SEPARADOS DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECONICOS, ANCADO A PISO MEDIANTE PLATINA Y 4 PERNOS DE EXPANSION CON CUBRETAPA, VIDRIO TEMP	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25
198		FIN CARPINTERIA METALICA	0 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25
199		**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**	**205 días**	**mar 8/4/25**	**mar 30/12/2**
200		INICIO CARPINTERIA ACERO	0 días	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25
201		DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR	1 día	lun 29/12/25	lun 29/12/25
202		DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR	1 día	mar 30/12/25	mar 30/12/25
203		BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR	1 día	mar 30/12/25	mar 30/12/25
204		FIN CARPINTERIA ACERO	0 días	mar 8/4/25	mar 8/4/25
205		**CUBIERTAS**	**18 días**	**jue 23/10/25**	**vie 14/11/25**
206		INICIO CUBIERTA	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25
207		ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y	3 días	jue 23/10/25	mar 11/11/25

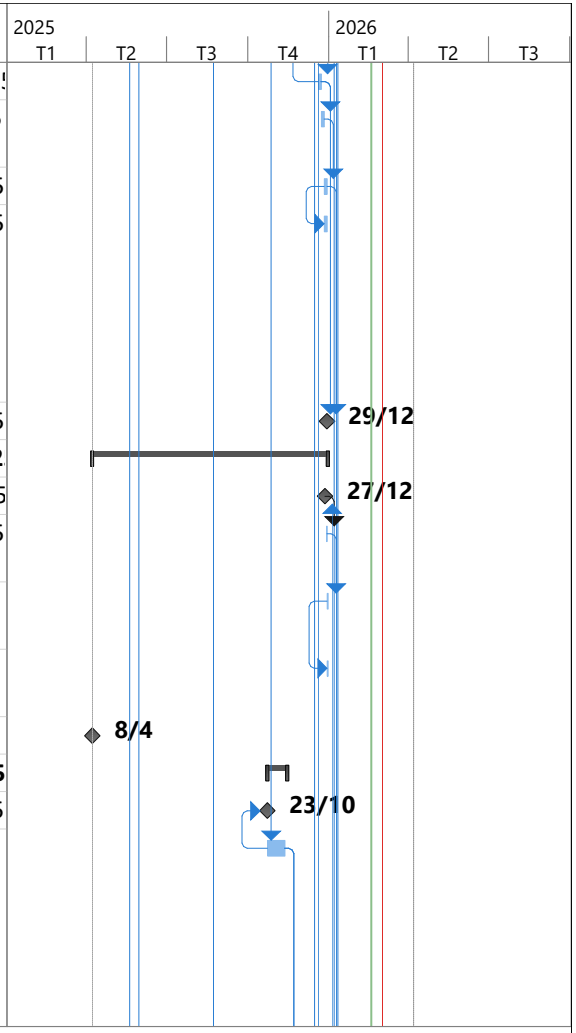

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
208		CUBIERTA TIPO EKOROOF ,Teja Blanca 5.9 x 1.07 m 2 mm Cresta Alta Upvc Klar .CLUYE KIT DE FIJACION DE CUBIERTA 4" 3/4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25
209		CANAL LAMINA ACERO GALVANIZADO 0.30 * 0.30 * 9.0 ML, INCLUYE REBOSE, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25
210		FIN CUBIERTA	0 días	vie 14/11/25	vie 14/11/25
211		**APARATOS Y ACCESORIOS**	**5 días**	**mié 24/12/2**	**mar 30/12/2**
212		INICIO APARATOS Y ACCCESORIOS	0 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25
213		JABONERA DE PORCELANA	1 día	mar 30/12/2	mar 30/12/2
214		TAPA REGISTROS 20 X 20 CM EUROPEA PLÁSTICAS.	1 día	mar 30/12/2	mar 30/12/2
215		SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.	1 día	mar 30/12/25	mar 30/12/25
216		REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	1 día	mar 30/12/2	mar 30/12/2
217		LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA.	1 día	vie 26/12/25	sáb 27/12/25
218		GRIFERÍA DE MESA PUSH MAX PLUS	1 día	vie 26/12/25	sáb 27/12/25
219		LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	2 días	mié 24/12/25	vie 26/12/25
220		POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	1 día	mié 24/12/25	jue 25/12/25
221		FIN APARATOS Y ACCESORIOS	0 días	jue 25/12/25	jue 25/12/25
222		**VIDRIOS**	**7 días**	**jue 18/12/25**	**vie 26/12/25**
223		INICIO VIDRIO	0 días	jue 18/12/25	jue 18/12/25
224		ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	1 día	jue 25/12/25	vie 26/12/25

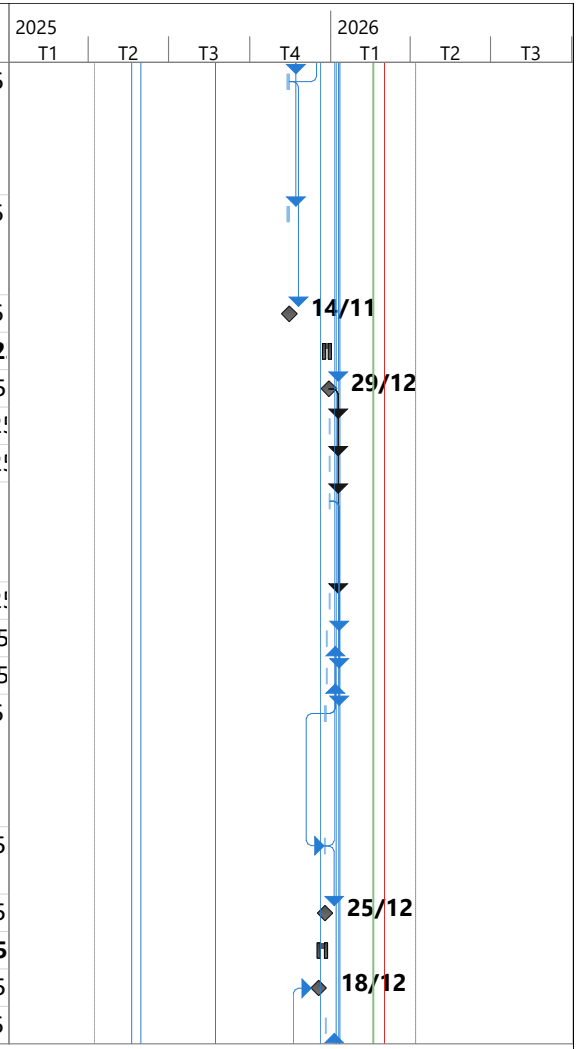

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
225		PP EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE DE LA UNIDAD Y DE LA FUERZA AEREA, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS	6 días	jue 18/12/25	jue 25/12/25
226		FIN VIDRIO	0 días	jue 25/12/25	jue 25/12/25
227		**CERRADURAS**	**2 días**	**lun 29/12/25**	**mié 31/12/2**
228		INICIO CERRADURAS	0 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25
229		BRAZO MECÁNICO PUERTA	1 día	mar 30/12/2	mar 30/12/2
230		CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BAÑO	1 día	mar 30/12/2	mar 30/12/2
231		CERRADURA YALE DOBLE PASADOR	1 día	mar 30/12/2	mar 30/12/2
232		TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER	1 día	mié 31/12/2	mié 31/12/2
233		CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD	1 día	mié 31/12/2	mié 31/12/2
234		FIN CERRADURAS	0 días	mié 31/12/2	mié 31/12/2
235		**OBRAS GENERALES**	**243.5 días**	**lun 26/5/25**	**lun 6/4/26**
236		INICIO OBRAS GENERALES	0 días	lun 26/5/25	lun 26/5/25
237		EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO	5 días	vie 19/12/25	jue 25/12/25
238		LETRA EN ACRÍLICO DE 17X10 ESPESORES DE 6 MM 2 CAPAS DE 3 MM DE ACRÍLICO NEGRO Y EN EL FRENTE UNA CAPA DE ACRÍLICO SILVER DE 3MM	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25
239		AVISOS INFORMATIVOS EN LAMINA DE ALUMINIO DE ALEACIONES 6061-T6, 5052-H38 o EXTRUSIONES SIMILARES SEGÚN DISEÑO TAMAÑO CON MATERIAL RETROREFLECTIVO 60 X 60 CM	3 días	lun 22/12/25	jue 25/12/25
240		TALA DE ÁRBOLES PORTE MEDIO Y ALTO, INCLUYE PICADO DE MATERIAL, DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL	30 días	lun 26/5/25	lun 11/8/25
241		MEDIDAS DE COMPENSACIÓN SEGÚN AUTORIDAD AMBIENTAL	204 días	vie 18/7/25	lun 6/4/26

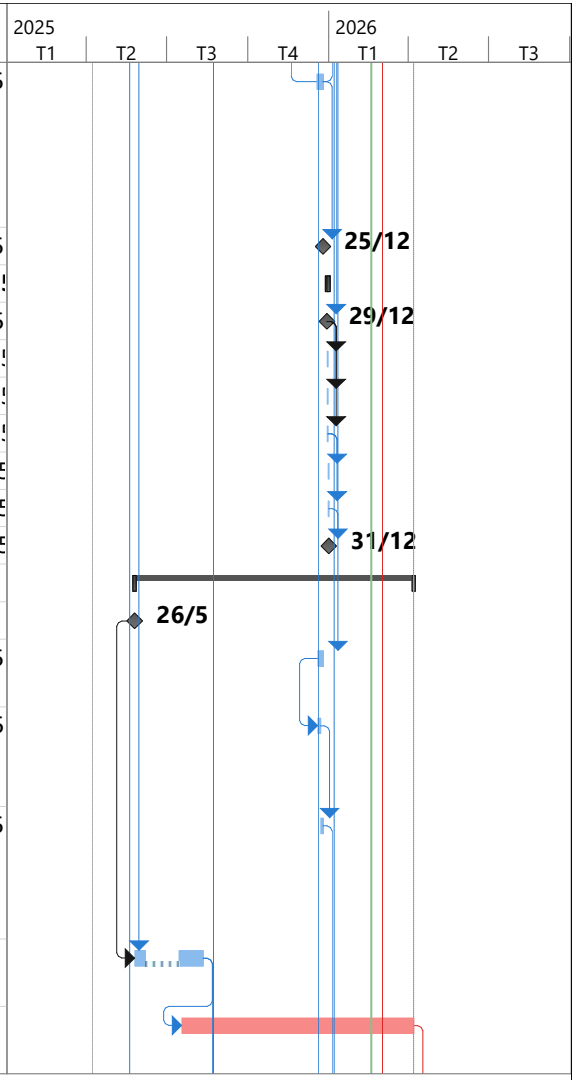

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
242		CORTE Y RETIRO DE RAIZ , INCLUYE PICADO DE MATERIAL, DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL	25 días	lun 11/8/25	vie 12/9/25
243		FIN OBRAS GENERALES	0 días	lun 6/4/26	lun 6/4/26
244		**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**	**5 días**	**jue 25/12/25**	**mié 31/12/2**
245		INICIO ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	0 días	jue 25/12/25	jue 25/12/25
246		ASEO GENERALINTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	1 día	jue 25/12/25	vie 26/12/25
247		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	5 días	jue 25/12/25	mié 31/12/2
248		FIN ASEO Y RETIRO ESCOMBROS	0 días	mié 31/12/2	mié 31/12/2
249		**VIAS-PAVIMENTOS**	**108.5 días**	**mar 12/8/25**	**mar 30/12/2**
250		INICIO PAVMIENTO	0 días	mar 12/8/25	mar 12/8/25
251		COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	3 días	mié 13/8/25	vie 15/8/25
252		CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO RÍGIDO MR-42 RESISTENTE A LOS SULFATOS. INCLUYE MICRO FIBRA DE ACERO Y POLIPROPILENO, POLIETILENO CAL NO. 6, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION DE FRAGUADO, NO INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA)	35 días	jue 6/11/25	sáb 20/12/25
253		ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.	15 días	vie 19/9/25	mié 8/10/25
254		JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA Y SELLO.	10 días	lun 15/12/25	vie 26/12/25
255		SARDINEL DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO TIPO A-10 INCLUYE EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE APOYO Y MORTERO DE PEGA.	3 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25
256		CONSTRUCCION DE CUNETA - BORDILLO SEGUN PLANOS	7 días	lun 22/12/25	mar 30/12/2
257		BORDILLO BAJO RAMPA CONSTRUIDO EN SITIO INCLUYE MORTERO DE NIVELACION	3 días	jue 25/12/25	lun 29/12/25
258		MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.	4 días	jue 25/12/25	mar 30/12/25

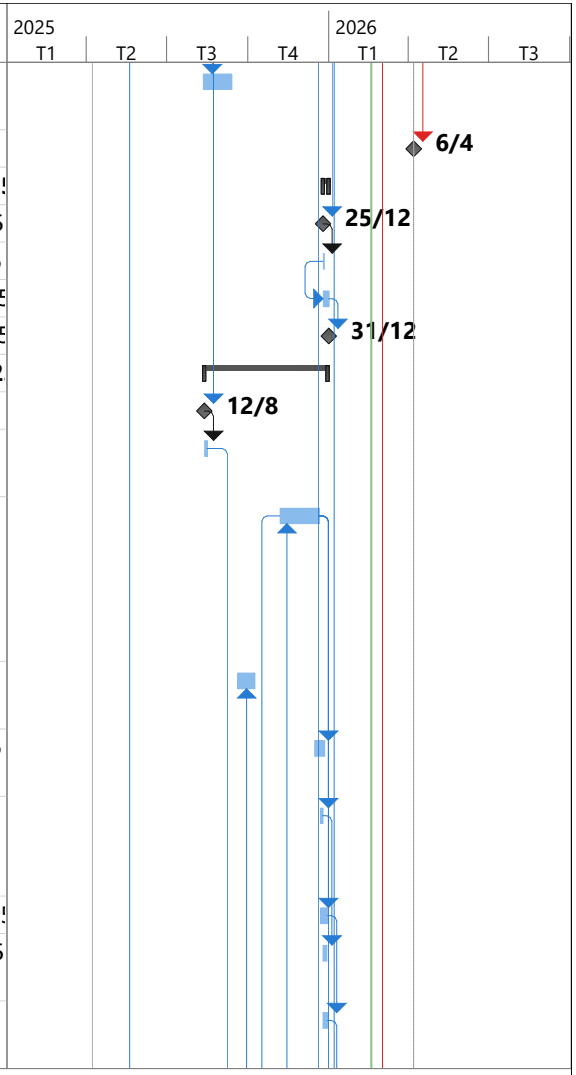

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
259		RELLENO EN MATERAL RECEBO TIPO SUB BASE LOCAL MEJORADA CON CEMENTO PARA ALCANZAR PROCTOR 95%	20 días	jue 9/10/25	lun 3/11/25
260		GEOTEXTIL NT 2100	10 días	lun 8/9/25	vie 19/9/25
261		MUROS EN CONCRETO CONCRETO DE 3000 PSI e: 0.10m PARA CONTENCIÓN., INCLUYE ACERO DE REFUERO	7 días	lun 22/12/25	mar 30/12/25
262		ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS , SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	5 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25
263		ACERO LISO DE 1" DE TRANSMISIÓN PARA PAVIMENTO	15 días	jue 6/11/25	mar 25/11/25
264		FIN PAVIMENTO	0 días	mar 30/12/25	mar 30/12/25
265		**CERRAMIENTO**	**220 días**	**sáb 10/5/25**	**vie 20/2/26**
266		**CERRAMIENTO- PRELIMINARES**	**57 días**	**sáb 10/5/25**	**vie 25/7/25**
267		INCIO PRELIMINARES	0 días	sáb 10/5/25	sáb 10/5/25
268		DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	10 días	mar 3/6/25	lun 16/6/25
269		DEMOLICIÓN EDIFICACION EXISTENTE	17 días	lun 12/5/25	mar 3/6/25
270		DEMOLICIÓN CERRAMIENTO EXISTENTE	5 días	mar 3/6/25	lun 9/6/25
271		DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE, MALEZAS Y CHAMIZOS	38 días	sáb 10/5/25	mar 1/7/25
272		CLASIFICACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN SITIO AUTORIZADO	10 días	lun 14/7/25	vie 25/7/25
273		FIN PRELIMINARES	0 días	vie 25/7/25	vie 25/7/25
274		**CERRAMIENTO-MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**45 días**	**mar 1/7/25**	**jue 28/8/25**
275		INICIO CERRAMIENTO	0 días	mar 1/7/25	mar 1/7/25
276		EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION	45 días	mar 1/7/25	jue 28/8/25
277		FIN CERRAMIENTO	0 días	jue 28/8/25	jue 28/8/25
278		**CERRAMIENTO- CIMENTACION**	**173 días**	**lun 14/7/25**	**vie 20/2/26**

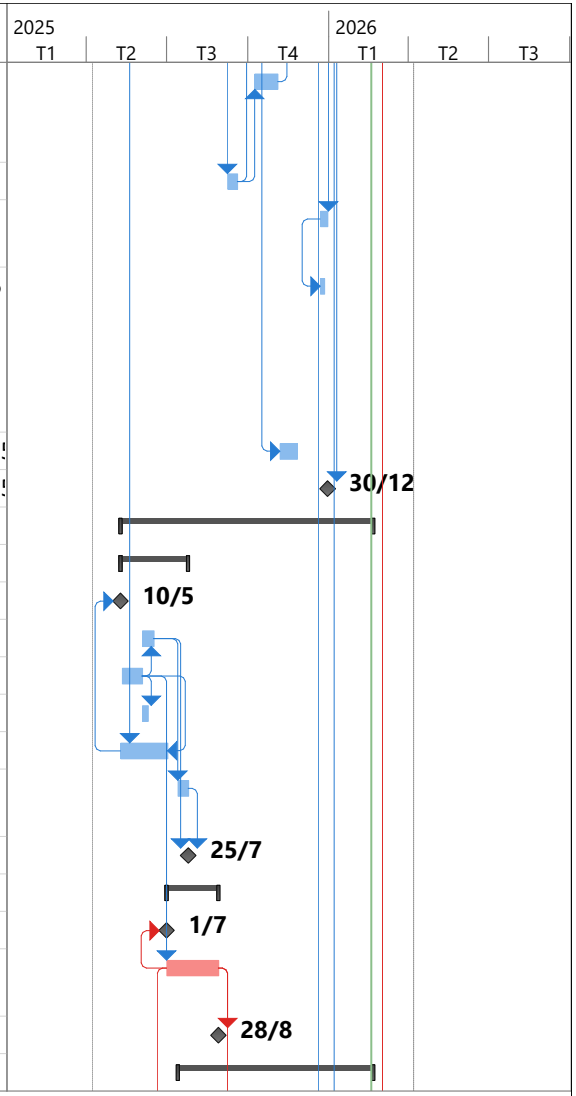

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
279		INICIO CIMENTACION	0 días	lun 14/7/25	lun 14/7/25
280		VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	60 días	vie 12/9/25	jue 27/11/25
281		COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	30 días	sáb 8/11/25	mar 16/12/25
282		ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.	60 días	lun 14/7/25	mar 30/9/25
283		SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	10 días	vie 15/8/25	jue 28/8/25
284		VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	20 días	vie 28/11/25	mar 23/12/25
285		ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	20 días	mar 19/8/25	vie 12/9/25
286		RELLENO EN MATERAL RECEBO TIPO SUB BASE LOCAL MEJORADA CON CEMENTO PARA ALCANZAR PROCTOR 95%	112 días	mié 1/10/25	vie 20/2/26
287		CONCRETO CICLOPEO 3000 RELA 60C/40P	20 días	lun 25/8/25	jue 18/9/25
288		ANCLAJES DE 3/8" PERFORACION 1/2" 10-15 CMS	15 días	jue 4/12/25	mar 23/12/25
289		FIN CIMENTACION	0 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25
290		**CERRAMIENTO- MAMPOSTERIA**	**34 días**	**jue 13/11/25**	**jue 25/12/25**

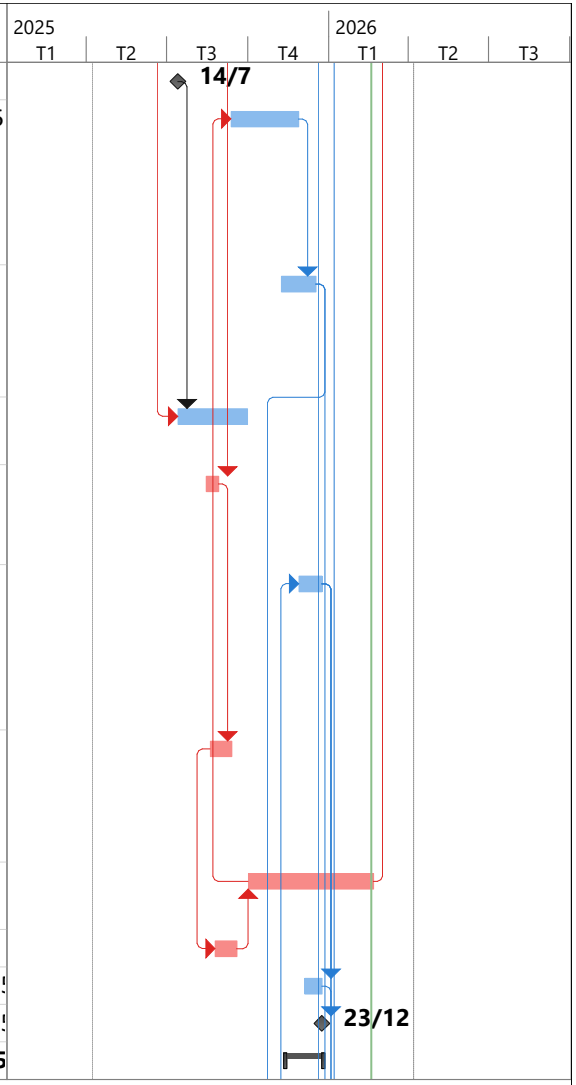

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
291		INICIO CERRAMIENTO	0 días	jue 13/11/25	jue 13/11/25
292		MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,15 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO PARA DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES.	30 días	jue 13/11/25	sáb 20/12/25
293		TUBO DE 3"EN PVC PRESION COLOR AZUL RELLENO DE CONCRETO DE 2000 PSI	25 días	vie 21/11/25	mar 23/12/25
294		PASE PVC SANITARIA 4"x16CM	7 días	mié 17/12/25	jue 25/12/25
295		FINALIZACION CERRAMIENTO	0 días	jue 25/12/25	jue 25/12/25
296		**CERRAMIENTO- ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**	**7 días**	**jue 11/12/25**	**vie 19/12/25**
297		INICIO ACABADOS	0 días	jue 11/12/25	jue 11/12/25
298		ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	7 días	jue 11/12/25	vie 19/12/25
299		FIN ACABADOS	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25
300		**CERRAMIENTO- CARPINTERIA METALICA**	**10 días**	**mié 17/12/25**	**mar 30/12/25**
301		INCIO CARPINTERIA METALICA	0 días	mié 17/12/25	mié 17/12/25
302		CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. INCLUYE. Y T	7 días	vie 19/12/25	lun 29/12/25
303		HILADAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A LOS POSTES METÁLICOS	7 días	vie 19/12/25	lun 29/12/25
304		PLATINA EN ACERO ASTM A 572 SEGÚN PLANOS, INCLUYE PERNOS, ANCLAJE EPOXICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIOAMIENTO	10 días	mié 17/12/25	mar 30/12/25

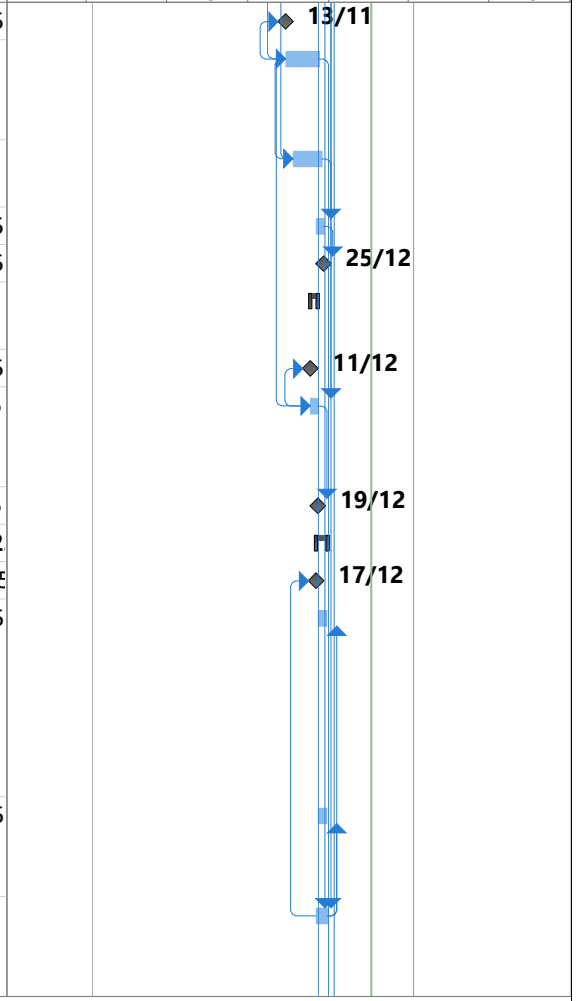

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
305		POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2"DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	7 días	lun 22/12/25	mar 30/12/25
306		PORTON EN TUBO CUADRADO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.0mm DE 0,70 X 0,70" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE WHASH PRIMER Y DOS CAPAS DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE MALL	7 días	lun 22/12/25	mar 30/12/25
307		DELINEADORES TUBULARES H=0,75mt, 0,008m	1 día	lun 29/12/25	mar 30/12/2
308		FIN CARPINTERIA METALICA	0 días	mar 30/12/2	mar 30/12/2
309		**CERRAMIENTO-ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**	**5 días**	**jue 25/12/25**	**mié 31/12/2**
310		INICIO	0 días	jue 25/12/25	jue 25/12/25
311		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	5 días	jue 25/12/25	mié 31/12/2
312		FIN ASEO	0 días	mié 31/12/2	mié 31/12/2
313		**TANQUE DE AGUA SUBTERRANEA Y TANQUE SEPTICO**	**93 días**	**mar 2/9/25**	**lun 29/12/25**
314		INICIO TANQUE	0 días	mar 2/9/25	mar 2/9/25
315		TANQUE SEPTICO IMHOFF HORIZONTAL 1000 LTS	5 días	sáb 20/12/25	vie 26/12/25
316		TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 1.0 X 1.0	3 días	mié 15/10/2	vie 17/10/25
317		FLOTADOR MECANIICO 1"	1 día	vie 10/10/25	sáb 11/10/25
318		PASO PLÁSTICO PARA TANQUE EN FLUORESCENTE TRÁFICO PESADO ANTIDESLIZANTE CON ALMA DE ACERO. RESISTENTE A QUÍMICOS, ÁCIDOS, CLOROX, DEBE CUMPLIR CON NORMA CÁMARA SALINA NTC 1156	2 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25

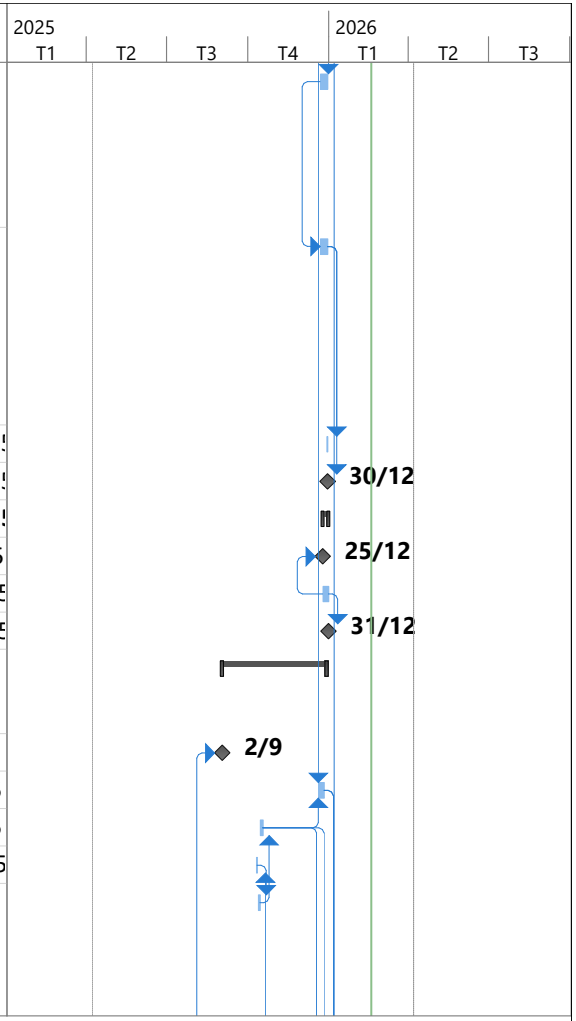

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
319		TUBERIA GALVANIZADA 4 PULG PARA VENTILACIÓN TANQUE SUBTERRÁNEO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	1 día	jue 9/10/25	vie 10/10/25
320		PASAMUROS 3/4"	1 día	mié 8/10/25	jue 9/10/25
321		PASAMUROS 1"	1 día	mié 8/10/25	jue 9/10/25
322		PASAMUROS 1 1/2"	1 día	mié 8/10/25	jue 9/10/25
323		PASAMURO 2"	1 día	mié 8/10/25	jue 9/10/25
324		PASAMUROS 3"	1 día	mié 8/10/25	jue 9/10/25
325		TANQUE SUBTERANEO EN CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 3.5X3.5X1.00 MTS INCLUYE EXCAVACION, FORMALETERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SUMEJECUCION	30 días	mar 2/9/25	jue 9/10/25
326		IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE CON POLIUREA EN FRIO (SIKALASTIC 850)	2 días	jue 25/12/25	vie 26/12/25
327		TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 2.0 X 1.0	1 día	sáb 27/12/25	lun 29/12/25
328		FIN TANQUE	0 días	vie 26/12/25	vie 26/12/25
329		**EQUIPOS**	**7 días**	**lun 22/12/25**	**mar 30/12/2**
330		**EQUIPOS ELECTRICOS**	**7 días**	**lun 22/12/25**	**mar 30/12/2**
331		Smart-UPS On-Line de APC, 3 kVA, iones de litio, montaje en rack 1U, 120 V, 5 x 5-20R + 1 x L5-30R, tomacorrientes NEMA, puerto SmartConnect, tiempo de funcionamiento prolongado, con conjunto de rieles, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS Y TRANSFORMADORES DE AISLA	2 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25
332		SIPS EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 2,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 100 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, ACCESORIOS, TUBERÍA DE CONEXIÓN GALVANIZADA, PEDESTALES, FLOTADOR ETC.)	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25

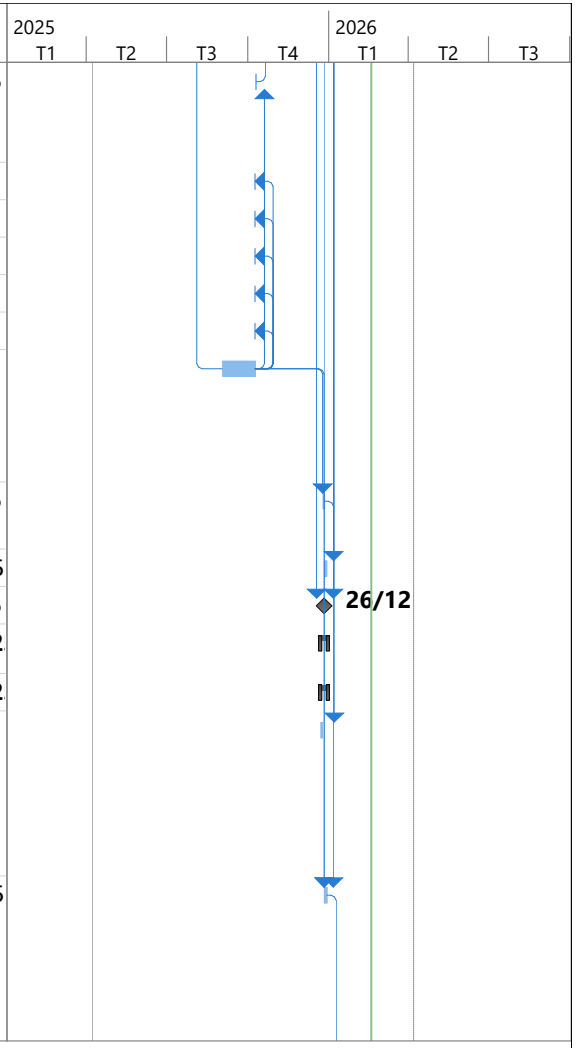

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
333		SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, EN HIERRO DUCTIL CON MOTOR ELECTRICO DE 1800 RPM, INCLUYE FLOTADOR Y CJ DE ARRANQUE	1 día	mar 30/12/25	mar 30/12/25



Andres Benito Useche Bustos
Arquitecto.
Representante Legal
CONSORCIO INTERSEDES 4
NIT. 901.884.356-8

Proyecto: RE PROGRAMACION
Fecha: mié 18/2/26

2024
HAROLD SIERRA ARISMENDY -
RL CONSORCIO AW
