Culturas	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	**Página** 1 de 9 **Código:** F-GIN-098 **Versión:** 4 **Fecha:** 24/Abr/2019

FECHA:	Semana: 4	13/10/2025	19/10/2025	
OBJETO:	***"Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"***			
CONTRATO DE OBRA No.:	1747-2025	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	1751-2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO ORIMEG - 2025	**INTEVENTOR**	JVM INGENIERÍA SAS BIC	
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$ 1.976.833.550,67	**VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 318.337.024,00	
VALOR SEDE DE ATANQUEZ:	$ 979.397.435,93	**VALOR SEDE DE ATANQUEZ:**	$ 149.870.938,00	
VALOR SEDE DE SANTA ROSA DEL SUR:	$ 997.436.114,74	**VALOR SEDE DE SANTA ROSA DEL SUR:**	$ 168.466.086,00	
FECHA DE INICIO OBRA:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:**	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	TRES (3) MESES Y NUEVE (9) DÍAS CALENDARIO	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	TRES (3) MESES Y NUEVE (9) DÍAS CALENDARIO	

3. Descrición Obras ejecutadas

Durante la semana de ejecución, comprendida entre el 13 de octubre de 2025 y el 19 de octubre de 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades en la obra:

- Se dio continuidad a la excavación manual y/o mecánica para zapatas.
- Se realizó la instalación de la red electrica provisional
- Se realizó figurado y armado de acero para cimentación de la estructura
- Se recibió el suministro de material petreo (Arena de rio, grava, piedra ciclopeo)

Observaciones de interventoría

Durante la presente semana, esta interventoría evidencia que continúan varios requerimientos pendientes de atención por parte del contratista, los cuales afectan directamente el normal desarrollo y avance del proyecto:

- A la fecha, no se ha recibido la versión ajustada del Plan de Contingencia, documento que ha sido requerido en múltiples oportunidades, incluyendo las Alertas 1 y 2 emitidas por esta interventoría. Si bien el contratista remitió el documento, este fue devuelto con observaciones técnicas y administrativas para su respectiva subsanación.

- Tal como se ha indicado en las comunicaciones y alertas previas, el proyecto aún no cuenta con la presencia del residente de obra, profesional con dedicación del 100% conforme a las obligaciones contractuales. Tampoco se ha recibido notificación formal o solicitud de cambio por parte del contratista. Esta ausencia limita el seguimiento técnico y administrativo en campo, generando un alto riesgo en la ejecución del proyecto. Si el día 20 de octubre de 2025, no se evidencia el profesional en campo esta interventoría tomará medidas contractuales, ya que este requerimiento se ha realizdo de forma reiterada.


- Se ha solicitado incrementar el personal operativo y técnico en obra, a fin de mejorar los rendimientos de las actividades y cumplir con los cronogramas establecidos. No obstante, se observa que los avances semanales continúan siendo bajos debido a la limitada cantidad de personal en el frente de trabajo.

- El atraso acumulado del proyecto se incrementó considerablemente durante la presente semana, pasando de un -6,65% (según el informe anterior) a un -13,40%, situación que refleja un bajo ritmo de trabajo en la ejecución y una deficiente planeación de los recursos por parte del contratista. Esta interventoría reitera la necesidad de implementar acciones correctivas inmediatas que permitan recuperar el ritmo de trabajo y evitar un mayor impacto en el cumplimiento del plazo contractual.

- El contratista ha presentado la solicitud de inclusión de un ítem para retiro de material en la sede de Santa Rosa del Sur, así como un NP relacionado con la demolición de rocas encontradas durante el proceso de excavación. Sin embargo, la documentación técnica y económica entregada no se encuentra completa ni cumple con los soportes necesarios para realizar la validación y análisis de viabilidad por parte de esta interventoría. En ese sentido, se encuentra pendiente la realización de una mesa de trabajo entre el contratista y la interventoría, con el fin de revisar detalladamente ambas solicitudes.

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.



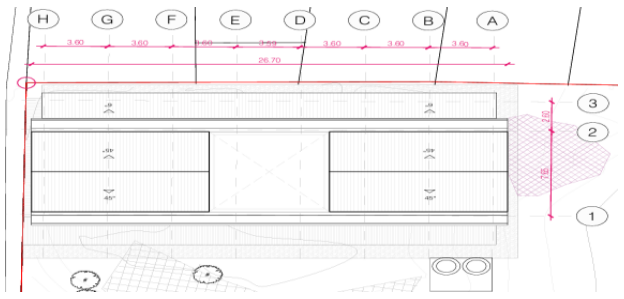



E Curva "S"

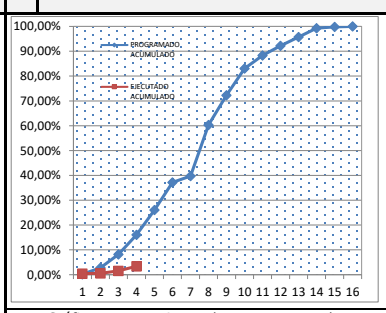


Gráfico porcent ejecutadas vs programadas

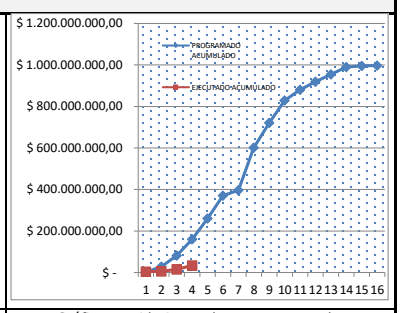


Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



Visual 1: EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA ZAPATAS



Visual 2: EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA ZAPATAS



Visual 3: DESCARGA DE MATERIALES



Visual 4: ACOPIO DE MATERIALES

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	28,00	**27,72%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 160.476.368,02**	**16,09%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 33.962.342,62**	**3,41%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**-$ 126.514.025,40**	**-12,68%**
Se presenta un atraso en la Obra	SI	SI
ESTADO DE ATRASO EN DÍAS (Atraso)	14,00	

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1	1
	PROFESIONAL SST Y AMBIENTE	1
	GEOTÉCNICO	1
	ESTRUCTURAL	1
	HIDROSANITARIO	1
	ELÉCTRICO	1
	PROFESIONAL SOCIAL	1
	ABOGADO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA 2	1
	PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL	1
	GEOTÉCNICO	1
	ESTRUCTURAL	1
	HIDROSANITARIO	1
	ELÉCTRICO	1
	PROFESIONAL SOCIAL	0
	ALMACENISTA	0
	MAESTRO DE OBRA	1
	AYUDANTES	1
	OFICIALES	0
	HERREROS	0
TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA		**18**


ARQ. FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,20%	0,20%	0,43%	0,43%
2	2,60%	2,80%	0,10%	0,53%
3	5,38%	8,18%	1,00%	1,53%
4	7,90%	16,09%	1,88%	3,41%
5	10,00%	26,08%	0,00%	
6	11,07%	37,16%	0,00%	
7	2,59%	39,75%	0,00%	
8	20,56%	60,31%	0,00%	
9	11,96%	72,26%	0,00%	
10	10,82%	83,08%	0,00%	
11	5,23%	88,31%	0,00%	
12	3,85%	92,16%	0,00%	
13	3,58%	95,74%	0,00%	
14	3,55%	99,29%	0,00%	
15	0,55%	99,85%	0,00%	
16	0,15%	100,00%	0,00%	

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 1.994.872,23	$ 1.994.872,23	$ 4.278.036,99	$ 4.278.036,99
2	$ 25.953.434,84	$ 27.948.307,07	$ 1.008.953,12	$ 5.286.990,11
3	$ 53.680.792,95	$ 81.629.100,02	$ 9.993.709,02	$ 15.280.699,12
4	$ 78.847.268,00	$ 160.476.368,02	$ 18.681.643,50	$ 33.962.342,62
5	$ 99.694.716,48	$ 260.171.084,50	$ -	
6	$ 110.443.743,78	$ 370.614.828,28	$ -	
7	$ 25.836.406,33	$ 396.451.234,61	$ -	
8	$ 205.077.200,89	$ 601.528.435,50	$ -	
9	$ 119.267.586,33	$ 720.796.021,83	$ -	
10	$ 107.923.568,59	$ 828.719.590,42	$ -	
11	$ 52.143.208,51	$ 880.862.798,93	$ -	
12	$ 38.367.557,78	$ 919.230.356,71	$ -	
13	$ 35.707.081,89	$ 954.937.438,60	$ -	
14	$ 35.439.446,31	$ 990.376.884,91	$ -	
15	$ 5.523.777,17	$ 995.900.662,08	$ -	
16	$ 1.535.452,66	$ 997.436.114,74	$ -	

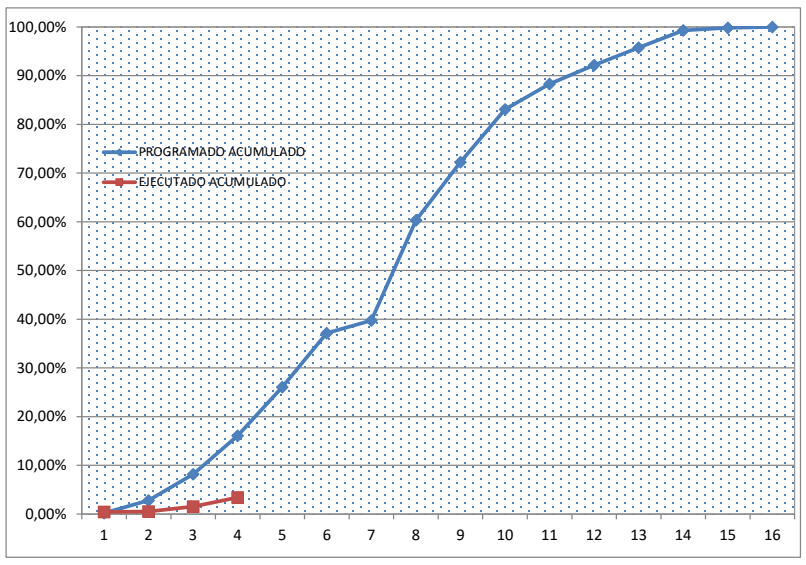

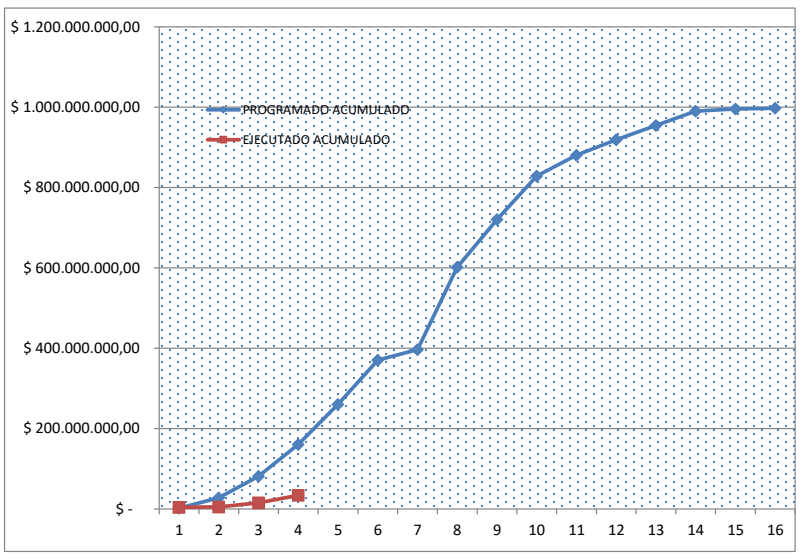

ARQ. FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 3

Proyecto Nº.	1747-2025	
Interventor:	JVM INGENIERÍA SAS BIC	
Constructor:	CONSORCIO ORIMEG - 2025	
Semana Reportada:	4	
Perido de Informe:	13/10/2025	19/10/2025

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS



En esta semana, al igual que en las anteriores se ha realizado el suministro de materiales básicos y/o herramientas a la obra.

La interventoría ha requerido al contratista la debida señalización de esta zona.

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



A la fecha se ha generado un gran volumen de material sobrante y/o rocas producto de la excavación para zapatas. La interventoría ha solicitado la respectiva documentación de la escombrera o ente competente para disponer de estos materiales, cuando haya lugar. Por lo pronto, se ha solicitado acopiar en un punto estrategico y señalizar y/o demarcar el área.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

N/A

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

N/A

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

N/A

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

N/A

N/A

ARQ. FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4

Proyecto Nº.	1747-2025	
Interventor:	JVM INGENIERÍA SAS BIC	
Constructor:	CONSORCIO ORIMEG - 2025	
Semana Reportada:	4	
Perido de Informe:	13/10/2025	19/10/2025

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
Según Formato No. _____

SI ☐ **NO** ☐

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:

Hasta el momento, se le requierió al contratista presentar certificado de calidad y ficha técnica de cada insumo, previo al ingreso a la obra para la revisión y visto bueno de la interventoría. Los párametros la validación de estos son respecto a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto. A continuación se relacionan los materiales verificados:

1. Cemento Gris
2. Acero Fy=60.000 psi

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.
Según Formato No. _____

SI ☐ **NO** ☐

Enumere los equipos calibrados:

- Equipo topografía (Estación total)

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.
Según Formato No. _____

SI ☐ **NO** ☐

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

Hasta la fecha de este informe semanal no se ha requerido la toma de pruebas para la realización de ensayos

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



AMARRE DE ACERO



FIGURADO DE ACERO



AMARRE DE ACERO



AMARRE DE ACERO



FIGURADO DE ACERO



AMARRE DE ACERO



MEZCLADORA



PERFILACIÓN DE EXCAVACIONES



SUMINISTRO DE MATERIAL



RED ELECTRICA PROVISIONAL

Culturas	**SECRETARIA GENERAL** **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES** **FORMATO DE PRESUPUESTO**

INFORMACION BASICA			
FECHA REG.	**19-10-2025**	**DEPARTAMENTO**	**BOLIVAR**
SEMANA No.	**4**	**OBJETO**	**PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL**
CENTRO CULTURAL DE SANTA ROSA DEL SUR		**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1)**	
BALANCE DE OBRA			

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: PRELIMINARES										
1.01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	52,00	$ 15.831,00	$ 823.212	83	$ 1.313.973,00	159,62%	83,00	$ 1.313.973,00	159,62%
1.01.03	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA	m2	455,00	$ 3.247,00	$ 1.477.385	351,23	$ 1.140.443,81	77,19%	351,23	$ 1.140.443,81	77,19%
1.01.04	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	1,00	$ 460.875,00	$ 460.875	1	$ 460.875,00	100,00%	1,00	$ 460.875,00	100,00%
1.01.05	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	1,00	$ 1.513.913,00	$ 1.513.913	1	$ 1.513.913,00	100,00%	1,00	$ 1.513.913,00	100,00%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 4.275.385,00**		**$ 4.429.204,81**			**$ 4.429.204,81**	
	CAPITULO 2: MOVIMINETO DE TIERRA										
2.02	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	m3	95,58	$ 40.202,00	$ 3.842.628	82,08	$ 3.299.780,16	85,87%	82,08	$ 3.299.780,16	86%
2.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	m3	80,03	$ 19.372,00	$ 1.550.361		$ -			$ -	0%
2.05	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme.	m3	20,00	$ 201.751,00	$ 4.035.020		$ -			$ -	0%
2.06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos, incluye suministro del material	m3	193,50	$ 63.069,00	$ 12.203.852		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 21.631.861,00**		**$ 3.299.780,16**			**$ 3.299.780,16**	
	CAPITULO 3: CIMENTACION										
3.01	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m2	51,49	$ 28.346,00	$ 1.459.536		$ -			$ -	0%
3.02	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	45,34	$ 305.928,00	$ 13.870.776	10,8	$ 3.304.022,40	23,82%	10,80	$ 3.304.022,40	24%
3.03	ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 4.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	15,55	$ 763.235,00	$ 11.868.304					$ -	
3.06	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 4.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muesca para apoyo de placa de contrapiso según planos.	m3	14,05	$ 800.572,00	$ 11.248.037					$ -	
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 38.446.653,00**		**$ 3.304.022,40**			**$ 3.304.022,40**	
	CAPITULO 4: REFUERZO										
4.01	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	12142,00	$ 7.195,00	$ 87.361.690	1750	$ 12.591.250,00	14,41%	1750,00	$ 12.591.250,00	14,41%
4.02	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	1516,00	$ 8.511,00	$ 12.902.676		$ -			$ -	0%
4.04	ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERFORACIÓN Ø 5/8" PROF MAX 0,30 M FIJADO MEDIANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO	u	320,00	$ 12.768,00	$ 4.085.760		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 104.350.126,00**		**$ 12.591.250,00**			**$ 12.591.250,00**	
	CAPITULO 5: ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
5.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=20,7 Mpa (3.000 PSI) e=0.10, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	375,00	$ 114.696,00	$ 43.011.000		$ -			$ -	0%
5.09	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el ítem de sellante).	m	49,00	$ 5.559,00	$ 272.391		$ -			$ -	0%
5.10	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sika Flex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.	m	49,00	$ 16.810,00	$ 823.690		$ -			$ -	0%
5.11	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	13,68	$ 890.091,00	$ 12.176.445		$ -			$ -	0%
5.14	VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	32,00	$ 952.256,00	$ 30.472.192		$ -			$ -	0%
5.18	LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.10) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	10,50	$ 186.470,00	$ 1.957.935		$ -			$ -	0%
5.30	VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI) , forma y dimensiones según diseño, incluye formaleta acabo liso, mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado pendiente al 1% longitudinal, impermeabilizante MAPELASTIC SMART A+B 2 capas en todo el contorno de la canal, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	20,05	$ 859.182,00	$ 17.230.036						
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 105.943.689,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 6: ESTRUCTURA METALICA Y MADERA										
6.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. ASTM A653 SS-GR 50, incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	kg	2905,00	$ 17.002,00	$ 49.390.810		$ -			$ -	0%
6.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	kg	3340,00	$ 19.720,00	$ 65.864.800		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 115.255.610,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 7:										
7.01	**CAJAS, POZOS, CARCAMOS**										
7.01.01	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	4,00	$ 1.019.501,00	$ 4.078.004		$ -			$ -	0%
7.01.03	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	2,00	$ 532.842,00	$ 1.065.684		$ -			$ -	0%
7.01.04	CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	4,00	$ 466.645,00	$ 1.866.580						
7.01.05	CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A120 80x30x22 (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m	55,40	$ 98.113,00	$ 5.435.460						
7.02	**REDES SANITARIAS**										
7.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	68,20	$ 43.332,00	$ 2.955.242						
7.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	10,10	$ 29.600,00	$ 298.960						
7.02.05	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	2,00	$ 73.029,00	$ 146.058						
7.02.07	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	4,00	$ 39.163,00	$ 156.652						
7.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	9,00	$ 116.386,00	$ 1.047.474						
7.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	2,00	$ 60.719,00	$ 121.438						
7.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	31,80	$ 50.982,00	$ 1.621.228		$ -			$ -	0%
7.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	15,90	$ 35.785,00	$ 568.982		$ -			$ -	0%
7.03	**REDES HIDRÁULICAS**										
7.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.	u	1,00	$ 782.197,00	$ 782.197		$ -			$ -	0%
7.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	70,70	$ 15.488,00	$ 1.095.002		$ -			$ -	0%
7.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	79,90	$ 12.367,00	$ 988.123		$ -			$ -	0%
7.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	27,70	$ 10.808,00	$ 299.382		$ -			$ -	0%
7.03.12	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	4,00	$ 49.647,00	$ 198.588		$ -			$ -	0%
7.03.13	PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	5,00	$ 38.868,00	$ 194.340		$ -			$ -	0%
7.03.14	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	14,00	$ 34.845,00	$ 487.830		$ -			$ -	0%
7.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	4,00	$ 177.587,00	$ 710.348		$ -			$ -	0%
7.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	4,00	$ 128.095,00	$ 512.380		$ -			$ -	0%
7.03.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	9,00	$ 105.096,00	$ 945.864		$ -			$ -	0%
7.03.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO PARA MANGUERA.	u	9,00	$ 50.839,00	$ 457.551		$ -			$ -	0%
7.04	**REDES VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS**										
7.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	7,80	$ 27.360,00	$ 213.408		$ -			$ -	0%
7.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	6,00	$ 43.484,00	$ 260.904		$ -			$ -	0%
7.04.05	PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño)	u	4,00	$ 59.822,00	$ 239.288		$ -			$ -	0%
7.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS (0,60 a X 0,90 h), tubería 110 mm (Incluye excavación, retiro de residuos, tubería corrugada para filtro PVC, accesorios, geotextil negro NT 1600, gravilla redonda libre de finos ø 3/4" a 1" y todo lo necesario para su instalación)	m	188,30	$ 94.772,00	$ 17.845.568		$ -			$ -	0%
7.05	**TANQUES Y EQUIPOS**										

7.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO (volumen de 5000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	1,00	$ 4.253.421,00	$ 4.253.421		$ -			$ -	0%
7.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	2,00	$ 1.796.657,00	$ 3.593.314	1	$ 1.796.657,00	50,00%	1,00	$ 1.796.657,00	50%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 52.439.270,00**		**$ 1.796.657,00**			**$ 1.796.657,00**	
	CAPITULO 8: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION										
8.01	**EQUIPO DE MEDIDA**										
8.01.01	Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes	u	1,00	$ 455.001,00	$ 455.001		$ -			$ -	0%
8.02	REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN	-	0,00	$ -	$ -						
8.02.01	Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación	m	120,00	$ 32.422,00	$ 3.890.640						
8.02.02	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red	m	60,00	$ 37.664,00	$ 2.259.840						
8.02.03	Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente según norma. incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	4,00	$ 846.803,00	$ 3.387.212						
8.03	**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES**										
8.03.01	Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección: IP 55 incluye: módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 25/15 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 2x30A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 1x30a de 20 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) DPS de 2 fases 220/120V. interruptores de normal: seis (6) interruptor de 1x20A de 10 KA riel din SCHNEIDER, ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a merz o similar, un (1) barraje tipo peine, dos (2) interruptor de 1x20A de 20 KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND todos estos elementos debidamente montados dentro del tablero según especificaciones y diagrama unifilar	u	1,00	$ 6.959.369,00	$ 6.959.369						
8.03.02	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 18 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado).	u	1,00	$ 881.515,00	$ 881.515						
8.03.03	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnético 1x30A 10kA, cinco (5) interruptores 1x20A 10kA; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado).	u	1,00	$ 379.328,00	$ 379.328						
8.04	**ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN**										
8.04.01	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	50,00	$ 152.186,00	$ 7.609.300						
8.04.03	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	15,00	$ 60.942,00	$ 914.130						
8.04.05	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	15,00	$ 34.258,00	$ 513.870						
8.04.06	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entrada y salida de UPS conexión borneras	m	10,00	$ 29.370,00	$ 293.700						
8.05	**RED NORMAL Y REGULADA**										
8.05.01	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito, caja galvanizada , tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	18,00	$ 104.348,00	$ 1.878.264						
8.05.02	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI instalación embebida en muro (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	4,00	$ 155.493,00	$ 621.972						
8.05.03	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80ºC, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	8,00	$ 127.757,00	$ 1.022.056						
8.05.06	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80ºC, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	2,00	$ 172.941,00	$ 345.882						
8.05.08	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80ºC	m	65,00	$ 16.929,00	$ 1.100.385						
8.06	**CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA**										
8.06.01	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	90,00	$ 22.463,00	$ 2.021.670						
8.07	**ILUMINACIÓN**										
8.07.01	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	10,00	$ 136.359,00	$ 1.363.590						
8.07.02	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	5,00	$ 165.877,00	$ 829.385						
8.07.03	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista en tubería EMT; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo Nº 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	48,00	$ 158.599,00	$ 7.612.752						
8.07.05	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación embebida en muro; (incluye, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo Nº 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	20,00	$ 104.298,00	$ 2.085.960						
8.07.06	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación de emergencia; embebida en muro (incluye cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo Nº 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	3,00	$ 133.395,00	$ 400.185						
8.07.07	Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60.000 Horas, 60W, 5500 Lúmenes, de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación, Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, kit de guayas aceradas para descolgar y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	u	14,00	$ 703.945,00	$ 9.855.230						
8.07.10	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 18W Flujo Luminoso mínimo 1260 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.	u	6,00	$ 79.927,00	$ 479.562						
8.07.11	Suministro e instalación de luminaria hermética de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas.	u	4,00	$ 158.475,00	$ 633.900						
8.07.12	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación.	u	2,00	$ 227.156,00	$ 454.312						
8.07.13	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, mínimo 2x100 lúmenes, IP20, mínimo 180 minutos de autonomía	u	16,00	$ 126.642,00	$ 2.026.272						
8.07.15	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía	u	3,00	$ 134.440,00	$ 403.320						
8.07.18	Suministro e instalación de luminaria tipo proyector LED 10W, 1000 lúmenes, 3000K, mínimo 30000 horas de vida útil	u	8,00	$ 84.442,00	$ 675.536						
8.08	**ILUMINACIÓN EXTERIOR**										
8.08.01	Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C, Vida Útil 100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08 Alimentación 100-240V, certificada RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN-2, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para control, incluye alambre de cobre desnudo 1F#8 AWG, varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8" y conector para varilla a tierra 2/8	u	3,00	$ 793.332,00	$ 2.379.996						
8.08.02	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica CODENSA AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	4,00	$ 480.020,00	$ 1.920.080						
8.08.03	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona	m	40,00	$ 49.606,00	$ 1.984.240						
8.08.04	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación.	m	40,00	$ 22.463,00	$ 898.520						
8.08.05	Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color máximo 3000K, mínimo 980 Lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	u	14,00	$ 115.893,00	$ 1.622.502						
8.08.06	Suministro e instalación de poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf, brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla., (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado RETILAP	u	3,00	$ 937.981,00	$ 2.813.943						
8.08.07	Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, mínimo 180, , temperatura de color máximo 3000K, lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	u	8,00	$ 136.675,00	$ 1.093.400						
8.08.09	Suministro e instalación de salida de iluminación en piso incluye caja plástica, tubería PV 3/4" y accesorios, 5m cable de cobre 3X12 THHN/THWN-2	u	8,00	$ 109.045,00	$ 872.360						
8.09	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**										
8.09.01	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 75 cm	m	30,00	$ 64.652,00	$ 1.939.560						
8.09.02	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	10,00	$ 32.489,00	$ 324.890						
8.09.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	4,00	$ 251.048,00	$ 1.004.192						
8.09.04	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	1,00	$ 138.746,00	$ 138.746						
8.09.05	Suministro e instalación de tratamiento artificial	u	4,00	$ 104.398,00	$ 417.592						
8.10	**APANTALLAMIENTO**										
8.10.01	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 75 cm	m	44,00	$ 56.735,00	$ 2.496.340						
8.10.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	2,00	$ 251.048,00	$ 502.096						
8.10.04	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	2,00	$ 34.296,00	$ 68.592						
8.10.05	Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en diámetro 5/8.	u	2,00	$ 140.430,00	$ 280.860						
8.10.06	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes	m	100,00	$ 38.682,00	$ 3.868.200						
8.10.07	suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación	u	2,00	$ 117.576,00	$ 235.152						
8.11	**VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN**										
8.11.01	Suministro e instalación salida eléctrica en muro (2,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tubería PVC 3/4 (instalación embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos, accesorios.	u	4,00	$ 144.721,00	$ 578.884						
8.12	**CERTIFICACIONES Y TRAMITES**										
8.12.01	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC	u	1,00	$ 3.598.376,00	$ 3.598.376						
8.12.02	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	u	1,00	$ 4.497.970,00	$ 4.497.970						
8.12.03	Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados.	u	1,00	$ 2.042.422,00	$ 2.042.422		$ -			$ -	0%

8.12.04	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.	u	1,00	$ 784.381,00	$ 784.381		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 97.717.432**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 9: REDES ESPECIALES										
9.01	**CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)**										
9.01.01	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto	u	10,00	$ 90.654,00	$ 906.540		$ -			$ -	0%
9.01.02	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	m	430,00	$ 8.099,00	$ 3.482.570		$ -			$ -	0%
9.01.03	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS	u	1,00	$ 907.919,00	$ 907.919		$ -			$ -	0%
9.01.04	Suministro e instalación de Swicth 24 puertos 10/100/1000	u	1,00	$ 376.174,00	$ 376.174		$ -			$ -	0%
9.01.05	Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	u	10,00	$ 36.557,00	$ 365.570		$ -			$ -	0%
9.01.06	Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal Formato 19" de 85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" Profundidad 30CM de 1 RU	u	1,00	$ 902.459,00	$ 902.459		$ -			$ -	0%
9.01.07	Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida	u	1,00	$ 2.884.811,00	$ 2.884.811						
9.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300 Mbps Access point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Botón QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de 4 DB)	u	1,00	$ 83.555,00	$ 83.555						
9.01.09	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería Conduit PVC de 3/4"; (incluye cajas de paso , curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	56,00	$ 11.299,00	$ 632.744						
9.01.10	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	45,00	$ 24.236,00	$ 1.090.620		$ -			$ -	0%
9.01.11	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	47,00	$ 22.463,00	$ 1.055.761		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 12.688.723,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 10: MAMPOSTERÍA										
10.01	Muros e.=12 cm en ladrillo arcilla bloque No. 5. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. Según diseños.	m2	77,22	$ 63.629,00	$ 4.913.431		$ -			$ -	0%
10.14	DILATACIONES EN ICOPOR E=20MM ENTRE FACHADA EXISTENTE Y FACHADA FLOTANTE	m	70,40	$ 5.488,00	$ 386.355		$ -			$ -	0%
10.17	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f´c. 3.000 PSI sección mínima de 180 cm2	m	70,40	$ 86.058,00	$ 6.058.483		$ -			$ -	0%
10.18	VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f´c. 3.000 PSI sección mínima de 180 cm2	m	35,10	$ 91.019,00	$ 3.194.767		$ -			$ -	0%
10.19	MURO EN CONCRETO A LA VISTA DE f´c=20,7 Mpa (3000 PSI), incluye formaleta, desencofrante, todos los elementos para su correcta ejecución (No incluye refuerzo)	m3	2,97	$ 880.002,00	$ 2.613.606		$ -			$ -	0%
10.20	MURO EN LADRILLO A LA VISTA DOS POR DOS CARAS DE 33x11,5x11cm (L x a x h) (o de proporción similar acorde a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente, de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. NO incluye aceros de refuerzos, según diseños.	m2	65,25	$ 95.484,00	$ 6.230.331		$ -			$ -	0%
10.21	MURO EN CELOSÍA CUADRADA DE 16x11,5x11cm (L x a x h) (producto de la partida de un ladrillo de 33X11,5X11 de media traba o de proporción similar acorde a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente, de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. NO incluye aceros de refuerzos, según diseños.	M2	35,05	$ 104.156,00	$ 3.650.668						
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 27.047.641,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 11: CUBIERTAS Y CIELO RASOS										
11.01	**Cubiertas**										
11.01.03	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. INCLUYE: Teja , Bandeja, lima hoyas, limatesas, caballetes, hastiales Clips de fijación, tornillos, aislante térmico poliestireno auto extinguible, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación.	m2	319,14	$ 216.373,00	$ 69.053.279		$ -			$ -	0%
11.01.08	SOLAPA O FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20, desarrollo según diseño, incluye elementos de fijación, acabado con anticorrosivo Wash Primer y pintura en esmalte para exteriores, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m	29,25	$ 54.349,00	$ 1.589.708		$ -			$ -	0%
11.02	**Cielo Rasos**										
11.02.01	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PANEL YESO DE 1/2", Incluye estructura metálica para armado y soporte, con dilataciones, tratamiento de juntas con cinta malla. Pintura color blanco, 3 manos.	m2	34,706	$ 79.655,00	$ 2.764.506		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 73.407.493,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 12: PANETES										
12.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	m2	169,884	$ 28.006,00	$ 4.757.771		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 4.757.771,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 13: PISOS Y ENCHAPES										
13.01	**Enchapes pisos y paredes**										
13.01.02	ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa Listo Plus o similar, boquilla blanca.	m2	10,74	$ 87.561,00	$ 940.405						
13.01.11	ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido, brillado, sellado. incluye endurecedor de Quarzo, Modulado acorde a planos.	m2	245,88	$ 24.448,00	$ 6.011.274						
13.02	**Guarda escobas y boca puertas**	-									
13.02.06	ZÓCALO EN MEDIACAÑA Vaciada en granito pulido, incluye dilataciones en t longitudinales.	m	15,68	$ 49.937,00	$ 783.012						
13.05	**Varios**										
13.05.01	MESON EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +-0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m	3,73	$ 280.514,00	$ 1.046.317		$ -			$ -	0%
13.05.03	POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, win de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	u	1	$ 256.414,00	$ 256.414		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 9.037.422,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 14: CARPINTERIA EN MADERA										
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS TIPO PERSIANA EN MADERA PINO AMARILLO O SIMILAR INMUNIZADA perfiles principales en 2" x 4", persianas en tabla de 18 x 900 mm, incluye inmunizado, parales, herrajes, elementos de sujeción, angeo, pisavidrio 1 x 1 cm, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.	m2	66,36	$ 323.651,00	$ 21.477.480		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 21.477.480,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 15: CARPINTERIA METALICA										
15.01	**REJAS Y VENTANAS**	-	0	$ -	$ -						
15.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN ESTRUCTURA TUBULAR DE 3 x 1 1/2" (76x38x1,5 mm) Y PLATINAS DE 2"X1/8" SEGÚN PLANOS, incluye pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, malla tipo angeo, y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	m2	10,9	$ 273.414,00	$ 2.980.213						
15.02	**PUERTAS**	-	0	$ -	$ -						
15.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PIVOTANTES O BASCULANTES EN PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PERSIANA CON ANGEO INTERNO Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta fabricación e instalación.	m2	19,14	$ 785.834,00	$ 15.040.863						
15.02.04	PUERTA TIPO REJA EN ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR DE 3" x 1 1/2", PLATINAS EN ACERO DE 2" x 1/8", incluye marco lateral y superior en estructura tubular de 3" x 1 1/2" , pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, pernos de anclaje, bisagras, topes de caucho, aldaba tipo pasador en varilla lisa de 1/2" y portacandado, y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	m2	3,63	$ 302.391,00	$ 1.097.679		$ -			$ -	0%
15.02.05	PUERTA TIPO REJA EN ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR DE 3" x 1 1/2", PLATINAS EN ACERO DE 2" x 1/8", incluye marco lateral y riel superior, pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, pernos de anclaje, pivote 600kg, bisagras para cada cuerpo, topes de caucho, rueda de 3" capacidad de carga 80 kg 1 por cuerpo, aldaba tipo pasador en varilla lisa de 1/2", portacandado y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	m2	31,68	$ 377.144,00	$ 11.947.922		$ -			$ -	0%
15.03	**VARIOS**	-	0	$ -	$ -						
15.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación	u	1	$ 265.405,00	$ 265.405		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 31.332.082,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 16: CERRADURAS										
16.01	COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto de cierre, 1 barra Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija Eiffel, 2 Cierrapuertas Ref. 3005; incluye accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	1	$ 2.005.885,00	$ 2.005.885		$ -			$ -	0%
16.02	CERRADURA DE MANIJA LISA CROMADO MATE O SATIN (ALCOBA O BAÑO), incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	10	$ 74.619,00	$ 746.190						
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 2.752.075,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 17: DOTACION DE BANOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS										
17.01	**APARATOS SANITARIOS**										
17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1	$ 747.713,00	$ 747.713						
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1	$ 819.703,00	$ 819.703						
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1	$ 413.021,00	$ 413.021						
17.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	2	$ 189.829,00	$ 379.658						
17.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1	$ 240.657,00	$ 240.657						
17.02	**GRIFERÍAS**										
17.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	2	$ 303.034,00	$ 606.068						
17.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1	$ 1.114.920,00	$ 1.114.920						
17.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1	$ 161.974,00	$ 161.974						
17.03	**ACCESORIOS**										
17.03.01	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.	u	1	$ 418.304,00	$ 418.304						
17.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado o mate, incluye anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	3	$ 47.206,00	$ 141.618						
17.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	u	5	$ 26.055,00	$ 130.275						
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 5.173.911,00**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 18: PINTURAS										
18.02	APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m2	371,984	$ 17.337,00	$ 6.449.087		$ -			$ -	0%

	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 6.449.087,00**		$ -			$ -	
	CAPITULO 19: VIDRIOS Y ESPEJOS											
19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN VIDRIO CRUDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado inclinado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	1	$ 433.433,00	$ 433.433		$ -			$ -	0%
19.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	1	$ 336.005,00	$ 336.005						
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 769.438,00**		$ -			$ -	
	CAPITULO 20: EQUIPOS Y OTROS											
20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica)	u	1	$ 116.570,00	$ 116.570		$ -			$ -	0%
20.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LIB - (incluye soporte)	u	5	$ 71.112,00	$ 355.560						
20.04	Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque hidro acumulador, arrancador montado, válvula de píe, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro, manómetro, presostato y switch flotador. Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos puntos de apoyo. Interruptores de presión con diferenciales de 20 psi. Arrancadores eléctricos directos con protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para protección de mínimo nivel de agua; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Q = 19.5GPM, HB = 28.2 mca, POTENCIA =1/2 HP.	u	2	$ 3.793.591,00	$ 7.587.182						
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 8.059.312,00**		$ -			$ -	
	CAPITULO 22: SENALIZACION											
22.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, Aviso ubicado sobre muro (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía ítem 10,5 según planos) Letras tipo ARIAL de 0.20 m de altura, profundidad de 0.01 m, fabricadas en aluminio fundido con acabado semimate y con laca transparente para metal, fijadas por medio de pernos soldados a puentes en el reverso de la letra, anclados al muro, incluye anclaje epóxico y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución e instalación	u	29	$ 49.441,00	$ 1.433.789		$ -			$ -	0%
22.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportados con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, así: (1) Un aviso Porta Plano de evacuación compuesto por dos acrílicos cristal 2 mm, medidas 50 x 35 cm, para plano tamaño tabloide, indicando las salidas de emergencia, incluye plano a color. (10) Nueve avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 20 cm X 20 cm, con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y texto, con sistema de relieve (braille) en la parte inferior. (baño hombres, baño mujeres, baño niños, baño niñas, baño PMR, cuarto eléctrico, deposito, cuarto basuras, Cocineta, cuarto de Aseo). (2) Dos avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 15 cm X 15 cm. (extintor, con indicaciones). (3) Tres avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 11 cm X 12 cm. cuerpo reflectivo (salida emergencia)	gb	1	$ 605.280,00	$ 605.280						
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 2.039.069,00**		$ -			$ -	
	CAPITULO 24: ASEO											
24.01	ASEO GENERAL DE OBRA	m2	364,7674	$ 4.201,00	$ 1.532.388						
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 1.532.388,00**						
		COSTOS DIRECTOS			**$ 746.583.918,00**		**$ 25.420.914,37**	**3,40%**		**$ 25.420.914,37**	**3,40%**
		ADMINISTRACION	27,15%		$ 202.697.533,74		$ 6.901.778,25			$ 6.901.778,25	
		IMPREVISTOS	0,50%		$ 3.732.920,00		$ 127.105,00			$ 127.104,57	
		UTILIDAD	5,00%		$ 37.329.196,00		$ 1.271.046,00			$ 1.271.045,72	
		TOTAL A.I.U. 30%			**$ 243.759.649,74**		**$ 8.299.929,25**			**$ 8.299.928,54**	
		IVA	19%		**$ 7.092.547,00**		**$ 241.499,00**			**$ 241.498,69**	
		TOTAL COSTO DIRECTO + AIU + IVA			**$ 997.436.114,74**		**$ 33.962.342,62**			**$ 33.962.341,60**	
		COSTO TOTAL			**$ 997.436.114,74**		**$ 33.962.342,62**			**$ 33.962.341,60**	

ARQ. FABIAN RADA SEGURA
INTERVENTORÍA

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	**4**				
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	13/10/2025	**Y EL**	19/10/2025	**PLAZO:**	3 MESES Y 9 DÍAS CALENDARIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIMEG - 2025			**CONTRATO No.**	1747-2025
INTERVENTOR:	JVM INGENIERÍA SAS BIC			**CONTRATO No.**	1751-2025

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES																												OBSERVACIONES
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
CARGO																																
DIRECTOR																		0	0	0	0	0										
ESPECIALISTAS																		0	0	0	0	0										
RESIDENTE																		0	0	0	0	0										Se solicita presencia del profesional en obra
MAESTRO DE OBRA																		1	1	1	1	1										
OFICIAL																		0	0	0	0	0										
AYUDANTE																		5	5	5	5	5										
PROFESIONAL SOCIAL																		0	0	0	0	0										
PROFESIONAL SST																		1	1	1	1	1										
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** 35

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		**35**	**100,00%**	
De la región		25	71,43%	
De fuera de la región		5	14,29%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
De fuera de la región		0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**5**	**14,29%**	
De la región		5	14,29%	
De fuera de la región		0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES		**5**	**14,29%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada		5	14,29%	
Profesionales - Técnicos		0	0,00%	
PROVEEDORES				
Local				
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: La interventoría exige la presencia en campo el residente de obra, para el cumplimiento de las obligaciones del componente, así como organización de las actividades. Desde la interventoría hemos elevado este requerimiento en diversas ocasiones y hasta la fecha no se ha presentado el profesional en campo, lo cual es demasiado preocupante.

ARQ. FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
Johan Ricardo Mican López	Director de obra	50%
Diana Marcela Albarracin Cristiano	Residente de obra 2	100%
Tatiana Katherine Dumar Ruiz	Porfesional SST y Ambiente	66%
Manuel Alvarez Vanegas	Geotécnico	30%
Diego Giovanny Parra Torres	Estructural	30%
Luis Alfonso Cagua Ospino	Hidrosanitario	30%
Fernando Trujillo Palomino	Eléctrico	30%
Helmer Fabian Vitola Herrera	Profesional Social	50%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
Fabian Miguel Rada Segura	Director de Interventoría	40%
Juan Carlos Vergara M.	Residente de interventoria 2	100%
Indira Scarleth Cardena Benitez	Porfesional SST y Ambiente	100%
Libardo José García Hoyos	Geotécnico	30%
Jair Useche Macías	Estructural	20%
Juan Carlos Martínez Cely	Hidrosanitario	30%
Miguel Ángel Ortiz Padilla	Eléctrico	30%
Mayra Alejandra Argel Martínez	Profesional Social	35%
Heyne Sorge Mogollón Behaine	Abogado	15%

OBRA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor anticipo:	30%	$ 593.050.065,30
valor propuesta:	$ 1.976.833.551,00	

ACTIVIDADES SOLICITUD DE ANTICIPO		VALOR
	%	$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -

INTERVENTORIA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor pago anticipado:	No aplica	$ -
porcentaje ofertado:	No aplica	$ -
valor total interventoria:	No aplica	$ -
valor total obra:	No aplica	$ -
