GOBERNACION
DE CASANARE
NIT.892099216-6

INFORME VISITA
FO-IF-07
2014-01-02
V. 02

CODIGO	
FECHA	AGOSTO 12 DE 2020
DESTINATARIO	OSCAR EDUARDO GARCIA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE CASANARE
PROFESIONAL	WALTER ANDRÉS CUBIDES ALFONSO
ASUNTO	VISITA TÉCNICA PARA EVALUAR EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE LA VIA SECUNDARIA PAVIMENTADA Y DETERMINAR LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO MEDIANTE EL RE PARCHEO EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO DE LA VIA DE SAN BENITO – RECETOR MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO	RECETOR – CHAMEZA DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VISITA	**SI**		**NO X**	
FECHA DE VISITA	AGOSTO 12 DE 2020			

1. ESTADO ACTUAL

SE REALIZA RECORRIDO DE LA VÍA SECUNDARIA PAVIMENTADA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN VÍAL UBICADA EN EL SITIO SAN BENITO AL MUNICIPIO DE RECETOR, PARA LOCALIZAR LOS PUNTOS EN LOS CUALES LA CARPETA ASFALTICA PRESENTA MAYOR DETERIORO Y EL ESTADO GENERAL DE LA VÍA.

SE EVIDENCIA A LO LARGO DEL RECORRIDO QUE LA CARPETA ASFÁLTICA PRESENTA PERDIDA DE MATERIAL, ESCARIFICACIÓN Y ALGUNAS FISURAS CAUSADAS POR EL DETERIORO PROPIO DEL DESGASTE POR USO, TAMBIÉN SE OBSERVA COMO CONSECUENCIA DE LOS ALTOS NIVELES FREÁTICOS SE HA OCASIONANDO DETERIORO PARCIAL O TOTAL EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CARPETA ASFÁLTICA, GENERANDO RIESGOS DE ACCIDENTALIDAD

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA UNA RELACIÓN DE LOS PUNTOS EN LOS CUALES SE EVIDENCIA MAYOR AFECTACIÓN Y DONDE ES PRIORIDAD REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARCHEO, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA CANTIDAD Y MEDIDA DE LO HUECOS IDENTIFICADOS EN LA PRESENTE VISITA PUEDE AUMENTAR DEBIDO AL TRAFICO CONTINUO EN LA VÍA.

2. ACTIVIDADES REQUERIDAS

AREAS A INTERVENIR CON REPARCHEO Y/O BACHEO VIA SECUNDARIA PAVIMENTADA				
TRAMO SAN BENITO - CASCO URBANO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE				
INVENTARIO DE HUECOS PARA PARCHEO CON MDC-2 GESTION CON COMPAÑIAS PETROLERAS				
Punto		**Largo (M)**	**Ancho (M)**	**Cantidad huecos**
0	K0+000 Interseccion via Yopal-Sogamoso con acceso a Recetor, sitio San Benito, dista 50.5Kms de Yopal			
1	K1+300	4,00	3,20	1
2	K6+200	5,00	0,90	1
3	K7+300	4,00	2,50	1
		2,00	1,50	1
		4,00	0,80	1
		0,30	0,50	1
4	K7+400	0,50	0,50	1
		2,00	0,70	1
5	K16+600	0,80	0,70	1
		0,50	0,70	1
		0,80	0,60	1
		12,00	1,50	1
		0,60	0,40	1
		0,90	0,30	1
		0,40	0,30	1
TOTAL				**15**

3. UBICACIÓN

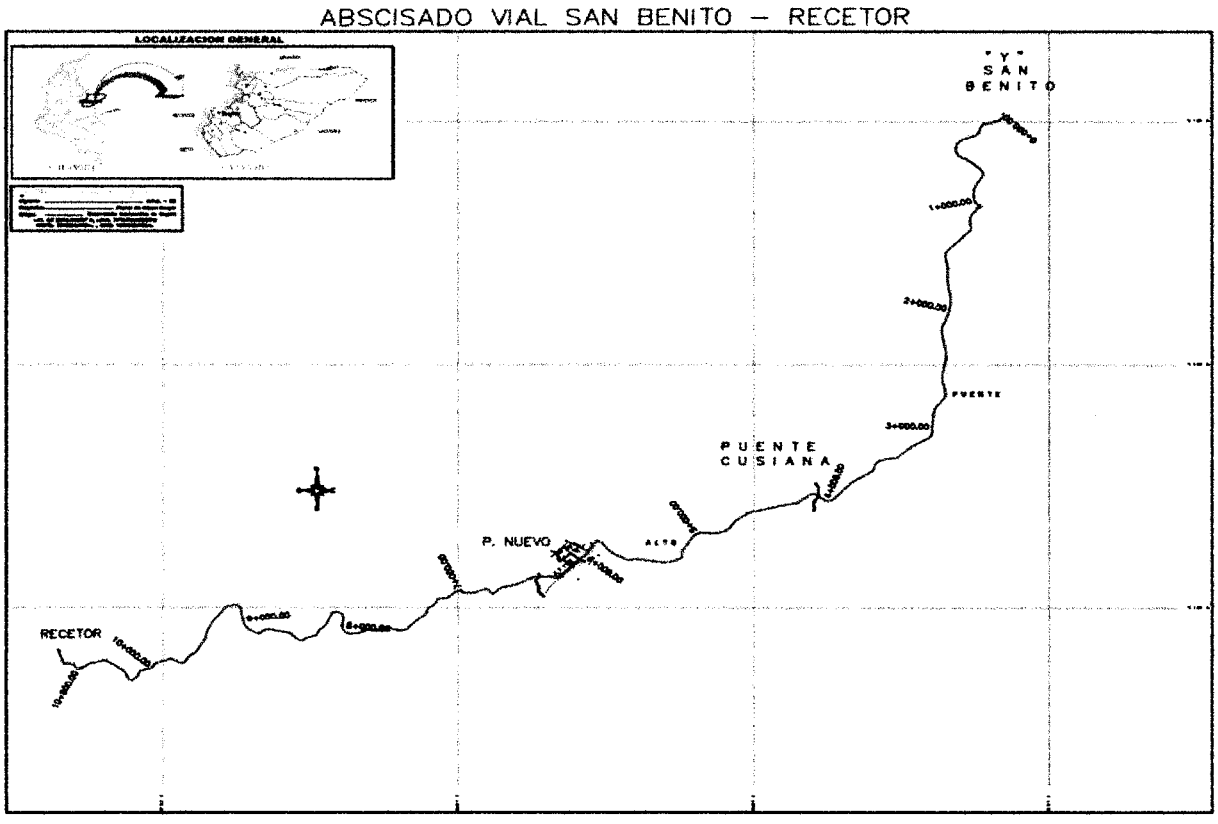
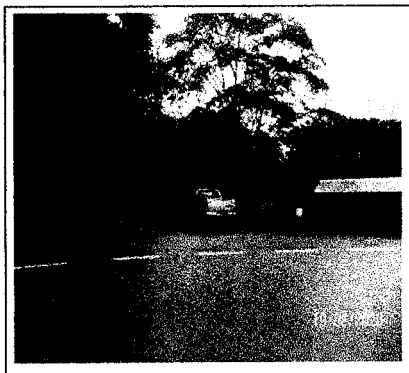




Ilustración 1 diferentes puntos identificados para intervenir con la mezcla densa en caliente mdc-2

6. SOLICITUD DE LA COMUNIDAD

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE RECETOR Y LAS COMUNIDADES DEL SECTOR, EN REPETIDAS OCASIONES HAN SOLICITADO EL MANTENIMIENTO DE ESTA VIA SECUNDARIA PAVIMENTADA A TRAVES DEL REPARCHEO CON MDC-2

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

		
Ilustración No 01	Ilustración No 02	Ilustración No 03
		
Ilustración No 04	Ilustración No 05	Ilustración No 06
		
Ilustración No 07	Ilustración No 08	Ilustración No 09

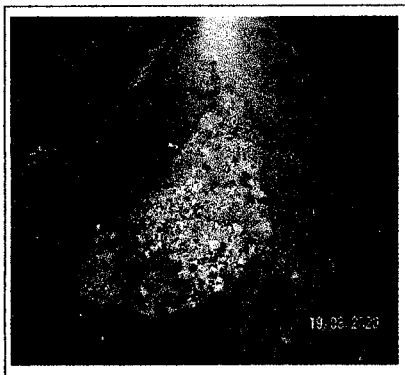		
Ilustración No 10	Ilustración No 11	Ilustración No 12

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL

WALTER ANDRÉS [illegible] ALFONSO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro.1175 DE 2020
