CODIGO	
FECHA	AGOSTO 24 DE 2020
DESTINATARIO	OSCAR EDUARDO GARCÍA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE CASANARE
PROFESIONAL	WALTER ANDRÉS CUBIDES ALFONSO
ASUNTO	INFORME DE VISITA TECNICA PARA EVALUAR EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE LA VIA SECUNDARIA PAVIMENTADA Y DETERMINAR LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO MEDIANTE EL RE PARCHEO EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO DE LA VIA CUATRO VIENTOS (TAURAMENA) – LA VARA(VILLANUEVA) MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO	TAURAMENA - VILLANUEVA

ACTA DE VISITA	**SI**		**NO X**	
FECHA DE VISITA	AGOSTO 19 DE 2020			

1. ESTADO ACTUAL

CON EL FIN DE DETERMINAR EL DETERIORO DE ESTE TRAMO VIAL, SE REALIZAN LAS VISITAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA A VILLANUEVA PARA UBICAR TODOS LOS PUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SE DETERMINA DURANTE EL RECORRIDO QUE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SE ENCUENTRAN EN UN TRAYECTO DE 50 KM APROXIMADAMENTE.

DURANTE EL RECORRIDO REALIZADO SE MUESTRA QUE ALGUNOS TRAMOS PRESENTAN BACHES EN LA MITAD DEL PERFIL VIAL, Y SE DENOTA QUE HAN TENIDO PERDIDA DE SUS CAPAS GRANULARES.

ES DE VITAL IMPORTANCIA GARANTIZAR EL TRANSITO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS, POR ESTE MOTIVO SE HACE NECESARIO EL REPARCHEO Y EL MEJORAMIENTO DE ESTA VÍA.


A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA UNA RELACIÓN DE LOS PUNTOS EN LOS CUALES SE EVIDENCIA MAYOR AFECTACIÓN Y DONDE ES PRIORIDAD REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARCHEO, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA CANTIDAD Y MEDIDA DE LO HUECOS IDENTIFICADOS EN LA PRESENTE VISITA PUEDE AUMENTAR DEBIDO AL TRAFICO CONTINUO EN LA VÍA.

2. ACTIVIDADES REQUERIDAS

Tramo de vía sector Cuatro Vientos (Tauramena) - La Vara en Villanueva				
	Áreas a intervenir con reparcheo con MDC-2	Dimensiones		
Punto	Abscisa	Largo	Ancho	No. Huecos
0	K0+000 Intersección vía pavimentada cuatro vientos - via mata de la urama - los gemelos - trompillos			
1	K29+600	1	0,8	1
2	K34+000	0,5	0,6	2
3	K35+600	0,8	0,8	2
4	K35+700	0,4	0,4	3
5	K37+100	0,6	0,6	1
6	K37+700	1	0,7	1
7	K39+100	0,7	0,8	2
8	K40+100	0,6	0,5	5
9	K40+280	0,9	0,9	3
10	K40+300	0,8	0,8	1
11	K40+400	0,6	0,7	2
12	K40+700	1	1	3
13	K41+100	1	0,5	1
14	K41+650	0,6	0,6	4
15	K41+700	0,6	0,7	2
16	K43+000	1	2	5
17	K43+700	1	0,8	1
18	K43+800	1	1	4
19	K44+000	0,9	0,8	5
20		0,7	2	3
21	K44+400	0,9	0,4	4
22	K44+800	1	0,5	2
23	K45+300	0,8	0,8	3
24	K45+600	0,6	0,6	2
25	K45+700	1	0,8	3
26	K45+900	0,6	0,9	7
27	K46+000	0,4	0,6	6
28	K46+100	1	0,8	5

29	K46+200	0,9	0,8	3
30	K46+300	1	1	9
31	K46+400	0,6	0,7	7
32	K46+600	1	0,7	12
33	K47+300	0,9	0,6	2
34	K47+400	0,9	1	1
35	K47+500	0,9	0,9	2
36	K47+600	1	0,8	1
37	K47+700	0,9	0,8	1
38	K47+900	0,9	0,8	2
39	K48+000	1	0,8	4
40	K48+050	0,8	0,7	2
41	K48+080	0,9	0,7	2
42	K48+100	0,8	0,8	2
43	K48+200	1,4	1,3	1
44	K48+300	1	1,2	3
45	K49+100	0,8	0,8	1
46	K49+700	0,6	0,6	4
47	K50+000	0,7	0,7	4
Total				146

3. UBICACIÓN

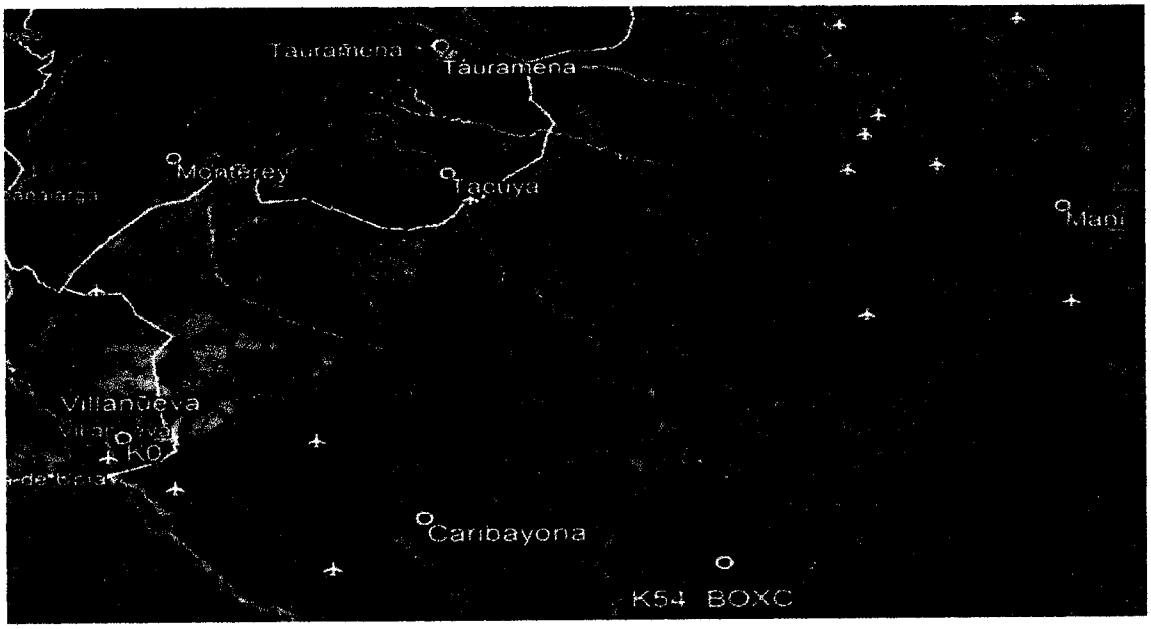

4. PERMISOS Y SERVIDUMBRE

- N/A POR SER UN MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO.

5. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

N/A PORQUE EL INSUMO ES FABRICADO EN PLANTA MODULAR MEZCLA DENSA EN CALIENTE

6. SOLICITUD DE LA COMUNIDAD

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TAURAMENA Y VILLANUEVA Y LAS COMUNIDADES EN REPETIDAS OCASIONES HAN SOLICITADO EL MANTENIMIENTO DE ESTA VIA SECUNDARIA PAVIMENTADA A TRAVES DEL REPARCHEO CON MDC-2

7. ANEXO FOTOGRAFICO

	
Ilustración No 01	Ilustración No 02



Ilustración No 03



Ilustración No 04



Ilustración No 05



Ilustración No 06



Ilustración No 07	Ilustración No 08
	
Ilustración No 09	**Ilustración No 10**
	
Ilustración No 11	

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL

WALTER ANDRES CUBIDES ALFONSO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 1175 DEL 2020
