MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL META

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIAS S.A.S.
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO 3 LOTE 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 1932 DE 2024

PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

MUNICIPIO DE GRANADA (META)
OCTUBRE DE 2025

Dirección: Conjunto Residencial Quintas del Trapiche casa 42
Celulares: 3152716653 - 3226610463
Email**:** Amv2024grupo3@gmail.com

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1 LOCALIZACIÓN 4
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 5
2.3 INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DE LA VIA 10
2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO. 15

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 42

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATOS A SUPERVISAR INTERVENTORÍA 31

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATOS DE OBRA 40

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 42

6. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 57

7. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 57

8. ANEXOS 59

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe resume las actividades desarrolladas por el contratista CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. en el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, correspondiente al informe N.º 16 mensual de ejecución del contrato de Administración vial No. 1932 de 2024 cuyo objeto es: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META LOTE 1".

Entre las funciones la administración de mantenimiento vial Grupo 3, debe adelantar la interventoría de los contratos que le designe la Territorial Meta de INVIAS, así como tareas adicionales que se establezcan por la territorial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo se presenta localización, características de la zona que se relacionan directamente en sector donde se realiza la interventoría por parte de la AMV (Administración Vial) grupo 3.

2.1 Localización

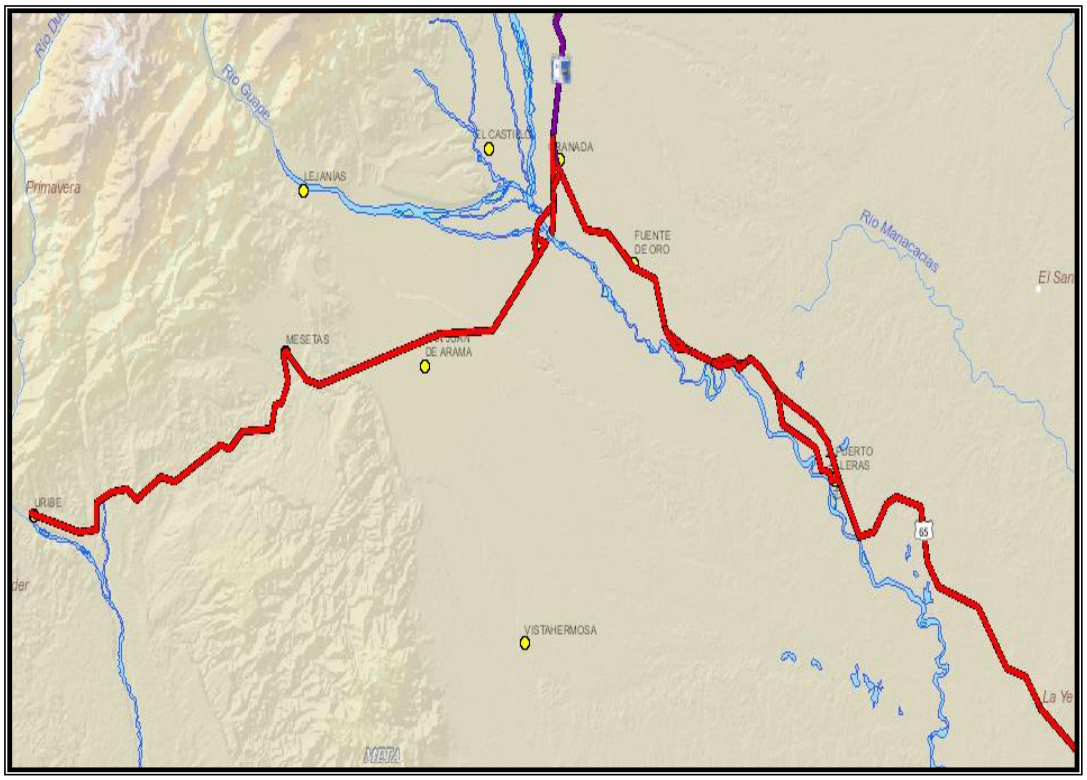


Imagen 1. Localización general de las rutas a cargo
Fuente: https://hermes.invias.gov.co/carreteras/

Las vías a cargo de esta administración pertenecen a la Ruta Nacional 65 que hace parte de la malla vial nacional de Colombia y atraviesa el territorio en sentido noreste bordeando la Cordillera Oriental, desde Villa garzón (Putumayo) hasta Saravena en el departamento de Arauca cerca de la frontera con Venezuela. El trayecto entre San Vicente del Caguán y San José del Guaviare, sin embargo, está sin construir ya que en su trayecto hay zonas de reserva forestal protegidas.
También está la Ruta Nacional 65A que es una ruta troncal nacional cuyo trazado pretende unir a la Ruta 65 entre San Vicente del Caguán y Granada como parte de la Troncal Marginal de la Selva.

Ruta 65A02, iniciando en el municipio de Uribe los cuales entre el PR 00+0000 al PR 17+0000 se encuentran pavimentados en losa de concreto, entre el PR+17+0000 al PR 30+0000, el tramo se encuentra en afirmado los cuales se encuentra en ejecución por parte del Consorcio Vías Colombia 065 realizando actividades como lo son: conformaciones de vía, elaboración de obras de arte, elaboración de elementos de contención, elaboración de cunetas revestidas. Entre el PR 30+0000 correspondiente al centro poblado de Jardín de Peñas y el PR 46+0500 vereda los Alpes del municipio de Mesetas, se encuentra en material afirmado de rio tamaño máximo 3", este tramo se encuentra en constante mantenimiento por parte de la maquinaria del Consorcio Vías Colombia 065. Entre los PR 46+0500 al PR 109+0821 la ruta cuenta con carpeta de rodadura entre pavimento en concreto y pavimento flexible en asfalto. El Instituto Nacional de Vías, ha empezado el mejoramiento y pavimentación de esta vía. Igualmente se tiene planeado unir los municipios de Uribe y el municipio de Colombia en el Huila para ofrecer un nuevo acceso entre los llanos y el interior del país.

Ruta 6508, iniciando en el cruce la ruta 65 en el acceso al municipio de Puerto Rico PR 00+0000 al PR 103+900 la ruta se encuentra pavimentada en su totalidad en pavimento flexible, esta ruta se ha visto afectada en los años recientes debido a las temporadas invernales y desbordamientos del rio Ariari afectado a las variantes de los centros poblados de Puerto Limón variante 65MTB y Puerto Santander variante 65MTC, y afectado la carpeta de rodadura en la variante 65MTD acceso a Puerto Aljure.

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Ruta 6508 Cruce Puerto Rico - Ye De Granada



Imagen 2 Localización
Fuente: https://hermes.invias.gov.co/carreteras/

Esta vía es de gran importancia para la región, debido a que comunica a Granada con distintos municipios del área de influencia del rio Ariari como lo son Fuente de Oro, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia además de ser la única vía de acceso al Guaviare, por lo que se hace necesario brindarle mucha atención, debido a que es una arteria de comunicación interdepartamental, por ella transitan todos los productos agrícolas que se dirigen hacia el resto del país.

2.2.1 Ruta 65MTA - paso por Puerto Lleras

Esta vía variante es un paso alterno para ingresar y salir del municipio de Puerto Lleras cuenta con 14 kilómetros los cuales entre el PR 00+0000 al PR 01+0000, se encuentran pavimentado y óptimas condiciones de tránsito. Entre el PR 01+0000 al PR 14+0000 Ahora bien, para el segmento mencionado se evidencia una vía completamente en afirmado, la cual presenta varias afectaciones que por su forma y gravedad se podría deducir que son ocasionadas por la carga de tránsito de este corredor, teniendo en cuenta que normalmente son vehículos de carga y maquinaria agrícola los que se desplazan por allí, sumado a esto las temporadas invernales han ocasionado incrementar en gran mayor grado las afectaciones.

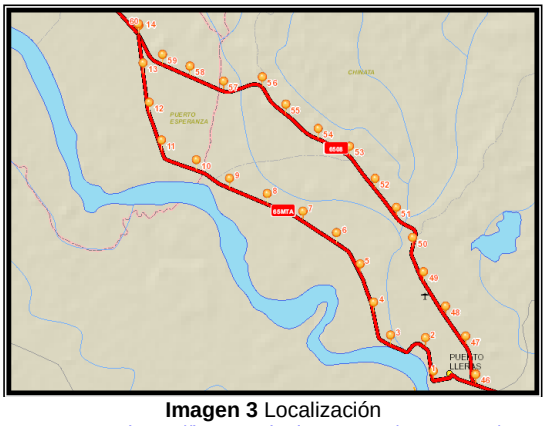


Imagen 3 Localización
Fuente: https://hermes.invias.gov.co/carreteras/

2.2.2 Ruta 65MTB - paso por Puerto Limón

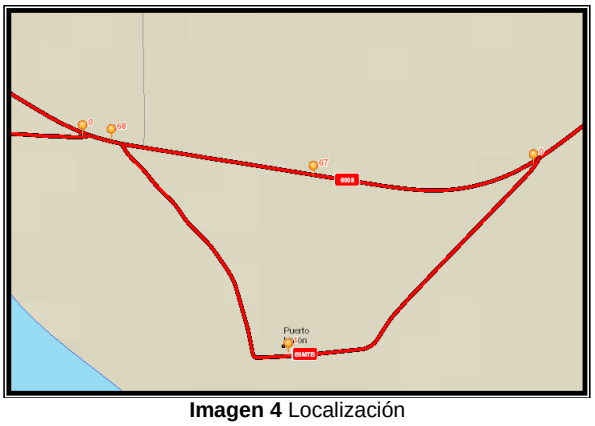


Imagen 4 Localización
Fuente: https://hermes.invias.gov.co/carreteras/

Esta vía es una ruta que comunica al centro poblado Puerto Limón con la ruta 6508, seriamente afectada por los desbordamientos del rio Ariari entre los años 2017 al 2020, afectado la variante entre su finalización en el cruce de la ruta 6508 en el PR 68+000 hasta el PR 01+0100 desapareciendo en su totalidad la vía.

2.2.3 Ruta 65MTC - paso por Puerto Santander

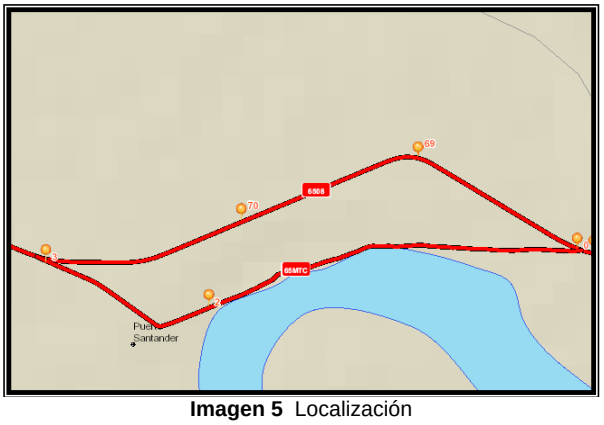


Imagen 5 Localización
Fuente: https://hermes.invias.gov.co/carreteras/

Esta vía es una ruta que comunica al centro poblado Puerto Limón con la ruta 6508, seriamente afectada por los desbordamientos del rio Ariari entre los años 2017 al 2020, la variante entre su finalización en el cruce de la ruta 6508 en el PR 71+000 hasta el PR 02+0000 se encuentra en óptimas el resto de la variante ha desapareciendo en su totalidad.

2.2.4 Ruta 65MTD - paso por Puerto Aljure



Imagen 6 Localización
Fuente: https://hermes.invias.gov.co/carreteras/

Esta vía es una ruta que comunica al centro poblado Puerto Aljure con la ruta 6508, seriamente afectada por los desbordamientos de los arroyos cercanos en la temporada invernal del mes de mayo del 2025, afectado la carpeta de rodadura, dicha problemática corresponde a la perdida de material en el costado derecho de la vía (PR 03+0160 – PR 03 + 0880).

2.2.5 Ruta 65A02. Uribe - Ye de Granada



Imagen 7 Localización
Fuente: https://hermes.invias.gov.co/carreteras/

Esta vía comunica al municipio de Uribe con el centro del departamento, además también comunica a Mesetas y San Juan de Arama, es una vía importante, debido a que la zona rural de estos municipios está dedicada a la producción de ganado el cual se comercializa hacia el centro del país transportándolo por esta ruta.

2.2.6 Ruta 65AMTA paso por Puerto Caldas

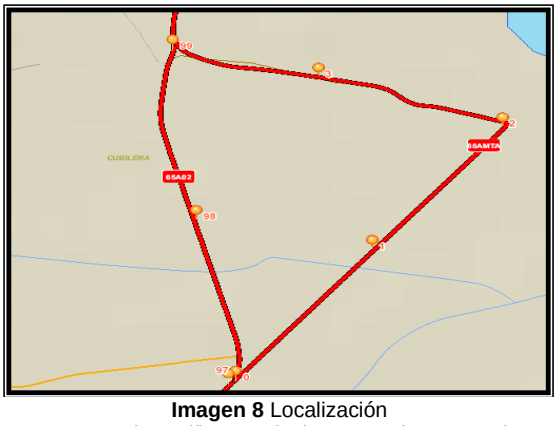


Imagen 8 Localización
Fuente: https://hermes.invias.gov.co/carreteras/

2.2.7 Ruta 65AMTB - acceso Pte. Guillermo León Valencia

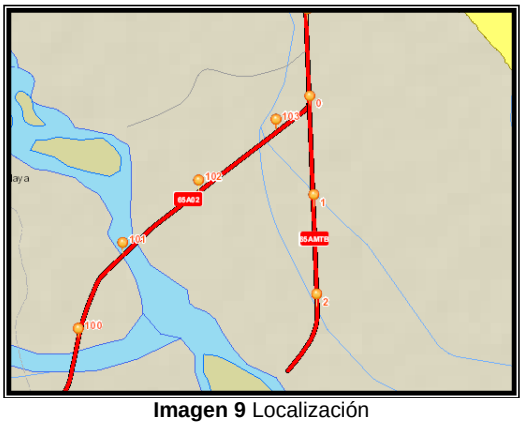


Imagen 9 Localización
Fuente: https://hermes.invias.gov.co/carreteras/

2.2.8 RUTA 65AMTC - VÍA ACCESO A GRANADA

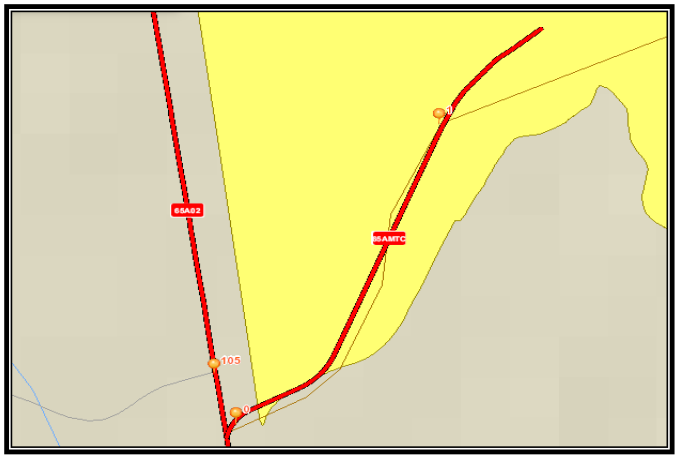


Imagen 10 Localización
Fuente: https://hermes.invias.gov.co/carreteras/

2.3 Inventario y estado inicial de las vías

En las siguientes tablas se relaciona el estado inicial y actual de las vías a cargo.

- **Ruta 6508 "Cruce Puerto Rico - Ye De Granada"**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
6508	00+0000	01+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.990	P	Bueno	Bueno	
6508	01+0000	02+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.010	P	Bueno	Bueno	
6508	02+0000	03+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.077	P	Bueno	Bueno	
6508	03+0000	04+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.080	P	Bueno	Bueno	
6508	04+0000	05+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.040	P	Bueno	Bueno	
6508	05+0000	06+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.040	P	Bueno	Bueno	
6508	06+0000	07+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.000	P	Bueno	Bueno	
6508	07+0000	08+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.986	P	Bueno	Bueno	
6508	08+0000	09+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.002	P	Bueno	Bueno	
6508	09+0000	10+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.000	P	Bueno	Bueno	
6508	10+0000	11+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.933	P	Bueno	Regular	Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	11+0000	12+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.082	P	Bueno	Regular	Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	12+0000	13+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.963	P	Bueno	Bueno	
6508	13+0000	14+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.211	P	Bueno	Regular	Presencia de hundimientos en la vía

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCION TERRITORIAL META** **Contrato de administración vial No. 1932/2024** **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META LOTE 1".**	

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
6508	14+0000	15+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.129	P	Bueno	Bueno	
6508	15+0000	16+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.899	P	Bueno	Regular	Presencia de hundimientos en la vía
6508	16+0000	17+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.049	P	Bueno	Regular	Presencia de hundimientos en la vía
6508	17+0000	18+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.000	P	Bueno	Bueno	
6508	18+0000	19+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.950	P	Bueno	Bueno	
6508	19+0000	20+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.880	P	Bueno	Bueno	
6508	20+0000	21+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.000	P	Bueno	Regular	Presencia de hundimientos en la vía
6508	21+0000	22+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.972	P	Bueno	Bueno	
6508	22+0000	23+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.960	P	Bueno	Bueno	
6508	23+0000	24+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.890	P	Bueno	Bueno	
6508	24+0000	25+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.000	P	Bueno	Bueno	
6508	25+0000	26+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.900	P	Bueno	Bueno	
6508	26+0000	27+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.132	P	Bueno	Bueno	
6508	27+0000	28+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.007	P	Bueno	Bueno	
6508	28+0000	29+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.940	P	Bueno	Bueno	

Dirección: Conjunto Residencial Quintas del Trapiche casa 42
Celulares: 3152716653 - 3226610463
Email: Amv2024grupo3@gmail.com

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
6508	29+0000	30+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.956	P	Bueno	Bueno	
6508	30+0000	31+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.100	P	Bueno	Bueno	
6508	31+0000	32+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.002	P	Bueno	Bueno	
6508	32+0000	33+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.010	P	Bueno	Bueno	
6508	33+0000	34+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.003	P	Bueno	Bueno	
6508	34+0000	35+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.861	P	Bueno	Bueno	
6508	35+0000	36+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.640	P	Bueno	Bueno	
6508	36+0000	37+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.959	P	Bueno	Bueno	
6508	37+0000	38+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.982	P	Bueno	Bueno	
6508	38+0000	39+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.220	P	Bueno	Bueno	
6508	39+0000	40+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.112	P	Bueno	Bueno	
6508	40+0000	41+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.130	P	Bueno	Bueno	
6508	41+0000	42+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.130	P	Bueno	Bueno	
6508	42+0000	43+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.140	P	Bueno	Bueno	
6508	43+0000	44+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.960	P	Bueno	Bueno	

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
6508	44+0000	45+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.700	P	Bueno	Bueno	
6508	45+0000	46+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.108	P	Bueno	Bueno	
6508	46+0000	47+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.978	P	Bueno	Bueno	
6508	47+0000	48+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.892	P	Bueno	Bueno	
6508	48+0000	49+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.028	P	Bueno	Bueno	
6508	49+0000	50+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.918	P	Bueno	Bueno	
6508	50+0000	51+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.009	P	Bueno	Regular	Presencia de hundimientos en la vía
6508	51+0000	52+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.894	P	Bueno	Bueno	
6508	52+0000	53+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.032	P	Bueno	Bueno	
6508	53+0000	54+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.874	P	Bueno	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	54+0000	55+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.015	P	Bueno	Bueno	
6508	55+0000	56+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.948	P	Bueno	Bueno	
6508	56+0000	57+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.006	P	Bueno	Bueno	
6508	57+0000	58+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.929	P	Bueno	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
6508	58+0000	59+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.993	P	Bueno	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	59+0000	60+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.856	P	Bueno	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	60+0000	61+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.011	P	Bueno	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	61+0000	62+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.000	P	Bueno	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	62+0000	63+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.970	P	Bueno	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	63+0000	64+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.003	P	Bueno	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	64+0000	65+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.000	P	Bueno	Bueno	
6508	65+0000	66+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.000	P	Bueno	Bueno	
6508	66+0000	67+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.844	P	Bueno	Bueno	
6508	67+0000	68+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.702	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	68+0000	69+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.979	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
6508	69+0000	70+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.007	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	70+0000	71+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.073	P	Bueno	Bueno	
6508	71+0000	72+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.988	P	Bueno	Bueno	
6508	72+0000	73+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.997	P	Bueno	Bueno	
6508	73+0000	74+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.020	P	Bueno	Bueno	
6508	74+0000	75+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.030	P	Bueno	Bueno	
6508	75+0000	76+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.988	P	Bueno	Bueno	
6508	76+0000	77+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.906	P	Bueno	Muy bueno	Intervenido bajo el contrato de obra 3532 del 2023
6508	77+0000	78+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.997	P	Bueno	Muy bueno	Intervenido bajo el contrato de obra 3532 del 2023
6508	78+0000	78+0200	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.997	P	Bueno	Muy bueno	Intervenido bajo el contrato de obra 3532 del 2023
6508	78+0200	79+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.897	P	Bueno	Muy Bueno	Intervenido bajo el contrato de obra 2936 del 2024
6508	79+0000	80+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.984	P	Regular	Muy Bueno	Intervenido bajo el contrato de obra 2936 del 2024
6508	80+0000	81+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.035	P	Regular	Muy bueno	Intervenido bajo el contrato de obra 2936 del 2024
6508	81+0000	82+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.958	P	Regular	Muy bueno	Intervenido bajo el contrato de obra 2936 del 2024
6508	82+0000	83+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.994	P	Regular	Muy bueno	Intervenido bajo el contrato de obra 2936 del 2024

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
6508	83+0000	84+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.036	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	84+0000	85+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.970	P	Bueno	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	85+0000	86+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.977	P	Bueno	Bueno	
6508	86+0000	87+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.786	P	Bueno	Bueno	
6508	87+0000	88+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.995	P	Bueno	Bueno	
6508	88+0000	89+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.979	P	Bueno	Bueno	
6508	89+0000	90+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.008	P	Bueno	Bueno	
6508	90+0000	91+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.996	P	Bueno	Bueno	
6508	91+0000	92+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.100	P	Bueno	Bueno	
6508	92+0000	93+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.102	P	Bueno	Bueno	
6508	93+0000	94+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.993	P	Bueno	Bueno	
6508	94+0000	95+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.005	P	Bueno	Bueno	
6508	95+0000	96+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.106	P	Bueno	Bueno	
6508	96+0000	97+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.993	P	Bueno	Bueno	

Dirección: Conjunto Residencial Quintas del Trapiche casa 42
Celulares: 3152716653 - 3226610463
Email: Amv2024grupo3@gmail.com

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
6508	97+0000	98+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.992	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	98+0000	99+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.129	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	99+0000	100+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.988	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	100+0000	101+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.995	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	101+0000	102+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.998	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	102+0000	103+0000	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	1.000	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
6508	103+0000	103+0900	Cruce Pto Rico - Ye de Granada	0.900	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo..

- **Variantes 65MTA "Paso por Puerto Lleras", 65MTB "Paso por Puerto Limón", 65MTC "Paso por Puerto Santander", 65MTD "Paso por Puerto Aljure"**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65MTA	00+0000	00+0700	Paso por Puerto Lleras	0.700	P	Bueno	Bueno	
65MTA	00+0700	01+0000	Paso por Puerto Lleras	0.319	P	Bueno	Bueno	

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65MTA	01+000	01+0160	Paso por Puerto Lleras	0.160	P	Bueno	Bueno	
65MTA	01+160	00+1200	Paso por Puerto Lleras	0.040	P	Bueno	Bueno	
65MTA	01+200	02+0000	Paso por Puerto Lleras	0.781	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	02+000	03+0000	Paso por Puerto Lleras	1.030	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	03+000	04+0000	Paso por Puerto Lleras	1.027	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	04+000	05+0000	Paso por Puerto Lleras	1.003	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	05+000	06+0000	Paso por Puerto Lleras	1.004	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	06+000	07+0000	Paso por Puerto Lleras	1.000	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	07+000	08+0000	Paso por Puerto Lleras	1.000	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	08+000	09+0000	Paso por Puerto Lleras	1.005	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	09+000	10+0000	Paso por Puerto Lleras	1.002	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	10+000	11+0000	Paso por Puerto Lleras	1.057	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	11+000	12+0000	Paso por Puerto Lleras	0.994	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	12+000	13+0000	Paso por Puerto Lleras	0.990	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65MTA	13+000	13+0970	Paso por Puerto Lleras	0.970	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65MTB	00+000	01+0200	Paso por Puerto Limón	1.200	P	Bueno	Bueno	

Dirección: Conjunto Residencial Quintas del Trapiche casa 42
Celulares: 3152716653 - 3226610463
Email: Amv2024grupo3@gmail.com

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65MTC	02+0280	03+0004	Paso por Puerto Santander	0.800	P	Bueno	Bueno	

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65MTD	00+0000	00+0700	Paso por Puerto Aljure	0.700	P	Bueno	Bueno	
65MTD	00+0700	01+0000	Paso por Puerto Aljure	0.300	P	Bueno	Bueno	
65MTD	01+0000	02+0000	Paso por Puerto Aljure	1.000	P	Bueno	Bueno	
65MTD	02+0000	02+0800	Paso por Puerto Aljure	0.796	P	Bueno	Bueno	
65MTD	02+0800	03+0160	Paso por Puerto Aljure	0.360	P	Bueno	Bueno	
65MTD	03+0160	03+0880	Paso por Puerto Aljure	0.720	P	Regular	Regular	Afectación en el hombro derecho, socavación por inundaciones
65MTD	03+0880	04+0110	Paso por Puerto Aljure	0.230	P	Regular	Regular	Afectación en el hombro derecho, socavación por inundaciones

- **Ruta 65A02 "La Uribe - Ye De Granada"**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65A02	00+0000	00+0110	La Uribe - Ye de Granada	0.11	P	Bueno	Bueno	
65A02	00+0110	01+0000	La Uribe - Ye de Granada	0.97	P	Bueno	Bueno	
65A02	01+0000	02+0000	La Uribe - Ye de Granada	0.92	P	Bueno	Bueno	
65A02	02+0000	03+0000	La Uribe - Ye de Granada	1.00	P	Bueno	Bueno	
65A02	03+0000	04+0000	La Uribe - Ye de Granada	1.00	P	Bueno	Bueno	

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65A02	04+000	05+000	La Uribe - Ye de Granada	0.97	P	Bueno	Bueno	
65A02	05+000	06+000	La Uribe - Ye de Granada	0.97	P	Bueno	Bueno	
65A02	06+000	07+000	La Uribe - Ye de Granada	0.95	P	Bueno	Bueno	
65A02	07+000	08+000	La Uribe - Ye de Granada	0.96	P	Bueno	Bueno	
65A02	08+000	09+000	La Uribe - Ye de Granada	0.98	P	Bueno	Bueno	
65A02	09+000	10+000	La Uribe - Ye de Granada	1.00	P	Bueno	Bueno	
65A02	10+000	11+000	La Uribe - Ye de Granada	1.07	A	Bueno	Bueno	
65A02	11+000	12+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	P	Bueno	Bueno	
65A02	12+000	13+000	La Uribe - Ye de Granada	0.94	P	Bueno	Bueno	
65A02	13+000	14+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	P	Bueno	Bueno	
65A02	14+000	15+000	La Uribe - Ye de Granada	1.04	A	Regular	Muy Bueno	Intervenido bajo el contrato de obra 1045 del 2021
65A02	15+000	16+000	La Uribe - Ye de Granada	0.92	A	Regular	Muy Bueno	Intervenido bajo el contrato de obra 1045 del 2021
65A02	16+000	17+000	La Uribe - Ye de Granada	1.05	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	17+000	18+000	La Uribe - Ye de Granada	1.05	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	18+000	19+000	La Uribe - Ye de Granada	0.93	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	19+000	20+000	La Uribe - Ye de Granada	0.92	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	20+000	21+000	La Uribe - Ye de Granada	1.00	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	21+000	22+000	La Uribe - Ye de Granada	1.07	A	Regular	Malo	La superficie se encuentra en afirmado, presentando hundimientos y ahuellamientos
65A02	22+000	23+000	La Uribe - Ye de Granada	0.93	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65A02	23+000	24+000	La Uribe - Ye de Granada	0.95	A	Regular	Malo	La superficie se encuentra en afirmado, presentando hundimientos y ahuellamientos
65A02	24+000	25+000	La Uribe - Ye de Granada	0.95	A	Regular	Malo	La superficie se encuentra en afirmado, presentando hundimientos y ahuellamientos
65A02	25+000	26+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	A	Regular	Malo	La superficie se encuentra en afirmado, presentando hundimientos y ahuellamientos
65A02	26+000	27+000	La Uribe - Ye de Granada	1.03	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	27+000	28+000	La Uribe - Ye de Granada	0.98	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	28+000	29+000	La Uribe - Ye de Granada	0.95	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	29+000	30+000	La Uribe - Ye de Granada	0.96	A	Regular	Muy bueno	Intervenido bajo el contrato de obra 1045 del 2021
65A02	30+000	31+000	La Uribe - Ye de Granada	0.95	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	31+000	32+000	La Uribe - Ye de Granada	0.90	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	32+000	33+000	La Uribe - Ye de Granada	1.01	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	33+000	34+000	La Uribe - Ye de Granada	1.02	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	34+000	35+000	La Uribe - Ye de Granada	1.05	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	35+000	36+000	La Uribe - Ye de Granada	0.95	A	Regular	Malo	La superficie se encuentra en afirmado, presentando hundimientos y ahuellamientos
65A02	36+000	37+000	La Uribe - Ye de Granada	0.75	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	37+000	38+000	La Uribe - Ye de Granada	1.08	A	Regular	Malo	La superficie se encuentra en afirmado, presentando hundimientos y ahuellamientos

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65A02	38+000	39+000	La Uribe - Ye de Granada	0.93	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	39+000	40+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	40+000	41+000	La Uribe - Ye de Granada	1.03	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	41+000	42+000	La Uribe - Ye de Granada	1.07	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	42+000	43+000	La Uribe - Ye de Granada	1.03	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	43+000	44+000	La Uribe - Ye de Granada	1.01	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	44+000	45+000	La Uribe - Ye de Granada	1.05	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	45+000	46+000	La Uribe - Ye de Granada	1.07	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	46+000	47+000	La Uribe - Ye de Granada	1.03	A	Regular	Regular	La superficie se encuentra en afirmado
65A02	47+000	48+000	La Uribe - Ye de Granada	1.00	P	Bueno	Bueno	
65A02	48+000	49+000	La Uribe - Ye de Granada	1.00	P	Bueno	Bueno	
65A02	49+000	49+350	La Uribe - Ye de Granada	0.35	P	Regular	Malo	Afectación en la vía, movimiento en masa, vulnerabilidad de obra hidráulica.
65A02	49+350	50+000	La Uribe - Ye de Granada	0.81	P	Bueno	Bueno	
65A02	50+000	51+000	La Uribe - Ye de Granada	0.94	P	Bueno	Bueno	
65A02	51+000	52+000	La Uribe - Ye de Granada	0.98	P	Bueno	Bueno	
65A02	52+000	53+000	La Uribe - Ye de Granada	1.02	P	Bueno	Bueno	
65A02	53+000	54+000	La Uribe - Ye de Granada	0.95	P	Bueno	Bueno	
65A02	54+000	55+000	La Uribe - Ye de Granada	0.98	P	Bueno	Bueno	
65A02	55+000	55+550	La Uribe - Ye de Granada	0.55	P	Bueno	Bueno	
65A02	55+550	56+000	La Uribe - Ye de Granada	0.40	P	Bueno	Bueno	

Dirección: Conjunto Residencial Quintas del Trapiche casa 42
Celulares: 3152716653 - 3226610463
Email: Amv2024grupo3@gmail.com

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65A02	56+000	56+800	La Uribe - Ye de Granada	0.80	P	Bueno	Bueno	
65A02	56+800	57+000	La Uribe - Ye de Granada	0.15	P	Bueno	Bueno	
65A02	57+000	58+000	La Uribe - Ye de Granada	0.95	P	Bueno	Bueno	
65A02	58+000	59+000	La Uribe - Ye de Granada	0.92	P	Bueno	Bueno	
65A02	59+000	60+000	La Uribe - Ye de Granada	0.92	P	Bueno	Bueno	
65A02	60+000	61+000	La Uribe - Ye de Granada	1.01	P	Bueno	Bueno	
65A02	61+000	62+000	La Uribe - Ye de Granada	1.02	P	Bueno	Bueno	
65A02	62+000	63+000	La Uribe - Ye de Granada	1.02	P	Bueno	Bueno	
65A02	63+000	64+000	La Uribe - Ye de Granada	1.01	P	Bueno	Bueno	
65A02	64+000	65+000	La Uribe - Ye de Granada	1.03	P	Bueno	Bueno	
65A02	65+000	66+000	La Uribe - Ye de Granada	1.00	P	Bueno	Bueno	
65A02	66+000	67+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	P	Bueno	Bueno	
65A02	67+000	68+000	La Uribe - Ye de Granada	0.98	P	Bueno	Bueno	
65A02	68+000	68+500	La Uribe - Ye de Granada	0.47	P	Bueno	Bueno	
65A02	68+500	69+000	La Uribe - Ye de Granada	0.47	P	Bueno	Bueno	
65A02	69+000	70+000	La Uribe - Ye de Granada	1.08	P	Bueno	Bueno	
65A02	70+000	71+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	P	Bueno	Bueno	
65A02	71+000	72+000	La Uribe - Ye de Granada	0.98	P	Bueno	Bueno	
65A02	72+000	73+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	P	Bueno	Bueno	
65A02	73+000	74+000	La Uribe - Ye de Granada	1.08	P	Bueno	Bueno	

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65A02	74+000	75+000	La Uribe - Ye de Granada	0.86	P	Bueno	Bueno	
65A02	75+000	76+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	P	Bueno	Bueno	
65A02	76+000	76+300	La Uribe - Ye de Granada	0.34	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	76+300	77+000	La Uribe - Ye de Granada	0.75	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	77+000	78+000	La Uribe - Ye de Granada	1.05	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	78+000	79+000	La Uribe - Ye de Granada	0.96	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	79+000	80+000	La Uribe - Ye de Granada	0.98	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	80+000	81+000	La Uribe - Ye de Granada	1.05	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	81+000	82+000	La Uribe - Ye de Granada	0.98	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	82+000	83+000	La Uribe - Ye de Granada	1.03	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	83+000	84+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	84+000	85+000	La Uribe - Ye de Granada	0.98	P	Bueno	Bueno	
65A02	85+000	86+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	P	Bueno	Bueno	
65A02	86+000	87+000	La Uribe - Ye de Granada	1.01	P	Bueno	Bueno	
65A02	87+000	88+000	La Uribe - Ye de Granada	1.03	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65A02	88+000	89+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	89+000	90+000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	90+000	91+000	La Uribe - Ye de Granada	1.10	P	Bueno	Bueno	
65A02	91+000	92+000	La Uribe - Ye de Granada	1.15	P	Bueno	Bueno	
65A02	92+000	93+000	La Uribe - Ye de Granada	0.95	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	93+000	94+000	La Uribe - Ye de Granada	1.17	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	94+000	95+000	La Uribe - Ye de Granada	0.97	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	95+000	96+000	La Uribe - Ye de Granada	0.98	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	96+000	97+000	La Uribe - Ye de Granada	1.08	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	97+000	98+000	La Uribe - Ye de Granada	1.00	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	98+000	99+000	La Uribe - Ye de Granada	1.03	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	99+000	100+0000	La Uribe - Ye de Granada	1.04	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	100+0000	101+0000	La Uribe - Ye de Granada	1.01	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	101+0000	102+0000	La Uribe - Ye de Granada	0.99	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías:

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
								fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	102+0000	103+0000	La Uribe - Ye de Granada	1.00	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	103+0000	104+0000	La Uribe - Ye de Granada	1.12	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	104+0000	105+0000	La Uribe - Ye de Granada	1.10	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	105+0000	106+0000	La Uribe - Ye de Granada	1.01	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	106+0000	107+0000	La Uribe - Ye de Granada	0.90	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	107+0000	108+0000	La Uribe - Ye de Granada	1.00	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	108+0000	109+0000	La Uribe - Ye de Granada	0.94	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65A02	109+0000	109+0821	La Uribe - Ye de Granada	1.01	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.

- **ariantes 65AMTA "Paso por Puerto Caldas", 65AMTB Acceso Puente Guillermo León Valencia", 65AMTC "Acceso a Granada"**

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65AMTA	00+0000	01+0000	Paso por Puerto Caldas	0.900	P	Bueno		
65AMTA	01+0000	02+0000	Paso por Puerto Caldas	0.900	P	Bueno		

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65AMTA	02+0000	03+0000	Paso por Puerto Caldas	1.000	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.
65AMTA	03+0000	03+0900	Paso por Puerto Caldas	1.100	P	Regular	Regular	Pavimento flexible, Presencia de patologías: fisuras en bloque, baches, piel de cocodrilo.

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65AMTB	00+0000	01+0000	Acceso Pte. Guillermo Valencia	0.900	P	Bueno		
65AMTB	01+0000	02+0000	Acceso Pte. Guillermo Valencia	0.928	P	Bueno		
65AMTB	02+0000	02+0840	Acceso Pte. Guillermo Valencia	1.012	P	Bueno		

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO		
						INICIAL 07 de julio del 2024	ACTUAL Criterio técnico tercer semestre 2025	OBSERVACIONES
65AMTC	00+0000	01+0000	Acceso a Granada	1.000	P	Regular		
65AMTC	01+0000	01+0300	Acceso a Granada	0.300	P	Regular		

2.4 Características técnicas del proyecto y necesidades de las rutas a cargo.

En la ruta 6508 el mantenimiento rutinario ha estado proyectado hacia las labores de rocería desmonte manual, poda de árboles, limpieza de cunetas, limpieza de señales, limpieza de obras de arte, limpieza de encoles, descoles, limpieza de puentes, pontones.

Para la ruta 65A02 se desarrollaron las actividades de rocería, limpieza de la calzada, bermas, bordillos, cunetas, alcantarillas, poda de árboles, limpieza de señales; limpieza de puentes, en el tramo de Mesetas a la Uribe la actividad de bacheo es importante para este sector para evitar pasos malos.

La presencia permanente de las Empresas de mantenimiento rutinario en la vía hace más fácil reportar los accidentes que ocurren en la vía y así informar al INVIAS estos sucesos. Los cinco (5) contratos de mantenimiento rutinario se desarrollan en la región del Ariari, dos (2) de los contratos se desarrollan en terreno plano y los tres (3) restantes en terreno ondulado y montañoso, su clima es húmedo y el transito promedio es bajo.

2.4.1 Ruta 6508 Cruce Puerto Rico - Ye De Granada

Invasiones presentes en la vía:
Esta ruta tiene problemas de invasión sobre las zonas de derecho de vía, como se relaciona en la siguiente tabla

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Puerto Rico	6508	00+0020	Izq	7	Restaurante
Puerto Rico	6508	00+0030	Der	4	Casetas
Puerto Rico	6508	00+0200	Izq	15	Vivienda
Puerto Rico	6508	00+0250	Izq	9	Vivienda
Puerto Rico	6508	00+0300	Izq	9	Vivienda
Puerto Rico	6508	00+0410	Izq	10	Vivienda
Puerto Rico	6508	00+0480	Izq	10	Vivienda
Puerto Rico	6508	00+0520	Izq	10	Vivienda
Puerto Rico	6508	00+0600	Izq	10	Vivienda
Puerto Rico	6508	00+0680	Izq	10	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0130	Der	7	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0210	Der	10	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0250	Izq	5	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0260	Der	8	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0310	Izq	7	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0330	Izq	7	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0610	Izq	7	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0710	Izq	7	Vivienda

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Puerto Rico	6508	01+0715	Izq	7	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0725	Izq	7	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0735	Izq	7	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0750	Izq	7	Vivienda
Puerto Rico	6508	01+0810	Izq	7	Vivienda
Puerto Rico	6508	02+0050	Izq	10	Vivienda
Puerto Rico	6508	02+0200	Izq	10	Vivienda
Puerto Rico	6508	02+0400	Izq	5	Vivienda
Puerto Rico	6508	02+0410	Izq	11	Vivienda
Puerto Rico	6508	03+0100	Der	7	Vivienda
Puerto Lleras	6508	03+0390	Der	5	Vivienda
Puerto Lleras	6508	03+0395	Izq	15	Vivienda
Puerto Lleras	6508	03+0400	Der	15	Restaurante
Puerto Lleras	6508	08+0380	Izq	10	Vivienda
Puerto Lleras	6508	09+0700	Der	15	Restaurante
Puerto Lleras	6508	13+0470	Der	10	Billar
Puerto Lleras	6508	13+0470	Izq	15	Vivienda
Puerto Lleras	6508	13+0475	Der	20	Tienda
Puerto Lleras	6508	13+0500	Der	10	Vivienda
Puerto Lleras	6508	13+0510	Der	10	Vivienda
Puerto Lleras	6508	18+0250	Der	10	Tienda
Puerto Lleras	6508	18+0260	Izq	20	Construcción
Puerto Lleras	6508	18+0280	Der	20	Tienda
Puerto Lleras	6508	18+0300	Der	20	Vivienda
Puerto Lleras	6508	18+0310	Der	20	Vivienda
Puerto Lleras	6508	26+0700	Izq	10	Tienda
Puerto Lleras	6508	27+0700	Der	5	Restaurante
Puerto Lleras	6508	27+0800	Izq	5	Vivienda
Puerto Lleras	6508	27+0820	Der	6	Montallantas
Puerto Lleras	6508	29+0100	Der	7	Vivienda
Puerto Lleras	6508	29+0110	Der	7	Tienda
Puerto Lleras	6508	32+0500	Der	10	Restaurante
Puerto Lleras	6508	37+0500	Izq	10	Vivienda

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Puerto Lleras	6508	37+0510	Der	10	Tienda
Puerto Lleras	6508	37+0510	Izq	12	Vivienda
Puerto Lleras	6508	45+0400	Izq	20	Bailnedario
Puerto Lleras	6508	47+0720	Izq	12	Montallantas
Puerto Lleras	6508	51+0300	Der	7	Construcción
Fuente de Oro	6508	65+0000	Der	6	Casetas
Fuente de Oro	6508	65+0960	Izq	6	Restaurante
Fuente de Oro	6508	70+0950	Izq	4	Casetas
Fuente de Oro	6508	71+0120	Der	10	Casetas
Fuente de Oro	6508	71+0150	Der	4	Vivienda
Fuente de Oro	6508	71+0210	Der	4	Casetas
Fuente de Oro	6508	73+0600	Der	4	Construcción
Fuente de Oro	6508	76+0450	Izq	5	Tienda
Fuente de Oro	6508	77+0080	Der	10	Restaurante
Fuente de Oro	6508	77+0350	Izq	5	Tienda
Fuente de Oro	6508	79+0200	Izq	10	Casetas
Fuente de Oro	6508	79+0220	Izq	12	Vivienda
Fuente de Oro	6508	79+0280	Izq	12	Vivienda
Fuente de Oro	6508	79+0300	Izq	12	Vivienda
Fuente de Oro	6508	79+0320	Izq	12	Vivienda
Fuente de Oro	6508	79+0380	Izq	10	Tienda
Fuente de Oro	6508	81+0720	Izq	10	Restaurante
Fuente de Oro	6508	93+0500	Der	9	Vivienda
Fuente de Oro	6508	93+0550	Der	9	Vivienda
Granada	6508	98+0100	Der	8	Tienda
Granada	6508	98+0150	Der	10	Vivienda
Granada	6508	98+0160	Der	10	Vivienda
Granada	6508	98+0170	Der	10	Tienda
Granada	6508	98+0180	Der	10	Vivienda
Granada	6508	98+0300	Der	7	Casetas
Granada	6508	98+0500	Izq	9	Tienda
Granada	6508	100+0120	Der	7	Tienda
Granada	6508	100+0200	Izq	5	Floristeria

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Granada	6508	100+0220	Izq	5	Casetas
Granada	6508	100+0250	Izq	4	Chatarreria
Granada	6508	100+0300	Izq	6	Montallantas
Granada	6508	100+0950	Der	9	Market
Granada	6508	101+0150	Der	9	Estructura abandonada
Granada	6508	101+0250	Der	9	Tanques
Granada	6508	101+0250	Izq	5	Casetas

- Necesidades

PR inicial	PR final	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
00+0000	103+0000	1. Estudios, Diseños, Rehabilitación y Pavimentación de la vía Cruce Puerto Rico - Ye de Granada. (RUTA 6508 / PR00+0000 - PR103+0000)
30+0900	30+0900	2. Construcción muro de contención (RUTA 6508 / PR 30+0900)
33+0500	33+0010	3. Construcción muro de contención (RUTA 6508 / PR 33+0500)
51+0900 52+0300 52+0500	51+0920 52+0315 52+0510	4. Construcción muro de contención (RUTA 6508 / PR 51+0900, PR 52+0300, PR 52+0500)
37+0000	37+0040	5. Construcción muro de contención (RUTA 6508 / PR 37+0000)
0+0000 46+0000 47+0150 66+0000 71+0000 87+0500 98+0560 99+0950	0+0050 46+0050 47+0200 66+0100 71+0100 87+0100 98+0910 100+0000	6. Deterioro y el aumento en la severidad que tienen las bandas alertadoras
14+0524	14+0546	7. Solicitud de garantía para daño en las juntas elastoremica del puente Caño Guichiral.
13+0200 16+0700 20+0300 21+0000 51+0620	13+0500 16+0800 20+0400 21+0100 51+0800	8. Estudios y diseños rehabilitación de hundimientos vulnerabilidad alta sobre el ancho de la carpeta.
40+0340 41+0340	40+0345 41+0345	9. Estudios y diseños reparación de daños en el cabezal de descarga y tubería, alcantarillas sencillas de 36".

2.4.2 Variante en la Ruta 65MTA - paso por Puerto Lleras

Se evidencio en los recorridos rutinarios que está a cargo de la AMV, que para el tramo del PR 01+0000 al PR 14+0000, se evidencia una vía completamente en afirmado, la cual presenta varias afectaciones que por su forma y gravedad se podría deducir que son ocasionadas por la carga de tránsito de este corredor, teniendo en cuenta que normalmente son vehículos de carga y maquinaria agrícola los que se desplazan por allí.

Invasiones presentes en la vía:
Esta ruta tiene problemas de invasión sobre las zonas de derecho de vía, como se relaciona en la siguiente tabla

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Puerto Lleras	65MTA	00+0320	Izq	4	Restaurante
Puerto Lleras	65MTA	00+0950	Izq	4	Caseta

Estado de la vía:

- Observaciones generales a lo largo de la ruta:

Del PR00+0000 – PR01+0200 presenta buenas condiciones. El resto de la vía del PR01+0200 – PR13+0970 se encuentra en afirmado en regulares condiciones.

- Necesidades

PR inicial	PR final	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
01+0000	13+0800	1. Pavimentación variante paso por Puerto Lleras (RUTA 65MTA)

2.4.3 Ruta 65MTB - paso por Puerto Limón

Invasiones presentes en la vía:
Esta ruta tiene problemas de invasión sobre las zonas de derecho de vía, como se relaciona en la siguiente tabla

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Fuente de Oro	65MTB	00+0500	Der	4	Vivienda
Fuente de Oro	65MTB	00+0510	Der	4	Vivienda
Fuente de Oro	65MTB	00+0530	Der	4	Vivienda
Fuente de Oro	65MTB	00+0580	Der	4	Vivienda

Fuente de Oro	65MTB	01+0300	Izq	4	Vivienda

Estado de la vía:

- Observaciones generales a lo largo de la ruta:

El tramo del PR00+0000 hasta el PR01+0200 se encuentra pavimentada en toda su extensión, la señalización horizontal está perdiendo visibilidad y falta señalización vertical. El tramo restante ya no existe ya que el río Ariari la destruyó en uno de sus desbordamientos.

2.4.4 Ruta 65MTC - paso por Puerto Santander

Invasiones presentes en la vía:

Esta ruta tiene problemas de invasión sobre las zonas de derecho de vía, como se relaciona en la siguiente tabla.

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Fuente de Oro	65MTC	02+0500	Izq	4	Caseta

Estado de la vía:

- Observaciones generales a lo largo de la ruta:

Esta vía se encuentra en tratamiento superficial en condiciones regulares desde el PR02+0000 al PR02+0500. El tramo del PR00+0000 hasta el PR02+0000 ya no existe ya que el río Ariari la destruyó en uno de sus desbordamientos. Se realiza seguimiento al hundimiento del pozo de inspección sobre el PR02+0300 construido por la alcaldía de Fuente de oro. Desde el PR02+0500 al PR03+004 la vía se encuentra en pavimento flexible en buenas condiciones y buena señalización horizontal. En todo el tramo la vía no cuenta con señalización vertical.

2.4.5 Ruta 65MTD - paso por Puerto Aljure

Estado de la vía:

- Observaciones generales a lo largo de la ruta:

De acuerdo a los recorridos realizados por esta Administración Vial, se continua evidenciando la afectación en la ruta 65MTD (Paso por Puerto Aljure) entre el PR 00+0000 y el PR 04+0110 existe se presenta una problemática que afecta desde la estructura del pavimento, obras de drenaje y así mismo la estabilidad de la vía en general, dicha problemática corresponde a la pérdida de material en el costado derecho de la vía (PR 03+0160 – PR 03+0880) ocasionado por un volumen de escorrentía superior a la capacidad hidráulica de los drenajes establecidos. Ahora bien, dentro del recorrido también se logró evidenciar que la capa de rodadura en general, presenta un desgaste común de acuerdo a la vida útil y al tiempo de servicio de este asfalto lo cual se desencadena en fisuras erráticas y demás afectaciones.

- Sitios críticos:

En el PR 3+0160 al PR 3+0880 se presenta la pérdida de hombro derecho del a banca de la vía.

- Necesidades

PR inicial	PR final	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
03+0160	03+0880	1. Estudios y Diseños protección y recuperación de carpeta asfáltica hombro derecho PR 03+0880 RUTA 65MTD

2.4.6 Ruta 65A02. Uribe - Ye de Granada

Esta vía comunica al municipio de Uribe con el centro del departamento, además también comunica a Mesetas y San Juan de Arama, es una vía importante, debido a que la zona rural de estos municipios está dedicada a la producción agropecuaria y ganadera, la cual se comercializa hacia el centro del país transportándolo por esta ruta.

Invasiones presentes en la vía:
Esta ruta tiene problemas de invasión sobre las zonas de derecho de vía, como se relaciona en la siguiente tabla

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Mesetas	65A02	49+0700	Izq	20	Vivienda
Mesetas	65A02	51+0150	Izq	12	Vivienda
Mesetas	65A02	54+0400	Der	10	Estadero
Mesetas	65A02	57+0200	Izq	4	Vivienda
Mesetas	65A02	57+0220	Izq	5	Vivienda
Mesetas	65A02	57+0400	Der	10	Tienda
Mesetas	65A02	60+0890	Der	15	Vivienda
Mesetas	65A02	61+0000	Der	12	Vivienda
Mesetas	65A02	61+0090	Der	7	Vivienda
Mesetas	65A02	61+0100	Der	10	Vivienda
San Juan de Arama	65A02	64+0500	Der	8	Caseta
San Juan de Arama	65A02	68+0400	Der	10	Caseta
San Juan de Arama	65A02	76+0700	Izq	15	Vivienda
San Juan de Arama	65A02	76+0720	Der	9	Vivienda
San Juan de Arama	65A02	86+0800	Izq	4	Vivienda
San Juan de Arama	65A02	86+0810	Izq	4	Vivienda

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
San Juan de Arama	65A02	86+0850	Der	7	Vivienda
San Juan de Arama	65A02	86+0850	Izq	10	Vivienda
San Juan de Arama	65A02	87+0050	Izq	15	Balnedario
Granada	65A02	88+0400	Der	20	Tienda
Granada	65A02	91+0050	Der	20	Montallantas
Granada	65A02	91+0080	Izq	7	Tienda
Granada	65A02	93+0300	Der	5	Vivienda
Granada	65A02	93+0300	Der	6	Taller
Granada	65A02	93+0400	Der	10	Caseta
Granada	65A02	94+0200	Izq	4	Caseta
Granada	65A02	95+0200	Der	20	Caseta
Granada	65A02	97+0100	Der	20	Vivero
Granada	65A02	97+0150	Der	6	Tienda
Granada	65A02	97+0200	Izq	7	Tienda
Granada	65A02	97+0200	Izq	10	Tienda
Granada	65A02	97+0450	Izq	12	Asadero
Granada	65A02	98+0400	Izq	15	Caseta
Granada	65A02	98+0500	Izq	10	Tienda
Granada	65A02	98+0800	Izq	10	Vienda
Granada	65A02	98+0900	Izq	5	Tienda
Granada	65A02	99+0320	Izq	5	Caseta
Granada	65A02	99+0550	Izq	5	Tienda
Granada	65A02	99+0710	Izq	5	Tienda
Granada	65A02	99+0730	Izq	5	Tienda
Granada	65A02	99+0750	Der	20	Tienda
Granada	65A02	99+0800	Der	5	Tienda
Granada	65A02	100+0200	Der	20	Vienda
Granada	65A02	100+0230	Izq	5	Caseta
Granada	65A02	100+0250	Der	5	Vivienda
Granada	65A02	100+0500	Izq	10	Tienda
Granada	65A02	100+0700	Der	15	Vivienda
Granada	65A02	100+0750	Der	16	Montallantas
Granada	65A02	100+0780	Der	7	Asadero
Granada	65A02	100+0845	Der	20	Construcción
Granada	65A02	101+0300	Izq	6	Tienda
Granada	65A02	101+0750	Der	15	Caseta

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Granada	65A02	103+0850	Izq	6	Caseta
Granada	65A02	104+0200	Der	10	Caseta
Granada	65A02	104+0500	Der	6	Vivienda
Granada	65A02	104+0520	Der	6	Vivienda
Granada	65A02	104+0530	Der	6	Tienda
Granada	65A02	104+0600	Der	10	Vivienda
Granada	65A02	105+0800	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	105+0820	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	105+0900	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	105+0920	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	105+0950	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0000	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0050	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0070	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0090	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0100	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0105	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0110	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0115	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0120	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0125	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0130	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0135	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0200	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0300	Der	15	Vivienda
Granada	65A02	106+0305	Der	15	Vivienda
Granada	65A02	106+0350	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0355	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0360	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0365	Der	7	Vivienda
Granada	65A02	106+0400	Der	4	Vivienda
Granada	65A02	106+0405	Der	4	Tienda
Granada	65A02	106+0420	Der	4	Tienda
Granada	65A02	106+0425	Der	4	Vivienda
Granada	65A02	106+0430	Der	4	Vivienda
Granada	65A02	106+0435	Der	4	Vivienda

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Granada	65A02	106+0440	Der	4	Vivienda
Granada	65A02	106+0450	Der	9	Vivienda
Granada	65A02	106+0460	Der	9	Vivienda
Granada	65A02	106+0470	Der	9	Vivienda
Granada	65A02	106+0480	Der	9	Vivienda
Granada	65A02	106+0490	Der	9	Vivienda
Granada	65A02	106+0500	Der	9	Vivienda
Granada	65A02	106+0510	Der	9	Vivienda
Granada	65A02	106+0520	Der	9	Vivienda
Granada	65A02	106+0540	Der	9	Vivienda
Granada	65A02	106+0560	Der	4	Vivienda
Granada	65A02	106+0580	Der	9	Vivienda
Granada	65A02	106+0600	Der	9	Vivienda
Granada	65A02	106+0620	Der	8	Caseta
Granada	65A02	106+0630	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0650	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0670	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0690	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0710	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0730	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0750	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0760	Der	8	Construcción
Granada	65A02	106+0770	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0790	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0810	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0830	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0850	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0870	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0890	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0910	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0930	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0950	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0970	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0980	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0985	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	106+0990	Der	8	Vivienda

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Granada	65A02	106+0995	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0000	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0010	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0015	Der	8	Caseta
Granada	65A02	107+0020	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0025	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0030	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0035	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0040	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0045	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0050	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0055	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0060	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0065	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0070	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0075	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0080	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0085	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0090	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0095	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0100	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0105	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0110	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0115	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0120	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0125	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0130	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0135	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0140	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0145	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0150	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0155	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0160	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0165	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0170	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0175	Der	8	Vivienda

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Granada	65A02	107+0180	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0185	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0190	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0195	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0200	Der	8	Vivienda
Granada	65A02	107+0220	Der	8	Vivienda

- Necesidades

PR inicial	PR final	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
49+0050	49+0050	Estudios, Diseños, reparación de estructura de drenaje alcantarilla y rehabilitación de estructura de la vía en la ruta 65A02
56+0362	57+0685	Mejoramiento en pavimento rígido en el paso urbano por mesetas del PR 57+0685 al PR 56+0362 de la ruta 65A02
76+0000	109+0000	Estudios, Diseños, Rehabilitación y Pavimentación vía La Uribe - Ye de Granada. (RUTA 65A02 / PR76+0000 - PR109+0000)
96+0750	96+0750	Estudios, Diseños, reparación de estructura de protección de erosión a la cimentación sobre el pontón ubicado en el PR 96+0750 de la vía en la ruta 65A02
95+0213	95+0213	Estudios, Diseños, reparación de estructura de la vía debido a hundimiento presentado sobre la alcantarilla doble ubicada en el PR 95+0213 de la vía en la ruta 65A02
100+0845	101+0307	Mantenimiento Puente El Alcaraván (RUTA 65A02 / PR100+0845)

2.4.7 Ruta 65AMTA paso por Puerto Caldas

Invasiones presentes en la vía:
Esta ruta tiene problemas de invasión sobre las zonas de derecho de vía, como se relaciona en la siguiente tabla

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Granada	65AMTA	01+0120	Der	6	Caseta
Granada	65AMTA	02+0030	Der	5	Montallantas
Granada	65AMTA	02+0030	Izq	5	Vivienda

Estado de la vía:

- Observaciones generales a lo largo de la ruta:

Del PR00+0000 al PR03+0900 la vía se encuentra en pavimento flexible en estado regular sin demarcación horizontal ni vertical y horizontal

- Necesidades

PR inicial	PR final	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
PR02+0000 al PR03+0900		1. Sobre carpeta variante paso por Puerto Caldas (RUTA 65AMTA)

2.4.8 Ruta 65AMTB - acceso Pte. Guillermo León Valencia

Invasiones presentes en la vía:

Esta ruta tiene problemas de invasión sobre las zonas de derecho de vía, como se relaciona en la siguiente tabla

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Granada	65AMTB	00+0000	Izq	6	Caseta
Granada	65AMTB	00+0020	Izq	5	Caseta
Granada	65AMTB	02+0350	Izq	8	Vivienda
Granada	65AMTB	02+0355	Izq	8	Vivienda
Granada	65AMTB	02+0365	Izq	8	Vivienda
Granada	65AMTB	02+0375	Izq	8	Vivienda
Granada	65AMTB	02+0400	Izq	8	Vivienda
Granada	65AMTB	02+0450	Izq	10	Caseta
Granada	65AMTB	02+0650	Der	4	Caseta

Estado de la vía:

- Observaciones generales a lo largo de la ruta:

Esta vía se encuentra pavimentada, el tráfico por ella es escaso, las alcantarillas se encuentran limpias.

2.4.9 Ruta 65AMTC - vía acceso a Granada

Invasiones presentes en la vía:
Esta ruta tiene problemas de invasión sobre las zonas de derecho de vía, como se relaciona en la siguiente tabla

Municipio	Ruta	PR	Costado	Distancia del eje	Observaciones
Granada	65AMTC	00+0000	Der	5	Caseta
Granada	65AMTC	00+0020	Der	5	Montallantas
Granada	65AMTC	02+0350	Der	6	Caseta
Granada	65AMTC	02+0355	Izq	5	Vivienda
Granada	65AMTC	02+0365	Izq	5	Vivienda
Granada	65AMTC	02+0375	Izq	5	Vivienda
Granada	65AMTC	02+0400	Der	4	Bar

Estado de la vía:

- Observaciones generales a lo largo de la ruta:

Esta vía necesita pintura para la demarcación horizontal, presenta problemas en el drenaje del agua lluvia en la cuneta del costado izquierdo debido a las adecuaciones que han hecho la comunidad para generar rampas de acceso a los predios, generando un obstáculo al flujo del agua lluvia, en el acceso se encuentran bandas alertadoras en mal estado, las cuales se recomienda reparar, debido a que con el pasar de los días han perdido su funcionalidad de advertir a los conductores el cruce en este sector.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1 Información general contratos a supervisar interventoría

RUTA 6508: CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA
SECTOR: CRUCE PUERTO RICO – PUERTO LLERAS

CTO DE OBRA No.	**1670 de 2024**		
CONTRATISTA.	CONSTRUCHAF VIAL LTDA		
OBJETO.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1		
PLAZO INICIAL.	HASTA 31 JULIO 2026	**PLAZO ACUMULADO.**	HASTA 31 JULIO 2026
FECHA DE INICIO.	29 MAYO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO.**	HASTA 31 JULIO 2026
VALOR CTO PRINCIPAL.	$2.219.956.900,00	**VALOR ANTICIPO**	$ 0,00

RUTA 6508: CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA
SECTOR: PUERTO LLERAS – FUENTE DE ORO

CTO DE OBRA No.	**1694 de 2024**		
CONTRATISTA.	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES VÍAS DEL PROGRESO LTDA		
OBJETO.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4		
PLAZO INICIAL.	HASTA 31 JULIO 2026	**PLAZO ACUMULADO.**	HASTA 31 JULIO 2026
FECHA DE INICIO.	01 JUNIO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO.**	HASTA 31 JULIO 2026
VALOR CTO PRINCIPAL.	$1.853.020.400,00	**VALOR ANTICIPO**	$ 0,00

RUTA 6508: CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA
SECTOR: FUENTE DE ORO - GRANADA
RUTA 65A02: URIBE - YE DE GRANADA
SECTOR: GRANADA – SAN JUAN DE ARAMA

CTO DE OBRA No.	**1710 de 2024**
CONTRATISTA.	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES SAN JUAN S.A.S

OBJETO.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ; 65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 -PR109+0821 LOTE 9		
PLAZO INICIAL.	HASTA 31 JULIO 2026	**PLAZO ACUMULADO.**	HASTA 31 JULIO 2026
FECHA DE INICIO.	29 MAYO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO.**	HASTA 31 JULIO 2026
VALOR CTO PRINCIPAL.	$1.654.397.500,00	**VALOR ANTICIPO**	$ 0,00

RUTA 65A02: URIBE - YE DE GRANADA
SECTOR: SAN JUAN DE ARAMA - MESETAS

CTO DE OBRA No.	**2896 de 2023**		
CONTRATISTA.	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN VIALVIAS LTDA		
OBJETO.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 - PR76+0000. LOTE 8		
PLAZO INICIAL.	HASTA 31 JULIO 2026	**PLAZO ACUMULADO.**	HASTA 31 JULIO 2026
FECHA DE INICIO.	29 MAYO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO.**	HASTA 31 JULIO 2026
VALOR CTO PRINCIPAL.	$1.665.074.180,00	**VALOR ANTICIPO**	$ 0,00

RUTA 65A02: URIBE - YE DE GRANADA
SECTOR: MESETAS – URIBE

CTO DE OBRA No.	**1671 de 2024**		
CONTRATISTA.	VIASDUDA LTDA.		
OBJETO.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 - PR40+0000. LOTE 2.		
PLAZO INICIAL.	HASTA 31 JULIO 2026	**PLAZO ACUMULADO.**	HASTA 31 JULIO 2026
FECHA DE INICIO.	29 MAYO 2024	**FECHA DE VENCIMIENTO.**	HASTA 31 JULIO 2026
VALOR CTO PRINCIPAL.	$1.977.256.400,00	**VALOR ANTICIPO**	$ 0,00

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, se dio cumplimiento al desarrollo del plan de trabajo programado (rocería, desmonte manual, limpieza manual de cunetas, limpieza de encoles y descoles, limpieza obras de arte, mantenimiento y limpieza de puentes, limpieza de señales y mojones, bacheo) por la administración vial para las cinco (5) empresas que están a cargo del mantenimiento rutinario de las vías 6508, 65A02 con sus accesos y variantes. Las Empresas se comprometieron y trabajaron en el desarrollo de las actividades programadas para dar cumplimiento a los indicadores, teniendo garantía y satisfacción de cumplimiento al ser recibidas por parte de la AMV G3.

En las siguientes tablas se relacionan las actividades realizadas de cada empresa de mantenimiento rutinario en el mes de octubre del 2025.

CONSTRUCHAF VIAL LTDA	
Fecha	Actividad desarrollada
1/10/2025	Se realizan actividades de poda, corte y/o recolección de árboles entre los PR 18+0000 al PR 22+0000, Ruta 6508
2/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto, retiro de derrumbe en el PR 32+0500 en la ruta 6508
3/10/2025	Se realizan actividades de limpieza rutinaria del puente Chinata en la ruta 6508
4/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
5/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 50+0000 al PR 52+0000 en la ruta 6508
7/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 48+0000 al PR 50+0000 en la ruta 6508
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 33+0000 al PR 34+0000 en la ruta 6508
9/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 34+0000 al PR 35+0000 en la ruta 6508
10/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 30+0000 al PR 32+0000 en la ruta 6508
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
13/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles entre los PR 62+0000 al 63+0000, en la Ruta 6508.
14/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles entre los PR 75+0000 al 77+0000, en la Ruta 6508.

CONSTRUCHAF VIAL LTDA	
Fecha	Actividad desarrollada
15/10/2025	Se realizan actividades de levantamientos de señalización entre los PR 3+0000 al 4+0000, en la variante 65MTD en la Ruta 6508.
16/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 74+0000 al 80+0000, en la Ruta 6508.
17/10/2025	Se realizan actividades de bacheo con mezcla asfaltica entre los PR 74+0000 al 89+0000, en la Ruta 6508.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
20/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 19+0000 al PR 22+0000 en la ruta 6508
21/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 13+0000 al PR 14+0000 en la ruta 6508
22/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 40+0000 al PR 41+0000 en la ruta 6508
23/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 52+0000 al PR 52+0100 en la ruta 6508
24/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 53+0000 al PR 56+0100 en la ruta 6508
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
27/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de bermas entre los PR 00+0000 al PR 01+0000 de la variante 65MTA, en la Ruta 6508
28/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto retiro de material provenidnete de movimiento en masa entre los PR 30+0900 al PR 31+0009 en la ruta 6508
29/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto retiro de material provenidnete de movimiento en masa entre los PR 30+0900 al PR 31+0009 en la ruta 6508
30/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 31+0000 al PR 32+0000 en la ruta 6508
31/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 25+0000 al PR 27+0000 en la ruta 6508

VÍAS DEL PROGRESO LTDA	
Fecha	Actividad desarrollada
1/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 71+0000 al 68+0000, Ruta 6508.
2/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 65+0000 al 68+0000, Ruta 6508.

VÍAS DEL PROGRESO LTDA	
Fecha	Actividad desarrollada
3/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 62+0000 al 65+0000, Ruta 6508.
4/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
5/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza rutinaria del puente iraca y limpieza de defensas metálicas entre los PR 56+0000 al 57+0000, Ruta 6508.
7/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 62+0000 al 60+0000, Ruta 6508.
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre los PR 70+0000 al 81+0000, Ruta 6508.
9/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 58+0000 al 60+0000, Ruta 6508.
10/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas en tierra entre los PR 11+0000 al 14+0000, en la variante 65MTA de la Ruta 6508.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencia
14/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 56+0000 al 58+0000, en la Ruta 6508.
15/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 04+0000 al 08+0000, en la variante 65MTA en la Ruta 6508
16/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 08+0000 al 14+0000, en la variante 65MTA en la Ruta 6508
17/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre los PR 68+0000 al 69+0000, en la Ruta 6508.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
20/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles entre los PR 62+0000 al 63+0000, en la Ruta 6508.
21/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles entre los PR 75+0000 al 77+0000, en la Ruta 6508.
22/10/2025	Se realizan actividades de levantamientos de señalización entre los PR 3+0000 al 4+0000, en la variante 65MTD en la Ruta 6508.
23/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 74+0000 al 80+0000, en la Ruta 6508.
24/10/2025	Se realizan actividades de bacheo con mezcla asfaltica entre los PR 74+0000 al 89+0000, en la Ruta 6508.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

VÍAS DEL PROGRESO LTDA	
Fecha	Actividad desarrollada
27/10/2025	Se realizan actividades de bacheo con mezcla asfaltica entre los PR 59+0000 al 89+0000, en la Ruta 6508.
28/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 70+0000 al 74+0000, en la Ruta 6508.
29/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 93+0000 al 96+0000, en la Ruta 6508.
30/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 90+0000 al 93+0000, en la Ruta 6508.
31/10/2025	Se realizan actividades de roceria de las variantes 65MTB y 65MTC en la Ruta 6508.

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES SAN JUAN S.A.S	
Fecha	Actividad desarrollada
1/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de bermas en el PR 96+0000 de la, Ruta 65A02.
2/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 96+0000 al PR 99+0000 de la, Ruta 6508
3/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 99+0000 al PR 102+0000 de la, Ruta 65A02.
4/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
5/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
6/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 105+0000 al PR 109+0000 de la, Ruta 65A02.
7/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 101+0000 al PR 105+0000 de la, Ruta 65A02.
8/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre los PR 76+0000 al PR 77+0000 de la, Ruta 65A02.
9/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 95+0000 al PR 100+0000 de la, Ruta 65A02.
10/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica caliente entre los PR 77+0000 al PR 84+0000 de la, Ruta 65A02.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 88+0000 al PR 92+0000 de la, Ruta 65A02.
15/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfaltica entre los PR 76+0000 al PR 99+0000 de la, Ruta 65A02.
16/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfaltica entre los PR

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES SAN JUAN S.A.S	
Fecha	Actividad desarrollada
	100+0000 al PR 105+0000 de la, Ruta 65A02.
17/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 88+0000 al PR 85+0000 de la, Ruta 65A02.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
20/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
21/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 88+0000 al PR 92+0000 de la, Ruta 65A02.
22/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfaltica entre los PR 76+0000 al PR 99+0000 de la, Ruta 65A02.
23/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfaltica entre los PR 100+0000 al PR 105+0000 de la, Ruta 65A02.
24/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 88+0000 al PR 85+0000 de la, Ruta 65A02.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
27/10/2025	Se realizan actividades de poda y corte de arboles entre los PR 100+0000 al PR 101+0000 costado derecho de la, Ruta 65A02.
28/10/2025	Se realizan actividades de poda y corte de arboles entre los PR 00+0000 al PR 03+0000 en la variante 65AMTA de la, Ruta 65A02.
29/10/2025	Se realizan actividades de cuneta revestidas en concreto entre los PR 103+0000 al PR 103+0300 costado izquierdo de la, Ruta 65A02.
30/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 95+0000 al PR 108+0000 costado izquierdo de la, Ruta 65A02.
31/10/2025	Se realizan actividades de poda y corte de arboles entre los PR 100+0000 al PR 101+0000 costado derecho de la, Ruta 65A02.

VIALVIAS LTDA	
Fecha	Actividad desarrollada
1/10/2025	Se realizan actividades de bacheo entre los PR 44+0000 al PR 47+0000, Ruta 65A02.
2/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de laderas entre los PR 57+0000 al PR 59+0000, Ruta 65A02.
3/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de laderas entre los PR 43+0000 al PR 46+0000, Ruta 65A02.
4/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
5/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR

VIALVIAS LTDA	
Fecha	Actividad desarrollada
	56+0000 al PR 60+0000, Ruta 65A02.
7/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 67+0000 al PR 76+0000, Ruta 65A02.
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 49+0000 al PR 55+0000, Ruta 65A02.
9/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 64+0000 al PR 67+0000, Ruta 65A02.
10/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 60+0000 al PR 64+0000, Ruta 65A02.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 47+0000 al PR 49+0000, Ruta 65A02.
15/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 45+0000 al PR 47+0000, Ruta 65A02.
16/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 43+0000 al PR 45+0000, Ruta 65A02.
17/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 53+0000 al PR 56+0000, Ruta 65A02.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
20/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 56+0000 al PR 60+0000, Ruta 65A02.
21/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 40+0000 al PR 42+0000, Ruta 65A02.
22/10/2025	Se realizan actividades de bacheo con material comun entre los PR 40+0000 al PR 43+0000, Ruta 65A02.
23/10/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre los PR 43+0000 al PR 44+0000, Ruta 65A02.
24/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cuentas en tierra entre los PR 43+0000 al PR 46+0000, Ruta 65A02.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
27/10/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre los PR 40+0000 al PR 43+0000, Ruta 65A02.
28/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre el PR 66+0000 al PR 76+0000, Ruta 65A02.
29/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre el PR 56+0000 al PR 66+0000, Ruta 65A02.

VIALVIAS LTDA	
Fecha	Actividad desarrollada
30/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre el PR 46+0000 al PR 56+0000, Ruta 65A02.
31/10/2025	Se realizan actividades de retiro de señalizacion vertical dañadas entre el PR 46+0000 al PR 76+0000, Ruta 65A02.

VIASDUDA LTDA	
Fecha	Actividad desarrollada
1/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de descoles de obras hidráulicas entre el PR 00+0000 al PR 01+0000, Ruta 65A02.
2/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de descoles de obras hidráulicas entre el PR 01+0000 al PR 02+0000, Ruta 65A02.
3/10/2025	Se realizan actividades de recoleccion de basuras y residuos sólidos entre el PR 10+0000 al PR 13+0000, Ruta 65A02.
4/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
5/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 01+0000 al PR 02+0000, Ruta 65A02.
7/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 02+0000 al PR 04+0000, Ruta 65A02.
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 09+0000 al PR 11+0000, Ruta 65A02.
9/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 36+0000 al PR 40+0000, Ruta 65A02.
10/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 33+0000 al PR 36+0000, Ruta 65A02.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realizan actividades de roceria manual limpieza de laderas entre el PR 08+0000 al PR 09+0000, Ruta 65A02.
15/10/2025	Se realizan actividades de roceria manual limpieza de laderas entre el PR 14+0000 al PR 15+0000, Ruta 65A02.
16/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 26+0000 al PR 29+0000, Ruta 65A02.
17/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 30+0000 al PR 33+0000, Ruta 65A02.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
20/10/2025	Se realizan actividades de limpieza rutinaria de puentes entre el PR

VIASDUDA LTDA	
Fecha	Actividad desarrollada
	13+0000 al PR 14+0000, Ruta 65A02.
21/10/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre el PR 20+0000 al PR 23+0000, Ruta 65A02.
22/10/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre el PR 23+0000 al PR 25+0000, Ruta 65A02.
23/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 05+0000 al PR 07+0000, Ruta 65A02.
24/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre el PR 04+0000 al PR 08+0000, Ruta 65A02.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
27/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 06+0000 al PR 07+0000, Ruta 65A02.
28/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 07+0000 al PR 08+0000, Ruta 65A02.
29/10/2025	Se realizan actividades de limpieza rutinaria de puentes entre el PR 08+0000 al PR 13+0000, Ruta 65A02.
30/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 23+0000 al PR 26+0000 de la, Ruta 65A02
31/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 20+0000 al PR 23+0000 de la, Ruta 65A02

3.3 Seguimiento Ítems no previstos.

No aplica para este proyecto.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

No aplica para este proyecto.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4.1 Informe Semanal.

Se presenta los informes semanales de las cinco (5) empresas de mantenimiento rutinario, acorde al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3, los cuales se encuentran en el anexo EMR.

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.

Se presenta los informes de maquinaria y equipo contrato de obra de las cinco (5) empresas de mantenimiento rutinario acorde al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, los cuales se encuentran en el anexo EMR.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Se presenta los informes de personal, control de aportes legales y seguridad social contrato de obra de las cinco (5) empresas de mantenimiento rutinario acorde al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, los cuales se encuentran en el anexo EMR.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Se presenta los informes financieros y presupuestal contrato de obra de las cinco (5) empresas de mantenimiento rutinario acorde al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, los cuales se encuentran en el anexo EMR.

4.5 Estado General del Tiempo.

Se presenta los informes del estado general del tiempo de los contratos de obra de las cinco (5) empresas de mantenimiento rutinario acorde al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, los cuales se encuentran en el anexo EMR.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio.

No aplica para este proyecto.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

Se presenta los informes del seguimiento de garantías y seguros de los contratos de obra de las cinco (5) empresas de mantenimiento rutinario acorde al formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, los cuales se encuentran en el anexo EMR.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

No aplica para este proyecto.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual.

No aplica para este proyecto.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato de interventoria.

En este capítulo se presenta la información del contrato de administración vial No 1932 del 2024 y las actividades ejecutadas en el mes de octubre 2025. En el año 2023, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS adelantó el concurso de méritos abierto, No **CMA-DEO-SGI-137-2023** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES HUILA, META Y CUNDINAMARCA LOTES DEL 1 AL 9" GRUPO 5."**; para el grupo 3 siendo seleccionado la empresa CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS– COINZA ING S.A.S., para ejecutar el contrato No. 1932 de 2024; el cual administra los corredores viales: ruta 6508 Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, ruta 65A02 Uribe - Ye de Granada; accesos y variantes: 65MTA Paso por Puerto Lleras, 65MTB Paso por Puerto Limón, 65MTC Paso por Puerto Santander, 65MTD Paso por Puerto Aljure, 65AMTA Paso por Puerto Caldas, 65AMTB Acceso Puente Guillermo León Valencia, 65AMTC Acceso a Granada; para un total de 244,68 kilómetros administrados.

A continuación, se muestra un resumen de la información del contrato de consultoría:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**1932 de 2024**		
CONTRATISTA.	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS – COINZA ING S.A.S.		
OBJETO.	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.		
PLAZO INICIAL.	VEINTINUEVE (29) MESES	PLAZO ACUMULADO.	29 MESES
FECHA DE INICIO.	05 DE JULIO DE 2024	FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO.	31 DE JULIO DE 2024
VALOR CTO PRINCIPAL.	$ 4.990.584.396,00	VALOR TOTAL DEL CTO.	$ 4.990.584.396,00
VALOR ADICION No. 1	N/A	VALOR TOTAL DEL CTO.	N/A
PRORROGA No. 1	N/A	NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO	N/A

SUSPENSIÓN No.1	N/A	FECHA DE RENAUDACIÓN	N/A
PRORROGA No. 4	N/A	NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO	N/A

5.2 Descripción de las actividades ejecutadas por parte de la AMV G3 durante el mes de octubre 2025.

FECHA	ACTIVIDAD
1/10/2025	Se realiza recorrido a la Ruta 6508 control de actividades por parte de las EMR.
2/10/2025	Se realiza recorrido a la Ruta 65A02 control de actividades por parte de las EMR.
3/10/2025	Se realizo trabajo de oficina - Personal disponible para vigilancia y emergencias.
4/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
5/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
6/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
7/10/2025	Se realiza recorrido a la Ruta 6508 control de actividades por parte de las EMR.
8/10/2025	Se realiza recorrido a la Ruta 65A02 control de actividades por parte de las EMR.
9/10/2025	Se realizo trabajo de oficina - Personal disponible para vigilancia y emergencias.
10/10/2025	Se realiza jornada de tapa huecos con mezcla asfáltica MDC-19 en la ruta 65A02, entre los PR 76+0000 al PR 90+0000 por parte de la EMR MYC.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realiza recorrido a la Ruta 6508 control de actividades por parte de las EMR.
15/10/2025	Se realiza jornada de tapa huecos con mezcla asfáltica MDC-19 en la ruta 65A02, entre los PR 90+0000 al PR 108+0000 por parte de la EMR MYC.
16/10/2025	Se realizo trabajo de oficina - Personal disponible para vigilancia y emergencias.
17/10/2025	Se realiza recorrido a la Ruta 6508 control de actividades por parte de las EMR.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
20/10/2025	Se realiza recorrido a la Ruta 6508 control de actividades por parte de las EMR.
21/10/2025	Se realiza recorrido a la Ruta 65A02 control de actividades por parte de las EMR.
22/10/2025	Se asiste a capacitación presencial aplicativo SIGPAV, en las instalaciones de la dirección territorial de Boyacá en la ciudad de Tunja.
23/10/2025	Se realizo trabajo de oficina - Personal disponible para vigilancia y emergencias.
24/10/2025	Se realiza jornada de tapa huecos con mezcla asfáltica MDC-19 en la ruta 6508, entre los PR 97+0000 al PR 103+0000 por parte de la EMR MYC.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

FECHA	ACTIVIDAD
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
27/10/2025	Se realiza jornada de tapa huecos con mezcla asfáltica MDC-19 en la ruta 6508, entre los PR 60+0000 al PR 95+0000 por parte de la EMR VIALPRO.
28/10/2025	Se realiza recorrido a la Ruta 65A02 control de actividades por parte de las EMR.
29/10/2025	Se realiza recorrido a la Ruta 6508 control de actividades por parte de las EMR.
30/10/2025	Se realiza recorrido a la Ruta 65A02 control de actividades por parte de las EMR.
31/10/2025	Se realizo trabajo de oficina - Personal disponible para vigilancia y emergencias.

Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías.

- Se comunica diariamente mañana y tarde, sobre el estado de las vías y el registro de emergencias, para mantener informado a la territorial INVÍAS Meta y a los usuarios, sobre las restricciones que presentan las dos rutas a cargo de la AMV G3, durante el mes de octubre del 2025 se atendieron las siguientes emergencias.

HORA	FECHA	RUTA	UBICACIÓN	CAUSA O EMERGENCIA	EMPRESA QUE ATENDIO EL SUCESO
17:40	16-10-2025	6508	PR 90+0700	CHOQUE	VIALCHAF
13:10	19-10-2025	6508	PR 56+0200	CHOQUE	VIALCHAF

- Se entregó al INVIAS la actualización de los sitios críticos en la ruta 65A02 y 6508.

Alertar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.

- Se realizó seguimiento al punto crítico ubicado PR 49+0050 en la ruta 65A02.
- Se realizo seguimiento al punto crítico ubicado en el PR 96+0750 de la ruta 65A02.
- Se realizo seguimiento al punto crítico ubicado en el PR 47+0220 de la ruta 65A02.
- Se realizo seguimiento al punto crítico ubicado en el PR 47+0450 de la ruta 65A02.
- Se realizo seguimiento al punto crítico ubicado en el PR 47+0910 de la ruta 65A02.
- Se realizo seguimiento al punto crítico ubicado en el PR 40+0340 de la ruta 6508.
- Se realizo seguimiento al punto crítico ubicado en el PR 47+0180 de la ruta 6508.
- Se realizo seguimiento al punto crítico ubicado en el PR 30+0900 de la ruta 6508.
- Se realizo seguimiento al punto critico ubicado en el PR 95+0213 de la ruta 65A02.

Evaluar, controlar y hacerles seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su administración vial (supervisión).

En el periodo de octubre de 2025 la ejecución de los cinco (5) contratos de mantenimiento rutinario, se programaron actividades como son rocería, limpieza de alcantarillas, limpieza de puentes, obras de drenaje; limpieza de laderas, algunas empresas priorizan unas actividades como limpieza de puentes, podas de árboles y parcheo con mezcla asfáltica.

- **VIALCHAF**

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
A. Tareas ejecutadas en la estructura de la calzada de carreteras pavimentadas			
229	Bacheo (carreteras pavimentadas):	*No se permitirá que haya huecos*	*Cumple*
B. Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de carreteras pavimentadas			
257	Parcheo:	*No se permitirá que haya huecos*	*Cumple*
263	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
264	Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
C. Tareas ejecutadas en carreteras afirmadas			
285	Bacheo (en carreteras destapadas):	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
D. Tareas ejecutadas en bermas pavimentadas			
317	Bacheo (en la berma pavimentada).	*No se permitirá que haya huecos*	*Cumple*
330	Parcheo (en la berma pavimentada):	*No se permitirá que haya huecos*	*Cumple*
333	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
334	Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
340	Limpieza de bermas pavimentadas:	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
E. Tareas ejecutadas en bermas afirmadas			
365	Bacheo (en la berma afirmada).	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
380	Limpieza de Bermas.	*Permanecerán siempre limpias*	*No se presentó*
F. Tareas en obras de drenaje y de protec. de la vía (drenaje superficial)			
425	Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
432	Limpieza de las zanjas de coronación revestidas y en tierra.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
434	Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra.	*Permanecerán siempre limpiis*	*No se presentó*
G. Tareas en obras de drenaje y de protec. de la vía (pequeñas obras hidráulicas)			

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
497	Limpieza de obras de más de 0,60 m2 de sección.	*Permanecerán siempre limpias*	*No se presentó*
498	Limpieza de pequeñas obras hidráulicas	*Permanecerán siempre limpias*	*No se presentó*
H. Puentes			
515	Mantenimiento rutinario de puentes	*Permanecerán siempre limpios*	*Cumple*
545	Limpieza manual del lecho del río	*Disponibilidad para la actividad*	*No aplica*
547	Limpieza manual de cursos de agua.	*Permanecerán siempre limpios*	*No se presentó*
548	Limpieza y pintura de barandas.	*Permanceran pintadas y limpias*	*No se presentó*
I. Obras complementarias			
625	Despeje de derrumbes	*Disp. permanente, no obstrucciones*	*Cumple*
630	Limpieza de la calzada.	*Permancerá siempre limpia*	*Cumple*
636	Rocería y desmonte manual.	*Permanerá por debajo de 30 cms*	*Cumple*
639	Poda, corte y/o retiro de arboles.	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
640	Empradización con semillas.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
641	Empradización con cespedones.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
642	Arborización.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
643	Jardinería.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
667	Reposición de la lámina de las señales	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
668	Reposición del poste de la señal.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
669	Reposición de la señal completa.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
673	Reposición de los mojones de referencia	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
678	Limpieza de señales y mojones.	*Permanecerán Siempre limpios*	*No se presentó*
682	Instalación de defensas metálicas de correa simple	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
683	Instalación de defensas metálicas de correa doble.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
685	Reposición de las partes dañadas de una defensa metálica.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
686	Limpieza de defensas metálicas.	*Permanecerá siempre limpia*	*No se presentó*
694	Vigilancia.	*Informar al INVIAS*	*Cumple*
695	Emergencias.	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
	PERSONAL	*Cumplimiento*	*Cumple*

- **VIALPRO**

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
A. Tareas ejecutadas en la estructura de la calzada de carreteras pavimentadas			
229	Bacheo (carreteras pavimentadas):	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
B. Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de carreteras pavimentadas			

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
257	Parcheo:	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
263	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
264	Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
C. Tareas ejecutadas en carreteras afirmadas			
285	Bacheo (en carreteras destapadas):	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
D. Tareas ejecutadas en bermas pavimentadas			
317	Bacheo (en la berma pavimentada).	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
330	Parcheo (en la berma pavimentada):	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
333	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
334	Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
340	Limpieza de bermas pavimentadas:	*Permanecerán siempre limpias*	*No se presentó*
E. Tareas ejecutadas en bermas afirmadas			
365	Bacheo (en la berma afirmada).	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
380	Limpieza de Bermas.	*Permanecerán siempre limpias*	*No se presentó*
F. Tareas en obras de drenaje y de protec. de la vía (drenaje superficial)			
425	Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
432	Limpieza de las zanjas de coronación revestidas y en tierra.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
434	Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra.	*Permanecerán siempre limpiis*	*No se presentó*
G. Tareas en obras de drenaje y de protec. de la vía (pequeñas obras hidráulicas)			
497	Limpieza de obras de más de 0,60 m2 de sección.	*Permanecerán siempre limpias*	*No se presentó*
498	Limpieza de pequeñas obras hidráulicas	*Permanecerán siempre limpias*	*No se presentó*
H. Puentes			
515	Mantenimiento rutinario de puentes	*Permanecerán siempre limpios*	*Cumple*
545	Limpieza manual del lecho del río	*Disponibilidad para la actividad*	*No aplica*
547	Limpieza manual de cursos de agua.	*Permanecerán siempre limpios*	*No se presentó*
548	Limpieza y pintura de barandas.	*Permanceran pintadas y limpias*	*No se presentó*
I. Obras complementarias			
625	Despeje de derrumbes	*Disp. permanente, no obstrucciones*	*No se presentó*
630	Limpieza de la calzada.	*Permancerá siempre limpia*	*Cumple*
636	Rocería y desmonte manual.	*Permanerá por debajo de 30 cms*	*Cumple*
639	Poda, corte y/o retiro de arboles.	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
640	Empradización con semillas.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
641	Empradización con cespedones.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
642	Arborización.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
643	Jardinería.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
667	Reposición de la lámina de las señales	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
668	Reposición del poste de la señal.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
669	Reposición de la señal completa.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
673	Reposición de los mojones de referencia	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
678	Limpieza de señales y mojones.	*Permanecerán Siempre limpios*	*Cumple*
682	Instalación de defensas metálicas de correa simple	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
683	Instalación de defensas metálicas de correa doble.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
685	Reposición de las partes dañadas de una defensa metálica.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
686	Limpieza de defensas metálicas.	*Permanecerá siempre limpia*	*No se presentó*
694	Vigilancia.	*Informar al INVIAS*	*Cumple*
695	Emergencias.	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
	PERSONAL	*Cumplimiento*	*Cumple*

- **M&C VIAL**

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
A. Tareas ejecutadas en la estructura de la calzada de carreteras pavimentadas			
229	Bacheo (carreteras pavimentadas):	*No se permitirá que haya huecos*	*Cumple*
B. Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de carreteras pavimentadas			
257	Parcheo:	*No se permitirá que haya huecos*	*Cumple*
263	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
264	Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
C. Tareas ejecutadas en carreteras afirmadas			
285	Bacheo (en carreteras destapadas):	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
D. Tareas ejecutadas en bermas pavimentadas			
317	Bacheo (en la berma pavimentada).	*No se permitirá que haya huecos*	*Cumple*
330	Parcheo (en la berma pavimentada):	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
333	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
334	Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
340	Limpieza de bermas pavimentadas:	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
E. Tareas ejecutadas en bermas afirmadas			

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
365	Bacheo (en la berma afirmada).	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
380	Limpieza de Bermas.	*Permanecerán siempre limpias*	*No se presentó*
F. Tareas en obras de drenaje y de protec. de la vía (drenaje superficial)			
425	Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
432	Limpieza de las zanjas de coronación revestidas y en tierra.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
434	Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra.	*Permanecerán siempre limpiis*	*Cumple*
G. Tareas en obras de drenaje y de protec. de la vía (pequeñas obras hidráulicas)			
497	Limpieza de obras de más de 0,60 m2 de sección.	*Permanecerán siempre limpias*	*No se presentó*
498	Limpieza de pequeñas obras hidráulicas	*Permanecerán siempre limpias*	*No se presentó*
H. Puentes			
515	Mantenimiento rutinario de puentes	*Permanecerán siempre limpios*	*No se presentó*
545	Limpieza manual del lecho del río	*Disponibilidad para la actividad*	*No aplica*
547	Limpieza manual de cursos de agua.	*Permanecerán siempre limpios*	*No se presentó*
548	Limpieza y pintura de barandas.	*Permanceran pintadas y limpias*	*No se presentó*
I. Obras complementarias			
625	Despeje de derrumbes	*Disp. permanente, no obstrucciones*	*No se presentó*
630	Limpieza de la calzada.	*Permancerá siempre limpia*	*Cumple*
636	Rocería y desmonte manual.	*Permanerá por debajo de 30 cms*	*Cumple*
639	Poda, corte y/o retiro de arboles.	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
640	Empradización con semillas.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
641	Empradización con cespedones.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
642	Arborización.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
643	Jardinería.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
667	Reposición de la lámina de las señales	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
668	Reposición del poste de la señal.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
669	Reposición de la señal completa.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
673	Reposición de los mojones de referencia	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
678	Limpieza de señales y mojones.	*Permanecerán Siempre limpios*	*No se presentó*
682	Instalación de defensas metálicas de correa simple	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
683	Instalación de defensas metálicas de correa doble.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
685	Reposición de las partes dañadas de una defensa metálica.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
686	Limpieza de defensas metálicas.	*Permanecerá siempre limpia*	*No se presentó*
694	Vigilancia.	*Informar al INVIAS*	*Cumple*
695	Emergencias.	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
	PERSONAL	*Cumplimiento*	*Cumple*

- **VIALVIAS**

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
A. Tareas ejecutadas en la estructura de la calzada de carreteras pavimentadas			
229	Bacheo (carreteras pavimentadas):	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
B. Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de carreteras pavimentadas			
257	Parcheo:	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
263	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
264	Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
C. Tareas ejecutadas en carreteras afirmadas			
285	Bacheo (en carreteras destapadas):	*No se permitirá que haya huecos*	*Cumple*
D. Tareas ejecutadas en bermas pavimentadas			
317	Bacheo (en la berma pavimentada).	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
330	Parcheo (en la berma pavimentada):	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
333	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
334	Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
340	Limpieza de bermas pavimentadas:	*Permanecerán siempre limpias*	*No se presentó*
E. Tareas ejecutadas en bermas afirmadas			
365	Bacheo (en la berma afirmada).	*No se permitirá que haya huecos*	*Cumple*
380	Limpieza de Bermas.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
F. Tareas en obras de drenaje y de protec. de la vía (drenaje superficial)			
425	Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
432	Limpieza de las zanjas de coronación revestidas y en tierra.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
434	Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra.	*Permanecerán siempre limpiis*	*Cumple*
G. Tareas en obras de drenaje y de protec. de la vía (pequeñas obras hidráulicas)			
497	Limpieza de obras de más de 0,60 m2 de sección.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
498	Limpieza de pequeñas obras hidráulicas	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
H. Puentes			
515	Mantenimiento rutinario de puentes	*Permanecerán siempre limpios*	*No se presentó*

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
545	Limpieza manual del lecho del río	*Disponibilidad para la actividad*	*No aplica*
547	Limpieza manual de cursos de agua.	*Permanecerán siempre limpios*	*No se presentó*
548	Limpieza y pintura de barandas.	*Permanceran pintadas y limpias*	*No se presentó*
I. Obras complementarias			
625	Despeje de derrumbes	*Disp. permanente, no obstrucciones*	*No se presentó*
630	Limpieza de la calzada.	*Permancerá siempre limpia*	*Cumple*
636	Rocería y desmonte manual.	*Permanerá por debajo de 30 cms*	*Cumple*
639	Poda, corte y/o retiro de arboles.	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
640	Empradización con semillas.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
641	Empradización con cespedones.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
642	Arborización.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
643	Jardinería.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
667	Reposición de la lámina de las señales	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
668	Reposición del poste de la señal.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
669	Reposición de la señal completa.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
673	Reposición de los mojones de referencia	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
678	Limpieza de señales y mojones.	*Permanecerán Siempre limpios*	*No se presentó*
682	Instalación de defensas metálicas de correa simple	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
683	Instalación de defensas metálicas de correa doble.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
685	Reposición de las partes dañadas de una defensa metálica.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
686	Limpieza de defensas metálicas.	*Permanecerá siempre limpia*	*No se presentó*
694	Vigilancia.	*Informar al INVIAS*	*Cumple*
695	Emergencias.	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
	PERSONAL	*Cumplimiento*	*Cumple*

- **VIASDUDA**

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
A. Tareas ejecutadas en la estructura de la calzada de carreteras pavimentadas			
229	Bacheo (carreteras pavimentadas):	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
B. Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de carreteras pavimentadas			
257	Parcheo:	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
263	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
264	Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
C. Tareas ejecutadas en carreteras afirmadas			
285	Bacheo (en carreteras destapadas):	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
D. Tareas ejecutadas en bermas pavimentadas			
317	Bacheo (en la berma pavimentada).	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
330	Parcheo (en la berma pavimentada):	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
333	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
334	Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm).	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
340	Limpieza de bermas pavimentadas:	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
E. Tareas ejecutadas en bermas afirmadas			
365	Bacheo (en la berma afirmada).	*No se permitirá que haya huecos*	*No se presentó*
380	Limpieza de Bermas.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
F. Tareas en obras de drenaje y de protec. de la vía (drenaje superficial)			
425	Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
432	Limpieza de las zanjas de coronación revestidas y en tierra.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
434	Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra.	*Permanecerán siempre limpiis*	*Cumple*
G. Tareas en obras de drenaje y de protec. de la vía (pequeñas obras hidráulicas)			
497	Limpieza de obras de más de 0,60 m2 de sección.	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
498	Limpieza de pequeñas obras hidráulicas	*Permanecerán siempre limpias*	*Cumple*
H. Puentes			
515	Mantenimiento rutinario de puentes	*Permanecerán siempre limpios*	*Cumple*
545	Limpieza manual del lecho del río	*Disponibilidad para la actividad*	*No aplica*
547	Limpieza manual de cursos de agua.	*Permanecerán siempre limpios*	*No se presentó*
548	Limpieza y pintura de barandas.	*Permanceran pintadas y limpias*	*Cumple*
I. Obras complementarias			
625	Despeje de derrumbes	*Disp. permanente, no obstrucciones*	*No se presentó*
630	Limpieza de la calzada.	*Permancerá siempre limpia*	*Cumple*
636	Rocería y desmonte manual.	*Permanerá por debajo de 30 cms*	*Cumple*
639	Poda, corte y/o retiro de arboles.	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
640	Empradización con semillas.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
641	Empradización con cespedones.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
642	Arborización.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
643	Jardinería.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
667	Reposición de la lámina de las señales	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
668	Reposición del poste de la señal.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*

Código	Actividad	Indicador de Mantenimiento	Cumplimiento
669	Reposición de la señal completa.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
673	Reposición de los mojones de referencia	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
678	Limpieza de señales y mojones.	*Permanecerán Siempre limpios*	*No se presentó*
682	Instalación de defensas metálicas de correa simple	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
683	Instalación de defensas metálicas de correa doble.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
685	Reposición de las partes dañadas de una defensa metálica.	*Disponibilidad para la actividad*	*No se presentó*
686	Limpieza de defensas metálicas.	*Permanecerá siempre limpia*	*No se presentó*
694	Vigilancia.	*Informar al INVIAS*	*Cumple*
695	Emergencias.	*Disponibilidad para la actividad*	*Cumple*
	PERSONAL	*Cumplimiento*	*Cumple*

Actualizar los costos de mantenimiento vial (análisis de precios unitario – APU) y suministrar la información requerida para los sistemas de administración de carreteras que utiliza INVIAS.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, y requerir al Contratista de obra reponer los postes de referencia (Señales SI-04) que hagan falta en la vía a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación periódicas para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos anteriores y cuya garantía de estabilidad vigente, según relación de contratos entregada por INVIAS.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento periódico.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria.

- Los días 21, 22 y 23 de octubre del 2025 se realizaron capacitaciones a las empresas de mantenimiento rutinario, por parte del profesional seguridad y salud en el trabajo; Tema: riesgo químico.

Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial correspondiente, así como participar en las evaluaciones de la gestión y de los programas de transferencia de tecnología que INVÍAS programe para los ingenieros de la Administración Vial, en diferentes sitios del país.

- Se asistió a la reunión programada por la Dirección Territorial Meta el día 17 de octubre del 2025.

Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo, con la metodología suministrada por el INVIAS.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Apoyar la supervisión de la territorial en los contratos que ejecute el INVIAS en sectores de carreteras a su cargo.

RUTA 65A02

En atención a las funciones propias de la presente AMV, se supervisaron las actividades proyectadas dentro del presupuesto oficial del contrato de obra No. 1045-2021 y contrato de interventoría 993 del 2021, esta administración superviso actividades de construcción de la vía entre los PR 14+0000 al PR 15+0000 y PR 16+0000 al PR 17+0000 que comunica a los municipios de Uribe y Mesetas.



Imagen 11 actividades de fundición de losa en concreto PR 17+0400 costado derecho.
Fuente: AMV GRUPO 3





Imagen 12 y 13 tramo terminado en actividades de fundición de placa en concreto entre los PR 16+0800 al PR 17+0000
Fuente: AMV GRUPO 3

Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical, horizontal y dispositivos de seguridad, llevar un inventario de la señalización existente y de las necesidades de obras de señalización y de seguridad vial.

- En este periodo no se realizaron actividades del ítem.

Recopilar, digitar y reportar mensualmente la información relacionada con la accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial.

- Se reportaron los accidentes ocurridos en el mes de octubre, mediante los reportes de emergencia a la territorial Meta y se solicita el día 04 de noviembre por medio del oficio CE-1932-2024-207 "*SOLICITUD EL INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (IPAT ACCIDENTALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025"* Con el fin de realizar el Informe Mensual de Accidentalidad.

Proporcionar al INVIAS datos y la información para el cálculo del valor del patrimonio de las vías a cargo.

- En este periodo no se realizaron actividades del ítem.

Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de la CARRETERA y sus fajas de retiro, y gestionar acciones en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes que brinden servicios a los usuarios de las carreteras.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Supervisar la elaboración de los conteos manuales y/o automatizados (DISPOSITIVOS ITS) de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Apoyar la validación de alertas emitidas por los dispositivos ITS, y reportarlas a los Directores Territoriales correspondientes.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Llevar a efecto la toma de información y/o ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Evaluar semestralmente con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología suministrada por el INVIAS.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial – HERMES

- Se reportan los accidentes en la plataforma HERMES.

Colaborar y participar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa digital de la red nacional de carreteras y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico – HERMES del INVIAS.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Establecer la necesidad de efectuar estudios y diseños tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de embellecimiento y ornato.

- Por medio del oficio CE-1932-2025-208 Informe actividades realizadas de embellecimiento y ornato en las rutas 65A02 (Uribe-ye de granada), 6508 (cruce de puerto rico – ye de granada) y sus variantes del mes de octubre del 2025, se relacionan las actividades que van de acuerdo a la política de embellecimiento y ornato de las rutas a cargo de esta administración.

Recolectar, digitar y reportar la información relacionada con el atropellamiento de fauna ocurrida en los tramos de carreteras a su cargo, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de soluciones como pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS.

- Se encontraron uno (01) avistamientos de fauna atropellada en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, los cuales fueron reportados por medio del aplicativo móvil Sukubun (Avistamiento y atropellamiento de fauna).

FECHA	HORA	UBICACIÓN	RUTA	CLASE DE ANIMAL	ESPECIE DE ANIMAL
01-10-2025	10:02 AM	PR 63+0900	6508	MAMIFERO	MAPACHE

Evaluación y Diagnóstico Superficial y Estructural del Pavimento.

- No se realizaron actividades de este ítem.

Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS

- No se realizaron actividades de este ítem.

5.3 Informes especialistas y profesionales.

- No se realizaron actividades de este ítem.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC.

Para el presente mes no se implementó el informe del Programa Anual de Caja - PAC.

5.5 Informe matriz de riesgos.

No aplica para este proyecto.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

Para el presente mes no se implementó el informe Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Control diario del equipo de la interventoría.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se relacionan la disposición diaria de los vehículos adscritos a la administración vial, así como también los implementos de la oficina, los cuales se encuentran en el anexo AMV.

6.2 Revisión y verificación de pago de aportes legales (Parafiscales) y seguridad social.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se entrega para verificación del INVIAS el pago de los aportes parafiscales y el pago a la seguridad social, los cuales se encuentran en el anexo AMV.

6.3 Información financiera contrato de interventoría.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 adjunto se consigna todo el movimiento financiero del contrato, los cuales se encuentran en el anexo AMV.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 adjunto se consigna todo el movimiento financiero del contrato, los cuales se encuentran en el anexo AMV.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

No aplica para este proyecto.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual.

No aplica para este proyecto.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

RUTA 6508 (PR 00+0000 al PR 103+0900) CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA.

- Con respecto a la vía Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, se ha evidenciado un estado medianamente bueno en el tramo PR00+0000 – PR103+0900, con excepción del PR91+0000 al PR98+0000 y del PR76+0700 al PR79+0000, lo anterior, teniendo en cuenta que el resto de la estructura del pavimento está presentando deterioro avanzado por el paso del tiempo y la acción del tránsito, por ende, se presentan numerosos descascaramientos de alta severidad los cuales han sido mitigados o subsanados temporalmente con mezcla asfáltica en frio en jornadas de parcheo, dichas actividades desarrolladas con las empresas de mantenimiento rutinario.
- Persisten los problemas de invasiones sobre las zonas de derecho de vía, ubicadas sobre los PR00+0000 al PR02+500, PR66+0000 al PR94+0000 y PR97+0400 al PR101+0250, sobre la vía se han encontrado ranchos donde se alojan familias y establecimientos comerciales, de lo cual se actualizaron los inventarios de invasiones y se remitieron a las alcaldías y al INVIAS Territorial Meta.
- Deterioro en las defensas metálicas por accidentalidad y demás acciones antrópicas.

RUTA 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS

- Entre el PR 01+0050 y el PR 14+000 la vía se encuentra en afirmado en regular estado, debido a las inundaciones presentadas por desbordamientos del rio Ariari entre los PR 01+0000 al PR 03+0000 el afirmado presenta saturación de sedimentos y es necesario realizar una intervención con el fin de mejorar el estado de este tramo.

RUTA 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE

- Entre el PR 00+0000 y el PR 04+0110 que debido al inicio de la temporada invernal y la creciente súbita del rio ariari han presentado una afectación a la estructura vía en la variante 65MTD en las siguientes abscisas;

  • PR 00+0000 al PR 00+0060 afectación en el terraplén daño en la conformación del hombro y afectación a la carpeta de rodadura costado izquierdo.

  • PR 02+0810 al PR 02+0870 afectación en el cabezal de descole de alcantarilla doble 36" daño en la conformación y afectación a la carpeta de rodadura costado derecho.

  • PR 03+0160 al PR 03+0880 afectación en terraplén conformación del hombro y afectación a la carpeta de rodadura costado izquierdo.

  Se presenta una problemática que afecta desde la estructura del pavimento, obras de drenaje y así mismo la estabilidad de la vía en general, dicha problemática corresponde a la pérdida de material en el costado derecho de la vía ocasionado por un volumen de escorrentía superior a la capacidad hidráulica de los drenajes establecidos.

RUTA 65A02 LA URIBE – YE DE GRANADA.

- se presentan inestabilidad y deslizamientos en los PR 47+0100, PR 47+0250, PR 47+0340, PR 47+0700, PR 48+0000, PR 48+0100 Y PR 48+0300

- Se presenta un movimiento en masa tipo reptación en el PR 49+0350, comprometiendo la banca y la estabilidad de la vía y desplazando una estructura de drenaje (alcantarilla doble 36") ubicada en este mismo sitio, por esta razón se determinó como punto crítico y se requiere atención inmediata por parte del INVIAS.

- Se recomienda se ejecuten contratos de atención de la carpeta asfáltica, debido a su deterioro notable a lo largo del corredor en especial del PR 76+000 a PR 84+200 y del PR 87+000 a PR 109+800.

8. ANEXOS.

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Fecha	Consecutivo	Origen	Destino	Descripción
1/10/2025	CE-1932-2024-199	AMV	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD MARTHA HELENA ROMERO MORENO Subdirectora de Sostenibilidad	Informe Trimestral Sukubun No. 5 (01/07/2025 – 30/09/2025)
1/10/2025	CE-1932-2024-200	AMV	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Director Territorial Meta (E)	Informe actividades realizadas de embellecimiento y ornato en las Rutas 65A02 (Uribe-Ye de Granada), 6508 (Cruce de Puerto Rico – Ye de Granada) y sus variantes del mes de septiembre del 2025
2/10/2025	CE-1932-2024-201	AMV	MAYOR JAIME MIGUEL ANGEL PALENCIA JEFE SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE META Dirección de Tránsito y Transporte Seccional Meta	SOLICITUD INFORME POLICIA ESTADISTICA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.
1/10/2025	CE-1932-2024-202	AMV	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Director Territorial Meta (E)	Necesidad de obras de rehabilitación de carpeta asfáltica por el paso urbano del municipio de Puerto Lleras variante 65MTA.
7/10/2025	CE-1932-2024-203	AMV	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Director Territorial Meta (E)	Informe Trimestral No. 4 JUL-SEP 2025
11/10/2025	CE-1932-2024-204	AMV	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Director Territorial Meta (E)	Informe técnico mensual No.15 mes de septiembre del 2025.

Fecha	Consecutivo	Origen	Destino	Descripción
10/10/2025	CE-1932-2024-205	AMV	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Director Territorial Meta (E)	Respuesta al radicado 2025S-VMET-075104 (Entrega acta 15 de la AMV G3)
27/10/2025	CE-1932-2024-206	AMV	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Director Territorial Meta (E)	Informe de actividades INSUMO MDC-19

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras.

Se relacionan el registro fotográfico de las distintas actividades realizadas por las empresas de mantenimiento rutinario en el mes de octubre del 2025, los cuales se encuentran en el anexo FOTOGRAFICO.

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

No aplica para este proyecto.

8.4 Copia de la Bitácora del mes correspondiente.

No aplica para este proyecto.

JUAN DAVID MENDOZA CASTRO
Ingeniero Residente AMV G3

IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ
Ingeniero Residente AMV G3

ANEXOS EMR

MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INF. SEMANALES EMR.
MEPI-MN1-IN-15-FR-4 EQUIPO EMR.
MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL EMR.
MEPI-MN1-IN-15-FR-8 FINANCIERO EMR.
MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO DEL TIEMPO EMR.
MEPI-MN1-IN-15-FR-12 GARANTIAS EMR.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 71 (Numeración consecutiva) del 29/09/2025 al 5/10/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	VIASDUDA LTDA		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1671 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,977,256,400.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,977,256,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 538,500,000.00	$ 691,440,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 115,392,857.14	$ 57,620,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 423,107,142.86	$ 633,820,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,601,577,684.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,074,212,773.33	67.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 969,260,000.00	61.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (104,952,773.33)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15,999,153.33	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,999,153.33	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,999,153.33	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,999,153.33	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,374,110,970.00	59.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 67%
Meta Física Ejecutada % 61%
Avance o Atraso Físico % -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	40	40	40	Prog	40	-	-	40	100.0%
					Ejec	40	-	-	40	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 65A02 URIBE - YE DE GRANADA PR0+0000 - PR40+0000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

29/09/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre el PR 32+0000 al PR 35+0000, Ruta 65A02.
30/09/2025	Se realizan actividades de limpieza de descoles de obras hidráulicas entre el PR 00+0000 al PR 01+0000, Ruta 65A02.
1/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de descoles de obras hidráulicas entre el PR 00+0000 al PR 01+0000, Ruta 65A02.
2/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de descoles de obras hidráulicas entre el PR 01+0000 al PR 02+0000, Ruta 65A02.
3/10/2025	Se realizan actividades de recoleccion de basuras y residuos sólidos entre el PR 10+0000 al PR 13+0000, Ruta 65A02.
4/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
5/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 01+0000 al PR 02+0000, Ruta 65A02.
7/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 02+0000 al PR 04+0000, Ruta 65A02.
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 09+0000 al PR 11+0000, Ruta 65A02.
9/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 36+0000 al PR 40+0000, Ruta 65A02.
10/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 33+0000 al PR 36+0000, Ruta 65A02.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No. 65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 40+000

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No. 65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 40+000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre el PR 32+0000 al PR 35+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de descoles de obras hidráulicas entre el PR 00+0000 al PR 01+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de descoles de obras hidráulicas entre el PR 00+0000 al PR 01+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de descoles de obras hidráulicas entre el PR 01+0000 al PR 02+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de recoleccion de basuras y residuos sólidos entre el PR 10+0000 al PR 13+0000, Ruta 65A02.

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 71 del 29/09/2025 al 5/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	VIALVIAS LTDA		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1712 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,665,074,180.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,665,074,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 453,500,000.00	$ 582,240,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 97,178,571.43	$ 48,520,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 356,321,428.57	$ 533,720,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,348,710,085.80	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 906,398,123.33	67.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 816,218,333.00	61.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (90,179,790.33)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13,472,386.67	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13,472,386.67	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,472,386.67	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,472,386.67	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,374,110,970.00	59.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 67%
Meta Física Ejecutada %: 61%
Avance o Atraso Físico %: -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	36	36	36	Prog	36	-	-	36	100.0%
					Ejec	36	-	-	36	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: 65A02 URIBE - YE DE GRANADA PR 40+0000 - PR 76+0000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
29/09/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas en tierra entre los PR 42+0000 al PR 44+0000, Ruta 65A02.
30/09/2025	Se realizan actividades de bacheo entre los PR 43+0000 al PR 45+0000, Ruta 65A02.
1/10/2025	Se realizan actividades de bacheo entre los PR 44+0000 al PR 47+0000, Ruta 65A02.
2/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de laderas entre los PR 57+0000 al PR 59+0000, Ruta 65A02.
3/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de laderas entre los PR 43+0000 al PR 46+0000, Ruta 65A02.
4/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
5/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 56+0000 al PR 60+0000, Ruta 65A02.
7/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 67+0000 al PR 76+0000, Ruta 65A02.
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 49+0000 al PR 55+0000, Ruta 65A02.
9/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 64+0000 al PR 67+0000, Ruta 65A02.
10/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 60+0000 al PR 64+0000, Ruta 65A02.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No. 65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 40+0000					PR 76+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No. 65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 40+0000					PR 76+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de limpieza de cunetas en tierra entre los PR 42+0000 al PR 44+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de bacheo entre los PR 43+0000 al PR 45+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de bacheo entre los PR 44+0000 al PR 47+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de laderas entre los PR 57+0000 al PR 59+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de laderas entre los PR 43+0000 al PR 46+0000, Ruta 65A02.

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 71 del 29/09/2025 al 5/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	M&C SAN JUAN S.A.S.		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1710 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,654,397,500.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,654,397,500.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 450,600,000.00	$ 578,520,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 96,557,142.86	$ 48,210,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 354,042,857.14	$ 530,310,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,340,061,975.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 898,817,540.00	67.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 811,001,500.00	61.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (87,816,040.00)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13,386,310.00	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13,386,310.00	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,386,310.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,386,310.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,374,110,970.00	59.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 67%
Meta Física Ejecutada %: 61%
Avance o Atraso Físico %: -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	51.45	51.45	51.45	Prog	51.45	-	-	51.45	100.0%
					Ejec	51.45	-	-	51.45	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

29/09/2025	Se realizan actividades de limpieza de bermas entre los PR 76+0000 al 76+0900 en la, Ruta 65A02.
30/09/2025	Se realizan actividades de limpieza de bermas en el PR 93+0000 de la, Ruta 65A02.
1/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de bermas en el PR 96+0000 de la, Ruta 65A02.
2/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 96+0000 al PR 99+0000 de la, Ruta 6508
3/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 99+0000 al PR 102+0000 de la, Ruta 65A02.
4/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
5/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

6/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 105+0000 al PR 109+0000 de la, Ruta 65A02.
7/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 101+0000 al PR 105+0000 de la, Ruta 65A02.
8/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre los PR 76+0000 al PR 77+0000 de la, Ruta 65A02.
9/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 95+0000 al PR 100+0000 de la, Ruta 65A02.
10/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica caliente entre los PR 77+0000 al PR 84+0000 de la, Ruta 65A02.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO						
RUTA No.	6508	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
		PR 96+0000				PR 103+0900
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No.	6508	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
		PR 96+0000				PR 103+0900

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO						
RUTA No.	65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
		PR 76+0000				PR 109+0821
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No.	65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
		PR 76+0000				PR 109+0821

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO						
RUTA No.	65AMTA	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
		PR 00+0000				PR 03+0900
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No.	65AMTA	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
		PR 00+0000				PR 03+0900

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO						
RUTA No.	65AMTB	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
		PR 00+0000				PR 02+0840
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No.	65AMTB	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
		PR 00+0000				PR 02+0840

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO						
RUTA No.	65AMTC	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
		PR 00+0000				PR 01+0300
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No.	65AMTC	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
		PR 00+0000				PR 01+0300

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de limpieza de bermas entre los PR 76+0000 al 76+0900 en la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de bermas en el PR 93+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de bermas en el PR 96+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 96+0000 al PR 99+0000 de la, Ruta 6508



Se realizan actividades de roceria entre los PR 99+0000 al PR 102+0000 de la, Ruta 65A02.

w

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora. Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 71 (Numeración consecutiva) del 29/09/2025 al 5/10/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION VIALES VIAS DEL PROGRESO LTDA
INTEGRANTES: DOCE (12) PERSONAS
CONTRATO No. 1694 DEL 2024 — VALOR INICIAL: $ 1,853,020,400.00
FECHA DE INICIO: 1/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1,853,020,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.
INTEGRANTES: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)
CONTRATO No. 1932 DEL 2024 — VALOR INICIAL: $ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 504,700,000.00	$ 648,000,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 108,150,000.00	$ 54,000,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 396,550,000.00	$ 594,000,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1,500,946,524.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1,006,751,106.67 — 67.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 905,025,000.00 — 60.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ (101,726,106.67) — -7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 12,617,500.00 — 1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 12,617,500.00 — 1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12,617,500.00 — 1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12,617,500.00 — 1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 4,042,373,360.76 — 100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 2,374,110,970.00 — 59.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 37,429,383.00 — 1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 37,429,383.00 — 1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 67%
Meta Física Ejecutada % 60%
Avance o Atraso Físico % -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	56.28	56.28	56.28	Prog	56.28	-	-	56.28	100.0%
					Ejec	56.28	-	-	56.28	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

29/09/2025	Se realizan actividades de poda, corte y/o recolección de árboles entre los PR 56+0000 al 58+0000, Ruta 6508.
30/09/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 79+0000 al 82+0000, Ruta 6508.
1/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 71+0000 al 68+0000, Ruta 6508.
2/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 65+0000 al 68+0000, Ruta 6508.
3/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 62+0000 al 65+0000, Ruta 6508.
4/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
5/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza rutinaria del puente iraca y limpieza de defensas metálicas entre los PR 56+0000 al 57+0000, Ruta 6508.
7/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 62+0000 al 60+0000, Ruta 6508.
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre los PR 70+0000 al 81+0000, Ruta 6508.
9/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 58+0000 al 60+0000, Ruta 6508.
10/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas en tierra entre los PR 11+0000 al 14+0000, en la variante 65MTA de la Ruta 6508.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No 6508	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 56+0000					PR 96+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No 6508	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 56+0000					PR 96+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No 65MTA	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 04+0000					PR 14+0080

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No 65MTA	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 04+0000					PR 14+0080

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No 65MTB	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 01+0890

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No 65MTB	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 01+0890

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No 65MTC	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 02+0000					PR 03+0100

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No 65MTC	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 02+0000					PR 03+0100

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No 65MTD	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 04+0110

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No 65MTD	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 04+0110

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de poda, corte y/o recolección de árboles entre los PR 56+0000 al 58+0000, Ruta 6508.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 79+0000 al 82+0000, Ruta 6508.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 71+0000 al 68+0000, Ruta 6508.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 65+0000 al 68+0000, Ruta 6508.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 62+0000 al 65+0000, Ruta 6508.

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 71 (Numeración consecutiva) del 29/09/2025 al 5/10/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCHAF VIAL LTDA – VIALCHAF LTDA
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS
CONTRATO No.	1670 DEL 2024
FECHA DE INICIO:	29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
VALOR INICIAL:	$ 2,219,956,900.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 2,219,956,900.00
	$ -
	$ -
	$

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)
CONTRATO No.	1932 DEL 2024
FECHA DE INICIO:	5/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	######
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	######
VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 604,500,000.00	$ 776,400,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 129,535,714.29	$ 64,700,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 474,964,285.71	$ 711,700,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,798,165,089.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,226,429,016.67	68.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,088,230,000.00	61.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (138,199,016.67)	-8.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15,112,500.00	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,112,500.00	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,112,500.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,112,500.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,374,110,970.00	59.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 68% — Avance o Atraso Físico % -8.00%
Meta Física Ejecutada % 61%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	60	60	60	Prog	60	-	-	60	100.0%
					Ejec	60	-	-	60	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

29/09/2025	Se realizan actividades de poda, corte y/o recolección de árboles entre los PR 53+0000 al PR 54+0000, Ruta 6508
30/09/2025	Se realizan actividades de poda, corte y/o recolección de árboles entre los PR 25+0000 al PR 27+0000, Ruta 6508
1/10/2025	Se realizan actividades de poda, corte y/o recolección de árboles entre los PR 18+0000 al PR 22+0000, Ruta 6508
2/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto, retiro de derrumbe en el PR 32+0500 en la ruta 6508
3/10/2025	Se realizan actividades de limpieza rutinaria del puente Chinata en la ruta 6508
4/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
5/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 50+0000 al PR 52+0000 en la ruta 6508
7/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 48+0000 al PR 50+0000 en la ruta 6508
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 33+0000 al PR 34+0000 en la ruta 6508
9/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 34+0000 al PR 35+0000 en la ruta 6508
10/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 30+0000 al PR 32+0000 en la ruta 6508
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No. 6508	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 56+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No. 6508	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 56+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No. 65MTA	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 04+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No. 65MTA	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 04+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de poda, corte y/o recolección de árboles entre los PR 53+0000 al PR 54+0000, Ruta 6508



Se realizan actividades de poda, corte y/o recolección de árboles entre los PR 25+0000 al PR 27+0000, Ruta 6508



Se realizan actividades de poda, corte y/o recolección de árboles entre los PR 18+0000 al PR 22+0000, Ruta 6508



Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto, retiro de derrumbe en el PR 32+0500 en la ruta 6508



Se realizan actividades de limpieza rutinaria del puente Chinata en la ruta 6508

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 12/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 72 del 6/10/2025 al 12/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	VIASDUDA LTDA		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1671 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,977,256,400.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,977,256,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 538,500,000.00	$ 691,440,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 115,392,857.14	$ 57,620,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 423,107,142.86	$ 633,820,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,601,577,684.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,090,211,926.67	68.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 983,665,000.00	61.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (106,546,926.67)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15,999,153.33	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,999,153.33	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,999,153.33	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,999,153.33	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,414,876,963.00	60.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68%
Meta Física Ejecutada %: 61%
Avance o Atraso Físico %: -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	40	40	40	Prog	40	-	-	40	100.0%
					Ejec	40	-	-	40	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: 65A02 URIBE - YE DE GRANADA PR0+0000 - PR40+0000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 01+0000 al PR 02+0000, Ruta 65A02.
7/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 02+0000 al PR 04+0000, Ruta 65A02.
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 09+0000 al PR 11+0000, Ruta 65A02.
9/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 36+0000 al PR 40+0000, Ruta 65A02.
10/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 33+0000 al PR 36+0000, Ruta 65A02.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realizan actividades de roceria manual limpieza de laderas entre el PR 08+0000 al PR 09+0000, Ruta 65A02.
15/10/2025	Se realizan actividades de roceria manual limpieza de laderas entre el PR 14+0000 al PR 15+0000, Ruta 65A02.
16/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 26+0000 al PR 29+0000, Ruta 65A02.
17/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 30+0000 al PR 33+0000, Ruta 65A02.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No. 65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 40+000

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No. 65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 00+0000					PR 40+000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 01+0000 al PR 02+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 02+0000 al PR 04+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 09+0000 al PR 11+0000, Ruta 65A02.

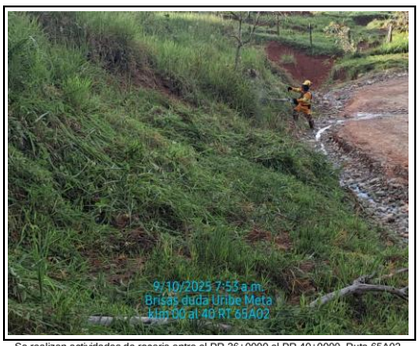

Se realizan actividades de roceria entre el PR 36+0000 al PR 40+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de roceria entre el PR 33+0000 al PR 36+0000, Ruta 65A02.

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 72 del 6/10/2025 al 12/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	VIALVIAS LTDA	INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS	INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)
CONTRATO No.	1712 DEL 2024	CONTRATO No.	1932 DEL 2024
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	FECHA DE INICIO:	5/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
VALOR INICIAL:	$ 1,665,074,180.00	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,665,074,180.00	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 453,500,000.00	$ 582,240,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 97,178,571.43	$ 48,520,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 356,321,428.57	$ 533,720,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,348,710,085.80	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 919,870,510.00	68.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 828,348,333.00	61.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (91,522,177.00)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13,472,386.67	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13,472,386.67	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,472,386.67	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,472,386.67	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,414,876,963.00	60.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68%
Meta Física Ejecutada %: 61%
Avance o Atraso Físico %: -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	36	36	36	Prog	36	-	-	36	100.0%
					Ejec	36	-	-	36	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: 65A02 URIBE - YE DE GRANADA PR 40+0000 - PR 76+0000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 56+0000 al PR 60+0000, Ruta 65A02.
7/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 67+0000 al PR 76+0000, Ruta 65A02.
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 49+0000 al PR 55+0000, Ruta 65A02.
9/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 64+0000 al PR 67+0000, Ruta 65A02.
10/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 60+0000 al PR 64+0000, Ruta 65A02.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 47+0000 al PR 49+0000, Ruta 65A02.
15/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 45+0000 al PR 47+0000, Ruta 65A02.
16/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 43+0000 al PR 45+0000, Ruta 65A02.
17/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 53+0000 al PR 56+0000, Ruta 65A02.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No. 65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 40+0000					PR 76+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No. 65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
PR 40+0000					PR 76+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 56+0000 al PR 60+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 67+0000 al PR 76+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 49+0000 al PR 55+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 64+0000 al PR 67+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 60+0000 al PR 64+0000, Ruta 65A02.

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 72 del 6/10/2025 al 12/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	M&C SAN JUAN S.A.S.		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1710 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,654,397,500.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,654,397,500.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 450,600,000.00	$ 578,520,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 96,557,142.86	$ 48,210,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 354,042,857.14	$ 530,310,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,340,061,975.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 912,203,850.00	68.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 823,054,000.00	61.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (89,149,850.00)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13,386,310.00	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13,386,310.00	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,386,310.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,386,310.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,414,876,963.00	60.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68% — Avance o Atraso Físico %: -7.00%
Meta Física Ejecutada %: 61%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	51.45	51.45	51.45	Prog	51.45	-	-	51.45	100.0%
					Ejec	51.45	-	-	51.45	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

6/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 105+0000 al PR 109+0000 de la, Ruta 65A02.
7/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 101+0000 al PR 105+0000 de la, Ruta 65A02.
8/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre los PR 76+0000 al PR 77+0000 de la, Ruta 65A02.
9/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 95+0000 al PR 100+0000 de la, Ruta 65A02.
10/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica caliente entre los PR 77+0000 al PR 84+0000 de la, Ruta 65A02.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 88+0000 al PR 92+0000 de la, Ruta 65A02.
15/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfaltica entre los PR 76+0000 al PR 99+0000 de la, Ruta 65A02.
16/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfaltica entre los PR 100+0000 al PR 105+0000 de la, Ruta 65A02.
17/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 88+0000 al PR 85+0000 de la, Ruta 65A02.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 6508	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 96+0000				PR 103+0900
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 6508	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 96+0000				PR 103+0900

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 76+0000				PR 109+0821
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65A02	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 76+0000				PR 109+0821

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65AMTA	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000				PR 03+0900
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65AMTA	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000				PR 03+0900

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65AMTB	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000				PR 02+0840
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65AMTB	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000				PR 02+0840

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65AMTC	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000				PR 01+0300
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65AMTC	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000				PR 01+0300

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de roceria entre los PR 105+0000 al PR 109+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 101+0000 al PR 105+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre los PR 76+0000 al PR 77+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 95+0000 al PR 100+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica caliente entre los PR 77+0000 al PR 84+0000 de la, Ruta 65A02.

w

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora. Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 72 del 6/10/2025 al 12/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MANTENIEMIENTO Y CONSTRUCCION VIALES VIAS DEL PROGRESO LTDA
INTEGRANTES: DOCE (12) PERSONAS
CONTRATO No. 1694 DEL 2024 — VALOR INICIAL: $ 1,853,020,400.00
FECHA DE INICIO: 1/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1,853,020,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.
INTEGRANTES: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)
CONTRATO No. 1932 DEL 2024 — VALOR INICIAL: $ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 504,700,000.00	$ 648,000,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 108,150,000.00	$ 54,000,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 396,550,000.00	$ 594,000,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,500,946,524.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,021,745,106.67	68.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 918,525,000.00	61.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (103,220,106.67)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12,617,500.00	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12,617,500.00	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12,617,500.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,617,500.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,414,876,963.00	60.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 68%
Meta Física Ejecutada % 61%
Avance o Atraso Físico % -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	56.28	56.28	56.28	Prog	56.28	-	-	56.28	100.0%
					Ejec	56.28	-	-	56.28	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza rutinaria del puente iraca y limpieza de defensas metálicas entre los PR 56+0000 al 57+0000, Ruta 6508.
7/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 62+0000 al 60+0000, Ruta 6508.
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre los PR 70+0000 al 81+0000, Ruta 6508.
9/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 58+0000 al 60+0000, Ruta 6508.
10/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas en tierra entre los PR 11+0000 al 14+0000, en la variante 65MTA de la Ruta 6508.
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencia
14/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 56+0000 al 58+0000, en la Ruta 6508.
15/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 04+0000 al 08+0000, en la variante 65MTA en la Ruta 6508
16/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 08+0000 al 14+0000, en la variante 65MTA en la Ruta 6508
17/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre los PR 68+0000 al 69+0000, en la Ruta 6508.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 6508	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 56+0000				PR 96+0000
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 6508	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 56+0000				PR 96+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTA	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 04+0000				PR 14+0080
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTA	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 04+0000				PR 14+0080

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTB	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000				PR 01+0890
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTB	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000				PR 01+0890

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTC	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 02+0000				PR 03+0100
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTC	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 02+0000				PR 03+0100

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTD	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000				PR 04+0110
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTD	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000				PR 04+0110

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de limpieza rutinaria del puente iraca y limpieza de defensas metálicas entre los PR 56+0000 al 57+0000, Ruta 6508.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 62+0000 al 60+0000, Ruta 6508.



Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre los PR 70+0000 al 81+0000, Ruta 6508.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 58+0000 al 60+0000, Ruta 6508.



Se realizan actividades de limpieza de cunetas en tierra entre los PR 11+0000 al 14+0000, en la variante 65MTA de la Ruta 6508.

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 72 (Numeración consecutiva) del 6/10/2025 al 12/10/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCHAF VIAL LTDA – VIALCHAF LTDA		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1670 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 2,219,956,900.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 2,219,956,900.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	######	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	######	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 604,500,000.00	$ 776,400,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 129,535,714.29	$ 64,700,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 474,964,285.71	$ 711,700,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,798,165,089.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,244,394,050.00	69.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,104,405,000.00	61.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (139,989,050.00)	-8.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15,112,500.00	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,112,500.00	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,112,500.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,112,500.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,414,876,963.00	60.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 69%
Meta Física Ejecutada % 61%
Avance o Atraso Físico % -8.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	60	60	60	Prog	60	-	-	60	100.0%
					Ejec	60	-	-	60	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

6/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 50+0000 al PR 52+0000 en la ruta 6508
7/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 48+0000 al PR 50+0000 en la ruta 6508
8/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 33+0000 al PR 34+0000 en la ruta 6508
9/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 34+0000 al PR 35+0000 en la ruta 6508
10/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 30+0000 al PR 32+0000 en la ruta 6508
11/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
12/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles sobre la faja de vía entre los PR 03+0000 al PR 03+0900 en la variante 65MTA de la ruta 6508
15/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 20+0000 al PR 20+0300 en la ruta 6508
16/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de puente chinata entre los PR 50+0630 al PR 50+0666 en la ruta 6508
17/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 34+0000 al PR 35+0000 de la ruta 6508.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 6508		SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000					PR 56+0000
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No. 6508		SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000					PR 56+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65MTA		SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000					PR 04+0000
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No. 65MTA		SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	
	PR 00+0000					PR 04+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 50+0000 al PR 52+0000 en la ruta 6508



Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 48+0000 al PR 50+0000 en la ruta 6508



Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 33+0000 al PR 34+0000 en la ruta 6508



Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 34+0000 al PR 35+0000 en la ruta 6508



Se realizan actividades de limpieza de zanjas de coronación entre los PR 30+0000 al PR 32+0000 en la ruta 6508

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 19/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 73 (Numeración consecutiva) del 13/10/2025 al 19/10/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	VIASDUDA LTDA		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1671 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,977,256,400.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,977,256,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 538,500,000.00	$ 691,440,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 115,392,857.14	$ 57,620,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 423,107,142.86	$ 633,820,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,601,577,684.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,106,211,080.00	69.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 998,070,000.00	62.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (108,141,080.00)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15,999,153.33	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,999,153.33	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,999,153.33	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,999,153.33	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,455,642,956.00	61.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 69%
Meta Física Ejecutada % 62%
Avance o Atraso Físico % -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	40	40	40	Prog	40	-	-	40	100.0%
					Ejec	40	-	-	40	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 65A02 URIBE - YE DE GRANADA PR0+0000 - PR40+0000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realizan actividades de roceria manual limpieza de laderas entre el PR 08+0000 al PR 09+0000, Ruta 65A02.
15/10/2025	Se realizan actividades de roceria manual limpieza de laderas entre el PR 14+0000 al PR 15+0000, Ruta 65A02.
16/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 26+0000 al PR 29+0000, Ruta 65A02.
17/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre el PR 30+0000 al PR 33+0000, Ruta 65A02.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
20/10/2025	Se realizan actividades de limpieza rutinaria de puentes entre el PR 13+0000 al PR 14+0000, Ruta 65A02.
21/10/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre el PR 20+0000 al PR 23+0000, Ruta 65A02.
22/10/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre el PR 23+0000 al PR 25+0000, Ruta 65A02.
23/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 05+0000 al PR 07+0000, Ruta 65A02.
24/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre el PR 04+0000 al PR 08+0000, Ruta 65A02.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO						
RUTA No.	65A02	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000						PR 40+000
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No.	65A02	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000						PR 40+000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

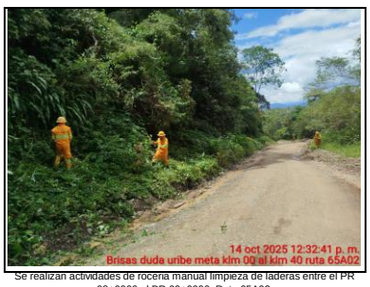


Se realizan actividades de roceria manual limpieza de laderas entre el PR 08+0000 al PR 09+0000, Ruta 65A02.




Se realizan actividades de roceria manual limpieza de laderas entre el PR 14+0000 al PR 15+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de roceria entre el PR 26+0000 al PR 29+0000, Ruta 65A02.

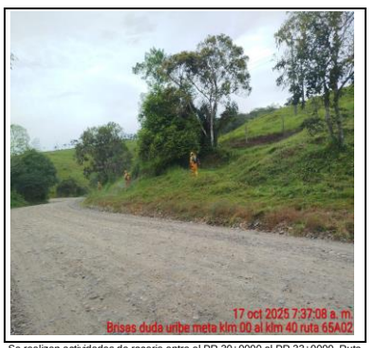

Se realizan actividades de roceria entre el PR 30+0000 al PR 33+0000, Ruta 65A02.



Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 73 del 13/10/2025 al 19/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	VIALVIAS LTDA		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1712 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,665,074,180.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,665,074,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 453,500,000.00	$ 582,240,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 97,178,571.43	$ 48,520,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 356,321,428.57	$ 533,720,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,348,710,085.80	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 933,342,896.67	69.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 840,478,333.00	62.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (92,864,563.67)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13,472,386.67	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13,472,386.67	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,472,386.67	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,472,386.67	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,455,642,956.00	61.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 69%
Meta Física Ejecutada %: 62%
Avance o Atraso Físico %: -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	36	36	36	Prog	36	-	-	36	100.0%
					Ejec	36	-	-	36	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: 65A02 URIBE - YE DE GRANADA PR 40+0000 - PR 76+0000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 47+0000 al PR 49+0000, Ruta 65A02.
15/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 45+0000 al PR 47+0000, Ruta 65A02.
16/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 43+0000 al PR 45+0000, Ruta 65A02.
17/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 53+0000 al PR 56+0000, Ruta 65A02.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

20/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 56+0000 al PR 60+0000, Ruta 65A02.
21/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 40+0000 al PR 42+0000, Ruta 65A02.
22/10/2025	Se realizan actividades de bacheo con material comun entre los PR 40+0000 al PR 43+0000, Ruta 65A02.
23/10/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre los PR 43+0000 al PR 44+0000, Ruta 65A02.
24/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cuentas en tierra entre los PR 43+0000 al PR 46+0000, Ruta 65A02.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65A02	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 40+0000					PR 76+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65A02	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 40+0000					PR 76+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 47+0000 al PR 49+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 45+0000 al PR 47+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 43+0000 al PR 45+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 53+0000 al PR 56+0000, Ruta 65A02.

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 73 del 13/10/2025 al 19/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	M&C SAN JUAN S.A.S.		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1710 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,654,397,500.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,654,397,500.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 450,600,000.00	$ 578,520,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 96,557,142.86	$ 48,210,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 354,042,857.14	$ 530,310,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,340,061,975.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 925,590,160.00	69.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 835,105,500.00	62.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (90,484,660.00)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13,386,310.00	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13,386,310.00	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,386,310.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,386,310.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,455,642,956.00	61.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 69% — Avance o Atraso Físico %: -7.00%
Meta Física Ejecutada %: 62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	51.45	51.45	51.45	Prog	51.45	-	-	51.45	100.0%
					Ejec	51.45	-	-	51.45	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 88+0000 al PR 92+0000 de la, Ruta 65A02.
15/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfaltica entre los PR 76+0000 al PR 99+0000 de la, Ruta 65A02.
16/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfaltica entre los PR 100+0000 al PR 105+0000 de la, Ruta 65A02.
17/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 88+0000 al PR 85+0000 de la, Ruta 65A02.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

20/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 82+0000 al PR 85+0000 de la, Ruta 65A02.
21/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 79+0000 al PR 82+0000 de la, Ruta 65A02.
22/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 76+0000 al PR 79+0000 de la, Ruta 65A02
23/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de bermas entre los PR 90+0000 al PR 91+0000 de la, Ruta 65A02.
24/10/2025	Se realizan actividades de bacheo con mezcla asfaltica entre los PR 96+0000 al PR 103+0000 en la ruta 6508 y entre los PR 105+0000 al PR 109+0000 de la, Ruta 65A02.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO						
RUTA No.	6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
		PR 96+0000				PR 103+0900
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No.	6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
		PR 96+0000				PR 103+0900

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO						
RUTA No.	65A02	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
		PR 76+0000				PR 109+0821
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No.	65A02	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
		PR 76+0000				PR 109+0821


MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO						
RUTA No.	65AMTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
		PR 00+0000				PR 03+0900
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No.	65AMTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
		PR 00+0000				PR 03+0900

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO						
RUTA No.	65AMTB	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
		PR 00+0000				PR 02+0840
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No.	65AMTB	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
		PR 00+0000				PR 02+0840

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO						
RUTA No.	65AMTC	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
		PR 00+0000				PR 01+0300
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO						
RUTA No.	65AMTC	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
		PR 00+0000				PR 01+0300

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias



Se realizan actividades de roceria entre los PR 88+0000 al PR 92+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfaltica entre los PR 76+0000 al PR 99+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfaltica entre los PR 100+0000 al PR 105+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 88+0000 al PR 85+0000 de la, Ruta 65A02.

w

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora. Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 73 del 13/10/2025 al 19/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MANTENIEMIENTO Y CONSTRUCCION VIALES VIAS DEL PROGRESO LTDA
INTEGRANTES: DOCE (12) PERSONAS
CONTRATO No. 1694 DEL 2024 — VALOR INICIAL: $ 1,853,020,400.00
FECHA DE INICIO: 1/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1,853,020,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.
INTEGRANTES: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)
CONTRATO No. 1932 DEL 2024 — VALOR INICIAL: $ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 504,700,000.00	$ 648,000,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 108,150,000.00	$ 54,000,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 396,550,000.00	$ 594,000,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,500,946,524.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,036,739,106.67	69.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 932,025,000.00	62.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (104,714,106.67)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12,617,500.00	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12,617,500.00	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12,617,500.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12,617,500.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,455,642,956.00	61.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 69%
Meta Física Ejecutada % 62%
Avance o Atraso Físico % -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	56.28	56.28	56.28	Prog	56.28	-	-	56.28	100.0%
					Ejec	56.28	-	-	56.28	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencia
14/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 56+0000 al 58+0000, en la Ruta 6508.
15/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 04+0000 al 08+0000, en la variante 65MTA en la Ruta 6508
16/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 08+0000 al 14+0000, en la variante 65MTA en la Ruta 6508
17/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre los PR 68+0000 al 69+0000, en la Ruta 6508.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

20/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles entre los PR 62+0000 al 63+0000, en la Ruta 6508.
21/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles entre los PR 75+0000 al 77+0000, en la Ruta 6508.
22/10/2025	Se realizan actividades de levantamientos de señalización entre los PR 3+0000 al 4+0000, en la variante 65MTD en la Ruta 6508.
23/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 74+0000 al 80+0000, en la Ruta 6508.
24/10/2025	Se realizan actividades de bacheo con mezcla asfaltica entre los PR 74+0000 al 89+0000, en la Ruta 6508.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 56+0000					PR 96+0000
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 56+0000					PR 96+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 04+0000					PR 14+0080
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 04+0000					PR 14+0080

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTB	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 01+0890
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTB	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 01+0890

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTC	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 02+0000					PR 03+0100
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTC	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 02+0000					PR 03+0100

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTD	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 04+0110
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTD	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 04+0110

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencia



Se realizan actividades de roceria entre los PR 56+0000 al 58+0000, en la Ruta 6508.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 04+0000 al 08+0000, en la variante 65MTA en la Ruta 6508

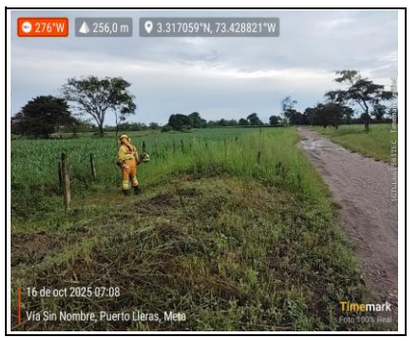

Se realizan actividades de roceria entre los PR 08+0000 al 14+0000, en la variante 65MTA en la Ruta 6508



Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas entre los PR 68+0000 al 69+0000, en la Ruta 6508.

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 73 del 13/10/2025 al 19/10/2025 — Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCHAF VIAL LTDA – VIALCHAF LTDA
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS
CONTRATO No.	1670 DEL 2024
FECHA DE INICIO:	29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
VALOR INICIAL:	$ 2,219,956,900.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 2,219,956,900.00
	$ -
	$ -
	$

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)
CONTRATO No.	1932 DEL 2024
FECHA DE INICIO:	5/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	######
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	######
VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 604,500,000.00	$ 776,400,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 129,535,714.29	$ 64,700,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 474,964,285.71	$ 711,700,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,798,165,089.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,262,359,083.33	70.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,120,580,000.00	62.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (141,779,083.33)	-8.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15,112,500.00	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,112,500.00	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,112,500.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,112,500.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,455,642,956.00	61.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 70% — Avance o Atraso Físico % -8.00%
Meta Física Ejecutada % 62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	60	60	60	Prog	60	-	-	60	100.0%
					Ejec	60	-	-	60	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

13/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
14/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles sobre la faja de via entre los PR 03+0000 al PR 03+0900 en la variante 65MTA de la ruta 6508
15/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 20+0000 al PR 20+0300 en la ruta 6508
16/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de puente chinata entre los PR 50+0630 al PR 50+0666 en la ruta 6508
17/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 34+0000 al PR 35+0000 de la ruta 6508.
18/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
19/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

20/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 19+0000 al PR 22+0000 en la ruta 6508
21/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 13+0000 al PR 14+0000 en la ruta 6508
22/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 40+0000 al PR 41+0000 en la ruta 6508
23/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 52+0000 al PR 52+0100 en la ruta 6508
24/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 53+0000 al PR 56+0100 en la ruta 6508
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO

RUTA No. 6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 56+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No. 6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 56+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO


RUTA No. 65MTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 04+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO

RUTA No. 65MTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 04+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias



Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles sobre la faja de via entre los PR 03+0000 al PR 03+0900 en la variante 65MTA de la ruta 6508




Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 20+0000 al PR 20+0300 en la ruta 6508



Se realizan actividades de limpieza de puente chinata entre los PR 50+0630 al PR 50+0666 en la ruta 6508



Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 34+0000 al PR 35+0000 de la ruta 6508.



Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 26/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 74 (Numeración consecutiva) del 20/10/2025 al 26/10/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	VIASDUDA LTDA		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1671 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,977,256,400.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,977,256,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 538,500,000.00	$ 691,440,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 115,392,857.14	$ 57,620,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 423,107,142.86	$ 633,820,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,601,577,684.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,122,210,233.33	70.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,012,475,000.00	63.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (109,735,233.33)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15,999,153.33	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,999,153.33	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,999,153.33	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,999,153.33	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,496,408,949.00	62.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 70% — Avance o Atraso Físico %: -7.00%
Meta Física Ejecutada %: 63%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	40	40	40	Prog	40	-	-	40	100.0%
					Ejec	40	-	-	40	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: 65A02 URIBE - YE DE GRANADA PR0+0000 - PR40+0000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
20/10/2025	Se realizan actividades de limpieza rutinaria de puentes entre el PR 13+0000 al PR 14+0000, Ruta 65A02.
21/10/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre el PR 20+0000 al PR 23+0000, Ruta 65A02.
22/10/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre el PR 23+0000 al PR 25+0000, Ruta 65A02.
23/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 05+0000 al PR 07+0000, Ruta 65A02.
24/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre el PR 04+0000 al PR 08+0000, Ruta 65A02.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
27/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 06+0000 al PR 07+0000, Ruta 65A02.
28/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 07+0000 al PR 08+0000, Ruta 65A02.
29/10/2025	Se realizan actividades de limpieza rutinaria de puentes entre el PR 08+0000 al PR 13+0000, Ruta 65A02.
30/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 23+0000 al PR 26+0000 de la, Ruta 65A02
31/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 20+0000 al PR 23+0000 de la, Ruta 65A02
1/11/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
2/11/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65A02	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 40+000


MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65A02	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 40+000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de limpieza rutinaria de puentes entre el PR 13+0000 al PR 14+0000, Ruta 65A02.

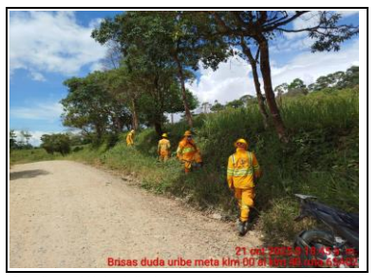

Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre el PR 20+0000 al PR 23+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre el PR 23+0000 al PR 25+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre el PR 05+0000 al PR 07+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre el PR 04+0000 al PR 08+0000, Ruta 65A02.

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 74 del 20/10/2025 al 26/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	VIALVIAS LTDA		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1712 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,665,074,180.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,665,074,180.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 453,500,000.00	$ 582,240,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 97,178,571.43	$ 48,520,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 356,321,428.57	$ 533,720,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,348,710,085.80	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 946,815,283.33	70.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 852,608,333.00	63.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (94,206,950.33)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13,472,386.67	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13,472,386.67	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,472,386.67	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,472,386.67	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,496,408,949.00	62.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%
	$ 37,429,383.00	1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 70%
Meta Física Ejecutada %: 63%
Avance o Atraso Físico %: -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	36	36	36	Prog	36	-	-	36	100.0%
					Ejec	36	-	-	36	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: 65A02 URIBE - YE DE GRANADA PR 40+0000 - PR 76+0000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

20/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 56+0000 al PR 60+0000, Ruta 65A02.
21/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 40+0000 al PR 42+0000, Ruta 65A02.
22/10/2025	Se realizan actividades de bacheo con material comun entre los PR 40+0000 al PR 43+0000, Ruta 65A02.
23/10/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre los PR 43+0000 al PR 44+0000, Ruta 65A02.
24/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cuentas en tierra entre los PR 43+0000 al PR 46+0000, Ruta 65A02.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

27/10/2025	Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre los PR 40+0000 al PR 43+0000, Ruta 65A02.
28/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre el PR 66+0000 al PR 76+0000, Ruta 65A02.
29/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre el PR 56+0000 al PR 66+0000, Ruta 65A02.
30/10/2025	Se realizan actividades de recolección de basuras y residuos sólidos entre el PR 46+0000 al PR 56+0000, Ruta 65A02.
31/10/2025	Se realizan actividades de retiro de señalizacion vertical dañadas entre el PR 46+0000 al PR 76+0000, Ruta 65A02.
1/11/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
2/11/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65A02		SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 40+0000					PR 76+0000
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65A02		SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 40+0000					PR 76+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 56+0000 al PR 60+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de obras hidráulicas entre los PR 40+0000 al PR 42+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de bacheo con material comun entre los PR 40+0000 al PR 43+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza manual de laderas entre los PR 43+0000 al PR 44+0000, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de limpieza de cuentas en tierra entre los PR 43+0000 al PR 46+0000, Ruta 65A02.

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 74 del 20/10/2025 al 26/10/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	M&C SAN JUAN S.A.S.		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1710 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 1,654,397,500.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1,654,397,500.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 450,600,000.00	$ 578,520,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 96,557,142.86	$ 48,210,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 354,042,857.14	$ 530,310,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,340,061,975.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 938,976,470.00	70.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 847,159,000.00	63.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (91,817,470.00)	-7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13,386,310.00	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 13,386,310.00	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,386,310.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,386,310.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,496,408,949.00	62.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 70%
Meta Física Ejecutada %: 63%
Avance o Atraso Físico %: -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	51.45	51.45	51.45	Prog	51.45	-	-	51.45	100.0%
					Ejec	51.45	-	-	51.45	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO (DISPONIBLE)

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

20/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 82+0000 al PR 85+0000 de la, Ruta 65A02.
21/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 79+0000 al PR 82+0000 de la, Ruta 65A02.
22/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 76+0000 al PR 79+0000 de la, Ruta 65A02
23/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de bermas entre los PR 90+0000 al PR 91+0000 de la, Ruta 65A02.
24/10/2025	Se realizan actividades de bacheo con mezcla asfaltica entre los PR 96+0000 al PR 103+0000 en la ruta 6508 y entre los PR 105+0000 al PR 109+0000 de la, Ruta 65A02.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

27/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 87+0000 al PR 87+0300 costado derecho de la, Ruta 65A02.
28/10/2025	Se realizan actividades de poda y corte de arboles entre los PR 100+0000 al PR 101+0000 costado derecho de la, Ruta 65A02.
29/10/2025	Se realizan actividades de poda y corte de arboles entre los PR 00+0000 al PR 03+0000 en la variante 65AMTA de la, Ruta 65A02.
30/10/2025	Se realizan actividades de cuneta revestidas en concreto entre los PR 103+0000 al PR 103+0300 costado izquierdo de la, Ruta 65A02.
31/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 95+0000 al PR 108+0000 costado izquierdo de la, Ruta 65A02.
1/11/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
2/11/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 96+0000					PR 103+0900
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 96+0000					PR 103+0900

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65A02	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 76+0000					PR 109+0821
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65A02	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 76+0000					PR 109+0821

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65AMTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 03+0900
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65AMTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 03+0900

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65AMTB	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 02+0840
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65AMTB	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 02+0840

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65AMTC	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 01+0300
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65AMTC	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 01+0300

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de roceria entre los PR 82+0000 al PR 85+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 79+0000 al PR 82+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 76+0000 al PR 79+0000 de la, Ruta 65A02



Se realizan actividades de limpieza de bermas entre los PR 90+0000 al PR 91+0000 de la, Ruta 65A02.



Se realizan actividades de bacheo con mezcla asfaltica entre los PR 96+0000 al PR 103+0000 en la ruta 6508 y entre los PR 105+0000 al PR 109+0000 de la, Ruta 65A02.

w

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora. Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 74 (Numeración consecutiva) del 20/10/2025 al 26/10/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION VIALES VIAS DEL PROGRESO LTDA
INTEGRANTES: DOCE (12) PERSONAS
CONTRATO No. 1694 DEL 2024 — VALOR INICIAL: $ 1,853,020,400.00
FECHA DE INICIO: 1/06/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1,853,020,400.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.
INTEGRANTES: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)
CONTRATO No. 1932 DEL 2024 — VALOR INICIAL: $ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO: 5/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 504,700,000.00	$ 648,000,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 108,150,000.00	$ 54,000,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 396,550,000.00	$ 594,000,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1,500,946,524.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1,051,733,106.67 — 70.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 945,525,000.00 — 63.00%
AVANCE O ATRASO DE LA OBRA: $ (106,208,106.67) — -7.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 12,617,500.00 — 1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 12,617,500.00 — 1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12,617,500.00 — 1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12,617,500.00 — 1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 4,042,373,360.76 — 100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 2,496,408,949.00 — 62.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 37,429,383.00 — 1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 37,429,383.00 — 1.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 70%
Meta Física Ejecutada % 63%
Avance o Atraso Físico % -7.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	56.28	56.28	56.28	Prog	56.28	-	-	56.28	100.0%
					Ejec	56.28	-	-	56.28	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

20/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles entre los PR 62+0000 al 63+0000, en la Ruta 6508.
21/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles entre los PR 75+0000 al 77+0000, en la Ruta 6508.
22/10/2025	Se realizan actividades de levantamientos de señalización entre los PR 3+0000 al 4+0000, en la variante 65MTD en la Ruta 6508.
23/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 74+0000 al 80+0000, en la Ruta 6508.
24/10/2025	Se realizan actividades de bacheo con mezcla asfaltica entre los PR 74+0000 al 89+0000, en la Ruta 6508.
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

27/10/2025	Se realizan actividades de bacheo con mezcla asfaltica entre los PR 59+0000 al 89+0000, en la Ruta 6508.
28/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 70+0000 al 74+0000, en la Ruta 6508.
29/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 93+0000 al 96+0000, en la Ruta 6508.
30/10/2025	Se realizan actividades de roceria entre los PR 90+0000 al 93+0000, en la Ruta 6508.
31/10/2025	Se realizan actividades de roceria de las variantes 65MTB y 65MTC en la Ruta 6508.
1/11/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
2/11/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 56+0000					PR 96+0000
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 56+0000					PR 96+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 04+0000					PR 14+0080
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 04+0000					PR 14+0080

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTB	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 01+0890
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTB	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 01+0890

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTC	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 02+0000					PR 03+0100
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTC	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 02+0000					PR 03+0100

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No 65MTD	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 04+0110
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No 65MTD	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 04+0110

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles entre los PR 62+0000 al 63+0000, en la Ruta 6508.



Se realizan actividades de poda y/o corte de árboles entre los PR 75+0000 al 77+0000, en la Ruta 6508.



Se realizan actividades de levantamientos de señalización entre los PR 3+0000 al 4+0000, en la variante 65MTD en la Ruta 6508.



Se realizan actividades de roceria entre los PR 74+0000 al 80+0000, en la Ruta 6508.



Se realizan actividades de bacheo con mezcla asfaltica entre los PR 74+0000 al 89+0000, en la Ruta 6508.

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 74 (Numeración consecutiva) del 20/10/2025 al 26/10/2025 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCHAF VIAL LTDA – VIALCHAF LTDA		
INTEGRANTES:	DOCE (12) PERSONAS		
CONTRATO No.	1670 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 2,219,956,900.00
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 2,219,956,900.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	COINZA ING S.A.S.		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. (100%)		
CONTRATO No.	1932 DEL 2024	VALOR INICIAL:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE INICIO:	5/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	######	VALOR ACUMULADO:	$ 4,990,584,396.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	######	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 604,500,000.00	$ 776,400,000.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 129,535,714.29	$ 64,700,000.00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 474,964,285.71	$ 711,700,000.00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,729,802,802.00	$ 1,956,767,694.00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 178,235,157.00	$ 163,063,974.50		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,551,567,645.00	$ 1,793,703,719.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,798,165,089.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,280,324,116.67	71.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,136,755,000.00	63.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (143,569,116.67)	-8.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15,112,500.00	1.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15,112,500.00	1.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,112,500.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15,112,500.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,042,373,360.76	100.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,496,408,949.00	62.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37,429,383.00	1.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 71%
Meta Física Ejecutada % 63%
Avance o Atraso Físico % -8.00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
MANTENIMIENTO DE VIAS	KM	60	60	60	Prog	60	-	-	60	100.0%
					Ejec	60	-	-	60	100.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Guadañas	12	12
TOTAL	12	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

20/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 19+0000 al PR 22+0000 en la ruta 6508
21/10/2025	Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 13+0000 al PR 14+0000 en la ruta 6508
22/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 40+0000 al PR 41+0000 en la ruta 6508
23/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 52+0000 al PR 52+0100 en la ruta 6508
24/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 53+0000 al PR 56+0100 en la ruta 6508
25/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
26/10/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

27/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de bermas entre los PR 00+0000 al PR 01+0000 de la variante 65MTA, en la Ruta 6508
28/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto retiro de material proveniidnete de movimiento en masa entre los PR 30+0900 al PR 31+0009 en la ruta 6508
29/10/2025	Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto retiro de material proveniidnete de movimiento en masa entre los PR 30+0900 al PR 31+0009 en la ruta 6508
30/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 31+0000 al PR 32+0000 en la ruta 6508
31/10/2025	Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 25+0000 al PR 27+0000 en la ruta 6508
1/11/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias
2/11/2025	Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 56+0000
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 6508	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 56+0000

MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADO					
RUTA No. 65MTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 04+0000
MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO					
RUTA No. 65MTA	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	
PR 00+0000					PR 04+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 19+0000 al PR 22+0000 en la ruta 6508



Se realizan actividades de parcheo con mezcla asfáltica entre los PR 13+0000 al PR 14+0000 en la ruta 6508



Se realizan actividades de poda y/o corte de arboles entre los PR 40+0000 al PR 41+0000 en la ruta 6508



Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 52+0000 al PR 52+0100 en la ruta 6508



Se realizan actividades de limpieza de cunetas revestidas en concreto entre los PR 53+0000 al PR 56+0100 en la ruta 6508

Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DAVID MENDOZA - IVAN MAURICIO GUALTEROS

Matrícula Profesional No.: 63202-328112 QND Y 52202-282367 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1.

CONTRATO No. 1670 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSTRUCHAF VIAL LTDA – VIALCHAF LTDA

CONTRATO INTERVENTORIA No. 1932-2024 **INTERVENTOR** COINZA ING S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GUADAÑA	HUSQVARNA	142 R	PUERTO LLERAS / RUTA 65MTA - PR 01+0000	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
HERRAMIENTA MENOR				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
TOTAL ACTIVO				16	16	16	16	0	16	16	16	16	16	16	0	0	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	16
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	16	66.67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	16	33.33%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: OSCAR ALEXANDER ENCISO LUGO

Firma

Nombre: IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	1	11	2025
		(Día / Mes / Año)	

REPRESENTANTE LEGAL - VIALCHAF LTDA
Contratista
C.C. No. 86.012.156 de Granada

Matrícula No. 25202-224826 CND
INGENIERO RESIDENTE AMV G3
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL

CONTRATO No. 1694 DE 2024 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES VÍAS DEL PROGRESO LTDA - VIALPRO LTDA

CONTRATO INTERVENTORIA No. 1932-2024 **INTERVENTORIA:** COINZA ING S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
GUADAÑA	SHINDAIWA	C 35	PUERTO SANTANDER / RUTA 65MTC - PR 02+0000	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
HERRAMIENTA MENOR				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
TOTAL ACTIVO				13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	13	0	0	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	13	66.67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	13	33.33%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: BLADISMIR ALVAREZ GUERRA

Firma

Nombre: IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ

FECHA	1	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

REPRESENTANTE LEGAL -VIALPRO LTDA
Contratista
C.C. No. 86.031.275 de Fuentedeoro

Matrícula No. 25202-224826 CND
INGENIERO RESIDENTE AMV G3
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ; 65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

CONTRATO No. 1710 DE 2024 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES SAN JUAN S.A.S – M&C VIAL S.A.S

CONTRATO INTERVENTORIA No. 1932-2024 **INTERVENTORIA:** COINZA ING S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GUADAÑA	SHINDAIWA	C 35	SAN JUAN DE ARAMA / RUTA 65A02 - PR 76+0000	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA	ZENOAH	G 45I		A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA	STIHL	160		A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA	HUSQVARNA	142 R		A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
HERRAMIENTA MENOR				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL ACTIVO				12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	0	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	12	66.67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12	33.33%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: DARIO MENDEZ BARRAGAN
REPRESENTANTE LEGAL -M&C VIAL S.A.S

Firma

Nombre: IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ
Matrícula No. 25202-224826 CND

FECHA	1	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

Contratista
C.C. No. 80.742.962 de Bogotá D.C.

INGENIERO RESIDENTE AMV G3
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 - PR76+0000. LOTE 8

CONTRATO No. 1712 DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN VIALVIAS LTDA – VIALVIAS LTDA

CONTRATO INTERVENTORIA No. 1932-2024 **INTERVENTORIA:** COINZA ING S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
GUADAÑA	SHINDAIWA	B 45	MESETAS / RUTA 65A02 - PR 57+0000	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
HERRAMIENTA MENOR				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
TOTAL ACTIVO				13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	13	0	0	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	13	66.67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	13	33.33%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JHON BALDOMERO SANABRIA MENDOZA

Firma

Nombre: IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 1 11 2025
(Día / Mes / Año)

REPRESENTANTE LEGAL -VIALVIAS LTDA
C.C. No. 17´421.613 de Acacias
Contratista

Matrícula No. 25202-224826 CND
INGENIERO RESIDENTE AMV G3
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **META**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 - PR40+0000. LOTE 2.

CONTRATO No. 1671 DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL BRISAS DEL DUDA LTDA – VIASDUDA LTDA

CONTRATO INTERVENTORIA No. 1932-2024 **INTERVENTORIA:** COINZA ING S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
GUADAÑA	SHINDAIWA	B 45	LA URIBE / RUTA 65A02 - PR 00+0000	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA		C 35		A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
GUADAÑA	STIHL	160		A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
HERRAMIENTA MENOR				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
TOTAL ACTIVO				13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	13	0	0	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	13	66.67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	13	33.33%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: GERMAN LOSADA LOSADA

Firma

Nombre: IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	1	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

REPRESENTANTE LEGAL -VIASDUDA LTDA
C.C. No. 83.247.779 de Colombia - Huila
Contratista

Matrícula No. 25202-224826 CND
INGENIERO RESIDENTE AMV G3
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 1 11 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1670 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSTRUCHAF VIAL LTDA – VIALCHAF LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000, LOTE 1.

CONTRATO INTERVENTORIA No. 1932-2024 **INTERVENTOR** COINZA ING S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAMES ALEJANDRO OSORIO AGUILAR	1121147740	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	PORVENIR	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
2	LUIS FELIPE RENFIGO HOYOS	16553380	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	PROTECCIÓN	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
3	JOSE LAZARO URREGO AGUDELO	17333088	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	PORVENIR	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
4	WILMAR ENCISO LUGO	17353572	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	COLPENSIONES	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
5	JUAN DE JESUS SANCHEZ ARAGON	19454829	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	COLPENSIONES	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
6	LUIS ALBERTO MARTIN TUNJANO	7818275	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	COLPENSIONES	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
7	LUIS HERNAN GRANADA VALENCIA	7818988	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	CAPITAL SALUD EPS	1112707045	$ 57,000	PORVENIR	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
8	EMIR AGUILAR HOYOS	7819237	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	COLPENSIONES	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
9	HECTOR DIDIER VALENCIA GRANADA	7819406	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	COLPENSIONES	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
10	PEDRO NEL FRANCO VASQUEZ	7819416	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	PROTECCIÓN	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
11	EDUAR ALEXIS VALENCIA GRANADA	7819813	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	PORVENIR	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
12	CHARLES ALEXANDER GUARNIZO MOYA	79822446	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	COLFONDOS	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
13	OSCAR ALEXANDER ENCISO LUGO	86012156	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	COLPENSIONES	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
14	JAIME CIFUENTES GUEVARA	86048779	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	1112707045	$ 57,000	COLPENSIONES	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
15	FLOR MARIA USUCHE LOZANO	1121816389	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALCHAF	$ 1,423,500	$ 99,100	V	CAJA COPI	1112707045	$ 57,000	PORVENIR	1112707045	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha **30/10/2025** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **OSCAR ALEXANDER ENCISO LUGO**
REPRESENTANTE LEGAL - VIALCHAF LTDA
Contratista
C.C. No. 86.012.156 de Granada

Firma

Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula No. 05202-197804 ANT
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900938567
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCHAF VIAL LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LLERAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 9 N° 6-75 PORVENIR	TELÉFONO:	6524229
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**1112707045**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		733000	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.139.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.139.000	$ 0	$ 1.139.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.594.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.594.700	$ 0	$ 1.594.700
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.900	$ 0	$ 227.900
SUBTOTALES:										**$ 3.417.200**	**$ 0**	**$ 3.417.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 684.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.000	$ 0	$ 0	$ 684.000
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 855.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 855.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.341.300	$ 1.341.300	$ 0	$ 0	$ 1.341.300
SUBTOTALES:									**$ 1.341.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.341.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	15	$ 855.000	$ 0	$ 855.000
SUBTOTALES:			**$ 855.000**	**$ 0**	**$ 855.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES												
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900938567
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCHAF VIAL LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LLERAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 9 N° 6-75 PORVENIR	TELÉFONO:	6524229
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1112707045**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	733000		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 19454829	SANCHEZ ARAGON JUAN DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 7818275	MARTIN TUNJANO LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 7818988	VALENCIA GRANADA LUIS HERNAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 7819237	AGUILAR HOYOS EMIR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 7819406	VALENCIA GRANADA HECTOR DIDIER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 7819416	FRANCO VASQUEZ PEDRO NEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 7819813	VALENCIA GRANADA EDUAR ALEXIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 79822446	GUARNIZO MOYA CHARLES ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																01-21	231001-COLFONDOS	21	$ 996.450	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 996.450		$ 0	21	$ 996.450	CCF34-COFREM META	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 79822446	GUARNIZO MOYA CHARLES ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 427.050		$ 29.800	9	$ 427.050	CCF34-COFREM META	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 86012156	ENCISO LUGO OSCAR ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 86048779	CIFUENTES GUEVARA JAIME	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.468.500

Planilla Pagada

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1694 DE 2024

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES VÍAS DEL PROGRESO LTDA - VIALPRO LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1932-2024

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAVIER IVAN GUALTEROS ALVAREZ	1120357661	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992706567	$ 57,000	PORVENIR	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
2	NICOLAS ARIAS DUARTE	1123532549	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992706567	$ 57,000	PORVENIR	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
3	RICARDO GONZALEZ GOMEZ	17230031	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	FAMISANAR	7992706567	$ 57,000	COLPENSIONES	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
4	EDGAR PEREZ PEREZ	79992952	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	EPS CM	7992706567	$ 57,000	COLPENSIONES	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
5	SANTIAGO RAMIREZ SERNA	19418491	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992706567	$ 57,000	COLPENSIONES	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
6	FRANCISCO GAVILAN CASTAÑO	8001584	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992706567	$ 57,000	COLPENSIONES	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
7	EDUIN GONZALEZ ARIAS	86010930	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	CAJACOPI	7992706567	$ 57,000	COLPENSIONES	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
8	WILLIAM CELIS REYES	86030309	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992706567	$ 57,000	PORVENIR	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
9	JOSE ALFREDO ARIAS CESPEDES	86030366	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992706567	$ 57,000	COLPENSIONES	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
10	JOSE ALEXI ALVAREZ GUERRA	86031068	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	FAMISANAR	7992706567	$ 57,000	COLPENSIONES	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
11	CESAR AUGUSTO ALVAREZ GUERRA	86031174	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	CAJACOPI	7992706567	$ 57,000	COLPENSIONES	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
12	BLASDIMIR ALVAREZ GUERRA	86031275	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIALPRO LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992706567	$ 57,000	COLPENSIONES	7992706567	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha **29/10/2025** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **BLADISMIR ALVAREZ GUERRA**
REPRESENTANTE LEGAL -VIALPRO LTDA
Contratista
C.C. No. 86.031.275 de Fuentedeoro

Firma

Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matrícula No. 05202-197804 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900916131
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES VIAS DEL PROGRESO LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUENTE DE ORO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	INSPECCION DE PUERTO SANTANDER	TELÉFONO:	6642373
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992706567**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1886865730		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 2.050.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.050.200	$ 0	$ 2.050.200
230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 0	$ 683.400
SUBTOTALES:										**$ 2.733.600**	**$ 0**	**$ 2.733.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 228.000
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 228.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 684.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 684.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.189.200	$ 1.189.200	$ 0	$ 0	$ 1.189.200
SUBTOTALES:									**$ 1.189.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.189.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	12	$ 684.000	$ 0	$ 684.000
SUBTOTALES:			**$ 684.000**	**$ 0**	**$ 684.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1120357661	GUALTEROS ALVAREZ JAVIER IVAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1123532549	ARIAS DUARTE NICOLAS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 17230031	GONZALEZ GOMEZ RICARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	5421001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 19418491	RAMIREZ SERNA SANTIAGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 79992952	PEREZ PEREZ EDGAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 8001584	GAVILAN CASTAÑO FRANCISCO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900916131
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES VIAS DEL PROGRESO LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUENTE DE ORO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	INSPECCION DE PUERTO SANTANDER	TELÉFONO:	6642373
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992706567**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1886865730

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 86010930	GONZALES ARIAS EDUIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 86030309	CELIS REYES WILLIAM	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 86030366	ARIAS CESPEDES JOSE ALFREDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	5421001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 86031068	ALVAREZ GUERRA JOSE ALEXI	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 86031174	ALVAREZ GUERRA CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 86031275	ALVAREZ GUERRA BLADISMIR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.290.800

Planilla Pagada

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1710 DE 2024 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES SAN JUAN S.A.S – M&C VIAL S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ; 65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1932-2024 **INTERVENTOR:** COINZA ING S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ELKIN ALBERTO REYES FORERO	1121841556	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MC VIAL SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992476561	$ 57,000	PORVENIR	7992476561	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
2	JUAN CARLOS MARTINEZ SUAREZ	1124242137	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MC VIAL SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992476561	$ 57,000	PORVENIR	7992476561	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
3	MANUEL ORLANDO MONRROY MONRROY	1124243283	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MC VIAL SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992476561	$ 57,000	PORVENIR	7992476561	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
4	BENUR JOHANNY GARCIA ROMERO	1124242222	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MC VIAL SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	CAPITAL SALUD	7992476561	$ 57,000	PORVENIR	7992476561	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
5	SAMUEL MENDEZ BARRAGAN	7392001	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MC VIAL SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992476561	$ 57,000	PROTECCIÓN	7992476561	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
6	MAURICIO ALDANA ZAMBRANO	7392021	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MC VIAL SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992476561	$ 57,000	COLPENSIONES	7992476561	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
7	LEONARDO VALDERRAMA RIVERA	7392202	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MC VIAL SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992476561	$ 57,000	PORVENIR	7992476561	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
8	JOSE ADAN BONILLA LONDOÑO	7491974	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MC VIAL SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992476561	$ 57,000				$ 57,000	$ -	$ -	
9	DARIO MENDEZ BARRAGAN	80742962	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MC VIAL SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SANITAS S.A.	7992476561	$ 57,000	PORVENIR	7992476561	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
10	YAMID LOPEZ OLARTE	86010775	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MC VIAL SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992476561	$ 57,000	PROTECCIÓN	7992476561	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
11	DEISY VIVIANA ALDANA ZAMBRANA	52746589	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MC VIAL SAS	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SANITAS S.A.	7992476561	$ 57,000	COLFONDOS	7992476561	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha **29/10/2025** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **DARIO MENDEZ BARRAGAN**
REPRESENTANTE LEGAL -M&C VIAL S.A.S
Contratista
C.C. No. 80.742.962 de Bogotá D.C.

Firma

Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula No. 05202-197804 ANT
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900914677
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC VIAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JUAN DE ARAMA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 19 B 12 61	TELÉFONO:	6642373
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992476561**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1887342893		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.366.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.366.800	$ 0	$ 1.366.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230201	230201- PROTECCION	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 2.278.000**	**$ 0**	**$ 2.278.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 399.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 627.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 627.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.090.100	$ 1.090.100	$ 0	$ 0	$ 1.090.100
SUBTOTALES:									**$ 1.090.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.090.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	11	$ 627.000	$ 0	$ 627.000
SUBTOTALES:			**$ 627.000**	**$ 0**	**$ 627.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1121841556	REYES FORERO ELKIN ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1124242137	MARTINEZ SUAREZ JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1124242222	GARCIA ROMERO BENUR JOHANNY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1124243283	MONROY MONROY MANUEL ORLANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	0004210	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 52746589	ALDANA ZAMBRANO DEISY VIVIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	5421001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 7392001	MENDEZ BARRAGAN SAMUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	0004210	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900914677
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC VIAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JUAN DE ARAMA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 19 B 12 61	TELÉFONO:	6642373
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992476561**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1887342893

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
7	CC 7392021	ALDANA ZAMBRANO MAURICIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	5421001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 7392202	VALDERRAMA RIVERA LEONARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 7491974	BONILLA LONDOÑO JOSE ADAN	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 80742962	MENDEZ BARRAGAN DARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 86010775	LOPEZ OLARTE YAMIR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 4.622.100**

Planilla Pagada

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1712 DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN VIALVIAS LTDA – VIALVIAS LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 - PR76+0000. LOTE 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1932-2024

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	HENRY OTONIEL GÓMEZ GONZALEZ	1033682076	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992638286	$ 57,000	COLPENSIONES	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
2	VICTOR HUGO SOTELO PACHON	1119946289	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992638286	$ 57,000	PORVENIR	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
3	JAIBER MARROQUIN LONDOÑO	1119949178	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992638286	$ 57,000	PORVENIR	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
4	MILLER DE JESUS GRAJALES G.	1120352883	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992638286	$ 57,000	COLPENSIONES	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
5	JUAN DANILO GOMEZ GONZALEZ	1121853425	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992638286	$ 57,000	COLFONDOS	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
6	ANDRES GUZMAN CASTAÑEDA	17286581	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992638286	$ 57,000	COLPENSIONES	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
7	MERARDO ANTONIO GRAJALES G.	17287763	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992638286	$ 57,000	COLPENSIONES	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
8	JHON BALDOMERO SANABRIA MENDOZA	17421613	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992638286	$ 57,000	COLPENSIONES	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
9	RUBERNEY SANABRIA MENDOZA	80831454	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992638286	$ 57,000	COLPENSIONES	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
10	WILBERT SOTELO PACHON	86013419	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992638286	$ 57,000	COLPENSIONES	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
11	JOSE WILSON GALINDO PERDOMO	1121853425	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992638286	$ 57,000	PORVENIR	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
12	ADRIANA LIZETH GUZMAN PEREZ	1119946420	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992638286	$ 57,000	PORVENIR	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
13	GEOVANNY CARILLO MAHECHA	31333618	SOCIO	$ 1,423,500	X	VIALVIAS LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992638286	$ 57,000	COLPENSIONES	7992638286	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha **30/10/2025** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JHON BALDOMERO SANABRIA MENDOZA**
REPRESENTANTE LEGAL -VIALVIAS LTDA
C.C. No. 17´421.613 de Acacias
Contratista

Firma

Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
Matrícula No. 05202-197804 ANT
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900889601
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIALVIAS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MESETAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 6 5 - 6	TELÉFONO:	6642373
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7992638286**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1888403903		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 911.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.200	$ 0	$ 911.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.594.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.594.700	$ 0	$ 1.594.700
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 2.733.700**	**$ 0**	**$ 2.733.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 0	$ 285.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 399.000
SUBTOTALES:													**$ 684.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 684.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.129.800	$ 1.129.800	$ 0	$ 0	$ 1.129.800
SUBTOTALES:									**$ 1.129.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.129.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	12	$ 684.000	$ 0	$ 684.000
SUBTOTALES:			**$ 684.000**	**$ 0**	**$ 684.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																									PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900889601
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIALVIAS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MESETAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 6 5 - 6	TELÉFONO:	6642373
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992638286**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1888403903		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 17286581	GUZMAN CASTAÑEDA ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 17287763	GRAJALES GRAJALES MERARDO ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17421613	SANABRIA MENDOZA JHON BALDOMERO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	0004210	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 80831454	SANABRIA MENDOZA RUBERNEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 86013419	SOTELO PACHON WILBERT	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												01-18					25-14 COLPENSIONES	18	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	EPS002-SALUD TOTAL	18	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18	$ 854.100	0004210	$ 0	18	$ 854.100	CCF34-COFREM META	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 86013419	SOTELO PACHON WILBERT	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS002-SALUD TOTAL	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12	$ 569.400		$ 39.700	12	$ 569.400	CCF34-COFREM META	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 86035882	GALINDO PERDOMO JOSE WILSON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.231.500

Planilla Pagada

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1671 DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL BRISAS DEL DUDA LTDA – VIASDUDA LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 - PR40+0000. LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1932-2024

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MILLER ANDRES MORERAS VIRGUEZ	1120374210	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992772446	$ 57,000	PORVENIR	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
2	DARWIN RESTREPO ARIAS	1123142716	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992772446	$ 57,000	PROTECCIÓN	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
3	GIOVAN BAQUERO MATEOS	17225362	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992772446	$ 57,000	COLPENSIONES	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
4	WILMAR PABON ANGULO	17287832	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992772446	$ 57,000	COLPENSIONES	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
5	SAUBLO FERNANDEZ PECHENE	4692560	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992772446	$ 57,000	COLPENSIONES	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
6	DANIEL TIBERIO HINCAPIE SORIANO	79849312	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	COMPENSAR	7992772446	$ 57,000	COLPENSIONES	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
7	JEYMSON AVENDAÑO GUERRERO	80128797	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	COMPENSAR	7992772446	$ 57,000	COLPENSIONES	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
8	DEMETRIO ALEXIS PRIETO BUITRAGO	80229981	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992772446	$ 57,000	COLPENSIONES	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	VACACIONES 01-11
9	GERMAN LOSADA LOSADA	83247779	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992772446	$ 57,000	COLPENSIONES	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
10	WILLIAN ESQUIVEL CHACON	83248358	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	NUEVA EPS	7992772446	$ 57,000	COLPENSIONES	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
11	JAHUER DE JESUS GALVEZ PEREZ	86080980	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	SALUD TOTAL	7992772446	$ 57,000	COLPENSIONES	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	
12	EMILY TATIANA PABON ARENAS	1123432715	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	CAPITAL SALUD	7992772446	$ 57,000	PORVENIR	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	VACACIONES 14-30
13	BRAYAN ENRIQUE SEDENO SANCHEZ	1119946804	SOCIO	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	VIASDUDA LTDA	$ 1,423,500	$ 99,100	V	CAJA COPI	7992772446	$ 57,000	PORVENIR	7992772446	$ 227,800	$ 57,000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha **29/10/2025** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **GERMAN LOSADA LOSADA**
REPRESENTANTE LEGAL -VIASDUDA LTDA
C.C. No. 83.247.779 de Colombia - Huila
Contratista

Firma

Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
Matrícula No. 05202-197804 ANT
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900891792
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIASDUDA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	URIBE	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 7 4 64	TELÉFONO:	6642373
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992772446**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1887417940		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 0	$ 683.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 2.050.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.050.300	$ 0	$ 2.050.300
SUBTOTALES:										**$ 2.961.500**	**$ 0**	**$ 2.961.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 399.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 741.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 741.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.195.900	$ 1.195.900	$ 0	$ 0	$ 1.195.900
SUBTOTALES:									**$ 1.195.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.195.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	13	$ 741.000	$ 0	$ 741.000
SUBTOTALES:			**$ 741.000**	**$ 0**	**$ 741.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1119946804	SEDENO SANCHEZ BRAYAN ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1120374210	MORERAS VIRGUEZ MILLER ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1123142716	RESTREPO ARIAS DARWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1123432715	PABON ARENAS EMILY TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	13	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	13	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13	$ 616.850		$ 43.000	13	$ 616.850	CCF34-COFREM META	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1123432715	PABON ARENAS EMILY TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														14-30			230301-PORVENIR	17	$ 806.650	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 129.100	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	17	$ 806.650	$ 32.300	$ 0	$ 32.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	$ 806.650	5421001	$ 0	17	$ 806.650	CCF34-COFREM META	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 17225362	BAQUERO MATEOS GIOVAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900891792
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIASDUDA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	URIBE	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 7 4 64	TELÉFONO:	6642373
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992772446**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1887417940

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
7	CC 17287832	PABON ANGULO WILMAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 4692560	FERNANDEZ PECHENE SAUBLO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 79849312	HINCAPIE SORIANO DANIEL TIBERIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 80128797	AVENDANO GUERRERO JEYM SON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 80229981	PRIETO BUITRAGO DEMETRIO ALEXIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														01-11			25-14 COLPENSIONES	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	EPS002-SALUD TOTAL	11	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 20.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 521.950		$ 0	11	$ 521.950	CCF34-COFREM META	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 80229981	PRIETO BUITRAGO DEMETRIO ALEXIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPS002-SALUD TOTAL	19	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 36.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19	$ 901.550		$ 62.800	19	$ 901.550	CCF34-COFREM META	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 83247779	LOSADA LOSADA GERMAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 83248358	ESQUIVEL CHACON WILLIAM	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 86080980	GALVEZ PEREZ JAHUER DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF34-COFREM META	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.639.400

Planilla Pagada

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1670 DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCHAF VIAL LTDA – VIALCHAF LTDA

MES INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1932-2024

INTERVENTOR COINZA ING S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	438224	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 719,355,000.00	
2025	193225	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 923,916,000.00	
2026					Contrato Principal	$ 576,685,900.00	
			TOTAL			$ 2,219,956,900.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2,219,956,900.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
						2024									
1	PARCIAL	MAYO-JUN/24	$ 60,450,000.00	$ 11,485,500.00	$ 71,935,500.00	$ -	$ 71,935,500.00		RP 2024 - No. 438224 - 20/05/24	$ 647,419,500.00	$ 2,148,021,400.00		X		
2	PARCIAL	jun-24	$ 4,030,000.00	$ 765,700.00	$ 4,795,700.00	$ -	$ 4,795,700.00			$ 642,623,800.00	$ 2,143,225,700.00		X		
3	PARCIAL	jul-24	$ 60,450,000.00	$ 11,485,500.00	$ 71,935,500.00	$ -	$ 71,935,500.00			$ 570,688,300.00	$ 2,071,290,200.00		X		
4	PARCIAL	ago-24	$ 60,450,000.00	$ 11,485,500.00	$ 71,935,500.00	$ -	$ 71,935,500.00			$ 498,752,800.00	$ 1,999,354,700.00		X		
5	PARCIAL	sep-24	$ 60,450,000.00	$ 11,485,500.00	$ 71,935,500.00		$ 71,935,500.00			$ 426,817,300.00	$ 1,927,419,200.00		X		
6	PARCIAL	oct-24	$ 60,450,000.00	$ 11,485,500.00	$ 71,935,500.00		$ 71,935,500.00			$ 354,881,800.00	$ 1,855,483,700.00		X		
7	PARCIAL	nov-24	$ 60,450,000.00	$ 11,485,500.00	$ 71,935,500.00		$ 71,935,500.00			$ 282,946,300.00	$ 1,783,548,200.00		X		
8	PARCIAL	dic-24	$ 60,450,000.00	$ 11,485,500.00	$ 71,935,500.00		$ 71,935,500.00			$ 211,010,800.00	$ 1,711,612,700.00		X		
						2025									
9	PARCIAL	ene-25	$ 64,700,000.00	$ 12,293,000.00	$ 76,993,000.00		$ 76,993,000.00		RP 2024 - No. 438224 - 20/05/24	$ 134,017,800.00	$ 1,634,619,700.00		X		
10	PARCIAL	feb-25	$ 64,700,000.00	$ 12,293,000.00	$ 76,993,000.00		$ 76,993,000.00			$ 57,024,800.00	$ 1,557,626,700.00		X		
11	PARCIAL	mar-25	$ 64,700,000.00	$ 12,293,000.00	$ 76,993,000.00		$ 76,993,000.00			$ -	$ 1,480,633,700.00		X		
									RP 2025 - No. 193225 - 25/03/25	$ 903,947,800.00					
12	PARCIAL	abr-25	$ 64,700,000.00	$ 12,293,000.00	$ 76,993,000.00		$ 76,993,000.00			$ 826,954,800.00	$ 1,403,640,700.00		X		
13	PARCIAL	may-25	$ 64,700,000.00	$ 12,293,000.00	$ 76,993,000.00		$ 76,993,000.00			$ 749,961,800.00	$ 1,326,647,700.00		X		
14	PARCIAL	jun-25	$ 64,700,000.00	$ 12,293,000.00	$ 76,993,000.00		$ 76,993,000.00			$ 672,968,800.00	$ 1,249,654,700.00		X		
15	PARCIAL	jul-25	$ 64,700,000.00	$ 12,293,000.00	$ 76,993,000.00		$ 76,993,000.00			$ 595,975,800.00	$ 1,172,661,700.00		X		
16	PARCIAL	ago-25	$ 64,700,000.00	$ 12,293,000.00	$ 76,993,000.00		$ 76,993,000.00			$ 518,982,800.00	$ 1,095,668,700.00		X		
17	PARCIAL	sep-25	$ 64,700,000.00	$ 12,293,000.00	$ 76,993,000.00		$ 76,993,000.00			$ 441,989,800.00	$ 1,018,675,700.00		X		
18	PARCIAL	oct-25	$ 64,700,000.00	$ 12,293,000.00	$ 76,993,000.00		$ 76,993,000.00			$ 364,996,800.00	$ 941,682,700.00				
TOTALES			**$ 1,013,730,000.00**	**$ 204,094,200.00**	**$ 1,278,274,200.00**	**$ -**	**$ 1,278,274,200.00**	**$ -**		**$ 364,996,800.00**	**$ 941,682,700.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1,013,730,000.00	$ 204,094,200.00	**$ 1,217,824,200.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A		**N/A**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A		**N/A**
AJUSTES	N/A		**N/A**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		**N/A**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
VALOR TOTAL	**$ 1,013,730,000.00**	**$ 204,094,200.00**	**$ 1,217,824,200.00**
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **OSCAR ALEXANDER ENCISO LUGO**
REPRESENTANTE LEGAL - VIALCHAF LTDA
Contratista
C.C. No. 86.012.156 de Granada

Firma
Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula No. 05202-197804 ANT
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1694 DE 2024

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES VÍAS DEL PROGRESO LTDA - VIALPRO LTDA

MES INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1932-2024

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	438724	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 600,593,000.00	$ -
2025	198225	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 771,120,000.00	
2026					Contrato Principal	$ 481,307,400.00	
			TOTAL			$ 1,853,020,400.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,853,020,400.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
2024															
1	PARCIAL	jun-24	$ 50,470,000.00	$ 9,589,300.00	$ 60,059,300.00	$ -	$ 60,059,300.00		RP 2024 - No. 438724 - 20/05/24	$ 540,533,700.00	$ 1,792,961,100.00		X		
2	PARCIAL	jul-24	$ 50,470,000.00	$ 9,589,300.00	$ 60,059,300.00	$ -	$ 60,059,300.00			$ 480,474,400.00	$ 1,732,901,800.00		X		
3	PARCIAL	ago-24	$ 50,470,000.00	$ 9,589,300.00	$ 60,059,300.00	$ -	$ 60,059,300.00			$ 420,415,100.00	$ 1,672,842,500.00		X		
4	PARCIAL	sep-24	$ 50,470,000.00	$ 9,589,300.00	$ 60,059,300.00	$ -	$ 60,059,300.00			$ 360,355,800.00	$ 1,612,783,200.00		X		
5	PARCIAL	oct-24	$ 50,470,000.00	$ 9,589,300.00	$ 60,059,300.00	$ -	$ 60,059,300.00			$ 300,296,500.00	$ 1,552,723,900.00		X		
6	PARCIAL	nov-24	$ 50,470,000.00	$ 9,589,300.00	$ 60,059,300.00	$ -	$ 60,059,300.00			$ 240,237,200.00	$ 1,492,664,600.00		X		
7	PARCIAL	dic-24	$ 50,470,000.00	$ 9,589,300.00	$ 60,059,300.00	$ -	$ 60,059,300.00			$ 180,177,900.00	$ 1,432,605,300.00		X		
2025															
8	PARCIAL	ene-25	$ 54,000,000.00	$ 10,260,000.00	$ 64,260,000.00	$ -	$ 64,260,000.00		RP 2024 - No. 438724 - 20/05/24	$ 115,917,900.00	$ 1,368,345,300.00		X		
9	PARCIAL	feb-25	$ 54,000,000.00	$ 10,260,000.00	$ 64,260,000.00	$ -	$ 64,260,000.00			$ 51,657,900.00	$ 1,304,085,300.00		X		
10	PARCIAL	mar-25	$ 54,000,000.00	$ 10,260,000.00	$ 64,260,000.00	$ -	$ 64,260,000.00			$ -	$ 1,239,825,300.00		X		
									RP 2025 - No. 198225 - 25/03/25	$ 758,517,900.00					
11	PARCIAL	abr-25	$ 54,000,000.00	$ 10,260,000.00	$ 64,260,000.00	$ -	$ 64,260,000.00			$ 694,257,900.00	$ 1,175,565,300.00		X		
12	PARCIAL	may-25	$ 54,000,000.00	$ 10,260,000.00	$ 64,260,000.00	$ -	$ 64,260,000.00			$ 629,997,900.00	$ 1,111,305,300.00		X		
13	PARCIAL	jun-25	$ 54,000,000.00	$ 10,260,000.00	$ 64,260,000.00	$ -	$ 64,260,000.00			$ 565,737,900.00	$ 1,047,045,300.00		X		
14	PARCIAL	jul-25	$ 54,000,000.00	$ 10,260,000.00	$ 64,260,000.00	$ -	$ 64,260,000.00			$ 501,477,900.00	$ 982,785,300.00		X		
15	PARCIAL	ago-25	$ 54,000,000.00	$ 10,260,000.00	$ 64,260,000.00	$ -	$ 64,260,000.00			$ 437,217,900.00	$ 918,525,300.00		X		
16	PARCIAL	sep-25	$ 54,000,000.00	$ 10,260,000.00	$ 64,260,000.00	$ -	$ 64,260,000.00			$ 372,957,900.00	$ 854,265,300.00		X		
17	PARCIAL	oct-25	$ 54,000,000.00	$ 10,260,000.00	$ 64,260,000.00	$ -	$ 64,260,000.00			$ 308,697,900.00	$ 790,005,300.00				
TOTALES			**$ 893,290,000.00**	**$ 169,725,100.00**	**$ 1,063,015,100.00**	**$ -**	**$ 1,063,015,100.00**	**$ -**		**$ 308,697,900.00**	**$ 790,005,300.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 893,290,000.00	$ 169,725,100.00	**$ 1,063,015,100.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A		**N/A**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A		**N/A**
AJUSTES	N/A		**N/A**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		**N/A**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
VALOR TOTAL	**$ 893,290,000.00**	**$ 169,725,100.00**	**$ 1,063,015,100.00**
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **BLADISMIR ALVAREZ GUERRA**
REPRESENTANTE LEGAL -VIALPRO LTDA
Contratista
C.C. No. 86.031.275 de Fuentedeoro

Firma
Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matrícula No. 05202-197804 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1710 DE 2024

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES SAN JUAN S.A.S – M&C VIAL S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ; 65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1932-2024

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	449524	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 536,214,000.00	
2025	201625	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 688,438,800.00	
2026					Contrato Principal	$ 429,744,700.00	
				TOTAL		$ 1,654,397,500.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,654,397,500.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
2024															
1	PARCIAL	MAYO-JUN/24	$ 45,060,000.00	$ 8,561,400.00	$ 53,621,400.00	$ -	$ 53,621,400.00		RP 2024 - No. 449524 - 21/05/24	$ 482,592,600.00	$ 1,600,776,100.00		X		
2	PARCIAL	jun-24	$ 3,004,000.00	$ 570,760.00	$ 3,574,760.00	$ -	$ 3,574,760.00			$ 479,017,840.00	$ 1,597,201,340.00		X		
3	PARCIAL	jul-24	$ 45,060,000.00	$ 8,561,400.00	$ 53,621,400.00	$ -	$ 53,621,400.00			$ 425,396,440.00	$ 1,543,579,940.00		X		
4	PARCIAL	ago-24	$ 45,060,000.00	$ 8,561,400.00	$ 53,621,400.00	$ -	$ 53,621,400.00			$ 371,775,040.00	$ 1,489,958,540.00		X		
5	PARCIAL	sep-24	$ 45,060,000.00	$ 8,561,400.00	$ 53,621,400.00	$ -	$ 53,621,400.00			$ 318,153,640.00	$ 1,436,337,140.00		X		
6	PARCIAL	oct-24	$ 45,060,000.00	$ 8,561,400.00	$ 53,621,400.00	$ -	$ 53,621,400.00			$ 264,532,240.00	$ 1,382,715,740.00		X		
7	PARCIAL	nov-24	$ 45,060,000.00	$ 8,561,400.00	$ 53,621,400.00	$ -	$ 53,621,400.00			$ 210,910,840.00	$ 1,329,094,340.00		X		
8	PARCIAL	dic-24	$ 45,060,000.00	$ 8,561,400.00	$ 53,621,400.00	$ -	$ 53,621,400.00			$ 157,289,440.00	$ 1,275,472,940.00		X		
2025															
9	PARCIAL	ene-25	$ 48,210,000.00	$ 9,159,900.00	$ 57,369,900.00	$ -	$ 57,369,900.00		RP 2024 - No. 449524 - 21/05/24	$ 99,919,540.00	$ 1,218,103,040.00		X		
10	PARCIAL	feb-25	$ 48,210,000.00	$ 9,159,900.00	$ 57,369,900.00	$ -	$ 57,369,900.00			$ 42,549,640.00	$ 1,160,733,140.00		X		
11	PARCIAL	mar-25	$ 48,210,000.00	$ 9,159,900.00	$ 57,369,900.00	$ -	$ 57,369,900.00			$ -	$ 1,103,363,240.00		X		
									RP 2025 - No. 201625 - 26/03/25	$ 673,618,540.00					
12	PARCIAL	abr-25	$ 48,210,000.00	$ 9,159,900.00	$ 57,369,900.00	$ -	$ 57,369,900.00			$ 616,248,640.00	$ 1,045,993,340.00		X		
13	PARCIAL	may-25	$ 48,210,000.00	$ 9,159,900.00	$ 57,369,900.00	$ -	$ 57,369,900.00			$ 558,878,740.00	$ 988,623,440.00		X		
14	PARCIAL	jun-25	$ 48,210,000.00	$ 9,159,900.00	$ 57,369,900.00	$ -	$ 57,369,900.00			$ 501,508,840.00	$ 931,253,540.00		X		
15	PARCIAL	jul-25	$ 48,210,000.00	$ 9,159,900.00	$ 57,369,900.00	$ -	$ 57,369,900.00			$ 444,138,940.00	$ 873,883,640.00		X		
16	PARCIAL	ago-25	$ 48,210,000.00	$ 9,159,900.00	$ 57,369,900.00	$ -	$ 57,369,900.00			$ 386,769,040.00	$ 816,513,740.00		X		
17	PARCIAL	sep-25	$ 48,210,000.00	$ 9,159,900.00	$ 57,369,900.00	$ -	$ 57,369,900.00			$ 329,399,140.00	$ 759,143,840.00		X		
18	PARCIAL	oct-25	$ 48,210,000.00	$ 9,159,900.00	$ 57,369,900.00	$ -	$ 57,369,900.00			$ 272,029,240.00	$ 701,773,940.00				
TOTALES			**$ 800,524,000.00**	**$ 152,099,560.00**	**$ 952,623,560.00**	**$ -**	**$ 952,623,560.00**	**$ -**		**$ 272,029,240.00**	**$ 701,773,940.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 800,524,000.00	$ 152,099,560.00	**$ 952,623,560.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A		**N/A**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A		**N/A**
AJUSTES	N/A		**N/A**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		**N/A**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
VALOR TOTAL	**$ 800,524,000.00**	**$ 152,099,560.00**	**$ 952,623,560.00**
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **DARIO MENDEZ BARRAGAN**
REPRESENTANTE LEGAL -M&C VIAL S.A.S
Contratista
C.C. No. 80.742.962 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula No. 05202-197804 ANT
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-8 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1712 DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN VIALVIAS LTDA – VIALVIAS LTDA

MES INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 - PR76+0000. LOTE 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1932-2024

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	449724	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 539,665,000.00	$ -
2025	195925	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 692,865,600.00	$ -
2026					Contrato Principal	$ 432,543,580.00	
				TOTAL		$ 1,665,074,180.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,665,074,180.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
2024															
1	PARCIAL	MAYO-JUN/24	$ 45,350,000.00	$ 8,616,500.00	$ 53,966,500.00	$ -	$ 53,966,500.00		RP 2024 - No. 449724 - 21/05/24	$ 485,698,500.00	$ 1,611,107,680.00		X		
2	PARCIAL	jun-24	$ 3,023,333.00	$ 574,433.27	$ 3,597,766.27	$ -	$ 3,597,766.27			$ 482,100,733.73	$ 1,607,509,913.73		X		
3	PARCIAL	jul-24	$ 45,350,000.00	$ 8,616,500.00	$ 53,966,500.00	$ -	$ 53,966,500.00			$ 428,134,233.73	$ 1,553,543,413.73		X		
4	PARCIAL	ago-24	$ 45,350,000.00	$ 8,616,500.00	$ 53,966,500.00	$ -	$ 53,966,500.00			$ 374,167,733.73	$ 1,499,576,913.73		X		
5	PARCIAL	sep-24	$ 45,350,000.00	$ 8,616,500.00	$ 53,966,500.00	$ -	$ 53,966,500.00			$ 320,201,233.73	$ 1,445,610,413.73		X		
6	PARCIAL	oct-24	$ 45,350,000.00	$ 8,616,500.00	$ 53,966,500.00	$ -	$ 53,966,500.00			$ 266,234,733.73	$ 1,391,643,913.73		X		
7	PARCIAL	nov-24	$ 45,350,000.00	$ 8,616,500.00	$ 53,966,500.00	$ -	$ 53,966,500.00			$ 212,268,233.73	$ 1,337,677,413.73		X		
8	PARCIAL	dic-24	$ 45,350,000.00	$ 8,616,500.00	$ 53,966,500.00	$ -	$ 53,966,500.00			$ 158,301,733.73	$ 1,283,710,913.73		X		
2025															
9	PARCIAL	ene-25	$ 48,520,000.00	$ 9,218,800.00	$ 57,738,800.00	$ -	$ 57,738,800.00		RP 2024 - No. 449724 - 21/05/24	$ 100,562,933.73	$ 1,225,972,113.73		X		
10	PARCIAL	feb-25	$ 48,520,000.00	$ 9,218,800.00	$ 57,738,800.00	$ -	$ 57,738,800.00			$ 42,824,133.73	$ 1,168,233,313.73		X		
11	PARCIAL	mar-25	$ 48,520,000.00	$ 9,218,800.00	$ 57,738,800.00	$ -	$ 57,738,800.00			$ -	$ 1,110,494,513.73		X		
									RP 2025 - No. 195925 - 25/03/25	$ 677,950,933.73					
12	PARCIAL	abr-25	$ 48,520,000.00	$ 9,218,800.00	$ 57,738,800.00	$ -	$ 57,738,800.00			$ 620,212,133.73	$ 1,052,755,713.73		X		
13	PARCIAL	may-25	$ 48,520,000.00	$ 9,218,800.00	$ 57,738,800.00	$ -	$ 57,738,800.00			$ 562,473,333.73	$ 995,016,913.73		X		
14	PARCIAL	jun-25	$ 48,520,000.00	$ 9,218,800.00	$ 57,738,800.00	$ -	$ 57,738,800.00			$ 504,734,533.73	$ 937,278,113.73		X		
15	PARCIAL	jul-25	$ 48,520,000.00	$ 9,218,800.00	$ 57,738,800.00	$ -	$ 57,738,800.00			$ 446,995,733.73	$ 879,539,313.73		X		
16	PARCIAL	ago-25	$ 48,520,000.00	$ 9,218,800.00	$ 57,738,800.00	$ -	$ 57,738,800.00			$ 389,256,933.73	$ 821,800,513.73		X		
17	PARCIAL	sep-25	$ 48,520,000.00	$ 9,218,800.00	$ 57,738,800.00	$ -	$ 57,738,800.00			$ 331,518,133.73	$ 764,061,713.73		X		
18	PARCIAL	oct-25	$ 48,520,000.00	$ 9,218,800.00	$ 57,738,800.00	$ -	$ 57,738,800.00			$ 273,779,333.73	$ 706,322,913.73				
TOTALES			**$ 805,673,333.00**	**$ 153,077,933.27**	**$ 958,751,266.27**	**$ -**	**$ 958,751,266.27**	**$ -**		**$ 273,779,333.73**	**$ 706,322,913.73**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 805,673,333.00	$ 153,077,933.27	**$ 958,751,266.27**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A		**N/A**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A		**N/A**
AJUSTES	N/A		**N/A**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		**N/A**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
VALOR TOTAL	**$ 805,673,333.00**	**$ 153,077,933.27**	**$ 958,751,266.27**
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **JHON BALDOMERO SANABRIA MENDOZA**
REPRESENTANTE LEGAL -VIALVIAS LTDA
C.C. No. 17´421.613 de Acacias
Contratista

Firma
Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
Matrícula No. 05202-197804 ANT
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 1671 DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL BRISAS DEL DUDA LTDA – VIASDUDA LTDA

MES INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 - PR40+0000, LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1932-2024

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	439124	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 640,815,000.00	$ -
2025	178125	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 822,813,600.00	$ -
2026					Contrato Principal	$ 513,627,800.00	
				TOTAL		$ 1,977,256,400.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,977,256,400.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
2024															
1	PARCIAL	MAYO-JUN/24	$ 53,850,000.00	$ 10,231,500.00	$ 64,081,500.00	$ -	$ 64,081,500.00		RP 2024 - No. 439124 - 20/05/24	$ 576,733,500.00	$ 1,913,174,900.00		X		
2	PARCIAL	jun-24	$ 3,590,000.00	$ 682,100.00	$ 4,272,100.00	$ -	$ 4,272,100.00			$ 572,461,400.00	$ 1,908,902,800.00		X		
3	PARCIAL	jul-24	$ 53,850,000.00	$ 10,231,500.00	$ 64,081,500.00	$ -	$ 64,081,500.00			$ 508,379,900.00	$ 1,844,821,300.00		X		
4	PARCIAL	ago-24	$ 53,850,000.00	$ 10,231,500.00	$ 64,081,500.00	$ -	$ 64,081,500.00			$ 444,298,400.00	$ 1,780,739,800.00		X		
5	PARCIAL	sep-24	$ 53,850,000.00	$ 10,231,500.00	$ 64,081,500.00	$ -	$ 64,081,500.00			$ 380,216,900.00	$ 1,716,658,300.00		X		
6	PARCIAL	oct-24	$ 53,850,000.00	$ 10,231,500.00	$ 64,081,500.00	$ -	$ 64,081,500.00			$ 316,135,400.00	$ 1,652,576,800.00		X		
7	PARCIAL	nov-24	$ 53,850,000.00	$ 10,231,500.00	$ 64,081,500.00	$ -	$ 64,081,500.00			$ 252,053,900.00	$ 1,588,495,300.00		X		
8	PARCIAL	dic-24	$ 53,850,000.00	$ 10,231,500.00	$ 64,081,500.00	$ -	$ 64,081,500.00			$ 187,972,400.00	$ 1,524,413,800.00		X		
2025															
9	PARCIAL	ene-25	$ 57,620,000.00	$ 10,947,800.00	$ 68,567,800.00	$ -	$ 68,567,800.00		RP 2024 - No. 439124 - 20/05/24	$ 119,404,600.00	$ 1,455,846,000.00		X		
10	PARCIAL	feb-25	$ 57,620,000.00	$ 10,947,800.00	$ 68,567,800.00	$ -	$ 68,567,800.00			$ 50,836,800.00	$ 1,387,278,200.00		X		
11	PARCIAL	mar-25	$ 57,620,000.00	$ 10,947,800.00	$ 68,567,800.00	$ -	$ 68,567,800.00			$ -	$ 1,318,710,400.00		X		
									RP 2025 - No. 178125 - 20/03/25	$ 805,082,600.00					
12	PARCIAL	abr-25	$ 57,620,000.00	$ 10,947,800.00	$ 68,567,800.00	$ -	$ 68,567,800.00			$ 736,514,800.00	$ 1,250,142,600.00		X		
13	PARCIAL	may-25	$ 57,620,000.00	$ 10,947,800.00	$ 68,567,800.00	$ -	$ 68,567,800.00			$ 667,947,000.00	$ 1,181,574,800.00		X		
14	PARCIAL	jun-25	$ 57,620,000.00	$ 10,947,800.00	$ 68,567,800.00	$ -	$ 68,567,800.00			$ 599,379,200.00	$ 1,113,007,000.00		X		
15	PARCIAL	jul-25	$ 57,620,000.00	$ 10,947,800.00	$ 68,567,800.00	$ -	$ 68,567,800.00			$ 530,811,400.00	$ 1,044,439,200.00		X		
16	PARCIAL	ago-25	$ 57,620,000.00	$ 10,947,800.00	$ 68,567,800.00	$ -	$ 68,567,800.00			$ 462,243,600.00	$ 975,871,400.00		X		
17	PARCIAL	sep-25	$ 57,620,000.00	$ 10,947,800.00	$ 68,567,800.00	$ -	$ 68,567,800.00			$ 393,675,800.00	$ 907,303,600.00		X		
18	PARCIAL	oct-25	$ 57,620,000.00	$ 10,947,800.00	$ 68,567,800.00	$ -	$ 68,567,800.00			$ 325,108,000.00	$ 838,735,800.00				
TOTALES			**$ 956,740,000.00**	**$ 181,780,600.00**	**$ 1,138,520,600.00**	**$ -**	**$ 1,138,520,600.00**	**$ -**		**$ 325,108,000.00**	**$ 838,735,800.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 956,740,000.00	$ 181,780,600.00	**$ 1,138,520,600.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A		**N/A**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A		**N/A**
AJUSTES	N/A		**N/A**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		**N/A**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A		**N/A**
VALOR TOTAL	**$ 956,740,000.00**	**$ 181,780,600.00**	**$ 1,138,520,600.00**
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **GERMAN LOSADA LOSADA**
REPRESENTANTE LEGAL -VIASDUDA LTDA
C.C. No. 83.247.779 de Colombia - Huila
Contratista

Firma
Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
Matrícula No. 05202-197804 ANT
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1670 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSTRUCHAF VIAL LTDA – VIALCHAF LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1932-2024 **INTERVENTOR:** COINZA ING S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	21	24	21	20	24	24	20	24	24	21	21	24	24	24	21	20	24	24	24	21	24	20	24	22	24	21	24	23	704
Lluvias moderadas				3		3	4			4			3	3				3	4				3		4		2		3		1	40
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: OSCAR ALEXANDER ENCISO LUGO
REPRESENTANTE LEGAL - VIALCHAF LTDA
Contratista
C.C. No. 86.012.156 de Granada

Firma

Nombre: IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ
Matrícula No. 25202-224826 CND
INGENIERO RESIDENTE AMV G3
INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1694 DE 2024 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES VÍAS DEL PROGRESO LTDA - VIALPRO LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1932-2024 **INTERVENTOR:** COINZA ING S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	21	24	21	20	24	24	20	24	24	21	21	24	24	24	21	20	24	24	24	21	24	20	24	22	24	21	24	23	704
Lluvias moderadas				3		3	4			4			3	3				3	4				3		4		2		3		1	40
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **BLADISMIR ALVAREZ GUERRA**
REPRESENTANTE LEGAL -VIALPRO LTDA
Contratista

Firma

Nombre: **IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ**
Matrícula No. 25202-224826 CND
INGENIERO RESIDENTE AMV G3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

C.C. No. 86.031.275 de Fuentedeoro

Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1710 DE 2024 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES SAN JUAN S.A.S – M&C VIAL S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ; 65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1932-2024 **INTERVENTOR:** COINZA ING S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	21	24	21	20	24	24	20	24	24	21	21	24	24	24	21	20	24	24	24	21	24	20	24	22	24	21	24	23	704
Lluvias moderadas				3		3	4			4			3	3				3	4				3		4		2		3		1	40
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.


NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:



Firma

Nombre: DARIO MENDEZ BARRAGAN
REPRESENTANTE LEGAL -M&C VIAL S.A.S
Contratista
C.C. No. 80.742.962 de Bogotá D.C.



Firma

Nombre: IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ
Matrícula No. 25202-224826 CND
INGENIERO RESIDENTE AMV G3
INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1712 DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN VIALVIAS LTDA – VIALVIAS LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 - PR76+0000. LOTE 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1932-2024 **INTERVENTOR:** COINZA ING S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	21	24	21	20	24	24	20	24	24	21	21	24	24	24	21	20	24	24	24	21	24	20	24	22	24	21	24	23	704
Lluvias moderadas				3		3	4			4			3	3				3	4				3		4		2		3		1	40
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: JHON BALDOMERO SANABRIA MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL -VIALVIAS LTDA
C.C. No. 17´421.613 de Acacias
Contratista

Firma

Nombre: IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ
Matrícula No. 25202-224826 CND
INGENIERO RESIDENTE AMV G3
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 1671 DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL BRISAS DEL DUDA LTDA – VIASDUDA LTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/10/2025 AL 31/10/2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 - PR40+0000, LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1932-2024 **INTERVENTOR:** COINZA ING S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	21	24	21	20	24	24	20	24	24	21	21	24	24	24	21	20	24	24	24	21	24	20	24	22	24	21	24	23	704
Lluvias moderadas				3		3	4			4			3	3				3	4				3		4		2		3		1	40
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: GERMAN LOSADA LOSADA
REPRESENTANTE LEGAL -VIASDUDA LTDA
C.C. No. 83.247.779 de Colombia - Huila
Contratista

Firma

Nombre: IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ
Matrícula No. 25202-224826 CND
INGENIERO RESIDENTE AMV G3
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 1670 **CONTRATISTA:** CONSTRUCHAF VIAL LTDA – VIALCHAF LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000. LOTE 1

FECHA DE INICIO: 29/05/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2,219,956,900.00

VALOR ACUMULADO: $ 2,219,956,900.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1932 **INTERVENTOR:** COINZA ING S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 221,995,690.00	10	5	2024	31	7	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 443,991,380.00	10	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 665,987,070.00	31	7	2026	31	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052858

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 390,000,000.00	10	5	2024	31	7	2026
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012279 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	11 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	N/A			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A			
Calidad de Estudios y Diseños	N/A			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A			
Otros	N/A			

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) / 11 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 1694

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES VÍAS DEL PROGRESO LTDA - VIALPRO LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 56+0000 - PR96+0000; 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR 4+0000 - PR14+0000; 65MTB PASO POR PUERTO LIMÓN, PR0+0000 - PR 1+0200; 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0280 -PR 3+0000; 65MTD PASO POR PUERTO ALJURE, PR0+0000 - PR 4+0110. LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 1/06/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,853,020,400.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,853,020,400.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1932

INTERVENTOR: COINZA ING S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 185,302,040.00	14	5	2024	31	7	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 370,604,080.00	14	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 555,906,120.00	31	7	2026	31	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052835

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 390,000,000.00	10	5	2024	31	7	2026
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012288

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	11 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	N/A							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A							
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros	N/A							

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 1710 **CONTRATISTA:** M&C SAN JUAN S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTORES: 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900 ;65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900; 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEÓN VALENCIA, PR0+0000 - PR2+0840; 65AMTC ACCESO A GRANADA, PR0+0000 - PR1+0300; 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR76+0000 - PR109+0821 LOTE 9TE 1

FECHA DE INICIO: 29/05/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,654,397,500.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,654,397,500.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1932 **INTERVENTOR:** COINZA ING S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 165,439,750.00	10	5	2024	31	7	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 330,879,500.00	10	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 496,319,250.00	31	7	2026	31	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052837

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 390,000,000.00	10	5	2024	31	7	2026
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012274 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	11 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	N/A							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A							
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros	N/A							

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 1712 **CONTRATISTA:** VIALVIAS LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 -PR76+0000 LOTE 8

FECHA DE INICIO: 29/05/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,665,074,180.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,665,074,180.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1932 **INTERVENTOR:** COINZA ING S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 166,507,418.00	10	5	2024	31	7	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 333,014,836.00	10	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 499,522,254.00	31	7	2026	31	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052836

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 390,000,000.00	10	5	2024	31	7	2026
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012276 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	11 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	N/A							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A							
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros	N/A							

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 1671 **CONTRATISTA:** VIASDUDA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META, SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 -PR40+0000 LOTE 2

FECHA DE INICIO: 29/05/2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,977,256,400.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,977,256,400.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1932 **INTERVENTOR:** COINZA ING S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 197,725,640.00	10	5	2024	31	7	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 395,451,280.00	10	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 593,176,920.00	31	7	2026	31	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000052859

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 390,000,000.00	10	5	2024	31	7	2026
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620-74-994000012280 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1 (Día)	11 (Mes)	2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	N/A							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A							
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros	N/A							

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO AMV
MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTRATO AMV
MEPI-MN1-IN-15-FR-9 FINANCIERO AMV
MEPI-MN1-IN-15-FR-13 GARANTIAS AMV

Dirección: Conjunto Residencial Quintas del Trapiche casa 42
Celulares: 3152716653 - 3226610463
Email**:** Amv2024grupo3@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01/10/2025 - 31/10/2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1932/2024

INTERVENTORÍA: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS – COINZA ING S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. N/A

CONTRATISTA: N/A

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO	KFN242	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULO	HPK295	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Ivan Mauricio Gualteros Hernandez
RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL G3
Matrícula Profesional No.: 25202-224826 CND

Firma
Nombre: Fabian Andres Ortiz Colmenares
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Direccion Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	1/11/2025 (Día / Mes / Año)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-25 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:**

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ	1032433646	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,866,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 7,866,000	$ 547,474	V	SANITAS S.A.	7990834797	$ 314,640	COLPESIONES	7990834797	$ 1,258,560	$ 314,640			
2	JUAN DAVID MENDOZA CASTRO	1094933669	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,866,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 7,866,000	$ 547,474	V	SALUD TOTAL	7990834797	$ 314,640	COLPESIONES	7990834797	$ 1,258,560	$ 314,640			
3	JAIRO ALEXANDER CARRASCO CAMPOS	1010188753	INGENIERA AUXILIAR I	$ 5,170,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 5,170,000	$ 359,832	V	FAMISANAR	7990834797	$ 206,800	PORVENIR	7990834797	$ 827,200	$ 206,800			
4	ELIAM DAVID FONSECA LESMEZ	1193383450	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,710,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 3,710,000	$ 258,216	V	SALUD TOTAL	7990834797	$ 148,400	PORVENIR	7990834797	$ 593,600	$ 148,400			
5	VIVIANA ANDREA CARO HERRERA	1120364048	INSPECTOR SISO	$ 2,415,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 2,415,000	$ 168,084	V	NUEVA EPS	7990834797	$ 96,600	PORVENIR	7990834797	$ 386,400	$ 96,600			
6	NELSON VASQUEZ AGUILAR	17356355	CONDUCTOR	$ 1,590,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 1,590,000	$ 110,664	V	NUEVA EPS	7990834797	$ 63,600	COLPESIONES	7990834797	$ 254,400	$ 63,600			
7	WILINTON ALBADAN HERNANDEZ	1120363519	CONDUCTOR	$ 1,590,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 1,590,000	$ 110,664	V	SALUD TOTAL	7990834797	$ 63,600	PORVENIR	7990834797	$ 254,400	$ 63,600			
9	YEIMY PAOLA VARGAS RUBIANO	1006811693	SECRETARIA	$ 1,525,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 1,525,000	$ 106,140	V	CAPITAL SALUD	7990834797	$ 61,000	PORVENIR	7990834797	$ 244,000	$ 61,000			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 31,732,000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma
Nombre : FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-232984 TLM

Orioinal: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900839861
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS IZASA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 40 N° 81 A 132	TELÉFONO:	4137967
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7990839306**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1909186671

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.935.200	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 3.049.200	$ 0	$ 3.049.200
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.690.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.690.800	$ 0	$ 1.690.800
SUBTOTALES:										**$ 4.740.000**	**$ 0**	**$ 4.740.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 392.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.200	$ 0	$ 0	$ 392.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 63.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 61.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.600	$ 0	$ 0	$ 144.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 96.600
SUBTOTALES:													**$ 1.156.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.156.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.921.000	$ 1.921.000	$ 0	$ 0	$ 1.921.000
SUBTOTALES:									**$ 1.921.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.921.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 171.000	$ 0	$ 171.000
CCF34	CCF34-COFREM META	8	$ 985.800	$ 0	$ 985.800
SUBTOTALES:			**$ 1.156.800**	**$ 0**	**$ 1.156.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
																														APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINED
1	CC 1006811693	VARGAS RUBIANO YEIMY PAOLA	DEPEND		$ 1.525.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.525.000	$ 244.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 244.000	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.525.000	$ 61.000	$ 0	$ 61.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.525.000		106.200	30	$ 1.525.000	CCF34-COFREM META	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010188753	CARRASCO CAMPOS JAIRO ALEXANDER	DEPEND		$ 5.170.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 5.170.000	$ 827.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 827.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 5.170.000	$ 206.800	$ 0	$ 206.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 5.170.000		359.900	30	$ 5.170.000	CCF34-COFREM META	206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1032433646	GUALTEROS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	DEPEND		$ 7.866.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.866.000	$ 1.258.600	$ 39.400	$ 39.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.337.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.866.000	$ 314.700	$ 0	$ 314.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 7.866.000		547.500	30	$ 7.866.000	CCF34-COFREM META	314.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1094933669	MENDOZA CASTRO JUAN DAVID	DEPEND		$ 7.866.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.866.000	$ 1.258.600	$ 39.400	$ 39.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.337.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 7.866.000	$ 314.700	$ 0	$ 314.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 7.866.000		547.500	30	$ 7.866.000	CCF34-COFREM META	314.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1120363519	ALBADAN HERNANDEZ WILINTON	DEPEND		$ 1.590.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.590.000	$ 254.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.590.000	$ 63.600	$ 0	$ 63.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.590.000		110.700	30	$ 1.590.000	CCF34-COFREM META	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1120364048	CARO HERRERA VIVIANA ANDREA	DEPEND		$ 2.415.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.415.000	$ 386.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 386.400	NUEVA EPS CM	30	$ 2.415.000	$ 96.600	$ 0	$ 96.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.415.000		168.100	30	$ 2.415.000	CCF34-COFREM META	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900839861
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS IZASA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 40 N° 81 A 132	TELÉFONO:	4137967
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7990839306**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1909186671

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1128269284	ISAZA PALACIO RUBEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.80	$	$	$	$	Norma	$ 227.80	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.00	$	$ 57.00	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.10	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.00	$	$	$	$
8	CC 1193383450	FONSECA LESMEZ ELIAM DAVID	DEPEND		$ 3.720.000	FIJO			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.720.000	$ 595.20	$	$	$	$	Norma	$ 595.20	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.720.000	$ 148.80	$	$ 148.80	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.720.000		$ 259.00	30	$ 3.720.000	CCF34-COFREMETA	148.80	$	$	$	$
9	CC 17356355	VASQUEZ AGUILAR NELSON	DEPEND		$ 1.590.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.590.000	$ 254.40	$	$	$	$	Norma	$ 254.40	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.590.000	$ 63.60	$	$ 63.60	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.590.000		$ 110.70	30	$ 1.590.000	CCF34-COFREMETA	$ 63.60	$	$	$	$
10	CC 43222199	ISAZA PALACIO SUSANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.80	$	$	$	$	Norma	$ 227.80	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.00	$	$ 57.00	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.50	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.00	$	$	$	$
11	CC 70559814	HOYOS RESTREPO SERGIO ALONSO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.80	$	$	$	$	Norma	$ 227.80	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.00	$	$ 57.00	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.10	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.00	$	$	$	$

TOTAL PAGADO: $ 8.974.600

Planilla Pagada

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MNG-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 de 2024

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS GAZA INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: sep-25

PROYECTO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META, GRUPO ANV 3 LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No:

CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	544824	C-2401-0600-103-511020-2401054-02	30	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1,729,802,802	$ -
2025	169325	C-2401-0600-103-511020-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1,956,767,694	$ 1,949,406,361.14
2026					PRINCIPAL	$ 1,304,013,900	
				TOTAL		$ 4,990,584,396	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4,990,584,396

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	Saldo Registro Presupuestal No. 169325 De (17/03/2025)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	jul-24	$ 77,248,274.00	$ 14,677,172.06	$ 91,925,446.06		$ 91,925,446.06		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1,637,877,355.94		$ 4,898,658,949.94		
2	ago-24	$ 89,774,260.00	$ 17,057,109.40	$ 106,831,369.40		$ 106,831,369.40		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1,531,045,986.54		$ 4,791,827,580.54		
3	sep-24	$ 104,188,000.00	$ 19,795,720.00	$ 123,983,720.00		$ 123,983,720.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1,407,062,266.54		$ 4,667,843,860.54		
4	oct-24	$ 91,253,020.00	$ 17,338,073.80	$ 108,591,093.80		$ 108,591,093.80		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1,298,471,172.74		$ 4,559,252,766.74		
5	nov-24	$ 88,731,840.00	$ 16,859,049.60	$ 105,590,889.60		$ 105,590,889.60		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1,192,880,283.14		$ 4,453,661,877.14		
6	dic-24	$ 134,356,600.00	$ 25,527,754.00	$ 159,884,354.00		$ 159,884,354.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1,032,995,929.14		$ 4,293,777,523.14		
7	ene-25	$ 95,902,600.00	$ 18,221,494.00	$ 114,124,094.00		$ 114,124,094.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 918,871,835.14		$ 4,179,653,429.14		
8	feb-25	$ 95,329,450.00	$ 18,112,595.50	$ 113,442,045.50		$ 113,442,045.50		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 805,429,789.64		$ 4,066,211,383.64		
9	mar-25	$ 94,414,400.00	$ 17,938,736.00	$ 112,353,136.00		$ 112,353,136.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 693,076,653.64		$ 3,953,858,247.64		
10	abr-25	$ 97,011,300.00	$ 18,432,147.00	$ 115,443,447.00		$ 115,443,447.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 577,633,206.64		$ 3,838,414,800.64		
11	may-25	$ 98,243,000.00	$ 18,666,170.00	$ 116,909,170.00		$ 116,909,170.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 460,724,036.64		$ 3,721,505,630.64		
12	jun-25	$ 99,691,450.00	$ 18,941,375.50	$ 118,632,825.50		$ 118,632,825.50		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 342,091,211.14		$ 3,602,872,805.14		
13	jul-25	$ 97,907,200.00	$ 18,602,368.00	$ 116,509,568.00		$ 116,509,568.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 225,581,643.14		$ 3,486,363,237.14		
14	ago-25	$ 99,787,750.00	$ 18,959,672.50	$ 118,747,422.50		$ 118,747,422.50		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 106,834,220.64		$ 3,367,615,814.64		
15	sep-25	$ 95,962,650.00	$ 18,232,903.50	$ 114,195,553.50		$ 114,195,553.50		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024) / Registro Presupuestal No. 169325 De (17/03/2025)	$ -	$ 1,949,406,361.14	$ 3,253,420,261.14		
16	oct-25	$ 99,201,150.00	$ 18,848,218.50	$ 118,049,368.50		$ 118,049,368.50		Registro Presupuestal No. 169325 De (17/03/2025)		$ 1,838,718,325.50	$ 3,135,370,892.64		
	TOTALES	$ 1,559,002,944.00	$ 296,210,559.36	$ 1,855,213,503.36									

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 1,190,073,504.00	$ 226,113,965.76	$ 1,416,187,469.76
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 361,478,440.00	$ 68,680,903.60	$ 430,159,343.60
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	$ 7,451,000.00	$ 1,415,690.00	$ 8,866,690.00
VALOR TOTAL	$ 1,559,002,944.00	$ 296,210,559.36	$ 1,855,213,503.36

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comoaración del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: RUBEN GAZA PALACIO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma

Nombre: JUAN ANDRES ORTIZ CIELMENARES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-232984 TLM

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS – COINZA ING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 5/07/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4,990,584,396.00

VALOR ACUMULADO: $ 4,990,584,396.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 499,058,439.60	7	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 998,116,879.20	7	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1,497,175,318.80	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100231914

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN	FECHA	1/11/2025 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	N/A	N/A						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A						
Calidad del servicio	N/A	N/A						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: IVAN MAURICIO GUALTEROS
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-282367 CND

Firma
Nombre: FABIAN ANDRES ORTIZ COLMENARES
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202232984 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Dirección: Conjunto Residencial Quintas del Trapiche casa 42
Celulares: 3152716653 - 3226610463
Email**:** Amv2024grupo3@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INFORME MENSUAL No. 15

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERIRTORIAL META GRUPO AMV 3
LOTE 1
CONSULTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.

Periodo : 01 al 31 de Octubre de 2025

ADMINISTRACION VIAL- META

ANEXO FOTOGRÁFICO



Se realizaron actividades de limpieza en la berma en el PR96+0000, Ruta 65A02



Se realizaron actividades de rocería entre los PR 68+0000 al PR 71+0000, Ruta 6508



Se realizaron actividades de limpieza en obras hidráulicas en los PR0+0200 al PR 0+0500, Ruta 65A02



Se realizaron actividades de retiro de material sobre la cuneta en el PR 32+0500, Ruta 6508



Se realizaron actividades de limpieza puente en el PR 50+0700, Ruta 6508



Se realizaron actividades de limpieza en cuneta en el PR 50+0000 al PR 52+0000, Ruta 6508

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INFORME MENSUAL No. 15

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERIRTORIAL META GRUPO AMV 3
LOTE 1
CONSULTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.

Periodo : 01 al 31 de Octubre de 2025

ADMINISTRACION VIAL- META

ANEXO FOTOGRÁFICO



Se realizaron actividades de rocería en los PR 48+0000 al PR 50+0000, Ruta 6508



Se realizó recolección de basuras en el PR76+0000, Ruta 65A02



Se realizaron actividades de limpieza en zanjas de coronación en el PR 34+0000, Ruta 6508



Se realizaron actividades de parcheo en los PR 77+0000 al PR 84+0000, Ruta 65A02



Se realizaron actividades de limpieza de obras hidráulicas en los PR 47+0000 al PR 49+0000, Ruta 6508



Se realizaron actividades de rocería en los PR 8+0000 al PR 9+0000, Ruta 65A02

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INFORME MENSUAL No. 15** **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERIRTORIAL META GRUPO AMV 3** **LOTE 1** **CONSULTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.** **Periodo : 01 al 31 de Octubre de 2025**	coinza **ADMINISTRACION VIAL- META**

ANEXO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de parcheo en el PR 20+0000, Ruta 6508



Se realizan actividades de limpieza de laderas en los PR 14+0000 al PR 15+0000, Ruta 65A02



Se realizan actividades de parcheo en los PR 103+0000 al PR 105+0000, Ruta 65A02



Se realizan actividades de rocería en los PR 8+0000 al PR 14+0000, en la variante 65MTA



Se realizan actividades de limpieza de defensas metálicas en el PR 69+0000, Ruta 6508



Se realizan actividades de poda de árboles en los PR 56+0000 al PR 60+0000, Ruta 65A02

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INFORME MENSUAL No. 15

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERIRTORIAL META GRUPO AMV 3
LOTE 1
CONSULTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.

Periodo : 01 al 31 de Octubre de 2025

ADMINISTRACION VIAL- META

ANEXO FOTOGRÁFICO



Se realizan actividades de limpieza en el puente del PR13+0600, Ruta 65A02



Se realizan actividades de parcheo en los PR 19+0000 al PR 22+0000, Ruta 6508



Se realizan actividades de parcheo en el PR 14+0000, Ruta 6508



Se realizan actividades de rocería en los PR 79+0000 al PR 82+0000, Ruta 65A02



Se realizan actividades de recolección de basuras en los PR 4+0000 al PR 8+0000, Ruta 6508



Se realizan actividades de parcheo en los PR 96+0000 al PR 103+0000 y PR 105+0000 al PR 109+0000, Ruta 65A02
