GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047**
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**9**		FECHA:	**22**	de	**ENERO**	de	**2026**				
PERIODO:	DEL	**1**	de	**JULIO**	de	**2025**	AL	**31**	de	**JULIO**	de	**2025**	

CONVENIO No:	**2580**	DE	**2024**

OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2580 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL SUMUNISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACA, MUNICIPIO DE TUNJA VIAS URBANAS

INFORMACIÓN DE LA RESOLUCION			
ENTIDAD TERRITORIAL			
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**MUNICIPIO DE TUNJA**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ		**LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA**	
Teléfono: 7420150	Dirección: Cll 20 No 9-90 Tunja, Boyacá	Teléfono:3108713234	Dirección: Calle 19 #9-95 Tunja, Boyacá
ASIGNACIÓN DE SEGUIMIENTO: 27 DE MARZO DE 2025		8 DE OCTUBRE DE 2024	
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 2,000,000,000.00	**$ 96,371,894.00**	**$ 0.00**	**$ 2,096,371,894.00**

OBSERVACIÓN: Si bien el ingeniero OSCAR IVÁN PINZÓN SÁNCHEZ se mantenía como supervisor durante el periodo en mención, el presente informe ha sido elaborado y suscrito por el nuevo supervisor, ingeniero ARIEL ADOLFO VARGAS GÁMEZ, en atención a que subsistían observaciones pendientes por parte de los informes previamente emitidos.

ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE TUNJA	
ETAPA DEL PROCESO	**FECHA**
Proceso No. 005-2024- SA-SUBASTA INVERSA	8 DE OCTUBRE DE 2024
Aviso de Convocatoria o Invitación	8 DE OCTUBRE DE 2024
Estudios Previos	8 DE OCTUBRE DE 2024
Proyecto de pliego de condiciones	8 DE OCTUBRE DE 2024
Pliego de condiciones definitivos	31 DE OCTUBRE DE 2024
Acto de adjudicación	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE TUNJA	
ETAPA DEL PROCESO	**FECHA**
Proceso No.	
Aviso de Convocatoria o Invitación	
Estudios Previos	
Proyecto de pliego de condiciones	
Pliego de condiciones definitivos	
Acto de adjudicación	

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA	**4,724,227,249,00**
OBJETO:	
SIT- 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ"	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
UNIÓN TEMPORAL TUNJA-2024	**JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ**
Teléfono: 3143308903 Dirección: Calle 27 N° 9 30	Teléfono: 3143308903 Direccion: Calle 27 N° 9 30

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
OBJETO:	


GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047**
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
Teléfono: Dirección	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	6	9	2024	11	12	2024			
PLAZO INICIAL	8	10	2024	31	12	2024			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	5	12	2024	31	12	2024			
ADICIONES EN PLAZO	26 DÍAS			3 MESES					
ADICIONES EN PLAZO	9 MESES Y 21 DÍAS			90 DÍAS					
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	4	1	2026	30	8	2025			

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA RESOLUCION

% DE AVANCE CONVENIO	**60.7%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**69.7%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90.0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se realizará la instalación de mezcla y se garantizará que la mezcla asfáltica suministrada para las labores a realizar cumpla con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías INVIAS. Nos comprometemos a instalar el material recibido, bajo los lineamientos establecidos en el manual de mantenimiento de carreteras del "INVIAS", esto de acuerdo a la actividad requerida en campo; por tanto, los mismos serán responsables de su correcta instalación; así mismo la Secretaría de Infraestructura dispone de un anexo técnico en donde se podrá consultar especificaciones técnicas y proceso constructivo de las siguientes actividades: parcheo en calzada y bermas pavimentadas, parcheo temporal en calzada y bermas pavimentadas y Bacheo de Pavimento asfaltico; documento tomado del manual de mantenimiento de carreteras del "INVIAS). Dicho material será utilizado para rehabilitar, mejorar y mantener los tramos viales que defina la Alcaldía de Tunja y que san aprobados por la Gobernacion de Boyaca , cumpliendo con todos los requisitos previos a la ejecución física de la obra . Los metros cúbicos aproximados a ser suministrados al Municipio de Tunja corresponde a 3.024,30 Mt3 sueltos.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	6	9	2024	
Acta de prorroga No. 1	4	12	2024	se realiza solicitud por que no se habia dado inicio al contrato de suministro.
Acta de suspension No. 1	27	12	2024	Se realiza suspensión por festividades de fin de año y el no suministró de Mezcla Asfaltica.

Acta de reinicio	10	3	2025	culmina la suspensión despues de 73 días
Acta de prorroga No. 2	14	3	2025	Se realiza prorroga para dar cumplimiento al convenio.

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA No. 1		VEINTI SEIS (26) DIAS
2	SUSPENSIÓN 1		DESDE 27 DE DICIEMBRE DE 2024
3	PRORROGA No. 2		NUEVE (9) MESES Y VENTIUN (21) DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0.00**	**DIEZ (10) MESES Y DIECISIESTE (17) DÍAS**

SEGUIMIENTO FINANCIERO (N/ A)

CONVENIO

CUENTA No.	390864577	**BANCO:**	OCCIDENTE	**SUCURSAL:**	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	MUNICIPIO DE TUNJA – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 2580 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	90	16	10	2024	$ 1,800,000,000.00
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 1,800,000,000.00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
LAS NIEVES CARRERA 7	28
LAS NIEVES CALLE 25 - CARRERA 7	63.8
LAS NIEVES CALLE 25 - CARRERA 8	35.96
LAS NIEVES CARRERA 7 - CALLE 25	13.98
LAS NIEVES CALLE 25 - CARRERA 9	78
LAS NIEVES CALLE 25 - CARRERA 10	18.55
TOTAL (m3)	238.29

(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
27 DE SEPTIEMBRE DE2024	SUPERVISION DE CONVENIO	ENTREGA DE FORMATOS PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMES	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
27 DE SEPTIEMBRE DE2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA GIRO DE ANTICIPO	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
27 DE SEPTIEMBRE DE2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACION PARA INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
3 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	INVITACION A CELEBRACION DE COMITÉ TECNICO	CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
23 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE AJUSTE A MINUTA DEL CONVENIO	ENVIADA A LA SECRETARIA DE CONTRATACION
16 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE AJUSTE A MINUTA DEL CONVENIO	ENVIADA A LA SECRETARIA DE CONTRATACION
29 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICIUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA

28 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	RESPUESTA ALCALDIA DE TUNJA	RADICADA A LA SUPERVISION DEL CONVENIO
29 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
6 DE NOVIEMBRE DE 2024	ALCALDIA DE TUNJA	ACLARACION DEL VAUR CONTRATADO PARA EFECTOS DE EJECUCION DEL CONVENIO	RECIBIDA POR PARTE DE LA SUPERVISION DE LA GOBERNACION DE BOYACA
8 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
19 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE HABILITACION DE CORREO EXCLUSIVO PARA EL CONVENIO	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
18 DE NOVIEMBRE DE 2024	ALCALDIA DE TUNJA	SOLICITUD DE NUMERO DE CUENTA PARA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SUPERVISION ENVIO DATOS DE NUMERO DE CUENTA PARA TAL FIN
19 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE NUMERO DE CUENTA PARA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SE DIRIGIO CARTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL PARA LA ENTREGA DE ESTA INFORMACION
20 DE NOVIEMBRE DE 2024	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	ENTREGA DE NUMERO DE CUENTA PARA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFORMACION ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
26 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	INVITACION A CELEBRACION DE COMITÉ TECNICO	REMITIDA A LA ALCALDIA DE TUNJA
27 DE NOVIEMBRE DE 2024	ALCALDIA DE TUNJA	RESPUESTA A INVITACION A COMITÉ TECNICO	SE CAMBIA DE FECHA EL COMITÉ PROPUESTO
22 DE MAYO DE 2025	ALCALDIA DE TUNJA	SOLICITUD DE APROBACION NUEVOS TRAMOS VIALES	SE SOLICITA LA APROBACION DE INTERVENCION A UN NUEVO LISTADO DE TRAMOS VIALES
23 DE MAYO DE 2025	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y FINANCIEROS	SE SOLICITA QUE LA ALCALDÍA DE CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO
23 DE MAYO DE 2025	SUPERVISION DE CONVENIO	APROBACIÓN DE NUEVOS TRAMOS VIALES	REALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN LA CLAUSULA DÉCIMA DEL CONVENIO SE DA LA APROBACIÓN DE LOS NUEVOS TRAMOS VIALES
28 DE MAYO DE 2025	ALCALDIA DE TUNJA	CERTIFICADO DE SERVICIOS PÚBLICOS	CERTIFICACIÓN DE QUE LOS NUEVOS TRAMOS VIALES PUEDEN SER INTERVENIDOS
9 DE JUNIO DE 2025	SUPERVISION DE CONVENIO	APROBACIÓN DE NUEVOS TRAMOS VIALES	REALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN LA CLAUSULA DÉCIMA DEL CONVENIO SE DA LA APROBACIÓN DE LOS NUEVOS TRAMOS VIALES

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ TECNICO No. 1	8	10	2024	
COMITÉ TECNICO No. 2	15	10	2024	
COMITÉ TECNICO No. 3	3	12	2024	
COMITÉ TECNICO No. 4	31	3	2025	
COMITÉ TECNICO No. 5	28	5	2025	
COMITÉ TECNICO No. 6	31	7	2025	REALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO, SE SOCIALIZÓ INFORME DE VISITA TÉCNICA DE REVISIÓN DE ESTABILIDAD DE PARCHES Y SE SOLICITÓ POR EL MUNICIPIO APROBACIÓN DE NUEVOS TRAMOS.

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	6	9	2024	5	10	2024	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Informe de Supervisión No. 2	6	10	2024	5	11	2024	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Informe de Supervisión No. 3	6	11	2024	5	12	2024	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Informe de Supervisión No. 4	6	12	2024	27	12	2024	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Informe de Supervisión No. 5	10	3	2025	31	3	2025	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Informe de Supervisión No. 6	1	4	2025	30	4	2025	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Informe de Supervisión No. 7	1	5	2025	31	5	2025	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Informe de Supervisión No. 8	1	6	2025	31	6	2025	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Informe de Supervisión No. 9	1	7	2025	31	7	2025	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

OBSERVACIONES:

Los informes del municipio 8, 9, 10, 11, 12 y 13 ya ajustados fueron recibidos el día 22/01/2026 en el despacho del supervisor, la Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial del Departamento de Boyacá.

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	SI	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	

Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	SI	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	YA SE RADICO	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	NO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	NO	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	NO	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	NO	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	SI	
Registro de instalación Valla informativa	NO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	Supervisor Departamento
NOMBRE:	ARIEL ADOLFO VARGAS GÁMEZ

Gobernación de Boyacá Contratación
PUBLICADO
ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA
Fecha: 23-02-2026

Elaboró Steeven René Rojas Acero
Profesional externo SIP

Informe dirigido a: Oscar Iván Pinzón Sánchez, Director de Desarrollo e Infraestructura Vial

MUNICIPIO: Tunja	**FECHA: 29/07/2025**
CONTRATO / CONVENIO No. 2580 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACA	
OBJETO DE LA VISITA: REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN A LOS DIFERENTES TTRAMOS INTERVENIDOS CON INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA LA FECHA EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CUYO OBJETO RADICA EN "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."	
TIPO DE VISITA	
Interventoría:	**Supervisión: X**
Visita Técnica:	**Otro:**

ASISTENTES

No.	Nombres y Apellidos	Entidad	Cargo
1	SEBASTIÁN ALEXANDER GIL	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PASANTE DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
2	STEEVEN RENÉ ROJAS ACERO	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
3	OSCAR RODRÍGUEZ TARAZONA	ALCALDÍA DE TUNJA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

En el marco del convenio suscrito entre la **Gobernación de Boyacá** y el **Municipio de Tunja**, cuyo objeto es el **apoyo al mantenimiento vial urbano mediante el suministro de mezcla**

asfáltica en caliente, se realizó una visita técnica con el fin de:

- Verificar el avance de las actividades programadas.
- Evaluar las condiciones de las vías intervenidas y por intervenir.
- Asegurar el cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos en el proyecto.

Este informe consolida los hallazgos, observaciones y recomendaciones derivadas de la inspección realizada.

El convenio busca mejorar la **transitabilidad y seguridad vial** en **las vías urbanas** en Tunja, mediante:

- **Suministro de mezcla asfáltica** por parte de la Gobernación.
- **Ejecución directa o contratada** por el Municipio para la instalación del material.
- Intervenciones focalizadas en **pavimento flexible**, priorizando vías que cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos.

Durante la visita, se verificó la ejecución de las siguientes actividades:

A. Pavimento Flexible

1. **Parcheo en Calzada y Bermas Pavimentadas**
   - Esta actividad se refiere al reemplazo de áreas de pavimento que se encuentren deterioradas en calzada y bermas y que afecten exclusivamente a las capas asfálticas, encontrándose en buenas condiciones la base granular y demás capas inferiores.
2. **Parcheo Temporal**
   - Esta actividad se refiere al relleno de depresiones localizadas y desprendimientos del tipo ojo de pescado en calzadas o bermas pavimentadas, empleando mezclas asfálticas.
3. **Bacheo Estructural**
   - Esta actividad se refiere al reemplazo de áreas de pavimento que se encuentren deterioradas en calzada y bermas y que afecten tanto a las capas asfálticas como, al menos, la base o parte de ella. En consecuencia, es un procedimiento de reparación de áreas que presenten fallas estructurales.

B. Parámetros de Vías Intervenidas

Se confirmó que las vías seleccionadas cumplen con:

- Vías urbanas cuya construcción sea mayor a Cinco (05) años.
- Vías urbanas que cuenten con todas las redes de servicios públicos INSTALADAS y en buen estado, acorde a lo establecido en el RAS 2000.
- Vías urbanas de uso público.
- Vías urbanas con nomenclatura establecida dentro del EOT.
- Vías urbanas que no se encuentren bajo alguna supervisión por parte de entidades

como: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.

- Vías urbanas que no se encuentren dentro de intervenciones próximas por parte de la alcaldía municipal.

Se realiza visita a los tramos:

- SANTA INÉS – CALLE 41 CRA 1C – CRA 1F, intervenido en DIC 2024 según INFORME 04
- SAN FRANCISCO, intervenido en FEB 2025 según INFORME 05. 130.03 m^3
- AV. UNIVERSITARIA, intervenido en MAR 2025 según INFORME 05. 268.16 m^3
- AV. UNIVERSITARIA, intervenido en ABR 2025 según INFORME 06. 55.24 m^3
- AV. UNIVERSITARIA, intervenido en MAY 2025 según INFORME 07. 345.2875 m^3
- SANTA INÉS – CALLE 41 CRA 2- CRA 6, intervenido en MAY 2025 según INFORME 07. m^3
- DORADO – CRA4 – CRA7, intervenido en MAY 2025 según INFORME 07. m^3
- TOPO (CRA15) – CALLE19 – CALLE17, intervenido en MAY 2025 según INFORME 07. m^3
- CALLE 17- CRA 12 – CRA 15, intervenido en JUN 2025, aún sin informe.
- CALLE 25 – CRA 7 – CRA 10, intervenido en JUL 2025, aún sin informe.

El municipio expresa que se pondrá al día con los informes lo antes posible. Para la visita la metodología utilizada fue la de realizar inspección visual en cada uno de los tramos y medir al azar parches que se hayan realizado en el tramo respectivo.

A partir de la visita se generó la siguiente cartera tomada en campo que expresa con mayor claridad lo encontrado en los diferentes tramos:

REFERENCIA	TRAMO	COORDENADAS		MEZCLA ASFÁLTICA				REGISTRO FOTOGRÁFICO	
		LATITUD	LONGITUD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	ANTES	DESPUES
INFORME 7 - PARCHE 13	AV. UNIVERSITARIA	5° 33` 4,86"	73° 20` 45,43"	9.9	3.4	0.09	3.0294		
INFORME 7 - PARCHE	SANTA INES	5° 32` 55,56"	73° 21` 2,44"	10.5	4.7	0.1	4.935		
INFORME 7- PARCHE 57	DORADO	5° 32` 1,46"	73° 21` 9,66"	23.9	3.4	0.12	9.7512		
INFORME 7- PARCHE 65	TOPO	5° 31`55,19"	73° 22` 5,3"	10.3	4.2	0.11	4.7586		
INFORME POR REALIZAR	CAI SAN FRANCISCO	5° 30` 33,29"	73° 22` 05,89"	9.1	3.4	0.1	3.094		
INFORME POR REALIZAR	CC BOULEVARD SUR	5° 30` 53,31"	73° 22` 5,97"	60	7.5	0.1	45		
INFORME POR REALIZAR	CRA 7 24-08 NIEVES	5° 32` 9,40"	73° 21` 27,75"	47.3	8.7	0.1	41.151		
INFORME POR REALIZAR	CALLE 25 # 8-77 NIEVES	5° 32` 14,25"	73° 21` 32,98"	50.8	3.3	0.1	16.764		

El cuadro completo se encuentra anexo a este informe para su verificación.

En el tramo de la CALLE 17 ENTRE CRA 12 – CRA 15 se presentó un hallazgo de un hundimiento en el sector conocido como "5 esquinas". El ingeniero Oscar Rodríguez dice que este está sujeto a garantía por estabilidad de la obra por parte del contratista de la instalación de carpeta asfáltica. Además, se encontraron daños en andenes aledaños que, según dice el ingeniero Óscar, se presentaron al momento de la excavación y levantamiento del pavimento por parte del contratista.



Se visitó el frente de trabajo actual sobre la avenida Universitaria, el cual se encuentra en la bahía frente a la universidad Santo Tomás, donde se evidencia el control del agua que estaba imposibilitando la instalación de las capas de subbase y base para la posterior aplicación de la mezcla asfáltica. En el momento de la visita estaba instalando los sardineles.



También se visitó cerca a este último lugar, sobre la calzada sentido Norte-Sur un acontecimiento que se presentó por la desinformación de un privado quien se encuentra construyendo un edificio y durante su fase constructiva rompen un tubo que conduce el agua desde un nacedero sobre predios de la Universidad Santo Tomás a los canales que discurren a través del barrio Las Quintas.



El municipio manifiesta la imposibilidad de la instalación de mezcla asfáltica en este punto a raíz de esta situación, que ya se informó a la curaduría urbana y demás entes de control para que el privado realice los ajustes necesarios para la conducción del agua a los canales ya mencionados y así poder dar solución a la dificultad presentada en términos de movilidad sobre este tramo.

Conclusiones:

1. **Verificación de Medidas:**
   - Se confirma que las **medidas superficiales reportadas por el Municipio** en los tramos visitados y parches evaluados son correctas, lo que evidencia un adecuado levantamiento de información y planeación de las intervenciones.
2. **Cumplimiento del Convenio:**
   - La Supervisión del convenio reitera su **compromiso de acompañamiento continuo** durante el suministro de la mezcla asfáltica, garantizando que la ejecución se ajuste a lo pactado en términos de calidad, espesores y

procedimientos.

3. **Coordinación Interinstitucional:**
   - La articulación entre la **Gobernación de Boyacá** y el **Municipio de Tunja** ha permitido una ejecución técnica conforme a lo establecido, optimizando los recursos asignados.


Recomendaciones:

1. **Seguimiento Durante la Instalación:**
   - Realizar **visitas in situ** durante la colocación del material para verificar:
     - Compactación adecuada (mínimo **10 cm compactos**).
     - Temperatura óptima de la mezcla asfáltica.
     - Correcta preparación de superficies (limpieza, aplicación de riego de adherencia, etc.).
2. **Documentación y Reportes:**
   - Fortalecer el **registro fotográfico y actas de avance** que evidencien el antes, durante y después de las intervenciones, facilitando la trazabilidad y auditoría futura.
3. **Control de Calidad:**
   - Asegurar que el contratista cumpla con los **parámetros técnicos** del proyecto, especialmente en:
     - Profundidad de bacheo estructural.
     - Sellado de juntas y uniformidad superficial.
     -
4. **Comunicación Efectiva:**
   - Mantener una **comunicación permanente** entre la Supervisión y el Municipio para resolver contingencias (ej.: lluvias, daños no previstos) sin retrasar el cronograma.
5. **Socialización con la Comunidad:**
   - Informar a los ciudadanos sobre los horarios y sectores de intervención para minimizar afectaciones a la movilidad.


COMPROMISOS
1. SOCIALIZACIÓN DE INFORME PARA COTEJO DE INFORMACION POR PARTE DE LA ALCALDIA DE TUNJA EN LA MESA TÉCNICA PACTADA PARA EL 31 DE JULIO.
2. CUIDAR LA MANIOBRABILIDAD DE LA MAQUINARIA A FIN DE EVITAR DAÑOS ALEDAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA TRABAJADA
3. CUIDAR QUE EL PROCESO DE EXCAVACION NO COMPROMETA LA ESTABILIDAD DE LAS CAPAS GRANULARES INFERIORES
4. EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA EXCAVACION TENER EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS DADOS EN EL ANEXO TECNICO QUE FORMA PARTE DEL CONVENIO CELEBRADO, ASI COMO LA NORMATIVIDAD INVIAS (ESPESOR RECONOCIDO : 10 CMS COMPACTOS)

5. IMPLEMENTACION ADECUADA DE PMT
6. PRESENTACIÓN DE INFORMES PENDIENTES A LA FECHA QUE INCLUYAN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CADA TRAMO INTERVENIDO.

RESPONSABLE DE LA VISITA

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
STEEVEN RENÉ ROJAS ACERO	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTRATISTA SIP**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

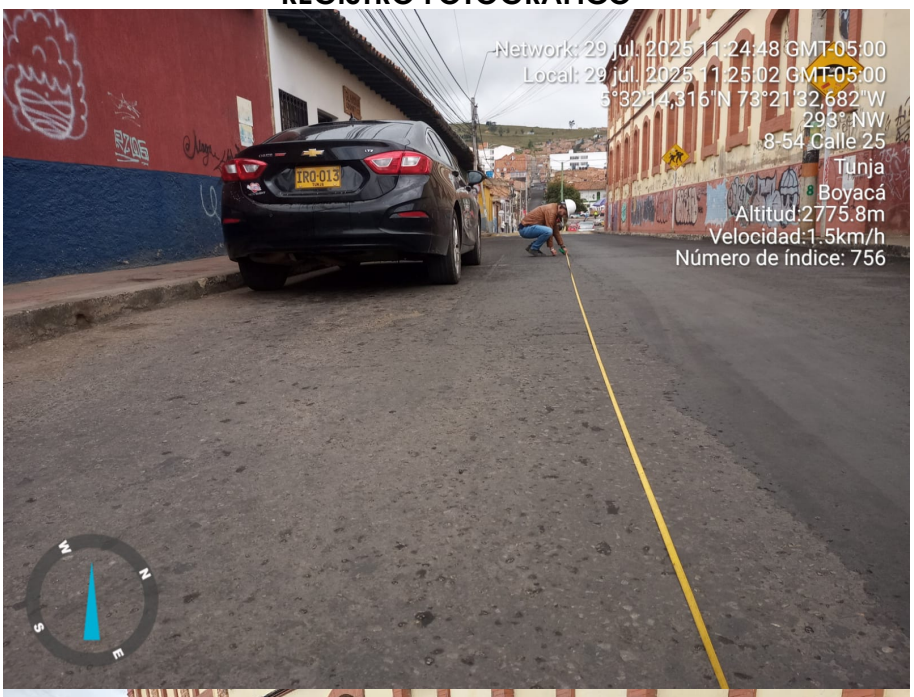


















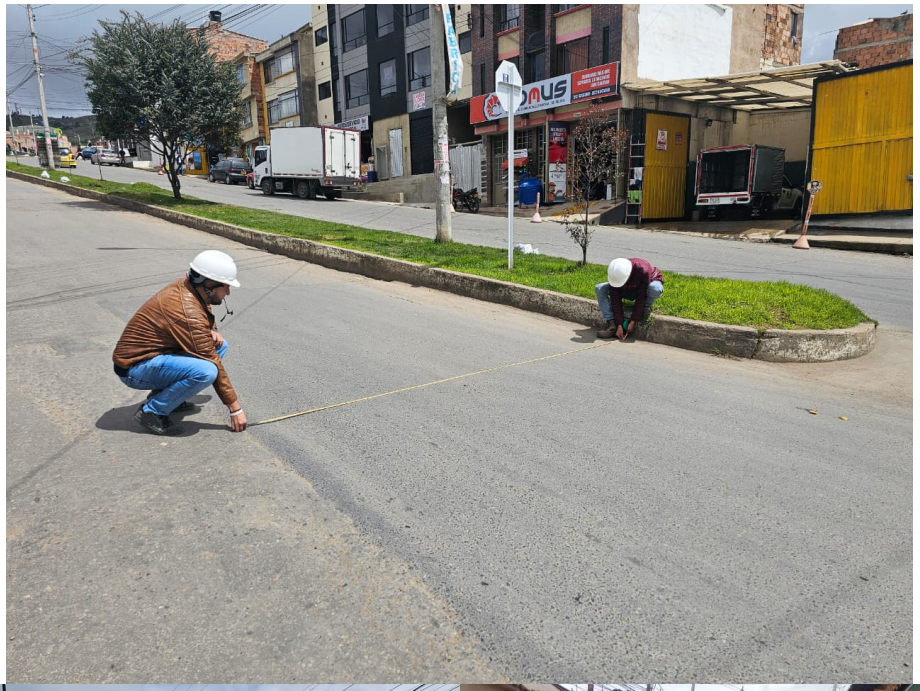

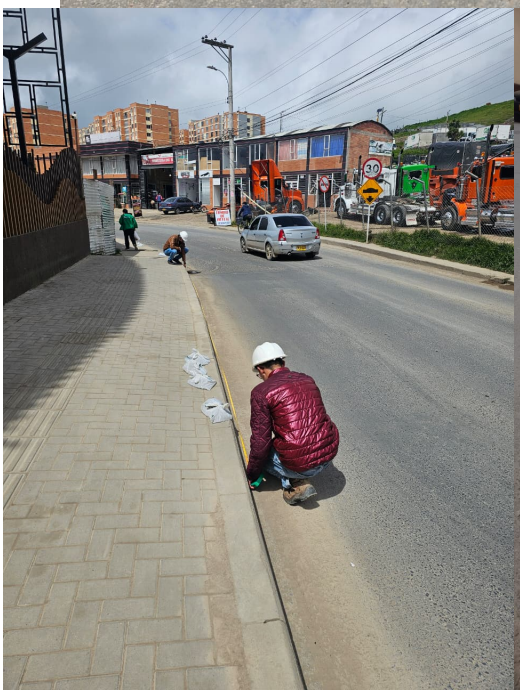


Network: 29 jul. 2025 10:03:49 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 10:04:04 GMT-05:00
5°31'55.191"N 73°22'5.301"W
206° SW
#17-48 Carrera 15
Tunja
Boyacá
Altitud:2830.2m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 709

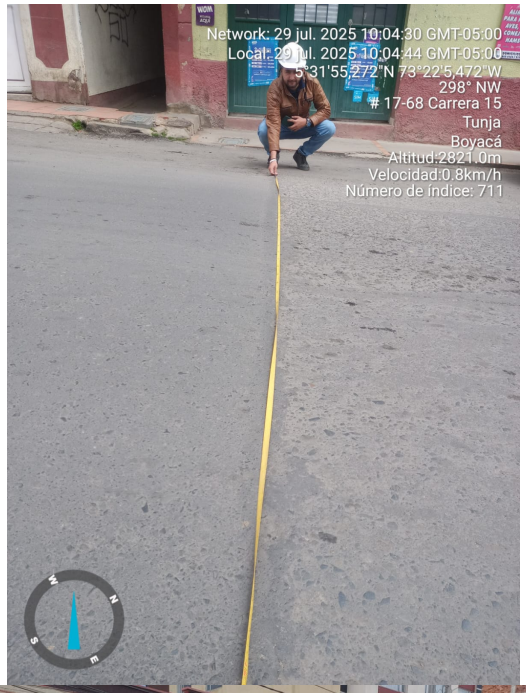

Network: 29 jul. 2025 10:04:30 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 10:04:44 GMT-05:00
5°31'55,272"N 73°22'5,472"W
298° NW
17-68 Carrera 15
Tunja
Boyacá
Altitud:2821.0m
Velocidad:0.8km/h
Número de índice: 711


Network: 29 jul. 2025 10:08:31 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 10:08:45 GMT-05:00
5°31'52,962"N 73°22'6,238"W
68° E
14A-97 Calle 17
Tunja
Boyacá
Altitud:2834.5m
Número de índice: 713


Network: 29 jul. 2025 10:07:00 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 10:07:14 GMT-05:00
5°31'52,602"N 73°22'5,682"W
343° N
14A-87 Calle 17
Tunja
Boyacá
Altitud:2821.5m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 712
N
W
E
S


Hops
Network: 29 jul. 2025 10:22:27 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 10:22:41 GMT-05:00
5°30'58,31"N 73°22'5,97"W
198° S
#1A-47 Calle A El Progreso
Tunja
Boyacá
Altitud:2813.9m
Velocidad:3.1km/h
Número de índice: 720
S
W
E
N

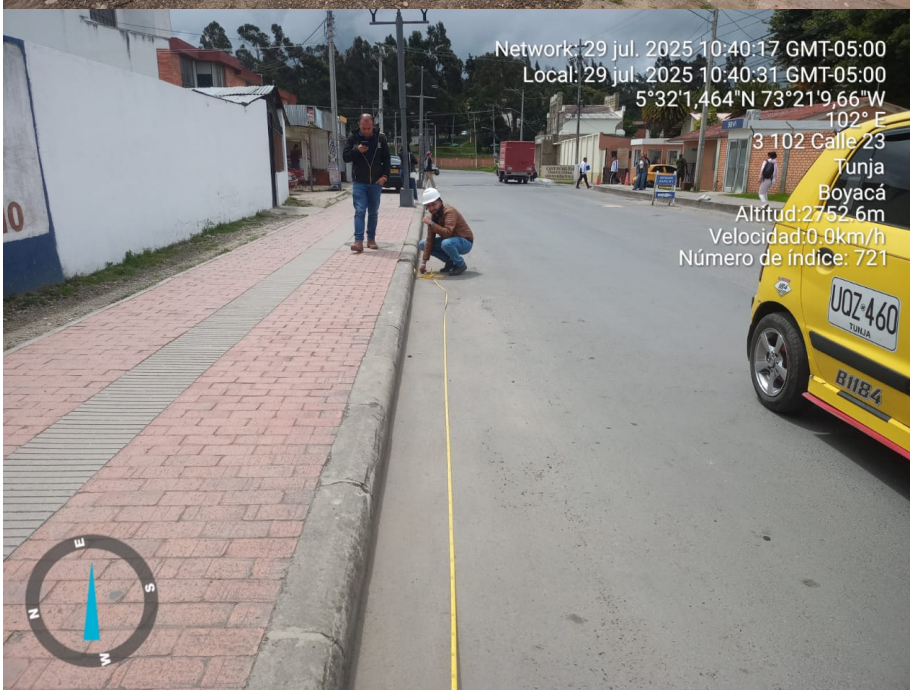


Network: 29 jul. 2025 10:40:17 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 10:40:31 GMT-05:00
5°32'1,464"N 73°21'9,66"W
102° E
3 102 Calle 23
Tunja
Boyacá
Altitud:2752.6m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 721
UOZ460
TUNJA
B1184
E
S
N
W


Network: 29 jul. 2025 10:55:18 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 10:55:33 GMT-05:00
5°33'3,018"N 73°20'37,988"W
213° SW
47-3 Carrera 2A
Tunja
Boyacá
Altitud:2716.1m
Número de índice: 733


Network: 29 jul. 2025 11:00:13 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 11:00:28 GMT-05:00
5°33'4,86"N 73°20'45,438"W
197° S
46 - 21 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
Altitud:2717.4m
Velocidad:1.1km/h
Número de índice: 734


Network: 29 jul. 2025 11:11:00 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 11:11:15 GMT-05:00
5°32'55,68"N 73°21'2,664"W
30° NE
41-4 Carrera 3
Tunja
Boyacá
Altitud:2718.3m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 737
N
E
S
W




Network: 29 jul. 2025 11:19:09 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 11:19:23 GMT-05:00
5°32'9,408"N 73°21'27,756"W
22° N
2408 Carrera 7
Tunja
Boyacá
Altitud:2763.2m
Velocidad:1.0km/h
Número de índice: 743


Network: 29 jul. 2025 11:20:36 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 11:20:51 GMT-05:00
5°32'10,596"N 73°21'27,252"W
301° NW
24-44 Carrera 7
Tunja
Boyacá
Altitud:2770.1m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 751


Network: 29 jul. 2025 11:11:16 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 11:11:31 GMT-05:00
5°32'55,566"N 73°21'2,442"W
334° NW
41-3 Carrera 2b
Tunja
Boyacá
Altitud:2719.3m
Velocidad:2.4km/h
Número de índice: 738


Network: 29 jul. 2025 11:27:01 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 11:27:15 GMT-05:00
5°32'15,162"N 73°21'34,38"W
312° NW
25-3 Carrera 10
Tunja
Boyacá
Altitud:2774.3m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 760


Network: 29 jul. 2025 11:27:03 GMT-05:00
Local: 29 jul. 2025 11:27:18 GMT-05:00
5°32'15,072"N 73°21'34,32"W
340° N
25-3 Carrera 10
Tunja
Boyacá
Altitud:2.771.4m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 761
N
W
E
S

FECHA PRESENTE ACTA:	31 de Julio de 2025
CONTRATO / CONVENIO N°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2580 DE 2024
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL SUMUNISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior:

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS	
COMPROMISO	**OBSERVACIÓN**
Allegar certificación de que los últimos tramos aprobados cumplen con las condiciones establecidas para su intervención	El municipio si allegó la información para darle trámite a la solicitud

DESARROLLO DEL COMITÉ

SE REÚNEN A LAS 2:10 P.M. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ LOS ABAJO FIRMANTES PARA DAR DESARROLLO AL COMITÉ CITADO POR LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ PARA TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS:

1. Revisar los avances del Convenio 2580-2024, celebrado entre la Gobernación de Boyacá y el Municipio de Tunja "para aunar esfuerzos entre el Municipio de Tunja y el Departamento de Boyacá para el suministro de mezcla asfáltica en caliente para el mantenimiento vial urbano en el Municipio de Tunja en el Departamento de Boyacá."

Se conversa sobre los avances realizados hasta la fecha, siendo intervenidos ya 13 de los 28 tramos que han sido aprobados por la supervisión desde la Gobernación de Boyacá. El Municipio de Tunja informó que envió una solicitud formal a la Gobernación para la aprobación de nuevos tramos, la cual se encuentra en revisión.

La Gobernación de Boyacá programará una visita técnica en la cual se revisarán los tramos a aprobar en los próximos días, y se le dará respuesta al oficio que radicó el municipio de Tunja.

2. Socializar los hallazgos identificados durante la visita técnica realizada por los profesionales designados por ambas entidades.

Se socializa primero el hallazgo del hundimiento percibido en el sector 5 esquinas sobre el tramo CALLE 17 ENTRE CRA 12 Y CRA 15. El municipio manifiesta que ya se ofició a VEOLIA quienes van a realizar un informe para ver si fue causante de que falló la tubería de alcantarillado la cuál tiene más de 30 años instaladas. También manifiestan que en caso de no ser el tubo se haría válida la póliza de estabilidad para con el contratista quién haría los arreglos correspondientes. Desde la Supervisión se manifiesta que este hallazgo no compromete el cumplimiento de los compromisos adquiridos para con el convenio.

El segundo hallazgo es el encontrado sobre la AV UNIVERSITARIA SENTIDO NORTE-SUR frente a la Universidad Santo Tomás. El municipio manifiesta que ya se han hecho los respectivos reportes a Curaduría Urbana y que será el privado que causó el daño el que hará la reparación de los daños. Se reitera que este hallazgo no compromete el cumplimiento de los compromisos adquiridos para con el convenio.

Por último, se comparte con el municipio que se confirmó que las medidas superficiales reportadas por el

Municipio en los tramos visitados y parches evaluados son correctas, lo que evidencia un adecuado levantamiento de información y planeación de las intervenciones.

3. Definir acciones conjuntas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Se acordó entre las partes dar solvencia en los próximos días a los informes que están pendientes del mes de Junio y Julio, con el fin de evitar acumulación de trabajo y atrasos en la gestión de la supervisión del convenio.

Luego de la socialización de los nuevos tramos a aprobar desde la Dirección de Desarrollo e Infraestructura Vial se le hace saber al municipio que cuenta con el apoyo de la Gobernación para que el mejoramiento de la carpeta asfáltica del área urbana del Municipio de Tunja, llegue a beneficiar a la mayor parte de la población, y que serán aprobadas dichas vías siempre y cuando cumplan con lo pactado en la CLAUSULA DÉCIMA del convenio numeral 2 que reza:

"(…)CLÁUSULA DECIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO

(…)

2 garantizar que las vías objeto de intervención cumplan con los siguientes requisitos:

-Vías urbanas cuya construcción sea mayor a Cinco (05) años. -Vías urbanas que cuenten con todas las redes de servicios públicos INSTALADAS y en buen estado, acorde a lo establecido en el RAS 2000. -Vías urbanas de uso público. – Vías urbanas con nomenclatura establecida dentro del EOT. -Vías urbanas que no se encuentren bajo alguna supervisión por parte de entidades como: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. -Vías urbanas que no se encuentren dentro de intervenciones próximas por parte de la alcaldía municipal (…)."

Esto será revisado en una visita técnica por parte de la supervisión para verificar que estos nuevos tramos, a parte de la condición anterior dada, sean tramos que son parte fundamental del circuito vial urbano que articula sectores comerciales, institucionales y residenciales.

Dado que estas vías no fueron incluidas en el listado inicial del convenio, su incorporación requiere concepto técnico previo y aprobación formal por parte del Comité realizando vista a campo para visualizar el estado en constancia se deja registro fotografió de la visita.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	**A convenir entre las partes, se notificará a través de oficio.**

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Realizar una visita técnica a los tramos nuevos solicitados para aprobación por parte del Municipio de Tunja		Gobernación de Boyacá
Allegar los informes de los meses Junio y Julio a la oficina de la Dirección de Desarrollo e Infraestructura		Municipio de Tunja

Vial		

PARTICIPANTES			
NOMBRE	**CARGO**	**CELULAR**	**FIRMA**
Lina María Bautista Avellaneda	**Secretaria de Infraestructura Territorial – Municipio de Tunja**	**310 871 3234**	
Oscar Rodríguez Tarazona	**Apoyo a la Supervisión del Convenio – Municipio de Tunja**	**313 233 5522**	
Oscar Iván Pinzón Sánchez	**Director de Desarrollo e Infraestructura Vial – Secretaría de Infraestructura Pública – Gobernación de Boyacá**	**311 451 3442**	
Steeven René Rojas Acero	**Apoyo a la Supervisión del Convenio – Secretaría de Infraestructura Pública – Gobernación de Boyacá**	**304 202 2369**	
