Agencia de Renovación del Territorio

**ACTA DE REUNIÓN N°:002**

**DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:** Arauca / Municipio de Tame

LUGAR: Plataforma Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDllMzA1YjgtY2E0NS00ZDU5LTgwODMtZDkwZWIxOTliNGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fd1013e-2a08-4c47-93d4-16e929a2ca61%22%2c%22Oid%22%3a%228583eee8-0ea4-49bc-af9a-d1a3b8d7d160%22%7d

Link de la grabación
Citación a comité operativo N° 2 Citación a comité operativo convenio 097-20255-20250819_142151-Grabación de la reunión.mp4

**FECHA:** 19/08/2025 **HORA:** 2:00 PM

**DEPENDENCIA QUE CONVOCA:** Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social

**OBJETIVO:**
Realizar la sesión No. 2 del Comité Operativo del Convenio 0097 de 2025, suscrito entre la Agencia de Renovación del Territorio y la Alcaldía Municipal de Tame, para hacer seguimiento al estado de avance contractual, financiero, técnico y social de la ejecución del objeto del Convenio: construcción de canchas múltiples y cerramientos en el municipio de Tame.

**AGENDA:**

| Ítem | Tema | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Llamado a lista y verificación del quórum | Johanna Mondragón Vélez |
| 2 | Revisión de compromisos del comité operativo 1 | Johanna Mondragón Vélez |
| 3 | Presentación de avances de la ejecución del contrato de obra | JENNY UPEGUI-CONTRATISTA INTERVENTORIA |
| 4 | Requerimientos pendientes | SEUPERVISION-APOYO ART-MUNICIPIO |
| 5 | Control social y fortalecimiento ICO | Vilma Dilia Figueroa Lucero. Apoyo Social Supervisión ART |
| 6 | Proposiciones y varios | Todos los participantes |
| 7 | Compromisos | Johanna Mondragón Vélez |

**DESARROLLO:**

1. **Verificación del Quórum:** Se confirma la participación de los miembros del Comité Operativo conforme al numeral 6.2.2 del anexo técnico del Convenio. Se cuenta con representación de la Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social (ART), la Dirección Territorial de la ART en Arauca, el equipo de supervisión de la ART, y la Alcaldía Municipal de Tame, incluyendo a la Oficina Asesora Jurídica, la Secretaría de Infraestructura. Se resalta la presencia de los apoyos técnico, financiero, jurídico y social asignados por la ART.Por parte del municipio de Tame se da la delegación por medio de la resolución N°1004 de 19/08/2025 a la Ing Jenny Upegui en representación del alcalde municipal.

- Desarrollar el proceso el ICO-ART-Municipio-contratistas

Se debe ir adelantando por parte de la persona delegada por el coordinador de la subregión de Arauca, las asociaciones y/o padres de familia-definir organización social ART

- Inconsistencia del informe financiero de Julio –municipio de Tame ( 20/08/2025)

Se solicita a la secretaria de hacienda soporte técnico con respecto a las deducciones de los anticipos

- Apropiación estudios y diseños –tema cancha Julieros (CONTRATISTA BALANCE 5/09/2025)

Se le requiere al contratista de obra e interventoría presentar el análisis técnico financiero parap oder construir la cancha en el sitio donde se encuentra la institución, esto también fue un requerimiento de la comunidad en la socialización de los contratos, ya que actualmente está destinada para hacerse a unos 500 m aproximadamente la cual quedaría fuera de la institución educativa sin cerramiento. La supervisora Ing. Jenny Upegui manifestó que de esta manera esta desde la etapa de factibilidad del proyecto.

5. **Control social y fortalecimiento ICO:**

La profesional de la ART, Vilma Figueredo, resaltó la importancia del control social como mecanismo de participación ciudadana, en el marco de la Ley 1757 de 2015. Señaló que los comités de control social y seguimiento no actúan como supervisores, sino como garantes de la veeduría y acompañamiento a los recursos invertidos en los territorios, asegurando la transparencia, la sostenibilidad de los proyectos y la incidencia de las comunidades en la resolución de problemas.

Destacó la necesidad de fortalecer la participación activa de los representantes comunitarios en el conocimiento del POA, cronogramas y recursos, así como en visitas de campo junto a interventores y contratistas, de modo que puedan rendir cuentas a sus comunidades y contribuir en la solución de barreras locales.

En un segundo eje, subrayó el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales, proceso respaldado en marcos jurídicos y en el Acuerdo de Paz, con el fin de empoderarlas para garantizar la sostenibilidad de los proyectos, especialmente en educación y salud. Para ello, se propone a los compañeros de la regional, focalizar organizaciones sociales afines (por ejemplo, asociaciones de padres de familia en los centros educativos), aplicar instrumentos de diagnóstico (ICO) y coordinar con autoridades étnicas para identificar las organizaciones pertinentes en territorios indígenas.

que el día de las socializaciones también hubo conformación de veeduría ciudadana por los asistentes, se realizo las actas de vecindad de los predios y recintos junto a las instituciones y se ha generado los siguientes actos administrativos:

resolución N° 801 del 09 de Julio de 2025 por la cual se "Aprueba y concede la licencia urbanistica modalidad intervención y ocupación de espacio público y cerramiento" la cual rige a partir del 24 de Julio, fecha en la cual vence el plazo de publicación del edicto en medio de comunicación radial.

Respecto a la programación de las obras para la semana 4 se presenta el programado vs el ejecutado:

| | SEMANA | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| **FLUJO DE INVERSIÓN** | Miles de $ | $ 103.116.663,45 | $ 143.330.790,30 |
| **PROGRAMADA SEMANAL** | % | **2,86%** | **3,98%** |
| **FLUJO DE INVERSIÓN** | Miles de $ | $ 103.116.663,45 | $ 143.330.790,30 |
| **PROGRAMADA ACUMULADA** | % | 2,86% | |

El interventor menciono que se tienen dos frentes de trabajo, uno en la la IE Cristobal Colon donde se vienen desarrollando las siguientes actividades:

**CERRAMIENTO**

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM

VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I

COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I

**CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA CRISTOBAL COLÓN**

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO

1939
~~2111~~

Agencia de Renovación del Territorio

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | obligaciones contractuales de la interventoría. | | | |

**FIRMA ASISTENTES:**

| Nombre | Cargo / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Edith Zulima Rojas Gómez | Subdirector de la subdirección de Reconciliación y Desarrollo social de la ART/ Supervisora | ART | EDITH ZULIMA ROJAS GOMEZ Firmado digitalmente por EDITH ZULIMA ROJAS GOMEZ Fecha: 2025.09.02 14:19:32 -05'00' |
| Víctor Manuel Bohórquez | Coordinador de la ART regional | ART Arauca | |
| Jenny Upegui | Supervisor del convenio (ente territorial). | municipio de Tame | |
| Jenny Upegui | Representante legal del ente territorial o quien este designe. | municipio de Tame | |

**Anexos:**

1. Registro fotográfico de la sesión presencial
2. Pantallazos de la sesión virtual
3. Presentación Comité
4. Resolución de delegación Municipio de Tame
5. Presentación seguimiento de obra
6. Seguimiento POA corte 14/07/2025
7. Registro de asistencia.

Proyecto: Johanna Mondragón Vélez –Secretaria técnica


Aprobó: Zulima Rojas Gómez- Supervisora convenio 097-2025



Scanned with CamScanner

Agencia de Renovación
del Territorio

2. Pantallazos de la sesión virtual

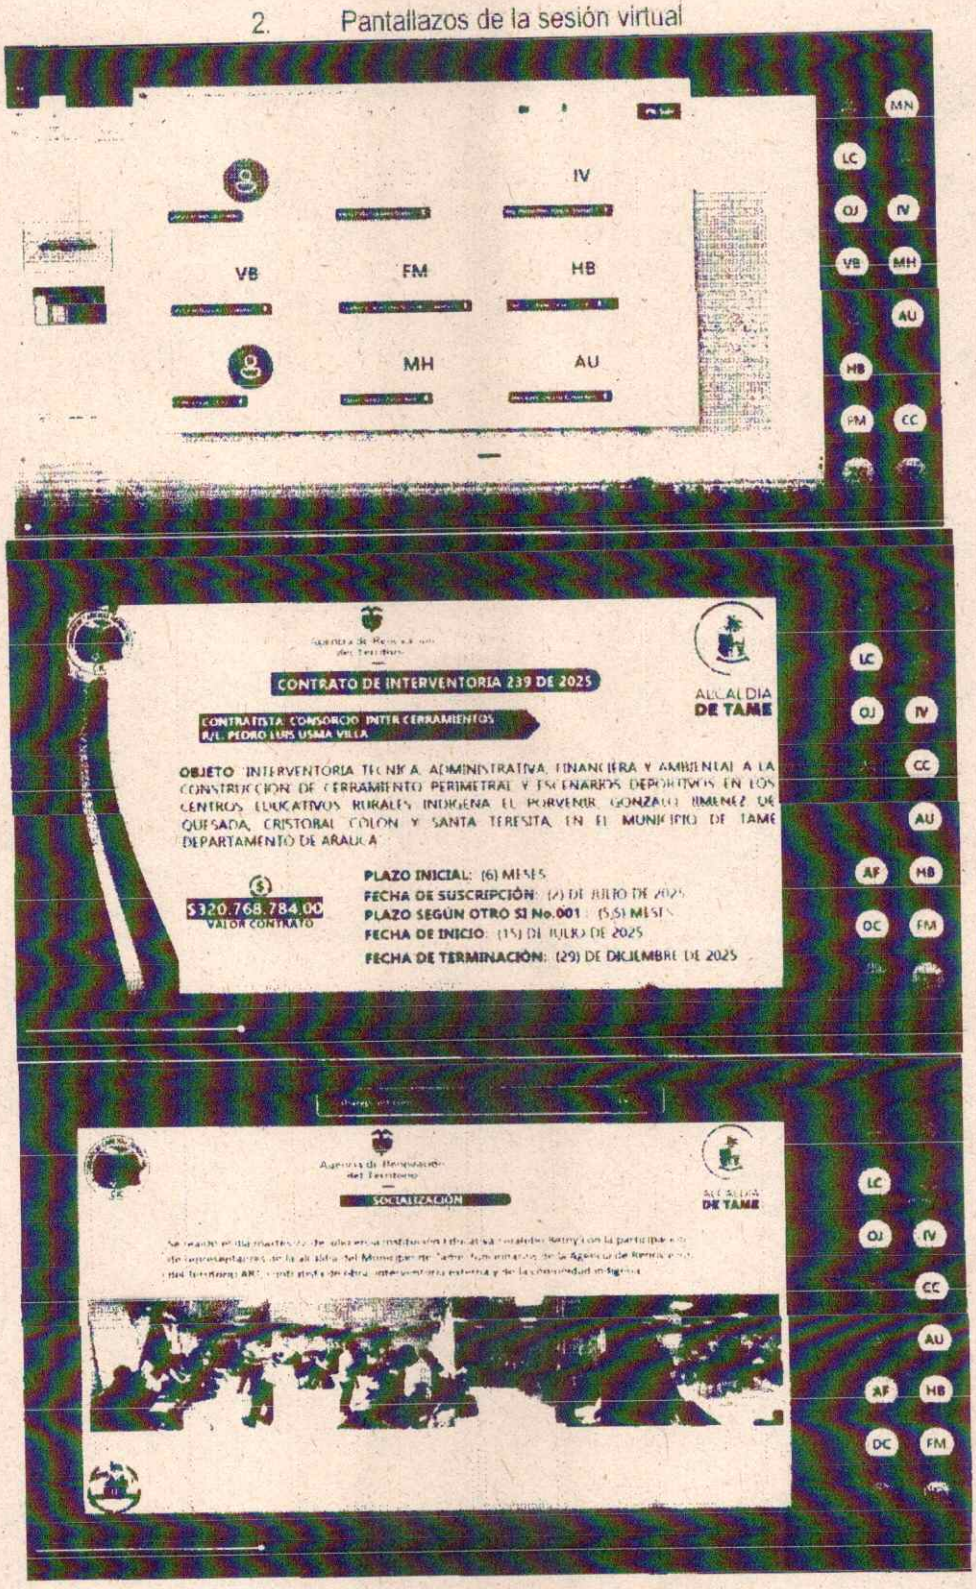




Programas Desarrollo Enfoque Territorial

1941

Agencia de Renovación del Territorio


Agencia de Renovación del Territorio

ALCALDÍA DE TAME

## ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS


| 35,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | m2 |
|---|---|---|
| Cantidad contractual | Cantidad Ejecutado | % Avance |
| 336,20 | 336,20 | 100 |

EVIDENCIA



| 28,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | m2 |
|---|---|---|
| Cantidad contractual | Cantidad Ejecutada | % Avance |
| 672 | 672 | 100 |


EVIDENCIA



Agencia de Renovación del Territorio

ALCALDÍA DE TAME

## VISITAS ART VERIFICACION AVANCES

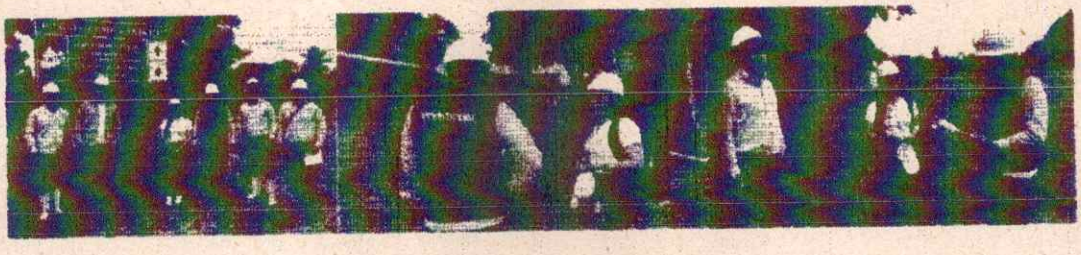

# ANEXO 2.
# COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA MES DE AGOSTO

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca.
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
311249131?

1943

# CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958.438-2

R/ Libardo Hoy 7
04/08/2025
10:00 AM

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962439-1

Tame Arauca, 04 de agosto de 2025

Señores
**CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC**
**R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO**
Contratista de Obra

**Referencia:** Solicitud de Documentos Técnicos

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en medio de mis funciones como interventoría externa del contrato de Obra No. 251 de 2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, me permito solicitar la siguiente documentación:

- Diseño de mezcla de concreto de 3000 psi.
- Certificados de calidad del acero de Refuerzo y cemento.
- Documentos de cantera de agregados pétreos

Quedo atento a cualquier manifiesto de su parte.

Atentamente;

**PEDRO LUIS OSMA VILLA**
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

1944

# CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958.438-2

R/ Libardo Sarmiento 06/08/2025 09:35 AM

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC NIT. 901962979-1

Tame Arauca, 06 de agosto de 2025

Señores
**CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC**
**R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO**
Contratista de Obra

**Referencia:** Solicitud de Informe mensual No.01 Julio 2025- Contrato de Obra 251 de 2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en medio de mis funciones como interventoría externa del contrato de Obra No. 251 de 2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, me permito solicitar de acuerdo a la cláusula 10 del contrato OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA; El informe de actividades de obra No 01. Correspondiente al periodo del 15 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025 con sus respectivos soportes y aspectos administrativos, jurídicos, técnicos, financieros y ambientales.

Adicionalmente se solicita informar la gestión adelantada para la ubicación de la respectiva vaya informativa.

Quedo atento a cualquier manifiesto de su parte.

Atentamente;

**PEDRO LUIS USMA VILLA**
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

Carrera 22 No.16-63 Barrio el Cielo Tame – Arauca
intercerramiento@gmail.com
Tel 3142787705

1945

# CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Recibi
05-08-25.
2:00 pm.

Tame, 05 de Agosto de 2025

Señores:
**CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS**
**R/L PEDRO LUIS USMA VILLA**
**Ciudad**

**Ref.** Respuesta solicitud documentos técnicos

**Cordial saludo.**

Por medio de la presente me permito remitir diseño de mezcla, certificados de calidad de Refuerzos y Cemento y documentos de la cantera Playa Blanca usados para la ejecución del Contrato de Obra Pública N°. 251 de 2025 cuyo objeto es la **CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENAS EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

Libardo Sarmiento
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT 901962949-1

**LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO**
**R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC**

**Anexo:**

- Diseño de mezcla
- Certificado de Calidad
- Documentos de Cantera

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

1946

~~2805~~

# CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Tame, 08 de Agosto de 2025

Recibí
08-8-25
08:00 am.

Señores:
**CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS**
**R/L PEDRO LUIS USMA VILLA**
**Ciudad**

**Ref.** Respuesta solicitud informe mensual

**Cordial saludo,**

Por medio de la presente me permito remitir informe mensual correspondiente al periodo del 15 al 31 de Julio del año 2025 para la ejecución del **Contrato de Obra Pública N°. 251 de 2025** cuyo objeto es la **CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENAS EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

Libardo Sarmiento M.

**LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO**
**R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC**

Anexo:

- Informe mensual

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

# ANEXO 3.
# COPIA DE BITÁCORA DE OBRA

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

1948
~~3087~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| FECHA | Viernes, 01 de agosto de 2025 | Hoja No: | 18 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE | ALCALDIA DE TAME | OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| CONTRATISTA DE OBRA | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| CONTRATO DE OBRA | Nº 251 de 2025 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | 1 | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 2 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**
Se da inicio a la actividad de localización y replanteo topografico del perimetro del cerramiento (428,80 m2) y cancha multiple (672 m2)
Se inicia actividad de descapote manual del perimetro del cerramiento y cancha multiple. (100 m2)
Se da inicio a la actividad de excavación manual para zapatas (13,38 m3 - Eje 1)

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**
Se da inicio a la actividad de localización y replanteo topografico del perimetro del cerramiento (194,78 m2 eje A-B) y cancha multiple (336 m2)

**ITEM EJECUTADOS**
17,1 - 20,1 Localización y replanteo topográfico
17,2 Excavación manual en material común
20,4 Descapote y nivelación manual del terreno
25,1 - 28,1 Localización y replanteo topográfico

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Equipo de Topografia | 1 | Bueno |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| NOMBRE: | CLAUDIA SEGURA | NOMBRE: | LEONARDO CAMARGO |
| CARGO: | RESIDENTE DE OBRA | CARGO: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| T.P | A1062022-1010221789 | T.P | 68202-359088 STD |

1949

~~3070~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| FECHA | Sabado, 02 de agosto de 2025 | Hoja No: | 19 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | 1 | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 2 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLON):**

Se continua con la excavacion en material común para zapatas (21,21 m3 Eje A-B)

Se inicia con el corte figurado y amarre de acero de refuerzo para zapatas y pedestales

Se inicia con las excavaciones para las vigas de cimentación. (11,87 m3 Eje 1-A)

Se continua con el descapote manual del perimetro de la cancha multiple (100 m2)

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

Se continua con la actividad de localización y replanteo topografico del perimetro del cerramiento (121,42 m2 eje 1-2) y cancha multiple (336 m2)

**ITEM EJECUTADOS**

17.2 Excavación manual en material común

18.4 Acero de refuerzo 60000 PSI

20.4 Descapote y nivelación manual del terreno

25.1 - 28.1 Localización y replanteo topográfico

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1950

~~391~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Domingo, 03 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | | Ayudantes | | Secretario | |
| Ingenieros | | Topografo | | HSEQ | |
| Conductores | | Cadeneros | | Inspectores | |
| Oficiales | | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

Dia dominal, no se realizaron actividades

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

| Si | | No | |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

Hubo Lesión?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **NOMBRE:** | CLAUDIA SEGURA | **NOMBRE:** | LEONARDO CAMARGO |
| **CARGO:** | RESIDENTE DE OBRA | **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| **T.P** | A1052022-1010221789 | **T.P** | 68202-359088 STD |

1951

~~3012~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| FECHA | Lunes, 04 de agosto de 2025 | Hoja No: | 21 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | 1 | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 2 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se continua con la excavacion manual para zapatas (9,18 m3 - Eje 2)

Se continua con la excavacion manual para vigas de cimentación (12,16 m3 Ejes B-2)

Se continua con el descapote manual del area de la cancha multiple (200 m2)

Se continua con el corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para zapatas y pedestales

Se incia con el corte de madera para pedestales

**ITEM EJECUTADOS**

17,2 Excavación manual en material común

18,4 Acero de refuerzo 60000 PSI

20,4 Descapote y nivelación manual del terreno (33,8 m2)

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| NOMBRE: | CLAUDIA SEGURA | NOMBRE: | LEONARDO CAMARGO |
| CARGO: | RESIDENTE DE OBRA | CARGO: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| T.P | A1052022-1010221789 | T.P | 68202-359088 STD |

1952

~~3073~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| FECHA | Martes, 05 de agosto de 2025 | Hoja No: | 22 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | 1 | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 2 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se continua con el corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para zapatas y pedestales

Se incia el vaciado de solado pobre de limpieza de 2500 PSI para zapatas y vigas de cimentación (77,31 m2 Ejes 1-B)

Se incia con el vaciado de zapatas en concreto de 3000 PSI (1,68 m3 - Eje 1)

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

**NOTA:** Se realizaron trabajos con maquinaria pajarita para acceso a la comunidad Roqueros, se traen viajes de material crudo para conformación de via

**NOTA:** Se tomaron muestras para ensayo de laboratorio de elementos de zapatas en Generaros

**ITEM EJECUTADOS**

18,1 Concreto de 2500 PSI solado E=5 CM

18,4 Acero de refuerzo 60000 PSI

18,7 Zapatas en concreto de 3000 PSI para gradena

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| Pajarita | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1953

~~3014~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Miercoles: 06 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topografo | 1 | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 2 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se continua con el corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas de cimentacion y zapatas

Se inicia con el encofrado de pedestales y su respectivo vaciado de concreto de 3000 PSI (24 ml - Eje 1)

Se realiza vaciado de zapatas con concreto de 3000 PSI (1,88 m3 - Eje 1)

Se inicia con la instalacion de aceros para vigas de cimentación

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

Se continua con la conformacion y arreglos de la via de acceso a la comunidad de Roqueros

**NOTA:** Se recibe visita del Director de Intrventoria, se realiza recorrido por las diferentes actividades en ejecución junto con el contratista de obra

**ITEM EJECUTADOS**

18.4 Acero de refuerzo 60000 PSI

18.3 Columneta de 20x20 cm en concreto de 3000 PSI

18.7 Zapatas en concreto de 3000 PSI

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| Pajarita | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **NOMBRE:** | CLAUDIA SEGURA | **NOMBRE:** | LEONARDO CAMARGO |
| **CARGO:** | RESIDENTE DE OBRA | **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| **T.P** | A1052022-1010221789 | **T.P** | 68202-359088 STD |

1954

2025

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| FECHA | Jueves, 07 de agosto de 2025 | Hoja No: | 24 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | | Ayudantes | | Secretario | |
| Ingenieros | | Topógrafo | | HSEQ | |
| Conductores | | Cadeneros | | Inspectores | |
| Oficiales | | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

Dia festivo, no se realizaron actividades

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| NOMBRE: | CLAUDIA SEGURA | NOMBRE: | LEONARDO CAMARGO |
| CARGO: | RESIDENTE DE OBRA | CARGO: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| T.P | A1052022-1010221789 | T.P | 68202-359088 STD |

1955

~~396~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Viernes, 08 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | 1 | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleade | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se incia encofrado de vigas de cimentación

Se continua con el corte, figurado y amarre de aceros de refuerzo para zapatas, pedestales y vigas de cimentación.

Se realizo vaciado de concreto de 3000 PSI para pedestales (23 ml - Eje B)

Se realizo vaciado de concreto de limpieza solado zapatas ( 24,54 m2 Eje A-2)

Se realizo vaciado de concreto de 3000 PSI para zapatas (3,16 m3 - Eje B)

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

En la comunidad Roqueros se termina de arreglar el acceso a la comunidad con material de crudo de rio.

**ITEM EJECUTADOS**

18.1 Concreto de 2500 PSI solado E=5 CM

18.3 Columneta de 20x20 cm en concreto de 3000 PSI

18.4 Acero de refuerzo 60000 PSI

18.7 Zapatas en concreto de 3000 PSI

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| Pajarita | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1956

~~251~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Sabado, 09 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | X | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAROS (ESCUELA CRISTOBAL COLON):**

Se continua con el corte, figurado y amarre de aceros de refuerzo para vigas de cimentación

Se realizó el desencofreado de pedestales

Se realizo vaciado de concreto de limpieza solado para vigas de cimentación ( 30,28 m2 Eje A-2)

Se realizó el vaciado de concreto de 3000 PSI para zapatas. (2,45 m3 Eje 2)

**ITEM EJECUTADOS**

18,1 Concreto de 2500 PSI solado E=5 CM

18,4 Acero de refuerzo 60000 PSI

18,7 Zapatas en concreto de 3000 PSI

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1957

~~2018~~

| | |
|---|---|
| | **BITACORA DIARIA DE OBRA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Domingo, 10 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

| **Personal en Obra** | | | | | | **Estado del Tiempo / Duración** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cargo** | **Cantidad** | **Cargo** | **Cantidad** | **Cargo** | **Cantidad** | | **a.m.** | **p.m.** |
| Ing. Ambiental | | Ayudantes | | Secretario | | Soleado | | |
| Ingenieros | | Topógrafo | | HSEQ | | Seco | | |
| Conductores | | Cadeneros | | Inspectores | | Nublado | | |
| Oficiales | | Paleteros | | | | Lluvia Pasajera | | |
| | | | | | | Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

Dia dominical, no se realizaron actividades

| **Equipos en Obra** | | | **Accidentes en Obra** | |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Cant.** | **Estado** | Ocurrio Algun Accidente? | |
| | | | Si | No |
| | | | | |
| | | | Hora: | |
| | | | Nombre: | |
| | | | Cargo: | |
| | | | Actividad que Desempeñaba: | |
| | | | | |
| | | | Hubo Lesión? | |
| | | | Si | No |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1958
~~3004~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Lunes, 11 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | X | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó encofrado de pedestales

Posteriormente se realizó el vaciado en concreto de 3000 PSI para pedestales (17.00 ml - Eje 2)

Se realizó el vaciado de zapatas del porton principal (0.236 m3 - Eje B)

Se inicio con el vaciado de concreto de 3000 PSI de vigas de cimentación (50 ml - Eje 1)

Se continua con el corte, figurado y amarra de acero de refuerzo para vigas de cimentación

**NOTA:** Se realizó visita del director de interventoria junto con los contratistas de obra, se realizaron los recorridos en cada actividad en ejecución, por parte de la interventoria se recibieron recomendaciones en temas de aseo y limpieza de las zonas de trabajo.

**NOTA:** Se tomaron muestras para ensayo de laboratorio de elementos de vigas de cimentación en Genareros.

**ITEM EJECUTADOS**

18.2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 en concreto de 3000 PSI

18.3 Columneta de 20x20 cm en concreto de 3000 PSI

18.4 Acero de refuerzo 60000 PSI

18.7 Zapatas en concreto de 3000 PSI para graderia

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1959
~~3100~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Martes, 12 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó el desencofrado de pedestales

Se continuo con el encofrado de viga de cimentación

Posteriormente se realizó el vaciado de concreto de 3000 PSI para vigas de cimentación (50 ml - Eje 1)

Se realizó el vaciado en concreto de 3000 PSI para pedestales (15,50 ml - Eje A)

**NOTA:** La interventoria realizo toma de muestras de concreto para viga de cimentación en la comunidad genareros

**ITEM EJECUTADOS**

18.2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 en concreto de 3000 PSI

18.3 Columneta de 20x20 cm en concreto de 3000 PSI

18.4 Acero de refuerzo 60000 PSI

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA.** | |
| **OBRA:** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **NOMBRE:** | CLAUDIA SEGURA | **NOMBRE:** | LEONARDO CAMARGO |
| **CARGO:** | RESIDENTE DE OBRA | **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| **T.P** | A1052022-1010221789 | **T.P** | 68202-359088 STD |

1960

3101

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| FECHA | Miercoles, 13 de agosto de 2025 | Hoja No: | 30 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | X | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó desencofrado de pedestales

Se continua con el corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas de cimentación

Se realizó el vaciado de vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI (22.40 ml - Eje 1)

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

Se realizó descapote perimetral del cerramiento

**NOTA:** Se realizó visita a obra por parte de la interventoria en compañía de representantes de la ART, junto con el contratista haciendo verificación de materiales en obra procesos constructivos, personal idoneo y avance general de las actividades en obra

**ITEM EJECUTADOS**

18.2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 en concreto de 3000 PSI

18.4 Acero de refuerzo 60000 PSI

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| NOMBRE: | CLAUDIA SEGURA | NOMBRE: | LEONARDO CAMARGO |
| CARGO: | RESIDENTE DE OBRA | CARGO: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| T.P | A1052022-1010221789 | T.P | 68202-359088 STD |

1961

~~3107~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Jueves, 14 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó desencofrado de vigas de cimentación

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas de cimentación

Se realizó encofrado y posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI para zapatas (2,30 m3- Eje A)

Se realizó vaciado de concreto de 3000 PSI para vigas de cimentación (50 ml - Eje B)

**ITEM EJECUTADOS**

18,2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 en concreto de 3000 PSI

18,4 Acero de refuerzo 60000 PSI

18,7 Zapatas en concreto de 3000 PSI

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **NOMBRE:** | CLAUDIA SEGURA | **NOMBRE:** | LEONARDO CAMARGO |
| **CARGO:** | RESIDENTE DE OBRA | **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| **T.P** | A1052022-1010221789 | **T.P** | 68202-359088 STD |

1962
~~3103~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Viernes, 15 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topografo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas de cimentación perimetral

Se realizó encofrado de vigas de cimentación y posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI (68,10 ml - Eje B)

Se realizo relleno interno y externo de las vigas de cimentación con material de excavación

**ITEM EJECUTADOS**

18.2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 en concreto de 3000 PSI

18.4 Acero de refuerzo 60000 PSI

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **NOMBRE:** | CLAUDIA SEGURA | **NOMBRE:** | LEONARDO CAMARGO |
| **CARGO:** | RESIDENTE DE OBRA | **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| **T.P** | A1052022-1010221789 | **T.P** | 68202-359088 STD |

1963

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Sabado, 16 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó desencofrado de vigas de cimentación

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas de cimentación perimetral

Se realizó encofrado de vigas y posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI (40 ml - Eje 2)

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para columnetas

**ITEM EJECUTADOS**

18.2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 en concreto de 3000 PSI

18.4 Acero de refuerzo 60000 PSI

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**cidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| OBRA: | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| NOMBRE: | CLAUDIA SEGURA | NOMBRE: | LEONARDO CAMARGO |
| CARGO: | RESIDENTE DE OBRA | CARGO: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| T.P | A1052022-1010221789 | T.P | 68202-359088 STD |

1964

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| FECHA | Domingo, 17 de agosto de 2025 | Hoja No: | 34 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | | Ayudantes | | Secretario | |
| Ingenieros | | Topógrafo | | HSEQ | |
| Conductores | | Cadeneros | | Inspectores | |
| Oficiales | | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

Dia dominical, no se realizaron actividades

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

| Si | | No | |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

Hubo Lesión?

| Si | | No | |
|---|---|---|---|

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| NOMBRE: | CLAUDIA SEGURA | NOMBRE: | LEONARDO CAMARGO |
| CARGO: | RESIDENTE DE OBRA | CARGO: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| T.P | A1052022-1010221789 | T.P | 68202-359088 STD |

1965

~~3195~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Lunes, 18 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | | Ayudantes | | Secretario | |
| Ingenieros | | Topógrafo | | HSEQ | |
| Conductores | | Cadeneros | | Inspectores | |
| Oficiales | | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

Dia festivo, no se realizaron actividades

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

| Si | | No | |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

Hubo Lesion?

| Si | | No | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1966
~~310~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Martes, 19 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó desencofrado de vigas de cimentación
Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas de cimentación
Se realizó encofrado de vigas y posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI (44,60 ml - Eje 2)
Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para columnetas

**ITEM EJECUTADOS**

18.2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 en concreto de 3000 PSI
18.4 Acero de refuerzo 60000 PSI

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **NOMBRE:** | CLAUDIA SEGURA | **NOMBRE:** | LEONARDO CAMARGO |
| **CARGO:** | RESIDENTE DE OBRA | **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| **T.P** | A1052022-1010221789 | **T.P** | 68202-359088 STD |

1967
~~3198~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Miercoles, 20 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó desencofrado de vigas de cimentación

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas de cimentación

Se realizó encofrado de vigas de cimnetación y posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI (40 ml - Eje A)

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para columnas de 30x30 de los portones

Se construyó las formaletas para las columnas de 30x30

Llegó material de ladrillo a la vista, se realiza el respectivo descargue

**ITEM EJECUTADOS**

18,2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 en concreto de 3000 PSI

18,4 Acero de refuerzo 60000 PSI

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| Formaleta en madera | 2 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **NOMBRE:** | CLAUDIA SEGURA | **NOMBRE:** | LEONARDO CAMARGO |
| **CARGO:** | RESIDENTE DE OBRA | **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| **T.P** | A1052022-1010221789 | **T.P** | 68202-359088 STD |

1968
~~359~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| FECHA | Jueves, 21 de agosto de 2025 | Hoja No: | 38 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó desencofrado de vigas de cimentación
Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para vigas de cimentación
Se realizó encofrado de vigas y posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI (35,5 ml - Eje A)
Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para columnas de 30x30 de los portones
Se inició con el encofrado de columnas de 30x30 para los portones de acceso y se fundieron en concreto de 3000 psi (7,4 ml - Eje 1)
Se realiza la instalación de estribos para columnetas
Se realizó revisión de materiales para la placa de la cancha

**ITEM EJECUTADOS**

18.2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 en concreto de 3000 PSI
18.4. Acero de refuerzo 60000 PSI
18.6 Columna de 30x30 en concreto de 3000 PSI

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| Formaleta en madera | 2 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| OBRA: | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| NOMBRE: | CLAUDIA SEGURA | NOMBRE: | LEONARDO CAMARGO |
| CARGO: | RESIDENTE DE OBRA | CARGO: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| T.P | A1052022-1010221789 | T.P | 68202-359088 STD |

1969

~~CIC~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| FECHA | Viernes, 22 de agosto de 2025 | Hoja No: | 39 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó desencofrado de vigas de cimentación

Se realizó la respetiva limpieza de formaleta

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para columnas de 30x30 de los portones

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para columnetas 20x20

Se continua con las formaletas para las columnetas

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

En la comunidad de Roqueros se hace entrada de material petreo para rellenos del area de la cancha, crudo de 4" y sub base granular

Se realiza acopio en el lugar indicado

Se inician actividades de descapote y nivelación manual del terreno en zona de cancha multiple (250 m2)

**ITEM EJECUTADOS**

18,4 Acero de refuerzo 60000 PSI

18,6 Columna de 30x30 en concreto de 3000 PSI

28,4 Descapote y nivleación Manual del Terreno

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| *Formaleta en madera* | 2 | *Bueno* |
| Volqueta | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora | | | |
| Nombre | | | |
| Cargo | | | |
| Actividad que Desempeñaba | | | |
| | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1970

~~311~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Sabado, 23 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó desencofrado de columnas para portones de acceso

Se continuó con el encofrado de columnas de 30x30 para portones

Se realizó fundida de columas de 30x30 en concreto de 3000 PSI (7,4 ml - Eje B)

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para columnetas

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

En la comunidad de Roqueros se continua con el acopio de materiales de sub base granular auxiliares.

Se continuan actividades de descapote y nivelación manual del terreno en zona de cancha multiple (222 m2)

**ITEM EJECUTADOS**

18,4 Acero de refuerzo 60000 PSI

18,6 Columna de 30x30 en concreto de 3000 PSI

28,4 Descapote y nivleación Manual del Terreno

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 2 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Formaleta en madera | 2 | Bueno |
| Volqueta | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Hora | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Actividad que Desempeñaba | |

Hubo Lesión?

| Si | | No | X |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1971

~~312~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Domingo, 24 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | | Ayudantes | | Secretario | |
| Ingenieros | | Tepógrafo | | HSEQ | |
| Conductores | | Cadeneros | | Inspectores | |
| Oficiales | | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nubiado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

Dia dominical, no se realizaron actividades

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

Si | No

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si | No

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **NOMBRE:** | CLAUDIA SEGURA | **NOMBRE:** | LEONARDO CAMARGO |
| **CARGO:** | RESIDENTE DE OBRA | **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| **T.P** | A1052022-1010221789 | **T.P** | 68202-359088 STD |

1972

~~373~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Lunes, 25 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 8 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó desencofrado de columas de 30x30 en los portones de acceso principal

Se realizó acopio de material petreo en la zona donde quedara la cancha multiple (crudo de 4" y sub base granular)

Se continua con el descapote y nivelación del terreno de la cancha multiple y graderias (301,40 m2)

Se terminó corte, amarre y figurado de acero de refuerzo para las columnetas.

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

Se dio inicio a la excavacion manual de zapatas ( 9,72 m3 - Eje B)

Se realizó excavación manual para vigas de cimentación ( 6,52 m3 - Eje B)

Se termina de acomodar el acopio de material petreo

Se finalizan actividades de descapote y nivelación manual del terreno en zona de cancha multiple y graderias (229,40 m2)

**ITEM EJECUTADOS**

18,4 Acero de refuerzo 60000 PSI

18,6 Columna de 30x30 en concreto de 3000 PSI

20,4 Descapote y nivelación manual del terrno

25,2 Excavación manual en material comun

28,4 Descapote y nivleación Manual del Terreno

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 3 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Volqueta | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrió Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora | | | |
| Nombre | | | |
| Cargo | | | |
| Actividad que Desempeñaba | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1973
~~314~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Martes, 26 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 8 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | X | X |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**
Se realizó extendida de material crudo de 4" para relleno y nivelación en la zona de la cancha multiple (117,6 m3)

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**
Se realizó excavación manual para zapatas ( 5,28 m3 - Eje 2)
Se realizó excavación y nivelación de terreno natural para viga de cimentación (2,64 m3 - Eje 2)
Se fabricaron cajones para pedestales
Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para zapatas y columnetas
Se realizó el vaciado de concreto de 3000 PSI para zapatas (2,59 m3- Eje B)
Se realizó el vaciado de concreto de 2500 PSI para solado (45,03 m2 - Ejes B-2)
Se realizó el extendido y compactación de material petreo (crudo de 4") para relleno en la zona de la cancha multiple (117,6 m3)
**NOTA:** Se tomaron muestras para ensayo de laboratorio de elementos de zapatas en Roqueros

**ITEM EJECUTADOS**
20,5 Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño maximo 4"
25,2 Excavación manual en material comun
26,1 Concreto de 2500 PSI para solado E=5cm
26,4 Acero de refuerzo 60000 PSI
26,7 Zapatas en concreto de 3000 PSI
28,5 Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño maximo 4"

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 3 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Rana vibrocompactador | 1 | Bueno |
| Volqueta | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1974
~~315~~

| | |
|---|---|
| | **BITACORA DIARIA DE OBRA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Miercoles, 27 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

| **Personal en Obra** | | | | | | **Estado del Tiempo / Duración** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cargo** | **Cantidad** | **Cargo** | **Cantidad** | **Cargo** | **Cantidad** | | **a.m.** | **p.m** |
| | | | | | | Soleado | X | X |
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 | Seco | | |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 | Nublado | | |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 | Lluvia Pasajera | | |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | | Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó extendida de material crudo de 4" para relleno y nivelación en la zona de la cancha multiple (117,6 m3)

Se inciaron excavaciones de graderias (10,47 m3)

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para zapatas y pedestales

Se realizó en encofrado para pedestales

Se realizó vaciado de concreto de 3000 PSI para pedestales (27 ml - Ejes B-2)

Se realizó vaciado de concreto de 3000 PSI para zapatas (1,40 m3 -Eje 2)

Se realizó el vaciado de concreto de 2500 PSI para solado ( 33,68 m2 - Eje A)

Se continua con la excavación manual de zapatas y vigas de cimentación (17,24 m3 - Eje A)

Se realizó el extendido y compactación de material petreo (crudo de 4") para relleno en la zona de la cancha multiple (117,6 m3)

**ITEM EJECUTADOS**

17,2 Excavación manual en material común

20,5 Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño maximo 4"

25,2 Excavación manual en material comun

26,1 Concreto de 2500 PSI para solado E=5cm

26,3 Columneta de 20x20 en concreto de 3000 PSI

26,4 Acero de refuerzo 60000 PSI

26,7 Zapatas en concreto de 3000 PSI

| **Equipos en Obra** | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **Cant.** | **Estado** |
| Herramienta Menor | 3 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Rana vibrocompactador | 1 | Bueno |
| Volqueta | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |

| **Accidentes en Obra** | | | |
|---|---|---|---|
| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-356088 STD** |

1975

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Jueves, 28 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | N° 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | N° 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se realizó el extendio y compactación de material sub base para espacio de la cancha multiple (44,80 m3)

Se continuaron excávaciones de graderias (19,88 m3)

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

Se realizó desencofrado de pedestales y su respectiva limpieza

Se realizó encofrado para fundir en concreto de 3000 PSI los pedestales (20,50 ml - Eje A)

Se realizó vaciado de concreto de 3000 PSI para zapatas (2,94 m3 - Eje A)

Se continua con la excavación manual de zapatas y vigas de cimentación ( 8,43 m3 - Eje 1)

Se realizó extendido y compactación de material sub base granular en la zona de la cancha multiple (50,00 m3)

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para zapatas y pedestales

Se realizó encofrado para fundir en concreto de 3000 PSI las vigas de cimentación (50 ml - Eje A)

**ITEM EJECUTADOS**

17,2 Excavación manual en material común

20,3 Relleno con material tipo sub base

25,2 Excavación manual en material comun

26,2 Vigas de cimentación cerramiento 20x25 cm

26,3 Columneta de 20x20 en concreto de 3000 PSI

26,4 Acero de refuerzo 60000 PSI

26,7 Zapatas en concreto de 3000 PSI

28,3 Relleno con material tipo sub base

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 3 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Rana vibrocompactador | 1 | Bueno |
| Volqueta | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

1976

~~317~~

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Viernes, 29 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se continua el extendio y compactación de material sub base para espacio de la cancha multiple (44,80 m3)

Se finalizaron excavaciones de graderias (3,41 m3)

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

Se realizó desencofrado de pedestales

Se realizó encofrado para fundir en concreto de 3000 PSI las vigas de cimentación (52,78 ml - Eje A)

Se realizó vaciado de concreto de 3000 PSI para zapatas (1,47 m3 - Eje 1)

Se inicia con la excavación manual de cimentación de graderias (24,43 m3)

Se realizó el vaciado de concreto de 2500 PSI para solado ( 16,25 m2 -Eje 1)

Se realizó extendido y compactación de material sub base granular en la zona de la cancha multiple (50,00 m3).

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para zapatas y pedestales

**NOTA:** Se tomaron muestras para ensayo de laboratorio de elementos de vigas de cimentación en Roqueros.

**ITEM EJECUTADOS**

17,2 Excavación manual en material común

20,3 Relleno con material tipo sub base

25,2 Excavación manual en material comun

26,1 Concreto de 2500 PSI para solado,E=5cm

26,2 Vigas de cimentación cerramiento 20x25 cm

26,3 Columneta de 20x20 en concreto de 3000 PSI

26,4 Acero de refuerzo 60000 PSI

26,7 Zapatas en concreto de 3000 PSI

28,3 Relleno con material tipo sub base

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 3 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Rana vibrocompactador | 1 | Bueno |
| Volqueta | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **NOMBRE:** | CLAUDIA SEGURA | **NOMBRE:** | LEONARDO CAMARGO |
| **CARGO:** | RESIDENTE DE OBRA | **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| **T.P** | A1052022-1010221789 | **T.P** | 68202-359088 STD |

1977

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Sabado, 30 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | 1 | Ayudantes | 5 | Secretario | 1 |
| Ingenieros | 2 | Topógrafo | | HSEQ | 1 |
| Conductores | 1 | Cadeneros | 1 | Inspectores | 2 |
| Oficiales | 2 | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempó / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

**FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):**

Se continua el extendio y compactación de material sub base para espacio de la cancha multiple (44,80 m3)

Se realiza el vaciado de concreto de limpieza para cimentación de graderias (30,94 m2)

**FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):**

Se continua con el vaciado en concreto de 3000 PSI de las vigas de cimentación (43,12 ml - Eje 2)

Se realizó corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para zapatas y vigas de cimentación

Se continua con el extendido y compactación de material sub base granular en la zona de la cancha multiple (34,40 m3)

Se finaliza la excavación manual de cimentación de graderias (9,30 m3)

Se realizó el vaciado de concreto de 2500 PSI para solado para graderias (30,94 m2)

**Nota:** La interventoria realizo toma de muestras de concreto para viga de cimentación en Roqueros

**ITEM EJECUTADOS**

18.1 Concreto de 2500 PSI solado E=5 CM
20.3 Relleno con material tipo sub base
25.2 Excavación manual en material comun
26.1 Concreto de 2500 PSI para solado E=5cm
26.2 Vigas de cimentación cerramiento 20x25 cm
26.4 Acero de refuerzo 60000 PSI
28.3 Relleno con material tipo sub base

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| Herramienta Menor | 3 | Bueno |
| Cizalla manual | 1 | Bueno |
| Dobladora manual | 1 | Bueno |
| Rana vibrocompactador | 1 | Bueno |
| Volqueta | 1 | Bueno |
| Vibrador de concreto | 1 | Bueno |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrió Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| Hora | | | |
| Nombre | | | |
| Cargo | | | |
| Actividad que Desempeñaba | | | |
| | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC** | **INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS** |
| **NOMBRE:** | **CLAUDIA SEGURA** | **NOMBRE:** | **LEONARDO CAMARGO** |
| **CARGO:** | **RESIDENTE DE OBRA** | **CARGO:** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **T.P** | **A1052022-1010221789** | **T.P** | **68202-359088 STD** |

# BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | Domingo, 31 de agosto de 2025 | **Hoja No:** | 48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE TAME | **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **CONTRATO DE OBRA** | Nº 251 de 2025 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | Nº 239 de 2025 |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ambiental | | Ayudantes | | Secretario | |
| Ingenieros | | Topógrafo | | HSEQ | |
| Conductores | | Cadeneros | | Inspectores | |
| Oficiales | | Paleteros | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvioso | | |

**Actividades Desarrolladas**

Dia dominical, no se realizaron actividades

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Accidentes en Obra**

Ocurrio Algun Accidente?

Si | | No | X

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si | | No | X

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **OBRA:** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS |
| **NOMBRE:** | CLAUDIA SEGURA | **NOMBRE:** | LEONARDO CAMARGO |
| **CARGO:** | RESIDENTE DE OBRA | **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| **T.P** | A1052022-1010221789 | **T.P** | 68202-359088 STD |

# ANEXO 4.
# COPIA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2025 Y NOMINAS

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901962949 | 1 | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal | CRA 17 12-93 | TAME-ARAUCA | 3112691312 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1764000106 | 9491625302 | E | 2025/09/10 | 2025/09/09 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $6,184,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1116852188 | GARCIA HERNANDEZ CARLOS JOSE | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF67 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1018441104 | LEIVA JIMENEZ ALFREDO | 230201 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS037 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF67 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-11 | 30 | $2,500,000 | $174,000 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1116866434 | ORTIZ SUAREZ LUIS ALEJANDRO | 231001 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS041 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | CCF67 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | 14-11 | 30 | $3,500,000 | $243,600 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1094244456 | QUINTO OROZCO HUGO ALBERTO | 25-14 | 30 | $2,200,000 | $352,000 | EPS037 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | CCF67 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | 14-11 | 30 | $2,200,000 | $153,200 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 80094040 | RINCON MEDINA EDWIN ARNALDO | 230301 | 30 | $2,250,000 | $360,000 | EPS037 | 30 | $2,250,000 | $90,000 | CCF67 | 30 | $2,250,000 | $90,000 | 14-11 | 30 | $2,250,000 | $156,600 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1018461400 | ROMERO RIAÑO MARTIN DANILO | 230301 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS037 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF67 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-11 | 30 | $2,500,000 | $174,000 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1116778744 | SARMIENTO MALDONADO LIBARDO ALFONSO | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS041 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF67 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1010221789 | SEGURA AVILA CLAUDIA MILENA | 230301 | 30 | $3,800,000 | $608,000 | EPS010 | 30 | $3,800,000 | $152,000 | CCF67 | 30 | $3,800,000 | $152,000 | 14-11 | 30 | $3,800,000 | $264,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 8)** | | | | | **$19,973,500** | **$3,195,800** | | | **$19,973,500** | **$799,000** | | | **$19,973,500** | **$799,000** | | | **$19,973,500** | **$1,390,300** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 8 | $3,195,800 | $0 | $0 | $3,195,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $560,000 | $0 | $0 | $560,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $352,000 | $0 | $0 | $352,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $1,883,800 | $0 | $0 | $1,883,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $400,000 | $0 | $0 | $400,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $1,390,300 | $0 | $0 | $1,390,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 8 | $1,390,300 | $0 | $0 | $1,390,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $799,000 | $0 | $0 | $799,000 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 8 | $799,000 | $0 | $0 | $799,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 8 | $799,000 | $0 | $0 | $799,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $152,000 | $0 | $0 | $152,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $378,000 | $0 | $0 | $378,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 3 | $269,000 | $0 | $0 | $269,000 |
| TOTAL | | | | 8 | $6,184,100 | $0 | $0 | $6,184,100 |



2025/09/09 11:00 AM

1980

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901962949 | 1 | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal | CRA 17 12-93 | TAME-ARAUCA | 3112691312 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1763972275 | 9491624779 | A | 2025/09/30 | 2025/09/09 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $3,740,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1022924815 | CEPEDA SANCHEZ CARLOS FERNEY | 25-14 | 8 | $379,600 | $60,800 | EPS037 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF67 | 8 | $395,417 | $15,900 | 14-11 | 8 | $379,600 | $26,500 | 8 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1006496933 | DELGADO DIAZ LIGINIO | 230301 | 26 | $1,233,700 | $197,400 | EPS041 | 26 | $1,233,700 | $49,400 | CCF67 | 26 | $1,285,104 | $51,500 | 14-11 | 26 | $1,233,700 | $85,900 | 26 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1116852230 | DIAZ ANICETO ALFONSO | 230301 | 26 | $1,233,700 | $197,400 | EPS041 | 26 | $1,233,700 | $49,400 | CCF67 | 26 | $1,285,104 | $51,500 | 14-11 | 26 | $1,233,700 | $85,900 | 26 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 96193416 | GARCIA TULIVILA NELSON | 25-14 | 6 | $284,700 | $45,600 | EPS041 | 6 | $284,700 | $11,400 | CCF67 | 6 | $284,700 | $11,400 | 14-11 | 6 | $284,700 | $19,900 | 6 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1116869153 | NEIVA ORTIZ HECTOR ELIAS | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | ESSC24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF67 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1116866305 | NEIVA ORTIZ JOSE DELFIN | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF67 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1116874041 | ORTIZ GALLEGO DAVID ALEJANDRO | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | ESSC24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF67 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 96192092 | ORTIZ GUTIERREZ DAVID | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | ESSC24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF67 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 96195806 | SOLER ROJAS JOSE ANGEL | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF67 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 96193430 | TULIVILA GARCIA EDGAR | 230301 | 6 | $284,700 | $45,600 | EPS041 | 6 | $284,700 | $11,400 | CCF67 | 6 | $284,700 | $11,400 | 14-11 | 6 | $284,700 | $19,900 | 6 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1007396990 | TULIVILA GARCIA OSCAR | 230301 | 6 | $284,700 | $45,600 | EPS037 | 6 | $284,700 | $11,400 | CCF67 | 6 | $284,700 | $11,400 | 14-11 | 6 | $284,700 | $19,900 | 6 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1006496984 | VELASQUEZ DIAZ HERMINSON | 230301 | 26 | $1,233,700 | $197,400 | EPS041 | 26 | $1,233,700 | $49,400 | CCF67 | 26 | $1,285,104 | $51,500 | 14-11 | 26 | $1,233,700 | $85,900 | 26 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 12)** | | | $12,052,300 | $1,928,800 | | | $12,052,300 | $482,600 | | | $12,222,329 | $489,600 | | | $12,052,300 | $839,400 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 12 | $1,928,800 | $0 | $0 | $1,928,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $334,200 | $0 | $0 | $334,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 9 | $1,594,600 | $0 | $0 | $1,594,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $839,400 | $0 | $0 | $839,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 12 | $839,400 | $0 | $0 | $839,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $489,600 | $0 | $0 | $489,600 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 12 | $489,600 | $0 | $0 | $489,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 12 | $482,600 | $0 | $0 | $482,600 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 3 | $171,000 | $0 | $0 | $171,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $140,600 | $0 | $0 | $140,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 5 | $171,000 | $0 | $0 | $171,000 |
| TOTAL | | | | 12 | $3,740,400 | $0 | $0 | $3,740,400 |



2025/09/09 11:01 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901962949 | 1 | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal | CRA 17 12-93 | TAME-ARAUCA | 3112691312 | SI |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: Principal (1 Afiliados) | | | | | $379,600 | $60,800 | | | $379,600 | $15,200 | | | $395,417 | $15,900 | | | $379,600 | $26,500 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: Principal ( 1 Afiliados) | | | | | $379,600 | $60,800 | | | $379,600 | $15,200 | | | $395,417 | $15,900 | | | $379,600 | $26,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: TAME Depto: ARAUCA ( 1 Afiliados) | | | | | $379,600 | $60,800 | | | $379,600 | $15,200 | | | $395,417 | $15,900 | | | $379,600 | $26,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1116867010 | RODRIGUEZ GARCIA CARLOS ALBERTO | 230301 | 8 | $379,600 | $60,800 | EPS005 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF67 | 8 | $395,417 | $15,900 | 14-11 | 8 | $379,600 | $26,500 | 8 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $379,600 | $60,800 | | | $379,600 | $15,200 | | | $395,417 | $15,900 | | | $379,600 | $26,500 | | $0 | $0 |

1982

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1918141561 | 94945329 95 | E | 2025/09/10 | 2025/11/10 | BANCO DAVIVIENDA | 61 | $123,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $60,800 | $2,300 | $0 | $63,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $60,800 | $2,300 | $0 | $63,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $26,500 | $1,100 | $0 | $27,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $26,500 | $1,100 | $0 | $27,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $15,900 | $700 | $0 | $16,600 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 1 | $15,900 | $700 | $0 | $16,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $15,200 | $600 | $0 | $15,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $15,200 | $600 | $0 | $15,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $118,400 | $4,700 | $0 | $123,100 |



1983

# CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

## NIT. 901962949-1

### NOMINA AGOSTO 2025

CONTRATO DE OBRA No. 251 DE 2025 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDÍGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

| INFORMACION DEL TRABAJADOR | | | | INGRESO | RETIRO | SUELDO BASICO | AUXILIO DE TRANSPORTE | DIAS TRABAJADOS | DEVENGADO | | DEDUCCIONES | | | NETO A PAGAR | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | NUMERO DE CEDULA | CARGO | | | | | | SALARIO | AUX TRANSPORTE | SALUD | PENSION | TOTAL DEDUCIDO | | |
| 1 | LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO | 1116778744 | SECRETARIO | 15/7/2025 | | $1,800,000 | 200,000 | 30 | 1,800,000 | 200,000 | 72,000 | 72,000 | 144,000 | 1,856,000 | Libardo Sarmiento |
| 2 | CLAUDIA MILENA SEGURA AVILA | 1010221789 | RESIDENTE DE OBRA | 15/7/2025 | | $3,800,000 | - | 30 | 3,800,000 | 0 | 152,000 | 152,000 | 304,000 | 3,496,000 | CLAUDIA SEGURA |
| 3 | ALFREDO LEIVA JIMENEZ | 1018441104 | INSPECTOR DE OBRA | 15/7/2025 | | $2,500,000 | 200,000 | 30 | 2,500,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 2,500,000 | Alfredo Leiva |
| 4 | MARTIN DANILO ROMERO RIAÑO | 1018461400 | INSPECTOR DE OBRA | 15/7/2025 | | $2,500,000 | 200,000 | 30 | 2,500,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 2,500,000 | Martin Riano |
| 5 | EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA | 80094040 | DIRECTOR DE OBRA | 15/7/2025 | | $2,250,000 | 200,000 | 30 | 2,250,000 | 200,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 2,270,000 | Arnaldo Rincon |
| 6 | LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ | 1116866434 | INGENIERO AMBIENTAL PGIO | 15/7/2025 | | $3,500,000 | - | 30 | 3,500,000 | 0 | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 3,220,000 | Alejandro Ortiz |
| 7 | HUGO ALBERTO QUINTO OROZCO | 1094244456 | AUXILIAR SST PGIO | 15/7/2025 | | $2,200,000 | 200,000 | 30 | 2,200,000 | 200,000 | 88,000 | 88,000 | 176,000 | 2,224,000 | Hugo Quinto |
| 8 | CARLOS JOSE GARCIA HERNANDEZ | 1116852188 | CONDUCTOR | 15/7/2025 | | $1,423,500 | 200,000 | 30 | 1,423,500 | 200,000 | 56,940 | 56,940 | 113,880 | 1,509,620 | Carlos Garcia |
| 9 | JOSE ANGEL SOLER ROJAS | 96195806 | OFICIAL | 1/8/2025 | | $1,423,500 | 200,000 | 30 | 1,423,500 | 200,000 | 56,940 | 56,940 | 113,880 | 1,509,620 | ANGEL SOLER |
| 10 | DAVID ORTIZ GUTIERREZ | 96.192.092 | OFICIAL | 1/8/2025 | | $1,423,500 | 200,000 | 30 | 1,423,500 | 200,000 | 56,940 | 56,940 | 113,880 | 1,509,620 | David Ortiz |
| 11 | JOSE DELFIN NEIVA ORTIZ | 1116866305 | AYUDANTE DE OBRA | 1/8/2025 | | $1,423,500 | 200,000 | 30 | 1,423,500 | 200,000 | 56,940 | 56,940 | 113,880 | 1,509,620 | DELFIN NEIVA |
| 12 | DAVID ALEJANDRO ORTIZ GALLEGO | 1116874041 | AYUDANTE DE OBRA | 1/8/2025 | | $1,423,500 | 200,000 | 30 | 1,423,500 | 200,000 | 56,940 | 56,940 | 113,880 | 1,509,620 | David Ortiz |
| 13 | HERMINSON VELAZQUES DIAZ | 1006496984 | AYUDANTE DE OBRA | 1/8/2025 | 26/8/2025 | $1,423,500 | 200,000 | 26 | 1,233,700 | 173,333 | 49,348 | 49,348 | 98,696 | 1,308,337 | Herminson Velazques |
| 14 | ALFONSO DIAZ ANISETO | 1116852230 | AYUDANTE DE OBRA | 1/8/2025 | 26/8/2025 | $1,423,500 | 200,000 | 26 | 1,233,700 | 173,333 | 49,348 | 49,348 | 98,696 | 1,308,337 | Alfonso Diaz |
| 15 | LIGINIO DELGADO DIAZ | 1006496933 | AYUDANTE DE OBRA | 1/8/2025 | 26/8/2025 | $1,423,500 | 200,000 | 26 | 1,233,700 | 173,333 | 49,348 | 49,348 | 98,696 | 1,308,337 | Ligino Delgado |
| 16 | CARLOS FERNEY CEPEDA SANCHEZ | 1022924815 | CADENERO | 1/8/2025 | 8/8/2025 | $1,423,500 | 200,000 | 8 | 379,600 | 53,333 | 15,184 | 15,184 | 30,368 | 402,565 | CARLOS CEPEDA |
| 17 | HECTOR ELIAS NEIVA ORTIZ | 1116869153 | CADENERO / AYUDANTE | 1/8/2025 | | $1,423,500 | 200,000 | 30 | 1,423,500 | 200,000 | 56,940 | 56,940 | 113,880 | 1,509,620 | Hector Neiva |
| 18 | EDGAR TULIVILA GARCIA | 96193430 | AYUDANTE DE OBRA | 25/8/2025 | | $1,423,500 | 200,000 | 6 | 284,700 | 40,000 | 11,388 | 11,388 | 22,776 | 301,924 | Edgar Tulivila |

1984

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | OSCAR TULIVILA GARCIA | 1007396990 | AYUDANTE DE OBRA | 25/8/2025 | | $1,423,500 | 200,000 | 6 | 284,700 | 40,000 | 11,388 | 11,388 | 22,776 | 301,924 | Oscar Tulivila |
| 20 | NELSON GARCIA TULIVILA | 96193415 | AYUDANTE DE OBRA | 25/8/2025 | | $1,423,500 | 200,000 | 6 | 284,700 | 40,000 | 11,388 | 11,388 | 22,776 | 301,924 | Nelson Tulivila |
| 21 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA | 1,116,867,010 | TOPOGRAFO | 1/8/2025 | 8/8/2025 | $1,423,500 | 200,000 | 8 | 379,600 | 53,333 | 15,184 | 15,184 | 30,368 | 402,565 | CARLOS GARCIA |
| TOTAL | | | | | | | | | 32,405,400 | 2,846,667 | 1,296,216 | 1,296,216 | 2,592,432 | 32,759,635 | |

Libardo Sarmiento M

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA YERITZE CASTELLANOS CASTANEDA
CONTADORA PUBLICA
T.P. No 280346-T


1985

# ANEXO 5.
# MEMORIAS DE CALCULO

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 17.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | UNID. | M2 | UBICACIÓN | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENARENOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

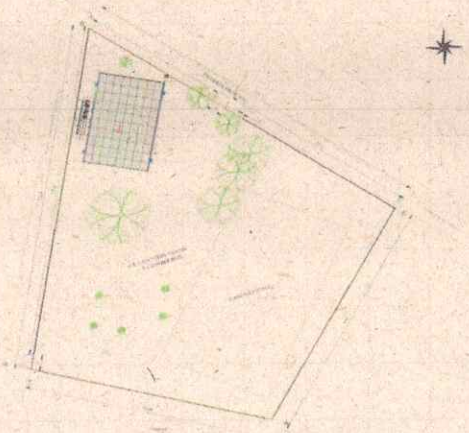

| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Longitud | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERRAMIENTO | | | | | | |
| EJE A | 1 | 74,30 | | | 74,30 | 74,30 |
| EJE B | 1 | 118,10 | | | 118,10 | 118,10 |
| EJE 1 | 1 | 122,40 | | | 122,40 | 122,40 |
| EJE 2 | 1 | 84,6 | | | 84,60 | 84,60 |
| GRADERIAS | 1 | 12,25 | 2,40 | | 29,40 | 29,40 |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | | | | | 428,80 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecuctadas en obra.

EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND


CLAUDIA MILENA SEGURA
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789

PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

LEONARDO CAMARGO VELAZCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 17.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | UNID. | M3 | UBICACIÓN | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

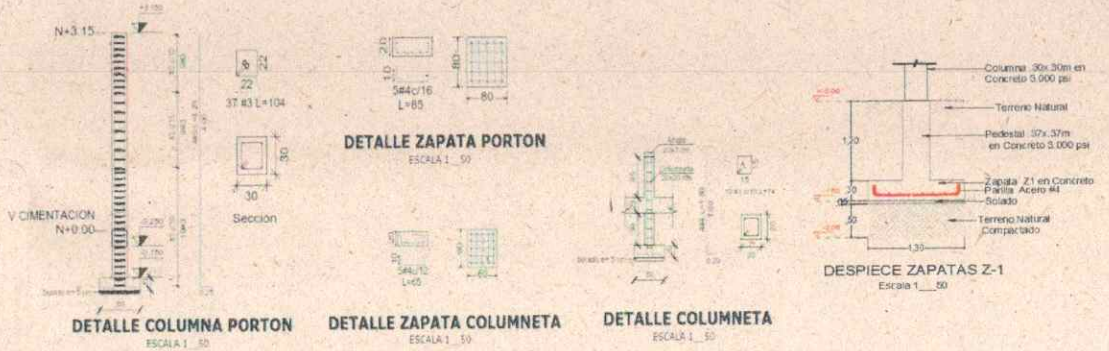


| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Volumen | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Cimentacion | | | | | | |
| EJE A | 1 | 76,00 | 0,20 | 0,30 | 4,56 | 4,56 |
| EJE B | 1 | 118,10 | 0,20 | 0,30 | 7,09 | 7,09 |
| EJE 1 | 1 | 122,40 | 0,20 | 0,30 | 7,34 | 7,34 |
| EJE 2 | 1 | 84,6 | 0,20 | 0,30 | 5,08 | 5,08 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Zapatas Porton | 4 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,48 | 1,92 |
| Zapatas Columneta | 155 | 0,60 | 0,60 | 0,75 | 0,27 | 41,85 |
| | | | | | | |
| GRADERIAS | | | | | | |
| ZAPATAS Z-1 | 4 | 1,30 | 1,30 | 1,55 | 2,62 | 10,478 |
| ZAPATAS Z-2 | 4 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 3,49 | 13,950 |
| ZAPATAS Z-3 | 1 | 1,50 | 2,55 | 1,55 | 5,93 | 5,929 |
| V.C GRADERIA | 1 | 37,85 | 0,30 | 0,30 | 3,41 | 3,407 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | | | | | 101,60 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecutadas en obra.

EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND


CLAUDIA MILENA SEGURA
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789


PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS


LEONARDO CAMARGO VELAZCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | ITEM | 18.1 | CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM | UNID. | M2 | UBICACIÓN | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

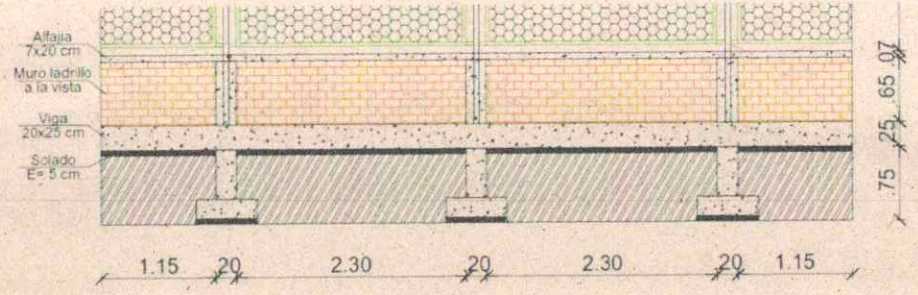




DESPIECE ZAPATAS Z-1
Escala 1:__50

| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Dimensiones Ancho | Dimensiones Alto | Area | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Cimentacion | | | | | | |
| EJE A | 1 | 75,7 | 0,20 | 0,05 | 15,14 | 15,14 |
| EJE B | 1 | 118,1 | 0,20 | 0,05 | 23,62 | 23,62 |
| EJE 1 | 1 | 122,4 | 0,20 | 0,05 | 24,48 | 24,48 |
| EJE 2 | 1 | 84,6 | 0,20 | 0,05 | 16,92 | 16,92 |
| Columnetas | -159 | 0,2 | 0,20 | | 0,04 | -6,36 |
| Zapatas Poton | 4 | 0,80 | 0,80 | 0,05 | 0,64 | 2,56 |
| Zapatas Columnetas | 155 | 0,60 | 0,60 | 0,05 | 0,36 | 55,80 |
| GRADERIAS | | | | | | |
| ZAPATAS Z-1 | 4 | 1,30 | 1,30 | | | 6,760 |
| ZAPATAS Z-2 | 4 | 1,50 | 1,50 | | | 9,000 |
| ZAPATAS Z-3 | 1 | 1,50 | 2,55 | | | 3,825 |
| V.C GRADERIA | 1 | 37,85 | 0,30 | | | 11,355 |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | | | | | 163,10 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecutadas en obra.

EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

CLAUDIA MILENA SEGURA
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789


PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

LEONARDO CAMARGO VELAZCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD

1984

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | ITEM | 18.2 | VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I | UNID. | ML | UBICACIÓN | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENARENOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

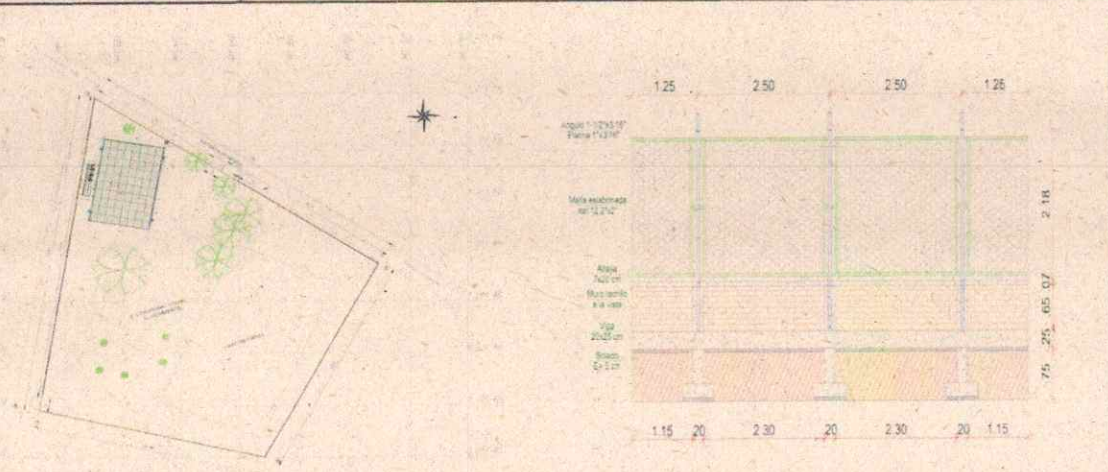



| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Longitud | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Cimentacion | | | | | | |
| EJE A | 1 | 75,5 | | | 75,50 | 75,50 |
| EJE B | 1 | 118,1 | | | 118,10 | 118,10 |
| EJE 1 | 1 | 122,4 | | | 122,40 | 122,40 |
| EJE 2 | 1 | 84,6 | | | 84,60 | 84,60 |
| | | | | | | |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | | | | | 400,60 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecutadas en obra.

| EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA | CLAUDIA MILENA SEGURA | PEDRO LUIS USMA VILLA | LEONARDO CAMARGO VELAZCO |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| M.P 091037-0601065 CND | M.P A1052022-1010221789 | M.P 54202-403854 NTS | M.P 68202-359088 STD |

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | ITEM | 18.3 | COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3,000 P.S.I | UNID. | ML | UBICACIÓN | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

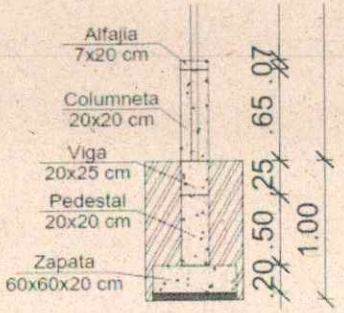


| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Longitud | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestal | | | | | | |
| EJE A | 31 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 15,50 |
| EJE B | 46 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 23,00 |
| EJE 1 | 48 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 24,00 |
| EJE 2 | 34 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 17,00 |
| | | | | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | 79,50 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecutadas en obra.

EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND


CLAUDIA MILENA SEGURA
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789

PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS


LEONARDO CAMARGO VELAZCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 2 |

| CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | ITEM | 18.4 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | UNID. | KG | UBICACIÓN | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

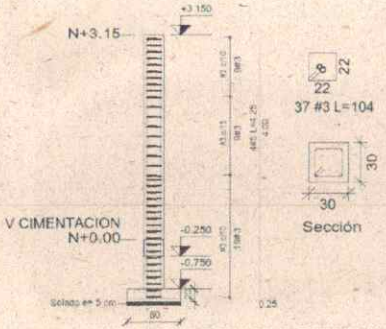



DETALLE COLUMNA PORTON
ESCALA 1__50





DETALLE ZAPATA PORTON
ESCALA 1__50






DETALLE ZAPATA COLUMNETA
ESCALA 1__50





DETALLE COLUMNETA
ESCALA 1__50








| Localización | Cant | Dimensiones Long | Dimensiones Diametro # | Dimensiones Cantidad | Peso | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZAPATAS** | | | | | | |
| ZAPATA 0,8x0,8x0,2 | 4 | 0,85 | 4 | 5,00 | 1,00 | 17,00 |
| | 4 | 0,85 | 4 | 5,00 | 1,00 | 17,00 |
| ZAPATA 0,6x0,6x0,2 | 155 | 0,65 | 4 | 5,00 | 1,00 | 503,75 |
| | 155 | 0,65 | 4 | 5,00 | 1,00 | 503,75 |
| **VIGA CIMENTACION** | | | | | | |
| EJE A | 1 | 84,80 | 4 | 4,00 | 1,00 | 339,20 |
| ESTRIBOS | 1 | 0,72 | 3 | 512,00 | 0,56 | 206,44 |
| EJE B | 1 | 130,11 | 4 | 4,00 | 1,00 | 520,44 |
| ESTRIBOS | 1 | 0,72 | 3 | 788,00 | 0,56 | 317,72 |
| EJE 1 | 1 | 134,84 | 4 | 4,00 | 1,00 | 539,36 |
| ESTRIBOS | 1 | 0,72 | 3 | 816,00 | 0,56 | 329,01 |
| EJE 2 | 1 | 93,26 | 4 | 4,00 | 1,00 | 373,04 |
| ESTRIBOS | 1 | 0,72 | 3 | 564,00 | 0,56 | 227,40 |
| **COLUMNETA** | | | | | | |
| COLUMNETA | 159 | 1,80 | 4 | 4,00 | 1,00 | 1.144,80 |
| ESTRIBOS | 159 | 0,74 | 3 | 10,00 | 0,56 | 658,90 |
| | | | | | | |
| **COLUMNA** | | | | | | |
| COL 30x30 | 4 | 4,25 | 5 | 4,00 | 1,552 | 105,54 |
| ESTRIBOS | 4 | 1,04 | 3 | 37,00 | 0,56 | 86,20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | ITEM | 18.6 | COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I | UNID. | ML | UBICACIÓN | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENARAROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

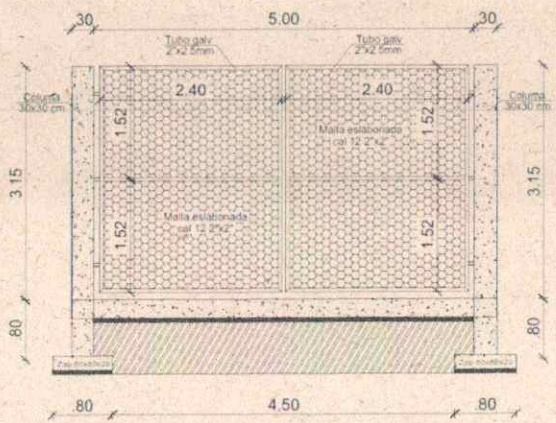


| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Longitud | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMNA 30x30 | 4 | 3,15 | | | 3,15 | 12,60 |
| PEDESTAL 30x30 | 4 | 0,55 | | | 0,55 | 2,20 |
| | | | | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | 14,80 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecutadas en obra.

EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND


CLAUDIA MILENA SEGURA
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789

PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

LEONARDO CAMARGO VELAZCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | ITEM | 18.7 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I | UNID. | M3 | UBICACIÓN | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENARENOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




**DETALLE ZAPATA PORTON**
ESCALA 1__50




**DETALLE ZAPATA COLUMNETA**
ESCALA 1__50


| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Volumen | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAPATAS PORTON | 4 | 0,8 | 0,80 | 0,20 | 0,12 | 0,47 |
| ZAPATA COLUMNETA | 156 | 0,6 | 0,60 | 0,20 | 0,07 | 11,23 |
| | | | | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | 11,70 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecutadas en obra.

| EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA | CLAUDIA MILENA SEGURA | PEDRO LUIS USMA VILLA | LEONARDO CAMARGO VELAZCO |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| M.P 091037-0601065 CND | M.P A1052022-1010221789 | M.P 54202-403854 NTS | M.P 68202-359088 STD |

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 20.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | UNID. | M2 | UBICACIÓN | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENARE ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

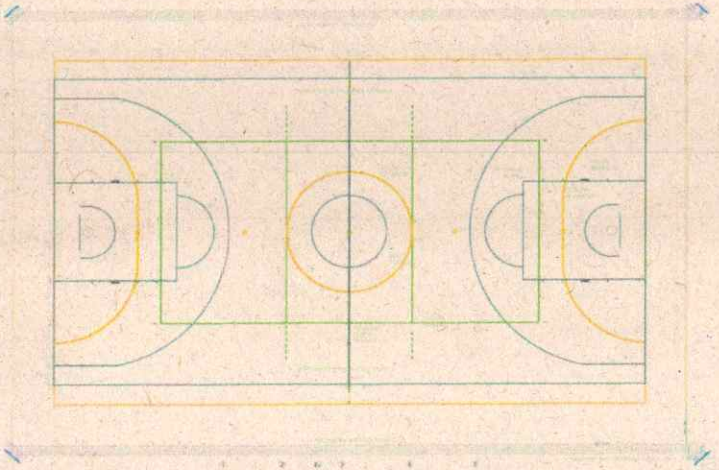

| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Area | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA CANCHA | 1 | 32 | 21,00 | | 672,00 | 672,00 |
| | | | | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | 672,00 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecutadas en obra.

**EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA**
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND


**CLAUDIA MILENA SEGURA**
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789


**PEDRO LUIS USMA VILLA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

**LEONARDO CAMARGO VELAZCO**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 20.3 | RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE | UNID. | M3 | UBICACIÓN | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENARENOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

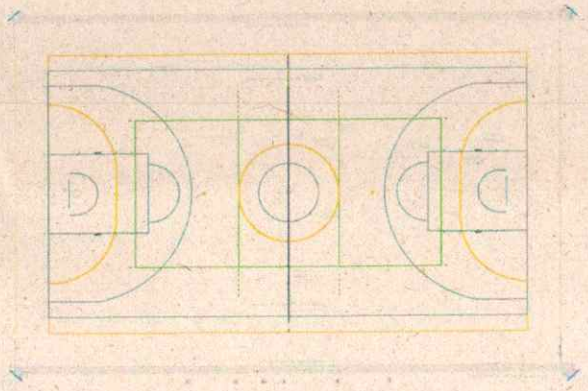

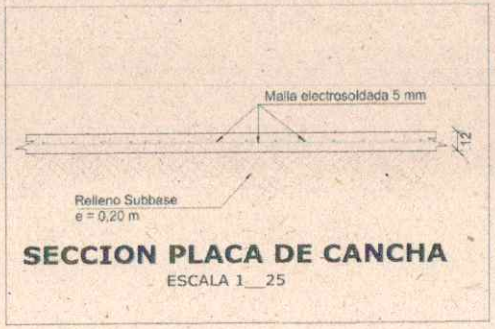


| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Volumen | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área Cancha | 1 | 32 | 21,00 | 0,20 | 134,40 | 134,40 |
| | | | | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | 134,40 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecutadas en obra.

EDWIN ARNALDO RINCÒN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

CLAUDIA MILENA SEGURA
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789

PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

LEONARDO CAMARGO VELAZCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD


9491
1996

## CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

### INFORME MENSUAL AGOSTO 2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | TAME | **CONTRATO DE OBRA:** | 251 DE 2025 | **MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES** | | | |
| **PROYECTO:** | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE TAME | **FECHA:** | AGOSTO DE 2025 | **HOJA** | 1 | **DE** | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO** | PRELIMINARES | **ITEM** | 20.4 | DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO | **UNID.** | M2 | **UBICACIÓN** | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENARAREROS |

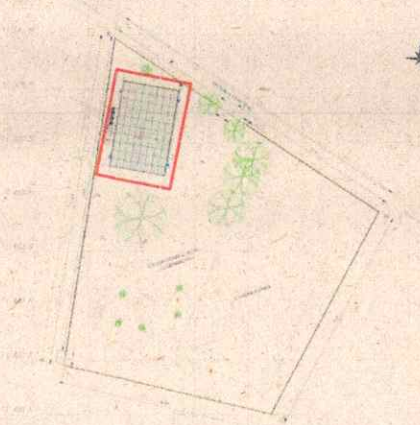

| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Área | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCHA MULTIPLE | 1 | 32 | 21,00 | | 672,00 | 672,00 |
| GRADERIAS | 1 | 12,25 | 2,40 | | 29,40 | 29,40 |
| | | | | **CANTIDAD TOTAL EJECUTADA** | | 701,40 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecutadas en obra.

**EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA**
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND


**CLAUDIA MILENA SEGURA**
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789

**PEDRO LUIS USMA VILLA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

**LEONARDO CAMARGO VELAZCO**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 20.5 | RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4" | UNID. | M3 | UBICACIÓN | ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENARENOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

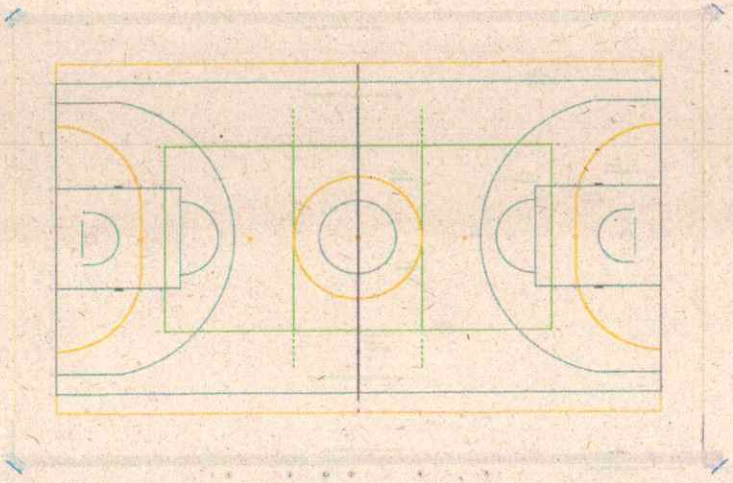

| Localización | Cant | Dimensiones | | | Volumen | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largo | Ancho | Alto | | |
| CANCHA MULTIPLE | 1 | 32 | 21,00 | 0,35 | 235,20 | 235,20 |
| | | | | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | 235,20 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecuctadas en obra.

EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND


CLAUDIA MILENA SEGURA
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789

PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

LEONARDO CAMARGO VELAZCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 25.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | UNID. | M2 | UBICACIÓN | ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

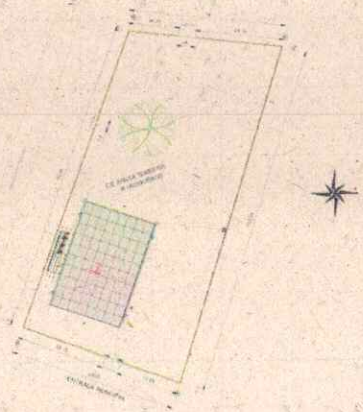

| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Longitud | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| CERRAMIENTO | | | | | | |
| EJE A | 1 | 102,780 | | | 102,78 | 102,78 |
| EJE B | 1 | 92,000 | | | 92,00 | 92,00 |
| EJE 1 | 1 | 48,020 | | | 48,02 | 48,02 |
| EJE 2 | 1 | 44,000 | | | 44,00 | 44,00 |
| | | | | | | |
| GRADERIAS | 1 | 12,25 | 2,40 | | 29,40 | 29,40 |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | | | | | 316,20 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecutadas en obra.

EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

CLAUDIA MILENA SEGURA
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789


PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

LEONARDO CAMARGO VELAZCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD

1999

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 25,2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | UNID. | M3 | UBICACIÓN | ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

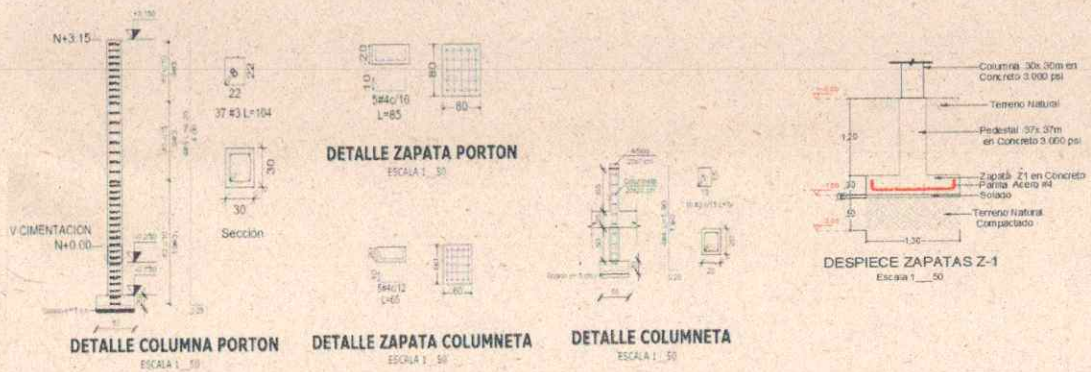


| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Volumen | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V. Cimentacion** | | | | | | |
| EJE A | 1 | 102,78 | 0,20 | 0,30 | 6,17 | 6,17 |
| EJE B | 1 | 92 | 0,20 | 0,30 | 5,52 | 5,52 |
| EJE 1 | 1 | 48,02 | 0,20 | 0,30 | 2,88 | 2,88 |
| EJE 2 | 1 | 44 | 0,20 | 0,30 | 2,64 | 2,64 |
| ZapatasPorton | 4 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,48 | 1,92 |
| ZapatasPorton | 110 | 0,60 | 0,60 | 0,75 | 0,27 | 29,70 |
| **GRADERIAS** | | | | | | |
| ZAPATAS Z-1 | 4 | 1,30 | 1,30 | 1,55 | 2,62 | 10,478 |
| ZAPATAS Z-2 | 4 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 3,49 | 13,950 |
| ZAPATAS Z-3 | 1 | 1,50 | 2,55 | 1,55 | 5,93 | 5,929 |
| V.C GRADERIA | 1 | 37,85 | 0,30 | 0,30 | 3,42 | 3,417 |
| | | | | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | 82,60 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecuctadas en obra.

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

CLAUDIA MILENA SEGURA
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789


PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS


LEONARDO CAMARGO VELAZCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD


2002

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | ITEM | 26.1 | CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM | UNID. | M2 | UBICACIÓN | ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

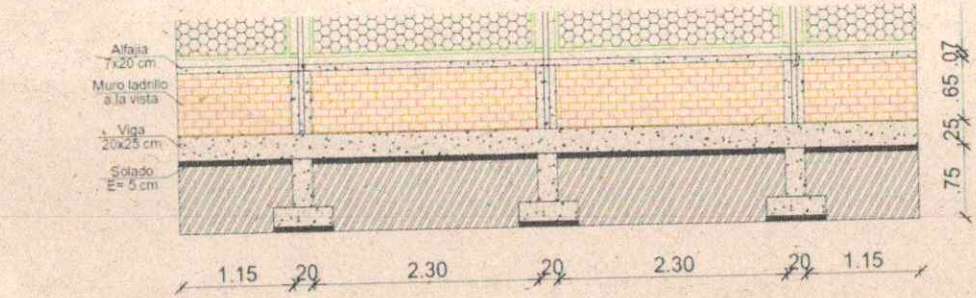




DESPIECE ZAPATAS Z-1
Escala 1:__50

| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Area | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V. Cimentacion cerramiento** | | | | | | |
| EJE A | 1 | 102,78 | 0,20 | 0,05 | 20,56 | 20,56 |
| EJE B | 1 | 92 | 0,20 | 0,05 | 18,40 | 18,40 |
| EJE 1 | 1 | 48,02 | 0,20 | 0,05 | 9,60 | 9,60 |
| EJE 2 | 1 | 44 | 0,20 | 0,05 | 8,80 | 8,80 |
| Columnetas | -114 | 0,2 | 0,20 | | 0,04 | -4,56 |
| Zapatas Porton | 4 | 0,80 | 0,80 | 0,05 | 0,64 | 2,56 |
| Zapatas Columneta | 110 | 0,60 | 0,60 | 0,05 | 0,36 | 39,60 |
| **GRADERIAS** | | | | | | |
| ZAPATAS Z-1 | 4 | 1,30 | 1,30 | | | 6,760 |
| ZAPATAS Z-2 | 4 | 1,50 | 1,50 | | | 9,000 |
| ZAPATAS Z-3 | 1 | 1,50 | 2,55 | | | 3,825 |
| V.C GRADERIA | 1 | 37,85 | 0,30 | | | 11,355 |
| | | | | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | 125,90 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecutadas en obra.

EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

CLAUDIA MILENA SEGURA
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789


PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS


LEONARDO CAMARGO VELAZCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD

1002

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | ITEM | 26.2 | VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3,000 P.S.I | UNID. | ML | UBICACIÓN | ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

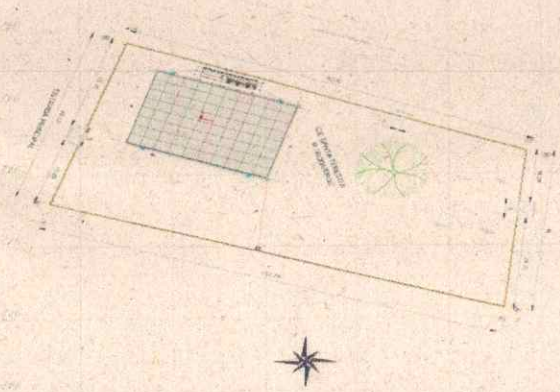


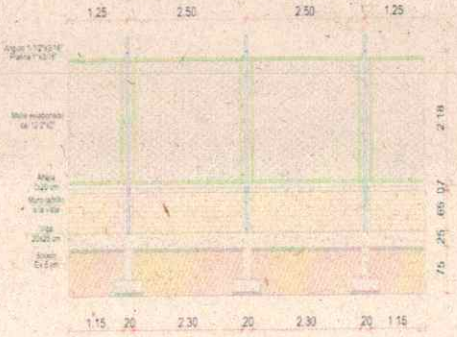


| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Longitud | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Cimentacion | | | | | | |
| EJE A | 1 | 102,78 | | | 102,78 | 102,78 |
| EJE 2 | 1 | 43,12 | | | 43,12 | 43,12 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

| CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 | | | | MEMORIAS DE CALCULO<br>CANTIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO: | TAME | CONTRATO DE OBRA: | 251 DE 2025 | | | | |
| PROYECTO: | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE TAME | FECHA: | AGOSTO DE 2025 | HOJA | 1 | DE | 1 |

| CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | ITEM | 26.3 | COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I | UNID. | ML | UBICACIÓN | ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

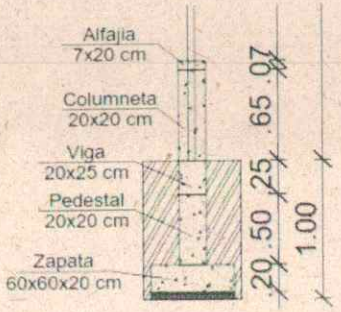


| Localización | Cant | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Longitud | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestal | | | | | | |
| EJE A | 41 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 20,50 |
| EJE B | 36 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 18,00 |
| | | | | | | |
| EJE 2 | 18 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 9,00 |
| | | | | | | |
| | | | | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | | 47,50 |

OBSERVACIONES : Cantidades ejecuctadas en obra.

EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

CLAUDIA MILENA SEGURA
RESIDENTE DE OBRA
M.P A1052022-1010221789

PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

LEONARDO CAMARGO VELAZCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 68202-359088 STD

2003
