Conclusiones:

Luego de un análisis técnico detallado y considerando las intervenciones de todas las partes involucradas, se concluye que los ajustes propuestos representan una optimización significativa del proyecto original, garantizando una mejor funcionalidad de las instalaciones y respondiendo adecuadamente a las necesidades específicas de las comunidades beneficiarias. Las modificaciones mantienen los estándares técnicos requeridos y preservan el equilibrio económico del contrato. Se resalta el valor agregado que representan estas adecuaciones en términos de seguridad, accesibilidad y pertinencia cultural del proyecto.

Se concluye que las modificaciones realizadas no alteran la programación de obra aprobada, por tal motivo no se presenta una reprogramación de actividades.

1. ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. La Interventoria se compromete a realizar el seguimiento y verificación permanente del cumplimiento de los ajustes aprobados durante la etapa de ejecución de las obras, el cual se verá reflejado en los informes mensuales presentados

2. ANEXOS

1. Planos de implantación arquitectónica ajustados para ambos resguardos.
2. Memorias de cálculo de los ítems ajustados
3. Carteras de material de relleno
4. Oficio de Solicitud de la comunidad indígena del Resguardo Indígena Julieros
5. Balance financiero detallado con análisis del saldo a favor.

3. DECISIONES TOMADAS

- La secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano Jenny Milena Upegui Siculaba, en calidad de supervisora y el Ingeniero Pedro Luis Usma Villa en calidad de Interventor externo, ven viable el ajuste a los diseños originales, dado que no se presenta un desequilibrio económico del contrato.

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NIT. 901.958.438-2
Contratista de Interventoria

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901.962.949-1
Contratista de Obra

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisora

Proyectó: Ing. Cristian Jair Patiño Pinzón
Revisó: Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

2615

BALANCE FINANCIERO

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.251 DE 2025

							CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JUIQUEROS										
1 CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA EL PORVENIR										
1										
	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	269,40	$ 7.616,00	$ 2.051.750,00			269,40	$ 2.051.750,00
	1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	74,40	$ 50.462,00	$ 3.754.373,00			74,40	$ 3.754.373,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 5.806.123,00				$ 5.806.123,00
2										
	2.1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM	M2	110,10	$ 58.287,00	$ 6.417.399,00			110,10	$ 6.417.399,00
	2.2	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	239,60	$ 106.606,00	$ 25.542.798,00			239,60	$ 25.542.798,00
	2.3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	108,10	$ 107.723,00	$ 11.644.856,00			108,10	$ 11.644.856,00
	2.4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5.964,00	$ 13.763,00	$ 82.082.532,00			5.964,00	$ 82.082.532,00
	2.5	ALFAJIA DE 20x7 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I, INCLUYE REFUERZO	ML	227,00	$ 68.556,00	$ 15.561.985,00			227,00	$ 15.561.985,00
	2.6	COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00			14,80	$ 2.418.364,00
	2.7	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	M3	7,30	$ 1.272.329,00	$ 9.288.002,00			7,30	$ 9.288.002,00
	2.8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIA	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00			20,30	$ 33.421.819,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 186.377.755,00				$ 186.377.755,00
3										
	3.1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	135,50	$ 188.595,00	$ 25.564.623,00			135,50	$ 25.564.623,00
	3.2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2" INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2,5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA, INCLUYE PINTURA	ML	227,00	$ 785.372,00	$ 178.279.444,00			227,00	$ 178.279.444,00
	3.3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2,5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.857,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	3.4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE, TUBO GALVANIZADO DE 2"X2 5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	3.5	PASAMANO METALICO EN 3 SECCIONES INC BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
Subtotal MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 234.392.894,00				$ 234.392.894,00
4 CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR										
4										
	4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	4.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,80			6,40	$ 322.957,80
	4.3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,80	$ 28.829.875,00
	4.4	DESCAPOTE Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00			176,00	$ 1.776.192,00
	4.5	RELLENO Y COMPACTACION EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00	360,80		265,84	$ 49.608.919,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 85.210.350,00				$ 84.655.895,00
5										
	5.1	PLACA DE PISO EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.536,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	5.2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0.15*0.40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	5.3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	5.4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACION	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 131.757.224,00				$ 131.757.224,00
6										
	6.1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	6.2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	6.3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.467,00	$ 20.590.261,00			633,80	$ 20.590.261,00
Subtotal ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 45.853.568,00				$ 45.853.568,00
7										
	7.1	CANUELA EN CONCRETO PREFABRICADO 0.30*0.30 *0.80 M INCLUYE REJILLA	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			80,00	$ 26.823.760,00
	7.2	CAJA DE INSPECCION 0.60M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	7.3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	7.4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	7.5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	8,12	$ 106.567,00	$ 861.264,00			8,12	$ 861.264,00
Subtotal INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						$ 31.710.620,00				$ 31.710.620,00
8										
	8.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	8.3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 35 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	8.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLECTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 49.049.730,00				$ 49.049.730,00
ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS										
9 CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA GONZALO JIMENEZ										
9										
	9.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	383,70	$ 7.616,00	$ 2.922.259,00			383,70	$ 2.922.259,00
	9.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	93,90	$ 50.462,00	$ 4.738.382,00			93,90	$ 4.738.382,00

BALANCE FINANCIERO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.251 DE 2025

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
Subtotal PRELIMINARES						$ 7.660.641,00				$ 7.660.641,00
	10									
	10.1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM	M2	148,10	$ 58.287,00	$ 8.632.305,00			148,10	$ 8.632.305,00
	10.2	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	354,60	$ 106.606,00	$ 37.802.488,00			354,60	$ 37.802.488,00
	10.3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I.	ML	162,20	$ 107.723,00	$ 17.472.671,00			162,20	$ 17.472.671,00
	10.4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.623,60	$ 13.763,00	$ 104.923.607,00			7.623,60	$ 104.923.607,00
	10.5	ALFAJIA DE 20x7 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I, INCLUYE REF	ML	342,00	$ 68.555,00	$ 23.445.810,00			342,00	$ 23.445.810,00
	10.6	COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00			14,80	$ 2.418.364,00
	10.7	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	M3	10,40	$ 1.272.328,00	$ 13.232.222,00			10,40	$ 13.232.222,00
	10.8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIA	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.519,00			20,30	$ 33.421.519,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 241.349.286,00				$ 241.349.286,00
	11									
	11.1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	203,70	$ 188.595,00	$ 38.416.802,00			203,70	$ 38.416.802,00
	11.2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2 5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA, INCLUYE PINTURA	ML	342,00	$ 785.372,00	$ 268.597.224,00			342,00	$ 268.597.224,00
	11.3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE TUBO GALVANIZADO DE 2"X2 5MM, PLATINA DE 1"X3/16", INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	11.4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE TUBO GALVANIZADO DE 2"X2 5MM, PLATINA DE 1"X3/16", INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	11.5	PASAMANO METALICO EN 3 SECCIONES INC BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
Subtotal MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 337.572.853,00				$ 337.572.853,00
IV CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA GONZALO JIMENEZ										
	12									
	12.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	12.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			6,40	$ 322.957,00
	12.3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,40	$ 28.829.875,00
	12.4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.076.529,00			701,40	$ 7.076.529,00
	12.5	RELLENO Y COMPACTACION EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00			231,72	$ 43.221.397,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 85.210.350,00				$ 84.570.719,00
	13									
	13.1	PLACA DE PISO EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.526,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	13.2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0.15*0.40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	13.3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	13.4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACION	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 131.757.224,00				$ 131.757.224,00
	14									
	14.1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	14.2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	14.3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			633,80	$ 20.590.261,00
Subtotal ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 45.853.568,00				$ 45.853.568,00
	15									
	15.1	CANUELA EN CONCRETO PREFABRICADO 0.30*0.30 *0.80 M INCLUYE REJILLA	UND	88,00	$ 335.297,00	$ 29.823.760,00			88,00	$ 29.823.760,00
	15.2	CAJA DE INSPECCION 0.60M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	15.3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	15.4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	15.5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	9,15	$ 106.067,00	$ 970.513,00			9,15	$ 970.513,00
Subtotal INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						$ 31.819.869,00				$ 31.819.869,00
	16									
	16.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	16.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	16.3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	16.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	16.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	16.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	16.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLECTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 49.049.730,00				$ 49.049.730,00
ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS										
V CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA CRISTOBAL COLON										
	17									
	17.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	428,80	$ 7.616,00	$ 3.265.741,00			428,80	$ 3.265.741,00
	17.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	101,60	$ 50.462,00	$ 5.126.939,00			101,60	$ 5.126.939,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 8.392.680,00				$ 8.392.680,00
	18									
	18.1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM	M2	163,10	$ 58.287,00	$ 9.506.610,00			163,10	$ 9.506.610,00
	18.2	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	400,60	$ 106.606,00	$ 42.706.364,00			400,60	$ 42.706.364,00
	18.3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	182,90	$ 107.723,00	$ 19.702.537,00			182,90	$ 19.702.537,00
	18.4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.269,00	$ 13.763,00	$ 113.806.247,00			8.269,00	$ 113.806.247,00

BALANCE FINANCIERO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 251 DE 2025

							CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
	18.5	ALFAJIA DE 20x7 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I. INCLUYE REFUERZO	ML	395,00	$ 68.555,00	$ 27.079.225,00			395,00	$ 27.079.225,00
	18.6	COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I.	ML	14,80	$ 163.493,00	$ 2.418.364,00			14,80	$ 2.418.364,00
	18.7	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	M3	11,70	$ 1.272.329,00	$ 14.886.249,00			11,70	$ 14.886.249,00
	18.8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIA	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00			20,30	$ 33.421.819,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 263.527.415,00				$ 263.527.415,00
	19									
	19.1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	233,40	$ 188.595,00	$ 44.018.073,00			233,40	$ 44.018.073,00
	19.2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2" INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2,5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA, INCLUYE PINTURA	ML	395,00	$ 785.372,00	$ 310.221.940,00			395,00	$ 310.221.940,00
	19.3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE TUBO GALVANIZADO DE 2"X2,5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	19.4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE TUBO GALVANIZADO DE 2"X2,5MM, PLATINA DE 1"X3/16", INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	19.5	PASAMANO METÁLICO EN 3 SECCIONES INC BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
Subtotal MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 384.796.840,00				$ 384.796.840,00
CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA CRISTOBAL COLON										
	20									
	20.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	20.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			6,40	$ 322.957,00
	20.3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,40	$ 28.829.875,00
	20.4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00			701,40	$ 7.078.529,00
	20.5	RELLENO Y COMPACTACION EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00			235,20	$ 43.861.037,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 85.210.350,00				$ 85.210.350,00
	21									
	21.1	PLACA DE PISO EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	21.2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0.15*0.40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	21.3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	21.4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACION	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 131.757.224,00				$ 131.757.224,00
	22									
	22.1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	22.2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	22.3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			633,80	$ 20.590.261,00
Subtotal ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 45.853.568,00				$ 45.853.568,00
	23									
	23.1	CAÑUELA EN CONCRETO PREFABRICADO 0.30*0.30 *0.80 M. INCLUYE REJILLA	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			80,00	$ 26.823.760,00
	23.2	CAJA DE INSPECCION 0.60M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	23.3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	23.4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	23.5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	4,00	$ 106.067,00	$ 424.268,00			4,00	$ 424.268,00
Subtotal INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						$ 31.273.624,00				$ 31.273.624,00
	24									
	24.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	24.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	24.3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	24.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	24.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.580,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	24.6	SUMINISTRO EINSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	24.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLEGTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 49.049.730,00				$ 49.049.730,00
ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS										
VII CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA SANTA TERESITA										
	25									
	25.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	316,20	$ 7.616,00	$ 2.408.179,00			316,20	$ 2.408.179,00
	25.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	82,60	$ 50.462,00	$ 4.168.161,00			82,60	$ 4.168.161,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 6.576.340,00				$ 6.576.340,00
	26									
	26.1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM	M2	125,90	$ 58.287,00	$ 7.338.333,00			125,90	$ 7.338.333,00
	26.2	VIGA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO 20x25 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	286,80	$ 106.606,00	$ 30.574.601,00			286,80	$ 30.574.601,00
	26.3	COLUMNETA DE 20x20 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I.	ML	131,10	$ 107.723,00	$ 14.122.485,00			131,10	$ 14.122.485,00
	26.4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6.647,20	$ 13.763,00	$ 91.485.414,00			6.647,20	$ 91.485.414,00
	26.5	ALFAJIA DE 20x7 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I. INCLUYE RE	ML	281,20	$ 68.555,00	$ 19.277.666,00			281,20	$ 19.277.666,00
	26.6	COLUMNA DE 30x30 cm, EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I.	ML	14,80	$ 163.493,00	$ 2.418.364,00			14,80	$ 2.418.364,00
	26.7	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	M3	8,40	$ 1.272.329,00	$ 10.687.564,00			8,40	$ 10.687.564,00
	26.8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA GRADERIA	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00			20,30	$ 33.421.819,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 209.326.246,00				$ 209.326.246,00
	27									

BALANCE FINANCIERO

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVA

2221

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.251 DE 2025

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
	27.1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	162,90	$ 188.595,00	$ 30.722.126,00			162,90	$ 30.722.126,00
	27.2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2" INCLUYE ANGULOS DE SOPORTE DE 1-1/2"X3/16", TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16", BRAZO DOBLE PARA ALAMBRE Y CONCERTINA. INCLUYE PINTURA	ML	281,20	$ 785.372,00	$ 220.846.606,00			281,20	$ 220.846.606,00
	27.3	PORTON EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			31,50	$ 20.407.811,00
	27.4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 2"X2", INCLUYE TUBO GALVANIZADO DE 2"X2.5MM, PLATINA DE 1"X3/16" INCLUYE PINTURA	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			3,70	$ 2.653.884,00
	27.5	PASAMANO METÁLICO EN 3 SECCIONES INCLUYE BARANDA VERTICAL EN PERFIL CIRCULAR DE 2" INCLUYE PINTURA	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			15,80	$ 7.497.132,00
Subtotal MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 282.127.559,00				$ 282.127.559,00
VIII. CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA SANTA TERESITA										
	28									
	28.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00			672,00	$ 5.117.952,00
	28.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			6,40	$ 322.957,00
	28.3	RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			134,40	$ 28.829.875,00
	28.4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00			701,40	$ 7.078.529,00
	28.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00			235,20	$ 43.861.037,00
Subtotal PRELIMINARES						$ 85.210.350,00				$ 85.210.350,00
	29									
	29.1	PLACA DE PISO EN CONCRETO ESP. 0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA DE 5MM	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			672,00	$ 103.881.792,00
	29.2	VIGA CONFINAMIENTO DE 0.15*0.40 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			106,00	$ 10.107.206,00
	29.3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			483,00	$ 6.567.834,00
	29.4	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			497,00	$ 11.200.392,00
Subtotal ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ 131.757.224,00				$ 131.757.224,00
	30									
	30.1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00			2,00	$ 19.782.272,00
	30.2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			382,30	$ 5.481.035,00
	30.3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,60	$ 32.467,00	$ 20.570.261,00			633,60	$ 20.570.261,00
Subtotal ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS						$ 45.853.568,00				$ 45.853.568,00
	31									
	31.1	CANUELA EN CONCRETO PREFABRICADO 0.30*0.30*0.80 M INCLUYE REJILLA	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			80,00	$ 26.823.760,00
	31.2	CAJA DE INSPECCION 0.80M*0.60M	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			2,00	$ 1.371.488,00
	31.3	CAJA DE INSPECCION 1M*1M	UND	1,00	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00			1,00	$ 1.183.580,00
	31.4	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			20,70	$ 1.470.528,00
	31.5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	9,00	$ 106.067,00	$ 954.603,00			9,00	$ 954.603,00
Subtotal INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						$ 31.803.959,00				$ 31.803.959,00
	32									
	32.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			2,00	$ 100.924,00
	32.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M - 510 KG-F	UND	4,00	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00			4,00	$ 17.688.236,00
	32.3	CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	M3	1,50	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00			1,50	$ 1.702.626,00
	32.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA REFLECTORES EN POSTE	UND	4,00	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00			4,00	$ 5.913.664,00
	32.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 W SOLAR FOTOVOLTAICO	UND	8,00	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00			8,00	$ 14.172.768,00
	32.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 30 W	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			8,00	$ 4.230.136,00
	32.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REFLECTORES	UND	4,00	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00			4,00	$ 5.241.376,00
Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 49.049.730,00				$ 49.049.730,00
					SUBTOTAL OBRA FISICA	$ 3.542.000.192,00				$ 3.540.806.097,00
					IMPLEMENTAR PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (PGIO)	$ 35.933.036,60				$ 35.933.036,60
					TRAMITE DE CERTIFICADO RETILAP	$ 22.000.000,00				$ 22.000.000,00
					VALOR TOTAL CIVIL	$ 3.599.933.228,60				$ 3.598.739.133,60
					VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.598.933.228,60	OBSERVACIONES: N/A			
					VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00				
					VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 3.598.739.133,60				
					SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 1.194.096,00				

Realizó: EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 09100-0601065 CND

Verificó: LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT 901362359-8

Aprobó: PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ALCALDIA MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TAME


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

MUNICIPIO:	TAME	AREA DE INFLUENCIA:	RURAL				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
CONTRATO DE OBRA:	251 DE 2025	FECHA:	oct-25	HOJA	1	DE	1

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	4.4	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO	UNID.	M2	UBICACIÓN	ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS

Localización	Cant	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	Volumen	Medida Total
CANCHA MULTIPLE	1	8.8	20.00		176.00	176.00





176,00

OBSERVACIONES : Medidas Tomadas de los planos

Realizó: EDWIN REINALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

Verificó: LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Aprobó: PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS


VoBo JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

2614


ALCALDIA MUNICIPIO DE TAME

MUNICIPIO:	TAME	AREA DE INFLUENCIA:	RURAL	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES			
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
CONTRATO DE OBRA:	251 DE 2025	FECHA:	oct-25	HOJA	1	DE	1

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	4.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	UNID.	M3	UBICACIÓN	ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS

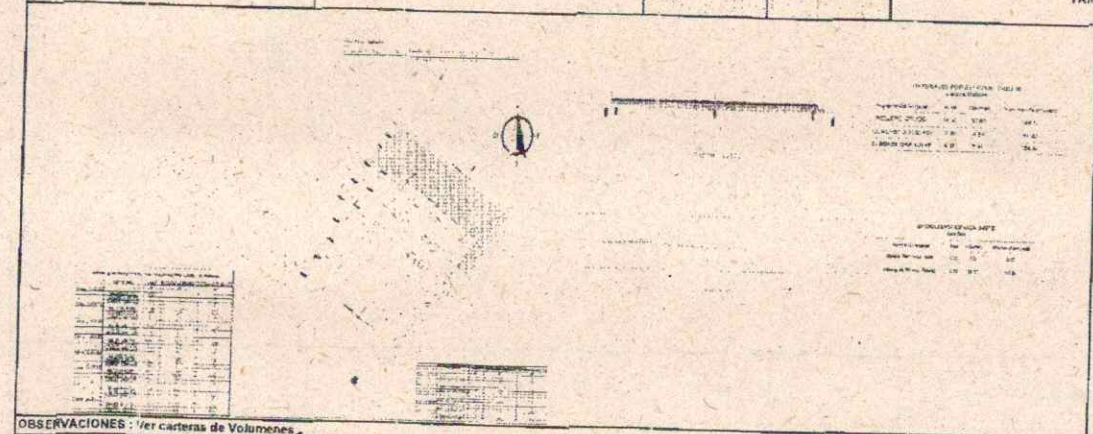

Localización	Cant	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	Volumen	Medida Total
VOLUMEN CANCHA MULTIPLE					148,72	148,72
VOLUMEN ZONA BAJA					111,94	111,94

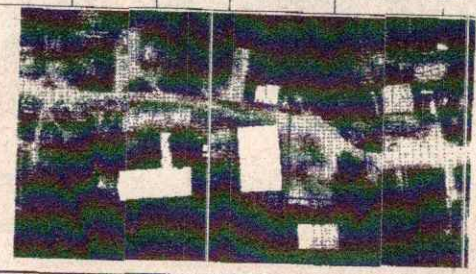

OBSERVACIONES : Ver carteras de Volumenes

260,66

Realizó: EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

Verificó: LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Aprobó: PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403154 NTS

VoBo JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO


ALCALDIA MUNICIPIO DE TAME

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

MUNICIPIO:	TAME	AREA DE INFLUENCIA:	RURAL				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRIETOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
CONTRATO DE OBRA:	251 DE 2025	FECHA:	oct-25	HOJA	1	DE	1


CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	12,5	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	UNID.	M3	UBICACIÓN	ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS

Localización	Cant	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	Volumen	Medida Total
CANCHA MULTIPLE	1				231,77	231,77



MATERIALES POR ESTACION 0+038.15

Nombre del Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
CORTE	0.00	0.00	0.00
CRUDO DE RIO	0.00	4.56	231.77
MAT. SUBBASE	0.00	9.85	134.46



231,77

OBSERVACIONES : Ver carteras de Volumenes

Realizó: EDWIN ARNALDO RINCÓN MEDINA
DIRECTOR DE OBRA
M.P 091037-0601065 CND

Verificó: LIBARDO A. SARMIENTO MALDONADO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Aprobó: PEDRO LUIS USMA VILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P 54202-403854 NTS

VoBo JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

2618

CARTERA DE MATERIALES ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR

	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
		m^2	m^3	m^3
Station: 0+000.000				
	RELLENO(CRUDO)	5,99	0	0
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	0	0
	SUBBASE GRANULAR	4,2	0	0
Station: 0+005.000				
	RELLENO(CRUDO)	2,56	21,38	21,38
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	10,5
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	21
Station: 0+010.000				
	RELLENO(CRUDO)	0,99	8,89	30,27
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	21
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	42
Station: 0+015.000				
	RELLENO(CRUDO)	2,65	9,1	39,38
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	31,5
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	63
Station: 0+020.000				
	RELLENO(CRUDO)	1,17	9,54	48,92
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	42
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	84
Station: 0+025.000				
	RELLENO(CRUDO)	7,04	20,52	69,44
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	52,5
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	105
Station: 0+030.000				
	RELLENO(CRUDO)	11,54	46,46	115,9
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	10,5	63
	SUBBASE GRANULAR	4,2	21	126
Station: 0+032.000				
	RELLENO(CRUDO)	16,4	32,8	148,72
	CONCRETO 3000 PSI	2,1	4,2	67,2
	SUBBASE GRANULAR	4,2	8,4	134,4

Carlos Rodriguez

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M.P 01-21298

DIRECTOR INTERVENTOR.

2619

MOVIMEINTO DE TIERRA PARA ESTABILIZACION DE AREA CONSTRUCTIVA CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR

	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
		m²	m³	m³
Station 0+019.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	0	0	0
Station 0+024.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	1,87	4,68	4,68
Station 0+029.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	4,09	14,89	19,57
Station 0+031.262				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	17,05	52,84	72,42
Station 0+037.518				
	Material Removido (corte)	0	0	0
	Material de Relleno (Relleno)	4,39	39,52	111,94

Carlos Rodriguez

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M.P 01-21298

DIRECTOR INTERVENTORIA

CARTERA DE MATERIALES ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE VELASQUEROS

	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
Station: 0+000.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	0	0	0
Station: 0+003.770				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	8,11	15,29	15,29
Station: 0+004.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	8,16	1,87	17,16
Station: 0+008.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	8,17	32,66	49,81
Station: 0+012.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,96	30,26	80,08
Station: 0+016.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	5,77	25,47	105,54
Station: 0+020.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	5,78	23,09	128,64
Station: 0+024.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	5,9	23,35	151,99
Station: 0+028.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,12	24,05	176,04
Station: 0+032.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,45	25,16	201,2
Station: 0+035.770				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	6,69	24,77	225,97
Station: 0+036.000				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	4,23	1,26	227,23
Station: 0+038.152				
	CORTE	0	0	0
	CRUDO DE RIO	0	4,55	231,77

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M P 01-21298

DIRECTOR, IOTEAVENTOMA

CARTERA DE MATERIALES ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE VELASQUEROS

	TIPO DE AREA	AREA	VOLUMEN INCREMENTAL	VOLUMEN ACUMULADO
Station: 0+000.000				
	MAT. SUBBASE	0	0	0
Station: 0+003.770				
	MAT. SUBBASE	3,83	7,21	7,21
Station: 0+004.000				
	MAT. SUBBASE	3,83	0,88	8,09
Station: 0+008.000				
	MAT. SUBBASE	3,84	15,34	23,44
Station: 0+012.000				
	MAT. SUBBASE	3,8	15,29	38,72
Station: 0+016.000				
	MAT. SUBBASE	3,76	15,13	53,86
Station: 0+020.000				
	MAT. SUBBASE	3,77	15,06	68,91
Station: 0+024.000				
	MAT. SUBBASE	3,77	15,07	83,99
Station: 0+028.000				
	MAT. SUBBASE	3,77	15,09	99,07
Station: 0+032.000				
	MAT. SUBBASE	3,78	15,12	114,19
Station: 0+035.770				
	MAT. SUBBASE	3,79	14,29	128,48
Station: 0+036.000				
	MAT. SUBBASE	3,78	0,87	129,35
Station: 0+038.152				
	MAT. SUBBASE	0	5,05	134,40

Carlos Rodriguez

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
TOPÓGRAFO
M.P 01-21298

DIRECTOR INTERVENTORIA

2779

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDÍGENAS EL PORVENIR, GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA, CRISTÓBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, MUNICIPIO DE TAME – DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Contrato N.° 251V-2025

R/ Libardo Jarmiento Pl.
06/09/2025
11:05 A.M.

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962959-1

Resguardo indígena Ju lieros. 06-09-2025

Señores:

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
Contratista.

INTERCERRAMIENTOS
Interventoría

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Ciudad.

Referencia: Solicitud de cambio de ubicación para la construcción de la cancha deportiva.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted de manera respetuosa para solicitar que la construcción de la cancha deportiva en la sede educativa **El Porvenir** se realice dentro del espacio o entorno escolar.

La propuesta actual de construcción de la cancha se encuentra aproximadamente a 500 metros de distancia de la institución, lo cual genera múltiples dificultades y riesgos para los estudiantes:

- El desplazamiento hacia la cancha implica que los niños y niñas transiten muy cerca al corredor vial, exponiéndose a accidentes.
- En épocas de lluvia existe el riesgo de encontrarse con animales peligrosos (serpientes, arañas, entre otros) y no hay espacios adecuados para resguardarse.

ANEXO 2. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958.438-2

R/ Libardo Sarmiento 09:00 a.m. 02/10/2025

Tame Arauca, 02 de octubre de 2025

Señores
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
Contratista de obra

Referencia: Viabilidad de ajustes en cerramiento perimetral y cancha múltiple – Resguardos Indígenas Julieros y Velasqueros

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en medio de mis funciones como interventoría externa del contrato de obra No. 251 de 2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENAS EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, me permito informar que, una vez revisada y evaluada la documentación presentada mediante comunicación del 01 de octubre 2025 , correspondiente a las solicitudes de ajuste para la construcción de cerramiento perimetral y cancha múltiple en las escuelas de los Resguardos Indígenas Julieros y Velasqueros, esta Interventoría emite **CONCEPTO FAVORABLE** respecto a la viabilidad de las modificaciones propuestas.

Se verificó que los ajustes, tanto en la realineación del cerramiento y desplazamiento de la cancha en la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada del Resguardo Indígena Velasqueros, como en la reubicación de la cancha en la escuela el Porvenir del Resguardo Indígena Julieros, cuentan con sustento técnico, social y financiero, además los balances económicos presentados demuestran que las modificaciones no afectan el equilibrio contractual ni generan sobrecostos significativos.

En consecuencia, se procederá a informar formalmente a la Entidad Contratante sobre la viabilidad de los ajustes, con el fin de programar un comité de aprobación en el que participen todas las partes involucradas.

Una vez obtenida la aprobación en dicho comité, se autorizará la ejecución de las actividades contractuales ajustadas, de conformidad con lo establecido en los documentos técnicos y financieros presentados.

Atentamente,

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

Carrera 22 No.16-63 Barrio el Cielo Tame – Arauca
intercerramiento@gmail.com
Tel. 3142787795

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958.438-2

2623

Tame, 03 de octubre de 2025

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIA: 3-10-2025
HORA: 3:00 PM
RECIBIO: DPS

Ingeniera
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Y DESARRLLO URBANO
Supervisor

Referencia: Solicitud de Comité Técnico para Socialización y Aprobación de Ajustes a los Diseños.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en mi calidad de Interventor externo del Contrato de Obra N° 251 de 2025, me permito solicitar la convocatoria de un Comité Técnico con el fin de socializar y evaluar de manera conjunta los ajustes a los diseños propuestos por el contratista de obra para los cerramientos perimetrales y canchas múltiples en las escuelas indígenas de los Resguardos Julieros y Velasqueros.

Se aclara que estas modificaciones han sido previamente viabilizadas técnica y financieramente por esta Interventoría Externa y buscan atender solicitudes específicas de las comunidades indígenas y optimizar la funcionalidad el proyecto. Los cambios propuestos son:

Resguardo Velasqueros (Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada): Realineación del cerramiento para incluir una estructura vital para la alimentación de la población infantil y realizar el desplazamiento de la cancha múltiple para liberar área de expansión futura.

Resguardo Julieros (Escuela El Porvenir): Reubicación de la cancha múltiple al interior del área de la escuela, lo cual implica la reubicación concertada de tres viviendas familiares para su viable ejecución.

Cabe resaltar que el objetivo de este comité es presentar la documentación técnica y financiera de soporte, socializar los alcances de los ajustes y obtener la aprobación conjunta de todas las partes, permitiendo así proceder con la ejecución contractual de las actividades actualizadas sin contratiempos.

Agradezco la gestión para la programación de este espacio de trabajo, quedando atento a la confirmación de la fecha y logística para la realización del mismo.

Atentamente,

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTERCERRAMIENTOS

Carrera 22 No.16-63 Barrio el Cielo Tame – Arauca
intercerramiento@gmail.com
Tel. 3142787795

2624

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958-[illegible]8-2

R/Libardo Sarmiento 04/10/2025 09:30 a.m

Tame Arauca, 04 de octubre de 2025

Señores
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
Contratista de Obra

Referencia: Solicitud de Informe mensual No.03 septiembre 2025- Contrato de Obra 251 de 2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en medio de mis funciones como interventoría externa del contrato de Obra No. 251 de 2025 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, me permito solicitar de acuerdo a la cláusula 10 del contrato OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA; El informe de actividades de obra No 03. Correspondiente al periodo del 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 con sus respectivos soportes y aspectos administrativos, jurídicos, técnicos, financieros y ambientales.

Quedo atento a cualquier manifiesto de su parte.

Atentamente;

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

Tame Arauca, 06 de octubre de 2025

06-10-2025

Ingeniera:
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Supervisora

Referencia: Remisión de Informes mensuales mes de septiembre de 2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en medio de mis funciones como interventoría externa del contrato de Obra No. 251 de 2025 cuyo objeto es la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, me permito remitir el informe mensual No.3 de Interventoría correspondiente al mes de septiembre de 2025 con copia del Informe de Obra aprobado para su revisión y demás fines pertinentes.

- Informe No.3 del Contrato de Interventoría No.239 de 2025 (01 - 30 septiembre 2025)
- Informe No.3 del Contrato de Obra No.251 de 2025 (01 - 30 septiembre 2025)

Atentamente;

REDECILUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

2626

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.948.438-2

R/L Libardo Sarmiento M.
08/10/2025
11:00 am

Tame Arauca, 08 de octubre de 2025

Señores
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
Contratista de Obra

Referencia: Solicitud de Información de retrasos de contrato de obra No. 251-2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, y en el marco de mis funciones como Interventor Externo del Contrato de Obra N.º 251 de 2025, cuyo objeto es la *"Construcción de cerramiento perimetral y escenarios deportivos en los Centros Educativos Rurales Indígenas El Porvenir, Gonzalo Jiménez de Quesada, Cristóbal Colón y Santa Teresita, en el municipio de Tame, departamento de Arauca"*, me permito solicitar al contratista la información detallada sobre el retraso que actualmente presenta la obra.

Dicha información será fundamental para evaluar las causas que han generado el desfase en la ejecución, así como para definir las acciones correctivas y el plan de recuperación correspondiente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas y plazos establecidos en el contrato.

Quedo atento a cualquier manifiesto de su parte.

Atentamente;

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

2627

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958.438-2

R/ Libardo Sarmiento M.
13/10/2025.
9:00 am

Tame Arauca, 13 de octubre de 2025

Señores
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
Contratista de Obra

Referencia: Verificación suspensión de actividades por paro

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, y en el marco de mis funciones como Interventor Externo del Contrato de Obra N.º 251 de 2025, cuyo objeto es la *"Construcción de cerramiento perimetral y escenarios deportivos en los Centros Educativos Rurales Indígenas El Porvenir, Gonzalo Jiménez de Quesada, Cristóbal Colón y Santa Teresita, en el municipio de Tame, departamento de Arauca"*, y dando respuesta a la información presentada por el contratista, la interventoría externa avala la suspensión temporal de actividades correspondiente a los días 14 al 18 de octubre de 2025, debido a situaciones de orden público que generaron el cierre de vías en el municipio de Tame.

Dicha suspensión se considera justificada, teniendo en cuenta que las condiciones de acceso y seguridad en la zona impidieron el normal desarrollo de las labores en campo. Una vez restablecidas las condiciones adecuadas, el contratista deberá reanudar las actividades el fin de mitigar el impacto en el cronograma de ejecución.

Quedo atento a cualquier manifiesto de su parte.

Atentamente;

PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

2628

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958.438-2

Tame Arauca, 17 de octubre de 2025

17/10/25.

Ingeniera:
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Supervisora

Referencia: Reporte de Avance Quincenal COP 251 DE 2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en medio de mis funciones como interventoría externa del contrato de Obra No. 251 de 2025 cuyo objeto es la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, me permito remitir a su despacho para revisión y fines pertinentes, el reporte Quincenal de Avance Físico del contrato de obra de la referencia, el cual se presenta a corte del 15 de Octubre de 2025.

Atentamente;

PEDRO LUIS OSMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

2629

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

NIT. 901.958.438-2

R/ Libardo Sarmiento M.
20/10/2025.
10:30 am.

Tame Arauca, 20 de octubre de 2025

Señores
CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
Contratista de Obra

Referencia: Verificación suspensión de actividades por paro

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, y en el marco de mis funciones como Interventor Externo del Contrato de Obra N.º 251 de 2025, cuyo objeto es la *"Construcción de cerramiento perimetral y escenarios deportivos en los Centros Educativos Rurales Indígenas El Porvenir, Gonzalo Jiménez de Quesada, Cristóbal Colón y Santa Teresita, en el municipio de Tame, departamento de Arauca"*, y dando respuesta a la información presentada por el contratista, la interventoría externa avala la suspensión temporal de actividades en el resguardo Velazqueros, correspondiente a los días 20 y 21 de octubre de 2025.

Dicha suspensión se considera justificada, debido al fallecimiento de un miembro de la comunidad, situación que llevó a que la misma restringiera el ingreso del personal de obra y no permitiera la ejecución de las labores programadas durante las fechas mencionadas.

Una vez la comunidad otorgue la autorización para el reinicio de las actividades, el contratista deberá reprogramar las tareas pendientes con el fin de garantizar la continuidad del proyecto y minimizar el impacto en el cronograma de ejecución.

Quedo atento a cualquier manifiesto de su parte.

Atentamente;

PEDRO JOSE USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Tame, 01 de octubre de 2025

Recibí
01-10-25.
8:00 AM.
DIRECTOR.

Señores
CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
R/L PEDRO LUIS USMA VILLA
Ciudad

REF: Solicitud de comité técnico para revisión de ajustes en diseños.

Cordial saludo,


Por medio de la presente se informa que, de acuerdo con la programación de obra aprobada, se dará inicio a la construcción del cerramiento perimetral y la cancha múltiple en las siguientes instituciones:

- ✓ Escuela Indígena El Porvenir (Resguardo Indígena Julieros)
- ✓ Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada (Resguardo Indígena Velasqueros)

No obstante, atendiendo a las solicitudes realizadas por los gobernadores y docentes de estas comunidades durante la socialización del contrato (22 de julio de 2025), se presentan para su revisión y aprobación los documentos técnicos que avalan los siguientes ajustes:

1. Resguardo Indígena Velasqueros: Realineación del cerramiento y desplazamiento de la cancha

Solicitud: La comunidad solicitó modificar el alineamiento del cerramiento en un costado para incluir una estructura existente utilizada para el almacenamiento de víveres del programa de alimentación escolar. Esta estructura, en la implantación actual, quedaría fuera del cerramiento, lo que la hace vulnerable a robos.

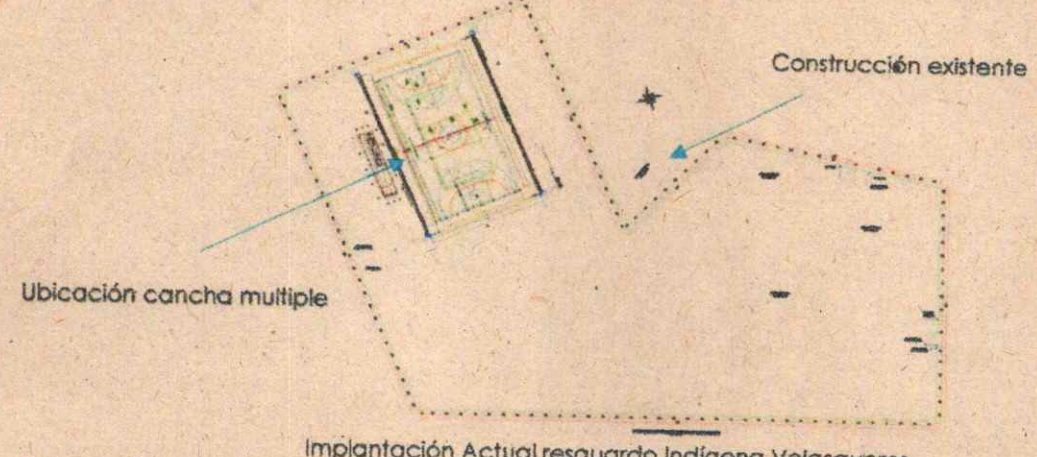

Implantación Actual resguardo Indígena Velasqueros


CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC



Estructura a conservar dentro del Cerramiento Perimetral (Resguardo Indígena Velasqueros)

Evaluación Técnica: Tras una visita de verificación, se constató que el cambio de alineamiento es viable. No afecta el equilibrio económico del contrato, ya que existe zona suficiente para cumplir con la longitud total de 354.26 ml contemplada en los planos originales..

Ajuste Adicional: Aprovechando el nuevo espacio disponible y a solicitud de la comunidad, se propone desplazar la cancha múltiple 12 metros hacia el oeste. Esto libera un área valiosa para futuras ampliaciones de la institución educativa.

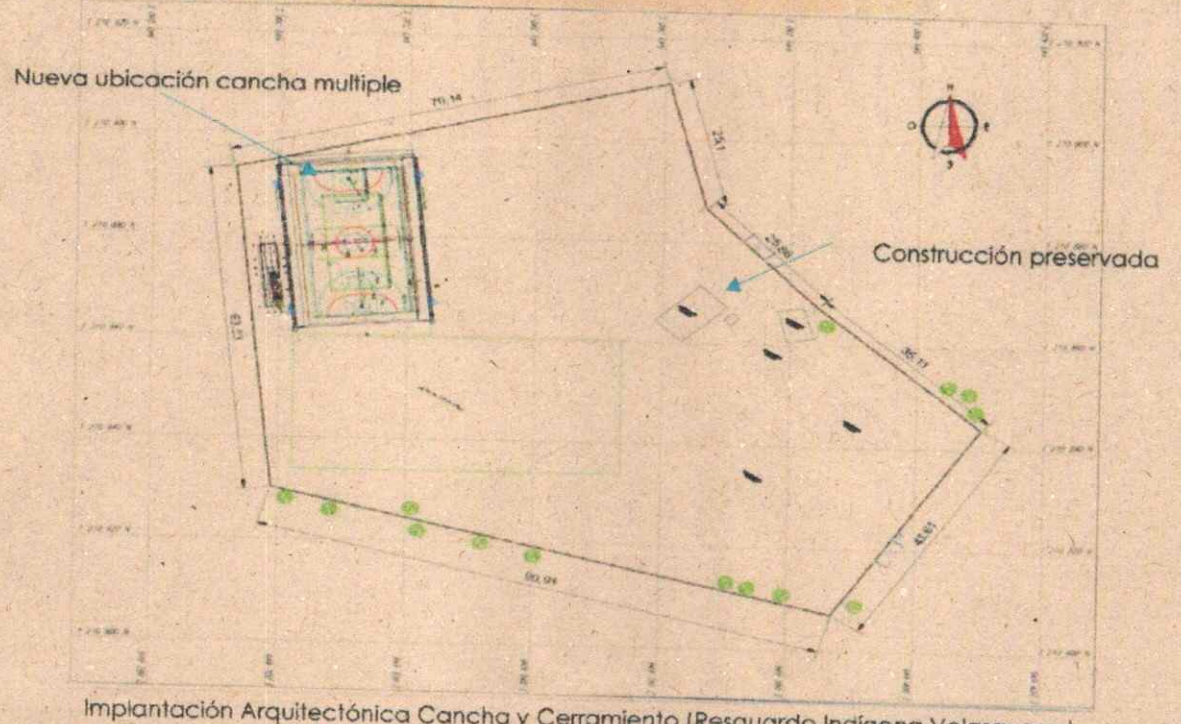

Implantación Arquitectónica Cancha y Cerramiento (Resguardo Indígena Velasqueros)

Para soportar esta modificación, se anexa la planimetría con secciones transversales, la nueva implantación del cerramiento, el volumen de materiales y el balance financiero correspondiente.

2. Resguardo Indígena Julieros (Escuela El Porvenir): Reubicación de la cancha múltiple

Solicitud: La comunidad, mediante oficio del 6 de septiembre de 2025, solicitó construir la cancha dentro de las instalaciones de la sede educativa, puesto que en los diseños iniciales, la cancha se ubicaba a 350 metros de la escuela, lo que genera riesgos para los estudiantes por la proximidad a la vía nacional, la presencia de animales peligrosos en invierno y la falta de sombra y agua potable en verano.



Implantación Actual (Resguardo Indígena Julieros)

Se realizó una visita de reconocimiento para evaluar la viabilidad del ajuste, durante la cual se identificó que la nueva zona propuesta dentro de la escuela contenía tres viviendas familiares construidas con materiales rudimentarios, como palma y madera. Por este motivo, se concertó con las familias afectadas su reubicación.

Evaluación Financiera:

Se llevó a cabo un levantamiento topográfico para determinar los nuevos volúmenes de material requeridos. Tras analizar la cantidad de material crudo de río (Tamaño Nominal

4") y contrastarlo con las carteras de campo, se concluye que la reubicación es viable técnica y financieramente, sin generar sobrecostos significativos.




Viviendas que requieren Reubicación (Resguardo Indígena Julieros)



Zona de Implantación cancha múltiple (Resguardo Indígena Julieros)

A continuación, se presenta la propuesta de implantación:

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

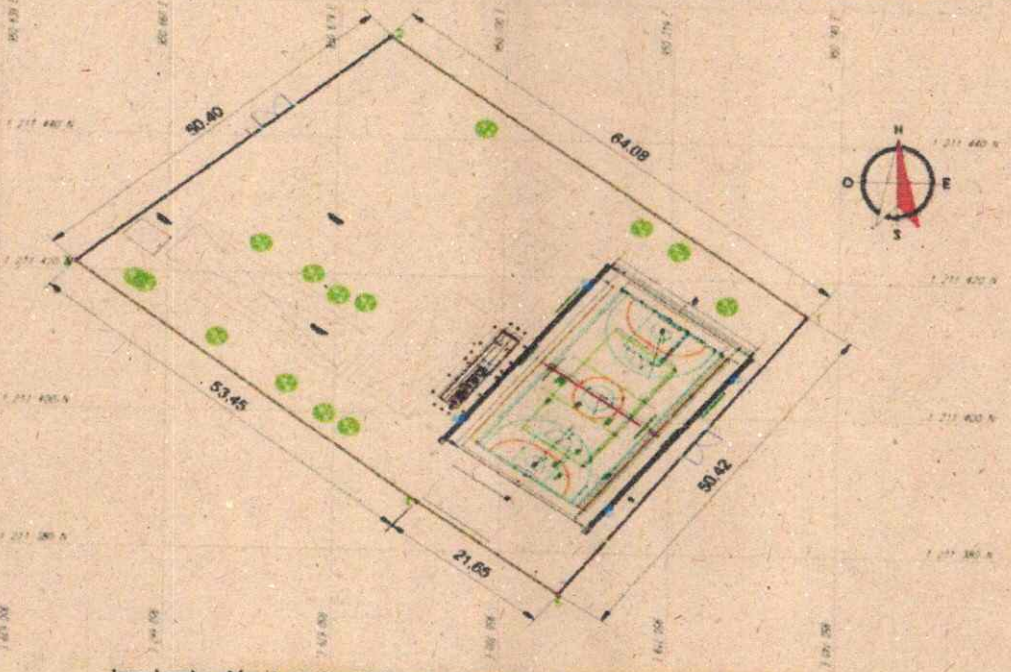

Implantación Arquitectónica Cancha (Resguardo Indígena Julieros)

Para soportar esta modificación, se anexa el oficio de solicitud de la comunidad, el balance financiero actualizado y los planos de implantación de los diseños ajustados.

Conclusión y Solicitud

En virtud de lo expuesto, se solicita a la interventoría revisar la documentación adjunta y evaluar la viabilidad técnica de los ajustes propuestos para proceder con su implementación, considerando que la ejecución de actividades en ambos resguardos está programada para iniciar en los próximos días.

Documentos Anexos:

- ✓ Oficio de solicitud del Resguardo Indígena Julieros.
- ✓ Balances financieros actualizados para ambos resguardos.
- ✓ Planos de implantación de diseños ajustados (Resguardos Julieros y Velasqueros), que incluyen volúmenes de materiales.

Cordialmente,

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT 901962949-1

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1

2635

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TRD- 400

Recibí
03-10-25.
3:00 pm.
DIRECTOR

Tame, 03 octubre de 2025

Ingeniero:
PEDRO LUIS USMA VILLA
R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
Carrera 22 No.16-63 Barrio el Cielo
Ciudad

Referencia: Citación Comité Técnico No.02 Contrato Obra Pública No.251 de 2025.

Cordial saludo,

En atención a su solicitud de comité técnico mediante la cual busca socializar los ajustes a los diseños propuestos para el Contrato de Obra Pública No.251 de 2025, en referencia a los cerramientos perimetrales y canchas múltiples en las escuelas indígenas de los Resguardos Julieros y Velasqueros, esta Supervisión ha programado la siguiente reunión:

- ✓ Fecha: 06 de octubre de 2025
- ✓ Hora: 8:00 a.m.
- ✓ Lugar: Oficina de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Objetivo de Comité:

Verificar los documentos técnicos presentados y analizar conjuntamente los ajustes propuestos por el contratista de obra, los cuales fueron previamente viabilizados por la interventoría externa, con el fin de evaluar su aprobación definitiva.

Temas a tratar:

- ✓ Presentación de los ajustes propuestos para el Resguardo Velasqueros (realineación de cerramiento perimetral y desplazamiento de cancha múltiple).
- ✓ Presentación de los ajustes propuestos para el Resguardo Julieros (reubicación de cancha múltiple y reubicación de viviendas).
- ✓ Análisis de la documentación técnica y financiera presentada como soporte.
- ✓ Evaluación conjunta y definición de viabilidad de los ajustes.

Se solicita puntual asistencia y portar copia física de los documentos técnicos y financieros correspondientes para su verificación durante la reunión.

Aprovechamos para extender esta convocatoria a los representantes del contratista de obra y demás actores involucrados en el proyecto.

Cordialmente,

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano
Supervisora

2636

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Tame, 11 de octubre de 2025

Recibido
11-10-25.
8:00 am.

Señores
CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
R/L PEDRO LUIS USMA VILLA
Ciudad

REF: Respuesta a solicitud de información de retrasos de obra

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informar a la interventoría externa que los retrasos presentados en la ejecución de la obra se originaron por la falta de disponibilidad de material de ornamentación requerido para la instalación del cerramiento perimetral, específicamente en los ángulos de soporte, tubos galvanizados y platinas, insumos indispensables para el correcto desarrollo de dicha actividad.

Esta situación generó una interrupción temporal en la programación de las labores de campo, dado que el avance de la estructura metálica dependía directamente del suministro de los elementos mencionados, los cuales no se encontraban disponibles en el proveedor durante el periodo correspondiente.

No obstante, se informa que a la fecha el material ha sido recibido en su totalidad, por lo que el personal de obra cuenta con los insumos necesarios para continuar con las actividades de ornamentación y ensamble. En consecuencia, se ha reprogramado la ejecución de estas labores dentro del cronograma general, con el fin de recuperar el tiempo no ejecutado y minimizar el impacto en el avance físico del proyecto.

Cordialmente,

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962949-1

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

2637

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Tame, 12 de octubre de 2025

Recibí
12-10-25
Director.
8:00 am.

Señores
CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
R/L PEDRO LUIS USMA VILLA
Ciudad

REF: Información de suspensión de actividades

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informar a la interventoría externa que durante los días 14 al 18 de octubre no se realizarán actividades en campo debido a la situación de orden público que se presenta en el municipio, la cual ha ocasionado el cierre de las vías de acceso hacia la zona de trabajo. En consecuencia, el personal operativo no ha podido desplazarse al sitio de la obra, lo que ha impedido la ejecución de las labores programadas para dichas fechas. Cabe resaltar que el día 13 de octubre fue festivo, por lo cual no se realizaron actividades en cumplimiento del calendario laboral vigente.

Cordialmente,

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962949-1

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

2638

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC

Tame, 20 de octubre de 2025

Recibí
20-10-25
Director
8:00 am

Señores
CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
R/L PEDRO LUIS USMA VILLA
Ciudad

REF: Información de suspensión de actividades

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informar a la interventoría externa que durante los días 20 y 21 de octubre no se llevarán a cabo actividades en campo en el resguardo Velazqueros, debido a una situación social interna relacionada con el fallecimiento de un miembro de la comunidad.

La comunidad, en atención a sus costumbres y procesos culturales, ha solicitado suspender temporalmente las labores y restringir el ingreso del personal de obra al área de intervención durante los días mencionados, con el fin de adelantar las respectivas actividades conmemorativas y de acompañamiento a la familia afectada.

En este sentido, y atendiendo las disposiciones comunitarias, el contratista ha suspendido las labores programadas para dichas fechas, garantizando el respeto por los usos y tradiciones del resguardo. Una vez la comunidad autorice el reinicio de actividades, se procederá con la reprogramación de las tareas pendientes, a fin de dar continuidad a la ejecución del contrato sin afectar significativamente el cronograma establecido.

Cordialmente,

CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT. 901962949-1

LIBARDO ALFONSO SARMIENTO
R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
NIT: 901.962.949-1

Calle 17 #12-93 B. La ferias Tame – Arauca
consorciocic1@gmail.com
Nit. 901.962.949-1
3112691312

ANEXO 3.
COPIA DE BITACORA DE OBRA MES DE OCTUBRE

2640

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Miercoles, 01 de octubre de 2025	Hoja No:	79
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	Nº 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	5	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	2	Electrico		Soldador	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLON):
Se realiza corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi
Se continua con la consfrucción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje A -25 ml)
Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje B -11.96 m2)
Se realiza fundida de vigas de confinamiento de cancha (BD1 - X2 - 64 ml)
Se incia corte y sello para dilataciones de la cancha (20 secciones 3.20*2.62)
FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje 2 - 8.97 m2)
Se realizo corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi
ITEM EJECUTADOS
18.4 - 21.3 - 26.4 Acero de refuerzo 60000 psi
18.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo
19.1 - 27.1 Muro en ladrillo a la vista
21.2 Viga confinamiento de 0.15*0.40 m en concreto de 3.000 PSI
21.4 Corte y sello para juntas de dilatación

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	2	Bueno
Cizalla manual	1	Bueno
Dobladora manual	1	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	1	Bueno
Cortadora de ladrillo con disco	2	Bueno
Vibrador de concreto	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Jueves, 02 de octubre de 2025	Hoja No:	80
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRÁL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	Nº 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	5	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	2	Electrico		Soldador	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):

Se continua con corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi

Se continua con la construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje 1 -30 ml)

Se realizo fundida de cañuela en concreto de 3000 psi (13 unidades - 10.4 ml)

Se realizo vaciado de concreto de 3000 psi en gradenas (1,02 m3) Muro T 1 (4)

Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje B -15,87 m2)

Se continua con corte y sello para dilataciones de la cancha (30 secciones 3.20*2.62)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):

Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje 2 - 8,13 m2)

Se realizo construcción de muro en las graderias en bloque No. 5

Se realizo corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi

ITEM EJECUTADOS

18.4 - 21.3 - 26.4 Acero de refuerzo 60000 psi

18.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo

18.8 Concreto de 3000 psi para graderia

19.1 - 27.1 Muro en ladrillo a la vista

21.4 Corte y sello para juntas de dilatación

23.1 Cañuela en concreto prefabricado 0.30*0.30 *0.80 m, incluye rejilla

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	2	Bueno
Cizalla manual	1	Bueno
Dobladora manual	1	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Cortadora de ladrillo con disco	2	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

26411

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Viernes, 03 de octubre de 2025	Hoja No:	81

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	Nº 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	5	Secretario	1
Ingenieros	2	Topografo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	2	Electrico		Soldador	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAROS (ESCUELA CRISTOBAL COLON):

Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje 2 - 11,96 m2)

Se continua con corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi

Se continua con la construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje 1 -30 ml)

Se realizo fundida de cañuela en concreto de 3000 psi (13 unidades - 10,4 ml)

Se realizo vaciado de concreto de 3000 psi en graderias (0,41 m3) Muro T2 (1) Muro T3 (1)

Se finaliza con corte y sello para dilataciones de la cancha (30 secciones 3,20*2,62)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):

Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje B - 8,97 m2)

Se continua con el vaciado de concreto de 3000 psi para muros de refuerzo gradenas (1,43 m3)- M-T1 (4) M-T2(1) M-T3(1)

Se realizo corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi

ITEM EJECUTADOS

18.4 - 21.3 - 26.4 Acero de refuerzo 60000 psi

18.5 Alfajia de 20x7 cm. en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo

18.8 - 26.8 Concreto de 3000 psi para graderia

19.1 - 27.1 Muro en ladrillo a la vista

21.4 Corte y sello para juntas de dilatación

23.1 Cañuela en concreto prefabricado,0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	2	Bueno
Cizalla manual	1	Bueno
Dobladora manual	1	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Cortadora de ladrillo con disco	2	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Sabado 04 de octubre de 2025	Hoja No:	82

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	5	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	2	Electrico		Soldador	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLON):

Se realizo vaciado de concreto de 3000 psi en graderias (1.22 m3)-Contrahuellas 1.2y3.

Se realizo fundida de cañuela en concreto de 3000 psi (13 unidades - 10.4 ml)

Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje 2 - 11.96 m2)

Se continua con corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi

Se continua con la construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje 1 -30 ml)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):

Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje B - 8.97 m2)

Relleno con material comun de excavación para graderias

ITEM EJECUTADOS

18.4 / 21.3 Acero de refuerzo 60000 psi

18.5 Alfajia de 20x7 cm. en concreto de 3.000 PSI. incluye refuerzo

18.8 Concreto de 3000 psi para graderia

19.1 - 27.1 Muro en ladrillo a la vista

23.1 Cañuela en concreto prefabricado 0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	2	Bueno
Cizalla manual	1	Bueno
Dobladora manual	1	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Cortadora de ladrillo con disco	2	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora	
Nombre	
Cargo	
Actividad que Desempeñaba	

Hubo Lesión?

Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

2642

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Domingo, 05 de octubre de 2025	**Hoja No:**	83
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental		Ayudantes		Secretario	
Ingenieros		Topógrafo		HSEQ	
Conductores		Cadeneros		Inspectores	
Oficiales		Electrico		Soldador	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
No se realizaron actividades, dia dominical

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
No se realizaron actividades, dia dominical

ITEM EJECUTADOS

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	X

FIRMA		**FIRMA**	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

3155

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Lunes, 06 de octubre de 2025	Hoja No:	84

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	Nº 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	4	Secretario	1
Ingenieros	2	Topografo	1	HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros	2	Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
Se realizó la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje 2 - 11.96 m2)
Se continua con la construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje 1 -26,80 ml)
Se realizo fundida de cañuela en concreto de 3000 psi (13 unidades - 10.4 ml)
FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje B - 8,97 m2)
Se continua con el vaciado de concreto de 3000 psi para contra huellas graderias (1.22 m3) - contrahuella 1.2y3
FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
Se inició con la actividad de localización y replanteo topografico del cerramiento (Eje 1 - 63.53 m2) y cancha (672 m2)
Se inició con el descapote en la zona de cancha (400 m2)
Se iaicio con la excavación manual para zapatas (Eje 1 -3.78 m3 - 14 zapatas)
ITEM EJECUTADOS
9.1-12.1 Localización y replanteo topografico
9.2 Excavación manual en material común
12.4 Descapote y nivelación manual del terreno
18.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo
26.8 Concreto de 3000 psi para graderia
19.1 - 27.1 Muro en ladrillo a la vista
23,1 Cañuela en concreto prefabricado 0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Equipo de topografia	1	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno
Cortadora de ladrillo con disco	2	Bueno
Equipo de soldadura	1	Bueno
Equipo de pintura	1	Bueno
Andamios	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesion?

Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359038 STD

2643

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Martes, 07 de octubre de 2025	Hoja No:	86

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	4	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo	1	HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros	2	Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		X

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLON):
Se realizó la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje 2 - 14,69 m2)
Se continua con la construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje B - 30 ml)
Se realizo fundida de cañuela en concreto de 3000 psi (13 unidades - 10,4 ml)
Se realiza exacavacion y fundidad de cajas de inspección (1 caja 0.60*0.60)
FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje B - 8,97 m2)
Se continua con el vaciado de concreto de 3000 psi para graderias (0,43 m3) - Contrahuela 2A (1) - Auxiliares (2)
FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
Se continua con la actividad de localización y replanteo topografico del cerramiento (Eje A - 70,14 m2)
Se finalizó el descapote de la cancha. (301,4 m2)
ITEM EJECUTADOS
9.1 - 12.1 Localización y replanteo topográfico
9.2 Excavación manual en material común
12.4 Descapote y nivelación manual del terreno
18.5 Alfajia de 20x7 cm. en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo
23.1 Cañuela en concreto prefabricado 0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla
23.2 Caja de inspección 0.60m*0.60m
23.3 Caja de inspección 1m*1m
26.8 Concreto de 3000 psi para graderia
19.1 - 27.1 Muro en ladrillo a la vista

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menór.	3	Bueno
Equipo de topografia	1	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno
Cortadora de ladrillo con disco	2	Bueno
Equipo de soldadura	1	Bueno
Equipo de pintura	1	Bueno
Andamios	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora			
Nombre			
Cargo			
Actividad que Desempeñaba			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA,		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Miercoles 08 de octubre de 2025	**Hoja No:**	66

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATÓ DE OBRA	Nº 251 de 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	Nº 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	4	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo	1	HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros	2	Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		X

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):

Se continua con la construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje B - 30 ml)

Se realizaron remates de cañuela en concreto de 3000 psi

Se realiza fundidad de vigas de confinamiento de cancha (QD2 - X2 - 42 ml)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):

Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje B - 8,97 m2)

Se continua con el vaciado de concreto de 3000 psi para huellas graderias (1,22m3) - huellas 1 y 2

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:

Se continua con la excavación manual del terreno (Eje 1 -3,24 m3 - 12 zapatas)

Se realiza la excavación manual de vigas de cimentación (Eje 1 - 1,8 m3 -30 ml)

Se continua con la actividad de localización y replanteo topografico del cerramiento (Eje 3 - 86,07 m2)

ITEM EJECUTADOS:

9.1 - 12,1 Localización y replanteo topográfico

9.2 Excavación manual en material comun

18.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo

21.2 Viga confinamiento de 0.15*0.40 m en concreto de 3.000 PSI

23.1 Cañuela en concreto prefabricado 0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla

26.8 Concreto de 3000-psi para graderia

27.1 Muro en ladrillo a la vista

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Equipo de topografia	1	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno
Cortadora de ladrillo con disco	1	Bueno
Cortadora de concreto	2	Bueno
Equipo de soldadura	1	Bueno
Equipo de pintura	1	Bueno
Andamios	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

FIRMA		**FIRMA**	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	**NOMBRE:**	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:**	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	**T.P**	68202-359088 STD

2644

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Jueves, 09 de octubre de 2025	Hoja No:	87
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	Nº 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	4	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo	1	HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros	2	Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		X

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):

Se continua con la construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje B - 30 ml)

Se continua con la fundida de cañuela en concreto de 3000 psi (15 unidades - 12 ml)

Se realizo instalación de Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2 (Eje 1 - 15.75 m2)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):

Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje B - 9.49 m2)

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:

Se continua con la actividad de localización y replanteo topografico del cerramiento (Eje 2 - 43.61 m2)

Se continua con el descapote y excavación manual del terreno (Eje A -3.78 m3 - 14 zapatas)

Se realiza la excavación manual de vigas de cimentación (Eje 1 - 2.01 m3 -33.53 ml)

ITEM EJECUTADOS:

9.1 Localización y replanteo topográfico

9.2 Excavación manual en material comun

19.3 Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2",

18.5 Alfajia de 20x7 cm. en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo

23.1 Cañuela en concreto prefabricado 0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla

27.1 Muro en ladrillo a la vista

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Equipo de topografia	1	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Vibrador de concreto	1	Bueno
Cortadora de ladrillo con disco	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

3191

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Viernes, 10 de octubre de 2025	Hoja No:	88

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES: INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	4	Secretario	1
Ingenieros	2	Topografo	1	HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros	2	Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		X

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
Se realizo vaciado de concreto de 3000 psi en gradenas (0,43 m3)-Contrahuellas 2a y huellas auxiliares
Se realiza construcción de cajas de inspección (1 caja 0.60*0.60)
Se realiza instalación de tubería sanitaria de 4" PVC (20,70 ml)
Se continua con la construccion de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje B - 21,30 ml)
Se realizo instalación de Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2 (Eje B - 15,75 m2)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
Se continua con la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje 1 - 14,95 m2)

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA):
Se continua con la actividad de localización y replanteo topografico del cerramiento (Eje B - 90,91 m2)
Se continua con el descapote y excavacion manual del terreno (Eje A -3,78 m3 - 14 zapatas)
Se realiza la excavación manual de vigas de cimentación (Eje A - 2,10 m3 -35 ml)
Se realiza corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi

FRENTE DE OBRA No.4 RESGUARDO INDIGENA JULIEROS: (ESCUELA PORVENIR)
Se inicia con la excavación manual (Eje B - 7,29 m3 -27 zapatas)
se realiza localización y Replanteo para cerramiento (125 m2 - Ejes A-1)
se realiza localización y Replanteo para cancha (672 m2)
Se realiza descapote y nivelación del terreno en zona de cancha (100 m2)

ITEM EJECUTADOS:
1.1 - 4.1 - 9 .1 Localización y replanteo topográfico
1.2 - 9.2 Excavación manual en material común
4.4 Descapote y nivelación manual del terreno
10.4 Acero de refuerzo 60000 psi
18.5 Alfajia de 20x7 cm. en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo
18.8 Concreto de 3000 psi para graderia
19.3 Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2"
23.2 Caja de inspeccion 0.60m*0.60m
23.3 Caja de inspección 1m*1m
23.4 Tuberia pvc sanitaria 4"
23.5 Tuberia pvc sanitaria 6"
27.1 Muro en ladrillo a la vista

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Cizalla manual	1	Bueno
Dobladora manual	1	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Cortadora de ladrillo con disco	2	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno
Equipo de topografia	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

2645

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Sabado, 11 de octubre de 2025	Hoja No:	89
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	4	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo	1	HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros	2	Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		X

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLON):
Se continua con el vaciado de concreto de 3000 psi para gradenas (1.22 m3)-huellas 1y2
Se continua con la construcción de cajas de inspección (1 caja 1.00*1.00)
Se continua con la construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje 2 -30 ml)
se realizo instalación de Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2" (Eje B - 3.70 m2)
Se realiza instalación de tuberia sanitaria de 6" PVC (4.0 ml)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
Se continua la actividad de alzado de muro en ladrillo a la vista del cerramiento (Eje B - 9.51 m2)
se realiza vaciado de Concreto de 3000 psi para huella de gradena (1.36 m3) - huellas 3 y 2a

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
Se continua con la actividad de localización y replanteo topografico de las gradenas (29.44 m2)
Se continua con el descapote y excavación manual del terreno (Eje 3 -3.78 m3 - 14 zapatas)
Se realiza la excavación manual de vigas de cimentación (Eje A - 2.11 m3 -35.14 ml)
se realiza vaciado de Concreto de 2500 psi para solado e=5cm (19.44 m2-54 zapatas)-(24.57 m2 vigas cimentación) Ejes 1-A
Se realiza corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi

FRENTE DE OBRA No.4 RESGUARDO INDIGENA JULIEROS: (ESCUELA PORVENIR)
Se inicia con la excavación manual (Eje 1 - 4.32 m3 - 16 zapatas)
se realiza localización y Replanteo para cerramiento (115 m2 - Ejes B-2)
se realiza localización y Replanteo para graderias (29.40 m2)
Se realiza descapote y nivelación del terreno en zona de cancha (77 m2)

ITEM EJECUTADOS:
1.1 - 4.1 - 9.1 Localización y replanteo topográfico
1.2 - 9.2 Excavación manual en material comun
4.4 Descapote y nivelación manual del terreno
10.1 Concreto de 2500 psi para solado e=5cm
10.4 Acero de refuerzo 60000 psi
18.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo
18.8 - 26.8 Concreto de 3000 psi para graderia
19.4 Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2"
23.2 Caja de inspección 0.60m*0.60m
23.3 Caja de inspección 1m*1m
23.4 Tuberia pvc sanitaria 4"
23.5 Tuberia pvc sanitaria 6"
27.1 Muro en ladrillo a la vista

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Equipo de topografia	1	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno
Cortadora de ladrillo con disco	1	Bueno
Cizalla manual	1	Bueno
Dobladora manual	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?			
SI		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
SI		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Domingo, 12 de octubre de 2025	Hoja No:	90

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	Nº 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental		Ayudantes		Secretario	
Ingenieros		Topógrafo	/	HSEQ	
Conductores		Cadeneros		Inspectores	
Oficiales		Electrico		Soldador	

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLON):
No se realizaron actividades, dia dominical

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
No se realizaron actividades, dia dominical

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
No se realizaron actividades, dia dominical

ITEM EJECUTADOS

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora:
Nombre:
Cargo:
Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

2646

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Lunes, 13 de octubre de 2025	Hoja No:	91

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	2	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo	1	HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros	2	Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
No se realizaron actividades, dia festivo

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
No se realizaron actividades, dia festivo

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
No se realizaron actividades, dia festivo

ITEM EJECUTADOS

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

3163

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Martes, 14 de octubre de 2025	Hoja No:	92

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	2	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo	1	HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros	2	Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nubiado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

ITEM EJECUTADOS

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

2647
~~3164~~

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Miércoles, 15 de octubre de 2025	Hoja No:	93

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	2	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo	1	HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros	2	Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentacion en taller y labores administrativas

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentacion en taller y labores administrativas.

ITEM EJECUTADOS

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra

Ocurrió Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora			
Nombre			
Cargo			
Actividad que Desempeñaba			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Jueves, 16 de octubre de 2025	Hoja No:	9a

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	Nº 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº 239 de 2025

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	2	Secretario	1	Soleado	X	X
Ingenieros	2	Topógrafo	1	HSEQ	1	Seco		
Conductores	1	Cadeneros	2	Inspectores	2	Nublado		
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1	Lluvia Pasajera		
						Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

ITEM EJECUTADOS

Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra			
Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora			
Nombre			
Cargo			
Actividad que Desempeñaba			
Hubo Lesion?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

2648

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Viernes, 17 de octubre de 2025	Hoja No:	05

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	Nº 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	2	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo	1	HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros	2	Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

ITEM EJECUTADOS

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

3167

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Sabado, 18 de octubre de 2025	Hoja No:	96

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	Nº. 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº. 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	3	Secretario	1
Ingenieros	2	Topografo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
No se realizaron actividades en campo debido a inconvenientes de orden público y cierre de vías, lo que impidió el desplazamiento del personal al sitio de trabajo. Durante la jornada se adelantaron actividades de ornamentación en taller y labores administrativas.

ITEM EJECUTADOS

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

2649

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Domingo, 19 de octubre de 2025	Hoja No:	97

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
Ing. Ambiental		Ayudantes		Secretario		Soleado		
Ingenieros		Topógrafo		HSEQ		Seco		
Conductores		Cadeneros		Inspectores		Nublado		
Oficiales		Electrico		Soldador		Lluvia Pasajera		
						Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLON):
No se realizaron actividades, dia dominical

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
No se realizaron actividades, dia dominical

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
No se realizaron actividades, dia dominical

ITEM EJECUTADOS

Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra			
Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora			
Nombre			
Cargo			
Actividad que Desempeñaba			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Lunes 20 de octubre de 2025	Hoja No:	98

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	3	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):

Se continua con el vaciado de concreto de 3000 psi para graderias (0.89 m3) huella 3.

Se continua con la construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje 2 -30 ml)

Se inicia con la instalación de Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2" (Eje A - 25 ml)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):

Se inicia construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje A - 30 ml)

Se realiza construcción de cajas de inspección (1 caja 0,60*0,60)

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:

No fue posible ejecutar actividades en campo, ya que, la comunidad no autorizó el ingreso del personal por motivo de un velorio realizado en la comunidad.

ITEM EJECUTADOS

18.5 - 26.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo

18.8 Concreto de 3000 psi para gradería

19.2 Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2".

31.2 Caja de inspección 0.60m*0.60m

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno
Equipo de soldadura	1	Bueno
Equipo de pintura	1	Bueno
Andamios	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

2650

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Martes, 21 de octubre de 2025	Hoja No:	99

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	3	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
Se continua con la construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje 2 -24.6 ml)
Se continua con la instalación de Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2". (Eje A - 25 ml)
Se continua con el vaciado de concreto de 3000 psi para graderias (0.47 m3)-huella 2A

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
Se continua con la actividad de construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje A - 30 ml)
Se realiza construcción de cajas de inspección (1 caja 0.60*0.60)

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
No fue posible ejecutar actividades en campo, ya que, la comunidad no autonzó el ingreso del personal por motivo de un velorio realizado en la zona.

ITEM EJECUTADOS
18.5 - 26.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3,000 PSI, incluye refuerzo
18.8 Concreto de 3000 psi para graderia
19.2 Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2"
31.2 Caja de inspección 0.60m*0.60m

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno
Equipo de soldadura	1	Bueno
Equipo de pintura	1	Bueno
Andamios	1	Bueno

Accidentes en Obra

¿Ocurrió Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora			
Nombre			
Cargo			
Actividad que Desempeñaba			
¿Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Miercoles 22 de octubre de 2025	Hoja No:	100

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	13	Secretaño	1
Ingenieros	2	Topógrafo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLON):
Se continua con la instalación de Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2". (Eje A - 30 ml)
Relleno de perimetro de la cancha con material sub base
FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
Se continua con la actividad de construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje A - 30 ml)
Se realiza construcción de cajas de inspección (1 caja 1.00*1.00)
FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
Se realiza encofrado de pedestales y columnetas de 20x20
Se realizo corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi
Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para zapatas (Eje 1 - 13 zapatas - 0.94 m3)
NOTA: El contratista de obra realizo toma de muestras de concreto para zapatas en concreto de 3000 psi
ITEM EJECUTADOS
10.3 Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI
10.4 Acero de refuerzo 60000 psi
10.7 Zapata en concreto de 3.000 PSI
19.2 Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2"
20.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo
31.3 Caja de inspeccion 1m*1m

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	2	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno
Equipo de soldadura	1	Bueno
Equipo de pintura	1	Bueno
Andamios	1	Bueno
cortadora de concreto	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?			
SI		No	X
Hora			
Nombre			
Cargo			
Actividad que Desempeñaba			
Hubo Lesión?			
SI		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359888 STD

2651
~~317~~

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Jueves 23 de octubre de 2025	Hoja No:	101

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	3	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
Se continua con la instalación de Cerramiento en malla eslabonada calibre 12.2"x2" (Eje 2 - 37.50 ml)
Aseo general

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
Se continua con la actividad de construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje A - 12.78 ml) - (Eje 2 - 15 ml)

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para zapatas (Eje 1 - 13 zapatas - 0.94 m3)
Se realizo corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi
Se realiza encofrado y vaciado de columnetas de 20x20 en concreto de 3000 psi (Eje 1 -7 ml -14 pedestales)
Se realiza encofrado para vigas de cimentación

NOTA: El contratista de obra realizó toma de muestras de concreto para vigas de cimentación en concreto de 3000 psi

ITEM EJECUTADOS
10.2 Viga de cimentacion de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI
10.3 Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI
10.4 Acero de refuerzo 60000 psi
10.7 Zapata en concreto de 3.000 PSI
19.2 Cerramiento en malla eslabonada calibre 12.2"x2".
26.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	3	Bueno
Vibrador de concreto	2	Bueno
Equipo de soldadura	1	Bueno
Equipo de pintura	1	Bueno
Andamios	1	Bueno
cortadora de concreto	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Viernes, 24 de octubre de 2025	Hoja No:	102

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N°. 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N°. 239 de 2025

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
						Soleado	X	X
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	3	Secretario	1	Seco		
Ingenieros	2	Topógrafo		HSEQ	1	Nublado		
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2	Lluvia Pasajera		
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1	Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
Se continua con la instalacion de Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2" (Eje 2 - 47.10 ml)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
Se continua con la actividad de construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje 2 - 23.40 ml) - (Eje B - 7 ml)

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
Se realizo vaciado de concreto de 3000 psi para vigas de cimentación (Eje 1- 25 ml)
Se realiza excavacion manual para zapatas (Eje 3 -5.55 m3 - 19 zapatas)
Se realiza la excavación manual de vigas de cimentación (Eje 3 - 1.8 m3 -30.00 ml)
Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para zapatas (Eje A - 10 zapatas -0.72 m3)
Se realiza encofrado y vaciado de columnetas de 20x20 en concreto de 3000 psi (Eje 1 -6 ml -12 pedestales)
Se realizo corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi
NOTA: La interventoria realiza toma de muestras de concreto para viga de cimentacion en concreto de 3000 psi

ITEM EJECUTADOS
10.2 Viga de cimentacion de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI
9.2 Excavación manual en material comun
10.3 Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI
10.4 Acero de refuerzo 60000 psi
10.7 Zapata en concreto de 3.000 PSI
19.2 Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2"
20.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo

Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	3	Bueno
Vibrador de concreto	1	Bueno
Equipo de soldadura	1	Bueno
Equipo de pintura	1	Bueno
Andamios	1	Bueno
cortadora de concreto	1	Bueno

Accidentes en Obra			
Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

2652

2124

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Sabado. 25 de octubre de 2025	Hoja No:	103

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	Nº 261 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	3	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico		Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Secó		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
Se continua con la instalacion de Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2" (Eje 1 - 40 ml)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
Se continua con la actividad de construccion de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje B - 20 ml)

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
Se realiza vaciado de concrete de 3000 psi para zapatas (Eje A - 10 zapatas -0.72 m3)
Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para pedestales (Eje A -7 ml -14 pedestales)

ITEM EJECUTADOS
10.3 Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI
10.7 Zapata en concreto de 3.000 PSI
19.2 Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2"
26.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	3	Bueno
Vibrador de concreto	1	Bueno
Equipo de soldadura	1	Bueno
Equipo de pintura	1	Bueno
Andamios	1	Bueno
cortadora de concreto	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora			
Nombre			
Cargo			
Actividad que Desempeñaba			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Domingo, 26 de octubre de 2025	Hoja No:	104

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N°. 239 de 2025

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
						Soleado		
Ing. Ambiental		Ayudantes		Secretario		Seco		
Ingenieros		Topógrafo		HSEQ		Nublado		
Conductores		Cadeneros		Inspectores		Lluvia Pasajera		
Oficiales		Electrico		Soldador		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):
No se realizaron actividades, dia dominical

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
No se realizaron actividades, dia dominical

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
No se realizaron actividades, dia dominical

ITEM EJECUTADOS

Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado

Accidentes en Obra			
Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

2653

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Lunes, 27 de octubre de 2025	Hoja No:	105

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	5	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico	1	Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENARENOS (ESCUELA CRISTOBAL COLÓN):

Se realizo extendido de relleno perimentral

Se realizo actividad de instalacion de Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2" (Eje 1 - 40 ml)

Se realizo instalacion de estructura para reflectores en poste (4 unidades)

Se realizo instalación de reflectores de 400w solar fotovoltaico (8 unidades)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):

Se continua con la actividad de construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje B - 20 ml)

Se realiza instalacion de tuberia sanitaria (tuberia PVC 4" -20,70 ml) - (tuberia PVC 6" -9,0 ml)

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:

Se realiza excavación manual para zapatas (Eje 2 -2,7 m3 - 10 zapatas)

Se realiza la excavación manual de vigas de cimentación (Eje 3 - 1,8 m3 -30,00 ml)

Se realiza encofrado de vigas de cimentación

Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi de vigas de cimentación (Eje 1- 25 ml)

FRENTE DE OBRA No.4 RESGUARDO INDIGENA JULIEROS: (ESCUELA PORVENIR)

Se realizo la actividad de excavación manual (Eje A -8,37 m3 - 31 zapatas)

Se inicia la reubicación de viviendas que estan en el perimetro del cerramiento.

ITEM EJECUTADOS

1.2 Excavación manual en material común

10.2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI

9.2 Excavación manual en material común

19.2 Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2",

24.4 Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste

24.5 Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico

26.5 Alfajia de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo

31.4 Tubería pvc sanitaria 4"

31.5 Tubería pvc sanitaria 6"

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	3	Bueno
Vibrador de concreto	1	Bueno
Equipo de soldadura	1	Bueno
Equipo de pintura	1	Bueno
Andamios	1	Bueno
Equipo de alturas dielectrico	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si		No	X

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA	Martes, 28 de octubre de 2025	Hoja No:	106

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAME	OBJETO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO DE OBRA	N° 251 de 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 239 de 2025

Personal en Obra

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Ambiental	1	Ayudantes	5	Secretario	1
Ingenieros	2	Topógrafo		HSEQ	1
Conductores	1	Cadeneros		Inspectores	2
Oficiales	1	Electrico	1	Soldador	1

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA No1. RESGUARDO INDIGENA GENAREROS (ESCUELA CRISTOBAL COLON):
Se realizó actividad de instalacion de Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2" (Eje 1 - 36,80 ml)
Se realizo instalacion de panel solar fotovoltaico de 40 w (8 unidades)
Se realizo instalación de Sistema de puesta a tierra para reflectores (4 unidades)

FRENTE DE OBRA No.2 RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS (ESCUELA SANTA TERESITA):
Se continua con la actividad de construcción de alfajia en concreto de 3000 psi (Eje B - 30.0 ml)
Se inicia la instalacion de Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2" (Eje A -62.50 ml)

FRENTE DE OBRA No.3 RESGUARDO INDIGENA VELAZQUEROS (ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA:
Se realizo corte, amarre y figurado de acero de refuerzo de 60000 psi
Se realiza encofrado de vigas de cimentación y posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi (Eje 1- 13.53 ml) -(Eje A -15 ml)
Se realiza excavación manual para zapatas (Eje 2 -2.31 m3 - 7 zapatas)
Se realiza la excavación manual de vigas de cimentación (Eje 3 - 1.56 m3 -26.07 ml)

FRENTE DE OBRA No.4 RESGUARDO INDIGENA JULIEROS: (ESCUELA PORVENIR)
Se realiza vaciado de concreto de 2500 psi para solado e=5cm (Eje B -9.72 m2 - 27 zapatas 0,60*0,60)- (Eje 1 - 5.76 m2 - 16 zapatas 0,60*0,60) - (Eje 1 - 1.28 m2 - 2 zapatas 0,80*0,80)
Se continua con la reubicación de viviendas que estan en el perimentro del cerramiento

ITEM EJECUTADOS
2.1 Concreto de 2500 psi para solado e=5cm
10.2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI
10.4 Acero de refuerzo 60000 psi
9.2 Excavación manual en material común
19.2-27.2 Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2",
24.6 Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 40 w
24.7 Sistema de puesta a tierra para reflectores
26.5 Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo

Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	3	Bueno
Formaleta en madera 3 usos	3	Bueno
Vibrador de concreto	1	Bueno
Equipo de soldadura	1	Bueno
Equipo de pintura	1	Bueno
Andamios	1	Bueno
Cizalla manual	1	Bueno
Doblado manual	1	Bueno
Equipo de alturas dielectrico	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrio Algun Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

FIRMA		FIRMA	
OBRA:	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NOMBRE:	CLAUDIA SEGURA	NOMBRE:	LEONARDO CAMARGO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
T.P	A1052022-1010221789	T.P	68202-359088 STD
