3077

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ASESORA JURÍDICA

TRD-120

NOTA INTERNA

FECHA:	**17 DE FEBRERO DE 2026**
PARA:	**LENNY HERNÁNDEZ GARCES** Jefe Oficina Asesora Jurídica
DE:	**JENNY MILENA UPEGUI SICULABA** Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

URGENTE		ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	X	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	X
INFORMAR POR ESCRITO		ARCHIVAR	
ENCARGARSE DEL ASUNTO	X	ENTERARSE Y DEVOLVER	
OTRO:		DILIGENCIAR Y DEVOLVER	

De manera atenta y muy respetuosa me permito remitir a su despacho el EXPEDIENTE PARA ACTA PARCIAL No 01 CINT-239-2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDÍGENAS EL PORVENIR, GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA", para su respectivo tramite.

TRES (03) CAJAS que contienen DIECISIETE (17) CARPETAS

Respetuosamente,

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

RECIBIDO: Victor Montenegro FECHA: 17-02-2026 HORA: 15:15

CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
NIT. 901.958.438-2

31. INFORME DE LA INTERVENTORÍA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA, DE ACUERDO AL FORMATO APROBADO POR CALIDAD CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, FIRMADO POR EL DIRECTOR Y/O RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA Y EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

INFORME DE INTERVENTORÍA
PARA ACTA PARCIAL No 01

PERIODO: DEL 15 DE JULIO DE 2025 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 239 DE 2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS R/L PEDRO LUIS USMA VILLA
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
SUPERVISOR	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TAME, ARAUCA
ENERO
2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 4
1.2.1. INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 5
2. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA 5
2.2.1. PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO 6
3. GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 7
3.2.1. PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO 9
4. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES 10
5. ACTOS ADMINISTRATIVOS 10
6. MODIFICACIONES Y/O ADICIONES AL CONTRATO DE OBRA 11
7. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS 11
8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 12
9. BITACORA DIARIA DE OBRA. 13
10. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 14
10.1.1. ACTAS Y REUNIONES SUSCRITAS POR LA VEEDURÍA CIUDADANA 15
11. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 15
12. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 24
13. PERMISOS Y LICENCIAS 27
14. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 28
15. ASPECTOS TECNICOS 31
15.3.1. AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS 118
15.3.2. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL 118
15.3.3. PROGRAMACION DE LA OBRA 118
16. ASPECTOS FINANCIEROS 131
16.1.1. APERTURA DE ENCARGO FIDUCIARIO 131
16.1.2. ESTADO DE ENCARGO FIDUCIARIO 131
16.1.3. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 131
16.1.4. CONTROL DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 132
16.1.5. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 132
16.2.1. APERTURA DE ENCARGO FIDUCIARIO 133
16.2.2. ESTADO DE ENCARGO FIDUCIARIO 133
16.2.3. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 133
16.2.4. CONTROL DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 133
16.2.5. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 134
17. ASPECTOS AMBIENTALES 134
18. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES. 137
19. CONCLUSIONES. 137
20. ANEXOS 138

INTRODUCCIÓN

El presente informe para acta de recibo parcial No. 01 pretende dar a conocer el seguimiento que realizo la interventoría a la ejecución del contrato de obra N.251 de 2025, bajo el objeto **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, contratista de obra CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC NIT. 901.962.949-1 representado por LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO.

Durante el presente periodo de este informe parcial no. 01 el contratista de obra realizó actividades contractuales en las siguiente escuelas, ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS, ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS, ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS, la ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENARERO S, en la cuales llevo a cabo actividades correspondientes los capítulos de preliminares, estructuras de concreto, mampostería y estructuras metálicas que componen el cerramiento perimetral, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias según especificaciones técnicas y diseños aprobados, e implementación del PGIO

El periodo comprendido del 15 DE JULIO DE 2025 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El municipio de Tame adelantó el proceso de selección del contratista mediante la licitación pública LP-TA-003-2025, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la oficina asesora jurídica realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, municipio de Tame, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al **CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC con NIT No. 901.962.949-1 R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO** mediante Resolución *727 de 2025 del 27 de junio de 2025.*

Tabla 1. Información Contractual - Ficha Técnica del Contrato de Obra

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAME
INTERVENTORÍA EXTERNA	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
CONTRATO INTERVENTORÍA NO.	239 DE 2025
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO LUIS USMA VILLA C.C 1.094.277.845 DE PAMPLONA N. S
SUPERVISOR	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC
CONTRATO DE OBRA NO.	251 DE 2025
REPRESENTANTE LEGAL	LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO
NIT:	901.962.949-1
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA CENTÉSIMAS. ($ 3.599.933.228,60)
PLAZO CONTRACTUAL	CINCO (05) MESES
VALOR DEL ANTICIPO	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($ 1.799.966.614,30)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO:	CDP20250513001 DEL 13/05/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	RP20250707001 DEL 07/07/2025
FIRMA DEL CONTRATO	07 DE JULIO DE 2025
FECHA INICIO	15 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA PARCIAL NO. 1	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME	DEL 15/07/2025 AL 15/11/2025
DÍAS TRANSCURRIDOS	124 DÍAS

1.2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.2.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de Interventoría.

Tabla 2. Información Contractual - Ficha Técnica del Contrato de Interventoría

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
SUPERVISOR FINAL:	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLLO URBANO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO	239 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NIT.:	901.958.438-2
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($320.768.784,00).
PLAZO CONTRACTUAL	SEIS (06) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP20250513002 DEL 13/05/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP20250702002 DEL 02/07/2025
FIRMA DEL CONTRATO	02 DE JULIO DEL 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE JULIO DEL 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN OTRO SI MODIFICATORIO NO.1:	15 DE JULIO DEL 2025
PLAZO SEGÚN OTRO SI NO. 1	CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA PARCIAL NO. 1	18 DE NOVIEMBRE DE 2025

2. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con las garantías exigidas por el municipio de Tame en el Contrato de Obra No. 251 DE 2025, se suscribe con la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 18 del Contrato así:

2.1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 08 de julio de 2025 por la Aseguradora Seguros Mundial, tomadas por CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC y como beneficiario el municipio de Tame y Agencia de Renovación del Territorio (ART). Dichas pólizas fueron aprobadas por la oficina jurídica, mediante certificación firmada por la Dra. Lenny Hernández Garcés el día 09 de julio de 2025.

Tabla 3. Pólizas iniciales del contrato de obra No. 251 del 2025.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	08/07/2025	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	COQ-100006184	$719.986.645,80	07/07/2025	07/06/2025	POLIZA APROBADA POR LA JEFE ASESORA DE JURIDICA MUNICIPAL EL 09/07/2025
		ANTICIPO			$1.799.966.614,50	07/07/2025	07/04/2026	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND			$179.996.661,45	07/07/2025	07/12/2028	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			719.986.645,80	07/07/2025	07/12/2030	
0	08/07/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	COQ-100001555	$569.400.000	07/07/2025	07/12/2025	

DATOS DE LA PÓLIZA

Código de Seguridad	G1wCjKht525fbdRjZKuMKQ==		
Número de póliza	100006184	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	8/07/2025
Inicio de vigencia Global	07/07/202	Fin de vigencia Global	07/12/203
Tomador	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC		
Asegurado	ALCALDIA MUNICPAL DE TAME	Valor asegurado	3.419.936.567,5
		movimiento	EXPEDICION

Objeto de póliza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.COP-251-2025 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TAME NIT 800102801-3 / AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO (ART) NIT 901.006.886-4
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 901082426-3 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S (PART. 5,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901141856-0 CIVIND INGENIERIA SAS (PART. 90,0 %)
INTEGRANTE 3 - NIT: 900703012-0 CEPAR SAS (PART. 5,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC)

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 07/07/2025	24:00 Horas del 07/06/2026	$ 719.986.645,80	$ 1.529.968,21
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 07/07/2025	24:00 Horas del 07/04/2026	$ 1.799.966.614,50	$ 3.187.717,63
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 07/07/2025	24:00 Horas del 07/12/2028	$ 179.996.661,45	$ 1.414.647,75
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 07/07/2025	24:00 Horas del 07/12/2030	$ 719.986.645,80	$ 8.284.353,33

2.2. AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS

2.2.1. Pólizas Ampliadas Según Acta de Inicio

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del 15 de julio de 2025, por la Aseguradora Seguros Mundial, tomadas por CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC y como beneficiario el municipio de Tame y Agencia de Renovación del Territorio (ART). Dichas pólizas fueron aprobadas por la oficina jurídica, mediante certificación firmada por la Dra. Lenny Lurney Hernández Garces el día 21 de julio de 2025.

Tabla 4. Pólizas iniciales del contrato de obra No. 251 del 2025, ampliadas según acta de inicio.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
2	21/07/2025	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	COQ-100006184	$719.986.645,80	15/07/2025	15/06/2025	POLIZA APROBADA POR LA JEFE ASESORA DE JURIDICA MUNICIPAL EL 21/07/2025
		ANTICIPO			$1.799.966.614,50	15/07/2025	15/04/2026	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND			$179.996.661,45	15/07/2025	15/12/2028	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			719.986.645,80	15/07/2025	15/12/2030	
2	21/07/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	COQ-100001555	$569.400.000	15/07/2025	07/12/2025	

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	mL9B00J6IkgICF5SY5/w/Q==		
Número de póliza	100006184	Número de anexo	2
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	21/07/202
Inicio de vigencia Global	15/07/202	Fin de vigencia Global	15/12/203
Tomador	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC		
Asegurado	ALCALDIA MUNICPAL DE TAME	Valor asegurado	3.419.936.567,5
		Movimiento	TRASLADO DE VIGENCIA

Objeto de póliza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.COP-251-2025 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TAME NIT 800102801-3 / AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO (ART) NIT 901.006.886-4
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 901082426-3 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S (PART. 5,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901141856-0 CIVIND INGENIERIA SAS (PART. 90,0 %)
INTEGRANTE 3 - NIT: 900703012-0 CEPAR SAS (PART. 5,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC)

**CON EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO FIRMADA EL 15 DE 07 DE 2025, EN LA CUAL SE ESTABLECE DAR INICIO AL OBJETO DEL CONTRATO EL DÍA 15 DE 07 DE 2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 15/07/2025	24:00 Horas del 15/06/2025	$ 719.986.645,80	$ 1.349.862,22
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 15/07/2025	24:00 Horas del 15/04/2026	$ 1.799.966.614,50	$ 4.724.912,91
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 15/07/2025	24:00 Horas del 15/12/2028	$ 179.996.661,45	$ 1.416.647,70
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 15/12/2025	24:00 Horas del 15/12/2030	$ 719.986.645,80	$ 8.204.863,43

3. GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con las garantías exigidas por el municipio de Tame en el Contrato de Interventoría No. 239 del 2025, se suscribe con la Aseguradora Seguros Mundial, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA QUINCE del Contrato así:

3.1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 03 de julio de 2025 por la aseguradora Seguros Mundial, tomadas por consorcio Inter Cerramientos y como beneficiario el municipio de Tame. Dichas pólizas fueron aprobadas por la oficina asesora de jurídica, mediante certificación firmada por la jefe de la oficina de jurídica Dra. Lenny Lurney Hernández Garces el día 09 de julio de 2025.

Tabla 5. Pólizas de legalización del contrato de interventoría No.239 del 2025.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	03/07/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros Mundial	COQ-100006155	$64.153.756,80	02/07/2025	02/07/2026	POLIZA APROBADA POR LA JEFE ASESORA DE JURIDICA MUNICIPAL EL 09/07/2025
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			$ 160.384.392,00	02/07/2025	02/05/2026	
		PRESTACIONES SOCIALES			$16.038.439,20	02/07/2025	02/01/2029	
		CALIDAD DEL SERVICIO			$64.153.756,80	02/07/2025	02/01/2031	

DATOS DE LA POLIZA

Código de seguridad	Mkcz9Ox3YTPHe2XF4wrlWA==		
Número de póliza	100006155	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	3/07/2025
Inicio de vigencia Global	02/07/202	Fin de vigencia Global	02/01/203
Tomador	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS		
Asegurado	ALCALDIA MUNICPAL DE TAME	Valor asegurado	304.730.344,80
		Movimiento	EXPEDICION

Objeto de póliza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CIN-239-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDÍGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TAME NIT 800102801-3 / AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART NIT 901006886-4
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 900885335-4 TAS SOLUCIONES SAS(PART. 60,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901482213-8 CCO GROUP SAS (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 3 - NIT: 901867080-9 E&P CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS)

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 02/07/2025	24:00 Horas del 02/07/2026	$64.153.756,80	$ 141.134,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 02/07/2025	24:00 Horas del 02/05/2026	$ 160.384.392,00	$ 352.844,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 02/07/2025	24:00 Horas del 02/01/2029	$ 16.038.439,20	$ 129.382,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 02/01/2026	24:00 Horas del 02/01/2031	$ 64.153.756,80	$ 706.075,00

3087

3.2. AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS

3.2.1. Pólizas Ampliadas Según Acta de Inicio

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del 15 de julio de 2025, por la aseguradora Seguros Mundial, y aprobadas por la oficina asesora de jurídica, mediante certificación firmada por la jefe de la oficina de jurídica Dra. Lenny Lurney Hernández Garces.

Tabla 6. Pólizas iniciales del contrato de interventoría No. 239 del 2025, ampliadas según acta de inicio.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
1 y 2	16/07/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros Mundial	COQ-100006155	$64.153.756,80	15/07/2025	15/07/2026	POLIZA APROBADA POR LA JEFE ASESORA DE JURIDICA MUNICIPAL
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			$160.384.392,00	15/07/2025	15/05/2026	
		PRESTACIONES SOCIALES			$16.038.439,20	15/07/2025	15/01/2029	
		CALIDAD DEL SERVICIO			$64.153.756,80	15/01/2026	15/01/2031	

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	BPx5E+tCEwptPiue9IpbDA==		
Número de póliza	100006155	Número de anexo	2
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	16/07/2025
Inicio de vigencia Global	15/07/2025	Fin de vigencia Global	15/01/2031
Tomador	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS		
Asegurado	ALCALDIA MUNICPAL DE TAME	Valor asegurado	304.730.344,80
		Movimiento	TRASLADO DE VIGENCIA

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CIN-239-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDÍGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TAME NIT 800102801-3 / AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART NIT 901006886-4

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 15/07/2025	24:00 Horas del 15/07/2026	$ 64.153.756,80	$ 141.138,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 15/07/2025	24:00 Horas del 15/05/2026	$ 160.384.392,00	$ 307.235,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 15/07/2025	24:00 Horas del 15/01/2029	$ 16.038.439,20	$ 129.362,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 15/01/2026	24:00 Horas del 15/01/2031	$ 64.153.756,80	$ 706.079,00

3080

3.2.2. Pólizas Ampliadas Según Otro si Modificatorio No. 1

Las pólizas fueron ampliadas según otro si modificatorio No. 1 del 15 de julio de 2025, por la aseguradora Seguros Mundial, y aprobadas por la oficina asesora de jurídica, mediante certificación firmada por la jefe de la oficina de jurídica Dra. Lenny Lurney Hernández Garces.

Tabla 6. Pólizas iniciales del contrato de interventoría No. 239 del 2025, ampliadas según acta de inicio.

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
3	21/07/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros Mundial	COQ-100006155	$64.153.756,80	15/07/2025	15/07/2026	POLIZA APROBADA POR LA JEFE ASESORA DE JURIDICA MUNICIPAL
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			$ 160.384.392,00	15/07/2025	15/05/2026	
		PRESTACIONES SOCIALES			$16.038.439,20	15/07/2025	15/01/2029	
		CALIDAD DEL SERVICIO			$64.153.756,80	15/01/2026	15/01/2031	

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	jUbtZ0Fr5FARoOhn928j3w==		
Número de póliza	100006155	Número de anexo	3
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	21/07/202
Inicio de vigencia Global	15/07/202	Fin de vigencia Global	15/01/203
Tomador	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS		
Asegurado	ALCALDIA MUNICPAL DE TAME	Valor asegurado	304.730.344,80
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE

Objeto de póliza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CIN-239-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDÍGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TAME NIT 800102801-3 / AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART NIT 901006886-4
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 900885335-4 TAS SOLUCIONES SAS(PART. 60,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901482213-8 CCO GROUP SAS (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 3 - NIT: 901867080-9 E&P CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS)

** CON EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS DEL OTROSÍ-MODIFICATORIO NO. 01 DEL 15 DE 07 DE 2025.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 15/07/2025	24:00 Horas del 15/07/2026	$ 64.153.756,80	$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 15/07/2025	24:00 Horas del 15/05/2026	$ 160.384.392,00	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 15/07/2025	24:00 Horas del 15/01/2029	$ 16.038.439,20	$ 0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 15/01/2026	24:00 Horas del 15/01/2031	$ 64.153.756,80	$ 0,00

Tabla 7. Actos Administrativos Contrato de Obra No. 251 DE 2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
15/07/2025	ACTA DE INICIO	INICIO DEL CONTRATO DE OBRA 251 DE 2025	- LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC -JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESSARROLLO URBANO Y SUPERVISOR(A) PEDRO LUIS USMA VILLA R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
22/07/2025	ACTA SOCIALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA	SOCIALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA	-LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC -JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESSARROLLO URBANO Y SUPERVISOR(A) -PEDRO LUIS USMA VILLA R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS -ANGEL VALENTIN MOLINA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION -EDGAR ALBERTO ERASO SOLARTE INSTITUCION EDUCATIVA GUAHIBO BETOY -VICTOR BOHORQUEZ COORDINADOR ART-ARAUCA VEEDURIA: RENE DELADO DIAZ LUIS ALFREDO CEDEÑO YEPES GERARDO MARTINEZ GARRIDO LIGINIO DELGADO DIAZ ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ GAITAN URIEL DELGADO DIAZ OSCAR GIOVANII ALVARADO GARCIA
18/11/2025	ACTA PARCIAL NO. 1	COBRO PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 251 DE 2025	- LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO R/L CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC -JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESSARROLLO URBANO Y SUPERVISOR(A) PEDRO LUIS USMA VILLA R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE ALCALDESA DELEGADA RESOLUCIÓN No. 1430 DEL 18/11/2025

Tabla 8. Actos Administrativos Contrato de Interventoría No. 239 DE 2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
15/07/2025	ACTA DE INICIO	INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 239 DE 2025	-JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESSARROLLO URBANO Y SUPERVISOR(A) PEDRO LUIS USMA VILLA R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
15/07/2025	OTROSI MODIFICATORIO No. 01	AJUSTE DE PLAZO	-JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON FUNCIONES DE ALCALDE DELEGADO RES 822 DEL 14/07/2025 PEDRO LUIS USMA VILLA R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS
18/11/2025	ACTA PARCIAL NO. 1	COBRO PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 239 DE 2025	PEDRO LUIS USMA VILLA R/L CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS -JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESSARROLLO URBANO Y SUPERVISOR(A) MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE ALCALDESA DELEGADA RESOLUCIÓN No. 1430 DEL 18/11/2025

6. MODIFICACIONES Y/O ADICIONES AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

Durante el presente periodo se han presentado las siguientes modificaciones y/o adiciones al contrato de interventoría.

FECHA	DESCRIPCIÓN	MOTIVO	OBSERVACIÓN
15/07/2025	Otro si modificatorio No. 1	Modificación de plazo contractual del contrato de interventoría No. 239 de 2025	Nuevo plazo según otro si modificatorio No. 1, cinco punto cinco (5.5) meses

NOTA: Los documentos del OTRO SI MODIFICATORIO No. 1, se encuentran relacionado en el numeral 28 de la lista de chequeo del contrato de interventoría.

7. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito las siguientes actas de comités técnicos desarrollados entre las partes:

Tabla 9. Relación de Comité Técnicos del Contrato de Obra No. 251 DE 2025.

FECHA	COMITÉ TECNICO	MOTIVO DEL COMITÉ	SUSCRITA POR
18/07/2025	Acta de Reunión No. 1	Apropiación de estudios y diseños	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, R/L Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado, el interventor CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS R/L Pedro Luis Usma Villa y Leonardo Camargo como Residente de Interventoría.

FECHA	COMITÉ TECNICO	MOTIVO DEL COMITÉ	SUSCRITA POR
22/07/2025	Acta de comité de CCSS No. 1	Acta de conformación de comité de control social y seguimiento	Coordinador de ART regional, Víctor Manuel Bohórquez, interventor CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS R/L Pedro Luis Usma Villa, Ing ambiental de obra Alejandro Ortiz, Vocero Luis Alfredo Cedeño, representantes de comunidades
19/08/2025	Acta de comité de control social y seguimiento – CCSS No. 2	Comité de avance de proyecto	Subdirector de ART, Edith Zulima Rojas, Coordinador de ART regional, Víctor Manuel Bohórquez y Supervisora Jenny Milena Upegui Secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano.
16/09/2025	Acta de comité de control social y seguimiento – CCSS No. 3	Comité de avance de proyecto	Delegada SRDS ART Rosa Milena Molina Caro, Coordinador de ART regional, Víctor Manuel Bohórquez y Supervisora Jenny Milena Upegui Secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano.
29/10/2025	Acta de comité de control social y seguimiento – CCSS No. 4	Comité de avance de proyecto	Delegada SRDS ART Rosa Milena Molina Caro, Coordinador de ART regional, Víctor Manuel Bohórquez, Supervisora Jenny Milena Upegui Secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano y Señor Alcalde del Municipio de Tame Miguel Ángel Bastos.

FECHA	COMITÉ TECNICO	MOTIVO DEL COMITÉ	SUSCRITA POR
06/10/2025	Acta de Comité No. 1	Modificaciones de diseños de Julieros y Velasqueros	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, R/L Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado, el interventor CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS R/L Pedro Luis Usma Villa y Jenny Milena Upegui Secretaria de Infraestructura y desarrollo urbano.
11/11/2025	Acta de Comité No. 2	Analizar y aprobar Plan de contingencia	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC, R/L Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado, Director de Obra Edwin Arnaldo Rincón Medina, el interventor CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS R/L Pedro Luis Usma Villa y Jenny Milena Upegui Secretaria de Infraestructura y desarrollo urbano.

Tabla 10. Relación de Comité Técnicos del Contrato de Interventoría No. 239 DE 2025.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
10/07/2025	Acta de comité técnico alcaldía No 1	Solicitud Modificación Plazo Contractual Y Reajuste De Ítems Contrato De Interventoría 239 De 2025	-Jenny Milena Upegui Siculaba Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano Y Supervisor(A) -Pedro Luis Usma Villa R/L Consorcio Inter Cerramientos -Danilo Pérez Silva Profesional Universitario Cod. 219 Grado 15

3091

8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de obra para el periodo del presente informe, se ha enviado y recibido la siguiente correspondencia entre la Interventoría, el contratista y el municipio de Tame:

Tabla 11. Relación de Correspondencia Enviada por la Interventoría del Contrato de Obra No. 251 DE 2025

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	DESCRIPCIÓN
08/07/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME	SOLICITUD DE COMITÉ TÉCNICO
09/07/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME	REMISION POLIZAS DE LEGALIZACION DE CONTRATO
15/07/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA CONTROL DE EJECUCIÓN
16/07/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	APROBACIÓN PLAN DE CALIDAD
18/07/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	CONCEPTO TÉCNICO Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS
18/07/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	INVITACIÓN COMITÉ TÉCNICO
21/07/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME	REMISIÓN DOCUMENTOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 239 de 2025
21/07/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME	REMISIÓN DOCUMENTOS CONTRATO DE OBRA No. 251 de 2025
21/07/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME	REMISIÓN DE DOCUMENTOS COP 251 DE 2025
21/07/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME	REMISIÓN DOCUMENTOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 239 de 2025
30/07/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME	REMISIÓN DE DOCUMENTOS
04/08/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	SOLICITUD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
06/08/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	SOLICITUD DE INFORME MENSUAL NO. 1 JULIO 2025 - CONTRATO DE OBRA NO. 251 DE 2025
8/08/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES MES DE JULIO DE 2025
22/08/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	REMISIÓN DE PROGRAMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 239 DE 2025
04/09/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	SOLICITUD DE INFORME MENSUAL NO. 2
20/09/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	SOLICITUD DE ENSAYOS DE LABORATORIOS
2/10/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	REVISION VIABILIDAD DE AJUSTES CERRAMIENTO
3/10/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE COMITÉ DE AJUSTE
4/10/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	SOLICITUD DE INFORME MES DE SEPTIEMBRE
6/10/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	REMISION DE INFORMES DEL MES DE SEPTIEMBRE
8/10/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	SOLICITUD DE INFORMACION DE RETRASOS
13/10/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	VERIFICACION SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR PARO
17/10/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	REPORTE DE AVANCE QUINCENAL
20/10/2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	VERIFICACION DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES RESGUARDO VELASQUEROS

Fecha	Remitente	Destinatario	Descripción
	Cerramientos		Actividades Resguardo Velasqueros
5/11/2025	Consorcio Inter Cerramientos	Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	Reporte De Avance Quincenal
10/11/2025	Consorcio Inter Cerramientos	Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	Informe Sobre Suspensión Temporal De Actividades En El Resguardo Julieros - Fallecimiento
10/11/2025	Consorcio Inter Cerramientos	Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	Remisión Plan De Contingencia Contrato De Obra
11/11/2025	Consorcio Inter Cerramientos	Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	Remision De Informes Del Mes De Octubre

Tabla 12. Relación de Correspondencia Recibida por la Interventoría del Contrato de Obra No. 251 DE 2025.

Fecha	Remitente	Destinatario	Descripción
09/07/2024	Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	Consorcio Inter Cerramientos	Citación Comité
14/07/2025	Consorcio Canchas Deportivas Cic	Consorcio Inter Cerramientos	Presentación Plan De Calidad
17/07/2025	Consorcio Canchas Deportivas Cic	Consorcio Inter Cerramientos	Respuesta A Solicitud De Información Para Control De Ejecución
21/07/2025	Consorcio Canchas Deportivas Cic	Consorcio Inter Cerramientos	Pólizas Según Acta De Inicio Y Plan De Inversión De Anticipo
30/07/2025	Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	Consorcio Inter Cerramientos	Solicitud De Información
05/08/2025	Consorcio Canchas Deportivas Cic	Consorcio Inter Cerramientos	Respuesta A Solicitud De Documentos técnicos
08/08/2025	Consorcio Canchas Deportivas Cic	Consorcio Inter Cerramientos	Respuesta A Solicitud De Informe Mensual
05/09/2025	Consorcio Canchas Deportivas Cic	Consorcio Inter Cerramientos	Respuesta Solicitud Informe Mensual No. 2
29/09/2025	Consorcio Canchas Deportivas Cic	Consorcio Inter Cerramientos	Remisión De Ensayos De Laboratorios
1/10/2025	Consorcio Canchas Deportivas Cic	Consorcio Inter Cerramientos	Viabilidad De Ajustes En Cerramiento Perimetral Y Cancha Múltiple - Resguardo Indígenas Julieros Y Velasqueros
3/10/2025	Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	Consorcio Inter Cerramientos	Citación Comité
11/10/2025	Consorcio Canchas Deportivas Cic	Consorcio Inter Cerramientos	Respuesta A Solicitud De Información De Retrasos De Obra
12/10/2025	Consorcio Canchas Deportivas Cic	Consorcio Inter Cerramientos	Información De Suspensión De Actividades
20/10/2025	Consorcio Canchas Deportivas Cic	Consorcio Inter Cerramientos	Información De Suspensión De Actividades

ANEXO 1. COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

9. BITACORA DIARIA DE OBRA.

El día 15 de julio de 2025 se hizo apertura de bitácora de obra de manera conjunta residente de obra y residente de interventoría. Se diligencia folio por día incluidos los días no laborales, y de manera consecutiva ascendentemente, la bitácora es diligenciada por los profesionales Arq. Claudia Milena Segura Ávila residente de obra y Ing. Leonardo Camargo Velazco residente de interventoría. Se encuentra en el numera 52 de la lista de chequeo para cobro de acta parcial de contrato de obra No. 251 de 2025.

10. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

10.1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

El 22 de julio del 2025 se realizó la socialización del contrato de obra No. 251 DE 2025 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, en la Institución Educativa Guahibo Betoy, previa convocatoria realizada por la firma contratista.

En dicha reunión participaron representantes de la Administración Municipal, Agencia de Renovación del Territorio ART, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría externa y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión de la Administración Municipal. Conformación de la veeduría ciudadana

En la reunión de socialización del proyecto se llevó a cabo por parte de la comunidad que asistió a la convocatoria, el nombramiento de las personas que hacen parte de la veeduría ciudadana y que serán los voceros de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra ante el contratista, la Interventoría externa, entidad contratante, entes de control y demás instituciones.

Tabla 13. Conformación de la veeduría ciudadana para el control social del contrato de obra No. 251 del 2025

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	REPRESENTACION
1	Rene Delgado Diaz	1006496924	3212754721	Resguardo Genareros
2	Luis Alfredo Cedeño Yepes	17560252	3118410362	Institución Educativa Guahibo Betoy
3	Gerardo Martínez Garrido	1007362419	3133628636	Resguardo Julieros
4	Liginio Delgado Diaz	1006496933	3133479197	Resguardo Genareros
5	Ángel Custodio Rodríguez Gaitán	6609604	3133479197	Resguardo Roqueros
6	Uriel Delgado Diaz	1116853848	3214038050	Resguardo Velázqueros
7	Oscar Giovanni Alvarado Garcia	74301656	3138929900	Institución Educativa Guahibo Betoy

La veeduría ciudadana fue radicada para su respectivo diligenciamiento y reconocimiento oficial de la misma en las instalaciones de la Personería del Municipio de Tame, la cual fue aprobada mediante Resolución No. 016 del 31 de julio del 2025 en las oficinas de la entidad.

Durante el periodo del presente informe se ha mantenido una constante comunicación fluida con el comité veedor, resolviendo las observaciones e inquietudes presentadas por ellos a la firma contratista, con lo cual fue posible el avance de los trabajos sin ningún tipo de percance con la comunidad beneficiaria del proyecto.

10.1.1. Actas y reuniones suscritas por la veeduría ciudadana

Acta de veeduría de inicio de obra

Con el fin de dar inicio a la ejecución física de las obras se suscribió el acta de inicio de la veeduría ciudadana del contrato de obra No. 251 del 2025 de fecha 15 de julio 2025, en la cual se da a conocer por parte del contratista y la Interventoría externa aspectos como el plan de trabajo, se socializa el PGIO y se dan indicaciones sobre la vinculación de la mano de obra calificada y no calificada en la ejecución de la obra.

Acta de veeduría de Recibo Parcial

Con el fin de hacer entrega de la ejecución física de las obras se suscribió el acta de veeduría de recibo parcial del contrato de obra No. 251 del 2025 de fecha 15 de julio 2025, en la cual se hace entrega de las actividades ejecutadas hasta la fecha de 15 de noviembre de 2025 corte del acta parcial.

10.2. REUNIONES CON EL COMITÉ VEEDOR

Para el presente periodo no se han realizado reuniones con el comité veedor, teniendo en cuenta el corto plazo del mismo.

11. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

11.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO OBRA.

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha. A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 14. Personal administrativo del contrato de obra No. 251 DE 2025

MES: JULIO DE 2025 PLANILLA: 9490533598											
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA	80.094.040	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.200.000,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓
2	CLAUDIA MILENA SEGURA AVILA	1.010.221.789	RESIDENTE DE OBRA	$ 2.026.667,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓
3	MARTIN DANILO ROMERO RIAÑO	1.018.461.400	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.333.334,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓
4	ALFREDO LEIVA JIMENEZ	1.018.441.104	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.333.334,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓
5	LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO	1.116.778.744	SECRETARIO	$ 960.000,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓
6	HUGO ALBERTO QUINTO OROZCO	1.094.244.456	AUXILIAR SST PGIO	$ 1.173.334,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓
7	LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ	1.116.866.434	ING. AMBIENTAL PGIO	$ 1.866.667,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓
8	CARLOS JOSE GARCIA HERNANDEZ	1.116.852.188	CONDUCTOR	$ 759.200,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓

MES: AGOSTO DE 2025 PLANILLA: 9491625302											
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA	80.094.040	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.250.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
2	CLAUDIA MILENA SEGURA AVILA	1.010.221.789	RESIDENTE DE OBRA	$ 3.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
3	MARTIN DANILO ROMERO RIAÑO	1.018.461.400	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
4	ALFREDO LEIVA JIMENEZ	1.018.441.104	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
5	LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO	1.116.778.744	SECRETARIO	$ 1.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
6	HUGO ALBERTO QUINTO OROZCO	1.094.244.456	AUXILIAR SST PGIO	$ 2.200.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
7	LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ	1.116.866.434	ING. AMBIENTAL PGIO	$ 3.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
8	CARLOS JOSE GARCIA HERNANDEZ	1.116.852.188	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓

MES: SEPTIEMBRE DE 2025 PLANILLA: 1821312270											
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA	80.094.040	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.250.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
2	CLAUDIA MILENA SEGURA AVILA	1.010.221.789	RESIDENTE DE OBRA	$ 3.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
3	MARTIN DANILO ROMERO RIAÑO	1.018.461.400	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
4	ALFREDO LEIVA JIMENEZ	1.018.441.104	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
5	LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO	1.116.778.744	SECRETARIO	$ 1.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
6	HUGO ALBERTO QUINTO OROZCO	1.094.244.456	AUXILIAR SST PGIO	$ 2.200.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
7	LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ	1.116.866.434	ING. AMBIENTAL PGIO	$ 3.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
8	CARLOS JOSE GARCIA HERNANDEZ	1.116.852.188	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓

MES: OCTUBRE DE 2025 PLANILLA: 9494483373											
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA	80.094.040	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.250.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
2	CLAUDIA MILENA SEGURA AVILA	1.010.221.789	RESIDENTE DE OBRA	$ 3.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
3	MARTIN DANILO ROMERO RIAÑO	1.018.461.400	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
4	ALFREDO LEIVA JIMENEZ	1.018.441.104	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
5	LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO	1.116.778.744	SECRETARIO	$ 1.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
6	HUGO ALBERTO QUINTO OROZCO	1.094.244.456	AUXILIAR SST PGIO	$ 2.200.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
7	LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ	1.116.866.434	ING. AMBIENTAL PGIO	$ 3.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
8	CARLOS JOSE GARCIA HERNANDEZ	1.116.852.188	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓

MES: NOVIEMBRE DE 2025 PLANILLA:											
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA	80.094.040	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.250.000,00	15/07/2025	-		✓	✓	✓	✓
2	CLAUDIA MILENA SEGURA AVILA	1.010.221.789	RESIDENTE DE OBRA	$ 3.800.000,00	15/07/2025	-		✓	✓	✓	✓
3	MARTIN DANILO ROMERO RIAÑO	1.018.461.400	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-		✓	✓	✓	✓
4	ALFREDO LEIVA JIMENEZ	1.018.441.104	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-		✓	✓	✓	✓
5	LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO	1.116.778.744	SECRETARIO	$ 1.800.000,00	15/07/2025	-		✓	✓	✓	✓
6	HUGO ALBERTO QUINTO OROZCO	1.094.244.456	AUXILIAR SST PGIO	$ 2.200.000,00	15/07/2025	-		✓	✓	✓	✓
7	LUIS ALEJANDRO ORTIZ SUAREZ	1.116.866.434	ING. AMBIENTAL PGIO	$ 3.500.000,00	15/07/2025	-		✓	✓	✓	✓
8	CARLOS JOSE GARCIA HERNANDEZ	1.116.852.188	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	15/07/2025	-		✓	✓	✓	✓

309

11.2. PERSONAL OPERATIVO OBRA.

Tabla 16. Personal operativo del contrato de obra No. 251 DE 2025

MES: AGOSTO DE 2025 PLANILLA: 9491624779 - 9494532995											
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	JOSE ANGEL SOLER ROJAS	96.195.806	OFICIAL	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
2	DAVID ORTIZ GUTIERREZ	96.192.092	OFICIAL	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
3	JOSE DELFIN NEIVA ORTIZ	1.116.866.305	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
4	DAVID ALEJANDRO ORTIZ GALLEGO	1.116.874.041	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
5	HERMINSON VELAZQUES DIAZ	1.006.496.984	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/08/2025	26/08/2025	26	✓	✓	✓	✓
6	ALFONSO DIAZ ANISETO	1.116.856.230	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/08/2025	26/08/2025	26	✓	✓	✓	✓
7	LIGINIO DELGADO DIAZ	1.006.496.933	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/08/2025	26/08/2025	26	✓	✓	✓	✓
8	CARLOS FERNEY CEPEDA SANCHEZ	1.022.924.815	CADENERO	$ 1.423.500,00	1/08/2025	8/08/2025	8	✓	✓	✓	✓
9	HECTOR ELIAS NEIVA ORTIZ	1.116.869.153	CADENERO	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
10	EDGAR TULIVILA GARCIA	96.193.430	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	25/08/2025	-	6	✓	✓	✓	✓
11	OSCAR TULIVILA GARCIA	1.007.396.990	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	25/08/2025	-	6	✓	✓	✓	✓
12	NELSON GARCIA TULIVILA	96.193.416	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	25/08/2025	-	6	✓	✓	✓	✓
13	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA	1.116.867.010	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	1/08/2025	8/08/2025	8	✓	✓	✓	✓

MES: SEPTIEMBRE DE 2025 PLANILLA: 9492839099 - 9493004106											
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	JOSE ANGEL SOLER ROJAS	96.195.806	OFICIAL	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
2	DAVID ORTIZ GUTIERREZ	96.192.092	OFICIAL	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
3	JOSE DELFIN NEIVA ORTIZ	1.116.866.305	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
4	DAVID ALEJANDRO ORTIZ GALLEGO	1.116.874.041	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
5	HERMINSON VELAZQUES DIAZ	1.006.496.984	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	03/09/2025	-	28	✓	✓	✓	✓
6	ALFONSO DIAZ ANISETO	1.116.856.230	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	03/09/2025	-	28	✓	✓	✓	✓
7	LIGINIO DELGADO DIAZ	1.006.496.933	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	03/09/2025	20/09/2025	18	✓	✓	✓	✓
8	HECTOR ELIAS NEIVA ORTIZ	1.116.869.153	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/08/2025	20/09/2025	20	✓	✓	✓	✓
9	EDGAR TULIVILA GARCIA	96.193.430	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	25/08/2025	20/09/2025	20	✓	✓	✓	✓
10	OSCAR TULIVILA GARCIA	1.007.396.990	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	25/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
11	NELSON GARCIA TULIVILA	96.193.416	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	25/08/2025	20/09/2025	20	✓	✓	✓	✓

12	JAIDER GONZALO ALCALA ORTIZ	1.006.457.194	AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 1.423.500,00	22/09/2025	24/09/2025	3	✓	✓	✓	✓
13	YEISON JAVIER GAMBA ORTIZ	1.116.856.176	AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 1.423.500,00	22/09/2025	24/09/2025	3	✓	✓	✓	✓
14	IVAN RENE GÓMEZ OCAMPO	1.116.866.723	TÉCNICO ELECTRICISTA	$ 1.423.500,00	22/09/2025	24/09/2025	3	✓	✓	✓	✓

MES: OCTUBRE DE 2025 PLANILLA: 9494574053 - 9494573786

	DATOS GENERALES							AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	JOSE ANGEL SOLER ROJAS	96.195.806	OFICIAL	$ 1.423.500,00	1/08/2025	04/10/2025	04	✓	✓	✓	✓
2	DAVID ORTIZ GUTIERREZ	96.192.092	OFICIAL	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
3	JOSE DELFIN NEIVA ORTIZ	1.116.866.305	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
4	DAVID ALEJANDRO ORTIZ GALLEGO	1.116.874.041	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	1/08/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
5	HERMINSON VELAZQUES DIAZ	1.006.496.984	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	03/09/2025	12/10/2025	12	✓	✓	✓	✓
6	ALFONSO DIAZ ANISETO	1.116.856.230	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	03/09/2025	12/10/2025	12	✓	✓	✓	✓
7	WILSON DELGADO DIAZ	1.116.853.849	SOLDADOR	$ 1.423.500,00	06/10/2025		25	✓	✓	✓	✓
8	JAVIER DELGADO DIAZ	1.116.853.764	CADENERO/ AYUDANTE	$ 1.423.500,00	06/10/2025		25	✓	✓	✓	✓
9	CARLOS FERNEY CEPEDA SANCHEZ	1.022.924.815	CADENERO	$ 1.423.500,00	06/10/2025	17/10/2025	12	✓	✓	✓	✓
10	OSCAR TULIVILA GARCIA	1.007.396.990	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	25/08/2025	04/10/2025	4	✓	✓	✓	✓
11	JAIDER GONZALO ALCALA ORTIZ	1.006.457.194	AYUDANTE ELECTRICISTA/ AYUDANTE	$ 1.423.500,00	27/10/2025		4	✓	✓	✓	✓
12	ROBERT YEIR PEROSA	1.007.469.766	AYUDANTE ELECTRICISTA/ AYUDANTE	$ 1.423.500,00	27/10/2025		4	✓	✓	✓	✓
13	IVAN RENE GÓMEZ OCAMPO	1.116.866.723	TÉCNICO ELECTRICISTA	$ 1.423.500,00	27/10/2025	30/10/2025	4	✓	✓	✓	✓
14	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA	1.116.867.010	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	06/10/2025	17/10/2025	12	✓	✓	✓	✓

MES: NOVIEMBRE DE 2025 PLANILLA:

	DATOS GENERALES							AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	David Ortiz Gutiérrez	96192092	Oficial	$ 1.423.500,00	01/08/2025			✓	✓	✓	✓
2	Jose Delfín Neiva Ortiz	1116866305	Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	01/08/2025			✓	✓	✓	✓
3	David Alejandro Ortiz Gallego	1116874041	Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	01/08/2025			✓	✓	✓	✓

4	Wilson Delgado Diaz	1.116.853.849	Soldador	$ 1.423.500,01	06/10/2025			✓	✓	✓	✓
5	Javier Delgado Diaz	1.116.853.764	Cadenero/Ayudante	$ 1.423.500,02	06/10/2025			✓	✓	✓	✓
6	Jaider Gonzalo Alcala Ortiz	1.006.457.194	Ayudante Electricista / Ayudante	$ 1.423.500,00	27/10/2025	11/11/2025		✓	✓	✓	✓
7	Robert Yeir Perosa	1.007.469.766	Ayudante Electricista / Ayudante	$ 1.423.500,00	27/10/2025			✓	✓	✓	✓
8	Herson Delgado Martinez	1.116.871.311	Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	04/11/2025			✓	✓	✓	✓
9	Elmer Diaz Tulivila	1.116.853.324	Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	04/11/2025			✓	✓	✓	✓
10	Edward Ramirez Meche	94.151.671	Oficial	$ 1.423.500,00	4/11/2025			✓	✓	✓	✓
11	Yair Carrero Parales	1.116.788.412	Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	4/11/2025			✓	✓	✓	✓
12	Edgar Bello Pregonero	96.192.862	Oficial	$ 1.423.500,00	4/11/2025			✓	✓	✓	✓
13	Franklin Fuentes Angarita	1.192.925.222	Oficial	$ 1.423.500,00	4/11/2025			✓	✓	✓	✓
14	Eduardo Barrera Nosa	1.091.673.486	Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	4/11/2025			✓	✓	✓	✓
15	Jhon Freddy Carrillo Mendoza	1.115.725.112	Soldador	$ 1.423.500,00	4/11/2025			✓	✓	✓	✓
16	Javier Steven Pedraza Arenas	1.116.869.334	Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	4/11/2025			✓	✓	✓	✓
17	Jaime Ortiz Benitez	1.116.865.092	Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	4/11/2025			✓	✓	✓	✓
18	Miguel Angel Angarita Arenas		Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	4/11/2025			✓	✓	✓	✓
19	Omar Daniel Ortiz Guerrero	1.116.858.151	Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	13/11/2025			✓	✓	✓	✓
20	Omar Antonio Ortiz Riaño	96.193.934	Oficial	$ 1.423.500,00	13/11/2025			✓	✓	✓	✓
21	Anthony Jhons Gutiérrez Duran	1.116.870.886	Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	10/11/2025			✓	✓	✓	✓
22	William Guillermo Garavito Muñoz	1.012.327.635	Ayudante De Obra	$ 1.423.500,00	10/11/2025			✓	✓	✓	✓

11.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA.

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.
A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

11.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA.

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Personal administrativo mes de Julio

MES: JULIO DE 2025 PLANILLA: 9490561292											
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	PEDRO LUIS USMA VILLA	1.094.277.845	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.040.000,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓
2	LEONARDO CAMARGO VELAZCO	1.098.758.486	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.026.667,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓
3	YEISSON ALEJANDRO SARMIENTO MALDONADO	1.116.798.046	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 960.000,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓
4	DANIEL FERNANDO VERA GARCIA	1.010.168.976	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.333.334,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓
5	VICTOR MANUEL SANCHEZ TARAZONA	96.190.364	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.333.334,00	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	✓

Personal Sub contratado mes de Julio

MES: JULIO DE 2025										PLANILLA
DATOS GENERALES							AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
1	YONIER FERNANDO ROMERO MENDOZA	86079305	CONDUCTOR	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	7978846895
2	FRANKLIN RODOLFO SALAS CANO	5822989	TOPÓGRAFO	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	9489913666

3	NESTOR FABIAN RINCON MARTÍNEZ	1116871105	CADENERO	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	9489040010
4	CRISTIAN JAIR PADILLA PINZON	1116868220	CADENERO	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	7978192178 6006465579

Personal administrativo mes de Agosto

MES: AGOSTO DE 2025 PLANILLA: 9491625278											
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	PEDRO LUIS USMA VILLA	1.094.277.845	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$3.825.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
2	LEONARDO CAMARGO VELAZCO	1.098.758.486	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$3.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
3	YEISSON ALEJANDRO SARMIENTO MALDONADO	1.116.798.046	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$1.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
4	DANIEL FERNANDO VERA GARCIA	1.010.168.976	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
5	VICTOR MANUEL SANCHEZ TARAZONA	96.190.364	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓

Personal Sub contratado mes de Agosto

MES: AGOSTO DE 2025											PLANILLA
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS		SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
1	YONIER FERNANDO ROMERO MENDOZA	86079305	CONDUCTOR	15/07/2025	-	30		✓	✓	✓	7981499993
2	FRANKLIN RODOLFO SALAS CANO	5822989	TOPÓGRAFO	15/07/2025	-	30		✓	✓	✓	9499202602
3	NESTOR FABIAN RINCON MARTÍNEZ	1116871105	CADENERO	15/07/2025	-	30		✓	✓	✓	9490443801
4	CRISTIAN JAIR PADILLA PINZON	1116868220	CADENERO	15/07/2025	-	30		✓	✓	✓	7984219339

Personal administrativo mes de septiembre

MES: SEPTIEMBRE DE 2025 PLANILLA: 9492954959												
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	PEDRO LUIS USMA VILLA	1.094.277.845	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 3.825.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
2	LEONARDO CAMARGO VELAZCO	1.098.758.486	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
3	YEISSON ALEJANDRO SARMIENTO MALDONADO	1.116.798.046	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
4	DANIEL FERNANDO VERA GARCIA	1.010.168.976	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
5	VICTOR MANUEL SANCHEZ TARAZONA	96.190.364	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓

Personal Sub contratado mes de septiembre

MES: SEPTIEMBRE DE 2025											
DATOS GENERALES							AFILIADO A			PLANILLA
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
1	YONIER FERNANDO ROMERO MENDOZA	86079305	CONDUCTOR	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	7986245541
2	FRANKLIN RODOLFO SALAS CANO	5822989	TOPÓGRAFO	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	9493874760
3	NESTOR FABIAN RINCON MARTÍNEZ	1116871105	CADENERO	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	9491904416
4	CRISTIAN JAIR PADILLA PINZON	1116868220	CADENERO	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	7988642716

Personal administrativo mes de octubre

MES: OCTUBRE DE 2025 PLANILLA: 9494622788											
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	PEDRO LUIS USMA VILLA	1.094.277.845	DIRECTOR DE	$ 3.825.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓

			INTERVENTORIA									
2	LEONARDO CAMARGO VELAZCO	1.098.758.486	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
3	YEISSON ALEJANDRO SARMIENTO MALDONADO	1.116.798.046	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.800.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
4	DANIEL FERNANDO VERA GARCIA	1.010.168.976	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓
5	VICTOR MANUEL SANCHEZ TARAZONA	96.190.364	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.500.000,00	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	✓

Personal Sub contratado mes de octubre

MES: OCTUBRE DE 2025										
DATOS GENERALES							AFILIADO A			PLANILLA
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
1	YONIER FERNANDO ROMERO MENDOZA	86079305	CONDUCTOR	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	7990302310
2	FRANKLIN RODOLFO SALAS CANO	5822989	TOPÓGRAFO	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	9493082037
3	NESTOR FABIAN RINCON MARTÍNEZ	1116871105	CADENERO	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	9493340822
4	CRISTIAN JAIR PADILLA PINZON	1116868220	CADENERO	15/07/2025	-	30	✓	✓	✓	7988643054

Personal administrativo mes de noviembre

MES: NOVIEMBRE DE 2025 PLANILLA:											
DATOS GENERALES								AFILIADO A			
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
1	PEDRO LUIS USMA VILLA	1.094.277.845	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 3.825.000,00	15/07/2025			✓	✓	✓	✓
2	LEONARDO CAMARGO VELAZCO	1.098.758.486	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.800.000,00	15/07/2025			✓	✓	✓	✓

3104

3	YEISSON ALEJANDRO SARMIENTO MALDONADO	1.116.798.046	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.800.000,00	15/07/2025	-		✓	✓	✓	✓
4	DANIEL FERNANDO VERA GARCIA	1.010.168.976	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.500.000,00	15/07/2025			✓	✓	✓	✓
5	VICTOR MANUEL SANCHEZ TARAZONA	96.190.364	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.500.000,00	15/07/2025			✓	✓	✓	✓

Personal Sub contratado mes de noviembre

MES: OCTUBRE DE 2025										
DATOS GENERALES							AFILIADO A			PLANILLA
	NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
1	YONIER FERNANDO ROMERO MENDOZA	86079305	CONDUCTOR	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	-
2	FRANKLIN RODOLFO SALAS CANO	5822989	TOPÓGRAFO	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	-
3	NESTOR FABIAN RINCON MARTÍNEZ	1116871105	CADENERO	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	-
4	CRISTIAN JAIR PADILLA PINZON	1116868220	CADENERO	15/07/2025	-	16	✓	✓	✓	-

NOTA: Los soportes de la vinculación del personal, se encuentran relacionado en el numeral 15, 42 y 43 de la lista de chequeo para cobro de acta parcial No. 1 del contrato de interventoría.

11.4. PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral escrito para cada uno de los meses que se relacionan en el presente informe.

3106

12. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

12.1. DOTACIÓN DEL PERSONAL

La firma contratista suministro al personal que laboró en la obra los elementos de protección necesarios para llevar a cabo sus tareas diarias. Estos elementos fueron entregados de acuerdo con las necesidades individuales de cada trabajador. Las planillas de entrega de estos elementos están incluidas en el informe de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental y en el informe de Seguridad y salud en el trabajo, proporcionado por el contratista de obra y verificado por la interventoría.

Tabla 19. Dotación del Personal en Obra de Elementos de Protección Contrato de obra No. 251 de 2025

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Personal administrativo, personal operativo
GUANTES	X		X			Personal administrativo, personal operativo
BOTAS DE SEGURIDAD.	X		X			Personal administrativo, personal operativo
GAFAS DE PROTECCIÓN	X		X			Personal administrativo, personal operativo
CAMISA / PANTALÓN	X		X			Personal administrativo, personal operativo
TAPA BOCAS	X		X			Personal administrativo, personal operativo



La Interventoría llevó a cabo una supervisión diaria en el lugar de trabajo para asegurar el uso adecuado de los elementos de protección por parte del personal en obra. En casos en que se identificó que algunos trabajadores no estaban utilizando dichos elementos en momentos específicos, se realizaron los correspondientes requerimientos para corregir la situación.

12.2. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

Durante el desarrollo de las actividades de obra el contratista fue realizando la respectiva señalización de la obra, delimitando las áreas de intervención y señalizando las entradas y salidas de los vehículos de transporte de materiales, con la finalidad de mitigar los accidentes que se puedan llegar a ocasionar y cumpliendo con las recomendaciones dadas por esta interventoría, además de esto se está dando cumplimiento a las recomendaciones dadas en el PGIO.

Tabla 17. Señalización Instalada en la Obra por el Contratista- Contrato de Obra No. 251 de 2025

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	INSTALADOS		ESTADO		
	Si	No	Bueno	Regular	Malo
AVISOS PREVENTIVOS	X		X		
AVISOS INFORMATIVOS	X		X		
CINTA REFLECTIVA "PELIGRO NO PASE" ROLLO	X		X		

La Interventoría diariamente verificó que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.



Imagen: Licencia de construcción



Imagen: Valla de información contrato de obra

12.3. ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA

La Interventoría vigiló de cerca el registro y atención de los accidentes laborales que pudieran surgir entre el personal contratado para la obra. Durante el período abarcado por este informe, es importante destacar que NO se reportaron accidentes laborales en la ejecución del contrato No. 251 del 2025.

Además, la Interventoría también estuvo alerta ante posibles incidentes que pudiesen afectar a terceros debido a la realización de la obra. Es relevante señalar que, durante el periodo del presente informe, NO se registraron accidentes que involucraran a terceros en la ejecución del contrato No. 251 del 2025.

12.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "*consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.*"


12.6. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A INTERVENTORIA

12.7. DOTACIÓN DEL PERSONAL

La firma contratista CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS suministro al personal administrativo de la interventoría los elementos de protección necesarios para llevar a cabo sus tareas diarias una vez se den inicio a las actividades constructivas. Las planillas de entrega de estos elementos están incluidas en el informe de Seguridad y salud ocupacional, proporcionado por la interventoría.

Tabla 16. Dotación de Elementos de Protección personal del Contrato de interventoría No. 239 de 2025

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Personal administrativo
CAMISA	X		X			Personal administrativo
CHALECO	X		X			Personal administrativo

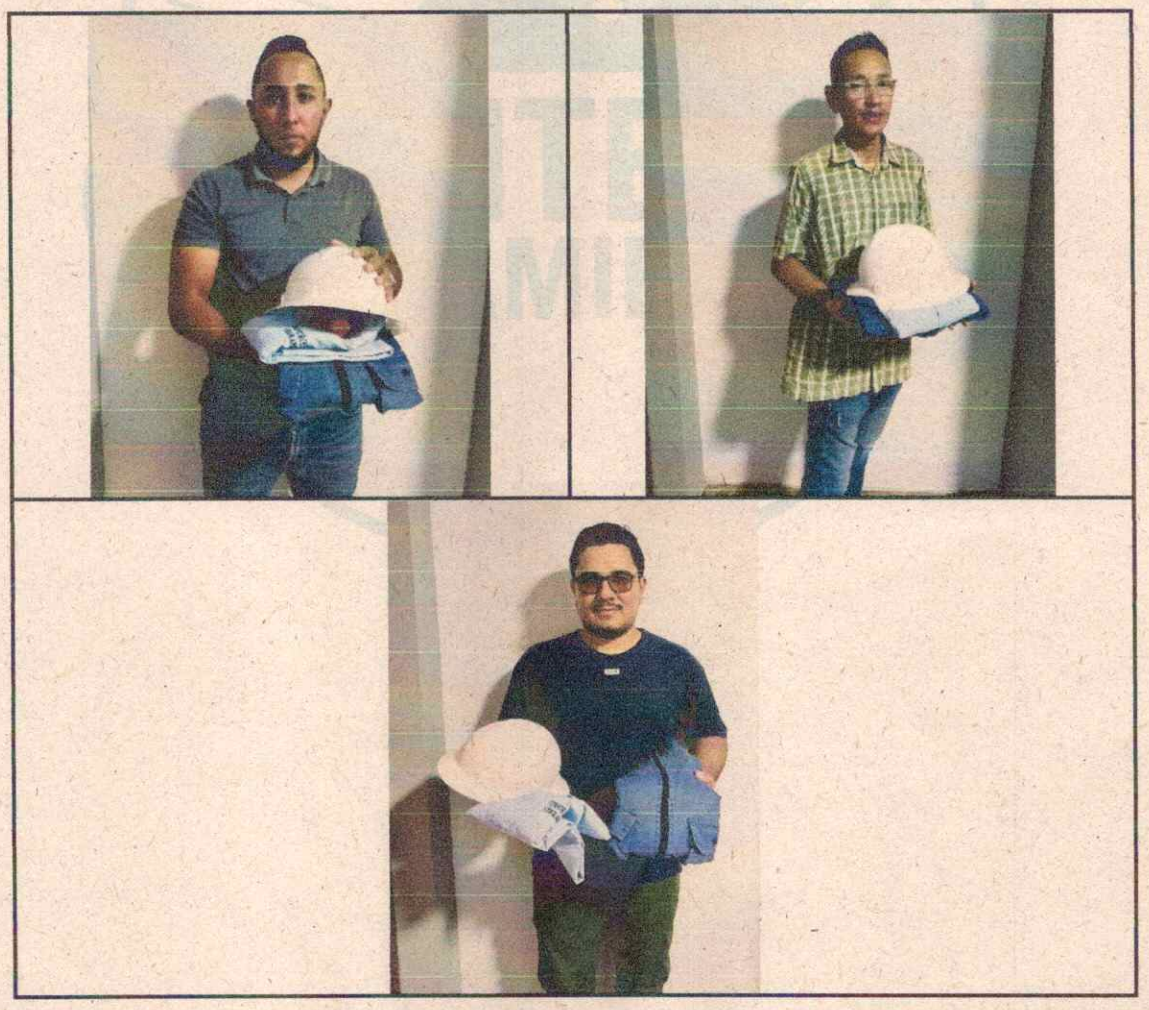

En tal sentido, el contratista cumplió con la aplicación del (SG-SST), tal como se evidencia en el Informe del Contratista de Cumplimiento en la Aplicación del SG-SST, que se encuentra en el numeral No. 57 de la lista de chequeo del contrato de obra. El informe de seguimiento al SST de obra por parte de la interventoría, se encuentra en el numeral 36 de la lista de chequeo para cobro de acta parcial No. 1 del contrato de interventoría.

13. PERMISOS Y LICENCIAS

13.1. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN U OTRO TIPO DE LICENCIA URBANÍSTICA

El contrato de obra No 251 de 2025 por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, Requiere de licencia urbanística, la cual, se otorga mediante resolución No. 801 con fecha de 09 de julio de 2025, en modalidad de INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO Y CERRAMIENTO de uso ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CERRAMIENTO.

13.2. LICENCIA O PERMISOS AMBIENTALES.

El contrato de obra No 251 de 2025 por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLÓN Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, NO requiere tramite de permisos ambientales.

13.3. LICENCIAS Y PERMISOS PARA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El contratista realizo los acercamientos y tramitara la adquisición de los materiales de construcción como arena, triturado, en canteras autorizadas por la Agencia Nacional de Minería que cuentan con los respectivos permisos y licencias de CORPORINOQUIA, vigentes a la fecha de adquisición de los materiales.

Durante el periodo del presente informe, el contratista de obra realizo adquisición de materiales de construcción.

Tabla 18. Relación de Licencias o permisos de canteras certificadas

TIPO DE MATERIAL	CANTERA	LOCALIZACIÓN DE LA CANTERA	PERMISOS Y LICENCIAS		RESOLUCIÓN DE CORPORINOQUIA	REGISTRO MINERO	VIGENTE	
			Minero	Ambiental			SI	NO
Arena, triturado, base, subbase	CANTERA Y AGRAGADOS PLAYA BLANCA S.A.S	TAME-ARAUCA	X		500.36.22-0622 DE 16/08/2022	RUCOM-2025050530747	X	

14. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA E INTERVENTORIA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

De acuerdo a las actividades ejecutadas en el presente informe, se utilizaron los equipos necesarios para el correcto desarrollo de estas, entre los cuales se encontraban los siguientes:

DESCRIPCIÓN		REGISTRO FOTOGRAFICO
EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: AUMENTOS: PRECISIÓN: ESTADO:	Estación total Topcon GTS-239W 293072 30 x 9" Usado	
EQUIPO: MARCA: REFERENCIA: SERIAL:	Nivel EFIX eBase/F7+ 4289338-4292531	
EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: ESTADO:	Mezcladora de concreto Tipo Trompo 1 Marquitec N/A N/A Diesel Usado	

EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: ESTADO:	Mezcladora de concreto Tipo Trompo 2 LN N/A N/A Diesel Usado	
EQUIPO: MOTOR: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: POWER: ESTADO:	Vibrador de concreto con manguera Honda N/A N/A Diesel 4.0 kW Usado	
EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: ESTADO:	Cortador de concreto N/A N/A N/A Diesel Usado	

EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: ESTADO:	Vibrocompactador tipo rana N/A N/A 39023Y040039 Diesel Usado	 
EQUIPO: MARCA: MODELO: SERIAL: COMBUSTIBLE: ESTADO:	Vibrocompactador tipo rana Jadever Jdpm2a2100 N/A Gasolina Usado	

EQUIPO Y VEHICULO DE INTERVENTORIA

El contratista de interventoría CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS, para el adecuado desarrollo y cumplimiento de las actividades propias del contrato, dispone de los equipos, herramientas y recursos técnicos necesarios, los cuales permiten garantizar una correcta supervisión, control y seguimiento a la ejecución del proyecto.

Estos equipos se encuentran disponibles de manera permanente y en condiciones óptimas de funcionamiento, asegurando el apoyo requerido para la verificación técnica, administrativa y operativa de las actividades contratadas, en concordancia con los lineamientos establecidos en el contrato y la normativa vigente.

Equipo de topografía



Vehículo tipo camioneta







15. ASPECTOS TECNICOS

15.1. CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA 251 DE 2025.

El contrato de obra suscrito entre el Municipio de Tame y la firma contratista CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de cinco (5) meses.

Tabla 19. Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No. 251 DE 2025.

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS					
I	**CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA EL PORVENIR**				**$ 426.576.772,00**
1	**PRELIMINARES**				**$ 5.806.123,00**
1.1	Localización y replanteo topográfico	M2	269,4	$ 7.616,00	$ 2.051.750,00
1.2	Excavación manual en material común	M3	74,4	$ 50.462,00	$ 3.754.373,00
2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 186.377.755,00**
2.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	110,1	$ 58.287,00	$ 6.417.399,00
2.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	239,6	$ 106.606,00	$ 25.542.798,00
2.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 p.s.i	ML	108,1	$ 107.723,00	$ 11.644.856,00
2.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	5.964,00	$ 13.763,00	$ 82.082.532,00
2.5	Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo	ML	227	$ 68.555,00	$ 15.561.985,00
2.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,8	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00
2.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	7,3	$ 1.272.329,00	$ 9.288.002,00
2.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,3	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00
3	**MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 234.392.894,00**
3.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	135,5	$ 188.595,00	$ 25.554.623,00
3.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	227	$ 785.372,00	$ 178.279.444,00
3.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,5	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00
3.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,7	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00
3.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,8	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00
II	**CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR**				**$ 343.581.492,00**
4	**PRELIMINARES**				**$ 85.210.350,00**
4.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00
4.2	Excavación manual en material común	M3	6,4	$ 50.462,00	$ 322.957,00
4.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,4	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00
4.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,4	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00

4.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,2	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 131.757.224,00**
5.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00
5.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00
5.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00
5.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00
6	**ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 45.853.568,00**
6.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00
6.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,3	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00
6.3	Pintura para canchas	M2	633,8	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 31.710.620,00**
7.1	Cañuela en concreto prefabricado.0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00
7.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00
7.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00
7.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,7	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00
7.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	8,12	$ 106.067,00	$ 861.264,00
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 49.049.730,00**
8.1	Excavación manual en material común	M3	2	$ 50.462,00	$ 100.924,00
8.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00
8.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,5	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00
8.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00
8.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00
8.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00
8.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00
ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS					
III	**CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA GONZALO JIMENEZ**				**$ 586.582.780,00**
9	**PRELIMINARES**				**$ 7.660.641,00**
9.1	Localización y replanteo topográfico	M2	383,7	$ 7.616,00	$ 2.922.259,00
9.2	Excavación manual en material común	M3	93,9	$ 50.462,00	$ 4.738.382,00
10	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 241.349.286,00**
10.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	148,1	$ 58.287,00	$ 8.632.305,00
10.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	354,6	$ 106.606,00	$ 37.802.488,00
10.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	162,2	$ 107.723,00	$ 17.472.671,00
10.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	7.623,60	$ 13.763,00	$ 104.923.607,00
10.5	Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI incluye refuerzo	ML	342	$ 68.555,00	$ 23.445.810,00
10.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,8	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00
10.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	10,4	$ 1.272.329,00	$ 13.232.222,00
10.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,3	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00

11	**MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 337.572.853,00**
11.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	203,7	$ 188.595,00	$ 38.416.802,00
11.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	342	$ 785.372,00	$ 268.597.224,00
11.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,5	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00
11.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,7	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00
11.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,8	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00
IV	**CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA GONZALO JIMENEZ**				**$ 343.690.741,00**
12	**PRELIMINARES**				**$ 85.210.350,00**
12.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00
12.2	Excavación manual en material común	M3	6,4	$ 50.462,00	$ 322.957,00
12.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,4	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00
12.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,4	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00
12.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,2	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00
13	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 131.757.224,00**
13.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00
13.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00
13.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00
13.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00
14	**ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 45.853.568,00**
14.1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00
14.2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,3	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00
14.3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,8	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00
15	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 31.819.869,00**
15.1	Cañuela en concreto prefabricado.0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00
15.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00
15.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00
15.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,7	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00
15.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	9,15	$ 106.067,00	$ 970.513,00
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 49.049.730,00**
16.1	Excavación manual en material común	M3	2	$ 50.462,00	$ 100.924,00
16.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00
16.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,5	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00
16.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00

16.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00
16.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00
16.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00
ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS					
V	**CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA CRISTOBAL COLON**				**$ 656.718.935,00**
17	**PRELIMINARES**				**$ 8.392.680,00**
17.1	Localización y replanteo topográfico	M2	428,8	$ 7.616,00	$ 3.265.741,00
17.2	Excavación manual en material común	M3	101,6	$ 50.462,00	$ 5.126.939,00
18	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 263.527.415,00**
18.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	163,1	$ 58.287,00	$ 9.506.610,00
18.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	400,6	$ 106.606,00	$ 42.706.364,00
18.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	182,9	$ 107.723,00	$ 19.702.537,00
18.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	8.269,00	$ 13.763,00	$ 113.806.247,00
18.5	Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo	ML	395	$ 68.555,00	$ 27.079.225,00
18.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,8	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00
18.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	11,7	$ 1.272.329,00	$ 14.886.249,00
18.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,3	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00
19	**MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 384.798.840,00**
19.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	233,4	$ 188.595,00	$ 44.018.073,00
19.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	395	$ 785.372,00	$ 310.221.940,00
19.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,5	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00
19.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,7	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00
19.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,8	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00
VI	**CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA CRISTOBAL COLON**				**$ 343.144.496,00**
20	**PRELIMINARES**				**$ 85.210.350,00**
20.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00
20.2	Excavación manual en material común	M3	6,4	$ 50.462,00	$ 322.957,00
20.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,4	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00
20.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,4	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00
20.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,2	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00
21	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 131.757.224,00**
21.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00
21.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00
21.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00

21.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00
22	**ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 45.853.568,00**
22.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00
22.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,3	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00
22.3	Pintura para canchas	M2	633,8	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00
23	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 31.273.624,00**
23.1	Cañuela en concreto prefabricado.0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00
23.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00
23.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00
23.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,7	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00
23.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	4	$ 106.067,00	$ 424.268,00
24	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 49.049.730,00**
24.1	Excavación manual en material común	M3	2	$ 50.462,00	$ 100.924,00
24.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00
24.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,5	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00
24.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00
24.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00
24.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00
24.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00
ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS					
VII	**CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA SANTA TERESITA**				**$ 498.030.145,00**
25	**PRELIMINARES**				**$ 6.576.340,00**
25.1	Localización y replanteo topográfico	M2	316,2	$ 7.616,00	$ 2.408.179,00
25.2	Excavación manual en material común	M3	82,6	$ 50.462,00	$ 4.168.161,00
26	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 209.326.246,00**
26.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	125,9	$ 58.287,00	$ 7.338.333,00
26.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	286,8	$ 106.606,00	$ 30.574.601,00
26.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	131,1	$ 107.723,00	$ 14.122.485,00
26.4	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG	6.647,20	$ 13.763,00	$ 91.485.414,00
26.5	Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI incluye refuerzo	ML	281,2	$ 68.555,00	$ 19.277.666,00
26.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,8	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00
26.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	8,4	$ 1.272.329,00	$ 10.687.564,00
26.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,3	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00
27	**MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 282.127.559,00**
27.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	162,9	$ 188.595,00	$ 30.722.126,00
27.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	281,2	$ 785.372,00	$ 220.846.606,00

27.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,5	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00
27.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,7	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00
27.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,8	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00
VIII	**CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA SANTA TERESITA**				**$ 343.674.831,00**
28	**PRELIMINARES**				**$ 85.210.350,00**
28.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00
28.2	Excavación manual en material común	M3	6,4	$ 50.462,00	$ 322.957,00
28.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,4	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00
28.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,4	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00
28.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,2	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00
29	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 131.757.224,00**
29.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00
29.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00
29.3	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG	483	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00
29.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00
30	**ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 45.853.568,00**
30.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2	$ 9.891.136,00	$ 19.782.272,00
30.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,3	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00
30.3	Pintura para canchas	M2	633,8	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00
31	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 31.803.959,00**
31.1	Cañuela en concreto prefabricado.0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00
31.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00
31.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1	$ 1.183.580,00	$ 1.183.580,00
31.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,7	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00
31.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	9	$ 106.067,00	$ 954.603,00
32	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 49.049.730,00**
32.1	Excavación manual en material común	M3	2	$ 50.462,00	$ 100.924,00
32.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4	$ 4.422.059,00	$ 17.688.236,00
32.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,5	$ 1.135.084,00	$ 1.702.626,00
32.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4	$ 1.478.416,00	$ 5.913.664,00
32.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8	$ 1.771.596,00	$ 14.172.768,00
32.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 30 w	UND	8	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00
32.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4	$ 1.310.344,00	$ 5.241.376,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	**$ 3.542.000.192,00**
	IMPLEMENTAR PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA (PGIO)				$ 35.933.036,60
	TRAMITE DE CERTIFICADO RETILAP				$ 22.000.000,00
				TOTAL COSTO OBRA CIVIL	**$ 3.599.933.228,60**

Tabla 20. Cantidades ejecutadas durante el periodo del presente informe parcial no. 01

ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	PARCIAL JULIO - NOVIEMBRE		
						CANT	VALOR	%
	ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS							
I	**CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA EL PORVENIR**				**$ 426.576.772,00**			
1	**PRELIMINARES**				**$ 5.806.123,00**			
1.1	Localización y replanteo topográfico	M2	269,40	$ 7.616,00	$ 2.051.750,00	269,4	$ 2.051.750,00	100%
1.2	Excavación manual en material común	M3	74,40	$ 50.462,00	$ 3.754.373,00	40,62	$ 2.049.766,00	54,60%
2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 186.377.755,00**			
2.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	110,10	$ 58.287,00	$ 6.417.399,00	69,86	$ 4.071.930,00	63,45%
2.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	239,60	$ 106.606,00	$ 25.542.798,00	189,48	$ 20.199.705,00	79,08%
2.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 p.s.i	ML	108,10	$ 107.723,00	$ 11.644.856,00	47	$ 5.062.981,00	43,48%
2.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	5.964,00	$ 13.763,00	$ 82.082.532,00	3582,19	$ 49.301.681,00	60,06%
2.5	Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo	ML	227,00	$ 68.555,00	$ 15.561.985,00		$ 0,00	0,00%
2.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00	14,8	$ 2.418.364,00	100,00%
2.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	7,30	$1.272.329,00	$ 9.288.002,00	6,99	$ 8.893.580,00	95,75%
2.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	$1.646.395,00	$ 33.421.819,00			
3,0	**MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 234.392.894,00**			
3.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	135,50	$ 188.595,00	$ 25.554.623,00			
3.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	227,00	$ 785.372,00	$ 178.279.444,00			
3.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			
3.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			
3.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			
II	**CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR**				**$ 343.581.492,00**			
4	**PRELIMINARES**				**$ 85.210.350,00**			
4.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00	672	$ 5.117.952,00	100,00%

4.2	Excavación manual en material común	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			
4.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			
4.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00	176	$ 1.776.192,00	25,09%
4.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00	235,2	$ 43.861.037,00	100,00%
5,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 131.757.224,00**			
5.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			
5.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			
5.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			
5.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			
6	**ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 45.853.568,00**			
6.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2,00	$9.891.136,00	$ 19.782.272,00			
6.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			
6.3	Pintura para canchas	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 31.710.620,00**			
7.1	Cañuela en concreto prefabricado.0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			
7.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			
7.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	$1.183.580,00	$ 1.183.580,00			
7.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			
7.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	8,12	$ 106.067,00	$ 861.264,00			
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 49.049.730,00**			
8.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			
8.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	$4.422.059,00	$ 17.688.236,00			
8.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	$1.135.084,00	$ 1.702.626,00			
8.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	$1.478.416,00	$ 5.913.664,00			
8.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	$1.771.596,00	$ 14.172.768,00			
8.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 40 w	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			
8.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	$1.310.344,00	$ 5.241.376,00			
ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS								
III	**CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA GONZALO JIMENEZ**				**$ 586.582.780,00**			
9,0	**PRELIMINARES**				**$ 7.660.641,00**			
9.1	Localización y replanteo topográfico	M2	383,70	$ 7.616,00	$ 2.922.259,00	383,7	$ 2.922.259,00	100,00%
9.2	Excavación manual en material común	M3	93,90	$ 50.462,00	$ 4.738.382,00	44,72	$ 2.256.661,00	47,63%

10	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 241.349.286,00**			
10.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	148,10	$ 58.287,00	$ 8.632.305,00	87,07	$ 5.075.049,00	58,79%
10.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	354,60	$ 106.606,00	$ 37.802.488,00	263,35	$ 28.074.690,00	74,27%
10.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	162,20	$ 107.723,00	$ 17.472.671,00	119,6	$ 12.883.671,00	73,74%
10.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	7.623,60	$ 13.763,00	$ 104.923.607,00	5213,8	$ 71.757.529,00	68,39%
10.5	Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI incluye refuerzo	ML	342,00	$ 68.555,00	$ 23.445.810,00			
10.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00	14,8	$ 2.418.364,00	100,00%
10.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	10,40	$1.272.329,00	$ 13.232.222,00	7,71	$ 9.809.657,00	74,13%
10.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	$1.646.395,00	$ 33.421.819,00			
11,0	**MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 337.572.853,00**			
11.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	203,70	$ 188.595,00	$ 38.416.802,00	37,91	$ 7.149.636,00	18,61%
11.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	342,00	$ 785.372,00	$ 268.597.224,00			
11.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00			
11.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00			
11.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			
IV	**CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA GONZALO JIMENEZ**				**$ 343.690.741,00**			
12,0	**PRELIMINARES**				**$ 85.210.350,00**			
12.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00	672	$ 5.117.952,00	100,00%
12.2	Excavación manual en material común	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00			
12.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00			
12.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00	701,4	$ 7.078.529,00	100,00%
12.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00	231,77	$ 43.221.397,00	98,54%
13,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 131.757.224,00**			
13.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00			
13.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00			
13.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00			

13.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00			
14,0	**ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 45.853.568,00**			
14.1	CANCHA MULTIPLE METALICA CON TABLERO METALICO ANTIVANDALICO	UND	2,00	$9.891.136,00	$ 19.782.272,00			
14.2	DEMARCACION CANCHA CON PINTURA ACRILICA A DOS MANOS	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			
14.3	PINTURA PARA CANCHAS	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			
15	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 31.819.869,00**			
15.1	Cañuela en concreto prefabricado.0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00			
15.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00			
15.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	$1.183.580,00	$ 1.183.580,00			
15.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00			
15.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	9,15	$ 106.067,00	$ 970.513,00			
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 49.049.730,00**			
16.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00			
16.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	$4.422.059,00	$ 17.688.236,00			
16.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	$1.135.084,00	$ 1.702.626,00			
16.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	$1.478.416,00	$ 5.913.664,00			
16.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	$1.771.596,00	$ 14.172.768,00			
16.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 40 w	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00			
16.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	$1.310.344,00	$ 5.241.376,00			
	ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS							
V	**CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA CRISTOBAL COLON**				**$ 656.718.935,00**			
17,0	**PRELIMINARES**				**$ 8.392.680,00**			
17.1	Localización y replanteo topográfico	M2	428,80	$ 7.616,00	$ 3.265.741,00	424,9	$ 3.236.038,00	99,09%
17.2	Excavación manual en material común	M3	101,60	$ 50.462,00	$ 5.126.939,00	101,26	$ 5.109.782,00	99,67%
18,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 263.527.415,00**			
18.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	163,10	$ 58.287,00	$ 9.506.610,00	162,04	$ 9.444.825,00	99,35%
18.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	400,60	$ 106.606,00	$ 42.706.364,00	395,5	$ 42.162.673,00	98,73%
18.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	182,90	$ 107.723,00	$ 19.702.537,00	182,85	$ 19.697.151,00	99,97%
18.4	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	8.269,00	$ 13.763,00	$ 113.806.247,00	8223,41	$ 113.178.792,00	99,45%
18.5	Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI, incluye refuerzo	ML	395,00	$ 68.555,00	$ 27.079.225,00	383,1	$ 26.263.421,00	96,99%

18.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00	14,8	$ 2.418.364,00	100,00%
18.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	11,70	$1.272.329,00	$ 14.886.249,00	11,63	$ 14.797.186,00	99,40%
18.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	$1.646.395,00	$ 33.421.819,00	20,3	$ 33.421.819,00	100,00%
19,0	**MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 384.798.840,00**			
19.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	233,40	$ 188.595,00	$ 44.018.073,00	228,35	$ 43.065.668,00	97,84%
19.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	395,00	$ 785.372,00	$ 310.221.940,00	383,1	$ 300.876.013,00	96,99%
19.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00	31,5	$ 20.407.811,00	100,00%
19.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00	3,7	$ 2.653.884,00	100,00%
19.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			
VI	**CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA CRISTOBAL COLON**				**$ 343.144.496,00**			
20,0	**PRELIMINARES**				**$ 85.210.350,00**			
20.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00	672	$ 5.117.952,00	100,00%
20.2	Excavación manual en material común	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00	6,4	$ 322.957,00	100,00%
20.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00	134,4	$ 28.829.875,00	100,00%
20.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00	701,4	$ 7.078.529,00	100,00%
20.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00	235,2	$ 43.861.037,00	100,00%
21,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 131.757.224,00**			
21.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00	672	$ 103.881.792,00	100,00%
21.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00	106	$ 10.107.206,00	100,00%
21.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00	483	$ 6.567.834,00	100,00%
21.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00	413	$ 9.307.368,00	83,10%
22,0	**ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 45.853.568,00**			
22.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2,00	$9.891.136,00	$ 19.782.272,00			
22.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00			
22.3	Pintura para canchas	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00			
23,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 31.273.624,00**			

23.1	Cañuela en concreto prefabricado.0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00	80	$ 26.823.760,00	100,00%
23.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00	2	$ 1.371.488,00	100,00%
23.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	$1.183.580,00	$ 1.183.580,00	1	$ 1.183.580,00	100,00%
23.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00	20,7	$ 1.470.528,00	100,00%
23.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	4,00	$ 106.067,00	$ 424.268,00	4	$ 424.268,00	100,00%
24,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 49.049.730,00**			
24.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00	2	$ 100.924,00	100,00%
24.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	$4.422.059,00	$ 17.688.236,00	4	$ 17.688.236,00	100,00%
24.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	$1.135.084,00	$ 1.702.626,00	1,5	$ 1.702.626,00	100,00%
24.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	$1.478.416,00	$ 5.913.664,00	4	$ 5.913.664,00	100,00%
24.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	$1.771.596,00	$ 14.172.768,00	8	$ 14.172.768,00	100,00%
24.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 40 w	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00	8	$ 4.230.136,00	100,00%
24.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	$1.310.344,00	$ 5.241.376,00	4	$ 5.241.376,00	100,00%
	ESCUELA SANTA TERESITA RESGUARDO INDIGENA ROQUEROS							
VII	**CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA SANTA TERESITA**				**$ 498.030.145,00**			
25,0	**PRELIMINARES**				**$ 6.576.340,00**			
25.1	Localización y replanteo topográfico	M2	316,20	$ 7.616,00	$ 2.408.179,00	316,2	$ 2.408.179,00	100,00%
25.2	Excavación manual en material común	M3	82,60	$ 50.462,00	$ 4.168.161,00	82,6	$ 4.168.161,00	100,00%
26,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 209.326.246,00**			
26.1	Concreto de 2500 psi para solado e=5cm	M2	125,90	$ 58.287,00	$ 7.338.333,00	125,9	$ 7.338.333,00	100,00%
26.2	Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	286,80	$ 106.606,00	$ 30.574.601,00	286,8	$ 30.574.601,00	100,00%
26.3	Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	131,10	$ 107.723,00	$ 14.122.485,00	131,1	$ 14.122.485,00	100,00%
26.4	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG	6.647,20	$ 13.763,00	$ 91.485.414,00	6641,32	$ 91.404.487,00	99,91%
26.5	Alfajía de 20x7 cm, en concreto de 3.000 PSI incluye refuerzo	ML	281,20	$ 68.555,00	$ 19.277.666,00	274,4	$ 18.811.492,00	97,58%
26.6	Columna de 30x30 cm, en concreto de 3.000 PSI	ML	14,80	$ 163.403,00	$ 2.418.364,00	14,8	$ 2.418.364,00	100,00%
26.7	Zapata en concreto de 3.000 PSI	M3	8,40	$ 1.272.329,00	$ 10.687.564,00	8,4	$ 10.687.564,00	100,00%
26.8	Concreto de 3000 psi para gradería	M3	20,30	$ 1.646.395,00	$ 33.421.819,00	20,3	$ 33.421.819,00	100,00%
27,0	**MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 282.127.559,00**			
27.1	Muro en ladrillo a la vista	M2	162,90	$ 188.595,00	$ 30.722.126,00	161,33	$ 30.426.031,00	99,04%

27.2	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye ángulos de soporte de 1-1/2"x3/16", tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16", brazo doble para alambre y concertina, incluye pintura	ML	281,20	$ 785.372,00	$ 220.846.606,00	274,4	$ 215.506.077,00	97,58%
27.3	Portón en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	31,50	$ 647.867,00	$ 20.407.811,00	31,5	$ 20.407.811,00	100,00%
27.4	Puerta en malla eslabonada calibre 12 2"x2", incluye, tubo galvanizado de 2"x2.5mm, platina de 1"x3/16" incluye pintura	M2	3,70	$ 717.266,00	$ 2.653.884,00	3,7	$ 2.653.884,00	100,00%
27.5	Pasamano metálico en 3 secciones inc baranda vertical en perfil circular de 2" incluye pintura	ML	15,80	$ 474.502,00	$ 7.497.132,00			
VIII	**CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA SANTA TERESITA**				**$ 343.674.831,00**			
28,0	**PRELIMINARES**				**$ 85.210.350,00**			
28.1	Localización y replanteo topográfico	M2	672,00	$ 7.616,00	$ 5.117.952,00	672	$ 5.117.952,00	100,00%
28.2	excavación manual en material común	M3	6,40	$ 50.462,00	$ 322.957,00	6,4	$ 322.957,00	100,00%
28.3	Relleno con material tipo sub base	M3	134,40	$ 214.508,00	$ 28.829.875,00	134,4	$ 28.829.875,00	100,00%
28.4	Descapote y nivelación manual del terreno	M2	701,40	$ 10.092,00	$ 7.078.529,00	701,4	$ 7.078.529,00	100,00%
28.5	Relleno y compactación en material seleccionado de cantera tamaño máximo 4"	M3	235,20	$ 186.484,00	$ 43.861.037,00	235,2	$ 43.861.037,00	100,00%
29,0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 131.757.224,00**			
29.1	Placa de piso en concreto esp. 0.10m incluye malla electrosoldada de 5mm	M2	672,00	$ 154.586,00	$ 103.881.792,00	672	$ 103.881.792,00	100,00%
29.2	Viga confinamiento de 0,15*0,40 m en concreto de 3.000 PSI	ML	106,00	$ 95.351,00	$ 10.107.206,00	106	$ 10.107.206,00	100,00%
29.3	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG	483,00	$ 13.598,00	$ 6.567.834,00	483	$ 6.567.834,00	100,00%
29.4	Corte y sello para juntas de dilatación	ML	497,00	$ 22.536,00	$ 11.200.392,00	413	$ 9.307.368,00	83,10%
30,0	**ACABADOS Y ESTRUCTURAS METALICAS**				**$ 45.853.568,00**			
30.1	Cancha múltiple metálica con tablero metálico antivandálico	UND	2,00	$9.891.136,00	$ 19.782.272,00	2	$ 19.782.272,00	100,00%
30.2	Demarcación cancha con pintura acrílica a dos manos	ML	382,30	$ 14.337,00	$ 5.481.035,00	382,3	$ 5.481.035,00	100,00%
30.3	Pintura para canchas	M2	633,80	$ 32.487,00	$ 20.590.261,00	633,8	$ 20.590.261,00	100,00%
31	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 31.803.959,00**			
31.1	Cañuela en concreto prefabricado.0.30*0.30 *0.80 m. Incluye rejilla	UND	80,00	$ 335.297,00	$ 26.823.760,00	80	$ 26.823.760,00	100,00%
31.2	Caja de inspección 0.60m*0.60m	UND	2,00	$ 685.744,00	$ 1.371.488,00	2	$ 1.371.488,00	100,00%
31.3	Caja de inspección 1m*1m	UND	1,00	$1.183.580,00	$ 1.183.580,00	1	$ 1.183.580,00	100,00%
31.4	Tubería pvc sanitaria 4"	ML	20,70	$ 71.040,00	$ 1.470.528,00	20,7	$ 1.470.528,00	100,00%
31.5	Tubería pvc sanitaria 6"	ML	9,00	$ 106.067,00	$ 954.603,00	9	$ 954.603,00	100,00%

32	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 49.049.730,00**			
32.1	Excavación manual en material común	M3	2,00	$ 50.462,00	$ 100.924,00	2	$ 100.924,00	100,00%
32.2	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m - 510 kg-f	UND	4,00	$4.422.059,00	$ 17.688.236,00	4	$ 17.688.236,00	100,00%
32.3	Cimentación de poste de concreto	M3	1,50	$1.135.084,00	$ 1.702.626,00	1,5	$ 1.702.626,00	100,00%
32.4	Suministro e instalación de estructura para reflectores en poste	UND	4,00	$1.478.416,00	$ 5.913.664,00	4	$ 5.913.664,00	100,00%
32.5	Suministro e instalación de reflector de 400 w solar fotovoltaico	UND	8,00	$1.771.596,00	$ 14.172.768,00	8	$ 14.172.768,00	100,00%
32.6	Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico de 40 w	UND	8,00	$ 528.767,00	$ 4.230.136,00	8	$ 4.230.136,00	100,00%
32.7	Sistema de puesta a tierra para reflectores	UND	4,00	$1.310.344,00	$ 5.241.376,00	4	$ 5.241.376,00	100,00%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**$ 3.542.000.192,00**		**$2.100.832.758,00**	
	IMPLEMENTAR PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA (PGIO)				$ 35.933.036,60	0,8137	$ 29.238.036,60	81,37%
	TRAMITE DE CERTIFICADO RETILAP				$ 22.000.000,00			
	TOTAL COSTO OBRA CIVIL				**$ 3.599.933.228,60**	**59,17%**	**$2.130.070.794,60**	

VALOR CONTRATADO	**$ 3.599.933.228,60**
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 1.799.966.614,30
VALOR DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL No.1	$ 2.130.070.794,60
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 1.065.035.397,30
VALOR NETO A PAGAR EN PRESENTE ACTA PARCIAL	**$ 1.065.035.397,30**
SALDO POR EJECUTAR	$ 1.469.862.434,00
SALDO POR AMORTIZAR	$ 734.931.217,00
VALOR NETO PENDIENTE POR PAGAR	$ 734.931.217,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

15.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

Para el presente periodo del 15 de julio de 2025 al 15 de noviembre de 2025, el contratista de obra CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC bajo la supervisión de la interventoría realizó las siguientes actividades contractuales.

ESCUELA EL PORVENIR RESGUARDO INDIGENA JULIEROS

I. CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA EL PORVENIR

1 PRELIMINARES

1.1 Localización y replanteo topográfico

El contratista de obra realizó la localización, trazado y replanteo topográfico, del cerramiento perimetral de la escuela EL Porvenir y las graderías, ubicando los puntos de referencia y niveles para su construcción, con el fin de lograr una estructura del cerramiento uniformemente alineada a lo largo de su recorrido y la correcta ubicación de la gradería con respecto a la cancha.

Materiales utilizados: *Puntilla 1+ 1/2 A 3 Pulg., Pintura En Esmalte, Estaca De Madera H=50cm*
Equipos y Maquinaria: Herramienta Menor, Equipo De Topográfica (Estación Y Nivel)
Personal: *Topógrafo, ayudante, cadenero.*

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Con la ayuda de la comisión topográfica se verificó la localización del área total a intervenir del cerramiento y las graderías de la escuela El Porvenir. Asimismo, se logró la verificación de los ejes trazados y de los niveles de ubicación de cada uno de los elementos que conforman la construcción.

ACTIVIDAD:	*LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO*		
ITEM:	*1.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*269.4*	CANTIDAD ACUMULADA:	*269.4*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*269.4*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100%*		



1.2 Excavación manual en material común

El contratista de obra ejecuto la excavación manual en material común, la cual se realizó en la ubicación de los elementos de cimentación, así como zapatas y vigas de cimentación para las diferentes estructuras como lo son el cerramiento perimetral y las graderías, según a la ubicación y dimensiones establecidas en los planos, con la supervisión de la interventoría.

Materiales utilizados: N.A
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor.
Personal: ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control de medidas de largo, ancho y de profundidad de las excavaciones para alcanzar los niveles estipulados en los diseños.

ACTIVIDAD:	*EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN*		
ITEM:	*1.2*	UNIDAD:	*M3*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*74.4*	CANTIDAD ACUMULADA:	*40.62*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*40.62*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*45.4%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*54.60%*		





2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2.1 Concreto de 2500 psi para solado e=5cm

El contratista de obra realizó la aplicación un concreto de limpieza de 2500 psi o solado con una capa de 5 cm para aislar y proteger de cualquier tipo de contaminación las estructuras de la cimentación como las vigas y zapatas, se hizo de acuerdo a la ubicación de los planos y en acompañamiento de la interventoría.

Materiales utilizados: Concreto de 2000 psi
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de niveles en las zonas donde se va aplicar la capa de solado de 2500 psi de espesor de 5 cms, según los diseños y planos del proyecto.

ACTIVIDAD:	*CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM*		
ITEM:	*2.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*110.1*	CANTIDAD ACUMULADA:	*69.86*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*69.86*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*36.55%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*63.45%*		





2.2 Viga De Cimentación De Cerramiento 20x25 Cm, En Concreto De 3.000 p.s.i

El contratista de obra realizó la fundición de las vigas de cimentación en concreto de 3000 psi y medidas de 20x25cm vaciando el concreto de la resistencia especificada observando que no exista segregación y realizando el respectivo vibrado del elemento para eliminar las burbujas de aire, esta actividad que conto con todos los estándares de calidad, teniendo en cuenta la ubicación contemplada en los planos, y con el acompañamiento de la interventoría.

Materiales utilizados: Concreto de 3000 psi
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, formaleta de madera, vibrador de concreto
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de las medidas para la viga de cimentación, tomando medidas en campo para garantizar una sección mínima de 20*25 cm, en concordancia con los diseños aprobados para el proyecto, se verifican niveles y el armado de acero antes de verter el concreto de 3000 psi.

ACTIVIDAD:	*VIGA DE CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO 20X25 CM, EN CONCRETO DE 3.000 PSI*		
ITEM:	*2.2*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*239.6*	CANTIDAD ACUMULADA:	*189.48*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*189.48*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*20.92%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*79.08%*		




2.3 Columneta De 20x20 Cm, En Concreto De 3.000 P.S.I

Se realizo el armado de las formaletas para las columnetas, verificando que estén debidamente alineadas y garantizando las medidas de 20*20 cm, seguidamente el contratista de obra realiza la aplicación del concreto de 3000 psi y el vibrado, la actividad se hizo según las ubicaciones y dimensiones contenidas en los planos, y con el acompañamiento de la interventoría.

Materiales utilizados: Concreto de 3000 psi,
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, formaletas, vibrador de concreto
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de las medidas para las columnetas en concreto, tomando medidas en campo para garantizar una sección mínima de 20*20 cm, se verifican niveles de plomada y alturas, en concordancia con los diseños aprobados para el proyecto, se verifican niveles y el armado de acero antes de verter el concreto de 3000 psi.

ACTIVIDAD:	*COLUMNETA DE 20X20 CM, EN CONCRETO DE 3.000 PSI*		
ITEM:	*2.3*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*108.10*	CANTIDAD ACUMULADA:	*47*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*47*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*56.525%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*43.48%*		




2.4 Acero de refuerzo 60000 psi

El contratista de obra realizo el suministro, figurado y armado del hierro para cada una de las actividades que contemplan su utilización como aquellas estructuras que incluyen el refuerzo en acero de 60000 psi, siguiendo los diseños y despieces aprobados especificados en los planos estructurales, los cuales son verificados previamente por la interventoría.

Materiales utilizados: Acero de refuerzo 60000 psi, alambre negro
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, dobladora, cizalla manual
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación del acero de refuerzo verificando su calidad mediante los certificados de calidad, que tenga la resistencia deseada, tomando medidas en campo para garantizar diámetros, traslapos, ganchos y longitudes, en concordancia con los diseños aprobados para el proyecto.

ACTIVIDAD:	*ACERO DE REFUERZO 60000 PSI*		
ITEM:	*2.4*	UNIDAD:	*KG*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*5964*	CANTIDAD ACUMULADA:	*3582.19*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*3582.19*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*39.94%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*60.06%*		





2.6 Columna De 30x30 Cm, En Concreto De 3.000 P.S.I

Se realizo el armado de las formaletas para las columnas de las porterias, verificando que estén debidamente alineadas y garantizando las medidas de la sección de 30*30 cm, seguidamente el contratista de obra realiza la aplicación del concreto de 3000 psi y el vibrado, la actividad se hizo según las ubicaciones y dimensiones contenidas en los planos, y con el acompañamiento de la interventoría.


Materiales utilizados: Concreto de 3000 psi,
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, formaletas, vibrador de concreto
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de las medidas para las columnas en concreto para la porteria, tomando medidas en campo para garantizar

una sección mínima de 30*30 cm, se verifican niveles de plomada y alturas, en concordancia con los diseños aprobados para el proyecto, se verifican niveles y el armado de acero antes de verter el concreto de 3000 psi.

ACTIVIDAD:	*COLUMNA DE 30X30 CM, EN CONCRETO DE 3.000 PSI*		
ITEM:	*2.6*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*14.8*	CANTIDAD ACUMULADA:	*14.8*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCÍAL No. 01:	*14.8*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100%*		



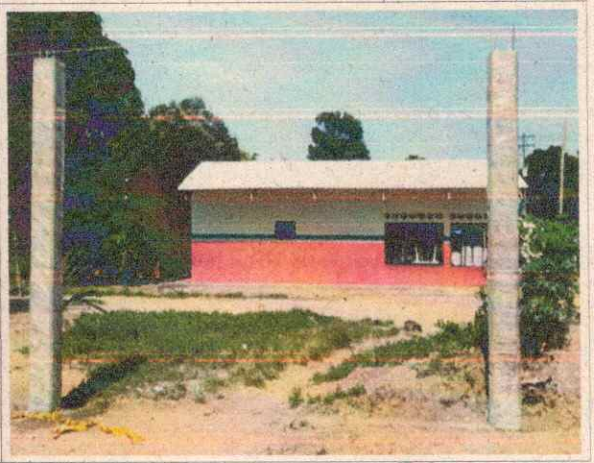

2.7 Zapata en concreto de 3.000 PSI

El contratista de obra fundió las zapatas para la cimentación en concreto de 3000 psi, realizando un buen vibrado eliminando las burbujas de aire, se construyeron en el sitio predeterminado en los planos estructurales y arquitectónicos, esta actividad se realizó bajo la supervisión de la interventoría.

Materiales utilizados: Concreto de 3000 psi,
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de las medidas de las zapatas antes de iniciar a fundir con concreto de 3000 psi, se verifican niveles, y espesores, se revisa el acero de refuerzo y su espaciamiento, según los diseños y planos del proyecto.

ACTIVIDAD:	*ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI*		
ITEM:	*2.7*	UNIDAD:	*M3*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*7.3*	CANTIDAD ACUMULADA:	*6.99*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*6.99*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*4.25%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*95.75%*		





II CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA EL PORVENIR

4 PRELIMINARES

4.1 Localización y replanteo topográfico

El contratista de obra realizó la localización, trazado y replanteo topográfico, de la cancha múltiple de la escuela El Porvenir, ubicando los puntos de referencia y niveles para su construcción, con el fin de lograr una estructura uniforme y garantizar un adecuado bombeo.

Materiales utilizados: *Puntilla 1+ 1/2 A 3 Pulg., Pintura En Esmalte, Estaca De Madera H=50cm*
Equipos y Maquinaria: Herramienta Menor, Equipo De Topografica (Estación Y Nivel)
Personal: *Topógrafo, ayudante, cadenero.*

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Con la ayuda de la comisión topográfica se verificó la localización del área total a intervenir de la cancha múltiple de la escuela El Porvenir. Asimismo, se logró la verificación de los ejes trazados y de los niveles de ubicación de cada uno de los elementos que conforman la construcción.

ACTIVIDAD:	*LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO*		
ITEM:	*4.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*672*	CANTIDAD ACUMULADA:	*672*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*672*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100%*		



4.4 Descapote y nivelación manual del terreno

El contratista de obra realizó el descapote y nivelación del terreno, en el área en la cual se realizará la construcción de la cancha múltiple, verificando que no quede algún tipo de material vegetal y que quede debidamente nivelado.

Materiales utilizados:
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor
Personal: Ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Esta actividad se realizó con la presencia del personal de interventoría verificando la correcta ejecución del descapote del material vegetal y la nivelación del terreno y su preparación para la instalación del material seleccionado de cantera tamaño máximo 4" para la cancha multiple.

ACTIVIDAD:	*DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO*		
ITEM:	*4.4*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*701.4*	CANTIDAD ACUMULADA:	*176*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:	*176*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*74.91%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*25.09%*		





4.5 Relleno Y Compactación En Material Seleccionado De Cantera Tamaño Maximo 4"

Para esta actividad se realizó el suministro, conformación y compactación de la capa de sub base granular en cada una de las áreas definidas en donde se construirá la cancha múltiple, una vez se realiza la instalación y conformación se verifican medidas y niveles, según las especificaciones técnicas.

Materiales utilizados: Sub base granular, agua
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, vibrocompactador tipo rana
Personal: Ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Esta actividad se realizó con la presencia del personal de interventoría en las áreas de suministro, conformación y compactación del material sub base granular el cual tienen como objetivo principal mejorar las condiciones naturales del terreno en donde se construirá la cancha, la interventoría en conjunto con el contratista de obra, verifican cotas y niveles de acuerdo a la topografía de las áreas a intervenir con la finalidad de garantizar la correcta conformación de la sub base granular.

ACTIVIDAD:	*RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE*		
ITEM:	*4.5*	UNIDAD:	*M3*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*235.2*	CANTIDAD ACUMULADA:	*235.2*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*235.2*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100%*		





ESCUELA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA RESGUARDO INDIGENA VELASQUEROS

III CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA GONZALO JIMENEZ

9 PRELIMINARES

9.1 Localización y replanteo topográfico

El contratista de obra realizó la localización, trazado y replanteo topográfico, del cerramiento perimetral de la escuela Gonzalo Jimenez de Quesada y las graderías, ubicando los puntos de referencia y niveles para su construcción, con el fin de lograr una estructura del cerramiento uniformemente alineada a lo largo de su recorrido y la correcta ubicación de la gradería con respecto a la cancha.

Materiales utilizados: *Puntilla 1+ 1/2 A 3 Pulg., Pintura En Esmalte, Estaca De Madera H=50cm*
Equipos y Maquinaria: Herramienta Menor, Equipo De Topografica (Estación Y Nivel)
Personal: *Topógrafo, ayudante, cadenero.*

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Con la ayuda de la comisión topográfica se verificó la localización del área total a intervenir del cerramiento y las graderias de la escuela Gonzalo Jimenez de Quesada. Asimismo, se logró la verificación de los ejes trazados y de los niveles de ubicación de cada uno de los elementos que conforman la construcción.

ACTIVIDAD:	*LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO*		
ITEM:	*9.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*383.7*	CANTIDAD ACUMULADA:	*383.7*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*383.7*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100%*		



9.2 Excavación manual en material común

El contratista de obra ejecuto la excavación manual en material común, la cual se realizó en la ubicación de los elementos de cimentación, así como zapatas y vigas de cimentación para las diferentes estructuras como lo son el cerramiento perimetral y las graderías, según a la ubicación y dimensiones establecidas en los planos, con la supervisión de la interventoría.

Materiales utilizados: N.A
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor.
Personal: ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control de medidas de largo, ancho y de profundidad de las excavaciones para alcanzar los niveles estipulados en los diseños.

ACTIVIDAD:	*EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN*		
ITEM:	*9.2*	UNIDAD:	*M3*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*93.9*	CANTIDAD ACUMULADA:	*44.72*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*44.72*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*52.37%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*47.63%*		




10 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

10.1 Concreto de 2500 psi para solado e=5cm

El contratista de obra realizó la aplicación un concreto de limpieza de 2000 psi o solado con una capa de 5 cm para aislar y proteger de cualquier tipo de contaminación las estructuras de la cimentación como las vigas y zapatas, se hizo de acuerdo a la ubicación de los planos y en acompañamiento de la interventoría.

Materiales utilizados: Concreto de 2000 psi
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de niveles en las zonas donde se va aplicar la capa de solado de 2000 psi de esperor de 5 cms, según los diseños y planos del proyecto.

ACTIVIDAD:	*CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM*		
ITEM:	*10.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*148.1*	CANTIDAD ACUMULADA:	*87.07*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*87.07*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*41.21%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*58.79%*		




10.2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI

El contratista de obra realizó la fundición de las vigas de cimentación en concreto de 3000 psi y medidas de 20x25cm vaciando el concreto de la resistencia especificada observando que no exista segregación y realizando el respectivo vibrado del elemento para eliminar las burbujas de aire, esta actividad que conto con todos los estándares de calidad, teniendo en cuenta la ubicación contemplada en los planos, y con el acompañamiento de la interventoría.

Materiales utilizados: Concreto de 3000 psi
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, formaleta de madera, vibrador de concreto
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de las medidas para la viga de cimentación, tomando medidas en campo para garantizar una sección mínima de 20*25 cm, en concordancia con los diseños aprobados para el proyecto, se verifican niveles y el armado de acero antes de verter el concreto de 3000 psi.

ACTIVIDAD:	*VIGA DE CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO 20X25 CM, EN CONCRETO DE 3.000 PSI*		
ITEM:	*10.2*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*354.6*	CANTIDAD ACUMULADA:	*263.35*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*263.35*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*25.73%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*74.27%*		





10.3 Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI

Se realizo el armado de las formaletas para las columnetas, verificando que estén debidamente alineadas y garantizando las medidas de 20*20 cm, seguidamente el contratista de obra realiza la aplicación del concreto de 3000 psi y el vibrado, la actividad se hizo según las ubicaciones y dimensiones contenidas en los planos, y con el acompañamiento de la interventoría.


Materiales utilizados: Concreto de 3000 psi,
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, formaletas, vibrador de concreto
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de las medidas para las columnetas en concreto, tomando medidas en campo para garantizar una sección

mínima de 20*20 cm, se verifican niveles de plomada y alturas, en concordancia con los diseños aprobados para el proyecto, se verifican niveles y el armado de acero antes de verter el concreto de 3000 psi.

ACTIVIDAD:	*COLUMNETA DE 20X20 CM, EN CONCRETO DE 3.000 PSI*		
ITEM:	*10.3*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*162.2*	CANTIDAD ACUMULADA:	*119.60*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*119.60*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*26.26%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*73.74%*		



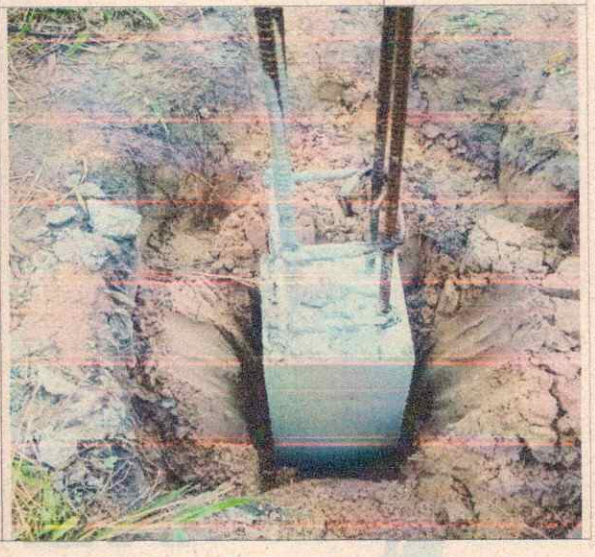

10.4 Acero de refuerzo 60000 psi

El contratista de obra realizo el suministro, figurado y armado del hierro para cada una de las actividades que contemplan su utilización como aquellas estructuras que incluyen el refuerzo en acero de 60000 psi, siguiendo los diseños y despieces aprobados especificados en los planos estructurales, los cuales son verificados previamente por la interventoría.

Materiales utilizados: Acero de refuerzo 60000 psi, alambre negro
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, dobladora, cizalla manual
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación del acero de refuerzo verificando su calidad mediante los certificados de calidad, que tenga la resistencia deseada, tomando medidas en campo para garantizar diámetros, traslapos, ganchos y longitudes, en concordancia con los diseños aprobados para el proyecto.

ACTIVIDAD:	*ACERO DE REFUERZO 60000 PSI*		
ITEM:	*10.4*	UNIDAD:	*KG*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*7623.60*	CANTIDAD ACUMULADA:	*5213.80*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*5213.80*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*31.61%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*68.39%*		




10.6 Columna De 30x30 Cm, En Concreto De 3.000 P.S.I

Se realizo el armado de las formaletas para las columnas de las porterias, verificando que estén debidamente alineadas y garantizando las medidas de la sección de 30*30 cm, seguidamente el contratista de obra realiza la aplicación del concreto de 3000 psi y el vibrado, la actividad se hizo según las ubicaciones y dimensiones contenidas en los planos, y con el acompañamiento de la interventoría.

Materiales utilizados: Concreto de 3000 psi,
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, formaletas, vibrador de concreto
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de las medidas para las columnas en concreto para la porteria, tomando medidas en campo para garantizar una sección mínima de 30*30 cm, se verifican niveles de plomada y alturas, en concordancia con los diseños aprobados para el proyecto, se verifican niveles y el armado de acero antes de verter el concreto de 3000 psi.

ACTIVIDAD:	*COLUMNA DE 30X30 CM, EN CONCRETO DE 3.000 PSI*		
ITEM:	*10.6*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*14.8*	CANTIDAD ACUMULADA:	*14.8*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*14.8*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100%*		




10.7 Zapata en concreto de 3.000 PSI

El contratista de obra fundió las zapatas para la cimentación en concreto de 3000 psi, realizando un buen vibrado eliminando las burbujas de aire, se construyeron en el sitio predeterminado en los planos estructurales y arquitectónicos, esta actividad se realizó bajo la supervisión de la interventoría.

Materiales utilizados: Concreto de 3000 psi,
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, vibrador de concreto
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de las medidas de las zapatas antes de iniciar a fundir con concreto de 3000 psi, se verifican niveles, y espesores, se revisa el acero de refuerzo y su espaciamiento, según los diseños y planos del proyecto.

ACTIVIDAD:	*ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI*		
ITEM:	*10.7*	UNIDAD:	*M3*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*10.4*	CANTIDAD ACUMULADA:	*7.71*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*7.71*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*25.87%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*74.13%*		





11. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

11.1 MURO EN LADRILLO A LA VISTA

Esta actividad contempla la construcción de muro en ladrillo a la vista que hace parte del cerramiento perimetral, el contratista de obra utilizó mortero de 1:4, las brechas tenían un espesor de 2 centímetros, tanto horizontales como verticales. La interventoría verifico la plomada de los muros construidos, siguiendo las indicaciones y medidas indicadas en los planos arquitectónicos, actividad realizada bajo la supervisión de la interventoría.

Materiales utilizados: Ladrillo prensado perforado, mortero 1:4
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, cortadora de ladrillo con disco
Personal: Oficial, ayudantes

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de la ejecución del muro en ladrillo a la vista, tomando medidas en campo para garantizar que se ejecuten los m2 en concordancia con los diseños aprobados para el proyecto, se verifican y espesores de mortero destinado para el pegue de los ladrillos.

ACTIVIDAD:	*MURO EN LADRILLO A LA VISTA*		
ITEM:	*11.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*203.7*	CANTIDAD ACUMULADA:	*37.91*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*37.91*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*81.39%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*18.61%*		





IV CONSTRUIR CANCHA MULTIPLE ESCUELA GONZALO JIMENEZ

12 PRELIMINARES

12.1 Localización y replanteo topográfico

El contratista de obra realizó la localización, trazado y replanteo topográfico, de la cancha múltiple de la escuela Gonzalo Jimenez de Quesada, ubicando los puntos de referencia y niveles para su construcción, con el fin de lograr una estructura uniforme y garantizar un adecuado bombeo.

Materiales utilizados: *Puntilla 1+ 1/2 A 3 Pulg., Pintura En Esmalte, Estaca De Madera H=50cm*
Equipos y Maquinaria: Herramienta Menor, Equipo De Topografica (Estación Y Nivel)
Personal: *Topógrafo, ayudante, cadenero.*

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Con la ayuda de la comisión topográfica se verificó la localización del área total a intervenir de la cancha múltiple de la escuela Gonzalo Jimenez de Quesada. Asimismo, se logró la verificación de los ejes trazados y de los niveles de ubicación de cada uno de los elementos que conforman la construcción.

ACTIVIDAD:	*LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO*		
ITEM:	*12.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*672*	CANTIDAD ACUMULADA:	*672*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*672*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100%*		



12.4 Descapote y nivelación manual del terreno

El contratista de obra realizó el descapote y nivelación del terreno, en el área en la cual se realizará la construcción de la cancha múltiple, verificando que no quede algún tipo de material vegetal y que quede debidamente nivelado.

Materiales utilizados:
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor
Personal: Ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Esta actividad se realizó con la presencia del personal de interventoría verificando la correcta ejecución del descapote del material vegetal y la nivelación del terreno y su preparación para la instalación del material seleccionado de cantera tamaño máximo 4" para la cancha multiple.

ACTIVIDAD:	*DESCAPOTE Y NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO*		
ITEM:	*12.4*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*701.4*	CANTIDAD ACUMULADA:	*701.4*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*701.4*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*100%*		





12.5 Relleno Y Compactación En Material Seleccionado De Cantera Tamaño Maximo 4"

Para esta actividad se realizó el suministro, conformación y compactación de la capa de sub base granular en cada una de las áreas definidas en donde se construirá la cancha múltiple, una vez se realiza la instalación y conformación se verifican medidas y niveles, según las especificaciones técnicas.

Materiales utilizados: Sub base granular, agua
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, vibrocompactador tipo rana
Personal: Ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Esta actividad se realizó con la presencia del personal de interventoría en las áreas de suministro, conformación y compactación del material sub base granular el cual tienen como objetivo principal mejorar las condiciones naturales del terreno en donde se construirá la cancha, la interventoría en conjunto con el contratista de obra, verifican cotas y niveles de acuerdo a la topografía de las áreas a intervenir con la finalidad de garantizar la correcta conformación de la sub base granular.

ACTIVIDAD:	*RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE*		
ITEM:	*12.5*	UNIDAD:	*M3*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*235.2*	CANTIDAD ACUMULADA:	*231.77*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*231.77*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*1.46%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*98.54%*		





ESCUELA CRISTOBAL COLON RESGUARDO INDIGENA GENAREROS

V. CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCUELA CRISTOBAL COLON

17. PRELIMINARES

17.1 Localización y replanteo topográfico

El contratista de obra realizó la localización, trazado y replanteo topográfico, del cerramiento perimetral de la escuela Cristóbal Colón y las graderías, ubicando los puntos de referencia y niveles para su construcción, con el fin de lograr una estructura del cerramiento uniformemente alineada a lo largo de su recorrido y la correcta ubicación de la gradería con respecto a la cancha.

Materiales utilizados: *Puntilla 1+ 1/2 A 3 Pulg., Pintura En Esmalte, Estaca De Madera H=50cm*
Equipos y Maquinaria: Herramienta Menor, Equipo De Topografica (Estación Y Nivel)
Personal: *Topógrafo, ayudante, cadenero.*

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Con la ayuda de la comisión topográfica se verificó la localización del área total a intervenir del cerramiento y las graderias de la escuela Cristóbal Colón. Asimismo, se logró la verificación de los ejes trazados y de los niveles de ubicación de cada uno de los elementos que conforman la construcción.

ACTIVIDAD:		*LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO*	
ITEM:	*17.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*428.8*	CANTIDAD ACUMULADA:	*424.9*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*424.9*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0.91%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*99.09%*		





17.2 Excavación manual en material común

El contratista de obra ejecuto la excavación manual en material común, la cual se realizó en la ubicación de los elementos de cimentación, así como zapatas y vigas de cimentación para las diferentes estructuras como lo son el cerramiento perimetral y las graderías, según a la ubicación y dimensiones establecidas en los planos, con la supervisión de la interventoría.

Materiales utilizados: N.A
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor.
Personal: ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control de medidas de largo, ancho y de profundidad de las excavaciones para alcanzar los niveles estipulados en los diseños.

ACTIVIDAD:		*EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN*	
ITEM:	*17.2*	UNIDAD:	*M3*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*101.6*	CANTIDAD ACUMULADA:	*101.26*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*101.26*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0.33%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*99.67%*		





18. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

18.1 Concreto de 2500 psi para solado e=5cm

El contratista de obra realizó la aplicación un concreto de limpieza de 2500 psi o solado con una capa de 5 cm para aislar y proteger de cualquier tipo de contaminación las estructuras de la cimentación como las vigas y zapatas, se hizo de acuerdo a la ubicación de los planos y en acompañamiento de la interventoría.

Materiales utilizados: Concreto de 2500 psi
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de niveles en las zonas donde se va aplicar la capa de solado de 2500 psi de esperor de 5 cms, según los diseños y planos del proyecto.

ACTIVIDAD:	*CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E=5CM*		
ITEM:	*18.1*	UNIDAD:	*M2*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*163.1*	CANTIDAD ACUMULADA:	*162.04*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*162.04*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*0.33%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*99.67%*		





18.2 Viga de cimentación de cerramiento 20x25 cm, en concreto de 3.000 PSI

El contratista de obra realizó la fundición de las vigas de cimentación en concreto de 3000 psi y medidas de 20x25cm vaciando el concreto de la resistencia especificada observando que no exista segregación y realizando el respectivo vibrado del elemento para eliminar las burbujas de aire, esta actividad que conto con todos los estándares de calidad, teniendo en cuenta la ubicación contemplada en los planos, y con el acompañamiento de la interventoría.

Materiales utilizados: Concreto de 3000 psi
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, formaleta de madera, vibrador de concreto
Personal: Oficial, ayudantes.

Actividades de control y verificación de la Interventoría: Se realiza el control y verificación de las medidas para la viga de cimentación, tomando medidas en campo para garantizar una sección mínima de 20*25 cm, en concordancia con los diseños aprobados para el proyecto, se verifican niveles y el armado de acero antes de verter el concreto de 3000 psi.

ACTIVIDAD:	*VIGA DE CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO 20X25 CM, EN CONCRETO DE 3.000 PSI*		
ITEM:	*18.2*	UNIDAD:	*ML*
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	*400.6*	CANTIDAD ACUMULADA:	*395.5*
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME PARCIAL No. 01:	*395.5*	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	*1.27%*
PORCENTAJE EJECUTADO:	*98.73%*		





18.3 Columneta de 20x20 cm, en concreto de 3.000 PSI

Se realizo el armado de las formaletas para las columnetas, verificando que estén debidamente alineadas y garantizando las medidas de 20*20 cm, seguidamente el contratista de obra realiza la aplicación del concreto de 3000 psi y el vibrado, la actividad se hizo según las ubicaciones y dimensiones contenidas en los planos, y con el acompañamiento de la interventoría.

Materiales utilizados: Concreto de 3000 psi,
Equipos y Maquinaria: Herramienta menor, formaletas, vibrador de concreto
Personal: Oficial, ayudantes.
