CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1085 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO COF, ZÓN DE JESÚS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA PARA PRE-ACTA No. 01

PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATANTE

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E.
GERENTE: CRISTAN DANIEL AREVALO GUERRA
NIT: 846.000.471-5

CONTRATISTA INTERVENTORIA

JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
C.C. 1.085.335.004

SUPERVISOR

MARCELINA CUARAN INAGAN

OCTUBRE DE 2025

1. INTRODUCCION

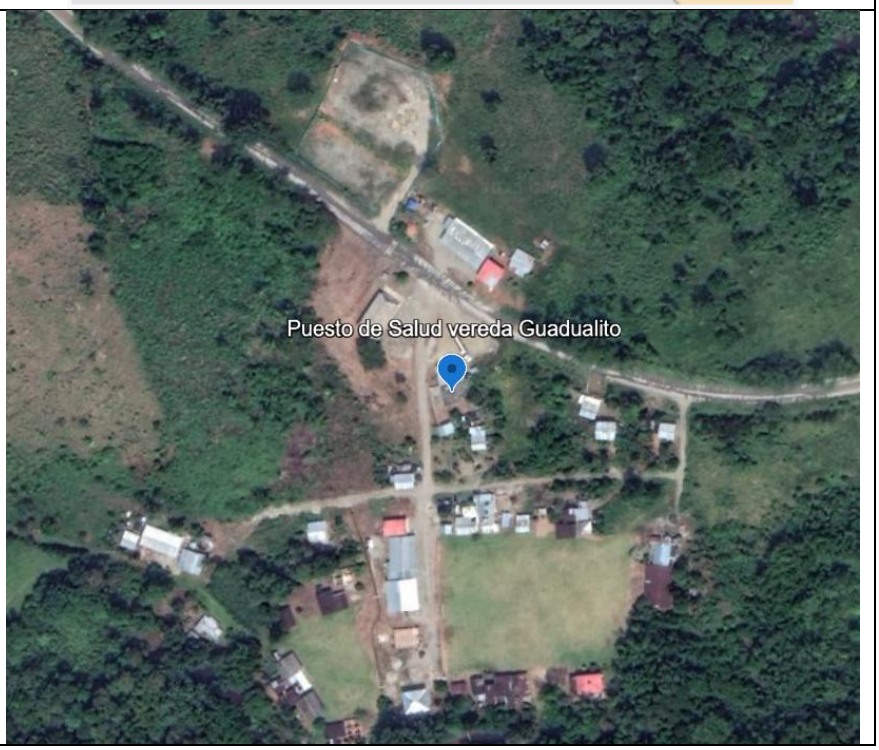
El presente informe de interventoría tiene por objeto suministrar la información necesaria para la empresa social de estado HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, con el fin de informar al ente contratante el desarrollo de las actividades y procesos técnicos y administrativos que se han llevado durante la ejecución del contrato de obra 1066 del 29 de agosto de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

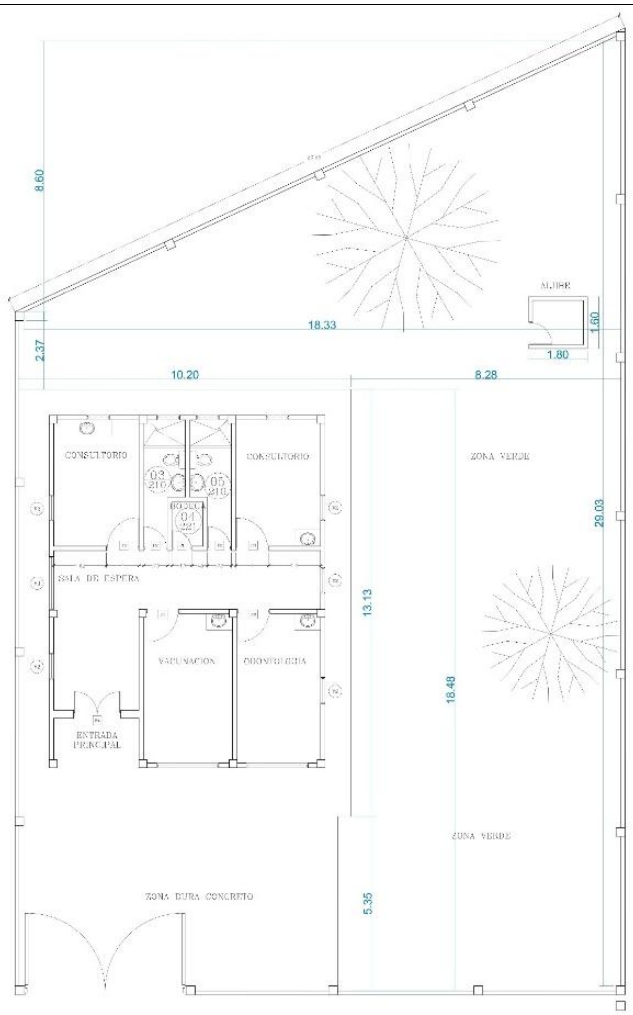
En este informe se describen los detalles de las actividades y cantidades de obra contractuales ejecutadas por la firma contratista de obra INGSERH SAS, correspondiente al periodo entre el día once (11) de septiembre al once (11) de octubre de 2025.

En cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, se presenta el informe técnico, en el cual se indica la información de ejecución acumulada y financiera de cada uno de los ítems ejecutados de acuerdo con el presupuesto de obra dentro del periodo de la pre-acta No 01. Se anexan las respectivas memorias de cálculo con el registro de cantidades de obra ejecutadas y su respectiva pre-acta de avance acumulado de la presente acta parcial, la cual fue conciliada con el contratista de obra y ya está avalada por esta interventoría. Posteriormente, se deja plasmado el estado financiero del contrato de obra, el cual para el periodo en cuestión tiene un avance del 40,37% que corresponde a un valor de $78.416.890,00.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del Municipio de Valle del Guamuez, Putumayo. Su ejecución contempla la adecuación de la infraestructura existente del puesto de salud Guadualito, las cuales serán ejecutadas en la inspección de Guadualito en el Municipio Valle del Guamuez, en el centro poblado donde se encuentra la sede de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS.

LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO	
ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO. INSPECCION DE GUADUALITO	

ESQUEMA DE EJECUCION DEL PROYECTO	

a. Descripción del proyecto.

El proyecto contempla la adecuación de las instalaciones del Puesto de Salud de Guadualito, ubicado en la inspección del mismo nombre, con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud ofrecidos por la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Además, se busca contar de manera permanente con personal auxiliar en el área de la salud perteneciente a la comunidad local.

Las actividades a ejecutar se desarrollan considerando las condiciones técnicas y estructurales identificadas durante la fase de formulación del proyecto.

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 1085 DEL 03 SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS. NIT N°: 846.000.471-5
CONTRATISTA	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO 1.085.335.004 de Pasto
VALOR DEL CONTRATO	$ 10.301.687,00
PLAZO:	TRES (03) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	MARCELINA CUARAN INAGAN

a. Registro y seguimiento de las pólizas del contrato de interventoría.

Anexo 0 de fecha de expedición: 04 de septiembre de 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/09/2025	04/06/2026	$ 1.030.168,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/09/2025	05/12/2028	$ 515.084,35
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2025	05/12/2030	$ 2.060.337,40

Anexo 1 de fecha de expedición: 05 de septiembre de 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/09/2025	04/06/2026	$ 1.030.168,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/09/2025	05/12/2028	$ 515.084,35
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2025	05/12/2030	$ 2.060.337,40

Anexo 3 de fecha de expedición: *12 de septiembre de 2025*

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/09/2025	12/06/2026	$ 1.030.168,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/09/2025	13/12/2028	$ 515.084,35
CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2025	13/12/2030	$ 2.060.337,40

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025	
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS. NIT N°: 846.000.471-5
CONTRATISTA DE OBRA:	INGSERH S.A.S NIT N°: 900.128.087-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL C.C.: 1.126.456.040 de Valle del Guamuez
INTERVENTORÍA:	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO 1.085.335.004 de Pasto
SUPERVISIÓN GENERAL:	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NUMERO DEL CONTRATO:	1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO:	“ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.”
FECHA SUSCRIPCIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO:	TRES (03) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025

a. Registro y seguimiento de las pólizas del contrato de obra.

PÓLIZAS CONDICIONES PRIMIGENIAS				
AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	29-08-2025	29-05-2026	$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	29-08-2025	29-11-2028	$9.713.033,65
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		$38.852.134,60
PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	29-08-2025	29-11-2025	$284.700.000,00

ANEXO. 1 – ACLARATORIA DE BENEFICIAROS				
AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	29-08-2025	29-05-2026	$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	29-08-2025	29-11-2028	$9.713.033,65
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		$38.852.134,60
PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	29-08-2025	29-11-2025	$284.700.000,00

ANEXO. 3 – ACTA DE INICIO				
AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	11-09-2025	11-06-2026	$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	11-09-2025	12-12-2028	$9.713.033,65
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		$38.852.134,60
PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	11-09-2025	12-12-2025	$284.700.000,00

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

De acuerdo con la ejecución del contrato de obra 1066 del 29 de agosto de 2025, se detallan a continuación las actividades hechas del presupuesto de obra contratado para la "ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", durante el periodo del 11 de septiembre al 11 de octubre de 2025. Es de resaltar que todas las actividades ejecutadas se han llevado a cabo bajo el seguimiento y control de la interventoría y el acompañamiento de la supervisión a cargo de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS.

Para el presente informe parcial, se describirán las actividades realizadas:

1	PRELIMINARES
1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA.
1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO
1,04	ROCERIA Y RETIRO DE VEGETACIÓN PERIMETRAL DEL PUESTO DE SALUD
1,05	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS
1,06	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO
1,07	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE.
3	CUBIERTAS Y CIELO RASOS
3,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE TENSOR EN L/2 ENTRE APOYOS, EN VARILLA DE 3/8"
3,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
3,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PAR CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

a. Avance físico de las actividades de obra.

- 1,01 desmonte de aparatos sanitarios.



imagen 1. Desmonte de aparatos sanitarios.

- 1,02 desmonte y retiro de cubierta existente incluye estructura.



imagen 2. Desmonte y retiro de cubierta existente.

- 1,03 demolición de piso esmaltado, cerámica, baldosa cemento o mortero nivelación. incluye retiro.



imagen 3. Demolición de piso cerámico.

- 1,04 rocería y retiro de vegetación perimetral del puesto de salud.



imagen 4. Limpieza de Material vegetal.

- 1,05 demolición de enchape de muros.



imagen 5. Demolición y retiro de enchape de muros.

- 1,06 demolición de mesones en concreto, incluye retiro.



imagen 6. Demolición de mesones en concreto.

- 1,07 desmonte y retiro de tanque existente.



imagen 7. Tanque existente en malas condiciones.

- 3,01 estructura para cubierta en perfil ref: (pag_c 120x60_ 1,9 mm) calibre 14, pintado con anticorrosivo o wash primer. incluye tensor en l/2 entre apoyos, en varilla de 3/8".

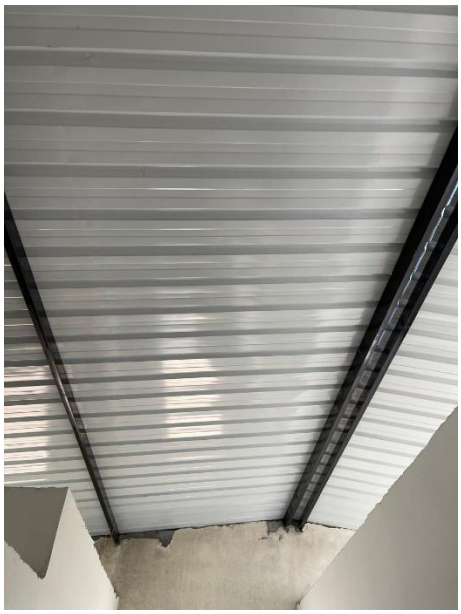


imagen 8. Instalación de estructura metálica para cubierta.

- 3,02 suministro y colocación de cubierta en lámina master 1000 calibre 28 prepintada, incluye accesorios y elementos de fijación.



imagen 9. instalación de cubierta metálica.

- 3,03 caballete en lámina metálica pintada, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.



imagen 10. instalación de Caballete metálico.

6. INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

De acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista de obra, se presenta a continuación el estado financiero de los valores programados y porcentajes ejecutados según la pre-acta de avance mensual No. 01, además se indican el saldo y el porcentaje pendientes por ejecutar.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 194.26.673,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 78.416.890,00
% EJECUTADO PRESENTE ACTA	40.37%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 115.843.783,00
% PENDIENTE POR EJECUTAR	59.63%

a. Relación Pre-actas avance de obra

DETALLE	PERIODO DE EJECUCION		VALOR EJECUTADO
	DESDE	HASTA	
PRE-ACTA DE AVANCE No. 01	11/09/2025	11/101/2025	$ 78.416.890,00

7. EJECUCION SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

El contratista a la fecha a la fecha ha ejecutado un porcentaje del 40,37%, teniendo en cuenta el cronograma de obra presentado en la oferta donde se pretendía ejecutar un 37,54%. Por lo tanto, es posible evidenciar que se superó en 2,83% a lo programado, lo que genera un panorama favorable en el proceso de ejecución de actividades que permitan cumplir con el objeto contractual.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomienda que durante el proceso de ejecución se continue teniendo materiales a disposición para ejecución de actividades, que permita continuar con la correcta ejecución de actividades.
- Se recomienda realizar verificación de la instalación de la cubierta, teniendo en cuenta que en la zona se han presentado altos niveles pluviométricos, esto con el interés de revisar que no se generen filtraciones en la cubierta y la instalación se haya realizado de manera correcta.



JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
CONTRATISTA INTERVENTORIA
CC 1.085.335.004

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

DESGLOSE DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

1. COSTO DIRECTO DE INTERVENTORIA					ACTA DE AVANCE No_1		EJECUTADO ACUMULADO	
PERSONAL	**DEDICACIÓN**	**TIEMPO DEDICADO**	**SALARIO + PRESTACIONES**	**COSTO TOTAL**	Cant	Costo Total	Cant	Costo Total
Residente de Obra	60%	3,00	1.623.000,00	2.921.400,00	1	$ 973.800,00	1,00	$ 973.800,00
			SUBTOTAL COSTOS DE PESONAL	**2.921.400,00**	**$**	**973.800,00**	**$**	**973.800,00**
			FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL	1,80		1,80		1,80
			TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**5.258.520,00**	**$**	**1.752.840,00**	**$**	**1.752.840,00**
2. OTROS COSTOS								
DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**COSTO TOTAL**				
TRANSPORTE	MES	3,00	400.000,00	1.200.000,00	1	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00
INFORMES/REGISTRO FOTOGRAFICO/VIDEOS/ PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN GENERAL/PLOTEADO DE PLANOS Y COPIAS	MES	3,00	306.983,00	920.949,00	1	$ 306.983,00	1,00	$ 306.983,00
			SUBTOTAL	**2.120.949,00**	**$**	**706.983,00**	**$**	**706.983,00**
			SUBTOTAL OTROS COSTOS	2.120.949,00	$	706.983,00	$	706.983,00
			FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL	**1,00**	**1**		**1**	
			TOTAL OTROS COSTOS	2.120.949,00	$	706.983,00	$	706.983,00
3. GASTOS DE PUBLICACION EN GACETA Y POLIZAS								
DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**COSTO TOTAL**				
POLIZAS	UND	1,00	92.715,00	92.715,00	1	$ 92.715,00	1,00	$ 92.715,00
IMPUESTOS	UND	1,00	1.184.692,00	1.184.692,00	1	$ 1.184.692,00	1,00	$ 1.184.692,00
			SUBTOTAL OTROS COSTOS	1.277.407,00	**$**	**1.277.407,00**	$	1.277.407,00
			TOTAL GASTOS PUBLICACION EN GACETA Y POLIZAS	1.277.407,00	$	1.277.407,00	$	1.277.407,00
			TOTAL SIN IVA	**8.656.876,00**	**$**	**3.737.230,00**	**$**	**3.737.230,00**
			IVA 19%	$ 1.644.806,00	$	710.074,00	$	710.073,70
			TOTAL CON IVA	**10.301.687,00**	**$**	**4.447.304,00**	**$**	**4.447.303,70**
			PORCENTAJE DE AVANCE		43,17%		43,17%	

ELABORA	REVISA	APRUEBA
JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO	**DIEGO ALEXANDER ORTEGA**	**MARCELINA CUARAN INAGAN**
1.085.335.004	APOYO A LA SUPERVISIÓN	SUPERVISOR DESIGNADO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**	**HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
No. Identificación: CC1085335004
Dirección: BARRIO CENTRAL
Telefono: 3103598799
Correo: centraldeservi@gmail.com
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ
Número de Planilla: 8391219843

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1085335004	**Periodo de Cotización Salud**	septiembre de 2025
Número de planilla	8391219843	**Periodo de Cotización Pensión**	septiembre de 2025
Fecha pago	2025-11-06	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	93742539	**Total Pagado**	300200
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	6400

PAGADA
8391219843

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	23700	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	155200	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	121300	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1085335004
APELLIDOS Y NOMBRES: JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
ESSC18	230201	949000	949000	949000	0	118700	0	151900	0	23200	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
No. Identificación: CC1085335004
Dirección: BARRIO CENTRAL
Telefono: 3103598799
Correo: centraldeservi@gmail.com
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ
Número de Planilla: 8391219863

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Tipo y número de identificación	CC1085335004
Número de planilla	8391219863
Fecha pago	2025-11-06
Número de autorización pago	93437029
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2025
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	441000
Total Intereses de Mora	500

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	34800	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	228000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	178200	1

8391219863

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1085335004
APELLIDOS Y NOMBRES: JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
ESSC18	230201	1423500	1423500	1423500	0	178000	0	227800	0	34700	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
