CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1085 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA PARA PRE-ACTA No. 03

PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E.
GERENTE: CRISTAN DANIEL AREVALO GUERRA
NIT: 846.000.471-5

CONTRATISTA INTERVENTORIA

JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
C.C. 1.085.335.004

SUPERVISOR

MARCELINA CUARAN INAGAN

DICIEMBRE DE 2025

1. INTRODUCCION

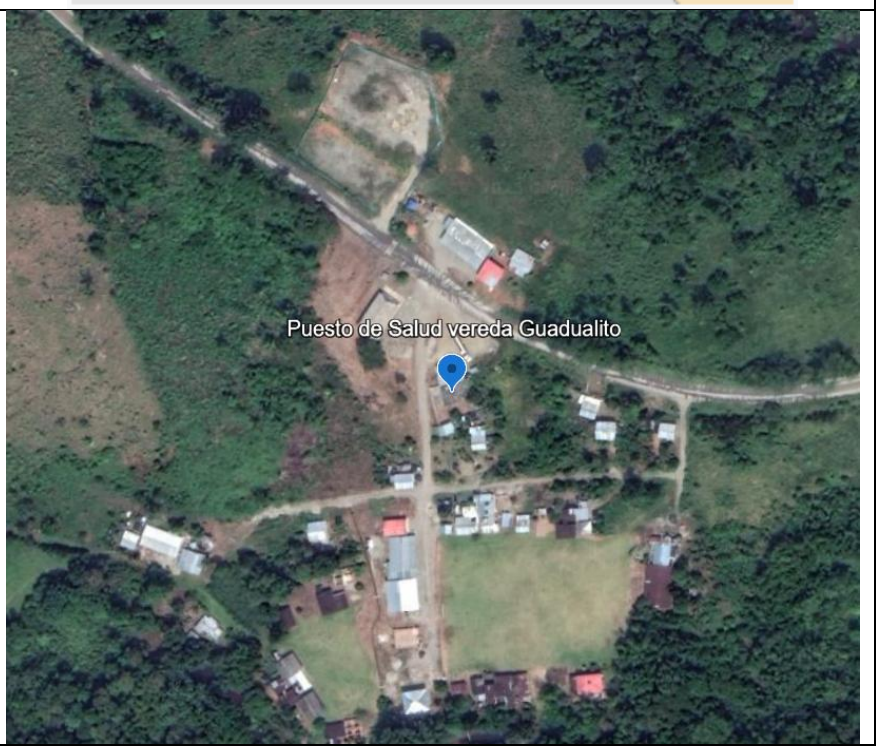
El presente informe de interventoría tiene por objeto suministrar la información necesaria para la empresa social de estado HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, con el fin de informar al ente contratante el desarrollo de las actividades y procesos técnicos y administrativos que se han llevado durante la ejecución del contrato de obra 1066 del 29 de agosto de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

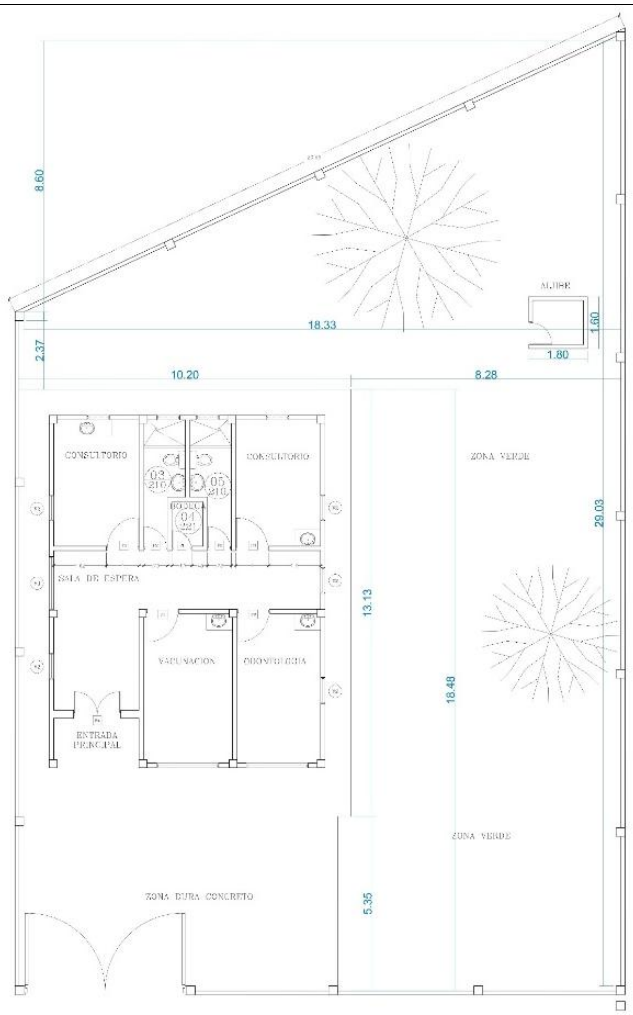
En este informe se describen los detalles de las actividades y cantidades de obra contractuales ejecutadas por la firma contratista de obra INGSERH SAS, correspondiente al periodo entre el día once (11) de noviembre al diez (10) de diciembre de 2025.

En cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, se presenta el informe técnico, en el cual se indica la información de ejecución acumulada y financiera de cada uno de los ítems ejecutados de acuerdo con el presupuesto de obra dentro del periodo de la pre-acta No 03. Se anexan las respectivas memorias de cálculo con el registro de cantidades de obra ejecutadas y su respectiva pre-acta de avance acumulado de la presente acta parcial, la cual fue conciliada con el contratista de obra y ya está avalada por esta interventoría. Posteriormente, se deja plasmado el estado financiero del contrato de obra, el cual para el periodo en cuestión tiene un avance del 31,24% que corresponde a un valor de $60.689.653,00.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del Municipio de Valle del Guamuez, Putumayo. Su ejecución contempla la adecuación de la infraestructura existente del puesto de salud Guadualito, las cuales serán ejecutadas en la inspección de Guadualito en el Municipio Valle del Guamuez, en el centro poblado donde se encuentra la sede de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS.

LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO	
ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO. INSPECCION DE GUADUALITO	

ESQUEMA DE EJECUCION DEL PROYECTO	

a. Descripción del proyecto.

El proyecto contempla la adecuación de las instalaciones del Puesto de Salud de Guadualito, ubicado en la inspección del mismo nombre, con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud ofrecidos por la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Además, se busca contar de manera permanente con personal auxiliar en el área de la salud perteneciente a la comunidad local.

Las actividades a ejecutar se desarrollan considerando las condiciones técnicas y estructurales identificadas durante la fase de formulación del proyecto.

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 1085 DEL 03 SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS. NIT N°: 846.000.471-5
CONTRATISTA	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO 1.085.335.004 de Pasto
VALOR DEL CONTRATO	$ 10.301.687,00
PLAZO:	TRES (03) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	MARCELINA CUARAN INAGAN

a. Registro y seguimiento de las pólizas del contrato de interventoría.

Anexo 0 de fecha de expedición: *04 de septiembre de 2025*

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/09/2025	04/06/2026	$ 1.030.168,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/09/2025	05/12/2028	$ 515.084,35
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2025	05/12/2030	$ 2.060.337,40

Anexo 1 de fecha de expedición: *05 de septiembre de 2025*

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/09/2025	04/06/2026	$ 1.030.168,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/09/2025	05/12/2028	$ 515.084,35
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2025	05/12/2030	$ 2.060.337,40

Anexo 3 de fecha de expedición: *12 de septiembre de 2025*

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/09/2025	12/06/2026	$ 1.030.168,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/09/2025	13/12/2028	$ 515.084,35
CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2025	13/12/2030	$ 2.060.337,40

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025	
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS. NIT N°: 846.000.471-5
CONTRATISTA DE OBRA:	INGSERH S.A.S NIT N°: 900.128.087-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL C.C.: 1.126.456.040 de Valle del Guamuez
INTERVENTORÍA:	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO 1.085.335.004 de Pasto
SUPERVISIÓN GENERAL:	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NUMERO DEL CONTRATO:	1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO:	“ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.”
FECHA SUSCRIPCIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO:	TRES (03) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025

a. Registro y seguimiento de las pólizas del contrato de obra.

PÓLIZAS CONDICIONES PRIMIGENIAS				
AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	29-08-2025	29-05-2026	$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	29-08-2025	29-11-2028	$9.713.033,65
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		$38.852.134,60
PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	29-08-2025	29-11-2025	$284.700.000,00

ANEXO. 1 – ACLARATORIA DE BENEFICIAROS				
AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	29-08-2025	29-05-2026	$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	29-08-2025	29-11-2028	$9.713.033,65
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		$38.852.134,60
PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	29-08-2025	29-11-2025	$284.700.000,00

ANEXO. 3 – ACTA DE INICIO				
AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	11-09-2025	11-06-2026	$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	11-09-2025	12-12-2028	$9.713.033,65
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		$38.852.134,60
PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	11-09-2025	12-12-2025	$284.700.000,00

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

De acuerdo con la ejecución del contrato de obra 1066 del 29 de agosto de 2025, se detallan a continuación las actividades hechas del presupuesto de obra contratado para la "ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", durante el periodo del 11 de septiembre al 10 de diciembre de 2025. Es de resaltar que todas las actividades ejecutadas se han llevado a cabo bajo el seguimiento y control de la interventoría y el acompañamiento de la supervisión a cargo de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS.

Para el presente informe parcial, se describirán las actividades realizadas:

2	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS
2,02	HIDROFUGADO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA
3	CUBIERTAS Y CIELO RASOS
3,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE RINCONERAS, ANGULOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.
6	INSTALACIONES ELECTRICAS
6,01	CONEXIÓN ACOMETIDA PARCIAL DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE TRIFASICO ENCAUCHETADO NO 8, CABLE NO 8, TENSORES PARA CABLE, TUBO EMT 3/4", CAPASETE 3/4".
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BIFASICA, CON PIN DE CORTE 2X63 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE 2,40M.
6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR.
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMACORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.
6,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL.
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.

7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO DE 1000LTS, INCLUYE FLUIDMASTER, TAPA, Y ACCESORIOS PVC PARA LA CORRECTA CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS PREFABRICADO.
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE.
8	LIMPIEZA.
8,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
N.P.1	NO PREVISTOS INSTALACIONES ELECTRICAS
N.P.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMACORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)
N.P.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE ESPECIAL PARA ELECTROBOMBA 1/2 Hp 110 V
N.P.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMACORRIENTE DOBLES DE 110 V TIPO GFCI (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS



imagen 1. Instalación de cielo raso.



imagen 2. Aplicación de estuco y pintura.



imagen 3. instalación de canal recolector de aguas lluvias.



imagen 4. instalación de medidor de consumo de energía.

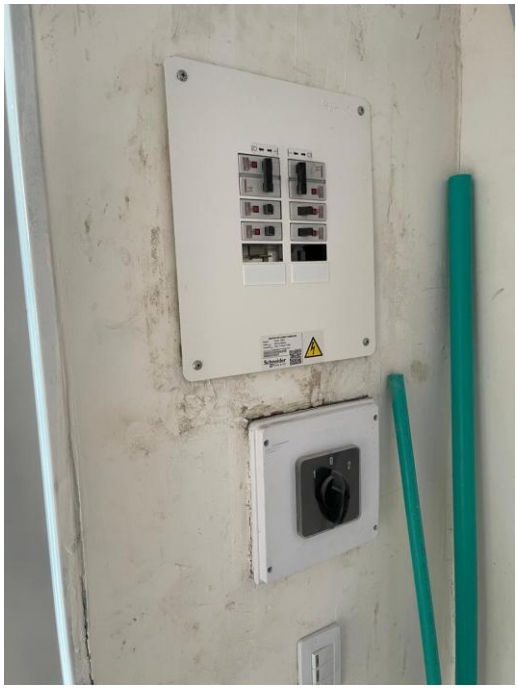


imagen 5. instalación de tablero de control y transferencia manual.



imagen 6. instalación de lámparas luminarias tipo LED.



imagen 7.Instalación de lonchera de conexión a red de distribución.



imagen 8. Punto de tomacorriente de 220V.



imagen 9.Punto de conexión para generador eléctrico externo.



imagen 10.Instalación de mesones en RH.



imagen 11. instalación de tanque para distribución de agua.



imagen 12. instalación de tele ducha y ducha tipo regadera.



imagen 13. instalación de tomacorrientes de 110V y tomacorrientes 110V GFCI.

6. INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

De acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista de obra, se presenta a continuación el estado financiero de los valores programados y porcentajes ejecutados según la pre-acta de avance mensual No. 03, además se indican el saldo y el porcentaje pendientes por ejecutar.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 194.260.673,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 60.689.653,00
% EJECUTADO PRESENTE ACTA	31,24%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 00,00
% PENDIENTE POR EJECUTAR	0.0%

a. Relación Pre-actas avance de obra

DETALLE	PERIODO DE EJECUCION		VALOR EJECUTADO
	DESDE	HASTA	
PRE-ACTA DE AVANCE No. 01	11/09/2025	11/10/2025	$ 78.416.890,00
PRE-ACTA DE AVANCE No. 02	12/10/2025	11//11/2025	$ 55.154.129,00
PRE-ACTA DE AVANCE No. 03	12/11/2025	10/12/2025	$ 60.689.653,00

7. EJECUCION SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

El contratista a la fecha a la fecha ha ejecutado un porcentaje del 100%. Por lo tanto, es posible evidenciar que se cumplió lo programado, lo que genera un el cumplimiento del 100% del objeto contractual.

8. CONCLUSIONES.

- El contrato cuyo objeto fue la Adecuación menor de la infraestructura física del Puesto de Salud Guadualito de la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el municipio de Valle del Guamuez, departamento del Putumayo, fue ejecutado en su totalidad, conforme a las actividades contempladas en el alcance contractual.
- Las obras realizadas permitieron mejorar las condiciones físicas, funcionales y de seguridad del Puesto de Salud Guadualito, contribuyendo al fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud a la comunidad del área de influencia.
- Las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, evidenciándose una adecuada calidad en los materiales empleados y en los procesos constructivos desarrollados.
- Durante la ejecución contractual se dio cumplimiento a los plazos establecidos, sin que se presentaran retrasos significativos que afectaran el desarrollo normal del contrato.
- La ejecución del contrato se realizó conforme a la normatividad vigente aplicable en materia de contratación pública, seguridad y salud en el trabajo y condiciones mínimas de infraestructura para servicios de salud.
- El contratista atendió de manera oportuna las observaciones formuladas por la supervisión/interventoría, permitiendo la correcta culminación de las actividades programadas.
- Una vez finalizadas las obras, el Puesto de Salud Guadualito se encuentra en condiciones óptimas de uso, cumpliendo con el objetivo de mejorar la infraestructura física sin alterar la operación misional de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS.



_____

JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
CONTRATISTA INTERVENTORIA
C.C. 1.085.335.004

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

DESGLOSE DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

1. COSTO DIRECTO DE INTERVENTORIA					ACTA DE AVANCE No_1		ACTA DE AVANCE No_2		ACTA DE AVANCE No_3		EJECUTADO ACUMULADO	
PERSONAL	**DEDICACIÓN**	**TIEMPO DEDICADO**	**SALARIO + PRESTACIONES**	**COSTO TOTAL**	Cant	Costo Total	Cant	Costo Total	Cant	Costo Total	Cant	Costo Total
Residente de Obra	60%	3,00	1.623.000,00	2.921.400,00	1	$ 973.800,00	1,00	$ 973.800,00	1,00	$ 973.800,00	3,00	$ 2.921.400,00
			SUBTOTAL COSTOS DE PESONAL	**2.921.400,00**	**$**	**973.800,00**	**$**	**973.800,00**	**$**	**973.800,00**	**$**	**2.921.400,00**
			FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL	1,80		1,80		1,80		1,80		1,80
			TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**5.258.520,00**	**$**	**1.752.840,00**	**$**	**1.752.840,00**	**$**	**1.752.840,00**	**$**	**5.258.520,00**
2. OTROS COSTOS												
DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**COSTO TOTAL**								
TRANSPORTE	MES	3,00	400.000,00	1.200.000,00	1	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	3,00	$ 1.200.000,00
INFORMES/REGISTRO FOTOGRAFICO/VIDEOS/ PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN GENERAL/PLOTEADO DE PLANOS Y COPIAS	MES	3,00	306.983,00	920.949,00	1	$ 306.983,00	1,00	$ 306.983,00	1,00	$ 306.983,00	3,00	$ 920.949,00
			SUBTOTAL	**2.120.949,00**	**$**	**706.983,00**	**$**	**706.983,00**	**$**	**706.983,00**	**$**	**2.120.949,00**
			SUBTOTAL OTROS COSTOS	2.120.949,00	$	706.983,00	$	706.983,00	$	706.983,00	$	2.120.949,00
			FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL	**1,00**	**1**		**1**		**1**		**1**	
			TOTAL OTROS COSTOS	2.120.949,00	$	706.983,00	$	706.983,00	$	706.983,00	$	2.120.949,00
3. GASTOS DE PUBLICACION EN GACETA Y POLIZAS												
DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**COSTO TOTAL**								
POLIZAS	UND	1,00	92.715,00	92.715,00	1	$ 92.715,00		$ -		$ -	1,00	$ 92.715,00
IMPUESTOS	UND	1,00	1.184.692,00	1.184.692,00	1	$ 1.184.692,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.184.692,00
			SUBTOTAL OTROS COSTOS	1.277.407,00	**$**	**1.277.407,00**	$ -		$ -		$	1.277.407,00
			TOTAL GASTOS PUBLICACION EN GACETA Y POLIZAS	1.277.407,00	$	1.277.407,00	$ -		$ -		$	1.277.407,00
			TOTAL SIN IVA	**8.656.876,00**	**$**	**3.737.230,00**	**$**	**2.459.823,00**	**$**	**2.459.823,00**	**$**	**8.656.876,00**
			IVA 19%	$ 1.644.806,00	$	710.074,00	$	467.366,00	$	467.366,00	$	1.644.806,00
			TOTAL CON IVA	**10.301.687,00**	**$**	**4.447.304,00**	**$**	**2.927.189,00**	**$**	**2.927.189,00**	**$**	**10.301.687,00**
PORCENTAJE DE AVANCE					43,17%		28,41%		28,41%		100,00%	

ELABORA	**REVISA**	**APRUEBA**
JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO	**DIEGO ALEXANDER ORTEGA**	**MARCELINA CUARAN INAGAN**
1.085.335.004	APOYO A LA SUPERVISIÓN	SUPERVISOR DESIGNADO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**	**HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
No. Identificación: CC1085335004
Dirección: BARRIO CENTRAL
Telefono: 3103598799
Correo: centraldeservi@gmail.com
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ
Número de Planilla: 8392428638

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1085335004	**Periodo de Cotización Salud**	noviembre de 2025
Número de planilla	8392428638	**Periodo de Cotización Pensión**	noviembre de 2025
Fecha pago	2025-12-17	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	93058724	**Total Pagado**	444800
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	4300

PAGADA
8392428638

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	35100	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	230000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	179700	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1085335004
APELLIDOS Y NOMBRES: JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
ESSC18	230201	1423500	1423500	1423500	0	178000	0	227800	0	34700	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
No. Identificación: CC1085335004
Dirección: BARRIO CENTRAL
Telefono: 3103598799
Correo: centraldeservi@gmail.com
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ
Número de Planilla: 8392428714

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1085335004	**Periodo de Cotización Salud**	diciembre de 2025
Número de planilla	8392428714	**Periodo de Cotización Pensión**	diciembre de 2025
Fecha pago	2025-12-17	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	93704958	**Total Pagado**	147000
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8392428714

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	11600	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	76000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	59400	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1085335004
APELLIDOS Y NOMBRES: JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
ESSC18	230201	474500	474500	474500	0	59400	0	76000	0	11600	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
