INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA NO. 1

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA D.C

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.1680613

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

CONTRATO DE OBRA NO. CO1. PCCNTR. 1577780

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

OCTUBRE DE 2020

Elaboró	Revisó
Ing. Marcela Contreras Residente de Interventoría Fecha de entrega: Octubre de 2020	Arq. Santiago Páez Coordinador de Interventoría Fecha de Entrega: Octubre de 2020

Octubre de 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.1680613

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA D.C

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.1680613
CONTRATISTA INTERVENTORIA:
VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT. 900-416-314-9

CONTRATO DE OBRA No CO1. PCCNTR. 1577780
CONTRATISTA DE OBRA:
DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA
NIT: 900.320.206-8

BOGOTA D.C

OCTUBRE DE 2020

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTENIDO	Informe Mensual de Interventoría No.1 Contrato de Interventoría no. CO1.PCCNTR.1680613

PERIODO	**INICIO**	**FIN**
	2 de septiembre	1 de octubre

FECHA ELABORACION	Octubre De 2020	Versión 1

ELABORADO POR	CARGO	NOMBRE	FIRMA
	Residente de Interventoría	Ing. Marcela Contreras	

APROBADO POR	CARGO	NOMBRE	FIRMA
	Coordinador de Interventoría	Arq. Santiago Páez	

Vo.Bo	CARGO	NOMBRE	FIRMA
	Director de Interventoría	Ing. Luis Campaña	

Vo.Bo	CARGO	NOMBRE	FIRMA
	Apoyo a la Supervisión de contrato	Arq. Hugo Tibaquira	

CONTENIDO

Contenido

CONTENIDO 4
TABLAS....5
ANEXOS 6
ILUSTRACIONES....7
INTRODUCCION....8
1. CONTROL ADMINISTRATIVO....9
1.1. CONTRATO INTERVENTORÍA....9
1.2. POLIZAS DE INTERVENTORIA.... 10
1.3. CONTRATO DE OBRA 10
1.4. POLIZAS DE OBRA 11
1.5. ACTAS DE REUNION 11
1.6. CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA. 12
1.7. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 12
1.8. RELACION DE CORRESPONDENCIA 13
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR. 1577780.... 15
3. CONTROL TECNICO 21
DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES.... 21
4. GENERALIDADES DEL PLAN DE CALIDAD.... 23
OBJETIVO....24
4.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.... 24
4.2. RECURSOS.... 24
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 27
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 34
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.... 34

TABLAS

- **TABLA 1.** CONTRATO DE INTERVENTORIA
- **TABLA 2.** PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
- **TABLA 3.** CONTRATO DE OBRA
- **TABLA 4.** PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA
- **TABLA 5**. ACTAS DE REUNIÓN
- **TABLA 6.** PERSONAL DEL CONTRATISTA
- **TABLA 7.** PERSONAL DE INTERVENTORÍA
- **TABLA 8**. CORRESPONDENCIA ENVIADA
- **TABLA 9.** CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- **TABLA 10.** CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ANEXOS

Anexo 1 ACTAS DE COMITÉ

Anexo 2 INFORMES SEMANALES

Anexo 3 BITÁCORAS DE CAMPO

- **a)** I.E.D. CAMILO TORRES
- **b)** I.E.D. POLICARPA SALAVARRIETA
- **c)** I.E.D. ANTONIA SANTOS SEDE A
- **d)** I.E.D. ANTONIA SANTOS SEDE B
- **e)** I.E.D. ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO

ILUSTRACIONES

- **Ilustración 1** I.E.D. Externado Nacional Camilo Torres Sede A Kr 7 # 33-64 Localidad Santa Fe
- **Ilustración 2** I.E.D. Colegio Policarpa Salavarrieta sede B República de Argentina Calle 20 # 4-68 Localidad Santa Fe.
- **Ilustración 3** I.E.D. Colegio Liceo Nacional Antonia Santos sede A Kr 22 # 12-49 Localidad Mártires.
- **Ilustración 4** I.E.D. Colegio Liceo Nacional Antonia Santos sede B Calle 12 # 21-14 Localidad Mártires.
- **Ilustración 5** I.E.D. Colegio Escuela Nacional del Comercio sede B Kr 3 Este # 9-77 Localidad Candelaria.

INTRODUCCION

El presente documento corresponde al INFORME MENSUAL NO.1 DE INTERVENTORIA elaborado por la interventoría VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

La firma VALLEJO H CONSULTORES CONSTRUCTORES realiza la interventoría al contrato de Obra No. CO1. PCCNTR. 1577780 de 2020 celebrado entre Bogotá Distrito Capital- Secretaria de Educación Distrital y el contratista DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA con domicilio en la ciudad de Bogotá CARRERA 15A N° 121-12 Of 501

El presente Informe mensual de interventoría, correspondiente al Periodo del 2 de septiembre de 2020 al 1 de octubre de 2020. Es presentado en cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato de Interventoría NO. CO1.PCCNTR.1680613 del 21 de julio de 2020 suscrito entre VALLEJO H INGENIEROS y la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED).

1. CONTROL ADMINISTRATIVO

En este capítulo se encuentra toda la documentación y compromisos posteriores al inicio del contrato, tanto para la interventoría como para el contrato de consultoría.

1.1. CONTRATO INTERVENTORÍA

El contrato de interventoría NO. CO1.PCCNTR.1680613 del 21 de julio de 2020 se celebró entre la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL y el contratista CO1.PCCNTR. 1577780 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO" por un valor de CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS $ 160.578.600. INCLUIDO IVA, y un tiempo de plazo inicial de seis (6) meses

1 CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CONTRATISTA:	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS
NIT.	900.416.314-9
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIÁN ANDRES VALLEJO PACHON
CONTACTO:	DIRECCIÓN. Diag. 59 No. 24 - 20 Barrio San Luis - Bogotá TEL. (1) 7587901
VALOR DE:	$ 160.578.600
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN:	1 DE MARZO DE 2021

Tabla 1. Contrato de interventoría

En el siguiente cuadro se relacionan los amparos correspondientes a las pólizas presentadas por la firma interventora y actualizadas según la fecha de acta de inicio del contrato de interventoría.

1.2. POLIZAS DE INTERVENTORIA

CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	2/09/2020	5/07/2021	$ 32.115.720,00
Pago Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2/09/2020	6/03/2024	$ 16.057.860,00
Calidad del servicio	10/12/2020	7/03/2023	$ 32.115.720,00

Tabla 2. Póliza Contrato de interventoría

1.3. CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra No CO1. PCCNTR. 1577780 de 2020 celebrado entre Bogotá Distrito Capital-Secretaria de Educación Distrital y el contratista DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO" por un valor MIL DIECINUEVE MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS $ 1.019.003.283,00 INCLUIDO IVA y un tiempo total del plazo de nueve (5) meses.

En el siguiente cuadro se relacionan los amparos correspondientes a las pólizas presentadas por la firma constructora y actualizadas según la fecha de acta de inicio del contrato de consultoría.

CONTRATISTA:	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA
NIT.	900.320.206-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA MARCELA ROJAS PRIETO
CONTACTO:	CARRERA 15A N° 121-12 Of 501 TEL. (1) 3106560 - 3186559263
VALOR DE:	$ 1.019.003.283,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN:	1 DE FEBRERO DE 2021

Tabla 3. Contrato de Obra

1.4. POLIZAS DE OBRA

CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	2/09/2020	1/02/2024	$ 203,800.656.60
Prestaciones Sociales	2/09/2020	1/02/2024	$ 101,900,328.30
Estabilidad de la Obra	1/02/2021	1/02/2023	$ 203,800,656.60

Tabla 4. Pólizas Contrato de Obra

1.5. ACTAS DE REUNION

A continuación, se relacionan las actas de reunión al contrato de interventoría que se realizaron durante el periodo del presente informe, con la participación de las partes involucradas, en dichas reuniones se trataron temas de programación, avance, información al comité veedor del avance de las actividades ejecutadas a la fecha, problemas técnicos, entre otros.

ACTA DE REUNIÓN	ASUNTO	FECHA
3	Seguimiento Aprobación Preliminar	11/09/2020
4	Seguimiento de Obra y Preliminares	15/09/2020
5	Inspección del muro	17/09/2020
6	Inspección del talúd	17/09/2020
7	Seguimiento de Obra	18/09/2020
8	Seguimiento de Obra	23/09/2020

Tabla 5. Actas de reunión

Se anexan actas de reunión suscritas en el mes de septiembre Anexo 1 ACTAS DE COMITE.

Se anexan los Informes Semanales del mes de septiembre en el Anexo 2 INFORMES SEMANALES

Se anexan las bitácoras del mes de septiembre en el Anexo 3 BITÁCORAS DE CAMPO.

1.6. CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA.

A continuación, se relaciona el personal profesional con el que cuenta el contratista para ejecutar las actividades correspondientes al cumplimiento del objeto del contrato el cual fue aprobado y avalado por esta Interventoría.

CARGO	NOMBRE
Director de Obra	Arq. Adriana Marcela Rojas Prieto
Residente de Obra	Ing. Willmen Peñaloza Rico
Residente de Obra	Ing. Diego Andrés Romero Villamizar
Asesor Estructural	Ing. Jonathan José Cala Monroy
Asesor Electricista	Ing. Héctor Mauricio Alarcón Segura
Asesor en Redes Hidorsanitarias	Ing. Rodrigo Villegas Angarita
Asesor SST	Ing. Ray Alexander Hernández Becerra
Profesional de Costos y Presupuestos	Ing. Camilo Albeiro Torres Peña
Especialista Ambiental	Ing. Melissa Alejandra Pulido Gutiérrez
Patólogo Estructural	Ing. Carlos Manuel Olarte Martínez
Especialista en Geotecnia	Ing. Orlando Rivera Mora
Residente de Obra	Ing. Juan Pablo Arellano Barón

Tabla 6. Personal del Contratista

1.7. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

A continuación, se relaciona el personal profesional con el que cuenta la interventoría para ejecutar las actividades correspondientes al cumplimiento del objeto del contrato el cual fue aprobado y avalado por la supervisión SED.

CARGO	NOMBRE
Director de Interventoría	Ing. Luis Oswaldo Campaña Diaz
Coordinador de Interventoría	Arq. Santiago Alexander Páez Bejarano
Residente de Interventoría	Ing. Claudia Marcela Contreras Montañez
Especialista Estructural y en Geotecnia	Ing. José Mauricio Moreno Silva
Especialista en Redes Eléctricas	Ing. German Gabriel Suárez Soler
Especialista en Redes Hidráulicas	Ing. Humberto Pérez Ramírez
Especialista en Presupuestos	Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
Especialista Ambiental y SST	Ing. Danny Juliana Quiñoñez Nieto
Patólogo Estructural	Ing. Wilber Yezid Jimenez Bejarano
Abogado	José Jaime Roys
Inspectora	Adriana Marcela Losada Merchán
Inspectora	Valeria Katherin Carreño Jiménez
Inspectora	Leidy Daniela Barrantes Villabon

Tabla 7. Personal de Interventoría

1.8. RELACION DE CORRESPONDENCIA

Se relaciona a continuación la correspondencia enviada tanto al Contratista, como a la SED, de igual manera la correspondencia recibida del Contratista y la Entidad, durante el periodo correspondiente al presente informe.

a) CORRESPONDENCIA ENVIADA EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-015	Remisión de los APU´s para ´ítems No Previstos	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
1-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-016	Remisión del Acta de Inicio de Interventoría	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
2-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-017	Remisión del Acta de Inicio de Obra	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
1-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-018	Remisión del Acta de Inicio de Obra	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
4-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-019	Solicitud de Ingreso a las Instituciones Educativas	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
8-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-020	Solicitud de Ingreso de personal mano de obra a las Instituciones Educativas	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
9-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-021	Actualización de Pólizas contra acta de inicio	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
10-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-022	Actualización de Pólizas contra acta de inicio	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
11-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-023	Envío de documentación para apertura de PIN ante la SDA	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
16-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-024	Inconformidad Ingreso de personal	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
12-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-025	Personal Interventoría	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
16-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-026	Solicitud de Ingreso nuevo personal mano de obra a las Instituciones Educativas	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
19-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-027	Solicitud de Ingreso Personal y Vehículos del Contratista	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
19-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-028	Solicitud de Ingreso nuevo personal mano de obra a las Instituciones Educativas	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
21-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-029	Aprobación Plan de Manejo Ambiental	VALLEJO H INGENIEROS	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA
21-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-030	Remisión de planos para cuarto de Refrigerios Antonia Santos Sede A	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
21-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-031	Modificación de cuenta Bancaria Contratista	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
23-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-032	Respuesta a Comunicado DOBLER-35-027-2020	VALLEJO H INGENIEROS	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA
24-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-033	Entrega Informe Semanal No. 3	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
25-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-034	Respuesta a comunicado DOBLER-035-030-2020 entrega de documentos ambientales	VALLEJO H INGENIEROS	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA
30-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-035	Entrega Informe Semanal No. 4	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.
30-sep-20	SED-CM-A-DCCEE-149-2019-036	Remisión Pólizas actualizadas del contratista Doble R	VALLEJO H INGENIEROS	S.E.D.

Tabla 8. Correspondencia Enviada

b) CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
2-sep-20	DOBLER-35-015-2020	Entrega Plan Manejo Ambiental V.1 y Plan de Gestión Integral RCD	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
2-sep-20	DOBLER-36-016-2020	Respuesta correcciones documentos iniciales	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
4-sep-20	DOBLER-36-017-2020	Solicitud de ingreso permanente a las instalaciones educativas	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
8-sep-20	DOBLER-36-018-2020	Ingreso de Personal a las instituciones educativas	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
8-sep-20	DOBLER-35-019-2020	Programación	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
11-sep-20	DOBLER-35-020-220	Entrega documentos apertura PIN	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
16-sep-20	DOBLER-35-022-2020	Ingreso de Personal a las instituciones educativas	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
16-sep-20	DOBLER-35-023-2020	Ingreso de Personal a las instituciones educativas	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
18-sep-20	DOBLER-35-024-2020	Modificación cuenta bancaria	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
18-sep-20	DOBLER-35-025-2020	Ingreso de Personal a las instituciones educativas	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
21-sep-20	DOBLER-35-026-2020	Entrega PMA V2	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
22-sep-20	DOBLER-35-027-2020	Entrega Resolución Ambiental Gestor RCD	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
24-sep-20	DOBLER-35-029-2020	Entrega documentos ambientales Cantera	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
24-sep-20	DOBLER-35-030-2020	Entrega documentos ambientales centro de aprovechamiento	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS
28-sep-20	DOBLER-35-032-2020	Entrega Pólizas Actualizadas	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA	VALLEJO H INGENIEROS

Tabla 9. Correspondencia Recibida

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR. 1577780

Ilustración 1. I.E.D. Externado Nacional Camilo Torres Sede A
Kr 7 # 33-64 Localidad Santa Fe



Entrada a las baterías sanitarias











En la *I.E.D. Externado Nacional Camilo Torres* se han realizado labores de cerramiento del lugar a intervenir, desmonte de sanitarios y orinales, demolición de muros divisorios, demolición de enchape y pañetes, desmonte de muro en drywall, desmonte de paneles metálicos divisorios de orinales, demolición de placa existente, demolición de mediacaña en granito lavado, retiro de red hidráulica y sanitaria existente, demolición de mesones de lavamanos existente, demolición de poceta para aseo, excavación para retiro de red sanitaria en gres y para nivelación de terreno. Se realiza excavación para caja de inspección de la nueva red sanitaria.

Ilustración 2. I.E.D. Policarpa Salavarrieta Sede B
Calle 20 # 4-68 Santa Fe.



Interior de las baterías sanitarias



Interior de las baterías sanitarias









En la *I.E.D. Policarpa Salavarrieta* se han venido realizando actividades de cerramiento en el lugar de trabajo, desmonte de sanitarios y orinales, desmonte de puertas y ventanas, demolición de muros divisorios, demolición de enchape y pañetes, retiro de tubería hidráulica y sanitaria existente, excavación para nivelación de piso, retiro de escombros, se realiza excavación para cajas de inspección nuevas.

Ilustración 3. I.E.D. Liceo Nacional Antonia Santos Sede A
Kr 22 # 12-49 Mártires.



Exterior del cuarto para adaptar a shut de basuras

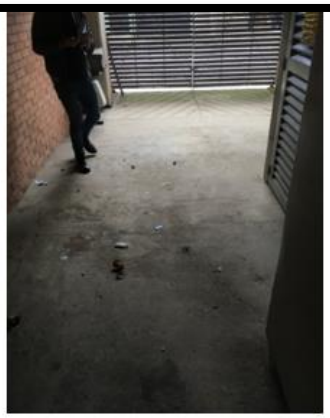

Pasillo de acceso al shut de basuras









En la *I.E.D. Liceo Nacional Antonia Santos Sede A* se realizaron actividades de cerramiento de obra, regata para instalación de tubería de desagüe, fundición de placa para nivelación de terreno, escarificación de pañetes, instalación de enchape y emboquillado.

Ilustración 4. I.E.D. Liceo Nacional Antonia Santos Sede B
Calle 12 # 21-14 Mártires



Tienda Escolar



Área para adecuación del cuarto de almacenamiento de refrigerios







En la *I.E.D. Liceo Nacional Antonia Santos Sede B* se han realizado actividades de cerramiento, retiro de adoquín ecológico, instalación de recebo común y compactación del mismo, figurado de acero para vigas de cimentación, instalación de tubería sanitaria para desagüe y tubería hidráulica.

Ilustración 5. I.E.D. Escuela Nacional de Comercio Sede B
Kr 3 Este # 9-77 La Candelaria



Sanitarios para mantenimiento



Lavados para mantenimiento



En la *I.E.D. Escuela Nacional de Comercio Sede B* se realiza la instalación del campamento para poder iniciar con las actividades programadas.

3. CONTROL TECNICO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES

- Mediante oficio SED-CM-A-DCCEE-149-2019-016 el día 1 de septiembre la interventoría remite a la Entidad SED el Acta de inicio.

- El día 2 de septiembre mediante oficio DOBLER-36-16-2020 envía respuesta de las correcciones hechas por la interventoría a los documentos iniciales entregados.

- Por medio de correo electrónico, el día 2 de septiembre la interventoría envía al contratista el acta de inicio de obra, para que sea completada con la información correspondiente y debidamente firmada por el representante legal.

- El contratista el día 2 de septiembre envía a la interventoría mediante correo electrónico, el acta de inicia debidamente firmada.

- El día 3 de septiembre la Entidad SED envía por correo electrónico a la Interventoría, el acta de inicio del contratista solicitando realizar algunas correcciones.

- La interventoría remite el día 3 de septiembre al contratista, el acta de inicio mediante correo electrónico solicitando realizar las correcciones requeridas por la Entidad SED.

- El día 3 de septiembre el contratista envía a la interventoría el acta de inicio con las correcciones solicitadas por la SED.

- Mediante oficio SED-CM-A-DCCEE-149-2019-017 el día 3 de septiembre la interventoría remite a la Entidad SED el Acta de inicio de obra corregida.

- El contratista mediante oficio DOBLER-36-17-2020 el día 4 de septiembre, realiza solicitud de ingreso de personal profesional a las instituciones educativas durante el desarrollo del contrato.

- Mediante oficio SED-CM-A-DCCEE-149-2019-018 el día 4 de septiembre la interventoría remite a la Entidad SED la solicitud de permiso para ingreso de personal profesional tanto de la interventoría como del contratista a las instituciones educativas.

- El día 8 de septiembre la Entidad SED remite por correo electrónico a la interventoría, el acta de inicio firmada por el supervisor para actualización de pólizas del contrato de interventoría.

- El contratista envía mediante correo electrónico a la interventoría el día 8 de septiembre, el acta corregida y firmada.

- Mediante oficio DOBLER-36-18-2020 enviado el día 8 de septiembre a la interventoría, el contratista solicita permiso de ingreso a las instituciones educativas del personal mano de obra.

- Mediante oficio SED-CM-A-DCCEE-149-2019-020 el día 8 de septiembre la interventoría remite a la Entidad SED la solicitud de permiso para ingreso de personal mano de obra a las instituciones educativas.

- El día 9 de septiembre se da inicio a las actividades en obra en dos Institución Educativas, incluyendo la señalización e instalación de protocolos de bioseguridad, y su respectiva valla informativa.

- Las actividades que se inician el día 9 de septiembre en los frentes de trabajo, son labores de demolición de muros y enchapes en las bateri9as sanitarias.

- El día 10 de septiembre la interventoría radica mediante oficio SED-CM-A-DCCEE-149-2019-022 ante la Entidad SED, las pólizas actualizadas contra acta de inicio del contrato de interventoría.

-El contratista el día 11 de septiembre mediante oficio DOBLER-35-020-2020 envía a la interventoría los documentos para apertura del PIN.

- El día 11 de septiembre la interventoría mediante oficio SED-CM-A-DCCEE-149-2019-023 remite a la entidad, después de revisados, los documentos enviados por el contratista para apertura del PIN.

- El día 12 de septiembre la interventoría radica ante la Entidad SED mediante oficio SED-CM-A-DCCEE-149-2019-025 el listado del personal profesional de interventoría.

- El contratista envía mediante correo electrónico a la interventoría, los planos correspondientes al cuarto de refrigerios a realizarse en el Colegio Antonia Santos Sede B el día 15 de septiembre.

- El día 17 de septiembre se realiza visita a Las Instituciones Los Pinos y Nacional de Comercio con los Profesionales de la Entidad SED Ing. Ángela Pinzón (Topografía), Ing. Carlos Granados (Estructural), Ing. Freddy Quiroga (Geotecnista) y el profesional de la Interventoría Ing. Wilber Jiménez (Patólogo Estructural), para emitir un concepto más preciso acerca de los muros afectados en estas dos instituciones.

- El contratista mediante oficio DOBLER-35-026-2020 envía a la interventoría el día 21 de septiembre el Plan de Manejo Ambiental V.2, según las correcciones solicitadas por la interventoría.

- La interventoría mediante oficio SED-CM-A-DCCEE-149-2019-029 del día 21 de septiembre, aprueba el Plan de Manejo Ambiental del contratista.

- El día 22 de septiembre el contratista envía actas de vecindad a la interventoría para revisión.

- El contratista el día 22 de septiembre entrega mediante oficio DOBLER-35-027-2020 a la interventoría, la Resolución Ambiental Gestor RCD.

- El día 23 de septiembre mediante oficio SED-CM-A-DCCEE-149-2019-032 la interventoría aprueba proveedor para disposición RCD.

- La interventoría mediante correo electrónico solicita a la Entidad SED el día 23 de septiembre, los formatos para facturación.

- Mediante oficio DOBLER-35-029-2020 el contratista envía a la Interventoría los Documentos ambientales para aprobación de Cantera el día 24 de septiembre.

- La entidad SED el día 25 de septiembre mediante correo electrónico, envía los formatos correspondientes para facturación y el listado de los documentos que se necesitan.

- El día 28 de septiembre el contratista mediante oficio DOBLER-35-032-2020 envía a la interventoría las pólizas actualizadas contra acta de inicio de obra.

- El día 29 de septiembre el contratista envía mediante correo electrónico, el acta preliminar de obra para revisión por parte de la interventoría.

- El día 30 de septiembre la interventoría devuelve el acta de preliminar al contratista y le recuerda que debe ajustarla al formato entregado por la SED.

- El día 30 de septiembre mediante oficio SED-CM-A-DCCEE-149-2019-036 la interventoría hace entrega a la Entidad SED de las pólizas actualizadas del contratista.

- El día 30 de septiembre la interventoría devuelve al contratista las actas de vecindad, y le recuerda al contratista que la interventoría no es quien debe firmar las actas, sino la persona encargada de cada institución, ya que es la persona encargada de recibir las instalaciones como las entregó.

4. GENERALIDADES DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.1680613 de 2020, el cual tiene por objeto**: Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la**

adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.

Fue elaborado de acuerdo al **Pliego de condiciones del SED,** el contrato correspondiente y los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de VALLEJO H CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.

OBJETIVO

Establecer el enfoque, la metodología y responsabilidades frente a cada una de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato en mención, cumpliendo con los requisitos legales y contractuales estipulados en el mismo, así como logrando la satisfacción de nuestro cliente.

4.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La constitución política de Colombia establece que la educación es una función social y prioritaria del estado, la cual debe ser prestada de manera permanente, regular, continua y eficiente bajo los estándares mínimos de calidad, por tanto, en un derecho de toda la población distribuida en el Distrito debe ser garantizado. De acuerdo con las necesidades de cobertura de población en edad escolar por demanda de cupos del sistema educativo oficial, objeto en el cual se enmarca el desarrollo y cumplimiento de metas del proyecto de inversión 1046 “infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje del plan sectorial de educación”

4.2. RECURSOS

- **PERSONAS**

El personal que participa en el proyecto y que posee responsabilidad directa con la calidad se encuentra precalificado antes de su inicio, mediante la selección de personal competente con base en la educación, formación y experiencia apropiada para cumplir los requisitos exigidos por el contratante. La selección se efectúa hasta donde sea aplicable, de acuerdo al “Procedimiento de RECURSOS HUMANOS PRRH- 01” establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad de VALLEJO H. CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S**.** perteneciente a VALLEJO H. CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. Posteriormente se realiza la evaluación de su competencia a través del seguimiento periódico de su desempeño en el cargo.

ORGANIGRAMA DE LA INTERVENTORIA

CARGO	NOMBRE	% DEDICACIÓN
Director de Interventoría	Ing. Luis Oswaldo Campaña Diaz	50%
Residente de Interventoría	Ing. Claudia Marcela Contreras Montañez	100%
Especialista Estructural	Ing. José Mauricio Moreno Silva	5%
Especialista en Redes Eléctricas	Ing. German Gabriel Suárez Soler	5%
Especialista en Redes Hidráulicas	Ing. Humberto Pérez Ramírez	5%
Especialista en Geotecnia	Ing. José Mauricio Moreno Silva	5%
Especialista SST	Ing. Danny Juliana Quiñoñez Nieto	5%
Especialista en Presupuestos	Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos	5%
Especialista Ambiental	Ing. Danny Juliana Quiñoñez Nieto	5%
Patólogo Estructural	Ing. Wilber Yezid Jimenez Bejarano	5%
Abogado	José Jaime Roys	5%
Inspectora	Adriana Marcela Losada Merchán	100%
Inspectora	Leidy Daniela Barrantes Villabon	100%

Mediante oficio SED-CM-A-DCCEE-149-2020-011 la interventoría remite a la Entidad SED, la hoja de vida correspondiente para el cambio de inspectora de Francy Johanna Gutiérrez González por Adriana Marcela Losada Merchán.

- ✓ **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Funciones

- Ejercer la representación de la Interventoría ante el contratante
- Velar por el cumplimiento del objeto del Contrato en mención.
- Velar por el cumplimiento de las metas de los objetivos del proyecto.
- Establecer el sistema de aseguramiento de calidad del Contrato y velar por su cumplimiento.
- Revisar y verificar el plan de calidad del proyecto y velar por el cumplimiento del mismo.
- Hacer seguimiento respectivo al plan de calidad.
- Verificar y aprobar la bitácora de obra.
- Velar por la adecuada y oportuna facturación y cobro de las obras, servicios y suministros del Contrato.
- Asistir y coordinar las reuniones de control de avance.
- Revisar y firmar las actas de las reuniones, informes y demás documentos del proyecto.
- Trabajar con las versiones vigentes de los documentos suministrados por el contratante.

Responsabilidades

El Director de Interventoría es responsable por el cumplimiento del contrato, Gestión de los recursos financieros, humanos, físicos y equipos asignados, coordinación con los proveedores de servicios, oportuna facturación del contrato y gestión del Sistema de Calidad.

El Director de Interventoría es responsable de la entrega de los productos de Interventoría como son los informes y demás resultados solicitados por el cliente, en los tiempos establecidos contractualmente y con la calidad requerida por el IDRD. Lo anterior incluye el cumplimiento de compromisos definidos en comités, visitas y reuniones del contrato y la solución de quejas, reclamos y solicitudes de las partes interesadas.

Autoridad

Tiene autoridad sobre el personal asignado, solución de problemas técnicos de acuerdo a su competencia y para definir y modificar el programa de trabajo y la asignación de los Recursos necesarios.

- ✓ **INGENIEROS RESIDENTES, ESPECIALISTAS Y PERSONAL DE CAMPO**

Funciones

- Ejercer la representación del interventor en el campo
- Revisión de los documentos que se generen aplicables al proyecto.
- Velar por el cumplimiento de las Condiciones Técnicas de los Términos del Contrato de actas de reunión y comités.
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones con el contratista con relación al personal y su dotación, por los equipos de obra y su estado, por la calidad de los materiales, por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas del contratante, por la seguridad industrial, por el manejo ambiental de los proyectos, de acuerdo por lo establecido por la IDRD.
- Recibir y responsabilizarse por el equipo y elementos de trabajo que se le entreguen para el cumplimiento de sus funciones.
- Responder por el adecuado manejo de la caja menor que le entregue la dirección.
- Asistir a las reuniones de control de avance de las obras con el contratante y el contratista.
- Velar por el cumplimiento del programa de trabajo del Contrato.
- Preparar las comunicaciones relacionadas con instrucciones de obra, tanto en forma de memorandos de campo y de oficios firmados por la dirección del Contrato
- Coordinar la iniciación, continuación, terminación y entrega de las obras en el campo.
- Asumir todas las demás responsabilidades afines a sus funciones, que le asigne la dirección.
- Mantener permanente relación con el contratista para preparar con la debida anticipación las obras a realizar, facilitar la consecución de la información necesaria, velar por la debida coordinación de las respectivas entregas y obras a ejecutar, estudiar las soluciones a los problemas e imprevistos que se presenten en las obras.
- Coordinar y participar en las reuniones de control de avance de las obras con el contratante y el contratista.
- Realizar los informes requeridos según especificaciones del contratante.

Responsabilidades

Cumplimiento de los programas de trabajo acordados en los comités de obra, gestión de los recursos humanos, físicos y equipos, análisis y solución de problemas técnicos y gestión de la información técnica del contrato.

El Residente de Interventoría es responsable de la entrega de los productos de Interventoría como son los informes y demás resultados solicitados por el cliente, en los tiempos establecidos contractualmente y con la calidad requerida por el IDRD. Lo anterior incluye el cumplimiento de compromisos definidos en comités, visitas y reuniones del contrato y la solución de quejas, reclamos y solicitudes de las partes interesadas.

Autoridad

El Residente tiene autoridad sobre el personal asignado, solución de problemas técnicos de acuerdo a su competencia y la realización de cambios en la programación de actividades de interventoría por situaciones imprevistas o de Urgencia.

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El cumplimiento de la entrega de productos y servicios, será medido de acuerdo al cronograma propuesto por el contratista y controlado por la interventoría.

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAEST	**vie 28/08/20**	**mié 27/01/21**	**153 días**
IED CAMILO TORRES	**mar 1/09/20**	**sáb 28/11/20**	**88 días**
INICIO IED CAMILO TORRES	**mar 1/09/20**	**mar 1/09/20**	**0 días**
PRELIMINARES	**mié 2/09/20**	**dom 27/09/20**	**26 días**
OBRAS PRELIMINARES	**mié 2/09/20**	**dom 27/09/20**	**26 días**
CAMPAMENTO	mié 2/09/20	mar 8/09/20	7 días
CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,14 M. TIPO ACESCO Ó SIMILAR	mié 9/09/20	mié 9/09/20	1 día
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	jue 10/09/20	jue 10/09/20	1 día
VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (2.00 X 1.00)	vie 11/09/20	vie 11/09/20	1 día
DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	sáb 12/09/20	dom 13/09/20	2 días
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	lun 14/09/20	mar 15/09/20	2 días
DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	mié 16/09/20	mié 16/09/20	1 día
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	jue 17/09/20	jue 17/09/20	1 día
DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	vie 18/09/20	vie 18/09/20	1 día
DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	sáb 19/09/20	sáb 19/09/20	1 día
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	dom 20/09/20	dom 20/09/20	1 día
DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	lun 21/09/20	mié 23/09/20	3 días
DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	jue 24/09/20	dom 27/09/20	4 días
DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	mié 2/09/20	mié 2/09/20	1 día
DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	jue 3/09/20	jue 3/09/20	1 día
DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	vie 4/09/20	vie 4/09/20	1 día
ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	sáb 5/09/20	sáb 5/09/20	1 día
DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	dom 6/09/20	dom 6/09/20	1 día
DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EN LÁMINA H=2.	lun 7/09/20	lun 7/09/20	1 día
DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	mar 8/09/20	mar 8/09/20	1 día
SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE S	mié 9/09/20	mié 9/09/20	1 día
DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	jue 10/09/20	jue 10/09/20	1 día
DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SO	vie 11/09/20	vie 11/09/20	1 día

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
VARIOS - PRELIMINARES	**jue 10/09/20**	**sáb 19/09/20**	**10 días**
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPO	vie 18/09/20	sáb 19/09/20	2 días
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIA	jue 10/09/20	jue 10/09/20	1 día
TRASIEGO HORIZONTAL y VERTICAL EN CARRETILLA DIS	mar 15/09/20	jue 17/09/20	3 días
DEMOLICION MEDIA CAÑA Y CENEFA EN GRANITO	sáb 12/09/20	sáb 12/09/20	1 día
DESMONTE Y REINTALACION DE CONCERTINA	dom 13/09/20	lun 14/09/20	2 días
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	**lun 28/09/20**	**mié 14/10/20**	**17 días**
DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS	**lun 28/09/20**	**mar 13/10/20**	**16 días**
ACCESORIO PVC-S Ø 2"	lun 28/09/20	lun 28/09/20	1 día
ACCESORIO PVC-S Ø 4"	mar 29/09/20	vie 2/10/20	4 días
MAMPOSTERIA	**lun 28/09/20**	**dom 4/10/20**	**7 días**
MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO	**lun 28/09/20**	**sáb 3/10/20**	**6 días**
MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	lun 28/09/20	sáb 3/10/20	6 días
INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	**lun 28/09/20**	**jue 1/10/20**	**4 días**
SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	**lun 28/09/20**	**mar 29/09/20**	**2 días**
SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALE	lun 28/09/20	lun 28/09/20	1 día
SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	mar 29/09/20	mar 29/09/20	1 día
ACOMETIDAS Y CONDUCTORES	**mié 30/09/20**	**jue 1/10/20**	**2 días**
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	mié 30/09/20	mié 30/09/20	1 día
CABLEADO 3#10	jue 1/10/20	jue 1/10/20	1 día
PISOS	**lun 28/09/20**	**jue 8/10/20**	**11 días**
BASES PISOS Y AFINADOS	**lun 28/09/20**	**mar 29/09/20**	**2 días**
AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	lun 28/09/20	mar 29/09/20	2 días
ACABADOS PISOS	**mié 30/09/20**	**jue 1/10/20**	**2 días**
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCL	mié 30/09/20	jue 1/10/20	2 días
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	**lun 28/09/20**	**vie 6/11/20**	**40 días**
CUBIERTAS	**lun 28/09/20**	**vie 30/10/20**	**33 días**
RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASB	lun 28/09/20	mar 29/09/20	2 días
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALIC/	mié 30/09/20	jue 1/10/20	2 días
RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASB	lun 28/09/20	mar 29/09/20	2 días
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALIC/	mié 30/09/20	jue 1/10/20	2 días
CIELOS RASOS Y DIVISIONES	**lun 28/09/20**	**jue 8/10/20**	**11 días**
DIVISIONES	**lun 28/09/20**	**jue 8/10/20**	**11 días**
DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	lun 28/09/20	jue 8/10/20	11 días
GENÉRICOS Y OTROS	**lun 28/09/20**	**vie 2/10/20**	**5 días**
HERRAMIENTAS	**lun 28/09/20**	**lun 28/09/20**	**1 día**
ANDAMIO TUBULAR	lun 28/09/20	lun 28/09/20	1 día
RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	**lun 28/09/20**	**vie 2/10/20**	**5 días**
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE CONCRETOS A LA VI	lun 28/09/20	vie 2/10/20	5 días

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
IED POLICARPA SALAVARRIETA	**mar 1/09/20**	**sáb 5/12/20**	**95 días**
INICIO IED POLICARPA SALAVARRIETA	**mar 1/09/20**	**mar 1/09/20**	**0 días**
PRELIMINARES	**mié 2/09/20**	**jue 22/10/20**	**51 días**
OBRAS PRELIMINARES	**mié 2/09/20**	**jue 10/09/20**	**9 días**
CAMPAMENTO	mié 2/09/20	mar 8/09/20	7 días
CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	mié 9/09/20	mié 9/09/20	1 día
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	jue 10/09/20	jue 10/09/20	1 día
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	**vie 11/09/20**	**jue 15/10/20**	**35 días**
DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	vie 11/09/20	lun 14/09/20	4 días
DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	mar 15/09/20	sáb 19/09/20	5 días
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	dom 20/09/20	mar 22/09/20	3 días
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	mié 23/09/20	jue 24/09/20	2 días
DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	vie 25/09/20	sáb 26/09/20	2 días
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	dom 27/09/20	lun 28/09/20	2 días
DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	mar 29/09/20	mié 30/09/20	2 días
DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	jue 1/10/20	vie 2/10/20	2 días
IED ANTONIA SANTOS	**mar 1/09/20**	**vie 25/09/20**	**24 días**
INICIO IED ANTONIA SANTOS	**mar 1/09/20**	**mar 1/09/20**	**0 días**
PRELIMINARES	**mié 2/09/20**	**dom 13/09/20**	**12 días**
OBRAS PRELIMINARES	**mié 2/09/20**	**sáb 5/09/20**	**4 días**
CAMPAMENTO	mié 2/09/20	jue 3/09/20	2 días
CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LON	vie 4/09/20	vie 4/09/20	1 día
VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (2.00 X 1.00)	sáb 5/09/20	sáb 5/09/20	1 día
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	**dom 6/09/20**	**dom 13/09/20**	**8 días**
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIR	dom 6/09/20	lun 7/09/20	2 días
ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	mar 8/09/20	mié 9/09/20	2 días
DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARG	jue 10/09/20	vie 11/09/20	2 días
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPO	sáb 12/09/20	dom 13/09/20	2 días
CIMENTACION	**vie 18/09/20**	**vie 18/09/20**	**1 día**
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	**vie 18/09/20**	**vie 18/09/20**	**1 día**
PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INC	vie 18/09/20	vie 18/09/20	1 día
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	**lun 14/09/20**	**jue 17/09/20**	**4 días**
DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS	**lun 14/09/20**	**jue 17/09/20**	**4 días**
ACCESORIO PVC-S Ø 4"	lun 14/09/20	mar 15/09/20	2 días
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concret	mié 16/09/20	jue 17/09/20	2 días
MAMPOSTERIA	**lun 14/09/20**	**lun 14/09/20**	**1 día**
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES	**lun 14/09/20**	**lun 14/09/20**	**1 día**
ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	lun 14/09/20	lun 14/09/20	1 día

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	**lun 14/09/20**	**jue 17/09/20**	**4 días**
RED GENERAL DE AGUA FRIA	**lun 14/09/20**	**mar 15/09/20**	**2 días**
RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	lun 14/09/20	lun 14/09/20	1 día
REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	mar 15/09/20	mar 15/09/20	1 día
PUNTOS HIDRAULICOS	**mié 16/09/20**	**mié 16/09/20**	**1 día**
PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	mié 16/09/20	mié 16/09/20	1 día
SALIDAS SANITARIAS	**jue 17/09/20**	**jue 17/09/20**	**1 día**
PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	jue 17/09/20	jue 17/09/20	1 día
PAÑETES	**mar 15/09/20**	**jue 17/09/20**	**3 días**
PAÑETES SOBRE MUROS	**mié 16/09/20**	**jue 17/09/20**	**2 días**
FILOS Y DILATACIONES	mié 16/09/20	mié 16/09/20	1 día
RESANES GENERALES	jue 17/09/20	jue 17/09/20	1 día
PAÑETES BAJO PLACAS	**mar 15/09/20**	**mar 15/09/20**	**1 día**
PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4	mar 15/09/20	mar 15/09/20	1 día
PISOS	**sáb 19/09/20**	**vie 25/09/20**	**7 días**
BASES PISOS Y AFINADOS	**sáb 19/09/20**	**sáb 19/09/20**	**1 día**
AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	sáb 19/09/20	sáb 19/09/20	1 día
ACABADOS PISOS	**dom 20/09/20**	**vie 25/09/20**	**6 días**
CERAMICA 33 X 33	dom 20/09/20	dom 20/09/20	1 día
MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	lun 21/09/20	lun 21/09/20	1 día
MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	mar 22/09/20	vie 25/09/20	4 días
CARPINTERIA DE METÁLICA	**lun 14/09/20**	**lun 14/09/20**	**1 día**
CARPINTERIA EN ALUMINIO	**lun 14/09/20**	**lun 14/09/20**	**1 día**
INSTALACION CARPINTERIA METALICA	lun 14/09/20	lun 14/09/20	1 día
ENCHAPES	**mar 15/09/20**	**mar 15/09/20**	**1 día**
ENCHAPE SOBRE MUROS	**mar 15/09/20**	**mar 15/09/20**	**1 día**
ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE	mar 15/09/20	mar 15/09/20	1 día
PINTURA	**vie 18/09/20**	**sáb 19/09/20**	**2 días**
PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	**vie 18/09/20**	**vie 18/09/20**	**1 día**
ESTUCO	vie 18/09/20	vie 18/09/20	1 día
VARIOS - PINTURA	**sáb 19/09/20**	**sáb 19/09/20**	**1 día**
PINTURA EPOXICA	sáb 19/09/20	sáb 19/09/20	1 día
CERRADURAS Y VIDRIOS	**dom 20/09/20**	**dom 20/09/20**	**1 día**
CERRADURAS	**dom 20/09/20**	**dom 20/09/20**	**1 día**
CERRADURA SAFE ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO	dom 20/09/20	dom 20/09/20	1 día
FIN IED ANTONIA SANTOS	**vie 25/09/20**	**vie 25/09/20**	**0 días**

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
IED ANTONIA SANTOS SEDE B	**mar 1/09/20**	**jue 8/10/20**	**37 días**
INICIO IED ANTONIA SANTOS SEDE B	**mar 1/09/20**	**mar 1/09/20**	**0 días**
PRELIMINARES	**mié 2/09/20**	**lun 7/09/20**	**6 días**
OBRAS PRELIMINARES	**mié 2/09/20**	**dom 6/09/20**	**5 días**
CAMPAMENTO	mié 2/09/20	jue 3/09/20	2 días
CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LON	vie 4/09/20	vie 4/09/20	1 día
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	sáb 5/09/20	sáb 5/09/20	1 día
VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (2	dom 6/09/20	dom 6/09/20	1 día
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	**lun 7/09/20**	**lun 7/09/20**	**1 día**
DESMONTE Y RETIRO ADOQUIN ECOLOGICO	lun 7/09/20	lun 7/09/20	1 día
CIMENTACION	**mar 8/09/20**	**sáb 12/09/20**	**5 días**
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	**mar 8/09/20**	**sáb 12/09/20**	**5 días**
EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARG	mar 8/09/20	mar 8/09/20	1 día
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Hu	jue 10/09/20	jue 10/09/20	1 día
CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI	mié 9/09/20	mié 9/09/20	1 día
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. IN	vie 11/09/20	vie 11/09/20	1 día
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	vie 11/09/20	vie 11/09/20	1 día
GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	vie 11/09/20	vie 11/09/20	1 día
MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	vie 11/09/20	vie 11/09/20	1 día
GROUTING CONCRETO FLUIDO	sáb 12/09/20	sáb 12/09/20	1 día
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	**mar 8/09/20**	**vie 11/09/20**	**4 días**
DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS	**mar 8/09/20**	**vie 11/09/20**	**4 días**
TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	mar 8/09/20	mar 8/09/20	1 día
ACCESORIO PVC-S Ø 3"	mié 9/09/20	mié 9/09/20	1 día
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concret	jue 10/09/20	jue 10/09/20	1 día
PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	vie 11/09/20	vie 11/09/20	1 día
ESTRUCTURA	**dom 13/09/20**	**mié 16/09/20**	**4 días**
ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO	**dom 13/09/20**	**mié 16/09/20**	**4 días**
LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 P	dom 13/09/20	mié 16/09/20	4 días
MAMPOSTERIA	**jue 17/09/20**	**jue 1/10/20**	**15 días**
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO	**jue 17/09/20**	**jue 1/10/20**	**15 días**
MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm	jue 17/09/20	jue 24/09/20	8 días
ALFAJIAS LADRILLO PRENSADO	vie 25/09/20	mar 29/09/20	5 días
DINTEL LADRILLO HUECO No. 4	mié 30/09/20	mié 30/09/20	1 día
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOX	jue 1/10/20	jue 1/10/20	1 día
INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	**lun 7/09/20**	**jue 10/09/20**	**4 días**
ACOMETIDA	**lun 7/09/20**	**jue 10/09/20**	**4 días**
RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	lun 7/09/20	lun 7/09/20	1 día
REGISTRO DE BOLA 200 Lb. - Ø 1/2"	mar 8/09/20	mar 8/09/20	1 día
PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	mié 9/09/20	mié 9/09/20	1 día
PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	jue 10/09/20	jue 10/09/20	1 día

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	**lun 7/09/20**	**sáb 12/09/20**	**6 días**
SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	**lun 7/09/20**	**sáb 12/09/20**	**6 días**
SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENT	lun 7/09/20	lun 7/09/20	1 día
TUBERIA PVC 1/2" INCRUSTADA	mar 8/09/20	mar 8/09/20	1 día
CABLEADO 1#10	mié 9/09/20	mié 9/09/20	1 día
CABLEADO 2#8	jue 10/09/20	jue 10/09/20	1 día
TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESA	vie 11/09/20	vie 11/09/20	1 día
INTERRUPTOR DOBLE 200211	sáb 12/09/20	sáb 12/09/20	1 día
PISOS	**jue 17/09/20**	**lun 21/09/20**	**5 días**
BASES PISOS Y AFINADOS	**jue 17/09/20**	**lun 21/09/20**	**5 días**
AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	jue 17/09/20	jue 17/09/20	1 día
ADOQUIN ECOLÓGICO	vie 18/09/20	vie 18/09/20	1 día
CERAMICA 33 X 33	sáb 19/09/20	sáb 19/09/20	1 día
MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	dom 20/09/20	lun 21/09/20	2 días
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	**jue 17/09/20**	**lun 21/09/20**	**5 días**
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	**jue 17/09/20**	**lun 21/09/20**	**5 días**
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	jue 17/09/20	jue 17/09/20	1 día
IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3	vie 18/09/20	sáb 19/09/20	2 días
MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	dom 20/09/20	dom 20/09/20	1 día
BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	lun 21/09/20	lun 21/09/20	1 día
CARPINTERIA DE METÁLICA	**mar 22/09/20**	**mié 23/09/20**	**2 días**
CARPINTERIA EN ALUMINIO	**mar 22/09/20**	**mié 23/09/20**	**2 días**
PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMAL	mar 22/09/20	mar 22/09/20	1 día
VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)	mié 23/09/20	mié 23/09/20	1 día
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	**vie 11/09/20**	**sáb 12/09/20**	**2 días**
APARATOS SANITARIOS	**vie 11/09/20**	**sáb 12/09/20**	**2 días**
GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E	vie 11/09/20	vie 11/09/20	1 día
POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALA	sáb 12/09/20	sáb 12/09/20	1 día
IED ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO	**vie 25/09/20**	**vie 8/01/21**	**105 días**
INICIO IED ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO	**vie 25/09/20**	**vie 25/09/20**	**0 días**
PRELIMINARES	**sáb 26/09/20**	**mar 27/10/20**	**32 días**
OBRAS PRELIMINARES	**sáb 26/09/20**	**lun 5/10/20**	**10 días**
CAMPAMENTO	sáb 26/09/20	vie 2/10/20	7 días
INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES	**sáb 26/09/20**	**jue 22/10/20**	**27 días**
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOE	sáb 26/09/20	dom 27/09/20	2 días
DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SO	lun 28/09/20	mar 29/09/20	2 días
DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	mié 30/09/20	jue 1/10/20	2 días

TABLA 10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El seguimiento de la interventoría al avance de los trabajos por parte de constructor, se realizará diariamente frente a la programación establecida y aprobada haciendo énfasis en la ruta crítica identificada. En los reportes semanales y Avance físico de obra se controlará junto con el contratista

dicho avance y así mismo en los informes mensuales, se analizará el cumplimiento del cronograma y se propondrán las acciones en caso de retrasos.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Como una de la medida del desempeño de calidad, los procesos de VALLEJO H. CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S, que hace parte de los mismos, realizan el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría recomienda realizar lo antes posible una revisión hidráulica junto con los especialistas tanto del contratista como de interventoría en la I.E.D. Externado Nacional Camilo Torres, con el fin de dar solución a los inconvenientes presentados por filtraciones en este frente de trabajo y de esta manera no generar retrasos en las actividades programadas.
- La Interventoría recomienda dar agilidad en el trámite de emisión del concepto de la I.E.D. Los Pinos sede B Efraín Cañavera, ya que es indispensable para no dar atrasos con la ejecución de actividades del Contrato de Obra No. 1577780.

ANEXO 1

ACTAS DE COMITÉ

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: SEGUIMIENTO APROBACIÓN PRELIMINAR	DD	MM	AA
ACTA No. 1		22	8	2020

LUGAR: Videoconferencia **HORA DE INICIO:** 4:00 p. m. **HORA FIN:** 5:00 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ADRIANA ROJAS	Arq. Directora	Contratista
JUAN PABLO ARELLANO	Ing. Residente	Contratista
HUGO TIBAQUIRA	Supervisor del contrato	SED
SANTIAGO PAEZ	Arq, Coordinador	Interventoría
MARCELA CONTRERAS	Ing. Residente	Interventoría
WILLMEN PEÑALOZA	Ing. Residente	Contratista

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

El contratista Doble R Arquitectura e Ingenieria, afirma que tiene el Informe preliminar y lo estará entregando la próxima semana para su revisión.

Se requiere la información técnica de la Secretaria de Educación Distrital sobre el presupuesto y los NP´s, ya que no se pretende pasar de la bolsa actual para el proyecto, y el contratista necesita pasar el presupesto general para su aprobación.

Se requiere organizar la prioridad en el desarrollo de las actividades, principalmente las actividades del Colegio Los Pinos, ya que, de ser complicada la solución al arreglo del muro posterior, se necesitarían solicitar licencias que se demorarían mucho tiempo en salir y no es viable con el tiempo del contrato.

Se requiere realizar una nueva reunión la siguiente semana con el Gestor Territorial Ingeniero Leonardo Contador, para determinar los rubros establecidos por colegio.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN**

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	**X**	**NO**		
Observaciones					

Siendo las _5 PM__ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Marcela Contreras
CARGO		**CARGO**	Ing. Residente de Interventoría

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Marcela Contreras

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: SEGUIMIENTO APROBACIÓN PRELIMINAR	DD	MM	AA
ACTA No. 2		26	8	2020

LUGAR:	Videoconferencia	**HORA DE INICIO:**	3:00 p. m.	**HORA FIN:**	4:00 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ADRIANA ROJAS	Arq. Directora	Contratista
JUAN PABLO ARELLANO	Ing. Residente	Contratista
HUGO TIBAQUIRA	Supervisor del contrato	SED
SANTIAGO PAEZ	Arq, Coordinador	Interventoría
MARCELA CONTRERAS	Ing. Residente	Interventoría

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se toma como tema principal, las actividades que son prioridad a desarrollar en los diferentes Colegios.

Debido a los inconvenientes que se pueden presentar en el muro ubicado en la partre posterior del Colegio Los Pinos, se pide no intervenir por el momento y dejar una recomendación a la Secretaria de Educación, para realizar un estudio del talúd, ya que en este momento el presupuesto actual no alcanzaría para dar la intervención necesaria.

Se pide tanto a la Interventoría como al Contratista, socializar el personal que va a estar en obra, ya que se necesitan los datos para los permisos de ingreso a los establecimientos educativos.

Se entregarán las actas de inicio en borrador tanto a la Interventoría como al Contratista, para que digiten la información faltante de sus respectivas empresas.

Queda pendiente la apertura del PIN para acceso a la plataforma.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Entrega del Cronograma de actividades	Contratista	27/08/2020
Información del personal para los permisos de ingreso a los Colegios.	Contratista e Interventoría	27/08/2020
Entrega de actas de Inicio	Supervisor SED	27/08/2020
Entrega de observaciones al Informe Preliminar y Prespuestos	Interventoría	27/08/2020

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	**X**	**NO**		
Observaciones					

Siendo las _4 PM__ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Marcela Contreras
CARGO		**CARGO**	Ing. Residente de Interventoría

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Marcela Contreras

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: SEGUIMIENTO APROBACIÓN PRELIMINAR	DD	MM	AA
ACTA No. 3		11	9	2020

LUGAR: Videoconferencia **HORA DE INICIO:** 11:00 a. m. **HORA FIN:** 12:00 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ADRIANA ROJAS	Arq. Directora	Contratista
LUIS CAMPAÑA	Ing. Director	Interventoría
JUAN PABLO ARELLANO	Ing. Residente	Contratista
HUGO TIBAQUIRA	Supervisor del contrato	SED
SANTIAGO PAEZ	Arq. Coordinador	Interventoría
MARCELA CONTRERAS	Ing. Residente	Interventoría
JULIANA QUIÑONEZ	Ing. Ambiental	Interventoría
MELISSA PULIDO	Ing. Ambiental	Contratista

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se tiene pendiente la verificación de los NP´s, se está tratando de dar una solución lo antes posible para que ese tema quede subsanado y no se tengan inconvenientes futuros.

Está pendiente el tema del muro inclinado en el Colegio Los Pinos, se está a la espera de la disponibilidad del patólogo de la SED, para poder realizar la visita al Colegio y dar una solución a esta intervención o en dado caso de no ser posible una intervención, verificar otra actividad que se pueda realizar en este Colegio.

La Ingeniera Juliana Quiñonez, profesional ambiental y SST de la interventoría, comunica que los documentos para la apertura del PIN ya han sido revisados y enviados a la SED.

Se pide de parte del Arq. Hugo, supervisor de la SED, que la documentación del personal nuevo que vaya a ingresar a los Colegios, sea enviada con un mínimo de 3 días para seguir el conducto regular y no generar inconvenientes con la vigilancia en los ingresos.

El Arq. Hugo pide que se realicen actas de vecindad internas en las instituciones, para tener claridad con el estado inicial de las instituciones y no generar controversía con posibles daños durante el desarrollo del contrato y al entregar las obras finalizadas.

Por parte de SED, el Arq. Hugo pide al contratista que el material reutilizable (sanitarios, puertas, espejos, etc.) sean entregados con Acta a los rectores de la Institución correspondiente.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Verificación de NP`s	SED	15/09/2020
Disponibilidad del Patólogo para visita al Colegio Los Pinos	SED	

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	**X**	**NO**	
Observaciones				

Siendo las _12 PM__ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Marcela Contreras
CARGO		**CARGO**	Ing. Residente de Interventoría

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Marcela Contreras

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No. 4	Seguimiento de Obra y Preliminares	15	09	2020

LUGAR: Oficina Vallejo H-Interventoria HORA DE INICIO: 8:20 am HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
SANTIAGO PAEZ B	ARQ COORDINADOR	INTERVENTORIA
Willmen Peñaloza	Residente obra	Doble r - contratista
LUIS CAMPAÑA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	VALLEJO H INGENIEROS
Marcela Contreras	Ing. Residente	Interventoría

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Realizar los protocolos de seguridad - bioseguridad en la entrada de las instituciones (Desinfección y toma de temperatura).

Se ponen de acuerdo tanto interventoría como contratista para realizar mediciones conjuntas los dias lunes, y poder entregar datos oficiales en los comités.

Se revisan los NP's de acuerdo con el desarrollo de la obra:

1 → El trasiego se sigue manejando con el presupuesto, item aprobado de 0 a 100 mts. y se aumenta la cantidad.

2 → Muro superboard, se cambia por mampostería.

3 - Suministro e instalación de Fluxómetro, se cancela este NP.

4 - Demolición media caña → se cambia por otra actividad ya aprobada en m^2.

5 - Desmonte y reinstalación de concertina → Si se pasa

6 - Regata en muro y piso → Si se pasa.

7 - Revisión y sondeo → Agregar las tomas de presión y revisión si se pasa el item.

TEMAS TRATADOS

8 -> Equipo de Presión -> Se descarta

9 -> Red de conexión para cuarto de bomba -> se descarta.

10 -> Demolición cuneta -> Si va, se realiza ajuste.

11 -> Resane Estructural -> Si va.

12 -> Andamio Tubular -> Se realiza el ajuste al ítem existente

TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Realizar los ajustes de los NP's.	Contratista	15/09/2020
Realizar Actas de Vecindad Internas	Contratista.	15/09/2020

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	SANTIAGO PAEZ	NOMBRE		
CARGO	ARQ COORDINADOR	CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	SANTIAGO PAEZ P

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No. 5	Inspección del muro	17	09	2020.

LUGAR: Colegio los Pinos HORA DE INICIO: 10 am HORA FIN: 10:50 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Angela Jissette Pinzón B	Topografa	DCCEE SED.
Freddy E Quiroga	Esp. Geotecnia	DCCEE SED.
Carlos Eduardo Rodriguez	Esp. Estructura	DCCEE SED
Juan Pablo Arellano	Residente	Contratista
Hugo H. Tibaquira C	Arq. SED	DCEE SED
Wieber Yesid Jiménez B.	Esp. Patología	Interventoria
Marcela Contreras	Residente	Interventoria

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se pide hacer una visita por la parte alta del muro, por parte de los profesionales especialistas SED.
Ing. Carlos Eduardos (Estructural), Ing. Angela Pinzon (Topografia), Freddy Quiroga (Geotecnista).
Se verifica los movimientos que ha tenido el talud, el muro presenta problemas de estabilidad y no está diseñado para el fin que está ejerciendo, necesita un apuntalamiento. Es necesario intervenir el talud.
Es necesario realizar un estudio de riesgos frente al movimiento del talud. por remosión de masa.
La intervención es una obra de mejoramiento y no mantenimiento.
El talud requiere monitoreo continuo.
Estuvo presente el especialista Patologia por parte de la Interventoria. y concuerda con los especialistas de la SED.

TEMAS TRATADOS

El contratista se encuentra en disposición de realizar los trabajos de acuerdo al contrato contractual.

TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Conceptos escritos sobre el muro - I.E.D. Los Pinos	Especialistas SED	25/09/20

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?		SI		NO
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) SI en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Marcela Contreras

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Inspección del talud	DD	MM	AA
ACTA No. 6		17	09	2020

LUGAR: I.E.D. Externado Nal. de Comercio HORA DE INICIO: 11 am HORA FIN: 11:30 aun

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Carlos A. Estupiñán	Asesor Estructural	DCCEE - SED
Angela J. Pinzón B.	Topografa	DCCEE - SED.
Freddy Quiroga	Geotecnia - S	DCCEE - SED
Hugo Tibaquirá	Arq SED	DCCEE - SED
Wilber Yesid Jiménez B.	Especialista Patología	Interventoria
Juan pablo Arellano	Residente	contratista
Marcela		

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se realiza visita al Externado Nacional de Comercio. en conjunto con los especialistas de la SED, Ing. Carlos Estupiñán (Estructural), Ing. Angela Pinzón (Topografia), Ing. Freddy Quiroga (Geotecnista) y el Ing. Wilber Jiménez (Patologo - Interventoría), para emitir los conceptos técnicos frente al muro del parqueadero. Se evidencia asentamiento.

El contratista se encuentra en disposición de realizar los trabajos de acuerdo al objeto contractual

TEMAS TRATADOS

TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Concepto escrito sobre el muro - I.E.D Externado Nacional	Especialistas SED	25-09-20

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?		SI		NO	
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) SI en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Seguimiento de Obra	DD	MM	AA
ACTA No. 7		18	9	2020

LUGAR:	videoconferencia	**HORA DE INICIO:**	10:30	**HORA FIN:**	11:30

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Arq. Hugo Tibaquira	Supervisor	SED
Arq. Adriana Rojas	Directora de Obra	Contratista
Ing. Willmen Peñaloza	Residente	Contratista
Arq. Santiago Páez	Coordinador	Interventoría
Ing. Marcela Contreras	Residente	Interventoría

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se le recomienda al contratista cumplir con la señalización y los protocolos de bioseguridad por institución educativa.

Se establece que, ante cualquier actividad que se realice y no esté contemplada en lo contractual, sea reportada cada semana, los días lunes.

Se requiere dar solución en colegio Externado Nacional Camilo Torres, a la demolición del traspié que se encontraba en la salida del trayecto hacia el acopio, ya que no era necesaria su demolición.

La supervisión advierte que no se cumplió el día de ayer con la entrega del PAC, y que hoy se debe cumplir con la entrega del mismo.

La red hidraulica tanto horizontal como vertical de los Colegios Camilo Torres y Policarpa Salavarrieta se sustituirá completamente.

Se espera tener el concepto de los especialistas de la SED la próxima semana, para resolver lo relacionado a los muros del Colegio Los Pinos y El Nacional de Comercio.

El contratista entregará el día de hoy las correcciones de los APU´s de los NP´s que se llegaron a común acuerdo el día miércoles.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Realizar las Actas de Vecindad internas en cada institución	Contratista	21/09/2020

VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Seguimiento a Obra	DD	MM	AA
ACTA No. 8		23	09	2020

LUGAR: Video Conferencia. HORA DE INICIO: 8:30 am HORA FIN: 9:30 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Ing. Wilmer Peñaloza	Residente Obra	Contratista
Arq. Adriana Rojas	Directora Obra	Contratista
Arq. Santiago Páez	Coordinador Int.	Interventoría
Ing. Marcela Contreras	Residente Int.	Interventoría.

ORDEN DEL DIA

1.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

- Se revisa el correo recibido con respecto al diseño para el cuarto de almacenamiento de alimentos en el Colegio Antonia Santos Sede B y se actualiza con las respectivas observaciones solicitadas. Se pide colocar en el diseño una tabla con especificaciones técnicas, cotas y descripción del cuarto, para hacer entrega oficial a la SED y evitar así inconvenientes futuros.
Queda pendiente por definir la altura del cuarto, a más tardar entre hoy y mañana.
- Se deja constancia que el contratista hizo entrega el dia de ayer de las actas de vecindad y están en este momento en revisión por parte de la interventoría.
- El contratista pone en conocimiento que tuvo que cambiar de escombrera debido a la disponibilidad y por ello fue que se generó retraso en el retiro de escombros, pero que ya tienen programado este

TEMAS TRATADOS

retiro entre hoy y mañana.


- Con respecto a los campamentos, en Camilo Torres ya se construyó y se pone en funcionamiento a partir de mañana. En Policarpa se seguirá disponiendo como campamento el espacio que brindó el mismo Colegio. Ya se tiene construido el campamento de Antonia Santos Sede B.

En Antonia Santos sede A, el contratista sugiere no hacerlo, no lo consideran viable teniendo en cuenta que la obra a desarrollar en este Colegio no es tan grande.

* Queda pendiente ajustar el APU del Campamento, ya que el que aparece en el presupuesto, no es el que se está haciendo.

- El contratista pone en conocimiento que realizó un recorrido el día de ayer por los colegios, para verificar las actividades a desarrollar en las cubiertas a intervenir, y que planean realizar trabajos en la estructura debajo de la cubierta y después realizar desmonte e instalación de la nueva cubierta.
- Quedamos pendientes de la alternancia en los colegios por parte de la SED, para hacer los campamentos faltantes.
- Se dispone el lunes 28 de septiembre para realizar mesa de trabajo en conjunto Contratista con Interventoría para dejar unificados los cortes.
- Se le recuerda al contratista entregar con anticipación el listado del personal nuevo a ingresar, para no generar retrasos ni inconvenientes.
- Estamos pendientes de los conceptos técnicos a entregar por los especialistas SED del Colegio Los Pinos y Nacional de Comercio, a más tardar el viernes 25 de septiembre.
- Quedamos a la espera de la confirmación para recorrido el día viernes 25 de septiembre.

TEMAS TRATADOS

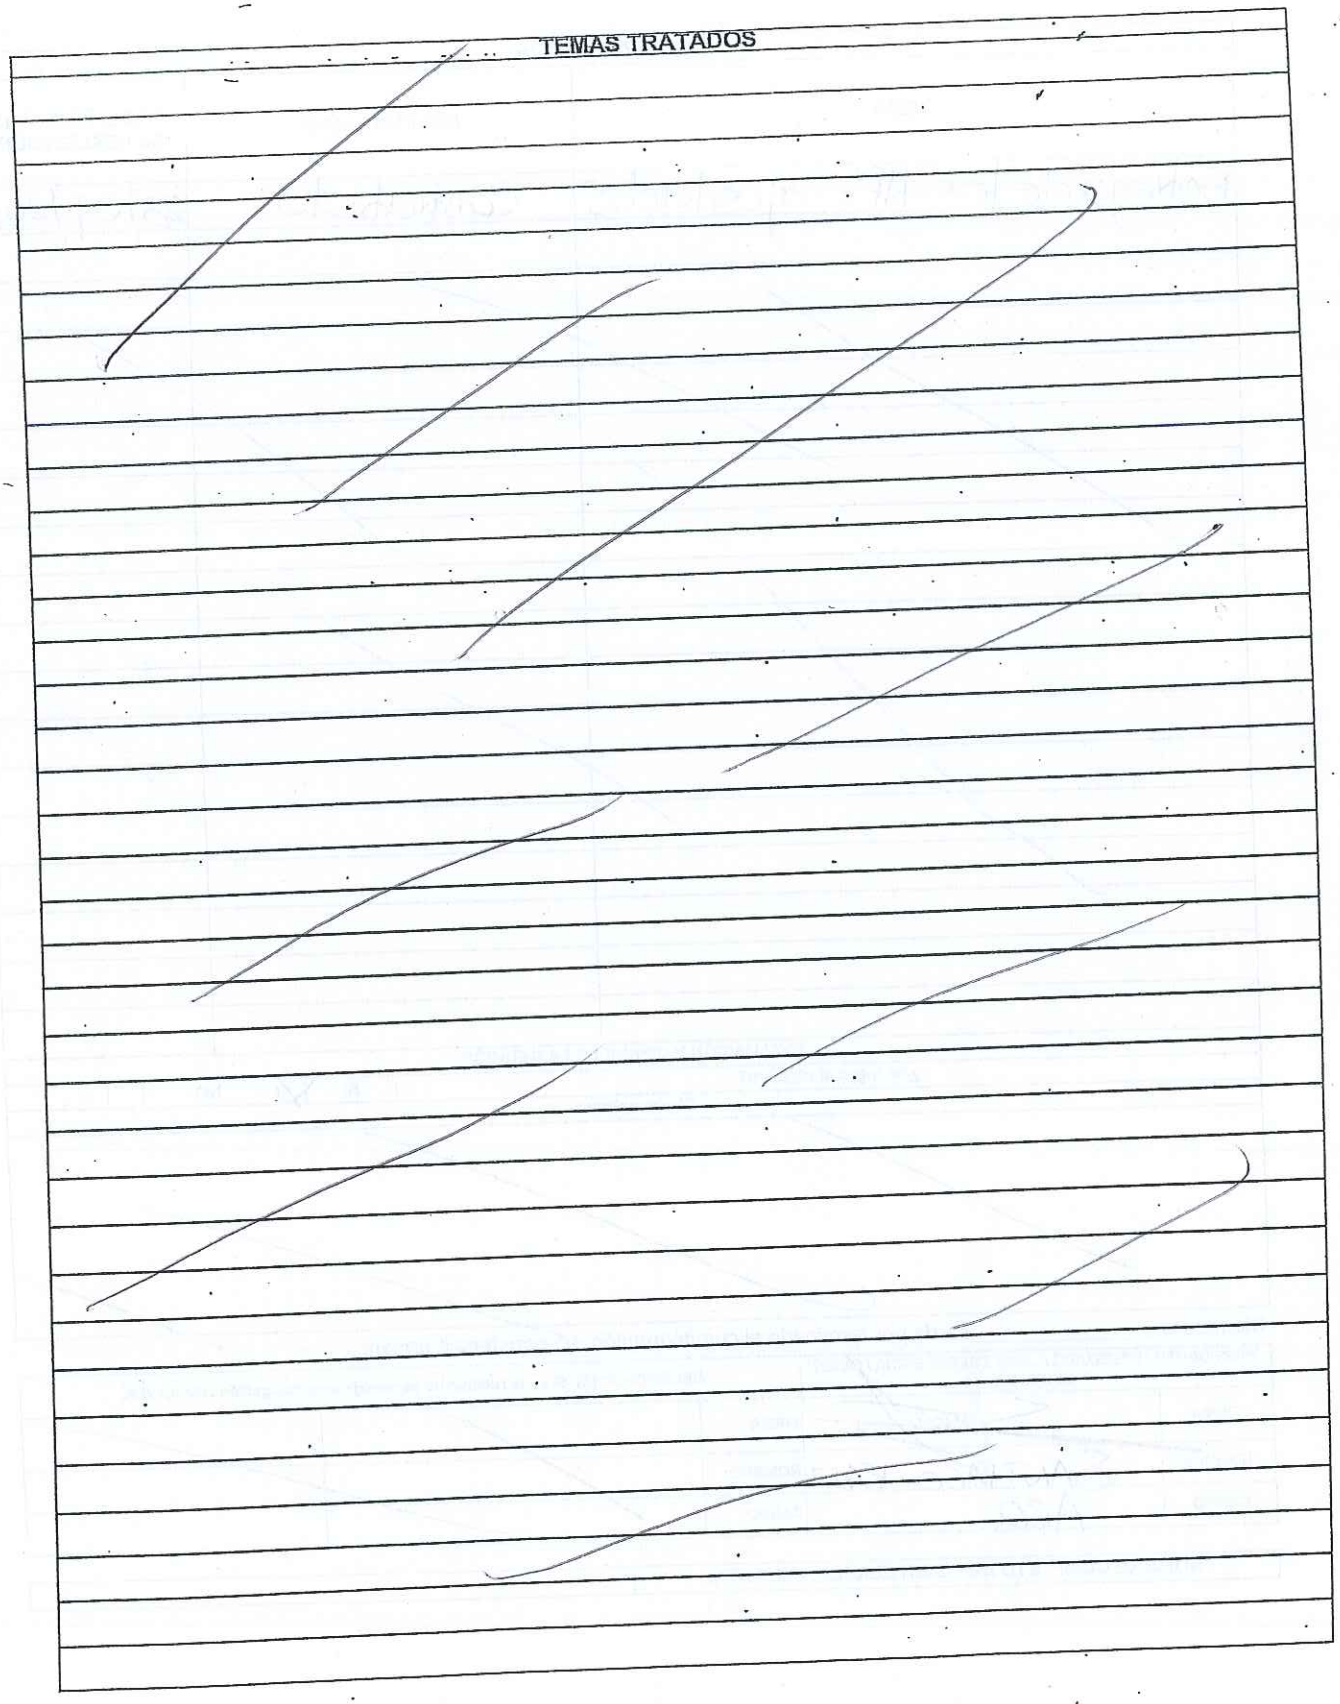

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega de los NP's ajustados	Contratista	23/09/2020

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN			
¿Se logró el objetivo?	SI X	NO	
Observaciones			

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) SI en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	SANTIAGO PAEZ	NOMBRE		
CARGO	ARQ.	CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

ANEXO 2

INFORMES SEMANALES

BOGOTÁ
Secretaria de Educación

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 1 DEL DÍA 02 MES 09 AÑO 2020 AL DÍA 05 MES 09 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. (GRUPO 12)

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.1680613

Supervisor SED: LUIS ANTONIO PINZON PARRA

Profesional de Apoyo a la Supervisión: HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 1.019.003.283
Valor Adicional	N.A
Valor Actualizado	$ 1.019.003.283
Plazo Inicial	5 MESES
Plazo prorroga	N.A
Plazo Actualizado	5 MESES
Fecha Inicio	miércoles, 2 de septiembre de 2020
Fecha Terminación Inicial	lunes, 1 de febrero de 2021
Fecha Terminación Actual	lunes, 1 de febrero de 2021

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 160.578.600
Valor Adicional	N.A
Valor Actualizado	$ 160.578.600
Plazo Inicial	6 MESES
Plazo Prorroga	N.A
Plazo Actualizado	6 MESES
Fecha Inicio	miércoles, 2 de septiembre de 2020
Fecha Terminación Inicial	lunes, 1 de marzo de 2021
Fecha Terminación Actual	lunes, 1 de marzo de 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	17,00%	17,00%
Valor del PAC Programado ($)	$ 173.230.558	$ 173.230.558

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ 0	$ 0

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	2,00%	2,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 20.380.066	$ 20.380.066

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0,3%	0,3%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 2.911.438	$ 2.911.438

RESUMEN CRONOGRAMA

Mantenimiento colegios /Actividades	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Atraso (-) o Adelanto (+)	Observaciones
1. IED CAMILO TORRES						
PRELIMINARES						
CAMPAMENTO	57%	0%	57%	0%	-57%	No se han iniciado las actividades
DESMONTE DE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado las actividades
DESMONTE DE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC. RET.)	100%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado las actividades
DESMONTE DE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RET.)	100%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado las actividades
ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO)	100%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado las actividades
2. IED POLICARPA SALAVARRIETA						
PRELIMINARES						
CAMPAMENTO	57%	0%	57%	0%	-57%	No se han iniciado las actividades
3. IED ANTONIA SANTOS SEDE A						
PRELIMINARES						
CAMPAMENTO	100%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado las actividades
CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M	100%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado las actividades
VALLA INFORMATIVA	100%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado las actividades

4. IED ANTONIA SANTOS SEDE B						
PRELIMINARES						
CAMPAMENTO	100%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado las actividades
CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M	100%	0%	100%	0%	-100%	No se han iniciado las actividades
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN POR COLEGIO						
Institución Educativa	**% Programado**	**% Programado Acomulado**	**% Ejecutado (fisico)**	**% Ejecutado (fisico Acomulado)**	**Atraso (-) o Adelanto (+)**	**Observaciones**
Externado Nacional Camilo Torres	3,0%	3%	0%	0%	-3%	No se han iniciado actividades
Policarpa Salavarrieta	2,0%	2%	0%	0%	-2%	No se han iniciado actividades
Antonia Santos Sede A	11,0%	11%	0%	0%	-11%	No se han iniciado actividades
Antonia Santos Sede B	6,0%	6%	2%	0%	-4%	No se han iniciado actividades
Escuela Nacional De Comerio	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades
Antonio Jose Uribe	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades
Los Pinos	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

SE REVISA Y APRUEBA EL PRESUPUESTO DE OBRA

SE REVISA Y VERIFICA LA PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCUIÓN DE ACTIVIDADES


SE REALIZA MODIFICACIÓN A LAS VALLAS

SE SOLICITA A LOS COLEGIOS EL ACCESO DEL PERSONAL PROFESIONAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

I.E.D. EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES

RECORRIDO DE OBRA

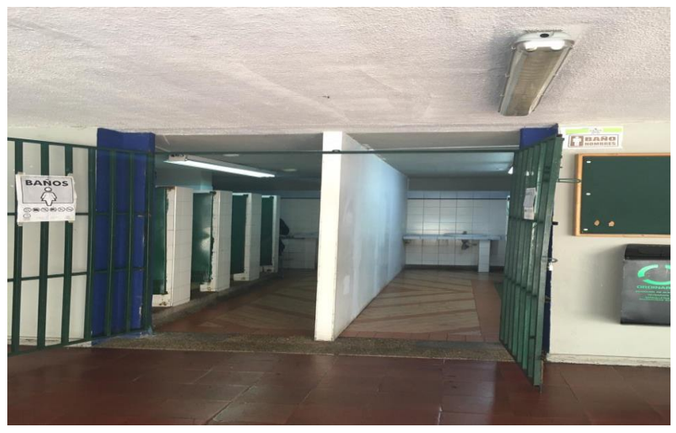



I.E.D. POLICARPA SALAVARRIETA

RECORRIDO DE OBRA






IED ANTONIA SANTOS SEDE A

RECORRIDO DE OBRA



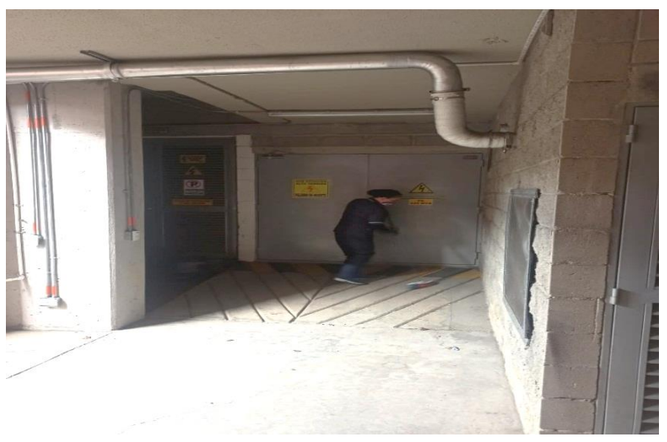

IED ANTONIA SANTOS SEDE B

RECORRIDO DE OBRA





IED ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO

RECORRIDO DE OBRA





IED ANTONIO JOSE URIBE

RECORRDIO DE OBRA





IED LOS PINOS

RECORRIDO DE OBRA





ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA DIAZ

Nombre - Director Interventoría / Obra

Firma

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 2 DEL DÍA 07 MES 09 AÑO 2020 AL DÍA 12 MES 09 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. (GRUPO 12)

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.1680613

Supervisor SED: LUIS ANTONIO PINZON PARRA

Profesional de Apoyo a la Supervisión: HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 1.019.003.283
Valor Adicional	N.A
Valor Actualizado	$ 1.019.003.283
Plazo Inicial	5 MESES
Plazo prorroga	N.A
Plazo Actualizado	5 MESES
Fecha Inicio	miércoles, 2 de septiembre de 2020
Fecha Terminación Inicial	lunes, 1 de febrero de 2021
Fecha Terminación Actual	lunes, 1 de febrero de 2021

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 160.578.600
Valor Adicional	N.A
Valor Actualizado	$ 160.578.600
Plazo Inicial	6 MESES
Plazo Prorroga	N.A
Plazo Actualizado	6 MESES
Fecha Inicio	miércoles, 2 de septiembre de 2020
Fecha Terminación Inicial	lunes, 1 de marzo de 2021
Fecha Terminación Actual	lunes, 1 de marzo de 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	17,00%	17,00%
Valor del PAC Programado ($)	$ 173.230.558	$ 173.230.558

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0,00%	0,00%
Valor del PAC Programado ($)	$ 0	$ 0

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	5,00%	7,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 50.950.164	$ 71.330.230

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	2,74%	3,04%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 27.900.243	$ 30.957.253

RESUMEN CRONOGRAMA

Mantenimiento colegios /Actividades	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Atraso (-) o Adelanto (+)	Observaciones
1. IED CAMILO TORRES						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	43%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.3 CERRAMIENTO PROVISIONAL	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.8 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO

1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	50%	64%	50%	64%	14%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	46%	0%	46%	46%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.9 DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	100%	0%	100%	100%	FINALIZADO
1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS	0%	50%	0%	50%	50%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.27 DESMONTE DE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.30 DESMONTE DE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.31 ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.32 DEMOLICION AFINADO DE PISO e=5 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.34 DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.35 DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.38 SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRAÚLICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.46 DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.49 DESMONTE DE LAMPARAS DE 2X32 (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
VARIOS-PRELIMINARES						
1.4.4 UNIDADES SANITARIAS PORTATILES	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2. IED POLICARPA SALAVARRIETA						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.5 CERRAMIENTO PROVISIONAL	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.8 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	50%	11%	50%	11%	-39%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.7 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	66%	0%	66%	66%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	46%	0%	46%	46%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	45%	0%	45%	45%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	100%	0%	100%	100%	FINALIZADO
3. IED ANTONIA SANTOS SEDE A						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.3 CERRAMIENTO PROVISIONAL	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
DEMOLICIONES						
1.3.8 DEMOLICIÓN MUROS EN BLOQUE e=12cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.31 ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.32 DEMOLICION AFINADO DE PISO e=5 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
VARIOS-PRELIMINARES						
1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES	50%	0%	50%	0%	-50%	EJECUTANDO ACTIVIDAD

4. IED ANTONIA SANTOS SEDE B						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.3 CERRAMIENTO PROVISIONAL	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.8 LOCALIZACION Y REPLANTEO	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
CIMENTACION						
2.1.4 EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRA	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMÚN	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.2.2 CONCRETO CICLOPEO	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.2 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.3 GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.4 MALLA ELECTRSOLDADA ESTANDAR	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.6 GROUNTING CONCRETO FLUIDO	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS						
3.1.4 TUBERÍA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3"	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS						
7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
7.4.33 REGISTRO DE BOLA 200 Lb. - Ø 1/2"	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
7.7.2 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES						
8.1.2 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.3.1 TUBERIA PVC 1/2" INCRUSTADA	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.3.15 CABLEADO 1#10	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.3.18 CABLEADO 2#8	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.4.1 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.4.10 INTERRUPTOR DOBLE 200211	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
16.1.9 GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
16.1.35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN POR COLEGIO						
Institución Educativa	**% Programado**	**% Programado Acumulado**	**% Ejecutado (fisico)**	**% Ejecutado (fisico Acomulado)**	**Atraso (-) o Adelanto (+)**	**Observaciones**
Externado Nacional Camilo Torres	7,0%	10,0%	10,3%	10,3%	3%	Se presentan atrasos a la programacion de inicio de actividades
Policarpa Salavarrieta	4,0%	6,0%	6,8%	6,8%	3%	Se presentan atrasos a la programacion de inicio de actividades
Antonia Santos Sede A	19,0%	30,0%	0%	0,0%	-19%	No se han iniciado actividades
Antonia Santos Sede B	36,0%	42%	2%	2,0%	-34%	No se han iniciado actividades
Escuela Nacional De Comerio	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades
Antonio Jose Uribe	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades
Los Pinos	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

Se mantiene el constante seguimiento de los protocolos de bioseguridad al ingreso y durante el desarrollo de la jornada de trabajo.

Se solicita acceso de personal mano de obra a los Colegios

REGISTRO FOTOGRÁFICO

I.E.D. EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD











1.1.3 CERRAMIENTO



1.1.9 VALLA INFORMATIVA



1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES



1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE



1.3.9 DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS



1.3.21 DESMONTE APARATOS



1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS



ACOPIO DE MATERIAL



SEÑALIZACION



TRASIEGO DE MATERIAL

I.E.D. POLICARPA SALAVARRIETA

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD










1.1.5 CERRAMIENTO PROVISIONAL



1.1.9 **VALLA INFORMATIVA**

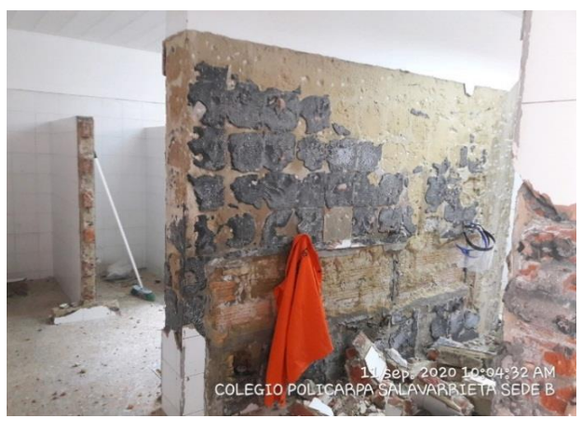

1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES



1.3.7 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO



1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE



1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS



1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS



SEÑALIZACION



ACOPIO DE MATERIAL



TRASIEGO DE MATERIAL

ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA DIAZ

Nombre - Director Interventoría / Obra

Firma

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 3 DEL DÍA 14 MES 09 AÑO 2020 AL DÍA 19 MES 09 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. (GRUPO 12)

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.1680613

Supervisor SED: LUIS ANTONIO PINZON PARRA

Profesional de Apoyo a la Supervisión: HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS

Contrato de Obra:

Valor Inicial	$ 1.019.003.283
Valor Adicional	N.A
Valor Actualizado	$ 1.019.003.283
Plazo Inicial	5 MESES
Plazo prorroga	N.A
Plazo Actualizado	5 MESES
Fecha Inicio	miércoles, 2 de septiembre de 2020
Fecha Terminación Inicial	lunes, 1 de febrero de 2021
Fecha Terminación Actual	lunes, 1 de febrero de 2021

Contrato de Interventoría:

Valor Inicial	$ 160.578.600
Valor Adicional	N.A
Valor Actualizado	$ 160.578.600
Plazo Inicial	6 MESES
Plazo Prorroga	N.A
Plazo Actualizado	6 MESES
Fecha Inicio	miércoles, 2 de septiembre de 2020
Fecha Terminación Inicial	lunes, 1 de marzo de 2021
Fecha Terminación Actual	lunes, 1 de marzo de 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	17,00%	17,00%
Valor del PAC Programado ($)	$ 173.230.558	$ 173.230.558

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ 0	$ 0

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	4,00%	11,00%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 40.760.131	$ 112.090.361

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	3,56%	6,60%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 36.307.892	$ 67.265.145

RESUMEN CRONOGRAMA

Mantenimiento colegios /Actividades	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Atraso (-) o Adelanto (+)	Observaciones
1. IED CAMILO TORRES						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	57%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.3 CERRAMIENTO PROVISIONAL	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.8 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO

1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	50%	36%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	54%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	25%	100%	25%	-75%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.14 DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.19 DEMOLICION PLACA MACIZA (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	49%	100%	49%	-51%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS	0%	50%	0%	100%	100%	FINALIZADO
1.3.27 DESMONTE DE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.30 DESMONTE DE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.31 ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.32 DEMOLICION AFINADO DE PISO e=5 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.34 DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.35 DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.38 SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRAÚLICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.46 DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.49 DESMONTE DE LAMPARAS DE 2X32 (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.4.4 UNIDADES SANITARIAS PORTATILES	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2. IED POLICARPA SALAVARRIETA						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.5 CERRAMIENTO PROVISIONAL	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.8 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	50%	39%	100%	50%	-50%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.7 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	66%	100%	66%	-34%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	6%	0%	52%	52%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	45%	0%	45%	45%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.38 SUSPENSION DE SALIDA HIDRAULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	0%	100%	100%	FINALIZADO
3. IED ANTONIA SANTOS SEDE A						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.5 CERRAMIENTO PROVISIONAL	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.31 ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.32 DEMOLICION AFINADO DE PISO e=5 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES	50%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD

CIMENTACION						
2.2.9 PLACA CONTRAPISO DE 8 cm	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS						
3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4"	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
MAMPOSTERIA						
5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS						
7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
7.7.2 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
PAÑETES						
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
9.1.10 RESANES GENERALES	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
9.2.4 PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
PISOS						
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
CARPINTERIA METALICA						
12.2.2 INSTALACION CARPINTERIA METALICA	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
ENCHAPES						
14.1.2 ENCHAPE PARED 20 x 20	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
PINTURA						
18.1.3 ESTUCO	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
18.4.10 PINTURA EPOXICA	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
4. IED ANTONIA SANTOS SEDE B						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.3 CERRAMIENTO PROVISIONAL	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.8 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
CIMENTACION						
2.1.4 EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRA	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMÚN	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.2.2 CONCRETO CICLOPEO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.2 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.3 GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.4 MALLA ELECTRSOLDADA ESTANDAR	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.6 GROUNTING CONCRETO FLUIDO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS						
3.1.4 TUBERÍA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3"	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
ESTRUCTURA						
4.3.7 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
MAMPOSTERIA						
5.2.7 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm	38,0%	0%	38%	0%	-38%	EJECUTANDO ACTIVIDAD

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS						
7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
7.4.33 REGISTRO DE BOLA 200 Lb. - Ø 1/2"	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
7.7.2 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES						
8.1.2 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.3.1 TUBERIA PVC 1/2" INCRUSTADA	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.3.15 CABLEADO 1#10	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.3.18 CABLEADO 2#8	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.4.1 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.4.10 INTERRUPTOR DOBLE 200211	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
PISOS						
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
10.2.4 ADOQUIN ECOLÓGICO	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
10.2.12 CERAMICA 33 X 33	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
CUBIERTAS						
11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
11.1.3 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
16.1.9 GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
16.1.35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN POR COLEGIO

Institución Educativa	% Programado	% Programado Acumulado	% Ejecutado (fisico)	% Ejecutado (fisico Acomulado)	Atraso (-) o Adelanto (+)	Observaciones
Externado Nacional Camilo Torres	6,0%	16,0%	7,7%	18,0%	2%	se presentan atrasos a la programacion de inicio de actividades
Policarpa Salavarrieta	3,0%	9,0%	1,9%	8,7%	-1%	se presentan atrasos a la programacion de inicio de actividades
Antonia Santos Sede A	51,0%	81,0%	15%	15%	-36%	se presentan atrasos a la programacion de inicio de actividades
Antonia Santos Sede B	19,0%	61%	0%	2%	-19%	No se han iniciado actividades
Escuela Nacional De Comerio	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades
Antonio Jose Uribe	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades
Los Pinos	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

Se mantiene el constante seguimiento de los protocolos de bioseguridad al ingreso y durante el desarrollo de la jornada de trabajo.

Se solicita acceso de personal mano de obra a los Colegios

No se han iniciado actividades en el Antonia Santos Sede B debido a la espera de aprobacion de diseños directamente de la SED

REGISTRO FOTOGRÁFICO

I.E.D. EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD









1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES



1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE



1.3.12 DEMOLICION PAÑETES



1.3.14 DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN



1.3.19 DEMOLICION PLACA MACIZA



1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS




ACOPIO DE MATERIAL



INSTALACION DE MANOMETRO

I.E.D. POLICARPA SALAVARRIETA

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

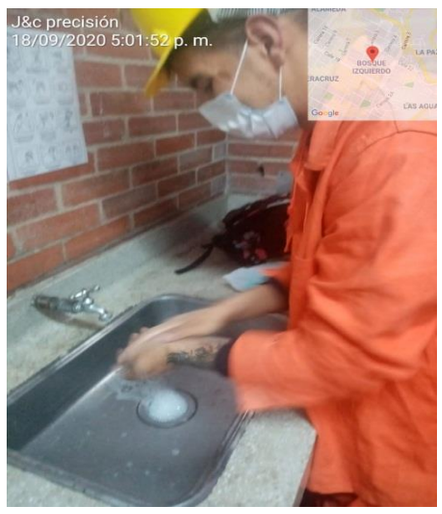





1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES



1.3.7 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO



1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE



1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS

IED ANTONIA SANTOS SEDE A

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD







1.1.5 CERRAMIENTO PROVISIONAL



1.1.9 VALLA INFORMATIVA



1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE



5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO

ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA DIAZ

Nombre - Director Interventoría / Obra

Firma

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 4 DEL DÍA 21 MES 09 AÑO 2020 AL DÍA 26 MES 09 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. (GRUPO 12)

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.1680613

Supervisor SED:	Profesional de Apoyo a la Supervisión:
LUIS ANTONIO PINZON PARRA	HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS

Contrato de Obra:		Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 1.019.003.283	Valor Inicial	$ 160.578.600
Valor Adicional	N.A	Valor Adicional	N.A
Valor Actualizado	$ 1.019.003.283	Valor Actualizado	$ 160.578.600
Plazo Inicial	5 MESES	Plazo Inicial	6 MESES
Plazo prorroga	N.A	Plazo Prorroga	N.A
Plazo Actualizado	5 MESES	Plazo Actualizado	6 MESES
Fecha Inicio	miércoles, 02 de septiembre de 2020	Fecha Inicio	miércoles, 02 de septiembre de 2020
Fecha Terminación Inicial	lunes, 01 de febrero de 2021	Fecha Terminación Inicial	lunes, 01 de marzo de 2021
Fecha Terminación Actual	lunes, 01 de febrero de 2021	Fecha Terminación Actual	lunes, 01 de marzo de 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	17,00%	17,00%	PAC Programado (%)	0%	0%
Valor del PAC Programado ($)	$ 173.230.558	$ 173.230.558	Valor del PAC Programado ($)	$ 0	$ 0

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	3,00%	14,00%	Actividades Ejecutadas (%)	10,82%	17,16%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 30.570.098	$ 142.660.460	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 110.246.401	$ 174.851.209

RESUMEN CRONOGRAMA

Mantenimiento colegios /Actividades	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Atraso (-) o Adelanto (+)	Observaciones
1. IED CAMILO TORRES						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.3 CERRAMIENTO PROVISIONAL	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.8 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.9 DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	36%	100%	61%	-39%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.14 DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.19 DEMOLICION PLACA MACIZA (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	51%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS	100%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.22 DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.23 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	75%	0%	75%	0%	-75%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD

1.3.27 DESMONTE DE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.31 ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.32 DEMOLICION AFINADO DE PISO e=5 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.34 DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.35 DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.38 SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRAÚLICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.46 DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.49 DESMONTE DE LAMPARAS DE 2X32 (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES	0%	67%	100%	67%	-33%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.4.4 UNIDADES SANITARIAS PORTATILES	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2. IED POLICARPA SALAVARRIETA						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.5 CERRAMIENTO PROVISIONAL	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.8 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	46%	100%	85%	-15%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.7 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	34%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	48%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	80%	100%	80%	-20%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
1.3.14 DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	100%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	55%	0%	100%	100%	FINALIZADO
1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	0%	100%	100%	FINALIZADO
1.3.30 DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	100%	0%	100%	100%	FINALIZADO
1.3.32 DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	0%	100%	0%	100%	100%	FINALIZADO
1.3.38 SUSPENSION DE SALIDA HIDRAULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	0%	100%	100%	FINALIZADO
1.3.49 DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	0%	100%	0%	100%	100%	FINALIZADO
1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	0%	50%	0%	50%	50%	EJECUTANDO ACTIVIDAD
3. IED ANTONIA SANTOS SEDE A						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.5 CERRAMIENTO PROVISIONAL	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.3.31 ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO

CIMENTACION						
2.2.9 PLACA CONTRAPISO DE 8 cm	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS						
3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4"	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
MAMPOSTERIA						
5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS						
7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
7.7.2 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
PAÑETES						
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
9.1.10 RESANES GENERALES	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
9.2.4 PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
PISOS						
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
10.2.12 CERAMICA 33 X 33	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
10.3.11 MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
CARPINTERIA METALICA						
12.2.2 INSTALACION CARPINTERIA METALICA	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
ENCHAPES						
14.1.2 ENCHAPE PARED 20 x 20	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
PINTURA						
18.1.3 ESTUCO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
18.4.10 PINTURA EPOXICA	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
CERRADURAS Y VIDRIOS						
19.1.4 CERRADURA SAFE ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
4. IED ANTONIA SANTOS SEDE B						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.1.3 CERRAMIENTO PROVISIONAL	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.8 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	0%	0%	100%	100%	0%	FINALIZADO
1.1.9 VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	0%	100%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
CIMENTACION						
2.1.4 EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRA	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMÚN	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.2.2 CONCRETO CICLOPEO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.2 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.3 GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.4 MALLA ELECTRSOLDADA ESTANDAR	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
2.3.6 GROUNTING CONCRETO FLUIDO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS						
3.1.4 TUBERÍA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3"	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
ESTRUCTURA						
4.3.7 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
MAMPOSTERIA						
5.2.7 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
5.3.1 ALFAJIAS LADRILLO PRENSADO	40%	0%	40%	0%	-40%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS						
7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
7.4.33 REGISTRO DE BOLA 200 Lb. - Ø 1/2"	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
7.7.2 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	0%	100%	100%	100%	0%	FINALIZADO
INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES						
8.1.2 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.3.1 TUBERIA PVC 1/2" INCRUSTADA	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.3.15 CABLEADO 1#10	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.3.18 CABLEADO 2#8	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.4.1 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
8.4.10 INTERRUPTOR DOBLE 200211	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
PISOS						
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
10.2.4 ADOQUIN ECOLÓGICO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
10.2.12 CERAMICA 33 X 33	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
CUBIERTAS						
11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
11.1.3 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
11.1.4 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
11.3.14 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
CARPINTERIA DE METALICA						
12.2.4 PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
12.2.10 VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)	100%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
16.1.9 GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
16.1.35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	0%	0%	100%	0%	-100%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
4. IED ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO						
PRELIMINARES						
1.1.1 CAMPAMENTO	14%	0%	14%	0%	-14%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD
1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	50%	0%	50%	0%	-50%	NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN POR COLEGIO

Institución Educativa	% Programado	% Programado Acumulado	% Ejecutado (fisico)	% Ejecutado (fisico Acomulado)	Atraso (-) o Adelanto (+)	Observaciones
Externado Nacional Camilo Torres	2,0%	18,0%	6,0%	19,7%	2%	Ejecutando Actividad
Policarpa Salavarrieta	4,0%	13,0%	8,8%	18,7%	6%	Ejecutando Actividad
Antonia Santos Sede A	19,0%	100%	41%	58%	-42%	se presentan atrasos a la programacion de inicio de actividades
Antonia Santos Sede B	18,0%	79%	20%	22%	-57%	se presentan atrasos a la programacion de inicio de actividades
Escuela Nacional De Comerio	1%	1%	0%	0%	-1%	No se han iniciado actividades
Antonio Jose Uribe	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades
Los Pinos	0%	0%	0%	0%	0%	No se han iniciado actividades

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

Se mantiene el constante seguimiento de los protocolos de bioseguridad al ingreso y durante el desarrollo de la jornada de trabajo.

Se solicita acceso de personal mano de obra a los Colegios

REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E.D. EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD









1.1.1 CAMPAMENTO



1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)



1.3.19 DEMOLICION PLACA MACIZA (INC. RETIRO DE SOBR.)



1.3.27 DESMONTE DE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)



1.3.32 DEMOLICION AFINADO DE PISO e=5 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)



1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES



TRASIEGO DE MATERIAL



ACOPIO DE MATERIALES

I.E.D. POLICARPA SALAVARRIETA

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD







1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS



1.3.7 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO



1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE



1.3.12 DEMOLICION PAÑETES



1.3.14 DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN



1.3.30 DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS



1.3.32 DEMOLICION AFINADOS DE PISO



1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES

IED ANTONIA SANTOS SEDE A

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD







1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE



1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES



2.2.9 PLACA CONTRAPISO



INSTALACION DE TUBERIA

IED ANTONIA SANTOS SEDE B

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD







1.1.3 CERRAMIENTO PROVISIONAL



1.1.9 VALLA INFORMATIVA



RETIRTO DE ADOQUIN



INSTALACION DE TUBERIA

ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA DIAZ

Nombre - Director Interventoría / Obra

Firma

ANEXO 3

BITÁCORAS DE CAMPO

a) I.E.D. CAMILO TORRES

Bitácora de campo
Interventoria

Contrato de interventoria.
No. CO1.PCCNTR.1680613

Contrato de Obra.
No. CO1.PCCNTR.1577780

IED CAMILO TORRES

Fecha.

Miercoles 2 de septiembre.

→ No se realizó actividad en obra.

Actividades preliminares.

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Jueves 3 de septiembre.

→ No se realizó actividad en obra.

Actividades preliminares.

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Viernes 4 de septiembre.

→ No se realizó actividad en obra.

Actividades preliminares.

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Sabado 5 de septiembre.

→ No se realizo actividad en obra.

Residente de Obra — Residente Interventoría

Domingo 6 de septiembre.

→ No laborable.

(Actividades preliminares)

Residente de Obra — Residente Interventoría

Lunes 7 de septiembre.

→ El contratista realizo recorrido con el personal de SST y Ambiental con acompañamiento de la interventoría

Actividades preliminares.

Residente de Obra — Residente Interventoría

Martes 8 de septiembre.

→ No se realizó ninguna actividad en obra.

Actividades preliminares.

Residente de Obra — Residente Interventoría.

Miercoles 9 de septiembre.

→ Día sabado.

→ 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector de interventoría

2 ayudantes.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura. y desinfección) estos se realizaron en el campamento de la obra y no al ingreso. de la misma.

se realiza la respectiva señalización de obra

se instala la valla informativa de licencia de construcción

se realiza el desmonte de 8 puertas metálicas

se realiza demolición manual con herramienta menor y al terminar la jornada se hacen labores de limpieza.

Residente de Obra — Residente de Interventoría

→ se realizan labores de limpieza en el área a intervenir.

Residente de Obra

Residente Interventoría.

Domingo 13 de septiembre.

→ No laborable.

Lunes 14 de septiembre.

→ Día soleado,

→ (1 residente de obra) 1 residente de interventoría, 1 inspecta de (obra), interventoría, 2 ayudantes, 1 maestro.

→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al todo el personal.

Se realiza demolición de muros divisorios, demolición de enchape perimetral, demolición de mesón cerrado.

se hace trasiego de material al sitio de acopio; Al finalizar la Jornada se realizan actividades de limpieza en el área a intervenir.

Residente de Obra

Residente Interventoría.

Martes 15 de septiembre.

→ Día nublado.

→ 1 residente de obra, 1 inpector de interventoría, residente interventoría, 2 ayudantes.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de obra a todo el personal.

→ se realiza trasiego de material hasta el sitio de acopio

se realiza demolición de pisos en baldosín y se encuentra doble enchape, se realiza demolición de pared perimetral.

Pisos (Cerámica-baldosín)

Residente de Obra

Residente Interventoría.

Jueves 10 de septiembre.

→ Dia nublado

→ 1 residente de Obra, 1 residente de interventoria, 1 inspector de interventoria 2 ayudantes.

→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección)

se realiza el cerramiento en lona en el area a intervenir.

se realizo demolición de muros costado occidente, se hace demolición de muros paneles prefabricados, se realizo y adecua el acopio de materiales al costado oriental del colegio y se desmontan 4 unidades de aparatos sanitarios.

se realizan labores de limpieza en el area a intervenir.

Residente de Obra

Residente Interventoria.

Viernes 11 de septiembre

→ Dia nublado

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección)

→ 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 2 ayudantes.

→ se realizo demolición de enchapes ceramicos perimetrales, desmonte de aparatos sanitarios y trasiego de material de demolicio al sitio de acopio.

se realizan labores de limpieza al terminar la jornada laboral.

Residente de Obra.

Residente Interventoria.

Sabado 12 de septiembre.

→ Dia sabado.

→ 1 residente de obra, 2 ayudantes, maestro de obra.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) a todo el personal.

→ Se realizo demolición de enchape ceramico perimetral, demolición de meson corrido, desmonte y retiro de 2 divisiones modulares, trasiego de material al sitio de acopio.

Miercoles 16 de septiembre.

→ Dia nublado

→ 1 residente de obra, 1 residente interventoria, 1 inspector de interventoria., 2 ayudantes. 1 maestro.

→ se realizan los respectivos: protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ se realiza demolicion de pañete perimetral, demolición de placa maciza, demolición de muro perimetial y columna en mampostera costado occidente, pregutas para verificación del estado de la tubería.

La columna en mampostería y el muro costado occidente se demolieron sin autorización de la interventoria, queda pendiente la justificación de esta actividad.

- Actas de vecindad: se le recuerda al Ingeniero residente de obra la importancia de realizar las actas de vecindad y que estas sean realizadas con urgencia.

Residente de obra

Residente de Interventoria.

Jueves. 17 de septiembre.

→ Dia nublado.

→ 1 Maestro, 1 inspector de interventoria, 2 ayudantes.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ se realiza trasiego de material de demolición al sitio de acopio.

se realizan actas de vecindad internas.

se instala manometro para verificar la presión de la tubería. Presión = 80 psi

se le solicita nuevamente al contratista el botiquin.

Residente de obra.

Residente de Interventoria.

Viernes 18 de septiembre.

→ Dia. nublado.

→ 1 Maestro, 1 Inspector de interventoria, 1 residente de interventoria, 2 ayudantes.

→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ Se realiza trasiego de material de demolición al sitio de acopio.
Se realiza demolición de placa maciza, demolición de piso y paneles perimetrales
- se presenta afección en la parte inferior del muro izquierdo costado oriente, en el momento de retirar la red existente de tubería - se contempla su demolición

Residente de obra — Residente de Interventoría.

Sabado 19 de septiembre.

→ Dia soleado.
→ 2 ayudantes, 1 maestro de obra.
→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.
→ A las 10:15 am se presenta un daño electrico, por parte de unos trabajadores externos del contrato, quedando el colegio sin servicio de luz.
Se realiza trasiego de material de demolición al sitio de acopio.
- Se realizo la adecuación del campamento de obra.

Residente de Obra — Residente de Interventoría.

Domingo 20 de septiembre.

→ No laborable.

Lunes 21 de septiembre.

→ Dia soleado.
→ 1 maestro, 3 ayudantes, 1 residente de obra
→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.
→ Re realiza demolición de piso y trasiego de material de demolición al sitio de acopio. Se Trabaja de 7:00 am hasta las 4:00 pm debido a las manifestaciones en la ciudad, se le solicita nuevamente al contratista el Botaquín.

Residente de Obra — Residente de Interventoría.

Martes 22 de septiembre.

→ Dia soleado.

→ 1 maestro, 1 inspector de interventoria, 3 ayudantes., 1 residente de obra

→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.

→ Se realiza demolición de piso, adecuación del campamento, instalación de cerramiento en el area de intervención y trasiego de material de demolición al sitio de acopio.

- El contratista manifiesta que se debe demoler por completo el muro (completo) costado occidente. ya que este se encuentra (tramado) tratado con el muro adyacente. - esto con el fin de garantizar su estabilidad.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

Miercoles 23 de septiembre.

→ Dia soleado.

→ 1 maestro, 1 inspector de interventoria, 4 ayudantes.

→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección al ingreso de la obra a todo el personal.

→ Se realiza demolición de piso con excavación. para dar nivel a este y verificar la tubería existente.

Durante la demolición del piso, se presento una ruptura en el tubo hidraulico. ubicado en la entrada del baño, se le da solución inmediata para evitar la fuga. de esta.

- Se realiza trasiego de material al sitio de acopio.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria

Jueves 24 de Septiembre.

→ Dia nublado

→ 1 residente de obra, 1 resinte de interventoria, 1 inspector de interventoria, 4 ayudantes

- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal

→ Se realizará demolición de piso con excavación para dar nivel a este y verificar la tubería existente.
Durante la demolición y excavación se encuentran 2 cajas, una de ellas sanitaria y la otra está en espera de ser destapada para verificar su uso.
se realizará demolición total del muro costado oriente.
Se realizó trasiego de material de demolición al sitio de acopio.
sobre las 3:00pm. se empieza a retirar material de escombro.
- se le solicitó al contratista que el material de demolición debe quedar organizado en el sitio de acopio.
- se le solicitó al contratista nuevamente el botiquín.

Residente de Obra.

Marcela Andrews
Residente de Interventoría.

Viernes 25 de septiembre.
→ Día nublado.
→ 1 inspector de interventoría, 1 residente de obra, 1 maestro, 1 ayudante.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Se realiza demolición restante del muro costado oriente.
Se realizó demolición y excavación de piso, trasiego de material de demolición al sitio de acopio.
Se realizó acopio y adecuación de material
Sobre las 3:00 pm. se empieza a retirar material de demolición.
-

Residente de Obra.

Marcela Andrews
Residente Interventoría.

Sábado 26 de septiembre.
→ Día soleado
→ 1 inspector de interventoría, 1 maestro, 2 ayudantes.
→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.

→ Se realizó demolición y excavación de piso.
- Se realizó desmonte de reja de ingreso. y desmonte de lamparas.

Residente de Obra. Residente de Interventoría.

Domingo 27 de septiembre.
→ No laborable

Lunes 28 de septiembre
→ Dia soleado
→ 1 inspector de interventoría, 1 ayudantes, 1 maestro
→ se realiza los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal,
- Se realizó demolición de cimientos encontrado.
Se realizo trasiego de material de demolición al sitio de acopio.

Residente de Obra Residente de Interventoría.

Martes 29 de septiembre.
→ Dia nublado.
→ 1 inspector de interventoría, 1 maestro, 3 ayudantes.
→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Se realizo retiro de tubería de desagüe existente y excavación de material de relleno
- Se realizo trasiego de material de demolición al sitio de acopio.
- Se realizo visita por parte de la SED por el Arquitecto Hugo Hidalgo.

Residente de Obra. Residente de Interventoría.

Miercoles 30 de septiembre.
→ Dia soleado.
→ 1 inspector de interventoría, 1 maestro, 1 ayudante.
→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal

→ Se realiza replanteo de ejes existentes.
→ Se realiza remoción de material de relleno.
- Se realiza traslado de material de demolición al sitio de acopio.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Jueves 1 de octubre.
→ Día soleado.
→ 1 inspector de interventoría, 1 maestro, 2 ayudantes
→ Se realizó los respectivos protocolos de bioseguridad. (Toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Se realiza excavación para nivelación de suelo.
- Se realiza regata para fundida de viga para muro lateral.
-

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

b) I.E.D. POLICARPA SALAVARRIETA

Bitácora de campo Interventoria.

Contrato de interventoria.
N. CO1.PCCNTR.1680613

Contrato de Obra
N. CO1.PCCNTR.1577780

IED
POLICARPA
SALAVARRIETA

Fecha

Miercoles 2 de septiembre.

→ No se realizó actividad en obra.
Actividades preliminares.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

Jueves 3 de septiembre.

→ No se realizó actividad en obra.
Actividades preliminares.

Residente de Obra. — Residente de Interventoría.

Viernes 4 de septiembre.

→ No se realizó actividad en obra.
Actividades preliminares.

Residente de Obra. — Residente de Interventoría.

Sabado 5 de septiembre.

→ No se realizó actividad en obra.
Actividades preliminares.

Residente de Obra. — Residente de Interventoría.

Domingo 6 de septiembre → No laboralde.

Lunes 7 de septiembre.

→ No se realizó actividad en obra.
Actividades preliminares.

Residente de Obra — Residente de Interventoría.

Martes 8 de septiembre.

→ No se realizó actividad en obra.
Actividades preliminares.

Residente de Obra. — Residente de Interventoría.

Sábado 12 de septiembre.

→ Día soleado.

→ 1 Maestro, 2 ayudantes, 1 inspector de interventoría.

→ Se realizaron los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) Se realizó demolición de muros divisorios del barrio de ninas y trasiego de material de demolición al sitio de acopio.

Al terminar actividades se realizó limpieza en el área de intervención.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Domingo 13 de septiembre → No laborable.

Lunes 14 de septiembre

→ Día soleado.

→ 1 residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, maestro de obra y 2 ayudante

→ se realizan los respectivos protocolos de (seguridad) bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) a todo el personal.

→ Se realizo demolición de 1 muro divisorio, demolición de enchape perimetral y trasiego de material al sitio de acopio.

Al terminar actividades se realizó limpieza en el área de intervención.
se le solicita nuevamente al contratista el Botiquín.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Martes 15 de septiembre.

→ Día nublado.

→ 1 inspector de interventoría, 1 maestro de obra, 2 ayudantes.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de obra a todo el personal.

→ se realizó demolición de enchape perimetral en el barrio de ninas y trasiego de material al sitio de acopio. Al terminar las actividades se realizó limpieza al sitio de intervención.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Sábado 12 de septiembre.

→ Día soleado.

→ 1 Maestro, 2 ayudantes, 1 inspector de interventoría.

→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) Se realiza demolición de muros divisorios del baño de niñas y trasiego de material de demolición al sitio de acopio.

Al terminar actividades se realiza limpieza en el área de intervención.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Domingo 13 de septiembre → No laborable.

Lunes 14 de septiembre

→ Día soleado.

→ 1 residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, maestro de obra y 2 ayudante

→ se realizan los respectivos protocolos de (seguridad) bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) a todo el personal.

→ Se realiza demolición de 1 muro divisorio, demolición de enchape perimetral y trasiego de material al sitio de acopio.

Al terminar actividades se realiza limpieza en el área de intervención.
se le solicita nuevamente al contratista el Botiquín.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Martes 15 de septiembre.

→ Día nublado.

→ 1 inspector de interventoría, 1 maestro de obra, 2 ayudantes.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de obra a todo el personal.

→ se realiza demolición de enchape perimetral en el baño de niñas y trasiego de material al sitio de acopio. Al terminar las actividades se realiza limpieza al sitio de intervención.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Sábado 12 de septiembre.

→ Día soleado.

→ 1 Maestro, 2 ayudantes, 1 inspector de interventoría.

→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) Se realiza demolición de muros divisorios del baño de niñas y trasiego de material de demolición al sitio de acopio.

Al terminar actividades se realiza limpieza en el área de intervención.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Domingo 13 de septiembre → No laborable.

Lunes 14 de septiembre

→ Día soleado.

→ 1 residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, maestro de obra y 2 ayudante

→ se realizan los respectivos protocolos de (seguridad) bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) a todo el personal.

→ Se realiza demolición de 1 muro divisorio, demolición de enchape perimetral y trasiego de material al sitio de acopio.

Al terminar actividades se realiza limpieza en el área de intervención.
se le solicita nuevamente al contratista el Botiquín.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Martes 15 de septiembre.

→ Día nublado.

→ 1 inspector de interventoría, 1 maestro de obra, 2 ayudantes.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de obra a todo el personal.

→ se realiza demolición de enchape perimetral en el baño de niñas y trasiego de material al sitio de acopio. Al terminar las actividades se realiza limpieza al sitio de intervención.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Sábado 19 de septiembre.

→ Día nublado.

→ 2 ayudantes 1 maestro., 1 inspector de interventoría.

→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ Se realiza demolición de piso en el baño de niños y trasiego de material al sitio de acopio, se realizan roqueteo para verificar la tiberia, se le solicita nuevamente al contratista el Botiquín.

Residente de Obra

Residente Interventoría.

Lunes 21 de septiembre.

→ Día soleado.

→ 1 maestro, 1 residente de obra, 2 ayudantes., 1 inspector de interventoría.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ Se realiza demolición de piso y sobrepiso del baño de niñas. Se realiza desmonte de sanitarios y orinales, y demolición de muros divisorios y trasiego de material al sitio de acopio. Se realiza limpieza al área de intervención, se le recuerda al contratista la elaboración de actas de vecindad.

se trabaja de 7:00 hasta las 4:00 pm debido a las manifestaciones en la ciudad.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Martes 22 de septiembre.

→ Día soleado

→ 1 Inspector de interventoría, 2 ayudantes.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ Se realiza demolición de muros divisorios del baño de niños, demolición de lavamos corrido, y trasiego de material de demolición al sitio de acopio.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Sábado 19 de septiembre.

→ Día nublado.

→ 2 ayudantes 1 maestro., 1 inspector de interventoría.

→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ Se realiza demolición de piso en el baño de niños y trasiego de material al sitio de acopio, se realizan roqueras para verificar la tubería, se le solicita nuevamente al contratista el Botiquín.

Residente de Obra

Residente Interventoría.

Lunes 21 de septiembre.

→ Día soleado.

→ 1 maestro, 1 residente de obra, 2 ayudantes., 1 inspector de interventoría.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ Se realiza demolición de piso y subepiso del baño de niñas.

Se realiza desmonte de sanitarios y orinales, y demolición de muros divisorios y trasiego de material al sitio de acopio. Se realiza limpieza al área de intervención, se le recuerda al contratista la elaboración de actas de vecindad.

se trabaja de 7:00 hasta las 4:00 pm debido a las manifestaciones en la ciudad.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Martes 22 de septiembre.

→ Día soleado

→ 1 Inspector de interventoría, 2 ayudantes.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ Se realiza demolición de muros divisorios del baño de niños, demolición de lavamos corrido, y trasiego de material de demolición al sitio de acopio.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Sábado 19 de septiembre.

→ Día nublado

→ 2 ayudantes 1 maestro., 1 inspector de interventoría.

→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ Se realiza demolición de piso en el baño de niños y trasiego de material al sitio de acopio, se realizan roqueas para verificar la tubería, se le solicita nuevamente al contratista el Retiro.

Residente de Obra

Residente Interventoría.

Lunes 21 de septiembre.

→ Día soleado.

→ 1 maestro, 1 residente de obra, 2 ayudantes., 1 inspector de interventoría.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ Se realiza demolición de piso y sobrepiso del baño de niñas. Se realiza desmonte de sanitarios y orinales, y demolición de muros divisorios y trasiego de material al sitio de acopio. Se realiza limpieza al área de intervención, se le recuerda al contratista la elaboración de actas de vecindad. se trabaja de 7:00am hasta las 4:00pm debido a las manifestaciones en la ciudad.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Martes 22 de septiembre.

→ Día soleado

→ 1 Inspector de interventoría, 2 ayudantes.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ Se realiza demolición de muros divisorios del baño de niños, demolición de lavamos corrido, y trasiego de material de demolición al sitio de acopio.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Miercoles. 23 de septiembre.

- Dia soleado - 1 maestro, 4 ayudantes.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.
- se realizó demolición de parrete perimetral en el baño de niñas.
se realizó demolicion de muros divisorios. en el baño de niños, demolición de piso y demolición de enchape perimetral.
- Se instala manómetro para verificar la presion de la tuberia.
se le solicitó al contratista. nuevamente el Botiquin.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

Jueves 24 de septiembre.

→ Ora. nublado.
→ 1 inspector de interventoria, 1 residente de obra, 1 maestro, 4 ayudantes.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.
- Sobre las 7:15 am se empieza a retirar material de escombro.
- Se realizó demolición de piso, y echape perimetral. y parrete en el baño de niños.
se realizó demolicion de parrete perimetral. en el baño de niñas.
se hace trasiego de material de demolición del baño de niñas y baño de niños.
Se realizó limpieza en el area de intervención.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

Viernes 25 de septiembre.

→ Ora nublado
→ 1 residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 maestro, 4 ayudantes.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Sobre las. 8:30 am. se empieza a retirar material de escombro.
- se presenta inconveniente. al ingreso de dos trabajadores del contratista. ya que el personal de seguridad manifiesta que no se encuentran registrados en los listados.

Miercoles. 23 de septiembre.

- Dia soleado - 1 maestro, 4 ayudantes.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.
- se realizó demolición de parete perimetral en el baño de niñas.
se realizó demolición de muros divisorios. en el baño de niños, demolición de piso y demolición de enchape perimetral.
- Se instala manómetro para verificar la presión de la tubería.
se le solicitó al contratista. nuevamente el Botiquín.

Residente de Obra.

Marcela Quintero S.
Residente de Interventoria.

Jueves 24 de septiembre.

→ Ord. nublado.
→ 1 inspector de interventoria, 1 residente de obra, 1 maestro, 4 ayudantes.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.
- Sobre las 7:15 am se empieza a retirar material de escombro.
- Se realiza demolición de piso, reachape perimetral. y parete en el baño de niños.
se realizó demolición de parete perimetral. en el baño de niñas.
se hace trasiego de material de demolición del baño de niñas y baño de niños.
se realizó limpieza en el area de intervención.

Residente de Obra.

Marcela Quintero S.
Residente de Interventoria.

Viernes 25 de septiembre.

→ Ora nublado
→ 1 residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 maestro, 4 ayudantes.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Sobre las. 8:30 am. se empieza a retirar material de escombro.
- se presenta inconveniente. al ingreso de dos trabajadores del contratista. ya que el personal de seguridad manifiesta que no se encuentran registrados en los listados.

Miercoles. 23 de septiembre.

- Dia soleado - 1 maestro, 4 ayudantes.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.
- se realizó demolición de pañete perimetral en el baño de niñas.
se realizó demolición de muros divisorios. en el baño de niños, demolición de piso y demolición de enchape perimetral.
- se instala manómetro para verificar la presión de la tubería.
se le solicita al contratista. nuevamente el Botiquin.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

Jueves 24 de septiembre.

→ Ord. nublado.
→ 1 inspector de interventoria, 1 residente de obra, 1 maestro, 4 ayudantes.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.
- Sobre las 7:15 am se empieza a retirar material de escombro.
- Se realiza demolición de piso, enchape perimetral. y pañete en el baño de niños.
se realiza demolición de pañete perimetral. en el baño de niñas.
se hace trasiego de material de demolición del baño de niñas y baño de niños.
se realiza limpieza en el area de intervención.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

Viernes 25 de septiembre.

→ Ora nublado
→ 1 residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 maestro, 4 ayudantes.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra d todo el personal.
- Sobre las. 8:30 am. se empieza a retirar material de escombro.
- se presenta inconveniente. al ingreso de dos trabajadores del contratista. ya que el personal de seguridad manifiesta que no se encuentran registrados en los listados.

→ Se realizó demolición de pared perimetral en el baño de niñas y baño de niño
- Se realizó demolición de placa maciza del baño de niñas y baño de niños.
Se realizó demolición de enchape del baño de niños.

Residente de Obra — Residente Interventoría.

Sábado 26 de septiembre.
→ Día soleado
- 1 inspector de interventoría, 1 maestro, 4 ayudantes.
→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Se realizó el desmonte de 4 ventanas metálicas.
Se realiza demolición de enchape perimetral del baño de niñas.
Se realiza demolición de pared perimetral del baños de niñas y de niño
Se realiza demolición de placa maciza.
Se hace trasiego de material de demolición al sitio de acopio

Residente de Obra. — Residente Interventoría.

Domingo. 27 de septiembre.
→ No laborable.

Lunes 28 de septiembre.
→ Día soleado
→ 1 inspector de interventoría, 1 maestro, 3 ayudantes.
→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- se realizó demolición de pared perimetral y enchape perimetral del baño de niños.
- se realizó trasiego de material de demolición al sitio de acopio.

Residente de Obra — Residente Interventoría.

Martes 29 de septiembre.

→ Día nublado

→ 1 inspector de interventoría, 1 maestro, 2 ayudantes.

- se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección al ingreso de la obra a todo el personal.
- se realiza traslado de material de demolición al sitio de acopio.
- se realiza replanteo de cajas existentes. para verificar su funcionamiento.
- se realiza demolición de pared perimetral y enchape perimetral.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Miercoles 30 de septiembre.

→ Día soleado

→ 1 inspector de interventoría, 1 maestro, 1 ayudante.

- se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección al ingreso de la obra a todo el personal.
- se realiza replante de cajas existentes en los baños.
- se realiza retiro de tubería existente.
- se realiza traslado de material de demolición al sitio de acopio.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Jueves 1 de octubre.

→ Día soleado.

→ 2 ayudantes, 1 maestro, 1 inspector de obra.

- se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal
- se realizan 2 viajes de volqueta, para el retiro de material de demolición.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

c) I.E.D. ANTONIA SANTOS SEDE A

Bitácora de campo

Interventoria.

Contrato de interventoria
No. Col. PCCNTR. 1680613

Contrato de Obra.
No. Col. PCCNTR. 1577780

IED ANTONIA SANTOS
Sede A

Fecha

Miercoles 2 de septiembre.

→ No se realizo actividad en obra.
Actividades preliminares.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Jueves 3 de septiembre.

→ No se realizo actividad en Obra.
Actividades preliminares.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

Viernes 4 de septiembre.

→ No se realizo actividad en Obra.
Actividades preliminare.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

Sabado 5 de septiembre.

→ No se realizo actividad en Obra.
Actividades preliminares.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

Domingo 6 de septiembre.

→ No laborable.

Lunes 7 de septiembre.

→ No se realizo actividad en obra.
Actividades preliminares.

Residente de Obra.

Residente Interventoria.

Martes 8 de septiembre.

→ No se realizo actividad en Obra.
Actividades preliminares.

Residente de Obra

Residente Interventoria.

Miercoles 9 de septiembre.

→ No se realizo actividad en Obra.

Actividades preliminares.

Residente de Obra. Residente Interventoria.

Jueves 10 de septiembre.

→ No se realizo actividad en obra.

Actividades preliminares.

Residente de Obra. Residente Interventoria.

Viernes 11 de septiembre.

→ No se realizo actividad en obra.

Actividades preliminares.

Residente de obra. Residente Interventoria.

Sabado 12 de septiembre.

→ No se realizo actividad en obra.

Actividades preliminares.

Residente de Obra. Residente Interventoria.

Domingo 13 de septiembre.

→ No laborable.

Lunes 14 de septiembre.

→ No se realizo actividad en obra.

Actividades preliminares.

Residente de Obra. Residente Interventoria

Martes 15 de septiembre.

→ No se realizo actividad en obra.

Actividades preliminares.

Residente de Obra. Residente Interventoria.

Miercoles. 16 de septiembre.

→ se realiza la respectiva señalización de obra y adecuación de campamento provicional

Residente de Obra — Residente Interventoria.

Jueves 17 de septiembre.

→ Dia soleado.

→ 1 inspector de interventoria, 1 maestro, 2 ayudantes, 1 residente de obra.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra. de todo el personal.

- Se instala la valla informativa de licencia de construcción.

se realiza escarificado de superficie en concreto.

se realiza (regolta) retiro de adoquín y regolta al exterior del shut.

Se le solicita al contratista el Botiquín.

Residente de obra — Residente de Interventoria.

Viernes 18 de septiembre.

→ Dia nublado.

→ 1 residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 2 ayudantes.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra. de todo el personal.

→ se realiza cerramiento en lona. al area de intervención

se realiza regolta al interior del shut para instalación de tuberia de descarga

se hace desinstalación de puerta de ingreso existente.

Se realiza demolición de muro en bloque.

Se le solicita nuevamente al contratista el Botiquín.

Residente de Obra — Residente de Interventoria.

Sabado 19 de septiembre,

→ No se realizo actividad en obra.

Residente de obra. — Residente de Interventoria.

Domingo. 20 de septiembre.

→ No laborable.

Lunes 21 de septiembre.

→ Dia soleado.

→ Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra. de todo el personal.

→ se realizo (regular) desinstalación de adoquin para regular. al exterior del shut. de basuras.

- Instalación de tubería de desagüe (e hidraulica).
- se trabaja de 7:00am hasta las 4:00pm debido a las manifestaciones en la ciudad

Residente de Obra.

Residente de Interventoria

Martes 22 de septiembre.

→ Dia soleado.

→ se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

→ Se realiza instalación de tubería de desagüe y tubería hidraulica.

- Se realizo regular al interior del shut de basuras.
- Se realiza reinstalación de adoquin.
- se le solicita nuevamente al contratista el Botaquin.

Residente de obra.

Residente de Interventoria.

Miercoles. 23 de septiembre.

→ No se realizo actividad en obra.

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

Jueves 24 de septiembre.

→ No se realizo actividad en obra.

- se le solicita nuevamente al contratista el Botaquin

Residente de Obra

Residente de Interventoria.

Viernes 25 de septiembre.

- Dia nublado.

- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.
- No se realiza actividad en obra.

Residente de Obra. Residente Interventoria

de.

Sabado 26 de Septiembre.

- Dia soleado
- 1 maestro, 2 ayudantes, 1 inspector de interventoria.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.
- Se realizo Fundida de la placa en concreto reforzado para la adecuación del shut.

Residente de Obra. Residente de Interventoria.

Domingo 27 de septiembre.

→ No laborable.

Lunes 28 de septiembre.

- No se realiza actividad en obra.

Residente de Obra. Residente Interventoria

Martes 29 de septiembre.

→ Dia nublado. - 1 inspector de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante.

- se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.
- Se realiza limpieza en el area de intervención.
- Se realizo visita por parte de la SED, el supervisor y Arquitecto Hugo Tibaquir

Residente de Obra. Residente de Interventoria.

Miercoles 30 de septiembre.

→ No se realizo actividad endural.

Residente de Obra

Parcela Quintero
Residente Interventor

Jueves 01 de octubre.

→ Dia soleado

→ 2 ayudantes, 1 maestro, 1 inspector de interventoria.

-Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra de todo el personal.

se realiza escarificado de paretes.

Residente de Obra.

Parcela Quintero
Residente de Interventoria.

d) I.E.D. ANTONIA SANTOS SEDE B

Bitácora de campo Interventoria.

Contrato de interventoria N. C01. PCCNTR.1680613

Contrato de Obra. N. C01. PCCTR. 1577780

IED ANTONIA SANTOS

Sede B

Fecha.

Miercoles 2 de septiembre.

→ No se realizo actividad en dora.

- Se encuentra en fase de estudio el diseño para la construcción del cuarto requerido.

Residente de Obra. | Residente de Interventoria.

Jueves 3 de septiembre.

→ No se realizo actividad en dora.

- Se encuentra en fase de estudio el diseño para la constiucción del cuarto requerido.

Residente de Obra | Residente de Interventoria

Viernes 4 de septiembre.

→ No se realizo actividad en dora.

- Se encuentra en fase de estudio el diseño para la constiucción del cuarto requerido.

Residente de Obra. | Residente de Interventoria.

Sabado 5 de septiembre.

→ No se realizo actividad en dora.

- Se encuentra en fase de estudio el diseño para la constiucción del cuarto requerido.

Residente de Obra | Residente de Interventoria.

Domingo. 6 de septiembre. → Dia no laborable.

Lunes 7 de septiembre.

→ No se realizo actividad en dora.

- Se encuentra en aprobación el diseño para la constiucción del cuarto requerido.

Residente de Obra | Residente de Interventoria.

Martes. 8 de septiembre.

→ No se realizó actividad en obra.

- Se encuentra en aprobación el diseño para la construcción del cuarto requerido

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miercoles 9 de septiembre.

→ No se realizó actividad en obra

- Se encuentra en aprobación el diseño para la construcción del cuarto requerido.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Jueves 10 de septiembre.

- No se realizó actividad en obra.
- se encuentra en aprobación el diseño para la contrucción del cuarto requerido.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 11 de septiembre.

- No se realizó actividad en obra
- se encuentra en aprobación el diseño para la contrucción del cuarto requerido.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Sabado. 12 de septiembre.

- No se realizó actividad en obra.
- Se encuentra en aprobación el dueño para la construcción del cuarto requerido

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 13 de septiembre.

→ No laborable.

Lunes 14 de septiembre.

- No se realiza actividad en obra.
- Se encuentra en aprobación el diseño para la construcción del cuarto requerido

Residente de Obra.

Residente Interventoría.

Martes 15 de septiembre.

- No se realiza actividad en obra.
- Se encuentra en aprobación el diseño para la construcción del cuarto requerido.

Residente de Obra.

Residente Interventoría

Miercoles 16 de septiembre.

- No se realiza actividad en obra.
- Se encuentra en aprobación el diseño para la construcción del cuarto requerido

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Jueves 17 de septiembre.

- No se realiza actividad en obra.
- Se encuentra en aprobación el diseño para la construcción del cuarto requerido.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

Viernes 18 de septiembre.

- No se realiza actividad en obra.
- Se encuentra en aprobación el diseño para la construcción del cuarto requerido.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Sabado 19 de septiembre

- Dia soleado
- 2 ayudantes, 1 maestro.
- Se realiza la adecuación del campamento de obra.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Domingo 20 de septiembre.

- No laborable.

Lunes 21 de septiembre.

- No se realiza actividad en obra
- Ya se tiene la aprobación del diseño para inicio de actividades, pero queda por definir la altura final del cuarto.
-

Residente de Obra

Residente Interventoria.

Martes 22 de septiembre.

No se realiza actividad en obra

- Ya se tiene la aprobación del diseño para inicio de actividades pero queda por definir la altura final del cuarto.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Miercoles 23 de septiembre.

- No se realiza actividad en obra.
- Ya se tiene la aprobación del diseño para inicio de actividades pero queda por definir la altura final del cuarto

Residente de obra

Residente Interventoria.

Jueves 24 de septiembre.

- Día nublado.
- 1 residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 maestro, 2 ayudantes.
- → se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Se realiza cerramiento en lona en el área a intervenir.
- se realiza retiro de adoquín en el área total de intervención.

Residente de Obra

Residente Interventoría.

Viernes 25 de septiembre.

- → Día nublado.
- → 1 residente de obra, 1 residente de Interventoría, 1 inspector de interventoría 1 maestro, 2 ayudantes.
- → se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Se realiza excavación de piso.
- se realiza regata para ubicación existente de tubería de desagüe.

Residente de Obra.

Residente Interventoría.

Sábado 26 de septiembre.

- → Día soleado.
- → 2 ayudantes. 1 maestro
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Se realiza nivelación del piso al área de intervención.
- Se instala la tubería de desagüe y tubería hidráulica.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Domingo 27 de septiembre.

- → No laborable.

Lunes 28 de septiembre.

→ No se realiza actividad en obra.

Residente de Obra.

Marcela Jaramillo
Residente de Interventoría.

Martes 29 de septiembre.

- Día nublado
- 1 inspector de interventoría, 1 maestro, 1 ayudante.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad. (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Se realiza figurado de acero para armar el refuerzo de la perimetral.
- se realiza limpieza en el área a intervenir.
- Se realiza visita de obra por el Arquitecto Hugo Tibaquirá.

Residente de obra.

Marcela Jaramillo
Residente de Interventoría.

Miercoles 30 de septiembre.

- Día soleado.
- 1 Inspector de interventoría, 1 maestro, 2 ayudantes.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Se realiza armado del refuerzo de la perimetral.

Residente de Obra.

Marcela Jaramillo.
Residente de Interventoría.

Jueves 01 de octubre.

- Día soleado
- 1 inspector de interventoría.
- Se realizan los respectivos protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección) al ingreso de la obra a todo el personal.
- Se realiza fundida de viga perimetral para polarca.

Residente de Obra

Marcela Jaramillo.
Residente de Interventoría.

e) I.E.D. ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO

Bitácora de campo Interventoría

Contrato de interventoría.
No. 001. PCCNTR. 1680613

Contrato de Obra.
N. 001. PCCNTR. 1577780

IED

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO

25 de septiembre. - Viernes.

→ No se realizo actividad en obra

Residente de Obra

Residente Interventoria

26 de septiembre. - sabado.

→ No se realizo actividad en obra

Residente de Obra.

Residente Interventoria.

27 de septiembre. → No laborable.

28 de septiembre. - Lunes.

→ No se realizo en dia.

Residente de Obra.

Residente Interventoria.

29 de septiembre. - Martes.

→ Dia nublado.

· El contratista realizo la debida señalizacion de dia.

Residente de Obra

Residente Interventoria.

30 de septiembre - Miercoles.

→ Dia soleado.

→ 1 inspector de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante.

· Se le recuerda al contratista que debe cumplir con los protocolos de bioseguridad

- se realiza aplicacion del campamento de dia.

· se inicia demolicion de muros divisorios.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Jueves 1 de octubre

→ Día soleado.

→ 1 inspector de interventoría. 3 ayudantes.

→ Se le recuerda al contratista que debe cumplir con los protocolos de bioseguridad

→ Se le recuerda al contratista la instalación de la valla de licencia de construcción.

→ Se finaliza la adecuación del campamento de obra.

- Se realiza demolición de muros divisorios.
- Se realiza demostración de enchape.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Viernes 2 de octubre.
