San Martín de los Llanos (Meta), 5 de diciembre de 2025

INFORME MENSUAL DE OBRA.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO
NÚMERO CONTRATO:	2299 - 2025
CLASE DE INFORME	INFORME MENSUAL
INFORME NUMERO	1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META.
NOMBRE Y NIT CONTRATISTA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN – SAN MARTIN DE LOS LLANOS, META CODIGO No. 95122300
VALOR TOTAL:	DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS ($2.450.000.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 MESES Y 25 DIAS
FECHA DE INICIO:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026
PRORROGA	N/A
ADICION	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A

2. PRESUPUESTO OFICIAL

A. PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ 5.761.622
2	ESTUDIOS DE SUELO	$ 11.523.245
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$ 21.606.084
4	DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO	$ 43.212.473
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ 21.606.084
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	$ 11.523.245
7	DISEÑO RED DE INCENDIO	$ 0
8	DISEÑO DE RED DE GAS	$ 2.880.812
9	DISEÑO ELECTRICO E LUMINACIÓN	$ 17.284.867
10	DISEÑO VOZ Y DATOS	$ 0

11	DISEÑO MECÁNICO Y BIOCLIMATICO	$ 0
12	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 8.642.434
13	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 5.787.115
14	OTROS	$ 0
TOTAL PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 149.827.981**

B. PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 84.123.457
TOTAL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 84.123.457**

C. PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
1	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA CUBIERTA. -AREA POLIVALENTE MULTIPROPÓSITO - EDIFICIO DE SERVICIOS	M2	312.5	$ 3.929.715	$ 1.228.035.972
2	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA DESCUBIERTA - GIMNASIO BIOSALUDABLE - PISTA DE TROTE - URBANISMO	M2	803.5	$ 732.561	$ 588.613.272
3	CERTIFICACIONES			$ 13.440.542	$ 13.440.542
4	IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO			$ 16.794.504	$ 16.794.504
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					**$ 1.846.883.748**

D. PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	INTERVENTORIA DE OBRA	$ 369.164.814
TOTAL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA		**$ 369.164.814**

TOTAL PRESUPUESTO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 149.827.981**
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 84.123.457**
VALOR PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 1.846.883.748**
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA	**$ 369.164.814**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 2.450.000.000**

3. AVANCE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2299 DE 2025

CONTRATOS DERIVADOS:

Durante el tiempo transcurrido en el presente periodo de informe mensual la entidad no tenía aún contratos derivados publicados en la página de compras del municipio.

AVANCE FISICO	CONVENIO 2299 - 2025
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.450.000.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	0%

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO.

Para el presente informe comprendido en el periodo de ejecución desde el 6 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre del 2025 no se ha iniciado la ejecución de actividades contractuales, debido a que la administración se encuentra en la etapa de estructuración de pliegos y demás documentos precontractuales, realizando el análisis técnico, jurídico y financiero del proceso con el fin de adelantar la contratación conforme a la normatividad vigente y proceder a su publicación en SECOP.

5. SOPORTES DE PAGO.

Para el presente informe comprendido en el periodo de ejecución desde el 6 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre del 2025, no se ha realizado ningún pago por parte del ENTE TERRITORIAL debido a que el convenio aún se encuentra en la fase precontractual.

6. OBJETIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

Está diseñado para promover actividades lúdicas, pedagógicas y de integración social y ciudadana a través de espacios facilitadores del desarrollo de la convivencia comunitaria fortaleciendo el conocimiento y proporcionando información específica sobre oportunidades, desafíos y ofertas en áreas como; salud, ambiente, sustentabilidad, cultura y deporte. De igual forma se configurará como un epicentro que conecta a las comunidades con facilitadores del diálogo, defensores de derechos humanos y gestores cívicos de convivencia buscando una plena integración y convivencia de ciudadana.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.

A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, se concluye que no se ha realizado la contratación del personal de mano de obra debido a que no se ha dado inicio de actividades contractuales, ya que el convenio se encuentra en la etapa de estructuración de documentos.

8. GARANTÍAS.

La póliza que ampara el convenio de la referencia fue revisada y confrontada con las estipulaciones contractuales y disposiciones legales, ajustándose a ellas en cuanto al objeto, cuantía, plazo, valor asegurado, beneficiario, tomador, vigencias y amparos, las cuales se describen a continuación

RIESGOS AMPARADOS	VR. ASEG.	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 490.000.000,00	07/11/2025 – 31/01/2027

9. RELACIÓN DE PERSONAL

A la fecha no se cuenta con un equipo consultor y operativo ni interventor debido a que no se ha iniciado la ejecución de actividades contractuales.

10. INFORME FINANCIERO DEL CONVENIO A LA FECHA.

El siguiente es el balance financiero de ejecución del convenio, correspondiente al periodo comprendido entre el seis (06) de noviembre y el treinta (30) de noviembre de 2025. Teniendo en cuenta que se encuentra en fase de estructuración de pliegos y demás documentos precontractuales, para el estado actual del informe financiero el primer desembolso se encuentra en estado de solicitud con fecha del 25 de noviembre del 2025.

Así mismo, se deja constancia que por medio del decreto municipal N° 142 de 2025 del 24 de noviembre de 2025 se efectuó la adición al presupuesto de rentas, ingresos, recursos de capital y gastos de inversión. Los recursos fueron incorporados tanto en el presupuesto de ingresos como en el presupuesto de gastos de inversión, para la ejecución del convenio identificado **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADAN "PAZ A LO BIEN" EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2299 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADAN, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META** con código **BPIN 202500000042906.**

CONCEPTO	VALOR	%
PRIMER DESEMBOLSO PENDIENTE	$ 857.500.000,00	35
SALDO POR DESEMBOLSAR	$ 1.592.500.000.00	65
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00	100

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
		0	0





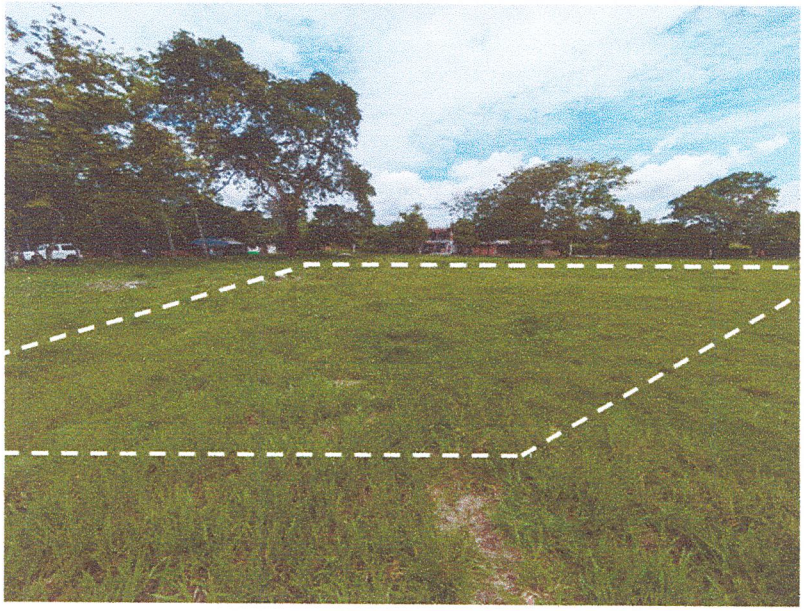


Ilustración 1. Estado actual del convenio.

OBSERVACIONES

Debido a que el convenio se encuentra aún en fase precontractual no se ha realizado intervención en el sector, por ende, su porcentaje de ejecución física es 0%.

12. CONCLUSIÓN.

Se concluye que el Convenio Interadministrativo No. 2299 de 2025 se encuentra en fase precontractual, sin ejecución de los contratos derivados, toda vez que durante el periodo reportado no se han iniciado las actividades contractuales previstas.

Lo anterior obedece a que la Administración Municipal se encuentra adelantando la estructuración de los pliegos y demás documentos precontractuales, así como el análisis técnico, jurídico y financiero conforme a la normatividad vigente y a los principios que rigen la contratación estatal.

En consecuencia, no se presentan avances de ejecución física ni financiera toda vez que no se ha ejecutado a la fecha contratos derivados del presente convenio, quedando pendiente el inicio formal de las actividades contractuales una vez culminada la etapa precontractual y surtidos los trámites correspondientes para la contratación y ejecución del contrato de llave en mano y del contrato de interventoría.

JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Obras Publicas
Alcaldía de San Martín de los Llanos

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
V°B°: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Públicas	
Revisó: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Públicas	
Elaboró: Ing. Andrés Felipe Mosquera Castro	Profesional de apoyo obras públicas C.P.S.	

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2299 DE 2025

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META

INFORME FINANCIERO DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, META

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META.

CUENTA (AHORROS) No 357-40273-4 **DEL BANCO:** **BANCO DE BOGOTA**

VALOR CONVENIO $ 2.450.000.000,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2.450.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0,00

	FECHA DE GIRO	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 1	$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 2	$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 3	$ 0,00
	GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 0,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) $ 0,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON
TOTAL CONTRATADO					

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL	AFECTACION + RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
	$ -
	$ -
TOTAL (3)	$ 0,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (0)	$ 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (1)	$ 0,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 0,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	$ 0,00

Observacion: Para el presente informe se manifiesta qué por no haber ningún deposito de dinero, la cuenta creada para el manejo de los recursos no generó rendimientos y tampoco generó extracto bancario.

DENNY ALMEIDA ARBOLEDA
Directora Administrativa de Tesorería

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

LA GERENCIA DE BANCA OFICIAL META – 1533

CERTIFICA QUE:

MUNICIPIO SAN MARTIN DE Los LLANOS identificado con NIT 892.099.548-6 está vinculado con el BANCO DE BOGOTA, titular de la cuenta de ahorros número 357-40273-4 denominada:
MUNICIPIO SAN MARTIN DE Los LLANOS ESTUDIO Y DISEÑOS CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANIA PAZ A LO BIEN aperturada el día 01 de noviembre de 2025 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha

Para constancia de lo anterior, se firma en Villavicencio a los primer (01) días del mes de noviembre de 2025

Atentamente,

MARY LUZ ROJAS GAMBOA
Gerente Banca Oficial Meta
317 3832757
Mroja41@bancodebogota.com.co

San Martín de los Llanos (Meta), 16 de enero de 2026

INFORME MENSUAL DE OBRA.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO
NÚMERO CONTRATO:	2299 - 2025
CLASE DE INFORME	INFORME MENSUAL
INFORME NUMERO	2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META.
NOMBRE Y NIT CONTRATISTA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN – SAN MARTIN DE LOS LLANOS, META CODIGO No. 95122300
VALOR TOTAL:	DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS ($2.450.000.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 MESES Y 25 DIAS
FECHA DE INICIO:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026
PRORROGA	N/A
ADICION	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A

2. PRESUPUESTO OFICIAL

A. PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ 5.761.622
2	ESTUDIOS DE SUELO	$ 11.523.245
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$ 21.606.084
4	DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO	$ 43.212.473
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ 21.606.084
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	$ 11.523.245
7	DISEÑO RED DE INCENDIO	$ 0
8	DISEÑO DE RED DE GAS	$ 2.880.812
9	DISEÑO ELECTRICO E LUMINACIÓN	$ 17.284.867
10	DISEÑO VOZ Y DATOS	$ 0
11	DISEÑO MECÁNICO Y BIOCLIMATICO	$ 0
12	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 8.642.434
13	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 5.787.115

14	OTROS	$ 0
TOTAL PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 149.827.981**

B. PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 84.123.457
TOTAL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 84.123.457**

C. PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
1	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA CUBIERTA. -AREA POLIVALENTE MULTIPROPÓSITO - EDIFICIO DE SERVICIOS	M2	312.5	$ 3.929.715	$ 1.228.035.972
2	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA DESCUBIERTA - GIMNASIO BIOSALUDABLE - PISTA DE TROTE - URBANISMO	M2	803.5	$ 732.561	$ 588.613.272
3	CERTIFICACIONES			$ 13.440.542	$ 13.440.542
4	IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO			$ 16.794.504	$ 16.794.504
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					**$ 1.846.883.748**

D. PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	INTERVENTORIA DE OBRA	$ 369.164.814
TOTAL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA		**$ 369.164.814**

TOTAL PRESUPUESTO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 149.827.981**
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 84.123.457**
VALOR PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 1.846.883.748**
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA	**$ 369.164.814**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 2.450.000.000**

3. AVANCE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2299 DE 2025

CONTRATOS DERIVADOS:

Durante el tiempo transcurrido en el presente periodo de informe mensual la entidad publicó en la página de compras SECOP II el proceso de llave en mano en la modalidad Licitación Pública N° 002 de 2025 cuyo objeto es: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META[1].

no tenía aún contratos derivados publicados en la página de compras del municipio.

AVANCE FISICO	CONVENIO 2299 - 2025
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.450.000.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	0%

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO.

Para el presente informe comprendido en el periodo de ejecución desde el 1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre del 2025 no se ha iniciado la ejecución de actividades contractuales, a la fecha, la administración ya cuenta con la publicación de los pliegos y demás documentos precontractuales en la página de compras del municipio SECOP II conforme a la normatividad vigente. Adicionalmente, durante el periodo mencionado se llevó a cabo actividades necesarias y previas para el inicio del mismo, tales como el alistamiento del terreno, que incluyó labores de limpieza, despeje de capa vegetal y verificación de las condiciones físicas del área de intervención, así como la identificación de accesos y delimitación del área del proyecto, con el fin de garantizar que el predio se encuentre en condiciones adecuadas para el inicio de las actividades constructivas una vez se formalicen los contratos correspondientes.

5. SOPORTES DE PAGO.

Para el presente informe comprendido en el periodo de ejecución desde el 1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre del 2025, no se ha realizado ningún pago por parte del ENTE TERRITORIAL debido a que el convenio aún se encuentra en la fase precontractual.

6. OBJETIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

Está diseñado para promover actividades lúdicas, pedagógicas y de integración social y ciudadana a través de espacios facilitadores del desarrollo de la convivencia comunitaria fortaleciendo el conocimiento y proporcionando información específica sobre oportunidades, desafíos y ofertas en áreas como; salud, ambiente, sustentabilidad, cultura y deporte. De igual forma se configurará como un epicentro que conecta a las comunidades con facilitadores del diálogo, defensores de derechos

humanos y gestores cívicos de convivencia buscando una plena integración y convivencia de ciudadana.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.

A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, se concluye que no se ha realizado la contratación del personal de mano de obra debido a que no se ha dado inicio de actividades contractuales, ya que el convenio se encuentra en la etapa de estructuración de documentos.

8. GARANTÍAS.

La póliza que ampara el convenio de la referencia fue revisada y confrontada con las estipulaciones contractuales y disposiciones legales, ajustándose a ellas en cuanto al objeto, cuantía, plazo, valor asegurado, beneficiario, tomador, vigencias y amparos, las cuales se describen a continuación

RIESGOS AMPARADOS	VR. ASEG.	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 490.000.000,00	07/11/2025 – 31/01/2027

9. RELACIÓN DE PERSONAL

A la fecha no se cuenta con un equipo consultor y operativo debido a que no se ha iniciado la ejecución de actividades contractuales. El convenio se encuentra en estado precontractual.

10. INFORME FINANCIERO DEL CONVENIO A LA FECHA.

El siguiente es el balance financiero de ejecución del convenio, correspondiente al periodo comprendido entre el primero (01) de diciembre y el treinta y uno (31) de diciembre de 2025. Teniendo en cuenta que los pliegos y demás documentos precontractuales se encuentran ya publicados en la página de compras del municipio SECOP II, únicamente se ha realizado el desembolso primero valor justificado con fecha de desembolso del 26 de diciembre del 2025.

Así mismo, se deja constancia que por medio del decreto municipal N° 142 de 2025 del 24 de noviembre de 2025 se efectuó la adición al presupuesto de rentas, ingresos, recursos de capital y gastos de inversión. Los recursos fueron incorporados tanto en el presupuesto de ingresos como en el presupuesto de gastos de inversión, para la ejecución del convenio identificado **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADAN "PAZ A LO BIEN" EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2299 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADAN, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META** con código **BPIN 202500000042906.**

CONCEPTO	VALOR	%
PRIMER DESEMBOLSO REALIZADO	$ 857.500.000,00	35
SALDO POR DESEMBOLSAR	$ 1.592.500.000.00	65
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00	100

En la cuenta aperturada para los desembolsos del convenio 2299 de 2025 se tienen los siguientes valores:

Fecha	Concepto	Descripción del Movimiento	Valor	Saldo
Viernes, 26 de diciembre de 2025	Primer desembolso	Cr. Ach. Dir. Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio Del Inter	$ 857.500.000,00	$ 857.500.000,00
Martes, 30 de diciembre de 2025	Rendimientos generados por el primer desembolso	interés remuneración especial	$ 300.114,00	$ 857.800.114,00

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	Alistamiento del terreno.	0	0




Ilustración 1. Condición inicial del convenio.

OBSERVACIONES
Se realiza el registro fotográfico de la condición inicial, con el fin de realizar una secuencia de las actividades previas para el inicio de obra, iniciando por el alistamiento del terreno.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	Alistamiento del terreno.	0	0



Ilustración 2. Alistamiento del terreno para previo inicio de actividades contractuales.

OBSERVACIONES
Se efectúa el registro fotográfico de las actividades correspondientes al alistamiento y preparación del terreno, las cuales constituyen las labores preliminares previas al inicio de la ejecución de la obra.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	PRELIMINARES	EJECUTADO	%
	Alistamiento del terreno.	0	0



Ilustración 3. Alistamiento del terreno para previo inicio de actividades contractuales.

OBSERVACIONES
Se efectúa el registro fotográfico de las actividades correspondientes al alistamiento y preparación del terreno, las cuales constituyen las labores preliminares previas al inicio de la ejecución de la obra.

12. CONCLUSIÓN.

Se concluye que el Convenio Interadministrativo No. 2299 de 2025 se encuentra en fase inicial, sin ejecución física a la fecha, toda vez que durante el periodo reportado no se han iniciado las actividades contractuales previstas.

Lo anterior obedece a que la Administración Municipal se encuentra en fase precontractual ya con los pliegos y demás documentos publicados en la página SECOP, todo lo anterior para dar inicio con la siguiente fase del convenio, conforme a la normatividad vigente y a los principios que rigen la contratación estatal.

En consecuencia, no se presenta avances de obra durante el periodo evaluado, quedando pendiente el inicio formal de las actividades contractuales una vez culminada la etapa precontractual y surtidos los trámites correspondientes para la contratación y ejecución del objeto del convenio. Sin embargo, se realiza la ejecución de actividades previas como el alistamiento del terreno, con el fin de dejar el proyecto en condiciones adecuadas para el inicio de la fase constructiva una vez se formalicen los contratos.

JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía de San Martín de los Llanos

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
V°B°: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Públicas	
Revisó: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Públicas	
Elaboró: Ing. Andrés Felipe Mosquera Castro	Profesional de apoyo obras públicas C.P.S.	

Anexos:

1. Cuatro (4) folios: certificación de presupuesto de incorporación al presupuesto municipal, certificado de tesorería de cuenta bancaria y rendimientos, estrato y saldo bancarios.
2. Un (1) Folio: Evidencia entrega informes de supervisión y financieros correspondientes a noviembre y diciembre del año 2025.

LA SUSCRITA DIRECTORA FINANCIERA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que los recursos provenientes del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2299 de 2025, celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de San Martín de los Llanos – Meta, por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($2.450.000.000) M/CTE, fueron debidamente incorporados en el Presupuesto General del Municipio de San Martín de los Llanos – Meta, correspondiente a la vigencia fiscal 2025.

Dicha incorporación se realizó mediante Decreto No. 142 del 24 de noviembre de 2025, a través del cual se efectuó la adición al presupuesto de rentas, ingresos, recursos de capital y gastos de inversión, de conformidad con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, la Ley 819 de 2003, la Ley 1551 de 2012 y el Acuerdo Municipal No. 007 de 2025 – Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal.

Los recursos fueron incorporados tanto en el presupuesto de ingresos como en el presupuesto de gastos de inversión, para la ejecución del proyecto identificado **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" EN EL MARCO DEL Convenio Interadministrativo No 2299 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNCIPIO DE SAN MARTIN, META** con código **BPIN 202500000042906**, conforme a la distribución presupuestal allí señalada.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales y administrativos que haya lugar, en el Municipio de San Martín de los Llanos – Meta, a los 16 días del mes de Enero de 2026.

GINA GISSELA GUERRERO DEL VALLE

Directora Financiera de Presupuesto

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA

CERTIFICA

Que a la cuenta de ahorros No 357402734 del BANCO DE BOGOTÁ denominada **MUNICIPIO DE SAN MARTIN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO 2299**, fue depositado el 26 de diciembre del año 2025, la suma de $857.500.000 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE) correspondiente al primer desembolso de la cláusula sexta del convenio 2299.

Que, a 31 de diciembre, dichos recursos generaron unos rendimientos financieros por valor de $300.114 (TRESCIENTOS MIL CIENTO CATORCE PESOS MCTE), los cuales se encuentran disponibles en la citada cuenta.

Que, en lo corrido del mes de enero, no se registran movimientos adicionales. Por tanto, el saldo disponible en cuenta asciende a la suma de 857.800.114 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO CATORCE PESOS MCTE).

Se expide la presente certificación, a solicitud de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de San Martín de los Llanos a los 16 días del mes de enero del año 2026.

Cordialmente,

DENNY ALMEIDA ARBOLEDA
Directora Administrativa de Tesorería

Anexo:
-Extracto bancario diciembre 2025
-Saldo bancario de 1 de enero a 15 de enero de 2026


Banco de Bogotá

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026010512AH0044300828

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



17770 1-2

MUNICIPIO DE SAN MARTIN
CR 5 4 75
FUNDADORES
SAN MARTIN ,META
Entrega: UR Oficina: 1533
17770

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2025**

Desde: Diciembre 01	Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número:	357402734
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 365
Cod. Origen:	1533
SAN MARTIN	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000001 Abonos:	857,500,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	300,114.00
Saldo Final:	**857,800,114.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
26/12	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio Del Inter	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	857,500,000.00	857,500,000.00
30/12	0678	Interes remuneracion especial	Vcencio	GER BANCA GOB 15	000000	300,114.00	857,800,114.00
		--------FIN MOVIMIENTOS--------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS NIT 860020580-2

Banco de Bogotá

DENNY ALMEIDA ARZOLEDA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/16 08:18

Consultas
> Saldos
> Por Producto

Saldos por Producto

Parámetros de Consulta

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

CONV PAZ A LO BIEN / *****2734

Detalle del Producto

Estado Producto	Activo
Saldo Disponible	$857,800,114.00
Saldo Canje	$0.00
Saldo Actual	$857,800,114.00

Gmail obraspublicas sanmartin-meta.gov.co <obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co>

INFORMES DE SUPERVICIÓN Y FINANCIEROS 1 Y 2.

1 mensaje

obraspublicas sanmartin-meta.gov.co <obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co> 6 de febrero de 2026 a las 10:58
Para: andresf.hernandez@mininterior.gov.co, Danny Jhoan Aldana Velandia <danny.aldana@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a la solicitud remitida, me permito enviar adjunto los **informes conforme a los parámetros establecidos**, correspondientes a los meses 1 y 2 del convenio interadministrativo cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META", los cuales han sido debidamente ajustados conforme a las observaciones realizadas.

Quedo atento a cualquier inquietud,

Gracias por su atención.

HONOR Y TRABAJO
ALCALDÍA SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

JAIRO ABDUL RICO

SECRETARIA DE DESPACHO - OBRAS PUBLICAS

obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co
3115822670
www.sanmartin-meta.gov.co

"La Corte Constitucional en sus sentencias C-621 de 1997, T 377 del 2000,T487 de 2001 y el Consejo de Estado Sección cuarta sentencia 99/07/09 expediente 9409 establecieron que las comunicaciones recibidas por correo electrónico tiene el mismo valor jurídico que la recibida por la ventanilla de la entidad."

5 adjuntos

- **1. INFORME No.1 DE SUPERVISOR.pdf** 801K
- **1. FINANCIERO NOVIEMBRE CON ANEXOS.pdf** 1064K
- **2. INFORME No.2 DE SUPERVISOR.pdf** 2663K
- **2. FINANCIERO DICIEMBRE CON ANEXOS.pdf** 1801K
- **2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE.pdf** 42K

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2299 DE 2025

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, META

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META.

CUENTA (AHORROS) No 357-40273-4 DEL BANCO: BANCO DE BOGOTA

VALOR CONVENIO $ 2.450.000.000,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2.450.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0,00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	26/12/2025	GIRO 1	$ 857.500.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 857.500.000,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) $ 857.500.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
TOTAL CONTRATADO					

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/12/2025	$ 300.114,00
TOTAL (3)	$ 300.114,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 857.500.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (0)	$ 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (1)	$ 300.114,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 300.114,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	$ 857.800.114,00

Observacion En el mes de diciembre no se realizó ningun descuento

DENNY ALMEIDA ARBOLEDA
Directora Administrativa de Tesoreria

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT 892.099.548-6

MES: **DICIEMBRE** AÑO **2025**

NUMERO DE CUENTA	AHORRO 357402734	ENTIDAD: BANCO DE BOGOTA

VALOR DEL CONVENIO	**$**	**2.450.000.000**
26/12/2025 PRIMER DESEMBOLSO		$ 857.500.000
SALDO POR GIRAR DE CONVENIO	$	1.592.500.000
TOTAL EN CUENTA CONVENIO MÁS INTERESES ACUMULADOS		$ 857.800.114

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	$	300.114
TOTAL RENDIMIENTOS	**$**	**300.114**

ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

Formato ContE02

Fecha: 14/01/2026 Conciliación del mes de Diciembre de 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA:1110060260

ESTUDIO Y DISEÑOS CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANIA

Saldo en Contabilidad: 857,800,114.00

Más transacciones pagadas y registradas con fecha posterior

Más o Menos Notas Bancarias

Más o Menos Transacciones por Contabilizar

Más cheques sin cobrar Vigencia anterior

Mas cheques sin cobrar

Menos consignaciones en trÃ¡nsito

Saldo Conciliado	857,800,114.00
Saldo Extracto	857,800,114.00
Diferencia	0.00
CONCILIACIÓN CORRECTA	

Observaciones:

ELABORO
ELABORÓ:

REVISO
APROBADO POR

VISTO BUENO EN FORMATO DE CONCILIACION
Vo.Bo.

ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

Comprobante: Nota Bancaria de Ingresos		**Número:** 2025000973
Fecha: 31/12/2025		**Centro de Costo:** 9999999999999999
Tercero: BANCO DE BOGOTA		**NIT:** 860002964
Documento:	**Fecha:** 05/02/2026	**Valor:** 300,114.00
Concepto: RENDIMIENTO CTA 2734 MES DICIEMBRE		

Detalle:

No. Doc.	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
		1110060260	ESTUDIO Y DISEÑOS CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANIA PAZ A LO BIEN / M/PIOS -ICLD DIF.A LA PARTICIP P	300,114.00	0.00
	1.ADMC.1.2.05.02.05	48020101	Provenientes De Recursos De Libre Destinacion/ Otros Rendimi	0.00	300,114.00
			Sumas Iguales:	300,114.00	300,114.00

Elaboro	Reviso	Aprobo	Fecha: Día/Mes/Año
LVARGAS			

ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

Comprobante: Nota Bancaria de Ingresos		**Número:** 2025001038
Fecha: 31/12/2025		**Centro de Costo:** 9999999999999999
Tercero: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		**NIT:** 899999090
Documento:	**Fecha:** 12/02/2026	**Valor:** 857,500,000.00
Concepto: RECAUDO CTA 2734 CONV PAZ A LO BIEN MES DICIEMBRE		

Detalle:

No. Doc.	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
		1110060260	ESTUDIO Y DISEÑOS CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANIA PAZ A LO BIEN	857,500,000.00	0.00
	1.ADMC.1.1.02.06.006.06.04	44280201	Para proyectos de inversión	0.00	857,500,000.00
			Sumas Iguales:	857,500,000.00	857,500,000.00

Elaboro	Reviso	Aprobo	Fecha: Día/Mes/Año
LVARGAS			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

AUXILIAR CON SALDOS DE DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025
Entre Cuentas 1110060260 y 1110060260

Código Cuenta: 1110060260 ESTUDIO Y DISEÑOS CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANIA PAZ A Saldo Inicial: 0.00

Fecha	Tipo	Número	No. Doc	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
31/12/2025	NBA	2025000973		RENDIMIENTO CTA 2734 MES DICIEMBRE	BANCO DE BOGOTA	300,114.00	0.00	300,114.00
31/12/2025	NBA	2025001038		RECAUDO CTA 2734 CONV PAZ A LO BIEN MES DICIEMBRE	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	857,500,000.00	0.00	857,800,114.00
					Subtotal	857,800,114.00	0.00	
					Total	857,800,114.00	0.00	

San Martín de los Llanos (Meta), 13 de febrero de 2026

INFORME MENSUAL DE OBRA.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO
NÚMERO CONTRATO:	2299 - 2025
CLASE DE INFORME	INFORME MENSUAL
INFORME NUMERO	3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META.
NOMBRE Y NIT CONTRATISTA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN – SAN MARTIN DE LOS LLANOS, META CODIGO No. 95122300
VALOR TOTAL:	DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS ($2.450.000.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 MESES Y 25 DIAS
FECHA DE INICIO:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026
PRORROGA	N/A
ADICION	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A

2. PRESUPUESTO OFICIAL

A. PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ 5.761.622
2	ESTUDIOS DE SUELO	$ 11.523.245
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$ 21.606.084
4	DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO	$ 43.212.473
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ 21.606.084
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	$ 11.523.245
7	DISEÑO RED DE INCENDIO	$ 0
8	DISEÑO DE RED DE GAS	$ 2.880.812
9	DISEÑO ELECTRICO E LUMINACIÓN	$ 17.284.867
10	DISEÑO VOZ Y DATOS	$ 0

11	DISEÑO MECÁNICO Y BIOCLIMATICO	$ 0
12	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 8.642.434
13	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 5.787.115
14	OTROS	$ 0
TOTAL PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 149.827.981**

B. PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 84.123.457
TOTAL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 84.123.457**

C. PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
1	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA CUBIERTA. -AREA POLIVALENTE MULTIPROPÓSITO - EDIFICIO DE SERVICIOS	M2	312.5	$ 3.929.715	$ 1.228.035.972
2	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA DESCUBIERTA - GIMNASIO BIOSALUDABLE - PISTA DE TROTE - URBANISMO	M2	803.5	$ 732.561	$ 588.613.272
3	CERTIFICACIONES			$ 13.440.542	$ 13.440.542
4	IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO			$ 16.794.504	$ 16.794.504
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					**$ 1.846.883.748**

D. PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	INTERVENTORIA DE OBRA	$ 369.164.814
TOTAL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA		**$ 369.164.814**

TOTAL PRESUPUESTO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 149.827.981**
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 84.123.457**
VALOR PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 1.846.883.748**
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA	**$ 369.164.814**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 2.450.000.000**

3. AVANCE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2299 DE 2025

CONTRATOS DERIVADOS:

Durante el tiempo transcurrido en el presente periodo de informe mensual la entidad publicó en la página de compras SECOP II el proceso de llave en mano en la modalidad Licitación Pública N° 002 de 2025 cuyo objeto es: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META[1].

no tenía aún contratos derivados publicados en la página de compras del municipio.

AVANCE FISICO	CONVENIO 2299 - 2025
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.450.000.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	0%

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO.

Para el presente informe comprendido en el periodo de ejecución desde el 1 de enero de 2026 al 31 de enero del 2026 no se ha iniciado la ejecución de actividades contractuales, a la fecha, la administración ya cuenta con la publicación de los pliegos y demás documentos precontractuales en la página de compras del municipio SECOP II conforme a la normatividad vigente. Adicionalmente, durante el período mencionado se llevó a cabo la instalación de la valla informativa del convenio, la cual cumple funciones técnicas, legales, informativas y de control social, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y los principios de publicidad y transparencia. Dicho elemento visual permite divulgar a la comunidad la información relevante del convenio, incluyendo su objeto, alcance, valor, plazo y entidades responsables, facilitando el control ciudadano y la identificación del convenio en ejecución.

5. SOPORTES DE PAGO.

Para el presente informe comprendido en el periodo de ejecución desde el 1 de enero de 2026 al 31 de enero del 2026, no se ha realizado ningún pago por parte del ENTE TERRITORIAL debido a que el convenio aún se encuentra en la fase precontractual.

6. OBJETIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

Está diseñado para promover actividades lúdicas, pedagógicas y de integración social y ciudadana a través de espacios facilitadores del desarrollo de la convivencia comunitaria fortaleciendo el conocimiento y proporcionando información específica sobre oportunidades, desafíos y ofertas en áreas como; salud, ambiente, sustentabilidad, cultura y deporte. De igual forma se configurará como un epicentro que conecta a las comunidades con facilitadores del diálogo, defensores de derechos humanos y gestores cívicos de convivencia buscando una plena integración y convivencia de ciudadana.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.

A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, se concluye que no se ha realizado la contratación del personal de mano de obra debido a que no se ha dado inicio de actividades contractuales, ya que el convenio se encuentra en la etapa de estructuración de documentos.

8. GARANTÍAS.

La póliza que ampara el convenio de la referencia fue revisada y confrontada con las estipulaciones contractuales y disposiciones legales, ajustándose a ellas en cuanto al objeto, cuantía, plazo, valor asegurado, beneficiario, tomador, vigencias y amparos, las cuales se describen a continuación

RIESGOS AMPARADOS	VR. ASEG.	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 490.000.000,00	07/11/2025 – 31/01/2027

9. RELACIÓN DE PERSONAL

A la fecha del presente informe no se cuenta con un equipo consultor y operativo debido a que no se ha iniciado la ejecución de actividades contractuales. El convenio se encuentra en estado precontractual.

10. INFORME FINANCIERO DEL CONVENIO A LA FECHA.

El siguiente es el balance financiero de ejecución del convenio, correspondiente al periodo comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de enero de 2026. Teniendo en cuenta que los pliegos y demás documentos precontractuales se encuentran ya publicados en la página de compras del municipio SECOP II, únicamente se ha realizado el desembolso primero valor justificado con fecha de desembolso del 26 de diciembre del 2025.

Así mismo, se deja constancia que por medio del decreto municipal N° 142 de 2025 del 24 de noviembre de 2025 se efectuó la adición al presupuesto de rentas, ingresos, recursos de capital y gastos de

inversión. Los recursos fueron incorporados tanto en el presupuesto de ingresos como en el presupuesto de gastos de inversión, para la ejecución del convenio identificado **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADAN "PAZ A LO BIEN" EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2299 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADAN, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META** con código **BPIN 202500000042906.**

CONCEPTO	VALOR	%
PRIMER DESEMBOLSO REALIZADO	$ 857.500.000,00	35
SALDO POR DESEMBOLSAR	$ 1.592.500.000.00	65
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00	100

En la cuenta aperturada para los desembolsos del convenio 2299 de 2025 se tienen los siguientes valores:

Fecha	Concepto	Descripción del Movimiento	Valor	Saldo
Viernes, 26 de diciembre de 2025	Primer desembolso	Cr. Ach. Dir. Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio Del Inter	$ 857.500.000,00	$ 857.500.000,00
Martes, 30 de diciembre de 2025	Rendimientos generados por el primer desembolso	interés remuneración especial	$ 300.114,00	$ 857.800.114,00
Viernes, 30 de enero de 2026	Rendimientos generados por monto acumulado en la cuenta	Interés remuneración especial	$ 1.551.147,00	$ 859.351.261,00

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	PRELIMINARES	**EJECUTADO**	**%**
	Alistamiento del terreno.	0	0





Ilustración 1. Instalación de la valla informativa.

OBSERVACIONES
Se llevó a cabo la instalación de la valla informativa del convenio, con dimensiones de 2,00 x 4,00 metros, como elemento visual obligatorio que cumple funciones técnicas, legales, informativas y de control social, en concordancia con las disposiciones contractuales y normativas vigentes. La valla permite divulgar de manera clara y visible la información relevante del convenio, tales como el objeto, alcance, valor, plazo y entidades responsables, garantizando los principios de publicidad, transparencia y facilitando el ejercicio del control ciudadano

12. CONCLUSIÓN.

Se concluye que el Convenio Interadministrativo No. 2299 de 2025 se encuentra en fase inicial, sin ejecución física a la fecha, toda vez que durante el periodo reportado no se han iniciado las actividades contractuales previstas.

Lo anterior obedece a que la Administración Municipal se encuentra en fase precontractual ya con los pliegos y demás documentos publicados en la página SECOP, todo lo anterior para dar inicio con la siguiente fase del convenio, conforme a la normatividad vigente y a los principios que rigen la contratación estatal.

En consecuencia, no se presentan avances de obra durante el período evaluado, quedando pendiente el inicio formal de las actividades contractuales una vez culminada la etapa precontractual y surtidos los trámites correspondientes para la contratación y ejecución del objeto del convenio. No obstante, se han adelantado actividades necesarias y previas para el inicio de este, tales como el alistamiento del terreno y la instalación de la valla informativa, dando cumplimiento a los requisitos técnicos, legales y de publicidad establecidos, lo cual permite dejar el convenio en condiciones adecuadas para dar inicio a la fase de ejecución una vez se formalicen los actos contractuales correspondientes

JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía de San Martín de los Llanos

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
V°B°: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Públicas	
Revisó: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Públicas	
Elaboró: Ing. Andrés Felipe Mosquera Castro	Profesional de apoyo obras públicas C.P.S.	

Anexos: Un (01) Folio: Soporte entrega informe de supervisión y financiero No.3 correspondiente al mes de enero de 2026 y entrega de informes financieros 1 y 2 subsanados correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2025.

Gmail obraspublicas sanmartin-meta.gov.co <obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co>

ENTREGA DE INFORME SUPERVISIÓN Y FINANCIEROS.

1 mensaje

obraspublicas sanmartin-meta.gov.co <obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co> 13 de febrero de 2026 a las 10:27
Para: andresf.hernandez@mininterior.gov.co, Danny Jhoan Aldana Velandia <danny.aldana@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar adjunto el **informe No.3. Correspondiente al mes de enero con los parámetros establecidos** del convenio interadministrativo cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META".

Adicionalmente, se adjuntan de igual manera los informes financieros No.1, No.2 y No.3. Con sus respectivas correcciones y ajustes al formato suministrado por ustedes.

Quedo atento a cualquier inquietud,

Gracias por su atención.

--

HONOR Y TRABAJO
ALCALDÍA SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

JAIRO ABDUL RICO

SECRETARIA DE DESPACHO - OBRAS PUBLICAS

obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co
3115922870
www.sanmartin-meta.gov.co

"La Corte Constitucional en sus sentencias C-621 de 1997, T 377 del 2000,T487 de 2001 y el Consejo de Estado Sección cuarta sentencia 99/07/09 expediente 9409 establecieron que las comunicaciones recibidas por correo electrónico tiene el mismo valor jurídico que la recibida por la ventanilla de la entidad."

4 adjuntos

- **3. INFORME No.3 DE SUPERVISOR.pdf** 588K
- **3. INFORME FINANCIERO ENERO 2026.pdf** 1155K
- **2. INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 2025.pdf** 1032K
- **1. INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 2025.pdf** 876K

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2299 DE 2025

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026 MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, META

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META.

CUENTA (AHORROS) No 357-40273-4 **DEL BANCO:** **BANCO DE BOGOTA**

VALOR CONVENIO **$ 2.450.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.450.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	26/12/2025	GIRO 1	$ 857.500.000,00
OR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	$ 0,00
LOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 857.500.000,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 857.500.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON
TOTAL CONTRATADO					

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

NDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL NVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/12/2025	$ 300.114,00
30/01/2026	$ 1.551.147,00
TOTAL (3)	$ 1.851.261,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 857.500.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (0) **$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (1) **$ 1.851.261,00**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) **$ 0,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 1.851.261,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 859.351.261,00**

Observacion En el mes de diciembre no se realizó ningun descuento, durante el mes de enero del año 2026 no se realizó ningún descuento

DENNY ALMEIDA ARBOLEDA
Directora Administrativa de Tesorería

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT 892.099.548-6

MES: **ENERO** AÑO **2026**

NUMERO DE CUENTA	AHORRO 357402734	ENTIDAD: BANCO DE BOGOTA

VALOR DEL CONVENIO	**$**	**2.450.000.000**
26/12/2025 PRIMER DESEMBOLSO		$ 857.500.000
SALDO POR GIRAR DE CONVENIO	$	1.592.500.000
TOTAL EN CUENTA CONVENIO MÁS INTERESES		$ 859.351.261

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	$	300.114
RENDIMIENTOS ENERO 2026	$	1.551.147
TOTAL RENDIMIENTOS	**$**	**1.851.261**

ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

Formato ContE02

Fecha: 05/02/2026 Conciliación del mes de Enero de 2026

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA:1110060260

ESTUDIO Y DISEÑOS CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANIA

Saldo en Contabilidad: 859,351,261.00

Más transacciones pagadas y registradas con fecha posterior

Más o Menos Notas Bancarias

Más o Menos Transacciones por Contabilizar

Más cheques sin cobrar Vigencia anterior

Mas cheques sin cobrar

Menos consignaciones en trÃ¡nsito

Saldo Conciliado	859,351,261.00
Saldo Extracto	859,351,261.00
Diferencia	0.00
CONCILIACIÓN CORRECTA	

Observaciones:

ELABORO
ELABORÓ:

REVISO
APROBADO POR

VISTO BUENO EN FORMATO DE CONCILIACION
Vo.Bo.

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

Comprobante: Nota Bancaria de Ingresos		**Número:** 2026000002
Fecha: 30/01/2026		**Centro de Costo:** 9999999999999999
Tercero: BANCO DE BOGOTA		**NIT:** 860002964
Documento:	**Fecha:** 06/03/2026	**Valor:** 1,551,147.00
Concepto: RENDIMIENTO CTA 2734 CONV PAZ A LO BIEN MES ENERO		

Detalle:

No. Doc.	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
		1110060260	ESTUDIO Y DISEÑOS CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANIA PAZ A LO BIEN / M/PIOS -ICLD DIF.A LA PARTICIP P	1,551,147.00	0.00
		48020101	Provenientes De Recursos De Libre Destinacion/ Otros Rendimi / M/PIOS -ICLD DIF.A LA PARTICIP P	0.00	1,551,147.00
			Sumas Iguales:	1,551,147.00	1,551,147.00

Elaboro	Reviso	Aprobo	Fecha: Día/Mes/Año
LVARGAS			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

AUXILIAR CON SALDOS DE ENERO 1 A ENERO 31 DE 2026
Entre Cuentas 1110060260 y 1110060260

Código Cuenta: 1110060260 ESTUDIO Y DISEÑOS CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANIA PAZ A **Saldo Inicial:** 857,800,114.00


Fecha	Tipo	Número	No. Doc	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
30/01/2026	NBA	2026000002		RENDIMIENTO CTA 2734 CONV PAZ A LO BIEN MES ENERO	BANCO DE BOGOTA	1,551,147.00	0.00	859,351,261.00
					Subtotal	1,551,147.00	0.00	
					Total	1,551,147.00	0.00	

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026020301AH2015361365



24070 1-2

MUNICIPIO DE SAN MARTIN
CR 5 4 75
FUNDADORES
SAN MARTIN ,META
Entrega: UR Oficina: 1533
24070

FECHA EXTRACTO
Desde: Enero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
SAN MARTIN

Enero - Enero 2026
Hasta: Enero 31
357402734
Superdía Especial 365
1533

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**857,800,114.00**
Saldo Inicial:	**857,800,114.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,551,147.00
Saldo Final:	**859,351,261.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/01	0678	Interes remuneracion especial	Vcencio	GER BANCA GOB 15	000000	1,551,147.00	859,351,261.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS. NIT: 860028930-2

San Martín de los Llanos, 23 de febrero de 2026

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
RADICADO No. 0327
FECHA: 23-02-2026 HORA: 3:00 p.m.
RECIBIDO: Alejandra Tuay C.

Doctora
YOVANA MARTINEZ MORA
Secretaria de despacho – contratación
Alcaldía Municipal

Asunto: **Remisión de informes mensuales de supervisión y financieros para cargue a la plataforma SECOP II del convenio interadministrativo 2299 de 2025.**

Respetuoso saludo:

A través de la presente, me permito remitir los informes mensuales de supervisión y financieros con el fin de cargar dicha documentación al SECOP II del convenio interadministrativo 2299 de 2025 cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META".**

DOCUMENTOS	No. FOLIO
INFORME SUPERVISOR No.1.	7
INFORME FINANCIERO No.1.	2
INFORME SUPERVISOR No.2.	13
INFORME FINANCIERO No.2.	6
INFORME SUPERVISOR No.3.	8
INFORME FINANCIERO No.3.	6
TOTAL FOLIOS	**42**

Cordialmente,

ING. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Despacho - Obras Públicas

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
V°B°: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Públicas	
Revisó: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Públicas	J.A.R.E
Elaboró: Ing. Andrés Felipe Mosquera Castro	Profesional Secretaria de Obras Públicas C.P.S	A. Mosquera.
