

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONSORCIO SUBA VIAL VR

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN No. 4

MAO. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA GESTIÓN AMBIENTAL Y SST

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2024

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

FECHA: 31 DE JULIO DE 2025


REGISTRO DE REVISIONES

Revisión No.	Fecha	Descripción
1	01/08/2025	Emitido para revisión a la interventoría

VISIÓN Y APROBACIÓN

Contrato No.	1009-2024 LP (119226)	**FECHA**	Julio 2025
Título del Documento	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 04 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTROL INTERNO

Área	Elaboró	Revisó	Aprobó
Ambiental	 Prof. Alejandro Acosta Residente Ambiental	Prof. Sandra Cuestas Directora de obra	Prof. Katherine Guañarita Res. AMB – Interventoría
SST	 Prof. Camilo Duran Residente SST	Prof. Sandra Cuestas Directora de obra	Prof. Erick Steven Ramírez Res. SST – Interventoría

Revisó: **ING. SAMUEL ALEJANDRO VICTORIA VALENCIA DFLS CTO 285 DE 2025**

Aprobó: **ING. SAMUEL ALEJANDRO VICTORIA VALENCIA DFLS CTO 285 DE 2025**

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN. 9
1. OBJETIVO GENERAL 10
1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 10
2. ALCANCE 10
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO. 10
4 ACTIVIDADES GENERALES DE OBRA A DESARROLLAR. 12
4.1 INTERVENCIÓN MALLA VIAL 12
4.2 LOCALIZACIÓN. 15
4.3 IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS VIALES. 16
4.3.1 Intervención De CIV´S. 16
5 GESTIÒN AMBIENTAL. 17
5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. 17
5.2 RADICADO SECRETARIA DISTRITAL AMBIENTE 17
6 IMPLEMENTACION MANEJO AMBIENTAL DE OBRA – MAO. MANEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y OBLIGACIONES A&SST. 21
6.1 PROVEEDORES: 21
6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 22
6.3 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES 23
6.4 PROGRAMA DE CONTROL DE DISPOSICION DE RCD 24
6.6 PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIALES 28
6.7 MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO. 33
6.8 FICHA DE INDIVIDUOS ARBOREOS 34
6.10 APROVECHAMIENTO IN SITU 35
7.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO Y CAPACITACIONES 38
7.4 PROCEDIMIENTO DE INGREGO Y RETIRO DEL PERSONAL. 42
7.6 PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL. 44
7.7 COMITES 45
7.7.1 COPASST 45
7.8 CAPACITACIONES, INDUCCIONES, CHARLAS DE SEGURIDAD 45
7.8.1 INDUCCIÒN 45
7.8.2 CAPACITACIONES, CHARLAS DE SEGURIDAD 47
7.9 ELABORACION Y DIVULGACIÒN DE ATS 49
7.10 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN. 50

7.11 SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE FRENTES DE OBRA. 51
7.12 INSPECCIONES 54
7.13 MEDICINA PREVENTIVA 55
7.13.1 EXAMEN DE INGRESO 55
7.13.2 EXÁMENES DE EGRESO 56
7.13.3 HIDRATACIÓN 56
7.14 PLAN DE EMERGENCIA. 56
8 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS 58
8.2 MANEJO DE VEHICULOS. 60
9.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD 61
9.1.2 CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO 62

Índice de Tablas

Tabla No. 1. Datos Generales del Contrato. 11
Tabla No. 2. Datos Generales de interventoría. 11
Tabla No. 3. Listado de inspecciones por CIV´S 16
Tabla No. 4. Radicados ante la secretaria Distrital de Ambiente 18
Tabla No. 5. Listado de Proveedores 21
Tabla No. 6. Cronograma de Actividades Ambientales. 22
Tabla No. 7. Capacitaciones Ambientales- junio 24
Tabla No. 8. Listado de civ´s intervenidos**.** 24
Tabla No. 9. Relación de RCD durante el periodo de 01 al 30 de junio de 2025- CIV 11002026 24
Tabla No.10. Relación de RCD´S durante el periodo de 01 al 30 de julio de 2025 25
Tabla No. 11. Relación de Materiales del 01 al 30 de junio de 2025 28
Tabla No. 12. Lista de indicadores de RCD de 01 al 30 de junio. 31
Tabla No 13 Listado de Indicadores de RCD de 01 al 31 de julio 31
Tabla No. 14. Listado de Campamentos instalados. 33
Tabla No 15 Listado de ubicación de baños 33
Tabla No. 16. Cronograma de trabajo y capacitaciones – julio 2025 38
Tabla No. 17. Listado de personal contractual. 41
Tabla No. 18. Listado ingreso de personal-julio de 2025 42
Tabla No. 19. Listado retiro de personal. 43
Tabla No. 20. Listado de Charlas. julio – 2025 47
Tabla No. 21.Inspecciones julio - 2025 55
Tabla No. 22. Maquinaria ingresada a obra. 58
Tabla No. 23. Listado de vehículos ingresados en el mes a obra. 60

Índice de ilustraciones

Ilustración No. 1.Mapa localidad de Suba 15
Ilustración No. 2. Certificado de disposición de residuos aprovechables 19
Ilustración No. 3. Cargue de excavación. 27
Ilustración No.4.Instalación de Materiales. 30
Ilustración No 5 Indicador de gestión de RCD -junio. 32
Ilustración No 6 Indicador de gestión De RCD Julio 32
Ilustración No. 7, 8, 9 y 10. Adecuación de campamento de obra, protecciones de sumideros, protección de materiales y aseo, mantenimiento de baño portátil 33
Ilustración 11, 12, 13, 14. Socialización del memorando informativo – Reducción de la jornada laboral 36
Ilustración No. 15, 16. Carteleras informativas. 37
Ilustración No. 17. Reunión COPASST 45
Ilustración No. 18, 19, 20, 21. Asistencia a inducción y notificación de riesgos. 46
Ilustración No. 22, 23, 24, 25. Asistencia a charlas y capacitaciones. 49
Ilustración No. 26, 27, 28, 29. Entregas de Dotación y EPP 50
Ilustración No. 30, 31, 32, 33. Señalización punto crea. 51
Ilustración No. 34, 35, 36, 37, 38, 39.Señalización en los frentes de obra. 52
Ilustración No. 40, 41, 42, 43. Inspecciones y preoperacionales. 54
Ilustración No. 44, 45.Punto de hidratación 56
Ilustración No. 46,47,48,49.Punto de atención a emergencias – PAC. 57
Ilustración No. 50, 51, 52, 53.Punto de atención a emergencias – frente de obra. 57

Ilustración No. 54, 55. Maquinaria con identificación móvil. 59
Ilustración No. 56, 57.Vehículos con identificación. 60

Índice de Anexos

Anexo No. 1. Cronograma Ambiental Junio 17
Anexo No. 2. Radicado SDA 20
Anexo No. 3. Plan de acción ambiental. 23
Anexo No. 4. Control RCD. 25
Anexo No. 5. Control Materiales 28
Anexo No. 6. Manejo de agua. 34
Anexo No. 7. Ficha de individuos arbóreos. 35
Anexo No. 8. Aprovechamiento INSITU 36
Anexo No. 9. Cronograma de trabajo y capacitaciones. 38
Anexo No. 10. Documentación de personal 42
Anexo No. 11. Listado de personal. 44
Anexo No. 12. Pagos de seguridad social. 44
Anexo No. 13. Acta de reunión COPASST. 45
Anexo No. 14. Notificación de riesgos e inducción. 47
Anexo No. 15. Capacitaciones y charlas 47
Anexo No. 16. Soportes de ATS diligenciados. 50
Anexo No. 17. Entrega de Dotación y EPP 50
Anexo No. 18. Inspecciones y preoperacionales. 55
Anexo No. 19.Exámenes médicos. 55

INTRODUCCIÓN.

CONSORCIO SUBA VIAL VR, fue contratado para llevar a cabo el contrato FDLS 1009-2024, cuyo objetivo es contrato de obra No 403 -2023, "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C DE LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO", para el cual se están implementando todas las actividades que hacen parte de las fichas de manejo del MAO, con el fin de minimizar los impactos ambientales generados durante las actividades constructivas del proyecto.

El presente informe describe el avance de la gestión ambiental como a su vez de la seguridad y salud en el trabajo, realizada en el periodo evaluado presentando la información, las acciones de acompañamiento, seguimiento y control de las actividades de las labores en los segmentos viales de obra próximos a ser intervenidos durante el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2025.

1. OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer por medio de este informe todas las actividades realizadas durante la etapa de ejecución y diagnostico para el desarrollo del mantenimiento y conservación de la malla vial, correspondiente al componente ambiental para la ejecución del contrato FDLS 1009- 2024, para el periodo evaluado del 01 al 31 de julio del 2025.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Cumplir con las obligaciones contractuales para el MAO, manejo ambiental de obra.
- Presentar las medidas ambientales, la seguridad y salud en el trabajo que permiten mitigar, prevenir y controlar los impactos y riesgos que pueden generarse sobre el medio ambiente durante la ejecución de las actividades del contrato.
- Hacer seguimiento al MAO con el fin de garantizar su cumplimiento durante la ejecución y construcción.
- Cumplir con las normas ambiental, promoviendo una interacción acorde con el medio ambiental tomando las medidas de control que generar espacios seguros para trabajadores y habitantes del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

2. ALCANCE

El presente documento comprende todas las actividades del procedimiento constructivo que tengan relación con el sistema de gestión ambiental para la ejecución del contrato de obra No 1009 – 2024.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

El proyecto del CONSORCIO SUBA VIAL VR el cual es ejecutado bajo el contrato No-1009 del 2024 de la localidad de suba tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones de movilidad existentes de los diferentes actores viales, con el consecuente del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Suba. Además, dentro del alcance del proyecto se contempla ejecutar obras y actividades para el diagnóstico.

Tabla No. 1. Datos Generales del Contrato.

CONTRATISTA	CONSORCIO SUBA VIAL VR
Objeto	"Ejecutar a precios unitarios las actividades para la conservación de la malla vial local e intermedia y espacio público (lote 1) de la localidad de suba en la ciudad de Bogotá D.C., y las demás actividades que se detallen en el anexo técnico".
No del contrato	1009 de 2024
Valor del contrato	$ 13.388.373.112
Plazo de ejecución	Diez (10) meses.
Fecha de inicio	Primero (1) de abril de 2025.
Fecha de terminación	Primero (1) de febrero de 2026.
Representante legal	Farley Andrea Larrarte Barrera

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

Tabla No. 2. Datos Generales de interventoría.

INTERVENTORIA	CONSORCIO SUBA TH 003
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"
No del contrato	083 de 2025
Valor inicial del contrato:	$ 1.673.546.671
Duración (meses):	Once (11) meses.
Fecha de inicio	Primero (1) de abril de 2025.
Fecha de inicio	Primero (1) de marzo de 2026.
Representante Legal:	Edgar Alfredo Salazar Bernal

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

4 ACTIVIDADES GENERALES DE OBRA A DESARROLLAR.

4.1 INTERVENCIÓN MALLA VIAL

El alcance de las intervenciones a realizar dentro de conservación es el siguiente:

- **Mantenimiento rutinario:**

  Se define como el conjunto de actividades pendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura. Constituyen una práctica preventiva, e incluye limpieza de sumideros, vallados, pozos, sello de fisuras o juntas de dilatación, reparaciones puntuales en concreto flexible o rígido

  Los segmentos viales cuya intervención asignada a partir del cálculo del criterio índice de condición del pavimento del modelo de priorización, corresponda a mantenimiento rutinario, no serán objeto de diagnóstico detallado por parte del contratista, y las actividades a adelantar se limitarán a las descritas en el párrafo anterior

  Por lo tanto, se precisa que en el ejercicio de la planeación adelantando por la DTP, los elementos identificados con este tipo de intervención n o cuenta con asignación presupuestal para la actividad de diagnóstico.

- **Mantenimiento periódico:**

  Se define como el conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendiente a logar que por lo menos alcance su periodo de diseño o vida útil. Manteniendo la condición de servicio. Constituye en una práctica preventiva o correctiva, e incluye parcheo, bacheos, sobre carpetas, fresados estabilizados, renivelaciones.

- **Rehabilitación:**

  Esta actividad se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican retiro de parte de la

estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento.

Esta actividad puede incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o sin incorporación de material granular nuevo o existente, o colocación de capas superiores de mejoramiento estructural. La profundidad de las intervenciones será máxima hasta la primera capa granular de la estructura y de ser necesario, se realizarán mejoras en las condiciones hidráulicas, que no impliquen renovación o diseño de redes.

Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la ampliación de los periodos de vida útil y en consecuencia es necesaria la realización de estudios de tránsito de materiales y el dimensionamiento estructural. Los segmentos viales cuya intervención, asignada a partir del cálculo del criterio índice de condición del pavimento del modelo de priorización, corresponda a rehabilitación, deberán ser objeto de actualización de diagnósticos por parte del contratista, de acuerdo con lo establecido en la versión vigente del anexo técnico del diagnóstico para la conservación de infraestructura vial para Bogotá del IDU.

- **Reconstrucción:**

Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un pavimento para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilización total o parcial de los materiales existentes. Se requiere realizar estudios de tránsito, de materiales y el dimensionamiento estructural y si se requiere el diseño y la renovación de redes hidráulicas, para garantizar el período de vida útil previsto.

Los segmentos viales cuya intervención asignada a partir del cálculo del criterio Índice de condición del pavimento del modelo de priorización, corresponda a reconstrucción, deberán ser objeto de elaboración de estudios y diseños por parte del contratista, de acuerdo con lo establecido en la versión vigente del anexo técnico de diagnóstico para conservación de infraestructura vial para Bogotá del Instituto de Desarrollo Urbano.

El orden de intervención de la malla vial y espacio público será definido por EL FONDO DE DESARROLLO SUBA.

El contratista debe tener presenta que, durante la ejecución de proyecto, el FONDO DE DESARROLLO LOCALD DE SUBA podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales)

algunos de los elementos asignados a cada grupo, o de ser necesario, incluir otros elementos. La inclusión de nuevo elementos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no pueden ser intervenidos.

- **Reparaciones puntuales:**

Son aquellas actividades requeridas para reparar daños puntuales en segmentos que cuentan con póliza de estabilidad vigente en lo que los daños presentados han sido imputables al contratista y se ha hecho efectiva la póliza respectiva, o en los que los daños presentados no son imputables al contratista.

Estos requerimientos serán priorizados por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.

- **Atención de emergencia:**

La Atención de Emergencias es la actividad tendiente para mitigar de manera puntual, problemas que afecten la seguridad y la movilidad tanto peatonal como vehicular en la infraestructura de la ciudad. Realizar actividades de mitigación inmediata ante eventos externos tales como inundaciones y derrumbes, que generen problemas de movilidad.


La Atención de Emergencias se podrá realizar sobre cualquiera de los elementos de la malla vial de la localidad dentro de la zona o grupo objeto del contrato. Estas intervenciones serán priorizadas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA y su ejecución, factibilidad será evaluada por los especialistas de la interventoría y contratista de obra.

4.2 LOCALIZACIÓN.

El proyecto no posee una ubicación única y especificada dado que las obras a ejecuta se encuentran situadas en diferentes unidades de planeamiento zonal (UPZ) de la localidad, por lo cual se consideran que el área de influencia directa e indirecta del proyecto es la localidad de suba y sus UPZ que la conforman:

La localidad de suba está ubicada en el extremo noroccidental de la cuidad y limita al norte con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá por el Oriente con la localidad de Usaquén y por el Occidente con el municipio de Cota.

Ilustración No. 1*.Mapa localidad de Suba*

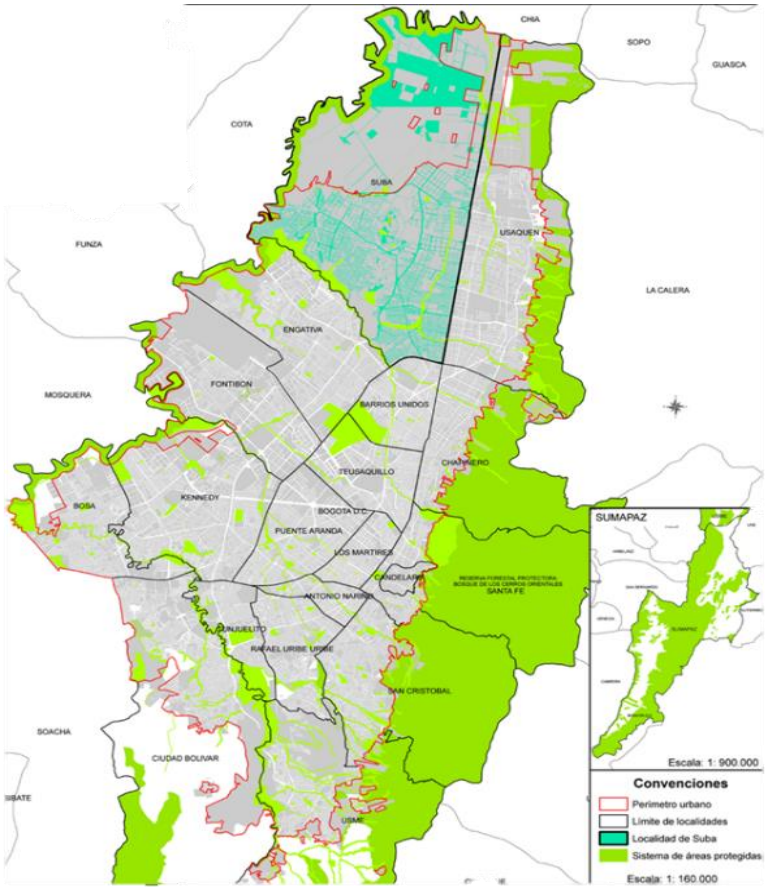

Fuente: Fondo desarrollo local de suba

4.3 IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS VIALES.

Por medio de los visualizadores online se genera una inspección de los segmentos viales donde se va a intervenir conocidos como CIV´S (códigos de identificación vial) en donde recolecta la información primaria se dirige el equipo in situ corroborar esta información.

4.3.1 Intervención De CIV´S.

En el periodo de evaluado se da inicio a las actividades de ejecución, por lo tanto, el inicio de la intervención de los segmentos viales para el periodo de junio es: **CIV 11002026, CIV 11004595**, **CIV 11002945-11002757.**

Con las siguientes actividades por parte del área SST y ambiental; Instalación del PMT (Plan de Manejo de tránsito), cerramiento del segmento vial a intervenir. Dando así inicio a las actividades de ejecución de obra como lo es el ingreso de maquinaria para realizar el cajeo de vía, retiro de RCD´S a sitios de disposiciones finales y de aprovechamiento.

Tabla No. 3. Listado de inspecciones por CIV´S

NUMERO	CIV	PK_ID	TRAMO	DESDE	HASTA
1	11004595	174103	CLL 132 B BIS A	CRA 126 B	TV 127
2	11000912	176635	CL 152 B	KR 114 F	KR 114 D
3	11000875	176636	CL 152 B	KR 115	KRA 114 F
4	11000989	176634	CL 152 B	KR 114 B	KRA 114 D
5	11001010	176633	CL 152 B	KR 114 B	KRA 114 A
6	11001040	176632	CL 152 B	KRA 114 A	KR 114
7	11001062	176631	CL 152 B	KRA 114	KRA 113 C
8	11002026	175844	KRA 136 A	CL 143 A	CL 144
9	11004595	174103	CLL 132 B BIS A	CRA 126 D	TV 127
10	11010570	168695	KR 70 G	CL 119 A	CL 119 A
11	11011935	472336	KR 70 G	CL 119 A	CL 120
12	11002945	175729	TV 127 C	DG 139 A BIS	DG 139 B
13	11002757	175731	TV 127 C	DG 139 B	DG 140
14	11001937	176420	KR 114	CL 147 A	CL 148
15	11002134	176418	KR 114	AV SUBA	CLL 147A
16	11004428	174146	TV 126 D	CL 132 D	CL 133
17	11004438	174810	TV 126 D	CL 133	CL 135

Fuente: Anexo técnico

5 GESTIÒN AMBIENTAL.

5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo evaluado, se llevaron a cabo la gestión para el desarrollo del cronograma ambiental correspondiente al mes de junio, el cual presento el proceso y ejecución que es realizado con el acompañamiento de la parte técnica y del área SST- ambiental del contrato. Para su verificación se puede consultar en el Anexo adjunto.

Anexo No. 1. Cronograma Ambiental Julio

5.2 RADICADO SECRETARIA DISTRITAL AMBIENTE

Como parte de las actividades y desarrollos contractuales, el CONSORCIO SUBA VIAL VR. realizo la actividad de **TALA** para el tramo de la: kra 136ª entre CL 144 y CL 143 para el CIV 11002026, en donde inicialmente con el apoyo del área social se realizó la socialización de la actividad silvicultural de la tala por medio de un volante de numero: 017. Para la reunión de inicio de la actividad el cual fue suministrado a la comunidad el 13 de junio del 2025. Con el fin de asegurar la adecuada difusión a la comunidad sobre el desarrollo de la actividad silvicultural.

Esta solicitud fue emitida por medio del Fondo de Desarrollo Local de Suba FDLS, el cual realizo las gestiones pertinentes ante la secretaria Distrital de Ambiente – SDA con el fin de identificar las acciones técnicas e idóneas para el tratamiento del individuo arbóreo.

El desarrollo de la actividad se realizó el día 14 de junio de 2025 con el apoyo del concepto técnico del residente forestal del Consorcio Suba Vial VR. En donde se presentó mediante el documento de "**MEMORIA TECNICA EJECUCION DE ACTIVIDAD SILVICULTURAL DE LA TALA AUTORIZADO POR LA RESOLUCION NO. 0091 CON CONCEPTO TECNICO NO. SSFFS-03519 DEL 03 DE**

JUNIO DEL 2025". En donde se encontrarán las metodologías, manejo de avifauna, socialización de la actividad silvicultural de la tala, ejecución de actividades silviculturales, proceso de compensación, resultados, conclusiones y recomendaciones.

De tal forma se presentó el formato de ejecución de actividades silviculturales, en donde se presenta la evaluación, control y seguimiento, en donde se presentan los datos de la intervención, el registro fotográfico desarrollado durante el tiempo de ejecución y a su vez se presenta el control de cambios respecto al trámite de la documentación presentada ante la SDA (secretaria distrital de ambiente).

Tabla No. 4. Radicados ante la secretaria Distrital de Ambiente

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción de la modificación	No Acto Administrativo y fecha
1	Adopción	Radicado 2019 IE92381 DE ABRIL DE 2019
2	Ajuste al documento a los lineamientos el Procedimiento Control de la información documentada del sistema integrado de Gestión – SIG.	Radicado 2020 IE 205370 DE NOVIEMBRE DE 2020
3	Ajuste al documento con el fin de que la información se más clara para que el usuario en el momento de recopilar los requisitos para su trámite.	Radicado No 2021 IE 113566 de JUNIO DE 2021
4	Entrega de informe final tala árbol 11002026	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-161 27 DE JUNIO.
5	Entrega de memoria técnica de ejecución de actividades silviculturales de "tala" autorizada	La Resolución No. 0091 Con Concepto Técnico No. Ssffs-03519 Del 03 De junio Del 2025
6	Solicitud de verificación pagos efectuados por evaluación para cruce de cuentas y emisión de recibo por saldo final adeudado por compensación por tala de arboles	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-230 26 DE JULIO.

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

Como finalidad de la actividad silvicultura se tiene cuenta con el certificado de disposición de los residuos aprovechables.

Ilustración No. 2. Certificado de disposición de residuos aprovechables

PALOS DE LA LOMA
ECO-VIVERO

ECOAMBITHOZ LTDA
Ecología y ambiente

ECO 0256 - 25

Bogotá D.C., 14 de junio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Ciudad.

Referencia: **CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS**

La suscrita María Paula Castelblanco Suárez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.836.929 de Bogotá D.C., en calidad de Gerente y Representante Legal del Vivero Palos de La Loma, unidad operativa filial de Ecoambithoz Ltda., se permite expedir la presente Certificación de Disposición Final de Residuos, con fundamento en la información operativa y ambiental registrada, conforme a los siguientes términos:

CERTIFICADO ECO 0256 POR 1 M3

1. Objeto de la certificación

Mediante el presente documento se certifica que el 14 de junio del año 2025, se realizó la recolección, retiro, transporte y disposición final de un volumen de UN METRO CÚBICO (1 m³) de residuos vegetales. Dichos residuos fueron movilizados empleando el vehículo automotor identificado con placas TTZ-869, conducido por el señor VICTOR ALFONSO TALERO SARMIENTO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1.049.604.793.

2. Origen de los residuos

El material vegetal objeto de esta certificación se originó como subproducto del proceso de tala de un árbol de la especie Chicalá (*Tecoma stans*) realizado en el marco de las actividades contempladas en el contrato de ejecución del proyecto vial correspondiente al segmento **CIV 11002026**, ubicado en la **Carrera 136A entre Calle 143A y Calle 143**, en la localidad de Suba, cuyo responsable es la empresa CONSORCIO SUBA VIAL VR con Nit. 901.903.833-2.

3. Tipo de residuos y tratamiento aplicado

Los residuos vegetales recolectados corresponden exclusivamente a material orgánico biodegradable, derivados del corte de césped y mantenimiento de zonas verdes. De conformidad con las buenas prácticas ambientales y en cumplimiento de la normatividad vigente sobre el manejo adecuado de residuos orgánicos (incluyendo lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019 y demás normas aplicables), dichos residuos fueron transportados y

Calle 152B Nº 56-75 Casa 48. Tel / Fax: 4961366 Cel: 310 2061743
E-mail: ecoambithoz@gmail.com
Bogotá - Colombia

1

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

PALOS DE LA LOMA
ECO-VIVERO

ECOAMBITHOZ LTDA
Ecología y ambiente

dispuestos en la planta de tratamiento del Vivero Palos de La Loma, ubicado en la vereda Santa Lucía, municipio de Guasca, departamento de Cundinamarca.

En dicha instalación, el material vegetal fue incorporado al sistema de manejo y transformación biológica mediante procesos de compostaje y lombricultura, con el objetivo de obtener abono orgánico de alta calidad destinado al mejoramiento de suelos y la nutrición vegetal, en el marco de una economía circular y sostenible. Se hace explícito que los residuos no fueron objeto de incineración, quema a cielo abierto, disposición inadecuada ni comercialización, garantizando así una gestión ambientalmente responsable y conforme a los principios de prevención, reducción y aprovechamiento de residuos sólidos.

4. Declaración final

En concordancia con el marco normativo vigente y las políticas ambientales adoptadas por el Vivero Palos de La Loma y su casa matriz, Ecoambithoz Ltda., se deja constancia de que la totalidad del volumen mencionado (1 m³) fue debidamente dispuesto y aprovechado mediante procesos técnicamente validados, sin generar impactos negativos al entorno, cumpliendo con los principios de sostenibilidad, trazabilidad y legalidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, a los catorce (14) días del mes de junio de 2025.

Atentamente;

MARIA PAULA CASTELBLANCO
Gerente

CERTIFICADO EPP – 0256
POR 1 M3

Calle 152B N° 56-75 Casa 48. Tel / Fax: 4961366 Cel: 310 2061743
E-mail: ecoambithoz@gmail.com
Bogotá - Colombia

2

Anexo No. 2.*Radicado SDA*

6 IMPLEMENTACION MANEJO AMBIENTAL DE OBRA – MAO. MANEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y OBLIGACIONES A&SST.

6.1 PROVEEDORES:

Siguiendo los lineamientos del documento MAO, el CONSORCIO SUBA VIAL VR lleva a cabo la identificación de los trámites y permisos necesarios para la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Estos residuos generan un impacto ambiental que se busca mitigar mediante la colaboración con empresas gestoras especializadas, con el fin de asegurar una disposición final adecuada.

El objetivo es encontrar soluciones más sostenibles y mejorar el ciclo de vida de estos materiales. Cabe destacar que esta información se encuentra desarrollada con mayor detalle en el Programa de Manejo Ambiental de RCD (PMARCD).

Tabla No. 5. Listado de Proveedores

No. DE REGISTRO IDU	NOMBRE	CATEGORIA	VIGENCIA	FECHA DE APROBACION
478-2017	PUENTE PIEDRA	TRANSFORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RCD	16-04-2025	10 DE JUNIO 2025
609-2021	CONCREMACK	SUMINSITROS DE CONCRETOS	02-05-2025	23 DE JULIO 2025
488-2018	DROMOS	MEZCLA ASFÁLTICA	29-12-2025	4 DE JUNIO DE 2025 OFICIO 110
695-2023	ECODESARROLLO	TRATAMIENTO DISPOSICION FINAL	2-02-2026	
467-2017	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA-GRECO	TRANSFORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RCD	30-09-2025	4 DE JUNIO DE 2025 OFICIO 110
683-2023	INDUSTRIA NACIONAL DE AGREGADOS RECICLADOS	PROVEEDOR DE MATERIALES Y SITIOS DE DISPOSICION FINAL, TRANSFORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS	15-08-2025	4 DE JUNIO DE 2025 OFICIO 110
648-2022	RECICLADOS INDUSTRIALES	TRANSFORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RCD	3-08-2025	4 DE JUNIO DE 2025 OFICIO 110
421-2025	MAQUINAS AMARRILAS	TRATAMIENTO DE DISPOSICION FINAL	26-08-2024	10 DE MAYO DE 2025 OFICIO 129
1257-2021	TECNOMINERALES	TRATAMIENTO DE DISPOSICION FINAL	27-09-2024	10 DE MAYO DE 2025 OFICIO 129
514 -2019	SECAM JM	TRANSFORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RCD	25-09-2025	2 DE JULIO DE 2025 OFICIO 170

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

Para el presente periodo se dio cumplimiento a las actividades ambientales, tal como se muestra en el cronograma que incluye todas las actividades de índole ambiental.

Tabla No. 6. Cronograma de Actividades Ambientales.

DESCRIPCION	AÑO 2025			
	JULIO			
Programa A1. Cumplimiento a obligaciones ambientales contractuales	**9**	**10**	**11**	**12**
Gestión para obtención o actualización de permisos.	1	1	1	1
	10	10	10	10
Cumplimiento de las labores del residente ambiental	1	1	1	1
	10	10	10	10
Elaboración de informes ambientales que reportarán el cumplimiento de la Gestión Ambiental en Obra				1
				10
Programa B1. Manejo ambiental de centros de acopio	**1**	**2**	**3**	**4**
Ubicación de zona de acopio de materiales y RCD	1	1	1	1
	10	10	10	10
Demarcación y señalización de zona de acopio de materiales como concretos, asfaltos, prefabricados, tuberías, formaletas de madera y RCD	1	1	1	1
	10	10	10	10
Cerramiento de zona de acopio de materiales como concretos, asfaltos, prefabricados, tuberías, formaletas de madera y RCD, con malla de polipropileno y/o cinta	1	1	1	1
	10	10	10	10
Mantenimiento del cerramiento de zona de acopio de materiales y RCD, y área a intervenir	1	1	1	1
	10	10	10	10
Instalación de sistema sanitario y baños móviles	1	1	1	1
	10	10	10	10
Ubicación y señalización de canecas plásticas para la recolección de residuos	1	1	1	1
	10	10	10	10
Programa B2. Manejo de materiales de construcción	**1**	**2**	**3**	**4**
Actividad de protección del suelo con lonas, plásticos, geo textil o plataforma metálica	1	1	1	1
	10	**10**	**10**	**10**
Instalación y mantenimiento de la señalización de las zonas de almacenamiento de materiales como concretos, asfaltos, prefabricados, tuberías, formaletas de madera y RCD	1	1	1	1
	0	**0**	**0**	**0**
Programa B3. Manejo Integral de Residuos Sólidos	**1**	**2**	**3**	**4**
Separación y clasificación de los materiales sobrantes RCD, RESPEL, ordinarios, entre otros	1	1	1	1
	10	10	10	10
Recolección de residuos sólidos	1	1	1	1
	10	10	10	10
Limpieza de las vías	1	1	1	1
	10	**10**	**10**	**10**
Limpieza de las llantas de los vehículos y maquinaria de la obra	1	1	1	1
	10	**10**	**10**	**10**
Proveer y mantener los puntos ecológicos y bolsas en todas las áreas de trabajo.	1	1	1	1
	10	10	10	10

Programa B4. Control de emisiones atmosféricas	**1**	**2**	**3**	**4**
Limpieza de las vías de acceso a la obra	1	1	1	1
	0	0	0	0
Certificación de gases de todos los vehículos	1	1	1	1
	10	10	10	10
Cubrimiento de materiales granulados o RCD	1	1	1	1
	0	0	0	0
Cerramiento con paredes en malla de polipropileno para el uso de cortadoras en húmedo	1	1	1	1
	0	0	0	0
Humedecimiento y limpieza de la superficie de la vía	1	1	1	1
	10	10	10	10
Programa B5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros	**1**	**2**	**3**	**4**
Elaboración de inventario de obras hidráulicas y sumideros, diagnóstico del estado actual al inicio de las obras	1	1	1	1
	10	10	10	10
Instalación de filtros para los sumideros que consisten en una malla de "polisombra" de ojo de 1 cm	1	1	1	1
	10	10	10	10
Programa E1 de señalización	**1**	**2**	**3**	**4**
Señalización de los centros de acopio de materiales, acopio de residuos	1	1	1	1
	10	10	10	10
Señalización de frentes de obra	1	1	1	1
	10	10	10	10
Señalización de instalaciones temporales	1	1	1	1
	10	10	10	10
Señalización de los senderos peatonales	1	1	1	1
	10	10	10	10

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.3 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES

Dando continuidad hacia el desarrollo del informe se dispuso de un programa de inducciones, capacitaciones y entrenamiento, en el cual se encuentra inmersa las capacitaciones ambientales y SST que van a hacer dadas al personal durante el desarrollo del proyecto, registros acordes a lo estipulado para el desarrollo del contrato, consultar el anexo adjunto.

Anexo No. 3. Plan de acción ambiental.

Tabla No. 7. Capacitaciones Ambientales- junio

CAPACITACIONES AMBIENTALES - JULIO			
No	Descripción de la charla	No de participantes	Fecha
1	Trabajos mecánicos repetitivos minicargador retroexcavadora	7	2/07/2025
2	Suministro de materiales reciclados	8	28/07/2025

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.4 PROGRAMA DE CONTROL DE DISPOSICION DE RCD

El proyecto cuanta con PIN: 26985, y a la fecha cuenta con la generación de RCD provenientes de los segmentos viales los cuales son provenientes de los siguientes CIV. Estos se iniciaron en el periodo de julio correspondiente al informe N.º 4 el cual corresponde del 1 al 31 de julio del 2025.

Tabla No. 8. Listado de civ´s intervenidos**.**

NUMERO	CIV	PK_ID	TRAMO	DESDE	HASTA
37	11002026	175844	KRA 136A	CLL 143ª	CLL 144
8	11004595	174103	CLL 132 B BIS A	CRA 126 D	TV 127
12	11002945	175729	TV 127 C	DG 139 A BIS	DG 139 B
13	11002757	175731	TV 127 C	DB 139 B	DG 140

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.5 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION – RCD.

El Consorcio Suba Vial Vr, ya se encuentra realizando la documentación reglamentaria y adecuada para el desarrollo de la actividad de la separación de los residuos de RCD generados, para el periodo evaluado se cuenta con la generación de RCD provenientes del CIV 11002026, CIV 11004595. CIV 11002945 los cuales fueron dispuestos en los sitios autorizados.

Tabla No. 9. Relación de RCD durante el periodo de 01 al 30 de junio de 2025- CIV 11002026

SITIO DE DISPOSICION FINAL	MATERIAL	VOLUMEN SUELTO (M3)	FINALIDAD
MAQUINAS AMARILLAS	EXCAVACIÓN	735	Disposición Final
TECNOMINERALES	EXCAVACIÓN	255	Disposición Final
TOTAL		990	

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Tabla No.10. Relación de RCD´S durante el periodo de 01 al 30 de julio de 2025


SITIO DE DISPOSICION FINAL	MATERIAL	VOLUMEN SUELTO (M3)	FINALIDAD
MAQUINAS AMARILLAS	EXCAVACIÓN	180	Disposición Final
PUENTE PIEDRA	EXCAVACIÓN	150	Disposición Final
GRECO	SARDINEL-CONCRETO	14	Aprovechamiento
GRECO	ASFALTO	180	Aprovechamiento
TECNOMINERALES	EXCAVACION	75	Disposición Final
RECICLADOS INDUSTRIALES	SARDINEL-CONCRETO	13	Disposición Final
TOTAL		612	

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Para el periodo correspondiente se están realizando las certificaciones pertinentes correspondiente al mes de junio de las excavaciones generadas, de igual manera se anexan los vales de excavaciones.


Anexo No. 4. *Control RCD.*

Gráfico No 1. RCD´S JUNIO-CIV 11002026

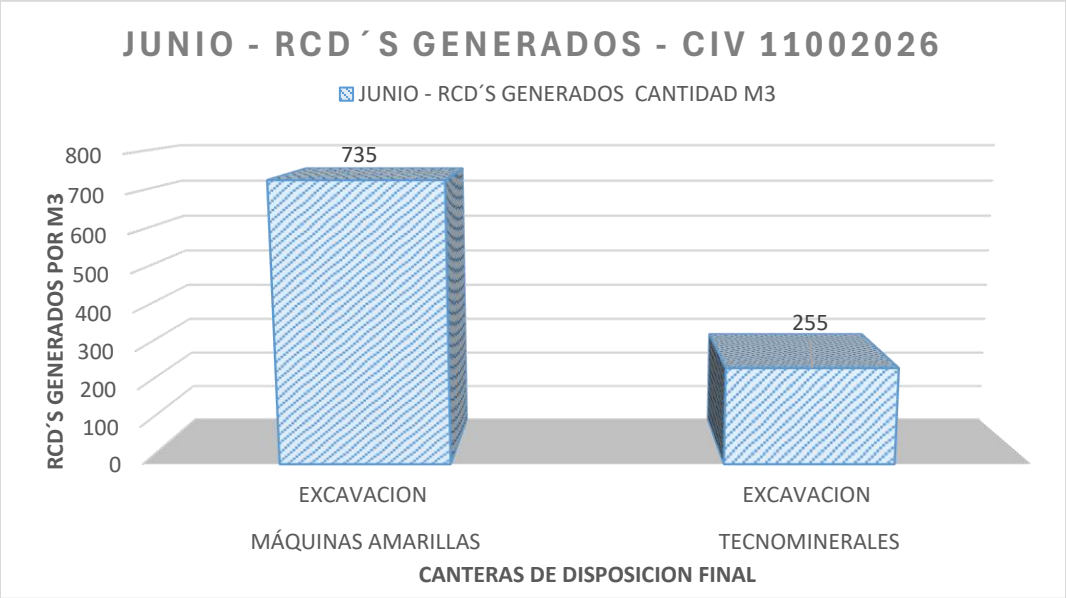

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Gráfico No 2. RCD´S JULIO - CIV 11002026 – CIV 11004595- CIV 11002945

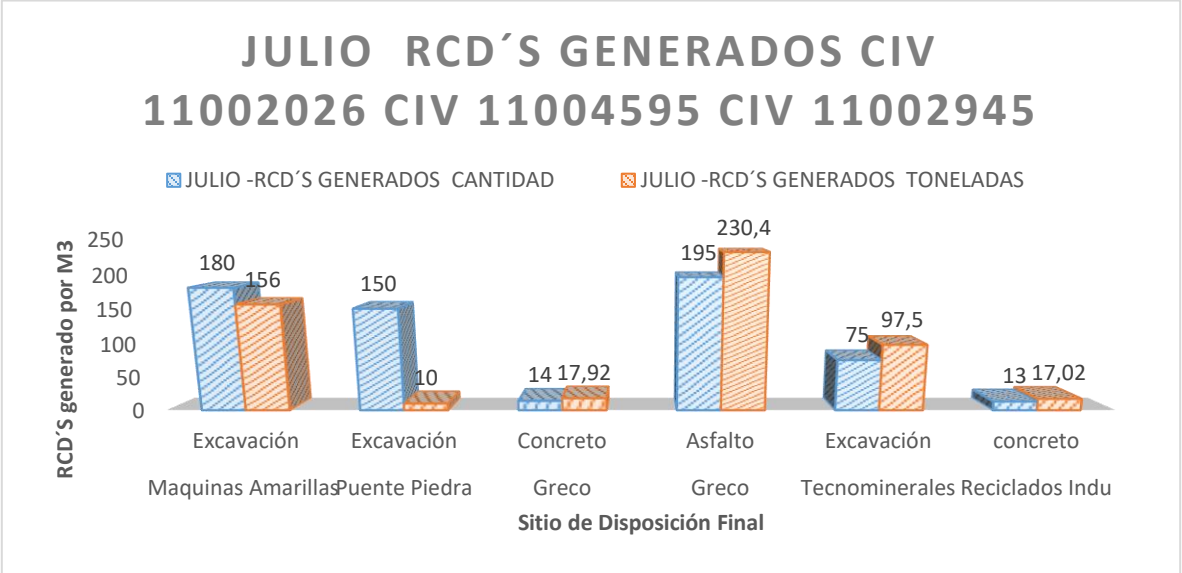

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Para el periodo evaluado se presenta las disposiciones de excavaciones correspondientes de los siguientes CIV 11002026, CIV 11004595 y CIV 11002945 para este periodo se contaron con cuatro sitios de disposición final de las excavaciones autorizadas por la interventoría para este periodo como lo son Maquinas Amarillas, Puente Piedra, Greco y Tecno minerales

En grafico No 2 se evidencia la generación de los metros cúbicos generados en donde el total de estos en toneladas corresponden a 612 m3.

Los cuales fueron entregas a los sitios de disposición y aprovechamiento para sus tratamientos adecuados. Estos se verán reportado en el formato de suministro del programa de manejo ambiental de los RCD´S.

Ilustración No. 3. Cargue de excavación.

CARGUE DE EXCAVACIÓN



Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.6 PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIALES

En el periodo evaluado de julio, se evidencia el suministro de material usado para los CIV 11002026, CIV 11004595, CIV 11002945 por el Consorcio Suba Vial VR, para las actividades requeridas. A continuación, se relaciona las cantidades los materiales usados.

Tabla No. 11. Relación de Materiales del 01 al 30 de junio de 2025

SITIO DE ORGIGEN	MATERIAL	CANTIDAD (M3)
GRECO	SBG-50	240
GRECO	BG-38	14
RECICLADOS INDUSTRIALES	SBG-50	90
CONSTRITURAR	TRITURADO1/4" – 1"	21
CONSTRITURAR	B-200	29
TOTAL		289

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.


Tabla No.12 Relación de Materiales de listado de materiales del 01 al 31 de julio de 2025

SITIO DE ORGIGEN	MATERIAL	CANTIDAD (M3)
GRECO	AR-SBG 50	90
GRECO	AR-BG 38	270
CONSTRITURAR	TRITURADO 1 ½"	43
CONSTRITURAR	B-200	29
RECICLADOS INDUSTRIALES	AR-SBG 50	84
TOTAL		516

Para el periodo correspondiente se está realizando la solicitud pertinente a los certificados de materiales del mes de julio, de igual manera se anexan los vales correspondientes.


Anexo No. 5. *Control Materiales*

Gráfico No. 2. MATERIALES JUNIO-CIV 11002026

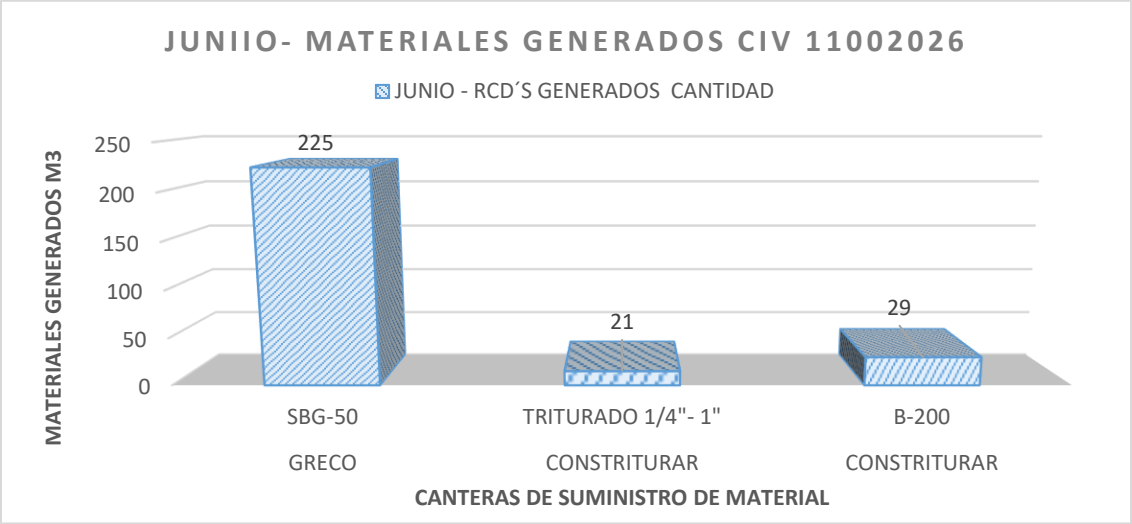

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

Gráfico No 3. Materiales CIV 11002026-11004595-CIV11002945

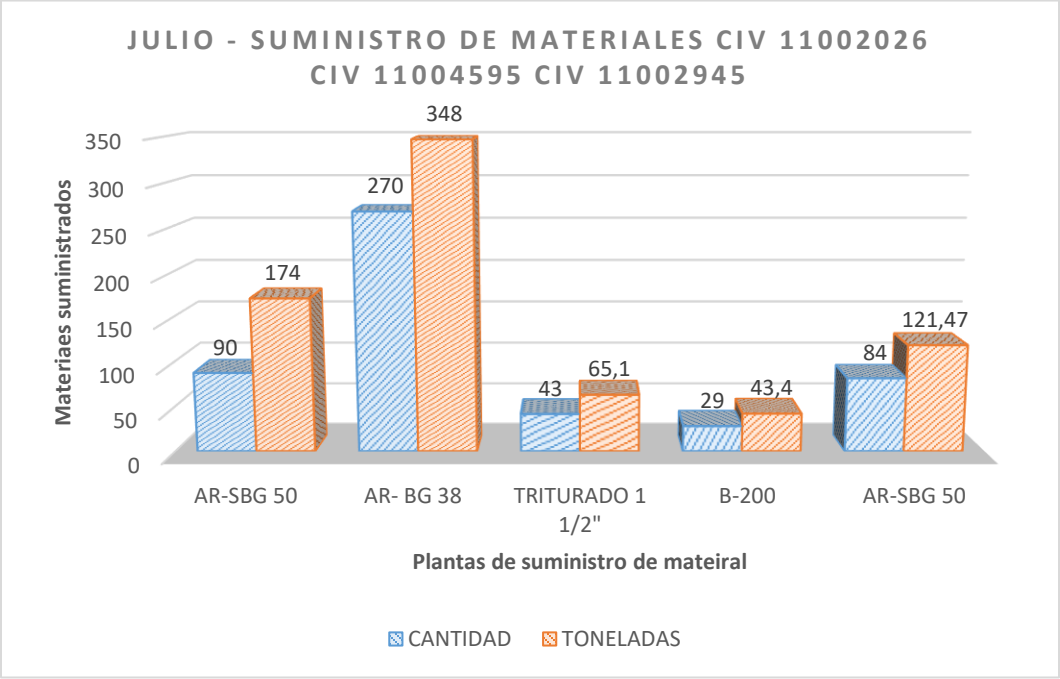

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

En el grafico podemos determinar e identificar los materiales seleccionados a implementar por el Consorcio Suba Vial VR para el desarrollo de las actividades técnicas durante el periodo evaluado en donde contamos con las plantas generado de aprovechamiento, canteras de suministros de materiales pétreos, aprobados por la interventoría para el periodo correspondiente

De igual manera el Consorcio Suba Vial VR emite de su componente ambiental el porcentaje de Circularidad durante el periodo evaluado el cual es correspondiente a: 33.7%.

$$\frac{174\ m^3\ SBG - 50}{516\ \ m^3\ materiales\ totales} * 100 = 33.7\%$$

Ilustración No.4.Instalación de Materiales.

INSTALACIÒN DE MATERIALES


Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

- **MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION**

El Consorcio Suba Vial VR -1009 cuenta con PIN # 26985, a continuación, se relaciona los indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia total de los RCD presentados para el periodo del 01 al 31 julio.

Tabla No. 12. Lista de indicadores de RCD de 01 al 30 de junio.


INDICADORES DE GESTION RCD			
NUMERO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**TONELADA (t)**	**PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t)% (t total)	1228.5	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)% (t aprovechadas /t totales)	0	0%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas /t total)	0	0%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas /t total)	0	0%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas /t total)	0	0%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas /t total)	0	0%
Meta total de aprovechamiento (sumatoria 2,3,4y 5)		0	0

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Tabla No 13 Listado de Indicadores de RCD de 01 al 31 de julio


INDICADORES DE GESTION RCD			
NUMERO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**TONELADA (t)**	**PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t)% (t total)	792.38	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)% (t aprovechadas /t totales)	0	0%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas /t total)	0	0%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas /t total)	272.98	34.45%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas /t total)	0	0%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas /t total)	519.2	65.5%
Meta total de aprovechamiento (sumatoria 2,3,4y 5)		272.98	49%

Ilustración No 5 Indicador de gestión de RCD -junio.

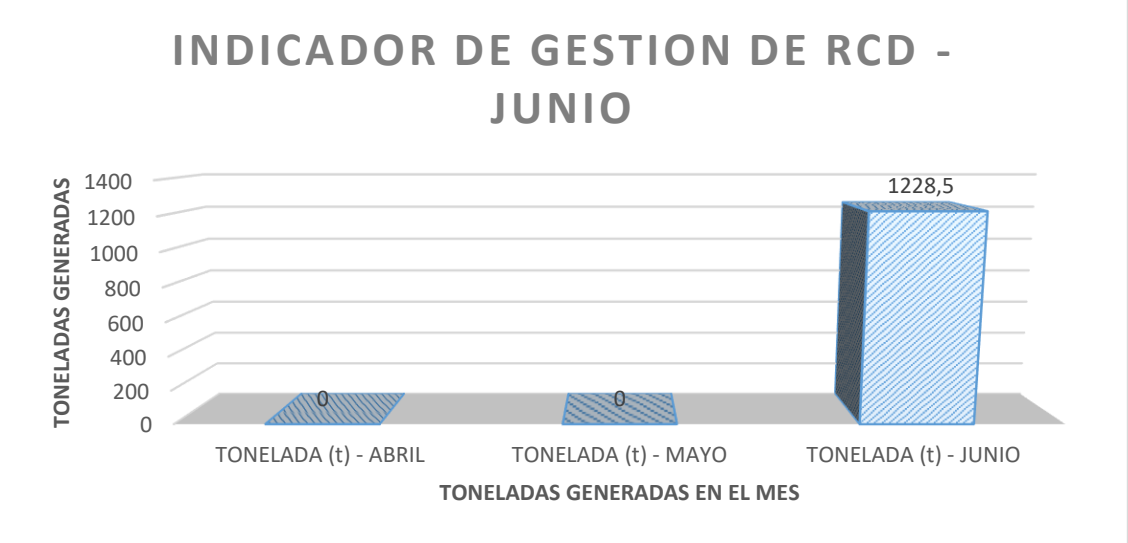

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Ilustración No 6 Indicador de gestión De RCD Julio

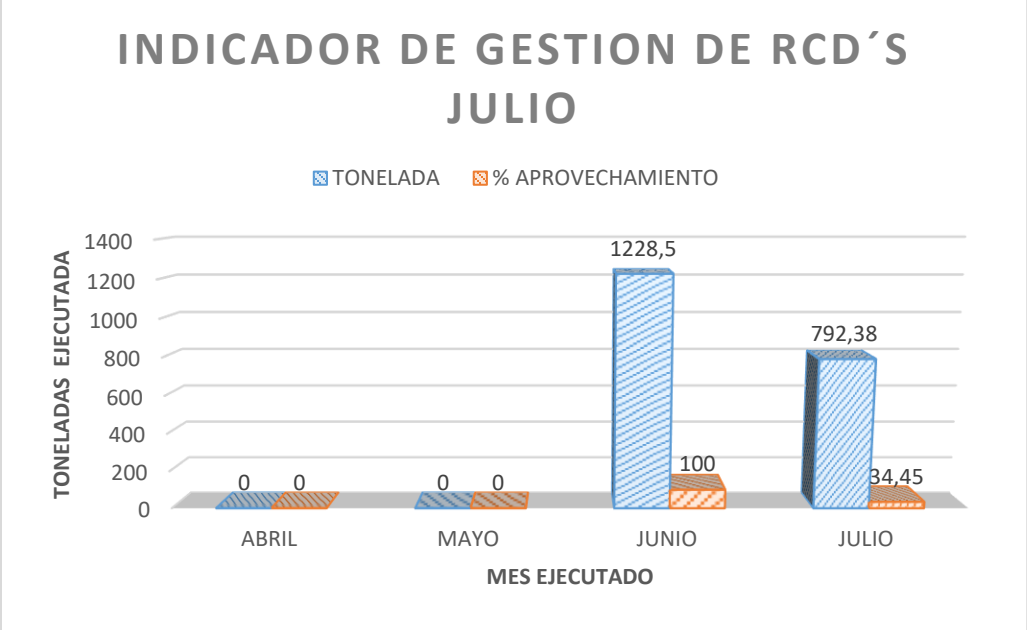

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.7 MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO.

Para el periodo evaluado se contó con un campamento temporal el desarrollo con los insumos pertinentes y adecuados para el personal que va a estar encargado en la ejecución de las actividades civiles, de igual manera se el campamento cuenta con unidades portátiles de baños del servicio de las unidades portátiles de baños va a estar organizadas y desarrolladas por la empresa encargada para el mantenimiento del aseo y recolección del agua residual generada, estos mantenimientos se realizan dos veces por semana.

Tabla No. 14. Listado de Campamentos instalados.

UBICACIÓN	TIPO DE CAMPAMENTO		UNIDAD SANITARIA		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
	FIJO	MOVIL	FIJO	MOVIL	
CRA 136A - CLL 144 - CL 143A		1		1	1

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

Tabla No 15 Listado de ubicación de baños

UBICACIÓN	TIPO DE CAMPAMENTO		UNIDAD SANITARIA		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
	FIJO	MOVIL	FIJO	MOVIL	
CLL 132 B BIS CRA 126 D TV 127		1		1	1
TV 127 C DG 139 A BIS DG 140		1		1	1

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

Ilustración No. 7, 8, 9 y 10. Adecuación de campamento de obra, protecciones de sumideros, protección de materiales y aseo, mantenimiento de baño portátil.

CAMPAMENTO DE OBRA	PROECCIÒN DE SUMIDEROS
	
PROTECCIÒN DE MATERIALES	**ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑO PORTATIL**
	

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Anexo No. 6. *Manejo de agua.*

6.8 FICHA DE INDIVIDUOS ARBOREOS

Este componente tiene como fin establecer las acciones para el manejo de los individuos arbóreos que se van a encontrar en el frente de obra de manera que se prevengan, minimicen y controles los impactos sobre la vegetación y zonas verdes. Para su desarrollo forestal y ambiental se realiza el plano geográfico de ubicación acorde a la información solicitada.

Por lo tanto, se evidencia que el Fondo de desarrollo local mediante el profesional forestal realiza la ficha técnica y silvicultura del individuo arbóreo a diagnostica y a realizar el procedimiento y solicitud de tala. El cual podrá ser consultado dentro del siguiente anexo:

Con la revisión inicial del contrato de obra, el Fondo de desarrollo local cuenta una documentación y solicitud ante la secretaria distrital del medio ambiental hacia la solicitud de autorización de tratamiento silvicultura de (1) individuo arbóreo ubicado en la Calle114 No 136ª -09. A continuación, se menciona enumeran los documentos radicados de N.º 2025ER86037. 15/05/2025 colocar la vista de la ingeniera por parte de la sda. Soporte de visita.

Anexo No. 7. Ficha de individuos arbóreos.

6.9 CUMPLIMIENTO DE INSTALACION DE GCR

El artículo 10 del Decreto Distrital 265 de 2016, establece que desde el 1 de julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en proceso constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metro cuadrado de la mezcla asfáltica usada para la obra en un porcentaje no menor al 30% de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías vehiculares (troncales de tráfico mixto, Malla vial arterial , No troncal, Malla Vial intermedia, Malla Vial Local.

Dando cumplimiento al decreto en mención a la fecha tiene un porcentaje de 0% las cantidades instaladas y proyectadas de mezcla.

TOTAL, MEZCLA INSTALADA (m3):0 m3
TOTAL, MEZCLA POR INSTALAR (m3):0m3
TOTAL, MEZCLA GCR(m3):0m3
Para el periodo evaluado no se han tenido reportes de mezclas instaladas: (m3): 0m

6.10 APROVECHAMIENTO IN SITU

En el periodo evaluado no se ha realizado el aprovechamiento in situ 0 m3 aprovechados.

Anexo No. 8. *Aprovechamiento INSITU*

7 GESTIÒN DE LA SEGURIDAD Y SALU D EN EL TRABAJO

7.1 NORMATIVIDAD:

LEY 2101 DE 2021: Dando cumplimiento a esta ley, donde se establece la reducción de la jornada laboral, el Consorcio Suba Vial VR emite un memorando donde se notifica a todos sus colaboradores que se ha establecido un nuevo horario laboral y comenzó a regir a partir del 15 de Julio del presente año.

A continuación, se detalla el nuevo horario laboral:

Lunes a viernes: 7:00 am – 4:00 pm

Sábados: 7:00 am – 11:00 am

El nuevo horario fue debidamente socializado con el personal del consorcio Suba Vial VR, asegurando una comprensión de los ajustes realizados a la jornada laboral y pueden ser evidenciados en las fotografías y en el anexo.

Anexo No. 9. *Soportes reducción jornada laboral.*

Ilustración 11, 12, 13, 14. Socialización del memorando informativo – Reducción de la jornada laboral

SOCIALIZACIÓN MEMORANDO INFORMATIVO – REDUCCIÓN JORNADA LABORAL









Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.2 POLITICAS:


En el punto de atención al ciudadano y en el frente de obra se encuentran publicadas firmadas y divulgadas las siguientes políticas y demás procedimientos.

- Política de seguridad y salud en el trabajo.
- Política ambiental.
- Política sobre consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Manual de convivencia laboral.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Plan de emergencia.
- Medevac.
- Divulgación del nuevo horario laboral.

A continuación, se muestra las carteleras informativas instaladas en los sitios de trabajo.

Ilustración No. 15, 16. Carteleras informativas.

CARTELERAS INFORMATIVAS

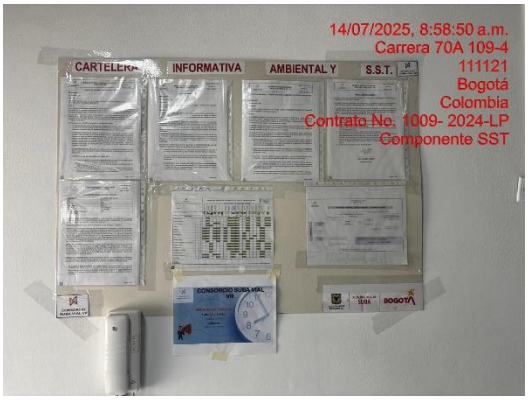



Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.3 CRONOGRAMA DE TRABAJO Y CAPACITACIONES

Para el presente periodo se dio cumplimiento a las actividades programadas en el cronograma de trabajo y capacitación para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo con un cumplimiento del 100% como se muestra a continuación:

Anexo No. 10.*Cronograma de trabajo y capacitaciones.*

Tabla No. 16. Cronograma de trabajo y capacitaciones – julio 2025

ACTIVIDADES		MES 4 jul-25			
		1	2	3	4
ADECUACIÓN DEL SGSST PARA EL PROYECTO					
(INDUCCIONES Y NOTIFICACIONES DE RIESGO)		P E	P E	P E	P E
SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS INTERNAS EN SGSST A TODO EL PERSONAL(INDUCCION)		P E	P E	P E	P E
AFILIACIONES AL SGSS:		P E	P E	P E	P E
PAGOS AL SGSS:		P E	P E	P E	P E
INDUCCION	GENERAL: (SGSS, AT, EP, Plan de emergencia, EPP,	P	P	P	P

		Notificación derecho examen egreso)	E	E	E	E
		NOTIFICACION DE RIESGOS	P	P	P	P
			E	E	E	E
COPASST	PLAN DE TRABAJO	INVESTIGACION DE ACCIDENTES, (cuando ocurran),	P	P	P	P
			E	E	E	E
		CONFORMACION				
		REUNIONES MENSUALES	P			
			E			
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	PLAN DE TRABAJO	CONFORMACION				
		REUNIONES TRIMESTRALES				
MEDICINA PREVENTIVA						
REMISION EPS Y ESPECIALISTAS (NOTIFICACIÓN)			P	P	P	P
			E	E	E	E
CAMPAÑAS/ CAPACITACIONES		PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y TABAQUISMO				
MEDICINA DEL TRABAJO						
EXAMENES DE INGRESO Y EGRESO			P	P	P	P
			E	E	E	E
AUSENTISMO LABORAL						P
						E
HIGIENE INDUSTRIAL						
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS,			P	P	P	P
			E	E	E	E
UNIDADES SANITARIAS /EN CONJUNTO CON EL AREA AMBIENTAL MANTENIMIENTOS, ESTOS MTTO SE REPORTAN EN EL ÁREA AMBIENTAL			P	P	P	P
			E	E	E	E
SEGURIDAD INDUSTRIAL						
ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS			P	P	P	P
			E	E	E	E
INSPECCIONES PERIODICAS		INSPECCIÓN VEHICULOS Y MAQUINARIAS				P
						E
		INSPECCIONES LOCATIVAS				P
						E
		INSPECCION DE USO DE EPP				P
						E
		INSPECCION DE BOTIQUINES				P
						E
						P

	INSPECCIONES DE EXTINTORES				E
	INSPECCION DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD				P
					E
ENTREGA DE DOTACIÓN Y REPOSICION DE EPP		P	P	P	P
		E	E	E	E
REPORTE E INVESTIGACION Y ELABORACION DE INFORME DE INCIDENTES Y ACCIDENTES, Si aplica		P	P	P	P
		E	E	E	E
SOCIALIZACION PROCEDIMIENTOS: En la inducción		P	P	P	P
		E	E	E	E
CAPACITACIÓN	USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
	CAUSAS Y CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES				
	RIESGO BIOMECANICO				
	USO CORRECTO DE TAPABOCAS			P	
				E	
	MATERIAL PARTICULADO, la importancia de utilizar el tapabocas				
	RUIDO				
	PREVENCION DE INCENDIOS				
	SUPERFICIE DE TRABAJO IRREGULARES				
	CUIDADO DE OJOS				
	RIESGO PÚBLICO				
PLAN DE EMERGENCIA					
SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIAS (En la inducción)		P	P	P	P
		E	E	E	E
Entrega y Reposición de Elementos de los Botiquines		P	P	P	P
		E	E	E	E
Reporte y atención de emergencias		P	P	P	P
		E	E	E	E
Simulacro					
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO		19	18	19	25
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO		19	18	19	25
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		100%	100%	100%	100%

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.4 PERSONAL DEL CONSORCIO SUBA VIAL VR

Se relaciona a continuación el personal contractual del CONSORCIO SUBA VIA VR.

Tabla No. 17. Listado de personal contractual.

No.	NOMBRES COMPLETOS	CARGO
1	Sandra Mariana Cuestas Fajardo	Director De Obra
2	Maida Nilaydi Cómbita Bosiga	Residente De Obra
3	Carlos Mauricio Castillo Londoño	Residente De Obra
4	Fabian Mauricio Benavides García	Especialista en Diseño Geométrico
5	Helbert Hernández Miranda	Especialista en urbanismos y en espacio publico
6	Laura Camilla Morales Galeano	Arquitecto apoyo en diseño urbano
7	Orlando Elías Gómez Maldonado	Especialista en Geotecnia
8	Juan Ricardo Troncoso	Especialista en Pavimentos
9	Lisando Núñez Galeano	Especialista en Redes Hidrosanitarias
10	Ana Milena Olarte Arenas	Especialista en Estructura
11	Luisa Fernanda Isaza Manrique	Especialista en SIGCAD
12	Andrés Felipe Torres Lozano	Profesional en presupuesto y programación
13	Jenny Alexandra Pira Barreto	Profesional en redes secas
14	Antonio Alejandro Acosta	Residente ambiental
15	Juan David Castañeda	Ingeniero Forestal
16	Henry Camilo Durán	Residente SST
17	Oscar Alejandro Santamaria	Residente de maquinaria y equipo
18	Liliana Galindo Zabaleta	Residente Social
19	Carlos Andrés muñoz león	Especialista en tránsito y transporte
20	Ana Milena Pulido Sora	Especialista en tránsito y transporte
21	Doris Julieth Mora Daza	Gerente

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.5 PROCEDIMIENTO DE INGREGO Y RETIRO DEL PERSONAL.

7.5.1 Ingreso de personal

Durante el periodo evaluado, el CONSORCIO SUBA VIAL VR ha llevado a cabo la vinculación del personal necesario para el desarrollo de las actividades operativas. Como parte del proceso de contratación, se realizaron de manera oportuna los procedimientos correspondientes de afiliaciones a ARL, EPS y FONDO DE PENSIONES, garantizando el cumplimiento de las normativas laborales y de seguridad social vigente.

Para el periodo del 1 al 31 de julio del 2025, Se realizo él envió de treinta y una (31) documentos correspondientes de personal a vincular, estos documentos fueron revisados y aprobados por la interventoría, de los cuales ingresaron treinta y una (31) personas, los demás quedan aprobados para su ingreso posteriormente, se adjunta toda la documentación aprobada en el anexo adjunto:

Anexo No. 11. *Documentación de personal.*

Tabla No. 18. Listado ingreso de personal-julio de 2025

No.	FECHA DE APROBACIÒN	NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	CARGO
1	03/07/2025 Of. 222	Jose Lorenzo Marquez Guzman	1.129.486.445	Ayudante de obra
2	03/07/2025 Of. 222	Steven Enrique Castro Hernandez	1.037.439.776	Ayudante de obra
3	07/07/2025 Of. 237	Omar Yesid Gonzalez Teran	1.099.551.831	Ayudante de obra
4	14/07/2025 Of. 256	Luis Junior Camargo Vargas	1.103.739.923	Ayudante de obra
5	16/07/2025 Of. 260	Carlos Alfredo Rengifo Pastrana	1.007.584.356	Ayudante de obra
6	16/07/2025 Of. 260	Orlando Julio Flores Alltamiranda	1.069.501.378	Ayudante de obra
7	16/07/2025 Of. 260	Felipe Bohorquez Nuñez	80.755.839	Ayudante de obra
8	16/07/2025 Of. 260	Jader Alberto Gonzalez Gouriyu	1.006.917.014	Ayudante de obra
9	17/07/2025 Of. 260	Ricardo Madrid Racero	1.192.742.761	Ayudante de obra
10	17/07/2025 Of. 260	Carlos Mario Osuna Rosario	1.002.250.337	Ayudante de obra

No.	FECHA DE APROBACIÒN	NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	CARGO
11	21/07/2025 Of. 267	Larson Daniel Hernandez Aragon	1.045.771.072	Ayudante de obra
12	21/07/2025 Of. 267	Jhon Jairo Mendoza Cabarcas	73.213.100	Ayudante de obra
13	22/07/2025 Of. 274	Joiscer Ardila Matos	1.046.431.060	Ayudante de obra
14	24/07/2025 Of. 287	Jainer Antonio Aparicio Diaz	1.143.388.571	Ayudante de obra
15	3/07/2025 - Correo.	Fredys Hernandez Palma	72.047.324	Ayudante de obra
16	14/07/2025 - Correo.	Juan Bernardo Valencia Tobar	17.360.851	Ayudante de obra
17	18/07/2025 - Correo.	Jhon Alexander Rodriguez Ramirez	1.010.181.099	Ayudante de obra
18	18/07/2025 - Correo.	Osner Jose De Hoyos Avila	1.063.161.816	Ayudante de obra
19	14/07/2025 - Correo.	Jeferson Camilo Gonzalez Rodriguez	1.016.098.544	Encargado - Maestro
20	18/07/2025 - Correo.	Sebastian Martinez Lopez	1.010.761.370	Ayudante de obra
21	1/07/2025 - Correo.	Miguel Angel Mancipe Medina	1.010.760.424	Conductor
22	17/07/2025 - Correo.	Wilmer Andres Camacho Gutierrez	1.031.180.934	Conductor
23	17/07/2025 - Correo.	Danny Arnulfo Gomez Gonzalez	80.722.563	Conductor
24	09/07/2025 - Correo.	Fabio Humberto Riaño Largo	1.020.719.296	Conductor
25	10/07/2025 - Correo.	Beimar Lopez Vargas	74.436.408	Conductor
26	4/07/2025 - Correo.	Virgilio Julian Jimenez Moreno	1.067.727.941	Operario
27	14/07/2025 - Correo.	Cristian Giovanny Algarra Rojas	1.001.078.136	Operario
28	22/07/2025 - Correo.	Yesid Arley Baquero Pereira	1.071.548.206	Operario
29	07/07/2025 - Correo.	Juan Esteban Sanchez Ñanguma	1.071.548.206	Operario
30	29/07/2025 – Correo.	Edgar Fabian Barrera Rodríguez	1.057.597.030	Operario
31	29/07/2025- OF.293	Carolimpo Hernandez Moreno	79.809.829	Cadenero 1

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.6 Retiro de personal

Para el periodo de 1 al 31 de julio del 2025 se presentó retiro de cinco (5) personas.

Tabla No. 19. Listado retiro de personal.

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	Edison David Chavarro González	1014268014	Cadenero Primero
2	Juan Camilo Amador Camargo	1001113548	Ayudante de obra
3	Juan Saul Bellos Palomo	1056774915	Ayudante de obra
4	Diego Javier Sanguino Mojica	79276683	Ayudante de obra.
5	Cristian Giovanny Algarra Rojas	1001078136	Operario

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

En el **Anexo No. 11**. Documentación de personal se adjunta las cartas de retiro.

Para el presente periodo se contó con la participación de un total de noventa (90) personas, quienes estuvieron involucradas en el desarrollo de las actividades. Esta información puede ser verificada en el anexo Adjunto.

Anexo No. 12. *Listado de personal.*

7.7 PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL.

Dando cumplimento a la ley 100 de 1993, la cual establece que todo colaborador debe estar debidamente Afiliado y con aportes vigentes al Sistema General de Seguridad Social, todo el personal que ingresa a realizar actividades al proyecto, se les realiza las respectivas afiliaciones a ARL, EPS y certificado de AFP.

Así mismo, al personal ya vinculado, se les realiza la verificación mensual de los pagos al sistema de seguridad Social correspondiente al mes en curso, con el objetivo de garantizar la cobertura en salud, pensión y riesgos laborales a todos los colaboradores del proyecto.

Los soportes de los pagos de seguridad social del personal pueden ser consultados en el siguiente Anexo:

Anexo No. 13.*Pagos de seguridad social*.

7.8 COMITES

7.8.1 COPASST

El día 25 de julio de 2025 se realizó el segundo comité de seguridad y salud en el trabajo don se trataron temas relacionados con:

- Cumplimiento de los compromisos.
- Verificación de materiales, para apertura de tramo almendros.

Ilustración No. 17. *Reunión COPASST.*

REUNIÒN COPASST



Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Anexo No. 14. *Acta de reunión COPASST.*

7.9 CAPACITACIONES, INDUCCIONES, CHARLAS DE SEGURIDAD

7.9.1 INDUCCIÒN

Se efectúo la inducción a los colaboradores que ingresaron durante el periodo comprendido desde el 01 hasta el 31 de julio de 2025, en los temas relacionados a continuación:


- Las generalidades de la empresa
- Política y objetivos SST
- Política de prevención de consumo de alcohol y drogas
- Horarios de trabajo
- Accidentes de trabajo como reportarlos, enfermedad profesional.
- Uso de elementos de protección personal
- Programas basados en seguridad
- Copasst
- Comité de convivencia laboral
- Notificación de riesgos
- Comunicación sobre funciones y responsabilidades con el SGSST
- Evaluación de la inducción

Los soportes de la inducción y notificación se pueden evidenciar en la ilustración mostrada a continuación y en el anexo adjunto:

Ilustración No. 18, 19, 20, 21.*Asistencia a inducción y notificación de riesgos.*

ASISTENCIA A INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS.	
	



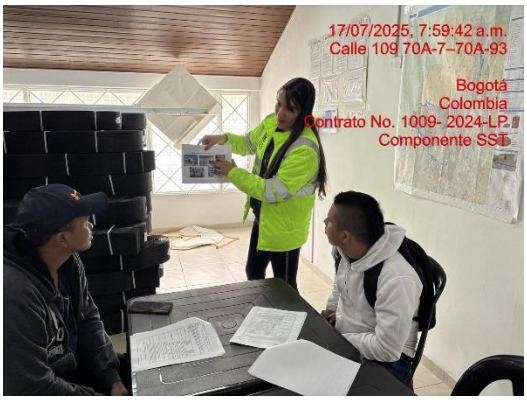

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Anexo No. 15.*Notificación de riesgos e inducción.*

7.9.2 CAPACITACIONES, CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante el presente periodo se llevó a cabo una capacitación realizada en el frente de obra, realizada el 25 de julio de 2025 el tema tratado fue sobre uso correcto del tapabocas y charlas de seguridad y salud en el trabajo, se pueden evidenciar en las ilustraciones y el anexo adjunto:

Anexo No. 16.*Capacitaciones y charlas.*

A continuación, se relacionan temas tratados en las charlas de seguridad:

Tabla No. 20. Listado de Charlas. julio – 2025

No.	FECHA	TEMA TRATADO
1	01/07/2025	Por qué la seguridad es responsabilidad de todos.
2	02/07/2025	Riesgos más comunes en el lugar de trabajo.
3	03/07/2025	Caídas, causas frecuentes.
4	04/07/2025	Pausas Activas.
5	05/07/2025	Hidratación en jornadas laborales.
6	7/07/2025	Importancia del descanso.
7	08/07/2025	Manejo Seguro de herramientas manuales.

8	09/07/2025	Los EPP no es opcional, son obligatorios.
9	10/11/2025	Cuidado de los elementos del punto de emergencia.
10	11/07/2025	Cuidado de objetos personales.
11	12/07/2025	Pausas Activas.
12	14/07/2025	Reducción de jornada Laboral
13	15/07/2025	Importancia de los EPP adecuados de acuerdo a las actividades.
14	16/07/2025	Importancia del reporte de accidentes
15	17/07/2025	Uso adecuado de los botellones de agua.
16	18/07/2025	Lavado de manos.
17	19/07/2025	Autocuidado.
18	21/07/2025	Transmilenio.
19	22/07/2025	Cuido mis manos.
20	23/07/2025	Capacitación Vanti, Medidas preventivas ante ruptura de manguera de gas.
21	24/07/2025	Divulgación de uso de formato Stop
22	25/07/2025	Capacitación del uso correcto del tapabocas.
23	26/07/2025	Uso adecuado de los fontaneros.
24	28/07/2025	Socialización formato de registro de asistencia
25	29/07/2025	Importancia de la puntualidad.
26	30/07/2025	Uso Moderado del celular.
27	31/07/2025	Maquinaria pesada: no te acerques innecesariamente.

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Ilustración No. 22, 23, 24, 25. *Asistencia a charlas y capacitaciones.*

CHARLAS Y CAPACITACIONES









Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.10 ELABORACION Y DIVULGACIÒN DE ATS

Durante el periodo en conjunto con la interventoría, se estableció de manera consensuada que los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) se elaborarán exclusivamente para aquellas actividades consideradas de alto riesgo o no rutinarias. Esta directriz responde a la necesidad de enfocar los esfuerzos en los controles críticos y garantizar que los recursos asignados a la gestión del riesgo sean utilizados de manera eficiente.

Se entiende por actividades de alto riesgo aquellas que implican exposición a condiciones peligrosas tales como trabajos en alturas, espacios confinados, manipulación de sustancias químicas peligrosas, trabajos con energía eléctrica, izajes, excavaciones profundas, entre otros. Por su parte,

las tareas no rutinarias comprenden actividades que no se realizan de forma habitual o que presentan condiciones variables que pueden generar nuevos peligros.

Para este periodo se realizaron ATS para la ejecución de actividades de alto riesgo como el relleno del posta del CIV. 11004595.

Anexo No. 17.*Soportes de ATS diligenciados.*

7.11 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN.

Se realizó la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación a los colaboradores, con el fin de garantizar su seguridad y cumplimiento de las normas establecidas en materia de salud y seguridad en el trabajo. La dotación incluyó los elementos necesarios según las actividades asignadas, asegurando que cada trabajador cuente con los insumos adecuados para el desarrollo seguro de sus funciones.

Anexo No. 18.*Entrega de Dotación y EPP.*

Ilustración No. 26, 27, 28, 29. *Entregas de Dotación y EPP.*

SOPORTE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	
	





Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.12 SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE FRENTES DE OBRA.

El CONSORCIO SUBA VIAL VR realizó la instalación de señalización preventiva en sus sitios de trabajo, incluyendo:

- Rutas de evacuaciones
- Ubicaciones de extintores
- Ubicación de camilla
- Ubicación de botiquín
- Identificación de riesgos
- Punto de hidratación
- Cartelera Informativas

Ilustración No. 30, 31, 32, 33. *Señalización punto crea.*

SEÑALIZACIÒN PUNTO CREA









En los sitios donde se realizaron actividades se usó la siguiente señalización:

- Rutas de evacuación
- Senderos peatonales (demarcados y libres de obstáculos).
- Cerramiento con polimalla azul y polisombra verde marcada.
- Instalación de PMT
- Señalización preventiva (prohibido fumar, uso de los elementos de protección personal, maquinaria en movimiento, prohibido el ingreso a personal no autorizado).

Ilustración No. 34, 35, 36, 37, 38, 39*.Señalización en los frentes de obra.*

SEÑALIZACIÒN FRENTES DE OBRA





SEÑALIZACIÒN FRENTES DE OBRA










Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

De igual manera, se verificó que toda la señalización estuviera colocada de forma estratégica y claramente visible, con el fin de advertir y restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se desarrollaban las actividades. Esta medida tiene como objetivo principal garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los miembros de la comunidad aledaña. La correcta implementación de la señalización puede ser corroborada en las siguientes ilustraciones, donde se evidencia su ubicación adecuada y su función preventiva en el entorno de trabajo.

7.13 INSPECCIONES

Durante el periodo evaluado se realiza inspecciones, preoperacionales y permisos necesarios para la ejecución de las actividades programadas diariamente, dando cumplimiento a todas las actividades del proyecto, podrán ser evidenciadas en la siguiente ilustración y el anexo adjunto.

Ilustración No. 40, 41, 42, 43*. Inspecciones y preoperacionales.*

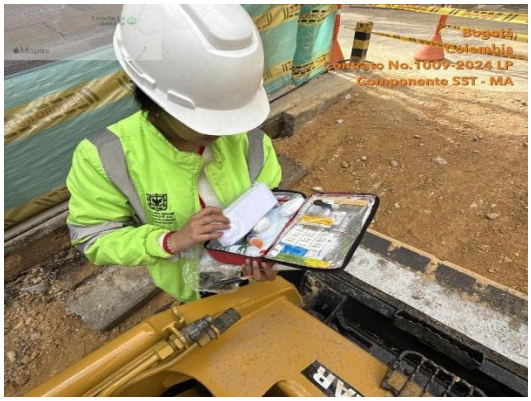INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES	
	
	

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Tabla No. 21.Inspecciones julio - 2025

INSPECCIÒN REALIZADA	NUMERO DE INSPECCIONES
Inspección de equipos y vehículos.	10
Inspección de botiquín.	5
Inspección de uso y estado de EPP.	5
Inspecciones locativas.	5
Inspección de señalización de seguridad.	5
Inspección de orden y aseo	5
Inspección de herramientas	5

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Anexo No. 19.*Inspecciones y preoperacionales.*

7.14 MEDICINA PREVENTIVA

7.14.1 EXAMEN DE INGRESO

Se realizaron los respectivos exámenes de ingreso a todo trabajador que ingreso a desarrollar actividades Laborales en el CONSORCIO SUBA VIAL VR, se les realizo el examen médico ocupacional, antes de iniciar sus respectivas actividades. Estos exámenes ocupacionales se realizan por IPS idóneas para implementar dichos exámenes una de estas entidades utilizadas es Medilaboral, esta entidad cuenta con un grupo de médicos especialistas en salud ocupacional para realizar dichos exámenes, y licencia de prestación de Servicios de Seguridad y Salud y Trabajo, es utilizada solo para los empleados contratados directamente para el CONSORCIO SUBA VIAL VR, para el personal de subcontratación se maneja con la IPS según comodidad propia, entre las cuales se encuentran: CLINISUR IPS LTDA, Quirón UNIDAD MÉDICA no obstante estos exámenes deben ser enviados de inmediato al profesional SST y este enviado a la interventoría para su aprobación.

Anexo No. 20*.Exámenes médicos.*

7.14.2 EXÁMENES DE EGRESO

Los exámenes médicos de egreso se realizarán cuando a un empleado se le dé o el mismo decide terminar sus labores, sin importar la causa. Este examen comprende de un chequeo médico general, y busca tener la certeza que la persona se retira en buenas condiciones de salud laboral.

Para el presente periodo se realizó la entrega de notificación de exámenes de retiro a la persona que se retiró y se puede verificar en el **Anexo 18.**

7.14.3 HIDRATACIÓN

Se realizó el suministro de agua potable consumo del personal, garantizando las condiciones necesarias para una correcta hidratación durante la jornada laboral. El acceso al agua potable estuvo disponible de manera permanente en la cocina del Punto de Atención al Ciudadano y en los sitios donde se realizaron actividades, destinada exclusivamente para este fin como se muestra a continuación.

Ilustración No. 44, 45*.Punto de hidratación*

PUNTO DE HIDRATACIÓN	
	

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.15 PLAN DE EMERGENCIA.

Para el presente periodo, el CONSORCIO SUBA VIAL VR tiene instalada en el Punto de Atención al Ciudadano, Los siguientes elementos: un (1) botiquín tipo A, un (1) extintor multipropósito tipo ABC de

10 libras, y una (1) camilla. Además, se tiene publicada en la cartelera informativa el Medevac acorde las necesidades.

Ilustración No. 46,47,48,49*.Punto de atención a emergencias – PAC.*

PUNTO DE ATENCIÒN A EMERGENCIAS - PAC









Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Adicional se realizó la instalación de los siguientes elementos en todos los frentes de un (1) botiquín tipo A, un (1) extintor multipropósito tipo ABC de 10 libras, y una (1) camilla en el campamento de obra. Además, se tiene publicada en la cartelera informativa el Medevac acorde las necesidades.


Ilustración No. 50, 51, 52, 53*.Punto de atención a emergencias – frente de obra.*

PUNTO DE ATENCIÒN A EMERGENCIAS – FRENTE DE OBRA







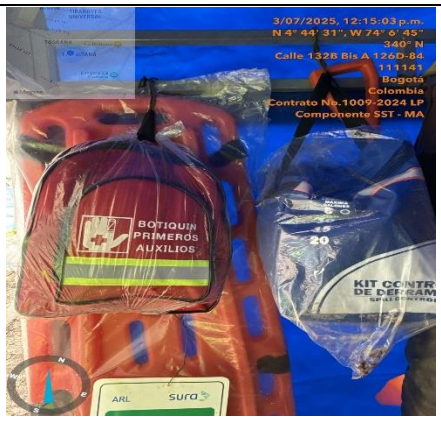

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

8 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

8.1 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Para el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2025, tuvimos la aprobación de la documentación catorce (14) maquinas, de las cuales a la fecha solo han ingresado seis (6) maquinas, las cuales cuentan con su stiker de identificación, las demás maquinas quedan aprobadas para su posible ingreso.

Tabla No. 22. *Maquinaria ingresada a obra.*

TIPO	REF.	MODELO	MOVIL #
VIBROCOMPACTADOR	HAMM2220D	2001	**5**
EXCAVADORA	SHANTUI SE75	2022	**4**
MINICARGADOR	CATERPILLAR 236B2	2008	**16**
EXACAVADORA	YANMAR VIO 45	2014	**12**
MINICARGADOR	CATERPILLAR 236B	2009	**15**
EXCAVADORA	SHANTUI SE75	2024	**21**

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Ilustración No. 54, 55*. Maquinaria con identificación móvil.*

MAQUINARIA CON IDENTIFICACIÒN MOVIL	
	

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

8.2 MANEJO DE VEHICULOS

En este periodo seguimos contando con un total de (16) vehículos aprobados, los cuales a mediada que van ingresando se realiza la instalación de la identificación de su stikers móvil como se puede evidenciar a continuación.

Tabla No. 23.Listado de vehículos ingresados en el mes a obra.

No.	FECHA DE APROBACIÒN	PLACA	MODELO	TIPO	MOVIL No.
1	22-04-2025	JTY693	2021	Camioneta	1
2	1/07/2025	FSU179	2019	Furgón	2
3	09/06/2025	SKX618	2009	Volqueta	6
4	09/06/2025	WFV868	2015	Volqueta	10
5	05/06/2025	TVB239	2013	Volqueta	11
6	26/06/2025	VDZ456	2006	Volqueta	13
7	10/07/2025	SST050	2012	Volqueta	14
8	17/06/2025	SPV659	2011	Volqueta	8
9	17/06/2025	KUL475	2007	Volqueta	7
10	11/06/2025	SZO642	2012	Volqueta	9
11	17/07/2025	KUM989	2008	Volqueta	20

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

***Ilustración No. 56, 57**.Vehículos con identificación.*

VEHICULOS IDENTIFICADOS





Fuente: Consorcio Suba Vial VR

9 INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

9.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD

Los indicadores utilizados para analizar la accidentalidad son: frecuencia y severidad que relacionan las lesiones incapacitantes y los días cargados a esas lesiones con el número de horas/hombre trabajadas, por ende, estos indicadores vinculan automáticamente las horas de exposición con la lesión y el índice de lesiones incapacitantes que integra las dos anteriores, para este periodo no se presentaron accidentes.

NOMBRE INDICADOR	DEFINICIÓN	COMO SE MIDE	INTERPRETACIÓN	RESULTADO
Índice de Frecuencia Accidentes de trabajo	Es la relación entre el número total de A.T con y sin incapacidad, registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante = 100 personas x 50 semanas (año) x 48 horas de trabajo (semanal); de donde: K = 240.000 ANO K = 120.000 SEMESTRE K = 20.000 MES). El resultado se interpreta como numero de AT ocurridos durante el periodo por cada 100 trabajadores de tiempo completo.	IFAT =(N° TOTAL DE A.T / N° HHT)*K K=20.000 constante At=0 HHT= 2.576 IFAT=(0/2576)*20.000	Por cada 100 trabajadores, se presentan 0 Accidentes de Trabajo en el periodo.	0
Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad	Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos durante el periodo, por cada 100 trabajadores de tiempo completo.	IFIAT= (N° DE A.T EN CON INCAPACIDAD / N° HHT)*K IFIAT = (0/2576)*20.000	Por cada 100 trabajadores, se presentan 0 Accidentes de Trabajo con incapacidad en el periodo	0
Índice de Severidad	Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K	ISAT= (N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS POR A.T / N° HHT)*K ISAT= 0/2576)*20.000	Por 2576 horas trabajadas al mes se pierden por accidente de trabajo 0 días (0 horas)	0

NOMBRE INDICADOR	DEFINICIÓN	COMO SE MIDE	INTERPRETACIÓN	RESULTADO
Índice de Lesiones Incapacitantes por A.T	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	ILIAT=IFIAT *ISAT 1000 ILIAT= 0*0/1000	Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo por Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo dividido en mil	0
Tasa Accidentalidad	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período	TA = N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES TA= 0/14	Por cada 100 trabajadores expuestos se presentan 0 accidentes en el período.	0

9.1.2 CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO

Para este periodo no se presentaron ausencias del personal.

NOMBRE INDICADOR	DEFINICIÓN	COMO SE MIDE	INTERPRETACIÓN	RESULTADO
Índice de Frecuencia de Ausentismo	Incluye Enfermedad Común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud.	IFA=N° DE EVENTOS DE AUSENCIA POR CAUSA DE SALUD * K IFA=0*20.000	Por 20.000 horas trabajadas se presentan 0 eventos incapacitantes por enfermedad común	0
Índice de Severidad del Ausentismo	Es la relación entre los días de incapacidad por enfermedad común y el total de HHT, multiplicado por K	ISA=N° DIAS DE AUSENCIA POR CAUSA DE SALUD DURANTE * K ISA=0*20.000	Por 20.000 horas programadas en el año se pierden 0 días por incapacidad de enfermedad común (0 horas)	0
Porcentaje de Tiempo Perdido	Muestra el porcentaje perdido en el periodo con relación al tiempo programado.	%TP=N° DIAS U HORAS PERDIDAS*100 N° DIAS U HORAS	Se perdió en el periodo, el 0% de	0

NOMBRE INDICADOR	DEFINICIÓN	COMO SE MIDE	INTERPRETACIÓN	RESULTADO
		PROGRAMADAS EN EL PERIODO %TP= 0*100/23	tiempo por incapacidades.	

9.2 INDICADORES DE COBERTURA Y GESTIÒN

De acuerdo al cronograma de actividades se relaciona las actividades realizadas en el periodo.

SUBPROGRAMA	TEMA	INDICADOR	RESULTADO
1. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	Exámenes Médicos de Ingreso	(No exam. Realiz. / Total Ingres.)*100	31/31* 100= 100%
	Exámenes Médicos Periódicos	(No exam. Periódicos Realiz. / Total Ingres.)*100	0/0*100=0% para este periodo no se realizaron
	Exámenes Médicos de Egreso	(No exam. Realiz./ Total Trabajadores retirados período)*100	2/2* 100= 100%
2. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	Programa de Inducción	(No trabaj.Inducción/Total Trabaja.Ingres.en el Periodo)*100	31/31* 100= 100%
	Notificación de Riesgos	(No trabaj.NR/Total Trabaja. Ingres. en el Periodo)*100	31/31* 100= 100%
	Suministro de EPP	(Total trabajadores Ingres. Con EPP/Total trabaj.ingres. En el periodo)*100	31/31* 100= 100%,
3. PLAN DE EMERGENCIA	Suministro de elementos de atención de emergencias.	(Total sitios de trabajo /Total suministros de atención a emergencias) *100	5/5*100= 100%
4. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Reuniones mes	(Total Reuniones mes ejecutadas/Total Reuniones mes programadas)*100 (Conformación)	1/1*100%= 100%
	Investigaciones AT	Total Investigaciones ejecutadas/Total Investigaciones requeridas)*100	0/0*100%=100%

SUBPROGRAMA	TEMA	INDICADOR	RESULTADO
5. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP)	Afiliaciones SGSS	(Total trabajadores afiliados/Total trabajadores ingresados) *100	31/31* 100= 100%

10 CONCLUSIONES

- El Consorcio Suba Vial VR al realizar la apertura del frente de obra CIV (11002945-11002757), realizo la instalación de medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos los trabajadores y la comunidad aledaña.
- Se realizo capacitación en los tramos con la empresa VANTI, sobre el manejo adecuado de cómo actuar ante la ruptura de la manguera de gas.
- Para el periodo evaluado El Consorcio Suba Vial VR a realizado el inicio de las actividades técnicas y de ejecución en campo sobre el CIV 11002026- CIV 11004595- CIV 11002945- CIV 11002757 con la generación del RCD´S (residuos de demolición y construcción). En donde se presenta el cumplimiento de RCD: 100% equivalente a 612m^3.
- Para el periodo ejecutado el Consorcio Suba Vial VR por medio de la tabla de indicadores de gestión de RCD logro generar un valor de 272.98 Toneladas equivalentes a un 34.45% como meta de residuos de construcción que fueron dispuestos en plantas de aprovechamiento
- El Consorcio Suba Vial ha presentado un Cumplimiento de circularidad de un 33.7% ya que de materiales fueron valorizados 174 m^3.
- Para el presente periodo el Consorcio Suba Vial VR no presento Accidentes de trabajo.
- Se cuenta con el apoyo y acompañamiento de profesionales en el cargo de inspectores SSTMA en los frentes de obra, los cuales garantizan el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el MAO.

ANEXO No. 1. Cronograma Ambiental.

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

Contrato N° 1009 – 2024 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL E INTERMEDIA Y ESPACIOS PÚBLICOS (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CUIDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"

DESCRIPCION	AÑO 2025																				SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				
Programa A1. Cumplimiento a obligaciones ambientales contractuales	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**%**
Gestión para obtención o actualización de permisos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Cumplimiento de las labores del residente ambiental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Elaboración de informes ambientales que reportarán el cumplimiento de la Gestión Ambiental en Obra				1				1				1				1				1	100
				10				10				10				10				10	
Desarrollo de Comités Ambientales e integrales donde se reportará el cumplimiento de la Gestión Ambiental en Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Programa B1. Manejo ambiental de centros de acopio	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**13**	**14**	**15**	**16**	
Ubicación de zona de acopio de materiales y RCD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Demarcación y señalización de zona de acopio de materiales como concretos, asfaltos, prefabricados, tuberías, formaletas de madera y RCD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Cerramiento de zona de acopio de materiales como concretos, asfaltos, prefabricados, tuberías, formaletas de madera y RCD, con malla de polipropileno y/o cinta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Mantenimiento del cerramiento de zona de acopio de materiales y RCD, y área a intervenir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Instalación de sistema sanitario y baños móviles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Ubicación y señalización de canecas plásticas para la recolección de residuos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Programa B2. Manejo de materiales de construcción	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**13**	**14**	**15**	**16**	
Actividad de protección del suelo con lonas, plásticos, geo textil o plataforma metálica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Instalación y mantenimiento de la señalización de las zonas de almacenamiento de materiales como concretos, asfaltos, prefabricados, tuberías, formaletas de madera y RCD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Programa B3. Manejo Integral de Residuos Sólidos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**13**	**14**	**15**	**16**	
Separación y clasificación de los materiales sobrantes RCD, RESPEL, ordinarios, entre otros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Recolección de residuos sólidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Limpieza de las vías	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Limpieza de las llantas de los vehículos y maquinaria de la obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Proveer y mantener los puntos ecológicos y bolsas en todas las áreas de trabajo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Programa B4. Control de emisiones atmosféricas	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**13**	**14**	**15**	**16**	
Limpieza de las vías de acceso a la obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Certificación de gases de todos los vehículos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Cubrimiento de materiales granulados o RCD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Cerramiento con paredes en malla de polipropileno para el uso de cortadoras en húmedo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Humedecimiento y limpieza de la superficie de la vía	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Programa B5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**13**	**14**	**15**	**16**	
Elaboración de inventario de obras hidráulicas y sumideros, diagnóstico del estado actual al inicio de las obras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Instalación de filtros para los sumideros que consisten en una malla de "polisombra" de ojo de 1 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Programa E1 de señalización	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**13**	**14**	**15**	**16**	
Señalización de los centros de acopio de materiales, acopio de residuos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Señalización de frentes de obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Señalización de instalaciones temporales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	
Señalización de los senderos peatonales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	

ANEXO No. 2. Radicado SDA.

Volante: 017 Fecha: 13/06/2025 Contrato: COP– FDLS 1009-2024 Localidad: Suba

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA

BARRIO SAN CARLOS DE SUBA

Tramo: KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143 A (CIV 11002026).

INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA



En las actividades previas requeridas para el inicio de las obras en el segmento vial ubicado en la Carrera 136ª entre Calle 144 y Calle 143ª, el Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS, realizó las gestiones pertinentes ante la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA para identificar las acciones técnicas idóneas para el tratamiento del árbol ubicado sobre el eje vial.

De acuerdo al diagnóstico y evaluación de las condiciones físicas y biológicas del individuo arbóreo se autorizó al FDLS, realizar las acciones de ***TALA***, a través del Consorcio Suba Vial VR, dando paso a la intervención y conservación del eje vial, siendo este un beneficio para la comunidad directa e indirecta.

Esta actividad se realizará el día 14 de Junio de 2025 en horas de la mañana, agradecemos su comprensión.

CONTRATISTA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Teléfono: 3114434502

Correoelectrónico: pac.cto1009conservacionsuba@gmail.com

Dirección: Carrera 70A # 108-16

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SUBA TH 003

Correo electrónico: socialsubavias@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

Código: PM04-PR29-F8 | Versión 3

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

FICHA DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL (Excepto traslados)						**Código:**			**Versión:**	
No. Concepto Técnico o Resolución:	SSFFS-03519					Código SIGAU:	SIN CODIGO		Placa Árbol:	1
03 de Junio del 2025						No. Árbol del concepto:	1			
Dirección: Calle 144 #136A-09						Especie:	Flor Amarillo		N. Científico	Tecoma Stans
Localidad: SUBA						Tipo de manejo:	Tala		SDA	

Entidad Ejecutora: **JBB** ☐ **CODENSA** ☐ **UAESP** ☐ **EAAB** ☐ **IDU** ☐ **ALCALDIA LOCAL DE** SUBA

OTRO ALCALDIA LOCAL DE SUBA **NIT / CC No.:** 830.053.812-2 **Dirección Correspondencia:** Cl 131 A 53 21

DATOS DE INTERVENCION

TIPO DE MANEJO AUTORIZADO	**TALA: X**	**CONSERVACION:**		**TRATAMIENTO INTEGRAL/ESPECIAL:**	
PODA:	Estado Físico: Regular	**ALTURA (m)**		**Diámetro de copa:**	
	Estado Sanitario: Bueno	Antes: 6	Después: 0	Polar 3	Ecuatorial 5
	Emplazamiento: Anden con zona verde angosta	PAP 0.72			
		Observación: Individuo talado debido a que interfiere con el desarrollo de la actividad constructiva			

TIPO DE PODA A EJECUTAR	**FORMACION:**	**MEJORAMIENTO:**		**Intensidad de la Poda (%)**
	CONTROL ALTURA	Realce	Estructura	Estabilidad
		Aclareo	Sanitaria	Radicular

Fecha Socialización: 12 de Junio del 2025 | **Fecha Inicio Intervención: 14 de Junio del 2025**


ALTURA (m) 6 | **DAP (cm) 22,774720060732587**

FOTOS DE INTERVENCIÓN

FOTO ANTES DE INTERVENCIÓN



FOTO DESPUES DE INTERVENCIÓN

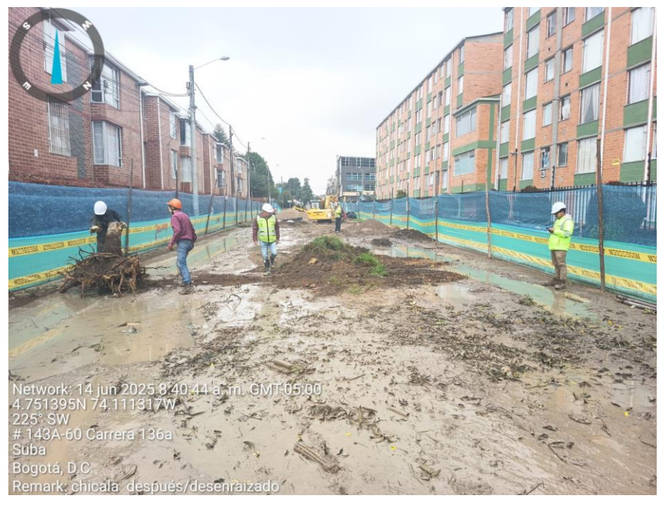

OBSERVACIONES:	**REALIZÓ**		**APROBÓ (si aplica)**	
Individuo talado debido a que interfiere con el desarrollo de la actividad constructiva	**FIRMA**		**FIRMA**	
	NOMBRE:	JUAN DAVID CASTAÑEDA PINEDA	**NOMBRE:**	ANTONIO ALEJANDRO ACOSTA GÒMEZ
	TARJETA PROFESIONAL:	**091226-0613334 CND**	**TARJETA PROFESIONAL:**	091021-0536712 CND
	CARGO:	Ingeniero Forestal y Coordinador en alturas	**CARGO:**	RESIDENTE AMBIENTAL

NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el profesional de campo y entregarse de forma digital y física

Control de cambios

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción	Radicado 2019IE92381 de abril 29 de 2019
2	Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE205370 de noviembre 17 de 2020
3	Se ajusta el documento con el fin de que la información sea más clara para el usuario en el momento de recopilar los requisitos para su trámite.	Radicado No. 2021IE113566 del 09 de junio de 021.

ECO 0256 - 25

Bogotá D.C., 14 de junio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Ciudad.

Referencia: **CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS**

La suscrita María Paula Castelblanco Suárez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.836.929 de Bogotá D.C., en calidad de Gerente y Representante Legal del Vivero Palos de La Loma, unidad operativa filial de Ecoambithoz Ltda., se permite expedir la presente Certificación de Disposición Final de Residuos, con fundamento en la información operativa y ambiental registrada, conforme a los siguientes términos:

CERTIFICADO ECO - 0256
POR 1 M3

1. Objeto de la certificación

Mediante el presente documento se certifica que el 14 de junio del año 2025, se realizó la recolección, retiro, transporte y disposición final de un volumen de UN METRO CÚBICO (1 m³) de residuos vegetales. Dichos residuos fueron movilizados empleando el vehículo automotor identificado con placas TTZ-869, conducido por el señor VICTOR ALFONSO TALERO SARMIENTO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1.049.604.793.

2. Origen de los residuos

El material vegetal objeto de esta certificación se originó como subproducto del proceso de tala de un árbol de la especie Chicalá (*Tecoma stans*) realizado en el marco de las actividades contempladas en el contrato de ejecución del proyecto vial correspondiente al segmento **CIV 11002026**, ubicado en la **Carrera 136A entre Calle 143A y Calle 143**, en la localidad de Suba, cuyo responsable es la empresa CONSORCIO SUBA VIAL VR con Nit. 901.903.833-2.

3. Tipo de residuos y tratamiento aplicado

Los residuos vegetales recolectados corresponden exclusivamente a material orgánico biodegradable, derivados del corte de césped y mantenimiento de zonas verdes. De conformidad con las buenas prácticas ambientales y en cumplimiento de la normatividad vigente sobre el manejo adecuado de residuos orgánicos (incluyendo lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019 y demás normas aplicables), dichos residuos fueron transportados y

dispuestos en la planta de tratamiento del Vivero Palos de La Loma, ubicado en la vereda Santa Lucía, municipio de Guasca, departamento de Cundinamarca.

En dicha instalación, el material vegetal fue incorporado al sistema de manejo y transformación biológica mediante procesos de compostaje y lombricultura, con el objetivo de obtener abono orgánico de alta calidad destinado al mejoramiento de suelos y la nutrición vegetal, en el marco de una economía circular y sostenible. Se hace explícito que los residuos no fueron objeto de incineración, quema a cielo abierto, disposición inadecuada ni comercialización, garantizando así una gestión ambientalmente responsable y conforme a los principios de prevención, reducción y aprovechamiento de residuos sólidos.

4. Declaración final

En concordancia con el marco normativo vigente y las políticas ambientales adoptadas por el Vivero Palos de La Loma y su casa matriz, Ecoambithoz Ltda., se deja constancia de que la totalidad del volumen mencionado (1 m³) fue debidamente dispuesto y aprovechado mediante procesos técnicamente validados, sin generar impactos negativos al entorno, cumpliendo con los principios de sostenibilidad, trazabilidad y legalidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, a los catorce (14) días del mes de junio de 2025.

CERTIFICADO ECO – 0256
POR 1 M3

Atentamente;

MARIA PAULA CASTELBLANCO
Gerente

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

MEMORIA TECNICA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD SILVICULTURAL DE TALA AUTORIZADO POR LA RESOLUCIÓN NO. 00991 CON CONCEPTO TÉCNICO NO. SSFFS-03519 DEL 03 DE JUNIO DEL 2025

ELABORADO POR

JUAN DAVID CASTAÑEDA PINEDA

INGENIERO FORESTAL RESIDENTE

BOGOTÁ D.C.

19 DE JUNIO DEL 2025

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Contenido

INTRODUCCIÓN 3

METODOLOGIA 4

Recopilación de evidencias y datos de ejecución 4

Planeación de intervenciones silviculturales 4

MANEJO DE AVIFAUNA 5

Etapa preliminar: inventario de avifauna y nidos 5

Método de censo búsqueda intensiva 6

Rescate de nidos 6

Si el nido contiene polluelos. Se pueden implementar dos procedimientos: 7

Procedimiento para el traslado de nidadas 7

Recibo y liberación de individuos criados 7

Ejecución de actividades silviculturales 8

SOCIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SILVICULTURAL DE TALA 8

- Información previa a la intervención: 8
- Información durante la intervención: 8
- Información posterior a la intervención: 8

RESULTADOS 9

SOCIALIZACIÒN DE ACTIVIDAD SILVICULTURAL DE TALA: 9

MANEJO DE AVIFAUNA: 10

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES 11

Ejecución de Poda, Tala, Trozado y disposición de Residuos: 11

PROCESO DE COMPENSACIÓN 14

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14

BIBLIOGRAFIA 14

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

INTRODUCCIÓN

Por medio de la resolución No. 00991 con concepto técnico No. SSFFS-03519 del 03 de Junio del 2025 emitido por la Secretaria Distrital de Medio Ambiente de Bogotá D.C. (SDA) autoriza la tala de un individuo arbóreo de la especie Flor Amarillo (Tecoma tans) emplazado en espacio público en la Cl 144 con 136 A-09 con CIV (Código de Identificación Vial) 11002026 , dado por sus regulares condiciones físicas y sanitarias ; además de interferir directamente con el desarrollo del proyecto denominado " AVENIDA BILBAO"

Tabla 1 Resumen de características del individuo arbóreo y actividad silvicultural y responsabilidades

Especie	Familia	Características				Actividad Silvicultural	Volumen Comercial
		PAP (m)	Altura Total (m)	Vol comercial Aprox	Estado Físico y Fitosanitario		
Tecoma Stans	BIGNONIACEAE	0.63	6	0	individuo con regulares condiciones físicas y fitosanitarias; además de presentar interferencias directas con el desarrollo del proyecto constructivo	Tala	presenta un volumen comercial equivalente a cero (0) por lo cual no requiere de salvoconducto para su disposición Final *

*En relación con el desplazamiento y disposición de los residuos vegetales producto de la actividad silvicultural de Tala autorizada por la SDA se realizó según lo establecido bajo el decreto 531 de 2010 en su artículo 19.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2



Ilustración 1 Ejecución de tala del flor amarillo por caída libre



Ilustración 2 picado de material vegetal



Ilustración 3 transporte y disposición de residuos vegetales

METODOLOGIA

Recopilación de evidencias y datos de ejecución

Para la elaboración del entregable a la SDA el cual es el FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES con Código: PM04-PR29-F8, se realizó la respectiva recolección y diligenciamiento de:

- Medidas Dasometricas (tomadas de la resolución emitida y la solicitud realizada)
- Registro fotográfico del antes y después de la intervención silvicultural
- Para la actividad de la ejecución de tratamientos silviculturales se hizo inicialmente los respectivos ATS para la ejecución de los 3 tipos de procedimientos forestales (tala, trozado y desenraizado)

Planeación de intervenciones silviculturales

.

- Elaboración de permiso en alturas: dicho permiso permite al Coordinador en Alturas e ingeniero Forestal verificar las condiciones óptimas del trabajador, equipos y herramientas de trabajo e identificar los posibles riesgos y daños durante la ejecución de la actividad en alturas.
- Delimitación con cinta en la zona de intervención
- Inspección de la zona de trabajo, para prevenir e identificar limitantes tales como: pozos, vallas, luminarias u otras condiciones que representen riesgos para los trabajadores.
- Revisión de nidos activos y abandonados (Inventario de Avifauna).

- Tala de árboles aprobados, que tendrá apeo, desrrame, corte de ramas, troceo y cargue de ramas y residuos vegetales que serán dispuestos en los respectivos lugares autorizados y con evidencia del certificado de disposición final.
- Poda de individuo aprobado

MANEJO DE AVIFAUNA

En este aparte se presenta la metodología para el rescate de nidos con huevos o polluelos de los árboles que serán podados en desarrollo de las actividades pactadas contractualmente. Estas actividades se realizarán de manera previa al trabajo de poda.

El procedimiento consta de:

- Inventario de aves ubicadas en el árbol a intervenir.
- Inventario de nidos en árboles a intervenir.
- Actividad de rescate y traslado de los nidos, durante el manejo forestal a realizar.

Con este procedimiento se busca disminuir el impacto generado sobre la población de avifauna, aplicando criterios de manejo para garantizar la reubicación y supervivencia de las aves afectadas en el trabajo de poda de árboles, previo un censo e inventario de aves y nidos presentes en el lugar. Lo anterior se establece dando cumplimiento a los establecido en el Decreto 531 de 2010 y su modificatorio 383 de 2018 por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones.

Etapa preliminar: inventario de avifauna y nidos

Antes de la ejecución de la poda o tala de los árboles se implementará una etapa preliminar que consiste en el inventario de aves y nidos ubicados en la zona a podar. Empleando el método de Censo de búsqueda intensiva.

No obstante, todos los inventarios arrojan un estimativo de cómo se encuentra la población de aves en los sectores a ser intervenidos, lo cual ayuda al reconocimiento, identificación y valoración de procedimientos particulares definidos por la especie de ave hallada en anidación. Además, facilita la decisión para realizar los esfuerzos en lo referente a la cría y/o rehabilitación artificial.

En todo caso cuando se encuentra un ave o nido, en los tramos intervenidos, es trasladada a la entidad competente, que para nuestro caso son: la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres – URRAS ubicado al interior del Campus de la Universidad Nacional de Colombia y/o el Centro de Recepción de Fauna y Flora Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, los cuales tienen la competencia para definir cuál será el destino final de las aves o nidos.

Método de censo búsqueda intensiva

Este método fue estandarizado por John Ralph en 1996 y es un censo visual que tiene por objeto ubicar nidos e identificar las especies de aves a que correspondan por observación directa, revisando la presencia de actividad aviar árbol por árbol, teniendo en cuenta la numeración establecida en los inventarios forestales.

Los recorridos se realizarán caminando, buscando que la movilidad sea pausada, lenta y silenciosa. En una libreta de campo, se registrarán las especies de aves detectadas visualmente, por esto es indispensable el uso de binoculares con buen aumento. Se anotan las especies vistas u oídas y se consignan las observaciones. Este método aumenta la probabilidad de detección para aquellas especies particularmente silenciosas.

Es importante contar con una cámara fotográficas y libros de consulta con ilustraciones para facilitar la identificación de las especies, como la guía de bolsillo de aves de la sabana de Bogotá, la guía de las aves del Jardín Botánico de Bogotá y la guía de aves de Colombia.

Se registrará el número de individuos encontrados para asignarle así a cada especie un valor de abundancia de la siguiente forma:

- Común: especie registrada permanentemente en todas las observaciones.
- Escasa: especie registrada al menos en la mitad de las observaciones.
- Ocasional: especie que sólo se observa en muy pocas oportunidades, generalmente son individuos provenientes de hábitats cercanos a Bogotá o puede tratarse de aves migratorias.
- Rara: especie que vive en climas diferentes al de la sabana de Bogotá y que algunas veces llegan al altiplano.
- Accidental: corresponde con especies de hábitats muy lejanos a la sabana de Bogotá.

Para cada especie observada se tomará información relativa al tipo de hábitat ocupado, período de actividad, abundancia relativa y anotaciones ecológicas de interés general.

Identificación de nidos

Una vez identificadas las aves se realizará una inspección visual de los árboles y arbustos del área a intervenir para identificar los sitios de anidación.

Con los monitoreos realizados en el área se determinarán los sitios de anidación y luego de un recorrido se inspeccionará visualmente árbol por árbol con ayuda de los binoculares, para descubrir los nidos, verificando si existen huevos o crías.

Rescate de nidos

La anidación es un proceso dinámico y en una ciudad como Bogotá varía mucho más. Ya que el comportamiento de las aves está sujeto a la disposición de recursos y alimentos y al grado de

importancia que el hombre le ha dado. Es por esto por lo que en un solo día un ave puede fabricar un nido e incluso poner huevos.

La actividad de rescate de los nidos en alturas será realizada por un operario, el cual tendrá experiencia en trabajos en altura, utilizará los elementos de protección y seguridad necesarios para subir al árbol y estará amparado por los requisitos de seguridad social determinados legalmente, esta labor será supervisada por un Ingeniero Forestal y/o profesional del área de biología.

Este procedimiento busca evitar la pérdida de material biológico (huevos y/o polluelos), por tal razón durante el levantamiento de un nido, en árboles de porte medio y alto, se usará una red extendida a la altura del suelo, para evitar pérdidas de huevos y/o polluelos por caída. Seguido a esto se hace el ascenso al árbol para realizar la captura del ave o nido y su posterior descenso. La captura se realiza en una canasta o recipiente, para asegurar el ave; y si son huevos, la canasta llevará algodón para aislar el material vivo y evitar traumatismos en el transporte.

Si el nido está vacío, se realizará disposición como residuos sólidos. Si el nido contiene huevos o aves, se identificará el ave y el estado de desarrollo para decidir el procedimiento a seguir.

Sí la nidada contiene huevos, resulta pertinente anotar que las URRAS determinan que los nidos con huevos, que fueron incubados artificialmente, presentan una eclosión del 8% y de este porcentaje la mortalidad posteclosional es de 100%. Por lo cual dispondrán de este huevo, ya sea para investigación o para eliminación.

Si el nido contiene polluelos. Se pueden implementar dos procedimientos:

- Uno ex situ (fuera del sitio original) que es el traslado de las aves a un sitio para su levantamiento y desarrollo.
- El otro procedimiento es in situ (en el sitio) que consiste en estimular en los parentales (padres) el seguimiento del nido a otra zona que no vaya a ser intervenida, este procedimiento puede llegar a durar varias horas y sólo aplica con algunas especies de aves.
- En caso de no poder llevar de forma inmediata las aves o polluelos al lugar donde serán entregados es necesario brindar alimentación y condiciones de descanso o pernoctación al ave. Dónde se garantice temperatura óptima y libre de ataques de animales.

Procedimiento para el traslado de nidadas

Durante el traslado del nido se debe mantener la estructura y la ubicación de los huevos y los polluelos, colocando algodón o papel higiénico entre los mismos y trasladando el nido completo utilizando un contenedor el cuál debe ser oscuro para minimizar el estrés de los polluelos.

Recibo y liberación de individuos criados

En las actividades operativas no se realizará el descarte de ninguna de las nidadas (nidos con contenidos). Las zonas de traslado trabajan todos los días y cuentan con personal calificado e

infraestructura adecuada para el desarrollo de las aves, de tal manera que tengan un contacto mínimo con humanos hasta que lleguen a la edad adulta.

El tiempo transcurrido desde el rescate, traslado y entrega en el sitio de recibo final, no debe superar las tres horas, para asegurar la supervivencia del contenido de los nidos.

Ejecución de actividades silviculturales

- La ejecución de las actividades silviculturales se realizó según lo recomendado en la normativa vigente para trabajo seguro en alturas y la normativa respectiva para el manejo de arbolado en riesgo contenido en la ley 1076 de 2015 sección 9, ARTÍCULO 2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia; causando perjuicio al desarrollo de obra pública y posibles riesgos.

SOCIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SILVICULTURAL DE TALA

CONSORCIO SUBA VIAL VR utilizando sus canales de comunicación realizará la divulgación correspondiente cuando se realicen las actividades de poda aprobadas por la autoridad ambiental.

Para asegurar la adecuada difusión a la comunidad sobre la actividad silvicultural de tala que se llevará a cabo en el CIV antes mencionado, el Consorcio usará los mecanismos descritos a continuación para que los visitantes del área y habitantes del sector estén informados antes, durante y después de realizar esta actividad incluida en dicha actividad.

- Información previa a la intervención: hacer reuniones periódicas con residentes, administradores de conjuntos residenciales, Juntas de Acción Comunal / Local entre otros públicos, en qué consiste la actividad de tala (y otras futuras intervenciones silviculturales) de árboles y cuál será la periodicidad con la que esta será llevada a cabo.
- Información durante la intervención: el equipo de operadores dispuestos para la labor (Boales y arboristas) de poda de árboles instalará un cerramiento con cinta peligro en el lugar donde se esté desarrollando la intervención, la cual incluirá medidas de seguridad que los transeúntes deben tener en cuenta al transitar cerca de la zona.
- Información posterior a la intervención: por medio de las redes sociales y diferentes canales de comunicación, se publicará registro fotográfico de la atención y ejecución de la actividad silvicultural aprobada (Tala) por la SDA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

RESULTADOS

SOCIALIZACIÒN DE ACTIVIDAD SILVICULTURAL DE TALA:

Por medio de sus medios de difusión como correo electrónico, redes sociales y entre otros el Consorcio compartió una pieza grafica informativa (ver Imagen e imagen)



Ilustración 4 Pieza informativa

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

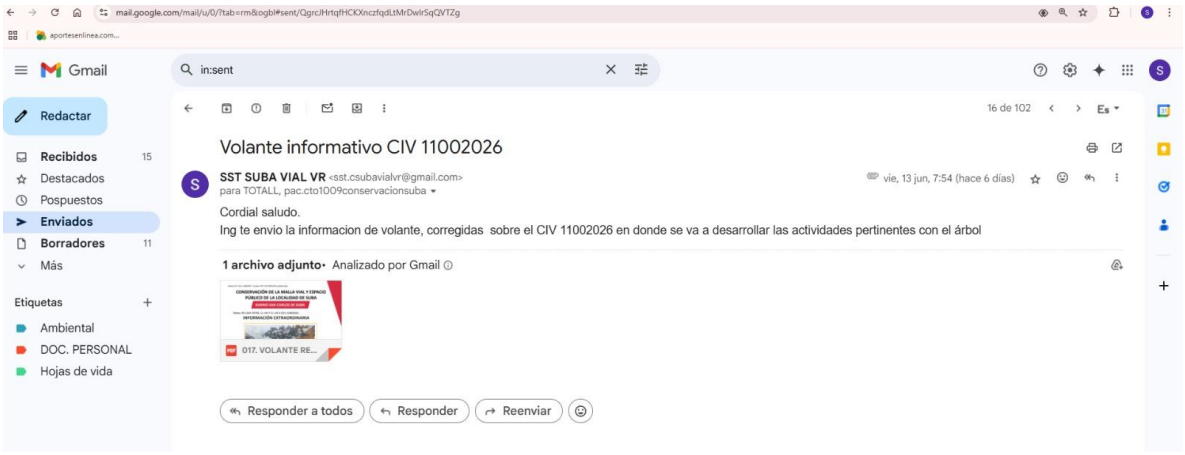


Ilustración 5 Comunicación de la pieza informativa de la actividad silvicultural de tala

MANEJO DE AVIFAUNA:

RELACIÓN DE LA INSPECCIÓN VISUAL Y ACTIVIDADES DE MANEJO. Rellene y marque con una (X) según corresponda. Adjunte registro fotográfico.											
Número de árbol	**Especie de árbol**	**Cantidad de nidos hallados**	**Cantidad de aves halladas**	**Especie de ave**	**Reubicación**		**Coordenadas destino**		**Rescate y entrega a la SDA**	**Rehabilitación en las instalaciones**	**Fecha de reubicación o liberación**
					Si	**No**	**X**	**Y**			
1	Flor amarillo	0	0	No se observó ninguna Sp de avifauna		X	-74.1113 44	4.7512939	N/A	N/A	N/A

Observaciones

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Describa aquí los procedimientos realizados para reubicación, rescate o rehabilitación de nidos y aves
durante las inspecciones visuales no se presenció ninguna especie de avifauna con nido activo



Firma	
Responsable:	Juan David Castañeda Pineda
C.C	1014247669
T.P	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

- Para el inicio de estas actividades se realizó la debida inspección de los trabajadores, herramientas y equipos trabajo en alturas y trabajadores en suelo y bajo la supervisión de un coordinador en alturas e ingeniero forestal.
- Posterior a las respectivas inspecciones se hizo un cerramiento del área de trabajo para la ejecución de podas, talas y trozado.

Ejecución de Poda, Tala, Trozado y disposición de Residuos:

Hechas las respectivas inspecciones se dispuso a ejecutar la debida tala direccionada y repique de material vegetal recopilando la información necesaria para la elaboración del el FORMATO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES con Código: PM04-PR29-F8 (ver anexo 1), se verifico que no hubieran nidos activos siguiendo la metodología descrita previamente.

- Disposición final de residuos: Para esta actividad los residuos producto de la tala (ramas y hojas) junto con los residuos producto del trozado y zoqueo se le dio la adecuada transformación de madera sin valor comercial; se transportó (ver ilustración #) y dispuso en un vivero para ser transformado como materia de compostaje donde se generó el respectivo certificado de disposición final; en este proceso no fue necesaria la solicitud de salvoconducto ya que el individuo presento un volcamiento de manera natural.



Ilustración 4 Disposición de residuos vegetales y madera sin valor Comercial

PALOS DE LA LOMA
ECO-VIVERO

ECOAMBITHOZ LTDA
Ecología y ambiente

ECO 0256 - 25

Bogotá D.C., 14 de junio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Ciudad.

Referencia: **CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS**

La suscrita María Paula Castelblanco Suárez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.836.929 de Bogotá D.C., en calidad de Gerente y Representante Legal del Vivero Palos de La Loma, unidad operativa filial de Ecoambithoz Ltda., se permite expedir la presente Certificación de Disposición Final de Residuos, con fundamento en la información operativa y ambiental registrada, conforme a los siguientes términos:

CERTIFICADO ECO 0256
POR 1 M3

1. Objeto de la certificación

Mediante el presente documento se certifica que el 14 de junio del año 2025, se realizó la recolección, retiro, transporte y disposición final de un volumen de UN METRO CÚBICO (1 m³) de residuos vegetales. Dichos residuos fueron movilizados empleando el vehículo automotor identificado con placas TTZ-869, conducido por el señor VICTOR ALFONSO TALERO SARMIENTO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1.049.604.793.

2. Origen de los residuos

El material vegetal objeto de esta certificación se originó como subproducto del proceso de tala de un árbol de la especie Chicalá (*Tecoma stans*) realizado en el marco de las actividades contempladas en el contrato de ejecución del proyecto vial correspondiente al segmento **CIV 11002026**, ubicado en la **Carrera 136A entre Calle 143A y Calle 143**, en la localidad de Suba, cuyo responsable es la empresa CONSORCIO SUBA VIAL VR con Nit. 901.903.833-2.

3. Tipo de residuos y tratamiento aplicado

Los residuos vegetales recolectados corresponden exclusivamente a material orgánico biodegradable, derivados del corte de césped y mantenimiento de zonas verdes. De conformidad con las buenas prácticas ambientales y en cumplimiento de la normatividad vigente sobre el manejo adecuado de residuos orgánicos (incluyendo lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019 y demás normas aplicables), dichos residuos fueron transportados y

Calle 152B N° 56-75 Casa 48. Tel / Fax: 4961366 Cel: 310 2061743
E-mail: ecoambithoz@gmail.com
Bogotá - Colombia

Ilustración 5 Certificado de disposición de residuos vegetales

PROCESO DE COMPENSACIÓN

- Debido a que en la solicitud del estudio se seleccionó la compensación económica no se definieron cantidades de arboles a plantar y productos entregables

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Es necesario tener en cuenta las recomendaciones hechas en el manual de silvicultura Urbana para Bogotá y en el documento técnico Arbolado Urbano de Bogotá, ya que ellos informan y guían a los profesionales idóneos y personas interesadas en los procesos de arborización y ejecución de actividades silviculturales.
- Toda intervención Silvicultural debe ser realizada bajo la supervisión de un profesional de dicha área (Ingeniero Forestal) y Coordinada por el o profesional en SST que cuente con la documentación que lo certifique en dicha función; con el objeto de que dicha actividad se haga de forma profesional garantizando un buen estado físico y sanitario de los individuos arbóreos y velando por la seguridad de los trabajadores en alturas, trabajadores en piso, flujo de personal próximo al área de intervención, estructuras, bienes e inmuebles del lugar.
- Se deben seguir todas las recomendaciones técnicas y requerimientos hechos por la secretaria Distrital de Medio Ambiente siguiendo el marco normativo que regula el arbolado urbano en Bogotá tanto en espacio privado como público.

BIBLIOGRAFIA

- Jardín Botánico José Celestino Mutis (2011). Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá. Recuperado de http://www.jbb.gov.co/documentos/planeacion/2018/mayo/manual_silvicultura_distrito.pdf
- SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE -SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. (2020). GUÍA PARA LA REDUCCIÓN DE INCONGRUENCIAS DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE PODA . BOGOTÁ D.C., COLOMBIA.

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Radicacion: 2025ER92187
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
Fecha: 2025-04-30 16:07:1
Proceso: 6609325
Folios: 63 Anexos: No
Asunto: RESPUESTA RADICADO 2025ER86037 /
Destino: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, F
Origen: ALCALDIA LOCAL DE SUBA
Tipo: Oficio Recibido

Bogotá D.C., 30 de abril de 2025

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre

Avenida Caracas No. 54 – 38

Bogotá D.C.

Correo: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co

Asunto: Respuesta a requerimiento de documentación faltante – Radicado No. 2025ER86037

Respetados señores:

En atención al requerimiento recibido mediante oficio con referencia al radicado No. **2025ER86037**, relacionado con la solicitud de autorización de tratamiento silvicultural de un (1) individuo arbóreo ubicado en la Calle 144 No. 136 A - 09, me permito allegar la información solicitada en el plazo establecido, conforme a los ítems indicados:

1. **Pago de Evaluación:** Se adjunta el comprobante de pago del excedente correspondiente, conforme a la Resolución No. 00431 de 2025.

2. **Fichas técnicas**: Se entregan la **Ficha No. 1** en formato Excel y la **Ficha No. 2** en formato PDF, conforme a la lista de chequeo vigente.

3. **Registro fotográfico:** Se adjunta el registro fotográfico del individuo arbóreo en formato digital.

4. **Esquema de intervención:** Se presenta el esquema de intervención en el urbanismo frente al diseño actual de la vía, considerando que el proyecto tiene carácter de conservación.

5. **Coordenadas geográficas**: Se remite el archivo Excel con las coordenadas de los vértices de intervención en formato de grados decimales, según lo solicitado (Ej. Latitud: 4.577852 y Longitud: -74.167712).

6. **Certificado COPNIA**: Se anexa el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios actualizado, expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA.

7. **Diseño Paisajístico**: Se informa que el Fondo de Desarrollo Local de Suba NO tiene la intención de compensar el arbolado mediante plantación.

8. **Duración estimada de la obra**: La obra tiene una duración estimada de **10 meses**, información que se suministra por escrito conforme a lo solicitado.

Scanned with CamScanner

Adicionalmente se adjunta el PODER que faculta a **Farley Andrea Larrarte Barrera**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.901.105 de Bogotá, en su calidad de representante legal del contratista responsable de la ejecución del proyecto vial correspondiente al segmento **CIV 11002026**, ubicado en la **Carrera 136A entre Calle 143A y Calle 143**, en la localidad de Suba, ciudad de Bogotá D.C., para que, represente, adelante todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de los trámites administrativos y ambientales inherentes al desarrollo del mencionado proyecto.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para dar continuidad al trámite.

Cordialmente,

FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA
C.C. 52.901.105
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Apoderada Alcaldía Local de Suba

Proyectó: Bladimir Castelblanco – Contratista de Gestión Ambiental FDLS791- 2024
Se adjuntan 64 anexos y una usb con el archivo digital de 203.170 KB

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 27 de junio de 2025

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-161-C

Señores:
Secretaria Distrital de Ambiente
Subdirección de Silvicultura, Flora y Faura Silvestre
AV caracas No. 54-38
Cuidad

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Radicacion: 2025ER136735
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
Fecha: 2025-06-27 11:46
Proceso: 6669286
Folios: 29 Anexos: No
Asunto: Entrega de documentación del Inf
Destino: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, F

Ref. **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 DE 2023. "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: Entrega de documentación del informe final (Tala de individuó del CIV 1102026)

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, el Consorcio Suba Vial VR identificado con NIT 901.903.833-2, remite a la interventoría la documentación ambiental y forestal del informe de ejecución de la actividad de tala del individuo arbóreo ubicado en el CIV 11002026 con dirección: CRA 136ª entre CL 144 y CL 143ª. Mediante la resolución No .0091 la cual es emitida por la secretaria Distrital de Ambiente, en donde se remite la información del desarrollo como el antes durante y después de la ejecución.

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con el desarrollo del procedimiento supervisado por parte del área de SST en donde se cuenta que el personal debe contar con los requerimientos mínimos, como lo son los elementos de protección personal, equipos de protección contra caídas, equipo de trabajo de poda y corte de arbolado.

A su vez se cuenta con el certificado aprovechamiento de los residuos de aprovechamiento. El cual contiene el objetivo de la certificación, especificación del origen de los residuos, tipo de residuos y su tratamiento aplicado, y concepto de tratamiento final.

Esta documentación se presenta con los tratamientos otorgados por el marco normativo vigente y las políticas ambientales adoptadas por el Vivero Palos de la oca y su casa matriz, Ecoambithoz LTDA.

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 3. Plan de acción ambiental.

FORMATO			
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
FO-AC-28	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

Cto. Obra No. CTO N° 1009 – 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL E INTERMEDIA Y ESPACIOS PÚBLICOS (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CUIDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	Primero (1) de abril de 2025.	Primero (1) de febrero de 2026.	NO SE PRESENTA OBSERVACIONES POR EL MOMENTO DENTRO DE LA EJECUCION DE CONTRATO N° 1009 DE 2024

INTERVENTOR CONSORCIO SUBA TH 003

Cto. Interventoría No. 083 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TECNICO"

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	Primero (1) de abril de 2025.	Primero (1) de marzo de 2026.	NO SE PRESENTA OBSERVACIONES POR EL MOMENTO DENTRO DE LA EJECUCION DE CONTRATO N° 1009 DE 2024

ETAPA	ACTIVIDAD	IMPACTO	ACCCIONES A EMPRENDER/MEDIDAD DE MANEJO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	PERIORICIDAD	REGISTRO	RESPONSABLE	COSTO
PREMILINAR	LOCALIZACIÓN REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	Obstruccion parcial del espacio Publico , alteracion paisajistica y de flujo veicular	Demarcación y señalización de obra, señalización de frentes de trabajo, señalizacion de campamentos e identificación del personal	N° de frentes de obra señalizados / N° de frentes de obra operando	Mensual	Registro fotográfico. Informe para Interventoría	El Constructor. Director de obra. Residente Ambiental. Residente SST. Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
			Información oportuna acerca de las actividades que se desarrollarán en la zona	N° Reuniones o socializaciones con la comunidad realizadas durante el periodo / N° Reuniones o socializaciones con la comunidad programadas para el periodo Area social		Registro fotográfico. Informe para Interventoría	Residente Social Residente de obra (área técnica) Residente Ambiental Residente SST	
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	DEMOLICIONES DE PISOS EXITENTES	Cambios en la calidad de aire y niveles de ruido	Revisión tecnico mecanica	N° vehículos con RTM / N° vehículos laborando	Mensual	Informe para la interventoría	El Constructor. Director de obra. Residente Ambiental. Residente SST. Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
	EXCAVACIONES MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	Cambios en la calidad de aire y niveles de ruido	Revisión tecnico mecanica	N° vehículos con RTM / N° vehículos laborando	Mensual	Informe para la interventoría Revisión tecnico mecanica	El Constructor. Director de obra. Residente Ambiental. Residente SST. Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
		Alteración de la calidad del agua	Protección de sumidireos y/o cuerpos de agua	N° de sumideros protegidos / N° de sumideros presentes en la zona	Mensual	Informe para Interventoría. Reporte Formato FO-AC-50 Manejo de cuerpos de agua	El Constructor. Director de obra. Residente Ambiental. Residente SST. Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES DE PROFUNDIDAD y DEMOLICIONES DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS .	Cambios en la calidad de aire y niveles de ruido	Revisión tecnico mecanica	N° vehículos con RTM / N° vehículos laborando	Mensual	Informe para la interventoría Revisión tecnico mecanica	El Constructor. Director de obra. Residente Ambiental. Residente SST. Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
		Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo a permanecer	Disposición adecuada de los residuos ante los gestores aprobados	Volumen de residuos sólidos peligrosos entregados / Volumen de residuos sólidos peligrosos generados	Mensual	Certificado de residuos entregados Formato IDU de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor Director de obra Residente Ambiental Residente SST Brigada de Orden, Aseo y Limpieza En general todo el personal de obra	PRESUPUESTO DE OBRA
				Cantidad mensual de residuos aprovechados en la obra / Cantidad mensual de material utilizado para la ejecución de la obra		Informe para interventoría Formato IDU de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor Director de obra Residente Ambiental Residente SST Brigada de Orden, Aseo y Limpieza En general todo el personal de obra	
				Cantidad mensual de RCD dispuestos en sitios autorizados / Cantidad estimada de RCD a generar al mes		Certificado de residuos entregados Formato IDU de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor Director de obra Residente Ambiental Residente SST Brigada de Orden, Aseo y Limpieza En general todo el personal de obra	
		Alteración de la calidad del agua	Protección de sumideros y/o cuerpos de agua	N° de sumideros protegidos / N° de sumideros presentes en la zona	Mensual	Informe para Interventoría. Reporte Formato FO-AC-50 Manejo de cuerpos de agua	El Constructor. Director de obra. Residente Ambiental. Residente SST. Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
CONSTRUCCION	ADECUACIONES, RELLENOS NIVELACION COMPATACION, IMPROIMACION DE EMULSION ASFALTICA	Cambios en la calidad de aire y niveles de ruido	Revisión tecnico mecanica	N° vehículos con RTM / N° vehículos laborando	Mensual	Informe para la interventoría Revisión tecnico mecanica	El Constructor. Director de obra. Residente Ambiental. Residente SST. Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
		Afectacion en obras hidraulicas	Protección de sumideros y/o cuerpos de agua	N° de sumideros protegidos / N° de sumideros presentes en la zona	Mensual	Informe para Interventoría. Reporte Formato FO-AC-50 Manejo de cuerpos de agua	El Constructor. Director de obra. Residente Ambiental. Residente SST. Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	

CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CAJAS, ACOMETIDAS, OBRAS HIDRAULICAS PLUVIALES	Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo a permanecer	Disposición adecuada de los residuos ante los gestores aprobados	Volumen de residuos sólidos peligrosos entregados / Volumen de residuos sólidos peligrosos generados	Mensual	Certificado de residuos entregados Formato IDU de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor Director de obra Residente Ambiental Residente SST Brigada de Orden, Aseo y Limpieza En general todo el personal de obra	PRESUPUESTO DE OBRA
				Cantidad mensual de residuos aprovechados en la obra / Cantidad mensual de material utilizado para la ejecución de la obra		Informe para interventoría Formato IDU de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor Director de obra Residente Ambiental Residente SST Brigada de Orden, Aseo y Limpieza En general todo el personal de obra	
				Cantidad mensual de RCD dispuestos en sitios autorizados / Cantidad estimada de RCD a generar al mes		Certificado de residuos entregados Formato IDU de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor Director de obra Residente Ambiental Residente SST Brigada de Orden, Aseo y Limpieza En general todo el personal de obra	
		Cambios en la calidad de aire y niveles de ruido	Revisión tecnico mecanica	N° vehículos con RTM / N° vehículos laborando		Informe para la interventoría Revisión tecnico mecanica	El Constructor. Director de obra. Residente Ambiental. Residente SST. Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	

Yo, ING. Alejandro Acosta , en mi calidad de Residente ambiental me comprometo a

a implementar los programas relacionados en el cuadro para mitigar los impactos ambientales que se generan

en la realización del contrato No. 1009 DE 2024

RESIDENTE AMBIENTAL (Firma)

Original:Dependencia Responsable del Contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

[1] Se deben incluir todas las actividades descritas en el cronograma de obra aprobado por la interventoría.

ANEXO No. 4. Control RCD.

CONTRATO DE OBRA Nº CTO 1009 DEL2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR - 1009

PERIODO : 4 **INFORME:** N°4 JULIO 2025

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO: **MAQUINAS AMARILLAS - PUENTE PIEDRA**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transport m3	RESPEL Kg	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
28/06/2025	KUL475	21276	185800	SAN CARLOS	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
1/07/2025	KUL475	21276	186021	SAN CARLOS	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
1/07/2025	SZO642	3376	186026	SAN CARLOS	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
2/07/2025	KUL475	21276	186278	SAN CARLOS	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
2/07/2025	SZO642	3376	186271	SAN CARLOS	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
3/07/2025	KUL475	21276	92204	SAN CARLOS	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
3/07/2025	KUL475	21276	186621	SAN CARLOS	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
4/07/2025	VDZ456	7224	1084	GAITANA	15	19,5	PUENTE PIEDRA
4/07/2024	SST050	16372	1085	GAITANA	15	19,5	PUENTE PIEDRA
7/07/2025	VDZ456	7224	1086	GAITANA	15	19,5	PUENTE PIEDRA
7/07/2025	VDZ456	7224	1087	GAITANA	15	19,5	PUENTE PIEDRA
8/07/2025	VDZ456	7224	1088	GAITANA	15	19,5	PUENTE PIEDRA
8/07/2025	VDZ456	7224	1089	GAITANA	15	19,5	PUENTE PIEDRA
8/07/2025	VDZ456	7224	1090	GAITANA	15	19,5	PUENTE PIEDRA
10/07/2025	VDZ456	7224	1091	GAITANA	15	19,5	PUENTE PIEDRA
10/07/2025	VDZ456	7224	1092	GAITANA	15	19,5	PUENTE PIEDRA
11/07/2025	ESK871	24324	4	SAN CARLOS	14	19,5	GRECO
14/07/2025	TVB239	6512	188596	GAITANA	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
16/07/2025	SST050	16372	1093	GAITANA	15	19,5	TECNOMINERALES
18/07/2025	SST050	16372	163023	SAN CARLOS	13	19,5	RECICLADO INDUSTRIALES
23/07/2025	SZO642	3376	5	ANA DE TIBAT	15	19,5	GRECO
23/07/2025	KUL475	21276	6	ANA DE TIBAT	15	19,5	GRECO
23/07/2025	KUM989	10208	7	ANA DE TIBAT	15	19,5	GRECO
23/07/2025	SZO642	3376	8	ANA DE TIBAT	15	19,5	GRECO
23/07/2025	KUL475	21276	9	ANA DE TIBAT	15	19,5	GRECO
23/07/2025	KUM989	10208	10	ANA DE TIBAT	15	19,5	GRECO
23/07/2025	SZO642	3376	11	ANA DE TIBAT	15	19,5	GRECO
23/07/2025	SZO642	3376	12	ANA DE TIBAT	15	19,5	GRECO
24/07/2025	SZO642	3376	8369	ANA DE TIBAT	15	19,5	TECNOMINERALES
24/07/2025	KUL475	21276	8388	GAITANA	15	19,5	TECNOMINERALES
24/07/2025	KUL475	21276	13	ANA DE TIBAT	15	19,5	GRECO
24/07/2025	KUL475	21276	14	ANA DE TIBAT	15	19,5	GRECO

24/07/2025	SZO642	3376	16	ANA DE TIBATU	15	19,5	GRECO
24/07/2025	KUM989	10208	15	ANA DE TIBATU	15	19,5	GRECO
25/07/2025	KUL475	21276	191790	ANA DE TIBATU	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
25/07/2025	SZO642	3376	191444	ANA DE TIBATU	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
25/07/2025	SZO642	3376	191791	ANA DE TIBATU	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
25/07/2025	KUL475	21276	191489	ANA DE TIBATU	15	19,5	MAQUINAS AMARILLAS
25/07/2025	SZO642	3376	8630	ANA DE TIBATU	15	19,5	TECNOMINERALES
25/07/2025	SZO642	3376	8344	ANA DE TIBATU	15	19,5	TECNOMINERALES
25/07/2025	SZO642	3376	8319	ANA DE TIBATU	15	19,5	TECNOMINERALES
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					612	799,5	-
Total Volumen (m3)					612		
Total Peso (Ton)					799,5		

(Firma)

Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)

Profesional Ambiental de Interventoría

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

(2)

1100244[illegible]

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-016-2025 Generado el: 2025-07-24**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-24 10:11:50

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** SERGIO MALDONADO **NO DE IDENTIFICACION:** 80128503 **PLACA VEHICULO:** SZO642 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Demolición de sardinel
San Carlos

1100208.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A006006-004-2025 Generado el: 2025-07-11**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-11 12:58:26

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** JAVIER STIVEN MONASTOQUE ANGEL **NO DE IDENTIFICACION:** 1031182845 **PLACA VEHICULO:** EKS871 **PIN-TRANS:** 24324 **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Heterogéneo	14 (m3) - 17.92 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

la gaitana

RCD PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1084

PLACA VD2 456 | FECHA 04 07 25

VOLUMEN | Mt3 15

TIPO MATERIAL excavacion

FRENTE DE OBRA Gaitana CIV 1100 4595

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

1

RCD PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1085

PLACA SST 050 | FECHA 04 07 25

VOLUMEN | Mt3 15

TIPO MATERIAL excavacion

FRENTE DE OBRA Gaitana CIV 1100 4595

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

2

RCD PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1086

PLACA VD2 456 | FECHA 07 07 25

VOLUMEN | Mt3 15

TIPO MATERIAL excavacion

FRENTE DE OBRA Gaitana CIV 1100 4595

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

3

RCD PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1087

PLACA VD2 456 | FECHA 07 07 25

VOLUMEN | Mt3 15

TIPO MATERIAL excavacion

FRENTE DE OBRA Gaitana CIV 1100 4595

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

4

RCD PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1088

PLACA VD2 456 | FECHA 08 07 25

VOLUMEN | Mt3 15

TIPO MATERIAL excavacion

FRENTE DE OBRA Gaitana CIV 1100 4595

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

5

RCD PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1089

PLACA VD2 456 | FECHA 08 07 25

VOLUMEN | Mt3 15

TIPO MATERIAL excavacion

FRENTE DE OBRA Gaitana CIV 1100 4595

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

6

RCD PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1090

PLACA VD2 456 | FECHA 08 07 25

VOLUMEN | Mt3

TIPO MATERIAL excavacion

FRENTE DE OBRA Gaitana CIV 1100 4595

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

7

(7) 3 Vdes pendients

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1092

PLACA VD2456	FECHA 10 07 25
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL excavacion	
FRENTE DE OBRA Baitana CIV 1100495	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

9

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1093

PLACA SST 050	FECHA 16 07 25
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL excavacion	
FRENTE DE OBRA Baitana CIV 1100495	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

10

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 1091

PLACA VD2456	FECHA 10 07 25
VOLUMEN	Mt3 15
TIPO MATERIAL excavacion	
FRENTE DE OBRA Suba Baitana CIV 1100495	

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

8

San carlos

(5)

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-[illegible]
Fecha: 2025-06-28 08:34:58
Cajero: Luis
Placa: KUL475 PIN Volqueta: 21276
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 10
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

(8)

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-186021
Fecha: 2025-07-01 14:07:04
Cajero: Luis
Placa: KUL475 PIN Volqueta: 21276
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 11
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

(7)

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-186026
Fecha: 2025-07-01 14:22:14
Cajero: Luis
Placa: SZC642 PIN Volqueta: 3376
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 12
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

(10)

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 02204

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 03 - julio - 2025
GENERADOR/CONTRATISTA: Consorcio Soba Vial
CONTRATO/FRENTE: Ingeniería Bivios
PLACAS VEHÍCULO: KUL - 475
TIPO DE MATERIAL: Escabelación
VOLUMEN (M3): 15 metros
HORA DE DESCARGUE: _____

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

(11)

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-196279
Fecha: 2025-07-02 13:41:05
Cajero: Luis
Placa: KUL475 PIN Volqueta: 21276
CLIENTE: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Recibo No. 92201 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

(9)

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-196278
Fecha: 2025-07-02 13:29:25
Cajero: Luis
Placa: SZO642 PIN Volqueta: 3376
CLIENTE: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Recibo No. 92203 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

(12)

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-196324
Fecha: 2025-07-04 07:45:43
Cajero: Luis
Placa: KUL475 PIN Volqueta: 21276
CLIENTE: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Recibo No. 92204 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Gaitana. 1595.

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-188596
Fecha: 2025-07-14 08:20:57
Cajero: Luis
Placa: TVB239 PIN Volqueta: 6512
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 15
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

LP INGENIEROS.
FIRMA CONDUCTOR
GAITANA.
Imprimir

Sabana de Tibabuyes

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-191790
Fecha: 2025-07-25 16:25:27
Cajero: Luis
Placa: KUL475 PIN Volqueta: 21276
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 13
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-191444
Fecha: 2025-07-24 15:33:27
Cajero: Luis
Placa: SZO642 PIN Volqueta: 3376
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 13
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-191791
Fecha: 2025-07-25 16:26:41
Cajero: Luis
Placa: SZO642 PIN Volqueta: 3376
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 14
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-191469
Fecha: 2025-07-25 07:10:47
Cajero: Luis
Placa: KUL475 PIN Volqueta: 21276
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 12
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

TecnoMinerales

Arenas & Gravas

Nit: 901.674.891-6 Registro CAR No. 59

CAR CUNDINAMARCA

Nº 8630

FECHA: DIA 25 MES 7 AÑO 25

HORA: —

PLACA: SZO-642 TOTAL m3 15

CONDUCTOR: —

SALIDA: Ing. Dino

DESTINO: Arcelas

VIAJE SENCILLO: — VIAJE DOBLE Si

OBSERVACIONES: —

Of. Cra 80 # 8C - 85 Bogotá D.C. - Email: ernestobarmor@hotmail.com - Tel: 314 343 3954

TecnoMinerales

Arenas & Gravas

Nit: 901.674.891-6 Registro CAR No. 59

CAR CUNDINAMARCA

Nº 8344

FECHA: DIA 17 MES 7 AÑO 25

HORA: —

PLACA: SZO-642 TOTAL m3 15

CONDUCTOR: —

SALIDA: Ing. Dino

DESTINO: Arcelas

VIAJE SENCILLO: — VIAJE DOBLE Si

OBSERVACIONES: —

Of. Cra 80 # 8C - 85 Bogotá D.C. - Email: ernestobarmor@hotmail.com - Tel: 314 343 3954

TecnoMinerales

Arenas & Gravas

Nit: 901.674.891-6 Registro CAR No. 59

CAR CUNDINAMARCA

Nº 8369

FECHA: DIA 23 MES 7 AÑO 25

HORA: —

PLACA: SZO-642 TOTAL m3 7

CONDUCTOR: —

SALIDA: Ing. Dino

DESTINO: Arcas.

VIAJE SENCILLO: — VIAJE DOBLE Si

OBSERVACIONES: —

Of. Cra 80 # 8C - 85 Bogotá D.C. - Email: ernestobarmor@hotmail.com - Tel: 314 343 3954

TecnoMinerales

Arenas & Gravas

Nit: 901.674.891-6 Registro CAR No. 59

CAR CUNDINAMARCA

Nº 8319

FECHA: DIA 17 MES 7 AÑO 25

HORA: —

PLACA: SZO-642 TOTAL m3 15

CONDUCTOR: —

SALIDA: Ing. Dino

DESTINO: Arcelas.

VIAJE SENCILLO: — VIAJE DOBLE Si

OBSERVACIONES: —

Of. Cra 80 # 8C - 85 Bogotá D.C. - Email: ernestobarmor@hotmail.com - Tel: 314 343 3954

La gontana. = LP.

TecnoMinerales

Arenas & Gravas

Nit: 901.674.891-6 Registro CAR No. 59

HORA: _____ Nº 8388

PLACA: KUL-495 TOTAL m3 15

FECHA: DIA 24 MES 05 AÑO 25

CONDUCTOR: _____

SALIDA: LP INGENIERIA

DESTINO: PESCEIA

VIAJE SENCILLO: ✓ VIAJE DOBLE SI

OBSERVACIONES: _____

Of. Cra 80 # 8C - 85 Bogotá D.C. - Email: ernestobarmor@hotmail.com - Tel: 314 343 3954

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogota - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15
Cargador

Remisión N: RF-163023
Fecha: 2025-07-18 13:07:10
Cajero: Nicoll Placa: KUL475
Generador: LP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS
Cliente: LP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS
Cliente Efectivo:
Recibo No.
Obra: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Ubicación:
Material: CONCRETO
Cantidad Mts: 13,00 M^3
Cantidad Ton: 17,02 Ton
Observaciones:

FIRMA CONDUCTOR

Todos nuestros materiales granulares son reciclados
Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión. Para garantizar un ambiente seguro para

(1)

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-010-2025** **Generado el: 2025-07-23**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-23 13:18:02

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** WILMER CAMACHO **NO DE IDENTIFICACION:** 1031180934 **PLACA VEHICULO:** KUM989 **PIN-TRANS:** 10208 **TIPO VEHICULO:**	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

(12)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-011-2025 Generado el: 2025-07-23**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-23 13:40:31

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** SERGIO MALDONADO **NO DE IDENTIFICACION:** 80128503 **PLACA VEHICULO:** SZO642 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

(11)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-012-2025 Generado el: 2025-07-23**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-23 16:21:09

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** SERGIO MALDONADO **NO DE IDENTIFICACION:** 80128503 **PLACA VEHICULO:** SZO642 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

(11)

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-009-2025 Generado el: 2025-07-23**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-23 12:45:21

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** JAVIER MATEUS **NO DE IDENTIFICACION:** 79726748 **PLACA VEHICULO:** KUL475 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

(10)

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-008-2025 Generado el: 2025-07-23**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-23 11:45:44

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): JAIRO GOMEZ **NO DE IDENTIFICACION:** 80128503 **CONDUCTOR:** SERGIO MALDONADO **NO DE IDENTIFICACION:** 80128503 **PLACA VEHICULO:** SZO642 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

(4)

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-007-2025 Generado el: 2025-07-23**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-23 11:12:51

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** WILMER CAMACHO **NO DE IDENTIFICACION:** 1031180934 **PLACA VEHICULO:** SUM989 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

(5)

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-015-2025 Generado el: 2025-07-24**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-24 09:47:32

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** WILMER CAMACHO **NO DE IDENTIFICACION:** 1031180934 **PLACA VEHICULO:** KUM989 **PIN-TRANS:** 10208 **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones: NOCHE	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

(7)

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-006-2025** **Generado el: 2025-07-23**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-23 09:48:49

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** JAVIER MATEUS **NO DE IDENTIFICACION:** 79726748 **PLACA VEHICULO:** KUL475 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto ✓	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

(3)

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-005-2025** **Generado el: 2025-07-23**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-23 09:46:13

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** SERGIO MALDONADO **NO DE IDENTIFICACION:** 80128503 **PLACA VEHICULO:** SZO642 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto ✓	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

(9)

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-014-2025 Generado el: 2025-07-24**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-24 09:46:06

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** JAVIER MATEUS **NO DE IDENTIFICACION:** 79726748 **PLACA VEHICULO:** KUL475 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones: NOCHE	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

(8)

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-013-2025 Generado el: 2025-07-24**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-24 09:44:34

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** JAVIER MATEUS **NO DE IDENTIFICACION:** 79726748 **PLACA VEHICULO:** KUL475 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA TIBABUYES **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

ANEXO No. 5. Control Materiales.

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			
CÓDIGO	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN**	

SUBDIRECCIÓN GENERAL NO APLICA **FECHA** JULIO

DIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NO APLICA

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONTRATISTA CONSORCIO SUBA VIAL VR

MES: JULIO

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1	15	CONSTRITURAR	14	ADO INDUSTI	0				460
2	14	CONSTRITURAR	14	ADO INDUSTI	0				56
3	14	CONSTRITURAR	14	ADO INDUSTI	0		0		0
4	14	CONSTRITURAR	14	ADO INDUSTI	0		0		0
5	15	CONSTRITURAR	0		0		0		0
6	15	GRECO	0		0		0		0
7	15	GRECO	0		0		0		0
8	15	GRECO	0		0		0		0
9	15	GRECO	0		0		0		0
10	15	GRECO	0		0		0		0
11	15	GRECO	0		0		0		0
12	15	GRECO	0		0		0		0
13	15	GRECO	0		0		0		0
14	15	GRECO	0		0		0		0
15	15	GRECO	0		0		0		0
16	15	GRECO	0		0		0		0
17	15	GRECO	0		0		0		0
18	15	GRECO	0		0		0		0
19	15	GRECO	0		0		0		0
20	15	GRECO	0		0		0		0
21	15	GRECO	0		0		0		0
22	15	GRECO	0		0		0		0
23	15	GRECO	0		0		0		0
24	15	GRECO	0		0		0		0
25	15	GRECO	0		0		0		0
26	15	GRECO	0		0		0		0
27	15	GRECO	0		0		0		0
28	15	GRECO	0		0		0		0
29	15	GRECO	0		0		0		0
30	14	RECICLADOS INDUSTRIALES	0		0		0		0
31	14	RECICLADOS INDUSTRIALES	0		0		0		0
TOTAL	460		56		0		0		516

Tipo de Material 1: B-200 =29M3
Tipo de Material 2: TRITURADO 28
Tipo de Material 3: SBG -AR 84
Tipo de Material 4: SBG 90
Tipo de Material 4: BG 270

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra **: 29 M3**
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra **: 28 M 3**
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra**: 84 M3**
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra **: 90 M3**
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado **=270 M3**

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directoriío de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre) ALEJANDRO ACOSTA

Ing Residente Ambiental Contratista

(Firma)

(Nombre) KATHERINE GUAÑARITA

Ing Residente Ambiental Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

CONSTRITURAR S.A.S.
Título Minero: 17415
Dir: Bogotá - Mochuelo
Tel: 3186129043
Certificado de Origen

Sistema P.O.S.: No. CT POS 17620
Fecha: 26/06/2025 01:12:42 p. m.
Cliente: INGENIERIA DINO DISEÑOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Documento: 901798659
Medio de pago: Anticipo
Forma de pago: Contado
Vendedor: Andres F.

Und	Producto	Precio	Total
15	B-200	$ 24.990	$ 374.850
1	S/C0042	$ 0	$ 0

Impuestos

Nombre	%	Base	Total
IVA	%	$ 315.000	$ 59.850
il		$ 0	$ 0

VALOR A PAGAR:

$ 374.850

Observaciones: JAIRO GOMEZ / OBRA SUBA

Comercializador Autorizado
Mineral Explotado: Recebo
Unidad de Medida: m3
www.loggro.com
Loggro S.A.S.
NIT: 901361537-4

Https://app.pipos.com/#/mar/orders/

CONSTRITURAR S.A.S.
Título Minero: 17415
Dir: Bogotá - Mochuelo
Tel: 3186129043
Certificado de Origen

Sistema P.O.S.: No. CT POS 17620
Fecha: 25/06/2025 01:05:55 p. m.
Cliente: INGENIERIA DINO DISEÑOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Documento: 901798659
Medio de pago: Anticipo
Forma de pago: Contado
Vendedor: Andres F.

Und	Producto	Precio	Total
14	B-200	$ 24.990	$ 349.860
1	S/C0042	$ 0	$ 0

Impuestos

Nombre	%	Base	Total
IVA	%	$ 294.000	$ 55.860
il		$ 0	$ 0

VALOR A PAGAR:

$ 349.860

Observaciones: JAIRO GOMEZ / OBRA SUBA

Comercializador Autorizado
Mineral Explotado: Recebo
Unidad de Medida: m3
www.loggro.com
Loggro S.A.S.
NIT: 901361537-4

Https://app.pipos.com/#/mar/orders/

Gaitana

CONSTRITURAR S.A.S.
Título Minero: 17415
Dir : Bogotá - Mosquera
Tel.: 3186129043
Certificado de Origen

Sistema P.O.S.: No. CTPOS18544
Fecha: 14-07-2025 10:53:54 a. m.
Cliente: LP INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS
Documento: 901606909
Medio de pago: Anticipo
Forma de pago: Contado
Vendedor: Andrés F.

Und	Producto	Precio	Total
1	SKX618	$ 0	$ 0
14	Triturado 1 ½" - 2"	$ 87.465	$ 1.224.510

Impuestos

Nombre	%	Base	Total
0		$ 0	$ 0
IVA	19%	$ 1.029.000	$ 195.510

VALOR A PAGAR:

$ 1.224.510

Observaciones: OBRA SUBA HUGO CASTRO
Comercializador Autorizado
Mineral Explotado: Recebo
Unidad de Medida: m3
www.loggro.com
Loggro S.A.S

LP ING. GAITANA.

CONSTRITURAR
CONSTRITURAR S.A.S

CONSECUTIVO 508

CONSECUTIVO EXTERNO:
ORIGEN: CANTERA CONSTRITURAR
CÓDIGO DE TRANSPORTE: Suministro sin Transporte
CLIENTE: INGENIERIA CINO DISEÑOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DOCUMENTO: 901798659
FORMA DE PAGO: Anticipo
CONDUCTOR: JAVIER MATEUS
DESTINO: SUBA TIBABUYES
PLACA: KUL479

MATERIAL	CANTIDAD	VALOR
Triturado ½ - 1"	15 m³	$ 1.374.450

OBSERVACIONES: NINGUNA

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguiente código

También puede consultar el vale a través del siguiente enlace: https://api-construccion.constriturar.com/api/ordenes-servicio/download-orden-servicio-pdf/fcaa6c91-181b-4279-80eb-1d60-9660-b09a8e15?v=e

(1)

REMISION MANUAL	
Numero:	20650
Fecha:	1/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: KUL475

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR

Observación: 01 JUL 2025 SIN VALE

HORA

NO IMPLICA ACEPTACION DE CONTENIDO

Elaborado

Recibido

Nombre y firma **Nombre y firma**

(2)

REMISION MANUAL	
Numero:	20651
Fecha:	1/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: SZO642

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR

Observación: 01 JUL 2025 SIN VALE

HORA

NO IMPLICA ACEPTACION DE CONTENIDO

Elaborado

Recibido

Nombre y firma **Nombre y firma**

(3)

REMISION MANUAL	
Numero:	20679
Fecha:	2/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: KUL475

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

0 2 JUL 2025

Elaborado

Nombre y firma

HORA

LA PUBLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

79776173

Recibido

Nombre y firma

(4)

REMISION MANUAL	
Numero:	20680
Fecha:	2/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: SZO642

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

0 2 JUL 2025

Elaborado

Nombre y firma

HORA

LA PUBLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

Recibido

Nombre y firma

(5)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00076989
Fecha: 03/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.**
Fax:			PV-00007286

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001065 ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo	fragudelo	79726748
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

(6)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00076990
Fecha: 03/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.**
Fax:			PV-00007286

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001065 ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo	fragudelo	
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077158
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	Transportador	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 Código: 901798659	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro.
Fax:			PV-00007304

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO
80128503

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030533
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	Transportador	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 Código: 901798659	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro.
Fax:			PV-00003932

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
ajperilla
COTA SUR
04 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ELABORADO

ajperilla
APROBADO

RECIBIDO
14726 MB

(9)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077147
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00007304
Fax:			

Item	Mot Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11	M3	15,000
		Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

8012853
RECIBIDO

(10)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077154
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00007304
Fax:			

Item	Mot Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11	M3	15,000
		Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

14/7/2025
RECIBIDO

11

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030536
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00003932
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
COTA. SUR
04 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ajperilla
ELABORADO

ajperilla
APROBADO

RECIBIDO

12

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077161
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00007304
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO

13

REMISION MANUAL	
Numero:	~~14365~~
Fecha.	7/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA SIN VALE

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: KUL475

OTRO ¿Cuál?: AR BG

Observación:

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
07 JUL 2025
NO IMPLICA VERIFICACIÓN NI ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

14

REMISION MANUAL	
Numero:	~~20758~~
Fecha:	7/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA GAITANIA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: KUL475

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
C.T.A. SUR
07 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

(9)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077200
Fecha: 07/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.**	
Fax:			PV-00007304

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO

(10)

REMISION MANUAL
Numero: 20759
Fecha: 7/07/2025
Pagina:

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT. 900767473-7
Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.
Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC
Nit o CC: 901798659
P.V. Nro:
Frente: SUBA GAITANIA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:
Placa: SZO642

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR
Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S. CTA. SUR
07 JUL 2025
Elaborado
Nombre y firma
HORA
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Recibido
Nombre y firma

(17)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00077201
Fecha: 07/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**
Contacto: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-
Nit o C.C.: 901798659 **Código:** 901798659	**Placa:** **Guía:** **Cajas:** 0
Dirección: CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**
Ciudad: BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA
Teléfono:	**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.** PV-00007304
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR		11	M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

7776748
RECIBIDO

(18)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00030611
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**
Contacto: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-
Nit o C.C.: 901798659 **Código:** 901798659	**Placa:** **Guía:** **Cajas:** 0
Dirección: CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**
Ciudad: BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA
Teléfono:	**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.** PV-00003950
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR		11	M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA GAITANA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

ajperilla
ELABORADO

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR
08 JUL 2025
HORA
LA SIMPLE ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ajperilla
APROBADO

7776748
RECIBIDO

REMISION MANUAL	
Numero:	14364
Fecha:	7/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 3158729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA SIN VALE

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: SZO642

OTRO ¿Cuál?: AR BG

Observación:

Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S
07 JUL 2025
NO IMPLICA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Elaborado
Nombre y firma

Recibido
Nombre y firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030612
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659
Dirección:	CL 19 NO. 20 76
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	
Fax:	

Transportador
-
Placa: **Guía:** **Cajas:** 0
Vendedor
1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.
		PV-00003950

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA GAITANA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S
CTA. SUR
08 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

ajperilla
ELABORADO

ajperilla
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030652
Fecha: 09/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00003963
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA GAITANA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR
09 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ajperilla
ELABORADO

ajperilla
APROBADO

19820796
RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030875
Fecha: 21/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00004013
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA GAITANA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR
21 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ajperilla
ELABORADO

ajperilla
APROBADO

19426748
RECIBIDO

(22)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077257
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00007329
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO

21

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077258
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00007329
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida

Cliente

Remisión N: RF-163099
Fecha: 2025-07-19 10:44:16
Cajero: Nicoll Placa: VDZ456
Generador:
Cliente: LP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS
Cliente Efectivo:
Recibo No.
Obra: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Ubicación:
Material: SBG-AR 2018
Cantidad Mts: 14,00 M^3
Cantidad Ton: 20,89 Ton*
Observaciones:

Todos nuestros materiales granulares son reciclados Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión. Para garantizar un ambiente seguro para todos,
confirmó que conozco y entiendo las normas de seguridad de la planta. Me comprometo a cumplirlas en todo momento y a contribuir a un entorno de trabajo seguro
Salida de materiales

Imprimir

Salida de materiales

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15
Cliente

Remisión N: RF-163164
Fecha: 2025-07-21 13:02:35
Cajero: Nicoll Placa: KUL475
Generador:
Cliente: LP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS
Cliente Efectivo:
Recibo No.
Obra: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Ubicación:
Material: SBG-AR 2018
Cantidad Mts: 14,00 M^3
Cantidad Ton: 20,89 Ton*
Observaciones:

FIRMA CONDUCTOR

Todos nuestros materiales granulares son reciclados Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión. Para garantizar un ambiente seguro para todos,
confirmó que conozco y entiendo las normas de seguridad de la planta. Me comprometo a cumplirlas en todo momento y a contribuir a un entorno de trabajo seguro
Salida de materiales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15
Cliente

Remisión N: RF-163294
Fecha: 2025-07-23 10:09:27
Cajero: Nicoll Placa: KUL475
Generador:
Cliente: LP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS
Cliente Efectivo:
Recibo No.
Obra: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Ubicación:
Material: SBG-AR 2018
Cantidad Mts: 14,00 M^3
Cantidad Ton: 20,89 Ton*
Observaciones:

FIRMA CONDUCTOR

Todos nuestros materiales granulares son reciclados Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión. Para garantizar un ambiente seguro para todos,
confirmó que conozco y entiendo las normas de seguridad de la planta. Me comprometo a cumplirlas en todo momento y a contribuir a un entorno de trabajo seguro
Salida de materiales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15
Cliente

Remisión N: RF-163319
Fecha: 2025-07-23 13:43:11
Cajero: Nicoll Placa: KUL475
Generador:
Cliente: LP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS
Cliente Efectivo:
Recibo No.
Obra FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Ubicación:
Material: SBG-AR 2018
Cantidad Mts: 14,00 M^3
Cantidad Ton: 20,89 Ton*
Observaciones:

FIRMA CONDUCTOR

Todos nuestros materiales granulares son reciclados
Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión. Para garantizar un ambiente seguro para todos,
confirmó que conozco y entiendo las normas de seguridad de la planta. Me comprometo a cumplirlas en todo momento y a contribuir a un entorno de trabajo seguro
Salida de materiales

Imprimir

en todo momento y a contribuir a un entorno de trabajo seguro
Salida de materiales

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15
Cliente

Remisión N: RF-163022
Fecha: 2025-07-18 13:01:48
Cajero: Nicoll Placa: KUL475
Generador:
Cliente: LP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS
Cliente Efectivo:
Recibo No.
Obra FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Ubicación:
Material: SBG-AR 2018
Cantidad Mts: 14,00 M^3
Cantidad Ton: 20,89 Ton*
Observaciones

FIRMA CONDUCTOR

Todos nuestros materiales granulares son reciclados
Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión. Para garantizar un ambiente seguro para todos,
confirmó que conozco y entiendo las normas de seguridad de la planta. Me comprometo a cumplirlas en todo momento y a contribuir a un entorno de trabajo seguro
Salida de materiales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15
Cliente

Remisión N: RF-162962
Fecha: 2025-07-18 07:22:36
Cajero: Nicoll Placa: KUL475
Generador:
Cliente: LP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS
Cliente Efectivo:
Recibo No.
Obra FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Ubicación:
Material: SBG-AR 2018
Cantidad Mts: 14,00 M^3
Cantidad Ton: 20,89 Ton*
Observaciones:

FIRMA CONDUCTOR

Todos nuestros materiales granulares son reciclados
Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión. Para garantizar un ambiente seguro para todos,
confirmó que conozco y entiendo las normas de seguridad de la planta. Me comprometo a cumplirlas en todo momento y a contribuir a un entorno de trabajo seguro
Salida de materiales

Imprimir

ANEXO No. 6. Manejo de agua.

Colombiana de ingenieria combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
9	7	25

Nº 53957

Dirección: CL 132 B. B. SANTA	Cliente: BBB12 SERVICE
Placa del Vehiculo: 394	No. de Baños: 1
Conductor: OSCAR GUERRERO	Tipo de Baño:
	Operario: DAGO

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: Andrés A

Colombiana de ingenieria combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
9	7	25

Nº 53955

Dirección: KR 136A CL 143.144	Cliente: BBB12. SERVICE
Placa del Vehiculo: 394	No. de Baños: 1
Conductor: OSCAR GUERRERO	Tipo de Baño:
	Operario: DAGO

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones: Dejan papel

Recibido: Alejandro Acosta

Scanned with CamScanner

Colombiana de ingeniería combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
14	7	25

Nº 54413

Dirección: Kr 135A # 141 San carlos Suba	Cliente: Global Ambiental
Placa del Vehiculo: 351	No. de Baños: 1
Conductor: OSCAR	Tipo de Baño: Portatil
	Operario: Jorge

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: Karoly Cano

Colombiana de ingeniería combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
11	07	25

Nº 54390

Dirección: Cra 136A - Cl 143	Cliente: global ambiental
Placa del Vehiculo: ZIF 253	No. de Baños: 1
Conductor: Jessica	Tipo de Baño:
	Operario: Miley

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: Karoly Cano

Colombiana de ingeniería combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
11	07	25

Nº 54387

Dirección: Cl 132A bis carrera 6d	Cliente: global ambiental
Placa del Vehiculo: ZIF 253	No. de Baños: 1
Conductor: Jessica	Tipo de Baño:
	Operario: Miley

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: Dayana Avila

Colombiana de ingeniería combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
14	7	25

Nº 54414

Dirección: TV 127 Cl 132 Suba	Cliente: Global Ambiental
Placa del Vehiculo: 351	No. de Baños: 1
Conductor: OSCAR	Tipo de Baño: Portatil
	Operario:

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

Scanned with CamScanner

Colombiana de ingenieria combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
16	07	25

Nº 53916

Dirección: calle 132 - CRA-726 (BV 127) Cliente: Global Ambiental services SAS

Placa del Vehiculo: ZIJ 253 No. de Baños: 1

Conductor: Angelino Tipo de Baño: portatil

Operario: Alfonso

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: Andrés A

Colombiana de ingenieria combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
16	07	25

Nº 53915

Dirección: CRA 736A - calle 7145-7144 Cliente: Global ambiental services SAS

Placa del Vehiculo: ZII 253 No. de Baños: 1

Conductor: ANGELINO Tipo de Baño: portatil

Operario: Alfonso

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: Karday Cano

Scanned with CamScanner

Colombiana de ingenieria combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
24	7	25

Nº 54661

Dirección: Cl 132 6b15 oficina 726	Cliente: Global Ambiental Services SAS
Placa del Vehiculo: 351	No. de Baños:
Conductor: Damar	Tipo de Baño:
	Operario: Deiso Turizo

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☑ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

Colombiana de ingenieria combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
24	7	25

Nº 54662

Dirección: Kra 136A-Ct 141	Cliente: Global Ambiental Servicios SAS
Placa del Vehiculo: 351	No. de Baños: 01
Conductor: Damar	Tipo de Baño:
	Operario: Deiso Turizo

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☑ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: Karday Cano

Colombiana de ingenieria combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO

Nº 54661

Dirección: Cl 132 bis a cra 12

Placa del Vehiculo: 351

Conductor: Oscar

Cliente: Global Ambiental Services SAS

No. de Baños:

Tipo de Baño:

Operario: Jorge Tirado

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: Jorge

Colombiana de ingenieria combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
21	7	25

Nº 54583

San carlos Suba

Dirección: Kr 136 cl 144

Placa del Vehiculo: 351

Conductor: OSCAR

Cliente: Global Ambiental

No. de Baños: 1

Tipo de Baño: Portatil

Operario: Jorge

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: Karday Caro

Colombiana de ingenieria combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
30	7	25

Nº 54070

Dirección: AK 127C # 132B-48

Placa del Vehiculo: 253

Conductor: ANGEL DIAZ

Cliente: SERVICIO 2.5

No. de Baños: 1

Tipo de Baño:

Operario: DIEGO

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido: JOEL ACOSTA AVILA

Colombiana de ingenieria combi s.a.s.

NIT. 830.021.507-3

Mantenimiento de Baños

FECHA

DÍA	MES	AÑO
21	07	25

Nº 54585

Dirección: Cl 132 bis a cra 12

Placa del Vehiculo: 351

Conductor: Oscar

Cliente: Global Ambiental

No. de Baños: 01

Tipo de Baño:

Operario: Jorge Tirado

Calidad de Servicio: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Observaciones:

Recibido:

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 7. Ficha de individuos arbóreos.

CONSTRITURAR S.A.S.
Título Minero: 17415
Dir: Bogotá - Mochuelo
Tel: 3186129043
Certificado de Origen

Sistema P.O.S.: No. CT POS 17620
Fecha: 26/06/2025 01:12:42 p. m.
Cliente: INGENIERIA DINO DISEÑOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Documento: 901798659
Medio de pago: Anticipo
Forma de pago: Contado
Vendedor: Andres F.

Und	Producto	Precio	Total
15	B-200	$ 24.990	$ 374.850
1	S/C0042	$ 0	$ 0

Impuestos

Nombre	%	Base	Total
IVA	%	$ 315.000	$ 59.850
il		$ 0	$ 0

VALOR A PAGAR:

$ 374.850

Observaciones: JAIRO GOMEZ / OBRA SUBA

Comercializador Autorizado
Mineral Explotado: Recebo
Unidad de Medida: m3
www.loggro.com
Loggro S.A.S.
NIT: 901361537-4

Https://app.pipos.com/#/mar/orders/

CONSTRITURAR S.A.S.
Título Minero: 17415
Dir: Bogotá - Mochuelo
Tel: 3186129043
Certificado de Origen

Sistema P.O.S.: No. CT POS 17620
Fecha: 25/06/2025 01:05:55 p. m.
Cliente: INGENIERIA DINO DISEÑOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Documento: 901798659
Medio de pago: Anticipo
Forma de pago: Contado
Vendedor: Andres F.

Und	Producto	Precio	Total
14	B-200	$ 24.990	$ 349.860
1	S/C0042	$ 0	$ 0

Impuestos

Nombre	%	Base	Total
IVA	%	$ 294.000	$ 55.860
il		$ 0	$ 0

VALOR A PAGAR:

$ 349.860

Observaciones: JAIRO GOMEZ / OBRA SUBA

Comercializador Autorizado
Mineral Explotado: Recebo
Unidad de Medida: m3
www.loggro.com
Loggro S.A.S.
NIT: 901361537-4

Https://app.pipos.com/#/mar/orders/

Gaitana

CONSTRITURAR S.A.S.
Título Minero: 17415
Dir : Bogotá - Mosquera
Tel.: 3186129043
Certificado de Origen

Sistema P.O.S.: No. CTPOS18544
Fecha: 14-07-2025 10:53:54 a. m.
Cliente: LP INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS
Documento: 901606909
Medio de pago: Anticipo
Forma de pago: Contado
Vendedor: Andrés F.

Und	Producto	Precio	Total
1	SKX618	$ 0	$ 0
14	Triturado 1 ½" - 2"	$ 87.465	$ 1.224.510

Impuestos

Nombre	%	Base	Total
0		$ 0	$ 0
IVA	19%	$ 1.029.000	$ 195.510

VALOR A PAGAR:

$ 1.224.510

Observaciones: OBRA SUBA HUGO CASTRO
Comercializador Autorizado
Mineral Explotado: Recebo
Unidad de Medida: m3
www.loggro.com
Loggro S.A.S

LP ING. GAITANA.

CONSTRITURAR
CONSTRITURAR S.A.S

CONSECUTIVO 508

CONSECUTIVO EXTERNO:
ORIGEN: CANTERA CONSTRITURAR
CÓDIGO DE TRANSPORTE: Suministro sin Transporte
CLIENTE: INGENIERIA CINO DISEÑOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
DOCUMENTO: 901798659
FORMA DE PAGO: Anticipo
CONDUCTOR: JAVIER MATEUS
DESTINO: SUBA TIBABUYES
PLACA: KUL479

MATERIAL	CANTIDAD	VALOR
Triturado ½ - 1"	15 m³	$ 1.374.450

OBSERVACIONES: NINGUNA

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguiente código

También puede consultar el vale a través del siguiente enlace: https://api-construccion.constriturar.com/api/ordenes-servicio/download-orden-servicio-pdf/fcaa6c91-181b-4279-80eb-1d60-9660-b09a8e15?v=e

(1)

REMISION MANUAL	
Numero:	20650
Fecha:	1/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: KUL475

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR

Observación: 01 JUL 2025 SIN VALE

HORA

NO IMPLICA ACEPTACION DE CONTENIDO

Elaborado

Recibido

Nombre y firma **Nombre y firma**

(2)

REMISION MANUAL	
Numero:	20651
Fecha:	1/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: SZO642

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR

Observación: 01 JUL 2025 SIN VALE

HORA

NO IMPLICA ACEPTACION DE CONTENIDO

Elaborado

Recibido

Nombre y firma **Nombre y firma**

(3)

REMISION MANUAL	
Numero:	20679
Fecha:	2/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: KUL475

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

0 2 JUL 2025

Elaborado

Nombre y firma

HORA

LA PUBLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

79776173

Recibido

Nombre y firma

(4)

REMISION MANUAL	
Numero:	20680
Fecha:	2/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: SZO642

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR

0 2 JUL 2025

Elaborado

Nombre y firma

HORA

LA PUBLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

Recibido

Nombre y firma

(5)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00076989
Fecha: 03/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.**
Fax:			PV-00007286

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001065 ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo	fragudelo	79726748
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

(6)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00076990
Fecha: 03/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.**
Fax:			PV-00007286

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001065 ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo	fragudelo	
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077158
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	Transportador	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 Código: 901798659	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro.
Fax:			PV-00007304

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO
80128503

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030533
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	Transportador	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 Código: 901798659	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro.
Fax:			PV-00003932

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
ajperilla
COTA SUR
04 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ELABORADO

ajperilla
APROBADO

RECIBIDO
14726 MB

(9)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077147
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00007304
Fax:			

Item	Mot Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11	M3	15,000
		Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

8012853
RECIBIDO

(10)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077154
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00007304
Fax:			

Item	Mot Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11	M3	15,000
		Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

14/7/2025
RECIBIDO

11

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030536
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00003932
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
COTA. SUR
04 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ajperilla
ELABORADO

ajperilla
APROBADO

RECIBIDO

12

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077161
Fecha: 04/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00007304
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO

13

REMISION MANUAL	
Numero:	~~14365~~
Fecha.	7/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA SIN VALE

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: KUL475

OTRO ¿Cuál?: AR BG

Observación:

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
07 JUL 2025
NO IMPLICA VERIFICACIÓN NI ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

14

REMISION MANUAL	
Numero:	~~20758~~
Fecha:	7/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA GAITANIA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: KUL475

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR

Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
C.T.A. SUR
07 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Elaborado

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

(9)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077200
Fecha: 07/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.**	
Fax:			PV-00007304

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO

(10)

REMISION MANUAL
Numero: 20759
Fecha: 7/07/2025
Pagina:

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT. 900767473-7
Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.
Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCC
Nit o CC: 901798659
P.V. Nro:
Frente: SUBA GAITANIA

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:
Placa: SZO642

OTRO ¿Cuál?: ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR
Observación: SIN VALE

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S. CTA. SUR
07 JUL 2025
Elaborado
Nombre y firma
HORA
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Recibido
Nombre y firma

(17)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00077201
Fecha: 07/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**
Contacto: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-
Nit o C.C.: 901798659 **Código:** 901798659	**Placa:** **Guía:** **Cajas:** 0
Dirección: CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**
Ciudad: BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA
Teléfono:	**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.** PV-00007304
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR		11	M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

7776748
RECIBIDO

(18)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00030611
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**
Contacto: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-
Nit o C.C.: 901798659 **Código:** 901798659	**Placa:** **Guía:** **Cajas:** 0
Dirección: CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**
Ciudad: BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA
Teléfono:	**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.** PV-00003950
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR		11	M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA GAITANA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

ajperilla
ELABORADO

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR
08 JUL 2025
HORA
LA SIMPLE ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ajperilla
APROBADO

7776748
RECIBIDO

REMISION MANUAL	
Numero:	14364
Fecha:	7/07/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 3158729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	P.V. Nro:	
Nit o CC:	901798659	Frente:	SUBA SIN VALE

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: SZO642

OTRO ¿Cuál?: AR BG

Observación:

Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S
07 JUL 2025
NO IMPLICA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Elaborado
Nombre y firma

Recibido
Nombre y firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030612
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659
Dirección:	CL 19 NO. 20 76
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	
Fax:	

Transportador
-
Placa: **Guía:** **Cajas:** 0
Vendedor
1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.
		PV-00003950

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA GAITANA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S
CTA. SUR
08 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

ajperilla
ELABORADO

ajperilla
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030652
Fecha: 09/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00003963
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA GAITANA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR
09 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ajperilla
ELABORADO

ajperilla
APROBADO

19820796
RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
Avenida Carrera Boyaca 73 00 Sur
BOGOTA D.C.
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030875
Fecha: 21/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00004013
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachad
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA GAITANA SIN VALE; PESO NETO 21.75 TN

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA. SUR
21 JUL 2025
HORA
NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

ajperilla
ELABORADO

ajperilla
APROBADO

19426748
RECIBIDO

(22)

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077257
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00007329
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA SZO642 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO

21

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00077258
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	**Transportador**	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	-	
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Teléfono:		**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00007329
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11		M3	15,000
			Total	15,000

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO
