INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	4		FECHA:	12	de	FEBRERO	de	2026			
PERIODO: DEL	1	de	ENERO	de	2026	AL	31	de	ENERO	de	2026

CONTRATO No:	**IPO-003**	DE	2025	RECURSOS:	REGALÍAS

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACION:

Municipio de Raquira - Departamento de Boyacá

Registro BPIN proyecto:	**2024004150430**

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO LA CANDELARIA	**ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
CONSORCIO INTERCANDELARIA	**JULIAN EDGARDO GUERRERO**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
N.A	N.A	N.A	NA.
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL:	$ 20,406,995,280.12	VALOR ADICIONALES:	$ 0.00	VALOR TOTAL:	$ 20,406,995,280.12

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	30	de	SEPTIEMBRE	de	**2026**						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	30	de	SEPTIEMBRE	de	**2026**						

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**35.42%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**39.43%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**6.99%**



INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	95294 27386	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd 21	mm 10	aa 2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	10	2025	1	4	2027	$ 2,040,699,528.01
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1	10	2025	1	2	2027	$ 6,122,098,584.04
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1	10	2025	1	10	2029	$ 2,040,699,528.01
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1	10	2026	1	10	2031	$ 4,081,399,056.02
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1	10	2025	1	10	2026	$ 1,020,349,764.01

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: Las condiciones climaticas durante el presente periodo han sido en su mayoría de días nublados y soleados, sin embargo se han presentado días exporadicos de fuertes lluvias.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE SOCIALIZACIÓN	22	9	2025
ACTA DE INICIO	1	10	2025
ACTA TÉCNICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	3	12	2025
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	3	12	2025
OTRO SI No. 1 MODIFICACIÓN EN ACTIVIDADES - CONTRATO IPO-003-2025	5	12	2025

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	K5+300 - K6+260
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	K4+400 - K6+060
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95%	K4+070 - K5+800
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. (AFIRMADO)	K4+070 - K5+800/Cantera Villamil Mining S.A.S
ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE	K4+400 - K6+260
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	K4+000 - K4+500
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. (SUBBASE GRANULAR)	K4+000 - K4+500/Cantera Villamil Mining S.A.S

DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). (CUNETAS EXISTENTES)	Se realiza la demolición de las cunetas en concreto existentes desde el K3+400 - K6+260
CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Se realiza el corte de pavimento por el costado derecho K0+980 - K2+995
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Se realiza fundida de cunetas revestidas en concreto por el costado derecho K0+980 - K1+700
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Se realiza instalación malla de refuerzo para cunetas revestidas en concreto por el costado derecho K0+980 - K1+700
ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Se realizó diagnostico y evaluación estructural de las estructuras hidraulicas (Alcantarillas y Box culverts), de acuerdo al inventario que se habia ejecutado previamente donde se identificó cada una en campo, revisando la necesidad de intervención real.	K0+000 hasta el K6+260.
Seguimiento, verificación y chequeo de la disposición del material sobrante en el botadero o escombrera.	Material sobrante del K0+000 hasta el K6+260.
Verificación y control mediante topografía de la actividad de excavación de cortes y canales sin clasificar para el mejoramiento de la subrasante como para el perfilado de taludes según diseño geometrico.	K0+000 hasta el K6+260.
Control de espesores mediante topografia del suministro, extendida y compactación de material de afirmado para la capa de mejoramiento de la estructura de pavimento.	K4+070 - K5+800
Control de espesores mediante topografia del suministro, extendida y compactación de material de subbase granular para la capa de subbase de la estructura de pavimento.	K4+000 - K4+500
Control en campo de la demolición de estructuras en concreto de las cunetas existentes y verificación de la disposición de los residuos de la demolición.	K3+400 - K6+260
Se realiza la verificación de la construcción de las cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa. Se constata la localización de acuerdo a los estudios y diseños, se supervisa la instalación de la formaleta para el encofrado, se corrobora la correcta instalación de la malla electrosoldada, se verifica que la mezcla de concreto presente homogeneidad y que se cumpla con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controla que las estructura del bordillo de la cuneta se encuentren correctamente verticales y bien apuntalados antes de realizar el vaciado de concreto, por último se realiza toma de muestras de cilindros con el fin de verificar la resistencia del concreto.	K0+980 - K1+700

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	
Verificación y chequeo de la distribución de la malla de refuerzo de las cunetas en construcción.	K0+980 - K1+700

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición)	UBICACIÓN Y CONTROL DE NIVELES Y/O COTAS PARA CONFORMACIÓN CAPA DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE AFIRMADO	20%	Se verificaron los certificados de calibración.
Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición)	UBICACIÓN Y CONTROL DE NIVELES Y/O COTAS PARA CONFORMACIÓN CAPA DE SUBBASE GRANULAR	20%	Se verificaron los certificados de calibración.

Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición)	UBICACIÓN Y CONTROL DE NIVELES Y/O COTAS PARA PERFILADO DE TALUDES	20%	Se verificaron los certificados de calibración.
Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición)	LOCALIZACIÓN Y MARCACIÓN DE NIVELETAS OBRAS DE DRENAJE (CUNETAS)	20%	Se verificaron los certificados de calibración.
Retroexcavadora	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) OBRAS DE DRENAJE (CUNETAS)	80%	El equipo cuenta con los preoperacionales.
Excavadora de oruga (>= 20 Ton)	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	30%	El equipo cuenta con los preoperacionales.
Excavadora de oruga (>= 20 Ton)	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	40%	El equipo cuenta con los preoperacionales.
Excavadora de oruga (>= 20 Ton)	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y PERFILADO DE TALUDES	30%	El equipo cuenta con los preoperacionales.
Minicargador	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	80%	El equipo cuenta con los preoperacionales.
Camioneta (PickUp o similar)	ACTIVIDADES GENERALES	100%	Se verificó la vigencia del SOAT y Tecno-mecánica.
Camión sencillo (Carroceria estacas)	ACTIVIDADES GENERALES	100%	Se verificó la vigencia del SOAT y Tecno-mecánica.
Motoniveladora (140 o similar) KOMATSU	EXTENDIDA Y CONFORMACIÓN CAPA DE AFIRMADO	100%	El equipo cuenta con los preoperacionales.
Vibrocompactador 10 Ton	COMPACTACIÓN CAPA DE AFIRMADO	100%	El equipo cuenta con los preoperacionales.

Motoniveladora (140 o similar) VOLVO	EXTENDIDA Y CONFORMACIÓN CAPA DE SUBBASE GRANULAR	100%	El equipo cuenta con los preoperacionales.
Vibrocompactador 10 Ton	COMPACTACIÓN CAPA DE SUBBASE GRANULAR	100%	El equipo cuenta con los preoperacionales.
Volqueta dobletroque	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	100%	El equipo cuenta con los preoperacionales.
Volqueta sencilla	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE DISPOSICIÓN	100%	El equipo cuenta con los preoperacionales.
Autohormigonera	MEZCLA DE CONCRETO PARA OBRAS DE DRENAJE	100%	El equipo cuenta con los preoperacionales.

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Materiales generales de Ferreteria	AM Ferreteria	Se realiza verificación de certificado de calidad.
Material granular de afirmado	Cantera Villamil Mining S.A.S	Se verifica fuente.
Material subbase granular	Cantera Villamil Mining S.A.S	Se verifica fuente.
Malla electrosoldada	AM Ferreteria	Se realiza verificación de certificado de calidad.
Agua	HidroRaquira ESP	Se verifica fuente de captación.
Cemento	Holcim Colombia S.A.	Se realiza verificación de certificado de calidad.
Geotextil NT1600	Geosistemas	Se realiza verificación de certificado de calidad.
Tuberia drenaje 4"	Gerfor	Se realiza verificación de certificado de calidad.
Material granular arena de trituración	Cantera Villamil Mining S.A.S	Se verifica fuente.
Material granular gravilla o triturado 3/4"	Cantera Villamil Mining S.A.S	Se verifica fuente.

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Camioneta (PickUp o similar)	Seguimiento , verificación y control de las actividades en general, movilización de equipos topograficos, traslado de personal de interventoría, toma de muestras de laboratorio (cilindros de concreto, toma de densidades de las capas de afirmado y subbase.)	100%	Se realiza verificación de cada una de las actividades desde el K0+980 - K5+800
Estación Total topográfica	Control Topográfico en Obra de la localización de las obras de drenaje y revisión de la ubicación de puntos de referencia para la conformación de la vía.	50%	Se realiza verificación de la localización y replanteo topografico en obra. Se anexan los certificados de calibración del equipo.
Nivel de precisión topográfico	Control y verificación topográfica en Obra de cotas de conformación y compactación de las capas de mejoramiento en afirmado y subbase granular.	100%	Se realiza control topografico de las actividades en obra, se entrega certificados de calibración de los equipo.
Equipos de computo	Seguimiento y control de Actividades	100%	Elaboración de informes y otros documentos.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO DE OBRA	30	10	2025	$ 6,122,098,584.04
ACTA PARCIAL No. 1	15	01	2026	$ 4,454,506,831.60
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 10,576,605,415.64**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
N.A				N.A.
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**N.A**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
9/01/2026	CONSORCIO LA CANDELARIA	REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS INFORMES SEMANALES	SE REALIZA ENTREGA DEL INFORME No. 3 DE OBRA
14/01/2026	TIERRASUA S.A.S	ENTREGA INFORME MENSUAL Y SEMANAL DE EJECUCIÓN	SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS INFORMES SEMANALES
14/01/2026	CONSORCIO LA CANDELARIA	SOLICITUD CERTIFICADOS DE CALIDAD	ENTREGA DOCUMENTOS CERTIFICADOS DE CALIDAD
23/01/2026	CONSORCIO INTERCANDELARIA	ENTREGA INFORME No. 3 DE OBRA	SE REALIZÓ LA REVISIÓN, SE ENVIAN OBSERVACIONES PARA SU CORRECCIÓN, PENDIENTE EL DOCUMENTO AJUSTADO

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL											
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO						
					DESDE			HASTA			
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	6765918	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ	6759479	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ	6775637	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
ELIZABETH MAHECHA VALERO	52797064	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ	1057582849	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
JUAN CAMILO PEDRAZA GOMEZ	1193447840	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
JUAN GUILLERMO CIFUENTES SANCHEZ	4375181	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
DANIEL AUGUSTO PEDRAZA PEREZ	1049628290	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
RUBEN DARIO CARO PULIDO	74810538	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
CARLOS ARTURO PULIDO TORRES	1116992019	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
FABIO ORLANDO TENJO BAUTISTA	1055227559	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
MARIA FERNANDA GALINDO VANEGAS	1000687128	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
ISNARDO MAURICIO MURCIA NOVA	1124510	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

MARLEN FLOREZ RONCANCIO	1013577862	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
JULIAN ANDRES TRIANA MARIN	1057015398	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
MARCO AURELIO SUAREZ	4114321	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
YEISON MANUEL SALINAS SIERRA	1057893372	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
HERLEY LISANDRO SALINAS SIERRA	1057892958	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
FERDINANDO CARDENAS SALINAS	6014634	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
FABIO YOHANY BUITRAGO RICO	1049412918	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
JOSE ANTONIO REINA RODRIGUEZ	1124186	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
MARIA FERNANDA ARIAS AMEZQUITA	1049649865	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
JUAN MAURICIO MARTINEZ REYES	6776554	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
DILSA FERNANDA DORADO SIERRA	1057892794	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
JHON FREDY HERNANDEZ SANCHEZ	86014572	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
LUZ DARY RAMIREZ BUITRAGO	23973910	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9540570	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
JACKSON SNEIDER SANDOVAL RIOS	1002735699	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
LUIS ALFONSO TRIANA FAJARDO	7278624	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
JAVIER MAURICIO RICO HERNANDEZ	1121880221	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
LUIS ALFONSO TRIANA FAJARDO	7278626	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
LIVINGSTON LOZANO SIERRA	72329117	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
EDWARD REINALDO CORDERO LOPEZ	810272	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
GREGORIO RAFAEL PEREZ LOPEZ	6078212	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
DAVID JIMENEZ MONROY	5236240	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
YEISON ANTONIO LOPEZ CARO	1002624251	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
CARLOS JOSE CAMPOS AMUNDRAY	6059771	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
GUSJEDI FEDERICO SALAZAR BETANCURT	6653912	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
NOEL ALEXANDER MOYA BRITO	5518220	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
MOISES DIAZ LLERENA	1236441299	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
JUAN BAUTISTA BARRERA	91434506	X	X	X	1	1	2026	31	1	2026
Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?								SI	X	NO

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
GERENTE DE PROYECTO - DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	6765918
RESIDENTE DE OBRA	HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ	6759479
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ	6775637
ESPECIALISTA AMBIENTAL	ELIZABETH MAHECHA VALERO	52797064
ESPECIALISTA SST	DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ	1057582849
Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?		SI X NO

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JORGE HUMBERTO BENITEZ CASTELBLANCO	6.764.329
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	WILSON JULIAN GRANADOS CHAPARRO	1.051.476.187
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	LAURA ALEJANDRA PINZON SILVA	1.101.756.910
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL	NICOLAS JOSE URIBE BLANCO	1.049.629.507
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	GERMAN ALONSO PACHECO SAAVEDRA	1.049.617.189

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Realizó la instalación de la señalización del Plan de manejo de tránsito	K0+000 - K6+260
Señalización en obra de las zonas de transición, zona de obras y final de obras	K0+000 - K6+260
Se cuenta con los controladores viales para el manejo del tránsito en cada uno de los frentes de trabajo	K0+000 - K6+260
Se instaló dos baños portatiles, uno en el frente de trabajo de avanzada de conformación de estructura de pavimento y otro en la zona de parqueadero de maquinaria.	K1+500
Se instaló los puntos ecologicos y puntos de disposición de residuos.	K1+500
Instalación de dos (2) puntos de campamento provisional	K1+500 y K4+050
Inspección preoperacional de maquinaria y equipos diaria	K1+500
Reposición de EPPs diaria o cuando fue necesario	K0+000 - K6+260
Hizó entrega de dotación, EPPs y elementos necesarios para la protección del personal de obra.	K0+000 - K6+260

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Se realizó verificación del cumplimiento del uso de EPPs por parte del personal de obra.	K0+000 - K6+260
Verificación de afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal de obra que ingresó en el presente periodo.	K0+000 - K6+260
Control del cumplimiento de la realización de la inspección preoperacional diaria de la maquinaria amarilla, equipos, herramientas y vehiculos.	K0+000 - K6+260
Se verificó el pago a tiempo de la planilla de seguridad social de todos los trabajadores que ejercen actividades en el marco del contrato de obra IPO-003-2025	K0+000 - K6+260
Se verificó que el contratista de obra implementará el PMT acorde a lo aprobado	K0+000 - K6+260
Se verificó que el contratista de obra contará con los controladores viales establecidos en el PMT y debidamente ubicados en los frentes de trabajo.	K0+000 - K6+260
Se revisó la instalación de los baños portatiles en los frentes de trabajo	K0+000 - K6+260
Se constató el cumplimiento de la realización de examenes de ingreso al personal nuevo.	K0+000 - K6+261
Se verificó la instalación de los puntos ecologicos y puntos de disposición de residuos	K0+000 - K6+260
Se constató el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental	K0+000 - K6+260

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Toma de muestras de concreto para la verificación en laboratorio de la resistencia a la compresión.	26	1	2026	Se encuentran pendientes los resultados
Toma de densidades de la capa de afirmado	26	1	2026	Se encuentran pendientes los resultados
Toma de densidades de la capa de subbase granular	30	1	2026	Se encuentran pendientes los resultados

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Toma de muestras de concreto para la verificación en laboratorio de la resistencia a la compresión.	26	1	2026	Se encuentran pendientes los resultados
Toma de densidades de la capa de afirmado	26	1	2026	Se encuentran pendientes los resultados
Toma de densidades de la capa de subbase granular	30	1	2026	Se encuentran pendientes los resultados

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES			
DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
AFIRMADO	Villamil Mining S.A.S - Vda Chipacata - Km 1 Municipio de Cucaita	40.4	Se realiza entrega de resultados de ensayos de caracterización del afirmado, se realiza cambio de fuente de material por solicitud del contratista de obra, la cual fue evaluada y aprobada por esta interventoría.
SUBBASE GRANULAR	Villamil Mining S.A.S - Vda Chipacata - Km 1 Municipio de Cucaita	40.4	Se realiza entrega de resultados de ensayos de caracterización de la subbase granular, se realiza cambio de fuente de material por solicitud del contratista de obra, la cual fue evaluada y aprobada por esta interventoría.
BASE GRANULAR	Cantera la Libertad - sector desaguadero - Municipio de Samaca	36.43	Se realiza entrega de resultados de ensayos de caracterización de la base granular, se realiza cambio de fuente de material por solicitud del contratista de obra, la cual fue evaluada y aprobada por esta interventoría.
ASFALTO	Pavitec RL - Tunja	60.3	Se realiza entrega de resultados de ensayo marshall de la mezcla asfaltica MDC-19 , se realiza cambio de fuente de material por solicitud del contratista de obra, la cual fue evaluada y aprobada por esta interventoría.

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de comité de obra No. 5	16	1	2026	Se realiza comité tecnico entre la obra e Interventoria con el fin de verificar el avance de las actividades en obra.
Acta de comité de obra No. 6	23	1	2026	Se realiza comité tecnico entre la obra e Interventoria con el fin de verificar el avance de las actividades en obra.

Acta de comité de obra No. 7	30	1	2026	Se realiza comité tecnico entre la obra e Interventoria con el fin de verificar el avance de las actividades en obra.

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría de Obra No. 1	1	10	2025	31	10	2025	Fue revisado y aprobado por la interventoría y remitido para revisión y cargue por parte de la supervisión.
Informe de Interventoría de Obra No. 2	1	11	2025	30	11	2025	Fue revisado y aprobado por la interventoría y remitido para revisión y cargue por parte de la supervisión.
Informe de Interventoría de Obra (Acta Parcial 1)	1	12	2025	12	12	2025	Fue revisado y aprobado por la interventoría y remitido para revisión y cargue por parte de la supervisión.
Informe de Interventoría de Obra No. 3	1	12	2025	31	12	2025	Fue revisado y aprobado por la interventoría y remitido para revisión y cargue por parte de la supervisión.
Informe de Interventoría de Obra No. 4	1	1	2026	31	1	2026	Fue revisado y aprobado por la interventoría y remitido para revisión y cargue por parte de la supervisión.

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	

OBSERVACIONES:

ACTAS DE COMITÉ SEMANALES: Se realizan comites tecnicos de obra semanales con el fin de verificar el avance de actividades, el cumplimiento de compromisos y la resolución de inconvenientes en Obra.

AVANCE DE OBRA: Para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, el avance programado acumulado corresponde al 6.99% vs el 39.43% que corresponde al porcentaje ejecutado acumulado en obra.

Para el periodo entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, el plazo transcurrido es del 35.42% correspondiente a 4 meses de ejecución, tomando como relación el plazo transcurrido / plazo total del contrato.

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA: Para el periodo del 01 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, las pólizas vigentes corresponden a las del acta de inicio.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA:

Se presenta un avance financiero del 31.18% correspondiente a lo cobrado en el acta parcial No. 1 de Obra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Para el presente periodo no se presentan actas de recibo parcial de Interventoría.

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

Para el presente periodo se realizó la verificación de las afiliaciones a EPS, AFP , CCF y ARL del personal de obra que ingresó a desempeñar trabajos en el marco del contrato de obra, así mismo se entregará la planilla de seguridad social del mes de diciembre en el siguiente informe mensual, teniendo en cuenta que el pago se realiza mes vencido.

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO

Para el periodo del 01 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, el personal mínimo exigido al contratista de obra CUMPLE y no se presenta novedades o solicitudes de cambio.

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORIA:

Para el periodo del 01 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026 se presentaron los siguientes informes semanales de Interventoría:

Informe semanal 14 - (29 diciembre - 04 de enero 2026)

Informe semanal 15 - (05 enero - 11 de enero 2026)

Informe semanal 16 - (12 enero - 18 de enero 2026)

Informe semanal 17 - (19 enero - 25 de enero 2026)

Informe semanal 18 - (26 enero - 01 de febrero 2026)

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACION	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	94-126
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	390-421
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	YA SE RADICO	
Amortización del anticipo	YA SE RADICO	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	YA SE RADICO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	61
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	YA SE RADICO	
Memorias y planos de diseño aprobados	YA SE RADICO	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	387-389
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	60
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	129-142 y 276-286
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	YA SE RADICO	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	SI	68-128 y 143-169
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	170-233
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	YA SE RADICO	
Generales		
Registro fotográfico	SI	48-55
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	373-386

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: 

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE:	Nicolas Figueroa Correa

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

INFORME DE OBRA No. 4

CONTRATO DE OBRA No. IPO 003-2025



OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA: CONSORCIO LA CANDELARIA

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 – 3105836391
e-mail: consorciovialacandelaria@gmail.com

PERIODO DEL INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

Introducion 4
1. Descripción General Del Proyecto 5
2. Localización General Del Proyecto 6
3. Información De Contrato De Obra 7
3.1. Información De Los Participantes Del Proyecto 8
3.2. Estado Del Contrato 8
3.3. Garantías 9
4. Seguimiento A La Ejecución Del Contrato 10
4.1. Actas Generadas En Período ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.2. Actividades Desarrolladas En La Obra 10
4.3. Equipos Empleados 12
4.4. Seguimiento Financiero 13
4.5. Personal Mínimo Exigido 14
4.6. Ensayos Y Análisis De Laboratorio 14
4.7. Actividades Desarrolladas Para El Control, Manejo Ambiental Y Seguridad Industrial 14
4.8. Registro Fotográfico 15
4.9. Análisis Aplicación Procesos Constructivos 19
Conclusiones 20

LISTAS DE TABLAS

Tabla 2. Información de los participantes del proyecto..... 8
Tabla 3. Relación de pólizas que amparan el contrato de obra – actualizadas con el acta de inicio 9
Tabla 4 Personal Administrativo de Obra..... 14

INTRODUCION

El presente documento constituye al Informe ejecutivo de Ejecución de Obra correspondiente al proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".


Este informe abarca el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2026, y tiene como propósito fundamental ofrecer una visión clara, concisa y objetiva del progreso físico alcanzado durante este mes para dar cumplimiento al contrato contractual.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como objeto el mejoramiento de la vía que comunica el casco urbano y el centro poblado la Candelaria en el municipio de Ráquira y el casco urbano del municipio, el cual incrementara la calidad de vida de sus habitantes y el turismo, evitando en tiempo seco la emisión de partículas de polvo y en tiempo de lluvia el encharcamiento y baches por el paso vehicular, esta vía que es de gran importancia para el desarrollo del Municipio de Ráquira, dada la conectividad con uno de sus principales puntos turísticos como lo es el monasterio del desierto de la candelaria.

Además, se busca fortalecer el eje turístico y socioeconómico de la provincia de Ricaurte, dando un aumento en la comodidad y seguridad vial para los miles de turistas (nacionales e internacionales) que visitan la zona, reduciendo los tiempos de desplazamientos y dando un impulso en la generación de empleo directo e indirecto en sectores claves como (transporte, hotelería y comercio). En esencia, la intervención vial es una **inversión clave** para capitalizar el patrimonio cultural de Ráquira y asegurar su desarrollo sostenible

2. Localización General Del Proyecto

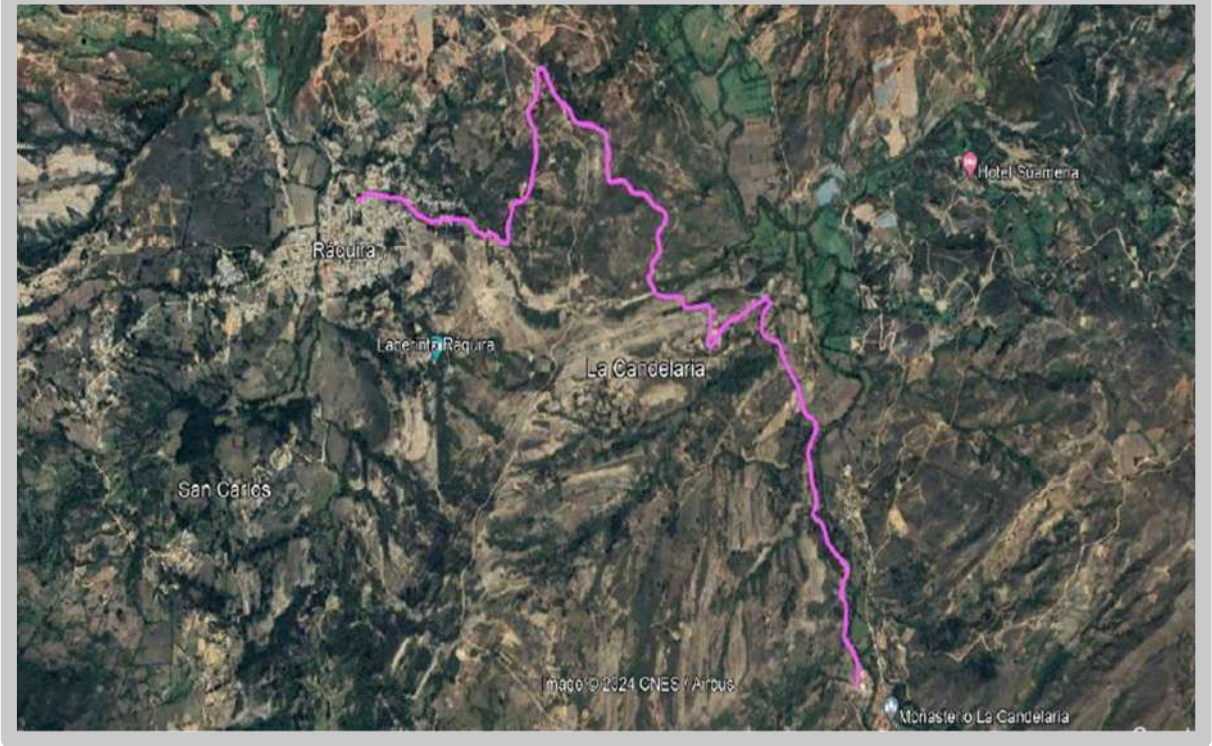

El corredor vial se encuentra localizado en jurisdicción del municipio de Ráquira, del departamento de Boyacá específicamente la vía que conduce del casco urbano del municipio de Ráquira al centro poblado la Candelaria, pasando por las veredas resguardo oriente y la candelaria, el proyecto presenta el propósito de mejorar el tramo vial que inicia desde el casco urbano hacia el sector en la vereda La Candelaria Occidente, desde el Km 0+000 hasta el Km 6+260.

3. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Información contrato de Obra

NÚMERO DEL CONTRATO	IPO-003- 2025
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ
ORIGEN DE LOS RECURSOS	REGALIAS
VALOR INICIAL	VEINTE MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE ($ 20.406.995.280,12)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	1 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
TIEMPO ADICIONAL 1	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

3.1. Información de los participantes del proyecto

Tabla 2. Información de los participantes del proyecto

Contratista:	**Entidad Contratante y SUPERVISION**	**Interventoría:**
CONSORCIO LA CANDELARIA NIT. 901.976.668-6 R/L ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ DIRECCIÓN: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja	TIERRASUA S.A.S R/L JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL DIRECCIÓN: Calle 19 # 9 – 35 Piso 10 Tunja	CONSORCIO INTERCANDELARIA NIT. 901.980.215-9 R/L NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA

Fuente: Consorcio La Candelaria.

3.2. Estado del contrato

Actualmente el proyecto tiene un avance ejecutado de 39.43%, el programado de un 6.99% y un % de tiempo transcurrido de 35.42%, estando dentro de la programación del proyecto.

3.3. Garantías

Para cumplir con las garantías requeridas por TIERRASUA S.A.S, el contrato de obra se amparó con pólizas adquiridas a la aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A según la siguiente descripción de vigencias y valores amparados

Tabla 3. Relación de pólizas que amparan el contrato de obra – actualizadas con el acta de inicio

Compañía	Póliza o certificación modificada No.	Riesgo	Vr / asegurado	VIGENCIA		Fecha aprobación
				Desde	Hasta	
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S. A	No. 95294	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	$ 2.040.699.528,01	1/10/2025	1/04/2027	21/10/2025
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S. A	No. 95294	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 6.122.098.584,04	1/10/2025	1/02/2027	21/10/2025
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S. A	No. 95294	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 2.040.699.528,01	1/10/2025	1/10/2029	21/10/2025
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S. A	No. 95294	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 4.081.399.056,02	1/10/2026	1/10/2031	21/10/2025
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S. A	No. 27386	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 1.020.349.764,01	1/10/2025	1/10/2026	21/10/2025

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, no se generan contratiempos en el seguimiento del cronograma establecido y sin contratiempos en el estado del tiempo, presentando condiciones climáticas con pocas precipitaciones de lluvia durante este periodo.

4.1. Actividades desarrolladas en la obra

Las actividades desarrollas en obra durante el periodo del 1 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, se relacionan a continuación:

A. EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ITEM 1.02

- Se da inicio a la conformación de la vía, según diseños geométricos y estructura de pavimentos, por lo cual, se comienzan los cortes de subrasante según cotas, para la construcción de la estructura, cortes y perfilados de taludes según diseño. (K5+300 – K6+260)

B. DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM). ITEM 1.03

- Se continua con la demolición de pavimento asfaltico existente correspondiente a una capa inferior de 3 cm, el cual se carga y se traslada al botadero conformado anterior mente para su disposición final con una distancia menor a 5 km. Esta actividad se encuentra entre las siguientes abscisas K4+400- K6+060.

C. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**) ITEM 1.04

- Se realiza el suministro de material de afirmado, para realizar su correspondiente extendida y compactación para nivelar la subrasante del terreno, y dar inicio a la conformación de la estructura del pavimento, actividad realizada del K4+070 - K5+800

D. TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. ITEM 1.06

- Se realiza el transporte del material requerido y empleado desde la cantera hasta el sitio de obra, para la nivelación y mejoramiento de la subrasante entre las siguientes abscisas K4+070 - K5+800

E. ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE. ITEM 2.01

- Se realiza esta actividad con el fin de disgregar las superficies existentes para mezclar, conformar y compactar por medio de Vibro compactador para conformar la estructura del terreno. En este caso se desarrolló esta actividad entre las abscisas K4+400 – K6+260

F. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) ITEM 2.02

- Se da inicio al suministro de material de subbase, para su correspondiente instalación, de manera que se realiza la extendida con motoniveladora, humectación con carrotanque y se compacta con vibro compactador, hasta alcanzar una compactación óptima desde el K4+000 – K4+500

G. TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. ITEM 2.06

- Se realiza el transporte del material requerido y empleado desde la cantera hasta el sitio de obra, para la conformación de la estructura de pavimento (subbase).

H. DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). (CUNETAS EXISTENTES). ÍTEM 3.01

- Se realiza esta actividad para la demolición de cunetas entre las siguientes abscisas K3+400 – K6+260

I. CORTE DE PAVIMENTO. Ítem 3.11

- Se realiza El corte de pavimento conforme al diseño de la vía para la conformación de la construcción de la cuneta al costado derecho de la vía, esta actividad se realiza entre las abscisas K0+980 – K2+995

J. CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS). ITEM 3.12

- La realización de esta actividad se lleva con el fin de controlar el manejo del flujo de agua para evitar daños en la estructura de la vía, con este fin se utiliza concreto de 21MPA desde las abscisas del K0+980 – K1+700

K. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA.ITEM 3.13

- Para la construcción de la cuneta y dar una adecuada resistencia se suministra e instalan mallas electrosoldadas de 6mm conforme al diseño para la conformación de estas, estas se disponen en las abscisas K0+980 – K1+700.

4.2. Equipos empleados

Durante el presente período se emplearon los equipos que se relacionan a continuación:

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

- Motoniveladora
- Vibro compactador
- Minicargador
- Carrotanque
- Volquetas

OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN

- Excavadora
- Vibro compactador
- Minicargador
- Retroexcavadora
- Volquetas
- Equipo menor
- Apisonador tipo canguro
- Vibrador para concreto

4.3. Seguimiento financiero

ESTADO FINANCIERO	
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$20.406.995.280,12
VALOR ANTICIPO (30% DEL VALOR)	$6.122.098.584,04

- ANTICIPO:

Para el desembolso del anticipo, se realizó apertura del negocio fiduciario con Bancolombia, del cual se generó el contrato No. 18083 con su respectiva certificación bancaria del P.A del anticipo para el giro de los recursos.

- Plan de inversión del anticipo (reprogramación No.1)

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
VALOR ANTICIPO		**6,122,098,584.04**	**100%**
1	PAGO DE NOMINAS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	220,395,549.03	3.60%
2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL	1,591,745,631.85	26.00%
3	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS	575,477,266.90	9.40%
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	3,734,480,136.26	61.00%
TOTAL		**6,122,098,584.04**	**100.00%**

- Resumen pagos realizados:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR APROBADO	VALOR PAGADO	SALDO
1	PAGO DE NOMINAS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	220.395.549,03	220.394.700,00	849,03
2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL	1.591.745.631,85	1.591.745.550,00	81,85
3	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS	575.477.266,90	575.471.616,00	5.650.90
4	SUB CONTRATOS DE OBRA CIVIL	3.734.480.136,26	3.734.472.553,00	7.583,26
TOTAL		**6.122.098.584,04**	**6.122.084.419,00**	**14.165,04**

NOTA: el contrato fiduciario se encuentra en proceso de liquidación, una vez sea enviado por parte de la fiducia el respectivo soporte, se anexará como archivo adjunto al informe.

4.4. Personal mínimo exigido

Tabla 4 Personal Administrativo de Obra

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	Gerente de Proyectos	20%
LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	Director de Obra	30%
HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ	Residente de Obra	100%
DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ	Especialista HSEQ	30%
JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ	Especialista en pavimentos	30%
ELIZABETH MAHECHA VALERO	Especialista ambiental	30%

Fuente: Consorcio la candelaria

4.5. Ensayos y análisis de laboratorio

- Se realizan ensayos de densidades y toma de muestras de cilindros de concreto para cunetas con resistencia de 3000 psi.
- Se informa que se anexaran los resultados de estos en el siguiente informe correspondiente al No 5.

4.6. Actividades desarrolladas para el control, manejo ambiental y seguridad industrial

Se realiza las siguientes actividades preventivas, de mitigación y monitoreo planificado para proteger el medio ambiente y garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.

A. Clasificación y almacenamiento: separación de residuos (peligrosos, orgánicos, reciclables, de construcción y demolición) en puntos ecológicos y almacenamiento temporal adecuado.

se concentra estas actividades entre las abscisas K0+980 – K6+260

B. Ubicación de controladores Viales para el control de transito
C. Señalización y Orden de Obra
D. Seguridad Industrial

- Identificación de Peligros: se realiza la evaluación de riesgos para identificar los peligros asociados a cada actividad de la ejecución de la obra
- Dotación y usos obligatorios de los elementos EPPS

4.7. Registro Fotográfico

EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ITEM 1.02	
	

Ilustración 1 excavación de cortes y canales sin clasificar

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM). ITEM 1.03	
	

Ilustración 2 demolición pavimento asfaltico

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**) ITEM 1.04	
	

Ilustración 3 suministro, extendida y compactación de material para afirmado

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. ITEM 1.06	
	

Ilustración 4 transporte de material de afirmado y/o granular suelto

ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE ITEM 2.01	
	

Ilustración 5 escarificación, mezclado, conformación y compactación de subbase

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) ITEM 2.02	
	

Ilustración 6 suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM ITEM 2.06	
	

Ilustración 7 transporte de material de afirmado y/o granular suelto

DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). (CUNETAS EXISTENTES) ITEM 3.01	
	

Ilustración 8 demolición obras en concreto simple, esta actividad se lleva a cabo para demolición de cunetas existentes

CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ITEM 3.11	
	

Ilustración 9 corte de pavimento asfáltico

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS). ITEM 3.12	
	

Ilustración 10 cunetas revestidas en concreto de 21 mpa.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA ITEM 3.13	
	

Ilustración 11 suministro e instalación de malla electrosoldada

4.8. Análisis aplicación procesos constructivos


Las actividades desarrolladas en el periodo de tiempo comprendido del 1 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, fueron desarrolladas con una ejecución meticulosa de los procesos constructivos definidos en los planos y especificaciones técnicas de la obra.

Las actividades clave incluyeron:

- Revisión y Planificación Detallada: Se realizó un análisis exhaustivo de los procedimientos constructivos para las etapas actuales (p. ej., corte de pavimento, instalación, suministro de malla y construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPA, suministro y compactación de subbase y afirmado), asegurando su alineación con la normativa vigente y los objetivos del contrato.
- Implementación de Metodologías Optimizadas: El personal técnico y de obra, altamente calificado y con probada experiencia en infraestructura vial, aplicó metodologías de construcción eficientes, enfocadas en optimizar el uso de recursos y minimizar tiempos de ejecución.
- Gestión de Maquinaria y Equipos: Se empleó la maquinaria necesaria y en óptimas condiciones operativas (p. ej., carrotanque, motoniveladora, vibro compactador de 6 toneladas, hormigonera con capacidad de 3 m3, volquetas y orugas), garantizando la disponibilidad y rendimiento adecuados para el avance del proyecto sin contratiempos.
- Aseguramiento del Cumplimiento: Todas las acciones ejecutadas estuvieron orientadas a garantizar la correcta materialización del diseño y el estricto cumplimiento del objeto contractual, manteniendo los estándares de seguridad industrial y manejo ambiental definidos para la obra.

CONCLUSIONES

- A la fecha de corte del presente informe No. 4 se presenta un avance ejecutado en obra del 39.43%.
- Se han suscrito todos los actos administrativos requeridos, según el desarrollo del contrato
- Por parte del Consorcio la Candelaria, se han actualizado las garantías del contrato, según lo requerido.
- Se iniciaron y se ejecutan las obras de cunetas para la protección de la estructura de la vía según lo programado.
- Las obras se han ejecutado siguiendo los parámetros de calidad establecidos en las condiciones del contrato de obra y bajo los diseños suministrados por la entidad.
- Se realiza seguimiento y capacitación para el desarrollo seguro de las actividades en obra de manera diaria antes de iniciar las labores.
- Durante este periodo no se generaron impactos ambientales severos sobre el medio ambiente, es así que el Consorcio la Candelaria, ha dado cumplimiento al PMA, mitigando los efectos negativos con medidas preventivas y de mitigación



Héctor Julio Pedraza Sánchez
Residente de obra

ANEXO 1. INFORME SST MES 4 - OBRA

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARÍA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"



CONTRATISTA

CONSORCIO LA CANDELARIA

NIT. 901.976.668-6

R/L ADRIANA MARCELA PEDRAZA G

ENERO DE 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1 GENERAL 6
2.2 ESPECIFICOS 6
3. POLÍTICAS 7
3.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 7
3.2 Política de Alcohol, Tabaco y Drogas 8
4.0 REGLAMENTO 8
4.1 Reglamento de Higiene y Seguridad 8
5.0 LOCALIZACIÒN 9
6.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 9
6.1 Actividades técnicas y de seguridad y Salud en el trabajo durante el mes. 10
7.0 LISTADO GENERAL DE PERSONAL A LA FECHA 10
7.1 Temas de Inducción 12
7.3 Evidencias de Inducción 13
8.0 SEGURIDAD SOCIAL 13
8.1 Afiliaciones al sistema general de Seguridad Social (EPS, ARL AFP, CAJA DE COMPENSACIÓN) trabajadores Nuevos. 13
8.2 Novedades de retiro de personal que finaliza contrato laboral 13
9.0 ENTREGA DE DOTACIONES DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 14
9.1 Matriz de Elementos de Protección personal por cargo 14
9.2 Formato evidencias de entrega de dotación de trabajo del mes 14
9.3 Evidencia fotográfica entrega o uso de dotaciones en obra. 15
10. SUB-PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16
10.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 16
10.1.1 Exámenes médicos Ocupacionales de Ingreso 16
10.1.2 Exámenes médicos Ocupacionales de Egreso 17
11 HIGIENE INDUSTRIAL 17
11.1.1 Control de material particulado y Ruido 18

12. SEGURIDAD INDUSTRIAL 18
12.1 Pre operacionales maquinaria y Equipos 18
12.2 PMT, Señalización, demarcación y aislamiento de áreas 18
12.3 Total de Inspecciones en el mes 20
12.4 Factor de riesgo locativo - Orden y Aseo ..... **¡Error! Marcador no definido.**
12.5 Charlas de Seguridad 20
13. PLAN DE EMERGENCIAS 22
13.1 Teléfonos de Emergencia 23
13.2 Actividades en Materia de Implementación el plan de emergencias 24
14. ACTAS DE COMITÉ COPASST –COCOLA 24
14.1 Manejo de residuos sólidos Comunes 24
15. INDICADORES 24
15.1 Exámenes de Ingreso o Egreso 24
15.2 Inducciones 25
15.3 Accidentalidad 25
16. ANEXOS 26
ANEXO 1. Pago de planillas de seguridad social del mes. 26
ANEXO 1.1 Planillas de Seguridad social 26
ANEXO 2. Formatos evidencias de Entrega de Dotación, consumibles. 26
ANEXO 3. Pre-operacionales Maquinaria y equipos 26
ANEXO 4. Charlas de Seguridad 26
ANEXO 5. Acta de conformación de COPASST - COCOLA 26
ANEXO 6. Formato Índice de accidentalidad y Ausentismo 26

Índice de Tablas

Tabla 1. Características del Proyecto 9
Tabla 3. Temas de Inducción 13
Tabla 4. Personal Ingresado en el Mes 13
Tabla 5. Inspecciones en el Mes 20
Tabla 6. Indicadores de Accidentalidad 25

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Política de SG-SST 7
Ilustración 2. Política de Alcohol, Tabaco y drogas 8
Ilustración 3. Localización del Proyecto 9
Ilustración 4. Entrega de Dotaciones y Epp 16
Ilustración 6. PMT, Demarcación y Señalización 20
Ilustración 7. Charlas de Seguridad 22
Ilustración 8. Números de Emergencia 23
Ilustración 9. Manejo de Residuos Solidos 24

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de seguridad y salud en el trabajo es una herramienta fundamental en toda obra o labor que se desarrolle y entrañe peligros como son en este caso el sector de la construcción de obra civil y vías, siendo este un sector sensible en materia de seguridad por los altos índices de accidentalidad laboral en el país dado la diversidad de factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores y la probabilidad elevada de materialización de los peligros, es por esto que se hace necesario una adecuada gestión en obra con el fin de prevenir y minimizar los accidentes laborales por medio de una serie de acciones conjuntas entre trabajadores empresa y el profesional en SST; aunado a estas acciones se desarrollan en obra labores en caminadas a prevenir, mitigar y compensar posibles impactos ambientales generados en obra por el uso, remoción y transporte de materiales y de más actividades propias de la actividad mencionada donde se tienen en cuenta también las actividades antrópicas que pueden contribuir a los impactos negativos y se plantea una potencializarían de impactos positivos.

2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Desarrollar actividades en materia de prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente en la obra **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARÍA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**.

2.2 ESPECIFICOS

- Identificar e implementar controles a los posibles riesgos que se presenten en obra.

- Desarrollar actividades en materia de prevención, capacitación y concientización de los riesgos a los trabajadores.

- Estabelcer labores en materia del plan de emergencias, señalización y de más labores encaminadas a atender cualquier eventualidad en obra.

- Supervisión en uso de EPP, inspecciones generales de obra, maquinaria y equipos.

- Desarrollar Capacitaciones y exámenes médicos de ingreso y retiro de trabajadores.

3. POLÍTICAS

3.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo




El consorcio LA CANDELARIA es una organización creada para la ejecución de obra civil, comprometida con la prevención y protección de accidentes y enfermedades laborales, por medio de la implementación de planes, programas, y procedimientos; dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ligada con la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; destinando los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios, y suficientes para mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores y contratistas.

Todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones inseguras que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y la organización.

Adriana Marcela Pedraza
Representante Legal
Fecha:04/10/2025, versión 00

Ilustración 1. Política de SG-SST

3.2 Política de Alcohol, Tabaco y Drogas

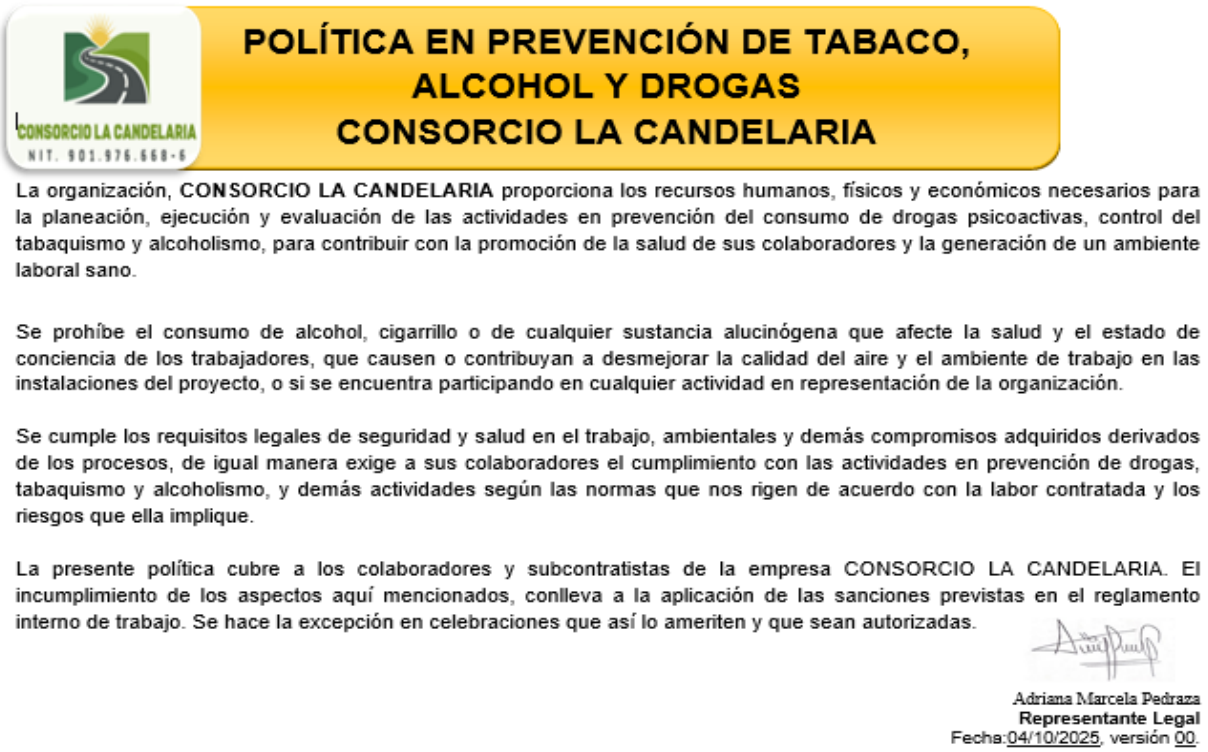

POLÍTICA EN PREVENCIÓN DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS CONSORCIO LA CANDELARIA

La organización, **CONSORCIO LA CANDELARIA** proporciona los recursos humanos, físicos y económicos necesarios para la planeación, ejecución y evaluación de las actividades en prevención del consumo de drogas psicoactivas, control del tabaquismo y alcoholismo, para contribuir con la promoción de la salud de sus colaboradores y la generación de un ambiente laboral sano.

Se prohíbe el consumo de alcohol, cigarrillo o de cualquier sustancia alucinógena que afecte la salud y el estado de conciencia de los trabajadores, que causen o contribuyan a desmejorar la calidad del aire y el ambiente de trabajo en las instalaciones del proyecto, o si se encuentra participando en cualquier actividad en representación de la organización.

Se cumple los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y demás compromisos adquiridos derivados de los procesos, de igual manera exige a sus colaboradores el cumplimiento con las actividades en prevención de drogas, tabaquismo y alcoholismo, y demás actividades según las normas que nos rigen de acuerdo con la labor contratada y los riesgos que ella implique.

La presente política cubre a los colaboradores y subcontratistas de la empresa CONSORCIO LA CANDELARIA. El incumplimiento de los aspectos aquí mencionados, conlleva a la aplicación de las sanciones previstas en el reglamento interno de trabajo. Se hace la excepción en celebraciones que así lo ameriten y que sean autorizadas.

Adriana Marcela Pedraza
Representante Legal
Fecha:04/10/2025, versión 00.


Ilustración 2. Política de Alcohol, Tabaco y drogas

4.0 REGLAMENTO

4.1 Reglamento de Higiene y Seguridad

El Consorcio LA CANDELARIA encargado de la ejecución de las actividades dentro del contrato, mantiene un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, publicado y socializado de acuerdo a lo dispuesto en el Código sustantivo del trabajo en su TITULO XI, CAPITULO I, artículos 348, 349, 350, 351, 352; De igual forma a medida que ingresa un trabajador nuevo este se socializa como uno de los temas de inducción.

5.0 LOCALIZACIÒN

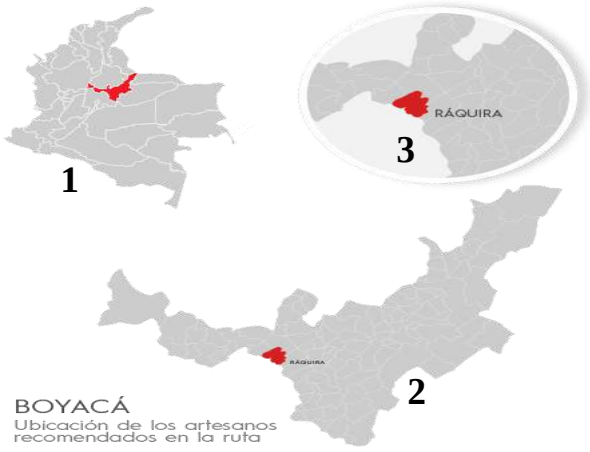

1.Colombia – 2. Boyacá – 3. Raquira
Fuente. *Google*

Ilustración 3. Localización del Proyecto

La obra se ejecuta en la zona rural del municipio de Raquira en el departamento de Boyacá, vía casco urbano – centro poblado la candelaria.

6.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

INFORMACION BASICA	
CONTRATANTE	**TIERRASUA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA CANDELARIA** NIT 901.976-668-6
REPRESENTANTE LEGAL	**ADRIANA MARCELA PEDRAZA** C.C. 1.049.646.125
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**OBRA PÚBLICA**
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARÍA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
VALOR INICIAL:	($ 20.406.995.280.12) M/CTE,
FECHA DE INICIO:	UNO (01) DE OCTUBRE DE 2025.
PLAZO:	DOCE (12) MESES.
FECHA PRESENTE INFORME:	**DEL (01) AL (31) ENERO DE 2026**

Tabla 1. Características del Proyecto

6.1 Actividades técnicas y de seguridad y Salud en el trabajo durante el mes.

Técnicas: Comprende la labor de:

- Construcción alcantarillas
- Instalación de base, sub-base, afirmado
- Aplicación de riego de liga
- Suministro e Instalación de carpeta asfáltica
- Obras de drenaje, excavación de cortes y canales

Sst: Comprenden:

- Charlas de seguridad e inducciones
- Pago de planillas de seguridad social
- Pre operacionales de maquinaria y equipos
- Entrega de dotación y cambio de Consumibles.
- Demarcación y señalización de áreas PMT.
- Hidratación de personal.
- Inspecciones pre-operacionales equipos, maquinaria.
- reuniones de comités de convivencia laboral y comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Inspecciones y acompañamiento en materia de SST.

7.0 LISTADO GENERAL DE PERSONAL A LA FECHA

A la fecha continúan trabajando para el consorcio los siguientes trabajadores en la lista.

PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO			
AREA	**CARGO**	**CC**	**NOMBRE**
PROFESIONALES	**DIRECTOR DE OBRA**	6765918	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA
	GERENTE DE PROYECTOS	6765918	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA
	RESIDENTE DE OBRA	6759479	HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ
	ESPECIALSITA EN PAVIMENTOS	6775637	JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ
	ESP INGENIERIA AMBIENTAL	52797064	ELIZABETH MAHECHA VALERO
	ESPECIALISTA SST	1057582849	DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ

	PROFESIONAL AMBIENTAL	1193447840	JUAN CAMILO PEDRAZA GOMEZ
	INSPECTOR DE OBRA	4.375.181	JUAN GUILLERMO CIFUENTES SANCHEZ
	INSPECTOR DE OBRA 2	6.755.678	GERMAN ANTONIO PEDRAZA SANCHEZ
	RESIDENTE DE OBRA 2	1.049.628.290	DANIEL AUGUSTO PEDRAZA PEREZ
	AUXILIAR SST	1049649865	MARIA FERNANDA ARIAS AMEZQUITA
	OPERADOR MOTONIVELADORA	74.810.538	RUBEN DARIO CARO PULIDO
	OPERADOR VIBRO	1.116.992.019	CARLOS ARTURO PULIDO
	OPERADOR MINICARGADOR	1.055.227.559	FABIO ORLANDO TENJO BAUTISTA
	CONTROLADORA VIAL	1.000.687.128	MARIA FERNANDA GALINDO VANEGAS
	CONTROLADOR VIAL	1.124.510	ISNARDO MAURICIO MURCIA NOVA
	CONTROLADOR VIAL	1.013.577.862	MARLEN FLORES RONCANCIO
	MAESTRO	1.057.015.398	JULIAN ANDRES TRIANA MARIN
	AYUDANTE	4.114.321	MARCO AURELIO SUAREZ
	AYUDANTE	1.057.893.372	YEISON MANUEL SALINAS SIERRA
	AYUDANTE	1.057.892.958	HERLEY LISANDRO SALINAS SIERRA
	AYUDANTE	6.014.634	FERDINANDO CARDENAS SALINAS
	AYUDANTE	1.049.412.918	FABIO YOHANY BUITRAGO RICO
	CELADOR	1.124.186	JOSE ANTONIO REINA RODRIGUEZ
OPERATIVO	**RECEPCIONISTA DE MATERIAL**	6776554	JUAN MAURICIO MARTINEZ REYES
	CONTROLADOR VIAL	1057892794	DILSA FERNANDA DORADO SIERRA
	CONTROLADOR VIAL	23973910	LUZ DARY RAMIREZ BUITRAGO
	AYUDANTE	9540570	ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

	AYUDANTE	1002735699	JACKSON SNEIDER SANDOVAL RIOS
	AYUDANTE	7278624	LUIS ALFONSO TRIANA FAJARDO
	CONDUCTOR	1121880221	JAVIER RICO
	OPERADOR ORUGA	86.014.572	JHON FREDY HERNANDEZ

7.1 Temas de Inducción

Dentro de las labores preventivas en materia de seguridad y salud en el trabajo se realiza una inducción general e inducción al cargo donde se socializan los siguientes temas continuamente a personal nuevo.

TEMAS INDUCCIÓN EN SST	
1.	Qué es la seguridad y Salud en el trabajo
2.	Estadística de accidentalidad en obras constructivas civiles y viales
3.	Políticas de seguridad y salud en el trabajo, alcohol tabaco y drogas
4.	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
5.	Reglamento Interno de trabajo de empresa asociada
6.	Socialización Plan de Emergencias
7.	Ubicación camilla, botiquín, extintor
8.	Rutas de evacuación
9.	Punto de encuentro, función
10.	Acciones frente a rotura de tubos de gas o agua.
11.	Procedimiento a seguir en caso de accidente
12.	Derechos del empleador
13.	Derechos del empleado
14.	Deberes tanto de empleados como de empleadores.
15.	Tipo de contrato, tiempo y beneficios
16.	Causas básicas para cancelación contrato de empleado
NORMAS BÁSICAS GENERALES	
17.	Uso obligatorio de dotación y Epp básicos
18.	Prohibido el ingreso bajo influencia del alcohol o drogas psicoactivas
19.	Uso de senderos peatonales
20.	Orden y Aseo en obra
21.	Responsabilidad frente a equipos y herramientas asignados
22.	Respeto y buena convivencia entre compañeros
23.	Prohibido las bromas o juegos dentro de la obra.
24.	Uso adecuado de punto ecológico
25.	Prohibido ingreso a obra bajo el efecto de alcohol o sustancias alucinógenas

Tabla 2. Temas de Inducción

7.3 Evidencias de Inducción

Anexo 1. *Inducción general*

8.0 SEGURIDAD SOCIAL

El CONSORCIO LA CANDELARIA dando cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud en el trabajo realiza continuamente afiliación de los trabajadores al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, AFP, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR); con anterioridad al ingreso de las labores en obra y según lo establecido en la ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y se realizan los pagos en las fechas establecidas por el Decreto 1670 de 2007.

8.1 Afiliaciones al sistema general de Seguridad Social (EPS, ARL AFP, CAJA DE COMPENSACIÓN) trabajadores Nuevos.

PERSONAL VINCULADO EN EL MES			
AREA	**CARGO**	**CC**	**NOMBRE**
OPERATIVA	AYUDANTE	12329117	LIVINGSTON LOZANO SIERRA
	AYUDANTE	810272	EDWARD REINALDO CORDERO LOPEZ
	AYUDANTE	6078212	GREGORIO RAFAEL PÉREZ LÓPEZ
	AYUDANTE	5236240	DAVID JIMÉNEZ MONROY
	AYUDANTE	1002624254	YEISON ANTONIO LÓPEZ CARO
	AYUDANTE	6059771	CARLOS JOSE CAMPOS AMUNDRAY
	AYUDANTE	6653912	GUSJEDI FEDERICO SALAZAR BENTANCURT
	AYUDANTE	15202932	NOEL ALEXANDER MOYA BRITO
	AYUDANTE	1236441299	MOISES DÍAZ LLERENA
	OPERADOR CARMIX	9143456 4	JUAN BAUTISTA BARRERA

Tabla 3. Personal Ingresado en el Mes

Anexo 2. *Sistema general de seguridad social, afiliaciones y pago de planillas del mes*

8.2 Novedades de retiro de personal que finaliza contrato laboral

Durante el periodo se retiró el siguiente personal quienes son operarios subcontratados de otra empresa.

PERSONAL VINCULADO EN EL MES			
AREA	**CARGO**	**CC**	**NOMBRE**
	OPERADOR VIBRO	1002395198	JHON FABER SUÁREZ SAMACA
	OPERADOR MOTONIVELADORA	4081635	SUAREZ SARMIENTO JOSE HECTOR

9.0 ENTREGA DE DOTACIONES DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

9.1 Matriz de Elementos de Protección personal por cargo

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT. 901.976.668-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SIG-032
	OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Versión: 00
	MATRIZ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: 05/10/2025

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	PROTECCIÓN DE MANOS								PROTECCIÓN FACIAL			PROTECCIÓN AUDITIVA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA			PROTECCIÓN DE PIES								PROTECCIÓN DE CUERPO						PROTECCIÓN DE CABEZA			
			Guantes Tipo Ingeniero	Guantes de Látex	Guates de Nitrilo	Guantes de hilo o algodón	Guantes de PVC	Guantes Carnaza Lar	Guantes de soldador	Guantes dieléctricos	Gafas de seguridad	Careta para esmerilar	Careta para soldar	Protector tipo Tapón	Protectores de Copa	Mascarilla	Tapabocas	Respirador con Cartucho	Equipo autocontenido	Botas de cuero con Punta de	Botas de cuero sin Puntera de	Botas Largas Tipo Soldador	Botas de Caucho	Botas Dieléctricas	Zapatos Antideslizantes	Botas Impermeables con	Botas Impermeables sin	Overol	Camisa -Pantalón	chemmax II PVC	Bata	Peto	Chaleco Reflectivo	Faja de Seguridad	Casco Tipo A	Casco Tipo B	Casco Tipo C	Gorro de Oruga
PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA-COMERCIAL																																					
1		SECRETARIA		x													x								x			x									
2		GERENTE/ R/L		x							x						x			x								x						x			
3		CONTADORA		x													x								x			x									
		VISITANTES									x						x			x								x						x			
PERSONAL AREA OPERATIVA																																					

Página 1

9.2 Formato evidencias de entrega de dotación de trabajo del mes

CONSORCIO LA CANDELARIA da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º de la Ley 11 de 1984, que reza; ‘’ *Todo patrono que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en la fecha de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador”.*

Anexo 3. *Formato Entrega, cambio y/o reposición de elementos de protección personal (Consumibles; como casco, guantes, gafas, otros).*

9.3 Evidencia fotográfica entrega o uso de dotaciones en obra.











Ilustración 4. Entrega de Dotaciones y Epp

10. SUB-PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Son todas las actividades médicas encaminadas a garantizar y controlar que la salud del trabajador sea la mejor y se encuentre apto para la labor que fue contratado.

El CONSORCIO LA CANDELARIA y sus políticas establecidas da cumplimiento a lo estipulado por la resolución 2346 de 2007 respecto a la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso; con el fin de conocer el estado físico y de salud de las personas a contratar; el médico ocupacional será quien valide o desapruebe la aptitud física para realizar las labores a desempeñar de igual forma será el encargado de establecer los exámenes a practicar según profesiograma establecido. Esta información será de manejo interno de la empresa y solo tendrá acceso a la historia clínica y resultados de los exámenes el profesional indicado.

10.1.1 Exámenes médicos Ocupacionales de Ingreso

En el mes se practicaron 10 exámenes de ingreso a personal que se vincula al consorcio para realizar diversas actividades operativas, esto con el fin de garantizar que los trabajadores se encuentren en condiciones físicas aptas para laborar.



Anexo 4*. Exámenes médicos de Ingreso*

10.1.2 Exámenes médicos Ocupacionales de Egreso

Durante el periodo no se realizaron exámenes médicos de Egreso.

11. HIGIENE INDUSTRIAL

Disciplina determinada a la identificación evaluación y control de los factores y agentes ambientales que son generados por el trabajo y producen accidentes o enfermedades laborales.

11.1 Control de material particulado y Ruido

Debido a que la obra está en su fase de inicio se genera considerablemente material particulado y ruido por el tránsito de volquetas, maquinaria y carros en general; para la actividad de retiro de material orgánico y transporte de bases granulares las volquetas se mantienen carpadas cuando llevan material de excavación, se mantiene carro tanque tipo flauta para aplicar agua y prevenir la generación de material particulado.

12. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Es el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y control de causas de los accidentes de trabajo, mantiene un ambiente laboral seguro, controlando las causas básicas que pueden generar daño a la integridad física del trabajador o a la empresa misma.

Es la encargada de inspeccionar, prevenir y controlar los riesgos que puedan ocasionar la maquinaria, instalaciones físicas, herramientas.

12.1 Pre operacionales maquinaria y Equipos

Las inspecciones pre-operacionales se realizan diariamente antes de iniciar labores de la maquinaria, equipos y parque automotor en general con el fin de identificar posibles daños, fugas, funcionamiento de mandos, luces y mecánica en general. Se realiza entre el profesional en seguridad y el operador o conductor de equipo o máquina.

Anexo 5. *Pre-operacionales maquinaria y equipos.*

12.2 PMT, Señalización, demarcación y aislamiento de áreas

Con el fin de prevenir accidentes dentro y fuera de la obra se realiza la instalación de señalización informativa, preventiva de acercamiento, de prohibición acorde con lo establecido en el plan de manejo de tráfico, se hace uso de controladoras de tráfico con radios de comunicación sobre las vías de influencia del proyecto con el fin de mantener el tránsito y acceso adecuado de los habitantes de la zona y prevenir posibles incidentes que involucren peatones, carros, motos o bicicletas. La señalización y aislamiento de áreas busca resaltar los riesgos, prevenir accidentes y aislar peligros. Alguna de esta señalización se está moviendo y colocando en sitios de trabajo que se estén interviniendo.

CONTROL DE TRAFICO











Ilustración 5. PMT, Demarcación y Señalización

12.3 Total de Inspecciones en el mes

Tipo	Frecuencia	Total
Inspección pre operacional Motoniveladora	Semanal - Mensual	1
Inspección pre operacional Mini cargador	Semanal - Mensual	1
Inspección pre operacional retro pajarita	Semanal - Mensual	1
Inspección pre operacional vibro compactador	Semanal - Mensual	1
Apisonador tipo canguro	Semanal - Mensual	1
Mezcladora	Semanal - Mensual	1
TOTAL		**6**

Tabla 4. Inspecciones en el Mes

12.4 Charlas de Seguridad

Dentro de las Actividades en materia de prevención de accidentes y enfermedades laborales EL CONSORCIO LA CANDELARIA viene desarrollando de manera continua charlas y capacitaciones de seguridad a todo el equipo de trabajo incluyendo operativo y administrativo de la obra, antes de iniciar labores diarias.

Fecha	Temas Tratados	No. Asistentes
07/01/2026	Uso de epp´s , generar conciencia sobre la importancia del uso correcto y cuando deben ser cambiados.	20
10/01/2026	Comunicación asertiva: concientizar como la comunicación asertiva nos ayuda a evitar un mal ambiente laboral, riñas o enfrentamientos con los compañeros, evitando así lesiones o accidentes	17
14/01/2026	identificar riesgos en el trabajo en el límite de la vía nos ayuda a prevenir incidentes o accidentes	20
17/01/2026	concientizar de como el uso de tapa oídos nos ayuda a evitar enfermedades de tipo auditivo, además se enseña el uso correcto de estos mismos	18
21/01/2026	Pausa activa: se habla de la importancia de las pausas activas y como el hacerlas nos ayuda a prevenir accidentes al realizar trabajos repetitivos haciendo que se genere un exceso de confianza	11
24/01/2026	concientizar a los trabajadores sobre la importancia del uso de tapabocas y el cuidado respiratorio para así prevenir enfermedades laborales.	18
30/01/2026	recordar a los trabajadores por que el uso del casco es importante y además como nos puede ayudar a prevenir accidentes graves o mortales	18







Ilustración 6. Charlas de Seguridad

Anexo 6. *Asistencia Charlas de Seguridad*

13. PLAN DE EMERGENCIAS

El plan de emergencias hace parte fundamental de las actividades en materia de prevención en seguridad y salud en el trabajo, permite evaluar los riesgos posibles a presentarse y brindar las herramientas que permitan responder de manera oportuna a cualquier situación no prevista y que necesite la intervención inmediata.

13.1 Teléfonos de Emergencia

<table>
<tr><td>CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6</td><td>RAQUIRA BOYACA</td></tr>
<tr><td></td><td>CONTACTOS DE EMERGENCIA</td></tr>
<tr><td>Teléfonos:
• 318404658
• 8 7426070
• 123
Dirección:
Avenida Colon Calle 21</td><td>• Teléfono: 3212153252
• Calle 1 # 5 - 10
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LA PARED DE RÁQUIRA Atención Cálida y Humana</td></tr>
<tr><td>ESTACIÓN DE POLICÍA
Teléfono:
3102746286
Línea nacional 123</td><td>
</td></tr>
<tr><td>EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. Pura Energía Boyacense
Atención al cliente 01 8000 999 115
Emergencias 115</td><td>vanti
Más formas de avanzar
Línea directa: 164</td></tr>
</table>

Ilustración 7. Números de Emergencia.

13.2 Actividades en Materia de Implementación el plan de emergencias

El plan de emergencias tiene contemplado la conformación de unas brigadas por medio de las cuales se mantienen con el fin de poder dar respuesta a situaciones repentinas que pongan en riesgo la vida de los trabajadores e instalaciones de la obra, dichas brigadas se encuentran en conformación.

14. ACTAS DE COMITÉ COPASST –COCOLA

Durante el mes se realizó la reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

Anexo 7*. Acta de reunión de copasst*

14.1 Manejo de residuos sólidos Comunes

La codificación de colores a utilizar es la establecida según la norma 2184 de 2019, la cual inicia en firme desde el primero de enero de 2021, establece el código de colores blanco, negro y verde para los contenedores de basura, canecas de reciclaje y bolsas que se utilicen en la separación de residuos en la fuente. Dichos puntos ecológicos se adecuan en obra y se usan según lo establecido y presentado en informe ambiental.



Ilustración 8. Manejo de Residuos Solidos

15. INDICADORES

Los indicadores permiten evaluar la eficiencia de las medidas programadas y ejecutadas en campo por medio de la cobertura y desempeño en temas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de las labores.

15.1 Exámenes de Ingreso o Egreso

$$\boldsymbol{Examenes\ medicos\ de\ Ingreso}: \frac{\#\ de\ Trabajadores\ con\ examen\ medico\ de\ Ingreso}{\#\ Total\ de\ trabajadores} * 100$$

$$\boldsymbol{Examenes\ medicos\ de\ Ingreso}: \frac{\mathbf{10}}{\mathbf{10}} * \mathbf{100} = \mathbf{100}\%$$

$$\boldsymbol{Examenes\ medicos\ de\ Egreso}: \frac{\#\ de\ Trabajadores\ con\ examen\ medico\ de\ Egreso}{\#\ Total\ de\ trabajadores\ Conterminacion\ laboral} * 100$$

$$\boldsymbol{Examenes\ medicos\ de\ Engreso}: \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} * \mathbf{100} = \mathbf{0}\%$$

A la fecha no se registraron trabajadores con terminación laboral

15.2 Inducciones

$$\boldsymbol{Inducciones}: \frac{\boldsymbol{\#\ de\ Trabajadores\ con\ Induccion}}{\boldsymbol{\#\ Total\ de\ trabajadores\ Ingresados\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$

$$\boldsymbol{Inducciones\ Generales}: \frac{\mathbf{10}}{\mathbf{10}} * \mathbf{100} = \mathbf{100}\%$$

15.3 Accidentalidad

Las estadísticas de accidentalidad permiten determinar las zonas y áreas donde más se generan y sus medidas correctivas, dichos datos de otro lado brinda un panorama de los fallos en prevención y posibles medidas a implementar; como lecciones aprendidas.

Índice de frecuencia de Accidentalidad	□ de accidentes de trabajo * K / Total de horas hombre
Índice de frecuencia de Accidente con incapacidad	(□ de accidentes de trabajo con incapacidad * K / Total de horas hombre)
Índice de Severidad de Accidente de Trabajo	□ de días perdidos por accidentes de trabajo * K / Total de horas hombre
Índice de Lesiones Incapacitantes	(Índice de frecuencia de accidente de trabajo * Índice de Severidad de accidentes de trabajo) / 1000
Investigación de accidentes de Trabajo	Total de accidentes de trabajo Investigados / Total de accidentes de trabajo
Reporte de accidentes de trabajo	Total de accidentes de trabajo Reportados/ Total de accidentes de trabajo

Tabla 5. Indicadores de Accidentalidad

Anexo 8. *Formato accidentalidad y ausentismo durante el mes.*

16. ANEXOS

ANEXO 1. Inducciones
ANEXO 2. Sistema general de seguridad social.
ANEXO 2.1 Afiliaciones a seguridad social
ANEXO 2.2 Planillas de Seguridad social del mes.
ANEXO 3. Formatos evidencias de Entrega de Dotación, consumibles.
ANEXO 4. Exámenes médicos de ingreso
ANEXO 5. Pre-operacionales Maquinaria y equipos
ANEXO 6. Charlas de Seguridad
ANEXO 7. Acta de conformación de COPASST
ANEXO 8. Formato Índice de accidentalidad y Ausentismo

.

Diego Fernando Saldaña Sánchez
ESPECIALISTA SST
Consorcio LA CANDELARIA

ANEXO 1
INDUCCIONES

2

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 978 662-9	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
	OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha: 05/10/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Cod. FT-SIG-016

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Consorcio la candelaria	Ragonia.	23	01	26.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	Induccion Personal nuevo.
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Capacitación		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	DAVID Jimenez M	5.236.240	Ayudante	
2	Gusjedi Salazar	6653912	Ayudante	
3	Gregorio Tapia	6078212	Ayudante	
4	Yeison Lopez	1002728251	Ayudante	
5	[illegible]	6055771	ayudante.	
6	Livinston lozano sierra	7232411+	ayudante	
7	Juan Barrera	914734106	oficial	
8	Eduard Cordero	810272	Obrero	Eduard Cordero
9	NOE MOYA	1522939	Ay	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones: Se realiza presentación de los compañeros, se les indica cuales seran las actividades, horario dia de pago, y reuniones de seguridad.

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
DIEGO FERNANDO. SANCHEZ SALDAÑA	

Powered by CamScanner

ANEXO 2
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ANEXO 2. 1

AFILIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CER_AFI_2026006374473

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Livinston Lozano Sierra identificado con CC. 72329117 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901976668

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/07	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 6 días del mes de enero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC06012026N72329117A252201.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	72329117
NOMBRES	LIVINSTON
APELLIDOS	LOZANO SIERRA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ATLANTICO
MUNICIPIO	BARRANQUILLA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD - MUTUAL SER EPS -CM	CONTRIBUTIVO	18/03/2019	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	01/25/2026 20:03:38	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LIVINSTON LOZANO SIERRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **72.329.117**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Enero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CER_AFI_2026006374301

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

EDUARD REINALDO CORDERO LOPEZ identificado con PT. 810272 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901976668

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/06	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 5 días del mes de enero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **PT05012026N810272A00252033.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PT
NÚMERO DE IDENTIFICACION	810272
NOMBRES	EDUARD REINALDO
APELLIDOS	CORDERO LOPEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOYACA
MUNICIPIO	RAQUIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	SUBSIDIADO	18/01/2024	05/02/2026	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	01/25/2026 20:08:11	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

porvenir

Fondo de Pensiones Obligatorias
Solicitud de Vinculación o Traslado

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Nit. 800.144.331-3

Nº 23799150

23799150

R R Z Z D D A A | Ciudad | Fecha de Solicitud de Afiliación 2 0 A A M M D D

1. Tipo de Vinculación

Vinculación Inicial
Marque con una X si el solicitante va a cotizar por primera vez, y no ha estado afiliado nunca a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) o Caja de Prevención Social y desea vincularse a Porvenir.
Pensiones Obligatorias

Traslado de Fondos de Pensiones (AFP)
(Permanencia mínima de 6 meses en otra AFP)
Pensiones Obligatorias Entidad de Origen | Pensión Familiar
Entidad de Destino

Traslado de Régimen
Marque con una X si el solicitante ha estado vinculado al régimen de prima media en alguna entidad oficial, en Colpensiones o cajas de Prevensión Social, durante más de 5 años y desea vincularse a Porvenir.
Entidad Origen | Pensión Familiar
Entidad Destino

2. Datos Básicos

Tipo de Documento: C.C T.I C.E PAS R.C C.D PT x
Nº de Documento de Identidad: 810272
Fecha de Expedición del Documento de Identidad: 20230808
Lugar de Expedición: Bogota
Género: M X F NB T
Es Pensionado (Jubilado): SI NO X

Primer Apellido: Cordero
Segundo Apellido: Lopez
Primer Nombre: Eduard
Otros Nombres: Reinaldo

Fecha de Nacimiento: 19880806
Lugar de Nacimiento: Venezuela
Nacionalidad: Colombiana Otra ¿Cuál?

3. Datos de Localización

Dirección de Residencia: Antiguo hospital
Barrio: Antiguo hospital
Ciudad/Municipio: Ragurá
Departamento: Boyaca
Nº. de Teléfono Fijo:
Nº. de Teléfono celular: 3001595671
Autorización de envío de información a través de medios electrónicos. Autorizo a Porvenir S.A. para enviar notificaciones, extractos y cualquier información de interés a mi correo electrónico y/o a mi teléfono celular. SI X NO
Dirección de Correo Electrónico (e-mail):

Dirección Laboral | Ciudad | Departamento | Nº. de Teléfono

4. Datos Empleador e información del Vinculo Laboral

Tipo de Trabajador: Dependiente X | Independiente Contratista | Independiente Voluntario
Ocupación o Cargo Actual: Ayudante de Obra
Salario o Ingreso Mensual: $1750091

Tipo de Documento: NIT X C.C C.E PAS T.I PT
Nº de Documento de Identidad: 901976668
Nombre y/o Razón Social: Consorcio la candelaria

Ciudad | Dirección Empleador | Departamento | Teléfono(s)

Envío de Notificación | Sucursal Principal X | Sucursal Ciudad

5. Datos Beneficiarios

Nombre y Apellido	Género	Tipo de Documento	Nº de Documento de Identidad	Fecha de Nacimiento	Código Parentesco
	M F			A A A A M M D D	
	M F			A A A A M M D D	

Códigos parentesco: 01 Cónyuge 02 Compañero permanente 03 Padres 04 Hijo 05 Hijo inválido 06 Hermano inválido *Los beneficiarios relacionados serán válidos de acuerdo con las normas legales vigentes.*

6. Bono Pensional

El Bono Pensional representa el valor de las cotizaciones realizadas con anterioridad a su afiliación al Régimen de Ahorro Individual, a entidades como Colpensiones (antes Instituto de seguros sociales. Siempre y cuando haya cotizado un mínimo de 150 semanas), y/o cajas o fondos de previsión del sector público, privado, y empleadores que asumían su propio pasivo Pensional.
Por favor indique en la siguiente casilla, si usted cumple alguna de las condiciones aquí descritas. SI__NO X Entidad a la cual realizó sus cotizaciones para pensión:_____

7. Síntesis de la asesoría recibida en el proceson de afiliación y que se encuentra contenida al respaldo del presente formulario de vinculación.

Manifiesto que de manera previa al diligenciamiento de este formulario, fui asesorado (a) de forma clara, oportuna y adecuada, en relación con: i) Los requisitos de mi afiliación al fondo de pensiones obligatorias administrado por Porvenir S.A, ii) Características y diferencias entre cada uno de los régimen pensionales, iii) Requisitos de acceso y forma de liquidación de las pensiones a cargo del Sistema General de Pensiones, iv) Información del programa de beneficios económicos periódicos, BEPS, v) Información del esquema Multifondos vi) Personas excluidas del Régimen de ahorro individual con solidaridad vii) Regímenes pensionales especiales y exceptuados viii) Términos mínimos de permanencia para trasladarme de fondo de perisiones ix) Términos mínimos de permanencia para traslado de régimen pensional x) Convenios internacionales de seguridad social xi) Características y cobertura del régimen de transición xii) Facultad y término para retractarme de esta afiliación.

Manifiesto que luego de haber recibido asesoría amplia y suficiente sobre el Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir S.A. conozco y entiendo las implicaciones legales que tiene mi decisión de vinculación o traslado al régimen de ahorro individual.

• Anexo fotocopia de mi documento de identidad ampliada al 150% en blanco y negro

8. Término de Retracto

Recuerda que a partir del momento en que el fondo de pensiones te notifique sobre la validez de la afiliación o del traslado, cuentas con un término de cinco (5) días hábiles para ejercer tu facultad de retracto, (Decreto 1813 de 2020).

9. Espacio reservado para el empleador

"Declaro bajo juramento que los antecedentes del trabajador incluidos en él presente contrato corresponden a la información que me ha sido suministrada"

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMPLEADOR

10. Voluntad de Selección y Afiliación

Hago constar que la selección del Régimen de Ahorro Individual la he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a PORVENIR S.A. para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos.

Con la firma de este formulario expreso mi consentimiento informado en la afiliación al fondo de pensiones obligatorias PORVENIR S.A.

ESPACIO PARA HUELLA

X
FIRMA Y HUELLA DEL SOLICITANTE

11. Espacio para la Administradora

Nombre del Promotor:
No. de identificación del promotor:
Firma del promotor:

Firma autorizada del Representante Legal

OFIX SAS NIT 900.156.826-1

Para información a cerca del diligenciamiento del formulario escanee el código QR

Nº 23799150

Porvenir/Pensiones Obligatorias

Scanned with CamScanner

CER_AFI_2026006374037

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

GREGORIO RAFAEL PEREZ LOPEZ identificado con PT. 6078212 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901976668

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/06	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 5 días del mes de enero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **PT05012026N6078212A0251777.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PT
NÚMERO DE IDENTIFICACION	6078212
NOMBRES	GREGORIO RAFAEL
APELLIDOS	PEREZ LOPEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOYACA
MUNICIPIO	RAQUIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	SUBSIDIADO	19/08/2025	05/02/2026	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	01/25/2026 20:07:12	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **GREGORIO RAFAEL PEREZ LOPEZ** identificado/a con documento de identidad **Permiso Protección Temporal** número **6078212,** se encuentra afiliado/a desde **28/10/2025** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 30 de enero de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CER_AFI_2026008915302

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

DAVID JIMENEZ MONROY identificado con PT. 5236240 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901976668

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/16	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 15 días del mes de enero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **PT15012026N5236240A0880829.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PT
NÚMERO DE IDENTIFICACION	5236240
NOMBRES	DAVID
APELLIDOS	JIMENEZ MONROY
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOYACA
MUNICIPIO	RAQUIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	SUBSIDIADO	05/05/2022	13/02/2026	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	01/25/2026 20:09:13	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

CER_AFI_2026009714522

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Yeison Antonio Lopez Caro identificado con CC. 1002624251 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901976668

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/19	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 18 días del mes de enero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC18012026N1002624251A1611226.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1002624251
NOMBRES	YEISON ANTONIO
APELLIDOS	LOPEZ CARO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOYACA
MUNICIPIO	RAQUIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/06/2020	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	02/02/2026 16:24:33	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

YEISON ANTONIO LOPEZ CARO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.002.624.251**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Febrero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CER_AFI_2026006374204

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

CARLOS JOSE CAMPOS MUNDARAIN identificado con PT. 6059771 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901976668

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/06	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 5 días del mes de enero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **PT05012026N6059771A0251936.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PT
NÚMERO DE IDENTIFICACION	6059771
NOMBRES	CARLOS JOSE
APELLIDOS	CAMPOS MUNDARAIN
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOYACA
MUNICIPIO	RAQUIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	SUBSIDIADO	01/02/2025	05/02/2026	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	01/25/2026 20:11:02	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

porvenir

Fondo de Pensiones Obligatorias
Solicitud de Vinculación o Traslado

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Nit. 800.144.331-3

N° 23799149

23799149

RRZZDDAA | Ciudad | Fecha de Solicitud de Afiliación 20 AA MM DD

1. Tipo de Vinculación

Vinculación Inicial
Marque con una X si el solicitante va a cotizar por primera vez, y no ha estado afiliado nunca a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) o Caja de Previsión Social y desea vincularse a Porvenir.
Pensiones Obligatorias

Traslado de Fondos de Pensiones (AFP)
(Permanencia mínima de 6 meses en otra AFP)
Pensiones Obligatorias
Entidad de Origen
Pensión Familiar
Entidad de Destino

Traslado de Régimen
Marque con una X si el solicitante ha estado vinculado al régimen de prima media en alguna entidad oficial, en Colpensiones o cajas de Prevensión Social, durante más de 5 años y desea vincularse a Porvenir.
Entidad Origen
Pensión Familiar
Entidad Destino

2. Datos Básicos

Tipo de Documento	N° de Documento de Identidad	Fecha de Expedición del Documento de Identidad	Lugar de Expedición	Género	Es Pensionado (Jubilado)
CC TI CE PAS RC CD PT	X 6059771	20210716	Bogota	M X F NB T	SI NO

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres
Campos	Mundarin	Carlos	Jose

Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento	Nacionalidad	
19840746		Colombiana	Otra ¿Cuál?

3. Datos de Localización

Dirección de Residencia: Antiguo hospital
Barrio: Antigo hapital
Ciudad/Municipio: Ragura
Departamento: Boyaca
N°. de Teléfono Fijo:
N°. de Teléfono celular: 3001595671.
Autorización de envío de información a través de medios electrónicos. Autorizo a Porvenir S.A. para enviar notificaciones, extractos y cualquier información de interés a mi correo electrónico y/o a mi teléfono celular. SI NO
Dirección de Correo Electrónico (e-mail): carliscam.04@gmail.com
Dirección Laboral
Ciudad
Departamento
N°. de Teléfono

4. Datos Empleador e información del Vínculo Laboral

Tipo de Trabajador	Ocupación o Cargo Actual	Salario o Ingreso Mensual
Dependiente X Independiente Contratista Independiente Voluntario	Ayudante de Obra	$1750905

Tipo de Documento	N° de Documento de Identidad	Nombre y/o Razón Social	
NIT X C.C C.E PAS T.I PT	901976668	Consorcio 10 Candelaria	

Ciudad	Dirección Empleador	Departamento	Teléfono(s)

Envío de Notificación: Sucursal Principal X Sucursal Ciudad

5. Datos Beneficiarios

Nombre y Apellido	Género	Tipo de Documento	N° de Documento de Identidad	Fecha de Nacimiento	Código Parentesco
	M F			AAAA MM DD	
	M F			AAAA MM DD	

"Códigos parentesco: 01 Cónyuge 02 Compañero permanente 03 Padres 04 Hijo 05 Hijo inválido 06 Hermano inválido" "Los beneficiarios relacionados serán válidos de acuerdo con las normas legales vigentes."

6. Bono Pensional

El Bono Pensional representa el valor de las cotizaciones realizadas con anterioridad a su afiliación al Régimen de Ahorro Individual, a entidades como Colpensiones (antes Instituto de seguros sociales. Siempre y cuando haya cotizado un mínimo de 150 semanas), y/o cajas o fondos de previsión del sector público, privado, y empleadores que asumían su propio pasivo Pensional.
Por favor indique en la siguiente casilla, si usted cumple alguna de las condiciones aquí descritas. SI___NO_X_ Entidad a la cual realizó sus cotizaciones para pensión:_____

7. Síntesis de la asesoría recibida en el proceson de afiliación y que se encuentra contenida al respaldo del presente formulario de vinculación.

Manifiesto que de manera previa al diligenciamiento de este formulario, fui asesorado (a) de forma clara, oportuna y adecuada, en relación con: i) Los requisitos de mi afiliación al fondo de pensiones obligatorias administrado por Porvenir S.A, ii) Características y diferencias entre cada uno de los régimen pensionales, iii) Requisitos de acceso y forma de liquidación de las pensiones a cargo del Sistema General de Pensiones, iv) Información del programa de beneficios económicos periódicos, BEPS, v) Información del esquema Multifondos vi) Personas excluidas del Régimen de ahorro individual con solidaridad vii) Regímenes pensionales especiales y exceptuados viii) Términos mínimos de permanencia para trasladarme de fondo de pensiones ix) Términos mínimos de permanencia para traslado de régimen pensional x) Convenios internacionales de seguridad social xi) Características y cobertura del régimen de transición xii) Facultad y término para retractarme de esta afiliación

Manifiesto que luego de haber recibido asesoría amplia y suficiente sobre el Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir S.A. conozco y entiendo las implicaciones legales que tiene mi decisión de vinculación o traslado al régimen de ahorro individual.

- **Anexo fotocopia de mi documento de identidad ampliada al 150% en blanco y negro**

8. Término de Retracto

Recuerda que a partir del momento en que el fondo de pensiones te notifique sobre la validez de la afiliación o del traslado, cuentas con un término de cinco (5) días hábiles para ejercer tu facultad de retracto (Decreto 1813 de 2020).

9. Espacio reservado para el empleador

"Declaro bajo juramento que los antecedentes del trabajador incluidos en el presente contrato corresponden a la información que me ha sido suministrada"

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMPLEADOR

10. Voluntad de Selección y Afiliación

Hago constar que la selección del Régimen de Ahorro Individual la he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a PORVENIR S.A. para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos.

Con la firma de este formulario expreso mi consentimiento informado en la afiliación al fondo de pensiones obligatorias PORVENIR S.A.

ESPACIO PARA HUELLA

FIRMA Y HUELLA DEL SOLICITANTE

11. Espacio para la Administradora

Nombre del Promotor:
No. de identificación del promotor:
Firma del promotor:

Firma autorizada del Representante Legal

Scanned with CamScanner

CER_AFI_2026006374128

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

GUSJEDI FEDERICO SALAZAR BETANCOURT identificado con PT. 6653912 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901976668

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/06	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 5 días del mes de enero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **PT05012026N6653912A0251866.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PT
NÚMERO DE IDENTIFICACION	6653912
NOMBRES	GUSJEDI FEDERICO
APELLIDOS	SALAZAR BETANCOURT
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOYACA
MUNICIPIO	RAQUIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	SUBSIDIADO	24/05/2022	05/02/2026	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	01/25/2026 20:05:58	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

CER_AFI_2026011406502

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Juan Bautista Barrera Pachon identificado con CC. 91434506 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	ZAGO INGENIERIA S.A.S	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 900546289

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/23	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5421001

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de enero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22012026N91434506A2969298.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PT
NÚMERO DE IDENTIFICACION	5518220
NOMBRES	NOEL ALEXANDER
APELLIDOS	MOYA BRITO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOYACA
MUNICIPIO	RAQUIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A. -CM	CONTRIBUTIVO	30/08/2019	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	01/25/2026 19:59:51	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

CER_AFI_2026006374408

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Moises Daniel Diaz Llerena identificado con CC. 1236441299 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	CONSORCIO LA CANDELARIA	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901976668

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/07	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5429001

Esta certificación se expide a los 6 días del mes de enero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC06012026N1236441299A252135.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1236441299
NOMBRES	MOISES DANIEL
APELLIDOS	DIAZ LLERENA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOYACA
MUNICIPIO	RAQUIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A. -CM	SUBSIDIADO	01/10/2023	05/02/2026	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	01/25/2026 20:01:50	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MOISES DANIEL DIAZ LLERENA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.236.441.299**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Enero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

CER_AFI_2026011406502

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Juan Bautista Barrera Pachon identificado con CC. 91434506 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	ZAGO INGENIERIA S.A.S	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 900546289

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/01/23	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5421001

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de enero del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC22012026N91434506A2969298.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	91434506
NOMBRES	JUAN BAUTISTA
APELLIDOS	BARRERA PACHON
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	SANTANDER
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/04/2019	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	01/25/2026 20:04:59	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JUAN BAUTISTA BARRERA PACHON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **91.434.506**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

ANEXO 2. 2

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765918		GORDILLO VALDERRAMA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 12 No 18 33	TUNJA-BOYACA	7454126	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	2087334569	9497974096	I	2026/02/05	2026/01/16	BANCO DE BOGOTA	0	$3,008,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,402,800						$1,031,400	
																				$1,402,800						$1,031,400	
																				$1,402,800						$1,031,400	
						$8,250,905	No		COLPENSIONES	30	$8,250,905	16%	SIN RIESGO	$1,320,200	$0	$0	$41,300	$41,300	$0	$1,402,800		FAMISANAR	30	$8,250,905	12.5%	$1,031,400	
																				$1,402,800						$1,031,400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$1,031,400			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$8,250,905	6.96%	5	$574,300	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765918		GORDILLO VALDERRAMA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 12 No 18 33	TUNJA-BOYACA	7454126	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	2087334569	9497974096	I	2026/02/05	2026/01/16	BANCO DE BOGOTA	0	$3,008,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,402,800						$1,031,400	
																				$1,402,800						$1,031,400	
																				$1,402,800						$1,031,400	
						$8,250,905	No		COLPENSIONES	30	$8,250,905	16%	SIN RIESGO	$1,320,200	$0	$0	$41,300	$41,300	$0	$1,402,800		FAMISANAR	30	$8,250,905	12.5%	$1,031,400	
																				$1,402,800						$1,031,400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$1,031,400			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$8,250,905	6.96%	5	$574,300	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976668	6	CONSORCIO LA CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	47934155	9499402161	E	2026/02/16	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$13,164,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049412918	BUITRAGO FABIO	X																	231001	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	PT	6059771	CAMPOS CARLOS	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
3	CC	6014634	CARDENAS FERDINANDO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1057892733	CASTILLO WILSON	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
5	CC	1002415021	CERON ALDEMAR	X																	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF10	11	$641,999	$25,700	14-23	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0	Si	$198,900
6	CC	1012434947	CHACON JOSE	X	X																231001	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
7	PT	810272	CORDERO EDUARD	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
8	CC	1236441299	DIAZ MOISES	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
9	CC	1057892794	DORADO DILSA	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	1013577862	FLOREZ MARLEN	X																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
11	CC	1000687128	GALINDO MARIA	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	CC	1006443670	GARZON JHON	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPSC25	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
13	CC	6775637	GOMEZ JAIME																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF10	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
14	CC	1062958042	GRACIANO JADER	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
15	PT	5236240	JIMENEZ DAVID	X																		0	$0	$0	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF10	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	Si	$139,800
16	CC	74750938	JIMENEZ JOSE	X	X																	0	$0	$0	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$8,900
17	CC	1002624251	LOPEZ YEISON	X																	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF10	12	$700,362	$28,100	14-23	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0	Si	$217,100
18	CC	72329117	LOZANO LIVINSTON	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	ESSC07	26	$1,517,451	$60,700	CCF10	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
19	PT	5518220	MOYA NOEL	X																	230301	10	$583,635	$93,400	EPS041	10	$583,635	$23,400	CCF10	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
20	CC	1124510	MURCIA ISNARDO	X																		0	$0	$0	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
21	CC	1127666356	OCHOA CARLOS	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
22	CC	6759479	PEDRAZA HECTOR																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF10	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
23	CC	1193447840	PEDRAZA JUAN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
24	CC	1124050452	PEREZ ALVEIRO	X																	230201	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
25	PT	6078212	PEREZ GREGORIO	X																	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF10	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
26	CC	23973910	RAMIREZ LUZ	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
27	CC	1124186	REINA JOSE																			0	$0	$0	ESSC24	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$299,200
28	CC	1118201375	REITA ENDER	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
29	CC	1121880221	RICO JAVIER	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
30	CC	1002647079	RODRIGUEZ EDILFONSO	X																	230201	9	$525,272	$84,100	EPS041	9	$525,272	$21,100	CCF10	9	$525,272	$21,100	14-23	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
31	CC	9540570	RODRIGUEZ ESTEBAN	X																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
32	PT	6653912	SALAZAR GUSJEDI	X																		0	$0	$0	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$218,400
33	CC	1002735699	SANDOVAL JACKSON	X																	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS010	28	$1,634,178	$65,400	CCF10	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0	Si	$506,100
34	CC	4114321	SUAREZ MARCO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
35	CC	1004485486	TERRAZA LUIS	X																	230301	5	$291,818	$46,700	EPS042	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976668	6	CONSORCIO LA CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	47934155	9499402161	E	2026/02/16	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$13,164,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$6,321,600	$0	$0	$6,321,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$289,600	$0	$0	$289,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,052,800	$0	$0	$2,052,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$3,287,900	$0	$0	$3,287,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$691,300	$0	$0	$691,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,182,500	$0	$0	$3,182,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	38	$3,182,500	$0	$0	$3,182,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	38	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				38	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$11,700	$0	$0	$11,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$150,100	$0	$0	$150,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$65,400	$0	$0	$65,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$60,700	$0	$0	$60,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$621,900	$0	$0	$621,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$395,000	$0	$0	$395,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$310,100	$0	$0	$310,100
TOTAL				**38**	**$13,164,100**	**$0**	**$0**	**$13,164,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976668	6	CONSORCIO LA CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	47934155	9499402161	E	2026/02/16	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$13,164,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049412918	BUITRAGO FABIO	X																	231001	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	PT	6059771	CAMPOS CARLOS	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
3	CC	6014634	CARDENAS FERDINANDO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1057892733	CASTILLO WILSON	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
5	CC	1002415021	CERON ALDEMAR	X																	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF10	11	$641,999	$25,700	14-23	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0	Si	$198,900
6	CC	1012434947	CHACON JOSE	X	X																231001	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
7	PT	810272	CORDERO EDUARD	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
8	CC	1236441299	DIAZ MOISES	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
9	CC	1057892794	DORADO DILSA	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	1013577862	FLOREZ MARLEN	X																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
11	CC	1000687128	GALINDO MARIA	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	CC	1006443670	GARZON JHON	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPSC25	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
13	CC	6775637	GOMEZ JAIME																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF10	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
14	CC	1062958042	GRACIANO JADER	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
15	PT	5236240	JIMENEZ DAVID	X																		0	$0	$0	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF10	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	Si	$139,800
16	CC	74750938	JIMENEZ JOSE	X	X																	0	$0	$0	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$8,900
17	CC	1002624251	LOPEZ YEISON	X																	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF10	12	$700,362	$28,100	14-23	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0	Si	$217,100
18	CC	72329117	LOZANO LIVINSTON	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	ESSC07	26	$1,517,451	$60,700	CCF10	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
19	PT	5518220	MOYA NOEL	X																	230301	10	$583,635	$93,400	EPS041	10	$583,635	$23,400	CCF10	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
20	CC	1124510	MURCIA ISNARDO	X																		0	$0	$0	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
21	CC	1127666356	OCHOA CARLOS	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
22	CC	6759479	PEDRAZA HECTOR																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF10	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
23	CC	1193447840	PEDRAZA JUAN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
24	CC	1124050452	PEREZ ALVEIRO	X																	230201	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
25	PT	6078212	PEREZ GREGORIO	X																	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF10	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
26	CC	23973910	RAMIREZ LUZ	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
27	CC	1124186	REINA JOSE																			0	$0	$0	ESSC24	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$299,200
28	CC	1118201375	REITA ENDER	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
29	CC	1121880221	RICO JAVIER	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
30	CC	1002647079	RODRIGUEZ EDILFONSO	X																	230201	9	$525,272	$84,100	EPS041	9	$525,272	$21,100	CCF10	9	$525,272	$21,100	14-23	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
31	CC	9540570	RODRIGUEZ ESTEBAN	X																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
32	PT	6653912	SALAZAR GUSJEDI	X																		0	$0	$0	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$218,400
33	CC	1002735699	SANDOVAL JACKSON	X																	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS010	28	$1,634,178	$65,400	CCF10	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0	Si	$506,100
34	CC	4114321	SUAREZ MARCO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
35	CC	1004485486	TERRAZA LUIS	X																	230301	5	$291,818	$46,700	EPS042	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976668	6	CONSORCIO LA CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	47934155	9499402161	E	2026/02/16	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$13,164,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$6,321,600	$0	$0	$6,321,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$289,600	$0	$0	$289,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,052,800	$0	$0	$2,052,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$3,287,900	$0	$0	$3,287,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$691,300	$0	$0	$691,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,182,500	$0	$0	$3,182,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	38	$3,182,500	$0	$0	$3,182,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	38	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				38	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$11,700	$0	$0	$11,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$150,100	$0	$0	$150,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$65,400	$0	$0	$65,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$60,700	$0	$0	$60,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$621,900	$0	$0	$621,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$395,000	$0	$0	$395,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$310,100	$0	$0	$310,100
TOTAL				**38**	**$13,164,100**	**$0**	**$0**	**$13,164,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52797064		MAHECHA VALERO ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 58D #1A-27Este	TUNJA-BOYACA	7428006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	46076778	9499393676	I	2026/02/16	2026/02/09	NEQUI	0	$233,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$817,089	$130,800			$817,089	$102,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$817,089	$130,800			$817,089	$102,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$817,089	$130,800			$817,089	$102,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 52797064	MAHECHA ELIZABETH	25-14	14	$817,089	$130,800	EPS005	14	$817,089	$102,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$817,089	$130,800			$817,089	$102,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52797064		MAHECHA VALERO ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 58D #1A-27Este	TUNJA-BOYACA	7428006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	46076778	9499393676	I	2026/02/16	2026/02/09	NEQUI	0	$233,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,800	$0	$0	$130,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$130,800	$0	$0	$130,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$102,200	$0	$0	$102,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$102,200	$0	$0	$102,200
TOTAL				**1**	**$233,000**	**$0**	**$0**	**$233,000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057582849
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO FERNANDO SALDANA SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 1A 10A-61	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6002103516**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	48358097

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1057582849	SALDAÑA SANCHEZ DIEGO FERNANDO	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976668	6	CONSORCIO LA CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	47934155	9499402161	E	2026/02/16	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$13,164,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049412918	BUITRAGO FABIO	X																	231001	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	PT	6059771	CAMPOS CARLOS	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
3	CC	6014634	CARDENAS FERDINANDO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1057892733	CASTILLO WILSON	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
5	CC	1002415021	CERON ALDEMAR	X																	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF10	11	$641,999	$25,700	14-23	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0	Si	$198,900
6	CC	1012434947	CHACON JOSE	X	X																231001	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
7	PT	810272	CORDERO EDUARD	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
8	CC	1236441299	DIAZ MOISES	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
9	CC	1057892794	DORADO DILSA	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	1013577862	FLOREZ MARLEN	X																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
11	CC	1000687128	GALINDO MARIA	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	CC	1006443670	GARZON JHON	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPSC25	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
13	CC	6775637	GOMEZ JAIME																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF10	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
14	CC	1062958042	GRACIANO JADER	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
15	PT	5236240	JIMENEZ DAVID	X																		0	$0	$0	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF10	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	Si	$139,800
16	CC	74750938	JIMENEZ JOSE	X	X																	0	$0	$0	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$8,900
17	CC	1002624251	LOPEZ YEISON	X																	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF10	12	$700,362	$28,100	14-23	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0	Si	$217,100
18	CC	72329117	LOZANO LIVINSTON	X																	230301	26	$1,517,451	$242,800	ESSC07	26	$1,517,451	$60,700	CCF10	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
19	PT	5518220	MOYA NOEL	X																	230301	10	$583,635	$93,400	EPS041	10	$583,635	$23,400	CCF10	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
20	CC	1124510	MURCIA ISNARDO	X																		0	$0	$0	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
21	CC	1127666356	OCHOA CARLOS	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
22	CC	6759479	PEDRAZA HECTOR																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF10	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
23	CC	1193447840	PEDRAZA JUAN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
24	CC	1124050452	PEREZ ALVEIRO	X																	230201	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
25	PT	6078212	PEREZ GREGORIO	X																	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF10	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
26	CC	23973910	RAMIREZ LUZ	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
27	CC	1124186	REINA JOSE																			0	$0	$0	ESSC24	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$299,200
28	CC	1118201375	REITA ENDER	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
29	CC	1121880221	RICO JAVIER	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
30	CC	1002647079	RODRIGUEZ EDILFONSO	X																	230201	9	$525,272	$84,100	EPS041	9	$525,272	$21,100	CCF10	9	$525,272	$21,100	14-23	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
31	CC	9540570	RODRIGUEZ ESTEBAN	X																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
32	PT	6653912	SALAZAR GUSJEDI	X																		0	$0	$0	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF10	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0	Si	$218,400
33	CC	1002735699	SANDOVAL JACKSON	X																	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS010	28	$1,634,178	$65,400	CCF10	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0	Si	$506,100
34	CC	4114321	SUAREZ MARCO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
35	CC	1004485486	TERRAZA LUIS	X																	230301	5	$291,818	$46,700	EPS042	5	$291,818	$11,700	CCF10	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976668	6	CONSORCIO LA CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	47934155	9499402161	E	2026/02/16	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$13,164,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$6,321,600	$0	$0	$6,321,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$289,600	$0	$0	$289,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,052,800	$0	$0	$2,052,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$3,287,900	$0	$0	$3,287,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$691,300	$0	$0	$691,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,182,500	$0	$0	$3,182,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	38	$3,182,500	$0	$0	$3,182,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	38	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				38	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$11,700	$0	$0	$11,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$150,100	$0	$0	$150,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$65,400	$0	$0	$65,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$60,700	$0	$0	$60,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$621,900	$0	$0	$621,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$395,000	$0	$0	$395,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$310,100	$0	$0	$310,100
TOTAL				**38**	**$13,164,100**	**$0**	**$0**	**$13,164,100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 4375181

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	JUAN GUILLERMO CIFUENTES SANCHEZ CIFUENTES SANCHEZ		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	4375181
Ciudad/Municipio	YOPAL	Departamento	CASANARE
Dirección	CRA 20 N 34-22	Teléfono	7777777
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**4637987174**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	enero / 2026	Periodo Cotización Salud	enero / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/01/30
Número Autorización	9995539829		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	JUAN GUILLERMO	Apellidos	CIFUENTES SANCHEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	4375181
Tipo cotizante	INDEPEND	Subtipo Cotizante	NO OBLIG COT PENS EDAD
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	CASANARE	Municipio	YOPAL
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 218.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 218.900**

Planilla Pagada

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-08, 07:40:30 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83570501

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 08/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GERMAN ANTONIO PEDRAZA SANCHEZ		
Documento	CC6755678	**Dirección**	CR 4 #4 - 70
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	74000099
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RAQUIRA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6755678	GERMAN ANTONIO PEDRAZA SANCHEZ	03	02																	0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049628290		DANIEL AUGUSTO PEDRAZA PEREZ	INDEPENDIENTE	Principal	Cll 12C 71B 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3104840415	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	27054851	9498959865	I	2026/02/20	2026/02/02	BANCOLOMBIA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		$499,100
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		**$499,100**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		**$499,100**
1	CC	1049628290	PEDRAZA DANIEL								X									25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$499,100**	**$0**	**$0**	**$499,100**

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-01-30, 09:58:08 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1079176386

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

Cliente:

PAGADA 2026-01-30

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA FERNANDA ARIAS AMEZQUITA				
Documento	CC 1049649865	**Dirección**	CR 5A #4 - 29		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3104748397		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	RAQUIRA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1049649865		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					ARIAS AMEZQUITA MARIA FERNANDA	15600000 - 15		BOYACA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	30	30	0	30				230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS041		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	CCF10	0,6 %	$ 1.750.905	$ 10.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A. CM	NINGUNA ARP	COMFABOY	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976668	6	CONSORCIO LA CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	47982318	9499402463	Y	2026/02/16	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$979,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049649865	ARIAS MARIA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
2	CC	4375181	CIFUENTES JUAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
3	CC	6765918	GORDILLO LUIS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
4	CC	52797064	MAHECHA ELIZABETH																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
5	CC	6776554	MARTINEZ JUAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
6	CC	1049628290	PEDRAZA DANIEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
7	CC	6755678	PEDRAZA GERMAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
8	CC	1057582849	SALDAÑA DIEGO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
9	CC	1055227559	TENJO FABIO		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	1	$58,364	$4,100	0	$0	$0	No	$4,100
Total	**Afiliados(9)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$14,065,604	$979,300		$0	$0		$979,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976668	6	CONSORCIO LA CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 20 12 84	TUNJA-BOYACA	3118284350	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	47982318	9499402463	Y	2026/02/16	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$979,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$979,300	$0	$0	$979,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$979,300	$0	$0	$979,300
TOTAL				9	$979,300	$0	$0	$979,300

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-08, 09:04:20 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83571098

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 08/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RUBEN DARIO CARO PULIDO		
Documento	CC74810538	**Dirección**	CR 42 #50 - 62
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7400099
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BERBEO	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 74810538	RUBEN DARIO CARO PULIDO	03	00		X															0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-08, 07:32:01 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83570447

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 08/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ARTURO PULIDO TORRES		
Documento	CC1116992019	**Dirección**	CL 20 #12 - 48
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7400099
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	AGUAZUL	**Departamento**	CASANARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116992019	CARLOS ARTURO PULIDO TORRES	03	00		X															0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 1.400	$ 500.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-08, 07:16:33 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079470218

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 08/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIO ORLANDO TENJO BAUTISTA		
Documento	CC1055227559	**Dirección**	CL 7 #17 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7400099
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PESCA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1055227559	FABIO ORLANDO TENJO BAUTISTA	03	00		X															0	30	30	0	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-09, 08:16:19 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1079137688

Periodo Cotización: enero de 2026 | Periodo Servicio: enero de 2026 | Referencia pago 8823837315

PAGADA 07/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN MAURICIO MARTINEZ REYES		
Documento	CC6776554	Dirección	CL 62A SUR #18 N - 09
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3007236053
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6776554	JUAN MAURICIO MARTINEZ REYES	3	0																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,750,905	$280,200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1,750,905	$218,900	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$0	$0	$280,200	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100	$0	$499,100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-08, 08:02:31 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079470649

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 08/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON FREDDY HERNANDEZ SANCHEZ		
Documento	CC86014572	**Dirección**	CR 4 #5 - 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3224745079
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TAURAMENA	**Departamento**	CASANARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 86014572	JOHN FREDY HERNANDEZ SANCHEZ	03	00		X															0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 3

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 976 668-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
19	20	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: x Juan Bautista Barrera C.C. x 91434506

Cargo: x Operador Hormigonera Obra: _____

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	✓	Talla	40
Overol	____	Talla	____
Pantalón	____	Talla	____
Camisa	____	Talla	____
Chaleco	____	Talla	____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	____	Protector Auditivo Tipo Copa	____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	____	Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	____
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	____	Botas Impermeables con Puntera Acero	____
Bota Impermeables sin Puntera	✓	Gafas de Seguridad	____
Guantes Hilo y PVC	____	Guantes de baqueta	____
Guantes Dieléctricos	____		____
Tapabocas	____	Respirador Contra Gases y Vapores	____
Casco	____	Barbuquejo	____
	____		____

FIRMAS

ENTREGA

x RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 976 666-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
17	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: x NOEL HOYOS C.C. x 15.202.932

Cargo: xAyudante. Obra: _____

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	42
Overol	____	Talla	____
Pantalón	____	Talla	____
Camisa	____	Talla	____
~~Chaleco~~ Capa	X	Talla	____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	✓	Protector Auditivo Tipo Copa	____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	____	Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	____
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	____	Botas Impermeables con Puntera Acero	____
Bota Impermeables sin Puntera	____	Gafas de Seguridad	✓
Guantes Hilo y PVC	✓	Guantes de baqueta	____
Guantes Dieléctricos	✓		____
Tapabocas	✓	Respirador Contra Gases y Vapores	____
Casco	✓	Barbuquejo	____
	____		____

FIRMAS

ENTREGA

RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	**Revisó:** Ing. Diego Fernando Saldaña	**Aprobó:** Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 376 666-6	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
14	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: x Yahson Saldaña Diaz C.C. 1062735664

Cargo: x Ayudante topografo Obra:

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	41
Overol		Talla	
Pantalón	X	Talla	40
Camisa	X	Talla	40
~~Guantes~~ Cuffy	X	Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	X	Protector Auditivo Tipo Copa	X
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas impermeables con Puntera Acero	
Bota impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC		Guantes de baqueta	
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas	X	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	X	Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

x Yahson Saldaña

RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 515 884-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha: 05-10-2025 Cód. FT-SST-55

día	mes	año
13	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: Moises Diaz CC. 1236101299

Cargo: Ayudante Obra:

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	
Overol		Talla	
Pantalón	✓	Talla	
Camisa	✓	Talla	
Chaleco		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	✓	Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Arero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes de baqueta	✓
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas	✓	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	✓	Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

Moises Diaz

RECIBE

Revisó:	Revisó:	Aprobó:
Ing. Diego Fernando Saldaña	Ing. Diego Fernando Saldaña	Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 976 553-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
	OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha:05 -10 -2025
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
14	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: Gosjeda Salazar C.C. 6653912

Cargo: _____ Obra: _____

DOTACIÓN PERSONAL

Botas X Talla _____

Overol _____ Talla _____

Pantalón X Talla _____

Camisa X Talla _____

Chaleco _____ Talla _____

Carpa

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	✓	Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC	✓	Guantes de baqueta	✓
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas	✓	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	✓	Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedroza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 376 663-3	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
14	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: Juan Mauricio Martinez Lopez C.C. 6796554

Cargo: Controlador Obra: _____

DOTACIÓN PERSONAL

	Botas	✓	Talla	42	
	Overol		Talla		
	Pantalón		Talla		
	Camisa		Talla		
Carpa	Chaleco	✓	Talla		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	✓	Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes de baqueta	
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas	✓	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	✓	Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 376 560-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
14	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: Esteban Rodriguez C.C. 95905 76

Cargo: Ayudante Topo Obra: _____

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	
Overol	✓	Talla	
Pantalón	✓	Talla	
Camisa		Talla	
Chaleco Capot		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	X	Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	✓
Guantes Hilo y PVC		Guantes de baqueta	
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas	✓	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	✓	Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 976 668-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
14	01	25.

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: x Gregorio Perez C.C. x 6078212

Cargo: x Oficial Obra: _____

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	√	Talla	42
Overol	√	Talla	XL
Pantalón	√	Talla	8
Camisa	√	Talla	L
Chaleco	√	Talla	L

cnlpa

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	√	Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero	.	Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes de baqueta	
Guantes Dieléctricos	√		
Tapabocas	√	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	√	Barbuquejo	
	√		

FIRMAS

ENTREGA

x RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 276 XXX-X	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
15	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: DAVID JIMENEZ M C.C.: 5236240

Cargo: Obrero Obra:

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	42
Overol		Talla	
Pantalón	X	Talla	42
Camisa	X	Talla	42
Chaleco		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	✓	Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	✓
Guantes Hilo y PVC	✓	Guantes de baquela	✓
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas	✓	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	✓	Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT. 901 578 663-9	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha: 05-10-2025 Cód. FT-PRE-55

dd	mm	aaaa
19	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: Fabio Yohany Bueno C.C. 1012402128

Cargo: Maestro. Obra:

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	35
Overol		Talla	
Pantalón		Talla	
Camisa		Talla	
Chaleco	X	Talla	L

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero	✓	Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes de baqueta	
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco		Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

Fabio Bueno
RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- PRE - 55
	OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	

día	mes	año
17	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: x Yerco A Suarez C.C. x 4114321

Cargo: x Obra: _____

DOTACION PERSONAL

Botas	X	Talla	
Overol		Talla	
Pantalón	✓	Talla	
Camisa	✓	Talla	
~~Chaleco~~ Carpa	✓	Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes de baqueta	
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco		Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

RECIBE

Revisó:	Revisó:	Aprobó:
Ing. Diego Fernando Saldaña	Ing. Diego Fernando Saldaña	Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT. 901 276 563-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
19	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: Julian Triana C.C. 1052 ... 378

Cargo: Maestro Obra: _____

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	39.
Overol	____	Talla	____
Pantalón	____	Talla	____
Camisa	____	Talla	____
~~Casco~~ Capa	✓	Talla	____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	____	Protector Auditivo Tipo Copa	____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	____	Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	____
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	____	Botas Impermeables con Puntera Acero	____
Bota Impermeables sin Puntera	____	Gafas de Seguridad	____
Guantes Hilo y PVC	____	Guantes de baqueta	____
Guantes Dieléctricos	____		____
Tapabocas	____	Respirador Contra Gases y Vapores	____
Casco	____	Barbuquejo	____
	____		____

FIRMAS

ENTREGA RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 576 666-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
	OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha:05 -10 -2025
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
17	01	2026.

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: Jair Guillermo Cifuentes S. C.C. 4'375181

Cargo: INSPECTOR-G. Obra: Consorcio la candelaria.

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	✓	Talla	✓
Overol	✓	Talla	✓
Pantalón	✓	Talla	✓
Camisa	✓	Talla	✓
Carpa.	X	Talla	✓

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes de baqueta	
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco		Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 376 668-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha: 05-10-2025 Cód. FT-PRE-55

dd	mm	aaaa
15	05	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: Eduard Cordero cc. 810.272

Cargo: obrero Obra:

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	Y	Talla	41
Overol		Talla	
Pantalón	X	Talla	M
Camisa	X	Talla	M
~~Chaleco~~ Casco	X	Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes de baqueta	
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco		Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

Eduard Cordero
RECIBE

Revisó:	Revisó:	Aprobó:
Ing. Diego Fernando Saldaña	Ing. Diego Fernando Saldaña	Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 375 868-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
17	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: [illegible] C.C. [illegible]

Cargo: xAyudante Obra: _____

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	V	Talla	40
Overol		Talla	
Pantalón		Talla	
Camisa		Talla	
~~Chaleco~~ Capa		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	V	Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes de baqueta	V
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas	V	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	V	Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

X

RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 376 663-6	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
	OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha:05 -10 -2025
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
17	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: Livingston Lozano Sierra C.C. 72329117

Cargo: AUXILIAR Obra: _____

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	X	Talla	
Overol	X	Talla	
Pantalón		Talla	
Camisa		Talla	
~~Chaleco~~ COMPA	✓	Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	✓	Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes de baquéta	✓
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas	✓	Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	✓	Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión. 00
	OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha:05 -10 -2025
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Cod. FT- PRE - 55

DÍA	MES	AÑO
17	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: Leonardo M. Murcia N. CC. M 121510

Cargo: Control Tráfico Obra

DOTACIÓN PERSONAL

Botas X Talla

Overol Talla

Pantalón Talla

Camisa Talla

Chaleco Talla

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	
Guantes Nilo y PVC		Guantes de baqueta	
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco		Barbuquejo	

FIRMAS

ENTREGA

RECIBE

Revisó:	Revisó:	Aprobó:
Ing. Diego Fernando Saldaña	Ing. Diego Fernando Saldaña	Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 375 663-8	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
17	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: Daniel Augusto Pedraza Perez C.C. 1049628290

Cargo: Profesional apoyo Obra: -

DOTACIÓN PERSONAL

Botas _____ Talla _____

Overol _____ Talla _____

Pantalón _____ Talla _____

Camisa _____ Talla _____

Careta ~~Casco~~ X Talla _____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	_____	Protector Auditivo Tipo Copa	_____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	_____	Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	_____
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	_____	Botas impermeables con Puntera Acero	_____
Bota Impermeables sin Puntera	_____	Gafas de Seguridad	_____
Guantes Hilo y PVC	_____	Guantes de baqueta	_____
Guantes Dieléctricos	_____		_____
Tapabocas	_____	Respirador Contra Gases y Vapores	_____
Casco	_____	Barbuquejo	_____
	_____		_____

FIRMAS

Diego Saldaña
ENTREGA

Daniel Pedraza
RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 975 558-6	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
	OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha:05 -10 -2025
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN DE TRABAJO	Cód. FT- PRE - 55

dd	mm	aaaa
17	01	2026

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre: x Yerson antonio lopez C.C. x1002624251

Cargo: x ayudante Obra: _____

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	✓	Talla	40
Overol		Talla	
Pantalón		Talla	
Camisa		Talla	
Chaleco	Copa ✓	Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	✓	Protector Auditivo Tipo Copa	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota Impermeables sin Puntera		Gafas de Seguridad	✓
Guantes Hilo y PVC	✓	Guantes de baqueta	✓
Guantes Dieléctricos			
Tapabocas		Respirador Contra Gases y Vapores	
Casco	✓	Barbuquejo	
	✓		

FIRMAS

ENTREGA

RECIBE

Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Revisó: Ing. Diego Fernando Saldaña	Aprobó: Adriana Pedraza S R/L

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.868-5

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha: 05/10/2025
REGISTRO DE ENTREGA Y CAMBIO DE CONSUMIBLES EPP	Cod. FT-SIG-017

Enero - 2026 — Sede - Obra: Consorcio la candelaria — Lugar: Reigura

No	Fecha	Nombre del Trabajador	Elemento Entregado o Cambiado	Cargo	Firma
1	13-01-26	Oliver Martinez Rios	Guantes	conductor	
2	13/01/26	Fabio Beltran	Guantes, Gafas, Tapabocas		
3	13/01/26		Guantes		
4	13/01/26	Gregorio Perez	Guantes	oficial	
5	13/01/26	Gusjed Salazar	Guantes	obrero	
6	13/01/26	Moises Diaz	Guantes	Ayudante	
7	13/01/26	Livingston Lozano	Guantes	Ayudante	
8	13/01/26	Eduard Cordero	" "	Obrero	Eduard Cordero
9	13/01/26	Yeison D Suarez	guantes, gafas	maestro	
10	13/01/26	Julian Andres Triana	Guantes	maestro	
11	13/01/26	Fernando Cardenas	Guantes		
12	14/01/26		Guantes	Autobotafo	
13	19/01/26		Guantes		
14	19/01/26	Julian Andrés Triana	Gafas Tapabocas	maestro	
15	19/01/26	Edwardo Murcia	Tapabocas	C. trafico	
16	19/01/26		Tapabocas, Guantes, Tapones		
17	19/01/26	Mario Fernando Galindo	Tapabocas	Controladora	
18	19/01/26	Alfonso Tricarico	Casco Guantes Tap	Maestro	
19	19/01/26	Luz DARY RAMIREZ	Tapabocas	controladora	
20	15/01/26	Fabio Beltran	Tapaodos gafas	Oficial	
21	15/01/26	Fernando Cardenas	Guantes		
22	15/01/26	Diego Fernando Ulloa	Tapabocas	Controlador	
23	15/01/26	Maria Flores	Controlador	Tapabocas	
24	15/01/26	Fabio Beltran	Guantes	oficial	
25	16/01/26		Guantes y tapabocas		
26			Guantes		
27	19/01/26	Gregorio Perez	Gafas		
28	19/01/26	Abel Beltran	Gafas		
29	19/01/26	Maria Anas	Gafas	HSEQ	
30	19/01/26	Juan Bautista Martinez	Gafas y Guantes	OPERARIO	
31	19/01/26	Alfonso Tricarico	Guantes		
32	19/01/26	Edward Cordero	Guantes	Obrero	Eduard Cordero

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: Ing. Diego Fernando Saldaña Sanchez

Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT 901.976.668-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha: 05/10/2025
REGISTRO DE ENTREGA Y CAMBIO DE CONSUMIBLES EPP	Cod. FT-SIG-017

Enero 2026 Sede - Obra	Lugar
Consorcio la candelaria	Ragora

No	Fecha	Nombre del Trabajador	Elemento Entregado o Cambiado	Cargo	Firma
1	19/01/26	Gusjed Salazar	Guantes	Ayudante	
2	20/01/26	Marco D Cerón	Guantes para palas		
3	21/01/26				
4	21/01/26	Yubio Yohany B	Guantes cormaso nitri		Yubio B.
5	21/01/26	Yeison Antonio López	Guantes cormaso nit	Ayudante	
6	29/01/26	Gusjed Salazar	Guantes	Ayudante	
7	29/01/26	Eduard Cordero	Guantes	Oficio	Eduard Cordero
8	29/01/26	Aldemar Cor	Guantes.	OFICIAL	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Ing. Diego Fernando Saldaña Sanchez	

Powered by CamScanner

ANEXO 4

EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**LIVINSTON LOZANO SIERRA**			
DOCUMENTO	CC	Nº	12329117	
CARGO	Auxiliar de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

1.Tipo de evaluación		
Ingreso: X	Periódico:	Egreso:
Otro:	Cual:	

2. Riesgos a los que va a estar o estuvo expuesto el trabajador					
Riesgo Físico	X	Riesgo Psicosocial	X	Riesgos Biológicos	
Riesgo Químico		Condiciones de Seguridad		Ergonómico	X
Riesgo Biomecánico	X	Fenómenos Naturales	X	Exposición a Trabajo continuo con videoterminales	

3. Concepto de aptitud según el perfil requerido para el cargo	
Apto y satisfactorio desempeñar las funciones propias del cargo	
Apto y satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que no limita su capacidad laboral	**X**
Satisfactorio para desempeñar las Funciones Propias del Cargo con Condición de Salud que Limita su Capacidad Laboral	
Satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que puede agravarse con la ejecución de actividades propias del cargo	

4.Examenes y pruebas complementarias			
	Satisfactorio/ no satisfactorio		Satisfactorio/ nosatisfactorio
Examen Medico	Satisfactorio	Énfasis osteomuscular	Satisfactorio
Audiometría	Satisfactorio	Visiometría	Satisfactorio
Glicemia	Satisfactorio	Colesterol	Satisfactorio
Espirometria	Satisfactorio	Triglicéridos	Satisfactorio

5. Recomendaciones de orden ocupacional			
Uso de Elementos de Protección Personal (Tapaoídos y Tapabocas)	X	Continuar incapacitado	
Capacidad para el Cargo	X	Otro	

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**LIVINSTON LOZANO SIERRA**			
DOCUMENTO	CC	Nº	12329117	
CARGO	Auxiliar de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

6. Recomendaciones de Orden General			
Manejo de Patología por EPS		Medicación Transitoria o Permanente	
Practicar Deporte	**X**	Valoración por Medicina y Otros	
Hábitos Saludables en Alimentación	**X**	Se solicita uso de tapa oídos y tapabocas	**X**
Uso de gafas para desarrollo de la actividad laboral		Capacitar en Higiene Postural, Manejo Adecuado de Cargas y Pausas Activas para el Cargo	**X**

7. Ampliación de Recomendaciones

Examen físico: Paciente con sobrepeso, por lo que se recomienda hábitos y estilos de vida saludables.
Audiometría: Paciente sin alteraciones auditivas
Visiometría: Paciente sin alteraciones visuales
Resultados de Laboratorio: Satisfactorios, se anexan resultados de laboratorio.
Espirometria: Satisfactoria

Declaro que los datos que le he suministrado al médico que ha practicado el presente examen son verdaderos en todas sus partes y autorizo a dicho facultativo para que informe a la empresa todo lo relacionado con el estado actual de mi salud.

Firma del Profesional	
CAROL MORALES SUÁREZ C.C. 1049603505 Resolución Licencia SSO. 1455 de 14 de julio	FIRMA DEL TRABAJADOR 72329117 

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**EDWARD REINALDO CORDERO LOPEZ**			
DOCUMENTO	CC	Nº	810272	
CARGO	Auxiliar de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

1.Tipo de evaluación		
Ingreso: X	Periódico:	Egreso:
Otro:	Cual:	

2. Riesgos a los que va a estar o estuvo expuesto el trabajador					
Riesgo Físico	X	Riesgo Psicosocial	X	Riesgos Biológicos	
Riesgo Químico		Condiciones de Seguridad		Ergonómico	X
Riesgo Biomecánico	X	Fenómenos Naturales	X	Exposición a Trabajo continuo con videoterminales	

3. Concepto de aptitud según el perfil requerido para el cargo	
Apto y satisfactorio desempeñar las funciones propias del cargo	**X**
Apto y satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que no limita su capacidad laboral	
Satisfactorio para desempeñar las Funciones Propias del Cargo con Condición de Salud que Limita su Capacidad Laboral	
Satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que puede agravarse con la ejecución de actividades propias del cargo	

4.Examenes y pruebas complementarias			
	Satisfactorio/ no satisfactorio		Satisfactorio/ nosatisfactorio
Examen Medico	Satisfactorio	Énfasis osteomuscular	Satisfactorio
Audiometría	Satisfactorio	Visiometría	Satisfactorio
Glicemia	Satisfactorio	Colesterol	Satisfactorio
Espirometria	Satisfactorio	Triglicéridos	Satisfactorio

5. Recomendaciones de orden ocupacional			
Uso de Elementos de Protección Personal (Tapaoídos y Tapabocas)	X	Continuar incapacitado	
Capacidad para el Cargo	X	Otro	

MEDILAB OC
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca Bussines Tunja –Boyacá Tel: 3107590233
medilaboc@gmail.com

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**EDWARD REINALDO CORDERO LOPEZ**			
DOCUMENTO	CC	Nº	810272	
CARGO	Auxiliar de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

6. Recomendaciones de Orden General			
Manejo de Patología por EPS		Medicación Transitoria o Permanente	
Practicar Deporte	**X**	Valoración por Medicina y Otros	
Hábitos Saludables en Alimentación	**X**	Se solicita uso de tapa oídos y tapabocas	**X**
Uso de gafas para desarrollo de la actividad laboral		Capacitar en Higiene Postural, Manejo Adecuado de Cargas y Pausas Activas para el Cargo	**X**

7. Ampliación de Recomendaciones

Examen físico: Paciente sano en examen físico
Audiometría: Paciente sin alteraciones auditivas
Visiometría: Paciente sin alteraciones visuales
Resultados de Laboratorio: Satisfactorios, se anexan resultados de laboratorio.
Espirometria: Satisfactoria

Declaro que los datos que le he suministrado al médico que ha practicado el presente examen son verdaderos en todas sus partes y autorizo a dicho facultativo para que informe a la empresa todo lo relacionado con el estado actual de mi salud.

Firma del Profesional	
CAROL MORALES SUÁREZ C.C. 1049603505 Resolución Licencia SSO. 1455 de 14 de julio	Eduard Cordero FIRMA DEL TRABAJADOR 810272

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**GREGORIO RAFAEL PÉREZ LÓPEZ**			
DOCUMENTO	CC	Nº	6078212	
CARGO	Oficial de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

1.Tipo de evaluación		
Ingreso: X	Periódico:	Egreso:
Otro:	Cual:	

2. Riesgos a los que va a estar o estuvo expuesto el trabajador					
Riesgo Físico	X	Riesgo Psicosocial	X	Riesgos Biológicos	
Riesgo Químico		Condiciones de Seguridad		Ergonómico	X
Riesgo Biomecánico	X	Fenómenos Naturales	X	Exposición a Trabajo continuo con videoterminales	

3. Concepto de aptitud según el perfil requerido para el cargo	
Apto y satisfactorio desempeñar las funciones propias del cargo	
Apto y satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que no limita su capacidad laboral	**X**
Satisfactorio para desempeñar las Funciones Propias del Cargo con Condición de Salud que Limita su Capacidad Laboral	
Satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que puede agravarse con la ejecución de actividades propias del cargo	

4.Examenes y pruebas complementarias			
	Satisfactorio/ no satisfactorio		Satisfactorio/ nosatisfactorio
Examen Medico	Satisfactorio	Énfasis osteomuscular	Satisfactorio
Audiometría	Satisfactorio	Visiometría	Satisfactorio
Glicemia	Satisfactorio	Colesterol	Satisfactorio
Espirometria	Satisfactorio	Triglicéridos	Satisfactorio

5. Recomendaciones de orden ocupacional			
Uso de Elementos de Protección Personal (Tapaoídos y Tapabocas)	X	Continuar incapacitado	
Capacidad para el Cargo	X	Otro	

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**GREGORIO RAFAEL PÉREZ LÓPEZ**			
DOCUMENTO	CC	Nº	6078212	
CARGO	Oficial de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

6. Recomendaciones de Orden General			
Manejo de Patología por EPS		Medicación Transitoria o Permanente	
Practicar Deporte	**X**	Valoración por Medicina y Otros	
Hábitos Saludables en Alimentación	**X**	Se solicita uso de tapa oídos y tapabocas	**X**
Uso de gafas para desarrollo de la actividad laboral		Capacitar en Higiene Postural, Manejo Adecuado de Cargas y Pausas Activas para el Cargo	**X**

7. Ampliación de Recomendaciones

Examen físico: Paciente con obesidad, por lo que se dan indicaciones para implementar hábitos y estilos de vida saludables.

Audiometría: Paciente sin alteraciones auditivas

Visiometría: Paciente sin alteraciones visuales

Resultados de Laboratorio: Satisfactorios, se anexan resultados de laboratorio.

Espirometria: Satisfactoria

Declaro que los datos que le he suministrado al médico que ha practicado el presente examen son verdaderos en todas sus partes y autorizo a dicho facultativo para que informe a la empresa todo lo relacionado con el estado actual de mi salud.

Firma del Profesional	
CAROL MORALES SUÁREZ C.C. 1049603505 Resolución Licencia SSO. 1455 de 14 de julio	6078212 FIRMA DEL TRABAJADOR

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**DAVID JIMÉNEZ MONROY**			
DOCUMENTO	CC	Nº	5236240	
CARGO	Auxiliar de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

1.Tipo de evaluación		
Ingreso: X	Periódico:	Egreso:
Otro:	Cual:	

2. Riesgos a los que va a estar o estuvo expuesto el trabajador					
Riesgo Físico	X	Riesgo Psicosocial	X	Riesgos Biológicos	
Riesgo Químico		Condiciones de Seguridad		Ergonómico	X
Riesgo Biomecánico	X	Fenómenos Naturales	X	Exposición a Trabajo continuo con videoterminales	

3. Concepto de aptitud según el perfil requerido para el cargo	
Apto y satisfactorio desempeñar las funciones propias del cargo	
Apto y satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que no limita su capacidad laboral	**X**
Satisfactorio para desempeñar las Funciones Propias del Cargo con Condición de Salud que Limita su Capacidad Laboral	
Satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que puede agravarse con la ejecución de actividades propias del cargo	

4.Examenes y pruebas complementarias			
	Satisfactorio/ no satisfactorio		Satisfactorio/ nosatisfactorio
Examen Medico	Satisfactorio	Énfasis osteomuscular	Satisfactorio
Audiometría	Satisfactorio	Visiometría	Satisfactorio
Glicemia	Satisfactorio	Colesterol	Satisfactorio
Espirometria	No Satisfactorio	Triglicéridos	Satisfactorio

5. Recomendaciones de orden ocupacional			
Uso de Elementos de Protección Personal (Tapaoídos y Tapabocas)	X	Continuar incapacitado	
Capacidad para el Cargo	X	Otro	

MEDILAB OC
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca Bussines Tunja –Boyacá Tel: 3107590233
medilaboc@gmail.com

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**DAVID JIMÉNEZ MONROY**			
DOCUMENTO	CC	Nº	5236240	
CARGO	Auxiliar de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

6. Recomendaciones de Orden General			
Manejo de Patología por EPS		Medicación Transitoria o Permanente	
Practicar Deporte	**X**	Valoración por Medicina y Otros	
Hábitos Saludables en Alimentación	**X**	Se solicita uso de tapa oídos y tapabocas	**X**
Uso de gafas para desarrollo de la actividad laboral		Capacitar en Higiene Postural, Manejo Adecuado de Cargas y Pausas Activas para el Cargo	**X**

7. Ampliación de Recomendaciones

Examen físico: Paciente con sobrepeso e hipertensión arterial con adherencia al tratamiento, por lo que se dan indicaciones para implementar hábitos y estilos de vida saludables y control por su EPS.
Audiometría: Paciente sin alteraciones auditivas
Visiometría: Paciente sin alteraciones visuales
Resultados de Laboratorio: Satisfactorios, se anexan resultados de laboratorio.
Espirometria: No satisfactoria, se solicita manejo por terapía respiratoria por su EPS, así como disminución en el consumo de cigarrillo.

Declaro que los datos que le he suministrado al médico que ha practicado el presente examen son verdaderos en todas sus partes y autorizo a dicho facultativo para que informe a la empresa todo lo relacionado con el estado actual de mi salud.

Firma del Profesional	
CAROL MORALES SUÁREZ C.C. 1049603505 Resolución Licencia SSO. 1455 de 14 de julio	FIRMA DEL TRABAJADOR 5.236.240

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**YEISON ANTONIO LÓPEZ CARO**			
DOCUMENTO	CC	Nº	1002624254	
CARGO	Auxiliar de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

1.Tipo de evaluación		
Ingreso: X	Periódico:	Egreso:
Otro:	Cual:	

2. Riesgos a los que va a estar o estuvo expuesto el trabajador					
Riesgo Físico	X	Riesgo Psicosocial	X	Riesgos Biológicos	
Riesgo Químico		Condiciones de Seguridad		Ergonómico	X
Riesgo Biomecánico	X	Fenómenos Naturales	X	Exposición a Trabajo continuo con videoterminales	

3. Concepto de aptitud según el perfil requerido para el cargo	
Apto y satisfactorio desempeñar las funciones propias del cargo	**X**
Apto y satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que no limita su capacidad laboral	
Satisfactorio para desempeñar las Funciones Propias del Cargo con Condición de Salud que Limita su Capacidad Laboral	
Satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que puede agravarse con la ejecución de actividades propias del cargo	

4.Examenes y pruebas complementarias			
	Satisfactorio/ no satisfactorio		Satisfactorio/ nosatisfactorio
Examen Medico	Satisfactorio	Énfasis osteomuscular	Satisfactorio
Audiometría	Satisfactorio	Visiometría	Satisfactorio
Glicemia	Satisfactorio	Colesterol	Satisfactorio
Espirometria	Satisfactorio	Triglicéridos	Satisfactorio

5. Recomendaciones de orden ocupacional			
Uso de Elementos de Protección Personal (Tapaoídos y Tapabocas)	X	Continuar incapacitado	
Capacidad para el Cargo	X	Otro	

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**JEISON ANTONIO LÓPEZ CARO**			
DOCUMENTO	CC	Nº	1002624254	
CARGO	Auxiliar de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

6. Recomendaciones de Orden General			
Manejo de Patología por EPS		Medicación Transitoria o Permanente	
Practicar Deporte	**X**	Valoración por Medicina y Otros	
Hábitos Saludables en Alimentación	**X**	Se solicita uso de tapa oídos y tapabocas	**X**
Uso de gafas para desarrollo de la actividad laboral		Capacitar en Higiene Postural, Manejo Adecuado de Cargas y Pausas Activas para el Cargo	**X**

7. Ampliación de Recomendaciones

Examen físico: Paciente con sobrepeso, por lo que se dan indicaciones para implementar hábitos y estilos de vida saludables.

Audiometría: Paciente sin alteraciones auditivas

Visiometría: Paciente sin alteraciones visuales

Resultados de Laboratorio: Satisfactorios, se anexan resultados de laboratorio.

Espirometria: Satisfactoria

Declaro que los datos que le he suministrado al médico que ha practicado el presente examen son verdaderos en todas sus partes y autorizo a dicho facultativo para que informe a la empresa todo lo relacionado con el estado actual de mi salud.

Firma del Profesional

CAROL MORALES SUÁREZ
C.C. 1049603505
Resolución Licencia SSO. 1455 de 14 de julio

FIRMA DEL TRABAJADOR
1002624254

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**CARLOS JOSE CAMPOS AMUNDRAY**			
DOCUMENTO	CC	Nº	6059771	
CARGO				
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

1.Tipo de evaluación		
Ingreso: X	Periódico:	Egreso:
Otro:	Cual:	

2. Riesgos a los que va a estar o estuvo expuesto el trabajador					
Riesgo Físico	X	Riesgo Psicosocial	X	Riesgos Biológicos	
Riesgo Químico		Condiciones de Seguridad		Ergonómico	X
Riesgo Biomecánico	X	Fenómenos Naturales	X	Exposición a Trabajo continuo con videoterminales	

3. Concepto de aptitud según el perfil requerido para el cargo	
Apto y satisfactorio desempeñar las funciones propias del cargo	
Apto y satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que no limita su capacidad laboral	**X**
Satisfactorio para desempeñar las Funciones Propias del Cargo con Condición de Salud que Limita su Capacidad Laboral	
Satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que puede agravarse con la ejecución de actividades propias del cargo	

4.Examenes y pruebas complementarias			
	Satisfactorio/ no satisfactorio		Satisfactorio/ nosatisfactorio
Examen Medico	No Satisfactorio	Énfasis osteomuscular	Satisfactorio
Audiometría	Satisfactorio	Visiometría	Satisfactorio
Glicemia	Satisfactorio	Colesterol	Satisfactorio
Espirometria	Satisfactorio	Triglicéridos	Satisfactorio

5. Recomendaciones de orden ocupacional			
Uso de Elementos de Protección Personal (Tapaoídos y Tapabocas)	X	Continuar incapacitado	
Capacidad para el Cargo	X	Otro	

MEDILAB OC
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca Bussines Tunja –Boyacá Tel: 3107590233
medilaboc@gmail.com

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos **Medilab OC** **medilab.o**

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**CARLOS JOSE CAMPOS AMUNDRAY**			
DOCUMENTO	CC	Nº	6059771	
CARGO				
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

6. Recomendaciones de Orden General			
Manejo de Patología por EPS		Medicación Transitoria o Permanente	
Practicar Deporte	**X**	Valoración por Medicina y Otros	
Hábitos Saludables en Alimentación	**X**	Se solicita uso de tapa oídos y tapabocas	**X**
Uso de gafas para desarrollo de la actividad laboral		Capacitar en Higiene Postural, Manejo Adecuado de Cargas y Pausas Activas para el Cargo	**X**

7. Ampliación de Recomendaciones

Examen físico: Paciente con bradicardia, por lo que se solicita electrocardiograma para tramitar por su EPS y manejo prioritario por medicina general.
Audiometría: Paciente sin alteraciones auditivas
Visiometría: Paciente sin alteraciones visuales
Resultados de Laboratorio: Satisfactorios, se anexan resultados de laboratorio.
Espirometria: Satisfactoria

Declaro que los datos que le he suministrado al médico que ha practicado el presente examen son verdaderos en todas sus partes y autorizo a dicho facultativo para que informe a la empresa todo lo relacionado con el estado actual de mi salud.

Firma del Profesional	
CAROL MORALES SUÁREZ C.C. 1049603505 Resolución Licencia SSO. 1455 de 14 de julio	FIRMA DEL TRABAJADOR 6059771

MEDILAB OC
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca Bussines Tunja –Boyacá Tel: 3107590233
medilaboc@gmail.com

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**GUSJEDI FEDERICO SALAZAR BENTANCURT**			
DOCUMENTO	CC	Nº	6653912	
CARGO	Oficial de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

1.Tipo de evaluación		
Ingreso: X	Periódico:	Egreso:
Otro:	Cual:	

2. Riesgos a los que va a estar o estuvo expuesto el trabajador					
Riesgo Físico	X	Riesgo Psicosocial	X	Riesgos Biológicos	
Riesgo Químico		Condiciones de Seguridad		Ergonómico	X
Riesgo Biomecánico	X	Fenómenos Naturales	X	Exposición a Trabajo continuo con videoterminales	

3. Concepto de aptitud según el perfil requerido para el cargo	
Apto y satisfactorio desempeñar las funciones propias del cargo	
Apto y satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que no limita su capacidad laboral	**X**
Satisfactorio para desempeñar las Funciones Propias del Cargo con Condición de Salud que Limita su Capacidad Laboral	
Satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que puede agravarse con la ejecución de actividades propias del cargo	

4.Examenes y pruebas complementarias			
	Satisfactorio/ no satisfactorio		Satisfactorio/ nosatisfactorio
Examen Medico	Satisfactorio	Énfasis osteomuscular	Satisfactorio
Audiometría	Satisfactorio	Visiometría	Satisfactorio
Glicemia	Satisfactorio	Colesterol	Satisfactorio
Espirometria	Satisfactorio	Triglicéridos	Satisfactorio

5. Recomendaciones de orden ocupacional			
Uso de Elementos de Protección Personal (Tapaoídos y Tapabocas)	X	Continuar incapacitado	
Capacidad para el Cargo	X	Otro	

MEDILAB OC
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca Bussines Tunja –Boyacá Tel: 3107590233
medilaboc@gmail.com

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**GUSJEDI FEDERICO SALAZAR BENTANCURT**			
DOCUMENTO	CC	Nº	6653912	
CARGO	Oficial de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

6. Recomendaciones de Orden General			
Manejo de Patología por EPS		Medicación Transitoria o Permanente	
Practicar Deporte	**X**	Valoración por Medicina y Otros	
Hábitos Saludables en Alimentación	**X**	Se solicita uso de tapa oídos y tapabocas	**X**
Uso de gafas para desarrollo de la actividad laboral		Capacitar en Higiene Postural, Manejo Adecuado de Cargas y Pausas Activas para el Cargo	**X**

7. Ampliación de Recomendaciones

Examen físico: Paciente con obesidad, por lo que se dan indicaciones para implementar hábitos y estilos de vida saludables.

Audiometría: Paciente sin alteraciones auditivas

Visiometría: Paciente sin alteraciones visuales

Resultados de Laboratorio: Satisfactorios, se anexan resultados de laboratorio.

Espirometria: Satisfactoria

Declaro que los datos que le he suministrado al médico que ha practicado el presente examen son verdaderos en todas sus partes y autorizo a dicho facultativo para que informe a la empresa todo lo relacionado con el estado actual de mi salud.

Firma del Profesional	
CAROL MORALES SUÁREZ C.C. 1049603505 Resolución Licencia SSO. 1455 de 14 de julio	6653912 FIRMA DEL TRABAJADOR

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**NOEL ALEXANDER MOYA BRITO**			
DOCUMENTO	CC	Nº	15202932	
CARGO	Operador de placa huella			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

1.Tipo de evaluación		
Ingreso: X	Periódico:	Egreso:
Otro:	Cual:	

2. Riesgos a los que va a estar o estuvo expuesto el trabajador					
Riesgo Físico	X	Riesgo Psicosocial	X	Riesgos Biológicos	
Riesgo Químico		Condiciones de Seguridad		Ergonómico	X
Riesgo Biomecánico	X	Fenómenos Naturales	X	Exposición a Trabajo continuo con videoterminales	

3. Concepto de aptitud según el perfil requerido para el cargo	
Apto y satisfactorio desempeñar las funciones propias del cargo	
Apto y satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que no limita su capacidad laboral	**X**
Satisfactorio para desempeñar las Funciones Propias del Cargo con Condición de Salud que Limita su Capacidad Laboral	
Satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que puede agravarse con la ejecución de actividades propias del cargo	

4.Examenes y pruebas complementarias			
	Satisfactorio/ no satisfactorio		Satisfactorio/ nosatisfactorio
Examen Medico	Satisfactorio	Énfasis osteomuscular	Satisfactorio
Audiometría	Satisfactorio	Visiometría	Satisfactorio
Glicemia	Satisfactorio	Colesterol	No Satisfactorio
Espirometria	Satisfactorio	Triglicéridos	No Satisfactorio

5. Recomendaciones de orden ocupacional			
Uso de Elementos de Protección Personal (Tapaoídos y Tapabocas)	X	Continuar incapacitado	
Capacidad para el Cargo	X	Otro	

MEDILAB OC
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca Bussines Tunja –Boyacá Tel: 3107590233
medilaboc@gmail.com

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**NOEL ALEXANDER MOYA BRITO**			
DOCUMENTO	CC	Nº	15202932	
CARGO	Operador de placa huella			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

6. Recomendaciones de Orden General			
Manejo de Patología por EPS	**X**	Medicación Transitoria o Permanente	
Practicar Deporte	**X**	Valoración por Medicina y Otros	
Hábitos Saludables en Alimentación	**X**	Se solicita uso de tapa oídos y tapabocas	**X**
Uso de gafas para desarrollo de la actividad laboral		Capacitar en Higiene Postural, Manejo Adecuado de Cargas y Pausas Activas para el Cargo	**X**

7. Ampliación de Recomendaciones

Examen físico: Paciente con obesidad, por lo que se dan indicaciones para implementar hábitos y estilos de vida saludables.
Audiometría: Paciente sin alteraciones auditivas
Visiometría: Paciente sin alteraciones visuales
Resultados de Laboratorio: No Satisfactorios, se evidencia hiperlipidemia e hipertrigliceridemia, se anexan resultados de laboratorio.
Espirometria: Satisfactoria
Paciente quien presenta alto riesgo cardiovascular, dado dislipemia mixta por lo que se sugiere control inmediato por EPS.

Declaro que los datos que le he suministrado al médico que ha practicado el presente examen son verdaderos en todas sus partes y autorizo a dicho facultativo para que informe a la empresa todo lo relacionado con el estado actual de mi salud.

Firma del Profesional	
CAROL MORALES SUÁREZ C.C. 1049603505 Resolución Licencia SSO. 1455 de 14 de julio	

MEDILAB OC
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca Bussines Tunja –Boyacá Tel: 3107590233
medilaboc@gmail.com

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**MOISES DÍAZ LLERENA**			
DOCUMENTO	CC	Nº	1236441299	
CARGO	Oficial de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

1.Tipo de evaluación		
Ingreso: X	Periódico:	Egreso:
Otro:	Cual:	

2. Riesgos a los que va a estar o estuvo expuesto el trabajador					
Riesgo Físico	X	Riesgo Psicosocial	X	Riesgos Biológicos	
Riesgo Químico		Condiciones de Seguridad		Ergonómico	X
Riesgo Biomecánico	X	Fenómenos Naturales	X	Exposición a Trabajo continuo con videoterminales	

3. Concepto de aptitud según el perfil requerido para el cargo	
Apto y satisfactorio desempeñar las funciones propias del cargo	
Apto y satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que no limita su capacidad laboral	**X**
Satisfactorio para desempeñar las Funciones Propias del Cargo con Condición de Salud que Limita su Capacidad Laboral	
Satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que puede agravarse con la ejecución de actividades propias del cargo	

4.Examenes y pruebas complementarias			
	Satisfactorio/ no satisfactorio		Satisfactorio/ nosatisfactorio
Examen Medico	Satisfactorio	Énfasis osteomuscular	Satisfactorio
Audiometría	Satisfactorio	Visiometría	Satisfactorio
Glicemia	Satisfactorio	Colesterol	Satisfactorio
Espirometria	No Satisfactorio	Triglicéridos	Satisfactorio

5. Recomendaciones de orden ocupacional			
Uso de Elementos de Protección Personal (Tapaoídos y Tapabocas)	X	Continuar incapacitado	
Capacidad para el Cargo	X	Otro	

MEDILAB OC
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca Bussines Tunja –Boyacá Tel: 3107590233
medilaboc@gmail.com

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos **Medilab OC** **medilab.o**

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**MOISES DÍAZ LLERENA**			
DOCUMENTO	CC	Nº	1236441299	
CARGO	Oficial de obra			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

6. Recomendaciones de Orden General			
Manejo de Patología por EPS		Medicación Transitoria o Permanente	
Practicar Deporte	**X**	Valoración por Medicina y Otros	
Hábitos Saludables en Alimentación	**X**	Se solicita uso de tapa oídos y tapabocas	**X**
Uso de gafas para desarrollo de la actividad laboral		Capacitar en Higiene Postural, Manejo Adecuado de Cargas y Pausas Activas para el Cargo	**X**

7. Ampliación de Recomendaciones

Examen físico: Paciente sin alteraciones en el examen físico.
Audiometría: Paciente sin alteraciones auditivas
Visiometría: Paciente sin alteraciones visuales
Resultados de Laboratorio: Satisfactorios, se anexan resultados de laboratorio.
Espirometria: No satisfactoria, paciente con historia de asma.

Se sugiere disminuir el consumo de sustancias psicoativas.

Declaro que los datos que le he suministrado al médico que ha practicado el presente examen son verdaderos en todas sus partes y autorizo a dicho facultativo para que informe a la empresa todo lo relacionado con el estado actual de mi salud.

Firma del Profesional	
CAROL MORALES SUÁREZ C.C. 1049603505 Resolución Licencia SSO. 1455 de 14 de julio	moises FIRMA DEL TRABAJADOR 1236441299

MEDILAB OC
CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL Y LABORATORIO CLINICO
Carrera 1F Numero 40-149 Consultorio 406 Edificio Marca
Bussines Servicio al cliente 24h (Whatsapp 310-759-0233)
Síguenos Medilab OC medilab.o

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**JUAN BAUTISTA BARRERA**			
DOCUMENTO	CC	Nº	9143456	
CARGO	Operador Maquinaria Pesada			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

1.Tipo de evaluación		
Ingreso: X	Periódico:	Egreso:
Otro:	Cual:	

2. Riesgos a los que va a estar o estuvo expuesto el trabajador					
Riesgo Físico	X	Riesgo Psicosocial	X	Riesgos Biológicos	
Riesgo Químico		Condiciones de Seguridad		Ergonómico	X
Riesgo Biomecánico	X	Fenómenos Naturales	X	Exposición a Trabajo continuo con videoterminales	

3. Concepto de aptitud según el perfil requerido para el cargo	
Apto y satisfactorio desempeñar las funciones propias del cargo	
Apto y satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que no limita su capacidad laboral	**X**
Satisfactorio para desempeñar las Funciones Propias del Cargo con Condición de Salud que Limita su Capacidad Laboral	
Satisfactorio para desempeñar las funciones propias del cargo con condición de salud que puede agravarse con la ejecución de actividades propias del cargo	

4.Examenes y pruebas complementarias			
	Satisfactorio/ no satisfactorio		Satisfactorio/ nosatisfactorio
Examen Medico	Satisfactorio	Énfasis osteomuscular	Satisfactorio
Audiometría	No Satisfactorio	Visiometría	Satisfactorio
Glicemia	Satisfactorio	Colesterol	Satisfactorio
Espirometria	Satisfactorio	Triglicéridos	Satisfactorio

5. Recomendaciones de orden ocupacional			
Uso de Elementos de Protección Personal (Tapaoídos y Tapabocas)	X	Continuar incapacitado	
Capacidad para el Cargo	X	Otro	

CERTIFICADO OCUPACIONAL DE EXAMEN MEDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EMPRESA	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 9 0 1 9 7 6 6 6 8 6			
NOMBRE	**JUAN BAUTISTA BARRERA**			
DOCUMENTO	CC	Nº	9143456	
CARGO	Operador Motoniveladora			
FECHA	23 de enero de 2026	HORA	8:00 am	

6. Recomendaciones de Orden General			
Manejo de Patología por EPS		Medicación Transitoria o Permanente	
Practicar Deporte	**X**	Valoración por Medicina y Otros	**X**
Hábitos Saludables en Alimentación	**X**	Se solicita uso de tapa oídos y tapabocas	**X**
Uso de gafas para desarrollo de la actividad laboral		Capacitar en Higiene Postural, Manejo Adecuado de Cargas y Pausas Activas para el Cargo	**X**

7. Ampliación de Recomendaciones

Examen físico: Paciente con obesidad e hipertensión arterial, por lo que se dan indicaciones para implementar hábitos y estilos de vida saludables, así como control por su EPS.

Audiometría: Paciente con hipoacusia leve se solicita manejo por fonoaudiología por EPS.

Visiometría: Paciente sin alteraciones visuales

Resultados de Laboratorio: Satisfactorios, se anexan resultados de laboratorio.

Espirometria: Satisfactoria

Declaro que los datos que le he suministrado al médico que ha practicado el presente examen son verdaderos en todas sus partes y autorizo a dicho facultativo para que informe a la empresa todo lo relacionado con el estado actual de mi salud.

Firma del Profesional

CAROL MORALES SUÁREZ
C.C. 1049603505
Resolución Licencia SSO. 1455 de 14 de julio

FIRMA DEL TRABAJADOR
9143456

ANEXO 5
PREOPERACIONALES

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA APISONADOR TIPO CANGURO	Versión 01

MARCA: BOMAG MODELO: 2022 SERIE

OPERADO POR: RUBEN CARO LOCALIZACION: LA CANDELARIA EQUIPO No. MOTONIVELA

PERIODO: DEL 12 AL 18 DE Enero 2026

ITEM		HORÓMETRO:	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
COMPONENTES DE LA MAQUINA			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE INFERIOR	Escalones y Asideros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Neumaticos, pernos rueda, Aros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Area de Articulación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Trasmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de aceite Hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapas y Dispositivos de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y sujeciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros, Tubos, Mangueras y Accesorios Hidraulicos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Trasmisión en Circulo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acomplamiento de las cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuchillas y Bricas con puntera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (Limpieza, Pintura)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de Liquidos, agua, valvulina, aceite motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tuercas o pernos flojos o faltantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COMPARTIMENTOS MOTOR	Aceite de motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Refrigerante de Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Depurador del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras (Todas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Correas (Todas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA EXTERIOR	Luces, lentes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos, Ventanas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas, cierres		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas, sistema de lavado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA INTERIOR	Sistema de protección anti vuelco (ROPS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE SEGURIDAD	Kit Antiderrames (Kit Ambiental)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (Vigente)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Totalmente dotado)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Firma Operador: RUBEN CARO

FIRMA HSEQ:

OBSERVACIONES:

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-HS
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA APISONADOR TIPO CANGURO	Versión 01

MARCA: KOMATSU MODELO: 30'22 SERIE

OPERADO POR: RUBEN CARO LOCALIZACION: CASAMINA EQUIPO No. MOTONIVELADORA

PERIODO: DEL 19 AL 23 DE ENERO 2026

ITEM	COMPONENTES DE LA MAQUINA	HORIMETRO:	LUN. C	LUN. NC	MAR. C	MAR. NC	MIER. C	MIER. NC	JUEV. C	JUEV. NC	VIER. C	VIER. NC	SAB. C	SAB. NC	DOM. C	DOM. NC
PARTE INFERIOR	Escaleras y Andenes		✓		✓		✓		✓		✓					
	Señalización, llantas rueda, Pernos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Área de Articulación		✓		✓		✓		✓		✓					
	Aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque de aceite Hidráulico		✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces y Dispositivos de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Baterías y conexiones		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cilindros, Tubos, Mangueras y Accesorios Hidráulicos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Transmisión en Circulo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Acoplamiento de las cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cuchillas y Bridas con puntera		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (Limpieza, Pintura)		✓		✓		✓		✓		✓					✓
	Fugas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de: Lavadora, agua, valvolina, aceite motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tuercas o pernos flojos o faltantes		✓		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMENTOS MOTOR	Aceite de motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Refrigerante de Motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Depurador del motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras (Todas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Correas (Todas)		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA EXTERIOR	Luces, lentes		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos, Ventanas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas, cierres		✓		✓		✓		✓		✓					
	Limpiabrisas, sistema de lavado		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA INTERIOR	Sistema de protección anti vuelco (ROPS)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPOS DE SEGURIDAD	Kit Antiderrames (Kit Ambiental)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor (Vigente)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin (Totalmente dotado)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Aire		✓		✓		✓		✓		✓					

Firma Operador

FIRMA HSEQ

OBSERVACIONES

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA APISONADOR TIPO CANGURO	Versión 01

MARCA: BOMAG MODELO: 35SE SERIE

OPERADO POR: EDISON CAÑO LOCALIZACION: LA CANDELARIA EQUIPO No. MOTONIVELA

PERIODO: DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

ITEM		HORÓMETRO:	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
COMPONENTES DE LA MAQUINA			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE INFERIOR	Escalones y Asideros		✓		✓		✓		✓		✓					
	Neumáticos, pernos rueda, Freno		✓		✓		✓		✓		✓					
	Area de Articulación		✓		✓		✓		✓		✓					
	Aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque de aceite Hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tapas y Dispositivos de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Baterias y conexiones		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cilindros, Tubos, Mangueras y Accesorios Hidraulicos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Transmisión en Circulo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Acoplamiento de las cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cuchillas y Bricas con puntera		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (Limpieza, Pintura)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Fugas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de Liquidos, agua, valvolina, aceite motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tuercas o pernos flojos o faltantes		✓		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMENTOS MOTOR	Aceite de motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Refrigerante de Motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Depurador del motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras (Todas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Correas (Todas)		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA EXTERIOR	Luces, lentes		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos, Ventanas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas, cierres		✓		✓		✓				✓					
	Limpiabrisas, sistema de lavado		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA INTERIOR	Sistema de protección anti vuelco (ROPS)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPOS DE SEGURIDAD	Kit Antiderrames (Kit Ambiental)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor (Vigente)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin (Totalmente dotado)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Aire		✓		✓		✓		✓		✓					

Firma Operador: [signature]

FIRMA HSEQ: [signature]

OBSERVACIONES:

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2023
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA APISONADOR TIPO CANGURO	Versión 01

MARCA: BOMAG MODELO: BW22 SERIE: GD

OPERADO POR: [illegible] LOCALIZACION: LA CAMPA EQUIPO No. [illegible]

PERIODO: DEL 05 AL 10 DE ENERO 2024

ITEM			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	CONPARTIMENTOS DE LA MAQUINA	HOROMETRO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE INTERIOR	Escalones y Asideros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acomodadores necesarios, Tuercas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Area de Articulación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de aceite Hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Topes y Dispositivos de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y conectores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros, Tubos, Mangueras y Accesorios Hidraulicos		✓		✓		✓		-		✓		✓			
	Transmisión en Circuito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acomplamiento de las cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuchillas y Bricas con puntera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (Limpieza, Pintura)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de Liquidos, agua, valvolina, aceite motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tuercas o pernos flojos o faltantes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COMPARTIMENTOS MOTOR	Aceite de motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Refrigerante de Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Depurador del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras (Todas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Correas (Todas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA EXTERIOR	Luces, lentes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos, Ventanas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas, cierres		✓		✓		-		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas, sistema de lavado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA INTERIOR	Sistema de proteccion anti vuelco (ROPS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE SEGURIDAD	Kit Antiderrames (Kit Ambiental)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (Vigente)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Totalmente dotado)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aire		✓		✓		-		✓		✓		✓			

Firma Operador: [illegible]

FIRMA HSEQ: [illegible]

OBSERVACIONES:

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 926 668-6	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA MEZCLADORA	Versión 01

MARCA: _____ **MODELO:** _____ **SERIE** _____

OPERADO POR: Julian Triana **LOCALIZACION:** Reguira **EQUIPO No.** _____

PERIODO: DEL 25 **AL** 31 **DE** Enero 2026.

ITEM	HOROMETRO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
COMPONENTES DE LA MAQUINA	CANTIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Poleas															
Medidor de aceite						X									
Tapa de combustible						X									
Bujía						X									
Tupo de escape						X									
Correas						X									
Choque						X									
Yoyo						X									
Acelerador						X									
Volante de operación						X									
Motor						X									
Filtro de Combustible						X									
Tapón de combustible						X									
Tornillos en general						X									
Guarda de los Piñones						X									
Tambor						X									
Estrias de compactación						X									
Llantas						X									
Engrase en General						X									
Balineras						X									
Freno de seguridad (tambor)						X									
Pintura y aseo en general						X									
Otra						X									

OBSERVACIONES: El manubrio de la mezcladora se dobla por un golpe cogiendo la compuerta de una volqueta, se solicita arreglo. Julian Triana

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 076 868-6	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA MEZCLADORA	Versiòn 01

MARCA: _____ **MODELO:** _____ **SERIE** _____

OPERADO POR: Julian Triana. **LOCALIZACION:** Ragonvalia. **EQUIPO No.** _____

PERIODO: DEL 19 **AL** 23 **DE** Enero 2026.

ITEM	HOROMETRO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
COMPONENTES DE LA MAQUINA	CANTIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Poleas								X							
Medidor de aceite								X							
Tapa de combustible								X							
Bujía								X							
Tupo de escape								X							
Correas								X							
Choque								X							
Yoyo								X							
Acelerador								X							
Volante de operación								X							
Motor								X							
Filtro de Combustible								X							
Tapón de combustible								X							
Tornillos en general								X							
Guarda de los Piñones								X							
Tambor								X							
Estrias de compactación								X							
Llantas								X							
Engrase en General								X							
Balineras								X							
Freno de seguridad (tambor)								X							
Pintura y aseo en general								X							
Otra								X							

OBSERVACIONES: Julian Triana

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 376 668-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA MEZCLADORA	Versión 01

MARCA: _____ **MODELO:** _____ **SERIE** _____

OPERADO POR: Julian Triana **LOCALIZACION:** Daguira **EQUIPO No.** _____

PERIODO: DEL 12 **AL** 18 **DE** Enero 2026.

ITEM	HOROMETRO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
COMPONENTES DE LA MAQUINA	CANTIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Poleas															
Medidor de aceite				X		X									
Tapa de combustible				X		X									
Bujía				X		X									
Tupo de escape				X		X									
Correas				X		X									
Choque				X		X									
Yoyo				X		X									
Acelerador				X		X									
Volante de operación				X		X									
Motor				X		X									
Filtro de Combustible				X		X									
Tapón de combustible				X		X									
Tornillos en general				X		X									
Guarda de los Piñones				X		X									
Tambor				X		X									
Estrias de compactación				X		X									
Llantas				X		X									
Engrase en General				X		X									
Balineras				X		X									
Freno de seguridad (tambor)				X		X									
Pintura y aseo en general				X		X									
Otra				X		X									

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT. 901 576 668-6	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA MEZCLADORA	Versiòn 01

MARCA: _____ **MODELO:** _____ **SERIE** _____

OPERADO POR: Julian triana. **LOCALIZACION:** Paquiva **EQUIPO No.** _____

PERIODO: DEL 05 **AL** 11 **DE** Enero 2026

ITEM	HOROMETRO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
COMPONENTES DE LA MAQUINA	CANTIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Poleas															
Medidor de aceite		X						X							
Tapa de combustible		X						X							
Bujía		X						X							
Tupo de escape		X						X							
Correas		X						X							
Choque		X						X							
Yoyo		X						X							
Acelerador		X						X							
Volante de operación		X						X							
Motor		X						X							
Filtro de Combustible		X						X							
Tapón de combustible		X						X							
Tornillos en general		X						X							
Guarda de los Piñones		X						X							
Tambor		X						X							
Estrias de compactación		X						X							
Llantas		X						X							
Engrase en General		X						X							
Balineras		X						X							
Freno de seguridad (tambor)		X						X							
Pintura y aseo en general		X						X							
Otra		X						X							

OBSERVACIONES: Julian Triana

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA APISONADOR TIPO CANGURO	Versiòn 01

MARCA: _____ MODELO: _____ SERIE _____

OPERADO POR: Juliana Triana. LOCALIZACION: Pagoro EQUIPO No. _____

PERIODO: DEL 26 AL 31 DE Enero. 2026.

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		HOROMETRO:														
ITEM		CANTIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
COMPONENTES DE LA MAQUINA																
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	rotos, dañados, fisurados, quemados		X													
PALANCA DEL ACELERADOR	instalada y funcionando correctamente		X													
FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Limpios		X													
RESORTES	Lubricados		X													
ZAPATAS	sin fisuras, rupturas, tornillos sueltos		X													
PALANCAS DE ACELERADOR, DESCOMPRESION y SILENCIADOR	Funcionando		X													
NIVELES DE ACEITE	Inspeccionar por la mirilla		X													
FUELLE	sin fisuras, rupturas, daños		X													
YOYO	Funcional, con tapa		X													
ESTADO GENERAL	Sin fisura, rupturas, aseo		X													
ACCESORIOS DE SEGURIDAD			X													

Firma Operador: Juliana Triana

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA HSEQ:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 515 882-3	CONSORCIO LA CANDELARIA	01/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA APISONADOR TIPO CANGURO	Versión 01

MARCA: _____ MODELO: _____ SERIE _____

OPERADO POR: Julian Bravo LOCALIZACION: Pereira EQUIPO No. _____

PERIODO: DEL 19 AL 25 DE Enero 2026

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		HOROMETRO:														
ITEM		CANTIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
COMPONENTES DE LA MAQUINA																
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	rotos, dañados, fisurados, quemados								Y							
PALANCA DEL ACELERADOR	instalada y funcionando correctamente								Y							
FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Limpios								Y							
RESORTES	Lubricados								Y							
ZAPATAS	sin fisuras, rupturas, tornillos sueltos								Y							
PALANCAS DE ACELERADOR, DESCOMPRESION y SILENCIADOR	Funcionando								Y							
NIVELES DE ACEITE	Inspeccionar por la mirilla								Y							
FUELLE	sin fisuras, rupturas, daños								Y							
YOYO	Funcional, con tapa								Y							
ESTADO GENERAL	Sin fisura, rupturas, aseo								Y							
ACCESORIOS DE SEGURIDAD									Y							

Firma Operador: Julian Bravo C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA HSEQ: _____

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA APISONADOR TIPO CANGURO	Versión 01

MARCA: _____ MODELO: _____ SERIE _____

OPERADO POR: Julian Tirado LOCALIZACION: Laguna EQUIPO No. _____

PERIODO: DEL 13 AL 18 DE Enero 2026

ITEM		HORÓMETRO:	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
COMPONENTES DE LA MAQUINA		CANTIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	rotos, dañados, fisurados, quemados				X											
PALANCA DEL ACELERADOR	instalada y funcionando correctamente				X											
FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Limpios				X											
RESORTES	Lubricados				X											
ZAPATAS	sin fisuras, rupturas, tornillos sueltos				X											
PALANCAS DE ACELERADOR, DESCOMPRESION y SILENCIADOR	Funcionando				X											
NIVELES DE ACEITE	Inspeccionar por la mirilla				X											
FUELLE	sin fisuras, rupturas, daños				X											
YOYO	Funcional, con tapa				X											
ESTADO GENERAL	Sin fisura, rupturas, aseo				X											
ACCESORIOS DE SEGURIDAD					X											

Firma Operador: Julian Tirado C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA HSEQ: _____

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 936 888-8	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA APISONADOR TIPO CANGURO	Versiòn 01

MARCA: _____ **MODELO:** _____ **SERIE** _____

OPERADO POR: Julian Triana. **LOCALIZACION:** Ragonia **EQUIPO No.** _____

PERIODO: DEL 05 **- AL** 11 **DE** Enero **-** 2026

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		HOROMETRO:														
ITEM		CANTIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
COMPONENTES DE LA MAQUINA																
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	rotos, dañados, fisurados, quemados												✓			
PALANCA DEL ACELERADOR	instalada y funcionando correctamente												✓			
FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE	Limpios												✓			
RESORTES	Lubricados												✓			
ZAPATAS	sin fisuras, rupturas, tornillos sueltos												✓			
PALANCAS DE ACELERADOR, DESCOMPRESION y SILENCIADOR	Funcionando												✓			
NIVELES DE ACEITE	Inspeccionar por la mirilla												✓			
FUELLE	sin fisuras, rupturas, daños												✓			
YOYO	Funcional, con tapa												✓			
ESTADO GENERAL	Sin fisura, rupturas, aseo												✓			
ACCESORIOS DE SEGURIDAD													✓			

Firma Operador: Julian Andres Triana C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA HSEQ:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR	Versión 01

MARCA: BOMAG MODELO: 2023 SERIE

OPERADO POR: CARLOS AP LOCALIZACION: LA CANDELARIA EQUIPO No. 211 D

PERIODO: DEL 05 AL 11 DE Enero 2026

	ITEM	HOROMETRO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	COMPONENTES DE LA MAQUINA	CANTIDAD:	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X			
CABINA	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios 10 lbs POS		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)		X	X	X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X			
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Espejo retrovisor central (convexo)			X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales															
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidraulicas		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	Puntos de lubricación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección (terminales, bomba hidraulica)		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X		X			
	* Motor		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	Batería y cables		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			

Firma Operador: CARLOS ARTURO PUC C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA HSEQ:

OBSERVACIONES: SE REQUIERE EL ESPEJO RETROVISOR

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR	Versión 01

MARCA: BOMAG MODELO: 2023 SERIE

OPERADO POR: CARLOS AP LOCALIZACION: LA CANDELARIA EQUIPO No. 211 D

PERIODO: DEL 12 AL 18 DE Enero 2026.

	ITEM / COMPONENTES DE LA MAQUINA	HOROMETRO CANTIDAD:	LUN. C	LUN. NC	MAR. C	MAR. NC	MIER. C	MIER. NC	JUEV. C	JUEV. NC	VIER. C	VIER. NC	SAB. C	SAB. NC	DOM. C	DOM. NC
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		\		\		\		X		\		\			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X			
CABINA	*Cabina antivuelco (ROPS)		X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad		X	X	X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios 10 lbs ABC		X	X	X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Manijas de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidraulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)		X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X			
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Espejo retrovisor central (convexo)			X		X		X		✓		X		X		
	Estado de pedales															
	Estado de mandos manuales			X		X	X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidraulicas		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	Puntos de lubricación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección (terminales, bomba hidraulica)		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X		X			
	* Motor		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	Batería y cables		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del pasador		X		X		X		X		X		X			

Firma Operador: CARLOS ARTURO FULIDO C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA HSEQ:

OBSERVACIONES: SE REQUIERE EL ESPEJO RETROVISOR

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-058
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR	Versión 01

MARCA: BOMAG MODELO: 2023 SERIE

OPERADO POR: CARLOS AP LOCALIZACION: LA CANDELARIA EQUIPO No. 211 D

PERIODO: DEL 19 AL 25 DE Enero 2026.

ITEM	COMPONENTES DE LA MAQUINA	HOROMETRO CANTIDAD:	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X			
CABINA	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)		X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X			
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Espejo retrovisor central (convexo)			X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales															
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	Puntos de lubricación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X		X			
	* Motor		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			

Firma Operador: CARLOS ARTURO PACHECO C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA HSEQ:

OBSERVACIONES: SE REQUIERE EL ESPEJO RETROVISOR

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT-SST-038
	CONSORCIO LA CANDELARIA	9/11/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR	Versión 01

MARCA: BOMAG MODELO: 2023 SERIE

OPERADO POR: CARLOS AP LOCALIZACION: CANDELARIA EQUIPO No. 211 D

PERIODO: DEL 26 AL 31 DE ENERO 2026

	ITEM	NOROMETRO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	COMPONENTES DE LA MAQUINA	CANTIDAD:	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X		X			
CABINA	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)		X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X			
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales															
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	Puntos de lubricación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X		X			
	* Motor		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X	/	X			

Firma Operador: CARLOS ARTURO PULIDO C: CUMPLE NC: NO CUMPLE

FIRMA HSEQ:

OBSERVACIONES: SE REQUIERE EL ESPEJO RETROVISOR

Powered by CamScanner

ANEXO 6

CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT 901 078 880-5

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha: 08/10/2025
REGISTRO DE ASISTENCIA	Cod. FT-SIG-018

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Consorcio la candelaria	Requisa	07	01	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Uso de los EPP's
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Capacitación		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Mario R Ramírez	1[illegible]321		
2	Dilsa Fernanda Durado	1052109[illegible]94	Contratadora	Dilsa Fernanda D.
3	Alberto Prieto	2[illegible]8	Maestro	Alberto Prieto
4	[illegible]	[illegible]		
5	Fernando	60[illegible]36		Fernando
6	Fabio Gilmar B.			Fabio B.
7	Julian Andres Tirado	1057.075.398	maestro	
8	Jhon Martinez	7113[illegible]6	operador	
9	Jhon Hernandez	96[illegible]572	OP	
10	Juan G. C[illegible]	A3[illegible]01	INSPECTOR	
11	LUZ DARY RAMIREZ	23937910	CONTROLADOR	
12	Juan Martinez	6976154	Contratista	
13	Fabio tenorio	1055[illegible]554	operador	Fabio tenorio
14	Gustavo Salazar	66539[illegible]	Obrero	
15	Eduard Cordero	810272	obrero	Eduard Cordero
16	David Jimenez M	5.236.240		David
17	CARLOS ARTURO P[illegible]ZA	1116992019	OPERADOR	CARLOS A.P.
18	Gregorio Perez	6078212	Oficial	
19	RAFAEL NUÑEZ	9953996 3	OPERADOR	
20	RUBEN DARIO CORREA	3481053[illegible]	OP MOTO	
21				
22				

Observaciones: Se explica a los trabajadores el uso correcto de epps para evitar de esa manera lesiones o enfermedades laborales.

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
DIEGO FERNANDO SANCHEZ SEPÚLVEDA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT 901 926 688-8

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha: 00/00/2025
REGISTRO DE ASISTENCIA	Cód. FT-SST-000

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Consorcio la candelaria	Ragonvalia	10	01	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Comunicación asertiva.
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Capacitación		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Eduard Cortero	.816272	Obrero	Eduard Cortero
2	Alonso Tarazona	7272(4)26	Maestro	Alonso Tarazona
3	Mauro A Suarez	1114721		
4	Moises Diaz	1.236.441.299	Obrero	Moises Diaz
5	Carlos Gonzalez	6a 59 71		
6	LUZ DARY RAMIREZ B	73973910	CONTRATISTA	
7	Julian André Triana	1057.575.398	maestro	
8	JHON Hernandez	EG-614577	Op	
9	Juan Martinez	6776554	Contratista	
10	Juan G - Gtuj	4305181	ENSTEMA	
11	Tun Martinez	7113330136	operador	
12	Gusedi Sylvia	66.53912	Obrero	
13	Diba Fernanda Dorado	1057897794	Contratista	Diba Fernanda.
14	Gregorio Perez	6078212		
15	Fabio rento	1057222559	operador	Fabio Rento
16	CARLOS ANTONIO PUNG	1116797019	OPERADOR	CARLOS AP
17	RUBEN DARIO CAMPO P	74810538	OP MOTO	
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones: Se habla de como el decir las cosas de manera cordial evita enfrentamientos o rencillas que puedan causar accidentes/lesiones.

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
DIEGO FERNANDO SANCHEZ SALDAÑA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 076 588-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
	OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha: 05/10/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Cod. FT-SIG-016

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Consorcio la candelaria	Raguira	14	01	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Trabajo en el limite de la via
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Capacitación		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Alfonso Triana	[illegible]	Maestro	Alfonso Triana
2	Marco A Lopez	4116321	maestro	
3	Fabio Yohany B.			
4	[illegible]	6.591771		
5	Juan [illegible]	7413730136	Operador	
6	Jhon Hernandez	86014516	OTP	
7	Juan C. Cifuentes	4375181	INSPECTOR	
8	Julian Andres Triana Marin	1057.075.798	Maestro	
9	Juan C. Cifuentes	4375181	INSPECTOR	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	Juan Martinez	6796554	Contratista	
12	Fabio tenza	1057322559	operador	Fabio tenza
13	CARLOS ARTUNDUAGA	1116992019	OPERADOR	CARLOS A
14	LUZ DARY RAMIREZ	23973910	CONTRATISTA	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16				
17	Gusseli [illegible]	6653912		
18	Eduard Cordero	810 272	Obrero	Eduard Cordero
19				
20	Gregorio Perez	6078212	Oficial	
21				
22				

Observaciones: identificar riesgos para lograr la prevencion de accidentes como atropellamientos, choques de vehiculos o mortales.

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
DIEGO FERNANDO SANCHEZ	SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT 901 578 665-5

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha: 05/10/2025
REGISTRO DE ASISTENCIA	Cod. FT-SIG-016

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Pasquilla Consorcio la candelaria	Ragonvalia.	21	01	26.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Concentración Pausa activa. "Conteo loco"
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Capacitación		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	[illegible]	74816538	[illegible]	[signature]
2	Marco D Suarez	4114321		[signature]
3	Ferdinando Cardenas	6014634		Ferdinando
4	Moises Diaz	1236447297		Moisés
5	Gusyedy Salazar	6653912	Obrero	[signature]
6	Jumston Lozano Sierra	72329117	Obrero	[signature]
7	Eduard Cordero	810272	obrero	Eduard Cordero
8	Fabio Yohany B.			Fabio B
9	NOEL MOYA	15202932		[signature]
10	Juan Martinez	74330136	Operador	[signature]
11	Juan Martinez	6776554	Contolador	Juan
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones: Se realiza pausa activa con el fin de explicar por que la importancia de esta y como la rutina nos puede generar evento de [illegible] accidentes.

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
DIEGO FERNANDO SANCHEZ SALPAÑA	[signature]

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT 901 478 686-8	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 06
	OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha: 05/10/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Cod. FT-SIG-016

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Consorcio la candelaria	Dagura	24	01	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		"Aire bueno y aire malo"
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Capacitación		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Eduard Cordero	810272	Obrero	Eduard Cordero
2	David Torres	1004455406	Auxiliar	David Torres
3	Alvaro Jose	1124050452	Auxiliar	Alvaro Jose
4	Yeison Antonio Lopez	1007624751	Auxiliar	
5	Julian Andrés Triana Marin	1057.875.398	maestro	
6	Alfonso Triana	79786944	Maestro	Alfonso Triana
7	Gusyedi Salazar	6653912	Ayudante	
8	Fabio Yohany Buitrago	1074412418	maestro	Fabio B.
9	Marco A Suarez	1114321	Maestro	
10	David Jimenez M.	5.236.240	Ayudante	
11	Moises Diaz	1236447299	Ayudante	Moises
12	Juan Martinez	6796554	Contolador	Juan
13		6859974		
14	Edwardo Murcia	1124510	C. Trafico	
15	Jaén G. Cifuentes	4375181	INSPECTOR	
16	Luz DARY RAMIREZ B.	23973910	c trafico	
17	Hayler Florez	1015577868	c trafico	
18	Fabian Andres Rios	1002735649	A. topografia	
19				
20				
21				
22				

Observaciones: Identificar los riesgos y recordar que el uso de tapabocas es importante para evitar accidentes o enfermedades laborales.

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
DIEGO FERNANDO SANCHEZ SALDAÑA	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
	OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha: 05/10/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Cod. FT-SIG-016

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Consorcio la Candelaria	Parque	25	01	26

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción
Reinducción
Charla de seguridad
Reunión de SST / Operativa
Capacitación
Capacitación específica al cargo
Otra

TEMAS TRATADOS

Importancia del uso del casco.

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Mauricio Martinez	6796554	Contratista	
2	Yeison Ortiz	1006626153	Mudante	
3	Eddie Lancheros	[illegible]		
4	Jhon Jairo Rodriguez	1014412818		
5	Juan Linares	71474506	operador	
6	Edilberto Rodriguez	1052 647 079		Edilberto
7	Jaylon Andres Triana	1057.015 398	maestro	
8	Eduard Cordero	810272	Obrero	Eduard Cordero
9	Alcides Jose Perez Alvarez	1120542462	Auxiliar	Alcides Perez
10	Jesus David Tarazona Olivera	1004485486	Auxiliar	
11	Jhonston Jhoan Serna	72329117	Auxiliar	
12	Gustavo Salazar	6653912	Ayudante	
13	Oldemar Cor-	1.007.115071	OFICIAL	
14	Moises Diaz	1236441299	AYUDANTE	Moises
15	David Jimenez M	5236240	AYUDANTE	
16	Noel Hoyos	15202954		
17	Marco A Suarez	1111321	Maestro	
18	Juan Martinez	74330136	operador	
19				
20				
21				
22				

Observaciones: Se recuerda y fortalece la importancia del uso de casco dentro de la obra para prevenir accidentes graves o mortales.

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
DIEGO FERNANDO SANCHEZ SALDAÑA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT 901 976.666-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00
OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA	Fecha: 05/10/2025
REGISTRO DE ASISTENCIA	Cod. FT-SIG-016

Sede - Obra	Lugar	DD	MM	AA
Consorcio la candelaria	Roquira	17	01	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Uso de Tapabidos
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Capacitación		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Eduard Cordero	.810272	obrero	Eduard Cordero
2	LUZ DARY RAMIREZ	23973910	CONTRATISTA	
3	Moises Diaz	1.236441299	obrero	Moises Diaz
4	Marco A Suarez	1114324		
5	Ivan Martinez	6776554	Contratista	
6	Alfredo Cortes	6659771		
7	Alfonso Trivilo	7272465	Maestro	
8	Fabio Yolmar B.			
9	Fernando	6046636		
10	Julian Andres Triana	1057 075 348	maestro	
11	Juan Martinez	741 330 136	operador	
12	Fabio orlando tenjo	1052279559		
13	Jhon Hernandez	86014572	OP	
14	Dilsa Fernanda Parada	1053894704	Contratista	
15	Gustavo Silva	6657912		
16	Julian G. Cifuentes	4378181	INSPECTOR	
17	Gregorio Perez	6078212	OFICIAL	
18	CARLOS ANTONIO PINEDO	1116922019	OP	CARLOS PD
19	ROBSEN DARIO CARO P	74810578	OP	MOTO
20				
21				
22				

Observaciones: se enseña el correcto uso de tapabidos para evitar enfermedades laborales.

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
DIEGO FERNANDO SANCHEZ	

Powered by CamScanner

ANEXO 7
ACTA REUNION COPASST

CONSORCIO LA CANDELARIA NIT. 901.976.668-6	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OBRA: CONSORCIO LA CANDELARIA FORMATO ACTAS DE REUNIÓN	Versión: 00 Fecha:05 -10 -2025 Cód. FT- SIG -13

ACTA Nº 01

Fecha: 20/01/2026	**Lugar:** Ragira - Boyaca
Tipo de reunión: COPASST.	

Temas a tratar:

1. Revisión de Botiquines.
2. Brigadas.
3. Capacitación

Desarrollo de la reunión:

Se verifica el quorum completo para el desarrollo de la presente reunión, donde se solicita. por parte de COPASST. lo siguiente como prioridad, la revisión de botiquines, conformación de brigada de emergencias. y solicitud de capacitación a paleteros, se realiza revisión de PMT donde se revisa la señalización en puntos criticos, se realiza revisión de charlas de seguridad y actividades realizadas.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-013
Ing. Diego Fernando Saldaña Sánchez	Ing. Diego Fernando Saldaña Sánchez		Fecha de modificación: 04/10/2025

Powered by CamScanner

Compromisos:
- Revisión de botiquines antes del 06/02/2026.
- Conformación de brigada de emergencias con fecha limite 13/02/2026.
- Solicitud de capacitaciones para controladores.
Observaciones:

Firma de los asistentes

Juan Mauricio Martinez Rojas jlbs8.	Representante Principal de Administración
	Representante de los Trabajadores.
DIEGO FERNANDO SANCHEZ.	ESPESIALISTA HSEQ.

Powered by CamScanner

ANEXO 8

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

FT-SST- 48
Rev. A
Versión: 00

INDICADORES DEL SG-SST


CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6


Proceso:	Operativo
Obra - proyecto:	Consorcio la Candelaria
Indicador:	Accidentalidad.
Responsable:	HSE
Constante "K":	100
Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:	1000

Datos	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Consolidado
Total trabajadores en el mes	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Σ de accidentes de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días de incapacidad por accidente de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de accidentes de trabajo con incapacidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de accidentes de trabajo mortales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de investigaciones de accidentes de trabajo realizadas y enviadas por correo electrónico al Coordinador HSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de accidentes de trabajo Reportados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formula	Nivel de Desagregación	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Consolidado
(Σ de accidentes de trabajo en el mes / numero de trabajadores en el mes)/100	Índice de frecuencia de accidente de trabajo.	0,0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
Σ de días de incapacidad por accidente de trabajo + dias cargados en el mes / numero de trabajadores mes)*100	Índice de Severidad de accidentes de trabajo	0,0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	Proporción de accidentes mortales	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
Total de accidentes de trabajo Investigados / Total de accidentes de trabajo	Investigaciones de Accidentes de Trabajo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Total de accidentes de trabajo Reportados/ Total de accidentes de trabajo	Reporte de Accidentes de Trabajo	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



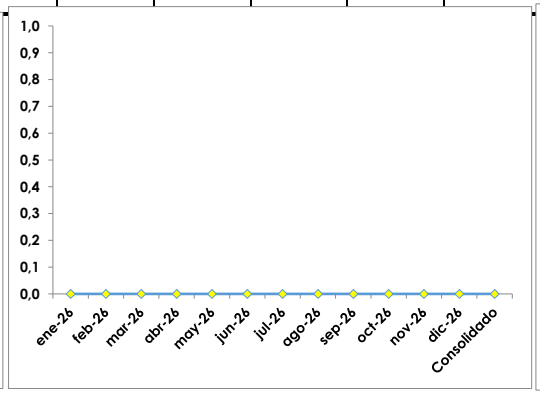

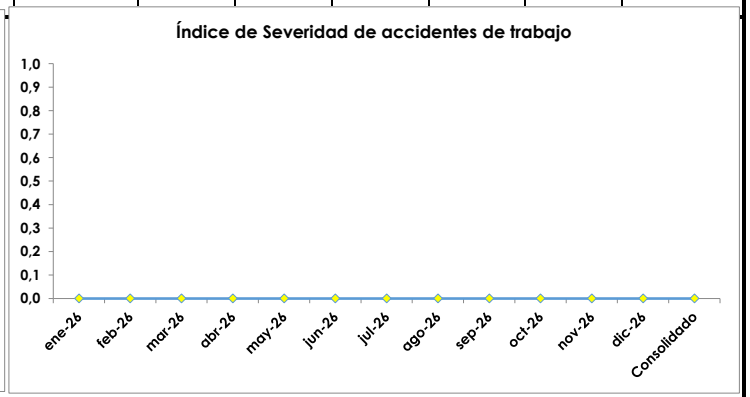

KDR-COR-SST- FRT-06
Rev. A
Versión: 00

INDICADORES DEL SG-SST

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6


Proceso:	Operativo
Obra - proyecto:	Consorio la candelaria
Indicador:	Ausentismo Por enfermedad
Responsable:	HSE
Constante "K":	100.000
Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:	1000

Datos	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Consolidado
Total de trabajadores en el mes	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Σ de días ausentes origen laboral o comun en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días trabajados en el mes	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Σ de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formula	Nivel de Desagregación	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Consolidado
(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Prevalencia de la enfermedad laboral	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Incidencia de la enfermedad laboral	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0
(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Ausentismo por causa medica	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0





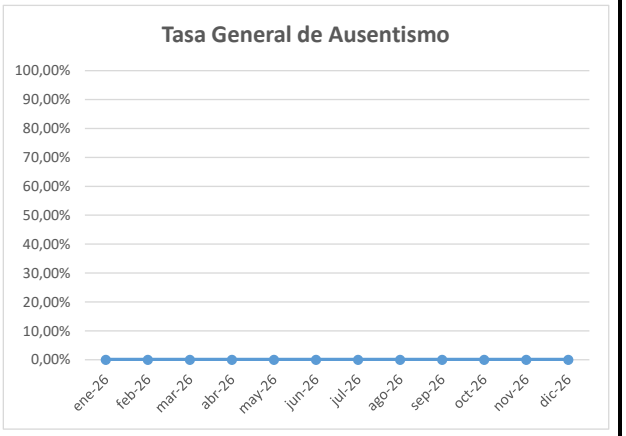

ANEXO 2. INFORME AMBIENTAL MES 4- OBRA

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL No. 04

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026



PRESENTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA – No. IPO 003-2025, CUYO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

ELABORADO POR:
CONSORCIO LA CANDELARIA

Municipio de Ráquira – Boyacá

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
OBJETIVO GENERAL 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. MARCO DE REFERENCIA 5
4. NORMATIVIDAD GESTIÓN AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO 6
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS TRAMOS INTERVENIDOS DURANTE EL PERIODO No. 04 8
6. CLIMATOLOGIA DURANTE EL PERIODO REPORTADO 9
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DENTRO DEL PERIODO No. 04 9
7.1. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL POR ACTIVIDAD EJECUTADA 10
8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 11
9. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES 14
9.1. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 14
10. CONCLUSIONES 42
11. ANEXO INFORME 01 AVANCE PRESUPUESTAL CUMPLIMIENTO PAGA 43

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

1. INTRODUCCION

El presente informe ambiental tiene como objetivo presentar las acciones y actividades realizadas en el marco del Contrato de Obra No. IPO 003-2025, cuyo objeto es el mejoramiento de la vía que conecta el municipio de Ráquira con el centro poblado La Candelaria, ubicado en el departamento de Boyacá. Este proyecto se lleva a cabo durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, y tiene como finalidad optimizar las condiciones de la infraestructura vial en la región, contribuyendo al desarrollo económico y social de la zona.

Con el fin de cumplir con los requisitos legales y normativos en materia ambiental, este informe describe las actividades ejecutadas durante el proceso de construcción y mejoramiento vial, así como las medidas de mitigación adoptadas para minimizar los impactos negativos sobre el entorno. El proyecto incluye la ejecución de trabajos como la aplicación de emulsión asfáltica, el suministro e instalación de carpeta asfáltica en caliente, la construcción de filtros de drenaje, la instalación de geotextiles para separación de capas y el manejo adecuado de las aguas pluviales a través de tuberías de drenaje, entre otras actividades.

En cumplimiento con la normativa ambiental vigente, se ha realizado un monitoreo constante de los efectos de las actividades de la obra sobre los recursos naturales y el entorno social. Este informe también incluye una evaluación de las medidas implementadas para la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades cercanas, así como el cumplimiento de los planes de manejo ambiental establecidos.

Este informe se estructura de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo de ejecución de la obra, detallando las acciones de prevención, mitigación y corrección que se han implementado para garantizar la sostenibilidad ambiental del proyecto y su cumplimiento con los estándares exigidos por las autoridades competentes.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer e implementar las medidas, programas y acciones ambientales necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales negativos generados por las actividades ejecutadas en el proyecto vial, así como potenciar los impactos ambientales positivos, garantizando la sostenibilidad ambiental del área de influencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Minimizar y controlar las afectaciones generadas sobre los recursos naturales renovables (suelo, agua, aire y cobertura vegetal) como resultado de las actividades constructivas ejecutadas durante el periodo No. 04.
- Verificar y asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como de los compromisos establecidos en el PAGA y en el contrato de obra.
- Implementar y fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo ambiental durante la ejecución de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026.
- Garantizar la correcta aplicación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), ajustado a las condiciones reales del proyecto y a las actividades ejecutadas en el tramo intervenido.
- Promover prácticas constructivas ambientalmente responsables que contribuyan a la prevención de riesgos ambientales y al mejoramiento de las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

3. MARCO DE REFERENCIA

La vía objeto del proyecto corresponde a una vía secundaria que cuenta con una extensión aproximadamente de 6,26 km con coordenadas Inicio: K0+000 (5°32' N - 73°38' O) Fin: K6+260 (5°29' N - 73°36' O), en donde su estructura y superficie de rodadura está totalmente conformada por material de afirmado (recebo). La vía presenta un alto nivel de deterioro en su capa de rodadura; el transito combinado de carga, pasajeros y vehículos particulares, así como las condiciones climáticas de la zona acrecientan el problema en época de lluvias, haciendo que se requiera gastar recursos abundantes en mantenimiento rutinario y periódico de la vía. El mejoramiento de esta vía promoverá el desarrollo turístico, económico y sociocultural de esta zona del departamento, así mismo, con el convenio entre el municipio de Ráquira y la Gobernación de Boyacá.

El CONSORCIO LA CANDELARIA dará cumplimiento a la normatividad ambiental en materia de gestión ambiental, uso del agua, emisiones atmosféricas, uso de la energía, residuos sólidos domésticos, peligrosos, licencias ambientales y en general lo necesario para lograr un desarrollo sostenible y cumplimiento al objeto contractual, y que para su cumplimiento se ceñirá al PAGA, el cual fue diseñado con el fin de establecer los programas de manejo ambiental necesarios para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales y sociales que puedan generarse durante la ejecución física del proyecto.

Si bien la naturaleza del contrato no requiere de licencia ambiental, las actividades de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación vial tienen potencial de generar impactos en el entorno, por lo que se implementan medidas de gestión ambiental conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

4. NORMATIVIDAD GESTIÓN AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO

El desarrollo del proyecto se enmarca en el cumplimiento de la legislación ambiental colombiana vigente, orientada a la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

A continuación, se relacionan las principales normas, decretos y resoluciones aplicables al Plan de adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y a la ejecución del Contrato de Obra No. IPO 003-2025:

Norma/Decreto/Resolución	Descripción	Aplicabilidad al PAGA y al Contrato de Obra
Ley 99 de 1993	Establece la creación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y regula la gestión ambiental en Colombia.	Regula la política ambiental nacional y establece principios para la gestión de impacto ambiental de proyectos de infraestructura.
Decreto 1076 de 2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que consolida las normativas ambientales en un solo documento.	Define los procedimientos y requisitos para el manejo ambiental durante la ejecución de obras de infraestructura.
Ley 141 de 1993	Define las normas para la protección del medio ambiente y los recursos naturales en Colombia.	Regula las actividades que puedan afectar el medio ambiente, incluyendo las obras de construcción y su impacto en el entorno natural.
Decreto 2041 de 2014	Regula la gestión de los recursos hídricos en Colombia, incluyendo la prevención de contaminación y el manejo adecuado de las aguas residuales y pluviales.	Asegura la correcta gestión del agua en el proyecto, incluyendo medidas para evitar la contaminación del agua durante la obra vial.
Resolución 1122 de 2014	Establece los lineamientos para la gestión de residuos sólidos en proyectos de construcción y obra pública.	Determina cómo manejar los residuos generados durante la obra de mejoramiento vial para evitar impactos negativos en el medio ambiente.
Decreto 948 de 1995	Establece el control sobre la calidad del aire, con un enfoque en la regulación de emisiones contaminantes en actividades industriales y de construcción.	Regula las emisiones atmosféricas generadas por las actividades de construcción, protegiendo la calidad del aire durante el desarrollo de la obra.
Resolución 0254 de 2013	Establece las condiciones para la ejecución de proyectos de infraestructura vial, incluidos los procedimientos para la evaluación de impactos ambientales.	Aplica para la ejecución del contrato de obra, asegurando el cumplimiento de los requisitos ambientales para el manejo de la infraestructura vial.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

Ley 1333 de 2009	Regula el régimen sancionatorio ambiental en Colombia, estableciendo las condiciones de responsabilidad por el incumplimiento de normas y permisos ambientales.	Asegura que el contratista cumpla con las normativas ambientales y evita sanciones por el incumplimiento durante la ejecución del contrato.
Resolución 1447 de 2016	Establece las condiciones para la evaluación de la viabilidad ambiental de proyectos de construcción y obras de infraestructura.	Regula la evaluación ambiental de los proyectos y garantiza la implementación de medidas correctivas si se detectan impactos ambientales.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS TRAMOS INTERVENIDOS DURANTE EL PERIODO No. 04

Las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado del Informe de Cumplimiento Ambiental No. 04 se desarrollaron dentro del corredor vial correspondiente al proyecto “Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado La Candelaria”, ubicado en el departamento de Boyacá, jurisdicción del municipio de Ráquira, en área rural de dicho territorio.

De acuerdo con el avance de obra reportado, las intervenciones se concentraron en tramos específicos del corredor vial, comprendidos entre las abscisas K0+980 y K6+260, atravesando las veredas Resguardo Oriente y La Candelaria, donde se ejecutaron actividades de preliminares y movimiento de tierras, construcción de la estructura de pavimento y obras de drenaje y estructuras de protección.

Tramos intervenidos durante el periodo

- Preliminares y movimiento de tierras:

  Actividades ejecutadas entre las abscisas K3+305 y K6+260, incluyendo excavación de cortes y canales, demolición de pavimento asfáltico, suministro y compactación de material de afirmado, conformación de botadero de escombros y transporte de material granular.

- Construcción de la estructura de pavimento:

  Intervenciones localizadas entre las abscisas K4+000 y K4+500, correspondientes a la escarificación, mezclado, conformación y compactación de subbase y/o base, así como el suministro y transporte de material granular.

- Obras de drenaje y estructuras de protección:

  Actividades desarrolladas en los tramos comprendidos entre K0+980 y K5+260, relacionadas con la demolición de cunetas existentes, corte de pavimento asfáltico, construcción de cunetas revestidas en concreto y suministro e instalación de malla electrosoldada.

Las actividades ejecutadas se localizaron dentro del Área de Influencia Directa (AID) del proyecto, correspondiente a la franja de intervención vial y sus zonas operativas, sin evidenciarse afectaciones por fuera de los límites establecidos en el Plan de Adaptacion a la guia ambiental (PAGA).

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

6. CLIMATOLOGIA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, el área de influencia del proyecto de mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado La Candelaria, en el departamento de Boyacá, presentó condiciones climáticas variables, características de la temporada de transición climática en la región.

Ver bitácora de Obra_ informe de Obra periodo de enero de 2026

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DENTRO DEL PERIODO No. 04

Durante el periodo No. 04, correspondiente al mes de enero de 2026, las actividades ejecutadas en el proyecto de mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado La Candelaria se desarrollaron en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), la normatividad ambiental vigente y las obligaciones contractuales.

Durante el Periodo 4 se desarrollaron actividades de obra correspondientes a preliminares, movimiento de tierras, estructura de pavimento y obras de drenaje, implementando las siguientes medidas de cumplimiento ambiental:

ÍTEM	ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
1	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	
1.02	Excavación de cortes y canales sin clasificar, incluye acarreo libre hasta 5 km	K5+300 – K6+260
1.03	Demolición pavimento asfáltico e=3 cm, incluye cargue y transporte hasta 5 km	K4+400 – K6+060
1.04	Suministro, extendida y compactación de material para afirmado hasta un diámetro de 2” y un índice plástico menor o igual al 9%, compactado al 95% Proctor, incluye acarreo libre hasta 5 km	K4+070 – K5+800
1.05	Conformación de botadero de escombrera	K3+305
1.06	Transporte de material de afirmado y/o granular suelto (medido en banco) después de 5 km	K4+070 – K5+800
2	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	
2.01	Escarificación, mezclado, conformación y compactación de subbase y/o base	K4+400 – K4+260
2.02	Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular, incluye acarreo libre hasta 5 km	K4+000 – K4+500
2.06	Transporte de material de afirmado y/o granular suelto (medido en banco) después de 5 km	K4+000 – K4+500
3	OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE	

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

	PROTECCIÓN	
3.01	Demolición obras en concreto simple, incluye cargue y retiro de sobrantes con acarreo libre hasta 5 km (cunetas existentes)	K3+400 – K5+260
3.11	Corte de pavimento asfáltico	K0+980 – K2+995
3.12	Cunetas revestidas en concreto de 21 MPa (3000 PSI) sin refuerzo (incluye sello de juntas)	K0+980 – K1+700
3.13	Suministro e instalación de malla electrosoldada	K0+980 – K1+700

7.1. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL POR ACTIVIDAD EJECUTADA

1. Preliminares y movimiento de tierras

- Ejecución de excavaciones de cortes y canales, garantizando la correcta delimitación de áreas de intervención y evitando afectaciones a zonas no autorizadas.
- Demolición de pavimento asfáltico, con control del material particulado mediante riego periódico y manejo adecuado de residuos generados.
- Suministro, extendida y compactación de material granular, realizando control de polvo y estabilidad del material para prevenir dispersión.
- Conformación de botaderos de escombros, asegurando su disposición en sitios autorizados y cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.
- Transporte de material de afirmado y granular, implementando cubrimiento de volquetas y limpieza de vías para evitar contaminación por arrastre de material.

2. Construcción de estructura de pavimento

- Escarificación, mezclado, conformación y compactación de subbase y base, garantizando el manejo adecuado de materiales y evitando derrames o pérdidas.
- Control de escorrentías superficiales durante las actividades de conformación para prevenir procesos de erosión.
- Aplicación de medidas de manejo ambiental durante el transporte y almacenamiento de materiales granulares.

3. Obras de drenaje y estructuras de protección

- Demolición de obras en concreto simple, con retiro controlado de sobrantes y disposición final conforme al Plan de Adaptacion a la guia ambiental (PAGA).
- Corte de pavimento asfáltico, implementando señalización preventiva y control de emisiones de polvo.
- Construcción de revestimientos en concreto y sellado de juntas, asegurando el uso eficiente de materiales y la limpieza de áreas intervenidas.
- Suministro e instalación de malla electrosoldada, manteniendo orden y correcta gestión de residuos metálicos.

4. Gestión ambiental complementaria

- Recolección, clasificación y disposición adecuada de residuos sólidos ordinarios y de construcción.
- Señalización ambiental y de seguridad en los frentes de obra activos.
- Verificación del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Adaptacion a la guia ambiental (PAGA)
- Sensibilización permanente al personal sobre buenas prácticas ambientales.

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

8.1 Metodología aplicada

Para la evaluación ambiental correspondiente al Informe de Cumplimiento Ambiental No. 04, se empleó la metodología establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a lo señalado en la *Guía General para la Evaluación de Impactos Ambientales* (2018). Esta metodología permite identificar, analizar y valorar los impactos ambientales derivados de las actividades ejecutadas durante la fase de construcción del proyecto.

La metodología aplicada contempló las siguientes etapas:

1. Identificación de las actividades del proyecto
   Se identificaron las actividades desarrolladas durante la fase de construcción, asociadas a los procesos de preliminares y movimiento de tierras, construcción de la estructura de pavimento y obras de drenaje y estructuras de protección.
2. Determinación de los factores ambientales susceptibles de afectación
   Para cada actividad se evaluaron los posibles impactos sobre los componentes ambientales, agrupados de la siguiente manera:
   - Medio abiótico: suelo, aire, agua, ruido y paisaje.
   - Medio biótico: flora, fauna y hábitats asociados.
   - Medio socioeconómico: empleo, seguridad, movilidad y bienestar comunitario.
3. Cálculo de la Importancia del impacto (IMP)
   La importancia del impacto se determinó mediante una ponderación global de carácter cualitativo, considerando la magnitud, extensión, duración, reversibilidad y controlabilidad de los impactos generados por cada actividad del proyecto.
4. Clasificación del impacto ambiental
   De acuerdo con el valor de importancia obtenido, los impactos fueron clasificados en las siguientes categorías:
   - Alta: impactos que requieren la implementación de medidas específicas de manejo ambiental.
   - Media: impactos mitigables mediante la aplicación de medidas básicas de manejo ambiental.
   - Baja: impactos controlables mediante la adopción de buenas prácticas constructivas.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

Para la valoración de la importancia de los impactos se emplearon los siguientes valores categóricos:

- Baja: 1
- Baja – Media: 1,5
- Media: 2
- Media (neto positivo): 2,2
- Media – Alta: 2,5
- Alta: 3

Esta metodología permitió establecer de manera sistemática el nivel de impacto ambiental asociado a las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado, así como verificar la efectividad de las medidas de manejo ambiental implementadas en cumplimiento del Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA) del proyecto.

8.2 Identificación y valoración de impactos por actividad ejecutada

Ítem	Actividad ejecutada	Factor(es) principal(es) afectado(s)	IMP (Importancia)	Gestión	Naturaleza	Observación	Evaluación
1	Excavación de cortes y canales	Suelo, paisaje	2	Mitigación	Negativo	Remoción temporal del suelo y modificación del relieve	Impacto medio, temporal y reversible
2	Demolición de pavimento asfáltico	Aire, ruido, suelo	2	Mitigación	Negativo	Generación de material particulado, ruido y residuos	Impacto medio, controlable
3	Suministro, extendida y compactación de material granular	Aire, suelo	1.5	Prevención	Negativo	Emisión de polvo y compactación superficial del suelo	Impacto bajo–medio
4	Conformación de botadero de escombros	Suelo, paisaje	2	Mitigación	Negativo	Alteración visual y ocupación temporal del suelo	Impacto medio, reversible
5	Transporte de material de afirmado y granular	Aire, movilidad	1.5	Prevención	Negativo	Emisión de polvo y aumento momentáneo del tráfico	Impacto bajo–medio
6	Escarificación y compactación de subbase y/o base	Suelo, aire	2	Mitigación	Negativo	Alteración física del suelo y generación de polvo	Impacto medio
7	Suministro y extendida de material para	Aire, paisaje	1.5	Prevención	Negativo	Afectación visual y emisión de partículas	Impacto bajo–medio

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

	subbase granular						
8	Demolición de obras en concreto simple	Suelo, aire, ruido	2	Mitigación	Negativo	Generación de escombros y ruido	Impacto medio
9	Corte de pavimento asfáltico	Aire, ruido	2	Mitigación	Negativo	Generación localizada de polvo y ruido	Impacto medio
10	Construcción de cunetas revestidas en concreto	Suelo, agua	1.5	Prevención	Negativo	Intervención localizada del suelo	Impacto bajo–medio
11	Suministro e instalación de malla electrosoldada	Socioeconómico (empleo)	2.2	Potenciación	Positivo	Generación de empleo temporal	

9. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES

Durante el periodo evaluado, las actividades ejecutadas en el proyecto se desarrollaron dando cumplimiento a las medidas ambientales establecidas en el Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA), orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales identificados, especialmente aquellos clasificados con importancia baja y media.

El seguimiento ambiental evidenció la aplicación de medidas de manejo ambiental en los frentes de obra correspondientes a preliminares y movimiento de tierras, construcción de la estructura de pavimento y obras de drenaje y estructuras de protección, garantizando la protección de los componentes abiótico, biótico y socioeconómico.

9.1. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

El manejo de fichas ambientales constituye una herramienta clave para el seguimiento y control de los impactos ambientales generados durante la ejecución del Contrato de Obra No. IPO 003-2025**,** cuyo objeto es el mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Ráquira al centro poblado La Candelaria, Boyacá**.**

Estas fichas permiten documentar de manera sistemática cada actividad de obra**,** identificando los factores ambientales potencialmente afectados, el nivel de importancia del impacto (IMP)**,** la naturaleza del efecto (positivo o negativo) y las medidas de manejo ambiental aplicadas.

- ✓ Control de emisiones atmosféricas y material particulado

- Riego periódico de las áreas intervenidas y vías de acceso para el control de polvo.
- Cubrimiento de volquetas durante el transporte de materiales granulares y escombros.
- Limpieza permanente de la calzada para evitar la dispersión de material particulado.

- ✓ Manejo y disposición de residuos

- Recolección, clasificación y disposición adecuada de residuos de construcción y demolición (RCD) en sitios autorizados.
- Manejo controlado del material proveniente de demoliciones y excavaciones.
- Disposición ordenada de residuos metálicos y sobrantes de obra.

- ✓ Protección del suelo y control de erosión

- Delimitación de áreas de intervención para evitar afectaciones innecesarias al suelo.
- Implementación de medidas de control de escorrentías superficiales durante excavaciones y conformación de estructuras.
- Recuperación y limpieza de áreas intervenidas una vez finalizadas las actividades.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

✓ Control de ruido y vibraciones

- Uso de maquinaria en horarios permitidos.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria para reducir niveles de ruido.

✓ Manejo del componente socioeconómico

- Señalización vial y ambiental para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios de la vía.
- Coordinación de actividades para minimizar afectaciones a la movilidad.
- Generación de empleo temporal, priorizando mano de obra local cuando fue posible.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL PROYECTO

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.							DAGA-1.1-01
OBJETIVOS Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
IMPACTOS MANEJADOS							
Generación de expectativas Conflictos por consecución del empleo Rechazo y falta de colaboración entre constructor y la ciudadanía por la falta de mecanismos de participación ciudadana Quejas y reclamos de la comunidad ante los organismos de control externo							
ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO							
• El Consorcio la Candelaria ha Garantizado la disponibilidad de respuesta a todas las quejas, inquietudes y/o reclamos de la comunidad. • Se Mantuvo la señalización, demarcación y seguridad en general en los frentes de obra. • Se da cumplimiento a la actualización y presentación de informe mensual, indicando el avance del cumplimiento de cada uno de los programas que conforman el PAGA, con los registros correspondientes.							
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		Especialista Ambiental /Contratista					

SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
indicador	**Complejidad**	**Periodicidad de evaluación**	**Registro de cumplimiento**
Conformación del Grupo de Gestión ambiental	Media baja	Única vez – inicio del proyecto	Acta de Conformación de grupo de gestión Ambiental – verificado en informe No. 01
Vinculación: (profesionales Vinculados / equipo mínimo de profesionales) x 100	Media baja	Mediante informes de gestión socioambiental Mensual	100% cumplido INFORME SST OBRA

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA.							DAGA-1.2-02
OBJETIVO Capacitar a todo el personal de la obra en temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
IMPACTOS MANEJADOS ✓ Falta de conocimiento sobre normatividad ambiental por parte de empleados. ✓ Falta de conciencia ambiental y malos hábitos ambientales.							
ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO ✓ Se realizo capacitación ambiental, como tema Manejo de materiales de construcción y concreto al personal de obra.							
TEMAS DE CAPACITACIÓN							

ACTIVIDADES	CANTIDAD POR MES	FECHA
Mitigación y control de incendios	1	14/01/2026



La capacitación en mitigación y control de incendios se considera necesaria en el marco del proyecto debido a los riesgos inherentes a las actividades constructivas ejecutadas durante la fase de obra, tales como el uso de maquinaria pesada, equipos eléctricos, almacenamiento y manejo de materiales combustibles, combustibles y lubricantes, así como la realización de trabajos en áreas abiertas con presencia de material seco.

Estas condiciones incrementan la probabilidad de ocurrencia de incendios accidentales, los cuales pueden generar impactos negativos sobre el medio ambiente, el personal de obra, la infraestructura del proyecto y las áreas aledañas, afectando componentes como el aire, el suelo, la flora y la seguridad de los trabajadores y la comunidad.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Capacitaciones = (Asistente a reunión / Trabajadores del proyecto). X 100	Media baja	Mensual	100% cumplido Registro de Asistencia.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: CLC-PAGA-063-01
		FECHA: 01/11/2025
		VERSION: 01

CHARLA:	CAPACITACION: X	ACTIVIDAD:
TEMA: Mitigación y control de Incendios		
RESPONSABLE: Elizbeth Mancera.	LUGAR:	FECHA: 14/01/2026

No.	C.C.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	1049649865	Maria Fernanda Ariza	Residente HSEQ	
	1014477919	Yoho Yabary		
	23933910	Luz Dary Gomez	Coordinadora	
	7057.075 3991	Julian Andres I	Maestro	
	96014572	Jesus Hernandez	OP	
	7173320136	Jhon Martinez	operador	
	6796554	Jhon Martinez	Auxiliar Logi	
	1049628290	Yanel Augusto Pabon	Ingeniero	Yanel Pedro 24
	4375181	Juan G C [illegible]	INSP. SST	
	1055221554	Fabio Tonso	operador	Fabio Tonso
	1116949019	CARLOS DAVID	OPERADOR	CARLOS D.P
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS LEGALES.	DAGA-1.3-03

OBJETIVOS

Realizar el control y seguimiento de la normatividad ambiental y normas sociales y territoriales durante la ejecución del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

IMPACTOS MANEJADOS

- ✓ Generación de expectativas
- ✓ Conflictos por requisitos y trámites legales
- ✓ Quejas y reclamos de la comunidad ante los organismos de control externo.

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida ambiental	Acción Ejecutada
Verificación del cumplimiento de requerimientos legales	Se verificó que el proyecto cumple con la normatividad ambiental aplicable. El proyecto no requiere permisos ni licencias.
Reporte ambiental y social	Se da cumplimento mediante el presente informe Mensual No. 04, consolidando la información de las fichas de manejo ambiental correspondientes a las actividades ejecutadas.
Verificación del licenciamiento de terceros (proveedores)	Se verificó el cumplimiento legal de los terceros encargados del suministro de materiales pétreos. Ver Anexo en Informe No. 01_Fuente de Materiales
Verificación cumplimiento alquiler unidades sanitarias	Se anexan certificados de alquiler y mantenimiento de unidad sanitaria portátil
Verificación documentos de adecuación escombrera	Se adecua material en sitio autorizado

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Autorizaciones = (Autoriza y permisos tramitados /autoriza y permisos requeridos) x 100	Media baja	Mensual	Anexo en Informe No. 01_Fuente de materiales pétreos. 100% cumplido

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

PROGRAMA 2: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	PAC-2.1-04

OBJETIVO

Implementar las acciones para el manejo de los materiales de construcción, manejo de la explotación de estas, manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural y el manejo de los residuos sólidos convencionales y especiales, en cumplimiento de la política ambiental que propende por un manejo integral de los mismos, que se puedan presentar en la ejecución del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

IMPACTOS MANEJADOS

- ✓ Cambio en el uso del suelo
- ✓ Accidentes laborales
- ✓ Aporte de partículas en suspensión a la atmosfera06/28 932
- ✓ Manejo por arrastre de materiales pétreos producto de eventos de lluvias.

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida Ambiental	Acción Ejecutada
Almacenamiento de materiales pétreos	Los materiales pétreos fueron acopiados en zonas designadas y debidamente cubiertas con lonas plásticas tipo polietileno.
Uso de elementos de protección personal (EPP)	El personal de obra fue instruido en el manejo seguro del cemento y concreto; los trabajadores portaron adecuadamente los guantes, botas y gafas, reduciendo el riesgo de irritaciones o lesiones cutáneas.
Manejo de residuos asfálticos	Los residuos fueron recogidos al finalizar cada jornada y dispuestos en el sitio autorizado, evitando su arrastre y debidamente acopiado para entrega al Municipio de Ráquira, para su reutilización en vías rurales.
Verificación de permisos y licencias de materiales	Se revisaron las licencias ambientales y permisos de explotación y comercialización de los proveedores de materiales pétreos

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVAL.	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Autorizaciones y/o permisos de explotación y comercialización de los materiales requeridos (AP) AP =(AP tramitados en periodo / AP requeridos en periodo) x100	Media baja	Mensual	Se requirió material de la planta de VILLAMIL MINING SAS -se anexa documentación Ver Anexo en Informe No. 01 100% cumplido
Condiciones de almacenamiento, confinamiento, demarcación y señalización de los materiales	Media baja	Mensual	Informe mensual de cumplimiento SST

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

AM = (Lugares almacenamiento adecuados utilizados / Total lugares almacenamiento utilizados) x100			Registro fotográfico 100% cumplido
REGISTRO FOTOGRAFICO			
Acopio de materiales de construcción  			

MANEJO INTEGRAL DE EXPLOTACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	PAC-2.2-05

OBJETIVO

Verificar que las fuentes de material tengan licenciamiento y permisos debidamente aprobados por la entidad competente.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

IMPACTOS MANEJADOS

- ✓ Presencia de personal extraño y ajeno a la obra
- ✓ Posibilidad de obstrucción por malas condiciones de material suministrado.

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Actividad	Acción Ejecutada
Verificación de permisos y autorizaciones ambientales de las fuentes de material	Se verificaron las licencias, permisos y autorizaciones ambientales vigentes de las fuentes proveedoras de materiales pétreos, conforme a lo establecido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las CAR competentes. Toda la documentación se registró en el Anexo en Informe 01 – Fuentes de Material, donde se incluyen las certificaciones de legalidad y vigencia de la planta de VILLAMIL MINING SAS.
Control de transporte y descarga de material	Se supervisó que el transporte de materiales se realizara en vehículos cubiertos con lona, evitando dispersión de partículas y pérdidas durante el trayecto.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Autorizaciones = (Autorizaciones y permisos tramitados /autoriza y permisos requeridos) x 100	Media baja	Mensual	Se requirió material de la planta de VILLAMIL MINING SAS -se anexa documentación Ver Anexo en Informe No. 01 100% cumplido

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

SEÑALIZACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.	PAC-2.3-06

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las medidas de señalización y demarcación de las áreas de trabajo y aislamiento de la obra de forma tal que se minimicen los accidentes y la afectación de las áreas de trabajo.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X

IMPACTOS MANEJADOS

- ✓ Posibilidad de accidentes e incidentes por falta de señalización
- ✓ Generación de molestias e incomodidad a la comunidad

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida Ambiental	Acción Ejecutada
Demarcación de áreas de trabajo	Se realizó señalización perimetral de las zonas de intervención mediante cinta de demarcación bicolor (amarillo y negro) de 12 cm de ancho, delimitando adecuadamente los frentes de obra.
Avisos preventivos e informativos en excavaciones	En las zonas con excavaciones superiores a 50 cm se instalaron avisos visibles que advertían sobre la labor en ejecución, reduciendo el riesgo de caídas o accidentes.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Señalización y demarcación Instalada	Media baja	Mensual	Registro fotográfico 100% cumplido Ver informe SST_OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS	PAC-2.4-07

OBJETIVO

Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición de sobrantes producto de actividades de construcción, residuos de demolición y lodos.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

IMPACTOS MANEJADOS

- ✓ Contaminación de cuerpos de agua
- ✓ Contaminación del suelo

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida de Manejo	Acción Ejecutada
Reutilización de sobrantes producto de demolición	Los materiales de demolición (concreto simple y armado) fueron triturados, limpios para su futura reutilización.
Reutilización del material de excavación	El material resultante de las excavaciones es acopiado para envió a escombrera autorizada del proyecto.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
MRC =(área excavada o demolida /área reutilizada) x100	Media baja	Mensual	☑ En tramite De cuantificación de cantidades.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO No. 02: Proceso de escarificación y Acopio de material para su futura reutilización por parte del Municipio.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.	PAC-2.5-08

OBJETIVOS

Controlar y mitigar cada uno de los impactos durante la generación, transporte, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales provenientes de la de las distintas etapas de construcción del proyecto.

Cumplir con la normatividad vigente asociada a la gestión integral de residuos en Colombia, específicamente en el Municipio de Ráquira.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación

IMPACTOS MANEJADOS

- ✓ Contaminación del suelo y aire
- ✓ Contaminación visual del área

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida Ambiental	Acción ejecutada	Cumplimiento
Separación en la fuente	Se implementó la separación por tipo de residuo utilizando recipientes de colores según el código establecido por la Resolución 2184 de 2019: • Blanco: residuos aprovechables. • Negro: no aprovechables. • Rojo: peligrosos.	☑ Cumplido



RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Implementación de recipientes para la adecuada disposición de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos - 2 unidades dispuestas en obra	Media baja	Mensual	Registro fotográfico 100% cumplimiento

REGISTRO FOTOGRAFICO



PUNTO ECOLOGICO No. 1



PUNTO ECOLOGICO No. 2

PROGRAMA 3: GESTIÓN HÍDRICA

MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES								PGH-3.1-10
OBJETIVO Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el recurso hídrico.								
TIPO DE MEDIDA								
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		
IMPACTOS MANEJADOS ✓ Cambios en la estabilidad de las márgenes hídricas ✓ Cambios en la calidad del agua superficial ✓ Alteración de la capacidad de transporte del agua superficial.								
ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO								

Medida Ambiental	Acción Ejecutada	Cumplimiento
Manejo adecuado de aguas superficiales	Se realizó el control de escorrentías superficiales mediante la excavación de cunetas para flujo natural de escorrentía.	☑ Cumplido
Riego para mitigar polvo en movimiento de material pétreo.	Se dispone de carro tanque para riego en vía y mitigación de dispersión de partículas de polvo.	☑ Cumplido

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Compra de recurso hídrico y verificación de riego en obra	Media baja	Mensual	Informe de cumplimiento ambiental Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO



humectación de vía en procesos constructivos

MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES							PGH-3.2-11
OBJETIVOS Prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos de los residuos líquidos.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
IMPACTOS MANEJADOS							
✓ Cambios en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del suelo							

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida Ambiental	Acción Ejecutada	Cumplimiento
Uso de baterías sanitarias alquiladas	Se instalaron unidades sanitarias alquiladas	☑ Cumplido

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Alquiler	Media baja	Mensual	Certificado de alquiler de las unidades sanitaria. 100% cumplido

Registro Fotográfico





UNIDADES SANITARIAS

CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO

DATOS GENEERALES		DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE DE LA, EMPREESA		NOMBRE DEL CLIENTE	
MASSEVENTOS		CONSORCIO LA CANDELARIA	
RESPONSABLE DEL TRADAJO		RESPONSABLE	
Darly Massiel Chacón Pérez		Adriana Marcela Pedraza Gomez	
DIRECCIÓN	Calle 20 # 19-76 Barrio Milagro	DIRECCIÓN	Calle 20 # 12-84
TELEFONO	3132934384 – 3214415958	TELEFONO	3105836391
EMAIL	massechok1318@gmail.com	EMAIL	Consorciolacandelaria@gmail.com

FECHA	DESCRIPCIÓN	GENÉRICA	SÓLIDOS RECOGIDOS
05-01-2026	Retiro de sólidos, liquidos, desinfección, recarga de agua y suministro de materiaes.	4.80 lt	4.0 kg
12-01-2026	Retiro de sólidos, liquidos, desinfección, recarga de agua y suministro de materiaes.	3.50 lt	2.8 kg
19-01-2026	Retiro de sólidos, liquidos, desinfección, recarga de agua y suministro de materiaes.	2.70 lt	3.3 kg

OBSERVACIÓN

Se realiza Ø mantenimiento, succión y aseo de barrios, ubicados en Raquira – Boyacá utilizando los implementos vmubacas (escobas, ceppihos, cepulos, taracos, detergentes, desinfectantes, y Iquimico degresantante de auinro, de protección personal (EPP). corresporindiente. La actividad nieculuye limpiatza pulnefrios, lavamanos, pises y paredes, asi como la succión de aguas residuales, garantizando condiciones higienicincas y sanitarias optimas. Esre negreś *trọas* optimo.

NOMBRE Y FIRMA DE LA EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Darly Massiel Chacón Pérez	R.L. ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ/ CONSORCIO LA CANDELARIA

Darly Massiel Chacón Pérez
3132934384
3214415958 / 32144115958
massechok1318@gmail.com

3105356391
Consorciolacandelalaria@gmail.com
Consorciolacandelaria@gmail.com

EMIR S.A. E.S.P.
EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.E.S.P.
Soluciones Ambientales a la mano

30 - 01-2026

CERTIFICACIÓN

Mediante la presente Empresa Regional para el Manejo Integral de Residuos EMIR SA ESP con NIT 900210774-8 certifica haber recibido de la empresa **MASSEVENTOS** con NIT 1049633246-0 , aproximadamente 15.000 lts de material liquido (lodos industriales no peligrosos y orgánicos) y 1.2 kil de material sólido (papel higiénico, papel de mano , guantes y tapobocas), para su diferid manejo y disposición final en la planta de residuos de Tunja **PTAR . PTAR .**

Actualmente la empresa cuenta con un carro de succión de lodos propio para la recolección transporte de este residuo, asi mismo, EMIR SA ESP mediante la resolución 2859 del 27 de octubre de 2018 otorgada por CORPOBOYACA para el manejo dichos residuos.

Se expide esta certificación por solicitud del interesado a los (30) días del mes de enero de 2026

Cordialmente,

Michael Nielsen

MICHAEL NIELSEN AVELLA
Ingeniero ambiental
–

Servicio al cliente
7 73 39 23 - Cel.: 310 343 09 86
www.emiresesp.com
emiresesp@gmail.com gerencia@emiresesp.com
Parque Industrial Calle 52ª # 11 – 85 Sogamoso - Boyacá

PROGRAMA 4: DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

MANEJO DEL DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL							PBSE-4.1-12
OBJETIVOS Verificar el aprovechamiento forestal, descapote y la disposición del material vegetal proveniente del manejo de la cobertura vegetal.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
IMPACTOS MANEJADOS							
✓ Cambios en la cobertura vegetal							

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida ambiental	Acción Ejecutada	Cumplimiento
Limpieza y descapote controlado	Se realizaron actividades de remoción únicamente dentro del ancho de vía aprobado en el trazado.	☑ Cumplido

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Volumen de capas de suelo descapotado (Sdesca) Sdesca = (Volumen de Sdesca aprovechado / Volumen de Sdesca proyectado) x100	Media baja	Mensual	Una vez culminada la actividad de almacenamiento se determinará el volumen de descapote.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Continuidad de proceso de descapote en perímetro de vía

PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS O SENSIBLES							PBSE-4.3-14
OBJETIVOS Proteger y recuperar los ecosistemas estratégicos identificados en el área de influencia a través de medidas de prevención en las actividades constructivas y manejo establecidas por la autoridad ambiental competente.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
IMPACTOS MANEJADOS							
✓ Alteración de ecosistemas estratégicos o sensibles							

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida Ambiental	Acción Ejecutada
visitas de campo	Se realizó inspección ambiental y verificación del área de influencia directa e indirecta, sin identificar zonas de especial protección dentro del trazado de la vía.
Delimitación física del área de trabajo	Se instalaron cintas de señalización amarilla y negra para evitar ingreso de maquinaria fuera del derecho de vía.
Control de tránsito y acceso	Se controló el tránsito de maquinaria para evitar compactación o deterioro del suelo en áreas contiguas a la vía.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Delimitación de las áreas de trabajo para limitar el acceso a los trabajadores a las áreas sensibles) Área sensible = (Áreas sensible delimitada/ Áreas sensible identificada) x100	Media baja	Mensual	No se identifican áreas estratégicas o sensibles, dentro del área de influencia del proyecto.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

PROGRAMA 5: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO	PMIT-5.3-18

OBJETIVOS

Prevenir y minimizar los impactos que se generan por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y sitios de acopio temporales.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

IMPACTOS MANEJADOS

- ✓ Generación de accidentes.
- ✓ Afectación a la salud laboral de los trabajadores.
- ✓ Incomodidad dentro del ambiente laboral.

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida Ambiental	Acción Ejecutada
Seguimiento y control	Se continua con la instalación de campamentos transitorios
Brigadas de aseo y mantenimiento	Se mantuvieron actividades de limpieza periódica en las zonas de trabajo y almacenamiento, se resalta la importancia del orden y aseo en obra.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Puntos Temporales PuntosTem = (Puntos temporales proyectados / Puntos temporales instalados) x100	Media baja	Mensual	Campamentos transitorios

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.	PMIT -5.3- 20

OBJETIVO

Realizar el control y seguimiento a la implementación de medidas de manejo tendientes a la minimización de impactos que puedan generarse por maquinaria, equipos y vehículos.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

IMPACTOS MANEJADOS

- ✓ Emisiones de ruido
- ✓ Emisiones de gases y partículas a la atmósfera
- ✓ Contaminación de suelos por derrames de aceites y combustibles

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida Ambiental	Acción Ejecutada
Restricción de lavado y mantenimiento en campo	Se prohíbe el lavado y reparación de maquinaria en los frentes de obra; se realiza en talleres autorizados.
Almacenamiento seguro y señalizado	El combustible se almacena en zonas ventiladas, alejadas de materiales inflamables.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Mantenimientos mantenimientos = (No.de mantenimientos realizados / No.de mantenimientos requeridos) x100	Media baja	Según necesidad de la maquina	Remitirse informe SST Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO



Correcto funcionamiento de la maquinaria en obra

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

PROGRAMAS 6: DE GESTIÓN SOCIAL.

MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUES DE GÉNERO, DERECHOS Y DIFERENCIAL.	**PDL-6.1-21**

OBJETIVO

Verificar la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensac.

IMPACTOS MANEJADOS

- ✓ Falta de inclusión laboral
- ✓ Falta de oportunidades económicas y mejorar calidad de vida.

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida Ambiental	**Acción ejecutada**
Vinculación de mano de obra local	Personal contratado residente en Ráquira y veredas aledañas.
Revisión de documentación y requisitos	Verificación de cédulas, certificados de residencia y afiliaciones.
Cumplimiento Ley 1496 de 2011	Igualdad de condiciones laborales entre hombres y mujeres.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	**COMPLEJIDAD**	**PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**
Verificación de la vinculación laboral de mano de obra con perfiles básico, técnico, profesional y especializado de la región. Vinculación = (MO de la región contratada / Total MO proyecto) x100	Media baja	Reportes mensuales con periodicidad de acuerdo con la necesidad o inclusión de personal	Informe SST
Validación de la vinculación laboral de mano de obra con perfiles básico, técnico, profesional y especializado de la región y perteneciente a grupos vulnerables (mujeres, víctimas, discapacitados, entre otros) Vinculación = (MO perteneciente a grupos vulnerables / Total personal proyecto de la región) x100	Media baja	Reportes mensuales con periodicidad de acuerdo con la necesidad o inclusión de personal	A la fecha no se han presentado casos de presencia de personas vulnerables.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

PROGRAMAS 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS

INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS							PGS-8.1-28
OBJETIVO Verificar el registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente (cercas, servicios públicos comunitarios, entre otros) aledaña a las áreas de intervención de la obra, infraestructura de uso temporal del contratista en el derecho de vía, previo al inicio de cualquier actividad técnica del proyecto.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
IMPACTOS MANEJADOS ✓ Dificultades sociales							
ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO							

Medida Ambiental	Acción Ejecutada
Levantamiento de actas de vecindad iniciales	Realizadas en los sectores priorizados de intervención (Tramo K0+000 a K6+260).
Atención de solicitudes o quejas	No se presentaron reclamaciones formales durante el periodo evaluado.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Verificación del registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente aledaña a áreas de intervención. ActaVecindad = (Acta de vecindad elaborada/ Construcciones aledañas) x100	Media baja	Al inicio y entrega a satisfacción de obra	Actas de vecindad iniciales. Remitirse a informe SST

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	PPGI-10.1-32

OBJETIVO

Verificar el funcionamiento del sistema de atención y respuesta oportuna y eficaz a las manifestaciones (quejas, solicitudes, reclamos, peticiones, sugerencias, denuncias, etc.), interpuestas por comunidades y autoridades mediante los medios dispuestos para esto (correo electrónico, llamada telefónica, personalmente, entre otros).

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

IMPACTOS MANEJADOS

- ✓ Generación de conflictos con la comunidad
- ✓ Hacer a la comunidad participativa del proyecto.

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Medida Ambiental	Acción Ejecutada
Recepción y registro de PQRS	No se registraron manifestaciones formales durante el periodo evaluado – se realiza apertura de buzón sugerencias PQRS.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Apertura buzón PQRS = (PQRS cerradas/ PQRS presentadas) x100	Media baja	Mensual	Acta de apertura de buzón Fecha 31/01/2026 Registro de cumplimiento 100% equivalente a 0 unidades de requerimientos en buzón.

REGISTRO DOCUMENTAL

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

ACTA DE APERTURA DE BUZÓN DE PQRS

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA CANDELARIA – RESGUARDO ORIENTE
CONTRATISTA: CONSORCIO LA CANDELARIA
FECHA: 31 / 01/ 2026

1. OBJETIVO: Con el fin de garantizar los mecanismos de participación ciudadana y dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), se procede a realizar la apertura del buzón de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), instalado en las instalaciones del proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El día 30 del mes de enero de 2026, siendo las 2:00 pm, el Coordinador Ambiental del CONSORCIO LA CANDELARIA, en presencia de los asistentes registrados, procedió a abrir el buzón físico de PQRS, con el fin de verificar el contenido y levantar el registro correspondiente.

Durante la apertura se verificó el estado físico del buzón, el sello de seguridad y se realizó la extracción del contenido, para posteriormente clasificar las manifestaciones de acuerdo con su tipología (Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia).

3. RESULTADOS DE LA APERTURA

- Estado del buzón: ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
- Fecha de última apertura: 30 /01/ 2026
- Número de manifestaciones encontradas: ___0____

Las manifestaciones recibidas serán registradas en el Formato de Control de PQRS, y se dará trámite a cada una conforme al procedimiento establecido, garantizando respuesta oportuna.

4. RESPONSABLE DE LA APERTURA

Nombre	Cargo	Firma
ELIZABETH MAHECHA	Coordinador Ambiental – Consorcio La Candelaria	

5. ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo / Rol	Firma
HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ	Ingeniero Residente	
DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ	Especialista HSEQ	
JUAN CAMILO PEDRAZA	Profesional Ambiental	
DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ	Consorcio La Candelaria	
JUAN CAMILO PEDRAZA	Consorcio La Candelaria	

6. OBSERVACIONES ADICIONALES

_____
_____
_____

Se firma la presente acta una vez verificada la apertura del buzón, dejando constancia de las manifestaciones encontradas y su debido registro en el sistema de control de PQRS.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN								PPGI-10.2-33
OBJETIVO Verificar la implementación de la estrategia pública de divulgación para brindar información oportuna, clara, veraz y actualizada a los actores sociales e institucionales sobre las actividades ejecutadas en el marco del contrato.								
TIPO DE MEDIDA								
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		
IMPACTOS MANEJADOS								
✓ Generación de conflictos con la comunidad								
ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO								

Acción Ambiental	Acción ejecutada
Divulgación de canales de atención ciudadana (buzón PQRS).	Oficina SAU, en proceso de instalación
Divulgación de Compromisos ambientales del proyecto a los trabajadores y comunidad.	Capacitaciones ambientales Y SST realizadas al personal de obra.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Verificación de cumplimiento del mínimo requerido de reuniones con comunidades y autoridades locales. Reuniones = (Reuniones celebradas/ Reuniones requeridas) x100	Media baja	según disponibilidad de la comunidad	Registro de asistencia a las reuniones con comunidades y autoridades locales realizadas y la respectiva Acta de Reunión.
Revisión de los comprobantes y registros de entrega de elementos resultantes de la estrategia pública de divulgación. Estrategia de divulgación pública = (Número de elementos de divulgación implementados / Número de elementos de divulgación proyectados) x100	Media baja	según disponibilidad de la comunidad	Registros de entrega y de divulgación a las comunidades de elementos y estrategias de información del proyecto.

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA							PPGI-10.3-34
OBJETIVOS Verificar las estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y concienciación con las comunidades educativas, líderes, comité de participación comunitaria y población en general. Validar los espacios para la participación y control social.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
IMPACTOS MANEJADOS							
Generación de conflictos con la comunidad							
ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO							
Información y divulgación mediante socialización del proyecto.							
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN				Especialista Ambiental /Contratista			
CRONOGRAMA				Durante la vigencia del contrato			

	SEGUIMIENTO Y MONITOREO		
INDICADOR	**COMPLEJIDAD**	**PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**
Validación de la promoción de espacios para la participación y control social a través de la conformación del Comité de Participación comunitaria y/o las posibles veedurías ciudadanas conformadas en el marco del proyecto. Acercamientos = (Reuniones realizadas/ Reuniones convocadas) x100	Media baja	Según la disponibilidad de la alcaldía, veeduría a comité de participación ciudadana.	No hubo requerimientos de espacios de participación ciudadana

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y TRANSVERSALIZACIÓN.						PPGI-10.4-35
OBJETIVO Verificar la aplicación del enfoque diferencial, de género y de derechos con el fin de reducir las barreras y brechas existentes para las personas, especialmente para las mujeres y personas con discapacidad.						
TIPO DE MEDIDA						
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación
IMPACTOS MANEJADOS						
✓ Generación de conflictos con la mujer y personas con discapacidad.						
ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO						

Medida ambiental	Evidencia Requerida
Integración laboral de mujeres cabeza de familia y personas con discapacidad en el proyecto.	Se vinculan dos mujeres -cargo Paleteras Ver Informe SST - OBRA

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Especialista Ambiental /Contratista
CRONOGRAMA	Durante la vigencia del contrato


SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR	COMPLEJIDAD	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Verificación de horarios laborales flexibles y alianzas orientadas a padres y padres cabeza de familia, madres lactantes, entre otros grupos poblacionales. Flexibilización = (Número de padres-madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización / Número total de padres- madres cabeza de hogar del proyecto) x100	Media baja	De acuerdo con las solicitudes de integración laboral	En tramite constante solicitudes laborales inclusión género femenino SE vinculan dos mujeres la proyecto

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

10. CONCLUSIONES

- Durante el periodo evaluado, las actividades ejecutadas en el proyecto se desarrollaron conforme a lo establecido en el Plan de adaptación a la guia ambiental (PAGA), evidenciando un adecuado control de los impactos ambientales asociados a la fase de construcción.
- La identificación y valoración de impactos ambientales permitió establecer que los efectos generados por las actividades de preliminares, movimiento de tierras, construcción de la estructura de pavimento y obras de drenaje presentan una importancia baja a media, siendo en su mayoría temporales, localizados y reversibles mediante la aplicación de medidas de manejo ambiental.
- Las medidas de prevención, mitigación y control implementadas durante el periodo evaluado resultaron eficaces para minimizar la generación de material particulado, el manejo de residuos de construcción y demolición, la protección del suelo y el control de ruido, evitando afectaciones significativas sobre los componentes abiótico, biótico y socioeconómico.
- El proyecto dio cumplimiento a las acciones de capacitación y concientización ambiental dirigidas al personal de obra, destacándose la capacitación en mitigación y control de incendios, la cual contribuye a la prevención de riesgos ambientales y a la protección de la seguridad de los trabajadores y del entorno.
- No se evidenciaron incumplimientos ambientales ni impactos negativos de carácter permanente durante el periodo correspondiente al Informe de Cumplimiento Ambiental No. 04, lo que demuestra un adecuado desempeño ambiental del proyecto.
- Las acciones implementadas fortalecen el compromiso del proyecto con la normatividad ambiental vigente y con la ejecución responsable de las actividades constructivas, garantizando la continuidad de la obra bajo criterios de sostenibilidad y gestión ambiental adecuada.



Ing. **ELIZABETH MAHECHA**
M. P. 1520214291BYC
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA AMBIENTAL

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

11. ANEXO INFORME 01 AVANCE PRESUPUESTAL CUMPLIMIENTO PAGA

Dirección: Calle 20 No. 12 – 84 Tunja. Teléfono: 3104840415 - 3105836391

AVANCE FINANCIERO MENSUAL - CUMPLIMIENTO _PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)						
PROGRAMA1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL						
CODIGO	**PROYECTO**					
DAGA-1.1-01	**Subprograma1. 1. CONFORMACION DE GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**					
	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	MES	VR UNITARIO	VR TOTAL
	ESPECIALISTA AMBIENTAL (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	MES	30%	1	$7,119,377.00	$2,135,813.10
					Total Proyecto:	**$2,135,813.10**
PAC-2.5-08	**Subprograma 2.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES**					
	ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANT**	**MES**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
	Manejo de residuos sólidos (incluye compra punto ecológico) no se generan cargos al PAGA, ya que el costo de los puntos ecológicos hace parte de los porcentajes administrativos del proyecto.	UN				
	Alquiler de 2 baños portátiles, debido a los frentes de trabajo con equipo de succión (según cotización)	UN	2	1	$1,190,000.00	$2,380,000.00
					Total Proyecto:	$2,380,000.00
					AL PERIODO No. 04	**$4,515,813.10**

ANEXO 3. INFORME PLAN DE CALIDAD MES 4- OBRA

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

INFORME DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026



PRESENTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA – No. IPO 003-2025, CUYO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

ELABORADO POR:
CONSORCIO LA CANDELARIA

2026

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No	FECHA EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	RESPONSABLE
0	16/07/2025	Emisión primera versión.	Coordinador de Calidad
1	31/10/2025	Informe No. 01 de plan de aseguramiento de calidad	Asesor Ambiental
2	30/11/2025	Informe No. 02 de plan de aseguramiento de calidad	Asesor Ambiental
3	31/12/2025	Informe No. 04 de plan de aseguramiento de calidad	Asesor Ambiental
4	31/01/2026	Informe No. 04 de plan de aseguramiento de calidad	Asesor Ambiental

Este documento hace parte integral del PROYECTO.

CONTENIDO

CONTROL DE CAMBIOS 2
1. DEFINICIONES: 4
2. POLITICA DE CALIDAD 10
3. MARCO NORMATIVO 11
4. OBJETIVOS 13
4.1. OBJETIVO GENERAL 13
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 13
5. INTRODUCCION 14
6. COMPONENTE GESTION ADMINISTRATIVA 16
7. COMPONENTE TÉCNICO 21
7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 21
A. PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 21
B. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 23
C. OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN 24
8. COMPONENTE GESTION FINANCIERA 27
9. COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL 32
10. CONTRATACION, COMPRAS Y ALQUILER 34
11. COMPONENTE GESTION DE SEGUROS Y DE RIESGOS 37
12. CONCLUSIONES 38
13. CERTIFICADOS DE CALIDAD ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. DEFINICIONES:

ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad u otra situación potencial no deseable.

AMBIENTE DE TRABAJO: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

AUDITORÍA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

CARACTERÍSTICA: rasgo diferenciador.

ENTIDAD CONTRATANTE: persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella.

CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito.

CORRECCIÓN: acción para eliminar una (No) conformidad detectada.

DETERMINACIÓN: actividad para encontrar una o más características y sus valores característicos.

DOCUMENTO: información y el medio en el que está contenida.

EFICACIA: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

ESPECIFICACIÓN: documento que establece requisitos.

ESTRATEGIA: plan para lograr un objetivo a largo plazo o global.

ÉXITO: logro de un objetivo.

GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

GESTIÓN DE LA CALIDAD: gestión con respecto a la calidad.

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

INFORMACIÓN: datos que poseen significado.

INSPECCIÓN: determinación de la conformidad con los requisitos específicos.

MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para mejorar el desempeño.

NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.

OBJETIVO: resultado a lograr.

OBJETIVO DE LA CALIDAD: objetivo relativo a la calidad.

POLÍTICA: intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección.

POLÍTICA DE LA CALIDAD: política relativa a la calidad.

PROCEDIMIENTO: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.

PROYECTO: proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas.

REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

REVISIÓN: determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos objetivos establecidos.

RIESGO: efecto de la incertidumbre.

SALIDA: resultado de un proceso.

SISTEMA: conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.

SISTEMA DE GESTIÓN: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: parte de un sistema de gestión relacionada con la calidad.

VALIDACIÓN: confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

VERIFICACIÓN: confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

ACCIDENTE DE TRABAJO: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

ACCIDENTE DE TRABAJO GRAVE: aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.

ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

ACCIÓN DE MEJORA: acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

ACCIÓN PREVENTIVA: acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

CONDICIONES DE SALUD: el conjunto de variables objetivas y de auto reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

EMERGENCIA: es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.

INCIDENTE DE TRABAJO: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.

MATRIZ LEGAL: es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.

NO CONFORMIDAD: no cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.

PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.

REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

REQUISITO NORMATIVO: requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.

RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.

VALORACIÓN DEL RIESGO: consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.

Abreviaturas

PCV	PLAN DE CALIDAD VIAL
PED	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS.
PCD	PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS
OMV	OBRA DE MANTENIMIENTO VIAL
PASC	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

2. POLITICA DE CALIDAD

El CONSORCIO LA CANDELARIA, en desarrollo del contrato correspondiente al proyecto de mejoramiento de la vía Ráquira – La Candelaria, se compromete a cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos establecidos en los documentos contractuales, garantizando una ejecución oportuna, eficiente y bajo los más altos estándares de calidad y sostenibilidad ambiental.

Para tal fin, se implementa el Plan de Aseguramiento de la Calidad, fundamentado en un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, integrando además criterios ambientales y sociales en coherencia con los lineamientos normativos y contractuales aplicables.

El Consorcio adopta como principio rector la mejora continua de los procesos, promoviendo el uso de tecnología adecuada, personal altamente calificado y procedimientos controlados que aseguren el cumplimiento de las metas técnicas, ambientales y sociales del proyecto.

De igual manera, el CONSORCIO LA CANDELARIA reafirma su compromiso con el cumplimiento ambiental, velando por la correcta implementación de los programas de manejo ambiental, el uso racional de los recursos naturales y la prevención de impactos negativos sobre el entorno y las comunidades del área de influencia.

Este compromiso integral de calidad y sostenibilidad permite garantizar que la ejecución del proyecto se realice conforme a los más altos estándares técnicos, ambientales y administrativos, cumpliendo las disposiciones del contrato y las exigencias establecidas por la interventoría y las autoridades competentes.

3. MARCO NORMATIVO

MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA	
ISO 9001	Norma para la gestión de calidad reconocida mundialmente. Ayuda a organizaciones de todos los tamaños y sectores a mejorar su desempeño, cumplir con las expectativas de los clientes y demostrar su compromiso con la calidad.
NTC ISO 9001:2015	Manejo de la gestión de la calidad; aplicable a cualquier organización; es de carácter internacional; provee a las organizaciones orientación y herramientas para asegurar el cumplimiento de los requerimientos: legales y de sus clientes.
NTC ISO 10005:2018	Proporciona pautas para establecer, revisar, aceptar, aplicar y revisar planes de calidad. Este documento es aplicable a los planes de calidad para cualquier resultado previsto, ya sea un proceso, producto, servicio, proyecto o contrato, y cualquier tipo o tamaño de organización.
Resolución 2335 de 2022, que adopta las versiones 2022 de las Guías de Manejo Ambiental para modos carretero, marítimo y fluvial, derogando las resoluciones anteriores (2009 y 2013) y actualizando los marcos de aplicación para la gestión ambiental en proyectos viales, marítimos y fluviales, siempre bajo el cumplimiento de la legislación ambiental colombiana vigente.	Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura delINVIAS.
Normas y Especificaciones de Invías 2012, actualizadas y complementadas por la Resolución 2451 del 15 de julio de 2022	Normas de Ensayo para Carreteras.
Resolución No. 003288 del 15 de agosto de 2007.	Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras
Versión 2022, emitido y actualizado por el INVIAS, que reemplazó a la versión anterior de 1998 y establece metodologías para evaluar el flujo vehicular y el desempeño de estas vías, alineándose con la Resolución 20223040024795 de 2022.	Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Calessegunda versión.
Resolución No. 000744, del 4 de marzo de 2009.	Manual de Diseño Geométrico para Carreteras.

Resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024 del Ministerio de Transporte	Manual de Señalización Vial.
Resolución No. 002857 de 1999, aunque se complementa con metodologías como AASHTO 93 y actualizaciones más recientes del INVIAS, como la Guía de Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte (Versión 2, 2022) y Cartilla de buenas prácticas para el manejo y uso del material recuperado de pavimentos asfálticos	Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios yAltos Volúmenes de Tránsito.
Resolución 003482 de 2007, aunque se complementa con especificaciones y guías más recientes, usando metodologías como AASHTO-93 adaptadas.	Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con bajos Volúmenes de Tránsito.
Adoptada en la Resolución 000743 de 2009, que actualizó la versión de 2002, aunque se complementa con normativas más recientes como la Resolución 2413 de 2022 (Guía de Estructuración de Proyectos) y otras especificaciones técnicas y cartillas de buenas prácticas de INVIAS	Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación dePavimentos Asfálticos de Carreteras.
Resolución 2413 de 2022, que complementan los diseños hidrológicos y la ejecución de obras, estableciendo periodos de retorno para plataformas (25-50 años) y drenaje transversal (≥100 años), con énfasis en la aplicación de flujos ideales (Tipo 4) y criterios ambientales (RAS-2000) para un diseño eficiente y sostenible.	Manual de Drenaje para Carreteras de INVIAS (2009) Cartilla de Obras Menores de Drenaje (2020). Guía de Estructuración de Proyectos
NSR-10 (Decreto 926 de 2010), pero ha tenido modificaciones, con el Decreto 1401 de 2023 que permite la aplicación de la nueva norma AIS 410-23 para la reducción de vulnerabilidad en viviendas informales de mampostería, actualizado y complementando la base de la NSR-10	Norma sismo resistente 2010 NSR10 y sus modificaciones.
Resolución No. 000090 del 26 deenero de 2004, emanada del Ministerio de Transporte	Por la cual se establece la instalación obligatoria de vallas informativas en las obras públicas que realice el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas.
Resolución No. 002543 del 23 de agosto de 2000, emanada del Ministerio de Transporte	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 002633 del 14 de ENERO de 1999. Vallas informativas.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, en el marco del proyecto de Mejoramiento de la Vía Ráquira – La Candelaria, con el fin de garantizar la planeación, control, ejecución y seguimiento eficiente de las actividades constructivas, ambientales y administrativas, asegurando el cumplimiento de los requisitos contractuales, la satisfacción de las partes interesadas y la mejora continua en los procesos del proyecto.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Implementar la estandarización de operaciones y procesos.

- Definir las actividades organizadas y controladas desde su inicio hasta el fin, permitiendo la trazabilidad del proyecto.

- Establecer los criterios y lineamientos correspondientes a la Gestión Administrativa, Técnica, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social, de Seguros y de Riesgos

- Realizar planes de mejora si en los resultados esperados de organización y cumplimiento contractual no fueron satisfactorios.

5. INTRODUCCION

El presente Informe de Calidad No. 04 corresponde al seguimiento técnico y de aseguramiento de la calidad realizado durante el mes de enero de 2026, en el marco del proyecto “Mejoramiento de la vía Ráquira – La Candelaria, del municipio de Ráquira, departamento de Boyacá”, ejecutado por el Consorcio La Candelaria

Durante el período evaluado se ejecutaron las siguientes actividades, las cuales fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, enfocándose principalmente en el control de calidad de los procesos que aseguran el cumplimiento de los requisitos contractuales, conforme al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) implementado, bajo las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 y los criterios de control de calidad establecidos:

A. PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.02 Excavación de cortes y canales sin clasificar, incluyendo acarreo libre hasta 5 km, ejecutada entre las abscisas K5+300 – K6+260.

1.03 Demolición de pavimento asfáltico con espesor de 3 cm, incluyendo cargue y transporte hasta 5 km, entre las abscisas K4+400 – K6+060.

1.04 Suministro, extendida y compactación de material para afirmado, con tamaño máximo de 2”, índice plástico ≤ 9% y compactación al 95% del Proctor Modificado, incluyendo acarreo libre hasta 5 km, entre K4+070 – K5+800.

1.05 Conformación de botadero de escombrera en la abscisa K3+305.

1.06 Transporte de material de afirmado y/o granular suelto (medido en banco) a distancias superiores a 5 km, entre K4+070 – K5+800.

B. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

2.01 Escarificación, mezclado, conformación y compactación de subbase y/o base, ejecutada entre K4+400 – K4+260.

2.02 Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular, incluyendo acarreo libre hasta 5 km, entre K4+000 – K4+500.

2.06 Transporte de material de afirmado y/o granular suelto (medido en banco) a distancias mayores a 5 km, entre K4+000 – K4+500.

C. OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN

3.01 Demolición de obras en concreto simple (cunetas existentes), incluyendo cargue y retiro de sobrantes con acarreo libre hasta 5 km, entre K3+400 – K5+260.

3.11 Corte de pavimento asfáltico, ejecutado entre K0+980 – K2+995.

3.12 Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPa (3000 PSI) sin refuerzo, incluyendo sello de juntas, entre K0+980 – K1+700.

3.13 Suministro e instalación de malla electrosoldada para cunetas, entre K0+980 – K1+700.

6. COMPONENTE GESTION ADMINISTRATIVA

Durante el mes de enero de 2026, en el marco de la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la vía Ráquira – La Candelaria, del municipio de Ráquira, departamento de Boyacá”, el componente de Gestión Administrativa estuvo orientado a garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales, así como la adecuada planeación, control y seguimiento de los recursos humanos, técnicos, financieros y ambientales.

Características principales del contrato:

NÚMERO DEL CONTRATO	IPO-003- 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO LA CANDELARIA NIT. 901.976.668-6 R/L ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ
ENTIDAD CONTRATANTE Y SUPERVISIÓN	TIERRASUA S.A.S R/L JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCANDELARIA NIT. 901.980.215-9 R/L NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	REGALIAS
VALOR INICIAL	VEINTE MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE ($ 20.406.995.280,12)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	1 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	DOCE (12) MESES

6.1. Recurso Humano

Durante el mes de enero de 2026, el recurso humano asignado al proyecto constituyó un elemento fundamental para el adecuado desarrollo de las actividades constructivas y administrativas, aportando su conocimiento, experiencia y compromiso al cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y plazos contractuales.

El personal vinculado al proyecto se encontró debidamente afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, garantizando el cumplimiento de la normatividad laboral vigente y el bienestar de los trabajadores durante la ejecución de las actividades.

PERSONAL VINCULADO A 31 DE ENERO DE 2026			
AREA	CARGO	CC	NOMBRE
PROFESIONALES	DIRECTOR DE OBRA	6765918	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA
	GERENTE DE PROYECTOS	6765918	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA
	RESIDENTE DE OBRA	6759479	HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ
	ESPECIALSITA EN PAVIMENTOS	6775637	JAIME ORLANDO GOMEZ RODRIGUEZ
	ESP INGENIERIA AMBIENTAL	52797064	ELIZABETH MAHECHA VALERO
	ESPECIALISTA SST	1057582849	DIEGO FERNANDO SALDAÑA SANCHEZ
	PROFESIONAL AMBIENTAL	1193447840	JUAN CAMILO PEDRAZA GOMEZ
	INSPECTOR DE OBRA	4.375.181	JUAN GUILLERMO CIFUENTES SANCHEZ
	INSPECTOR DE OBRA 2	6.755.678	GERMAN ANTONIO PEDRAZA SANCHEZ
	RESIDENTE DE OBRA 2	1.049.628.290	DANIEL AUGUSTO PEDRAZA PEREZ
	AUXILIAR SST	1049649865	MARIA FERNANDA ARIAS AMEZQUITA
	OPERADOR MOTONIVELADORA	74.810.538	RUBEN DARIO CARO PULIDO
	OPERADOR VIBRO	1.116.992.019	CARLOS ARTURO PULIDO
	OPERADOR MINICARGADOR	1.055.227.559	FABIO ORLANDO TENJO BAUTISTA
	CONTROLADORA VIAL	1.000.687.128	MARIA FERNANDA GALINDO VANEGAS

	CONTROLADOR VIAL	1.124.510	ISNARDO MAURICIO MURCIA NOVA
	CONTROLADOR VIAL	1.013.577.862	MARLEN FLORES RONCANCIO
	MAESTRO	1.057.015.398	JULIAN ANDRES TRIANA MARIN
	AYUDANTE	4.114.321	MARCO AURELIO SUAREZ
	AYUDANTE	1.057.893.372	YEISON MANUEL SALINAS SIERRA
	AYUDANTE	1.057.892.958	HERLEY LISANDRO SALINAS SIERRA
	AYUDANTE	6.014.634	FERDINANDO CARDENAS SALINAS
	AYUDANTE	1.049.412.918	FABIO YOHANY BUITRAGO RICO
	CELADOR	1.124.186	JOSE ANTONIO REINA RODRIGUEZ
OPERATIVO	RECEPCIONISTA DE MATERIAL	6776554	JUAN MAURICIO MARTINEZ REYES
	OPERADOR VIBRO	1002395198	JHON FABER SUÁREZ SAMACA
	OPERADOR MOTONIVELADORA	4081635	SUAREZ SARMIENTO JOSE HECTOR
	CONTROLADOR VIAL	1057892794	DILSA FERNANDA DORADO SIERRA
	CONTROLADOR VIAL	23973910	LUZ DARY RAMIREZ BUITRAGO
	AYUDANTE	9540570	ESTEBAN RODRIGUEZ
	AYUDANTE	1002735699	JACKSON SNEIDER SANDOVAL RIOS
	AYUDANTE	7278624	LUIS ALFONSO TRIANA FAJARDO
	CONDUCTOR	1121880221	JAVIER RICO
	OPERADOR ORUGA	86.014.572	JHON FREDY HERNANDEZ

6.2. Capacidad Técnica y Operativa

Durante el período evaluado, el equipo humano fue responsable de ejecutar las actividades correspondientes a las diferentes fases del proyecto, desde los trabajos preliminares y movimiento de tierras hasta las actividades relacionadas con la estructura de pavimento y obras complementarias.

La calidad técnica de los trabajos ejecutados durante enero de 2026 dependió en gran medida de la formación, experiencia y habilidades del personal, permitiendo una adecuada identificación y solución oportuna de situaciones técnicas, minimizando reprocesos y garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales.

6.3. Cumplimiento Normativo y Legal

En el marco de la ejecución del proyecto durante enero de 2026, se verificó que todo el personal, tanto directo como operativo, se encontrara afiliado a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, dando cumplimiento a la normativa legal vigente.

Este cumplimiento no solo responde a una obligación legal, sino que también protege los derechos laborales de los trabajadores y mitiga riesgos legales y contractuales para el contratista.

6.4. Bienestar y Seguridad de los Trabajadores

La afiliación al sistema de seguridad social garantizó una protección integral del personal durante el desarrollo de las actividades del proyecto, especialmente considerando los riesgos inherentes a las obras de infraestructura vial.

Contar con esta cobertura contribuyó a mejorar las condiciones laborales, fortalecer la confianza del equipo de trabajo y mantener un adecuado nivel de desempeño durante el mes de enero de 2026.

6.5. Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional

Durante el período evaluado se dio cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementando acciones de prevención de riesgos laborales, control de condiciones inseguras y promoción de prácticas seguras en obra.

Estas acciones permitieron reducir la probabilidad de incidentes y accidentes laborales, garantizando un entorno de trabajo seguro y alineado con las exigencias normativas y contractuales.

6.6. Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial

El contratista demostró su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, asegurando condiciones laborales dignas y el cumplimiento de las obligaciones sociales y legales con su equipo humano durante la ejecución del proyecto en enero de 2026.

Este enfoque contribuyó al fortalecimiento de la imagen institucional del proyecto frente a las autoridades, la comunidad y demás partes interesadas.

6.7. Motivación y Productividad

La garantía de estabilidad laboral y cobertura en seguridad social permitió que los trabajadores desarrollaran sus funciones con mayor tranquilidad y compromiso, impactando positivamente la productividad y calidad de las actividades ejecutadas durante el período evaluado.

Este factor se reflejó en una adecuada continuidad operativa y en el cumplimiento de las metas establecidas para el mes de enero de 2026.

7. COMPONENTE TÉCNICO

7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento del objeto contractual y de las actividades ejecutadas, el Consorcio la Candelaria garantizo, durante el mes de enero de 2026, el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en conformidad con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, en el desarrollo de las actividades constructivas ejecutadas en el proyecto “Mejoramiento de la vía Ráquira – La Candelaria, municipio de Ráquira, departamento de Boyacá”.

El control técnico implementado incluyó la supervisión permanente de los procesos de planificación, ejecución, inspección y verificación de las actividades realizadas durante el período evaluado, así como la aplicación de acciones correctivas y preventivas cuando fue requerido, con el fin de asegurar la calidad, durabilidad y sostenibilidad de las obras ejecutadas.

A. PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.02 Excavación de cortes y canales sin clasificar

Proceso constructivo:

La excavación se realizó mediante equipos mecánicos, conforme a las secciones y cotas definidas en los planos del proyecto. El material excavado fue cargado y transportado a sitios autorizados, incluyendo acarreo libre hasta 5 km, garantizando la estabilidad de los taludes y la correcta conformación de canales para drenaje superficial.

Control de calidad:

- Verificación de alineamientos, pendientes y profundidades conforme a planos.
- Inspección visual de estabilidad de taludes y geometría de los canales.
- Control de disposición final del material excavado en sitios autorizados.
- Registro fotográfico y actas de inspección en obra.

1.03 Demolición de pavimento asfáltico e = 3 cm

Proceso constructivo:

Se efectuó el corte y demolición del pavimento asfáltico existente mediante equipos mecánicos, asegurando la remoción controlada del material. El material demolido fue cargado y transportado hasta el sitio de disposición autorizado, incluyendo acarreo libre hasta 5 km.

Control de calidad:

- Verificación de espesores demolidos conforme a lo establecido en el contrato.
- Control de áreas intervenidas según abscisas aprobadas.
- Supervisión del cargue, transporte y disposición final del material.
- Registro de volúmenes y evidencia documental.

1.04 Suministro, extendida y compactación de material para afirmado

Proceso constructivo:

El material para afirmado fue suministrado desde fuente aprobada, extendido en capas uniformes y compactado mediante equipo vibratorio hasta alcanzar una densidad mínima del 95% del Proctor Modificado. El material cumplió con tamaño máximo de 2” e índice plástico ≤ 9%, incluyendo acarreo libre hasta 5 km.

Control de calidad:

- Verificación de la procedencia y características del material.
- Ensayos de laboratorio (granulometría, límites de Atterberg y Proctor).
- Control de espesor de capas y número de pasadas del equipo de compactación.
- Ensayos de densidad in situ para verificación del grado de compactación.

1.05 Conformación de botadero de escombrera

Proceso constructivo:

La escombrera fue conformada en el sitio autorizado, garantizando la disposición ordenada y estable del material, de acuerdo con los lineamientos ambientales y técnicos establecidos en el proyecto.

Control de calidad:

- Verificación de localización conforme a lo aprobado ambientalmente.
- Inspección de estabilidad y conformación del botadero.
- Control del tipo de material dispuesto.
- Registro fotográfico y actas de seguimiento ambiental.

1.06 Transporte de material de afirmado y/o granular suelto (más de 5 km)

Proceso constructivo:

El material granular fue transportado desde la fuente hasta el frente de obra mediante volquetas, garantizando condiciones adecuadas de cargue, transporte y descargue, para distancias superiores a 5 km.

Control de calidad:

- Control de volúmenes transportados y distancias recorridas.
- Verificación de condiciones del material durante el transporte.
- Registro de viajes y control documental de despacho.

B. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

2.01 Escarificación, mezclado, conformación y compactación de subbase y/o base

Proceso constructivo:

La capa existente fue escarificada, humedecida y mezclada de manera uniforme, posteriormente conformada y compactada hasta alcanzar las condiciones geométricas y de densidad especificadas en el diseño.

Control de calidad:

- Verificación de espesor y nivelación de la capa tratada.
- Control de humedad óptima durante el proceso de compactación.
- Ensayos de densidad in situ para verificación del grado de compactación.
- Inspección visual de uniformidad y acabado superficial.

2.02 Suministro, extendida y compactación de material para subbase granular

Proceso constructivo:

El material seleccionado para subbase granular fue extendido en capas homogéneas y compactado mediante equipos apropiados, cumpliendo con las especificaciones técnicas y el acarreo libre hasta 5 km.

Control de calidad:

- Verificación de la calidad del material mediante ensayos de laboratorio.
- Control de espesores y alineamientos.
- Ensayos de densidad in situ y control de humedad.
- Registro de resultados y aprobación por interventoría.

2.06 Transporte de material granular (más de 5 km)

Proceso constructivo:

Se realizó el transporte del material granular desde la fuente aprobada hasta los puntos de uso, asegurando la integridad del material durante el traslado.

Control de calidad:

- Control de cantidades y distancias transportadas.
- Verificación de condiciones de cargue y descargue.
- Registro documental de transporte.

C. OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN

3.01 Demolición de obras en concreto simple (cunetas existentes)

Proceso constructivo:

Las cunetas existentes fueron demolidas de manera controlada, utilizando equipos mecánicos, y el material resultante fue retirado y dispuesto en sitio autorizado, incluyendo acarreo libre hasta 5 km.

Control de calidad:

- Verificación de áreas intervenidas.
- Control de cargue, transporte y disposición final.
- Registro fotográfico y actas de demolición.

3.11 Corte de pavimento asfáltico

Proceso constructivo:

El pavimento asfáltico fue cortado de forma precisa mediante equipos especializados, garantizando bordes limpios y alineados para la posterior ejecución de obras.

Control de calidad:

- Verificación de alineamientos y profundidades de corte.
- Inspección del estado de los bordes del pavimento.
- Registro de tramos intervenidos.

3.12 Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPa

Proceso constructivo:

Se realizó la conformación de la sección, colocación de formaleta y vaciado de concreto con resistencia de 21 MPa (3000 PSI), asegurando un adecuado curado y sellado de juntas conforme a especificaciones.

Control de calidad:

- Verificación del diseño de mezcla y resistencia del concreto.
- Control de asentamiento (slump) y toma de cilindros.
- Inspección de acabado, alineamiento y curado.
- Registro de resultados de ensayos.

3.13 Suministro e instalación de malla electrosoldada

Proceso constructivo:

La malla electrosoldada fue suministrada e instalada conforme a planos, asegurando su correcta ubicación y recubrimiento previo al vaciado del concreto.

Control de calidad:

- Verificación de especificaciones y dimensiones de la malla.
- Inspección de la correcta colocación y fijación.
- Aprobación previa al vaciado del concreto.

8. COMPONENTE GESTION FINANCIERA

El presente informe financiero tiene como objetivo presentar un análisis detallado de la programación y flujo de fondos del proyecto y se consolida los costos directos, indirectos y otros gastos asociados a la ejecución de la obra, permitiendo un seguimiento transparente y ordenado de los recursos financieros durante la implementación del proyecto.

ESTADO FINANCIERO	
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$20.406.995.280,12
VALOR ANTICIPO (30% DEL VALOR)	$6.122.098.584,04

Para el desembolso del anticipo, se realizó apertura del negocio fiduciario con Bancolombia, del cual se generó el contrato No. 18083 con su respectiva certificación bancaria del P.A del anticipo para el giro de los recursos.

Plan de inversión del anticipo (reprogramación No.1) y discriminación de Ordenes de pago a la fecha
- ORDENES TRAMITADAS Y PAGADAS POR RUBRO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR APROBADO	VALOR PAGADO	SALDO
1	PAGO DE NOMINAS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	$ 220.395.549,03	$ 220.394.700,00	$ 849,03
2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL	$ 1.591.745.631,85	$ 1.591.745.550,00	$ 81,85
3	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS	$ 575.477.266,90	$ 575.471.616,00	$ 5.650,90
4	SUB-CONTRATOS DE OBRA CIVIL	$ 3.734.480.136,26	$ 3.734.472.553,00	$ 7.583,26
	TOTAL	$ 6.122.098.584,04	$ 6.122.084.419,00	$ 14.165,04

8.1. REPORTE DE FLUJO DE INVERSIÓN POR ACTIVIDADES

Durante el Periodo No. 04 (01-01-2026 al 31-01-2026) se realizó seguimiento al flujo de inversión del proyecto, de acuerdo con las actividades ejecutadas por capítulos y conceptos asociados, evidenciando el comportamiento financiero de la obra frente al presupuesto aprobado.

El valor total de la obra asciende a $20.406.995.280,12, mientras que el valor ejecutado acumulado a corte del periodo corresponde a $1.212.276.583,44, reflejando un avance financiero coherente con el nivel de ejecución física reportado para el periodo.

Capítulo 1. Preliminares

La inversión se concentró principalmente en actividades asociadas a:

- Excavación de cortes y canales.
- Demolición de pavimento asfáltico.
- Suministro, extendida y compactación de material para afirmado.
- Transporte de material granular.

Este capítulo presenta un subtotal ejecutado de $626.641.392,00, evidenciando un avance significativo en las actividades iniciales necesarias para el desarrollo del proyecto.

Capítulo 2. Construcción de estructura de pavimento

Durante el periodo se registró ejecución en:

- Escarificación, mezclado y conformación de subbase y base.
- Suministro y extendida de material granular.
- Transporte de materiales de afirmado y mezcla asfáltica.

El valor ejecutado en este capítulo fue de $284.143.751,00, lo cual indica un avance progresivo en la conformación de la estructura del pavimento, acorde con la programación establecida.

Capítulo 3. Obras de drenaje y estructuras de protección

Las inversiones se enfocaron principalmente en:

- Demolición de obras en concreto.
- Corte de pavimento asfáltico.
- Construcción de cunetas revestidas.
- Instalación de malla electrosoldada.

El subtotal ejecutado en este capítulo asciende a $284.772.015,00, reflejando el inicio y desarrollo de las estructuras hidráulicas y de protección previstas.

Otros conceptos

Adicionalmente, se ejecutaron recursos en actividades complementarias tales como:

- Plan de manejo de tráfico.
- Plan de adaptación de la guía ambiental.

Estas actividades presentan un valor ejecutado de $16.719.425,44, fundamentales para garantizar el cumplimiento normativo, ambiental y de seguridad vial durante la ejecución de la obra.

CONSORCIO LA CANDELARIA
NIT. 901.976.668-6

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DIST %	VALOR TOTAL + AIU	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
						M4 - 01-01-2026 - 31-01-2026	
1	CAP. 1: PRELIMINARES						
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	$ 361,895.00	6.26	0.00%	$ 2,945,101.50	0.00	$ -
1.02	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 33,952.00	10,443.81	0.00%	$ 460,964,708.30	2,195.00	$ 96,882,032.00
1.03	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	$ 8,991.00	25,040.00	0.00%	$ 292,675,032.00	5,400.00	$ 63,116,820.00
1.04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)	$ 106,573.00	5,066.88	0.00%	$ 701,990,382.90	1,750.00	$ 242,453,575.00
1.05	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	$ 4,313.00	6,332.78	0.00%	$ 35,507,264.20	0.00	$ -
1.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	$ 2,765.00	179,367.55	0.00%	$ 644,736,658.50	62,370.00	$ 224,188,965.00
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 2,138,819,147.40		$ 626,641,392.00
2	CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						
2.01	ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE	$ 9,207,262.00	6.26	0.00%	$ 74,928,698.20	1.72	$ 20,587,438.00
2.02	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	$ 140,355.00	12,178.55	0.00%	$ 2,222,116,500.80	850.00	$ 155,092,275.00
2.03	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	$ 145,808.00	6,837.84	0.00%	$ 1,296,115,307.10	0.00	$ -
2.04	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	$ 4,912.00	38,161.25	4.00%	$ 253,429,777.10	0.00	$ -
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	$ 1,127,223.00	3,052.90	0.00%	$ 4,473,688,825.70	0.00	$ -
2.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	$ 2,765.00	673,180.21	0.00%	$ 2,419,746,264.80	30,175.00	$ 108,464,038.00
2.07	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (MEDIDA EN BANCO).	$ 3,452.00	168,825.37	0.00%	$ 757,620,730.40	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				$ 11,497,646,104.10		$ 284,143,751.00

3	CAP. 3: OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN						
3.01	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	$ 244,765.00	821.45	0.00%	$ 261,380,871.70	251.68	$ 80,083,192.00
3.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	$ 70,530.00	17.32	0.00%	$ 1,588,054.00	0.00	$ -
3.03	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 33,952.00	1648.72	0.00%	$ 72,770,543.30	0.00	$ -
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	$ 558,149.00	72.38	4.00%	$ 54,619,211.40	0.00	$ -
3.05	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	$ 1,030,440.00	54.71	4.00%	$ 76,219,503.10	0.00	$ -
3.06	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	$ 1,267,906.00	70.94	4.00%	$ 121,605,980.60	0.00	$ -
3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO)	$ 724,942.00	140.00	4.00%	$ 137,217,021.50	0.00	$ -
3.08	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	$ 119,864.00	455.48	0.00%	$ 70,974,351.50	0.00	$ -
3.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	$ 31,740.00	6554.40	0.00%	$ 270,447,652.80	0.00	$ -
3.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 7,675.00	8104.60	4.00%	$ 84,098,192.10	0.00	$ -
3.11	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	$ 9,017.00	12520.00	0.00%	$ 146,760,692.00	2,995.00	$ 35,107,690.00
3.12	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	$ 778,253.00	1597.78	4.00%	$ 1,681,181,009.30	144.00	$ 151,516,520.00
3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	$ 7,423.00	29511.00	4.00%	$ 296,169,326.10	1,800.00	$ 18,064,613.00
3.14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	$ 2,765.00	47919.80	0.00%	$ 172,247,721.10	0.00	$ -
NP-3.15	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	$ 285,074.72	0.00	0.00%	$ 332,870,348.20	0.00	$ -
NP-3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	$ 33,484.59	0.00	4.00%	$ 64,964,122.60	0.00	$ -
NP-3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	$ 7,326.84	0.00	4.00%	$ 51,812,745.40	0.00	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO MES				**$ 3,896,927,346.70**		**$ 284,772,015.00**

	OTROS						
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)				$ 135,586,480.92		$ 12,203,612.34
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL				$ 54,629,757.20		$ 4,515,813.10
	CARCATERIZACIÓN DEL TRAMO VIAL				$ 25,520,000.00		$ -
	CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP				$ 9,500,000.00		$ -
	AJUSTE AL PESO				$ 11.00		$ -
	TOTAL OBRA				**$ 20,406,995,280.12**		**$ 1,212,276,583.44**

9. COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL

Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026, el Componente Socioambiental del proyecto “Mejoramiento de la vía Ráquira – La Candelaria, municipio de Ráquira, departamento de Boyacá” se desarrolló conforme a lo establecido en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y la normativa ambiental vigente.

Las acciones implementadas estuvieron orientadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales y sociales derivados de las actividades constructivas ejecutadas durante el período evaluado, garantizando la sostenibilidad del proyecto y una adecuada interacción con la comunidad del área de influencia.

9.1. Actividades Socioambientales Desarrolladas

En concordancia con el avance físico de obra durante enero de 2026, se implementaron las siguientes acciones socioambientales asociadas a las actividades ejecutadas:

- Control ambiental en botadero de escombrera, verificando la correcta conformación, estabilidad y disposición del material, evitando afectaciones al suelo y cuerpos de agua cercanos.
- Control de material particulado y polvo, mediante humectación periódica de vías y frentes de trabajo durante las actividades de excavación, transporte de material granular y afirmado.
- Gestión ambiental en transporte de materiales, garantizando el cubrimiento de volquetas y el cumplimiento de rutas autorizadas para minimizar impactos a la comunidad.
- Seguimiento ambiental a obras de drenaje, durante la demolición y construcción de cunetas, evitando obstrucciones y afectaciones a escorrentías naturales.

9.2. Gestión Social y Relacionamiento Comunitario

Durante el período evaluado se mantuvo una comunicación permanente con la comunidad del área de influencia, informando oportunamente sobre:

- Avances de obra y programación de actividades.
- Intervenciones que generaron restricción parcial del tránsito.
- Medidas de seguridad vial y manejo de tráfico implementadas.

Estas acciones contribuyeron a minimizar conflictos sociales, garantizar la seguridad de peatones y usuarios de la vía, y fortalecer la aceptación del proyecto por parte de la comunidad.

9.3. Seguridad y Salud en el Trabajo – Enfoque Ambiental

Las actividades ejecutadas durante enero de 2026 se desarrollaron bajo lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), priorizando:

- Uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP).
- Señalización adecuada de frentes de obra.
- Prevención de riesgos ambientales asociados a derrames, residuos y materiales peligrosos.

9.4. Cumplimiento Normativo y Seguimiento

Durante el período evaluado se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en:

- Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.
- Lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad (NTC ISO 9001:2015 e ISO 10005:2018).

El seguimiento realizado evidenció que las actividades ejecutadas durante enero de 2026 se desarrollaron sin generación de impactos ambientales críticos, manteniendo un adecuado control socioambiental.

Ver informe de cumplimiento Ambiental e informe SST -obra

10. CONTRATACION, COMPRAS Y ALQUILER

El componente de Contratación, Compras y Alquiler tiene como propósito garantizar el adecuado suministro de bienes, servicios, maquinaria y equipos requeridos para la ejecución de las obras contratadas, bajo criterios de transparencia, eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo.

Durante la fase inicial del contrato, este componente se ha enfocado en la planeación y gestión administrativa de las adquisiciones necesarias para el desarrollo de las actividades de obra, priorizando la disponibilidad oportuna de materiales, equipos y servicios complementarios.

Actividades Ejecutadas

Durante el periodo evaluado, se llevaron a cabo las siguientes gestiones y acciones principales:

- Formalización de contratos y órdenes de servicio con proveedores de insumos, materiales de obra y servicios logísticos.
- Contratación de equipos de topografía para actividades de localización, replanteo y control de avance.
- Adquisición y alquiler de maquinaria amarilla (retroexcavadoras, vibrocompactadores, volquetas) necesaria para el inicio de los trabajos de excavación y demolición.
- Negociación y adquisición de materiales básicos como acero de refuerzo, tubería de concreto y agregados pétreos, en cumplimiento de los requerimientos técnicos iniciales.

Proveedores y Recursos Vinculados

Proveedores de Materiales Pétreos

Material	**Proveedor / Empresa**
Material de afirmado o similar	Villamil Mining S.A.S.
Arena y grava	Villamil Mining S.A.S.
Suministro base granular	Planta la libertad
TIPO CONCRETO ASFALTICO MDC-19 ASFALTO 60/70 + PA (NT3)	PAVITEC RL LTDA “Tunja”

Proveedores de Materiales de Construcción

RELACIÓN DE PROVEEDORES Y SOPORTES DE CALIDAD (ACTUALIZADA)

Proveedor	Material suministrado	Certificado / Documento	Norma / Ensayos aplicados	Observaciones
Gerfor Colombia	Tubería de drenaje corrugada PVC rígido 4” con unión	Informe de laboratorio certificado y certificado de calidad	NTC 3358, NTC 2983, NTC 1125, NTC 4215	Cumple requisitos dimensionales, mecánicos y de rotulado
Gerfor Colombia	Geotextil no tejido 400N–160	Certificado de calidad	ASTM D4632, ASTM D6241, ASTM D4533, ASTM D4751, ASTM D4491	Cumple propiedades mecánicas e hidráulicas
Gerfor Colombia	Geotextil no tejido 700N–2500	Certificado de calidad	ASTM D4632, ASTM D6241, ASTM D4533, ASTM D4751, ASTM D4491	Cumple propiedades mecánicas e hidráulicas
PAVCO WAVIN	Tubería de drenaje corrugada PVC rígido y accesorios	Carta de calidad y certificado de conformidad	NTC 203 y normas ASTM aplicables	Fabricado bajo sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015
PAVCO WAVIN	Geotextil no tejido NT 2000	Certificado de conformidad	ASTM D4632, ASTM D6241, ASTM D4533, ASTM D4751, ASTM D4491	Cumple valores mínimos exigidos
HOLCIM Colombia S.A.	Cemento hidráulico ECOART Ecolpanet	Certificado de calidad	NTC 121	Ensayos de fraguado, finura y resistencia a la compresión conformes
HOLCIM Colombia S.A.	Cemento hidráulico UG Fuerte Ecolpanet	Certificado de calidad	NTC 121	Resultados de laboratorio conformes

Ferretería AM	Acero de refuerzo – barras corrugadas 60.000 PSI	Certificado de calidad del fabricante	NTC 2289, ASTM A615 Grado 60	Acero conforme para elementos estructurales
Ferretería G&J	Acero de refuerzo – barras corrugadas 60.000 PSI	Certificado de calidad del fabricante	NTC 2289, ASTM A615 Grado 60	Cumple especificaciones técnicas del proyecto
Laboratorio certificado	Ensayos a materiales de obra	Informes de resultados	NTC y ASTM según material	Resultados aprobados por control de calidad

Maquinaria y Equipos Vinculados

Tipo de Equipo / Maquinaria	**Uso Principal**
Motoniveladora	Conformación y compactación de subbase y base granular.
Excavadora de oruga	Excavaciones, cortes y demolición de estructuras existentes.
Vibrocompactador de 10 toneladas	Compactación de capas de afirmado y subbase.
Volqueta doble troque	Transporte de material de afirmado y escombros.
Volqueta sencilla	Apoyo logístico y acarreo de materiales.

Todo el personal y maquinaria vinculada cumple con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo (SST) conforme al Informe SST anexo.

11. COMPONENTE GESTION DE SEGUROS Y DE RIESGOS

En cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos por TIERRASUA S.A.S., el Consorcio La Candelaria constituyó las garantías exigidas para amparar los riesgos derivados del contrato de obra, conforme a las disposiciones legales vigentes y a lo establecido en el Estatuto Contractual.
Las pólizas fueron expedidas por la compañía BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., y garantizan el cumplimiento integral del contrato, la adecuada utilización del anticipo, la estabilidad de las obras, así como las obligaciones laborales y responsabilidades civiles del contratista.

Estas garantías se encuentran vigentes y aprobadas por la entidad contratante según el acta de inicio de obra.

Compañía Aseguradora	Póliza No.	Riesgo Amparado	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Fecha de Aprobación
Berkley International Seguros Colombia S.A.	No. 95294	Cumplimiento general del contrato	$2.040.699.528,01	01/10/2025	01/04/2027	21/10/2025
Berkley International Seguros Colombia S.A.	No. 95294	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$6.122.098.584,04	01/10/2025	01/02/2027	21/10/2025
Berkley International Seguros Colombia S.A.	No. 95294	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$2.040.699.528,01	01/10/2025	01/10/2029	21/10/2025
Berkley International Seguros Colombia S.A.	No. 95294	Estabilidad y calidad de la obra	$4.081.399.056,02	01/10/2026	01/10/2031	21/10/2025
Berkley International Seguros Colombia S.A.	No. 27386	Responsabilidad civil extracontractual	$1.020.349.764,01	01/10/2025	01/10/2026	21/10/2025


- Las pólizas cumplen con los valores y coberturas exigidas por el pliego de condiciones y el contrato principal.
- Los montos amparados garantizan la cobertura suficiente para riesgos contractuales, laborales y de terceros.

12. CONCLUSIONES

En el marco del Componente Técnico, las actividades correspondientes a preliminares y movimiento de tierras, construcción de la estructura de pavimento y obras de drenaje y estructuras de protección fueron ejecutadas conforme a los procedimientos constructivos establecidos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y los estándares definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. Los procesos de excavación, demolición, suministro y compactación de materiales, transporte, conformación de estructuras y obras hidráulicas se desarrollaron bajo supervisión permanente, asegurando la correcta ejecución y funcionalidad de la infraestructura.

El control de calidad de los materiales utilizados durante el período fue respaldado mediante certificados de conformidad certificados y cartas de calidad emitidas por proveedores reconocidos, tales como Gerfor Colombia, Pavco Wavin, Holcim Colombia S.A., Ferretería AM y Ferretería G&J. Entre los insumos certificados se encuentran tuberías de drenaje en PVC, geotextiles no tejidos, cementos hidráulicos y acero de refuerzo corrugado de 60.000 PSI, los cuales cumplieron con las normas técnicas nacionales (NTC) e internacionales (ASTM) aplicables, garantizando la trazabilidad, resistencia, durabilidad y desempeño adecuado de los materiales incorporados a la obra.

Las actividades constructivas se desarrollaron en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, implementando medidas orientadas a la prevención, mitigación y control de impactos ambientales y sociales. Se garantizó una adecuada gestión de residuos, el control de materiales y escombros, la protección del entorno natural y la seguridad vial y peatonal, así como el respeto por las comunidades del área de influencia.



Ing. **ELIZABETH MAHECHA**
M. P. 1520214291BYC
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA AMBIENTAL

13. CERTIFICADOS DE CALIDAD

Gerfor Colombia

CERTIFICADO DE CALIDAD
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400N-160

PROPIEDADES MECANICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR PROMEDIO REPORTE
Resistencia a la Tensiòn Metodo Grab	ASTM D 4632	N(lb)	450
Elongaciòn		%	>50
Resistencia al Punzonamiento CBR	ASTM D 6241	kN	1,2
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	ASTM D 4533	N	190

PROPIEDADES HIDRAULICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR PROMEDIO REPORTE
Tamaño de Abertura Aparente	ASTM D 4751	mm	0,18
Permeabilidad	ASTM D 4491	cm/s	$46x10^{-2}$
Permitividad	ASTM D 4491	s^{-1}	2,9
Tasa de Flujo	ASTM D 4491	l/min/m2	8109

PROPIEDADES FISICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR PROMEDIO REPORTE
Espesor	ASTM D 5199	mm	1,6
Resistencia UV	ASTM D 4355	%	>70
Ancho		m	3,8
Longitud		m	160
Area		m^2	608

Los valores mostrados son en la dirección principal más débil. Los valores MARV son calculados como el valor típico menos dos desviaciones estándar. Estadísticamente, esto da un grado de 97,7% de confianza de que toda muestra tomada en pruebas de control de calidad excederá el valor reportado.

Ing. Yeimi Milena Franco
Directora Conformidad
yeimi.franco@gerfor.com

Diana Paola Franco G
Diana Paola Franco García
Gerente Geosistemas
diana.franco@gerfor.com

Nit. 860 502 509 - 1
Autopista Medellín Km 2
600 m. vía parcelas, Cota
Cundinamarca, Colombia.
pbx: (1) 877 68 00 /20
fax: (1) 877 68 49
www.gerfor.com

Gerfor Colombia

CERTIFICADO DE CALIDAD
GEOTEXTIL NO TEJIDO 700N-2500

PROPIEDADES MECANICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR PROMEDIO REPORTE
Resistencia a la Tensión Metodo Grab	ASTM D 4632	N(lb)	787
Elongación		%	>50
Resistencia al Punzonamiento CBR	ASTM D 6241	kN	475
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	ASTM D 4533	N	303

PROPIEDADES HIDRAULICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR PROMEDIO REPORTE
Tamaño de Abertura Aparente	ASTM D 4751	mm	0,12
Permeabilidad	ASTM D 4491	cm/s	$40x10^{-2}$
Permitividad	ASTM D 4491	s^{-1}	2,05
Tasa de Flujo	ASTM D 4491	l/min/m2	5055

PROPIEDADES FISICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR PROMEDIO REPORTE
Espesor	ASTM D 5199	mm	2,2
Gramaje	ASTM D 5261	g/m^2	160
Resistencia UV	ASTM D 4355	%	>70
Ancho		m	3,8
Longitud		m	110
Area		m^2	418

Los valores mostrados son en la dirección principal más débil. Los valores MARV son calculados como el valor típico menos dos desviaciones estándar. Estadísticamente, esto da un grado de 97,7% de confianza de que toda muestra tomada en pruebas de control de calidad excederá el valor reportado.

Ing. Yelmi Milena Franco
Directora Conformidad
yelmi.franco@gerfor.com

Diana Paola Franco G
Diana Paola Franco García
Gerente Geosistemas
diana.franco@gerfor.com

Nit: 860 502 509 - 1
Autopista Medellín Km 2
600 m. vía parcelas, Cota
Cundinamarca, Colombia.
pbx: (1) 877 68 00 /20
fax: (1) 877 68 49
www.gerfor.com

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : **Agosto 08 de 2025**
Referencia : **TUBO DRENAJE 4" + UNION**
Norma : **EP-DD-069**
Lote de Fabricación: **30000077212**

REQUISITO	NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERNO	NTC 3358	mm	108,55 - 109,55	109,28
OVALAMIENTO	NTC 3358	mm	2,40	10,01
DIÁMETRO INTERIOR	NTC 3358	mm	100,02 - 103,02	101,22
ESPESOR "VALLE"	NTC 3358	mm	0,65	0,82
LONGITUD MÍNIMA DE TUBO	NTC 3358	mm	Rollo X 30m	CUMPLE
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	NTC 2983	Minutos	20 min (Acetona)	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	NTC 1125	Julios	15	CUMPLE
RIGIDEZ DEL ANILLO	NTC 4215	KN/m2	2,00	2,75
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	NTC 3254	%	30% Del Diámetro Externo	CUMPLE
ROTULADO	EP-DD-014	N/A	GERFOR IND-COL SUPRADEN 4" - 109mm	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Angela Galeano Sánchez
Inspector de Conformidad.

Reviso y Aprobó:

Jenny Rodriguez
Jefe laboratorio

AM FERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900,034,102

CLL 7 # 37 A 05

NTC 5806
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

Resolución 0277 de 2015
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada

FQ1201 | Fecha Rev:18-12-17 | Version: 1


Fecha de Emision : 2/12/2025

Cliente:

Descripcion de la muestra	
N° de Ensayo	3530-1
Referencia de Malla	XX-188
Diámetro de Grafil Long:	6,0
Diamentro de Grafil Transv:	6,0
Fecha de Producción de la Malla	1/12/2025
Fecha de recepcion de muestra	1/12/2025
Fecha de Ensayo	1/12/2025

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA

N° ENSAYO	CARGA (N)	LUGAR DE FALLA
1	15.174	Grafil
2	14.055	Grafil
3	16.297	Grafil
4	13.547	Soldadura
5		
Promedio	14.768	
Requisito de Norma NTC 5806 N° 8.3	6.814	U (KN)
CUMPLE (SI/NO)	SI	6,66

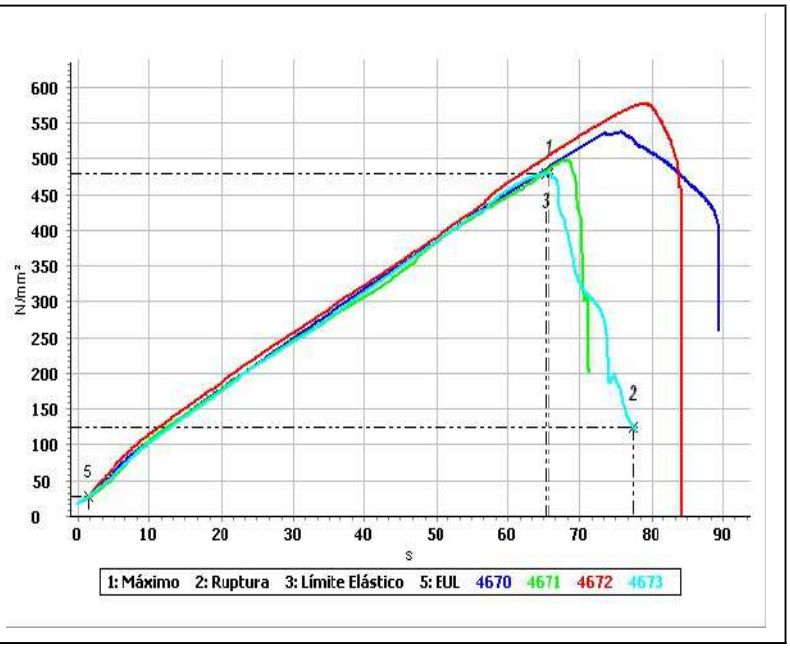

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)

TIPO	OBTENIDO	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	16	16	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)

TIPO	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	5.980	**6.000**	SI
Tranversales	2.340	**2.350**	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requsito Norma NTC 5806-2019 N°11)

	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	150	150	SI
Transversales	150	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requsito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)

TIPO	PROMEDIO OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)	METODO DE ENSAYO
Longitudinales	80	75	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)
Tranversales	40	50	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)

Condiciones Ambientales

Temperatura promedio °C	21.9	**Humedad Relativa promedio (%HR)**	46,0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S. NIT. 900 034 102

Realizó	Revisa:	Aprueba:
Juliana Cuervo Soler	Andrés Rueda	Andrés Rueda
LABORATORISTA	**CALIDAD**	**JEFE DE CALIDAD**
Juliana Cuervo Soler	**Andres Rueda**	**Andres Rueda**

AMFERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
CLL 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil .

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil .

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 26/11/2025

Cliente:

Características de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	5027
Diametro de Grafil (mm)	6,0
Lote	2827
Fecha de Fabricación	25/11/2025
Fecha de recepcion de la muestra	25/11/2025
Fecha de Ensayo	25/11/2025
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

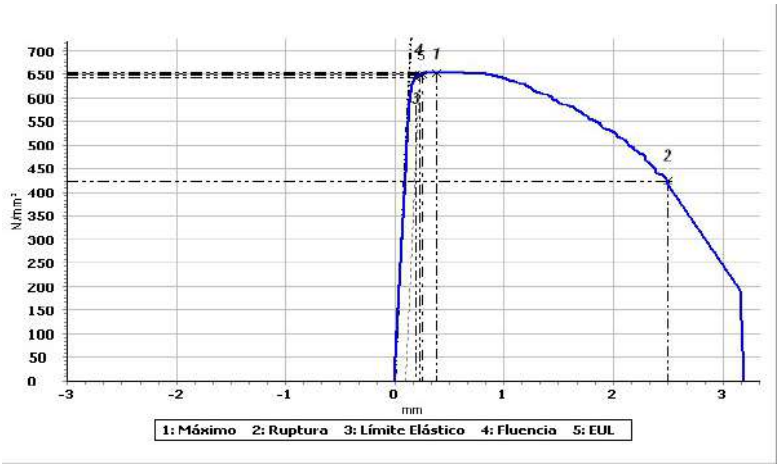

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	20.7	Humedad relativa (HR%)	47,0

DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
				Nominal	6	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0041	6,0	6,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0031	222	211,75	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (g)	0,0031	0,27	0,32	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm).	0,0045	4,62 a 7,24	6,15	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm.).	0,058	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	U (°)	0,00092	Mín 45°	50	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,0045	Mín 25%	26	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	U (mm)	0,0045	Mín 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de Imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Mpa)	2,70	550	653	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Mpa)	2,70	485	650	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AMFERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S. NIT. 900.034.102-1

Realiza: Juliana Cuervo Soler
LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa: Andres Rueda
CALIDAD
Andres Rueda

Aprueba: Andres Rueda
JEFE DE CALIDAD
Andres Rueda

AMFERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
CLL 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil .

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil .

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 1/12/2025

Cliente:

Características de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	5042
Diametro de Grafil (mm)	6,0
Lote	2831
Fecha de Fabricación	29/11/2025
Fecha de recepcion de la muestra	29/11/2025
Fecha de Ensayo	29/11/2025
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

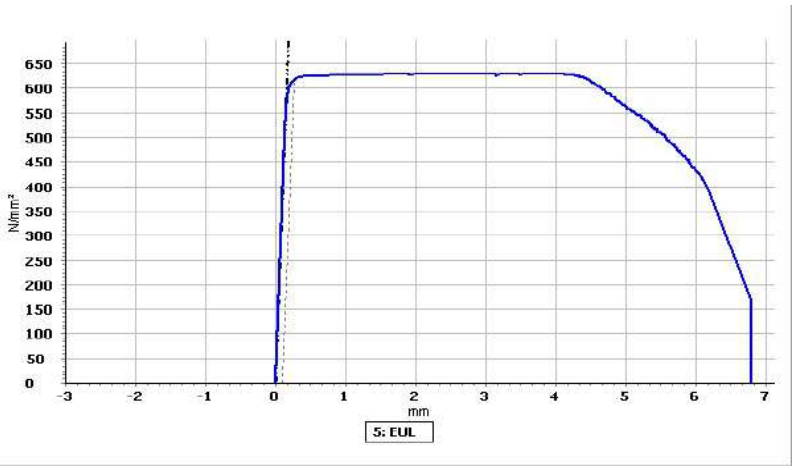

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	21.7	Humedad relativa (HR%)	47,0

DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
				Nominal	6	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0041	6,0	6,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0031	222	214,20	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (g)	0,0031	0,27	0,32	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm).	0,0045	4,62 a 7,24	6,15	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm.).	0,058	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	U (°)	0,00092	Mín 45°	49	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,0045	Mín 25%	26	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	U (mm)	0,0045	Mín 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de Imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Mpa)	2,70	550	630	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Mpa)	2,70	485	616	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AMFERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S. NIT. 900.034.102-1

Realiza: Juliana Cuervo Soler

LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa: Andres Rueda

CALIDAD
Andres Rueda

Aprueba: Andres Rueda

JEFE DE CALIDAD
Andres Rueda

Dirección
Autopista sur 71-75
Bogotá, Colombia

Teléfonos
+57 (1) 782 5000 Ext.1101
01 8000 912286

Sitio web
www.pavcowavin.com.co

jueves, 18 de diciembre de 2025 Folio: 19998

CONSORCIO LA
CANDELARIA

Carta de Calidad

1. Nuestros productos Tubos Drenaje se fabrican y se prueban de acuerdo con:

* NP 023. Tubería Drenaje Corrugada de PVC Rígido y Accesorios de Instalación.

2. Pruebas realizadas y aprobadas:

* Verificación dimensional.
* Verificación rotulación y marcado.
* Verificación de apariencia y color.
* Resistencia al Impacto.
* Impacto Tensor.
* Rigidez del Tubo.
* Deformación.

3. PAVCO WAVIN garantiza la funcionalidad de sus productos siempre y cuando estos se manipulen, almacenen e instalen de acuerdo con las recomendaciones definidas en el Manual técnico de producto, el cual podrá ser descargado de nuestra página www.pavcowavin.com.co haciendo clic en el producto objeto de esta carta.

4. Para efectos de lo anterior, el Sistema de Gestión Integrado de PAVCO WAVIN, normaliza procedimientos de asistencia a procesos de manufactura, mediante la supervisión y control continuos de las características de calidad del producto, durante todas las etapas de fabricación.

Atentamente,
MARITZA YANNETH MENDOZA
Quality Assurance/Quality Control Supervisor
PAVCO WAVIN

orbia
Advancing life together

PROALCO BEKAERT	INFORME DE ENSAYO DE PRODUCTO TERMINADO	CÓDIGO	FO-01-11
		VERSION	7

INFORME DE ENSAYO Nº	FECHA DE ELABORACION
DCEM 095 2025	12/10/2025

OC	CLIENTE	CIUDAD
NA	G Y J FERRETERIA SAS .	TUNJA
PRODUCTO :	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Ø 1,50mm X 25Kg	

CODIGO DEL PRODUCTO:	270095	LOTES DE PRODUCCION:	FABQ-21851
		DESARROLLO:	NA
		FICHA TÉCNICA :	FT-PL-10

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS							
ESPECIFICACION	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²)	PROMEDIO (kgf/mm²)	ELONGACION (%)	REDUCCIÓN DE ÁREA (%)	OVALIDAD
	N/A	1,50 +/- 0,02	Max 42	40	NO APLICA	NO APLICA	MAX 0,02

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
240	25	6.000

OBSERVACIONES :

Material libre de Radiactividad.

Jesús herrera.

REALIZO : auxiliar de calidad proalco bekeart
CONTROL CALIDAD

PROALCO BEKAERT
better together

PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 27.10.2025
HORA: 21:20:20
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6110779 - BARRA CORR END (M) N.4X6m NTC 2289 G60 **REPORTE:** 81.083
CLIENTE: 5036000 / G Y J FERRETERIAS-TUNJA **ORDEN DE ENTREGA:** 8091269386
DIRECCIÓN: CALLE 33 No. 8-33 **PLACA:** XJA319

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES			
Especifca / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res. mm	Anc.Vena mm
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								550	420	1,25	14		0,934		0,51	
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540					8,90		4,90

Lote/Colada	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%NI	%Mo	% V	%Ceq %	Rs(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res. mm	Anc.Vena mm
E33322-25	0,30	0,98	0,010	0,024	0,19	0,000	0,216	0,128	0,081	0,018	0,018	0,483	634,46	465,14	1,36	15,53	B	0,973	8,30	0,56	2,64

Características: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F - RELACIÓN R/F AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad.

Firma Autorizada: ING WILLIAN FERNANDO VIANCHA VALDERRAMA
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 05.08.2025

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**	Fecha Impresión	**25/08/05**	Informe N°:	**109994**
Dirección:	**CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**	No. Remisión:	**187213742**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**7457093**	Página:	**1 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037696	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037697	2,119.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037694	2,107.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037695	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037692	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037693	2,119.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037690	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037691	2,120.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037688	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037686	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037684	2,109.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037685	2,106.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037681	2,111.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037683	2,117.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037664	2,108.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037651	2,109.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.014	0.26	0.022	0.025	0.220	0.060	0.20	0.003

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**	Fecha Impresión	**25/08/05**	Informe N°:	**109994**
Dirección:	**CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**	No. Remisión:	**187213742**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**7457093**	Página:	**2 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	% CE
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037696	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037697	2,119.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037694	2,107.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037695	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037692	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037693	2,119.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037690	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037691	2,120.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037688	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037686	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037684	2,109.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037685	2,106.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037681	2,111.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037683	2,117.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037664	2,108.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037651	2,109.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**	Fecha Impresión	**25/08/05**	Informe N°:	**109994**
Dirección:	**CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**	No. Remisión:	**187213742**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**7457093**	Página:	**3 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037696	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037697	2,119.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037694	2,107.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037695	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037692	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037693	2,119.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037690	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037691	2,120.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037688	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037686	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037684	2,109.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037685	2,106.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037681	2,111.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037683	2,117.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037664	2,108.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**	Fecha Impresión	**25/08/05**	Informe N°:	**109994**
Dirección:	**CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**	No. Remisión:	**187213742**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**7457093**	Página:	**4 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037651	2,109.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00	SinGrieta	1.45	20250803

DATOS GENERALES / PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037696	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037697	2,119.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037694	2,107.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037695	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037692	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037693	2,119.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037690	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037691	2,120.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037688	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037686	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**	Fecha Impresión	**25/08/05**	Informe N°:	**109994**
Dirección:	**CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**	No. Remisión:	**187213742**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**7457093**	Página:	**5 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos
						mm	Kg/m	mm	mm
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037684	2,109.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037685	2,106.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037681	2,111.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037683	2,117.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037664	2,108.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037651	2,109.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.0	0.562	0.44	2.3

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**	Fecha Impresión	**25/08/05**	Informe N°:	**109994**
Dirección:	**CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**	No. Remisión:	**187213742**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**7457093**	Página:	**6 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte °
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037696	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037697	2,119.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037694	2,107.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037695	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037692	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037693	2,119.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037690	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037691	2,120.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037688	2,115.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037686	2,113.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037684	2,109.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037685	2,106.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037681	2,111.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037683	2,117.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037664	2,108.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037651	2,109.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA TUNJA**	Fecha Impresión	**25/08/05**	Informe N°:	**109994**
Dirección:	**CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA**	No. Remisión:	**187213742**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**7457093**	Página:	**7 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 5.06 MPA
Resistencia a la Tracción	± 5.06 MPA
Alargamiento	± 0.59 %
Altura Resalte	± 2.00 %
Separación entre extremos	± 1.00 %
Espaciamiento	± 0.16 %
Angulo de Resalte	± 0.13 °
Peso metro (masa)	± 0.22 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

Certificado de calidad ECOART

Interval From 01.01.2026 00:00 To 01.02.2026 00:00 Max. Records Period Primary log values

23.01.2026 10:08:41

INFORME DE RESULTADOS **Cemento hidráulico tipo ART** **INDUSTRIAL ECOPLANET**	Proveedor: Holcim Colombia S.A. Planta: Nobsa: Dirección: Km 15 vía Duitama - Belencito Municipio: Nobsa, Boyacá, Colombia Teléfono: 57 608 7730555 Cliente: **General**

Autor: Ingeniero de Control de Calidad	Revisa: Coordinador de Control de Calidad	Aprueba: Coordinador de Control de Calidad

Alcance

El cemento ECOART cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo ART. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras. Los datos presentados corresponden al Cemento ECOART producido por Holcim Colombia S.A. en la fecha especificada, la ejecución de los ensayos se lleva a cabo dentro de la semana señalada de análisis.

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine.

NTC 220: Determinación de la reistencia a la compresion de morteros de cemento hidráulico.

NTC 221: Método para determinar la densidad del cemento hidráulico.

NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua.

NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45 um.

NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.

NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland.

NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico.

NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat.

NTC 5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.

INFORME DE RESULTADOS

Composición Química - Oxidos (%)

FECHA	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	P.I.	Na2O	K2O	TiO2	P2O5	Mn2O3	Cl	Suma
10/01/2026	21.8	5.1	3.5	61.2	1.3	3.3	2.1	0.04	0.73	0.31	0.33	0.18	0.08	100.0
14/01/2026	25.3	7.7	2.8	56.3	1.3	3.1	1.7	0.08	0.64	0.38	0.29	0.95	0.04	100.5
17/01/2026	25.4	7.8	2.8	56.2	1.3	3.3	1.4	0.05	0.68	0.37	0.28	0.96	0.07	100.5
21/01/2026	25.2	7.7	2.9	56.4	1.2	3.7	1.5	0.11	0.60	0.37	0.27	0.97	0.07	100.9
Min	21.8	5.1	2.8	56.2	1.2	3.1	1.4	0.04	0.60	0.31	0.27	0.18	0.04	100.0
Max	25.4	7.8	3.5	61.2	1.3	3.7	2.1	0.11	0.73	0.38	0.33	0.97	0.08	100.9
Avg	24.4	7.1	3.0	57.5	1.3	3.4	1.7	0.07	0.66	0.36	0.29	0.76	0.06	100.5
Std	1.7	1.3	0.4	2.4	0.1	0.2	0.3	0.03	0.06	0.03	0.03	0.39	0.02	0.4

	Finura			Fraguado Vicat			Resistencias a la compresión				
FECHA	Blaine	Densidad	Ret. 45 um	Inicial	Final	C.Nor	1 día	3 días	7 días	28 días	A/C
	m2/kg	g/cm3	%	min	min	%	MPa	MPa	MPa	MPa	%
10/01/202	435	3.13	1.67	173	252	24.8	12.1	21.2	28.5		47.3
14/01/202	401	3.11	1.08	193	285	24.8	13.2	20.6			47.3
17/01/202	399	3.10	1.10	170	256	23.9	11.8	22.5			47.4
21/01/202	382	3.11	3.04	149	230	25.4					47.7
Min	382	3.10	1.08	149	230	23.9	11.8	20.6	28.5		47.3
Max	435	3.13	3.04	193	285	25.4	13.2	22.5	28.5		47.7
Avg	404	3.11	1.72	171	256	24.7	12.4	21.4	28.5		47.4
Std	22	0.01	0.92	18	23	0.6	0.7	1.0	0.0	0.0	0.2

NTC 4927
Exp. Barras Mortero sumergidas en agua (%)

Holcim	NTC 121
N/D	Máximo 0.02%

NTC 224
Contenido de aire en mortero de cemento (%)

Holcim	NTC 121
N/D	Máximo 12 %

Comentarios

N/D.: Resultado de ensayo no disponible.

Fecha de reporte: **23.01.2026**

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinador Control Calidad
Holcim Colombia S.A.
Planta Nobsa

Certificado de calidad Fuerte Ecoplanet

Interval From 01.01.2026 00:00 To 31.01.2026 00:00 Max. Records Period Primary log values

23.01.2026 10:00:56

INFORME DE RESULTADOS **Cemento hidráulico tipo UG** **FUERTE ECOPLANET**	Proveedor: Holcim Colombia S.A. Planta: Nobsa: Dirección: Km 15 vía Duitama - Belencito Municipio: Nobsa, Boyacá, Colombia Teléfono: 57-8-730555 Cliente: **General**

Autor: Ingeniero de Control de Calidad	Revisa: Coordinador de Control de Calidad	Aprueba: Coordinador de Control de Calidad

Alcance

El cemento Fuerte Ecoplanet cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras. Los datos presentados corresponden al Cemento Fuerte Ecoplanet producido por Holcim Colombia S.A. en la fecha especificada, la ejecución de los ensayos se lleva a cabo dentro de la semana señalada de análisis.

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine.

NTC 220: Determinación de la reistencia a la compresion de morteros de cemento hidráulico.

NTC 221: Método para determinar la densidad del cemento hidráulico.

NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua.

NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45 um.

NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.

NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland.

NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico.

NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat.

NTC 5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.

INFORME DE RESULTADOS

Composición Química - Oxidos (%)

FECHA	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	P.I.	Na2O	K2O	TiO2	P2O5	Cl	Suma
06/01/2026	26.9	6.2	2.8	52.5	0.8	2.2	7.5	0.05	0.71	0.36	0.27	0.06	100.9
13/01/2026	27.6	6.4	2.9	51.9	0.9	2.2	5.7	0.06	0.72	0.32	0.29	0.06	99.7
16/01/2026	22.2	4.9	3.3	53.1	0.8	2.0	6.9	0.02	0.70	0.32	0.27	0.06	100.1
Min	22.2	4.9	2.8	51.9	0.8	2.0	5.7	0.02	0.70	0.32	0.27	0.06	99.7
Max	27.6	6.4	3.3	53.1	0.9	2.2	7.5	0.06	0.72	0.36	0.29	0.06	100.9
Avg	25.6	5.8	3.0	52.5	0.9	2.1	6.7	0.04	0.71	0.33	0.28	0.06	100.2
Std	3.0	0.8	0.2	0.6	0.0	0.1	0.9	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.6

	Finura			Fraguado Vicat			Resistencias a la compresión				
FECHA	Blaine	Densidad	Ret. 45 um	Inicial	Final	C.Nor	1 día	3 días	7 días	28 días	A/C
	m2/kg	g/cm3	%	min	min	%	MPa	MPa	MPa	MPa	%
06/01/2026	521	2.97	6.78	159	276	26.8	7.5	15.6	20.0		50.7
13/01/2026	462	3.02	9.26	172	280	25.1	7.9	15.7			48.9
16/01/2026	470	3.04	7.30	144	249	25.2	6.9	14.1			49.7
Min	462	2.97	6.78	144	249	25.1	6.9	14.1	20.0		48.9
Max	521	3.04	9.26	172	280	26.8	7.9	15.7	20.0		50.7
Avg	484	3.01	7.78	158	268	25.7	7.4	15.1	20.0		49.8
Std	32	0.04	1.31	14	17	0.9	0.5	0.9	0.0	0.0	0.9

NTC 4927
Exp. Barras Mortero sumergidas en agua (%)

Holcim	NTC 121
N/D	Máximo 0.02%

NTC 224
Contenido de aire en mortero de cemento (%)

Holcim	NTC 121
N/D	Máximo 12 %

Comentarios

N/D.: Resultado de ensayo no disponible.

Fecha de reporte: **23.01.2026**

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinador Control Calidad
Holcim Colombia S.A.
Planta Nobsa

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleacion para refuerzo de concreto | Res. 2003:2022 Barras corrugadas de acero de baja aleacion para refuerzo de concreto | NTC 6574:2023 Acero figurado para refuerzo de concreto. | SC-2002486 | CO SC-2002486

No. 086473

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 19/12/2025

CLIENTE	**DISTRIBUIDORA FERREACEROS S.A.S.**	**DESTINO**	DUITAMA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	XID 437	**GRADO**	420

PEDIDO No.	37912
REMISIÓN No.	37943
FACTURA No.	124929

						ENSAYOS FÍSICOS				ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 4	12	20253935	3	504	✔	481.6	626.3	16.0	1.30	0.27	1.12	0.0125	0.033	0.20	0.15	0.06	0.08	0.011	0.00078	0.0020	0.47	0.969	0.740	8.340	70.9	1.500
R - No. 5	12	20253709	1	324	✔	477.3	635.3	15.5	1.33	0.26	1.13	0.0156	0.032	0.19	0.26	0.18	0.17	0.019	0.00107	0.0021	0.48	1.505	1.150	10.240	69.8	1.940
		20253707	1		✔	474.4	627.2	15.1	1.32	0.25	1.16	0.0166	0.030	0.19	0.27	0.21	0.17	0.019	0.00062	0.0021	0.48	1.498	1.200	10.240	69.8	1.960
		20253322	1		✔	497.6	658.4	15.2	1.32	0.27	1.13	0.0107	0.028	0.19	0.19	0.08	0.09	0.013	0.00034	0.0021	0.47	1.539	1.120	10.470	70.6	1.850
R - No. 4	6	20253582	3	2688	✔	470.1	609.0	15.6	1.30	0.27	1.12	0.0117	0.028	0.18	0.16	0.06	0.06	0.012	0.00044	0.0019	0.47	0.952	0.890	8.500	73.0	1.500
		20253613	5		✔	485.9	636.7	15.3	1.31	0.26	1.12	0.0136	0.032	0.20	0.21	0.08	0.12	0.015	0.00028	0.0020	0.47	0.969	0.900	8.500	73.0	1.610
R - No. 5	6	20253654	4	864	✔	470.3	614.9	19.0	1.31	0.27	1.15	0.0105	0.024	0.20	0.15	0.06	0.07	0.01	0.00052	0.0021	0.48	1.515	1.120	10.340	68.0	1.850
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

Ing. Sandra Cabrera
DIRECTOR CONTROL CALIDAD

Enviado: ferreaceros.sas@gmail.com

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia. C.P
- 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131655214

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIBUIDORA FERREACEROS S.A.S	**9007734905/10**	**OC 2306**	**11115911/000010**	**NTC 2289**	**26.941**

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727174601	GR 60	0,27	1,01	0,011	0,031	0,18	0,19	0,10	0,10	0,04	0,002	0,036	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727175101	GR 60	0,27	0,99	0,009	0,029	0,17	0,21	0,11	0,09	0,03	0,002	0,036	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727175201	GR 60	0,28	0,94	0,010	0,036	0,18	0,24	0,12	0,12	0,04	0,002	0,038	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727174601	3	471	680	1,45	16,2	0,550	OK	6,60	0,53	2,43	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727175101	3	459	656	1,43	16,8	0,549	OK	6,60	0,48	2,22	52	
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1727175201	3	473	678	1,43	15,4	0,544	OK	6,60	0,54	2,49	51	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm	45,0 - 70,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ. 10.12.2025

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia. C.P
- 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131655214

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIBUIDORA FERREACEROS S.A.S	**9007734905/20**	**OC 2306**	**11115911/000020**	**NTC 2289**	**6.233**

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1727172501	GR 60	0,25	0,92	0,009	0,026	0,15	0,23	0,10	0,08	0,03	0,002	0,027	0,42
108000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1727173201	GR 60	0,25	0,94	0,016	0,032	0,16	0,24	0,14	0,17	0,03	0,002	0,029	0,43
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
108000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1727172501	2	456	632	1,39	16,8	0,246	OK	4,40	0,31	1,56	52	
108000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1727173201	2	450	630	1,40	16,1	0,249	OK	4,40	0,30	1,49	53	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,234 kg/m		máx 4,45 mm	mín 0,25 mm	máx 2,49 mm	45,0 - 70,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ. 10.12.2025

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

ANEXO 4. INFORME PMT MES 4 – OBRA

INFORME PLAN DE MANEJO DE TRAFICO No. 4

CONTRATO DE OBRA No. IPO 003-2025



CONTRATISTA:

CONSORCIO LA CANDELARIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

PERIODO DE INFORME

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

RÁQUIRA 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCION 3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
4. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 4
5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 5
7. PRESUPUESTO 9
8. CONCLUSIONES 9

1. INTRODUCION

En el presente informe se realiza el seguimiento a la aplicación del plan de manejo de tráfico (PMT), durante el mes de enero de 2026, con el fin de garantizar su cumplimiento y mitigar el índice de accidentalidad de las personas que transitan por el corredor vial, de manera que, se garanticen condiciones seguras al tráfico durante la ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".


2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como objeto el MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RÁQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, a groso modo incluye la ejecución de las siguientes actividades:

- Movimiento de tierras
- Construcción de estructura de pavimento
- Obras de drenaje y estructuras de protección
- Señalización vial
- Urbanismo
- Alumbrado publico
- Construcción de escultura

El consorcio la candelaria, durante la ejecución de las diferentes actividades que conllevan los ítems mencionados anteriormente, garantizará el transito seguro para la comunidad en general, tanto vehicular como peatonal.

3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

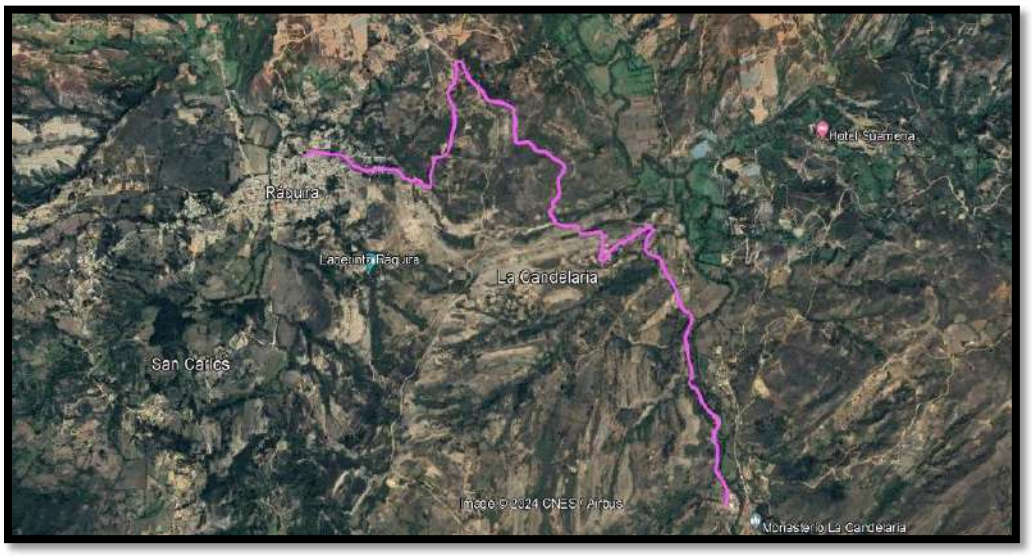

El corredor vial se encuentra localizado en jurisdicción del municipio de Ráquira, del departamento de Boyacá específicamente la vía que conduce del casco urbano del municipio de Ráquira al centro poblado la Candelaria, pasando por las veredas resguardo oriente y la candelaria, el proyecto presenta el propósito de mejorar el tramo vial que inicia desde el casco urbano hacia el sector en la vereda La Candelaria Occidente, desde el Km 0+000 hasta el Km 6+260.

4. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	IPO-003- 2025
CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ

VALOR INICIAL	VEINTE MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE. ($ 20.406.995.280,12)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	1 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OTRO SI No. 1 AL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2025

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

Las actividades desarrolladas durante el presente periodo se discriminan a continuación:

1. Se continúa con la presencia de los auxiliares viales (paleteros), de manera que el consorcio garantiza la seguridad de los usuarios y fluidez en tránsito del sector.





2. Se realizó la instalación de señales de tránsito, en los sitios requeridos para brindar información y alertar al usuario de la vía, sobre las labores de construcción en el sector.



3. Se complementó la señalización informativa, brindando mayor seguridad a los usuarios de la vía.



4. Suministro e instalación de delineadores tubulares, para delimitación de zonas de peligro, y zonas de acopio de material




5. Implementación de barreras plásticas (maletines), para cerrar el flujo vehicular de acuerdo a las actividades programadas en obra, evitando el transito de cualquier tipo de vehículo, así mismo, limitar el paso en zonas de peligro.




6. Implementación de paletas de pare/siga, como soporte de ayuda para controlar el trafico con los auxiliares viales (paleteros)





7. Señalización con cinta de peligro, para identificar zonas de peligro eminente, y de acceso restringido.





8. PRESUPUESTO

A continuación, se discrimina el presupuesto del plan de manejo de tráfico para el presente periodo.

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRÁ AL CENTRO POBLADO LA CANDELARÍA, MUNICIPIO DE RAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
A	PERSONAL PROFESIONAL						
ITEM	DESCRIPCIÓN			CANT AUX	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
A.1.	PALETERO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)			4	mes	1	$ 2,309,486.40	$ 9,237,945.60
B	SEÑALIZACIÓN							
ITEM	SEÑAL DE TRANSITO	TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
B.1	SPO-01-02-03-Otras	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	Rombo 60 cm x 60 cm	UND		2	$ 263,666.67	$ 527,333.34
B.3	SIO-02-03	SEÑAL INFORMATIVA EN OBRA SEGÚN NORMA INVIAS	Según velocidad MENOR O IGUAL A 50 KM/H	UND		0	$ 257,500.00	$ -
B.4		DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - DELINEADORES TUBULARES		UND		25	$ 65,000.00	$ 1,625,000.00
B.5		DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS- BARRERAS PLÁSTICAS (MALETINES)		UND		0	$ 460,000.00	$ -
B.1		SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO - PALETAS PARE / SIGA		UND		0	$ 33,950.00	$ -
B.3		DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - CINTA DE SEÑALIZACIÓN		Rollo 500 m		20.00	$ 40,666.67	$ 813,333.40
B.4		PASACALLES INFORMATIVO		UND		0	$ 220,000.00	$ -
TOTAL COSTOS (A+B+C)								$12,203,612.34

Página 1

9. CONCLUSIONES

- Se realiza la implementación al plan de manejo de tráfico de acuerdo al presupuesto para el mismo.

- Se disponen de más elementos de seguridad vial, para dar complemento a los instalados en obra.

- Se garantiza una adecuada transitabilidad durante la ejecución de las obras para el flujo vehicular.

- Se cuenta con auxiliares viales (paleteros) fundamentales para el adecuado control vial.

- Se realizó seguimiento a los ítems implementados durante la ejecución de las obras en el presente periodo.

- No se reportaron accidentes en los tramos que están interviniendo.

- El personal vial cuenta con los elementos requeridos para brindar una mayor seguridad e información a los usuarios de la vía.



Héctor Julio Pedraza Sánchez
Residente de obra

ANEXO 5. ACTAS DE COMITÉ

Fecha			DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE RÁQUIRA TIERRASUA S.A.S	CONSORCIO INTERCANDELARIA
16	01	2026		
DD	MM	AA	**ACTA DE COMITÉ TECNICO**	

ACTA DE COMITÉ No. 005

Contrato de Obra IPO-003-2025	**Contrato de Consultoría IPVO-019-2025**
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

I. PARTICIPANTES	**CARGO**
Hector Julio Pedraza Sanchez	Residente de obra
Wilson Julian Granados Chaparro	Residente de interventoria
Cristian Camilo Pardo	Residente de supervisión
Daniel Pedraza Perez	Ingeniero apoyo obra

II. OBJETO

a). Verificación avance de cantidades y actividades.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No hay observaciones.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N.A.

V. TEMAS TRATADOS

Nos reunimos en el Municipio de Ráquira - Boyacá el dia 16 de Enero de 2026 en la obra de Mejoramiento de la vía que conduce del Municipio de Raquira. al centro poblado de la Candelaria, con el fin de verificar el avance de actividades.

En la presente semana se vienen ejecutando actividades en los siguientes tramos:

- Perfilado y/o excavación mecánica de taludes desde el K5+300 - K5+600
- Demolición de asfalto se viene ejecutando hasta el K5+200.
- Escarificación, conformación y compactación de la subrasante. Se viene ejecutando en el K5+200.
- Corte de pavimento para construcción de cunetas desde el K0+980 - K2+000. costado derecho.
- Encofrado e instalación malla electrosoldada para cunetas. desde el K0+980 - K1+130.

Fecha	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE RÁQUIRA TIERRASUA S.A.S	CONSORCIO INTERCANDELARIA
DD MM AA	ACTA DE COMITÉ TECNICO	

- NOTA: Se evidenció en el recorrido la necesidad de evaluar con el equipo de especialistas de obra. e interventoria unas zonas de ladera en las que posiblemente sea necesario construir zanjas de coronación, con el fin de proteger la estabilidad de los taludes y encausar las aguas de escorrentia hacia. las cunetas y/o alcantarillas.

Asi mismo se evidenció una posible inestabilidad en la zona de ladera en las abscisas. K3+210 y K5+380, los cuales se recomienda revisar por el especialista geotecnista.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Mejorar la señalización PMT en obra.	Contratista obra.
Verificar la instalación de la señalización	Interventoria.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Ráquira - Boyacá, a los (16) días de Enero de 2026.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Residente de supervisión

Daniel Augusto Pedraza
Ingeniero apoyo obra

Fecha			DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE RÁQUIRA TIERRASUA S.A.S ACTA DE COMITÉ TECNICO	CONSORCIO INTERVIALES
23	01	2026		
DD	MM	AA		

ACTA DE COMITÉ No.

Contrato de Obra IPO-003-2025	Contrato de Consultoría IPVO-019-2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

I. PARTICIPANTES	CARGO
Hector Julio Pedraza Sanchez	Residente de obra
Wilson Julian Granados Chaparro	Residente de interventoria
Cristian Camilo Pardo	Residente de supervisión
Daniel Pedraza Perez	Ingeniero apoyo obra

II. OBJETO

a). Verificación avance de cantidades

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No hay observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verificó que el contratista mejorará la instalación y/o señalización del PMT en obra.

V. TEMAS TRATADOS

Nos reunimos en el Municipio de Ráquira - Boyacá, el día 23 de Enero de 2026, con el fin de verificar el avance de cantidades

A la fecha se vienen ejecutando actividades que se describen a continuación:

- Excavación mecánica. desde el K5+900 - K6+030
- Demolición del pavimento existente desde el K6+200 - K5+900
- Escarificación, conformación y compactación de la subrasante K5+200 - K5+900
- Corte de pavimento para construcción de cunetas desde K0+480 - K1+400
- Enfogrado e instalación malla electrosoldada para cunetas. K1+130 - K1+380
- Concreto cunetas 21 MPa desde el K1+130 - K1+380.

Adicional se ha venido realizando en conjunto obra e interventoria. la verificación de las posibles soluciones a las inestabilidades presentadas a lo largo del tramo. que se está interviniendo.

Powered by CamScanner

Fecha			DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE RÁQUIRA TIERRASUA S.A.S	CONSORCIO INTERCANDELARIA
23	01	2026	ACTA DE COMITÉ TECNICO	
DD	MM	AA		

De acuerdo a las verificaciones realizadas de los puntos de inestabilidad presentamos la ubicación, solución planteada o medida de estabilidad.

N°	Abscisa	Medida de estabilidad.
1	K0+460.00	Muro en concreto reforzado.
2	K0+490,00	Muro en concreto reforzado
3	K3+010,00	Muro en gaviones.
4	K3+350,00	Trinchos
5	K4+200,00	Muro en gaviones.
6	K5+780,00	Muro en concreto reforzado.
7	K6+0,180,00	Trinchos.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Se solicita al contratista realizar la dilatación de los bordillos de las cunetas.	Contratista Obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Ráquira - Boyacá, a los (23) días de Enero de 2026.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Residente de supervisión

Daniel Pedraza
Ingeniero apoyo obra

Powered by CamScanner

Fecha			DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE RÁQUIRA TIERRASUA S.A.S	CONSORCIO INTERCANDELARIA
30	01	2026	ACTA DE COMITÉ TECNICO	
DD	MM	AA		

ACTA DE COMITÉ No.

Contrato de Obra IPO-003-2025	Contrato de Consultoría IPVO-019-2025
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

I. PARTICIPANTES	CARGO
Hector Julio Pedraza Sanchez	Residente de obra
Wilson Julian Granados Chaparro	Residente de interventoria
Cristian Camilo Pardo	Residente de supervisión
Daniel Pedraza Perez	Ingeniero apoyo obra

II. OBJETO

a). Verificación avance de cantidades

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No hay observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifico que el contratista mejoraria la instalacion y/o señalizacion del PMT en obra.

V. TEMAS TRATADOS

Nos reunimos en el municipio de Raquira - Boyaca, el día 30 de Enero de 2026, con el fin de verificar el avance de cantidades

A la fecha se vienen ejecutando actividades que se describen a continuacion:

- Excavación mecanica desde el K6+030 al K6+260.
- Demolicion de pavimento existente. desde el K5+900 - K6+060
- Escarificacion, conformacion y compactacion de la sub-rasante. K5+900 - K6+260
- Corte de pavimento para construcción de cunetas. K1+400 - K2+495.
- Encofrado e instalacion de malla electrosoldada para cunetas. K1+380 - K1+700
- Concreto cunetas 21 MPa → K1+380 - K1+700

También se revisaron en varios tramos de la vía en intervención posibles puntos donde se hace necesario construir filtros longitudinales por la presencia de aguas de infiltracion que pueden afectar la estabilidad de la estructura de pavimento, a continuación se enuncian los tramos:

F1) K0+195 - K0+470	F17) K5+355 - K5+520
F2) K0+320 - K0+940	F18) K5+520 - K5+762
F13) K3+480 - K3+668	F19) K5+762 - K6+005
F15) K4+676 - K4+910	F20) K6+005 - K6+260
F16) K5+070 - K5+355	F21) K4+390 - K4+480.

Powered by CamScanner

Fecha			DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE RÁQUIRA TIERRASUA S.A.S ACTA DE COMITÉ TECNICO	CONSORCIO INTERCANDELARIA
30	01	2026		
DD	MM	AA		

Adicional se ha venido realizando en conjunto obra e interventoría la verificacion de las posibles soluciones a las inestabilidades a lo largo del tramo que se esta interviniendo.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Tomar muestras de concreto de cada fundida. de las cunetas.	Contratista obra.
Tomar contra-muestras de concreto de cada fundida. de las cunetas.	Interventoria.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Ráquira - Boyacá, a los ( ) días de Enero de 2026.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Residente de supervisión

Ingeniero apoyo obra

Powered by CamScanner

ANEXO 6. INFORMES SEMANALES

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	14

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	5	1	2026	1.2 SEMANA: Del 29/12/2025 hasta 04/01/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-003-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	IPVO-019-2025		
1.4 CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CANDELARIA			1.7 INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCANDELARIA		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	30	9	2026		30	9	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes 29	Martes 30	Miercoles 31	Jueves 01	Viernes 02	Sabado 03	Domingo 04	
	Nublado	Lluvias moderadas	Nublado	Soleado	Nublado	Nublado	Nublado	
2.1.1 Horas lluvia	-	2	-	-	-	-	-	

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).

2.2.1 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE OBRA

1) EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA PAVIMENTO

- Se realiza excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+400

2) DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)

- Se continua con la demolición del pavimento asfaltico en el K4+400 al K4+600, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.

3) ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE

- Se realiza escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+400 - K4+600.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.2.2 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

a. Se realiza la verificación de la construcción de las alcantarillas de 36" ejecutadas hasta la fecha ubicadas en el K2+000, K2+025, K3+340, K3+895, K3+990, K4+580 y K5+030 . Se constata la localización de acuerdo a los estudios y diseños, se supervisa la instalación de la tubería, se verifica que la tuberia se le realice el respectivo emboquille, que las estructuras cumplan con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controla que las estructuras aletas y muros se encuentran correctamente verticales y bien apuntalados antes de realizar el vaciado de concreto. Se realiza toma de cilindros de concreto con el fin de verificar la resistencia a la compresión. Se verifica que el acabado de los concretos presenten buenas condiciones tecnicas, visuales y de calidad.

b. Seguimiento, verificación y chequeo de la conformación de la subrasante con topografia en conjunto con el contratista de obra desde el K4+400 hasta el K4+600.

c. Se verifica que la maquinaria del contratista de obra, se encuentre en adecuadas condiciones operativas y cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso precontractual.

d. Verificación del cumplimiento e implementación de las actividades y presupuestos establecidos en el PMT y P.A.G.A.

e. Verificación topográfica del perfilado de taludes en el K5+400.

f. Verificación topográfica de la demolición del asfalto existente desde el K4+400 al K4+600.

g. Seguimiento a la disposición de los residuos producto de la demolición de asfalto existente.

2.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición) x 3 und

Retroexcavadora x 1 und

Excavadora de oruga (>= 20 Ton) x 1 und

Autohormigonera Carmix x 1 und

Minicargador x 1 und

Camioneta (PickUp o similar) x 2 und

Camión sencillo (Carroceria estacas) x 1und

Motoniveladora (140 o similar) x 1 und

Vibrocompactador 10 Ton x 1 und

Mezcladora de concreto x 1 und

Vibrocompactador tipo canguro x 1 und

Volquetas sencillas x 4 und

Volquetas doble x 10 und


Carrotanque x 1 und

NOTA: El contratista de obra ha realizado la movilización de la maquinaria para ejecutar todas las actividades previstas en el marco del contrato de obra No. IPO-003-2025.

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	12	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA	12	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	3.25	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	3.25	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	4.36
% AVANCE DE OBRA	33.75
% DE ATRASO	-29.39
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	27.08
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	27.08

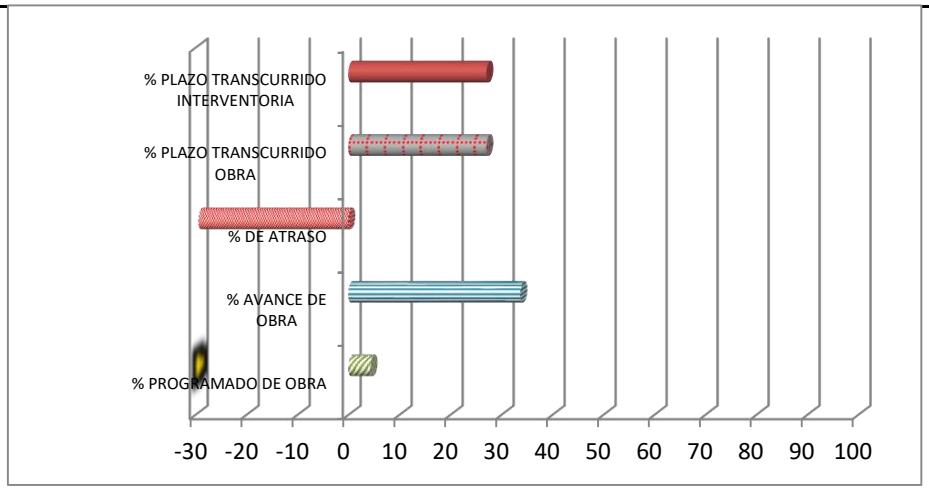

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta la temporada de fin de año e inicio del nuevo año, el rendimiento y/o avance se vio un poco disminuido, adicionalmente por el cierre de proveedores se trabaja con el stock de materiales disponibles en obra.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

El grupo de trabajo de especialistas y laboratorio del contratista de obra realiza la toma de información en campo para analizar los puntos de inestabilidades y zonas de manejo hidráulico en el tramo de intervención del contrato de obra IPO-003-2025.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Se realiza acompañamiento al equipo de especialistas de obra con la toma de información en campo, con el fin de verificar y evaluar posibles opciones de intervención desde la parte geotécnica e hidrológica en el tramo de construcción de la vía del contrato de obra IPO-003-2025.

5. FIRMAS

Firma: _____	**Firma:** _____
Nombre: NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA	**Nombre: ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ**
INTERVENTOR	**CONTRATISTA**

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Demolición del pavimento asfaltico en el K4+400 al K4+600, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.



Demolición del pavimento asfaltico en el K4+400 al K4+600, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.



Se realiza excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+400



Verificación topográfica de la excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+400



Demolición del pavimento asfaltico en el K4+400 al K4+600, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.



Se realiza escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+400 - K4+600.



Se realiza escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+400 - K4+600.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	15

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	12	1	2026	1.2 SEMANA: Del 05/01/2026 hasta 11/01/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-003-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	IPVO-019-2025		
1.4 CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CANDELARIA			1.7 INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCANDELARIA		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	30	9	2026		30	9	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes 05	Martes 06	Miercoles 07	Jueves 08	Viernes 09	Sabado 10	Domingo 11
	Lluvias moderadas	Lluvias moderadas	Nublado	Soleado	Nublado	Soleado	Nublado
2.1.1 Horas lluvia	4	2	-	-	-	-	-

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).

2.2.1 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE OBRA

1) EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA PAVIMENTO

- Se realiza excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+500 - K5+680

2) DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)

- Se continua con la demolición del pavimento asfaltico en el K4+600 al K4+900, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.

3) ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE

- Se realiza escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+600 - K4+900.

4) SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)

- Se realiza suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+070 - K4+300.

5) TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

- Transporte de material granular tipo afirmado para la conformación de la capa de mejoramiento.

6) CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

Se realiza corte de la carpeta asfaltica para ejecutar la construcción de las cunetas desde el K0+980 al K1+400.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.2.2 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

a. Se realiza la verificación de la construcción de las alcantarillas de 36" ejecutadas hasta la fecha ubicadas en el K2+000, K2+025, K3+340, K3+895, K3+990, K4+580 y K5+030 . Se constata la localización de acuerdo a los estudios y diseños, se supervisa la instalación de la tubería, se verifica que la tuberia se le realice el respectivo emboquille, que las estructuras cumplan con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controla que las estructuras aletas y muros se encuentran correctamente verticales y bien apuntalados antes de realizar el vaciado de concreto. Se realiza toma de cilindros de concreto con el fin de verificar la resistencia a la compresión. Se verifica que el acabado de los concretos presenten buenas condiciones tecnicas, visuales y de calidad.

b. Seguimiento, verificación y chequeo de la conformación de la subrasante con topografia en conjunto con el contratista de obra desde el K4+600 hasta el K4+900.

c. Se verifica que la maquinaria del contratista de obra, se encuentre en adecuadas condiciones operativas y cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso precontractual.

d. Verificación del cumplimiento e implementación de las actividades y presupuestos establecidos en el PMT y P.A.G.A.

e. Verificación topográfica del perfilado de taludes en el K5+500 - K5+680.

f. Verificación topográfica de la demolición del asfalto existente desde el K4+600 al K4+900.

g. Verificación topográfica de la conformación de la capa de afirmado desde el K4+070 - K4+300.

h. Control de la actividad de corte en la carpeta asfáltica para ejecutar la construcción de cunetas.

i. Verificación de la disposición del material sobrante producto de la demolición del asfalto existente.

2.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición) x 2 und

Retroexcavadora x 1 und

Excavadora de oruga (>= 20 Ton) x 1 und

Autohormigonera Carmix x 1 und

Minicargador x 1 und

Camioneta (PickUp o similar) x 2 und

Camión sencillo (Carroceria estacas) x 1und

Motoniveladora (140 o similar) x 1 und

Vibrocompactador 10 Ton x 1 und

Mezcladora de concreto x 1 und

Rodillo vibrocompactador x 1 und

Volquetas sencillas x 4 und

Volquetas doble x 10 und


Carrotanque x 1 und

NOTA: El contratista de obra ha realizado la movilización de la maquinaria para ejecutar todas las actividades previstas en el marco del contrato de obra No. IPO-003-2025.

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	12	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA	12	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	3.5	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	3.5	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	5.02
% AVANCE DE OBRA	34.19
% DE ATRASO	-29.17
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	29.17
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	29.17

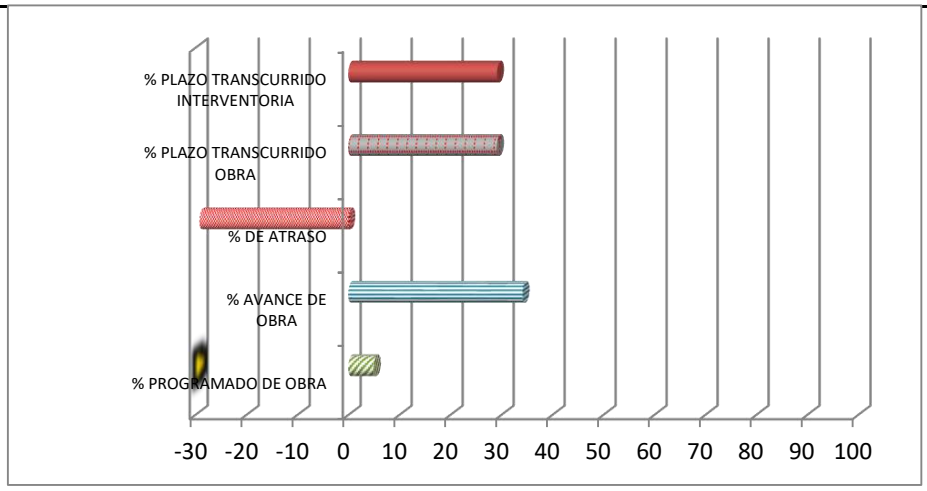

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

Las condiciones climaticas en esta semana fueron favorables sin presencia de fuertes lluvias, lo que permitió avanzar de buena manera en la ejecución de los trabajos, por esta razón se presenta un avance ejecutado superior al programado.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

El contratista de obra junto a su equipo de especialistas y profesionales se encuentra elaborando una propuesta a los puntos evidenciados como inestabilidades en los taludes, zonas de manejo hidraulico e hidrologico con el fin de garantizar en el tiempo la estabilidad y el correcto funcionamiento de la vía que se está construyendo.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Se realiza acompañamiento al equipo de especialistas de obra, con el fin de verificar y evaluar posibles opciones de intervención desde la parte geotécnica e hidrológica en el tramo de construcción de la vía del contrato de obra IPO-003-2025.

5. FIRMAS

Firma: _____	**Firma:** _____
Nombre: NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA	**Nombre: ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ**
INTERVENTOR	**CONTRATISTA**

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Se realiza escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+600 - K4+900.



Se realiza excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+500 - K5+680



Se realiza corte de la carpeta asfaltica para ejecutar la construcción de las cunetas desde el K0+980 al K1+400.



Se continua con la demolición del pavimento asfaltico en el K4+600 al K4+900, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.



Se realiza suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+070 - K4+300.



Se realiza suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+070 - K4+300.



Se realiza escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+600 - K4+900.



Se realiza escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+600 - K4+900.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	16

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	19	1	2026	1.2 SEMANA: Del 12/01/2026 hasta 18/01/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-003-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	IPVO-019-2025		
1.4 CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CANDELARIA			1.7 INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCANDELARIA		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	30	9	2026		30	9	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes 12	Martes 13	Miercoles 14	Jueves 15	Viernes 16	Sabado 17	Domingo 18
	Nublado	Nublado	Soleado	Nublado	Soleado	Soleado	Soleado
2.1.1 Horas lluvia	-	-	-	-	-	-	-

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).

2.2.1 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE OBRA

1) EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA PAVIMENTO

- Se realiza excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+680 - K5+900

2) DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)

- Se continua con la demolición del pavimento asfaltico en el K4+900 al K5+200, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.

3) ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE

- Se realiza escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+900 - K5+200.

4) SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)

- Se realiza suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+300 - K4+480.

5) TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

- Transporte de material granular tipo afirmado para la conformación de la capa de mejoramiento.

6) CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

Corte en los bordes de la carpeta asfáltica para realizar la construcción de las cunetas, desde el K1+400 al K2+000 por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.

7) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza el suministro e instalación de malla electrosoldada para el refuerzo de las cunetas desde el K0+980 al K1+130.

8) CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K0+980 al K1+130, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.

2.2.2 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

a. Se realiza la verificación de la construcción de las cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa ejecutadas desde el K0+980 al K1+130 . Se constata la localización de acuerdo a los estudios y diseños, se supervisa la instalación de la formaleta, corroborando su correcto apuntalado, se verifica que la malla electrosoldada instalada sea la establecida en los diseños y cumpla con los recubrimientos y medidas, además se constata que la cuneta cumpla con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controla que la formaleta para el bordillo de la cuneta se encuentre bien plomado antes de realizar el vaciado de concreto. Se realiza toma de cilindros de concreto con el fin de verificar la resistencia a la compresión. Se verifica que el acabado de los concretos presenten buenas condiciones tecnicas, visuales y de calidad. Se controla que se ejecuté la respectivas dilataciones en las cunetas, con el fin de garantizar que el concreto no presente a futuro fisuras por los cambios volumetricos en el concreto generados por los cambios de temperatura.

b. Seguimiento, verificación y chequeo de la conformación de la subrasante con topografia en conjunto con el contratista de obra desde el K4+900 - K5+200.

c. Se verifica que la maquinaria del contratista de obra, se encuentre en adecuadas condiciones operativas y cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso precontractual.

d. Verificación del cumplimiento e implementación de las actividades y presupuestos establecidos en el PMT y P.A.G.A.

e. Verificación topográfica del perfilado de taludes en el K5+680 - K5+900.

f. Verificación topográfica de la demolición del asfalto existente desde el K4+900 - K5+200.

g. Verificación topográfica de la conformación de la capa de afirmado desde el K4+300 - K4+480.

h. Control de la actividad de corte en la carpeta asfáltica para ejecutar la construcción de cunetas.

i. Toma de cilindros de concreto de 21 Mpa de las cunetas revestidas desde el K0+980 al K1+130.

2.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición) x 2 und

Retroexcavadora x 1 und

Excavadora de oruga (>= 20 Ton) x 1 und

Autohormigonera Carmix x 1und

Minicargador x 1 und

Camioneta (PickUp o similar) x 2 und

Camión sencillo (Carroceria estacas) x 1und

Motoniveladora (140 o similar) x 1und

Vibrocompactador 10 Ton x 1 und

Mezcladora de concreto x 1 und

Rodillo vibrocompactador x 1 und

Volquetas sencillas x 4 und

Volquetas doble x 10 und


Carrotanque x 1 und

NOTA: El contratista de obra ha realizado la movilización de la maquinaria para ejecutar todas las actividades previstas en el marco del contrato de obra No. IPO-003-2025.

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	**12**	Meses	**3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA**	**12**	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	**3.75**	Meses	**3.4 PLAZO TRANSCURRIDO**	**3.75**	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	**5.68**
% AVANCE DE OBRA	**34.40**
% DE ATRASO	**-28.72**
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	**31.25**
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	**31.25**

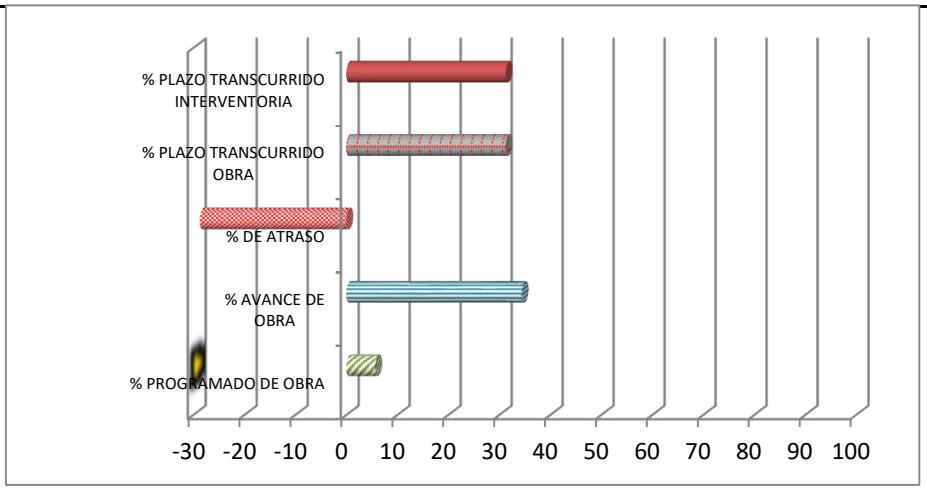

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

Se solicita por parte de está Interventoría al contratista de obra, mejorar la señalización de todas las zonas de trabajos , cumpliendo con la implementación del PMT.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

El contratista de obra junto a su equipo de especialistas y profesionales se encuentra elaborando una propuesta a los puntos evidenciados como inestabilidades en los taludes, zonas de manejo hidraulico e hidrologico con el fin de garantizar en el tiempo la estabilidad y el correcto funcionamiento de la vía que se está construyendo.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Se realiza acompañamiento al equipo de especialistas de obra, con el fin de verificar y evaluar posibles opciones de intervención desde la parte geotécnica e hidrológica en el tramo de construcción de la vía del contrato de obra IPO-003-2025.

5. FIRMAS

Firma: _____	**Firma:** _____
Nombre: NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA	**Nombre: ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ**
INTERVENTOR	**CONTRATISTA**

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Se realiza el suministro e instalación de malla electrosoldada para el refuerzo de las cunetas desde el K0+980 al K1+130.



Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K0+980 al K1+130, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Se realiza el suministro e instalación de malla electrosoldada para el refuerzo de las cunetas desde el K0+980 al K1+130.



Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K0+980 al K1+130, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K0+980 al K1+130, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K0+980 al K1+130, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K0+980 al K1+130, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K0+980 al K1+130, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+900 - K5+200.



Suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+300 - K4+480.



Excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+680 - K5+900



Excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+680 - K5+900



Excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+680 - K5+900



Demolición del pavimento asfaltico en el K4+900 al K5+200, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.



Suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+300 - K4+480.



Excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+680 - K5+900

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	17

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	26	1	2026	1.2 SEMANA: Del 19/01/2026 hasta 25/01/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-003-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	IPVO-019-2025		
1.4 CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CANDELARIA			1.7 INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCANDELARIA		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	30	9	2026		30	9	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes 19	Martes 20	Miercoles 21	Jueves 22	Viernes 23	Sabado 24	Domingo 25	
	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Nublado	Nublado	Soleado	
2.1.1 Horas lluvia	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).

2.2.1 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE OBRA

1) EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA PAVIMENTO

- Se realiza excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+900 - K6+030

2) DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)

- Se continua con la demolición del pavimento asfaltico en el K5+200 al K5+900, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.

3) ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE

- Se realiza escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K5+200 - K5+900.

4) SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)

- Se realiza suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+480 - K4+900.

5) TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

- Transporte de material granular tipo afirmado para la conformación de la capa de mejoramiento.

6) CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

Corte en los bordes de la carpeta asfáltica para realizar la construcción de las cunetas, desde el K0+980 al K1+400 por el costado izquierdo en la dirección hacia la candelaria.

7) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

Se realiza el suministro e instalación de malla electrosoldada para el refuerzo de las cunetas desde el K1+130 al K1+380.

8) CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K1+130 al K1+380, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.2.2 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

a. Se realiza la verificación de la construcción de las cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa ejecutadas desde el K1+130 al K1+380 . Se constata la localización de acuerdo a los estudios y diseños, se supervisa la instalación de la formaleta, corroborando su correcto apuntalado, se verifica que la malla electrosoldada instalada sea la establecida en los diseños y cumpla con los recubrimientos y medidas, además se constata que la cuneta cumpla con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controla que la formaleta para el bordillo de la cuneta se encuentre bien plomado antes de realizar el vaciado de concreto. Se realiza toma de cilindros de concreto con el fin de verificar la resistencia a la compresión. Se verifica que el acabado de los concretos presenten buenas condiciones tecnicas, visuales y de calidad. Se controla que se ejecuté la respectivas dilataciones en las cunetas, con el fin de garantizar que el concreto no presente a futuro fisuras por los cambios volumetricos en el concreto generados por los cambios de temperatura.

b. Seguimiento, verificación y chequeo de la conformación de la subrasante con topografia en conjunto con el contratista de obra desde el K5+200 - K5+900.

c. Se verifica que la maquinaria del contratista de obra, se encuentre en adecuadas condiciones operativas y cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso precontractual.

d. Verificación del cumplimiento e implementación de las actividades y presupuestos establecidos en el PMT y P.A.G.A.

e. Verificación topográfica del perfilado de taludes en el K5+900 - K6+030.

f. Verificación topográfica de la demolición del asfalto existente desde el K5+200 al K5+900.

g. Verificación topográfica de la conformación de la capa de afirmado desde el K4+480 - K4+900.

h. Control de la actividad de corte en la carpeta asfáltica para ejecutar la construcción de cunetas.

i. Toma de cilindros de concreto de 21 Mpa de las cunetas revestidas desde el K1+130 al K1+380.

2.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición) x 2 und

Retroexcavadora x 1 und

Excavadora de oruga (>= 20 Ton) x 1 und

Autohormigonera Carmix x 1und

Minicargador x 1 und

Camioneta (PickUp o similar) x 2 und

Camión sencillo (Carroceria estacas) x 1und

Motoniveladora (140 o similar) x 1und

Vibrocompactador 10 Ton x 1 und

Mezcladora de concreto x 1 und

Rodillo vibrocompactador x 1 und

Volquetas sencillas x 4 und

Volquetas doble x 10 und


Carrotanque x 1 und

NOTA: El contratista de obra ha realizado la movilización de la maquinaria para ejecutar todas las actividades previstas en el marco del contrato de obra No. IPO-003-2025.

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	12	Meses	3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA	12	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	4	Meses	3.4 PLAZO TRANSCURRIDO	4	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	6.33
% AVANCE FISICO DE OBRA	35.91
% DE ATRASO	-29.58
% DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA	31.18
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	33.33
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	33.33

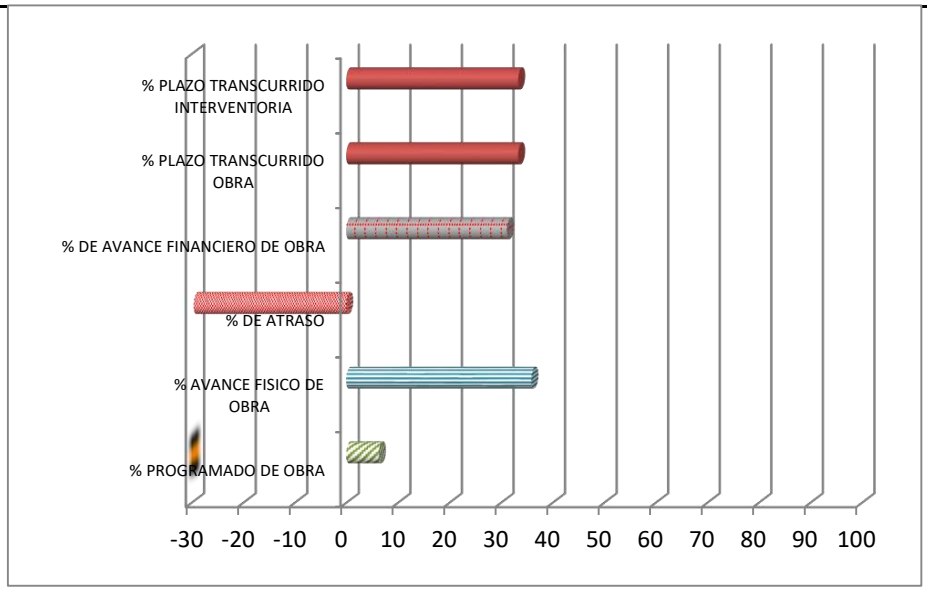

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

Las condiciones climaticas en esta semana fueron favorables sin presencia de fuertes lluvias, lo que permitió avanzar de buena manera en la ejecución de los trabajos, por esta razón se presenta un avance ejecutado superior al programado. El % de avance financiero (31.18%) corresponde al pago del acta parcial No. 1 del contrato de obra equivalente a $ 6.363.581.188,00.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

Verificar con su equipo de trabajo y especialistas geotecnico, estructural, hidrologo, hidraúlico las soluciones a los puntos criticos o de posibles inestabilidades en los taludes.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Se realiza acompañamiento en oficina Interventoría - contratista de obra con el fin de verificar y evaluar las soluciones de los posibles puntos de intervención geotecnica e hidrologica en el tramo de construcción de la vía del contrato de obra IPO-003-2025.

5. FIRMAS

Firma: _____

Nombre: NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
INTERVENTOR

Firma: _____

Nombre: ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ
CONTRATISTA

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Demolición del pavimento asfaltico en el K5+200 al K5+900, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.



Suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+480 - K4+900.



Escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K5+200 - K5+900.



Corte en los bordes de la carpeta asfáltica para realizar la construcción de las cunetas, desde el K0+980 al K1+400 por el costado izquierdo en la dirección hacia la candelaria.



Excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K5+900 - K6+030



Suministro e instalación de malla electrosoldada para el refuerzo de las cunetas desde el K1+130 al K1+380.




Suministro e instalación de malla electrosoldada para el refuerzo de las cunetas desde el K1+130 al K1+380.



Cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K1+130 al K1+380, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K1+130 al K1+380, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.

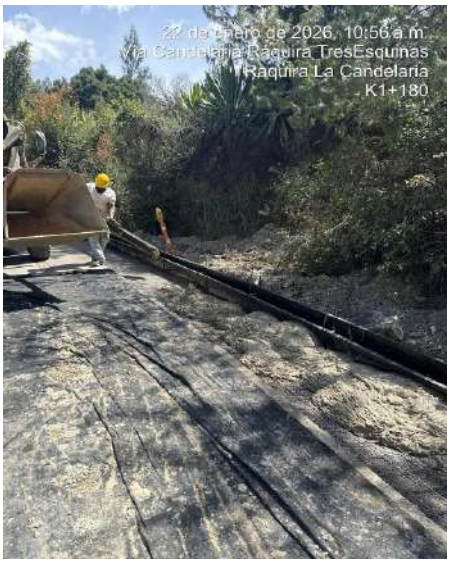

Cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K1+130 al K1+380, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Corte dilataciones de las cunetas en concreto, K1+130 al K1+380.



Cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K1+130 al K1+380, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K1+130 al K1+380, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K1+130 al K1+380, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Corte dilataciones de las cunetas en concreto, K1+130 al K1+380.



Cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K1+130 al K1+380, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.

TIERRASUA ¡Conectamos región!	INFORME DE AVANCE SEMANAL	18

1. INFORMACION GENERALL

1.1 FECHA DE INFORME	2	2	2026	1.2 SEMANA: Del 26/01/2026 hasta 01/02/2026			
1.3 CONTRATO OBRA No.	IPO-003-2025			1.6 CONTRATO INTERVENTORIA No.	IPVO-019-2025		
1.4 CONTRATISTA:	CONSORCIO LA CANDELARIA			1.7 INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCANDELARIA		
1.5 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA	1.8 FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	DD	MM	AAAA
	30	9	2026		30	9	2026

1.9 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2.1 ESTADO DEL TIEMPO	Lunes 26	Martes 27	Miercoles 28	Jueves 29	Viernes 30	Sabado 31	Domingo 01
	Nublado	Soleado	Lluvias intensas	Soleado	Soleado	Nublado	Nublado
2.1.1 Horas lluvia	-	-	4	-	-	-	-

2.2 DESCRIPCION: (Describir brevemente las actividades ejecutadas y localización).

2.2.1 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE OBRA

1) EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ESTRUCTURA PAVIMENTO

- Se realiza excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K6+030 - K6+260

2) DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=3 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)

- Se continua con la demolición del pavimento asfaltico en el K5+900 al K6+060, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.

3) ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE

- Se realiza escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K5+900 - K6+260.

4) SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)

- Se realiza suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+900 - K5+800.

5) TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

- Transporte de material granular tipo afirmado para la conformación de la capa de mejoramiento.

6) CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

Corte en los bordes de la carpeta asfáltica para realizar la construcción de las cunetas, desde el K1+400 al K2+995 por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.

7) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

Se realiza el suministro e instalación de malla electrosoldada para el refuerzo de las cunetas desde el K1+380 al K1+700 por el costado derecho.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

8) CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K1+380 al K1+700, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.

9) SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)

- Se realiza suministro, extendida y compactación de la capa de subbase granular para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+000 - K4+500.

10) TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.

- Transporte de material granular tipo subbase para la conformación de la estructura de pavimento

2.2.2 DESCRIPCION ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

a. Se realiza la verificación de la construcción de las cunetas revestidas en concreto de 21 Mpa ejecutadas desde el K1+380 al K1+700 . Se constata la localización de acuerdo a los estudios y diseños, se supervisa la instalación de la formaleta, corroborando su correcto apuntalado, se verifica que la malla electrosoldada instalada sea la establecida en los diseños y cumpla con los recubrimientos y medidas, además se constata que la cuneta cumpla con los espesores definidos en los planos del proyecto, se controla que la formaleta para el bordillo de la cuneta se encuentre bien plomado antes de realizar el vaciado de concreto. Se realiza toma de cilindros de concreto con el fin de verificar la resistencia a la compresión. Se verifica que el acabado de los concretos presenten buenas condiciones tecnicas, visuales y de calidad. Se controla que se ejecuté la respectivas dilataciones en las cunetas, con el fin de garantizar que el concreto no presente a futuro fisuras por los cambios volumetricos en el concreto generados por los cambios de temperatura.

b. Seguimiento, verificación y chequeo de la conformación de la subrasante con topografia en conjunto con el contratista de obra desde el K5+900 - K6+260.

c. Se verifica que la maquinaria del contratista de obra, se encuentre en adecuadas condiciones operativas y cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso precontractual.

d. Verificación del cumplimiento e implementación de las actividades y presupuestos establecidos en el PMT y P.A.G.A.

e. Verificación topográfica del perfilado de taludes en el K6+030 - K6+260.

f. Verificación topográfica de la demolición del asfalto existente desde el K5+900 - K6+060.

g. Verificación topográfica de la conformación de la capa de afirmado desde el K4+900 - K5+800.

h. Verificación topográfica de la conformación de la capa de subbase granular desde el K4+000 - K4+500.

i. Control de la actividad de corte en la carpeta asfáltica para ejecutar la construcción de cunetas.

j. Toma de cilindros de concreto de 21 Mpa de las cunetas revestidas desde el K1+380 al K1+700.

2.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo de topografia (Estación Total y nivel de presición) x 2 und

Retroexcavadora x 1 und

Excavadora de oruga (>= 20 Ton) x 1 und

Autohormigonera Carmix x 1und

Minicargador x 1 und

Camioneta (PickUp o similar) x 2 und

Camión sencillo (Carroceria estacas) x 1und

Motoniveladora (140 o similar) x 1und

Vibrocompactador 10 Ton x 1 und

Mezcladora de concreto x 1 und

Rodillo vibrocompactador x 1 und

Volquetas sencillas x 4 und

Volquetas doble x 10 und


Carrotanque x 1 und

NOTA: El contratista de obra ha realizado la movilización de la maquinaria para ejecutar todas las actividades previstas en el marco del contrato de obra No. IPO-003-2025.

3. CONTROL DE PLAZOS Y AVANCE DE EJECUCIÓN

3.1 PLAZO CONTRATO DE OBRA	**12**	Meses	**3.3 PLAZO CONTRATO INTERVENTORIA**	**12**	Meses
3.2 PLAZO TRANSCURRIDO	**4.25**	Meses	**3.4 PLAZO TRANSCURRIDO**	**4.25**	Meses

% PROGRAMADO DE OBRA	**6.99**
% AVANCE DE OBRA	**39.35**
% DE ATRASO	**-32.36**
% DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA	**31.18**
% PLAZO TRANSCURRIDO OBRA	**35.42**
% PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORIA	**35.42**

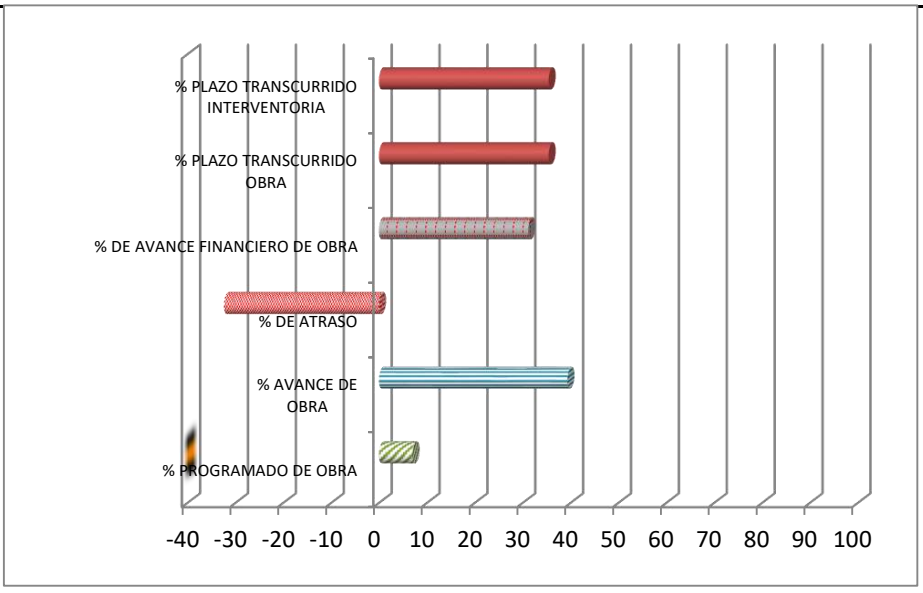

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1 OBSERVACIONES

Las condiciones climaticas en esta semana fueron favorables con presencia de fuertes lluvias pero en un día solamente, lo que permitió avanzar de buena manera en la ejecución de los trabajos, por esta razón se presenta un avance ejecutado superior al programado. El % de avance financiero (31.18%) corresponde al pago del acta parcial No. 1 del contrato de obra equivalente a $ 6.363.581.188,00.

4.2 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

Verificar con su equipo de trabajo y especialistas geotecnico, estructural, hidrologo, hidraúlico las soluciones a los puntos criticos o de posibles inestabilidades en los taludes.

4.3 ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Se realiza acompañamiento en oficina Interventoría - contratista de obra con el fin de verificar y evaluar las soluciones de los posibles puntos de intervención geotecnica e hidrologica en el tramo de construcción de la vía del contrato de obra IPO-003-2025.

5. FIRMAS

Firma: _____	**Firma:** _____
Nombre: NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA	**Nombre: ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ**
INTERVENTOR	**CONTRATISTA**

Nota: *Éste informe debe ser presentado al supervisor de interventoría, el primer día hábil de la semana. Adjuntar soportes y registros*

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K6+030 - K6+260



excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K6+030 - K6+260



excavación mecánica para la construcción de la estructura de pavimento, perfilado de taludes en el K6+030 - K6+260



demolición del pavimento asfaltico en el K5+900 al K6+060, se retira el material de demolición al sitio de disposición autorizado.



suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+900 - K5+800.



escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K5+900 - K6+260.



escarificación, mezclado, conformación y compactación de la subrasante para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K5+900 - K6+260.



suministro, extendida y compactación de la capa de mejoramiento en material de afirmado para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+900 - K5+800.



suministro e instalación de malla electrosoldada para el refuerzo de las cunetas desde el K1+380 al K1+700 por el costado derecho.



suministro, extendida y compactación de la capa de subbase granular para la construcción de la estructura de pavimento, desde el K4+000 - K4+500.



Construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPA desde el K1+380 al K1+700, por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.



Corte en los bordes de la carpeta asfáltica para realizar la construcción de las cunetas, desde el K1+400 al K2+995 por el costado derecho en la dirección hacia la candelaria.

ANEXO 7. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Tunja, 09 de enero de 2026

Señores
CONSORCIO LA CANDELARIA
Att. **ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ (R/L)**
Contratista Obra
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA IPO-003-2025 “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

ASUNTO: REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES

Cordial saludo,
Por medio de la presente y en mi calidad de Interventor del contrato de la referencia, de acuerdo al incumplimiento reiterado en los tiempos de entrega de los informes mensuales, volvemos a solicitar que se cumpla la entrega de los informes por su parte máximo los primeros tres (3) días de cada mes, teniendo en cuenta que nosotros debemos reportar y entregar máximo el 05 de cada mes a la supervisión los respectivos informes de la ejecución de los contratos de obra e interventoría.

Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha entregado el informe del mes de diciembre (No. 3), recalcamos la importancia del cumplimiento de estos tiempos de entrega, así mismo la calidad de los entregables y la entrega de todos los anexos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, de tránsito y de calidad que hacen parte integral del informe.

Lo conminamos a mejorar y cumplir con lo establecido en el contrato de obra en lo referente a la entrega de los informes mensuales de obra, so pena de tomar acciones de acuerdo con las obligaciones del contrato de Obra.

Cordialmente,

NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA
NIT. 901.980.215-9

Ráquira, 14 de enero de 2026

Señores
CONSORCIO LA CANDELARIA
Att. **ADRIANA MARCELA PEDRAZA GOMEZ (R/L)**
Contratista Obra
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA IPO-003-2025 "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA AL CENTRO POBLADO DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ASUNTO: SOLICITUD CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LA MALLA ELECTROSOLDADA Y CEMENTO (ACTIVIDAD CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO)

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que se viene adelantando la construcción de cunetas revestidas en concreto, es de gran importancia contar con los documentos que soportan y certifican la calidad de los insumos principales para está actividad; por esta razón solicitamos se nos allegue los certificados de calidad de los siguientes materiales:

- Malla electrosoldada utilizada como refuerzo para las cunetas.
- Cemento para la elaboración de la mezcla de concreto.

Así mismo se le recuerda la importancia de la toma de muestras de concreto de acuerdo a la periodicidad establecida por la norma técnica vigente aplicable al proyecto.

Cordialmente,

NICOLAS MAURICIO FIGUEROA CORREA
R/L CONSORCIO INTERCANDELARIA
NIT. 901.980.215-9
