INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA N° 03

CONTRATO DE OBRA No. 1066 DEL 29 DE AGOSTO 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

“ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

CONTRATISTA:
INGSERH S.A.S

INTERVENTORÍA:
JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO

Periodo
12 DE NOVIEMBRE 2025 HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2025

INGSERH S.A.S
CONSTRUCTORA
Ingeniería y Arquitectura de calidad

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 7
3. OBJETO DEL INFORME 8
4. LOCALIZACIÓN 8
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 10
5.1. AVANCE DE OBRA 10
5.2. AVANCE GENERAL EN OBRA 20
5.3. AVANCE FINANCIERO 27
6. RELACIÓN FINANCIERA 27
7. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 27
8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 28
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 30

INGSERH S.A.S
CONSTRUCTORA
Ingeniería y Arquitectura de calidad

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización general del proyecto. 9
Ilustración 2 Zona de ejecución del proyecto. 9
Ilustración 3 Plano general arquitectónico del Puesto de Salud. 10

INGSERH S.A.S
CONSTRUCTORA
Ingeniería y Arquitectura de calidad

ÍNDICE DE IMÁGENES

imagen 1. Desmonte de aparatos sanitarios existentes, inodoros y lavamanos.**¡Error! Marcador no definido.**
imagen 2. Desmonte de cubierta existente de asbesto cemento. ... **¡Error! Marcador no definido.**
imagen 3. Demolición de piso esmaltado en zona de baños. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
imagen 4. Demolición de enchape de muros en baños. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
imagen 5. Demolición de mesón en concreto en consultorio. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
imagen 6. Instalación de estructura para cubierta..... **¡Error! Marcador no definido.**
imagen 7. Instalación de cubierta en el puesto de salud. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

INGSERH S.A.S
CONSTRUCTORA
Ingeniería y Arquitectura de calidad

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Ejecución total del contrato de obra 1066 del 29 de agosto de 2025. 27

INGSERH S.A.S
CONSTRUCTORA
Ingeniería y Arquitectura de calidad

INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, realizo el proceso de contratación bajo el cual adjudico el contrato de obra No. 1066 del 29 de agosto de 2025 a la firma INGSERH SAS, cuyo objeto es la "ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", en un plazo de 3 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, la cual se suscribió el 11 de septiembre de 2025.

El valor de este contrato asciende a la suma de $ 194.260.673,00

En el presente informe se ilustran el avance de obra, los trabajos de seguimiento y control de obra junto con los respectivos documentos que soportan las cantidades de obra desarrolladas para periodo **comprendido entre el 12 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025.**

Se presentan anexo al presente documento, los soportes de seguridad social, los respectivos informes de gestión administrativa, que hacen parte de la "ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

INGSERH S.A.S
CONSTRUCTORA
Ingeniería y Arquitectura de calidad

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto contempla la adecuación de las instalaciones del puesto de salud Guadualito ubicado en la inspección de Guadualito, lo que permitirá lo que permitirá prestar los servicios de salud que cuenta la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS. Adicionalmente, contar un personal Auxiliar del área de la Salud de la misma comunidad y de manera estable.

Las actividades por realizar se complementan teniendo en cuenta las condiciones técnicas estructurales en el proceso de formulación del proyecto.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025	
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS. NIT N°: 846.000.471-5
CONTRATISTA DE OBRA:	INGSERH S.A.S NIT N°: 900.128.087-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL C.C.: 1.126.456.040 de Valle del Guamuez
INTERVENTORÍA:	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO 1.085.335.004 de Pasto
SUPERVISIÓN GENERAL:	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NUMERO DEL CONTRATO:	1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO:	"ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."
FECHA SUSCRIPCIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO:	TRES (03) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025

3. OBJETO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo entregar una relación detallada de todas las actividades ejecutadas por el contratista del proyecto en los aspectos técnicos y administrativos en el periodo comprendido desde el doce (12) de noviembre de 2025 hasta el once (10) de diciembre de 2025, además de:

- Verificación de aspectos y características importantes en la ejecución del proyecto y en las cuales se debe tener especial atención.
- Descripción detallada y específica de las actividades desarrolladas por el contratista de obra.
- Descripción del avance físico y financiero del contrato.
- Relacionar y detallar los recursos humanos y físicos utilizados por el contratista durante el periodo en tiempo de ejecución de la obra.
- Registro fotográfico de avance físico de las actividades desarrolladas por el contratista durante este periodo.
- Registros de control de ingreso de personal y planillas de seguridad social del personal empleado por el contratista y afiliaciones personal de obra.

4. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del Municipio de Valle del Guamuez, Putumayo. Su ejecución contempla la adecuación de la infraestructura existente del puesto de salud Guadualito, las cuales serán ejecutadas en la inspección de Guadualito en el Municipio Valle del Guamuez, en el centro poblado donde se encuentra la sede de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS.

INGSERH S.A.S CONSTRUCTORA Ingeniería y Arquitectura de calidad

MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Ilustración 1 Localización general del proyecto.



Ilustración 2 Zona de ejecución del proyecto.

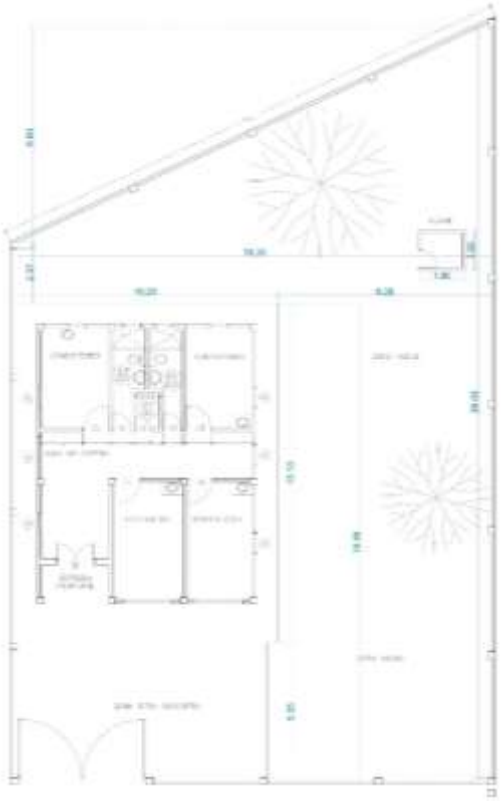


Ilustración 3 Plano general arquitectónico del Puesto de Salud.

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025

5.1.AVANCE DE OBRA

- **ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD**

  - **HIDROFUGADO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA**
    Se realiza la limpieza de muro perimetral de cerramiento, con la aplicación de un producto impermeabilizante, que permita mitigar la generación de moho.
  - **SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"**
    Se realiza la instalación de tubería que permita realizar la conducción de las aguas lluvias desde la cubierta hasta el terreno sin generar daños por la caída al terreno.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE RINCONERAS, ANGULOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.**
  Se realiza la instalación de Cielo raso que permita la instalación lámparas tipo LED y también mejorar los acabados de cubierta de la infraestructura.
- **CONEXIÓN ACOMETIDA PARCIAL DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE TRIFASICO ENCAUCHETADO NO 8, CABLE NO 8, TENSORES PARA CABLE, TUBO EMT 3/4", CAPASETE 3/4".**
  Se realiza la conexión de que permita la conexión eléctrica para el puesto de salud en los diferentes equipos se requiera.
- **ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS.**
  Se realiza la aplicación que permita preservar el estado de los muros y evitar la presencia de moho.
- **SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.**
  Se realiza la instalación de canal que permita la recolección del liquido que cae sobre la cubierta para conducirlo hacia el terreno.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BIFASICA, CON PIN DE CORTE 2X63 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE 2,40M.**
  Se realiza la instalación de punto de toma de medida de consumo energía para llevar el control por parte de la entidad prestadora del servicio en la zona.
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP).**
  Se realiza la instalación y organización de tablero que permita realizar la distribución de puntos eléctricos como lámparas, tomacorrientes, apagadores.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR.**
  Se realiza la instalación de luminarias tipo LED en el cielo raso, que permita mejorar la calidad del servicio.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**
  Se realiza la instalación entre la red principal de distribución que tiene la empresa prestadora del servicio y la red individual que conecta al puesto de salud.
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMACORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA).**
  Se realiza la instalación de puntos de conexión eléctrica (tomacorrientes) para los equipos que requieran 220V.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.**
  Se realiza la instalación de punto de transferencia, teniendo en cuenta que en algún momento sea necesario la incorporación de generador eléctrico externo, por la suspensión de servicio de energía.
- **ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL.**
  Se realiza la instalación de punto de conexión externa que seria necesario para el ingreso del flujo eléctrico desde el generador externo hacia el puesto de salud.
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 M. ANCHO: 0,60M.**
  Se realiza la instalación de articulo mobiliario con mesón en acero inoxidable y cajones en RH.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO DE 1000LTS, INCLUYE FLUIDMASTER, TAPA, Y ACCESORIOS PVC PARA LA CORRECTA CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.**
  Se realiza la instalación de tanque de almacenamiento en la estructura construida para generar la distribución por gravedad hacia los puntos hidráulicos dentro del puesto de salud.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS PREFABRICADO.**
  Se realiza la instalación de articulo prefabricado en zona de aseo que facilite el orden y aseo de los artículos del puesto de salud.
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE.**

Se realiza la instalación de artículos en ducha para el uso de usuarios o personal asistencial que se encuentre en el puesto de salud.

- **LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.**
  Se realiza recolección de escombros, material sobrante y limpieza interna y externa del puesto de salud posterior a haber realizado todo el desarrollo de las actividades.
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMACORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA).**
  Se realiza la instalación de puntos de conexión eléctrica (tomacorrientes) para que de esta manera sea posible la conexión de equipos tecnológicos al momento de prestar el servicio de salud.
- **SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE ESPECIAL PARA ELECTROBOMBA 1/2 HP 110 V.**
  Se realiza la instalación de punto de conexión que permita brindar flujo eléctrico para la electrobomba encargada de brindar el suministro liquido hasta el tanque elevado del puesto de salud.
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMACORRIENTE DOBLES DE 110 V TIPO GFCI (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)**
  Se realiza la instalación de puntos de conexión eléctrico para brindar un mejor servicio a los usuarios del puesto de salud.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS



imagen 1. Instalación de cielo raso.



imagen 2. Aplicación de estuco y pintura.



imagen 3. instalación de canal recolector de aguas lluvias.



imagen 4. instalación de medidor de consumo de energía.



imagen 5. instalación de tablero de control y transferencia manual.



imagen 6. instalación de lámparas luminarias tipo LED.



imagen 7.Instalación de lonchera de conexión a red de distribución.



imagen 8. Punto de tomacorriente de 220V.



imagen 9.Punto de conexión para generador eléctrico externo.



imagen 10.Instalación de mesones en RH.



imagen 11. instalación de tanque para distribución de agua.



imagen 12. instalación de tele ducha y ducha tipo regadera.



imagen 13. instalación de tomacorrientes de 110V y tomacorrientes 110V GFCI.

INGSERH S.A.S
CONSTRUCTORA
Ingeniería y Arquitectura de calidad

5.2.AVANCE GENERAL EN OBRA

El avance general de la obra se encuentra en los capítulos de MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS, CUBIERTAS Y CIELO RASOS, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS donde se tiene un acumulado de 10 actividades desarrolladas para el periodo comprendido en el presente informe.
El porcentaje de avance general del proyecto se ve reflejado en la pre-acta de obra No. 03, anexa al presente informe.

AVANCE GENERAL	% Parcial	% Acumulado
INFORME No. 01	**40,37%**	**40,37%**
INFORME No. 02	**28,39%**	**68,76%**
INFORME No. 03	**31,24%**	**100%**

AVANCE GENERAL	Valor Parcial	Valor Acumulado
INFORME No. 01	**78.416.890,00**	**78.416.890,00**
INFORME No. 02	**55.154.129,00**	**133.571.019,00**
INFORME No 03	**$ 60.689.653,00**	**194.260.673,00**

Valor Ejecutado según Pre-Acta Parcial de Obra al 10 de diciembre de 2025.

VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% AVANCE CTO 1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025
$194.260.673,00	$ 194.260.673,00	**100%**

En la siguiente ilustración podemos evidenciar los avances en cantidades de obra ejecutada respecto a las cantidades de obra contratadas según Pre-acta No. 03 con corte al 10 de diciembre de 2025.

INGSERH S.A.S CONSTRUCTORA Ingeniería y Arquitectura de calidad

- **AVANCE DE CONSTRUCCION**

ACTIVIDADES			CONDICIONES CONTRACUTALES	CONDICIONES MODIFICATORIO 01	EJECUTADO PRE-ACTA 3	CANTITADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE AVANCE
1	**PRELIMINARES**						
1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	7,00	7	0,00	7,00	100%
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA.	m2	114,64	114,64	0,00	114,64	100%
1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	m2	9,73	9,73	0,00	9,73	100%
1,04	ROCERIA Y RETIRO DE VEGETACIÓN PERIMETRAL DEL PUESTO DE SALUD	M2	272,40	272,4	0,00	272,40	100%
1,05	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS	M2	42,68	42,68	0,00	42,68	100%
1,06	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	ML	1,80	1,8	0,00	1,80	100%
1,07	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE.	GL	1,00	1	0,00	1,00	100%
2	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				0,00	0,00	
2,01	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	m2	42,68	41,24	0,00	41,24	100%
2,02	HIDROFUGADO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA	m2	87,32	87,32	87,32	87,32	100%

2,03	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	m2	60,11	60,11	0,00	60,11	100%
2,04	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	m2	145,46	145,46	0,00	145,46	100%
2,05	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	m2	132,12	132,12	0,00	132,12	100%
2,06	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	m2	107,94	107,94	0,00	107,94	100%
3	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**						
3,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE TENSOR EN L/2 ENTRE APOYOS, EN VARILLA DE 3/8"	ml	181,40	181,4	0,00	181,40	100%
3,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	m2	153,43	153,43	0,00	153,43	100%
3,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO .	ml	9,07	9,07	0,00	9,07	100%
3,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE	ml	18,20	18,2	0,00	18,20	100%

	ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE						
3,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ml	20,80	20,8	20,80	20,80	100%
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE RINCONERAS, ANGULOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	82,93	82,93	82,93	82,93	100%
4	**PISOS Y ENCHAPES**						
4,01	MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	m2	9,73	9,73	0,00	9,73	100%
4,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	m2	9,73	9,73	0,00	9,73	100%
4,03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	17,44	4,2	0,00	4,20	100%
5	**CARPINTERIA METALICA**				0,00	0,00	
5,01	Mantenimiendo de Puertas y Ventanas Metalicas, Incluye Cuand Aplique, cambio de vidrios, Cambio de cerraduras, cambio de bisagras, cambio de marcos. Incluye para todos lijada resane y aplicación de anticorrosivo y terminado en esmalte.	M2	28,57	28,57	0,00	28,57	100%
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
6,01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Trifasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo EMT 3/4", Capasete 3/4".	ml	50,00	20	20,00	20,00	100%

6,02	Suministro e instalación de Caja Medidor Bifasica, con pin de corte 2x63 amp, incluye instalación de Puesta a Tierra en Varilla de cobre 2,40m.	und	1,00	1	1,00	1,00	100%
6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)	und	1,00	1	1,00	1,00	100%
6,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar.	und	22,00	22	22,00	22,00	100%
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	1	1,00	1,00	100%
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	4,00	4	4,00	4,00	100%
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA	Und	1,00	1	1,00	1,00	100%

	PLANTA ELECTRICA.						
6,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL.	ML	4,00	4	4,00	4,00	100%
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**						
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ml	3,00	3	3,00	3,00	100%
7,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	und	2,00	2	0,00	2,00	100%
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	und	6,00	6	0,00	6,00	100%
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).	und	2,00	2	0,00	2,00	100%
7,05	Punto Hidraulico de 1/2"	UND	2,00	2	0,00	2,00	100%

7,06	Punto Sanitario de 2"	UND	2,00	2	0,00	2,00	100%
7,07	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	und	1,00	1	1,00	1,00	100%
7,08	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	und	1,00	1	1,00	1,00	100%
7,09	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	und	2,00	2	2,00	2,00	100%
8	**LIMPIEZA**						
8,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	GL	1,00	1	1,00	1,00	100%
N.P.1	**NO PREVISTOS INSTALACIONES ELECTRICAS**						
N.P.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND		16	16,00	16,00	100%
N.P.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE ESPECIAL PARA ELECTRO BOMBA 1/2 Hp 110 V	UND		1	1,00	1,00	100%
N.P.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V TIPO GFCI (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND		2	2,00	2,00	100%

INGSERH S.A.S CONSTRUCTORA Ingeniería y Arquitectura de calidad

5.3.AVANCE FINANCIERO

El avance financiero a la fecha se encuentra en 0% debido a que el proyecto no se manejó con anticipo, sino con cobros parciales según avance de obra.

% EJECUTADO ACUMULADO	100%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 00,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR	0%

Tabla 1 Ejecución total del contrato de obra 1066 del 29 de agosto de 2025.

6. RELACIÓN FINANCIERA

El contrato No. 1066 del 29 de agosto de 2025 tiene un valor de $ 194.260.673,00 destinado a la construcción del proyecto cuyo objeto es la "ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.".

VALORES DEL CONTRATO 1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025		
VALOR CONTRATO INICIAL:	**$**	194.260.673,00 COP.
VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO INICIAL:	**$**	0.0
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	**$**	194.260.673,00
% DE EJECUCIÓN FINANCIERO	**%**	100
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$**	00,00

Relación financiera Pagos del Contrato

7. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

Estado del cumplimiento a la programación establecida:

Durante el proceso de ejecución de actividades fue posible apreciar que se han desarrollado las actividades acordes a la programación presentada, haciendo que el porcentaje de avance acumulado se encuentre 100%, dando como resultado el cumplimiento del objeto contractual.

Las actividades desarrolladas y reportadas en el presente informe corresponden a un total de 21 actividades que forman parte de los capítulos de MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS, CUBIERTAS Y CIELO RASOS, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS.

Para el tiempo restante de ejecución se tiene previsto desarrollar el resto de las actividades programadas y cumplir a cabalidad con el 100% de las actividades contractuales con la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS que permitirán poner en funcionamiento las instalaciones del puesto de salud.

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

a. Garantías

PÓLIZAS CONDICIONES PRIMIGENIAS				
AMPAROS	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA**		**VALOR AFIANZADO**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	29-08-2025	29-05-2026	$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	29-08-2025	29-11-2028	$9.713.033,65
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		$38.852.134,60
PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	29-08-2025	29-11-2025	$284.700.000,00

ANEXO. 1 – ACLARATORIA DE BENEFICIAROS				
AMPAROS	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA**		**VALOR AFIANZADO**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	29-08-2025	29-05-2026	$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	29-08-2025	29-11-2028	$9.713.033,65
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		$38.852.134,60

PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	29-08-2025	29-11-2025	$284.700.000,00

ANEXO. 3 – ACTA DE INICIO				
AMPAROS	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA**		**VALOR AFIANZADO**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101296890	11-09-2025	11-06-2026	$19.426.067,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101296890	11-09-2025	12-12-2028	$9.713.033,65
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101296890	1 año		$38.852.134,60
PERJUICIOS A TERCEROS, COSTOS JURÍDICOS	41-40-101057115	11-09-2025	12-12-2025	$284.700.000,00

b. Relación de personal para el periodo:

IT	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**DOCS. ANEXOS DE CUMPLIMIENTO (siguiente informe)**
1	IVAN RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	PLANILLAS No. 9496547633 NOVIEMBRE, 9496547674 DICIEMBRE

INGSERH S.A.S CONSTRUCTORA Ingeniería y Arquitectura de calidad

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente informe se deja constancia de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 11 de noviembre de 2025 y el 10 de diciembre de 2025, en el marco del proyecto de adecuación del puesto de salud Guadualito, el cual hace parte de las instalaciones de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Valle del Guamuez. Durante este período se desarrollaron un total de veintiún (21) actividades, distribuidas en los capítulos de mampostería y acabados de muros, cubiertas y cielo rasos, instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias y aparatos sanitarios.

La ejecución de dichas actividades permitió alcanzar un avance físico del 31,24%, porcentaje que supera lo programado en el cronograma de obra aprobado. Es relevante resaltar que las labores necesarias para el cumplimiento del objeto contractual se vienen ejecutando de manera satisfactoria y conforme a lo establecido, evidenciándose además un desempeño superior al inicialmente previsto en cada uno de los informes presentados. En este sentido, se proyecta la finalización del cien por ciento (100%) del objeto contractual en un plazo inferior al estimado inicialmente.

Julieth Ortega

JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL
Representante Legal
INGSERH S.A.S
Nit. 900.128.087 – 6

INGSERH S.A.S
CONSTRUCTORA
Ingeniería y Arquitectura de calidad

PRE-ACTA DE OBRA N° 03

PRE-ACTA

DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	**SUPERVISOR:**	ESE HSCJ
MUNICIPIO:	VALLE DEL GUAMUEZ	**INTENVENTOR:**	JOSE DANIEL MARTINEZ ARELLANO
VALOR CONTRATO:	$194.260.673,00	**ACTA DE INICIO:**	11/09/2025
ENTE CONTRATANTE:	ESE HSCJ	**PLAZO INICIAL:**	3 MESES
CONTRATISTA:	INGSERH S.A.S.	**FECHA TERMINACIÓN:**	10/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	**FECHA DE ACTA:**	10/12/2025
		PAGINAS:	1 DE 1
		VALOR TOTAL INFORME:	$60.689.653,00

CONTRATO N° 1066 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVIDADES			CONDICIONES CONTRACUTALES			CONDICIONES MODIFICATORIO 01			EJECUTADO ACUMULADO PRE-ACTA 2		EJECUTADO PRE-ACTA 3		CANTITADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				$ -									
1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	7,00	$ 34.997,00	$ 244.979,00	7	$ 34.997,00	$ 244.979,00	7	$ 244.979,00		$ -	7,00	244.979,00
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA.	m2	114,64	$ 74.674,00	$ 8.560.627,00	114,64	$ 74.674,00	$ 8.560.627,00	114,64	$ 8.560.627,00		$ -	114,64	8.560.627,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	m2	9,73	$ 32.636,00	$ 317.548,00	9,73	$ 32.636,00	$ 317.548,00	9,73	$ 317.548,00		$ -	9,73	317.548,00
1,04	ROCERIA Y RETIRO DE VEGETACIÓN PERIMETRAL DEL PUESTO DE SALUD	M2	272,40	$ 7.978,00	$ 2.173.207,00	272,4	$ 7.978,00	$ 2.173.207,00	272,4	$ 2.173.207,00		$ -	272,40	2.173.207,00
1,05	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS	M2	42,68	$ 29.519,00	$ 1.259.871,00	42,68	$ 29.519,00	$ 1.259.871,00	42,68	$ 1.259.871,00		$ -	42,68	1.259.871,00
1,06	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	ML	1,80	$ 75.851,00	$ 136.532,00	1,8	$ 75.851,00	$ 136.532,00	1,8	$ 136.532,00		$ -	1,80	136.532,00
1,07	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE.	GL	1,00	$ 249.981,00	$ 249.981,00	1	$ 249.981,00	$ 249.981,00	1	$ 249.981,00		$ -	1,00	249.981,00
2	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**													
2,01	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	m2	42,68	$ 110.715,00	$ 4.725.316,00	41,24	$ 110.715,00	$ 4.565.887,00	41,24	$ 4.565.887,00		$ -	41,24	4.565.887,00
2,02	HIDROFUGADO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA	m2	87,32	$ 8.983,00	$ 784.396,00	87,32	$ 8.983,00	$ 784.396,00	0	$ -	87,32	$ 784.396,00	87,32	784.396,00
2,03	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	m2	60,11	$ 32.330,00	$ 1.943.356,00	60,11	$ 32.330,00	$ 1.943.356,00	60,11	$ 1.943.356,00		$ -	60,11	1.943.356,00
2,04	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	m2	145,46	$ 40.498,00	$ 5.890.839,00	145,46	$ 40.498,00	$ 5.890.839,00	145,46	$ 5.890.839,00		$ -	145,46	5.890.839,00
2,05	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	m2	132,12	$ 42.435,00	$ 5.606.512,00	132,12	$ 42.435,00	$ 5.606.512,00	132,12	$ 5.606.512,00		$ -	132,12	5.606.512,00
2,06	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	m2	107,94	$ 35.428,00	$ 3.824.098,00	107,94	$ 35.428,00	$ 3.824.098,00	107,94	$ 3.824.098,00		$ -	107,94	3.824.098,00
3	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**													
3,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C	ml	181,40	$ 137.535,00	$ 24.948.849,00	181,4	$ 137.535,00	$ 24.948.849,00	181,4	$ 24.948.849,00		$ -	181,40	24.948.849,00
3,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA	m2	153,43	$ 135.413,00	$ 20.776.417,00	153,43	$ 135.413,00	$ 20.776.417,00	153,43	$ 20.776.417,00		$ -	153,43	20.776.417,00
3,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO	ml	9,07	$ 81.447,00	$ 738.724,00	9,07	$ 81.447,00	$ 738.724,00	9,07	$ 738.724,00		$ -	9,07	738.724,00
3,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ml	18,20	$ 185.425,00	$ 3.374.735,00	18,2	$ 185.425,00	$ 3.374.735,00	18,2	$ 3.374.735,00		$ -	18,20	3.374.735,00
3,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ml	20,80	$ 43.455,00	$ 903.864,00	20,8	$ 43.455,00	$ 903.864,00	0	$ -	20,80	$ 903.864,00	20,80	903.864,00
3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE RINCONERAS, ANGULOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	82,93	$ 133.684,00	$ 11.086.414,00	82,93	$ 133.684,00	$ 11.086.414,00	0	$ -	82,93	$ 11.086.414,00	82,93	11.086.414,00
4	**PISOS Y ENCHAPES**													
4,01	MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	m2	9,73	$ 92.295,00	$ 898.030,00	9,73	$ 92.295,00	$ 898.030,00	9,73	$ 898.030,00		$ -	9,73	898.030,00
4,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	m2	9,73	$ 128.387,00	$ 1.249.206,00	9,73	$ 128.387,00	$ 1.249.206,00	9,73	$ 1.249.206,00		$ -	9,73	1.249.206,00
4,03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	17,44	$ 32.497,00	$ 566.748,00	4,2	$ 32.497,00	$ 136.487,00	4,2	$ 136.487,00		$ -	4,20	136.487,00
5	**CARPINTERIA METALICA**													
5,01	Mantenimiendo de Puertas y Ventanas Metalicas, Incluye Cuand Aplique, cambio de vidrios, Cambio de cerraduras, cambio de bisagras, cambio de marcos. Incluye para todos lijada resane y aplicación de anticorrosivo y terminado en esmalte.	M2	28,57	$ 344.992,00	$ 9.856.421,00	28,57	$ 344.992,00	$ 9.856.421,00	28,57	$ 9.856.421,00		$ -	28,57	9.856.421,00

6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**													
6,01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Trifasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo EMT 3/4", Capasete 3/4".	ml	50,00	$ 201.471,00	$ 10.073.550,00	20	$ 201.471,00	$ 4.029.420,00	0	$ -	20,00	$ 4.029.420,00	20,00	4.029.420,00
6,02	Suministro e instalación de Caja Medidor Bifasica, con pin de corte 2x63 amp, incluye instalación de Puesta a Tierra en Varilla de cobre 2,40m.	und	1,00	$ 1.406.838,00	$ 1.406.838,00	1	$ 1.406.838,00	$ 1.406.838,00	0	$ -	1,00	$ 1.406.838,00	1,00	1.406.838,00
6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)	und	1,00	$ 1.200.188,00	$ 1.200.188,00	1	$ 1.200.188,00	$ 1.200.188,00	0	$ -	1,00	$ 1.200.188,00	1,00	1.200.188,00
6,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar.	und	22,00	$ 199.941,00	$ 4.398.702,00	22	$ 199.941,00	$ 4.398.702,00	0	$ -	22,00	$ 4.398.702,00	22,00	4.398.702,00
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 979.044,00	$ 979.044,00	1	$ 979.044,00	$ 979.044,00	0	$ -	1,00	$ 979.044,00	1,00	979.044,00
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	4,00	$ 187.841,00	$ 751.364,00	4	$ 187.841,00	$ 751.364,00	0	$ -	4,00	$ 751.364,00	4,00	751.364,00
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.	Und	1,00	$ 876.871,00	$ 876.871,00	1	$ 876.871,00	$ 876.871,00	0	$ -	1,00	$ 876.871,00	1,00	876.871,00
6,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL.	ML	4,00	$ 201.471,00	$ 805.884,00	4	$ 201.471,00	$ 805.884,00	0	$ -	4,00	$ 805.884,00	4,00	805.884,00
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				$ -									
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ml	3,00	$ 1.999.005,00	$ 5.997.015,00	3	$ 1.999.005,00	$ 5.997.015,00	0	$ -	3,00	$ 5.997.015,00	3,00	5.997.015,00
7,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	und	2,00	$ 723.513,00	$ 1.447.026,00	2	$ 723.513,00	$ 1.447.026,00	2	$ 1.447.026,00		$ -	2,00	1.447.026,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	und	6,00	$ 401.452,00	$ 2.408.712,00	6	$ 401.452,00	$ 2.408.712,00	6	$ 2.408.712,00		$ -	6,00	2.408.712,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).	und	2,00	$ 145.084,00	$ 290.168,00	2	$ 145.084,00	$ 290.168,00	2	$ 290.168,00		$ -	2,00	290.168,00
7,05	Punto Hidraulico de 1/2"	UND	2,00	$ 65.713,00	$ 131.426,00	2	$ 65.713,00	$ 131.426,00	2	$ 131.426,00		$ -	2,00	131.426,00
7,06	Punto Sanitario de 2"	UND	2,00	$ 80.264,00	$ 160.528,00	2	$ 80.264,00	$ 160.528,00	2	$ 160.528,00		$ -	2,00	160.528,00
7,07	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	und	1,00	$ 1.250.503,00	$ 1.250.503,00	1	$ 1.250.503,00	$ 1.250.503,00	0	$ -	1,00	$ 1.250.503,00	1,00	1.250.503,00
7,08	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	und	1,00	$ 849.450,00	$ 849.450,00	1	$ 849.450,00	$ 849.450,00	0	$ -	1,00	$ 849.450,00	1,00	849.450,00
7,09	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	und	2,00	$ 1.251.845,00	$ 2.503.690,00	2	$ 1.251.845,00	$ 2.503.690,00	0	$ -	2,00	$ 2.503.690,00	2,00	2.503.690,00
8	**LIMPIEZA**													
8,01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	GL	1,00	$ 1.519.547,00	$ 1.519.547,00	1	$ 1.519.547,00	$ 1.519.547,00	0	$ -	1,00	$ 1.519.547,00	1,00	1.519.547,00
N.P.1	**NO PREVISTOS INSTALACIONES ELECTRICAS**													
N.P.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND				16	$ 308.519,00	$ 4.936.304,00	0	$ -	16,00	$ 4.936.304,00	16,00	4.936.304,00
N.P.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE ESPECIAL PARA ELECTRO BOMBA 1/2 Hp 110 V	UND				1	$ 553.828,00	$ 553.828,00	0	$ -	1,00	$ 553.828,00	1,00	553.828,00
N.P.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V TIPO GFCI (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND				2	$ 571.844,00	$ 1.143.688,00	0	$ -	2,00	$ 1.143.688,00	2,00	1.143.688,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 147.167.176,00			$ 147.167.176,00		101.190.166,00		$ 45.977.010,00		147.167.176,00
	COSTOS INDIRECTOS													
	ADMINISTRACION			26,00%	$ 38.263.466,00		26,00%	$ 38.263.466,00		$ 26.309.443,00		$ 11.954.023,00		$ 38.263.466,00
	IMPREVISTOS			1,0%	$ 1.471.672,00		1,0%	$ 1.471.672,00		$ 1.011.902,00		$ 459.770,00		$ 1.471.672,00
	UTILIDAD			5,0%	$ 7.358.359,00		5,0%	$ 7.358.359,00		$ 5.059.508,00		$ 2.298.851,00		$ 7.358.359,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			32,0%	$ 47.093.497,00		32,0%	$ 47.093.497,00		$ 32.380.853,00		$ 14.712.643,00		$ 47.093.497,00
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)				$ 194.260.673,00			$ 194.260.673,00		133.571.019,00		$ 60.689.653,00		194.260.673,00

JULIETH ORTEGA
R.L. INGSERH S.A.S.
CC 1126456040


DANIEL MARTINEZ
INTERVENTORIA
CC 1085335004

MARCELINA CUARAN INAGAN
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
SUPERVISOR DESIGNADO

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	**FECHA**		
ÍTEM	3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE RINCONERAS, ANGULOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	**Unidad Medida**	m2



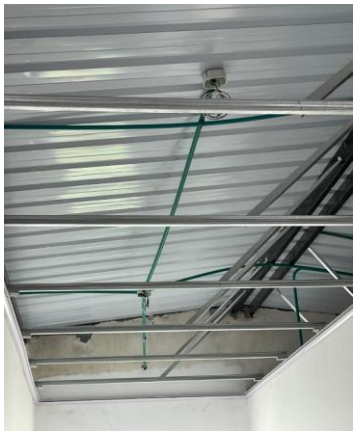

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
INGRESO	2,61		1,52		3,97
SALA ESPERA	3,10		2,61		8,09
	8,19		1,80		14,74
VACUNACIÓN	4,59		2,74		12,58
ODONTOLOGIA	4,59		2,56		11,75
CONSULTORIO 1	4,02		2,62		10,53
BAÑOS	4,02		2,69		10,81
CONSULTORIO 2	4,02		2,60		10,45

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD	**82,93**

Elaboró

IVAN RODRIGUEZ
Residente de Obra
INGSERH SAS

Aprobó

DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Residente de Obra
Contratista Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**		
ÍTEM	6,02	Suministro e instalación de Caja Medidor Bifasica, con pin de corte 2x63 amp, incluye instalación de Puesta a Tierra en Varilla de cobre 2,40m.	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO SALUD				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

TOTAL ACTIVIDAD	**1,00**

OBSERVACIONES:

Elaboró

IVAN RODRIGUEZ
Residente de Obra
INGSERH SAS

Aprobó

DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Residente de Obra
Contratista Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**		
ÍTEM	6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
PUESTO SALUD				1,00	1,00
					-
					-
					-

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**		
ÍTEM	6,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique.	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
ENTRADA PRINCIPAL				1,00	1,00
PASILLO				4,00	4,00
VACUNACION				2,00	2,00
ODONTOLOGIA				2,00	2,00
CONSULTORIO 1				2,00	2,00
CONSULTORIO 2				2,00	2,00
BAÑOS				2,00	2,00
ASEÑO				1,00	1,00
FACHADA FRONTAL				2,00	2,00
FACHADA LATERAL IZQ				1,00	1,00
FACHADA LATERAL DER.				1,00	1,00
FACHADA POSTERIOR				2,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL ACTIVIDAD					**22,00**

OBSERVACIONES:

Elaboró


IVAN RODRIGUEZ
Residente de Obra
INGSERH SAS

Aprobó

DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Residente de Obra
Contratista Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**	5-abr-24	
ÍTEM	6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	**Unidad Medida**	ML

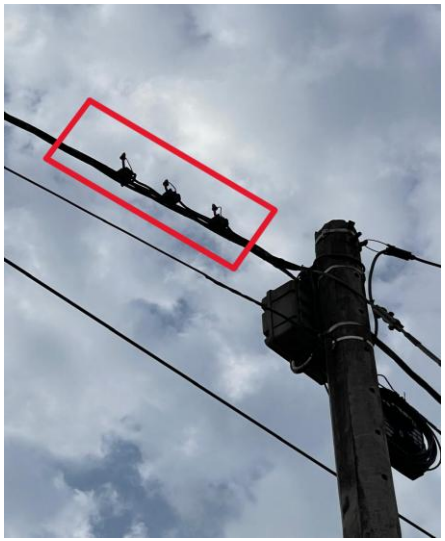

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
POSTE				1,00	1,00
					-
					-
					-

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**		
ÍTEM	6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
AIRES ACONDICIONADOS				4,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD	**4,00**

Elaboró

IVAN RODRIGUEZ
Residente de Obra
INGSERH SAS

Aprobó

DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Residente de Obra
Contratista Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**		
ÍTEM	6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Planta electrica				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD	**1,00**

Elaboró

IVAN RODRIGUEZ
Residente de Obra
INGSERH SAS

Aprobó

DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Residente de Obra
Contratista Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**FECHA**		
ÍTEM	6,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL.	**Unidad Medida**	ML



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Planta electrica	4,00			1,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD	**4,00**

Elaboró

IVAN RODRIGUEZ
Residente de Obra
INGSERH SAS

Aprobó

DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Residente de Obra
Contratista Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**		
ÍTEM	7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	**Unidad Medida**	ML



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
					-
ODONTOLOGIA	1,50			1,00	1,50
VACUNACIÓN	1,50			1,00	1,50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD	3,00

Elaboró

IVAN RODRIGUEZ
Residente de Obra
INGSERH SAS

Aprobó

DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Residente de Obra
Contratista Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**		
ÍTEM	7,07	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Tanque de Agua				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD	**1,00**

Elaboró

IVAN RODRIGUEZ
Residente de Obra
INGSERH SAS

Aprobó

DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Residente de Obra
Contratista Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**		
ÍTEM	7,08	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Cuarto Aseo				1,00	1,00
					-
					-
					-

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS	**FECHA**		
ÍTEM	7,09	Suministro e instalación de Ducha tip regadera y teleducha independiente.	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
Baño Ducha				2,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ACTIVIDAD	**2,00**

OBSERVACIONES:

Elaboró

IVAN RODRIGUEZ
Residente de Obra
INGSERH SAS

Aprobó

DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Residente de Obra
Contratista Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ
CAPITULO	LIMPIEZA	**FECHA**	
ÍTEM	N.P.1.1 — SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 1				4,00	4,00
CONSULTORIO 2				4,00	4,00
VACUNACION				4,00	4,00
ODONTOLOGIA				4,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ACTIVIDAD	**16,00**

OBSERVACIONES:

Elaboró

IVAN RODRIGUEZ
Residente de Obra
INGSERH SAS

Aprobó

DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Residente de Obra
Contratista Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.				
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO		**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	LIMPIEZA		**FECHA**		
ÍTEM	N.P.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE ESPECIAL PARA ELECTRO BOMBA 1/2 Hp 110 V	**Unidad Medida**	UND	



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
FACHADA LATERAL				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD	1,00

Elaboró

IVAN RODRIGUEZ
Residente de Obra
INGSERH SAS

Aprobó

DANIEL MARTINEZ ARELLANO
Residente de Obra
Contratista Interventoria

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES PREACTA No. 03

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD GUADUALITO DE LA E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD GUADUALITO	**MUNICIPIO**	VALLE DEL GUAMUEZ	
CAPITULO	LIMPIEZA	**FECHA**		
ÍTEM	N.P.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V TIPO GFCI (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	**Unidad Medida**	UND



Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
WC-1				1,00	1,00
WC-2				1,00	1,00
					-
					-
					-

12 de noviembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM.
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona. Ing. Civil
Actividades ejecutadas:
- Se realiza proceso de hidrofugado en muros de cerramiento perimetral
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra

Residente Interventoria.

13 de noviembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas
- Se realiza proceso de hidrofugado en muros de cerramiento perimetral.
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra

Residente Interventoria

14 de noviembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas
- Se realiza proceso de hidrofugado en muros de cerramiento perimetral

Residente de Obra

Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

18 de noviembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas.
- Instalacion de bajante de aguas lluvias.
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra | Residente Interventoria

19 de noviembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas.
- Instalacion de acometida de poste a medidor y londriera de poste
- Instalacion de medidor bifasico.
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra | Residente Interventoria

20 de noviembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas.
- Instalacion de tablero de control, tranferencia manual y conexion a planta electrica.
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra | Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

21 de noviembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas
- Instalacion de mesones en RH
- Instalacion de tanque plastico de distribucion de agua
Hora salida: 4:30 PM

Residente de Obra | Residente Interventoria

24 de noviembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: lluvias entre 1:30 PM y 4:25 PM
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas.
- Instalacion de lavatraperos
- Instalacion de ducha tipo regadera y teleducha
Hora salida: 5:30

Residente de Obra | Residente Interventoria

25 de noviembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas
- Instalacion de tomacorriente dobles de 220 V
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra | Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

26 de noviembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas
-Instalacion toma corrientes dobles 110V y 110 V GFCI
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra

Residente Interventoria

27 de noviembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas
-Instalacion de tomacorrientes dobles 110 V y 110V GFCI.
Hora salida: 5:30 PM.

Residente de Obra

Residente Interventoria

28 de noviembre. de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas
-Instalacion de tomacorrientes dobles 110 V y 110V GFCI.
Hora salida: 4:30 PM

Residente de Obra

Residente Interventoria

01 de diciembre de 2025.

Scanned with CamScanner

Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: lluvias entre 09:30 AM y 11:20 AM
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas.
-Instalacion de cielo raso en PVC, incluye estructura metalica.
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra | Residente Interventoria

02 de diciembre de 2025.
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra; 1 persona
Actividades ejecutadas
-Instalacion de cielo raso en PVC, incluye estructura metalica
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra | Residente Interventoria

03 de diciembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas.
-Instalacion de cielo raso en PVC, incluye estructura metalica
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra | Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

04 de diciembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM y clima soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas.
-Instalacion de luminaria LED de 18W
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra Residente Interventoria

05 de diciembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas.
-Instalacion de luminarias LED de 18W
Hora salida: 4:30 PM

Residente de Obra Residente Interventoria

09 de diciembre de 2025
Hora ingreso: 7:30 AM
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades ejecutadas.
-Limpieza general y retiro de material sobrante
Hora salida: 5:30 PM

Residente de Obra Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

10 de diciembre de 2025
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 persona
Actividades
- Visita de inspeccion visual y verificacion de cumplimiento de actividades contractuales.
- Firma de acta de entrega y recibo final.
- Comite en instalaciones de la ESE Hospital Sagrado corazon de Jesus.
- Cierre de bitacora de Obra

En la fecha 10 de diciembre de 2025 se deja constancia del cierre definitivo de la bitacora de obra del contrato N° 1066 del 29 de agosto de 2025, cuyo objeto fue, "Adecuacion menor de infraestructura fisica del puesto de salud Guadualito de la E.S.E. Hospital Sagrado Corazon de Jesus localizado en el municipio de Valle del Guamuez departamento del Putumayo", ejecutado en el municipio de Valle del Guamuez.

La obra se desarrolló entre el 11 de septiembre de 2025 y el 10 de diciembre de 2025, cumpliendo con las especificaciones tecnicas y condiciones contractuales.

Se deja constancia de que las actividades fueron ejecutadas en su totalidad y la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su funcionamiento. No se presentan observaciones pendientes al momento del cierre.

Para constancia se firma en el Valle del Guamuez, a los 10 dias del mes de diciembre de 2025.

Residente de Obra | Interventor | Julieth Ortega R.L. INGSERH SAS

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGSERH SAS (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC 1122784379	RODRIGUEZ IVAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	93429578	9496547633	E	2025/12/19	2025/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$440,900**	**$0**	**$0**	**$440,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGSERH SAS (1 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$0	$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$0	$0
1	CC 1122784379	RODRIGUEZ IVAN	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC18	10	$474,500	$19,000	CCF63	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
Total Afiliados(1)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	93017892	9496547674	E	2026/01/22	2025/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$147,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$0	$0	$76,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$76,000	$0	$0	$76,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,100	$0	$0	$33,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$33,100	$0	$0	$33,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,000	$0	$0	$19,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$19,000	$0	$0	$19,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,000	$0	$0	$19,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$19,000	$0	$0	$19,000
TOTAL				**1**	**$147,100**	**$0**	**$0**	**$147,100**
