ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: PRGC17-0000-0000-FO06
		VERSIÓN: 01
	FORMATO ACTA DE CORTE DE PAGO DERIVADO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	FECHA APROBACIÓN: 07/02/2025
		Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

Fecha:	18/02/26	Acta de Corte N°	18	Periodo Ejecución:	15/12/25	a	31/01/26
Persona natural:		Persona jurídica:	X	Modalidad contratación:		LICITACIÓN PÚBLICA	
Numero cedula:		NIT:		901.590.186-1	N° contrato:	SIOP 0082 - 2022	
Nombre contratista:	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA						
Correo electrónico:	gcontadores@hotmail.com				Número de contacto:	3007058074	
Nombre y cargo del supervisor:	AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS						

OBJETO DE CONTRATO:

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.

2. BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$	27.029.500.000,00
Anticipo 40% Contrato Inicial	$	-
Adicion No. 01 (SI APLICA):	$	902.219.533,57
Adicion No. 02 (SI APLICA):	$	2.159.933.356,58
Adicion No. 03 (SI APLICA):	$	15.846.639.020,79
Valor Total del Contrato:	$	45.938.292.510,94
Acta de corte (01):	$	1.445.063.750,00
Acta de corte (02):	$	557.101.500,00
Acta de corte (03):	$	369.439.375,00
Acta de corte (04):	$	3.662.337.807,97
Acta de corte (05):	$	1.146.114.908,57
Acta de corte (06):	$	3.783.751.000,77
Acta de corte (07):	$	3.503.523.626,45
Acta de corte (08):	$	2.073.031.907,80
Acta de corte (09):	$	1.109.805.419,74
Acta de corte (10):	$	1.092.541.851,47
Acta de corte (11):	$	1.516.912.166,59
Acta de corte (12)	$	1.507.623.413,28
Acta de corte (13)	$	1.721.095.420,46
Acta de corte (14)	$	1.589.056.563,95
Acta de corte (15)	$	1.198.000.288,28
Acta de corte (16)	$	747.123.883,62
Acta de corte (17)	$	1.008.188.347,40
Acta de corte (18)	$	1.087.515.310,44
Valor Total Ejecutado:	$	29.178.226.691,79
Saldo por ejecutar:	$	16.760.065.909,15
Porcentaje ejecutado a la fecha		63,52%

3. GENERALIDAD DE CONTRATISTA

Plazo Inicial del Contrato:	DIECISEIS (16) MESES
Fecha de inicio:	02 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de terminación inicial:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión no.1:	12 DE OCTUBRE DE 2022
Plazo de suspensión no.1:	45 DÍAS CALENDARIO
Reinicio 1:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha suscripción prorroga no.1 a la fase I	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha prorroga no.1 a la fase I	14 DE DICIEMBRE DE 2022
Plazo prorroga no.1:	160 DÍAS CALENDARIO
Fecha de suspensión no.2:	3 DE ABRIL DE 2023
Plazo de suspensión no.2:	TRES (3) MESES
Reinicio no.2:	30 DE JUNIO 2023
Acta de inicio fase ii	30 DE JUNIO 2023
Fecha de suspensión no.1 fase 2:	17 DE JULIO DE 2023
Plazo de suspensión no.1 a la fase 2:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
Otro si	14 DE AGOSTO 2023
Fecha de suscripción de la adición no.1 y prorroga no.2	15 DE AGOSTO DE 2023
Adición no.1 y prorroga no.2 a la fase 1	19 DE AGOSTO 2023
Plazo prorroga no.2 fase 1:	1 MES
Acta de inicio fase iii	15 DE AGOSTO DE 2023
Acta modificatoria no.1:	3 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de suspensión no.3:	1 DE ABRIL DE 2024
Plazo de suspensión no.3:	30 DÍAS CALENDARIO
Reinicio no.3:	31 DE MAYO DE 2024
Fecha de suspensión no.4:	1 DE JUNIO DE 2024
Plazo de suspensión no.4:	60 DÍAS CALENDARIO
Reinicio no.4:	1 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de modificatorio no.2 prorroga no.1 a la fase 3	10 DE AGOSTO DE 2024
Plazo de la prorroga no.1 a la fase 3	4 MESES Y 22 DÍAS
Fecha de suscripción prorroga no.2	27 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de prorroga no.2	1 DE ENERO 2025
Plazo de la prorroga no.2	2 MESES Y 17 DÍAS
Modificatorio no.3,adición no.2 y prorroga no.3 a la fase 3	18 DE MARZO DE 2025
Plazo de la prorroga no.3 a la fase 3	4 MESES
Fecha de suspensión no.5:	13 DE MAYO DE 2025
Plazo de suspensión no.5:	30 DIAS CALENDARIO
Fecha de ampliación 1 a la suspensión no.5:	12 DE JUNIO DE 2025
Plazo de ampliación a la suspensión no.5:	TREINTA (30) DIAS
Fecha de ampliación 2 a la suspensión no.5:	11 DE JULIO DE 2025
Plazo de ampliación 2 a la suspensión no.5:	30 DIAS CALENDARIO
Fecha de reinicio no.5	13 AGOSTO DE 2025
Fecha de suspensión no.6:	17 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo de suspensión no.6:	15 DIAS CALENDARIO
Fecha de ampliación 1 a la suspensión no.6:	31 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo de ampliación a la suspensión no.6:	15 DIAS CALENDARIO
Fecha de ampliación 2 a la suspensión no.6:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo de ampliación a la suspensión no.6:	15 DIAS CALENDARIO
Fecha de ampliación 3 a la suspensión no.6:	29 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo de ampliación a la suspensión no.6:	15 DIAS CALENDARIO
Fecha de ampliación 4 a la suspensión no.6:	10 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo de ampliación a la suspensión no.6:	4 DIAS CALENDARIO
Fecha de reinicio no.6	15 DE DICIEMBRE DE 2025
Modificatorio no.4,adición no.3 y prorroga no.4	15 DE DICIEMBRE DE 2025
Nueva Fecha de Terminación del Contrato:	31 DE DICIEMBRE DE 2026

4. RELACIÓN DE ANEXOS ENTREGADOS

	PAGINAS	SI	NO
Informe del supervisor	11	X	
Aval e informe acta parcial de obra N° 18	02	X	
Informe verificación de acta de corte interventoria	10	X	
Informe acta de corte No.18 incluido memorias, cantidades y bitacora	02	X	
Planillas de seguridad social	2	X	
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal y/o Contador y planillas	2	X	
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal:	2	X	
Certificado de la junta de contadores persona jurídica:	2	X	
Documentos legales (Polizas)	15	X	
Cuenta de cobro y/o factura:	1	X	
Certificación Bancaria	1	X	
Documento de conformación de unión temporal	3	X	
Registro Unico Tributario y cámara de comercio	38	X	
Informe de obra	35	X	
Anexo, Medio magnético CD, USB, OTROS: Planos			X

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

El suscrito supervisor, certifica que previa revisión del acta de corte, y los anexos relacionados con el informe de actividades CUMPLE con los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

5. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT: 901.590.186-1
JERSON MENDOZA OCHOA CC 1.118.844.495 DE RIOHACHA
Representante Legal - CONTRATISTA OBRA

UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
NIT: 901.614.955-0
CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
C.C. 1.104.011.113 de San Pedro Sucre
REPRESENTANTE LEGAL-
INTERVENTORÍA

ARQ. AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ORDENADOR DE GASTO
(DECRETO 056-2025)

	PROYECTO	REVISO				APROBO
NOMBRE	Juan Diego Trujillo Alvira	Nidia Marcela Hernandez- Revisión Técnica Luis Hernan Catellanos - Revisión Técnica Nidya Sabogal - Revisión Técnica Juan David Rodriguez - Revisión Técnica Cinthia Rodriguez- Revisión Juridico Liliana Avila- Apoyo SG STT	Amparo Andrea Rodriguez Colorado	Juana Valentina Carrasquilla Giraldo	Geydy Garcia	Luis Gabriel Campuzano Alzate
CARGO	CONTRATISTA SIOP	CONTRATISTA SIOP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Abogada	Asesor Despacho	Asesor Despacho
FIRMA						
FECHA:	18/02/26	18/02/26	18/02/26	18/02/26	18/02/26	18/02/26

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el acta de corte encontrandola ajustada a las normas y disposiciones legales vigentes

INFORME No.:	18
FECHA DE ELABORACIÓN:	18/02/2026
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**SIOP-0082-2022**
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
	NIT. 901.590.186-1
	R.L. JERSON MENDOZA C.C.1.118.844.195
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND).
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	13 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	02 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN 1	12 DE OCTUBRE DE 2022
REINICIO 1	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA No.1 a la fase 1	14 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSIÓN 2	03 DE ABRIL DE 2023
REINICIO 2	30 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE INICIO FASE II	30 DE JUNIO DE 2023
OTROSI	14 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN 3	3 DE ABRIL DE 2024
REINICIO 3	31 DE MAYO DE 2024
SUSPENSIÓN 4	31 DE MAYO DE 2024
REINICIO 4	1 DE AGOSTO DE 2024
SUSPENSIÓN 5	13 DE MAYO DE 2025
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 5	12 DE JUNIO DE 2025
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 5	11 DE JULIO DE 2025
REINICIO 5	13 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACION POR REINICIO 5:	17 DE OCTUBRE DE 2025
SUSPENSIÓN 6	17 DE OCTUBRE DE 2025
AMPLIACIÓN No 01 A LA SUSPENSIÓN No 6	31 DE OCTUBRE DE 2025
AMPLIACIÓN No 02 A LA SUSPENSIÓN No 6	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
AMPLIACION No 03 A LA SUSPENSIÓN No 6	29 DE NOVIEMBRE DE 2025
AMPLIACION No 04 A LA SUSPENSIÓN No 6	10 DE DICIEMBRE DE 2025 (4DÍAS)

REINICIO No 6	15 DE DICIEMBRE DE 2025				
MODIFICATORIO No 04 ADICION No 03 Y PRORROGA No 04	15 DE DICIEMBRE DE 2025				
TIEMPO DE PRORROGA No 04	12 MESES Y 17 DIAS				
VALOR ADICION No 03	$ 15.846.639.620,79				
FECHA ACTUALIZADA POR PRORROGA No 4	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
PÓLIZA DE GARANTÍA: No. 11- 44 - 101192082	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**		**VALOR ASEGURADO**	
	Cumplimiento del contrato	15/08/2023 – 30/10/2027		$9.187.658.502,16	
	Salarios y prestaciones sociales	15/08/2023 – 30/04/2030		$4.593.829.251.08	
	Estabilidad y calidad de la obra	08/11/2024 – 09/11/2029		$9.187.658.502,16	
PÓLIZA DE GARANTÍA: No. 11- 40 - 101049560	Predios labores y operaciones	15/08/2023 – 31/12/2026		$2.296.914.625,54	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC/TE ($ 27,029.500.000)				
ADICIÓN 1	$ 902.219.533,57				
ADICIÓN 2	$ 2.159.933.356,58				
ADICIÓN 3	$ 15.846.639.620,79				
REDUCCIONES	N/A				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($45.938.292.510,94).				
NO. CUENTA BANCARIA	68200001149	**TIPO DE CUENTA**			
ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia	AHORRO	X	CORRIENTE	
OBSERVACIÓN	N/A				

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA DESARROLLÓ ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND) EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DE ENERO 2026.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
1	Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.	El contratista ha cumplido con el objeto contractual incluyendo su anexo técnico y pliego de condiciones, realizando las actividades previstas en el modificatorio No. 4, cumpliendo la programación contractual.
2	Entregar el cronograma estimado de obra	El contratista presentó a la interventoría y al Municipio de Cota el cronograma actualizado con las actividades adicionales y pendientes por ejecutar en el plazo contractual definido en el modificatorio No. 4, con radicado de interventoría oficio CC0083/271-2022 del 11 de diciembre de 2025.
3	Colaborar con la entidad contratante en cualquier requerimiento que ella haga.	El contratista y la interventoría han atendido los diferentes requerimientos por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras públicas del Municipio de Cota con referente a la ejecución de la obra y seguimiento de la misma.
4	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el anexo técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a la entidad contratante.	Se han realizado las pruebas de calidad de los diferentes, materiales utilizados en la obra como toma de muestras para comprobar la resistencia del concretos de estructura, en los cuales además se verificó la correcta disposición del acero de refuerzo según diseños, al igual que se han verificado fichas técnicas de los diferentes materiales eléctrico y red contra incendios.
5	Dar a conocer a la entidad contratante cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Para el presente periodo no se presentó ninguna reclamación directa o indirecta que afecte el objeto del contrato.
6	Comunicarle a la entidad contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.	Desde el reinicio de obra No. 2 se han reportado al Juzgado Municipal de Cota las acciones tomadas en cumplimiento de la tutela No. 25214408900120 24-00220-00, la cual se encuentra en curso por el tema ambiental interpuesta por un colindante al proyecto, al igual que la interventoría ha solicitado modificación de cantidades de obra mediante oficio 181 y se ha solicitado prórroga al plazo contractual por 2 meses y 17 días, según oficio 180 motivado por la afectación del paro camionero y el fuerte régimen de lluvias acaecidos en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024 y conforme a esa solicito se obtiene prorroga número 2.
7	Elaborar, suscribir y presentar a la entidad contratante las respectivas actas parciales de obra. Estas actas parciales de obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.	El contratista presentó corte No. 18, la cual fue revisada y aprobada por la interventoría, de fecha de corte a 15 de diciembre de 2025 a 31 de enero de 2026.
8	Cumplir con los aportes a seguridad social en salud y pensión, conforme a las disposiciones legales vigentes	El contratista ha cumplido con los aportes a la seguridad social del personal vinculado al proyecto conforme a las disposiciones legales vigentes como se observa en la planilla aportada en el corte No. 18, la

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
		cual corresponde al periodo corte a 15 de diciembre de 2025 a 31 de enero de 2026.
9	Atender las observaciones del funcionario que ejerce control, supervisión y vigilancia del contrato.	Se han atendido las observaciones por parte de la Supervisión con respecto al cumplimiento del personal mínimo en obra y registro de actividades diarias y de avance de obra según cronograma.
10	Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.	Se ha llevado a cabo la estricta aplicación de la programación de manera diaria y semanal reportando los diferentes avances en los informes semanales, observándose cumplimiento a la programación. El contratista mantiene en obra materiales, equipos y personal conforme a sus obligaciones contractuales.
11	Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la información que le sea suministrada por motivo de la prestación de sus servicios.	El contratista ha mantenido para el presente periodo el conducto regular como la interventoría y la Secretaría de Obras públicas aplicando la reserva profesional.
12	Las demás que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinación con la dependencia encargada de ejercer el control y vigilancia del contrato.	Para cumplir este acápite la interventoría ha solicitado al contratista mantener permanente reuniones y/o comités para dinamizar la ejecución de las obras según la programación contractual y con participación de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Los diferentes comités de obra se llevan a cabo en oficina y en campo con asistencia de supervisor y los profesionales especializados de la SIOP, de obra e interventoría.

Obligación adicional	Evidencia de cumplimiento
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todas las actividades a los precios y condiciones señalados en la propuesta que hace parte del Contrato que se suscriba	El contratista ha presentado el corte No. 18 conforme al acta modificatoria No. 4, la cual se ha verificado y aprobado por la interventoría.
OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual	El contratista ha cumplido con la disposición de las maquinarias necesarias para la ejecución de las actividades en obra, realizando sus debido mantenimientos e inspecciones a las mismas.
PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA: debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta, Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, para la liquidación del contrato suscrito con la Entidad, se debe presentar	En verificación por parte de la interventoría, se ha evidenciado el soporte de los pagos del personal contratado por la Unión Temporal Cultura en Cota como contratista.

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
a la interventoría paz y salvo de cada una de las personas que intervinieron en la obra, firmado por las partes		
IV. PROFESIONALES A CARGO DEL PROYECTO: Cumplir con el personal solicitado en la convocatoria		El contratista ha cumplido con la vinculación mínima del personal solicitado en el pliego de condiciones y cual se ve reflejado en la planilla de aportes a seguridad social, permanencia en obras y visitas de los especialistas a obra.
Conservación DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA: Durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, el CONTRATISTA tendrá la obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de construcción, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y condición presente de la infraestructura pública a intervenir		El contratista ha velado por la conservación de la infraestructura en construcción del Complejo Cultural del Municipio de Cota utilizado los procedimientos adecuados y velando por la seguridad del recurso humano.
Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la ejecución del contrato		La Unión Temporal Cultura en Cota ha velado y respondido por los daños ocasionados en la ejecución del contrato, en este período no se han registrado daños a terceros.
Responder por la buena calidad de los elementos a suministrar y elementos utilizados en el objeto del presente Contrato		Para el presente corte No. 18 se presentan los certificados de calidad de los materiales utilizados en ejecución de la obra según aplica en cuanto a los ítems ejecutados.
En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.		La interventoría mantiene control permanente por las obligaciones y el cumplimiento de las responsabilidades civil y penal, por sus acciones y omisiones en la ejecución contractual.
Mantener y entregar al municipio, un registro fotográfico en medio físico y digital de los elementos a suministrar antes, durante la ejecución del recibo final del proyecto		En la ejecución del presente periodo se presentó el registro fotográfico del avance y realización de actividades a cobrar en el acta No. 18.

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
	Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar permanentemente las actividades realizadas frente a los recursos que financian el proyecto en forma discriminada	Se ha puesto mucho énfasis en el control y monitoreo de las actividades como parte importante para cumplir con las metas establecidas originalmente del proyecto del Centro Cultural de Cota. ✓ Inventario de materiales que se encuentran en la bodega. ✓ Control de entrega de materiales. ✓ Control de calidad con cada uno de los ingresos de los materiales (concretos, hierro de 60000 PSI, aceros y soldaduras.) ✓ Verificación del proceso de ensambles en obras según cálculos estructurales. ✓ Solicitud de hoja de vida del personal idóneo para el proceso de soldadura. (informe SST) ✓ Solitud de la afiliación del personal operativo (salud, pensión y ARL) (informe SST) ✓ Entrega de elementos de elementos de protección. SST ✓ Implementación de Matriz de riesgo. (informe SST) El eficaz manejo del control de materiales y recursos humanos, nos ha permitido a lo largo de la ejecución: ✓ La correcta y oportuna intervención del personal que labora en el proyecto. Adecuado rendimiento de trabajo. ✓ Calidad en el trabajo. ✓ Revisar si lo que se está haciendo es lo requerido. Confiabilidad de la información
	Presentar al supervisor del contrato, un informe periódico de ejecución, con los presupuestos, programación de las actividades t los avances de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el contrato. Al finalizar su ejecución igualmente, deberá presentar un informe que consolide todo lo relacionado con la gestión realizada durante la vigencia del contrato	El contratista presentó a la Interventoría informe técnico sobre las actividades ejecutadas en el periodo de corte del acta Nº 18 anexo a la cuenta.
	Mantener durante toda la ejecución del proyecto, el libro de actividades debidamente actualizado, así mismo entregar copia semanal del mismo al interventor al supervisor del Contrato, según corresponda.	Se ha realizado la verificación de la bitácora de obra la cual se encuentra anexa copia en los informes de obra del mes de diciembre de 2025 y enero del presente año 2026.
	Avisar oportunamente al Municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	En el presente periodo no se han presentado situaciones que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
	Permitir al Interventor o Supervisor el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad y demás documentación y en términos generales suministrar toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de la gestión	El contratista permitió el acceso a la obra y documentos solicitados por parte de la interventoría y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en colaboración del desarrollo de la obra.
	Dotar al personal asignado a la obra de elementos de seguridad industrial y adoptar los reglamentos a que haya Lugar para prevención de accidentes	El contratista desde área de seguridad en el trabajo ha supervisado que se cumpla con los elementos y seguir el reglamento para prevenir accidentes en la ejecución de la obra como lo muestra el informe de SST correspondiente.
	El contratista se obliga a constituir Garantía Única la cual deberá incluir como asegurado al Municipio de Cota, amparando los riesgos establecidos en los pliegos de condiciones t la cláusula respectiva del contrato.	El contratista luego de la modificatoria N°4, reinicio N°6 y prorroga N°4 actualizó las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil las cuales se adjuntan al informe técnico presentado por el contratista del corte No. 18.

No.	Obligación específica	Evidencia de cumplimiento
1	Tramitar las garantías exigidas en la fase III por el municipio y radicarlas en original ante la SIOP para su revisión y posterior aprobación.	El contratista radicó ante la entidad las pólizas de modificatoria N°4, reinicio N°6 , adición N°3 y prorroga N°4.
2	Una vez finalizada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría la fase I, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, el contratista, deberá presentar a la entidad, el cronograma detallado del plazo de ejecución de las obras de construcción y adecuación de la infraestructura física y componentes que se enmarcan en el presente proceso de contratación, dando cumplimiento al plazo establecido por la entidad	Se verificó y aprobó el respectivo cronograma de las actividades por ejecutar concomitante con la modificación No. 4, Adición N°3, reinicio N°6 y prórroga N°4 del plazo correspondiente. se mantiene control de avance con la programación aprobada actualizada en virtud del reinicio No.6 y la nueva fecha de terminación del contrato.
3	Dar estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional	Se ha hecho verificación y control del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y seguridad sanitaria en obra.
4	Revisar, junto con la interventoría, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los estudios técnicos y especificaciones de construcción establecidas en la FASE I-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE dentro de los ocho (8) días siguientes de la fecha del recibo de la fase I, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos	No aplica para el presente corte.

5	Garantizar y mantener durante la ejecución del contrato el personal propuesto, si llegase a realizarse algún cambio deberá ser informado oportunamente al supervisor e interventor, el cual verificara cada uno de los requisitos y experiencia solicitada del personal propuesto	La unión Temporal ha mantenido el personal propuesto y ha notificado los cambios realizados a lo largo de la ejecución del contrato.
6	Los cambios del personal mínimo exigido que el contratista deba realizar por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados deben ser presentados a la interventoría del proyecto, quien velara por que el personal a cambiar cuente con un perfil igual o superior al que se retira de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y la interventoría informara a la entidad la procedencia o no de la solicitud de cambio de personal para que sea o no aprobada	En el presente corte no se han presentado cambios de personal.
7	Mantener actualizada la programación de obra, gestión operativa demás acciones que se encuentren dentro de su objeto contractual, la cual debe ser reportada a la supervisión para efectos de seguimiento y control. 8. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se Llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato	La programación de obra actualizada quedó como soporte contractual modificatoria N°4, reinicio N°6, adición y prorroga de plazo correspondiente y se mantiene control de avance de actividades con la programación aprobada.
8	Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se Llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato	En el presente periodo no se han presentado eventos de contingencia en la ejecución del contrato.
9	El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue al municipio, son responsabilidad del constructor	No aplica para el presente periodo
10	Realizar la construcción del campamento de obra con un área mínima, cuya ubicación y dimensiones mínimas deberán contar con la aprobación de la Interventoría	No aplica para el presente periodo

11	Realizar el cerramiento provisional de la obra no de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos t terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra	El contratista mantiene el cerramiento en condiciones adecuadas y para el presente período y realiza el mantenimiento del campamento según programación del componente ambiental.
12	Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales los demás elementos ofertados en la propuesta y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de la ejecución de la obra en el tiempo estipulado	El contratista ha cumplido con la disposición de las maquinarias necesarias para la ejecución de las actividades en obra como lo son retroexcavadoras, minicargadores, elevadores, andamios y todo aquellos que sean necesarios para la perfecta ejecución de la obra.
13	Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato	Para el presente corte se presentan certificado de calidad de los diferentes materiales a utilizar en ejecución de la obra como calidad del hierro, concretos, materiales eléctricos y red contra incendios.
14	Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos (En perfectas condiciones) en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra	El contratista ha suministrado las maquinarias y herramientas oportunamente según la programación de obra para la ejecución de las actividades en la obra, adicionalmente se han suministrado en perfectas condiciones para salvaguardar la calidad de la obra y seguridad de los trabajadores en obra.
16	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra, presentando los respectivos informes a la interventoría y a la supervisión cuando esta lo requiera. En cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá presentar a la interventoría y a la supervisión cuando esta lo requiera los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos se encuentras debidamente calibrados y los mismos deben ser expedidos por Laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC	La Unión Temporal Cultura en Cota ha realizado las pruebas de los concretos, garantizando la calidad de los productos instalados, en laboratorios debidamente certificados, aplicados para el corte No. 18.

17	Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el municipio de Cota - Cundinamarca, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público	No aplica para el presente corte.
18	Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría	No aplica para el presenten corte.
19	Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras	No aplica para el presente corte
20	Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el municipio de Cota - Cundinamarca, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra	No aplica para el presente corte
21	Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo y viales que puedan ser afectadas a causa de la construcción, debido al tráfico pesado de maquinaria u otras actividades propias de la construcción, de manera que se garantice la entrega de los espacios de urbanismo y viales, como se encontraban al inicio de la obra.	No aplica para el presente corte.
22	Implementar como mínimo tres (3) frentes de trabajo (o los que se soliciten por parte de la interventoría o supervisión) en la ejecución de la FASE III del presente proceso	El contratista mantiene los siguientes frentes de trabajo los cuales se distribuyen de la siguiente manera para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales: • Estructura de soporte de ventanería e instalación ventanería y vidrios. • Instalación de redes eléctricas • Instalaciones hidráulicas y sanitarias • Instalación de red contraincendios
23	Siempre que, en opinión del interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses del municipio de Cota - Cundinamarca requieran de su uso, podrá tomarse posesión y hacer uso de dicha	N/A para el presente corte ni para el proyecto y/o contrato esta situación en específico.

	obra o parte de ella. El uso por parte del municipio de Cota - Cundinamarca de la obra o parte de ella, no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del municipio de Cota - Cundinamarca a ninguno de sus derechos	
24	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del municipio de Cota – Cundinamarca	La unión temporal cultura en cota lleva la memoria diaria de la obra (bitácora) con los registros día a día de lo acontecido en la obra, la cual se puede evidenciar en el sitio de la obra y se anexa en los informes de diciembre de 2025 y enero del presente año 2026.
25	Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución de la obra procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotográfico del estado inicial de los sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, asi como llevar una bitácora	En el informe técnico presentado por el contratista se evidencia el registro fotográfico del avance de la obra, estructura de soporte de ventanería e instalación ventanería y vidrios, Instalación de redes electricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalación de red contraincendios. Demás actividades del corte acta No. 18.
26	Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el municipio de Cota - Cundinamarca, los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al municipio de Cota - Cundinamarca con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético (Formato DWG)	No aplica para el presente periodo.
27	Ejecutar las obras diseñadas de la fase I con la calidad establecida en las especificaciones técnicas t en las áreas determinadas para la fase 1	Se aplican debidamente los diseños del proyecto en todos los frentes de obra.
28	Contar con una oficina en la zona urbana del municipio de Cota, que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra	El contratista cuenta con oficinas en el casco urbano del municipio de cota en dirección Cra 5 n 8-20 oficina 204

29	Brindar seguridad y vigilancia a los sitios que serán intervenidos hasta la entrega y recibo a satisfacción de las obras por parte del municipio	La Unión Temporal Cultura en Cota mantiene vigilancia en obra con el fin de salvaguardar la estructura, maquinaria y materiales dispuestos en obra.
30	Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual deberá contar con la aprobación de la interventoría	N/A para el presente corte.
31	Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación	Junto con el contratista se elaboró acta de corte No. 18 verificando en obra las cantidades ejecutadas y en oficina revisando la memoria de cantidades y soportes anexos del acta.
32	Evitar que sus empleados invadan o perjudiquen en cualquier forma zonas o monumentos que tengan interés arqueológico, histórico o turístico	N/A para el presente corte.
33	Presentar informes mensuales, o cuando la supervisión lo requiera, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener como mínimo: a). Componente técnico, b) Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), c). Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental PMA TIO Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), d). Seguimiento al plan de Gestión Social	Para el presente corte No. 18 el contratista anexa lo pertinente según aplica debidamente aprobado por la interventoría.
34	Presentar un informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y de acuerdo con la lista de chequeo suministrada por la alcaldía municipal de Cota	N/A para el presente corte.
35	Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), (Resolución 312 de 2019), incluyendo los lineamientos exigidos en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan	Se están aplicando en el desarrollo de las obras los diferentes planes y se reporta en el presente corte los avances en cada caso.
36	Elaborar, difundir, implementar y presentar a la Interventoría del contrato un reglamento interno de trabajo (Resolución 241311979 y	Se están aplicando en el desarrollo de las obras los diferentes planes y se reporta en el presente corte los avances en cada caso.

	Resolución 2013/86) y un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.	
37	Suministrar a sus trabajadores una serie de dotaciones para que estos puedan cumplir de manera segura y efectiva con su actividad o labor, de acuerdo con la circular 29 de 2020, el Ministerio del Trabajo, la cual recuerda la obligación que tienen los empleadores de suministrar a sus trabajadores los equipos de protección adecuados, con las condiciones de seguridad y eficiencia requeridos según la naturaleza del riesgo	Desde el área de SST se ha verificado que los trabajadores cuenten permanentemente con las dotaciones necesarias para la realización segura de los trabajos en obras y se controla permanentemente a diario lo que exige la norma.
38	Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin	Según la nueva normatividad vigente, la UNIÓN TEMPORAL CULUTRA EN COTA cuenta con un Reglamento de higiene y seguridad industrial el cual es implementado dentro del SG-SST, también cuenta con el COPASST, (Resolución 1508 de 2020) los soportes de conformación y reuniones se han adjuntado en los informes mensuales.
39	Elaborar formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas normas, constancia de capacitaciones	La UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA cumpliendo con la Resolución 0312 del 2019 implementa los indicadores de accidentalidad que establece la norma y cuenta con las fichas de dichos indicadores dentro de la implementación del SG-SST, al igual que los soportes de la implementación del programa de capacitaciones.
40	Afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato, a una entidad promotora de salud, pensiones y ARL de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de traba o (Decreto 1072 de 2015), aplicando en forma estricta los controles y obligaciones que le" competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales vigentes a la fecha de presentación de la propuesta durante la vigencia del contrato	La UNIÓN TEMPORAL CULUTRA EN COTA cumple con la normatividad en cuanto a afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social integral, tanto del personal directo como subcontratado y control de verificación también de los visitantes de obra, garantizando una cobertura del 100% del personal relacionado directa e indirectamente.
41	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración	La interventoría ha verificado el correcto cumplimiento por parte del contratista en el pago de los salarios de todo el personal de obra.

	y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el municipio de Cota - Cundinamarca	
42	Contar con los permisos y certificados para trabajo en alturas, del personal que estará en la ejecución de la obra, razón por la cual previo inicio de los trabajos las personas deberán presentar al supervisor el certificado de trabajo en alturas vigente, expedido por una escuela debidamente acreditada por el Ministerio de Trabajo	Dentro del SG-SST se aplican los procedimientos de trabajo para las diferentes actividades de alto riesgo como lo es el Trabajo en alturas, de igual manera dentro de los informes mensuales se entregan los soportes de los cursos correspondientes de los trabajadores autorizados para tal actividad con verificación de ministerio de trabajo.
43	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual	Dentro de la implementación del SG-SST se garantizan estas condiciones de seguridad industrial como lo es dentro del programa de mantenimiento, programa de inspecciones, matriz de EPP y todas las actividades que se implementan están encaminadas a la seguridad industrial dentro del proyecto.
44	Elaborar, implementar y presentar ala Interventoría y Supervisión del contrato la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Plan de Manejo Ambiental (PMA) TIO Programas de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato	No aplica en el presente periodo.
45	Entregar para iniciar la obra la certificación de una planta de RCD autorizada, con Resolución de aprobación en la CAR, donde se vayan a depositar los escombros y material sobrante de la obra, el cual deberá tener visto bueno del Interventor y/o supervisor para autorizar el movimiento de cualquier material, asimismo entregar las	Los permisos ambientales de la escombrera que presta el servicio al proyecto fueron entregados en el PMA Versión 2, sin embargo, para este periodo no fue requerido la entrega de material de excavación y/o demolición.

	áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza	
46	No utilizar fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta con la respectiva autorización de parte de la autoridad ambiental	El contratista ha cumplido con la no utilización de fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta con la respectiva autorización de parte de la autoridad ambiental.
47	Contar con un lugar en la obra para el lavado de llantas de los vehículos que ingresen a la obra y en el momento de retiro y circulación fuera de las áreas de la obra, así como garantizar la limpieza de las vías y andenes durante el desarrollo de la obra	La interventoría ha verificado la aplicación de este requisito para todos los vehículos y se mantiene sin afectación las áreas y espacios públicos de vías y andenes adyacentes al proyecto
48	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas (seres vivos en general), a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores	La interventoría ha verificado la aplicación de este requisito por parte de todo el personal del contratista que interviene en el proyecto
49	Realizar la fumigación y los controles respectivos y tomar las medidas pertinentes a que haya Lugar para el control de plagas en los inmuebles que serán intervenidos	No aplica en el presente periodo.
50	Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato el Plan de Gestión Social	No aplica al presente periodo.
51	El contratista deberá levantar las actas de vecindad (Inicial y final) con anterioridad al inicio t terminación de las labores propias del contrato, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso y zonas en general que no se intervendrán Estas actas deberán ser levantadas juntamente con la INTERVENTORIA t entregadas formalmente a la interventoría para su aprobación dentro de los primeros quince (15) días calendario de la etapa constructiva. Se requiere que las actas de vecindad sean diligenciadas por el profesional social y el residente de obra, con el fin de determinar daños preexistentes en los predios colindantes, igualmente se requerirá de este mismo personal para el cierre de las actas de vecindad al finalizar la obra	No aplica para el presente periodo
52	Efectuar una reunión de socialización con la comunidad vecina y beneficiaria del proyecto, la interventoría y representantes del municipio de Cota, en la cual presentará de forma general el proyecto a desarrollar.	Se realizó reunión con la comunidad el día 12 de noviembre del 2025 con el fin de informar de las actividades adicionales las cuales se presentaron a la entidad y fueron aprobadas el día 15 de diciembre del año 2025.

53	El contratista debe disponer dentro de su campamento de obra, de una oficina para la atención de la comunidad, con personal idóneo de impacto urbano que brinde respuesta oportuna y pertinente a las inquietudes de esta e informe periódicamente del avance del proyecto; la persona encargada debe ser designada por el contratista e informar de ello formalmente ala interventoría.	Dentro de la obra se cuenta con un espacio para atención a la comunidad en el cual se les brinda información oportuna a los requerimientos de la misma
54	Instalar una valla informativa (3.0 x 6.0 mts o según lineamientos de la supervisión) de acuerdo con la información y modelo que será suministrado por el Municipio de Cota. Los costos relacionados con el suministro e instalación de esta valla estarán a cargo del contratista dentro de los costos de la Administración en la elaboración de la propuesta económica. Esta debe ser instalada en un plazo no mayor a (15) quince días calendario a partir de la fecha de inicio de la obra y tramitar por medio del municipio de Cota — Cundinamarca previa aprobación de la interventoría, el permiso de publicación de esta ante la Oficina correspondiente cumpliendo con la Normatividad Legal Vigente.	Se mantiene valla informativa en el proyecto.
55	Tramitar, suministrar e implementar el PMT (Plan de Manejo de Tránsito) necesario, debidamente aprobado por parte de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Cota, para la ejecución y posterior cuidado de las obras y de los peatones y vehículos que circulan por el lugar, hasta la apertura.	La unión Temporal Cultura en cota cuenta con PMT actualizado para el ingreso de material a la obra. Según radicado CO-21566 emitido por la secretaria de tránsito, transporte y movilidad.
56	Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario	No aplica para el presente periodo
57	Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.	No aplica para el presente periodo
58	Entregar EL COMPLEJO CULTURAL al Municipio de Cota - Cundinamarca funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos.	No aplica para el presente periodo
59	Realizará a su costa, todos los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos provisionales t definitivos.	No aplica para el presente periodo

	Los derechos de conexión de los servicios públicos definitivos (contemplados dentro del proceso contractual) serán pagados por el municipio de Cota — Cundinamarca, previo informe del contratista y la aprobación de la interventoría.	
60	El contratista deberá solicitar a las entidades prestadoras de servicios públicos, (E.M.A.A.F. — E.S.P., Energía, Telecomunicaciones, aseo, etc.) la respectiva Interventoría para la revisión y recibo final de las obras que tengan que ver con dicho servicio público (Los derechos de conexión estarán a cargo del municipio de Cota-Cundinamarca).	No aplica para el presente periodo
61	En el evento en que los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos sean realizados por el municipio de Cota Cundinamarca, se le descontará al contratista el valor de los trámites, estimados en conjunto con la interventoría y los funcionarios del área de servicios públicos.	No aplica para el presente periodo
62	Hacer entrega de las obras contratadas según las especificaciones descritas en el "ANEXO — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FASE III", dentro del plazo máximo establecido del contrato. E) NOTA-El Contratista ejecutará las obligaciones particulares el contrato conforme a lo estipulado en el numeral 4.6.2. del pliego de condiciones.	No aplica para el presente periodo

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	x

Observaciones al desempeño:

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
SALUD	N/A	N/A	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
LA **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA** APORTA DOS (2) CERTIFICACIONES FIRMADAS POR LOS REVISORES FISCALES DE LOS MIEMBROS DE LA UT: LA PRIMERA EMITIDA A LOS12 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 Y LA SEGUNDA EMITIDA A LOS 28 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2026.			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X] NO [ ] NA [ ]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
ACTA PARCIAL DE OBRA No.1	2 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ 1.445.063.750,00
ACTA PARCIAL DE OBRA No.2	21 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 557.101.500,00
ACTA PARCIAL DE OBRA No.3	13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 10 DE FEBRERO 2023	$ 369.439.375,00
ACTA PARCIAL DE OBRA No.4	15 DE AGOSTO DE 2023 AL 28 DE AGOSTO 2023	$ 3.662.337.807,97
ACTA PARCIAL DE OBRA No.5	29 DE AGOSTO DE 2023 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023	$ 1.146.114.908,57
ACTA PARCIAL DE OBRA No.6	1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 24 DE NOVIEMBRE de 2023	$ 3.783.751.060,77
ACTA PARCIAL DE OBRA No.7	25 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023	$ 3.503.523.626,45
ACTA PARCIAL DE OBRA No.8	22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE MARZO DE 2024	$ 2.073.031.907,80
ACTA PARCIAL DE OBRA No.9	19 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 ---01 DE AGOSTO DE 2024 AL 16 DE AGOSTO DE 2024	$ 1.109.805.419,74
ACTA PARCIAL DE OBRA No.10	17 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 1.092.541.851,47
ACTA PARCIAL DE OBRA No.11	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 OCTUBRE DE 2024	$ 1.516.912.166,59
ACTA PARCIAL DE OBRA No.12	1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 16 DICIEMBRE de 2024	$ 1.567.623.413,28

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
ACTA PARCIAL DE OBRA No.13	17 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 10 FEBRERO DE 2025	$ 1.721.095.420,46
ACTA PARCIAL DE OBRA No.14	11 DE FEBRERO DE 2025 AL 11 MARZO DE 2025	$ 1.589.056.563,95
ACTA PARCIAL DE OBRA No.15	11 DE MARZO DE 2025 AL 15 ABRIL DE 2025	$ 1.198.000.288,28
ACTA PARCIAL DE OBRA No.16	13 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$ 747.123.883,62
ACTA PARCIAL DE OBRA No.17	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1.008.188.347,40
ACTA PARCIAL DE OBRA No.18	15 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DE ENERO 2026	$ 1.087.515.310,44
TOTAL		**$ 29.178.226.601,79**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas PREFACTURA No.18

Fechas DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DE ENERO 2026

Concepto: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA

Valor **$1.087.515.310,44** **Notas Crédito** **Notas Débito**

Valor Total MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (**$1.087.515.310,44**)

Saldo por Pagar DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 16.760.065.909,15) MC/TE.

OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO HACER EL PAGO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA POR UN VALOR DE MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.087.515.310,44).

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Los documentos que soportan la debida ejecución del contrato son los siguientes:

Prefactura No.18
Aval e informe parcial de obra
Informe de verificación de acta de corte No.18 incluido memorias , cantidades
Planillas de seguridad social
Certificado de la junta de contadores persona jurídica No 01
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal No 01
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal y/o Contador No 01
Certificado de la junta de contadores persona jurídica No 02
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal No 02
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal y/o Contador No 02
Certificación Bancaria

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL
	63,52 %

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del Contrato	$ 27.029.500.000	58,84%
Valor Adicionales 01	$ 902.219.533,57	1,96%
Valor Adicionales 02	$ 2.159.933.356,58	4,70%
Valor Adicionales 03	$ 15.846.639.620,79	34,50%
Reducciones	$ 0	0,00%
Valor Total del Contrato	**$ 45.938.292.510,94**	**100,00%**
Valor Pagado	**$ 28.090.711.291,35**	**61,15%**
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.087.515.310,44	2,37%
Valor total Ejecutado	$ 29.178.226.601,79	63,52%
Valor saldo por Ejecutar	$ 16.760.065.909,15	36,48%
Estado del contrato a	En Ejecución	

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARQ. AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. NIDIA MARCELA HERNÁNDEZ AMÓRTEGUI APOYO TÉCNICO ING. LUIS HERNÁN CASTELLANOS APOYO TÉCNICO ING. NIDYA ALEXANDRA SABOGAL APOYO TÉCNICO ING. JUAN DAVID RODRIGUEZ APOYO TÉCNICO LILIANA AVILA APOYO SGSST CINTHIA ESTEFANIA RODRIGUEZ ARANGO APOYO JURÍDICO

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
N/A	N/A	N/A

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.

Anexos ( ) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

Archívese en:	

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

Cota, 04 de febrero de 2026

Oficio: CC0083/286-2022

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA
Arq. AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
obras@alcaldiacota.gov.co
Cota-Cundinamarca

ALCALDIA DE COTA
4/02/2026 4:59:36 P. M.
RADICADO: CO-1804
OBRAS PUBLICAS

C.C UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
Atn: JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SIOP-0083-2022 Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA."

ASUNTO: REMISIÓN VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA DE CORTE No.18 CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082- 2022

Respetados señores cordial saludo

Una vez adelantada la respectiva revisión y verificación de actividades ejecutadas correspondiente al acta de corte No.18 que comprende el periodo del 15 de diciembre de 2025 a 31 de enero de 2026 del contrato relacionado en el asunto, nos permitimos remitir a la supervisión el informe de aval, con el acta correspondiente y sus respectivos anexos para el trámite pertinente por parte del municipio de Cota.

Quedamos atentos a su amable respuesta. Sin otro particular me suscribo.

Cordialmente.

Folios 247

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
INTERVENTORÍA


Calle 109 #14B-60 Oficina 204
E: mail: complejoculturalcota@gmail.com
Cota-Cundinamarca

001

AVAL E INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA No. 18- FASE III
PERIODO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026





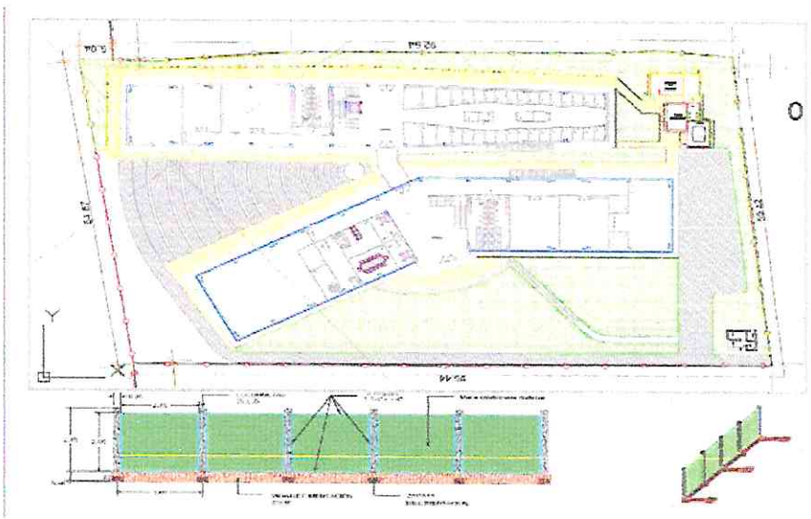

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SIOP-0083-2022CONTRATO DE OBRA SIOP-0082-2022
COTA, CUNDINAMARCA

31 DE ENERO DE 2026

No. de folios _____

0000002



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3
3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
4. INFORME FINANCIERO 8
4.1 AVANCE ACUMULADO 8
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 9
5.1 ESTADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE ACTIVIDADES DE OBRA 9
- Acta de corte 17 – CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS Y AVANCE DEL CONTRATO 9

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO 58

1. INTRODUCCIÓN

El contrato de interventoría No. SIOP 0083 de 2022, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA"**, fue firmado el 13 de julio de 2023 entre el **MUNICIPIO DE COTA** a través de la **Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas representada** por Luis Fernando Díaz Orjuela en el cargo de secretario de Infraestructura yObras Públicas y la Unión Temporal Intercultural.

El presente informe pretende comunicar a la parte contratante, el estado de ejecución del contrato de obra, sirviendo como soporte y aval para el trámite correspondiente del acta parcial No. 18, razón por la cual relacionamos la información de avance para el período comprendidoentre el 15 diciembre de 2025 a 31 de enero de 2026.

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SIOP-0083-2022	
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓNDE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA
Valor del contrato:	DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.661.437.888,00) M/CTE
Valor adicional No.1:	SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE ($628.133.106,00)
Valor adicional No.2:	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($242.575.981,00)
Valor adicional No.3:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($496.933.991,00)
Valor adicional No.4:	MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (1.813.124.452)
Valor actualizado:	CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($5.842.205.418)
No. RP y fecha:	2022001424 del 21 de Julio de 2022 CONTRATO INICIAL
No CDP y fecha:	2022000788 del 13 de mayo de 2022 y 2024000964 CONTRATO ADICIONAL
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
NIT	901.611.855-0
Fecha del contrato	13 de julio de 2022
Correo electrónico:	complejoculturalcota@gmail.com

Tabla 1. Información contrato de interventoría

NOVEDADES, EJECUCION Y SITUACION ACTUAL DEL CONTRATO SIOP-0082-2022 SEGUN SUS FASES	
FASE I	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y DE LA FASE I:	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE DICIEMBRE 2023
SUSPENSIÓN N°.1:	12 DE OCTUBRE DE 2022 (45 DÍAS)
REINICIO N°.1:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1 FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (160 DIAS CALENDARIO)
FECHA DE SUSPENSIÓN N°.2:	03 DE ABRIL DE 2023 (03 MESES)
FECHA DE REINICIO N° 2:	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 2 FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS:	15 DE AGOSTO DE 2023 (1 MES A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2023)
FECHA DE TERMINACION [FASE I	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FASE II – LICENCIAMIENTO	
FECHA DE INICIO FASE II:	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION DE LA FASE II:	8 DE NOVIEMBRE DE 2023

FASE III – OBRA	
FECHA DE INICIO DE LA FASE III:	15 DE AGOSTO DE 2023
ACTA MODIFICATORIA No.1:	3 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y DE LA FASE III:	11 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSION No 3 FASE iii	3 DE ABRIL DE 2024
REINICIO No 3 FASE III	31 DE MAYO DE 2024
SUSPENSION No 4 FASE III	31 DE MAYO DE 2024
REINICIO No 4 FASE III	01 DE AGOSTO DE 2024
SUSPENSION No 5 FASE III	13 DE MAYO DE 2025
REINICIO No 5 FASE III	13 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE MODIFICATORIO No.2 Y PRÓRROGA No. 1	10 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA No.2	27 DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSION No 6 FASE III	17 DE OCTUBRE DE 2025
REINICIO No 6 FASE III	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN	17 DE OCTUBRE DE 2025
MODIFICATORIO NO. 4, ADICIÓN NO. 3, PRÓRROGA NO. 4	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026

Tabla 2. *Tiempo de ejecución actual del contrato de interventoría*

SUPERVISIÓN	
Nombre supervisor:	**AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO**
Correo electrónico:	**obras@alcaldiacota.gov.co**

Tabla 3. *Información contrato apoyo a la supervisión*

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.)
PLAZO INICIAL	DIECISEIS (16) MESES

VALOR INICIAL	VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029'500.000.00) M/CTE
VALOR ADICION N°1	NOVECIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($902.219.533,57) M/CTE.
VALOR ADICION No 2	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.159.933.356.58) M/CTE
VALOR ADICION No 3	QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($15.846.639.620,79) M/CTE.
VALOR TOTAL	CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 45.938.292.510,94) M/CTE

CONSTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA NIT 901.590.186-1 RL. JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA CC No 1.118.844.495
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERCULTURAL NIT 901.611.855-0 RL CANDELARIA MENDOZA C.C No. 1.104.011.113
SUPERVISION	AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE COTA- CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO:	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE INICIO FASE I:	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO 1:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1 FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (160 DIAS CALENDARIO)
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	03 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE REINICIO 2:	30 DE JUNIO DE 2023
RESOLUCION No. 900.49.694 LICENCIA DE PARCELACION Y CONSTRUCCION MODALIDAD OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO	30 DE JUNIO DE 2023
OTROSI 1 DEFINICION DE PRESUPUESTO FASE III OBRA	15 DE AGOSTO DE 2023

ADICION 1 Y PRORROGA 2 FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS (1 MES):	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE I:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO FASE II:	30 DE JUNIO DE 2023
SUSPENSION 3 FASE II:	17 DE JULIO DE 2023
PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSION 3 FASE II:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
REINICIO 1 FASE II:	27 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION DE LA FASE II:	8 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE LA FASE III:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO Y DE LA FASE III:	11 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSION No 3	03 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 3	31 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4	31 DE MAYO DE 2024
REINICIO No 4	01 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE MODIFICATORIO No. 2 y PRORROGA No. 1	09 DE AGOSTO DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 1	4 MESES Y 22 DIAS
PRORROGA Nº 2	27 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 2	2 MESES Y 17 DIAS
MODIFICATORIO No3 ADICCION No2 Y PRORROGA No 3	17 DE MARZO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 3	4 MESES
VALOR ADICION No. 2	$2.159.933.356.58
SUSPENSIÓN 5	13 DE MAYO DE 2025
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 5	12 DE JUNIO DE 2025
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 5	11 DE JULIO DE 2025
REINICIO No. 5	13 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACION POR REINICIO 5:	17 DE OCTUBRE DE 2025

SUSPENSIÓN 6	17 DE OCTUBRE DE 2025
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 6	31 DE OCTUBRE DE 2025
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 6	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 6	29 DE NOVIEMBRE DE 2025
AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 6	10 DE DICIEMBRE DE 2025(4 DIAS)
REINICIO N°6	15 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICATORIO No4 ADICCION No3 Y PRORROGA No 4	15 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 4	12 MESES Y 17 DIAS
VALOR ADICION No. 3	$ 15.846.639.620,79
FECHA ACTUALIZADA POR PRORROGA No. 4	31 DE DICIEMBRE DE 2026

Tabla 4. *Información contrato de obra*

4. INFORME FINANCIERO

4.1 AVANCE ACUMULADO

4.1.1 Avance financiero contrato de obra

ACTA PARCIAL	FECHA DE ACTA PARCIAL	VALOR PARCIAL	% AVANCE
VALOR INICIAL		$27.029.500.000,00	
VALOR FASE 1 INICIAL		$2.615.500.000,00	
VALOR ADICION 1 FASE 1		$902.219.533,57	
VALOR ACTUALIZADO FASE1		$3.517.719.533,57	
VALOR FASE 3		$24.414.000.000,00	
VALOR ADICION 1 FASE 3		$2.159.933.356.58	
VALOR ADICION 2 FASE 3		$15.846.639.620,79	
VALOR ACTUALIZADO		$ 45.938.292.510,94	
VALOR ANTICIPO		N/A	N/A
ACTA PARCIAL N° 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	02/08/2022 A 20/09/2022	$ 1.445.063.750,00	5,17%
ACTA PARCIAL N° 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	21/09/2022 A 12/12/2022	$ 557.101.500,00	7,17%
ACTA PARCIAL N° 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	13/12/2022 A 10/02/2023	$ 369.439.375,00	8,49%
ACTA PARCIAL N° 4 - OBRA	15/08/2023 A 28/08/2023	$ 3.662.337.807,97	21,60%
ACTA PARCIAL N° 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	29/08/2023 A 30/09/2023	$ 1.146.114.908,57	25,71%
ACTA PARCIAL N° 6 - OBRA	1/10/2023 A 24/11/2023	$ 3.783.751.060,77	39,25%
ACTA PARCIAL N° 7 - OBRA	25/11/2023 A 21/12/2023	$ 3.503.523.626,45	51,80%
ACTA PARCIAL N° 8 - OBRA	22/12/2023 A 18/03/2024	$ 2.073.031.907,80	59,22%
ACTA PARCIAL N° 9- OBRA	19/03/2024 A 31/03/2024 - 01/08/2024 A 16/08/2024	$ 1.109.805.419,74	63,19%
ACTA PARCIAL N° 10- OBRA	17/08/2024 A 30/09/2024	$ 1.092.541.851,47	67,10%
ACTA PARCIAL N° 11- OBRA	30/09/2024 A 30/10/2025	$ 1.516.912.166,59	72,53%
ACTA PARCIAL N° 12- OBRA	1/11/2024 A 16/12/2024	$ 1.567.623.413,28	78,15%
ACTA PARCIAL N° 13- OBRA	17/12/2024 A 10/02/2025	$ 1.721.095.420,46	84,31%
ACTA PARCIAL N° 14- OBRA	11/02/2025 A 11/03/2025	$ 1.589.056.563,95	83,54%
ACTA DE OBRA N° 15- OBRA	11/03/2025 A 15/04/2025	$ 1.198.000.288,28	87,52%
ACTA DE OBRA N° 16 - OBRA	13/08/2025 A 31/08/2025	$ 747.123.883,62	90,00%
ADICION PRESUPUESTAL	15/12/2025	**$15.846.639.620,79**	
ACTA DE OBRA N° 17 - OBRA	01/09/2025 A 17/10/2025	$ 1.008.188.347,40	61,15%
ACTA DE OBRA N° 18 - OBRA	15/12/2025 A 31/01/2026	$ 1.087.515.310,44	63,52%
VALOR ACUMULADO PAGADO (HASTA ACTA N°17)		**$ 28.090.711.291,35**	
VALOR ACUMULADO EJECUTADO		**$ 29.178.226.601,79**	
% OBRA ACUMULADO EJECUTADO		**63,52%**	
% OBRA PAGADO		**61,15%**	
% OBRA EN TRÁMITE POR PAGAR		**2,37%**	

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE CORTE 18: 15 DE DICIEMBRE DE 2025 A 31 DE ENERO DE 2026.

PRESENTE ACTA	
% DE CORTE EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
2,37%	$ 1.087.515.310,44

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto se compone de 3 fases:

FASE I: Elaboración de estudios y diseños (duración 3 meses), ejecutado 100%

FASE II: Licenciamiento (duración 1 mes), ejecutado 100%.

FASE III: Construcción (duración inicial 12 meses), en ejecución.

El contrato de obra Pública: **No SIOP-0082-2022** que tiene por objeto la "**ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA**", es ejecutado por la **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA**, de acuerdo con el pliego de condiciones y la oferta presentada.

5.1 ESTADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE ACTIVIDADES DE OBRA

A corte de 31 de enero de 2026 se tiene un avance 63,52% del proyecto total incluyendo el presupuesto adicional y se encuentra en la Fase III de ejecución de la obra, actividades que se relacionan a continuación, cabe mencionar que estas cantidades fueron revisadas y avaladas por la interventoría durante el proceso constructivo en obra:

- **Acta de corte 17 – CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS Y AVANCE DEL CONTRATO**

ACTA No.17 Contrato de obra pública No. SIOP-0082-2022		Fecha de presentación acta de cuenta No. 18 31 de enero de 2026
VALOR INICIAL FASE I:	$ 2.615.500.000,00	contratista: UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
VALOR ADICIÓN No. I FASE I:	$902.219.533.,57	
VALOR TOTAL FASE I:	3.517.719.533,57	Interventor: UNION TEMPORAL INTERCULTURAL
VALOR FASE III INICIAL:	$ 24,414,000,000.00	
VALOR ADICIÓN No. 2 FASE III:	$2,159,933,356.58	OBJETO DE CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND)
VALOR ADICIÓN No. 3 FASE III:	$ 15.846.639.620,79	
VALOR TOTAL FASE III:	$ 42.420.572.977,37	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 45.938.292.510,94	
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026	

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022						Interventoría: UNIÓN TEMPORAL INTER-CULTURAL		
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL		

8RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA No 18

BLOQUE No. 2 MUSICA						
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	UN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18	
			CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
129	TUBERÍA PVC-C900 4"	ML	204,00	$ 23.557.104,00	62,07	$ 7.167.595,32
NP73	RESTRICTOR HD SERIE 1200 C900 4"	UND	10,00	$ 14.541.683,46	10,00	$ 14.541.683,46
NP74	ESTACION DE CONTROL DE ROCIADORES DE 2"	UND	2,00	$ 9.559.825,21	2,00	$ 9.559.825,21
NP75	KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN C-900 - A/C completa	UND	1,00	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33
NP76	SOPORTE ANTISISMICO 2'	UND	4,00	$ 832.494,80	4,00	$ 832.494,80
NP77	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2'	UND	7,00	$ 1.512.844,89	7,00	$ 1.512.844,89
NP78	SOPORTE ANTISISMICO 3'	UND	7,00	$ 1.700.269,89	7,00	$ 1.700.269,89
	SUB TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					**$ 38.803.276,91**
BLOQUE No. 3 TEATRO						
	CARPINTERIA METALICA ALUMINIO	**UN**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**	
			CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
260	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 EN CIRCULACIONES	M2	508,96	$ 773.879.342,18	24,57	$ 37.359.105,15
	SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO					**$ 37.359.105,15**
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**UN**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**	
			CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
	RED CONTRA INCENDIOS RCI					
277	ACCESORIOS PVC-C900 4"	un	6,00	$ 4.440.390,00	6,00	$ 4.440.390,00
278	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 4" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	35,30	$ 6.929.248,80	9,00	$ 1.766.664,00
279	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 1/2" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	41,25	$ 4.650.071,25	41,25	$ 4.650.071,25
280	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 " (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	22,10	$ 1.933.816,30	22,10	$ 1.933.816,30
281	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 1 1/ 2 " (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	34,40	$ 2.048.554,40	34,40	$ 2.048.554,40
NP80	RESTRICTOR HD SERIE 1200 C900 4"	UND	10,00	$ 14.541.683,46	10,00	$ 14.541.683,46
NP81	ESTACION DE CONTROL DE ROCIADORES DE 2"	UND	2,00	$ 9.559.825,21	2,00	$ 9.559.825,21
NP82	KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN C-900 - A/C completa	UND	1,00	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33
NP83	SOPORTE ANTISISMICO 2'	UND	4,00	$ 832.494,80	4,00	$ 832.494,80
NP84	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2'	UND	7,00	$ 1.512.844,89	7,00	$ 1.512.844,89
NP85	SOPORTE ANTISISMICO 3'	UND	7,00	$ 1.700.269,89	7,00	$ 1.700.269,89
	RED CONTRA INCENDIOS					
NP61	PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2"	ML	108,00	$ 10.136.988,00	108,00	$ 10.136.988,00
NP62	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO 1"SCH'40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	UND	194,00	$ 10.942.376,00	194,00	$ 10.942.376,00
NP64	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO DE HASTA 2"	ML	248,10	$ 1.403.997,90	248,10	$ 1.403.997,90
NP65	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO MAYOR A 2"	UND	106,40	$ 940.788,80	106,40	$ 940.788,80
NP66	VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1"	UND	1,00	$ 421.954,00	1,00	$ 421.954,00
NP67	GABINETE TIPO III	UND	4,00	$ 5.567.844,00	4,00	$ 5.567.844,00
NP69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES TUBERIA 3/4	ML	2.674,40	$ 218.932.062,39	2674,40	$ 218.932.062,39
NP72	EXCAVACION MANUAL	M3	152,80	$ 9.437.080,80	24,83	$ 1.533.402,11
	SUB TOTAL - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					**$ 296.354.590,73**
	COSTO DIRECTO DE OBRA					$ 372.516.972,79
	Administrativos	18%				$ 67.053.055,10
	Imprevistos	2%				$ 7.450.339,46
	Utilidad	10%				$ 37.251.697,28
	VALOR TOTAL FASE I y III					**$ 484.272.064,63**

ADICION Nº3						
No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18	
9,00	ELECTRICO	UND	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
NP-E01	SALIDA DE ILUMINACION, CONTROL Y TOMAS CORRIENTE	UND	972,00	$ 72.602.936,39	972,00	$ 72.602.936,39
NP-E18	Organizador doble tapa, incluye herraje plano 48 puertos UTP 6	UND	4,00	$ 6.768.751,08	4,00	$ 6.768.751,08
NP-E20	Suministro, instalación bandeja porta cables - DUCTO CERRADO CON DIVISION, accesorios de 40*20	UND	996,60	$ 278.930.757,98	996,60	$ 278.930.757,98
NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES TUBERIA 3/4	ML	1.150,00	$ 94.141.300,00	1150,00	$ 94.141.300,00
	SUB TOTAL ELECTRICO					$ 452.443.745,45
	COSTO DIRECTO DE OBRA					$ 452.443.745,45
	Administrativos	21,33%				$ 96.506.250,90
	Imprevistos	2%				$ 9.048.874,91
	Utilidad	10%				$ 45.244.374,55
	TOTAL ADICION Nº3 FASE III					$ 603.243.245,81
	VALOR TOTAL FASE I y III	VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4 y ADICION Nº4		$ 45.938.292.510,94		$ 1.087.515.310,44
	PORCENTAJE EJECUTADO %			100%		2,37%

Como consecuencia del Modificatorio No. 4, el contrato quedó estructurado con dos (2) componentes de AIU claramente diferenciados, a saber:

- **AIU del treinta por ciento (30%)**, correspondiente a los componentes contractuales originalmente pactados, así como a las actividades ejecutadas y/o en ejecución con anterioridad a la Adición No. 3. Dicho porcentaje se mantiene vigente y exigible, en la medida en que no fue derogado ni absorbido por las modificaciones contractuales posteriores.
- **AIU del treinta y tres coma treinta y tres por ciento (33,33%)**, aplicable de manera exclusiva a las nuevas actividades incorporadas mediante la Adición No. 3, el cual fue técnicamente calculado con el propósito de absorber el incremento en la carga tributaria y restablecer la ecuación económica del contrato, conforme a lo debidamente justificado y aprobado en el marco del Modificatorio No. 4.

Una vez verificados los pagos efectuados hasta la presente acta y los valores efectivamente reconocidos a la fecha, se evidencia que el AIU correspondiente al treinta por ciento (30%) no ha sido completamente amortizado, razón por la cual subsiste un saldo pendiente por cobrar, el cual asciende a la suma de: **MIL QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/C. ($ 1.516.669.592,37)**


	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									Interventoría: UNIÓN TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL		

RESUMEN DE CORTES

ACTA PARCIAL	PERIODO	VALOR PARCIAL	VALOR ACUMULADO	SALDO	% AVANCE
ACTA PARCIAL N° 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS	2 de agosto a 20 de septiembre de 2022	1,445,063,750.00	1,445,063,750.00	28,646,589,140.15	4.80%
ACTA PARCIAL N° 2- ESTUDIOS Y DISEÑOS	21 de septiembre a 12 de diciembre	557,101,500.00	2,002,165,250.00	28,089,487,640.15	6.65%
ACTA PARCIAL N° 3- ESTUDIOS Y DISEÑOS	13 de diciembre de 2022 a 10 de febrero 2023	369,439,375.00	2,371,604,625.00	27,720,048,265.15	7.88%
ACTA PARCIAL N° 4-OBRAS	15 de agosto a 28 de agosto 2023	3,662,337,807.97	6,033,942,432.97	24,057,710,457.18	20.05%
ACTA PARCIAL N° 5- ESTUDIOS Y DISEÑOS	29 de Agosto al 30 septiembre	1,146,114,908.57	7,180,057,341.54	22,911,595,548.61	23.86%
ACTA PARCIAL N° 6 OBRA	1 de octubre al 24 de noviembre de 2023	3,783,751,060.77	10,963,808,402.31	19,127,844,487.84	36.43%
ACTA PARCIAL N° 7 OBRA	25 de noviembre al 21 de diciembre de 2023	3,503,523,626.45	14,467,332,028.76	15,624,320,861.39	48.08%
ACTA PARCIAL N° 8 OBRA	22 de diciembre de 2023 al 18 de marzo de 2024	2,073,031,907.80	16,540,363,936.56	13,551,288,953.59	54.97%
ACTA PARCIAL N° 9 OBRA	19 de marzo a 31 de marzo de 2024 -01 de agosto a 16 de agosto de 2024	1,109,805,419.74	17,650,169,356.30	12,441,483,533.86	58.65%
ACTA PARCIAL N° 10 OBRA	17 de agosto a 30 de septiembre	1,092,541,851.47	18,742,711,207.76	11,348,941,682.39	62.29%
ACTA PARCIAL N° 11 OBRA	30 de septiembre al 30 octubre de 2024	1,516,912,166.59	20,259,623,374.35	9,832,029,515.80	67.33%

N° 10 OBRA	de septiembre				
ACTA PARCIAL N° 11 OBRA	30 de septiembre al 30 octubre de 2024	1,516,912,166.59	20,259,623,374.35	9,832,029,515.80	67.33%
ACTA PARCIAL N° 12 OBRA	1 de noviembre al 16 diciembre de 2024	1,567,623,413.28	21,827,246,787.63	8,264,406,102.52	72.54%
ACTA PARCIAL N° 13 OBRA	17 de diciembre al 10 febrero de 2025	1,721,095,420.46	23,548,342,208.10	6,543,310,682.06	78.26%
ACTA PARCIAL N° 14 OBRA	11 de febrero al 10 marzo de 2025	1,589,056,563.95	25,137,398,77..2.05	4,954,254,118.10	83.54%
ACTA PARCIAL N° 15 OBRA	11 de marzo al 15 de abril de 2025	1,198,000.288.28	26,335,399,060.33	3,756,253,829.82	87.52%
ACTA PARCIAL Nº 16 OBRA	13 de agosto al 31 de agosto 2025	747,123,883.62	27,082,522,943.95	3,009,129,946.20	90.00%
ADICION PRESUPUESTAL			**$ 15.846.639.620,79**		
ACTA PARCIAL Nº 17 OBRA	01 de septiembre al 17 de octubre 2025	$1,008,188,347.40	$28,090,711,291.35	$17,847,581,219.59	61.15%
ACTA PARCIAL Nº 18 OBRA	15 de diciembre de 2025 a 31 de enero 2026	$ 1.087.515.310,44	$ 29.178.226.601,79	$ 16.760.065.909,15	63.52%

AVANCE DE EJECUCION DE OBRA

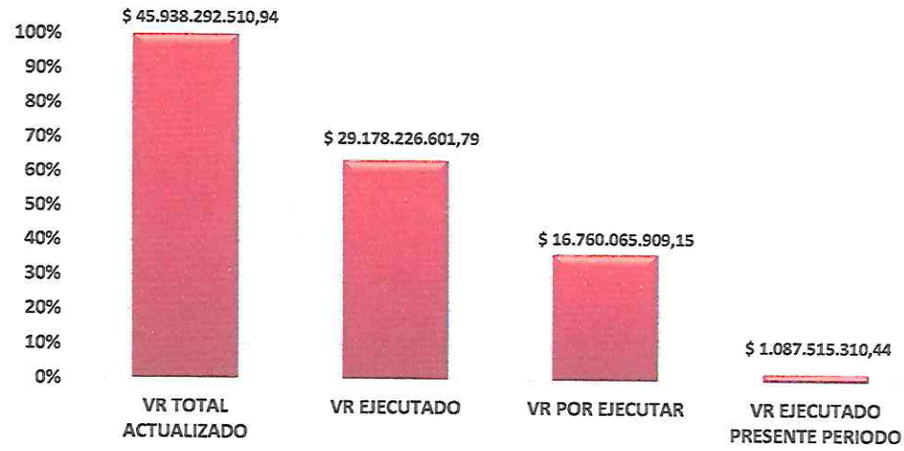

Teniendo en cuenta el Acta Parcial No.18, correspondiente a la ejecución de la Fase III presentado para el periodo comprendido entre 15 diciembre de 2025 a 31 de enero de 2026 por el contratista de obra, la Unión Temporal INTERCULTURAL en calidad de interventoría avala las cantidades presentadas, así como la documentación que soporta el corte facturado, luego de realizar el respectivo control y seguimiento a la ejecución de las actividades en obra tendientes al cumplimiento del objeto contractual.

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

DESCRIPCION		VALOR UNITARIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
A	FASE I- ESTUDIO Y DISEÑOS TÉCNICOS										
No.	DETALLE	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	UND	$ 549.474.789,92	1,00	$ 549.474.789,92			1,00	$ 549.474.789,92	0,00	$ 0,00
2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO	UND	$ 549.474.789,92	1,00	$ 549.474.789,92			1,00	$ 549.474.789,92	0,00	$ 0,00
3	DISEÑO DE AREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	UND	$ 175.831.932,77	1,00	$ 175.831.932,77			1,00	$ 175.831.932,77	0,00	$ 0,00
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND	$ 21.978.991,60	1,00	$ 21.978.991,60			1,00	$ 21.978.991,60	0,00	$ 0,00
5	ESTUDIO DE SUELOS	UND	$ 109.894.957,98	1,00	$ 109.894.957,98			1,00	$ 109.894.957,98	0,00	$ 0,00
6	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE	UND	$ 21.978.991,60	1,00	$ 21.978.991,60			1,00	$ 21.978.991,60	0,00	$ 0,00
7	DISEÑO ESTRUCTURALES	UND	$ 219.789.915,97	1,00	$ 219.789.915,97			1,00	$ 219.789.915,97	0,00	$ 0,00
8	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS	UND	$ 131.873.949,58	1,00	$ 131.873.949,58			1,00	$ 131.873.949,58	0,00	$ 0,00
9	ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	$ 131.873.949,58	1,00	$ 131.873.949,58			1,00	$ 131.873.949,58	0,00	$ 0,00
10	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	UND	$ 43.957.983,19	1,00	$ 43.957.983,19			1,00	$ 43.957.983,19	0,00	$ 0,00
11	DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES	UND	$ 65.936.974,79	1,00	$ 65.936.974,79			1,00	$ 65.936.974,79	0,00	$ 0,00
12	PRESUPUESTO DE OBRA	UND	$ 65.936.974,79	1,00	$ 65.936.974,79			1,00	$ 65.936.974,79	0,00	$ 0,00
13	PROGRAMACION DE OBRA	UND	$ 43.957.983,19	1,00	$ 43.957.983,19			1,00	$ 43.957.983,19	0,00	$ 0,00
14	ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO	UND	$ 21.978.991,60	1,00	$ 21.978.991,60			1,00	$ 21.978.991,60	0,00	$ 0,00
15	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	UND	$ 10.989.495,80	1,00	$ 10.989.495,80			1,00	$ 10.989.495,80	0,00	$ 0,00
16	COORDINACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	GLOBAL	$ 32.968.487,39	1,00	$ 32.968.487,39			1,00	$ 32.968.487,39	0,00	$ 0,00
17	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	M2	$ 67.602,71	2.538,61	$ 171.616.904,09			2538,61	$ 171.616.904,09	0,00	$ 0,00
18	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO			-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	DISEÑO DE AREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	M2	$ 18.195,21	10.841,03	$ 197.254.808,14			10841,03	$ 197.254.808,14	0,00	$ 0,00
20	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	M2	$ 529,61	9.227,63	$ 4.887.014,91			9227,63	$ 4.887.014,91	0,00	$ 0,00
21	ESTUDIO DE SUELOS	M2	$ 8.997,46	2.538,61	$ 22.841.038,09			2538,61	$ 22.841.038,09	0,00	$ 0,00
22	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE			-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23	DISEÑO ESTRUCTURALES	M2	$ 27.041,08	2.538,61	$ 68.646.761,64			2538,61	$ 68.646.761,64	0,00	$ 0,00
24	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS			-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25	ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	M2	$ 10.796,95	2.538,61	$ 27.409.245,71			2538,61	$ 27.409.245,71	0,00	$ 0,00
26	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	M2	$ 5.408,22	2.538,61	$ 13.729.352,33			2538,61	$ 13.729.352,33	0,00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
	FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL		

27	DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES	M2	$ 16.137,29	4.031,17	$ 65.052.167,07			4031,17	$ 65.052.167,07	0,00	$ 0,00
28	PRESUPUESTO DE OBRA	M2	$ 5.398,48	15.964,37	$ 86.183.253,83			15964,37	$ 86.183.253,83	0,00	$ 0,00
29	PROGRAMACION DE OBRA	M2	$ 3.598,98	15.964,37	$ 57.455.502,55			15964,37	$ 57.455.502,55	0,00	$ 0,00
30	ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO			-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
31	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	-	$ 0,00	-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
32	COORDINACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	M2	$ 2.699,24	15.964,37	$ 43.091.626,91			15964,37	$ 43.091.626,91	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL FASE I- ESTUDIOS Y DISEÑO				**$ 2.956.066.834,93**				**2.956.066.834,93**		**$ 0,00**
	IVA				$ 561.652.698,64				561.652.698,64		$ 0,00
	TOTAL FASE I				**$ 3.517.719.533,57**				**3.517.719.533,57**		**$ 0,00**
	SUB TOTAL ADICION FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS										$ 0,00
	TOTAL FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 3.517.719.533,57**				**$ 3.517.719.533,57**		**$ 0,00**

	FASE III- CONSTRUCCIÓN	VALOR UNITARIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
	ADECUACION CASA OFICINAS	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
33	DEMOLICION PISOS	M2	$ 13.015,00	71,25	$ 927.318,75			71,25	$ 927.318,75	0,00	$ 0,00
34	DEMOLICION ENCHAPES	M2	$ 9.943,00	12,89	$ 128.185,16			12,89	$ 128.185,16	0,00	$ 0,00
35	RELLENO PISO HABITACIONES PIEDRA RAJÓN	M3	$ 98.264,00	10,62	$ 1.043.563,68			10,62	$ 1.043.563,68	0,00	$ 0,00
36	RELLENO RECEBO COMPACTADO	M3	$ 89.878,00	5,56	$ 499.631,80			5,56	$ 499.631,80	0,00	$ 0,00
37	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UN	$ 18.338,00	6,00	$ 110.028,00			6,00	$ 110.028,00	0,00	$ 0,00
38	DESMONTE VENTANAS	UN	$ 15.911,00	6,00	$ 95.466,00			6,00	$ 95.466,00	0,00	$ 0,00
39	AFINADO DE PISOS	UN	$ 36.507,00	64,00	$ 2.336.448,00			64,00	$ 2.336.448,00	0,00	$ 0,00
40	PAÑETE MUROS	M2	$ 24.443,00	169,67	$ 4.147.268,25			169,67	$ 4.147.268,25	0,00	$ 0,00
41	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	$ 15.927,00	23,00	$ 366.321,00			23,00	$ 366.321,00	0,00	$ 0,00
42	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	$ 46.620,00	46,00	$ 2.153.720,00			46,00	$ 2.153.720,00	0,00	$ 0,00
43	PUNTOS SANITARIOS (salida sanitaria PVC -S paral 3")	UN	$ 112.973,00	3,00	$ 338.919,00			3,00	$ 338.919,00	0,00	$ 0,00
44	PUNTOS ELECTRICOS (salida lampara Toma PVC completa)	UN	$ 73.071,00	28,00	$ 2.045.988,00			28,00	$ 2.045.988,00	0,00	$ 0,00
45	ACABADO PISO ENCHAPE CERAMICO	M2	$ 74.851,00	64,00	$ 4.790.464,00			64,00	$ 4.790.464,00	0,00	$ 0,00
46	MARCO PUERTA Y ENCHAPE TABLA CHAPA 0.15M	UN	$ 304.192,00	6,00	$ 1.825.152,00			6,00	$ 1.825.152,00	0,00	$ 0,00
47	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	$ 343.808,00	7,97	$ 2.740.149,76			7,97	$ 2.740.149,76	0,00	$ 0,00
48	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	$ 9.820,00	169,67	$ 1.666.169,22			169,67	$ 1.666.169,22	0,00	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE INCLUYE GRIFERIA	UN	$ 379.937,00	1,00	$ 379.937,00			1,00	$ 379.937,00	0,00	$ 0,00
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	$ 233.770,00	1,00	$ 233.770,00			1,00	$ 233.770,00	0,00	$ 0,00
51	CIELO RASO DRYWALL	M2	$ 67.172,00	64,00	$ 4.299.008,00			64,00	$ 4.299.003,00	0,00	$ 0,00
	ADECUACION CASA ALMACEN			-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL								Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18								
	FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022								
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL		

52	PAÑETE MUROS	M2	$ 24.443,00	113,87	$ 2.783.397,74			113,87	$ 2.783.397,74	0,00	$ 0,00
53	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	$ 15.927,00	15,50	$ 246.868,50			15,50	$ 246.868,50	0,00	$ 0,00
54	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	$ 46.820,00	31,00	$ 1.451.420,00			31,00	$ 1.451.420,00	0,00	$ 0,00
55	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	$ 196.065,00	5,00	$ 980.325,00			5,00	$ 980.325,00	0,00	$ 0,00
56	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UN	$ 272.559,00	5,00	$ 1.362.795,00			5,00	$ 1.362.795,00	0,00	$ 0,00
57	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	$ 9.820,00	96,60	$ 948.612,00			96,60	$ 948.612,00	0,00	$ 0,00
58	PUNTOS SANITARIOS (salida sanitaria PVC -S paral 3")	UN	$ 112.973,00	3,00	$ 338.919,00			3,00	$ 338.919,00	0,00	$ 0,00
59	PUNTOS HIDRAULICOS (PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2")	UN	$ 87.224,00	3,00	$ 261.672,00			3,00	$ 261.672,00	0,00	$ 0,00
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	$ 379.937,00	2,00	$ 759.874,00			2,00	$ 759.874,00	0,00	$ 0,00
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	$ 233.770,00	1,00	$ 233.770,00			1,00	$ 233.770,00	0,00	$ 0,00
62	MAMPOSTERIA CUARTO ALMACEN (MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M)	M2	$ 53.570,00	48,30	$ 2.587.431,00			48,30	$ 2.587.431,00	0,00	$ 0,00
63	PAÑETE CUARTO ALMACEN	M2	$ 24.443,00	48,30	$ 1.180.596,90			48,30	$ 1.180.596,90	0,00	$ 0,00
64	CUBIERTA EN TEJA DE ZINC (TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26)	M2	$ 54.417,00	67,88	$ 3.693.880,38			67,88	$ 3.693.880,38	0,00	$ 0,00
65	PUNTOS ELECTRICOS (salida lampara Toma PVC completa)	UN	$ 73.071,00	6,00	$ 438.426,00			6,00	$ 438.426,00	0,00	$ 0,00
66	PUERTAS EN LAMINA METALICA 1.20 (CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.60 MTS)	M2	$ 194.380,00	2,64	$ 513.163,20			2,64	$ 513.163,20	0,00	$ 0,00
67	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	$ 343.808,00	2,00	$ 687.616,00			2,00	$ 687.616,00	0,00	$ 0,00
68	RECEBO COMPACTADO BASE PLACA DE CONTRAPISO	M3	$ 89.878,00	18,51	$ 1.663.911,41			18,51	$ 1.663.911,41	0,00	$ 0,00
69	PLACA DE CONTRAPISO ESPESOR 10CMS (PLACA BASE CONCRETO 0,10 2500 PSI)	M2	$ 70.989,00	61,71	$ 4.380.731,19			61,71	$ 4.380.731,19	0,00	$ 0,00
70	CERCA EN TEJA DE ZINC H: 1.80 M	ml	$ 58.510,00	310,00	$ 18.138.100,00			310,00	$ 18.138.100,00	0,00	$ 0,00
71	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	un	$ 3.338.472,00	1,00	$ 3.338.472,00			1,00	$ 3.338.472,00	0,00	$ 0,00
72	ACOMETIDA EN PVC 3/4 5M	un	$ 354.430,00	8,00	$ 2.835.440,00			8,00	$ 2.835.440,00	0,00	$ 0,00
73	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	m²	$ 12.445,00	1.760,85	$ 21.913.778,25			1760,85	$ 21.913.778,25	0,00	$ 0,00
74	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	m²	$ 8.407,00	7.134,00	$ 59.975.538,00			7134,00	$ 59.975.538,00	0,00	$ 0,00
75	DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20M	m²	$ 1.859,00	1.760,85	$ 3.273.420,15			1760,85	$ 3.273.420,15	0,00	$ 0,00
76	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m³	$ 20.198,00	2.619,70	$ 52.912.700,60			2619,70	$ 52.912.700,60	0,00	$ 0,00
77	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	m³	$ 89.876,00	2.095,00	$ 188.294.410,00			2095,00	$ 188.294.410,00	0,00	$ 0,00
78	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 11.076,00	880,43	$ 9.751.642,68			880,43	$ 9.751.642,68	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL PRELIMINARES				**$ 415.074.418,62**		**$ 0,00**		**$ 415.074.418,62**		**$ 0,00**
	BLOQUE No. 2 MUSICA			**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
	CIMENTACION	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**

000019

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNIÓN TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

79	CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PREHUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.50 MTR A 0.80 MTR	UN	$ 86.588,00	51,00	$ 4.415.988,00		$ 0,00	51,00	$ 4.415.988,00	0,00	$ 0,00
80	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ml	$ 504.356,00	141,76	$ 71.497.506,56		$ 0,00	141,76	$ 71.497.506,56	0,00	$ 0,00
81	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	$ 634.716,00	622,76	$ 395.275.736,16		$ 0,00	622,76	$ 395.275.736,16	0,00	$ 0,00
82	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	$ 949.782,00	435,37	$ 413.506.589,34		$ 0,00	435,37	$ 413.506.589,34	0,00	$ 0,00
83	BASE EN CONCRETO POBRE 1,500PSI	m^3	$ 410.402,00	15,59	$ 6.397.941,46		$ 0,00	15,59	$ 6.397.941,46	0,00	$ 0,00
84	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	$ 741.244,00	147,20	$ 109.107.410,58		$ 0,00	147,20	$ 109.107.410,58	0,00	$ 0,00
85	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	M3	$ 412.215,00	9,00	$ 3.709.935,00		$ 0,00	9,00	$ 3.709.935,00	0,00	$ 0,00
86	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m^3	$ 814.928,00	46,88	$ 38.203.824,64		$ 0,00	46,88	$ 38.203.824,64	0,00	$ 0,00
87	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI FOSO ASCENSOR	m2	$ 350.570,00	4,90	$ 1.717.793,00		$ 0,00	4,90	$ 1.717.793,00	0,00	$ 0,00
88	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp: 0.15 mts	m^2	$ 129.056,00	792,00	$ 102.212.352,00		$ 0,00	792,00	$ 102.212.352,00	0,00	$ 0,00
89	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES,DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	$ 7.163,00	51.446,36	$ 368.510.276,68		$ 0,00	51446,36	$ 368.510.276,68	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL CIMENTACIÓN				**$ 1.514.555.353,42**		**$ 0,00**		**$ 1.514.555.353,42**		**$ 0,00**
	ESTRUCTURA	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
90	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B	kg	$ 23.099,00	145.685,32	$ 3.365.185.136,00		$ 0,00	145685,32	$ 3.365.185.136,00	0,00	$ 0,00
91	MUROS CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, PUNTO FIJO ASCENSORES E: 20 CM	M3	$ 911.759,00	22,80	$ 20.787.011,09		$ 0,00	22,80	$ 20.787.011,09	0,00	$ 0,00
92	RELLENO COLUMNAS (CONCRETO FLUIDO 3500 PSI)	m^3	$ 867.322,00	44,24	$ 38.370.325,28		$ 0,00	44,24	$ 38.370.325,28	0,00	$ 0,00
93	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08(Entrepisos)	m^2	$ 187.119,00	740,70	$ 138.599.043,30		$ 0,00	740,70	$ 138.599.043,30	0,00	$ 0,00
94	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub)	m^2	$ 168.699,00	959,30	$ 161.832.950,70		$ 0,00	959,30	$ 161.832.950,70	0,00	$ 0,00
95	GROUTING DE NIVELACION	KG	$ 39.052,00	596,75	$ 23.304.281,00		$ 0,00	596,75	$ 23.304.281,00	0,00	$ 0,00
96	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	$ 23.099,00	3.524,24	$ 81.406.368,94		$ 0,00	2774,24	$ 64.082.118,94	750,00	$ 17.324.250,00
	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
97	PINTURA INTUMISCENTE PARA ESTRUCTURA METALICA	M2	$ 163.748,19	2.689,08	$ 440.332.233,63		$ 0,00	2687,78	$ 440.119.360,98	1,30	$ 212.872,65

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL								Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022								UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022		PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL				

98	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PROTECCION FUEGO LAMINAS STEELDECK)	KG	$ 7.163,00	3.400,00	$ 24.354.200,00		$ 0,00	3400,00	$ 24.354.200,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL ESTRUCTURA				**$ 4.294.171.549,94**		**$ 0,00**		**$ 4.276.634.427,29**		**$ 17.537.122,65**
	MAMPOSTERIA (No acústica)	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
99	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m²	$ 114.594,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
100	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PARED DOBLE	m²	$ 126.537,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
101	DINTELES (VIGUETA Y COLUMNETAS) CONCRETO DE 2500 PSI 17x12	ml	$ 64.753,00	2.707,46	$ 175.316.157,38		$ 0,00	2707,46	$ 175.316.157,38	0,00	$ 0,00
102	MESONES EN CONCRETO 2.500 PSI E: 10CM	M2	$ 129.567,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
103	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5	m2	$ 64.591,00	1.751,60	$ 113.137.363,07		$ 0,00	1712,77	$ 110.629.692,09	38,82	$ 2.507.680,98
104	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	ml	$ 65.226,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
105	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND	$ 26.968,00	698,00	$ 18.823.664,00		$ 0,00	698,00	$ 18.823.664,00	0,00	$ 0,00
106	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	$ 7.163,00	11.107,97	$ 79.566.377,02		$ 0,00	11107,97	$ 79.566.377,02	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL MANPOSTERIA (No acústica)				**$ 386.843.561,47**		**$ 0,00**		**$ 384.335.880,49**		**$ 2.507.680,98**
	CUBIERTA	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
107	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.08 MTR	m2	$ 36.751,00	908,78	$ 33.398.573,78		$ 0,00	908,78	$ 33.398.573,78	0,00	$ 0,00
108	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m²	$ 56.525,89	929,19	$ 52.523.292,82		$ 0,00	929,19	$ 52.523.292,82	0,00	$ 0,00
109	ADOQUIN GRES PEATONAL CIRCULCIONES EN TERRAZA	m²	$ 96.874,63	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
110	REMATE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	$ 72.685,67	169,58	$ 12.326.036,48		$ 0,00	169,58	$ 12.326.036,48	0,00	$ 0,00
111	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml	$ 37.721,14	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
112	ALFAJIAS CONCRETO DE 2500 PSI E=0.25M	ML	$ 72.685,00	171,81	$ 12.488.009,85		$ 0,00	171,81	$ 12.488.009,85	0,00	$ 0,00
NP1	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND	$ 26.968,00	172,00	$ 4.638.496,00		$ 0,00	172,00	$ 4.638.496,00	0,00	$ 0,00
NP2	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 776.875,00	10,32	$ 8.015.485,50		$ 0,00	10,32	$ 8.015.485,50	0,00	$ 0,00
NP3	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	KG	$ 7.163,00	563,17	$ 4.033.972,38		$ 0,00	563,17	$ 4.033.972,38	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL CUBIERTA				**$ 127.423.866,82**		**$ 0,00**		**$ 127.423.866,82**		**$ 0,00**

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									Interventoría: UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL				

	ELEMENTOS DE ACUSTICA	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	SALAS INSONORIZADAS-SALONES DE TEORIA-SALAS DE PIANO, PERCUSIONES, INCIACION MUSICAL Y AGRUPACIONES						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
113	MURO SENCILLO EN DRYWALL STC 47 E=12CM DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + DRYWALL 1/2" + Perfil B6 + FRESCASA 2.5" + FRESCASA 2.5" +PERFIL B6 + DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + Drywall de 1/2	m²	$ 185.000,15	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO STC 47 DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + DRYWALL 1/2" + PERFILERÍA + FRESCASA 2.5" INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	m²	$ 185.000,15	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO ACÚSTICO CON ASPERSION POR CELULOSA	m²	$ 105.000,18	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
116	PANEL ACÚSTICO ABSORBENTE MUROS COMPUESTO POR LAMINA DE BLACK THEATER 2", MARCO INTERNO Y FORRADO EN PAÑO. SOBREPUESTO EN MURO POR MEDIO DE SISTEMA DE CUCHILLA. (modulacion de 1m x 1,80 m)	m²	$ 350.000,01	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
117	SUMINISTRO DE LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO ACOUSTIC CONTROL F8 PARA PISO. (1.2m x 1m) E=2,8CM FIBRA DE VIDRIO 1" + MEMBRANA ACÚSTICA DE 3MM. NO INCLUYE MANO DE OBRA. INCLUYE TRANSPORTE HASTA COTA.	M2	$ 215.000,04	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL ELEMENTOS DE ACÚSTICA				**$ 0,00**		-		-		**$ 0,00**
	CARPINTERIA METALICA -ALUMINIO	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
118	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 6+6+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38, Multilaminado Crudo Antirrobo 17mm (6+6+5) (656,22), con Protección P6B (EN 356) PVB 0,76 EN AMBIENTES Y SALONES	M2	$ 2.173.844,03	325,14	$ 706.812.344,81		$ 0,00	325,14	$ 706.812.344,81	0,00	$ 0,00

000022

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL			

119	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 EN CIRCULACIONES	M2	$ 1.520.517,10	470,78	$ 715.834.210,10		$ 0,00	461,79	$ 702.161.112,13	8,99	$ 13.673.097,97
	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
120	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B (SOPORTE SUPERIOR VENTANAS Y VOLADIZOS)	kg	$ 23.099,00	4.570,28	$ 105.568.897,72		$ 0,00	4570,28	$ 105.568.897,72	0,00	$ 0,00
121	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	$ 366.407,00	2,40	$ 879.376,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,40	$ 879.376,80
122	BARANDA METALICA	ML	$ 540.543,00	40,80	$ 22.054.154,40		$ 0,00	40,71	$ 22.005.505,53	0,09	$ 48.648,87
123	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND	$ 26.968,00	1.117,00	$ 30.123.256,00		$ 0,00	1117,00	$ 30.123.256,00	0,00	$ 0,00
124	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	m^3	$ 776.875,00	15,08	$ 11.712.167,50		$ 0,00	15,08	$ 11.712.167,50	0,00	$ 0,00
125	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	kg	$ 7.163,00	1.417,92	$ 10.156.560,96		$ 0,00	1417,92	$ 10.156.560,96	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO				$ 1.603.140.968,28		$ 0,00		$ 1.588.539.844,65		$ 14.601.123,64
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
126	Punto hidraulico PVC Presion 1/2" (Lavamanos)	und	$ 87.224,00	15,00	$ 1.308.360,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 1.308.360,00
127	Punto hidraulico PVC Presion 1 1/4" (Flexmetro sanitario)	und	$ 116.050,00	24,00	$ 2.785.200,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 2.785.200,00
128	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" ORINAL	und	$ 92.635,00	3,00	$ 277.905,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 277.905,00
129	TUBERÍA PVC-C900 4"	ml	$ 115.476,00	204,00	$ 23.557.104,00	62,07	$ 7.167.595,32	68,07	$ 7.860.451,32	135,93	$ 15.696.652,68
130	ACCESORIOS PVC-C900 4"	un	$ 740.065,00	8,00	$ 5.920.520,00		$ 0,00	8,00	$ 5.920.520,00	0,00	$ 0,00
131	Tubería A.C. SCH - 40 4"	ml	$ 196.296,00	12,10	$ 2.375.181,60		$ 0,00	8,00	$ 1.570.368,00	4,10	$ 804.813,60
132	Tubería A.C. SCH - 40 3"	ml	$ 132.656,00	42,80	$ 5.677.676,80		$ 0,00	41,58	$ 5.515.836,48	1,22	$ 161.840,32
133	Tubería A.C. SCH - 40 2-1/2"	ml	$ 112.729,00	39,10	$ 4.407.703,90		$ 0,00	39,10	$ 4.407.703,90	0,00	$ 0,00
134	Tubería A.C. SCH - 40 2"	ml	$ 87.503,00	22,10	$ 1.933.816,30		$ 0,00	22,10	$ 1.933.816,30	0,00	$ 0,00
135	Tubería A.C. SCH - 40 1-1/2"	ml	$ 59.551,00	10,33	$ 615.161,83		$ 0,00	10,33	$ 615.161,83	0,00	$ 0,00
136	Accesorios A.C. 4"	un	$ 162.944,00	7,00	$ 1.140.608,00		$ 0,00	7,00	$ 1.140.608,00	0,00	$ 0,00
137	Unión flexible Ranurada 4"	un	$ 53.323,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
138	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 4"	un	$ 42.819,00	56,00	$ 2.397.864,00		$ 0,00	50,00	$ 2.140.950,00	6,00	$ 256.914,00
NP4	PUNTO A.F. DUCHAS	UND	$ 56.465,00	7,00	$ 395.255,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 395.255,00
NP5	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	$ 11.376,00	32,57	$ 370.516,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	32,57	$ 370.516,32
NP6	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	$ 14.110,00	22,80	$ 321.708,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,80	$ 321.708,00
NP7	REGISTO DE 1 1/2	UND	$ 229.918,00	1,00	$ 229.918,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 229.918,00
NP8	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" SANITARIO FLUXOMETRO	UND	$ 120.145,00	14,00	$ 1.682.030,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.682.030,00

000023

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL						Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18						UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
	FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022						
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31 ENERO 2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022		PROYECTO:				COMPLEJO CULTURAL

NP9	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" DUCHA	UND	$ 92.635,00	7,00	$ 648.445,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 648.445,00
NP10	RED SANITARIA PVC 2"	ML	$ 33.372,00	13,57	$ 452.858,04		$ 0,00	0,00	$ 0,00	13,57	$ 452.858,04
NP11	REVENTILACIÓN TUBERÍA PVC-V 2"	ML	$ 23.593,00	19,20	$ 452.985,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,20	$ 452.985,60
NP12	SIFON CON SOSCO 4,5 CM X 3.5 CM	UND	$ 29.332,00	14,00	$ 410.648,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 410.648,00
	ITEM NO PREVISTOS			-			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP13	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$ 21.468,00	404,82	$ 8.690.675,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	404,82	$ 8.690.675,76
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P 1 1/4"	ML	$ 39.626,00	2,53	$ 100.759,78		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,53	$ 100.759,78
NP15	RED DE SUMINSTRO DE PVC 1 1/ 2"	ML	$ 33.785,00	10,62	$ 358.796,70		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,62	$ 358.796,70
NP16	RED DE SUMINSTRO DE PVC 2"	ML	$ 47.416,00	25,94	$ 1.229.971,04		$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,94	$ 1.229.971,04
NP17	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	$ 72.830,00	39,82	$ 2.900.090,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,82	$ 2.900.090,60
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3"	ML	$ 82.270,00	39,22	$ 3.226.629,40		$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,22	$ 3.226.629,40
NP19	REGISTO DE 1/2	un	$ 86.032,00	12,00	$ 1.032.384,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.032.384,00
NP20	REGISTO DE 3/4"	un	$ 108.415,00	1,00	$ 108.415,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 108.415,00
NP21	REGISTO DE 1"	UND	$ 154.053,00	1,00	$ 154.053,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 154.053,00
NP22	REGISTO DE 2"	UND	$ 387.392,00	3,00	$ 1.162.176,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.162.176,00
NP23	REGISTO DE 2 1/2"	UND	$ 519.439,00	1,00	$ 519.439,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 519.439,00
	RED CONTRAINCENDIOS			-			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP24	PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2"	UND	$ 93.861,00	108,00	$ 10.136.988,00		$ 0,00	107,00	$ 10.043.127,00	1,00	$ 93.861,00
NP25	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO 1"SCH'40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	$ 56.404,00	277,61	$ 15.658.314,44		$ 0,00	277,61	$ 15.658.314,44	0,00	$ 0,00
NP26	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO DE HASTA 2"	ML	$ 5.659,00	310,04	$ 1.754.516,36		$ 0,00	310,04	$ 1.754.516,36	0,00	$ 0,00
NP27	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO MAYOR A 2"	ML	$ 8.842,00	127,00	$ 1.122.934,00		$ 0,00	127,00	$ 1.122.934,00	0,00	$ 0,00
NP28	VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1"	un	$ 421.954,00	1,00	$ 421.954,00		$ 0,00	1,00	$ 421.954,00	0,00	$ 0,00
NP29	SIAMESA INYECCION DE 4"X2 1/2X 2 1/2	un	$ 3.527.381,00	1,00	$ 3.527.381,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.527.381,00
NP30	GABINETE TIPO III	un	$ 1.391.961,00	4,00	$ 5.567.844,00		$ 0,00	4,00	$ 5.567.844,00	0,00	$ 0,00
NP31	ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2	un	$ 57.494,00	108,00	$ 6.209.352,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	108,00	$ 6.209.352,00
NP73	RESTRICTOR HD SERIE 1200 C900 4"	UND	$ 1.454.168,35	10,00	$ 14.541.683,46	10,00	$ 14.541.683,46	10,00	$ 14.541.683,46	0,00	$ 0,00
NP74	ESTACION DE CONTROL DE ROCIADORES DE 2"	UND	$ 4.779.912,61	2,00	$ 9.559.825,21	2,00	$ 9.559.825,21	2,00	$ 9.559.825,21	0,00	$ 0,00
NP75	KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN C-900 - A/C completa	UND	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33	0,00	$ 0,00
NP76	SOPORTE ANTISISMICO 2"	UND	$ 208.123,70	4,00	$ 832.494,80	4,00	$ 832.494,80	4,00	$ 832.494,80	0,00	$ 0,00
NP77	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2"	UND	$ 216.120,70	7,00	$ 1.512.844,89	7,00	$ 1.512.844,89	7,00	$ 1.512.844,89	0,00	$ 0,00
NP78	SOPORTE ANTISISMICO 3"	UND	$ 242.895,70	7,00	$ 1.700.269,89	7,00	$ 1.700.269,89	7,00	$ 1.700.269,89	0,00	$ 0,00
	RED DE AGUAS LLUVIAS			-			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
139	TUBERÍA PVC-S 6"	ml	$ 112.417,00	69,75	$ 7.841.085,75		$ 0,00	56,40	$ 6.340.318,80	13,35	$ 1.500.766,95
140	ACCESORIOS PVC-S 6"	un	$ 195.848,00	9,00	$ 1.762.632,00		$ 0,00	9,00	$ 1.762.632,00	0,00	$ 0,00
141	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 6"	un	$ 52.461,00	18,00	$ 944.298,00		$ 0,00	18,00	$ 944.298,00	0,00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL			

NP33	TUBERIA SANITARIO PVC 4	ml	$ 70.084,00	217,47	$ 15.241.167,48		$ 0,00	216,94	$ 15.133.793,79	1,53	$ 107.368,69
NP34	REJILLA TIPO GRANADA 6X4	un	$ 70.524,74	12,00	$ 846.296,88		$ 0,00	12,00	$ 846.296,88	0,00	$ 0,00
NP35	CODO SANITARIO CXC 90°X4"	un	$ 19.469,18	12,00	$ 233.630,16		$ 0,00	12,00	$ 233.630,16	0,00	$ 0,00
NP36	CODO SANITARIO CXC 45°X4"	un	$ 23.783,58	6,00	$ 142.701,48		$ 0,00	6,00	$ 142.701,48	0,00	$ 0,00
NP37	ADAPTADOR SANITARIO DE LIMPIEZA TAPON PVC 4"	un	$ 34.508,61	2,00	$ 69.017,22		$ 0,00	2,00	$ 69.017,22	0,00	$ 0,00
NP38	YEE SENCILLA SANITARIO PCV 4"	un	$ 41.989,06	14,00	$ 587.846,84		$ 0,00	14,00	$ 587.846,84	0,00	$ 0,00
NP39	UNION SANITARIO PVC CXC 4"	un	$ 13.354,79	19,00	$ 253.741,01		$ 0,00	19,00	$ 253.741,01	0,00	$ 0,00
NP40	SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	un	$ 57.290,00	9,00	$ 515.610,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 515.610,00
	SUB TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				**$ 181.317.847,88**		**$ 38.803.276,91**		**$ 123.624.068,40**		**$ 57.693.779,48**

	INSTALACIONES ELECTRICAS	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
142	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No.400 KCMIL +1xNo.400) DE TRANSFORMAOR A TABLERO TOTALIZADOR GENERAL, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	$ 2.089.199,53	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
143	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No.400 KCMIL +1xNo.400)TABLERO TOTALIZADOR GENERAL A PLANTA EMERGENCIA, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	$ 2.089.199,53	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
144	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No.400 KCMIL +1xNo.400)TABLERO TOTALIZADOR GENERAL A TG1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	$ 2.089.199,53	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
145	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3X(3No.400 KCMIL +1xNo.400) DE TG1 A TGA, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	$ 2.089.199,53	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
146	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.2+1No.2 DE TG1 A TD1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	$ 106.387,19	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
147	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.8+1No.8 DE TGR A TDR1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 1"1/4	ml	$ 22.149,84	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
148	VARILLA DE 2,4 M X 5/8 CU CERTIFICADA RETIE	un	$ 345.502,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
149	SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE 2/0 AWG COBRE A VARILLA DE 5/8 (PUNTOS)	un	$ 31.662,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
150	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 40X40 CM	un	$ 291.188,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

151	CABLE 2/0 AWG CU. PARA MALLA TIERRA	ml	$ 103.399,38	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SALIDAS DE ALUMBRADO			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
152	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERIA METALICA EMT, ACCESORIOS, CONDUCTORES,CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	$ 92.413,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SALIDAS PARA CONTROL DE ILUMINACION			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
153	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	$ 18.562,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
154	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	$ 23.562,32	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
155	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DUAL, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO EMT DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	$ 46.562,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SALIDAS TOMACORRIENTES			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
156	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES TOMA GFCI CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	$ 107.763,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
157	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES REGULADA MONOFASICAS DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	$ 117.586,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
158	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES NORMAL CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF	un	$ 93.586,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TABLEROS Y PROTECCIONES			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
159	TG1: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL , Segun diagrama unifilar . Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barreje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados. CERTIFICADO RETIE	un	$ 9.483.117,24	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNIÓN TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

160	TD1: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 4 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identif cación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	$ 1.224.029,75	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
161	TD5: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 5 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identif cación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	$ 1.665.610,75	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
162	TR3: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identif cación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	$ 971.373,45	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
163	TR4: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identif cación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	$ 971.373,45	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CONDUCTORES PARA CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSION			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
164	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.2+1No.2 DE TG1 A TG4, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 2"	ml	$ 106.387,19	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
165	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.2+1No.2 DE TG3 A TD5, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 2"	ml	$ 106.387,19	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
166	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.6+1No.6 DE TG3 A TD4, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 1"1/2	ml	$ 54.856,02	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
167	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.6+1No.6 DE TGR A TDR3, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 1"1/2	ml	$ 54.856,02	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
168	TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS Y CAJAS	ml	$ 33.829,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL		

	COMUNICACIONES			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	VOZ, DATOS Y TV			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
169	SALIDA HDMI EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	$ 33.829,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
170	SALIDA TV EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	$ 33.829,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
171	SALIDA DE DATOS SENCILLA EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	$ 33.829,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
172	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	$ 33.829,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
173	SALIDA VIDEO BEAM EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION,NO INCLUYE VIDEO BEAM	un	$ 33.829,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
174	SALIDA ACCESS POINT EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION, NO INCLUYE EQUIPO	un	$ 33.829,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
175	Patch cord CAT 6A, UTP, Diametro Reducido 26 AWG 6.2mm, 7ft (2.1 metros), azul.	un	$ 36.762,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
176	Cable categoria 6 U/UTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul. LSZH. caja de 305 metros.	un	$ 895.906,17	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
177	Herraje plano 48 puertos UTP 6	un	$ 304.857,54	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
178	Organizador doble con tapa.	un	$ 121.868,39	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
179	Gabinete cerrado 42U 800X800 mm Puertas Microperforadas	un	$ 4.373.796,90	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
180	Organizador vertical para Gabinete de 42U, 800 mm de ancho.	un	$ 820.073,45	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
181	Multitoma Horizontal Incluye Supresor de 13kA.	un	$ 550.950,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
182	Barraje horizontal para rack	un	$ 390.073,45	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
183	CAJA DE PASO METALICA 15X15	un	$ 95.774,69	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
184	Suministro, instalacion bandeja porta cables - tipo escalera con tapa, accesorios de 200*50	ml	$ 54.774,69	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
185	Canaleta plastica 54x100mm	ml	$ 38.774,69	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SISTEMA DE SONIDO			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
186	SALIDA DE SONIDO MONO	un	$ 79.607,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
187	Cable blindado para audio Tipo 2	ml	$ 21.662,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
188	Cable categoria 6 U/UTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul. LSZH. caja de 305 metros.	un	$ 898.706,17	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CERTIFICACIONES			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
189	CERTIFICACION RETIE	gl	$ 14.539.262,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
190	CERTIFICACION RETILAP	gl	$ 10.263.662,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
191	Certificación punto categoria 6	un	$ 94.912,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 0,00**		-		-		**$ 0,00**

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNIÓN TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

	ACABADOS DE MUROS	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
192	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM	m2	$ 24.443,00	3.145,43	$ 76.883.721,04		$ 0,00	2648,77	$ 64.743.814,57	496,66	$ 12.139.906,47
193	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m²	$ 28.956,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
194	INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO EN FACHADAS	m²	$ 247.908,51	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
195	RECUBRIMIENTO EN FACHADA CON LAMINA DE FIBROCEMENTO JUNTA MARCADA ANCLAJE MECANICO	m²	$ 194.248,30	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
196	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	m²	$ 362.286,71	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
197	COLOR PLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	$ 81.419,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
198	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (lineal)	ml	$ 15.184,00	2.676,58	$ 40.641.190,72		$ 0,00	2676,58	$ 40.641.190,72	0,00	$ 0,00
199	LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO 39X5X12 REF COBRIZO DE SANTAFE	M2	$ 227.749,88	449,81	$ 102.445.198,40		$ 0,00	448,54	$ 102.154.020,18	1,28	$ 291.178,22
200	LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO 39X5X12 REF COBRIZO DE SANTAFE	ML	$ 114.524,48	56,30	$ 6.447.728,22		$ 0,00	18,40	$ 2.107.250,43	37,90	$ 4.340.477,79
201	HILADA PARADA LADRILLO A LA VISTA	ML	$ 114.524,48	141,70	$ 16.228.118,82		$ 0,00	141,70	$ 16.228.118,82	0,00	$ 0,00
202	ENCHAPE COLUMNAS EN LADRILLO A LA VISTA	ML	$ 128.274,00	107,70	$ 13.815.109,80		$ 0,00	107,70	$ 13.815.109,80	0,00	$ 0,00
203	GROUTING DOVELAS	ML	$ 50.045,70	332,80	$ 16.655.208,96		$ 0,00	332,27	$ 16.628.684,74	0,53	$ 26.524,22
204	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	$ 7.163,00	186,00	$ 1.332.318,00		$ 0,00	185,19	$ 1.326.530,30	0,81	$ 5.787,70
205	ACERO FIGURADO 60000 PSI (GRAFIL DE 4 MM)	kg	$ 7.163,00	46,52	$ 333.222,76		$ 0,00	46,52	$ 333.222,76	0,00	$ 0,00
206	LAVADO DE FACHADA	M2	$ 38.347,00	465,00	$ 17.831.355,00		$ 0,00	465,00	$ 17.831.355,00	0,00	$ 0,00
NP79	ACABADO DE FACHADA EN GRANIPLAST, INCLUYE COLOR	M2	$ 189.280,74	390,00	$ 73.819.488,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	390,00	$ 73.819.488,60
	SUB TOTAL - ACABADOS DE MUROS				$ 366.432.660,32		$ 0,00		$ 275.809.297,31		$ 90.623.363,01

	CIELO RASOS	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	ITEMS NO PREVISTOS									0,00	$ 0,00
207	CIELO RASO EN SUPERBOAR 8 MM (INCLUYE PINTURA) EN FACHADA)	m²	$ 180.000,00	271,00	$ 48.780.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	271,00	$ 48.780.000,00
	SUB TOTAL - CIELO RASOS				$ 48.780.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 48.780.000,00

000029

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNIÓN TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

	BLOQUE No. 3 TEATRO			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
	CIMENTACION	UN	VALOR UNITARIO							CANT	VALOR
208	CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PREHUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.50 MTR A 0.80 MTR	UN	$ 86.588,00	52,00	$ 4.502.576,00		$ 0,00	52,00	$ 4.502.576,00	0,00	$ 0,00
209	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ml	$ 504.356,00	398,71	$ 201.091.780,76		$ 0,00	398,71	$ 201.091.780,76	0,00	$ 0,00
210	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	$ 634.716,00	140,12	$ 88.936.405,92		$ 0,00	140,12	$ 88.936.405,92	0,00	$ 0,00
211	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	$ 949.782,00	639,44	$ 607.328.602,08		$ 0,00	639,44	$ 607.328.602,08	0,00	$ 0,00
212	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m3	$ 410.402,00	15,86	$ 6.510.740,45		$ 0,00	15,86	$ 6.510.740,45	0,00	$ 0,00
213	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	$ 741.244,00	147,80	$ 109.557.345,69		$ 0,00	147,80	$ 109.557.345,69	0,00	$ 0,00
214	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	M3	$ 412.215,00	9,66	$ 3.981.996,90		$ 0,00	9,66	$ 3.981.996,90	0,00	$ 0,00
215	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m3	$ 814.928,00	51,60	$ 42.050.284,80		$ 0,00	51,60	$ 42.050.284,80	0,00	$ 0,00
216	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp: 0.15 mts	m2	$ 129.056,00	951,00	$ 122.732.256,00		$ 0,00	951,00	$ 122.732.256,00	0,00	$ 0,00
217	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES,DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	$ 7.163,00	58.900,94	$ 421.907.433,22		$ 0,00	58900,94	$ 421.907.433,22	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - CIMENTACION				$ 1.608.599.421,82		$ 0,00		$ 1.608.599.421,82		$ 0,00
	ESTRUCTURA	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
218	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B	kg	$ 23.099,00	155.417,72	$ 3.589.993.952,28		$ 0,00	155417,72	$ 3.589.993.952,28	0,00	$ 0,00
219	RELLENO COLUMNAS (CONCRETO FLUIDO 3500 PSI)	m3	$ 867.322,00	48,13	$ 41.746.983,29		$ 0,00	48,13	$ 41.746.983,29	0,00	$ 0,00
220	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08(Entrepisos)	m2	$ 187.119,00	723,68	$ 135.451.290,08		$ 0,00	719,00	$ 134.538.897,81	4,88	$ 912.392,24
221	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub)	m2	$ 168.699,00	1.120,66	$ 189.054.221,34		$ 0,00	1120,66	$ 189.054.221,34	0,00	$ 0,00
222	GROUTING DE NIVELACION	KG	$ 39.052,00	900,55	$ 35.168.278,60		$ 0,00	721,35	$ 28.170.160,20	179,20	$ 6.998.118,40
223	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	$ 23.099,00	4.946,96	$ 114.269.898,34		$ 0,00	2512,20	$ 58.029.317,87	2434,76	$ 56.240.580,47
	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
224	EXCAVACION MANUAL	M3	$ 61.761,00	84,47	$ 5.216.766,39		$ 0,00	83,82	$ 5.176.575,42	0,65	$ 40.190,97
225	RECEBO COMPACTADO BASE PLACA DE CONTRAPISO	M3	$ 89.876,00	61,01	$ 5.483.007,39		$ 0,00	50,57	$ 4.545.220,34	10,43	$ 937.787,05

226	ZAPATA, VIGA Y PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI CIMENTACION PUENTE	M3	$ 776.875,00	26,64	$ 20.694.240,88		$ 0,00	26,64	$ 20.694.240,88	0,00	$ 0,00
227	ACERO FIGURADO 60000 PSI DADOS, VIGAS Y PEDESETALES DE CIMENTACION PUENTE	KG	$ 7.163,00	2.740,79	$ 19.632.269,49		$ 0,00	2740,79	$ 19.632.269,49	0,00	$ 0,00
228	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B PLATINAS DE ANCLAJE Y PERNOS PUENTE	KG	$ 23.099,00	739,88	$ 17.090.496,20		$ 0,00	739,24	$ 17.075.712,84	0,64	$ 14.783,36
229	BARANDA METALICA	ML	$ 570.543,00	48,52	$ 28.227.146,36		$ 0,00	48,51	$ 28.221.740,93	0,01	$ 5.405,43
230	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B PUENTE DE CONEXIÓN	Kg	$ 23.099,00	8.897,10	$ 205.514.112,90		$ 0,00	8895,48	$ 205.476.602,43	1,62	$ 37.510,47
231	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08(Entrepisos) PUENTE	m2	$ 187.119,00	25,02	$ 4.681.717,38		$ 0,00	25,02	$ 4.681.717,38	0,00	$ 0,00
232	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluya conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub) PUENTE	m2	$ 168.699,00	25,02	$ 4.220.848,98		$ 0,00	25,02	$ 4.220.848,98	0,00	$ 0,00
233	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0,08 MTR	m2	$ 104.549,00	21,68	$ 2.266.622,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,68	$ 2.266.622,32
234	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m²	$ 56.525,89	23,80	$ 1.345.316,21		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,80	$ 1.345.316,21
235	ALFAJIAS CONCRETO DE 2500 PSI E=0.25M	ML	$ 72.685,00	22,66	$ 1.647.042,10		$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,66	$ 1.647.042,10
236	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0,20X0.12	ml	$ 37.721,14	21,66	$ 817.039,89		$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,66	$ 817.039,89
237	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND	$ 26.968,00	123,06	$ 3.318.562,22		$ 0,00	123,06	$ 3.318.562,22	0,00	$ 0,00
238	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	m³	$ 776.875,00	1,77	$ 1.376.622,50		$ 0,00	1,73	$ 1.347.412,00	0,04	$ 29.210,50
239	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	kg	$ 7.163,00	163,92	$ 1.174.158,96		$ 0,00	163,92	$ 1.174.158,96	0,00	$ 0,00
240	PINTURA INTUMISCENTE PARA ESTRUCTURA METALICA	M2	$ 163.748,19	3.021,93	$ 494.835.972,92		$ 0,00	3021,93	$ 494.835.972,92	0,00	$ 0,00
241	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PROTECCION FUEGO LAMINAS STEELDECK)	KG	$ 7.163,00	3.171,55	$ 22.717.807,84		$ 0,00	3171,55	$ 22.717.807,84	0,00	$ 0,00
NP41	CONCRETO CICLOPEO 3500 PSI ,40% RAJON	m³	$ 556.415,00	10,07	$ 5.604.907,40		$ 0,00	10,07	$ 5.604.907,40	0,00	$ 0,00
NP42	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp: 0.15 mts	m2	$ 129.056,00	40,32	$ 5.203.557,28		$ 0,00	40,27	$ 5.197.691,68	0,05	$ 5.865,60
NP43	FIJACION A ESTRUCTURA	un	$ 95.976,79	572,00	$ 54.899.867,88		$ 0,00	572,00	$ 54.899.867,88	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - ESTRUCTURA				**$ 5.009.652.707,39**		**$ 0,00**		**$ 4.938.354.842,38**		**$ 71.297.865,01**
	MAMPOSTERIA (No acústica)	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
242	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0,12 M	m²	$ 114.594,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
243	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PARED DOBLE	m²	$ 126.637,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
244	DINTELES (VIGUETA Y COLUMNETAS) CONCRETO DE 2500 PSI 17x12	ml	$ 64.753,00	1.838,81	$ 119.068.463,93		$ 0,00	1838,80	$ 119.067.816,40	0,01	$ 647,53
245	MESONES EN CONCRETO 2.500 PSI E: 10CM	M2	$ 129.587,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNIÓN TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
246	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5	m2	$ 64.591,00	1.329,84	$ 85.895.624,39		$ 0,00	1140,48	$ 73.664.453,02	189,36	$ 12.231.171,37
247	MAMPOSTERIA BORDILLO ENTRE PISO Y CUBIERTA	ml	$ 30.556,00	539,43	$ 16.483.901,94		$ 0,00	539,43	$ 16.483.901,94	0,00	$ 0,00
248	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0,12 M	ml	$ 65.226,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
249	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND	$ 26.968,00	446,00	$ 12.027.728,00		$ 0,00	446,00	$ 12.027.728,00	0,00	$ 0,00
250	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	$ 7.163,00	5.959,91	$ 42.690.856,93		$ 0,00	5959,91	$ 42.690.856,93	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL MANPOSTERIA (No acústica)				$ 276.166.575,19		$ 0,00		$ 263.934.756,29		$ 12.231.818,90
	CUBIERTA	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
251	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.08 MTR	m2	$ 104.549,00	1.080,00	$ 112.912.920,00		$ 0,00	1080,00	$ 112.912.920,00	0,00	$ 0,00
252	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m²	$ 56.525,89	1.101,90	$ 62.285.879,49		$ 0,00	1101,90	$ 62.285.879,49	0,00	$ 0,00
253	ADOQUIN GRES PEATONAL CIRCULCIONES EN TERRAZA	m²	$ 96.874,63	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
254	ALFAJIAS CONCRETO DE 2500 PSI E=0.25M	ML	$ 72.665,00	182,63	$ 13.274.461,55		$ 0,00	178,52	$ 12.975.726,20	4,11	$ 298.735,35
255	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml	$ 37.721,14	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
256	REMATE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	$ 72.665,67	178,62	$ 12.983.114,97		$ 0,00	178,62	$ 12.983.114,97	0,00	$ 0,00
NP44	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND	$ 26.968,00	179,00	$ 4.827.272,00		$ 0,00	179,00	$ 4.827.272,00	0,00	$ 0,00
NP45	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 776.875,00	10,73	$ 8.338.976,25		$ 0,00	10,73	$ 8.338.976,25	0,00	$ 0,00
NP46	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	KG	$ 7.163,00	603,56	$ 4.323.323,20		$ 0,00	603,56	$ 4.323.323,20	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL CUBIERTA				$ 218.945.947,46		$ 0,00		$ 218.647.212,11		$ 298.735,35
	ELEMENTOS DE ACUSTICA	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
257	MURO SENCILLO EN DRYWALL STC 47 E=12CM DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + DRYWALL 1/2" + Perfil B6 + FRESCASA 2.5" + FRESCASA 2.5" +PERFIL B6 + DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + Drywall de 1/2	m²	$ 185.000,16	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
258	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO ACÚSTICO CON ASPERSION POR CELULOSA	m²	$ 105.000,18	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - ELEMENTOS DE ACUSTICA				$ 0,00		-		-		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA -ALUMINIO	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNIÓN TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL			

				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
259	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 6+6+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38, Multilaminado Crudo Antirrobo 17mm (6+6+5) (656,22), con Protección P6B (EN 356) PVB 0,76 EN AMBIENTES Y SALONES	m2	$ 2.173.844,03	737,81	$ 1.603.875.171,84		$ 0,00	737,81	$ 1.603.875.171,84	0,00	$ 0,00
260	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 EN CIRCULACIONES	M2	$ 1.520.517,10	508,96	$ 773.879.342,18	24,57	$ 37.359.105,15	508,96	$ 773.879.342,18	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
261	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B (SOPORTE SUPERIOR VENTANAS Y VOLADIZOS)	kg	$ 23.099,00	5.933,72	$ 137.063.099,92		$ 0,00	5933,31	$ 137.053.412,20	0,42	$ 9.687,72
262	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 (puente)	M2	$ 1.520.517,10	62,12	$ 94.454.522,25		$ 0,00	61,49	$ 93.502.678,55	0,63	$ 951.843,70
263	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	$ 366.407,00	7,00	$ 2.564.849,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 2.564.849,00
264	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND	$ 26.968,00	1.224,00	$ 33.008.832,00		$ 0,00	1224,00	$ 33.008.832,00	0,00	$ 0,00
265	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	m^3	$ 776.875,00	14,08	$ 10.938.400,00		$ 0,00	14,08	$ 10.938.400,00	0,00	$ 0,00
266	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	kg	$ 7.163,00	1.860,00	$ 13.323.180,00		$ 0,00	1787,55	$ 12.804.233,70	72,45	$ 518.946,30
	SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO				$ 2.669.107.397,19		$ 37.359.105,15		$ 2.665.062.070,47		$ 4.045.326,72
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
267	AGUA POTABLE			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
268	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ml	$ 11.376,00	88,07	$ 1.001.884,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	88,07	$ 1.001.884,32
269	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ml	$ 14.110,00	41,59	$ 586.834,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	41,59	$ 586.834,90
270	PUNTO HIDRAULICO PVC-P PARA 1-1/4"	und	$ 116.050,00	9,00	$ 1.044.450,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 1.044.450,00
271	REGISTO DE 1 1/2	un	$ 229.918,00	3,00	$ 689.754,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 689.754,00
272	PUNTO A.F. SANITARIO FLUXOMETRO	un	$ 94.007,00	5,00	$ 470.035,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 470.035,00
273	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" LAVAMANOS	un	$ 87.224,00	4,00	$ 348.896,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 348.896,00
274	PUNTO A.F. DUCHAS	un	$ 56.465,00	9,00	$ 508.185,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 508.185,00
275	PUNTO A.F. ORINAL FLUXOMETRO	un	$ 72.075,00	2,00	$ 144.150,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 144.150,00
	RED CONTRA INCENDIOS RCI			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
276	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 4" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	$ 196.296,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
277	ACCESORIOS PVC-C900 4"	un	$ 740.065,00	6,00	$ 4.440.390,00	6,00	$ 4.440.390,00	6,00	$ 4.440.390,00	0,00	$ 0,00
278	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 4" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	$ 196.296,00	35,30	$ 6.929.248,80	9,00	$ 1.766.664,00	9,00	$ 1.766.664,00	26,30	$ 5.162.584,80

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL		

279	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 1/2" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	$ 112.729,00	41,25	$ 4.650.071,25	41,25	$ 4.650.071,25	41,25	$ 4.650.071,25	0,00	$ 0,00
280	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 " (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	$ 87.503,00	22,10	$ 1.933.816,30	22,10	$ 1.933.816,30	22,10	$ 1.933.816,30	0,00	$ 0,00
281	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 1 1/ 2 " (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	$ 59.551,00	34,40	$ 2.048.554,40	34,40	$ 2.048.554,40	34,40	$ 2.048.554,40	0,00	$ 0,00
282	Tuberia A.G. SCH - 40 1-1/4"	ml	$ 50.949,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
283	Unión flexible Ranurada 4"	un	$ 53.323,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
284	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 4"	un	$ 42.819,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP80	RESTRICTOR HD SERIE 1200 C900 4"	UND	$ 1.454.168,35	10,00	$ 14.541.683,46	10,00	$ 14.541.683,46	10,00	$ 14.541.683,46	0,00	$ 0,00
NP81	ESTACION DE CONTROL DE ROCIADORES DE 2"	UND	$ 4.779.912,61	2,00	$ 9.559.825,21	2,00	$ 9.559.825,21	2,00	$ 9.559.825,21	0,00	$ 0,00
NP82	KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN C-900 - A/C completa	UND	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33	0,00	$ 0,00
NP83	SOPORTE ANTISISMICO 2'	UND	$ 208.123,70	4,00	$ 832.494,80	4,00	$ 832.494,80	4,00	$ 832.494,80	0,00	$ 0,00
NP84	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2'	UND	$ 216.120,70	7,00	$ 1.512.844,89	7,00	$ 1.512.844,89	7,00	$ 1.512.844,89	0,00	$ 0,00
NP85	SOPORTE ANTISISMICO 3'	UND	$ 242.895,70	7,00	$ 1.700.269,89	7,00	$ 1.700.269,89	7,00	$ 1.700.269,89	0,00	$ 0,00
				-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	RED DE AGUAS RESIDUALES			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
285	RED SANITARIA TUBERÍA PVC-S 2"	ml	$ 33.372,00	91,89	$ 3.066.553,08		$ 0,00	14,00	$ 467.208,00	77,89	$ 2.599.345,08
286	RED SANITARIA TUBERÍA PVC-S 3"	ml	$ 45.799,00	61,99	$ 2.839.080,01		$ 0,00	12,00	$ 549.588,00	49,99	$ 2.289.492,01
287	RED SANITARIA TUBERÍA PVC-S 4"	ml	$ 62.017,00	375,00	$ 23.256.375,00		$ 0,00	97,48	$ 6.045.417,16	277,52	$ 17.210.957,84
288	REVENTILACIÓN TUBERÍA PVC-V 2"	ml	$ 23.593,00	68,32	$ 1.611.873,76		$ 0,00	15,00	$ 353.895,00	53,32	$ 1.257.978,76
289	REVENTILACIÓN TUBERÍA PVC-V 3"	ml	$ 29.612,00	9,50	$ 281.314,00		$ 0,00	9,50	$ 281.314,00	0,00	$ 0,00
290	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 4"	un	$ 42.819,00	46,00	$ 1.969.674,00		$ 0,00	46,00	$ 1.969.674,00	0,00	$ 0,00
291	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" SANITARIO FLUXOMETRO	un	$ 120.145,00	9,00	$ 1.081.305,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 1.081.305,00
292	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" LAVAMANOS	un	$ 87.224,00	16,00	$ 1.395.584,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 1.395.584,00
293	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" ORINAL	un	$ 92.635,00	3,00	$ 277.905,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 277.905,00
294	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" DUCHA	un	$ 92.635,00	9,00	$ 833.715,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 833.715,00
295	SIFON CON SOSCO 4.5 CM X 3.5 CM	un	$ 29.332,00	9,00	$ 263.988,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 263.988,00
	RED DE AGUAS LLUVIAS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
299	RED SANITARIA TUBERÍA PVC-S 6"	ml	$ 112.417,00	219,48	$ 24.673.283,16		$ 0,00	79,00	$ 8.880.943,00	140,48	$ 15.792.340,16
300	ACCESORIOS PVC-S 6"	un	$ 195.848,00	12,00	$ 2.350.176,00		$ 0,00	12,00	$ 2.350.176,00	0,00	$ 0,00
301	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 6"	un	$ 52.461,00	22,00	$ 1.154.142,00		$ 0,00	22,00	$ 1.154.142,00	0,00	$ 0,00
	ITEM NO PREVISTOS			-			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP47	REJILLA TIPO GRANADA 6X4	un	$ 70.524,74	12,00	$ 846.296,88		$ 0,00	12,00	$ 846.296,88	0,00	$ 0,00
NP48	CODO SANITARIO CXC 90°X4"	un	$ 19.469,18	12,00	$ 233.630,16		$ 0,00	12,00	$ 233.630,16	0,00	$ 0,00
NP49	CODO SANITARIO CXC 45°X4"	un	$ 23.783,58	7,00	$ 166.485,06		$ 0,00	7,00	$ 166.485,06	0,00	$ 0,00
NP50	ADAPTADOR SANITARIO DE LIMPIEZA TAPON PVC 4"	un	$ 34.508,61	2,00	$ 69.017,22		$ 0,00	2,00	$ 69.017,22	0,00	$ 0,00
NP51	YEE SENCILLA SANITARIO PCV 4"	un	$ 41.989,06	14,00	$ 587.846,84		$ 0,00	14,00	$ 587.846,84	0,00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL	Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL		

NP52	UNION SANITARIO PVC CXC 4"	un	$ 13.354,79	17,00	$ 227.031,43		$ 0,00	17,00	$ 227.031,43	0,00	$ 0,00
	ITEM NO PREVISTOS	ML		-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP53	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	$ 21.468,00	198,60	$ 4.263.544,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	198,60	$ 4.263.544,80
NP54	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P 1 1/4"	ML	$ 39.826,00	26,38	$ 1.050.609,88		$ 0,00	0,00	$ 0,00	26,38	$ 1.050.609,88
NP55	RED DE SUMINSTRO DE PVC 1 1/ 2"	ML	$ 33.785,00	11,25	$ 380.081,25		$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,25	$ 380.081,25
NP56	RED DE SUMINSTRO DE PVC 2"	UND	$ 47.416,00	48,38	$ 2.293.986,08		$ 0,00	0,00	$ 0,00	48,38	$ 2.293.986,08
NP57	REGISTO DE 1/2	UND	$ 86.032,00	2,00	$ 172.064,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 172.064,00
NP58	REGISTO DE 3/4"	UND	$ 108.415,00	1,00	$ 108.415,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 108.415,00
NP59	REGISTO DE 1"	UND	$ 154.053,00	1,00	$ 154.053,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 154.053,00
NP60	REGISTO DE 2"	UND	$ 387.392,00	4,00	$ 1.549.568,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.549.568,00
	RED CONTRA INCENDIOS			-			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP61	PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2"	ML	$ 93.861,00	108,00	$ 10.136.988,00	108,00	$ 10.136.988,00	108,00	$ 10.136.988,00	0,00	$ 0,00
NP62	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO 1"SCH'40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	UND	$ 56.404,00	194,00	$ 10.942.376,00	194,00	$ 10.942.376,00	194,00	$ 10.942.376,00	0,00	$ 0,00
NP63	ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2	ML	$ 57.494,00	108,00	$ 6.209.352,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	108,00	$ 6.209.352,00
NP64	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO DE HASTA 2"	ML	$ 5.659,00	248,10	$ 1.403.997,90	248,10	$ 1.403.997,90	248,10	$ 1.403.997,90	0,00	$ 0,00
NP65	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO MAYOR A 2"	UND	$ 8.842,00	106,40	$ 940.788,80	106,40	$ 940.788,80	106,40	$ 940.788,80	0,00	$ 0,00
NP66	VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1"	UND	$ 421.954,00	1,00	$ 421.954,00	1,00	$ 421.954,00	1,00	$ 421.954,00	0,00	$ 0,00
NP67	GABINETE TIPO III	UND	$ 1.391.961,00	4,00	$ 5.567.844,00	4,00	$ 5.567.844,00	4,00	$ 5.567.844,00	0,00	$ 0,00
NP68	SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE 4"		$ 57.290,00	17,00	$ 973.930,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 973.930,00
NP69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES TUBERIA 3/4	ML	$ 81.662,00	2.674,40	$ 218.932.062,39	2674,40	$ 218.932.062,39	2674,40	$ 218.932.062,39	0,00	$ 0,00
NP70	TUBERIA PCV CONDUIT 1"	ML	$ 10.457,00	100,00	$ 1.045.700,00		$ 0,00	82,56	$ 863.329,92	17,44	$ 182.370,08
NP71	TUBERIA PCV CONDUIT 1½"	ML	$ 18.743,00	150,00	$ 2.811.450,00		$ 0,00	142,47	$ 2.670.315,21	7,53	$ 141.134,79
NP72	EXCAVACION MANUAL	M3	$ 61.761,00	152,80	$ 9.437.080,80	24,83	$ 1.533.402,11	59,78	$ 3.692.319,62	93,02	$ 5.744.761,18
	SUB TOTAL - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				**$ 402.413.073,06**		**$ 296.354.590,73**		**$ 326.229.818,13**		**$ 76.183.254,93**
	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
	RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
302	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL)	un	$ 2.016.743,79	6,00	$ 12.100.462,75		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 12.100.462,75
303	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-276 CODENSA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL)	un	$ 2.814.990,69	8,00	$ 22.519.925,50		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 22.519.925,50
	SALIDAS DE ALUMBRADO			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
304	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERIA METALICA EMT, ACCESORIOS, CONDUCTORES,CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	$ 92.413,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022								Interventoría: UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL				
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL					

	SALIDAS PARA CONTROL DE ILUMINACION			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
305	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	$ 18.562,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
306	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	$ 23.562,32	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
307	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DUAL, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO EMT DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	$ 46.562,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SALIDAS TOMACORRIENTES			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
308	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES TOMA GFCI CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	$ 107.763,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES REGULADA MONOFASICAS DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	$ 117.588,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
310	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES NORMAL CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF	un	$ 93.588,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TABLEROS Y PROTECCIONES			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
311	TG2: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL . Segun diagrama unifilar . Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identif cación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamenta con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados. CERTIFICADO RETIE	un	$ 9.873.767,24	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
312	TD2: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 2 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identif cación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las	un	$ 2.195.428,75	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL												Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022												UNIÓN TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL						

	Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE										
313	TD3: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 3 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	$ 2.195.428,75	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
314	TR2: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	$ 971.373,45	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
315	TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS Y CAJAS	ml	$ 72.687,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	COMUNICACIONES			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	VOZ, DATOS Y TV			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
316	SALIDA HDMI EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	$ 117.987,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
317	SALIDA TV EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	$ 97.771,13	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
318	SALIDA DE DATOS SENCILLA EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	$ 98.487,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
319	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	$ 118.987,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
320	SALIDA VIDEO BEAM EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION,NO INCLUYE VIDEO BEAM	un	$ 108.987,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
321	SALIDA ACCESS POINT EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION, NO INCLUYE EQUIPO	un	$ 108.987,03	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
322	Patch cord CAT 6A, UTP, Diametro Reducido 26 AWG 6.2mm, 7ft (2.1 metros), azul.	un	$ 36.762,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
323	Cable categoria 6 U/UTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul, LSZH, caja de 305 metros.	un	$ 895.906,17	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
324	Herraje plano 48 puertos UTP 6	un	$ 304.857,54	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
325	Organizador doble con tapa.	un	$ 121.868,39	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
326	Gabinete cerrado 42U 800X800 mm Puertas Microperforadas	un	$ 4.373.796,90	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
327	Organizador vertical para Gabinete de 42U, 800 mm de ancho.	un	$ 820.073,45	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
328	Multitoma Horizontal Incluye Supresor de 13kA.	un	$ 550.950,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
329	Barraje horizontal para rack	un	$ 390.073,45	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

000037

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

330	CAJA DE PASO METALICA 15X15	un	$ 95.774,69	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
331	Suministro, instalacion bandeja porta cables - tipo escalera con tapa, accesorios de 200*50	ml	$ 54.774,69	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
332	Canaleta plastica 54x100mm	ml	$ 38.774,69	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SISTEMA DE SONIDO			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
333	Cable blindado para audio Tipo 2	ml	$ 21.662,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
334	Cable categoría 6 U/UTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul. LSZH. caja de 305 metros.	un	$ 898.706,17	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CERTIFICACIONES			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
335	CERTIFICACION RETIE	gl	$ 14.539.262,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
336	CERTIFICACION RETILAP	gl	$ 10.263.662,34	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 34.620.388,26**		**0,00**		**0,00**		**$ 34.620.388,26**
	ACABADOS DE MUROS	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
337	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM	m2	$ 24.443,00	2.667,84	$ 65.210.110,90		$ 0,00	2259,33	$ 55.224.695,65	408,52	$ 9.985.415,25
338	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	m2	$ 28.956,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
339	INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO EN FACHADAS	m2	$ 247.908,51	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
340	RECUBRIMIENTO EN FACHADA CON LAMINA DE FIBROCEMENTO JUNTA MARCADA ANCLAJE MECANICO	m2	$ 194.248,30	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
341	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	m2	$ 362.286,71	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
342	COLOR PLAST FACHADA SOBRE FACHADA	m2	$ 81.419,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
343	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (lineal)	ml	$ 15.184,00	2.185,90	$ 33.190.705,60		$ 0,00	1936,26	$ 30.159.371,84	199,64	$ 3.031.333,76
344	LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO 39X5X12 REF COBRIZO DE SANTAFE	M2	$ 227.914,00	107,95	$ 24.603.658,17		$ 0,00	107,95	$ 24.603.658,17	0,00	$ 0,00
345	HILADA PARADA LADRILLO A LA VISTA	ML	$ 114.414,00	60,20	$ 6.887.722,80		$ 0,00	60,20	$ 6.887.722,80	0,00	$ 0,00
346	ENCHAPE COLUMNAS EN LADRILLO A LA VISTA	ML	$ 128.274,00	124,80	$ 16.008.595,20		$ 0,00	124,80	$ 16.008.595,20	0,00	$ 0,00
347	GROUTING DOVELAS	ML	$ 50.045,70	195,80	$ 9.803.952,63		$ 0,00	195,88	$ 9.802.951,72	0,02	$ 1.000,91
348	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	$ 7.163,00	109,60	$ 785.064,80		$ 0,00	109,60	$ 785.064,80	0,00	$ 0,00
349	ACERO FIGURADO 60000 PSI (GRAFIL DE 4 MM)	kg	$ 7.163,00	15,54	$ 111.313,02		$ 0,00	15,54	$ 111.313,02	0,00	$ 0,00
350	LAVADO DE FACHADA	M2	$ 39.236,00	163,50	$ 6.415.086,00		$ 0,00	104,51	$ 4.100.581,83	58,99	$ 2.314.501,17
NP86	ACABADO DE FACHADA EN GRANIPLAST, INCLUYE COLOR	M2	$ 189.280,74	377,00	$ 71.358.838,98		$ 0,00	0,00	$ 0,00	377,00	$ 71.358.838,98
	SUB TOTAL - ACABADOS DE MUROS				**$ 234.375.048,10**		**$ 0,00**		**$ 147.683.955,02**		**$ 86.691.093,08**
	CIELO RASOS	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
351	CIELORRASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) EN CIRCULACIONES Y AREAS COMUNES	m2	$ 67.172,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNIÓN TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL			

	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
352	CIELO RASO SUPERBOARD 8 MM (INCLUYE PINTURA) PARA FACHADA	M2	$ 180.000,00	279,60	$ 50.328.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	279,60	$ 50.328.000,00
	SUB TOTAL - CIELO RASOS				$ 50.328.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 50.328.000,00
	EQUIPOS MECANICOS - AIRE ACONDICIONADO	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE REDES DE REFRIGERACION (Incluyen aislamiento elastomerico de celda cerrada de 1/2" de espesor, soporteria, montaje y conexion)			-	$ 0,00					0,00	$ 0,00
353	Tuberia de cobre tipo L sin costura de 3/4"	ml	$ 62.715,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
354	Tuberia de cobre tipo L sin costura de 1"	ml	$ 74.200,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
355	Derivador en Y para tuberia de cobre entre condensadoras se sistema de refrigereion variable	un	$ 760.000,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - EQUIPOS MECANICOS - AIRE ACONDICIONADO				$ 0,00		-		-		$ 0,00
	URBANISMO			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4						SALDO POR EJECUTAR	
	ESTRUCTURA	UN	VALOR UNITARIO			PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		CANT	VALOR
356	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM.INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub)	m2	$ 168.699,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
357	TANQUE DE CONCRETO SUBTERRANEO DE 3.500PSI INCENDIOS	m3	$ 1.006.939,00	33,50	$ 33.732.456,50		$ 0,00	33,50	$ 33.732.456,50	0,00	$ 0,00
358	TANQUE DE CONCRETO SUBTERRANEP DE 3.500PSI SURTIDO	m3	$ 1.006.939,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
359	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	$ 7.163,00	3.670,00	$ 26.288.210,00		$ 0,00	3670,00	$ 26.288.210,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
360	PUERTA CELOSIA CUARTO SUBESTACION ELECTRICA INCLUYE BARRA ANTIPANICO	M2	$ 482.104,00	8,00	$ 3.856.832,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 3.856.832,00
361	PUERTA EN CELOSIA ACCESO CUARTO DE MAQUINAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 482.104,00	3,00	$ 1.446.312,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00
362	PUERTA METALICA CUARTO PLANTA ELECTRICA	M2	$ 482.104,00	3,00	$ 1.446.312,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00
363	PUERTA METALICA CUARTO DE MEDIDORES Y TABLEROS ELECTRICOS	M2	$ 482.104,00	3,00	$ 1.446.312,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00
364	MARCO PARA PUERTA METALICA	UN	$ 196.065,00	4,00	$ 784.260,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 784.260,00
	SUB TOTAL ESTRUCTURA				$ 69.000.694,50		$ 0,00		$ 60.020.666,50		$ 8.980.028,00
	PORTERIAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4						SALDO POR EJECUTAR	
	PORTERIAS	UN	VALOR UNITARIO			PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		CANT	VALOR
365	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	m²	$ 8.407,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
366	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m³	$ 20.198,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
	FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

367	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m3	$ 410.402,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
368	ZAPATAS Y VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 776.875,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
369	PEDESTAL EN CONCRETO DE 300 PSI	M3	$ 776.875,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
370	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	$ 741.244,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
371	COLUMNA EN CONCRETO 3500 PSI	m3	$ 741.244,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
372	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m3	$ 814.928,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
373	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp: 0,15 mts	m2	$ 129.056,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
374	ACERO FIGURADO 60000 PSI ZAPATAS, VIGAS, PEDESTAL DE CIMENTACION	kg	$ 7.163,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
375	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m²	$ 114.594,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
376	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ml	$ 64.753,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
377	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	$ 23.099,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
378	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	$ 24.443,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
379	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (lineal)	ml	$ 15.184,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
380	TEJA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA A360	M2	$ 80.055,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
381	MAMPOSTERIA	ML	$ 33.190,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
382	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2	$ 36.751,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
383	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	un	$ 233.770,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
384	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO MONTECARLO REDONDO DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	un	$ 1.098.908,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
385	CANECA EN ACERO INOXIDABLE	un	$ 287.620,67	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
386	DISPENSADOR DE PAPEL	un	$ 198.521,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
387	DOSIFICADOR DE JABÓN LIQUIDO	un	$ 222.221,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
388	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	un	$ 37.340,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
389	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM , SIN BICELAR CON BORDE PULIDO Y SIN MARCO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO.EN BAÑOS	M2	$ 91.565,30	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - PORTERIAS				**$ 0,00**		-		-		**$ 0,00**
	CUARTO DE BOMBAS	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
	ITEMS NO PREVISTOS						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
390	MAMPOSTERIA	M2	$ 53.570,00	44,07	$ 2.360.829,90		$ 0,00	38,68	$ 2.072.087,60	5,39	$ 288.742,30
391	MAMPOSTERIA	ML	$ 33.190,00	23,00	$ 763.370,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 763.370,00

000040

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL												Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022												UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL						

392	PAÑETE	M2	$ 29.192,00	81,48	$ 2.378.564,16		$ 0,00	81,48	$ 2.378.564,16	0,00	$ 0,00
393	PAÑETE	ML	$ 17.987,00	23,00	$ 413.701,00		$ 0,00	23,00	$ 413.701,00	0,00	$ 0,00
394	COLUMNAS EN CONCRETO 3,000 PSI	M3	$ 1.038.556,00	0,60	$ 623.133,60		$ 0,00	0,44	$ 453.997,34	0,16	$ 169.136,26
395	ACERO (columnetas)	KG	$ 7.163,00	52,00	$ 372.476,00		$ 0,00	52,00	$ 372.476,00	0,00	$ 0,00
396	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.08 MTR	m2	$ 104.549,00	17,45	$ 1.824.380,05		$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,45	$ 1.824.380,05
397	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2	$ 36.751,00	17,46	$ 641.672,46		$ 0,00	17,46	$ 641.672,46	0,00	$ 0,00
398	IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO	M2	$ 56.526,00	19,19	$ 1.084.733,94		$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,19	$ 1.084.733,94
399	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	$ 9.820,00	106,84	$ 1.049.168,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	106,84	$ 1.049.168,80
400	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2	$ 36.751,00	17,46	$ 641.672,46		$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,46	$ 641.672,46
401	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0,20X0,12	ml	$ 37.721,14	16,90	$ 637.487,27		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,90	$ 637.487,27
402	COLUMNETAS EN CONCRETO 3,000 PSI	ML	$ 67.753,00	26,40	$ 1.788.679,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00	26,40	$ 1.788.679,20
403	ANCLAJES	UN	$ 26.968,00	44,00	$ 1.186.592,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 1.186.592,00
404	ACERO	KG	$ 7.163,00	26,40	$ 189.103,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00	26,40	$ 189.103,20
NP87	PUERTA CORTAFUEGO	UND	$ 7.704.186,40	2,00	$ 15.408.372,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 15.408.372,80
NP88	INSTALACION BOMBAS DE AGUA	UND	$ 1.123.030,00	1,00	$ 1.123.030,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.123.030,00
NP89	INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO	UND	$ 2.312.120,00	1,00	$ 2.312.120,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.312.120,00
	SUB TOTAL - CUARTO DE BOMBAS				**$ 34.799.086,84**		**$ 0,00**		**$ 6.332.498,56**		**$ 28.466.588,28**
	CUARTO SUBESTACION ELECTRICA		**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**	
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
405	DESCAPOTE	M2	$ 8.407,00	73,19	$ 615.308,33		$ 0,00	73,19	$ 615.308,33	0,00	$ 0,00
406	REPLANTEO	M2	$ 12.445,00	39,65	$ 493.444,25		$ 0,00	39,65	$ 493.444,25	0,00	$ 0,00
407	EXCAVACION MANUAL	M3	$ 61.761,00	168,33	$ 10.396.229,13		$ 0,00	168,33	$ 10.396.229,13	0,00	$ 0,00
408	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	M3	$ 410.402,00	21,46	$ 8.807.226,92		$ 0,00	3,26	$ 1.336.422,81	18,20	$ 7.470.804,11
409	CONCRETO ZAPATA	M3	$ 741.244,00	4,90	$ 3.632.095,60		$ 0,00	4,90	$ 3.629.130,62	0,00	$ 2.964,98
410	CONCRETO VIGAS	M3	$ 741.244,00	1,54	$ 1.141.515,76		$ 0,00	1,51	$ 1.120.205,00	0,03	$ 21.310,77
411	PLACA DE CONTRAPISO	M2	$ 129.056,00	39,65	$ 5.117.070,40		$ 0,00	39,65	$ 5.117.070,40	0,00	$ 0,00
412	PLACA DE CUBIERTA	M2	$ 111.414,00	45,86	$ 5.109.446,04		$ 0,00	45,15	$ 5.029.785,03	0,72	$ 79.661,01
413	MAMPOSTERIA	M2	$ 53.570,00	66,90	$ 3.583.833,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	66,90	$ 3.583.833,00
414	MAMPOSTERIA	ML	$ 33.190,00	10,40	$ 345.176,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,40	$ 345.176,00
415	PAÑETE	M2	$ 29.192,00	140,22	$ 4.093.302,24		$ 0,00	0,00	$ 0,00	140,22	$ 4.093.302,24
416	PAÑETE	ML	$ 17.987,00	71,60	$ 1.287.869,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00	71,60	$ 1.287.869,20
417	COLUMNAS EN CONCRETO 3,000 PSI	ML	$ 1.038.556,00	1,46	$ 1.516.291,76		$ 0,00	1,39	$ 1.443.592,84	0,07	$ 72.698,92
418	AFINADO CUBIERTA	M2	$ 36.751,00	41,30	$ 1.517.816,30		$ 0,00	0,00	$ 0,00	41,30	$ 1.517.816,30
419	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	$ 56.526,00	43,33	$ 2.449.271,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	43,33	$ 2.449.271,58
420	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	$ 9.820,00	173,03	$ 1.699.154,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	173,03	$ 1.699.154,60
421	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2	$ 36.751,00	34,35	$ 1.262.396,85		$ 0,00	0,00	$ 0,00	34,35	$ 1.262.396,85
422	COLUMNETAS EN CONCRETO 3,000 PSI	ML	$ 67.753,00	40,00	$ 2.710.120,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 2.710.120,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022		PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL					

423	ANCLAJES	UN	$ 26.968,00	52,00	$ 1.402.336,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	52,00	$ 1.402.336,00	
424	ACERO	KG	$ 7.163,00	2.330,00	$ 16.689.790,00		$ 0,00	2327,55	$ 16.672.209,13	2,45	$ 17.580,87	
NP90	PUERTA CORTAFUEGO	UND	$ 7.704.186,40	5,00	$ 38.520.932,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 38.520.932,00	
	SUB TOTAL - CUARTO SUBESTACION				**$ 112.390.625,96**		**$ 0,00**		**$ 45.853.397,54**		**$ 66.537.228,42**	
	CONEXIONES SANITARIAS	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**		
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
425	CAJA DE INSPECION 80X80	UND	$ 627.114,00	18,00	$ 11.288.052,00		$ 0,00	8,00	$ 5.016.912,00	10,00	$ 6.271.140,00	
426	INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 2"	ML	$ 3.988,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
427	INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML	$ 4.075,00	204,16	$ 831.952,00		$ 0,00	115,93	$ 472.414,75	88,23	$ 359.537,25	
428	RED SANITARIA PVC 2"	ML	$ 45.197,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
429	RED SANITARIA PVC 6"	ML	$ 120.298,00	204,16	$ 24.560.039,68		$ 0,00	115,93	$ 13.946.147,14	88,23	$ 10.613.892,54	
430	RED REVENTILACION DE 2"	ML	$ 25.573,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
431	REJILLA DE PISO DE 0,30 MTS	UND	$ 140.367,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
432	SALIDA SANITARIO DE 2"	UND	$ 62.017,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
433	BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	$ 49.231,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
434	EXCAVACION MANUAL	M3	$ 46.880,00	265,00	$ 12.423.200,00		$ 0,00	21,45	$ 1.005.482,24	243,55	$ 11.417.717,76	
	SUB TOTAL - CONEXIONES SANITARIAS				**$ 49.103.243,68**		**0,00**		**20.440.956,13**		**$ 28.662.287,55**	
	ZONAS DURA ANDENES	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**		**ACUMULADO ACTAS**		**SALDO POR EJECUTAR**		
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	
435	REPLANTEO	M2	$ 12.445,00	994,94	$ 12.382.028,30		$ 0,00	994,91	$ 12.381.679,84	0,03	$ 348,46	
436	EXCAVACION MANUAL	M3	$ 61.761,00	398,03	$ 24.582.435,55		$ 0,00	270,80	$ 16.724.878,80	127,23	$ 7.857.556,75	
437	RELLENO RECEBO COMPACTADO	M3	$ 89.878,00	199,00	$ 17.885.722,00		$ 0,00	161,00	$ 14.470.070,39	38,00	$ 3.415.651,61	
438	MATERIAL GRANUULAR FILTRANTE B-200 (Via peatonal y zonas y zonas duras)	m3	$ 107.111,00	199,00	$ 21.315.089,00		$ 0,00	160,23	$ 17.162.781,13	38,77	$ 4.152.307,87	
439	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m3	$ 410.402,00	49,75	$ 20.417.499,50		$ 0,00	33,55	$ 13.769.807,90	16,20	$ 6.647.691,60	
440	PLACA BASE DE CONCRETO 0,15 2500 PSI	M2	$ 101.649,00	994,94	$ 101.134.656,06		$ 0,00	671,04	$ 68.210.411,26	323,90	$ 32.924.244,80	
441	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ml	$ 122.655,00	869,77	$ 106.681.639,35		$ 0,00	357,72	$ 43.876.146,60	512,05	$ 62.805.492,75	
442	REFUERZO MALLA ELECTROSALDADA	KG	$ 11.600,00	1.532,21	$ 17.773.636,00		$ 0,00	1235,37	$ 14.330.315,20	296,84	$ 3.443.320,80	
	VIA PORTERIA-CUARTOS TECNICOS Y PARQUEADEROS			-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
NP91	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	m2	$ 13.600,00	609,99	$ 8.295.881,31		$ 0,00	0,00	$ 0,00	609,99	$ 8.295.881,31	
NP92	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=20 M Y APILE A 15 M	m2	$ 10.198,00	609,99	$ 6.220.691,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	609,99	$ 6.220.691,00	
NP93	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) (PLAZOLETA PRINCIPAL)	m3	$ 28.229,00	487,99	$ 13.775.554,91		$ 0,00	0,00	$ 0,00	487,99	$ 13.775.554,91	

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL		

NP94	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXPLANACIONES, CANALES, PRESTAMOS, SOBE ACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	$ 1.735,00	792,99	$ 1.375.835,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	792,99	$ 1.375.835,32
NP95	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (Via vehicular y ciclo parqueadero)	m3	$ 156.908,00	244,00	$ 38.285.004,25		$ 0,00	0,00	$ 0,00	244,00	$ 38.285.004,25
NP96	RELLENOS AGREGADOS EN MATERIAL DE BASE COMPATACTADO MECANICAMENTE (Via vehicular)	m3	$ 207.171,00	213,50	$ 44.230.375,69		$ 0,00	0,00	$ 0,00	213,50	$ 44.230.375,69
NP97	CONCRETO CLASE C, F'C =3000 PSI (Zona vehicular)	m3	$ 1.049.460,00	152,50	$ 160.040.360,29		$ 0,00	0,00	$ 0,00	152,50	$ 160.040.360,29
NP98	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ml	$ 96.418,00	569,30	$ 54.890.767,40		$ 0,00	0,00	$ 0,00	569,30	$ 54.890.767,40
NP99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1800	m2	$ 10.421,00	1.748,59	$ 18.222.069,65		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1748,59	$ 18.222.069,65
					$ 667.509.245,58		**$ 0,00**		**$ 200.926.091,13**		**$ 466.583.154,45**

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UN	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
443	SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES	UN	$ 5.000.000,00	2,00	$ 10.000.000,00		$ 0,00	2,00	$ 10.000.000,00	0,00	$ 0,00
444	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS	m3	$ 15.711,00	1.945,73	$ 30.569.364,03		$ 0,00	1945,73	$ 30.569.285,48	0,01	$ 78,56
445	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	M3	$ 11.076,00	2.362,42	$ 26.166.151,60		$ 0,00	2362,42	$ 26.166.151,60	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			-	**$ 66.735.515,63**		**$ 0,00**		**$ 66.735.437,08**		**$ 78,56**
	SUB-TOTAL FASE III OBRA				**$ 20.441.487.197,41**		**$ 372.516.972,79**		**$ 19.274.818.280,16**		**$ 1.166.668.917,25**
	SUB TOTAL DISEÑOS				$ 2.956.066.834,93				$ 2.956.066.834,93		$ 0,00
	IVA	**19%**			$ 561.652.698,64		$ 0,00		$ 561.652.698,64		$ 0,00
	TOTAL				**$ 3.517.719.533,57**		**$ 0,00**		**$ 3.517.719.533,57**		**$ 0,00**
	COSTO DIRECTO DE OBRA				**$ 20.441.487.197,41**		**$ 372.516.972,79**		**$ 19.274.818.280,16**		**$ 1.166.668.917,25**
	Administrativos	18%			$ 3.679.467.695,53		$ 67.053.055,10		$ 3.469.467.290,43		$ 210.000.405,10
	Imprevistos	2%			$ 408.829.743,95		$ 7.450.339,46		$ 385.496.365,60		$ 23.333.378,34
	Utilidad	10%			$ 2.044.148.719,74		$ 37.251.697,28		$ 1.927.481.828,02		$ 116.666.891,72
	TOTAL FASE III				**$ 26.573.933.356,58**		**$ 484.272.064,63**		**$ 25.057.263.764,21**		**$ 1.516.669.592,37**
	VALOR TOTAL FASE I y III				**$ 30.091.652.890,15**		**$ 484.272.064,63**		**$ 28.574.983.297,78**		**$ 1.516.669.592,37**

0080 43

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

ADICION N°3											
No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
1	EQUIPOS	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP- V1.1	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM200CXVAFC/AZ (UC2-P3-ED2)	UN	$ 65.913.143,94	1,00	$ 65.913.143,94		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 65.913.143,94
NP-V1.2	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM220CXVAFC/AZ (UC1-P3-ED2)	UN	$ 78.079.129,66	1,00	$ 78.079.129,66		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 78.079.129,66
NP-V1.3	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM460CXVAFC/AZ (UC-P3-LF-3)	UN	$ 102.562.903,94	1,00	$ 102.562.903,94		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 102.562.903,94
NP-1.4	Unidad Casette 1 via AM028NN1DKH/EU (CS1)	UN	$ 7.978.620,03	3,00	$ 23.935.860,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 23.935.860,09
NP-V1.5	Unidad Casette 1 via AM036NN1DKH/EU (CS1)	UN	$ 8.587.371,43	1,00	$ 8.587.371,43		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.587.371,43
NP-V1.6	Unidad Casette 4 vias AM009NN4DCH/AA (CS4)	UN	$ 8.808.506,16	2,00	$ 17.617.012,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 17.617.012,32
NP-V1.7	Unidad Casette 4 vias AM012NN4DCH/AA (CS4)	UN	$ 8.822.207,76	1,00	$ 8.822.207,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.822.207,76
NP-V1.8	Unidad Fancoil tipo ducto LSP AM028KNLDEH/EU (FC)	UN	$ 7.637.484,36	1,00	$ 7.637.484,36		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.637.484,36
NP-V1.9	Unidad Fancoil tipo ducto MSP AM036KNMDCH/AZ (FC)	UN	$ 10.685.217,29	10,00	$ 106.852.172,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 106.852.172,87
NP-V1.10	Unidad Fancoil tipo ducto MSP AM056ANMPKH/EU (FC)	UN	$ 9.301.553,29	1,00	$ 9.301.553,29		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.301.553,29
NP-V1.11	Unidad Fancoil tipo ducto MSPAM071ANMPKH/EU (FC)	UN	$ 9.903.393,29	4,00	$ 39.613.573,15		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 39.613.573,15
NP-V1.12	Unidad Fancoil tipo ducto MSP AM090ANMPKH/EU (FC)	UN	$ 10.587.688,29	3,00	$ 31.763.064,86		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 31.763.064,86

000044

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL			

NP-V1.13	Unidad Fancoil tipo ducto MSP AM090ANMPKH/EU (FC)	UN	$ 10.606.277,29	3,00	$ 31.818.831,86		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 31.818.831,86
NP-V1.14	Unidad Fancoil tipo ducto HSP AM036ANHDCH/AA (FC)	UN	$ 12.270.957,29	1,00	$ 12.270.957,29		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 12.270.957,29
NP-V1.15	Unidad Fancoil tipo ducto HSP AM076FNHDCH/AA (FC)	UN	$ 25.527.357,29	3,00	$ 76.582.071,86		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 76.582.071,86
NP-V1.16	Unidad expansion directa 1-1 12,000 btu/h (UC-E3-EDF2)	UN	$ 15.003.040,90	1,00	$ 15.003.040,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 15.003.040,90
NP-V1.17	Unidad de extraccion helicocentrifuga 420 CFM – 0,6 Inwg (VE-01)	UN	$ 5.372.956,00	3,00	$ 16.118.867,99		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 16.118.867,99
NP-V1.18	Unidad de extraccion helicocentrifuga 350 CFM – 0,5 Inwg VE-02	UN	$ 5.372.956,00	1,00	$ 5.372.956,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.372.956,00
NP-V1.19	Unidad de extraccion helicocentrifuga 430 CFM – 0,6 Inwg VE-03	UN	$ 5.372.956,00	1,00	$ 5.372.956,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.372.956,00
NP-V1.20	Unidad de extraccion helicocentrifuga 500 CFM – 0,7 Inwg VE-04	UN	$ 5.699.306,00	1,00	$ 5.699.306,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.699.306,00
NP-V1.21	Unidad de extraccion helicocentrifuga 600 CFM – 0,7 Inwg VE-05	UN	$ 5.699.306,00	1,00	$ 5.699.306,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.699.306,00
NP-V1.22	Unidad de extraccion helicocentrifuga 530 CFM – 0,6 Inwg VE-06	UN	$ 5.685.162,00	1,00	$ 5.685.162,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.685.162,00
NP-V1.23	unidad de extraccion falso plafon 70 CFM 0,2Inwg VE-07_VE08_VE-09	UN	$ 2.532.283,00	2,00	$ 5.064.565,99		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 5.064.565,99
NP-V1.24	Unidad de ventilacion 3500 CFM@2,2 Inwg con filtro Merv 8+Merv 13	UN	$ 35.068.756,74	1,00	$ 35.068.756,74		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 35.068.756,74
NP-V1.25	Unidad de ventilacion 4100 CFM@2,2 Inwg con filtro Merv 8+Merv 13	UN	$ 36.617.033,24	1,00	$ 36.617.033,24		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 36.617.033,24
			SUB TOTAL EQUIPOS		**$ 757.059.289,53**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 757.059.289,53**

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNIÓN TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
2,00	TUBERIA COBRE	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V2,01	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluye aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1/4"	ML	$ 182.378,79	32,27	$ 5.885.363,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	32,27	$ 5.885.363,58
NP-V2,02	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/8"	ML	$ 205.222,79	236,67	$ 48.570.077,89		$ 0,00	0,00	$ 0,00	236,67	$ 48.570.077,89
NP-V2,03	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1/2"	ML	$ 235.928,79	109,31	$ 25.789.376,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	109,31	$ 25.789.376,12
NP-V2,04	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø5/8"	ML	$ 289.361,67	270,43	$ 78.252.075,15		$ 0,00	0,00	$ 0,00	270,43	$ 78.252.075,15
NP-V2,05	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/4"	ML	$ 342.109,67	87,73	$ 30.013.280,94		$ 0,00	0,00	$ 0,00	87,73	$ 30.013.280,94
NP-V2,06	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø7/8"	ML	$ 396.311,67	65,11	$ 25.803.852,53		$ 0,00	0,00	$ 0,00	65,11	$ 25.803.852,53
NP-V2,07	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1"	ML	$ 500.213,67	5,00	$ 2.501.068,33		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 2.501.068,33
NP-V2,08	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ¼"	ML	$ 700.741,22	5,00	$ 3.503.706,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 3.503.706,09
NP-V2,09	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ⅝"	ML	$ 591.064,40	129,08	$ 76.294.592,92		$ 0,00	0,00	$ 0,00	129,08	$ 76.294.592,92
NP-V2,10	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ⅜"	ML	$ 690.223,35	11,68	$ 8.061.808,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,68	$ 8.061.808,71
NP-V2,11	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø7/8"	ML	$ 185.430,71	8,00	$ 1.483.445,70		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.483.445,70

000046

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL			

NP-V2.12	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø5/8"	ML	$ 185.430,71	6,00	$ 1.112.584,28		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.112.584,28
NP-V2.13	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø3/8"	ML	$ 178.900,71	12,00	$ 2.146.808,55		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 2.146.808,55
NP-V2.14	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø3/4"	ML	$ 191.958,71	7,00	$ 1.343.710,99		$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.343.710,99
NP-V2.15	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø1/4"	ML	$ 178.900,71	1,00	$ 178.900,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 178.900,71
NP-V2.16	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø1/2"	ML	$ 178.900,71	8,00	$ 1.431.205,70		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.431.205,70
NP-V2.17	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø 1 ⅜"	ML	$ 205.014,71	6,00	$ 1.230.088,28		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.230.088,28
NP-V2.18	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø1 ⅛"	ML	$ 198.486,71	3,00	$ 595.460,14		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 595.460,14
NP-V2.19	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø 1 ¼"	ML	$ 198.486,71	6,00	$ 1.190.920,28		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.190.920,28
NP-V2.20	Y join Branch MXJ-YA1509M	UND	$ 1.602.524,23	12,00	$ 19.230.290,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 19.230.290,76
NP-V2.21	Y join Branch MXJ-YA2512M	UND	$ 2.118.278,26	14,00	$ 29.655.895,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 29.655.895,58
NP-V2.22	Y join Branch MXJ-YA2812M	UND	$ 2.413.660,81	14,00	$ 33.791.251,37		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 33.791.251,37
NP-V2.23	Y join Branch MXJ-YA2815M	UND	$ 2.654.425,61	12,00	$ 31.853.107,34		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 31.853.107,34
NP-V2.24	Y join Branch MXJ-YA3419M	UND	$ 3.239.859,06	4,00	$ 12.959.436,22		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 12.959.436,22

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

NP-V2.25	Y join Branch MXJ-YA4119M	UND	$ 3.519.867,06	2,00	$ 7.039.734,11		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 7.039.734,11
NP-V2.26	Y join Branch MXJ-TA3419M	UND	$ 2.910.023,06	2,00	$ 5.820.046,11		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 5.820.046,11
NP-V2.27	Refrigerante R410A	KG	$ 230.241,59	70,00	$ 16.116.911,30		$ 0,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 16.116.911,30
			SUB TOTAL TUBERIA DE COBRE		$ 471.854.999,65		$ 0,00		$ 0,00		$ 471.854.999,65

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
3,00	CONDUCTOS	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V3.1	Conductos en poliisocianurato de 20 mm	M2	$ 385.151,54	717,00	$ 276.153.655,83		$ 0,00	0,00	$ 0,00	717,00	$ 276.153.655,83
NP-V3.2	Conductos en lamina galvanizada cal 24	M2	$ 260.924,97	600,00	$ 156.554.983,68		$ 0,00	0,00	$ 0,00	600,00	$ 156.554.983,68
			SUB TOTAL CONDUCTOS		$ 432.708.639,51		$ 0,00		$ 0,00		$ 432.708.639,51

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
4,00	DIFUSORES Y REJILLAS	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V4.01	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 6"x6"	UND	$ 472.987,69	47,00	$ 22.230.421,34		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 22.230.421,34
NP-V4.02	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 9"x9"	UND	$ 584.165,69	51,00	$ 29.792.450,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 29.792.450,09
NP-V4.03	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 12"x12"	UND	$ 695.349,69	47,00	$ 32.681.435,34		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 32.681.435,34

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022	Interventoría: UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL		

NP.V4.04	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 14"x14"	UND	$ 801.697,69	6,00	$ 4.810.186,13		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 4.810.186,13
NP-V4.05	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 18"x18"	UND	$ 1.028.903,69	9,00	$ 9.260.133,19		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 9.260.133,19
NP-V4.06	Rejilla de retorno L-RA 6"x6"	UND	$ 333.054,96	47,00	$ 15.653.583,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 15.653.583,12
NP-V4.07	Rejilla de retorno L-RA 8"x21"	UND	$ 527.124,45	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-V4.08	Rejilla de retorno L-RA 10"x12"	UND	$ 398.711,45	51,00	$ 20.334.284,01		$ 0,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 20.334.284,01
NP-V4.09	Rejilla de retorno L-RA 12"x18"	UND	$ 448.180,96	47,00	$ 21.064.505,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 21.064.505,12
NP-V4.10	Rejilla de retorno L-RA 18"x18"	UND	$ 710.242,53	9,00	$ 6.392.182,79		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 6.392.182,79
NP-V4-11	Rejilla de extraccion en muro L-OL-4 12"x12"	UND	$ 1.036.037,45	1,00	$ 1.036.037,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.036.037,45
NP-V4.12	Rejilla de retorno L-RA 12"x30"	UND	$ 732.104,45	1,00	$ 732.104,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 732.104,45
NP-V4.13	Rejilla de extraccion en muro L-OL-4 20"x12"	UND	$ 1.381.672,45	6,00	$ 8.290.034,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 8.290.034,71
			SUBTOTAL DIFUSORES Y REJILLAS		$ 172.277.357,73		$ 0,00		$ 0,00		$ 172.277.357,73

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
5,00	DAMPER DE BALANCEO	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V5.01	Damper manual de balanceo 8"x6"	UND	$ 902.331,96	4,00	$ 3.609.327,84		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.609.327,84

050049

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

NP-V5.02	Damper manual de balanceo 8"x8"	UND	$ 979.522,45	18,00	$ 17.631.404,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 17.631.404,12
NP-V5.03	Damper manual de balanceo 10"x6"	UND	$ 957.254,45	1,00	$ 957.254,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 957.254,45
NP-V5.04	Damper manual de balanceo 10"x4"	UND	$ 957.254,45	1,00	$ 957.254,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 957.254,45
NP-V5.05	Damper manual de balanceo 10"x8"	UND	$ 1.057.472,45	2,00	$ 2.114.944,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.114.944,90
NP-V5.06	Damper manual de balanceo 10"x10"	UND	$ 1.146.556,45	16,00	$ 18.344.903,22		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 18.344.903,22
NP-V5.07	Damper manual de balanceo 12"x8"	UND	$ 1.124.284,45	3,00	$ 3.372.853,35		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 3.372.853,35
NP-V5.08	Damper manual de balanceo 12"x12"	UND	$ 1.346.992,45	1,00	$ 1.346.992,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.346.992,45
NP-V5.09	Damper manual de balanceo 16"x10"	UND	$ 1.424.946,45	4,00	$ 5.699.785,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 5.699.785,80
NP-V5.10	Damper manual de balanceo 18"x8"	UND	$ 1.346.992,45	1,00	$ 1.346.992,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.346.992,45
NP-V5.11	Damper manual de balanceo 20"x10"	UND	$ 1.536.300,45	2,00	$ 3.072.600,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.072.600,90
	SUB TOTAL DAMPER DE BALANCEO				**$ 58.454.313,95**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 58.454.313,95**

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
6.00	SISTEMA DE CONTROL	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU-21.14	Tubería conduit EMT galvanizada de 3/4	ML	$ 39.995,00	1.120,00	$ 44.794.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1120,00	$ 44.794.400,00
NP-V6.01	Cable de control 2x18 blindado y apantallado	ml	$ 57.158,54	600,00	$ 34.295.124,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	600,00	$ 34.295.124,00

000030

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

NP-V6.02	Cable de control 2x16 vehicular	ml	$ 73.996,36	520,00	$ 38.478.108,66		$ 0,00	0,00	$ 0,00	520,00	$ 38.478.108,66
NP-V6.03	Tuberia para control IMC 3/4"	ml	$ 208.887,74	40,00	$ 8.355.509,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 8.355.509,60
NP-V6.04	Control central para equipos , capacidad de 128-256 unidades interiores, pantalla tactil	UND	$ 16.734.060,00	2,00	$ 33.468.120,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 33.468.120,00
NP-V6.05	Termostato alambrado para unidad tipo fan coil vrf	UND	$ 1.651.964,80	26,00	$ 42.951.084,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	26,00	$ 42.951.084,80
NP-V6.06	Programador horario unidades de extraccion y ventilacion	UND	$ 1.401.014,00	10,00	$ 14.010.140,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 14.010.140,00
			SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL		**$ 216.352.487,06**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 216.352.487,06**

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
7,00	ACABADOS	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU-4.12	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B (ESCALERA CARACOL Y DE GATO)	KG	$ 26.194,00	282,26	$ 7.393.518,44		$ 0,00	0,00	$ 0,00	282,26	$ 7.393.518,44
ICCU-4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$ 10.491,00	5.736,25	$ 60.178.998,75		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5736,25	$ 60.178.998,75
ICCU-5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI E=0.1 (INLCUYE REFUERZO)	M2	$ 146.380,00	10,30	$ 1.507.714,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,30	$ 1.507.714,00
ICCU-9.24	ESPEJOS BISELADOS INCOLORO	M2	$ 82.657,00	23,00	$ 1.901.111,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 1.901.111,00
ICCU-9.27	VIDRIO TEMPLADO 10 MM (DIVISIONES OFICINA Y BAÑO)	M2	$ 486.139,00	92,66	$ 45.045.639,74		$ 0,00	0,00	$ 0,00	92,66	$ 45.045.639,74
ICCU-10.12	DIVISION DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H:1,8, E= 6MM	M2	$ 735.860,00	28,00	$ 20.604.080,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 20.604.080,00

13003

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL										Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022										UNION TEMPORAL INTER-CURTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022		PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL				

ICCU-10.15	DIVISION DE BAÑO ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 20	M2	$ 1.095.993,00	87,82	$ 96.250.105,26		$ 0,00	0,00	$ 0,00	87,82	$ 96.250.105,26
ICCU-13.4	ALISTADO DE PISOS 1:3, E=0,04 MM	M2	$ 41.345,00	2.757,81	$ 114.021.654,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2757,81	$ 114.021.654,45
ICCU-14.19	PASO DE ESCALERA GRANITO	ML	$ 186.497,00	216,00	$ 40.283.352,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	216,00	$ 40.283.352,00
ICCU-14.33	REJILLA METALICA TRADICIONAL 3X2 CON SOSCO	UND	$ 22.821,00	28,00	$ 638.988,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 638.988,00
ICCU-14.41	CERAMICA PISO TRAFICO 5 CALIDAD PRIMERA	M2	$ 94.481,00	1.098,13	$ 103.752.420,53		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1098,13	$ 103.752.420,53
ICCU-15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (ZONA DE CIRCULACION, PASILLOS, PUNTOS FIJOS Y BAÑOS)	M2	$ 85.401,00	1.228,93	$ 104.951.850,93		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1228,93	$ 104.951.850,93
ICCU- 17.10	SUMINSTRO E INSTALACION DE DUCHA MEZCLADORA	UND	$ 299.338,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ICCU-18.14	ESTUCO PLASTICO	M2	$ 12.014,00	1.288,30	$ 15.477.636,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1288,30	$ 15.477.636,20
ICCU-18.15	ESTUCO PLASTICO	ML	$ 7.638,00	851,91	$ 6.506.888,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	851,91	$ 6.506.888,58
ICCU-18.16	VINILO 3 MANOS	M2	$ 25.503,00	2.140,21	$ 54.581.775,63		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2140,21	$ 54.581.775,63
NP-A01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	M2	$ 338.679,03	2.822,53	$ 955.931.716,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2822,53	$ 955.931.716,90
NP-A02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	ML	$ 109.326,50	1.703,24	$ 186.209.270,24		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1703,24	$ 186.209.270,24
NP-A03	PUERTA CORTAFUEGO (SALIDAD DE EMERGENCIAS)	UND	$ 7.714.486,40	4,00	$ 30.857.945,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 30.857.945,60

000052

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022		PROYECTO:		COMPLEJO CULTURAL					

NP-A04	SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	$ 1.568.108,14	25,00	$ 39.202.703,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 39.202.703,60
NP-A05	ORINAL INSTITUCIONAL	UND	$ 1.989.758,14	6,00	$ 11.938.548,86		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 11.938.548,86
NP-A06	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS INSTITUCIONAL	UND	$ 945.230,18	5,00	$ 4.726.150,89		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 4.726.150,89
NP-A07	GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL	UND	$ 639.518,11	34,00	$ 21.743.615,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	34,00	$ 21.743.615,76
NP-A08	BARRA DISCAPACITADO	UND	$ 245.659,05	2,00	$ 491.318,11		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 491.318,11
NP-A09	DISPENSADOR DE PAPEL	UND	$ 437.112,07	25,00	$ 10.927.801,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 10.927.801,80
NP-A10	PAPELERA METALICA ANTIBANDALICA	UND	$ 601.212,07	27,00	$ 16.232.725,94		$ 0,00	0,00	$ 0,00	27,00	$ 16.232.725,94
NP-A11	SECADOR AUTOMOATICO DE MANOS	UND	$ 1.276.518,11	5,00	$ 6.382.590,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 6.382.590,54
NP-A12	PUERTAS DE MADERA	UND	$ 1.422.511,84	14,00	$ 19.915.165,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 19.915.165,76
NP-A13	BARANDAS METALICAS	M2	$ 1.479.586,40	40,05	$ 59.257.435,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,05	$ 59.257.435,32
NP-A14	DISPENSADOR DE JABON DE EMPOTRAR	UND	$ 522.618,11	10,00	$ 5.226.181,08		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 5.226.181,08
NP-A15	DUCHA ANTIVANDALICA CON REGADERA DE EMPOTRAR	UND	$ 767.818,11	16,00	$ 12.285.089,73		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 12.285.089,73
				16	$ 2.054.423.993,65		$ 0,00		$ 0,00		$ 2.054.423.993,65

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL											Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022											UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL				

8,00	URBANISMO	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU-1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=20 M Y APILE A 15 M	m2	$ 10.198,00	658,97	$ 6.720.176,06		$ 0,00	0,00	$ 0,00	658,97	$ 6.720.176,06
ICCU-1.41	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	m2	$ 13.600,00	658,97	$ 8.961.992,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	658,97	$ 8.961.992,00
ICCU - 600,1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) (Via vehicular y parqueaderos)	m3	$ 28.229,00	271,18	$ 7.655.140,22		$ 0,00	0,00	$ 0,00	271,18	$ 7.655.140,22
ICCU - 1.6	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXPLANACIONES, CANALES, PRESTAMOS, SOBE ACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	$ 1.735,00	10.223,49	$ 17.737.748,21		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10223,49	$ 17.737.748,21
ICCU- 2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3,500 PSI 0.50 X 0.50 X 0.20 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	$ 867.072,00	20,20	$ 17.514.854,40		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,20	$ 17.514.854,40
ICCU- 2.7	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3,500 PSI 0.30 X 0.40 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	$ 924.714,00	36,00	$ 33.289.704,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	36,00	$ 33.289.704,00
ICCU- 2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3,500 PSI 0,12 X 0,15 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	$ 924.714,00	25,19	$ 23.293.545,66		$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,19	$ 23.293.545,66
ICCU - 3,22	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (Via vehicular y ciclo parqueadero)	m3	$ 156.908,00	84,74	$ 13.296.383,92		$ 0,00	0,00	$ 0,00	84,74	$ 13.296.383,92
ICCU-4,20	RIEGO DE IMPRIMACION	M2	$ 5.950,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ICCU - 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNETAS EN CERRAMIENTO	KG	$ 7.971,00	11.480,41	$ 91.510.370,27		$ 0,00	0,00	$ 0,00	11480,41	$ 91.510.370,27
ICCU-4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$ 10.491,00	705,00	$ 7.396.155,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	705,00	$ 7.396.155,00
ICCU - 4.3	COLUMNETA EN CONCRETO 3,500 PSI SEC: 0.25 X 0.25 ALTURA DE 2,07 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	$ 1.138.839,00	15,53	$ 17.686.169,67		$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,53	$ 17.686.169,67
ICCU-4.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1800	m2	$ 10.421,00	434,65	$ 4.529.487,65		$ 0,00	0,00	$ 0,00	434,65	$ 4.529.487,65
ICCU- 5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 DOS CARAS A LA VISTA	M2	$ 218.963,00	180,00	$ 39.413.340,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	180,00	$ 39.413.340,00
ICCU-6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ml	$ 96.418,00	87,00	$ 8.388.366,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	87,00	$ 8.388.366,00

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022	Interventoría: UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL		

ICCU- 10.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON REMARCO EN ANGULO DE 1 1/4"	m2	$ 165.027,00	800,00	$ 132.021.600,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	800,00	$ 132.021.600,00
ICCU-16.10	RELLENOS AGREGADOS EN MATERIAL DE BASE COMPATACTADO MECANICAMENTE (Via vehicular)	m3	$ 207.171,00	199,79	$ 41.390.694,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	199,79	$ 41.390.694,09
ICCU- 16.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN MOVIMIENTO DE TIERRAS (Via vehicular y parqueaderos)	m3	$ 74.321,00	192,00	$ 14.269.632,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	192,00	$ 14.269.632,00
INV-450.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (CICLORUTA)	m3	$ 1.135.858,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
INV-630.3	CONCRETO CLASE C, F,C =3000 PSI (Zona vehicular)	m3	$ 1.049.460,00	33,90	$ 35.576.694,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	33,90	$ 35.576.694,00
			SUB TOTAL URBANISMO		**$ 520.652.053,15**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 520.652.053,15**

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
9,00	ELECTRICO	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU- 21.28	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	$ 7.517,00	3.396,50	$ 25.531.490,50		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3396,50	$ 25.531.490,50
ICCU-12-26	POSTE METALICO DE 6 MTS	UND	$ 1.772.645,00	15,00	$ 26.589.675,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 26.589.675,00
ICCU-12-24	POSTE EN CONCRETO REFORZADO 12 MTS	UND	$ 2.027.612,00	1,00	$ 2.027.612,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1.00	$ 2.027.612,00
NP-E01	SALIDA DE ILUMINACION, CONTROL Y TOMAS CORRIENTE	UND	$ 74.694,38	972,00	$ 72.602.936,39	972,00	$ 72.602.936,39	972,00	$ 72.602.936,39	0.00	$ 0,00
NP-E02	SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL TIPO LED 32W.	UND	$ 524.656,57	67,00	$ 35.151.990,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	67,00	$ 35.151.990,09
NP-E03	SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CIRCULAR TIPO LED 18W.	UND	$ 187.754,57	54,00	$ 10.138.746,70		$ 0,00	0,00	$ 0,00	54,00	$ 10.138.746,70

SIOP 0083

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

NP-E04	SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CIRCULAR TIPO LED 40W	UND	$ 219.698,57	390,00	$ 85.682.441,72		$ 0,00	0,00	$ 0,00	390,00	$ 85.682.441,72
NP-E05	SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA AUTONOMIA 60 MIN	UND	$ 232.664,57	21,00	$ 4.885.955,94		$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,00	$ 4.885.955,94
NP-E06	SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO APLIQUE 16W.	UND	$ 172.664,57	8,00	$ 1.381.316,55		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.381.316,55
NP-E07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	$ 92.692,57	86,00	$ 7.971.560,89		$ 0,00	0,00	$ 0,00	86,00	$ 7.971.560,89
NP-E08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DUAL	UND	$ 438.364,57	29,00	$ 12.712.572,49		$ 0,00	0,00	$ 0,00	29,00	$ 12.712.572,49
NP-E09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	$ 104.964,57	12,00	$ 1.259.574,82		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.259.574,82
NP-E10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE	UND	$ 115.592,57	1,00	$ 115.592,57		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 115.592,57
NP-E11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES REGULADA BIFASICA DE 15 AMP CON POLO A TIERRA	UND	$ 112.492,57	111,00	$ 12.486.675,10		$ 0,00	0,00	$ 0,00	111,00	$ 12.486.675,10
NP-E12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES BIFASICA CON POLO A TIERRA	UND	$ 83.928,38	191,00	$ 16.030.320,39		$ 0,00	0,00	$ 0,00	191,00	$ 16.030.320,39
NP-E13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES TOMA GFCI CON POLO A TIERRA	UND	$ 197.592,57	3,00	$ 592.777,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 592.777,71
NP-E14	SALIDA HDMI	UND	$ 128.867,38	58,00	$ 7.474.307,98		$ 0,00	0,00	$ 0,00	58,00	$ 7.474.307,98
NP-E15	SALIDA TV	UND	$ 106.728,38	59,00	$ 6.296.974,36		$ 0,00	0,00	$ 0,00	59,00	$ 6.296.974,36
NP-E16	SALIDA DE DATOS SENCILLA	UND	$ 108.317,38	73,00	$ 7.907.168,67		$ 0,00	0,00	$ 0,00	73,00	$ 7.907.168,67

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL												Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022												UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL						

NP-E17	SALIDA DE VOZ IP	UND	$ 116.326,72	4,00	$ 465.306,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 465.306,87
NP-E18	Organizador doble tapa, incluye herraje plano 48 puertos UTP 6	UND	$ 1.692.187,77	4,00	$ 6.768.751,08	4,00	$ 6.768.751,08	4,00	$ 6.768.751,08	0,00	$ 0,00
NP-E19	Gabinete cerrado 42U 800X800 mm con puerta microperfonada	UND	$ 13.198.859,36	2,00	$ 26.397.718,72		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 26.397.718,72
NP-E20	Suministro, instalacion bandeja porta cables - DUCTO CERRADO CON DIVISION, accesorios de 40*20	UND	$ 279.882,38	996,60	$ 278.930.757,98	996,60	$ 278.930.757,98	996,60	$ 278.930.757,98	0,00	$ 0,00
NP-E21	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE (INCLUYE BASE)	UND	$ 689.661,65	138,00	$ 95.173.307,42		$ 0,00	0,00	$ 0,00	138,00	$ 95.173.307,42
NP-E22	ESTACION MANUAL DE ALARMA COMPLETA (PULL STATION)	UND	$ 7.555.904,79	4,00	$ 30.223.619,16		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 30.223.619,16
NP-E23	LINEA EN TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS Y CAJAS PARA RED CONTRA INCENDIO	UND	$ 116.846,28	788,47	$ 92.129.785,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	788,47	$ 92.129.785,60
NP-E24	TG1: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL 1 (incuye conexión a transformador, planta de emergencia, a tableros TGA, TD1, TD2, TDR1, TDR2, TBOMBAS, T ASCENSOR, T PORTERIA)	UND	$ 101.253.790,43	1,00	$ 101.253.790,43		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 101.253.790,43
NP-E25	TGA: TABLERO GENERAL AIRES	UND	$ 14.859.125,54	1,00	$ 14.859.125,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 14.859.125,54
NP-E26	TD1: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 1	UND	$ 5.095.701,87	1,00	$ 5.095.701,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.095.701,87
NP-E27	TD2: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 2	UND	$ 4.800.629,47	1,00	$ 4.800.629,47		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.800.629,47
NP-E28	TGR: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL REGULADO .	UND	$ 5.095.701,87	1,00	$ 5.095.701,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.095.701,87
NP-E29	TDR1: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION	UND	$ 3.958.061,87	1,00	$ 3.958.061,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.958.061,87

E00037

	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL									Interventoría:
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18 FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022									UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL			

NP-E30	TDR2: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION	UND	$ 3.549.355,18	1,00	$ 3.549.355,18		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.549.355,18
NP-E31	TBOMBAS:TABLERO NORMAL DISTRIBUCION CUARTO BOMBAS PRESION	UND	$ 3.958.061,87	1,00	$ 3.958.061,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.958.061,87
NP-E32	T FOSO:TABLERO NORMAL DISTRIBUCION FOSO ASCENSOR	UND	$ 2.851.478,49	1,00	$ 2.851.478,49		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.851.478,49
NP-E33	T PORTERIA:TABLERO NORMAL DISTRIBUCION	UND	$ 3.070.630,08	1,00	$ 3.070.630,08		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.070.630,08
NP-E34	SUMINSTRO E INSTALACIÓN UPS TRIFASICA 20KVA AUTNOMIA 10 MINUTOS	UND	$ 31.147.173,54	1,00	$ 31.147.173,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 31.147.173,54
NP-E35	PLANTA ELECTRICA TRIFASICA DE 150 KVA 240/120V	UND	$ 64.768.696,54	1,00	$ 64.768.696,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 64.768.696,54
NP-E36	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	$ 5.314.569,54	1,00	$ 5.314.569,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.314.569,54
NP-E37	SUMINSTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO DE 150 KVA, 11400V/208-120V	UND	$ 199.741.376,16	1,00	$ 199.741.376,16		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 199.741.376,16
NP-E38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION EN CABLE DE 3X185 AWG XLPE AI 15 KV SUBTERRANEA	ML	$ 2.303.195,51	120,00	$ 276.383.461,08		$ 0,00	0,00	$ 0,00	120,00	$ 276.383.461,08
NP-E39	SUMINSTRO E INSTALACION LUMINARIA LED SOLAR 100W KIT	UND	$ 3.170.808,95	15,00	$ 47.562.134,18		$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 47.562.134,18
NP-E40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE DERIVACION RED AEREA MT LA-228	ML	$ 3.582.898,35	1,00	$ 3.582.898,35		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.582.898,35
NP-E41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO DE MEDIDA AE-319 SEGÚN NORMA	UND	$ 13.526.086,74	2,00	$ 27.052.173,47		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 27.052.173,47
NP-E42	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-276 CODENSA DE 2X1,70X1,50	UND	$ 7.663.580,10	3,00	$ 22.990.740,30		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 22.990.740,30
NP-E43	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-280 CODENSA 2X2X1,80	UND	$ 12.040.896,00	2,00	$ 24.081.792,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 24.081.792,00
NP-E44	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	UND	$ 48.000.000,00	1,00	$ 48.000.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 48.000.000,00
NP-E45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR ELECTRICO DE PASAJEROS, 2 PARADAS, CAPACIDAD CARGA 800 KG	UND	$ 225.000.000,00	1,00	$ 225.000.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 225.000.000,00
NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES TUBERIA 3/4	ML	$ 81.862,00	1.150,00	$ 94.141.300,00	1150,00	$ 94.141.300,00	1150,00	$ 94.141.300,00	0,00	$ 0,00
			SUB TOTAL ELECTRICO		**$ 2.085.187.788,52**		**$ 452.443.745,45**		**$ 452.443.745,45**		**$ 1.632.744.043,07**

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
9,00	INSONORIZACION	UND	VR UNIT	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-AA01	BAJO PISO PARA AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO	M2	$ 425.424,56	773,88	$ 329.225.431,37		$ 0,00	0,00	$ 0,00	773,88	$ 329.225.431,37
NP-AA02	CIELO RASO (DOBLE) ACÚSTICO DE AISLAMIENTO	M2	$ 644.582,92	1.547,75	$ 997.653.214,43		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1547,75	$ 997.653.214,43
NP-AA03	CIELO ACONDICIONAMIENTO LAMINA DE ESPUMA POLIURETANO	M2	$ 427.799,26	1.547,75	$ 662.126.304,67		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1547,75	$ 662.126.304,67
NP-AA04	MURO DE AISLAMIENTO	M2	$ 655.717,72	1.218,05	$ 798.696.968,85		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1218,05	$ 798.696.968,85
NP-AA05	SOBRE MURO DE AISLAMIENTO	M2	$ 619.507,72	851,95	$ 527.789.602,05		$ 0,00	0,00	$ 0,00	851,95	$ 527.789.602,05


3008 CF


ALCALDÍA MUNICIPAL COTA - CUNDINAMARCA	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL						Interventoría: UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL					
	INFORME EJECUTIVO AVAL ACTA PARCIAL No. 18											
	FASE III CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022											
INFORME No.:	18	PERIODO:	15	DICIEMBRE	2025	A	31	ENERO	2026			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SIOP-0083-2022			PROYECTO:			COMPLEJO CULTURAL					

NP-AA06	MURO ACONDICIONAMIENTO FIBRA POLIESTER CON CAMARA DE AIRE	M2	$ 893.549,44	575,00	$ 513.790.928,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	575,00	$ 513.790.928,00
NP-AA07	MURO ACONDICIONAMIENTO EN MADERA 12 MM RANURADA PERFORADA	M2	$ 949.526,94	186,00	$ 176.612.010,84		$ 0,00	0,00	$ 0,00	186,00	$ 176.612.010,84
NP AA08	PUERTA ACÚSTICA DIMENSION 2M DE ALTO X 0.90 DE ANCHO	M2	$ 13.421.209,68	44,00	$ 590.533.225,92		$ 0,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 590.533.225,92
NP-AA09	PUERTA ACÚSTICA DIMENSION 2M DE ALTO X 1.60 DE ANCHO	M2	$ 22.603.401,68	23,00	$ 519.878.238,64		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 519.878.238,64
				SUB TOTAL INSONORIZACION	$ 5.116.305.924,77		$ 0,00		$ 0,00		$ 5.116.305.924,77
	SUB-TOTAL ADICION N°3 FASE III OBRA				$ 11.885.276.847,51		$ 452.443.745,45		$ 452.443.745,45		$ 11.432.833.102,06
	IVA	19%			$ -						
	TOTAL				$ -						
	COSTO DIRECTO DE OBRA				$ 11.885.276.847,51		$ 452.443.745,45		$ 452.443.745,45		$ 11.432.833.102,06
	Administrativos	21,33%			$ 2.535.129.551,57		$ 96.506.250,90		$ 96.506.250,90		$ 2.438.623.300,67
	Imprevistos	2%			$ 237.705.536,95		$ 9.048.874,91		$ 9.048.874,91		$ 228.656.662,04
	Utilidad	10%			$ 1.188.527.684,75		$ 45.244.374,55		$ 45.244.374,55		$ 1.143.283.310,21
	TOTAL ADICION N°3 FASE III				$ 15.846.639.620,79		$ 603.243.245,81		$ 603.243.245,81		$ 15.243.396.374,98
	VALOR TOTAL FASE I y III				$ 45.938.292.510,94		$ 1.087.515.310,44		$ 29.178.226.601,79		$ 16.760.065.909,15
	PORCENTAJE EJECUTADO %						2,37%		63,52%		36,48%


6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO




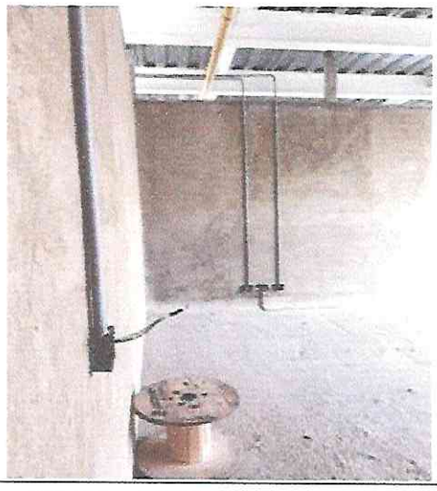

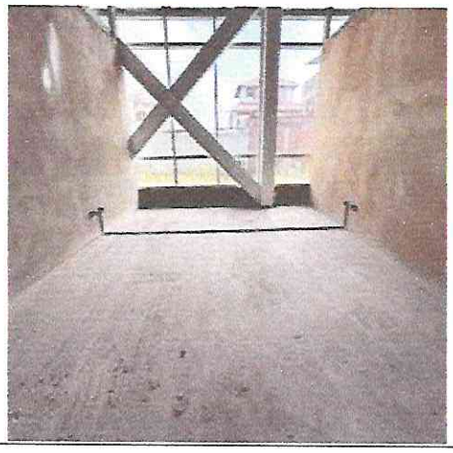




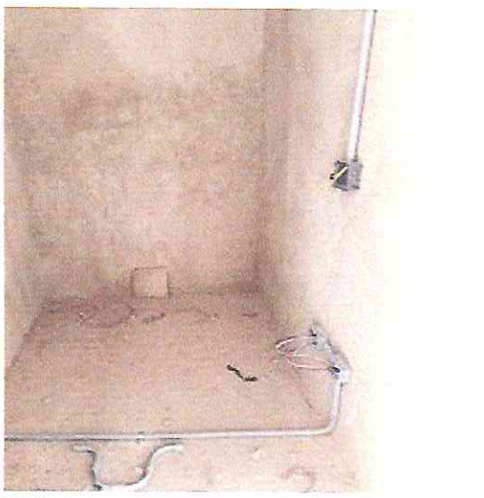

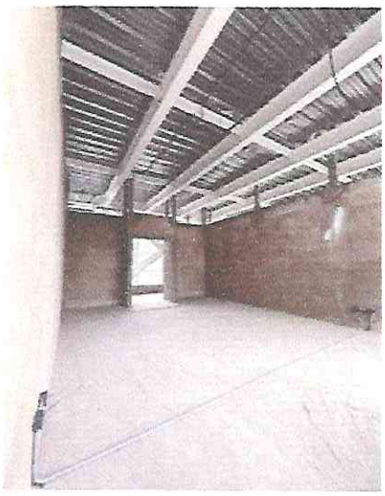



Instalaciones Eléctricas

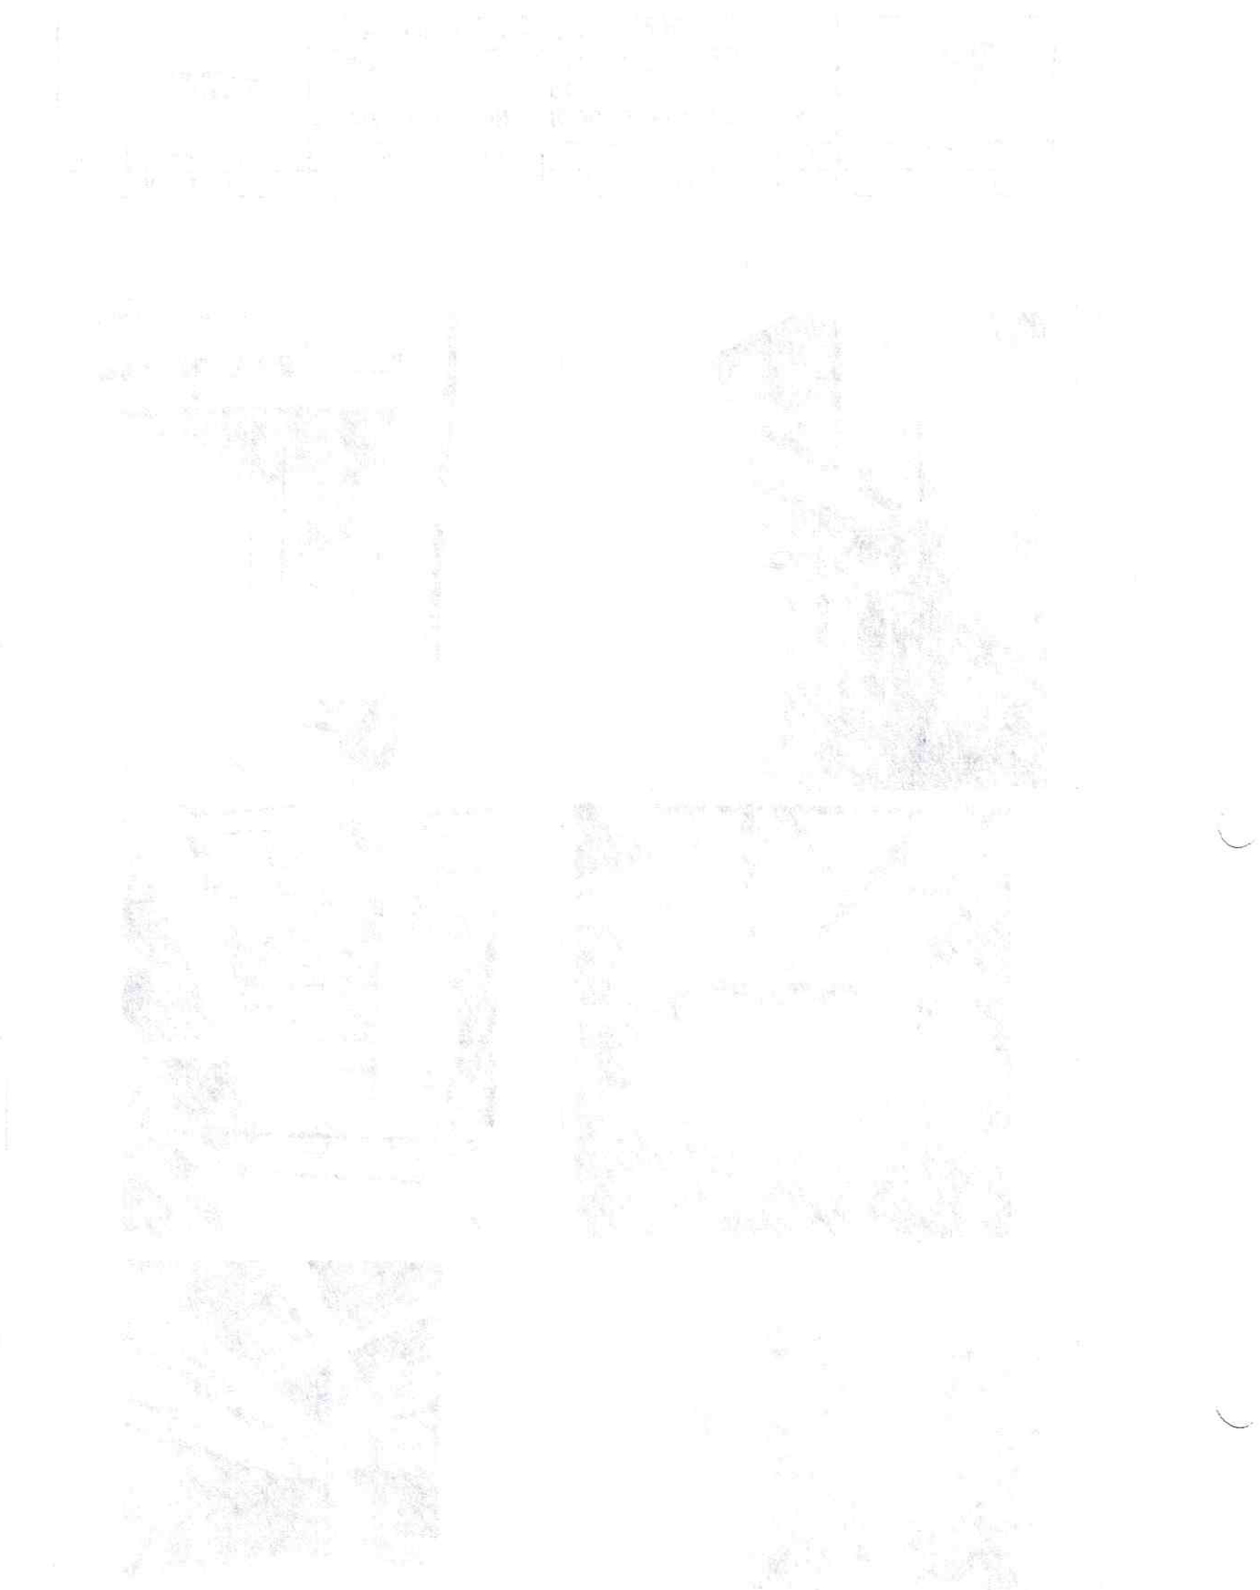





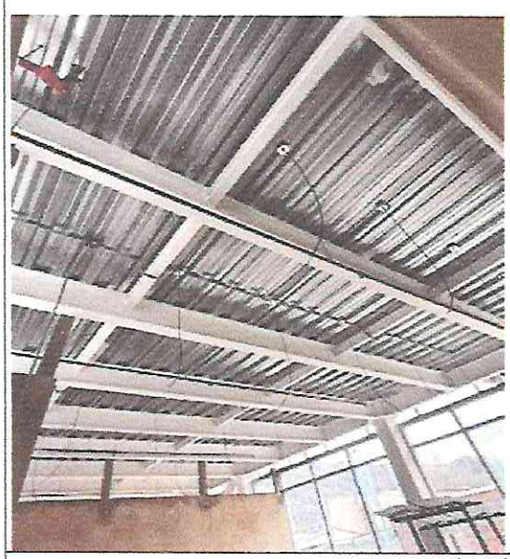

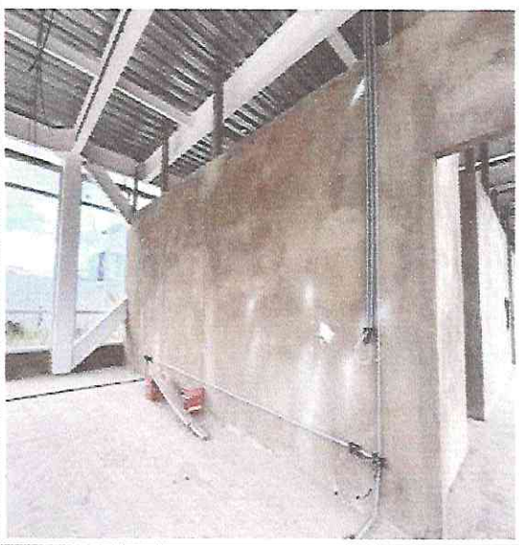

Instalaciones Eléctricas













Fotografía 2: *Red Contraincendios*









Carpinteria Metálica

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SIOP-0083-2022 Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA."

VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA DE CORTE No. 18
DEL CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022C
- RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

BLOQUE No. 2 MUSICA						
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	UN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18	
			CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
129	TUBERÍA PVC-C900 4"	ML	204,00	$ 23.557.104,00	62,07	$ 7.167.595,32
NP73	RESTRICTOR HD SERIE 1200 C900 4"	UND	10,00	$ 14.541.683,46	10,00	$ 14.541.683,46
NP74	ESTACION DE CONTROL DE ROCIADORES DE 2"	UND	2,00	$ 9.559.825,21	2,00	$ 9.559.825,21
NP75	KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN C-900 - A/C completa	UND	1,00	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33
NP76	SOPORTE ANTISISMICO 2'	UND	4,00	$ 832.494,80	4,00	$ 832.494,80
NP77	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2'	UND	7,00	$ 1.512.844,89	7,00	$ 1.512.844,89
NP78	SOPORTE ANTISISMICO 3'	UND	7,00	$ 1.700.269,89	7,00	$ 1.700.269,89
	SUB TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					**$ 38.803.276,91**
BLOQUE No. 3 TEATRO						
	CARPINTERIA METALICA ALUMINIO	UN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18	
			CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
260	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 EN CIRCULACIONES	M2	508,96	$ 773.879.342,18	24,57	$ 37.359.105,15
	SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO					**$ 37.359.105,15**
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	UN	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18	
			CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR
	RED CONTRA INCENDIOS RCI					
277	ACCESORIOS PVC-C900 4"	un	6,00	$ 4.440.390,00	6,00	$ 4.440.390,00
278	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 4" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	35,30	$ 6.929.248,80	9,00	$ 1.766.664,00
279	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 1/2" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	41,25	$ 4.650.071,25	41,25	$ 4.650.071,25
280	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 " (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	22,10	$ 1.933.816,30	22,10	$ 1.933.816,30
281	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 1 1/ 2 " (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	34,40	$ 2.048.554,40	34,40	$ 2.048.554,40
NP80	RESTRICTOR HD SERIE 1200 C900 4"	UND	10,00	$ 14.541.683,46	10,00	$ 14.541.683,46
NP81	ESTACION DE CONTROL DE ROCIADORES DE 2"	UND	2,00	$ 9.559.825,21	2,00	$ 9.559.825,21
NP82	KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN C-900 - A/C completa	UND	1,00	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33

NP83	SOPORTE ANTISISMICO 2'	UND	4,00	$ 832.494,80	4,00	$ 832.494,80
NP84	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2'	UND	7,00	$ 1.512.844,89	7,00	$ 1.512.844,89
NP85	SOPORTE ANTISISMICO 3'	UND	7,00	$ 1.700.269,89	7,00	$ 1.700.269,89
	RED CONTRA INCENDIOS					
NP61	PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2"	ML	108,00	$ 10.136.988,00	108,00	$ 10.136.988,00
NP62	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO 1"SCH'40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	UND	194,00	$ 10.942.376,00	194,00	$ 10.942.376,00
NP64	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO DE HASTA 2"	ML	248,10	$ 1.403.997,90	248,10	$ 1.403.997,90
NP65	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO MAYOR A 2"	UND	106,40	$ 940.788,80	106,40	$ 940.788,80
NP66	VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1"	UND	1,00	$ 421.954,00	1,00	$ 421.954,00
NP67	GABINETE TIPO III	UND	4,00	$ 5.567.844,00	4,00	$ 5.567.844,00
NP69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES TUBERIA 3/4	ML	2.674,40	$ 218.932.062,39	2674,40	$ 218.932.062,39
NP72	EXCAVACION MANUAL	M3	152,80	$ 9.437.080,80	24,83	$ 1.533.402,11
	SUB TOTAL - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					**$ 296.354.590,73**
	COSTO DIRECTO DE OBRA					**$ 372.516.972,79**
	Administrativos	18%				$ 67.053.055,10
	Imprevistos	2%				$ 7.450.339,46
	Utilidad	10%				$ 37.251.697,28
	VALOR TOTAL FASE I y III					**$ 484.272.064,63**

ADICION Nº3						
No.	**DESCRIPCION**	**VALOR UNITARIO**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4**		**PRESENTE ACTA N18**	
9,00	**ELECTRICO**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
NP-E01	SALIDA DE ILUMINACION, CONTROL Y TOMAS CORRIENTE	UND	972,00	$ 72.602.936,39	972,00	$ 72.602.936,39
NP-E18	Organizador doble tapa, incluye herraje plano 48 puertos UTP 6	UND	4,00	$ 6.768.751,08	4,00	$ 6.768.751,08
NP-E20	Suministro, instalación bandeja porta cables - DUCTO CERRADO CON DIVISION, accesorios de 40*20	UND	996,60	$ 278.930.757,98	996,60	$ 278.930.757,98
NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES TUBERIA 3/4	ML	1.150,00	$ 94.141.300,00	1150,00	$ 94.141.300,00
	SUB TOTAL ELECTRICO					**$ 452.443.745,45**
	COSTO DIRECTO DE OBRA					**$ 452.443.745,45**
	Administrativos	21,33%				$ 96.506.250,90
	Imprevistos	2%				$ 9.048.874,91
	Utilidad	10%				$ 45.244.374,55
	TOTAL ADICION Nº3 FASE III					**$ 603.243.245,81**
	VALOR TOTAL FASE I y III	**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4 y ADICION Nº4**		**$ 45.938.292.510,94**		**$ 1.087.515.310,44**
PORCENTAJE EJECUTADO %				**100%**		**2,37%**

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E: mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL
INTER-CULTURAL

Teniendo en cuenta la CLASULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES, en el desarrollo del presente contrato, se contaba con las siguientes obligaciones, las cuales se ejecutaron así:

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
1	Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.	El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual incluyendo su anexo técnico y pliego de condiciones, realizando las actividades previstas en el modificatorio No. 4, cumpliendo la programación contractual.
2	Entregar el cronograma estimado de obra	El contratista presentó a la interventoría y al Municipio de Cota el cronograma actualizado con las actividades adicionales y pendientes por ejecutar en el plazo contractual definido en el modificatorio No. 4, con radicado de interventoría oficio CC0083/271-2022 del 11 de diciembre de 2025.
3	Colaborar con la entidad contratante en cualquier requerimiento que ella haga.	El contratista y la interventoría han atendido los diferentes requerimientos por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras públicas del Municipio de Cota con referente a la ejecución de la obra y seguimiento de la misma.
4	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el anexo técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a la entidad contratante.	Se han realizado las pruebas de calidad de los diferentes, materiales utilizados en la obra como toma de muestras para comprobar la resistencia del concretos de estructura, en los cuales además se verificó la correcta disposición del acero de refuerzo según diseños, al igual que se han verificado fichas técnicas de los diferentes materiales eléctrico y red contra incendios.
5	Dar a conocer a la entidad contratante cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Para el presente periodo no se presentó ninguna reclamación directa o indirecta que afecte el objeto del contrato.
6	Comunicarle a la entidad contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.	Desde el reinicio de obra No. 2 se han reportado al Juzgado Municipal de Cota las acciones tomadas en cumplimiento de la tutela No. 25214408900120 24-00220-00, la cual se encuentra en curso por el tema ambiental interpuesta por un colindante al proyecto, al igual que la interventoría ha solicitado modificación de cantidades de obra mediante oficio 181 y se ha solicitado prórroga al plazo contractual por 2 meses y 17 días, según oficio 180 motivado por la afectación del paro camionero y el fuerte régimen de lluvias acaecidos en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024 y conforme a esa solicito se obtiene prorroga número 2.
7	Elaborar, suscribir y presentar a la entidad contratante las respectivas actas parciales de obra. Estas actas parciales de obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.	El contratista presentó corte No. 18, la cual fue revisada y aprobada por la interventoría, de fecha de corte a 15 de diciembre de 2025 a 31 de enero de 2026.

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E: mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
8	Cumplir con los aportes a seguridad social en salud y pensión, conforme a las disposiciones legales vigentes	El contratista ha cumplido con los aportes a la seguridad social del personal vinculado al proyecto conforme a las disposiciones legales vigentes como se observa en la planilla aportada en el corte No. 18, la cual corresponde al periodo corte a 15 de diciembre de 2025 a 31 de enero de 2026.
9	Atender las observaciones del funcionario que ejerce control, supervisión y vigilancia del contrato.	Se han atendido las observaciones por parte de la Supervisión con respecto a cabal cumplimiento del personal mínimo en obra y registro de actividades diarias y de avance de obra según cronograma.
10	Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.	Se ha llevado a cabo la estricta aplicación de la programación de manera diaria y semanal reportando los diferentes avances en los informes semanales, observándose cumplimiento a la programación. El contratista mantiene en obra materiales, equipos y personal conforme a sus obligaciones contractuales.
11	Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la información que le sea suministrada por motivo de la prestación de sus servicios.	El contratista ha mantenido para el presente periodo el conducto regular como la interventoría y la Secretaría de Obras públicas aplicando la reserva profesional.
12	Las demás que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinación con la dependencia encargada de ejercer el control y vigilancia del contrato.	Para cumplir este acápite la interventoría ha solicitado al contratista mantener permanente reuniones y/o comités para dinamizar la ejecución de las obras según la programación contractual y con participación de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Los diferentes comités de obra se llevan a cabo en oficina y en campo con asistencia de supervisor y los profesionales especializados de la SIOP, de obra e interventoría.
Obligación adicional		**Evidencia de cumplimiento**
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todas las actividades a los precios y condiciones señalados en la propuesta que hace parte del Contrato que se suscriba		El contratista ha presentado el corte No. 18 conforme al acta modificatoria No. 4, la cual se ha verificado y aprobado por la interventoría.
OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual		El contratista ha cumplido con la disposición de las maquinarias necesarias para la ejecución de las actividades en obra, realizando sus debido mantenimientos e inspecciones a las mismas.
PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA: debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan		En verificación por parte de la interventoría, se ha evidenciado el soporte de los pagos del personal contratado por la Unión Temporal Cultura en Cota como contratista.

UNION TEMPORAL
INTER-CULTURAL

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
	las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta, Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, para la liquidación del contrato suscrito con la Entidad, se debe presentar a la interventoría paz y salvo de cada una de las personas que intervinieron en la obra, firmado por las partes	
	IV. PROFESIONALES A CARGO DEL PROYECTO: Cumplir con el personal solicitado en la convocatoria	El contratista ha cumplido con la vinculación mínima del personal solicitado en el pliego de condiciones y cual se ve reflejado en la planilla de aportes a seguridad social, permanencia en obras y visitas de los especialistas a obra.
	Conservación DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA: Durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, el CONTRATISTA tendrá la obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de construcción, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y condición presente de la infraestructura pública a intervenir	El contratista ha velado por la conservación de la infraestructura en construcción del Complejo Cultural del Municipio de Cota utilizado los procedimientos adecuados y velando por la seguridad del recurso humano.
	Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la ejecución del contrato	La Unión Temporal Cultura en Cota ha velado y respondido por los daños ocasionados en la ejecución del contrato, en este período no se han registrado daños a terceros.
	Responder por la buena calidad de los elementos a suministrar y elementos utilizados en el objeto del presente Contrato	Para el presente corte No. 18 se presentan los certificados de calidad de los materiales utilizados en ejecución de la obra según aplica en cuanto a los ítems ejecutados.
	En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.	La interventoría mantiene control permanente por las obligaciones y el cumplimiento de las responsabilidades civil y penal, por sus acciones y omisiones en la ejecución contractual.
	Mantener y entregar al municipio, un registro fotográfico en medio físico y digital de los elementos a suministrar antes, durante la ejecución del recibo final del proyecto	En la ejecución del presente periodo se presentó el registro fotográfico del avance y realización de actividades a cobrar en el acta No. 18.

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E: mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
	Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar permanentemente las actividades realizadas frente a los recursos que financian el proyecto en forma discriminada	Se ha puesto mucho énfasis en el control y monitoreo de las actividades como parte importante para cumplir con las metas establecidas originalmente del proyecto del Centro Cultural de Cota. ✓ Inventario de materiales que se encuentran en la bodega. ✓ Control de entrega de materiales. ✓ Control de calidad con cada uno de los ingresos de los materiales (concretos, hierro de 60000 PSI, aceros y soldaduras.) ✓ Verificación del proceso de ensambles en obras según cálculos estructurales. ✓ Solicitud de hoja de vida del personal idóneo para el proceso de soldadura. (informe SST) ✓ Solitud de la afiliación del personal operativo (salud, pensión y ARL) (informe SST) ✓ Entrega de elementos de elementos de protección. SST ✓ Implementación de Matriz de riesgo. (informe SST) El eficaz manejo del control de materiales y recursos humanos, nos ha permitido a lo largo de la ejecución: ✓ La correcta y oportuna intervención del personal que labora en el proyecto. Adecuado rendimiento de trabajo. ✓ Calidad en el trabajo. ✓ Revisar si lo que se está haciendo es lo requerido. Confiabilidad de la información
	Presentar al supervisor del contrato, un informe periódico de ejecución, con los presupuestos, programación de las actividades t los avances de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el contrato. Al finalizar su ejecución	El contratista presentó a la Interventoría informe técnico sobre las actividades ejecutadas en el periodo de corte del acta N° 18 anexo a la cuenta.

No.	Obligación general	Evidencia de cumplimiento
	igualmente, deberá presentar un informe que consolide todo lo relacionado con la gestión realizada durante la vigencia del contrato	
	Mantener durante toda la ejecución del proyecto, el libro de actividades debidamente actualizado, así mismo entregar copia semanal del mismo al interventor al supervisor del Contrato, según corresponda.	Se ha realizado la verificación de la bitácora de obra la cual se encuentra anexa copia en los informes de obra del mes de diciembre de 2025 y enero del presente año 2026.
	Avisar oportunamente al Municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	En el presente periodo no se han presentado situaciones que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.
	Permitir al Interventor o Supervisor el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad y demás documentación y en términos generales suministrar toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de la gestión	El contratista permitió el acceso a la obra y documentos solicitados por parte de la interventoría y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en colaboración del desarrollo de la obra.
	Dotar al personal asignado a la obra de elementos de seguridad industrial y adoptar los reglamentos a que haya Lugar para prevención de accidentes	El contratista desde área de seguridad en el trabajo ha supervisado que se cumpla con los elementos y seguir el reglamento para prevenir accidentes en la ejecución de la obra como lo muestra el informe de SST correspondiente.
	El contratista se obliga a constituir Garantía Única la cual deberá incluir como asegurado al Municipio de Cota, amparando los riesgos establecidos en los pliegos de condiciones t la cláusula respectiva del contrato.	El contratista luego de la modificatoria N°4, reinicio N°6 y prorroga N°4 actualizó las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil las cuales se adjuntan al informe técnico presentado por el contratista del corte No. 18.

No.	Obligación específica	Evidencia de cumplimiento
1	Tramitar las garantías exigidas en la fase III por el municipio y radicarlas en original ante la SIOP para su revisión y posterior aprobación.	El contratista radicó ante la entidad las pólizas de modificatoria N°4, reinicio N°6 , adición N°3 y prorroga N°4.
2	Una vez finalizada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría la fase I, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, el contratista, deberá presentar a la entidad, el cronograma detallado del plazo de ejecución de las obras de construcción y adecuación de la infraestructura física y componentes que se enmarcan en el presente proceso de	Se verificó y aprobó el respectivo cronograma de las actividades por ejecutar concomitante con la modificación No. 4, Adición N°3, reinicio N°6 y prórroga N°4 del plazo correspondiente. se mantiene control de avance con la programación aprobada actualizada en virtud del reinicio No.6 y la nueva fecha de terminación del contrato.

	contratación, dando cumplimiento al plazo establecido por la entidad	
3	Dar estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional	Se ha hecho verificación y control del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y seguridad sanitaria en obra.
4	Revisar, junto con la interventoría, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los estudios técnicos y especificaciones de construcción establecidas en la FASE I- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE dentro de los ocho (8) días siguientes de la fecha del recibo de la fase I, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos	No aplica para el presente corte.
5	Garantizar y mantener durante la ejecución del contrato el personal propuesto, si llegase a realizarse algún cambio deberá ser informado oportunamente al supervisor e interventor, el cual verificara cada uno de los requisitos y experiencia solicitada del personal propuesto	La unión Temporal ha mantenido el personal propuesto y ha notificado los cambios realizados a lo largo de la ejecución del contrato.
6	Los cambios del personal mínimo exigido que el contratista deba realizar por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados deben ser presentados a la interventoría del proyecto, quien velara por que el personal a cambiar cuente con un perfil igual o superior al que se retira de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y la interventoría informara a la entidad la procedencia o no de la solicitud de cambio de personal para que sea o no aprobada	En el presente corte no se han presentado cambios de personal.
7	Mantener actualizada la programación de obra, gestión operativa demás acciones que se encuentren dentro de su objeto contractual, la cual debe ser reportada a la supervisión para efectos de	La programación de obra actualizada quedó como soporte contractual modificatoria N°4, reinicio N°6, adición y prorroga de plazo correspondiente y se mantiene control de avance de actividades con la programación aprobada.

	seguimiento y control. 8. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se Llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato	
8	Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se Llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato	En el presente periodo no se han presentado eventos de contingencia en la ejecución del contrato.
9	El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue al municipio, son responsabilidad del constructor	No aplica para el presente periodo
10	Realizar la construcción del campamento de obra con un área mínima, cuya ubicación y dimensiones mínimas deberán contar con la aprobación de la Interventoría	No aplica para el presente periodo
11	Realizar el cerramiento provisional de la obra no de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos t terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra	El contratista mantiene el cerramiento en condiciones adecuadas y para el presente período y realiza el mantenimiento del campamento según programación del componente ambiental.
12	Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales los demás elementos ofertados en la propuesta y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de la ejecución de la obra en el tiempo estipulado	El contratista ha cumplido con la disposición de las maquinarias necesarias para la ejecución de las actividades en obra como lo son retroexcavadoras, minicargadores, elevadores, andamios y todo aquellos que sean necesarios para la perfecta ejecución de la obra.
13	Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato	Para el presente corte se presentan certificado de calidad de los diferentes materiales a utilizar en ejecución de la obra como calidad del hierro, concretos, materiales eléctricos y red contra incendios.

14	Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos (En perfectas condiciones) en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra	El contratista ha suministrado las maquinarias y herramientas oportunamente según la programación de obra para la ejecución de las actividades en la obra, adicionalmente se han suministrado en perfectas condiciones para salvaguardar la calidad de la obra y seguridad de los trabajadores en obra.
16	Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra, presentando los respectivos informes a la interventoría y a la supervisión cuando esta lo requiera. En cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá presentar a la interventoría y a la supervisión cuando esta lo requiera los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos se encuentras debidamente calibrados y los mismos deben ser expedidos por Laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC	La Unión Temporal Cultura en Cota ha realizado las pruebas de los concretos, garantizando la calidad de los productos instalados, en laboratorios debidamente certificados, aplicados para el corte No. 18.
17	Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el municipio de Cota - Cundinamarca, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público	No aplica para el presente corte.
18	Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría	No aplica para el presenten corte.
19	Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que	No aplica para el presente corte

	presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras	
20	Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el municipio de Cota - Cundinamarca, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra	No aplica para el presente corte
21	Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo y viales que puedan ser afectadas a causa de la construcción, debido al tráfico pesado de maquinaria u otras actividades propias de la construcción, de manera que se garantice la entrega de los espacios de urbanismo y viales, como se encontraban al inicio de la obra.	No aplica para el presente corte.
22	Implementar como mínimo tres (3) frentes de trabajo (o los que se soliciten por parte de la interventoría o supervisión) en la ejecución de la FASE III del presente proceso	El contratista mantiene los siguientes frentes de trabajo los cuales se distribuyen de la siguiente manera para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales: • Estructura de soporte de ventanería e instalación ventanería y vidrios. • Instalación de redes eléctricas • Instalaciones hidráulicas y sanitarias • Instalación de red contraincendios
23	Siempre que, en opinión del interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses del municipio de Cota - Cundinamarca requieran de su uso, podrá tomarse posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella. El uso por parte del municipio de Cota - Cundinamarca de la obra o parte de ella, no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del municipio de Cota - Cundinamarca a ninguno de sus derechos	N/A para el presente corte ni para el proyecto y/o contrato esta situación en específico.
24	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de	La unión temporal cultura en cota lleva la memoria diaria de la obra (bitácora) con los registros día a día de lo acontecido en la obra, la cual se puede evidenciar en el sitio de la obra y se anexa en los informes de diciembre de 2025 y enero del presente año 2026.

	funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del municipio de Cota – Cundinamarca	
25	Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución de la obra procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotográfico del estado inicial de los sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, asi como llevar una bitácora	En el informe técnico presentado por el contratista se evidencia el registro fotográfico del avance de la obra, estructura de soporte de ventanería e instalación ventanería y vidrios, Instalación de redes electricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalación de red. contraincendios. Demás actividades del corte acta No. 18.
26	Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el municipio de Cota - Cundinamarca, los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al municipio de Cota - Cundinamarca con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético (Formato DWG)	No aplica para el presente periodo.
27	Ejecutar las obras diseñadas de la fase I con la calidad establecida en las especificaciones técnicas t en las áreas determinadas para la fase 1	Se aplican debidamente los diseños del proyecto en todos los frentes de obra.
28	Contar con una oficina en la zona urbana del municipio de Cota, que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra	El contratista cuenta con oficinas en el casco urbano del municipio de cota en dirección Cra 5 n 8-20 oficina 204
29	Brindar seguridad y vigilancia a los sitios que serán intervenidos hasta la entrega y recibo a satisfacción de las obras por parte del municipio	La Unión Temporal Cultura en Cota mantiene vigilancia en obra con el fin de salvaguardar la estructura, maquinaria y materiales dispuestos en obra.
30	Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así	N/A para el presente corte.

	como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual deberá contar con la aprobación de la interventoría	
31	Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación	Junto con el contratista se elaboró acta de corte No. 18 verificando en obra las cantidades ejecutadas y en oficina revisando la memoria de cantidades y soportes anexos del acta.
32	Evitar que sus empleados invadan o perjudiquen en cualquier forma zonas o monumentos que tengan interés arqueológico, histórico o turístico	N/A para el presente corte.
33	Presentar informes mensuales, o cuando la supervisión lo requiera, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener como mínimo: a). Componente técnico, b) Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), c). Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental PMA TIO Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), d). Seguimiento al plan de Gestión Social	Para el presente corte No. 18 el contratista anexa lo pertinente según aplica debidamente aprobado por la interventoría.
34	Presentar un informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y de acuerdo con la lista de chequeo suministrada por la alcaldía municipal de Cota	N/A para el presente corte.
35	Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), (Resolución 312 de 2019), incluyendo los lineamientos exigidos en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan	Se están aplicando en el desarrollo de las obras los diferentes planes y se reporta en el presente corte los avances en cada caso.
36	Elaborar, difundir, implementar y presentar a la Interventoría del contrato un reglamento interno de trabajo (Resolución 241311979 y Resolución 2013/86) y un plan de convivencia con el	Se están aplicando en el desarrollo de las obras los diferentes planes y se reporta en el presente corte los avances en cada caso.

	fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.	
37	Suministrar a sus trabajadores una serie de dotaciones para que estos puedan cumplir de manera segura y efectiva con su actividad o labor, de acuerdo con la circular 29 de 2020, el Ministerio del Trabajo, la cual recuerda la obligación que tienen los empleadores de suministrar a sus trabajadores los equipos de protección adecuados, con las condiciones de seguridad y eficiencia requeridos según la naturaleza del riesgo	Desde el área de SST se ha verificado que los trabajadores cuenten permanentemente con las dotaciones necesarias para la realización segura de los trabajos en obras y se controla permanentemente a diario lo que exige la norma.
38	Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin	Según la nueva normatividad vigente, la UNIÓN TEMPORAL CULUTRA EN COTA cuenta con un Reglamento de higiene y seguridad industrial el cual es implementado dentro del SG-SST, también cuenta con el COPASST, (Resolución 1508 de 2020) los soportes de conformación y reuniones se han adjuntado en los informes mensuales.
39	Elaborar formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas normas, constancia de capacitaciones	La UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA cumpliendo con la Resolución 0312 del 2019 implementa los indicadores de accidentalidad que establece la norma y cuenta con las fichas de dichos indicadores dentro de la implementación del SG-SST, al igual que los soportes de la implementación del programa de capacitaciones.
40	Afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato, a una entidad promotora de salud, pensiones y ARL de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de traba o (Decreto 1072 de 2015), aplicando en forma estricta los controles y obligaciones que le" competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales vigentes a la fecha de presentación de la propuesta durante la vigencia del contrato	La UNIÓN TEMPORAL CULUTRA EN COTA cumple con la normatividad en cuanto a afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social integral, tanto del personal directo como subcontratado y control de verificación también de los visitantes de obra, garantizando una cobertura del 100% del personal relacionado directa e indirectamente.

41	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el municipio de Cota - Cundinamarca	La interventoría ha verificado el correcto cumplimiento por parte del contratista en el pago de los salarios de todo el personal de obra.
42	Contar con los permisos y certificados para trabajo en alturas, del personal que estará en la ejecución de la obra, razón por la cual previo inicio de los trabajos las personas deberán presentar al supervisor el certificado de trabajo en alturas vigente, expedido por una escuela debidamente acreditada por el Ministerio de Trabajo	Dentro del SG-SST se aplican los procedimientos de trabajo para las diferentes actividades de alto riesgo como lo es el Trabajo en alturas, de igual manera dentro de los informes mensuales se entregan los soportes de los cursos correspondientes de los trabajadores autorizados para tal actividad con verificación de ministerio de trabajo.
43	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual	Dentro de la implementación del SG-SST se garantizan estas condiciones de seguridad industrial como lo es dentro del programa de mantenimiento, programa de inspecciones, matriz de EPP y todas las actividades que se implementan están encaminadas a la seguridad industrial dentro del proyecto.
44	Elaborar, implementar y presentar ala Interventoría y Supervisión del contrato la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Plan de Manejo Ambiental (PMA) TIO Programas de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato	No aplica en el presente periodo.

45	Entregar para iniciar la obra la certificación de una planta de RCD autorizada, con Resolución de aprobación en la CAR, donde se vayan a depositar los escombros y material sobrante de la obra, el cual deberá tener visto bueno del Interventor y/o supervisor para autorizar el movimiento de cualquier material, asimismo entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza	Los permisos ambientales de la escombrera que presta el servicio al proyecto fueron entregados en el PMA Versión 2, sin embargo, para este periodo no fue requerido la entrega de material de excavación y/o demolición.
46	No utilizar fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta con la respectiva autorización de parte de la autoridad ambiental	El contratista ha cumplido con la no utilización de fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta con la respectiva autorización de parte de la autoridad ambiental.
47	Contar con un lugar en la obra para el lavado de llantas de los vehículos que ingresen a la obra y en el momento de retiro y circulación fuera de las áreas de la obra, así como garantizar la limpieza de las vías y andenes durante el desarrollo de la obra	La interventoría ha verificado la aplicación de este requisito para todos los vehículos y se mantiene sin afectación las áreas y espacios públicos de vías y andenes adyacentes al proyecto
48	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas (seres vivos en general), a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores	La interventoría ha verificado la aplicación de este requisito por parte de todo el personal del contratista que interviene en el proyecto
49	Realizar la fumigación y los controles respectivos y tomar las medidas pertinentes a que haya Lugar para el control de plagas en los inmuebles que serán intervenidos	No aplica en el presente periodo.
50	Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato el Plan de Gestión Social	No aplica al presente periodo.

51	El contratista deberá levantar las actas de vecindad (Inicial y final) con anterioridad al inicio t terminación de las labores propias del contrato, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso y zonas en general que no se intervendrán Estas actas deberán ser levantadas juntamente con la INTERVENTORIA t entregadas formalmente a la interventoría para su aprobación dentro de los primeros quince (15) días calendario de la etapa constructiva. Se requiere que las actas de vecindad sean diligenciadas por el profesional social y el residente de obra, con el fin de determinar daños preexistentes en los predios colindantes, igualmente se requerirá de este mismo personal para el cierre de las actas de vecindad al finalizar la obra	No aplica para el presente periodo
52	Efectuar una reunión de socialización con la comunidad vecina y beneficiaria del proyecto, la interventoría y representantes del municipio de Cota, en la cual presentará de forma general el proyecto a desarrollar.	Se realizó reunión con la comunidad el día 12 de noviembre del 2025 con el fin de informar de las actividades adicionales las cuales se presentaron a la entidad y fueron aprobadas el día 15 de diciembre del año 2025.
53	El contratista debe disponer dentro de su campamento de obra, de una oficina para la atención de la comunidad, con personal idóneo de impacto urbano que brinde respuesta oportuna y pertinente a las inquietudes de esta e informe periódicamente del avance del proyecto; la persona encargada debe ser designada por el contratista e informar de ello formalmente ala interventoría.	Dentro de la obra se cuenta con un espacio para atención a la comunidad en el cual se les brinda información oportuna a los requerimientos de la misma
54	Instalar una valla informativa (3.0 x 6.0 mts o según lineamientos de la supervisión) de acuerdo con la información y modelo que será suministrado por el Municipio de Cota. Los costos relacionados con el suministro e instalación de esta valla estarán a cargo del contratista dentro de los costos de la Administración en la elaboración de la propuesta económica. Esta debe ser instalada en un plazo no mayor a (15) quince días calendario a partir de la fecha de inicio de la obra y	Se mantiene valla informativa en el proyecto.

UNION TEMPORAL
INTER-CULTURAL

61	En el evento en que los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos sean realizados por el municipio de Cota Cundinamarca, se le descontará al contratista el valor de los trámites, estimados en conjunto con la interventoría y los funcionarios del área de servicios públicos.	No aplica para el presente periodo
62	Hacer entrega de las obras contratadas según las especificaciones descritas en el "ANEXO — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FASE III", dentro del plazo máximo establecido del contrato. E) NOTA- El Contratista ejecutará las obligaciones particulares el contrato conforme a lo estipulado en el numeral 4.6.2. del pliego de condiciones.	No aplica para el presente periodo

Atentamente

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL
INTERVENTORÍA

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E: mail: complejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

ACTA DE CORTE N° 18
CONTRATO DE OBRA N° SIOP-0082-2022

OBJETO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.)
PLAZO INICIAL	DIECISEIS (16) MESES
VALOR INICIAL	VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029´500.000.00) M/CTE
VALOR ADICION N°1	NOVECIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($902.219.533,57) M/CTE.
VALOR ADICION No 2	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.159.933.356.58) M/CTE
VALOR ADICION No 3	QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCEINTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($15.846.639.620.79).
VALOR TOTAL	CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($45.938.292.510,94) M/CTE
CONSTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA NIT 901.590.186-1 RL. JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA CC No 1.118.844.495
INTERVENTORIA	UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL NIT 901.611.855-0 RL CANDELARIA MENDOZA C.C No. 1.104.011.113
SUPERVISION	AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE COTA- CUNDINAMARCA
FECHA DE INICIO:	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE INICIO FASE I:	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACION INICIAL:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO 1:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1 FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (160 DIAS CALENDARIO)
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	03 DE ABRIL DE 2023

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E:mail: compiejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

000083

FECHA DE REINICIO 2:	30 DE JUNIO DE 2023
RESOLUCION No. 900.49.694 LICENCIA DE PARCELACION Y CONSTRUCCION MODALIDAD OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO	30 DE JUNIO DE 2023
OTROSI 1 DEFINICION DE PRESUPUESTO FASE III OBRA	15 DE AGOSTO DE 2023
ADICION 1 Y PRORROGA 2 FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS (1 MES):	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE I:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO FASE II:	30 DE JUNIO DE 2023
SUSPENSION 3 FASE II:	17 DE JULIO DE 2023
PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSION 3 FASE II:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
REINICIO 1 FASE II:	27 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION DE LA FASE II:	8 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DE LA FASE III:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO Y DE LA FASE III:	11 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSION No 3	03 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 3	31 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4	31 DE MAYO DE 2024
REINICIO No 4	01 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE MODIFICATORIO No° 2 y PRORROGA No. 1	09 DE AGOSTO DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 1	4 MESES Y 22 DIAS
PRORROGA N° 2	27 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 2	2 MESES Y 17 DIAS
MODIFICATORIO No3 ADICCION No2 Y PRORROGA No 3	17 DE MARZO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 3	4 MESES

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E:mail: compiejoculturalcota@gmail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca

VALOR ADICION No. 2	$2.159.933.356.58
SUSPENSIÓN 5	13 DE MAYO DE 2025
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 5	12 DE JUNIO DE 2025
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 5	11 DE JULIO DE 2025
REINICIO No. 5	13 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACION POR REINICIO 5:	17 DE OCTUBRE DE 2025
SUSPENSIÓN 6	17 DE OCTUBRE DE 2025
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 6	31 DE OCTUBRE DE 2025
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 6	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 6	29 DE NOVIEMBRE DE 2025
AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 6	10 DE DICIEMBRE DE 2025(4 DIAS)
REINICIO N° 6	15 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICATORIO No4 ADICCION No3 Y PRORROGA No 4	15 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 4	12 MESES Y 17 DIAS
VALOR ADICION No. 3	$ 15.846.639.620,79
FECHA ACTUALIZADA POR PRORROGA No. 4	31 DE DICIEMBRE DE 2026

En Cota Cundinamarca a los dieciséis (31) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron las siguientes personas: Candelaria Mendoza identificada con CC No1.104.011.113 en calidad de Representante Legal de la Unión Temporal inter-cultural interventoría del contrato de obra pública SIOP-0082-2022 y el señor Jerson Esteban Mendoza identificado con cedula de ciudadanía No 1.118.844.495 Representante Legal Unión Temporal Cultura en Cota CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de dejar constancia del cumplimiento y recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas a cobrar mediante acta No 18 del contrato de obra pública SIOP-0082-2022 del periodo comprendido de 15 de diciembre de 2025 a 31 de enero de 2026, lo anterior de acuerdo al informe correspondiente al mismo periodo de acta de cobro , este documento hace parte integral del mismo.

UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL	$ 27.029.500.000,00
VALOR ADICIONES	$ 18.908.792.510,94
VALOR TOTAL	$ 45.938.292.510,94

% EJECUTADO ACTA CORTE No 18 Calculado sobre el valor del contrato	2,37%
VALOR EJECUTADO AL ACTA DE CORTE N° 18	$ 1.087.515.310,44

% EJECUTADO DEL CONTRATO N° SIOP-0082-2022	63,52%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 29.178.226.601,79

VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	$ 28.090.711.291,35
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 1.008.188.347,40
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO N° SIOP-0082-2022	$ 16.760.065.909,15
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	N/A
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO PRESENTE ACTA	N/A
VALOR TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO A LA FECHA	N/A

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída proceden a firmar los que en ella intervinieron.

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
INTERVENTOR

JERSON MENDOZA OCHOA
Representante Legal
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA DE OBRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA

ACTA CORTE Nº 18

Contrato de obra pública No. SIGP-0082-2022		VALOR TOTAL FASE II:	$ 3.517.719.533,57
Fecha de inicio: 02 de agosto de 2022		VALOR FASE 3:	$ 24.414.000.000,00
Fecha de suspensión No.1: 12 de octubre 2022	Fecha de reinicio No.1: 25 de noviembre de 2022	VALOR CONTRATO	$ 27.931.719.533,57
Fecha de suspensión No 2: 3 de abril de 2023	Fecha de reinicio No 2: 3 de julio de 2023	VALOR ADICION 1	$ 902.219.533,57
Fecha de suspensión No.3: 1 de abril de 2024	Fecha de reinicio No 3: 31 de mayo de 2024	VALOR ADICION 2	$ 2.159.593.398,58
Fecha de suspensión No.4: 1 de junio de 2024	Fecha de reinicio No 4: 01 de agosto de 2024	VALOR CONTRATO	$ 30.991.492.890,15
Fecha de suspensión No.5: 1 de mayo de 2025	Fecha de reinicio No 5: 13 de agosto de 2025	VALOR ADICION 3	$ 15.849.639.620,79
Fecha de suspensión No 6: 17 de octubre de 2025	Fecha de reinicio No 6: 15 de diciembre de 2025	VALOR CONTRATO	$ 46.838.292.510,94
Nueva fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2026		Nuevo plazo de ejecución: 34 meses y 9 días	

Fecha de presentación acta: 31/01/26	
contratista: UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	
Interventor: UNION TEMPORAL INTERCULTURAL	

OBJETO DE CONTRATO: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND)

	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
A	FASE I- ESTUDIO Y DISEÑOS TÉCNICOS									CANTIDAD		VALOR TOTAL									
No.	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	UND	1,0	$ 549.474.769,92	$ 549.474.769,92	1,00	$ 549.474.769,92							1,00	$ 549.474.769,92			1,00	$ 549.474.769,92	0,00	$ 0,00
2	DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE URBANISMO	UND	1,0	$ 549.474.769,92	$ 549.474.769,92	1,00	$ 549.474.769,92							1,00	$ 549.474.769,92			1,00	$ 549.474.769,92	0,00	$ 0,00
3	DISEÑO DE AREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	UND	1,0	$ 175.631.932,77	$ 175.631.932,77	1,00	$ 175.631.932,77							1,00	$ 175.631.932,77			1,00	$ 175.631.932,77	0,00	$ 0,00
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND	1,0	$ 21.978.991,60	$ 21.978.991,60	1,00	$ 21.978.991,60							1,00	$ 21.978.991,60			1,00	$ 21.978.991,60	0,00	$ 0,00
5	ESTUDIO DE SUELOS	UND	1,0	$ 109.894.957,98	$ 109.894.957,98	1,00	$ 109.894.957,98							1,00	$ 109.894.957,98			1,00	$ 109.894.957,98	0,00	$ 0,00
6	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE	UND	1,0	$ 21.978.991,60	$ 21.978.991,60	1,00	$ 21.978.991,60														$ 0,00
7	DISEÑO ESTRUCTURALES	UND	1,0	$ 219.789.915,97	$ 219.789.915,97	1,00	$ 219.789.915,97							1,00	$ 219.789.915,97			1,00	$ 219.789.915,97	0,00	$ 0,00
8	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS	UND	1,0	$ 131.873.949,58	$ 131.873.949,58	1,00	$ 131.873.949,58														$ 0,00
9	ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	1,0	$ 131.873.949,58	$ 131.873.949,58	1,00	$ 131.873.949,58							1,00	$ 131.873.949,58			1,00	$ 131.873.949,58	0,00	$ 0,00
10	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	UND	1,0	$ 43.957.983,19	$ 43.957.983,19	1,00	$ 43.957.983,19							1,00	$ 43.957.983,19			1,00	$ 43.957.983,19	0,00	$ 0,00
11	DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES	UND	1,0	$ 65.936.974,79	$ 65.936.974,79	1,00	$ 65.936.974,79							1,00	$ 65.936.974,79			1,00	$ 65.936.974,79	0,00	$ 0,00
12	PRESUPUESTO DE OBRA	UND	1,0	$ 65.938.974,79	$ 65.938.974,79	1,00	$ 65.938.974,79							1,00	$ 65.938.974,79			1,00	$ 65.938.974,79	0,00	$ 0,00
13	PROGRAMACIÓN DE OBRA	UND	1,0	$ 43.957.983,19	$ 43.957.983,19	1,00	$ 43.957.983,19							1,00	$ 43.957.983,19			1,00	$ 43.957.983,19	0,00	$ 0,00
14	ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO	UND	1,0	$ 21.978.991,60	$ 21.978.991,60	1,00	$ 21.978.991,60							1,00	$ 21.978.991,60			1,00	$ 21.978.991,60	0,00	$ 0,00
15	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	UND	1,0	$ 10.989.495,80	$ 10.989.495,80	1,00	$ 10.989.495,80							1,00	$ 10.989.495,80			1,00	$ 10.989.495,80	0,00	$ 0,00
16	COORDINACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1,0	$ 32.968.487,39	$ 32.968.487,39	1,00	$ 32.968.487,39							1,00	$ 32.968.487,39			1,00	$ 32.968.487,39	0,00	$ 0,00
17	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	M2	2.538,61	$ 67.602,71	$ 171.616.904,09	2.538,61	$ 171.616.904,09							2.538,61	$ 171.616.904,09			2539,61	$ 171.616.904,09	0,00	$ 0,00
18	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO				$ 0,00	0,00	$ 0,00							-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	DISEÑO DE AREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	M2	10.041,0	$ 18.195,21	$ 182.254.808,14	10.041,03	$ 182.254.808,14							10.041,03	$ 182.254.808,14			10041,03	$ 182.254.808,14	0,00	$ 0,00
20	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	M2	9.227,6	$ 529,61	$ 4.887.014,91	9.227,63	$ 4.887.014,91							9.227,63	$ 4.887.014,91			9227,63	$ 4.887.014,91	0,00	$ 0,00
21	ESTUDIO DE SUELOS	M2	2.538,6	$ 9.997,48	$ 22.641.039,09	2.538,61	$ 22.641.039,09							2.538,61	$ 22.641.039,09			2539,61	$ 22.641.039,09	0,00	$ 0,00
22	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE				$ 0,00	0,00	$ 0,00							-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23	DISEÑO ESTRUCTURALES	M2	2.538,61	$ 27.041,09	$ 68.646.761,64	2.538,61	$ 68.646.761,64							2.538,61	$ 68.646.761,64			2539,61	$ 68.646.761,64	0,00	$ 0,00
24	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS				$ 0,00	0,00	$ 0,00							-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25	ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	M2	2.538,61	$ 10.796,65	$ 27.409.245,71	2.538,61	$ 27.409.245,71							2.538,61	$ 27.409.245,71			2539,61	$ 27.409.245,71	0,00	$ 0,00
26	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	M2	2.538,61	$ 5.402,22	$ 13.729.252,33	2.538,61	$ 13.729.252,33							2.538,61	$ 13.729.252,33			2539,61	$ 13.729.252,33	0,00	$ 0,00
27	DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES	M2	4.031,17	$ 16.137,29	$ 65.052.197,67	4.031,17	$ 65.052.197,67							4.031,17	$ 65.052.197,67			4031,17	$ 65.052.197,67	0,00	$ 0,00
28	PRESUPUESTO DE OBRA	M2	15.964,37	$ 5.398,48	$ 86.183.253,83	15.964,37	$ 86.183.253,83							15.964,37	$ 86.183.253,83			15964,37	$ 86.183.253,81	0,00	$ 0,00
29	PROGRAMACIÓN DE OBRA	M2	15.964,37	$ 3.568,68	$ 57.459.502,55	15.964,37	$ 57.459.502,55							15.964,37	$ 57.459.502,55			15964,37	$ 57.459.502,55	0,00	$ 0,00
30	ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO				$ 0,00	0,00	$ 0,00							-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
31	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00							-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
32	COORDINACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	M2	15.964,37	$ 2.699,24	$ 43.091.628,91	15.964,37	$ 43.091.628,91							15.964,37	$ 43.091.628,91			15964,37	$ 43.091.628,51	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL FASE I- ESTUDIOS Y DISEÑO				$ 2.958.066.834,93		$ 2.958.066.834,93								$ 2.958.066.834,93				2.958.066.834,93		$ 0,00
	IVA		19%		$ 561.652.698,64		$ 561.652.698,64								$ 561.652.698,64				561.652.698,64		$ 0,00
	TOTAL FASE I				$ 3.517.719.533,57		$ 3.517.719.533,57								$ 3.517.719.533,57				3.517.719.533,57		$ 0,00
	SUB TOTAL ADICION FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS																				$ 0,00
	TOTAL FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 3.517.719.533,57										$ 3.517.719.533,57				$ 3.517.719.533,57		$ 0,00

	FASE II- CONSTRUCCIÓN	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
	ADECUACION CASA OFICINAS									CANTIDAD		VALOR TOTAL									
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
33	DEMOLICION PISOS	M2	71,25	$ 13.015,00	$ 927.318,75	71,25	$ 927.318,75	-	M2		-		0	71,25	$ 927.318,75			71,25	$ 927.318,75	0,00	$ 0,00
34	DEMOLICION ENCHAPES	M2	12,69	$ 9.643,00	$ 122.385,18	12,69	$ 122.385,18	-	M2		-		0	12,69	$ 122.385,18			12,69	$ 122.385,18	0,00	$ 0,00
35	RELLENO PISO HABITACIONES PIEDRA RAJON	M3	10,62	$ 98.264,00	$ 1.043.563,68	10,62	$ 1.043.563,68	-	M3		-		0	10,62	$ 1.043.563,68			10,62	$ 1.043.563,68	0,00	$ 0,00
36	RELLENO RECEBO COMPACTADO	M3	5,56	$ 80.828,00	$ 449.631,80	5,56	$ 449.631,80	-	M3		-		0	5,56	$ 449.631,80			5,56	$ 449.631,80	0,00	$ 0,00
37	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UN	6,00	$ 18.338,00	$ 110.028,00	6,00	$ 110.028,00	-	UN		-		0	6,00	$ 110.028,00			6,00	$ 110.028,00	0,00	$ 0,00
38	DESMONTE VENTANAS	UN	6,00	$ 15.511,00	$ 93.466,00	6,00	$ 93.466,00	-	UN		-		0	6,00	$ 93.466,00			6,00	$ 93.466,00	0,00	$ 0,00
39	APAMDO DE PISOS	UN	64,00	$ 36.527,00	$ 2.339.448,00	64,00	$ 2.339.448,00	-	UN		-		0	64,00	$ 2.339.448,00			64,00	$ 2.339.448,00	0,00	$ 0,00
40	PAÑETE MUROS	M2	169,67	$ 24.443,00	$ 4.147.268,25	169,67	$ 4.147.268,25	-	M2		-		0	169,67	$ 4.147.268,25			169,67	$ 4.147.268,25	0,00	$ 0,00
41	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	23,00	$ 15.927,00	$ 366.321,00	23,00	$ 366.321,00	-	M2		-		0	23,00	$ 366.321,00			23,00	$ 366.321,00	0,00	$ 0,00
42	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	49,00	$ 43.820,00	$ 2.147.720,00	49,00	$ 2.147.720,00	-	M2		-		0	49,00	$ 2.147.720,00			49,00	$ 2.147.720,00	0,00	$ 0,00
43	PUNTOS SANITARIOS (suelta sanitaria PVC -S sanal 3")	UN	3,00	$ 112.973,00	$ 338.919,00	3,00	$ 338.919,00	-	UN		-		0	3,00	$ 338.919,00			3,00	$ 338.919,00	0,00	$ 0,00
44	PUNTOS ELECTRICOS (suelta lampara Toma PVC consolida)	UN	28,00	$ 73.071,00	$ 2.045.988,00	28,00	$ 2.045.988,00	-	UN		-		0	28,00	$ 2.045.988,00			28,00	$ 2.045.988,00	0,00	$ 0,00
45	ACABADO PISO ENCHAPE CERAMICO	M2	64,00	$ 74.451,00	$ 4.764.864,00	64,00	$ 4.764.864,00	-	M2		-		0	64,00	$ 4.764.864,00			64,00	$ 4.764.864,00	0,00	$ 0,00
46	MARCO PUERTA Y ENCHAPE TAMA CHAPA 0.15M	UN	6,00	$ 304.192,00	$ 1.825.152,00	6,00	$ 1.825.152,00	-	UN		-		0	6,00	$ 1.825.152,00			6,00	$ 1.825.152,00	0,00	$ 0,00
47	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	7,67	$ 343.509,00	$ 2.740.149,78	7,67	$ 2.740.149,78	-	M2		-		0	7,67	$ 2.740.149,78			7,67	$ 2.740.149,78	0,00	$ 0,00
48	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	169,67	$ 9.820,00	$ 1.666.189,22	169,67	$ 1.666.189,22	-	M2		-		0	169,67	$ 1.666.189,22			169,67	$ 1.666.189,22	0,00	$ 0,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE INCLUYE GRIFERIA	UN	1,00	$ 379.937,00	$ 379.937,00	1,00	$ 379.937,00	-	UN		-		0	1,00	$ 379.937,00			1,00	$ 379.937,00	0,00	$ 0,00
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 233.770,00	$ 233.770,00	1,00	$ 233.770,00	-	UN		-		0	1,00	$ 233.770,00			1,00	$ 233.770,00	0,00	$ 0,00
51	CIELO RASO DRYWALL	M2	64,00	$ 67.172,00	$ 4.299.008,00	64,00	$ 4.299.008,00	-	M2		-		0	64,00	$ 4.299.008,00			64,00	$ 4.299.008,00	0,00	$ 0,00
	ADECUACION CASA ALMACEN				$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	0				0	-	$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
52	PAÑETE MUROS	M2	113,87	$ 24.443,00	$ 2.783.397,74	113,87	$ 2.783.397,74	-	M2		-		0	113,87	$ 2.783.397,74			113,87	$ 2.783.397,74	0,00	$ 0,00
53	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	15,50	$ 15.927,00	$ 246.809,50	15,50	$ 246.809,50	-	M2		-		0	15,50	$ 246.809,50			15,50	$ 246.809,50	0,00	$ 0,00
54	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	31,00	$ 46.820,00	$ 1.451.420,00	31,00	$ 1.451.420,00	-	M2		-		0	31,00	$ 1.451.420,00			31,00	$ 1.451.420,00	0,00	$ 0,00
55	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 13 .0.8	UN	5,00	$ 186.065,00	$ 930.325,00	5,00	$ 930.325,00	-	UN		-		0	5,00	$ 930.325,00			5,00	$ 930.325,00	0,00	$ 0,00
56	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 LIG. ANTICORROSIVO	UN	5,00	$ 272.559,00	$ 1.362.795,00	5,00	$ 1.362.795,00	-	UN		-		0	5,00	$ 1.362.795,00			5,00	$ 1.362.795,00	0,00	$ 0,00
57	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	59,60	$ 9.820,00	$ 585.512,00	59,60	$ 585.512,00	-	M2		-		0	59,60	$ 585.512,00			59,60	$ 585.512,00	0,00	$ 0,00
58	PUNTOS SANITARIOS (suelta sanitaria PVC -S sanal 3")	UN	3,00	$ 112.973,00	$ 338.919,00	3,00	$ 338.919,00	-	UN		-		0	3,00	$ 338.919,00			3,00	$ 338.919,00	0,00	$ 0,00
59	PUNTOS HIDRAULICOS (PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/RAFAL 1/2")	UN	3,00	$ 87.224,00	$ 261.672,00	3,00	$ 261.672,00	-	UN		-		0	3,00	$ 261.672,00			3,00	$ 261.672,00	0,00	$ 0,00
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	$ 379.937,00	$ 759.874,00	2,00	$ 759.874,00	-	UN		-		0	2,00	$ 759.874,00			2,00	$ 759.874,00	0,00	$ 0,00
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 233.770,00	$ 233.770,00	1,00	$ 233.770,00	-	UN		-		0	1,00	$ 233.770,00			1,00	$ 233.770,00	0,00	$ 0,00
62	MAMPOSTERIA CUARTO ALMACEN (MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M.)	M2	49,30	$ 53.570,00	$ 2.597.431,00	49,30	$ 2.597.431,00	-	M2		-		0	49,30	$ 2.597.431,00			49,30	$ 2.597.431,00	0,00	$ 0,00
63	PAÑETE CUARTO ALMACEN	M2	49,30	$ 24.443,00	$ 1.180.595,90	49,30	$ 1.180.595,90	-	M2		-		0	49,30	$ 1.180.595,90			49,30	$ 1.180.595,90	0,00	$ 0,00
64	CUBIERTA EN TEJA DE Z NC (TEJA EN LÁM NA GALVANIZADA CAL 20)	M2	67,63	$ 54.417,00	$ 3.680.880,33	67,63	$ 3.680.880,33	-	M2		-		0	67,63	$ 3.680.880,33			67,63	$ 3.680.880,33	0,00	$ 0,00
65	PUNTOS ELECTRICOS (suelta lampara Toma PVC consolida)	UN	6,00	$ 73.071,00	$ 438.426,00	6,00	$ 438.426,00	-	UN		-		0	6,00	$ 438.426,00			6,00	$ 438.426,00	0,00	$ 0,00
66	PUERTAS EN LAM NA METALICA 1.20 (CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA H. 4.60 MTS)	M2	2,64	$ 194.360,00	$ 513.163,20	2,64	$ 513.163,20	-	M2		-		0	2,64	$ 513.163,20			2,64	$ 513.163,20	0,00	$ 0,00
67	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	2,00	$ 343.509,00	$ 687.018,00	2,00	$ 687.018,00	-	M2		-		0	2,00	$ 687.018,00			2,00	$ 687.018,00	0,00	$ 0,00
68	RECEBO COMPACTADO BASE PLACA DE CONTRAPISO	M3	18,51	$ 89.878,00	$ 1.663.911,41	18,51	$ 1.663.911,41	-	M3		-		0	18,51	$ 1.663.911,41			18,51	$ 1.663.911,41	0,00	$ 0,00
69	PLACA DE CONTRAPISO ESPESOR 10CMS (PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI)	M2	61,71	$ 70.909,00	$ 4.380.731,19	61,71	$ 4.380.731,19	-	M2		-		0	61,71	$ 4.380.731,19			61,71	$ 4.380.731,19	0,00	$ 0,00
70	CERCA EN TEJA DE ZINC H. 1.80 M	ml	310,00	$ 59.510,00	$ 18.138.100,00	310,00	$ 18.138.100,00	-	ml		-		0	310,00	$ 18.138.100,00			310,00	$ 18.138.100,00	0,00	$ 0,00

116	PANEL ACÚSTICO ABSORBENTE MUROS COMPUESTO POR LAMINA DE BLACK TIGATEX 2", MARCO INTERNO Y FORRADO EN PAÑO, SOBREPUESTO EN MURO POR MEDIO DE SISTEMA DE CUCHILLA. (modulacion de 1m x 1,60 m)	m^2	1.760,00	$ 353.000,01	$ 621.000.025,14	0,00	$ 0,00		m2			0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ 0,00					0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
117	SUMINISTRO DE LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO ACOUSTIC CONTROL FB PARA PISO (1.2m x 1m) 8+2,5CM FIBRA DE VIDRIO 1" + MEMBRANA ACÚSTICA DE 3MM, NO INCLUYE MANO DE OBRA, INCLUYE TRANSPORTE HASTA OBRA	M2	988,00	$ 215.000,04	$ 212.420.038,55	0,00	$ 0,00		M2			0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	SUB TOTAL ELEMENTOS DE ACÚSTICA				$ 1.559.629.317,89	-						-	-	$ 0,00		-	-	-	-		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA -ALUMINIO	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)								
118	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 6-6+5 Laminado Crudo ca Sugarkind 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38, Multilaminado Crudo Antimoho 17mm (6-6+5) (6mm22), con Protección PDB (EN 356) PVB 0,76 EN AMBIENTES Y SALONES	M2	404,03	$ 2.173.644,03	$ 878.299.205,33	325,14	$ 706.812.344,81		M2			$ 0,00	$ 0,00	325,14	$ 706.812.344,81		$ 0,00	325,14	$ 706.812.344,81	0,00		$ 0,00
119	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5-5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5-5) Incoloro PVB 0,38 EN CIRCULACIONES	M2	356,78	$ 1.520.517,10	$ 464.913.308,50	451,79	$ 702.181.112,13		M2	1,00		$ 1.520.517,10	$ 0,00	470,79	$ 715.634.210,10		$ 0,00	451,79	$ 702.181.112,13	8,69		$ 13.673.097,97
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
120	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A 588 GRADO B (SOPORTE SUPERIOR VENTANAS Y VOLADIZOS)	kg		$ 23.099,00	$ 0,00	4570,28	$ 105.568.697,72		kg			$ 0,00	$ 0,00	4.570,28	$ 105.568.697,72		$ 0,00	4570,28	$ 105.568.697,72	0,00		$ 0,00
121	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		$ 369.407,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00	2,40	$ 879.378,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,40		$ 879.378,60
122	BARANDA METALICA	ML		$ 540.543,00	$ 0,00	40,71	$ 22.005.505,53		ML			$ 0,00	$ 0,00	40,50	$ 22.054.154,40		$ 0,00	40,71	$ 22.005.505,53	0,09		$ 48.648,87
123	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		$ 25.868,00		1117,00	$ 30.123.258,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	1.117,00	$ 30.123.258,00		$ 0,00	1117,00	$ 30.123.258,00	0,00		$ 0,00
124	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	m^3		$ 778.875,00		15,09	$ 11.712.187,50		m3			$ 0,00	$ 0,00	15,09	$ 11.712.187,50		$ 0,00	15,09	$ 11.712.187,50	0,00		$ 0,00
125	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	kg		$ 7.183,00	$ 0,00	1417,62	$ 10.184.560,66		kg			$ 0,00	$ 0,00	1.417,62	$ 10.184.560,66		$ 0,00	1417,62	$ 10.184.560,66	0,00		$ 0,00
	SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO				$ 1.343.211.513,82		1.668.639.644,65					$ 1.520.517,10	$ 0,00		$ 1.603.140.809,29				$ 1.668.639.644,65			$ 14.631.123,64
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)								
126	Punto hidraulico PVC Presion 1/2" (Lavamanos)	und	11,00	$ 87.224,00	$ 959.464,00	0,00	$ 0,00		und			$ 0,00	$ 0,00	15,00	$ 1.308.360,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,00		$ 1.308.360,00
127	Punto hidraulico PVC Presion 1 1/4" (Fluxometro sanitario)	und	10,00	$ 116.050,00	$ 1.160.500,00	0,00	$ 0,00		und			$ 0,00	$ 0,00	24,00	$ 2.785.200,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	24,00		$ 2.785.200,00
128	SALIDA SANITARIA PVC S/PARAL 2" ORINAL	und	2,00	$ 92.635,00	$ 185.270,00	0,00	$ 0,00		und			$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 277.905,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00		$ 277.905,00
129	TUBERIA PVC-C300 4"	ml	6,00	$ 115.476,00	$ 692.856,00	6,00	$ 692.856,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	204,00	$ 23.557.104,00	62,07	$ 7.167.625,33	68,07	$ 7.860.481,33	135,93		$ 15.696.622,67
130	ACCESORIOS PVC-C900 4"	un	3,00	$ 740.068,00	$ 2.220.195,00	8,00	$ 5.920.520,00		un			$ 0,00	$ 0,00	8,00	$ 5.920.520,00		$ 0,00	8,00	$ 5.920.520,00	0,00		$ 0,00
131	Tuberia A.C. SCH - 40 4"	ml	12,10	$ 196.295,00	$ 2.375.181,50	8,00	$ 1.570.360,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	12,10	$ 2.375.181,50		$ 0,00	8,00	$ 1.570.360,00	4,10		$ 804.813,50
132	Tuberia A.C. SCH - 40 3"	ml	5,00	$ 132.650,00	$ 663.250,00	41,58	$ 5.515.836,45		ml			$ 0,00	$ 0,00	42,80	$ 5.677.676,80		$ 0,00	41,58	$ 5.515.836,45	1,22		$ 161.840,35
133	Tuberia A.C. SCH - 40 2-1/2"	ml	10,00	$ 112.729,00	$ 1.127.290,00	39,10	$ 4.407.703,90		ml			$ 0,00	$ 0,00	39,10	$ 4.407.703,90		$ 0,00	39,10	$ 4.407.703,90	0,00		$ 0,00
134	Tuberia A.C. SCH - 40 2"	ml	33,00	$ 87.763,00	$ 2.897.599,00	22,10	$ 1.939.818,30		ml			$ 0,00	$ 0,00	22,10	$ 1.939.818,30		$ 0,00	22,10	$ 1.939.818,30	0,00		$ 0,00
135	Tuberia A.C. SCH - 40 1-1/2"	ml	100,00	$ 59.551,00	$ 5.955.100,00	10,33	$ 615.161,83		ml			$ 0,00	$ 0,00	10,33	$ 615.161,83		$ 0,00	10,33	$ 615.161,83	0,00		$ 0,00
136	Accesorios A.C. 4"	un	7,00	$ 162.944,00	$ 1.140.608,00	7,00	$ 1.140.608,00		un			$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.140.608,00		$ 0,00	7,00	$ 1.140.608,00	0,00		$ 0,00
137	Union Rapida Flanjuela 4"	un	2,00	$ 53.123,00	$ 106.246,00	0,00	$ 0,00		un			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
138	ABRAZADERA TUBERIA POR DUCTOS (MORDAZA) 4"	un	5,00	$ 42.819,00	$ 214.095,00	50,00	$ 2.140.950,00		un			$ 0,00	$ 0,00	56,00	$ 2.397.864,00		$ 0,00	50,00	$ 2.140.950,00	6,00		$ 256.914,00
NP4	PUNTO A F. DUCHAS	UND		$ 58.495,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 395.255,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00		$ 395.255,00
NP5	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML		$ 11.376,00		0,00	$ 0,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	32,57	$ 370.518,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	32,57		$ 370.518,32
NP6	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML		$ 14.110,00		0,00	$ 0,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	22,50	$ 317.708,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,50		$ 317.708,00
NP7	REGISTRO DE 1 1/2	UND		$ 229.918,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 229.918,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00		$ 229.918,00
NP8	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" SANITARIO FLUXOMETRO	UND		$ 120.145,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.682.030,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00		$ 1.682.030,00
NP9	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" DUCHA	UND		$ 92.635,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 648.445,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00		$ 648.445,00
NP10	RED SANITARIA PVC 2"	ML		$ 33.372,00		0,00	$ 0,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	13,57	$ 452.959,04		$ 0,00	0,00	$ 0,00	13,57		$ 452.959,04
NP11	REVENTILACION TUBERIA PVC-V 2"	ML		$ 23.593,00		0,00	$ 0,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	19,20	$ 452.985,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,20		$ 452.985,60
NP12	SIFON CON SOSCO 4 5 CM X 3,5 CM	UND		$ 29.332,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	14,00	$ 410.648,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00		$ 410.648,00
	ITEM NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00						$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
NP13	RED SUMINISTRO PVC 1	ML		$ 21.468,00		0,00	$ 0,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	404,62	$ 8.686.875,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	404,62		$ 8.686.875,76
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P 1 1/4"	ML		$ 39.626,00		0,00	$ 0,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	2,53	$ 100.259,78		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,53		$ 100.259,78
NP15	RED DE SUMINISTRO DE PVC 1 1/ 2	ML		$ 33.769,00		0,00	$ 0,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	10,62	$ 358.799,70		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,62		$ 358.799,70
NP16	RED DE SUMINISTRO DE PVC 2"	ML		$ 47.418,00		0,00	$ 0,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	25,94	$ 1.229.971,04		$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,94		$ 1.229.971,04
NP17	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML		$ 72.630,00		0,00	$ 0,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	39,52	$ 2.870.000,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,52		$ 2.870.000,60
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3"	ML		$ 82.270,00		0,00	$ 0,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	39,22	$ 3.226.629,40		$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,22		$ 3.226.629,40
NP19	REGISTRO DE 1/2	un		$ 86.693,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.040.364,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00		$ 1.040.364,00
NP20	REGISTRO DE 3/4"	un		$ 108.415,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 108.415,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00		$ 108.415,00
NP21	REGISTRO DE 1	UND		$ 154.553,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 154.553,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00		$ 154.553,00
NP22	REGISTRO DE 2	UND		$ 387.397,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.162.178,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00		$ 1.162.178,00
NP23	REGISTRO DE 2 1/2	UND		$ 519.439,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 519.439,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00		$ 519.439,00
	RED CONTRAINCENDIOS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
NP24	PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2	UND		$ 93.691,00		107,00	$ 10.043.127,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	109,00	$ 10.139.959,00		$ 0,00	107,00	$ 10.043.127,00	1,00		$ 93.691,00
NP25	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO 1"SCH40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML		$ 58.464,00		277,61	$ 15.658.314,44		ML			$ 0,00	$ 0,00	277,61	$ 15.658.314,44		$ 0,00	277,61	$ 15.658.314,44	0,00		$ 0,00
NP28	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO DE HASTA 2"	ML		$ 5.669,00		310,04	$ 1.754.516,36		ML			$ 0,00	$ 0,00	310,04	$ 1.754.516,36		$ 0,00	310,04	$ 1.754.516,36	0,00		$ 0,00
NP27	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO MAYOR A 2"	ML		$ 8.842,00		127,00	$ 1.122.934,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	127,00	$ 1.122.934,00		$ 0,00	127,00	$ 1.122.934,00	0,00		$ 0,00
NP26	VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1"	un		$ 421.954,00		1,00	$ 421.954,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 421.954,00		$ 0,00	1,00	$ 421.954,00	0,00		$ 0,00
NP29	CAMESA INYECCION DE 4 X 2 1/2 X 2 1/2	un		$ 3.527.391,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.527.391,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00		$ 3.527.391,00
NP30	GABINETE TIPO II	un		$ 1.391.961,00		4,00	$ 5.567.844,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	4,00	$ 5.567.844,00		$ 0,00	4,00	$ 5.567.844,00	0,00		$ 0,00
NP31	ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2	un		$ 97.494,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	108,00	$ 8.209.352,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	108,00		$ 8.209.352,00
NP73	RESTRICTOR LO SERIE 1200 C900 4"	UND		$ 1.454.168,35		0,00			UND	10,00		$ 14.541.683,48	$ 0,00	10,00	$ 14.541.683,48	10,00	$ 14.541.683,48	10,00	$ 14.541.683,48	0,00		$ 0,00
NP74	ESTACION DE CONTROL DE ROCIADORES DE 2"	UND		$ 4.779.512,61		0,00			UND	2,00		$ 9.559.025,21	$ 0,00	2,00	$ 9.559.025,21	2,00	$ 9.559.025,21	2,00	$ 9.559.025,21	0,00		$ 0,00
NP75	KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN C-900 - A/C comotella	UND		$ 3.488.563,33		0,00			UND	1,00		$ 3.488.563,33	$ 0,00	1,00	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33	1,00	$ 3.488.563,33	0,00		$ 0,00
NP76	SOPORTE ANTISISMICO 2"	UND		$ 208.123,76		0,00			UND	4,00		$ 832.494,86	$ 0,00	4,00	$ 832.494,86	4,00	$ 832.494,86	4,00	$ 832.494,86	0,00		$ 0,00
NP77	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2	UND		$ 216.120,70		0,00			UND	7,00		$ 1.512.844,89	$ 0,00	7,00	$ 1.512.844,89	7,00	$ 1.512.844,89	7,00	$ 1.512.844,89	0,00		$ 0,00
NP78	SOPORTE ANTISISMICO 3"	UND		$ 242.687,70		0,00			UND	7,00		$ 1.700.269,69	$ 0,00	7,00	$ 1.700.269,69	7,00	$ 1.700.269,69	7,00	$ 1.700.269,69	0,00		$ 0,00
	RED DE AGUAS LLUVIAS				$ 0,00	0,00						$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
139	TUBERIA PVC-S 6"	ml	56,40	$ 112.417,00	$ 6.340.318,80	56,40	$ 6.340.318,80		ml			$ 0,00	$ 0,00	69,75	$ 7.841.009,75		$ 0,00	56,40	$ 6.340.318,80	13,35		$ 1.500.769,95
140	ACCESORIOS PVC S 6"	un	9,00	$ 195.848,00	$ 1.762.632,00	9,00	$ 1.762.632,00		un			$ 0,00	$ 0,00	9,00	$ 1.762.632,00		$ 0,00	9,00	$ 1.762.632,00	0,00		$ 0,00
141	ABRAZADERA TUBERIA POR DUCTOS (MORDAZA) 6"	un	18,00	$ 52.461,00	$ 944.298,00	18,00	$ 944.298,00		un			$ 0,00	$ 0,00	18,00	$ 944.298,00		$ 0,00	18,00	$ 944.298,00	0,00		$ 0,00
NP33	TUBERIA SANITARIO PVC 4	ml		$ 70.024,00		215,91	$ 15.123.799,79		ml			$ 0,00	$ 0,00	217,47	$ 15.241.167,45		$ 0,00	215,54	$ 15.123.799,79	1,53		$ 107.369,69
NP34	REJILLA TIPO GRANADA 6X4	un		$ 70.574,74		12,00	$ 846.296,88		un			$ 0,00	$ 0,00	12,00	$ 846.296,88		$ 0,00	12,00	$ 846.296,88	0,00		$ 0,00
NP35	CODO SANITARIO CXC 90X4"	un		$ 19.459,18		12,00	$ 233.630,16		un			$ 0,00	$ 0,00	12,00	$ 233.630,16		$ 0,00	12,00	$ 233.630,16	0,00		$ 0,00
NP36	CODO SANITARIO CXC 45°X4"	un		$ 23.783,53		6,00	$ 142.701,48		un			$ 0,00	$ 0,00	6,00	$ 142.701,48		$ 0,00	6,00	$ 142.701,48	0,00		$ 0,00
NP37	ADAPTADOR SANITARIO DE LIMPIEZA TAPON PVC 4"	un		$ 34.508,61		2,00	$ 69.017,22		un			$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 69.017,22		$ 0,00	2,00	$ 69.017,22	0,00		$ 0,00
NP38	YEE SENCILLA SANITARIO PCV 4"	un		$ 41.569,00		14,00	$ 582.848,64		un			$ 0,00	$ 0,00	14,00	$ 582.848,64		$ 0,00	14,00	$ 582.848,64	0,00		$ 0,00
NP39	UNION SANITAR-O PVC C/C 4"	un		$ 13.354,75		19,00	$ 253.741,01		un			$ 0,00	$ 0,00	19,00	$ 253.741,01		$ 0,00	19,00	$ 253.741,01	0,00		$ 0,00
NP40	SIFON PARA NIVEL EN PVC DE 4	un		$ 57.200,00		0,00	$ 0,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	9,00	$ 515.610,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00		$ 515.610,00
	SUB TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				$ 29.735.333,40		24.820.791,49					$ 31.635.691,59	$ 0,00		$ 151.317.847,69		$ 33.603.276,91		$ 123.624.068,40			$ 57.693.779,49
	INSTALACIONES ELECTRICAS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)								
142	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No.400 KCMIL +1xNo.400) DE TRANSFORMADOR A TABLERO TOTALIZADOR GENERAL, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	15,00	$ 2.089.199,53	$ 31.337.993,02	$ 0,00			ml			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No.400 KCMIL +1xNo.400)TABLERO TOTALIZADOR GENERAL A PLANTA EMERGENCIA, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	10,00	$ 2.089.199,53	$ 20.891.995,34	$ 0,00			ml			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00

171	SALIDA DE DATOS SENCILLA EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	25,00	$ 33.829,00	$ 845.725,00		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
172	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	5,00	$ 33.829,00	$ 169.145,00		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
173	SALIDA VIDEO BEAM EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION NO INCLUYE VIDEO BEAM	un	54,00	$ 33.829,00	$ 1.826.766,00		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
174	SALIDA ACCESS POINT EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION. NO INCLUYE EQUIPO	un	28,00	$ 33.829,00	$ 947.212,00		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
175	Patch cord CAT 6A, UTP, Diametro Reductor 28 AWG 8 2mm, 7ft (2.1 metros), azul.	un	520,00	$ 36.762,34	$ 19.116.419,30		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
176	Cable categoria 6 U/UTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul, LSZH, caja de 305 metros.	un	4,00	$ 895.906,17	$ 3.583.624,69		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
177	Hembla cuno 48 puertos UTP 6	un	2,00	$ 304.857,54	$ 609.715,09		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
178	Organizador doble con tapa	un	2,00	$ 121.868,39	$ 243.736,79		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
179	Cablebla cerrada 47U 800X2000 mm Puertas Microperforadas	un	1,00	$ 4.373.716,00	$ 4.373.716,00		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
180	Organizador vertical para Gabinete de 42U, 600 mm de ancho	un	2,00	$ 520.073,45	$ 1.040.146,90		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
181	Multitoma Horizontal Incluya Blindaje de 15kA	un	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
182	Barraje horizontal para rack	un	1,00	$ 520.073,45	$ 520.073,45		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
183	CAJA DE PASO METALICA 15X15	un	60,00	$ 78.774,69	$ 4.726.481,48		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
184	Suministro, instalacion bandeja porta cables - tipo escalera con tapa, accesorios de 200*50	ml	200,00	$ 54.774,69	$ 10.954.937,92		$ 0,00		ml				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
185	Canaleta ebodica 50x100mm	ml	50,00	$ 38.774,69	$ 1.938.734,45		$ 0,00		ml				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SISTEMA DE SONIDO	-	-				$ 0,00						-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
186	SALIDA DE SONIDO MONO	un	25,00	$ 78.607,63	$ 1.965.175,75		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
187	Caida blindado para audio Tipo 2	ml	260,00	$ 21.692,34	$ 5.415.566,23		$ 0,00		ml				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
188	Caida categoria 6 U/UTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul, LSZH, caja de 305 metros.	un	1,00	$ 895.706,17	$ 895.706,17		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CERTIFICACIONES	-	-				$ 0,00						-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
189	CERTIFICACION RETIE	gl	1,00	$ 14.539.262,34	$ 14.539.262,34		$ 0,00		gl				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
190	CERTIFICACION RETILAP	gl	1,00	$ 10.293.682,34	$ 10.293.682,34		$ 0,00		gl				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
191	Certificacion puntos categoria 6	un	58,00	$ 94.912,34	$ 5.504.516,00		$ 0,00		un				-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 369.497.309,69			-					-	-		$ 0,00		-		-		$ 0,00

	ACABADOS DE MUROS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)									
192	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM	m2	3.303,60	$ 24.443,00	$ 80.749.894,80	2649,77	$ 64.743.514,57		m2			$ 0,00	$ 0,00		3.145,43	$ 76.883.721,04		$ 0,00	2649,77	$ 64.743.514,57	495,66	$ 12.139.906,47
193	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	m2	650,16	$ 28.668,00	$ 18.826.032,66	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00		-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
194	INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO EN FACHADAS	m2	544,00	$ 247.908,51	$ 134.882.230,04	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00		-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
195	RECUBRIMIENTO EN FACHADA CON LAMINA DE FIBROCEMENTO JUNTA MARCADA ANCLAJE MECANICO	m2	450,32	$ 154.249,50	$ 69.501.827,48	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00		-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
196	CORTASOL CELOSIA C-3 EN ALUZINC	m2	14,00	$ 362.288,71	$ 5.072.013,96	0,00	$ 0,00		m2		-564,28	$ 0,00	-$ 204.468.278,23		-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
197	COLOR PLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	450,32	$ 81.419,00	$ 36.667.377,63	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00		-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00		-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
198	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM (final)	ml	-	$ 15.184,00	$ 0,00	2678,58	$ 40.641.190,72		ml			$ 0,00	$ 0,00		2.678,58	$ 40.641.190,72		$ 0,00	2678,58	$ 40.641.190,72	0,00	$ 0,00
199	LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO 39X5X12 REF COBRIZO DE SANTAFE	M2	-	$ 227.749,68	$ 0,00	449,54	$ 102.154.020,13		M2		-465,2	$ 0,00	-$ 105.649.244,18		449,81	$ 102.445.198,40		$ 0,00	449,54	$ 102.154.020,18	1,28	$ 291.178,22
200	LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO 39X5X12 REF COBRIZO DE SANTAFE	ML	-	$ 114.824,43	$ 0,00	18,40	$ 2.107.250,43		ML			$ 0,00	$ 0,00		58,30	$ 6.447.719,27		$ 0,00	18,40	$ 2.107.250,43	37,90	$ 4.340.477,76
201	HILADA PARADA LADRILLO A LA VISTA	ML	-	$ 114.824,45	$ 0,00	141,70	$ 16.238.119,82		ML			$ 0,00	$ 0,00		141,70	$ 16.238.119,82		$ 0,00	141,70	$ 16.238.119,82	0,00	$ 0,00
202	ENCHAPE COLUMNAS EN LADRILLO A LA VISTA	ML	-	$ 129.274,00	$ 0,00	107,70	$ 13.815.109,80		ML			$ 0,00	$ 0,00		107,70	$ 13.815.109,80		$ 0,00	107,70	$ 13.815.109,80	0,00	$ 0,00
203	GROUTING DOVELAS	ML	-	$ 50.045,70	$ 0,00	332,27	$ 16.628.684,74		ML			$ 0,00	$ 0,00		332,50	$ 16.640.298,91		$ 0,00	332,27	$ 16.628.684,74	0,23	$ 28.524,22
204	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	-	$ 7.163,00	$ 0,00	185,19	$ 1.326.530,30		kg			$ 0,00	$ 0,00		185,19	$ 1.326.530,30		$ 0,00	185,19	$ 1.326.530,30	0,81	$ 5.797,70
205	ACERO FIGURADO 60000 PSI (GRAFIL DE 4 MM)	kg	-	$ 7.163,00	$ 0,00	46,52	$ 333.222,76		kg			$ 0,00	$ 0,00		46,52	$ 333.222,76		$ 0,00	46,52	$ 333.222,76	0,00	$ 0,00
206	LAVADO DE FACHADA	M2	-	$ 38.347,00	$ 0,00	455,00	$ 17.631.305,00		M2			$ 0,00	$ 0,00		455,00	$ 17.631.305,00		$ 0,00	455,00	$ 17.631.305,00	0,00	$ 0,00
NP79	ACABADO DE FACHADA EN GRANIPLAST, INCLUYE COLOR	M2		$ 189.200,74		0,00			M2	390		$ 73.819.488,60	$ 0,00		390,00	$ 73.819.488,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	390,00	$ 73.819.488,60
	SUB TOTAL - ACABADOS DE MUROS				$ 371.919.376,86		275.809.297,31					$ 73.819.488,60	-$ 308.797.522,41			$ 366.432.669,32		$ 0,00		$ 275.809.297,31		$ 90.623.393,01

	CIELO RASOS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)									
	ITEMS NO PREVISTOS																				0,00	$ 0,00
207	CIELO RASO EN SUPERBOARD 8 MM (INCLUYE PINTURA) EN FACHADA)	m2		$ 150.000,00		0,00	$ 0,00		m2			-	-	0	271,00	$ 48.780.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	271,00	$ 48.780.000,00
	SUB TOTAL - CIELO RASOS				$ 0,00		-					-	-			$ 48.780.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 48.780.000,00

	BLOQUE No. 3 TEATRO					EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4						SALDO POR EJECUTAR	
	CIMENTACION	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL					PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS			
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
208	CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PREHUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0,50 MTR A 0,60 MTR	UN	52,00	$ 86.588,00	$ 4.502.576,00	52,00	$ 4.502.576,00		UN			-	-	0	52,00	$ 4.502.576,00		$ 0,00	52,00	$ 4.502.576,00	0,00	$ 0,00
209	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ml	398,71	$ 504.356,00	$ 201.091.780,76	398,71	$ 201.091.780,76		ml			-	-	0	398,71	$ 201.091.780,76		$ 0,00	398,71	$ 201.091.780,76	0,00	$ 0,00
210	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	140,12	$ 634.715,00	$ 88.939.405,62	140,12	$ 88.939.405,62		ml			-	-	0	140,12	$ 88.939.405,62		$ 0,00	140,12	$ 88.939.405,62	0,00	$ 0,00
211	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	639,44	$ 949.723,00	$ 607.329.602,08	639,44	$ 607.329.602,08		ml			-	-	0	639,44	$ 607.329.602,08		$ 0,00	639,44	$ 607.329.602,08	0,00	$ 0,00
212	BASE EN CONCRETO PORE 1 600PSI	m3	15,86	$ 410.402,00	$ 6.510.740,45	15,86	$ 6.510.740,45		m3			-	-	0	15,86	$ 6.510.740,45		$ 0,00	15,86	$ 6.510.740,45	0,00	$ 0,00
213	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	147,60	$ 741.244,00	$ 109.537.345,69	147,60	$ 109.537.345,69		m3			-	-	0	147,60	$ 109.537.345,69		$ 0,00	147,60	$ 109.537.345,69	0,00	$ 0,00
214	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	m3	9,68	$ 412.215,00	$ 3.991.599,90	9,68	$ 3.991.599,90		m3			-	-	0	9,68	$ 3.991.599,90		$ 0,00	9,68	$ 3.991.599,90	0,00	$ 0,00
215	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI	m3	51,60	$ 814.978,00	$ 42.050.284,80	51,60	$ 42.050.284,80		m3			-	-	0	51,60	$ 42.050.284,80		$ 0,00	51,60	$ 42.050.284,80	0,00	$ 0,00
216	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp. 0.15 mts	m2	951,00	$ 129.058,00	$ 122.732.256,00	951,00	$ 122.732.256,00		m2			-	-	0	951,00	$ 122.732.256,00		$ 0,00	951,00	$ 122.732.256,00	0,00	$ 0,00
217	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES,DADOS Y VIGAS DE CIVENTACION	kg	58.900,94	$ 7.163,00	$ 421.907.433,22	58900,94	$ 421.907.433,22		kg			-	-	0	58.900,94	$ 421.907.433,22		$ 0,00	58900,94	$ 421.907.433,22	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - CIMENTACION				$ 1.609.569.421,82		1.609.569.421,82					-	-			$ 1.609.569.421,82		$ 0,00		$ 1.609.569.421,82		$ 0,00

	ESTRUCTURA	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)									
218	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B	kg	150.255,58	$ 23.099,00	$ 3.470.753.718,18	155417,72	$ 3.589.993.952,23		kg			$ 0,00	$ 0,00		155.417,72	$ 3.589.993.952,23		$ 0,00	155417,72	$ 3.589.993.952,23	0,00	$ 0,00
219	RELLENO COLUMNAS (CONCRETO FLUIDO 3000 PSI)	m3	10,10	$ 697.302,00	$ 8.753.952,20	43,13	$ 41.746.993,29		m3			$ 0,00	$ 0,00		43,13	$ 41.746.993,29		$ 0,00	43,13	$ 41.746.993,29	0,00	$ 0,00
220	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PSI Incluya conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E D7-08(Entrepisos)	m2	729,28	$ 107.119,00	$ 138.333.334,32	719,00	$ 134.539.697,61		m2			$ 0,00	$ 0,00		723,68	$ 135.451.299,66		$ 0,00	719,00	$ 134.539.697,61	4,68	$ 912.392,24
221	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluya conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E C7-08 (Cub)	m2	958,00	$ 168.699,00	$ 161.276.244,00	1120,66	$ 189.054.221,34		m2			$ 0,00	$ 0,00		1.120,66	$ 189.054.221,34		$ 0,00	1120,66	$ 189.054.221,34	0,00	$ 0,00
222	GROUTING DE NIVELACION	KG	400,00	$ 59.652,00	$ 15.523.600,00	721,35	$ 23.170.160,20		KG			$ 0,00	$ 0,00		600,65	$ 20.180.272,60		$ 0,00	721,35	$ 23.170.160,20	179,20	$ 6.668.118,40
223	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	1.554,00	$ 23.099,00	$ 35.895.846,00	2512,20	$ 58.029.317,87		Kg		2427,17	$ 58.065.129,83	$ 0,00		4.645,56	$ 114.269.599,34		$ 0,00	2512,20	$ 58.029.317,87	2434,78	$ 56.240.599,47
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00		-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
224	EXCAVACION MANUAL	M3		$ 81.761,00		83,82	$ 5.178.578,42		M3			$ 0,00	$ 0,00		84,47	$ 5.218.769,39		$ 0,00	83,82	$ 5.178.575,42	0,65	$ 40.190,97
225	RECEBO COMPACTADO BASE PLACA DE CONTRAPISO	M3		$ 89.878,00		50,57	$ 4.545.220,34		M3			$ 0,00	$ 0,00		61,01	$ 5.483.007,39		$ 0,00	50,57	$ 4.545.220,34	10,43	$ 937.787,05
226	ZAPATA, VIGA Y PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI CIMENTACION PUENTE	M3		$ 775.875,00		28,64	$ 20.694.240,88		M3			$ 0,00	$ 0,00		28,64	$ 20.694.240,88		$ 0,00	28,64	$ 20.694.240,88	0,00	$ 0,00
227	ACERO FIGURADO 60000 PSI DADOS, VIGAS Y PEDESETALES DE CIMENTACION PUENTE	KG		$ 7.163,00		2740,79	$ 19.632.289,49		Kg			$ 0,00	$ 0,00		2.740,79	$ 19.632.289,49		$ 0,00	2740,79	$ 19.632.289,49	0,00	$ 0,00

228	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B PLATINAS DE ANCLAJE Y PERNOS PUENTE	KG		$ 23.099,00		739,24	$ 17.075.712,84		KG			$ 0,00	$ 0,00	739,58	$ 17.090.499,20		$ 0,00	739,24	$ 17.075.712,84	0,64	$ 14.783,36
229	BARANDA METALICA	ML		$ 540.543,00	$ 0,00	49,51	$ 26.221.740,93		ML			$ 0,00	$ 0,00	49,52	$ 26.227.148,35		$ 0,00	49,51	$ 26.221.740,93	0,01	$ 5.406,43
230	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B PUENTE DE CONEXIÓN	Kg		$ 23.099,00		8895,43	$ 205.476.602,43		Kg			$ 0,00	$ 0,00	8.897,10	$ 205.514.112,90		$ 0,00	8895,43	$ 205.476.602,43	1,62	$ 37.510,47
231	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-03(Entrepisos) PUENTE	m2		$ 157.119,00		25,02	$ 4.681.717,38		m2			$ 0,00	$ 0,00	25,02	$ 4.681.717,38		$ 0,00	25,02	$ 4.681.717,38	0,00	$ 0,00
232	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub) FUENTE	m2		$ 169.699,00		25,02	$ 4.220.848,98		m2			$ 0,00	$ 0,00	25,02	$ 4.220.848,98		$ 0,00	25,02	$ 4.220.848,98	0,00	$ 0,00
233	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E 0.08 MTR	m2		$ 104.569,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	21,68	$ 2.268.622,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,68	$ 2.268.622,32
234	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m2		$ 58.525,89	$ 0,00	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	23,80	$ 1.345.316,21		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,80	$ 1.345.316,21
235	ALFAJIAS CONCRETO DE 2500 PSI E=0.25M	ML		$ 72.695,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		ML			$ 0,00	$ 0,00	22,65	$ 1.647.042,10		$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,65	$ 1.647.042,10
236	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml		$ 37.721,14	$ 0,00	0,00	$ 0,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	21,68	$ 817.939,86		$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,68	$ 817.939,86
237	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		$ 29.668,00	$ 0,00	123,06	$ 3.318.582,22		UND			$ 0,00	$ 0,00	123,06	$ 3.318.582,22		$ 0,00	123,06	$ 3.318.582,22	0,00	$ 0,00
238	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	m^3		$ 778.675,00	$ 0,00	1,73	$ 1.347.412,00		m3			$ 0,00	$ 0,00	1,77	$ 1.378.612,50		$ 0,00	1,73	$ 1.347.412,00	0,04	$ 29.210,50
239	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	kg		$ 7.163,00	$ 0,00	163,92	$ 1.174.158,96		kg			$ 0,00	$ 0,00	163,92	$ 1.174.158,96		$ 0,00	163,92	$ 1.174.158,96	0,00	$ 0,00
240	PINTURA INTUMESCENTE PARA ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 183.745,15		3021,93	$ 494.635.972,62		M2			$ 0,00	$ 0,00	3.021,93	$ 494.635.972,62		$ 0,00	3021,93	$ 494.635.972,62	0,00	$ 0,00
241	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PROTECCION FUEGO LAMINAS STEELDECK)	KG		$ 7.163,00		3171,55	$ 22.717.607,64		KG			$ 0,00	$ 0,00	3.171,55	$ 22.717.607,64		$ 0,00	3171,55	$ 22.717.607,64	0,00	$ 0,00
NP41	CONCRETO CICLOPEO 3500 PSI ,40% RAJON	m^3		$ 558.415,00	$ 0,00	10,07	$ 5.604.907,40		m^3			$ 0,00	$ 0,00	10,07	$ 5.604.907,40		$ 0,00	10,07	$ 5.604.907,40	0,00	$ 0,00
NP42	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp. 0.15 mts	m2		$ 129.096,00		43,27	$ 5.187.691,69		m2			$ 0,00	$ 0,00	40,32	$ 5.203.557,28		$ 0,00	43,27	$ 5.187.691,69	0,05	$ 5.865,60
NP43	FIJACION A ESTRUCTURA	un		$ 95.978,70		572,00	$ 54.899.667,68		un			$ 0,00	$ 0,00	572,00	$ 54.899.667,68		$ 0,00	572,00	$ 54.899.667,68	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - ESTRUCTURA				$ 3.930.638.804,70		4.638.354.842,38					$ 55.065.193,83	$ 0,00		$ 5.099.652.707,30		$ 0,00		$ 4.938.354.842,39		$ 71.297.865,01
	MAMPOSTERIA (No acústica)	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL									
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
242	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m^2	1.473,44	$ 114.594,00	$ 168.847.383,36	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
243	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PARED DOBLE	m^2	129,55	$ 126.517,00	$ 16.387.599,72	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
244	DINTELES, (VOQUETA Y COLUMNETAS) CONCRETO DE 2500 PSI 17x12	m1	43,00	$ 64.723,00	$ 2.783.689,00	1538,90	$ 119.067.816,40		m1			$ 0,00	$ 0,00	1.638,51	$ 119.068.403,53		$ 0,00	1538,90	$ 119.067.816,40	0,01	$ 587,13
245	MESONES EN CONCRETO 2.500 PSI E. 10CM	M2	9,90	$ 129.597,00	$ 1.282.713,30	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
246	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5	m2		$ 64.591,00		1140,48	$ 73.664.453,02		m2			$ 0,00	$ 0,00	1.329,84	$ 85.895.624,39		$ 0,00	1140,48	$ 73.664.453,02	189,36	$ 12.231.171,37
247	MAMPOSTERIA BORDILLO ENTRE PISO Y CUBIERTA	ml		$ 39.558,00		539,43	$ 19.463.901,94		ml			$ 0,00	$ 0,00	539,43	$ 19.463.901,94		$ 0,00	539,43	$ 19.463.901,94	0,00	$ 0,00
248	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	ml		$ 69.226,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
249	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		$ 29.668,00		440,00	$ 12.027.729,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	440,00	$ 12.027.729,00		$ 0,00	440,00	$ 12.027.729,00	0,00	$ 0,00
250	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG		$ 7.163,00		5669,91	$ 42.690.898,53		KG			$ 0,00	$ 0,00	5.669,91	$ 42.690.898,53		$ 0,00	5669,91	$ 42.690.898,53	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL MAMPOSTERIA (No acústica)				$ 189.311.578,38		263.934.799,29					$ 0,00	$ 0,00		$ 276.986.676,19		$ 0,00		$ 263.934.799,29		$ 12.231.818,80
	CUBIERTA	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL									
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
251	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E 0.08 MTR	m2	925,00	$ 104.569,00	$ 96.707.625,00	1060,00	$ 112.912.920,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	1.060,00	$ 112.912.920,00		$ 0,00	1060,00	$ 112.912.920,00	0,00	$ 0,00
252	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m^2	925,00	$ 58.525,89	$ 54.128.449,34	1101,50	$ 64.285.879,49		m2			$ 0,00	$ 0,00	1.101,50	$ 64.285.879,49		$ 0,00	1101,50	$ 64.285.879,49	0,00	$ 0,00
253	ADOQUIN GRES PEATONAL CIRCULACIONES EN TERRAZA	m^2	350,28	$ 99.874,63	$ 33.561.684,32	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
254	ALFAJIAS CONCRETO DE 2500 PSI E=0.25M	ML	168,60	$ 72.695,00	$ 13.064.760,00	178,52	$ 12.975.726,20		ML			$ 0,00	$ 0,00	182,63	$ 13.274.451,83		$ 0,00	178,52	$ 12.975.726,20	4,11	$ 298.725,63
255	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml	169,00	$ 37.721,14	$ 6.377.151,52	0,00	$ 0,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
256	REMATE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML		$ 72.695,67	$ 0,00	170,62	$ 12.983.114,97		ML			$ 0,00	$ 0,00	170,62	$ 12.983.114,97		$ 0,00	170,62	$ 12.983.114,97	0,00	$ 0,00
NP44	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		$ 29.668,00		179,00	$ 4.827.272,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	179,00	$ 4.827.272,00		$ 0,00	179,00	$ 4.827.272,00	0,00	$ 0,00
NP45	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	M3		$ 778.675,00		10,73	$ 8.338.978,25		M3			$ 0,00	$ 0,00	10,73	$ 8.338.978,25		$ 0,00	10,73	$ 8.338.978,25	0,00	$ 0,00
NP46	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	KG		$ 7.163,00		603,56	$ 4.323.323,20		KG			$ 0,00	$ 0,00	603,56	$ 4.323.323,20		$ 0,00	603,56	$ 4.323.323,20	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL CUBIERTA				$ 203.977.890,18		218.647.212,11					$ 0,00	$ 0,00		$ 218.845.947,48		$ 0,00		$ 218.647.212,11		$ 298.725,35
	ELEMENTOS DE ACUSTICA	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL									
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 0,00					-					$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
257	MURO SENCILLO EN DRYWALL STC 47 E=12CM DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACUSTICA + DRYWALL 1/2" + Perfil 6S + FRESCASA 2.5" + FRESCASA 2.5" +PERFIL 6S + DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + Drywall de 1/2	m^2	180,00	$ 185.000,15	$ 33.300.026,59		$ 0,00		m2			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 0,00					-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
258	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO ACÚSTICO CON ASPERSION POR CELULOSA	m^2	770,00	$ 100.000,18	$ 80.880.138,37		$ 0,00		m2			-	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - ELEMENTOS DE ACUSTICA				$ 114.180.164,96		-								$ 0,00		-		-		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA -ALUMINIO	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL									
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
259	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 6-5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38, Multimuro(de Cristo Arquitectos 17mm (5-8+5) (858 22), con Protección PGB (EN 356) PVB 0.76 EN AMBIENTES Y SALONES	m2	892,62	$ 2.173.844,03	$ 1.508.002.624,10	737,81	$ 1.603.575.171,84		m2			$ 0,00	$ 0,00	737,81	$ 1.603.575.171,84		$ 0,00	737,81	$ 1.603.575.171,84	0,00	$ 0,00
260	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5-5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5-5) Incoloro PVB 0,38 EN CIRCULACIONES	M2	487,57	$ 1.520.517,10	$ 741.358.522,45	484,39	$ 736.539.237,03		M2			$ 0,00	$ 0,00	508,96	$ 773.679.342,18	24,57	$ 37.389.105,15	508,96	$ 773.679.342,18	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
261	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B (SOPORTE SUPERIOR VENTANAS Y VOLADIZOS)	kg		$ 23.099,00	$ 0,00	5933,31	$ 137.063.412,20		kg			$ 0,00	$ 0,00	5.933,72	$ 137.063.099,62		$ 0,00	5933,31	$ 137.063.412,20	0,42	$ 9.687,42
262	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5-5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 (fachada)	M2		$ 1.520.517,10	$ 0,00	61,49	$ 93.502.678,55		M2			$ 0,00	$ 0,00	62,12	$ 94.454.522,25		$ 0,00	61,49	$ 93.502.678,55	0,63	$ 951.843,70
263	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		$ 368.407,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 2.564.849,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 2.564.849,00
264	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		$ 29.668,00		1224,00	$ 33.008.832,00		UND			$ 0,00	$ 0,00	1.224,00	$ 33.008.832,00		$ 0,00	1224,00	$ 33.008.832,00	0,00	$ 0,00
265	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI	m^3		$ 778.675,00		14,08	$ 10.938.400,00		m3			$ 0,00	$ 0,00	14,09	$ 10.938.400,00		$ 0,00	14,08	$ 10.938.400,00	0,00	$ 0,00
266	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	kg		$ 7.163,00	$ 0,00	1787,55	$ 12.804.233,70		kg			$ 0,00	$ 0,00	1.860,00	$ 13.323.150,00		$ 0,00	1787,55	$ 12.804.233,70	72,45	$ 518.916,30
	SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO				$ 2.247.441.149,54		2.627.702.665,32					$ 0,00	$ 0,00		$ 2.693.107.397,19		$ 37.389.105,15		$ 2.665.092.070,47		$ 4.015.323,72
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL									
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
267	AGUA POTABLE					0,00						$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
268	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ml	5,00	$ 11.376,00	$ 56.880,00	0,00	$ 0,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	88,07	$ 1.001.884,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	88,07	$ 1.001.884,32
269	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ml	12,00	$ 14.110,00	$ 169.320,00	0,00	$ 0,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	41,59	$ 586.634,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	41,59	$ 586.634,90
270	PUNTO HIDRAULICO PVC-P PARA 1-1/4"	und	35,00	$ 116.090,00	$ 4.063.150,00	0,00	$ 0,00		und			$ 0,00	$ 0,00	9,00	$ 1.044.450,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 1.044.450,00
271	REGISTO DE 1 1/2	un	2,00	$ 229.518,00	$ 459.036,00	0,00	$ 0,00		un			$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 689.754,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 689.754,00
272	PUNTO A.F. SANITARIO FLUXOMETRO	un	5,00	$ 81.007,00	$ 470.035,00	0,00	$ 0,00		un			$ 0,00	$ 0,00	5,00	$ 470.035,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 470.035,00
273	PUNTO HIDRAULICO PVC-P PARA 1/2" LAVAMANOS	un	4,00	$ 87.274,00	$ 349.096,00	0,00	$ 0,00		un			$ 0,00	$ 0,00	4,00	$ 349.096,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 349.096,00
274	PUNTO A.F. DUCHAS	un	4,00	$ 56.469,00	$ 225.860,00	0,00	$ 0,00		un			$ 0,00	$ 0,00	9,00	$ 508.155,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 508.155,00
275	PUNTO A.F. ORINAL FLUXOMETRO	un	2,00	$ 72.075,00	$ 144.150,00	0,00	$ 0,00		un			$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 144.150,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 144.150,00
	RED CONTRA INCENDIOS RCI					0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
276	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO ECH - 40 4" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	18,00	$ 195.258,00	$ 3.140.736,00	0,00	$ 0,00		ml			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
277	ACCESORIOS PVC-6600 4"	un	7,00	$ 740.685,00	$ 5.150.455,00	0,00	$ 0,00		un			$ 0,00	$ 0,00	6,00	$ 4.440.390,00	6,00	$ 4.440.390,00	6,00	$ 4.440.390,00	0,00	$ 0,00

312	TD2: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 2 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, conteine marquillas de identificacion, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pares para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con fermoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1,00	$ 2.195.428,75	$ 2.195.428,75		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
313	TD3: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 3 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, conteine marquillas de identificacion, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pares para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con fermoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1,00	$ 2.195.428,75	$ 2.195.428,75		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
314	TR2: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, conteine marquillas de identificacion, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pares para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con fermoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1,00	$ 671.373,45	$ 671.373,45		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO				$ 0,00		$ 0,00						0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
315	TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS Y CAJAS	ml	497,00	$ 72.697,03	$ 33.844.649,06		$ 0,00		ml				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	CONTINUACIONES				$ 0,00		$ 0,00						0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	VOZ, DATOS Y TV				$ 0,00		$ 0,00						0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
316	SALIDA HDMI EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	10,00	$ 117.967,09	$ 1.179.670,90		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
317	SALIDA TV EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	8,00	$ 97.771,13	$ 782.169,04		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
318	SALIDA DE DATOS SENCILLA EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	9,00	$ 98.437,03	$ 886.383,27		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
319	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	4,00	$ 118.997,03	$ 475.968,12		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
320	SALIDA VIDEO BEAM EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION NO INCLUYE VIDEO BEAM	un	8,00	$ 108.997,03	$ 871.896,24		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
321	SALIDA ACCESS POINT EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION, NO INCLUYE EQUIPO	un	8,00	$ 108.997,03	$ 853.922,18		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
322	Patch cord CAT 6A, UTP, Diametro Reducido 28 AWG 6.2mm, 7ft (2.1 metros), azul	un	28,00	$ 38.782,34	$ 965.630,96		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
323	Cable categoria 6 U/UTP, 500Mhz, 100, 23AWG, color azul. LSZH. caja de 305 metros	un	4,00	$ 895.906,17	$ 3.583.624,69		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
324	Patch pane plano 48 puertos UTP 6	un	2,00	$ 304.857,54	$ 609.715,08		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
325	Organizador doble con tapa	un	2,00	$ 121.868,39	$ 243.736,78		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
326	Gabinete cerrado 42U 800x800 mm Puertas Micoperforadas	un	1,00	$ 4.373.706,90	$ 4.373.706,90		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
327	Organizador vertical para Gabinete de 42U, 600 mm de ancho.	un	2,00	$ 820.073,45	$ 1.640.146,90		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
328	Multitoma Horizontal Inclusa Blindada de 12hA	un	1,00	$ 550.950,00	$ 550.950,00		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
329	Barraje horizontal para rack	un	1,00	$ 390.073,45	$ 390.073,45		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
330	CAJA DE PASO METALICA 15X15	un	38,00	$ 95.774,69	$ 3.447.888,83		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
331	Suministro, instalacion bandeja porta cables - tipo escalera con tapa, accesorios de 200*50	ml	109,00	$ 54.774,69	$ 5.970.441,17		$ 0,00		ml				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
332	Canaleta plastica 54x100mm	ml	20,00	$ 38.774,69	$ 775.493,79		$ 0,00		ml				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	SISTEMA DE SONIDO				$ 0,00		$ 0,00						0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
333	Cable profiled para Audio Tipo 2	ml	250,00	$ 21.662,34	$ 5.415.585,20		$ 0,00		ml				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
334	Cable categoria 6 U/UTP, 500Mhz, 100, 23AWG, color azul. LSZH. caja de 305 metros	un	1,00	$ 895.706,17	$ 895.706,17		$ 0,00		un				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	CERTIFICACIONES				$ 0,00		$ 0,00						0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
335	CERTIFICACION RETIE	gl	1,00	$ 14.539.282,34	$ 14.539.282,34		$ 0,00		gl				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
336	CERTIFICACION RETILAP	gl	1,00	$ 10.293.662,34	$ 10.293.662,34		$ 0,00		gl				0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00
	SUB TOTAL - INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 184.564.351,69	-							0,00			$ 34.620.389,29		0,00		0,00			$ 34.620.389,29

	ACABADOS DE MUROS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL									
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
337	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	1.887,78	$ 24.443,00	$ 46.142.512,65	2259,33	$ 55.204.105,65		m2			$ 0,00	$ 0,00	2.687,64	$ 65.210.110,60		$ 0,00	2259,33	$ 55.224.605,63	428,52	$ 9.985.415,20
338	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m2	912,20	$ 29.958,00	$ 29.413.683,20	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
339	INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO EN FACHADAS	m2	602,00	$ 247.908,51	$ 149.240.923,60	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
340	RECUBRIMIENTO EN FACHADA CON LAMINA DE FIBROCEMENTO JUNTA MARCADA ANCLAJE MECANICO	m2	480,32	$ 184.248,30	$ 88.501.341,85	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
341	CORTAFOGO ESTOSIA C-23 EN ALUZINC	m2	13,77	$ 342.205,71	$ 4.697.641,67	0,00	$ 0,00		m2		769,39	$ 0,00	-$ 273.738.619,32	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
342	COLOR PLAST FACHADA SOBRE FACHADA	m2	400,00	$ 91.419,00	$ 39.061.120,00	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS				$ 0,00	0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
343	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (Viseo)	ml		$ 15.184,00	$ 0,00	1988,26	$ 30.189.371,84		ml			$ 0,00	$ 0,00	2.189,90	$ 33.190.709,60		$ 0,00	1989,26	$ 30.189.371,84	199,64	$ 3.031.533,76
344	LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO 9X5X12 REF COSRIZO DE SANTAFE	M2	-	$ 227.914,00	$ 0,00	107,95	$ 24.603.658,17		M2		441,24	$ 0,00	-$ 100.584.203,58	107,95	$ 24.603.658,17		$ 0,00	107,95	$ 24.603.658,17	0,00	$ 0,00
345	HILADA PARADA LADRILLO A LA VISTA	ML	-	$ 114.414,00	$ 0,00	60,20	$ 6.887.722,80		ML			$ 0,00	$ 0,00	60,20	$ 6.887.722,80		$ 0,00	60,20	$ 6.887.722,80	0,00	$ 0,00
346	ENCHAPE COLUMNAS EN LADRILLO A LA VISTA	ML	-	$ 139.274,00	$ 0,00	124,80	$ 18.008.595,20		ML			$ 0,00	$ 0,00	124,80	$ 18.008.595,20		$ 0,00	124,80	$ 18.008.595,20	0,00	$ 0,00
347	CROUTING DOVELAS	ML	-	$ 59.045,72	$ 0,00	156,53	$ 9.802.951,72		ML			$ 0,00	$ 0,00	156,90	$ 9.803.052,61		$ 0,00	156,53	$ 9.802.951,72	0,02	$ 1.000,91
348	ACERO FIGURADO 60000 Psi	ka	-	$ 7.113,00	$ 0,00	109,60	$ 779.584,80		ka			$ 0,00	$ 0,00	109,60	$ 779.584,80		$ 0,00	109,60	$ 779.584,80	0,00	$ 0,00
349	ACERO FIGURADO 60000 PSI (GRAFIL DE 4 MM)	ka	-	$ 7.153,00	$ 0,00	15,54	$ 111.313,62		ka			$ 0,00	$ 0,00	15,54	$ 111.313,62		$ 0,00	15,54	$ 111.313,62	0,00	$ 0,00
350	LAVADO DE FACHADA	M2	-	$ 39.236,50	$ 0,00	104,51	$ 4.100.581,83		M2			$ 0,00	$ 0,00	183,50	$ 6.415.060,00		$ 0,00	104,51	$ 4.100.581,83	78,99	$ 2.314.504,17
NP89	ACABADO DE FACHADA EN GRANPLAST, INCLUYE COLOR	M2	-	$ 169.210,74	$ 0,00	0,00			M2	377		$ 71.358.838,58	-$ 378.303.129,80	377,00	$ 71.358.838,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	377,00	$ 71.358.838,58
	SUB TOTAL - ACABADOS DE MUROS				$ 399.187.408,68		$ 147.683.959,02					$ 71.358.838,58	-$ 378.303.129,80		$ 214.378.648,10		$ 0,00		$ 147.683.959,02		$ 51.881.093,08

	CIELO RASOS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL									
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
351	CELORRASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) EN CIRCULACIONES Y AREAS COMUNES	m2	926,14	$ 67.172,00	$ 62.210.676,08		$ 0,00		m2		0	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 0,00				0	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
352	CIELO RASO SUPERBOARD 8 MM (INCLUYE PINTURA) PARA FACHADA	M2	-	$ 150.000,00	$ 0,00		$ 0,00		M2		0	-	$ 0,00	279,60	- $ 50.328.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	279,60	$ 50.328.000,00
	SUB TOTAL - CIELO RASOS				$ 62.210.676,08										$ 50.328.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 50.328.000,00

	EQUIPOS MECANICOS - AIRE ACONDICIONADO	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL									
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE REDES DE REFRIGERACION (Incluyen aislamiento elastomerico de celda cerrada de 1/2" de espesor, esportería, montaje y operacion)						$ 0,00														$ 0,00
353	Tubería de cobre tipo L sin costura de 3/4"	ml	24,00	$ 62.715,00	$ 1.505.160,00		$ 0,00		ml		0	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
354	Tubería de cobre tipo L sin costura de 1"	ml	24,00	$ 74.200,00	$ 1.780.800,00		$ 0,00		ml		0	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
355	Derivador en Y para tubería de cobre entre condensadoras en sistema de refrigeracion variable	un	2,00	$ 760.000,00	$ 1.520.000,00		$ 0,00		un		0	-	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - EQUIPOS MECANICOS - AIRE ADONDICIONADO				$ 4.805.960,00	-									$ 0,00		-		-		$ 0,00

	URBANISMO					EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4						SALDO POR EJECUTAR	
	ESTRUCTURA	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD		VALOR TOTAL				PRESENTE ACTA N19		ACUMULADO ACTAS			
										MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
356	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga y/o cano E 07-08 (Dun)	m2	50,00	$ 168.699,00	$ 8.434.950,00	0,00	$ 0,00		m2			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
357	TANQUE DE CONCRETO ENTERRADO DE 3.500PSI INCENDIOS	m3	76,50	$ 1.006.930,00	$ 76.527.354,00	33,50	$ 33.722.456,50		m3			$ 0,00	$ 0,00	33,50	$ 33.722.456,50		$ 0,00	33,50	$ 33.722.456,50	0,00	$ 0,00

358	TANQUE DE CONCRETO SUBTERRANEO DE 3.500PSI SUMTIDO	m3	27,00	$ 1.609.699,00	$ 27.187.263,00	0,00	$ 0,00		m3			$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
359	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	6.420,00	$ 7.163,00	$ 45.969.460,00	3970,00	$ 28.200.210,00		kg			$ 0,00	$ 0,00	3.610,00	$ 29.268.210,00		$ 0,00	3970,00	$ 29.268.210,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS				$ 0,00	0,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
360	PUERTA CELOSIA CUARTO SUBESTACION ELECTRICA INCLUYE BARRA ANTIPANICO	M2		$ 492.104,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00	8,00	$ 3.936.832,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 3.936.832,00
361	PUERTA EN CELOSIA ACCESO CUARTO DE MAQUINAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 492.104,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00
362	PUERTA METALICA CUARTO PLANTA ELECTRICA	M2		$ 492.104,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00
363	PUERTA METALICA CUARTO DE MEDIDORES Y TABLEROS ELECTRICOS	M2		$ 492.104,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		M2			$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.312,00
364	MARCO PARA PUERTA METALICA	UN		$ 196.665,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		UN			$ 0,00	$ 0,00	4,00	$ 784.260,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 784.260,00
	SUB TOTAL ESTRUCTURA				$ 159.136.127,60		60.020.668,50					$ 0,00	$ 0,00		$ 69.000.684,50		$ 0,00		$ 60.020.668,50		$ 9.980.028,00

	PORTERIAS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)			CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
305	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.23 M APILE A 15 M	m^2	43,66	$ 5.407,00	$ 344.350,72		$ 0,00		m2			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
306	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m^3	7,00	$ 20.198,00	$ 141.386,00		$ 0,00		m3			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
307	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m3	92,00	$ 410.402,00	$ 37.756.984,00		$ 0,00		m3			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
308	ZAPATAS Y VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3		$ 778.875,00	$ 0,00		$ 0,00		M3			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
309	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 778.875,00	$ 0,00		$ 0,00		M3			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
370	DADOS EN CONCRETO 3000 PSI	m3	3,00	$ 741.244,00	$ 2.223.732,00		$ 0,00		m3			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
371	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI	m3	-	$ 741.244,00	$ 0,00		$ 0,00		m3			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
372	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI	m3	4,00	$ 814.968,00	$ 3.259.712,00		$ 0,00		m3			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
373	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI esp. 0.13 m/s	m2	92,00	$ 129.098,00	$ 11.873.152,00		$ 0,00		m2			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
374	ACERO FIGURADO 60000 PSI ZAPATAS, VIGAS, PEDESTAL DE CIMENTACION	kg	2.444,00	$ 7.163,00	$ 17.506.372,00		$ 0,00		kg			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
375	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m^2	94,60	$ 114.894,00	$ 10.874.972,40		$ 0,00		m2			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
376	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ml	6,00	$ 64.753,00	$ 388.518,00		$ 0,00		ml			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
377	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-569 GRADO B ESCALERA	Kg	2.035,00	$ 23.699,00	$ 48.238.574,00		$ 0,00		Kg			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
378	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	100,00	$ 24.447,00	$ 2.444.720,00		$ 0,00		m2			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
379	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (friso)	ml	-	$ 15.184,00	$ 0,00		$ 0,00		m1			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
380	TEJA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA A360	M2	71,60	$ 80.099,00	$ 5.735.108,00		$ 0,00		M2			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS						$ 0,00		0			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							$ 0,00		0			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
381	MAMPOSTERIA	ML		$ 23.190,00			$ 0,00		ML			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
382	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2		$ 38.751,00			$ 0,00		M2			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
383	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	un		$ 233.770,00			$ 0,00		un			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
384	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITAR O MONTECARLO REDONDO DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	un		$ 1.096.906,00			$ 0,00		un			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
385	CANECA EN ACERO INOXIDABLE	un		$ 257.630,87			$ 0,00		un			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
386	DISPENSADOR DE PAPEL	un		$ 138.521,00			$ 0,00		un			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
387	DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO	un		$ 222.221,00			$ 0,00		un			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
388	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	un		$ 37.340,00			$ 0,00		un			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
389	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM , SIN BISELA E CON BORDE PULIDO Y SIN MARCO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO EN BAÑOS	M2		$ 91.569,30			$ 0,00		M2			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - PORTERIAS				$ 141.643.609,32	-						0,00	0,00		$ 0,00		-		-		$ 0,00

	CUARTO DE BOMBAS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)			CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	ITEMS NO PREVISTOS																$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
390	MAMPOSTERIA	M2		$ 53.520,00		38,68	$ 2.072.007,60		M2			-	0	44,07	$ 2.360.609,60		$ 0,00	38,68	$ 2.072.087,60	5,39	$ 288.742,00
391	MAMPOSTERIA	ML		$ 33.190,00		0,00	$ 0,00		ML			-	0	23,00	$ 763.370,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 763.370,00
392	PAÑETE	M2		$ 29.192,00		81,43	$ 2.378.564,16		M2			-	0	81,43	$ 2.378.564,16		$ 0,00	81,43	$ 2.378.564,16	0,00	$ 0,00
393	PAÑETE	ML		$ 17.597,00		23,00	$ 413.791,00		ML			-	0	23,00	$ 413.791,00		$ 0,00	23,00	$ 413.791,00	0,00	$ 0,00
394	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3		$ 1.039.656,00		0,44	$ 453.697,34		M3			-	0	0,60	$ 623.133,60		$ 0,00	0,44	$ 453.697,34	0,16	$ 169.436,26
395	ACERO (columnetas)	KG		$ 7.163,00		52,00	$ 372.476,00		Kg			-	0	52,00	$ 372.476,00		$ 0,00	52,00	$ 372.476,00	0,00	$ 0,00
396	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E 0.03 MTR	m2		$ 104.549,00	$ 0,00		$ 0,00		m2			-	0	17,43	$ 1.824.360,63		$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,43	$ 1.824.360,63
397	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2		$ 38.751,00		17,46	$ 641.672,46		M2			-	0	17,46	$ 641.672,46		$ 0,00	17,46	$ 641.672,46	0,00	$ 0,00
398	IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO	M2		$ 56.828,00		0,00	$ 0,00		M2			-	0	19,19	$ 1.084.733,64		$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,19	$ 1.084.733,64
399	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2		$ 9.620,00		0,00	$ 0,00		M2			-	0	108,64	$ 1.045.183,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	108,64	$ 1.045.183,60
400	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2		$ 38.751,00			$ 0,00		M2			-	0	17,43	$ 641.672,46		$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,43	$ 641.672,46
401	CANUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml		$ 57.721,14	$ 0,00	0,00	$ 0,00		ml			-	0	16,90	$ 617.457,27		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,90	$ 617.457,27
402	COLUMNETAS EN CONCRETO 3.000 PSI	ML		$ 87.723,00			$ 0,00		ML			-	0	29,40	$ 1.788.679,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00	29,40	$ 1.788.679,20
403	ANGULARES	UN		$ 28.968,00			$ 0,00		UN			-	0	44,00	$ 1.186.592,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 1.186.592,00
404	ACERO	KG		$ 7.163,00			$ 0,00		KG			-	0	26,42	$ 189.109,23		$ 0,00	0,00	$ 0,00	26,42	$ 189.109,23
NP87	PUERTA CORTAFUEGO	UND		$ 7.704.186,40					UND	2		15.408.372,80	0	2,00	$ 15.408.372,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 15.408.372,80
NP88	INSTALACION BOMBAS DE AGUA	UND		$ 1.123.000,00					UND	1		1.123.000,00	0	1,00	$ 1.123.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.123.000,00
NP89	INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO	UND		$ 2.312.120,00					UND	1		2.312.120,00	0	1,00	$ 2.312.120,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.312.120,00
	SUB TOTAL - CUARTO DE BOMBAS				$ 0,00		6.332.499,56					18.843.922,80	-		$ 34.709.099,84		$ 0,00		$ 6.332.499,56		$ 28.466.600,28

	CUARTO SUBESTACION ELECTRICA		CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)			CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
405	DESCAPOTE	M2		$ 5.407,00		73,19	$ 615.309,33		M2			-	0	73,19	$ 615.309,33		$ 0,00	73,19	$ 615.309,33	0,00	$ 0,00
406	REPLANTEO	M2		$ 12.445,00		39,65	$ 493.444,25		M2			-	0	39,65	$ 493.444,25		$ 0,00	39,65	$ 493.444,25	0,00	$ 0,00
407	EXCAVACION MANUAL	M3		$ 61.761,00		169,33	$ 10.398.229,13		M3			-	0	169,33	$ 10.398.229,13		$ 0,00	169,33	$ 10.398.229,13	0,00	$ 0,00
408	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	M3		$ 410.402,00		3,25	$ 1.334.422,81		M3			-	0	21,45	$ 8.807.225,62		$ 0,00	3,25	$ 1.334.422,81	13,20	$ 7.470.804,11
409	CONCRETO ZAPATA	M3		$ 741.244,00		4,80	$ 3.629.130,62		M3			-	0	4,90	$ 3.632.095,60		$ 0,00	4,90	$ 3.629.130,62	0,00	$ 2.964,98
410	CONCRETO VIGAS	M3		$ 741.244,00		1,51	$ 1.120.255,00		M3			-	0	1,51	$ 1.141.515,78		$ 0,00	1,51	$ 1.120.255,00	0,00	$ 21.310,77
411	PLACA DE CONTRAPISO	M2		$ 129.098,00		39,65	$ 5.117.070,40		M2			-	0	39,65	$ 5.117.070,40		$ 0,00	39,65	$ 5.117.070,40	0,00	$ 0,00
412	PLACA DE CUBIERTA	M2		$ 111.414,00		45,15	$ 5.029.765,63		M2			-	0	45,68	$ 5.089.445,04		$ 0,00	45,15	$ 5.029.765,63	0,52	$ 59.691,61
413	MAMPOSTERIA	M3		$ 53.520,00		0,00	$ 0,00		M3			-	0	60,60	$ 3.583.633,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	60,60	$ 3.583.633,00
414	MAMPOSTERIA	ML		$ 33.190,00		0,00	$ 0,00		ML			-	0	10,40	$ 345.176,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,40	$ 345.176,00
415	PAÑETE	M2		$ 29.192,00		0,00	$ 0,00		M2			-	0	140,22	$ 4.093.302,24		$ 0,00	0,00	$ 0,00	140,22	$ 4.093.302,24
416	PAÑETE	ML		$ 17.597,00		0,00	$ 0,00		ML			-	0	71,60	$ 1.237.589,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00	71,60	$ 1.237.589,20
417	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI	ML		$ 1.039.656,00		1,39	$ 1.443.592,84		ML			-	0	1,40	$ 1.515.217,78		$ 0,00	1,39	$ 1.443.592,84	0,01	$ 72.625,02
418	AFINADO CUBIERTA	M2		$ 38.751,00		0,00	$ 0,00		M2			-	0	41,30	$ 1.517.515,30		$ 0,00	0,00	$ 0,00	41,30	$ 1.517.515,30
419	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA TRES CAPAS	M2		$ 58.536,00		0,00	$ 0,00		M2			-	0	43,33	$ 2.449.271,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	43,33	$ 2.449.271,58
420	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2		$ 9.620,00		0,00	$ 0,00		M2			-	0	173,03	$ 1.699.154,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	173,03	$ 1.699.154,60
421	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2		$ 38.751,00		0,00	$ 0,00		M2			-	0	34,35	$ 1.312.508,85		$ 0,00	0,00	$ 0,00	34,35	$ 1.312.508,85
422	COLUMNETAS EN CONCRETO 3.000 PSI	ML		$ 87.723,00		0,00	$ 0,00		ML			-	0	40,00	$ 2.710.120,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 2.710.120,00
423	ANGULARES	UN		$ 28.968,00		0,00	$ 0,00		UN			-	0	52,00	$ 1.462.336,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	52,00	$ 1.462.336,00
424	ACERO	KG		$ 7.163,00		2327,55	$ 10.672.209,13		KG			-	0	2.330,00	$ 19.689.720,00		$ 0,00	2327,55	$ 10.672.209,13	2,45	$ 17.510,87
NP90	PUERTA CORTAFUEGO	UND		$ 7.704.186,40					UND	5		38.520.932,00	0	5,00	$ 38.520.932,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 38.520.932,00
	SUB TOTAL - CUARTO SUBESTACION				$ 0,00		45.653.397,64					$ 38.520.932,00	$ 0,00		$ 112.390.625,60		$ 0,00		$ 45.653.397,64		$ 66.537.228,43

	CONEXIONES SANITARIAS	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)			CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
425	CAJA DE INSPECION 60X60	UND		$ 627.114,00		8,00	$ 5.016.912,00		UND			0,00	0,00	18,00	$ 11.288.052,00		$ 0,00	8,00	$ 5.016.912,00	10,00	$ 6.271.140,00
426	INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 2"	ML		$ 3.698,00		0,00	$ 0,00		ML			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
427	INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML		$ 4.075,00		115,53	$ 472.414,75		ML			0,00	0,00	204,16	$ 831.962,00		$ 0,00	115,53	$ 472.414,75	88,63	$ 359.537,25
428	RED. SANITARIA PVC 2	ML		$ 45.197,00		0,00	$ 0,00		ML			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
429	RED. SANITARIA PVC 6	ML		$ 122.299,00		115,53	$ 13.645.147,14		ML			0,00	0,00	204,16	$ 24.960.094,64		$ 0,00	115,53	$ 13.645.147,14	88,63	$ 10.814.802,50
430	RED REVENTILACION DE 2"	ML		$ 25.573,00		0,00	$ 0,00		ML			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
431	REJILLA DE PISO DE 0.30 MTS	UND		$ 143.387,00		0,00	$ 0,00		UND			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
432	SALIDA SANITARIA DE 2	UND		$ 62.017,00		0,00	$ 0,00		UND			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
433	BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML		$ 49.231,00		0,00	$ 0,00		ML			0,00	0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
434	EXCAVACION MANUAL	M3		$ 46.800,00		21,45	$ 1.005.492,24		M3			0,00	0,00	265,00	$ 12.423.200,00		$ 0,00	21,45	$ 1.005.492,24	243,55	$ 11.417.707,76
	SUB TOTAL - CONEXIONES SANITARIAS				$ 0,00		20.440.956,13					0,00	0,00		$ 49.103.249,60		0,00		20.440.956,13		$ 28.662.287,51

	ZONAS DURA ANDENES	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°8		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)		CANTIDAD		VALOR TOTAL								
									UND	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
435	REPLANTEO	M2		$ 12.445,00		994,91	$ 12.381.679,84		M2			$ 0,00	0	994,84	$ 12.382.628,30		$ 0,00	994,91	$ 12.381.679,84	0,03	$ 948,46
436	EXCAVACION MANUAL	M3		$ 61.761,00		270,80	$ 16.724.578,80		M3			$ 0,00	0	398,03	$ 24.582.435,55		$ 0,00	270,80	$ 16.724.578,80	127,23	$ 7.857.856,75
437	RELLENO RECEBO COMPACTADO	M3		$ 69.878,00		161,00	$ 14.470.070,39		M3			$ 0,00	0	199,00	$ 17.869.727,00		$ 0,00	161,00	$ 14.470.070,39	38,00	$ 3.415.691,61
438	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE B-200 (Via peatonal y zonas y zonas duras)	m3		$ 107.111,00		160,23	$ 17.162.781,13		m3			$ 0,00	0	199,00	$ 21.315.089,00		$ 0,00	160,23	$ 17.162.781,13	38,77	$ 4.152.307,87
439	BASE EN CONCRETO POBRE 1:500PSI	m3		$ 410.492,00		33,65	$ 13.769.807,90		m3			$ 0,00	0	49,75	$ 20.417.499,50		$ 0,00	33,65	$ 13.769.807,90	16,20	$ 6.647.691,60
440	PLACA BASE DE CONCRETO G:15 2500 PSI	M2		$ 101.649,00		671,04	$ 68.210.411,28		M2			$ 0,00	0	994,84	$ 101.134.698,96		$ 0,00	671,04	$ 68.210.411,28	323,80	$ 32.924.214,68
441	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ml		$ 122.699,00		357,72	$ 43.876.143,60		ml			$ 0,00	0	869,77	$ 106.681.639,23		$ 0,00	357,72	$ 43.876.143,60	512,05	$ 62.805.492,75
442	REFUERZO MALLA ELECTROSOLADA	KG		$ 11.600,00		1235,37	$ 14.330.315,20		KG			$ 0,00	0	1.532,21	$ 17.773.636,00		$ 0,00	1235,37	$ 14.330.315,20	296,84	$ 3.443.320,80
	VIA PORTERIA CUARTOS TECNICOS Y PARQUEADEROS					0,00	$ 0,00					$ 0,00	0	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP91	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	m2		$ 13.600,00		0,00	$ 0,00		m2	609,69		$ 8.295.881,31	0	609,69	$ 8.295.881,31		$ 0,00	0,00	$ 0,00	609,69	$ 8.295.881,31
NP92	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0 M.Y ABLE A 15 M	m2		$ 10.368,00		0,00	$ 0,00		m2	609,69		$ 6.320.691,00	0	609,69	$ 6.320.691,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	609,69	$ 6.320.691,00
NP93	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) (PLAZOLETA PRINCIPAL)	m3		$ 28.229,00		0,00	$ 0,00		m3	487,69		$ 13.775.554,51	0	487,69	$ 13.775.554,51		$ 0,00	0,00	$ 0,00	487,69	$ 13.775.554,51
NP94	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXPLANACIONES, CANALES, PRESTAMOS, SOBE ACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM		$ 1.726,00		0,00	$ 0,00		M3-KM	792,59		$ 1.378.835,32	0	792,59	$ 1.378.835,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	792,59	$ 1.378.835,32
NP95	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (Via vehicular y peatonal/ciclo)	m3		$ 158.908,00		0,00	$ 0,00		m3	244,00		$ 38.785.004,25	0	244,00	$ 38.785.004,25		$ 0,00	0,00	$ 0,00	244,00	$ 38.785.004,25
NP96	RELLENOS AGREGADOS EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE (Via vehicular)	m3		$ 207.171,00		0,00	$ 0,00		m3	213,50		$ 44.230.375,69	0	213,50	$ 44.230.375,69		$ 0,00	0,00	$ 0,00	213,50	$ 44.230.375,69
NP97	CONCRETO CLASE G, F'C =3000 PSI (Zona vehicular)	m3		$ 1.049.440,00		0,00	$ 0,00		m3	152,50		$ 160.040.360,29	0	152,50	$ 160.040.360,29		$ 0,00	0,00	$ 0,00	152,50	$ 160.040.360,29
NP98	BORDILLO PREFABRICADO A-52	ml		$ 89.411,00		0,00	$ 0,00		ml	569,30		$ 54.690.787,40	0	569,30	$ 54.690.787,40		$ 0,00	0,00	$ 0,00	569,30	$ 54.690.787,40
NP99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2		$ 10.421,00		0,00	$ 0,00		m2	1749,59		$ 18.222.069,65	0	1.749,59	$ 18.222.069,65		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1749,59	$ 18.222.069,65
							$ 209.925.091,13					$ 345.336.539,82	-		$ 697.509.245,59		$ 0,00		$ 209.926.091,13		$ 488.583.154,46

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°8		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR	(+,-)		CANTIDAD		VALOR TOTAL								
									UND	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
443	GERALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES	UN	2,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000,00	2,00	$ 10.000.000,00		UN			-	0	2,00	$ 10.000.000,00		$ 0,00	2,00	$ 10.000.000,00	0,00	$ 0,00
444	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS	m3	1.945,73	$ 15.711,00	$ 30.569.364,03	1945,73	$ 30.569.364,03		m3		-	-	0	1.945,73	$ 30.569.364,03		$ 0,00	1945,73	$ 30.569.285,48	0,01	$ 78,55
445	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	M3	2.362,42	$ 11.078,00	$ 26.168.151,60	2362,42	$ 26.168.151,60		M3			-		2.362,42	$ 26.168.151,60		$ 0,00	2362,42	$ 26.168.151,60	0,00	$ 0,00
	SUB TOTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 66.738.515,63		$ 66.738.437,09								$ 0,00		$ 0,00		$ 66.738.437,08		$ 78,55
	SUB-TOTAL FASE II OBRA				$ 18.780.000.000,00		$ 18.802.301.352,14					$ 888.000.652,31	- 888.000.652,31		$ 20.441.497.137,41		$ 372.515.972,79		$ 19.274.818.324,84		$ 1.166.669.972,47
	SUB TOTAL DISEÑOS				$ 2.956.068.834,63		$ 2.956.068.834,63					$ 2.956.068.834,63	$ 2.956.068.834,63		$ 2.956.068.834,63				$ 2.956.068.834,63		$ 0,00
	IVA	19%			$ 561.652.698,64		$ 561.652.698,64					$ 561.652.698,64	$ 561.652.698,64		$ 561.652.698,64		$ 0,00		$ 561.652.698,64		$ 0,00
	TOTAL				$ 3.517.719.533,27		$ 3.517.719.533,27					$ 3.517.719.533,27	$ 3.517.719.533,27		$ 3.517.719.533,27		$ 0,00		$ 3.517.719.533,27		$ 0,00
	COSTO DIRECTO DE OBRA				$ 18.780.000.000,00		$ 18.802.301.352,14					$ 888.000.652,31	-$ 888.000.652,31		$ 20.441.497.137,41		$ 372.515.972,79		$ 19.274.818.324,84		$ 1.166.669.972,47
	Administrativos	18%			$ 3.380.400.000,00		$ 3.402.414.243,39					$ 123.480.917,42	-$ 123.480.917,42		$ 3.672.467.605,63		$ 67.053.068,19		$ 3.469.467.289,49		$ 210.000.327,04
	Imprevistos	2%			$ 375.600.000,00		$ 378.045.027,04					$ 13.721.213,05	-$ 13.721.213,05		$ 408.829.734,59		$ 7.450.339,46		$ 385.495.309,50		$ 23.333.377,45
	Utilidad	10%			$ 1.878.000.000,00		$ 1.890.230.135,21					$ 68.606.065,23	-$ 68.606.065,23		$ 2.044.148.719,74		$ 37.251.697,23		$ 1.927.481.832,49		$ 116.669.887,25
	TOTAL FASE III				$ 24.414.000.000,00		$ 24.572.991.757,78					$ 891.878.848,00	-$ 891.878.848,00		$ 29.573.933.358,88		$ 484.272.004,63		$ 25.057.263.822,42		$ 1.516.669.536,15
	VALOR TOTAL FASE I y III				$ 27.931.719.533,87		$ 29.093.711.291,05								$ 30.091.602.895,15		$ 484.272.004,63		$ 29.074.993.356,99		$ 1.516.669.634,16

ADICION N°3

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N°8		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
1	EQUIPOS	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)		CANTIDAD		VALOR TOTAL									
									UND	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V1.1	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM200CXVAFC/AZ (UC2-P3-ED2)	UN	1,00	$ 65.913.143,84	$ 65.913.143,84	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 65.913.143,84	$ 0,00	1,00	$ 65.913.143,84		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 65.913.143,84
NP-V1.2	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM220CXVAFC/AZ (UC1-P3-ED2)	UN	1,00	$ 78.079.129,68	$ 78.079.129,68	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 78.079.129,68	$ 0,00	1,00	$ 78.079.129,68		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 78.079.129,68
NP-V1.3	Unidad condensadora sistema VRF cooling only AM460CXVAFC/AZ (UC-P3-LF-3)	UN	1,00	$ 102.582.903,94	$ 102.582.903,94	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 102.582.903,94	$ 0,00	1,00	$ 102.582.903,94		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 102.582.903,94
NP-1.4	Unidad Cassette 1 via AM028NN1DKH/EU (CS1)	UN	3,00	$ 7.978.620,03	$ 23.935.860,09	-	$ -	-	UN	3,00	-	$ 23.935.860,09	$ 0,00	3,00	$ 23.935.860,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 23.935.860,09
NP-V1.5	Unidad Cassette 1 via AM036NN1DKH/EU (CS1)	UN	1,00	$ 8.587.371,43	$ 8.587.371,43	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 8.587.371,43	$ 0,00	1,00	$ 8.587.371,43		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.587.371,43
NP-V1.6	Unidad Cassette 4 vias AM009NV4DCH/AA (CS4)	UN	2,00	$ 8.808.506,16	$ 17.617.012,32	-	$ -	-	UN	2,00	-	$ 17.617.012,32	$ 0,00	2,00	$ 17.617.012,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 17.617.012,32
NP-V1.7	Unidad Cassette 4 vias AM012NV4DCH/AA (CS4)	UN	1,00	$ 8.822.207,76	$ 8.822.207,76	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 8.822.207,76	$ 0,00	1,00	$ 8.822.207,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.822.207,76
NP-V1.8	Unidad Fancoil tipo ducto LSP AM024NLDEH/EU (FC)	UN	1,00	$ 7.637.454,36	$ 7.637.454,36	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 7.637.454,36	$ 0,00	1,00	$ 7.637.454,36		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.637.454,36
NP-V1.9	Unidad Fancoil tipo ducto MSP.AM036NLMDCH/AZ (FC)	UN	10,00	$ 10.689.217,29	$ 106.892.172,87	-	$ -	-	UN	10,00	-	$ 106.892.172,87	$ 0,00	10,00	$ 106.892.172,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 106.892.172,87
NP-V1.10	Unidad Fancoil tipo ducto MSP.AM036ANMPKH/EU (FC)	UN	1,00	$ 9.301.553,29	$ 9.301.553,29	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 9.301.553,29	$ 0,00	1,00	$ 9.301.553,29		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.301.553,29
NP-V1.11	Unidad Fancoil tipo ducto MSPAM071ANMPKH/EU (FC)	UN	4,00	$ 9.903.393,29	$ 39.613.573,15	-	$ -	-	UN	4,00	-	$ 39.613.573,15	$ 0,00	4,00	$ 39.613.573,15		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 39.613.573,15
NP-V1.12	Unidad Fancoil tipo ducto MSP.AM090ANMPKH/EU (FC)	UN	3,00	$ 10.587.688,29	$ 31.763.064,88	-	$ -	-	UN	3,00	-	$ 31.763.064,88	$ 0,00	3,00	$ 31.763.064,88		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 31.763.064,88
NP-V1.13	Unidad Fancoil tipo ducto MSP.AM090ANMPKH/EU (FC)	UN	3,00	$ 10.606.277,29	$ 31.818.831,88	-	$ -	-	UN	3,00	-	$ 31.818.831,88	$ 0,00	3,00	$ 31.818.831,88		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 31.818.831,88
NP-V1.14	Unidad Fancoil tipo ducto MSP.AM036ANHDCH/AA (FC)	UN	1,00	$ 12.270.957,29	$ 12.270.957,29	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 12.270.957,29	$ 0,00	1,00	$ 12.270.957,29		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 12.270.957,29
NP-V1.15	Unidad Fancoil tipo ducto MSP.AM076FNHDCH/AA (FC)	UN	3,00	$ 26.527.357,29	$ 79.582.071,88	-	$ -	-	UN	3,00	-	$ 79.582.071,88	$ 0,00	3,00	$ 79.582.071,88		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 79.582.071,88
NP-V1.16	Unidad expansion directa 1-1 12.000 btu/h (UC-E3-EDF2)	UN	1,00	$ 15.003.040,90	$ 15.003.040,90	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 15.003.040,90	$ 0,00	1,00	$ 15.003.040,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 15.003.040,90
NP-V1.17	Unidad de extraccion helicocentrifugo 420 CFM – 0,8 Inwg (VE-01)	UN	3,00	$ 5.372.958,00	$ 16.118.867,99	-	$ -	-	UN	3,00	-	$ 16.118.867,99	$ 0,00	3,00	$ 16.118.867,99		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 16.118.867,99
NP-V1.18	Unidad de extraccion helicocentrifugo 350 CFM – 0,5 Inwg VE-02	UN	1,00	$ 5.372.958,00	$ 5.372.958,00	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 5.372.958,00	$ 0,00	1,00	$ 5.372.958,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.372.958,00
NP-V1.19	Unidad de extraccion helicocentrifugo 430 CFM – 0,8 Inwg VE-03	UN	1,00	$ 5.372.958,00	$ 5.372.958,00	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 5.372.958,00	$ 0,00	1,00	$ 5.372.958,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.372.958,00
NP-V1.20	Unidad de extraccion helicocentrifugo 500 CFM – 0,7 Inwg VE-04	UN	1,00	$ 5.699.308,00	$ 5.699.308,00	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 5.699.308,00	$ 0,00	1,00	$ 5.699.308,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.699.308,00
NP-V1.21	Unidad de extraccion helicocentrifugo 600 CFM – 0,7 Inwg VE-05	UN	1,00	$ 5.699.308,00	$ 5.699.308,00	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 5.699.308,00	$ 0,00	1,00	$ 5.699.308,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.699.308,00
NP-V1.22	Unidad de extraccion helicocentrifugo 530 CFM – 0,8 Inwg VE-06	UN	1,00	$ 5.605.182,00	$ 5.605.182,00	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 5.605.182,00	$ 0,00	1,00	$ 5.605.182,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.605.182,00
NP-V1.23	unidad de extraccion falso platon 70 CFM 0,2 Inwg VE-07_VE08_VE-09	UN	2,00	$ 2.532.283,00	$ 5.064.565,99	-	$ -	-	UN	2,00	-	$ 5.064.565,99	$ 0,00	2,00	$ 5.064.565,99		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 5.064.565,99
NP-V1.24	Unidad de ventilacion 3500 CFM@2,2 Inwg con filtro Merv 6+Merv 13	UN	1,00	$ 35.068.758,74	$ 35.068.758,74	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 35.068.758,74	$ 0,00	1,00	$ 35.068.758,74		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 35.068.758,74

NP-V1.25	Unidad de ventilacion 4100 CFM@2.2 inwg con filtro Merv 8+Merv 13	UN	1,00	$ 38.617.033,24	$ 38.617.033,24	-	$ -	-	UN	1,00	-	$ 38.617.033,24	$ 0,00	1,00	$ 38.617.033,24		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 38.617.033,24
				SUB TOTAL EQUIPOS	$ 757.669.289,63		$ 0,00					$ 757.669.289,63	$ 0,00		$ 757.669.289,63		$ 0,00		$ 0,00		$ 757.669.289,63

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
										CANTIDAD	VALOR TOTAL								
2.03	TUBERIA COBRE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V2.01	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1/4"	ML	32,27	$ 182.378,79	$ 5.885.383,58	-	$ -	-	ML	32,27	-	$ 5.885.383,58	$ 0,00	32,27	$ 5.885.383,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	32,27	$ 5.885.383,58
NP-V2.02	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/8"	ML	236,67	$ 206.222,79	$ 48.810.077,89	-	$ -	-	ML	236,67	-	$ 48.810.077,89	$ 0,00	236,67	$ 48.810.077,89		$ 0,00	0,00	$ 0,00	236,67	$ 48.810.077,89
NP-V2.03	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1/2"	ML	109,31	$ 235.808,79	$ 25.789.378,12	-	$ -	-	ML	109,31	-	$ 25.789.378,12	$ 0,00	109,31	$ 25.789.378,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	109,31	$ 25.789.378,12
NP-V2.04	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø5/8"	ML	270,43	$ 289.361,67	$ 78.252.075,15	-	$ -	-	ML	270,43	-	$ 78.252.075,15	$ 0,00	270,43	$ 78.252.075,15		$ 0,00	0,00	$ 0,00	270,43	$ 78.252.075,15
NP-V2.05	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø3/4"	ML	87,73	$ 342.909,67	$ 30.083.280,64	-	$ -	-	ML	87,73	-	$ 30.083.280,64	$ 0,00	87,73	$ 30.083.280,64		$ 0,00	0,00	$ 0,00	87,73	$ 30.083.280,64
NP-V2.06	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø7/8"	ML	65,11	$ 396.311,67	$ 25.803.852,53	-	$ -	-	ML	65,11	-	$ 25.803.852,53	$ 0,00	65,11	$ 25.803.852,53		$ 0,00	0,00	$ 0,00	65,11	$ 25.803.852,53
NP-V2.07	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo L, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1"	ML	5,00	$ 500.213,67	$ 2.501.068,33	-	$ -	-	ML	5,00	-	$ 2.501.068,33	$ 0,00	5,00	$ 2.501.068,33		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 2.501.068,33
NP-V2.08	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ½"	ML	5,00	$ 700.741,22	$ 3.503.706,09	-	$ -	-	ML	5,00	-	$ 3.503.706,09	$ 0,00	5,00	$ 3.503.706,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 3.503.706,09
NP-V2.09	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ¾"	ML	129,08	$ 591.064,40	$ 76.294.592,92	-	$ -	-	ML	129,08	-	$ 76.294.592,92	$ 0,00	129,08	$ 76.294.592,92		$ 0,00	0,00	$ 0,00	129,08	$ 76.294.592,92
NP-V2.10	Tuberia de Refrigeracion en cobre tipo K, incluya aislamiento termico tipo Rubatex de 1/2" de espesor y accesorios y soportes de instalacion Ø1 ⅝"	ML	11,68	$ 690.223,35	$ 8.061.608,71	-	$ -	-	ML	11,68	-	$ 8.061.608,71	$ 0,00	11,68	$ 8.061.608,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,68	$ 8.061.608,71
NP-V2.11	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø7/8"	ML	8,00	$ 185.430,71	$ 1.483.445,70	-	$ -	-	ML	8,00	-	$ 1.483.445,70	$ 0,00	8,00	$ 1.483.445,70		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.483.445,70
NP-V2.12	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø5/8"	ML	6,00	$ 185.430,71	$ 1.112.584,28	-	$ -	-	ML	6,00	-	$ 1.112.584,28	$ 0,00	6,00	$ 1.112.584,28		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.112.584,28
NP-V2.13	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø3/8"	ML	12,00	$ 178.900,71	$ 2.146.808,55	-	$ -	-	ML	12,00	-	$ 2.146.808,55	$ 0,00	12,00	$ 2.146.808,55		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 2.146.808,55
NP-V2.14	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø3/4"	ML	7,00	$ 191.958,71	$ 1.343.710,99	-	$ -	-	ML	7,00	-	$ 1.343.710,99	$ 0,00	7,00	$ 1.343.710,99		$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.343.710,99
NP-V2.15	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø1/4"	ML	1,00	$ 178.900,71	$ 178.900,71	-	$ -	-	ML	1,00	-	$ 178.900,71	$ 0,00	1,00	$ 178.900,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 178.900,71
NP-V2.16	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø1/2"	ML	8,00	$ 179.900,71	$ 1.431.205,70	-	$ -	-	ML	8,00	-	$ 1.431.205,70	$ 0,00	8,00	$ 1.431.205,70		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.431.205,70
NP-V2.17	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø 1 ¼"	ML	6,00	$ 205.014,71	$ 1.230.088,25	-	$ -	-	ML	6,00	-	$ 1.230.088,25	$ 0,00	6,00	$ 1.230.088,25		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.230.088,25
NP-V2.18	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø1 ⅜"	ML	3,00	$ 198.486,71	$ 595.460,14	-	$ -	-	ML	3,00	-	$ 595.460,14	$ 0,00	3,00	$ 595.460,14		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 595.460,14
NP-V2.19	Aislamiento de cubierta para tuberia en chaqueta de aluminio Ø 1 ⅛"	ML	6,00	$ 198.486,71	$ 1.190.920,28	-	$ -	-	ML	6,00	-	$ 1.190.920,28	$ 0,00	6,00	$ 1.190.920,28		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.190.920,28
NP-V2.20	Y join Branch MXJ-YA1509M	UND	12,00	$ 1.602.524,23	$ 19.230.290,76	-	$ -	-	UND	12,00	-	$ 19.230.290,76	$ 0,00	12,00	$ 19.230.290,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 19.230.290,76
NP-V2.21	Y join Branch MXJ-YA2512M	UND	14,00	$ 2.118.278,28	$ 29.655.895,58	-	$ -	-	UND	14,00	-	$ 29.655.895,58	$ 0,00	14,00	$ 29.655.895,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 29.655.895,58
NP-V2.22	Y join Branch MXJ-YA3812M	UND	14,00	$ 2.413.660,51	$ 33.791.251,37	-	$ -	-	UND	14,00	-	$ 33.791.251,37	$ 0,00	14,00	$ 33.791.251,37		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 33.791.251,37
NP-V2.23	Y join Branch MXJ-YA2515M	UND	12,00	$ 2.654.425,61	$ 31.853.107,34	-	$ -	-	UND	12,00	-	$ 31.853.107,34	$ 0,00	12,00	$ 31.853.107,34		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 31.853.107,34
NP-V2.24	Y join Branch MXJ-YA3419M	UND	4,00	$ 3.239.859,06	$ 12.959.436,22	-	$ -	-	UND	4,00	-	$ 12.959.436,22	$ 0,00	4,00	$ 12.959.436,22		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 12.959.436,22
NP-V2.25	Y join Branch MXJ-YA4119M	UND	2,00	$ 3.519.867,06	$ 7.039.734,11	-	$ -	-	UND	2,00	-	$ 7.039.734,11	$ 0,00	2,00	$ 7.039.734,11		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 7.039.734,11
NP-V2.26	Y join Branch MXJ-TA3419M	UND	2,00	$ 2.910.023,06	$ 5.820.046,11	-	$ -	-	UND	2,00	-	$ 5.820.046,11	$ 0,00	2,00	$ 5.820.046,11		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 5.820.046,11
NP-V2.27	Refrigerante R410A	KG	70,00	$ 230.241,59	$ 16.116.911,30	-	$ -	-	KG	70,00	-	$ 16.116.911,30	$ 0,00	70,00	$ 16.116.911,30		$ 0,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 16.116.911,30
				SUB TOTAL TUBERIA DE COBRE	$ 471.654.899,65		$ 0,00					$ 471.654.899,65	$ 0,00		$ 471.654.899,65		$ 0,00		$ 0,00		$ 471.654.899,65

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
										CANTIDAD	VALOR TOTAL								
3.03	CONDUCTOS	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V3.1	Conductos en polisocanurato de 20 mm	M2	717,00	$ 385.151,54	$ 276.153.655,83	-	$ -	-	M2	717,00	-	$ 276.153.655,83	$ 0,00	717,00	$ 276.153.655,83		$ 0,00	0,00	$ 0,00	717,00	$ 276.153.655,83
NP-V3.2	Conductos en lamina galvanizada cal 24	M2	600,00	$ 260.924,97	$ 156.554.983,68	-	$ -	-	M2	600,00	-	$ 156.554.983,68	$ 0,00	600,00	$ 156.554.983,68		$ 0,00	0,00	$ 0,00	600,00	$ 156.554.983,68
				SUB TOTAL CONDUCTOS	$ 432.708.639,51		$ 0,00					$ 432.708.639,51	$ 0,00		$ 432.708.639,51		$ 0,00		$ 0,00		$ 432.708.639,51

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
										CANTIDAD	VALOR TOTAL								
4.00	DIFUSORES Y REJILLAS	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V4.01	Difusor de suministro 4V L-J3-O3 6"x6"	UND	47,00	$ 472.697,69	$ 22.220.421,34	-	$ -	-	UND	47,00	-	$ 22.220.421,34	$ 0,00	47,00	$ 22.220.421,34		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 22.220.421,34
NP-V4.02	Difusor de suministro 4V L-J3-O3 9"x9"	UND	51,00	$ 584.165,69	$ 29.792.450,09	-	$ -	-	UND	51,00	-	$ 29.792.450,09	$ 0,00	51,00	$ 29.792.450,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 29.792.450,09
NP-V4.03	Difusor de suministro 4V L-J3-O3 12"x12"	UND	47,00	$ 695.349,69	$ 32.691.435,34	-	$ -	-	UND	47,00	-	$ 32.691.435,34	$ 0,00	47,00	$ 32.691.435,34		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 32.691.435,34
NP-V4.04	Difusor de suministro 4V L-J3-O3 14"x14"	UND	8,00	$ 601.697,89	$ 4.810.166,13	-	$ -	-	UND	8,00	-	$ 4.810.166,13	$ 0,00	8,00	$ 4.810.166,13		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 4.810.166,13

NP-V4.05	Difusor de suministro 4V L-JS-OB 18"x18"	UND	9,00	$ 1.029.903,69	$ 9.269.133,19	-	$ -	-	UND	9,00	-	$ 9.269.133,19	$ 0,00	9,00	$ 9.269.133,19		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 9.269.133,19
NP-V4.06	Rejilla de retorno L-RA 6"x9"	UND	47,00	$ 333.054,99	$ 15.653.583,12	-	$ -	-	UND	47,00	-	$ 15.653.583,12	$ 0,00	47,00	$ 15.653.583,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 15.653.583,12
NP-V4.07	Rejilla de retorno L-RA 8"x21"	UND	-	$ 527.124,45	$ 0,00	-	$ -	-	UND	-	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-V4.08	Rejilla de retorno L-RA 10"x12"	UND	51,00	$ 399.711,45	$ 20.334.284,01	-	$ -	-	UND	51,00	-	$ 20.334.284,01	$ 0,00	51,00	$ 20.334.284,01		$ 0,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 20.334.284,01
NP-V4.09	Rejilla de retorno L-RA 12"x18"	UND	47,00	$ 448.180,56	$ 21.064.505,12	-	$ -	-	UND	47,00	-	$ 21.064.505,12	$ 0,00	47,00	$ 21.064.505,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 21.064.505,12
NP-V4.10	Rejilla de retorno L-RA 18"x18"	UND	9,00	$ 710.242,53	$ 6.392.182,79	-	$ -	-	UND	9,00	-	$ 6.392.182,79	$ 0,00	9,00	$ 6.392.182,79		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 6.392.182,79
NP-V4.11	Rejilla de extraccion en muro L-OL-4 12"x12"	UND	1,00	$ 1.036.037,45	$ 1.036.037,45	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 1.036.037,45	$ 0,00	1,00	$ 1.036.037,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.036.037,45
NP-V4.12	Rejilla de retorno L-RA 12"x30"	UND	1,00	$ 732.104,45	$ 732.104,45	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 732.104,45	$ 0,00	1,00	$ 732.104,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 732.104,45
NP-V4.13	Rejilla de extraccion en muro L-OL-4 20"x12"	UND	6,00	$ 1.381.672,45	$ 8.290.034,71	-	$ -	-	UND	6,00	-	$ 8.290.034,71	$ 0,00	6,00	$ 8.290.034,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 8.290.034,71
			SUBTOTAL DIFUSORES Y REJILLAS		$ 172.277.357,73			$ 0,00				$ 172.277.357,73	$ 0,00		$ 172.277.357,73		$ 0,00		$ 0,00		$ 172.277.357,73

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
8.03	DAMPER DE BALANCEO	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-V5.01	Damper manual de balanceo 8"x9"	UND	4,00	$ 902.331,96	$ 3.609.327,84	-	$ -	-	UND	4,00	-	$ 3.609.327,84	$ 0,00	4,00	$ 3.609.327,84		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.609.327,84
NP-V5.02	Damper manual de balanceo 8"x8"	UND	18,00	$ 979.522,45	$ 17.631.404,12	-	$ -	-	UND	18,00	-	$ 17.631.404,12	$ 0,00	18,00	$ 17.631.404,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 17.631.404,12
NP-V5.03	Damper manual de balanceo 10"x9"	UND	1,00	$ 957.254,45	$ 957.254,45	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 957.254,45	$ 0,00	1,00	$ 957.254,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 957.254,45
NP-V5.04	Damper manual de balanceo 10"x1"	UND	1,00	$ 957.254,45	$ 957.254,45	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 957.254,45	$ 0,00	1,00	$ 957.254,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 957.254,45
NP-V5.05	Damper manual de balanceo 10"x9"	UND	2,00	$ 1.057.472,45	$ 2.114.944,90	-	$ -	-	UND	2,00	-	$ 2.114.944,90	$ 0,00	2,00	$ 2.114.944,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.114.944,90
NP-V5.06	Damper manual de balanceo 10"x10"	UND	16,00	$ 1.146.656,45	$ 18.344.903,22	-	$ -	-	UND	16,00	-	$ 18.344.903,22	$ 0,00	16,00	$ 18.344.903,22		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 18.344.903,22
NP-V5.07	Damper manual de balanceo 12"x9"	UND	3,00	$ 1.124.284,45	$ 3.372.853,35	-	$ -	-	UND	3,00	-	$ 3.372.853,35	$ 0,00	3,00	$ 3.372.853,35		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 3.372.853,35
NP-V5.08	Damper manual de balanceo 12"x12"	UND	1,00	$ 1.346.992,45	$ 1.346.992,45	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 1.346.992,45	$ 0,00	1,00	$ 1.346.992,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.346.992,45
NP-V5.09	Damper manual de balanceo 18"x10"	UND	4,00	$ 1.424.926,45	$ 5.699.705,80	-	$ -	-	UND	4,00	-	$ 5.699.705,80	$ 0,00	4,00	$ 5.699.705,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 5.699.705,80
NP-V5.10	Damper manual de balanceo 18"x8"	UND	1,00	$ 1.346.992,45	$ 1.346.992,45	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 1.346.992,45	$ 0,00	1,00	$ 1.346.992,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.346.992,45
NP-V5.11	Damper manual de balanceo 20"x10"	UND	2,00	$ 1.536.300,45	$ 3.072.600,90	-	$ -	-	UND	2,00	-	$ 3.072.600,90	$ 0,00	2,00	$ 3.072.600,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.072.600,90
			SUB TOTAL DAMPER DE BALANCEO		$ 59.454.313,55			$ 0,00				$ 59.454.313,55	$ 0,00		$ 59.454.313,55		$ 0,00		$ 0,00		$ 59.454.313,55

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
8.08	SISTEMA DE CONTROL	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU-21.14	Tuberia conduit EMT galvanizada de 3/4	ML	1.120,00	$ 39.995,00	$ 44.794.400,00	-	$ -	-	ML	1.120,00	-	$ 44.794.400,00	$ 0,00	1.120,00	$ 44.794.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1120,00	$ 44.794.400,00
NP-V8.01	Cable de control 2x18 blindado y apantallado	ml	600,00	$ 57.108,54	$ 34.265.124,00	-	$ -	-	ml	600,00	-	$ 34.265.124,00	$ 0,00	600,00	$ 34.265.124,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	600,00	$ 34.265.124,00
NP-V8.02	Cable de control 2x18 vehicular	ml	520,00	$ 73.998,39	$ 38.479.108,68	-	$ -	-	ml	520,00	-	$ 38.479.108,68	$ 0,00	520,00	$ 38.479.108,68		$ 0,00	0,00	$ 0,00	520,00	$ 38.479.108,68
NP-V8.03	Tuberia para control IMC 3/4"	ml	40,00	$ 208.637,74	$ 8.365.509,60	-	$ -	-	ml	40,00	-	$ 8.365.509,60	$ 0,00	40,00	$ 8.365.509,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 8.365.509,60
NP-V8.04	Control central para equipos , capacidad de 128-256 unidades interiores, pantalla tactil	UND	2,00	$ 16.734.060,00	$ 33.468.120,00	-	$ -	-	UND	2,00	-	$ 33.468.120,00	$ 0,00	2,00	$ 33.468.120,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 33.468.120,00
NP-V8.05	Termostato alambrado para unidad tipo fan coil vrf	UND	28,00	$ 1.651.964,60	$ 42.951.084,60	-	$ -	-	UND	28,00	-	$ 42.951.084,60	$ 0,00	28,00	$ 42.951.084,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 42.951.084,60
NP-V8.06	Programador horario unidades de extraccion y ventilacion	UND	10,00	$ 1.401.014,00	$ 14.010.140,00	-	$ -	-	UND	10,00	-	$ 14.010.140,00	$ 0,00	10,00	$ 14.010.140,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 14.010.140,00
			SUB TOTAL SISTEMA DE CONTROL		$ 216.362.487,08			$ 0,00				$ 216.362.487,08	$ 0,00		$ 216.362.487,08		$ 0,00		$ 0,00		$ 216.362.487,08

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
7.09	ACABADOS	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU-4.12	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B (ESCALERA CARACOL Y DE GATO)	KG	282,25	$ 26.154,00	$ 7.383.518,44	-	$ -	-	KG	282,25	-	$ 7.383.518,44	$ 0,00	282,25	$ 7.383.518,44		$ 0,00	0,00	$ 0,00	282,25	$ 7.383.518,44
ICCU-4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	5.736,25	$ 10.491,00	$ 60.178.998,75	-	$ -	-	KG	5.736,25	-	$ 60.178.998,75	$ 0,00	5736,25	$ 60.178.998,75		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5736,25	$ 60.178.998,75
ICCU-5.8	MUROS EN CONCRETO 2500 PSI E=0.1 (INCLUYE REFUERZO)	M2	10,30	$ 149.390,00	$ 1.507.714,00	-	$ -	-	M2	10,30	-	$ 1.507.714,00	$ 0,00	10,30	$ 1.507.714,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,30	$ 1.507.714,00
ICCU-9.24	ESPEJOS BISELADOS INCOLORO	M2	23,00	$ 82.657,00	$ 1.901.111,00	-	$ -	-	M2	23,00	-	$ 1.901.111,00	$ 0,00	23,00	$ 1.901.111,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 1.901.111,00
ICCU-9.27	VIDRIO TEMPLADO 10 MM (DIVISIONES OFICINA Y BAÑO)	M2	92,65	$ 490.139,00	$ 45.045.639,74	-	$ -	-	M2	92,65	-	$ 45.045.639,74	$ 0,00	92,65	$ 45.045.639,74		$ 0,00	0,00	$ 0,00	92,65	$ 45.045.639,74
ICCU-10.12	DIVISION DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H 1,8, E=6MM	M2	28,00	$ 735.890,00	$ 20.604.060,00	-	$ -	-	M2	28,00	-	$ 20.604.060,00	$ 0,00	28,00	$ 20.604.060,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 20.604.060,00
ICCU-10.15	DIVISION DE BAÑO ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 20	M2	87,82	$ 1.006.993,00	$ 88.450.105,26	-	$ -	-	M2	87,82	-	$ 88.450.105,26	$ 0,00	87,82	$ 88.450.105,26		$ 0,00	0,00	$ 0,00	87,82	$ 88.450.105,26
ICCU-13.4	ALISTADO DE PISOS 1:3, E=0,04 MM	M2	2.757,61	$ 41.345,00	$ 114.021.654,45	-	$ -	-	M2	2.757,61	-	$ 114.021.654,45	$ 0,00	2.757,61	$ 114.021.654,45		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2757,61	$ 114.021.654,45
ICCU-14.19	PASO DE ESCALERA GRANITO	ML	216,00	$ 188.497,00	$ 40.283.352,00	-	$ -	-	ML	216,00	-	$ 40.283.352,00	$ 0,00	216,00	$ 40.283.352,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	216,00	$ 40.283.352,00
ICCU-14.33	REJILLA METALICA TRADICIONAL 3X2 CON MARCO	UND	28,00	$ 22.821,00	$ 639.868,00	-	$ -	-	UND	28,00	-	$ 639.868,00	$ 0,00	28,00	$ 639.868,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 639.868,00

ICCU-14.41	CERAMICA PISO TRAFICO 5 CALIDAD PRIMERA	M2	1.099,13	$ 94.401,00	$ 103.752.420,63	-	$ -	-	M2	1.099,13	-	$ 103.752.420,63	$ 0,00	1.099,13	$ 103.752.420,63		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1099,13	$ 103.752.420,63
ICCU-15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (ZONA DE CIRCULACION, PASILLOS, PUNTOS FIJOS Y BAÑOS)	M2	1.229,63	$ 85.401,00	$ 104.991.850,63	-	$ -	-	M2	1.229,63	-	$ 104.991.850,63	$ 0,00	1.229,63	$ 104.991.850,63		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1229,63	$ 104.991.850,63
ICCU- 17.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA MEZCLADORA	UND	-	$ 299.399,00	$ 0,00	-	$ -	-	UND	-	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ICCU-18.14	ESTUCO PLASTICO	M2	1.288,30	$ 12.014,00	$ 15.477.636,20	-	$ -	-	M2	1.288,30	-	$ 15.477.636,20	$ 0,00	1.288,30	$ 15.477.636,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1288,30	$ 15.477.636,20
ICCU-18.15	ESTUCO PLASTICO	ML	851,91	$ 7.638,00	$ 6.506.888,58	-	$ -	-	ML	851,91	-	$ 6.506.888,58	$ 0,00	851,91	$ 6.506.888,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	851,91	$ 6.506.888,58
ICCU-18.19	VINILO 3 MANOS	M2	2.140,21	$ 25.503,00	$ 54.581.775,63	-	$ -	-	M2	2.140,21	-	$ 54.581.775,63	$ 0,00	2.140,21	$ 54.581.775,63		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2140,21	$ 54.581.775,63
NP-A01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	M2	2.822,53	$ 339.679,00	$ 958.931.716,90	-	$ -	-	M2	2.822,53	-	$ 958.931.716,90	$ 0,00	2.822,53	$ 958.931.716,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2822,53	$ 958.931.716,90
NP-A02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 30X30 COLOR VITA PLATA (ZONAS DE CIRCULACION, SALONES, PASILLOS Y PUNTOS FIJOS)	ML	1.703,24	$ 109.326,50	$ 186.209.270,24	-	$ -	-	ML	1.703,24	-	$ 186.209.270,24	$ 0,00	1.703,24	$ 186.209.270,24		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1703,24	$ 186.209.270,24
NP-A03	PUERTA CONTRAFUEGO (SALIDAS DE EMERGENCIAS)	UND	4,00	$ 7.714.486,40	$ 30.857.945,60	-	$ -	-	UND	4,00	-	$ 30.857.945,60	$ 0,00	4,00	$ 30.857.945,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 30.857.945,60
NP-A04	SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	25,00	$ 1.568.108,14	$ 39.202.703,60	-	$ -	-	UND	25,00	-	$ 39.202.703,60	$ 0,00	25,00	$ 39.202.703,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 39.202.703,60
NP-A05	ORINAL INSTITUCIONAL	UND	6,00	$ 1.868.758,14	$ 11.938.549,68	-	$ -	-	UND	6,00	-	$ 11.938.549,68	$ 0,00	6,00	$ 11.938.549,68		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 11.938.549,68
NP-A06	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS INSTITUCIONAL	UND	5,00	$ 945.230,18	$ 4.726.150,89	-	$ -	-	UND	5,00	-	$ 4.726.150,89	$ 0,00	5,00	$ 4.726.150,89		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 4.726.150,89
NP-A07	GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL	UND	34,00	$ 639.518,11	$ 21.743.615,76	-	$ -	-	UND	34,00	-	$ 21.743.615,76	$ 0,00	34,00	$ 21.743.615,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	34,00	$ 21.743.615,76
NP-A08	BARRA DISCAPACITADO	UND	2,00	$ 245.659,05	$ 491.318,11	-	$ -	-	UND	2,00	-	$ 491.318,11	$ 0,00	2,00	$ 491.318,11		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 491.318,11
NP-A09	DISPENSADOR DE PAPEL	UND	25,00	$ 437.112,07	$ 10.927.801,80	-	$ -	-	UND	25,00	-	$ 10.927.801,80	$ 0,00	25,00	$ 10.927.801,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 10.927.801,80
NP-A10	PAPELERA METALICA ANTIBANDALICA	UND	27,00	$ 681.212,07	$ 18.232.725,84	-	$ -	-	UND	27,00	-	$ 18.232.725,84	$ 0,00	27,00	$ 18.232.725,84		$ 0,00	0,00	$ 0,00	27,00	$ 18.232.725,84
NP-A11	SECADOR AUTOMOATICO DE MANOS	UND	5,00	$ 1.276.518,11	$ 6.382.590,54	-	$ -	-	UND	5,00	-	$ 6.382.590,54	$ 0,00	5,00	$ 6.382.590,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 6.382.590,54
NP-A12	PUERTAS DE MADERA	UND	14,00	$ 1.422.511,84	$ 19.915.165,76	-	$ -	-	UND	14,00	-	$ 19.915.165,76	$ 0,00	14,00	$ 19.915.165,76		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 19.915.165,76
NP-A13	BARANDAS METALICAS	M2	40,05	$ 1.479.595,40	$ 59.257.435,32	-	$ -	-	M2	40,05	-	$ 59.257.435,32	$ 0,00	40,05	$ 59.257.435,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,05	$ 59.257.435,32
NP-A14	DISPENSADOR DE JABON DE EMPOTRAR	UND	10,00	$ 522.618,11	$ 5.226.181,08	-	$ -	-	UND	10,00	-	$ 5.226.181,08	$ 0,00	10,00	$ 5.226.181,08		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 5.226.181,08
NP-A15	DUCHA ANTIVANDALICA CON REGADERA DE EMPOTRAR	UND	18,00	$ 797.818,11	$ 12.285.069,73	-	$ -	-	UND	18,00	-	$ 12.285.069,73	$ 0,00	18,00	$ 12.285.069,73		$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 12.285.069,73
				0	$ 2.054.423.593,65		$ 0,00					$ 2.054.423.593,65	$ 0,00		$ 2.054.423.593,65		$ 0,00		$ 0,00		$ 2.054.423.593,65

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+-) SEGÚN MODIFICATORIO 4						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
8.00	URBANISMO	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	CANTIDAD MAYORES (+)	CANTIDAD MENORES (-)	VALOR TOTAL MAYORES (+)	VALOR TOTAL MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU-1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=20 M Y ABLE A 15 M	m2	668,97	$ 10.158,00	$ 6.720.176,06	-	$ -	-	m2	668,97	-	$ 6.720.176,06	$ 0,00	668,97	$ 6.720.176,06		$ 0,00	0,00	$ 0,00	668,97	$ 6.720.176,06
ICCU-1.41	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	m2	668,97	$ 13.600,00	$ 8.991.992,00	-	$ -	-	m2	668,97	-	$ 8.991.992,00	$ 0,00	668,97	$ 8.991.992,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	668,97	$ 8.991.992,00
ICCU - 600.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) (Via vehicular y parqueaderos)	m3	271,18	$ 29.229,00	$ 7.655.140,22	-	$ -	-	m3	271,18	-	$ 7.655.140,22	$ 0,00	271,18	$ 7.655.140,22		$ 0,00	0,00	$ 0,00	271,18	$ 7.655.140,22
ICCU - 1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXPLANACIONES, CANALES, PRESTAMOS, BOSE ACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	10.223,49	$ 1.735,00	$ 17.737.749,21	-	$ -	-	M3-KM	10.223,49	-	$ 17.737.749,21	$ 0,00	10.223,49	$ 17.737.749,21		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10223,49	$ 17.737.749,21
ICCU- 2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3.500 PSI 0.60 X 0.60 X 0.20 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	20,20	$ 897.072,00	$ 17.514.854,40	-	$ -	-	m3	20,20	-	$ 17.514.854,40	$ 0,00	20,20	$ 17.514.854,40		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,20	$ 17.514.854,40
ICCU- 2.7	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.500 PSI 0.30 X 0.40 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	38,00	$ 924.714,00	$ 33.289.704,00	-	$ -	-	m3	38,00	-	$ 33.289.704,00	$ 0,00	38,00	$ 33.289.704,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	38,00	$ 33.289.704,00
ICCU- 2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3.500 PSI 0.12 X 0.15 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	25,19	$ 924.714,00	$ 23.293.545,66	-	$ -	-	m3	25,19	-	$ 23.293.545,66	$ 0,00	25,19	$ 23.293.545,66		$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,19	$ 23.293.545,66
ICCU - 3.22	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE (Via vehicular y parqueaderos)	m3	84,74	$ 156.908,00	$ 13.296.383,92	-	$ -	-	m3	84,74	-	$ 13.296.383,92	$ 0,00	84,74	$ 13.296.383,92		$ 0,00	0,00	$ 0,00	84,74	$ 13.296.383,92
ICCU-4.20	RIEGO DE IMPRIMACION	M2	-	$ 5.990,00	$ 0,00	-	$ -	-	M2	-	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
ICCU - 4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNETAS EN CERRAMIENTO	KG	11.460,41	$ 7.971,00	$ 91.510.370,27	-	$ -	-	KG	11.460,41	-	$ 91.510.370,27	$ 0,00	11.460,41	$ 91.510.370,27		$ 0,00	0,00	$ 0,00	11460,41	$ 91.510.370,27
ICCU-4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	705,00	$ 10.461,00	$ 7.376.155,00	-	$ -	-	KG	705,00	-	$ 7.376.155,00	$ 0,00	705,00	$ 7.376.155,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	705,00	$ 7.376.155,00
ICCU - 4.3	COLUMNETA EN CONCRETO 3,500 PSI SEC: 0.25 X 0.25 ALTURA DE 2.07 MTR PARA CERRAMIENTO	m3	15,53	$ 1.139.839,00	$ 17.698.169,67	-	$ -	-	m3	15,53	-	$ 17.698.169,67	$ 0,00	15,53	$ 17.698.169,67		$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,53	$ 17.698.169,67
ICCU-4.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1500	m2	434,65	$ 10.421,00	$ 4.529.457,65	-	$ -	-	m2	434,65	-	$ 4.529.457,65	$ 0,00	434,65	$ 4.529.457,65		$ 0,00	0,00	$ 0,00	434,65	$ 4.529.457,65
ICCU-5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 DOS CARAS A LA VISTA	M2	180,00	$ 219.063,00	$ 39.413.340,00	-	$ -	-	M2	180,00	-	$ 39.413.340,00	$ 0,00	180,00	$ 39.413.340,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	180,00	$ 39.413.340,00
ICCU-5.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ml	87,00	$ 99.418,00	$ 8.388.366,00	-	$ -	-	ml	87,00	-	$ 8.388.366,00	$ 0,00	87,00	$ 8.388.366,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	87,00	$ 8.388.366,00
ICCU- 10.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON REMARCO EN ANGULO DE 1 1/4"	m2	600,00	$ 169.027,00	$ 132.021.600,00	-	$ -	-	m2	600,00	-	$ 132.021.600,00	$ 0,00	600,00	$ 132.021.600,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	600,00	$ 132.021.600,00
ICCU-19.10	RELLENOS AGREGADOS EN MATERIAL DE BASE COMPATACTADO MECANICAMENTE (Via vehicular)	m3	199,79	$ 207.171,00	$ 41.390.694,09	-	$ -	-	m3	199,79	-	$ 41.390.694,09	$ 0,00	199,79	$ 41.390.694,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	199,79	$ 41.390.694,09
ICCU- 19.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN MOVIMIENTO DE TIERRAS (Via vehicular y parqueaderos)	m3	192,00	$ 74.321,00	$ 14.269.632,00	-	$ -	-	m3	192,00	-	$ 14.269.632,00	$ 0,00	192,00	$ 14.269.632,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	192,00	$ 14.269.632,00
INV-450.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (CICLOVIA)	m3	-	$ 1.135.653,00	$ 0,00	-	$ -	-	m3	-	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
INV-480.3	CONCRETO CLASE C, F'C =3000 PSI (Zona vehicular)	m3	33,90	$ 1.049.460,00	$ 35.578.694,00	-	$ -	-	m3	33,90	-	$ 35.578.694,00	$ 0,00	33,90	$ 35.578.694,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	33,90	$ 35.578.694,00
				SUB TOTAL URBANISMO	$ 520.662.053,15		$ 0,00					$ 520.662.053,15	$ 0,00		$ 520.662.053,15		$ 0,00		$ 0,00		$ 520.662.053,15

No	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+-) SEGÚN MODIFICATORIO 4				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
										CANTIDAD	VALOR TOTAL								
9.00	ELECTRICO																		

		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
ICCU- 21.23	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	3.398,50	$ 7.517,00	$ 25.531.490,50	-	$ -	-	ML	3.398,50	-	$ 25.531.490,50	$ 0,00	3.398,50	$ 25.531.490,50		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3398,50	$ 25.531.490,50
ICCU-12-28	POSTE METALICO DE 6 MTS	UND	15,00	$ 1.772.645,00	$ 26.589.675,00	-	$ -	-	UND	15,00	-	$ 26.589.675,00	$ 0,00	15,00	$ 26.589.675,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 26.589.675,00
ICCU-12-24	POSTE EN CONCRETO REFORZADO 12 MTS	UND	1,00	$ 2.027.612,00	$ 2.027.612,00	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 2.027.612,00	$ 0,00	1,00	$ 2.027.612,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.027.612,00
NP-E01	SALIDA DE ILUMINACION, CONTROL Y TOMAS CORRIENTE	UND	972,00	$ 74.694,36	$ 72.602.936,39	-	$ -	-	UND	972,00	-	$ 72.602.936,39	$ 0,00	972,00	$ 72.602.936,39	972,00	$ 72.602.936,39	972,00	$ 72.602.936,39	0,00	$ 0,00
NP-E02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL TIPO LED 32W.	UND	67,00	$ 524.656,57	$ 35.151.960,09	-	$ -	-	UND	67,00	-	$ 35.151.960,09	$ 0,00	67,00	$ 35.151.960,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00	67,00	$ 35.151.960,09
NP-E03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CIRCULAR TIPO LED 18W	UND	54,00	$ 197.754,57	$ 10.138.746,70	-	$ -	-	UND	54,00	-	$ 10.138.746,70	$ 0,00	54,00	$ 10.138.746,70		$ 0,00	0,00	$ 0,00	54,00	$ 10.138.746,70
NP-E04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CIRCULAR TIPO LED 40W	UND	300,00	$ 219.698,57	$ 65.682.441,72	-	$ -	-	UND	300,00	-	$ 65.682.441,72	$ 0,00	300,00	$ 65.682.441,72		$ 0,00	0,00	$ 0,00	300,00	$ 65.682.441,72
NP-E05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA AUTONOMIA 60 MIN	UND	21,00	$ 232.664,57	$ 4.885.955,64	-	$ -	-	UND	21,00	-	$ 4.885.955,64	$ 0,00	21,00	$ 4.885.955,64		$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,00	$ 4.885.955,64
NP-E06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO APLIQUE 18W	UND	8,00	$ 172.664,57	$ 1.381.316,56	-	$ -	-	UND	8,00	-	$ 1.381.316,56	$ 0,00	8,00	$ 1.381.316,56		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.381.316,56
NP-E07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	69,00	$ 92.692,57	$ 7.971.560,69	-	$ -	-	UND	69,00	-	$ 7.971.560,69	$ 0,00	69,00	$ 7.971.560,69		$ 0,00	0,00	$ 0,00	69,00	$ 7.971.560,69
NP-E08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DUAL	UND	29,00	$ 438.364,57	$ 12.712.572,45	-	$ -	-	UND	29,00	-	$ 12.712.572,49	$ 0,00	29,00	$ 12.712.572,49		$ 0,00	0,00	$ 0,00	29,00	$ 12.712.572,49
NP-E09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	12,00	$ 104.964,57	$ 1.259.574,82	-	$ -	-	UND	12,00	-	$ 1.259.574,82	$ 0,00	12,00	$ 1.259.574,82		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.259.574,82
NP-E10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE	UND	1,00	$ 115.592,57	$ 115.592,57	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 115.592,57	$ 0,00	1,00	$ 115.592,57		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 115.592,57
NP-E11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES REGULADA BIFASICA DE 15 AMP CON POLO A TIERRA	UND	111,00	$ 112.492,57	$ 12.486.675,10	-	$ -	-	UND	111,00	-	$ 12.486.675,10	$ 0,00	111,00	$ 12.486.675,10		$ 0,00	0,00	$ 0,00	111,00	$ 12.486.675,10
NP-E12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES BIFASICA CON POLO A TIERRA	UND	191,00	$ 83.928,38	$ 16.030.320,39	-	$ -	-	UND	191,00	-	$ 16.030.320,39	$ 0,00	191,00	$ 16.030.320,39		$ 0,00	0,00	$ 0,00	191,00	$ 16.030.320,39
NP-E13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES TOMA GFCI CON POLO A TIERRA	UND	3,00	$ 197.592,57	$ 592.777,71	-	$ -	-	UND	3,00	-	$ 592.777,71	$ 0,00	3,00	$ 592.777,71		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 592.777,71
NP-E14	SALIDA HDMI	UND	58,00	$ 128.897,38	$ 7.474.307,58	-	$ -	-	UND	58,00	-	$ 7.474.307,58	$ 0,00	58,00	$ 7.474.307,58		$ 0,00	0,00	$ 0,00	58,00	$ 7.474.307,58
NP-E15	SALIDA TV	UND	59,00	$ 106.723,38	$ 6.296.974,36	-	$ -	-	UND	59,00	-	$ 6.296.974,36	$ 0,00	59,00	$ 6.296.974,36		$ 0,00	0,00	$ 0,00	59,00	$ 6.296.974,36
NP-E16	SALIDA DE DATOS SENCILLA	UND	73,00	$ 108.517,38	$ 7.921.168,67	-	$ -	-	UND	73,00	-	$ 7.907.169,67	$ 0,00	73,00	$ 7.907.169,67		$ 0,00	0,00	$ 0,00	73,00	$ 7.907.169,67
NP-E17	SALIDA DE VOZ IP	UND	4,00	$ 116.328,72	$ 465.306,87	-	$ -	-	UND	4,00	-	$ 465.306,87	$ 0,00	4,00	$ 465.306,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 465.306,87
NP-E18	Organizacion doble tapa, incluye hornaje plano 48 puertos UTP 6	UND	4,00	$ 1.692.187,77	$ 6.768.751,08	-	$ -	-	UND	4,00	-	$ 6.768.751,08	$ 0,00	4,00	$ 6.768.751,08	4,00	$ 6.768.751,08	4,00	$ 6.768.751,08	0,00	$ 0,00
NP-E19	Gabinete cerrado 42U 800x800 mm con puerta microperforada	UND	2,00	$ 13.198.859,36	$ 26.397.718,72	-	$ -	-	UND	2,00	-	$ 26.397.718,72	$ 0,00	2,00	$ 26.397.718,72		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 26.397.718,72
NP-E20	Suministro, instalacion bandeja porta cables - DUCTO CERRADO CON DIVISION, accesorios de 40*20	UND	999,60	$ 279.882,36	$ 278.930.757,93	-	$ -	-	UND	999,60	-	$ 278.930.757,93	$ 0,00	999,60	$ 278.930.757,93	999,60	$ 278.930.757,93	999,60	$ 278.930.757,93	0,00	$ 0,00
NP-E21	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE (INCLUYE BASE)	UND	138,00	$ 689.661,65	$ 95.173.307,42	-	$ -	-	UND	138,00	-	$ 95.173.307,42	$ 0,00	138,00	$ 95.173.307,42		$ 0,00	0,00	$ 0,00	138,00	$ 95.173.307,42
NP-E22	ESTACION MANUAL DE ALARMA COMPLETA (PULL STATION)	UND	4,00	$ 7.555.904,79	$ 30.223.619,16	-	$ -	-	UND	4,00	-	$ 30.223.619,16	$ 0,00	4,00	$ 30.223.619,16		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 30.223.619,16
NP-E23	LINEA EN TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS Y CAJAS PARA RED CONTRA INCENDIO	UND	788,47	$ 116.845,23	$ 92.129.785,60	-	$ -	-	UND	788,47	-	$ 92.129.785,60	$ 0,00	788,47	$ 92.129.785,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00	788,47	$ 92.129.785,60
NP-E24	TG1: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL 1 (Incluye conexion a transformador, planta de emergencia, a tableros TGA, TD1, TD2, TDR1, TDR2, TBOMBAS, T ASCENSOR, T PORTERIA)	UND	1,00	$ 101.253.790,43	$ 101.253.790,43	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 101.253.790,43	$ 0,00	1,00	$ 101.253.790,43		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 101.253.790,43
NP-E25	TGA: TABLERO GENERAL AIRES	UND	1,00	$ 14.859.125,54	$ 14.859.125,54	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 14.859.125,54	$ 0,00	1,00	$ 14.859.125,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 14.859.125,54
NP-E26	TD1: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 1	UND	1,00	$ 5.095.701,87	$ 5.095.701,87	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 5.095.701,87	$ 0,00	1,00	$ 5.095.701,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.095.701,87
NP-E27	TD2: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 2	UND	1,00	$ 4.600.629,47	$ 4.600.629,47	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 4.600.629,47	$ 0,00	1,00	$ 4.600.629,47		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.600.629,47
NP-E28	TGR: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL REGULADO	UND	1,00	$ 5.095.701,87	$ 5.095.701,87	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 5.095.701,87	$ 0,00	1,00	$ 5.095.701,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.095.701,87
NP-E29	TDR1: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION	UND	1,00	$ 3.958.061,87	$ 3.958.061,87	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 3.958.061,87	$ 0,00	1,00	$ 3.958.061,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.958.061,87
NP-E30	TDR2: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION	UND	1,00	$ 3.549.355,18	$ 3.549.355,18	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 3.549.355,18	$ 0,00	1,00	$ 3.549.355,18		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.549.355,18
NP-E31	TBOMBAS TABLERO NORMAL DISTRIBUCION CUARTO BOMBAS PRESION	UND	1,00	$ 3.958.061,87	$ 3.958.061,87	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 3.958.061,87	$ 0,00	1,00	$ 3.958.061,87		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.958.061,87
NP-E32	T FOSO TABLERO NORMAL DISTRIBUCION FOSO ASCENSOR	UND	1,00	$ 2.851.478,49	$ 2.851.478,49	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 2.851.478,49	$ 0,00	1,00	$ 2.851.478,49		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.851.478,49
NP-E33	T PORTERIA TABLERO NORMAL DISTRIBUCION	UND	1,00	$ 3.070.630,06	$ 3.070.630,06	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 3.070.630,06	$ 0,00	1,00	$ 3.070.630,06		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.070.630,06
NP-E34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS TRIFASICA 20KVA AUTNOVIA 10 MINUTOS	UND	1,00	$ 31.147.173,54	$ 31.147.173,54	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 31.147.173,54	$ 0,00	1,00	$ 31.147.173,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 31.147.173,54
NP-E35	PLANTA ELECTRICA TRIFASICA DE 150 KVA 240/120V	UND	1,00	$ 64.768.696,54	$ 64.768.696,54	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 64.768.696,54	$ 0,00	1,00	$ 64.768.696,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 64.768.696,54
NP-E36	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 5.314.569,54	$ 5.314.569,54	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 5.314.569,54	$ 0,00	1,00	$ 5.314.569,54		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.314.569,54

NP-E37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO DE 150 KVA, 11400/208-120V	UND	1,00	$ 189.741.378,16	$ 189.741.378,16	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 189.741.378,16	$ 0,00	1,00	$ 189.741.378,16		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 189.741.378,16
NP-E38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION EN CABLE DE 3X1/0 AWG XLPE AI 15 KV SUBTERRANEA	ML	120,00	$ 2.303.195,51	$ 276.383.461,06	-	$ -	-	ML	120,00	-	$ 276.383.461,06	$ 0,00	120,00	$ 276.383.461,06		$ 0,00	0,00	$ 0,00	120,00	$ 276.383.461,06
NP-E39	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED SOLAR 100W KIT	UND	15,00	$ 3.170.608,95	$ 47.562.134,18	-	$ -	-	UND	15,00	-	$ 47.562.134,18	$ 0,00	15,00	$ 47.562.134,18		$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 47.562.134,18
NP-E40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE DERIVACION RED AEREA MT LA-228	ML	1,00	$ 3.582.698,35	$ 3.582.698,35	-	$ -	-	ML	1,00	-	$ 3.582.698,35	$ 0,00	1,00	$ 3.582.698,35		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.582.698,35
NP-E41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO DE MEDIDA AE-319 SEGÚN NORMA	UND	2,00	$ 13.526.086,74	$ 27.052.173,47	-	$ -	-	UND	2,00	-	$ 27.052.173,47	$ 0,00	2,00	$ 27.052.173,47		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 27.052.173,47
NP-E42	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-278 CODENSA DE 2X1,70X1,50	UND	3,00	$ 7.663.580,10	$ 22.990.740,30	-	$ -	-	UND	3,00	-	$ 22.990.740,30	$ 0,00	3,00	$ 22.990.740,30		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 22.990.740,30
NP-E43	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-280 CODENSA 2X2X1,50	UND	2,00	$ 12.040.896,00	$ 24.081.792,00	-	$ -	-	UND	2,00	-	$ 24.081.792,00	$ 0,00	2,00	$ 24.081.792,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 24.081.792,00
NP-E44	CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	UND	1,00	$ 49.000.000,00	$ 49.000.000,00	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 49.000.000,00	$ 0,00	1,00	$ 49.000.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 49.000.000,00
NP-E45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR ELECTRICO DE PASAJEROS, 2 PARADAS, CAPACIDAD CARGA 800 KG	UND	1,00	$ 225.000.000,00	$ 225.000.000,00	-	$ -	-	UND	1,00	-	$ 225.000.000,00	$ 0,00	1,00	$ 225.000.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 225.000.000,00
NP-69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES TUBERIA 3/4	ML	1.150,00	$ 81.862,00	$ 94.141.300,00	-	$ -	-	ML	1.150,00	-	$ 94.141.300,00	$ 0,00	1.150,00	$ 94.141.300,00	1150,00	$ 94.141.300,00	1150,00	$ 94.141.300,00	0,00	$ 0,00
				SUB TOTAL ELECTRICO	$ 2.085.187.788,62			$ 0,00				$ 2.085.187.788,62	$ 0,00		$ 2.085.187.788,62		$ 452.443.745,45		$ 452.443.745,45		$ 1.632.744.043,07

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO				EJECUTADO Y/O PAGADO ACTAS ANTERIORES		MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-) SEGÚN MODIFICATORIO 4			CANTIDAD		VALOR TOTAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4		PRESENTE ACTA N18		ACUMULADO ACTAS		SALDO POR EJECUTAR	
9.69	INSONORIZACION	UND	CANT	VR UNT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	(+,-)	UND	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-AA01	BAJO PISO PARA AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO	M2	773,68	$ 425.424,50	$ 329.225.431,37	-	$ -	-	M2	773,68	-	$ 329.225.431,37	$ 0,00	773,68	$ 329.225.431,37		$ 0,00	0,00	$ 0,00	773,68	$ 329.225.431,37
NP-AA02	CIELO RASO (DOBLE) ACÚSTICO DE AISLAMIENTO	M2	1.547,75	$ 644.582,92	$ 997.653.214,43	-	$ -	-	M2	1.547,75	-	$ 997.653.214,43	$ 0,00	1.547,75	$ 997.653.214,43		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1547,75	$ 997.653.214,43
NP-AA03	CIELO ACONDICIONAMIENTO LÁMINA DE ESPUMA POLIURETANO	M2	1.547,75	$ 427.709,29	$ 662.126.304,67	-	$ -	-	M2	1.547,75	-	$ 662.126.304,67	$ 0,00	1.547,75	$ 662.126.304,67		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1547,75	$ 662.126.304,67
NP-AA04	MURO DE AISLAMIENTO	M2	1.218,05	$ 655.717,72	$ 798.698.968,85	-	$ -	-	M2	1.218,05	-	$ 798.698.968,85	$ 0,00	1.218,05	$ 798.698.968,85		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1218,05	$ 798.698.968,85
NP-AA05	SOBRE MURO DE AISLAMIENTO	M2	851,95	$ 619.507,72	$ 527.789.602,05	-	$ -	-	M2	851,95	-	$ 527.789.602,05	$ 0,00	851,95	$ 527.789.602,05		$ 0,00	0,00	$ 0,00	851,95	$ 527.789.602,05
NP-AA06	MURO ACONDICIONAMIENTO FIBRA POLIESTER CON CAMARA DE AIRE	M2	575,00	$ 893.549,44	$ 513.790.928,00	-	$ -	-	M2	575,00	-	$ 513.790.928,00	$ 0,00	575,00	$ 513.790.928,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	575,00	$ 513.790.928,00
NP-AA07	MURO ACONDICIONAMIENTO EN MADERA 12 MM RANURADA PREFORMATIA	M2	188,00	$ 949.528,84	$ 178.612.010,84	-	$ -	-	M2	188,00	-	$ 178.612.010,84	$ 0,00	188,00	$ 178.612.010,84		$ 0,00	0,00	$ 0,00	188,00	$ 178.612.010,84
NP-AA08	PUERTA ACÚSTICA DIMENSION 2M DE ALTO X 0.90 DE ANCHO	M2	44,00	$ 13.421.209,66	$ 590.533.225,02	-	$ -	-	M2	44,00	-	$ 590.533.225,02	$ 0,00	44,00	$ 590.533.225,02		$ 0,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 590.533.225,02
NP-AA09	PUERTA ACÚSTICA DIMENSION 2M DE ALTO X 1.60 DE ANCHO	M2	23,00	$ 22.603.401,60	$ 519.878.236,84	-	$ -	-	M2	23,00	-	$ 519.878.236,84	$ 0,00	23,00	$ 519.878.236,84		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 519.878.236,84
				SUB TOTAL INSONORIZACION	$ 5.116.305.924,77		$ 0,00					$ 5.116.305.924,77	$ 0,00		$ 5.116.305.924,77		$ 0,00		$ 0,00		$ 5.116.305.924,77
	SUB-TOTAL ADICION N°3 FASE III OBRA				$ 11.885.278.847,51		$ -					$ 11.885.278.847,51	$ -		$ 11.885.278.847,51		$ 452.443.745,45		$ 452.443.745,45		$ 11.432.833.102,05
	IVA	19%			$ 0,00		$ -					$ 0,00	$ -		$ -						
	TOTAL				$ 0,00		$ -					$ 0,00	$ -		$ -						
	COSTO DIRECTO DE OBRA				$ 11.885.278.847,51		$ -					$ 11.885.278.847,51	$ -		$ 11.885.278.847,51		$ 452.443.745,45		$ 452.443.745,45		$ 11.432.833.102,05
	Administrativos	21,33%			$ 2.535.129.551,57		$ -					$ 2.535.129.551,57	$ -		$ 2.535.129.551,57		$ 95.506.250,90		$ 95.506.250,90		$ 2.439.623.300,67
	Imprevistos	2%			$ 237.705.536,95		$ -					$ 237.705.536,95	$ -		$ 237.705.536,95		$ 9.048.874,91		$ 9.048.874,91		$ 228.656.662,04
	Utilidad	10%			$ 1.189.527.684,75		$ -					$ 1.189.527.684,75	$ -		$ 1.189.527.684,75		$ 45.244.374,55		$ 45.244.374,55		$ 1.143.283.310,21
	TOTAL ADICION N°3 FASE III				$ 15.849.639.620,79		$ -					$ 15.849.639.620,79	$ -		$ 15.849.639.620,79		$ 603.243.245,81		$ 603.243.245,81		$ 15.243.396.374,99
	VALOR TOTAL FASE I y III						$ 28.099.711.291,35					VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 4 y ADICION N°4			$ 46.938.292.619,94		$ 1.067.515.310,44		$ 29.178.226.601,79		$ 15.760.065.909,15
																			PORCENTAJE DE EJECUCION		2,37%		63,52%		35,49%

RESUMEN DE CORTES

ACTA PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR ACUMULADO	SALDO	% AVANCE	PERIODO
ACTA PARCIAL N° 1-ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.445.013.750,00	$ 1.445.013.750,00	$ 28.489.665.783,67	5,17%	2 de agosto a 20 de septiembre de 2022
ACTA PARCIAL N° 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 557.101.500,00	$ 2.002.165.250,00	$ 25.929.654.283,67	7,17%	21 de septiembre a 12 de diciembre de 2022
ACTA PARCIAL N° 3-ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 369.439.375,00	$ 2.371.604.625,00	$ 25.560.114.908,67	8,49%	13 de diciembre de 2022 a 10 de febrero de 2023
ACTA PARCIAL N° 4-OBRAS	$ 3.862.337.807,67	$ 6.233.942.432,67	$ 21.697.777.100,67	21,60%	15 de agosto a 28 de agosto de 2023
ACTA PARCIAL N° 5-ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.146.114.908,87	$ 7.380.057.341,54	$ 20.751.662.192,03	25,71%	29 de agosto al 30 septiembre de 2023
ACTA PARCIAL N° 6 OBRA	$ 3.783.781.060,77	$ 10.963.868.402,31	$ 16.967.611.131,26	39,25%	1 de octubre al 24 de noviembre de 2023
ACTA PARCIAL N° 7 OBRA	$ 3.500.823.620,45	$ 14.467.392.026,76	$ 13.464.387.504,81	51,80%	25 de noviembre al 21 de diciembre de 2023
ACTA PARCIAL N° 8 OBRA	$ 2.073.031.907,80	$ 16.540.363.998,56	$ 11.391.355.597,01	59,22%	22 de diciembre de 2023 al 18 de marzo de 2024
ACTA PARCIAL N° 9 OBRA	$ 1.109.805.419,74	$ 17.650.169.368,30	$ 10.281.550.177,29	63,15%	19 de marzo a 31 de marzo de 2024 - 01 de agosto a 16 de agosto de 2024
ACTA PARCIAL N° 10 OBRA	$ 1.069.541.851,47	$ 18.742.711.207,76	$ 9.189.008.325,81	67,10%	17 de agosto a 30 de septiembre de 2024
ACTA PARCIAL N° 11 OBRA	$ 1.518.612.168,59	$ 20.259.823.374,35	$ 7.672.096.139,22	72,53%	30 de septiembre a 30 octubre de 2024
ACTA PARCIAL N° 12 OBRA	$ 1.587.603.413,28	$ 21.827.245.787,63	$ 6.104.472.745,94	78,15%	01 de noviembre a 16 diciembre de 2024
ACTA PARCIAL N° 13 OBRA	$ 1.721.099.420,46	$ 23.548.342.208,09	$ 4.383.377.325,48	84,31%	17 de diciembre al 10 febrero de 2025
ACTA PARCIAL N° 14 OBRA	$ 1.569.056.583,95	$ 25.137.398.772,04	$ 2.784.320.751,53	89,94%	11 de febrero al 11 marzo de 2025
ACTA PARCIAL N° 15 OBRA	$ 1.199.000.288,28	$ 26.336.399.060,34	$ 3.758.253.892,90	87,52%	11 de marzo al 15 abril de 2025
ACTA PARCIAL N° 16 OBRA	$ 747.123.683,62	$ 27.082.522.943,95	$ 3.009.129.949,23	90,06%	13 de Agosto al 31 agosto de 2025
ACTA PARCIAL N° 17 OBRA	$ 1.008.188.347,40	$ 28.090.711.291,35	$ 17.847.591.219,69	61,15%	1 de septiembre al 17 octubre de 2025
ACTA PARCIAL N° 18 OBRA	$ 1.087.515.310,44	$ 29.178.226.601,79	$ 15.760.065.909,15	63,62%	15 de diciembre al 31 de enero de 2026

JEISON MENDOZA OCHOA
INGENIERO CIVIL TP 44202-343452
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT: 9015900189-1

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTERCULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL
N.I.T. 901611865-0


AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE COTA
SUPERVISORA

APOYO A LA SUPERVISION

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18	FECHA	DD	31	MM	1	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-063-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-052-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	129	TUBERÍA PVC-C900 4"	ml	EDIFICIO MUSICA	



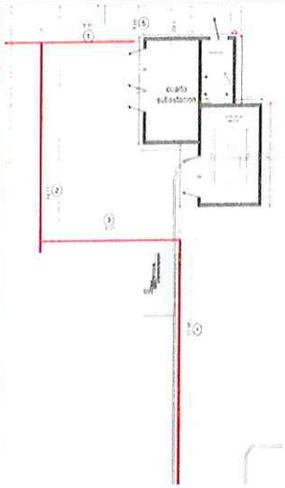

UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ZONA ENTRE LA TEE Y CODO CUARTO DE BOMBAS (1)	6.31				6.31
ZONA ENTRE LA TEE Y TRANSISION TEATRO (2)	14.11				14.11
ZONA ENTRE LA TEE Y SUB ESTACION (3)	8.07				8.07
ZONA ENTRE CODO SUB ESTACION A PORTERIA (4)	32.98				32.98
ZONA ENTRE CODO A ENTREDA SUB ESTACION (5)	1.6				1.6
			TOTAL		62.07


TOTAL	62.07
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	125.93
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	63.1
A PAGAR PRESENTE ACTA	62.07
SALDO POR EJECUTAR	0.8

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18	FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-032-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	NP73	RESTRICTOR HD SERIE 1200 C900 4"	UND	EDIFICIO MUSICA	

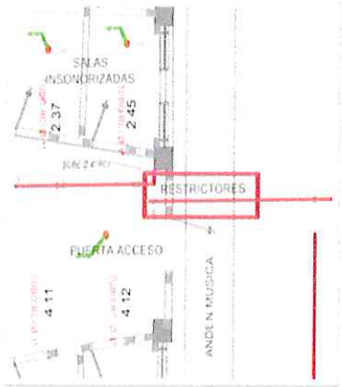



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAMBIO DE C900 A HD 1 PISO CORREDOR ACCESO CORREDOR SALONES INSONORIZADOS				10.00	10.00
			TOTAL		10.00


TOTAL	10.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	10.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	10.00
SALDO POR EJECUTAR	-20.0


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18		ACTA DE OBRA 18		FECHA	DD	31	MM	1	AA	2023	
OBJETO DEL CONTRATO		ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA									
INTERVENTOR		UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.859-0		CONTRATO No.		5-OP-083-2022		
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901390186		CONTRATO No.		5-OP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	=acta 18!D185	NP74	=acta 18!D239	=acta 18!E239	EDIFICIO MUSICA	

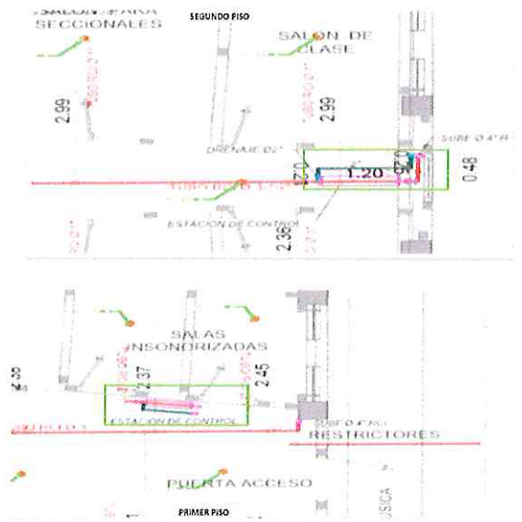





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
Conteder salones insonorizados 1 piso				1	=N11
Conteder salones seccionales 2 piso				1	=N12
			TOTAL		=SUMA(O11:O60)
TOTAL					=+O59
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA					


BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	=acta 18!AJ239
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	=acta 18!AC239
A PAGAR PRESENTE ACTA	=+O59
SALDO POR EJECUTAR	=N65-N85-N84

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18	FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.655-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	NP75	KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN C-900 - A/C completa	UND	EDIFICIO MUSICA	

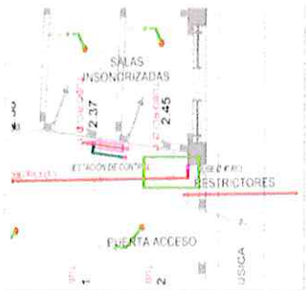



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
Transicion tuberia C900 a HD renureda en corredor salones insonorizados 1 piso (Estaciòn de control)				1.00	1.00
			TOTAL		1.00

TOTAL	1.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	1.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1.00
SALDO POR EJECUTAR	-2.0

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18	FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,550,185		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	NP76	SOPORTE ANTISISMICO 2'	UND	EDIFICIO MUSICA	





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
salon piano (1, 2)				2.00	2.00
salon piano avanzado (3 , 4)				2.00	2.00
			TOTAL		4.00

TOTAL	4.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	4.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	4.00
SALDO POR EJECUTAR	-8.0

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18	FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	NP77	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2'	UND	EDIFICIO MUSICA	





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
Hall 1 piso (1,2,3)				3.00	3.00
corredor salon ensamble (4,5)				2.00	2.00
corredor salon ensamble (6,7)				2.00	2.00
			TOTAL		7.00

TOTAL	7.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	7.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	7.00
SALDO POR EJECUTAR	-14.0


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL


ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18		FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.		SIOP-083-2022	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.		SIOP-082-2022	


CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	NP78	SOPORTE ANTISISMICO 3"	UND		EDIFICIO MUSICA



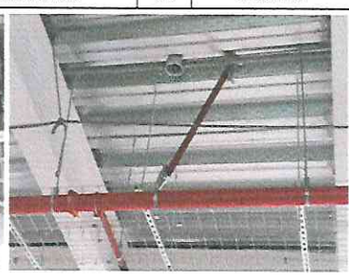







UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
Salones insonorizados (5,6,7)				3.00	3.00
Hall escaleras 1 piso (1,2)				2.00	2.00
Gavinete corredor salon de percusiones (3,4)				2.00	2.00
			TOTAL		7.00

TOTAL	7.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	7.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	7.00
SALDO POR EJECUTAR	-14.0

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CARDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18		FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO	260	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 EN CIRCULACIONES	M2	EDIFICIO TEATRO	





UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	N°	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
puente costado occidental columnas	1,2	0.44	3.7	2	3.256
	3,4	0.46	3.7	2	3.404
	5,6	0.41	3.7	2	3.034
	7.00	0.51	3.7	1	1.887
puente costado oriental columnas	9,10	0.42	3.7	3	4.664
	11,12	0.46	3.7	2	3.404
	13,14	0.41	3.7	2	3.034
	8.00	0.51	3.7	1	1.887
			TOTAL		24.57

TOTAL	24,57
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	508.96
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	509.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	24,57
SALDO POR EJECUTAR	

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18	FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.		SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.		SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	277	ACCESORIOS PVC-C900 4"	un	EDIFICIO TEATRO	







UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CORREDOR SALON TEATRO 1 PISO					
CODO 90 (1)				1.00	1.00
SEMICODOS (1,2,3,4,5)				5.00	5.00
			TOTAL		6.00

TOTAL	6.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	6.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	6.00
SALDO POR EJECUTAR	


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA


CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18	FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-033-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-032-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	278	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 4" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	EDIFICIO TEATRO	



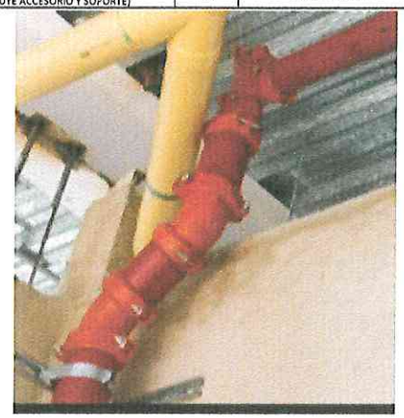



UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNA VERTICAL ENTRE PISO 1 AL 2 CORREDOR SALON DE TEATRO (1)	9.00				9.00
				TOTAL	9.00


TOTAL	9.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	26.30
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	9.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	9.00
SALDO POR EJECUTAR	

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA QUIZDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL


ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18		FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	279	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 1/2" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	EDIFICIO TEATRO	









	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
HALL ESCALERA 1 PISO (1)	9.55				9.55
CORREDOR ZONA ADMINISTRATIVA 1 PISO (2)	10.63				10.63
CORREDOR SALON DE TEATRO 1 PISO (3)	10.50				10.50
VESTIER Y MAQUILLAJE 1 PISO (4)	10.57				10.57
			TOTAL		41.25

TOTAL	41.25
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	41.3
A PAGAR PRESENTE ACTA	41.25
SALDO POR EJECUTAR	

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18	FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SOP-082-2022		


CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACION	LOCALIZACION
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	289	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 " (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml		EDIFICIO TEATRO








1 piso

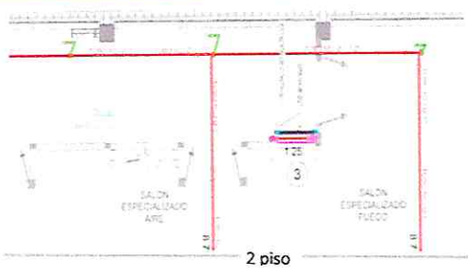

2 piso



2 piso

UBICACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ESTACION DE CONTROL CORREDOR SALON TEATRO 1 PISO (1)	1.25				1.25
COLUMNA RUFE DEL 1 AL 2 PISO BUTRON (2)	8.06				8.06
ESTACION DE CONTROL CORREDOR SALON ESPECIALIZADO 2 PISO (3)	1.25				1.25
SALON TEATRO 2 PISO (4)	7.33				7.33
SALON TEATRO 2 PISO (5)	4.21				4.21
				TOTAL	22.10

TOTAL	22.10
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	22.1
A PAGAR PRESENTE ACTA	22.10
SALDO POR EJECUTAR	

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA-OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18		FECHA	DD	31	MM	1	AA	2023
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-013-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	281	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 1 1/ 2 " (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	mi	EDIFICIO TEATRO	







1 piso

2 piso

UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CORREDOR SALON TEATRO. 1 PISO (1)	7.37				7.37
SALON MUSICAL. 1 PISO (2)	8.10				8.10
SALA DE JUNTAS 1 PISO (3)	3.85				3.85
PRIMEROS AUXILIOS 1 PISO (4)	7.63				7.63
CORREDOR SALON ESPECIALIZADO FUEGO. 2 PISO (5)	7.45				7.45
			TOTAL		34.40


TOTAL	34.40
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	34.4
A PAGAR PRESENTE ACTA	34.40
SALDO POR EJECUTAR	


JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18	FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL	NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022			

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	NP80	RESTRICTOR HD SERIE 1200 C900 4"	UND	EDIFICIO TEATRO	

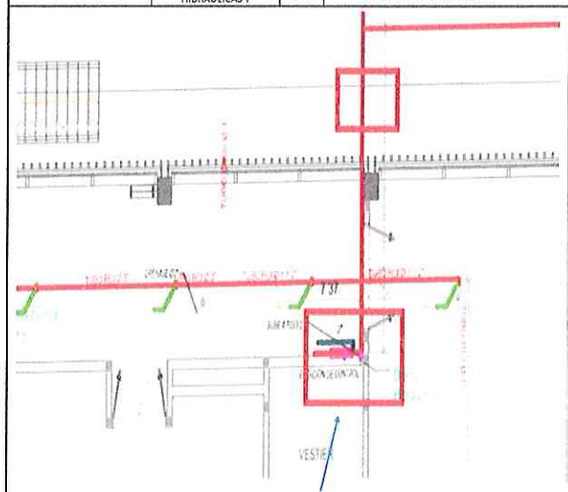

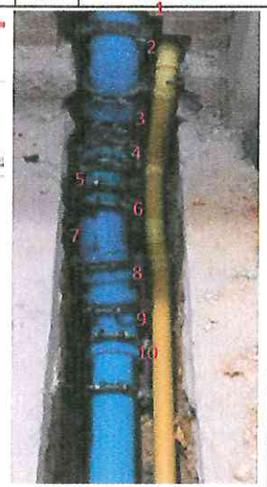

UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CORREDOR SALON TEATRO. 1 PISO CODOS Y SEMICODOS C900 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)				10.00	10.00
			TOTAL		10.00

TOTAL	10.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	10.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	10.00
SALDO POR EJECUTAR	

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA


CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18		FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	NP81	ESTACION DE CONTROL DE ROCIADORES DE 2"	UND	EDIFICIO TEATRO	







1 piso



2 piso

UBICACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CORREDOR SALON TEATRO. 1 PISO				1.00	1.00
CORREDOR SALON FUEGO. 2 PISO				1.00	1.00
			TOTAL		2.00

TOTAL	2.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	

BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	2.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	2.00
SALDO POR EJECUTAR	

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA


CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA N° 18	ACTA DE OBRA 18		FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER-CULTURAL		NIT O C.C.	901.611.855-0		CONTRATO No.	SIOP-083-2022		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT O C.C.	901,590,186		CONTRATO No.	SIOP-082-2022		

CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y	NP82	KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN C-900 - A/C completa	UND	EDIFICIO TEATRO	





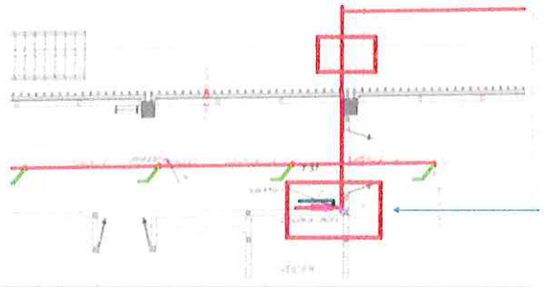

UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	LONG.	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CORREDOR SALON TEATRO. 1 PISO TRANSICION TUBERIA C900 A HD				1.00	1.00
			TOTAL		1.00

TOTAL	1.00
TOTAL AJUSTADA A LA DECIMA	
BALANCE DE CANTIDADES	
CANTIDAD TOTAL CONTRATADA	-
PAGO EN ACTAS ANTERIORES	1.0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1.00
SALDO POR EJECUTAR	

JERSON MENDOZA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
CONTRATISTA

CANDELARIA MENDOZA OVIEDO
INTERVENTORIA
UNION TEMPORAL INTER- CULTURAL
REPRESENTANTE LEGAL
