25 FEB 2026
RECIBIDO
HORA 2:00pm

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
No.001

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	08 DE 2026
OBJETO	"CONTRATO NO 008 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y DE SUS DERIVADOS, SUSCRITOS POR LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P"
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	ELIDA JOHANA AVILA PIRACOCA
SUPERVISOR	LINDA JULISSA ARDILA RENTERIA
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
FECHA DEL ACTA DE INCIO	16 DE ENERO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO	($36.000.000) M/CTE
VALOR ACTA N° 002 RECIBO PARCIAL 001 DE FECHA DEL 24 DE FEBRERO DE 2026	$ 6.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 6.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 30.000.000

ADICIONAL

ADICIONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	N/A
FECHA PRÓRROGA	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA	N/A
PLAZO PRÓRROGA	N/A
PRÓRROGA No.	N/A
FECHA PRÓRROGA	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA	N/A
PLAZO PRÓRROGA	N/A

SUSPENSION PLAZO


MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.000.000
VALOR ACTA No 002 PARCIAL No 001	$ 6.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 6.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 30.000.000

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Se debe reseñar el proceso contractual mediante el cual fue adjudicado el contrato de interventoría (PANTALLAZO CARGUE A SECOP II).

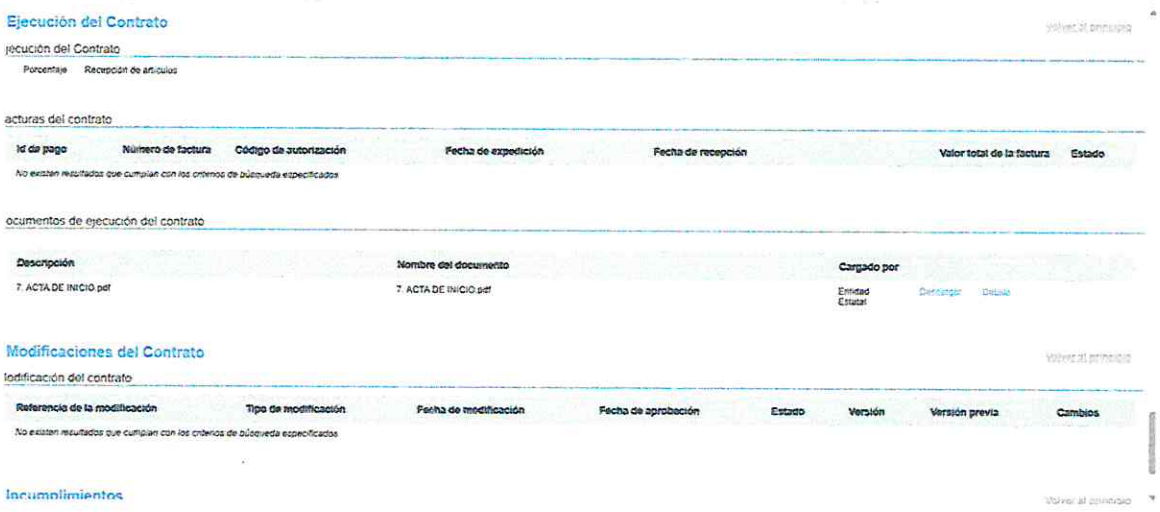

Ejecución del Contrato

Volver al principio

jecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

acturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

ocumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
7. ACTA DE INICIO.pdf	7. ACTA DE INICIO.pdf	Entidad Estatal	Descargar Detalle

Modificaciones del Contrato

Volver al principio

lodificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Volver al principio

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
01	ACTA DE INICIO	16 DE ENERO DEL 2026
02	ACTA N° 02 PARCIAL 01	24 DE FEBRERO DEL 2026

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Durante el periodo comprendido entre el 16 de enero y el 15 de febrero de 2026, desde la supervisión se verificó que la contratista del contrato de prestación de servicios profesionales No. 008 de 2026 cumplió con las actividades programadas, brindando apoyo técnico, administrativo y financiero en el seguimiento de los contratos interadministrativos y sus derivados adelantados por las Empresas Públicas de Puerto Boyacá.

A continuación, se detallan las principales actividades verificadas:

Desde la supervisión se verificó que la contratista prestó apoyo efectivo en las siguientes actividades:

- Asistencia presencial de la contratista a comité de obra del proyecto Villa Futuro II – Fase I, en el cual se realizó seguimiento al avance físico de las actividades ejecutadas, revisión de cronograma y análisis de compromisos pendientes, permitió fortalecer el control técnico y la articulación entre contratista, interventoría y supervisión.

- Participación de la contratista en comité de obra realizado en sitio para el proyecto "Construcción, optimización y reposición de red de alcantarillado del barrio 10 de Enero", con el propósito de verificar el avance físico de las actividades programadas.

  Asimismo, se verificó el acompañamiento en recorridos de obra para validar las condiciones de ejecución y cumplimiento de especificaciones técnicas.

- Acompañamiento brindado por la contratista en la socialización del proyecto "Construcción, optimización y reposición de red de alcantarillado en el municipio de Puerto Boyacá", realizada con la comunidad del barrio 10 de Enero y sectores aledaños, garantizando una adecuada comunicación entre la entidad y la comunidad beneficiaria.

- Acompañamiento técnico realizado por la contratista en visitas de campo a los siguientes proyectos:

  - Construcción de alcantarillado sanitario en el escenario deportivo (Carrera 5 y 7ª).

- Urbanismo Fase I – Villa Futuro II.

- Construcción, optimización y reposición de red de alcantarillado en el municipio (Contrato 077 de 2025).

- Revisión y evaluación documental realizada por la contratista para los procesos de liquidación de los siguientes contratos:

  - Contrato de obra 0200-13-02-019-24 (primera y segunda revisión).
  - Contrato de interventoría 0200-13-02-019-24 (segunda revisión).
  - Contrato de obra 050 de 2025 (primera revisión).
  - Contrato de interventoría 051 de 2025 (primera revisión).

- Apoyo brindado por la contratista en la revisión de la documentación inicial de los contratos:

  - Obra 070 de 2025.
  - Interventoría 071 de 2025.
  - Obra 077 de 2025.
  - Interventoría 078 de 2025.

  Validando requisitos contractuales, soportes administrativos y documentos técnicos necesarios para la correcta ejecución de los proyectos.

- Apoyo brindado en la solicitud y trámite de prórrogas para los contratos:

  - Obra 0200-13-02-022-24.
  - Interventoría 0200-13-02-020-24.

  Dicho acompañamiento contribuyó a la continuidad formal de los proyectos conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

PARTE VI. REGISTRO FOTOGRAFICO

Visita de obra proyecto alcantarillado escenario deportivo	**Visita de obra proyecto alcantarillado escenario deportivo**

	
Comité de obra proyecto Villa Futuro II Fase I	Visita proyecto Villa Futuro II, Llenos compactados
	
Socialización proyecto Alcantarillado 10 de enero	Socialización proyecto Alcantarillado 10 de enero
	
Amarre de acero pozo de inspección, alcantarillado escenario deportivo	Excavaciones, alcantarillado escenario deportivo
	
Excavaciones, alcantarillado escenario deportivo	Pozo de inspección en concreto reforzado, alcantarillado escenario deportivo

	
Comité de obra Proyecto alcantarillado 10 de enero	Comité de obra Proyecto alcantarillado 10 de enero
	
Recorrido de obra, alcantarillado 10 de enero	Recorrido de obra, alcantarillado 10 de enero
	

LINDA JULISSA ARDILA RENTERIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
