	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA TECNICA AGROPECUARIA DACHI DADA KERA. NIT: 901393794-3 DANE: 266572001407 RES1216 DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2020 Y RES 882 DE 25 DE ABRIL DE 2023.	
	ACTA DE ENTREGA	


Objeto:

ADECUACION DE DORMITORIO DE NIÑOS EN LA IE INDIGENA TECNICA AGROPECUARIA DACHI DADA KERA - VDA KEMBERDE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA.

ContratoN°. **C-014 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

Contratista: **OyM INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS**

PLANO

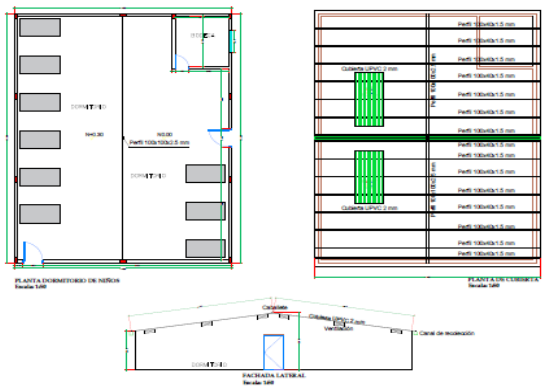

REGISTRO FOTOGRÁFICO
(min 4 Fotos)






ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	**DESMONTES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**					
1,1	Desmonte de dormitorio existente, incluye paredes y cubierta	glb	1,0	$ 553.603,42	$ 553.603,42	
1,2	Excavación manual	M3	0,4	$ 38.865,72	$ 17.411,84	
2	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**					
2,1	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CC	ML	32,0	$ 156.241,28	$ 4.999.720,96	
2,2	VIGA DE CORONACION DE 3000 PSI	ML	56,0	$ 182.795,50	$ 10.236.548,00	
2,3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	656,9	$ 11.983,42	$ 7.871.916,62	
3	**ESTRUCTURA METALICA**				$ -	
3,1	PERFIL 100X100X2,5 MM	ML	9,0	$ 218.399,29	$ 1.965.593,61	
3,2	PERFILES PARA CORREAS 40x100x1,5 mm	ML	162,0	$ 144.291,87		
4	**CUBIERTA**					
4,1	TEJA UPVC 2 MM	M2	180,0	$ 65.709,58	$ 11.827.724,45	
4,2	CABALLETE UPVC 2 MM	ML	15,0	$ 64.609,58	$ 969.143,70	
4,3	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	30,0	$ 48.117,58		
5	**MAMPOSTERIA Y PISOS**				$ -	
5,1	MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA	M2	129,2	$ 78.657,52	$ 10.162.553,07	
6	**CARPINTERIA METALICA**				$ -	
6,1	PUERTA EN LAMINA CALIBRE 20	M2	3,8	$ 485.717,63	$ 1.845.726,98	
6,2	VENTANA METALICA EN LAMINA CALIBRE 20	M2	3,6	$ 452.256,34	$ 1.646.213,06	
6,3	PUERTA REJA BATERIAS EXISTENTES	M2	0,0	$ 350.000,00	$ -	
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				$ -	
7,1	PUNTOS SANITARIOS	UND	0,0	$ 203.000,00	$ -	
7,2	PUNTOS HIDRAULICOS	UND	0,0	$ 84.733,65	$ -	
7,3	REPARACIONES BATERIAS SANITARIAS EXISTENTES	UND	0,0	$ 200.000,00	$ -	
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -	
8,1	SALIDA PARA ILUMINACION	UND	4,0	$ 81.776,56	$ 327.106,24	
8,2	SALIDA PARA TOMAS	UND	9,0	$ 71.195,60	$ 640.760,40	

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

la presente acta se firma a los 25 dias del mes de noviembre del año 2025

Firma : OVER DE JESUS CELIS ORTIZ
CONTRATISTA DE OBRA

ANGELA MARIA MAYA MAYA
RECTORA INSTITUCION EDUCATIVA
