MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

Villavicencio-Meta, 02 de febrero del 2026

Señores
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dr. Jhonny Alexánder Moreno Montoya
Ciudad

REF: Contrato de Obra No. 3599 de 2025, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

ASUNTO: Entrega Informe Mensual No. 1 – Mes de diciembre

Respetados señores:

En mi calidad de contratista del Contrato de Obra No. 3599 de 2025, me permito hacer entrega formal del Informe Mensual No. 1, correspondiente al mes de diciembre, el cual se adjunta para su revisión y conocimiento.

Agradezco muy amablemente la atención prestada y quedo atento a cualquier observación, aclaración o requerimiento adicional que consideren pertinente.

Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
Representante Legal
MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN
RECIBIDO

FECHA: 02 FEB 2026 9:17am
HORA

Recibido por Johana. P.T.

Radicado No. 194 No. Folios 112

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025
ALCALDIA MUNICIPAL DEVILLAVICENCIO

INFORME MENSUAL No.1
26 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO DEL CONTRATO:
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"



INFORME MENSUAL No.1

26 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

832

1. INTRODUCCIÓN

La ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO mediante contrato de obra N° 3599-2025 celebra con MEGA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S representada legalmente por el CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO, el contrato de obra cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". por un valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 95.578.766) M/CTE.

En el presente informe se describen las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 26 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, indicando el avance físico y administrativo del contrato, las principales novedades presentadas, como y las evidencias de las labores desarrolladas, como suspensiones, modificaciones y adicionales tramitadas, con el fin de garantizar el adecuado mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Almacén Municipal.

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901.744.193-4

R.L. CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO

SUPERVISOR:

ENITH RIATIVA SALINAS

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO	CONTRATISTA	CONTRATANTE	VALOR	PLAZO INICIAL	SUSPENSION
Mantenimiento de la infraestructura física del almacén municipal ubicado en el barrio Jordán - Paraíso calle 37a no. 19c-26 del municipio de Villavicencio.	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 95.578.766)	TREINTA Y SEIS (36) DÍAS	Quince (15) días

3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

El Municipio de Villavicencio requiere adelantar la presente contratación con el fin de conservar y mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de la infraestructura física del Almacén Municipal, ubicado en el barrio Jordán – Paraíso, Calle 37A No. 19C-26, garantizando la adecuada operación de las áreas destinadas al almacenamiento y custodia de bienes, así como el correcto desempeño de los espacios de apoyo administrativo.

La necesidad de la intervención se fundamenta en las condiciones reales evidenciadas en el sitio, donde se identificaron requerimientos de mantenimiento y adecuación asociados a cubiertas y elementos de drenaje de aguas lluvias (impermeabilización, canales, flanches y bajantes), así como a la recuperación y/o reemplazo de elementos de carpintería metálica (puertas, marcos, rejas y ventanas). De igual manera, se contempla la ejecución de actividades de obra civil y acabados tales como demoliciones puntuales, pañetes, resanes, pintura, cortes en mampostería y placa, sellado de juntas de dilatación y adecuación de pisos, con el fin de restituir condiciones óptimas de servicio en los espacios intervenidos.

Adicionalmente, el alcance comprende la adecuación de redes e instalaciones (eléctricas e hidrosanitarias), incluyendo salidas para luminarias LED y tomacorrientes, además del suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado tipo mini split. En zonas específicas como baños y áreas complementarias, se desarrollan actividades de demolición de enchapes y muros, excavaciones, transporte y disposición de escombros, instalación de tuberías, accesorios y aparatos sanitarios, construcción y/o adecuación de cajas de inspección, instalación de tanque de almacenamiento y trabajos asociados a enchapes y acabados. Asimismo, se incluyen intervenciones de apoyo como la instalación de mesón y adecuaciones de cerramiento (malla eslabonada y portón), y actividades de fachada (limpieza, pañete y pintura), necesarias para mejorar integralmente el estado de la edificación.

No obstante, durante la ejecución contractual se evidenció una situación técnica asociada a infiltración de aguas residuales, la cual requiere evaluación técnica, así como la definición y adopción de las soluciones correspondientes, con el fin de restablecer las condiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para la correcta ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, y para garantizar que la continuidad de las actividades no afecte la calidad, seguridad y correcta ejecución del objeto contractual, se considera procedente y contractualmente justificada la suspensión temporal del Contrato de Obra No. 3599 de 2025 por el término de quince (15) días calendario, contados a partir del 30/12/2025, plazo estimado para adelantar las verificaciones y decisiones técnicas requeridas, y proceder posteriormente con la reanudación de las actividades contractuales.

En virtud de lo anterior, la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO suscribió el Contrato de Obra No. 3599 de 2025 con MEGA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S., representada legalmente por el señor CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO, por un valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($95.578.766) M/CTE, con un plazo inicial de treinta y seis (36) días. El contrato fue suscrito el 14 de noviembre de 2025, con Acta de Inicio del 26 de noviembre de 2025 y fecha de terminación inicial prevista para el 31 de diciembre de 2025.

4. OBJETO DEL INFORME:

- Dar a conocer el porcentaje de avance de cada una de las actividades.
- Presentar valor de avance en cumplimiento al alcance del objeto contractual.
- Presentar el estado técnico, financiero y administrativo del proyecto.

5. LOCALIZACIÓN:



Figura 2. Localización Regional del Proyecto.

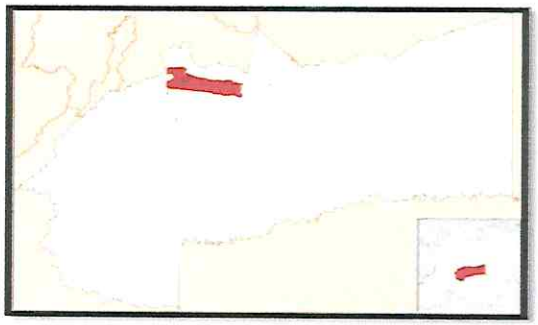


Figura 1. Localización Departamental del proyecto.



Figura 3. Localización específica del proyecto.

La zona del proyecto se encuentra localizada en área urbana del Municipio de Villavicencio, Como serelaciona a continuación en la imagen.

6. GENERALIDADES Y CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE OBRA:

Durante el desarrollo del contrato de obra No. 3599-2025, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" se identificaron variaciones sustanciales entre las condiciones iniciales proyectadas y las condiciones reales encontradas en el sitio de intervención.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N.º 3599 de 2025	
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"	
CONTRATISTA	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT. N°	901.744.193-4
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
PLAZO INICIAL	TREINTA Y SEIS (36) DÍAS
FECHA DEL CONTRATO	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION:	Quince (15) días calendario
FECHA DE REINICIO:	14 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN SUSPENSION No.1:	15 DE ENERO DE 2026
VALOR CONTRATADO	NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 95.578.766)

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA:

La disponibilidad y registros presupuestales que amparan la realización del presente contrato se relacionan a continuación:

REGISTRO PRESUPUESTAL.

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
Gastos-Inversión 0401-2-3.45.99.1000.046-2024500010198-1.2.1.0.00-02	BPIN2024500010198 Conservación y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de las instalaciones administrativas de propiedad del municipio de Villavicencio – Meta. Recurso propio-Libre destinación Recursos propios **Clasificadores** 45994599016-54129-2024500010198-210150001-1.2.1.0.00-16.0-0-0	**No. 7263** $ 95.578.766,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	CDP
0401-2-3.45.99.1000.046-2024500010198- 1.2.1.0.00–02	$100.000.000	5448 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2025

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

8. CANTIDADES CONTRACTUALES:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**ARCHIVO 1 - 2 (MANTENIMIENTO)**		
1.1	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	48,50
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	48,50
1.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	22,70
1.4	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA CAL 28 CON ANTICORROSIVO D=0.6 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5,80
1.5	CORREA PERFIL C PHR NEGRO100x50x1.2 MM CALIBRE 18	ML	32,00
1.6	MANTENIMIENTO CARPINTERIA METAL (Puerta y ventana)	M2	1,90
1.7	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	4,88
1.9	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1,95
1.10	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1,05
1,11	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0,83
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.70 M	UN	2,00
1,13	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD	M2	227,56
1,14	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INC TUBO EMT 3/4" Y LED 60X60	UN	12,00
1,15	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	100,00
1.16	CORTES PLACA DE CONTRAPISO (CONCRETO E= 1 CM)	ML	120,00
1.17	SELLADOR DE DILATACIONES. SIKAFLEX 15 LM	ML	100,00
1.18	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	120,00
1.19	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,65
1.20	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,38
1.21	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,20

1.22	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	143,96
1.23	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	140,22
1.24	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERIA EMT 3/4"	UN	9,00
1.25	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00
2	**ARCHIVO 1 - BAÑOS**		
2,1	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	5,49
2,2	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS Y PISOS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	6,59
2,3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,45
2,4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,77
2,5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	1,00
2,6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	1,77
2,7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1,00
2,8	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00
2,9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00
2,10	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00
2,11	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1,87
2,12	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00
2,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00
2,14	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	2,00
2,15	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00
2,16	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	8,00
2,17	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	8,00

2.18	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,37
2.19	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	9,24
2.20	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,45
2.21	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,17
2.22	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	87,50
2.23	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	4,72
2.24	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	15,70
2.25	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	ML	0,04
2.26	PISO Y PARED EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	25,30
2,27	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	4,72
2,28	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD	M2	9,90
2,29	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTAL	UN	2,00
2,30	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00
2,31	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2,00
2,32	ESPEJO 3MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,56
2,33	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	37,50
2,34	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00
2,35	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00
2,36	CORTES PLACA DE CONTRAPISO (CONCRETO E= 1 CM)	ML	7,00
2,37	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 500 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA PVC 1/2", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00
2,38	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,44
2,39	PAÑETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	4,44
2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	2,80

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

2.41	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERIA EMT 3/4"	UN	2,00
2.42	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INC TUBO EMT 3/4" Y LED 60X60	UN	2,00
3	**ARCHIVO 1 - MESÓN**		
3,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	1,08
3,2	Suministro e Instalación. Mesón auxiliar en granito pulido, el cual incluye salpicaderos de 7 cm y frenteros de 8 cm y. (el ancho del mesón es de 60 cm)	ML	4,00
3,3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,35
3,4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,06
3,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,70
3,6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,35
3,7	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00
3,8	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2,50
3,9	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00
3,10	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00
3,11	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00
3,12	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2	UN	1,00
3,13	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	2,00
3,14	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00
3,15	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	3,36
3,16	PISO Y PARED EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	1,20
3,17	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERIA EMT 3/4"	UN	2,00
4	**ARCHIVO 1 - MALLAS**		
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CORREDIZA <FIJA S-I 1X 3/16 INCLUYE DIAGONAL	M2	23,40
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4"; (1.5 MM) MALLA ESLABONADA 2X2	M2	4,40
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4"	UN	10,00

843

5	**FACHADA**		
5,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	56,75
5,2	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	10,00
5,3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	10,00
5,4	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	15,00
5,5	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15,66
5,6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,75

9. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERSONAL:

Se hace entrega de los reportes de pagos de EPS, ARL y Pensión de los trabajadores a cargo de la ejecución del contrato para el periodo comprendido por este informe.

A continuación, se relaciona el personal vinculado al desarrollo de las actividades:

Nombre	***Cédula***	***Cargo***	***N°. De Planilla***
BORNACHERA MARTIN	93435500	Oficial de Obra	9496195656
GOMEZ JAIRO	17334923	Residente de Obra	9496195656
LADINO JHORDAN	1121833941	Maestro de Obra	9496195656

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

12. AVANCE CRONOLÓGICO:

OBJETO	PLAZO INICIAL	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	36 DÍAS	26 NOVIEMBRE 2025	31 DICIEMBRE 2025	34 DIAS	94.44%

13. AVANCE DEL CONTRATO:

AVANCE FISICO ACUMULADO

PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO %	COSTO EJECUTADO ACUMULADO ($pesos)
DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	57.73%	$ 55.180.364,00

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO %	PAGOS ACUMULADOS ($pesos)
DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2026	0%	$ 0,00

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	AVANCE	TOTAL AVANCE
1	ARCHIVO 1 - 2 (MANTENIMIENTO)						
1.1	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	48,50	$ 55.000,00	$ 2.667.500,00	0,00	$ 0,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	48,50	$ 26.000,00	$ 1.261.000,00	0,00	$ 0,00
1.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	22,70	$ 170.000,00	$ 3.859.000,00	22,70	$ 3.859.000,00
1.4	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA CAL 28 CON ANTICORROSIVO D=0.6 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5,80	$ 70.000,00	$ 406.000,00	5,80	$ 406.000,00

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

1.5	CORREA PERFIL C PHR NEGRO100x50x1.2 MM CALIBRE 18	ML	32,00	$ 32.000,00	$ 1.024.000,00	18,00	$ 576.000,00
1.6	MANTENIMIENTO CARPINTERIA METAL(Puerta y ventana)	M2	1,90	$ 140.000,00	$ 266.000,00	1,90	$ 266.000,00
1.7	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000,00	1,00	$ 85.000,00
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	4,88	$ 650.000,00	$ 3.172.000,00	4,88	$ 3.172.000,00
1.9	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1,95	$ 18.000,00	$ 35.100,00	1,95	$ 35.100,00
1.10	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1,05	$ 18.000,00	$ 18.900,00	1,05	$ 18.900,00
1.11	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0,83	$ 26.500,00	$ 21.995,00	0,83	$ 21.995,00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.70 M	UN	2,00	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	2,00	$ 1.000.000,00
1.13	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD	M2	227,56	$ 11.500,00	$ 2.616.940,00	215,60	$ 2.479.400,00
1.14	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INC TUBO EMT 3/4" Y LED 60X60	UN	12,00	$ 260.000,00	$ 3.120.000,00	0,00	$ 0,00
1.15	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	100,00	$ 1.600,00	$ 160.000,00	100,00	$ 160.000,00
1.16	CORTES PLACA DE CONTRAPISO (CONCRETO E= 1 CM)	ML	120,00	$ 5.000,00	$ 600.000,00	0,00	$ 0,00
1.17	SELLADOR DE DILATACIONES. SIKAFLEX 15 LM	ML	100,00	$ 4.700,00	$ 470.000,00	100,00	$ 470.000,00
1.18	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	120,00	$ 20.000,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ 0,00
1.19	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,65	$ 360.000,00	$ 234.000,00	0,00	$ 0,00
1.20	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,38	$ 60.000,00	$ 22.800,00	0,00	$ 0,00
1.21	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,20	$ 950.000,00	$ 190.000,00	0,00	$ 0,00
1.22	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	143,96	$ 35.000,00	$ 5.038.600,00	0,00	$ 0,00
1.23	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	140,22	$ 60.000,00	$ 8.413.200,00	0,00	$ 0,00
1.24	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERIA EMT 3/4"	UN	9,00	$ 120.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	$ 0,00
1.25	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 3.500.000,00	$ 10.500.000,00	3,00	$ 10.500.000,00
				SUBTOTAL	**$ 48.662.035,00**		**$ 23.049.395,00**
2,0	**ARCHIVO 1 - BAÑOS**						
2.1	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	5,49	$ 18.000,00	$ 98.820,00	5,49	$ 98.820,00

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

2.2	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS Y PISOS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	6,59	$ 12.000,00	$ 79.080,00	6,59	$ 79.080,00
2.3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,45	$ 370.000,00	$ 166.500,00	0,45	$ 166.500,00
2.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,77	$ 70.000,00	$ 123.900,00	1,77	$ 123.900,00
2.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	1,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00	1,00	$ 220.000,00
2.6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	1,77	$ 60.000,00	$ 106.200,00	1,77	$ 106.200,00
2.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00	0,00	$ 0,00
2.8	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 39.000,00	$ 39.000,00	1,00	$ 39.000,00
2.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00	1,00	$ 30.000,00
2.10	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000,00	1,00	$ 85.000,00
2.11	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1,87	$ 6.000,00	$ 11.220,00	1,87	$ 11.220,00
2.12	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	4,00	$ 120.000,00
2.13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 10.000,00	$ 100.000,00	10,00	$ 100.000,00
2.14	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	2,00	$ 65.000,00	$ 130.000,00	2,00	$ 130.000,00
2.15	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 80.000,00	$ 160.000,00	2,00	$ 160.000,00
2.16	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	8,00	$ 47.000,00	$ 376.000,00	8,00	$ 376.000,00
2.17	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	8,00	$ 27.000,00	$ 216.000,00	8,00	$ 216.000,00
2.18	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,37	$ 810.000,00	$ 299.700,00	0,37	$ 299.700,00
2.19	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	9,24	$ 52.000,00	$ 480.480,00	9,24	$ 480.480,00
2.20	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,45	$ 1.300.000,00	$ 585.000,00	0,20	$ 260.000,00
2.21	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,17	$ 1.300.000,00	$ 221.000,00	0,11	$ 143.000,00
2.22	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	87,50	$ 8.000,00	$ 700.000,00	87,50	$ 700.000,00
2.23	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	4,72	$ 7.000,00	$ 33.040,00	4,72	$ 33.040,00
2.24	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	15,70	$ 27.000,00	$ 423.900,00	15,70	$ 423.900,00
2.25	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	ML	0,04	$ 1.750.000,00	$ 70.000,00	0,04	$ 70.000,00

347

2.26	PISO Y PARED EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	25,30	$	70.000,00	$ 1.771.000,00	25,30	$ 1.771.000,00
2.27	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	4,72	$	12.500,00	$ 59.000,00	4,72	$ 59.000,00
2.28	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD	M2	9,90	$	12.000,00	$ 118.800,00	9,90	$ 118.800,00
2.29	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTAL	UN	2,00	$	85.000,00	$ 170.000,00	2,00	$ 170.000,00
2.30	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00	$	500.000,00	$ 1.000.000,00	2,00	$ 1.000.000,00
2.31	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2,00	$	380.000,00	$ 760.000,00	2,00	$ 760.000,00
2.32	ESPEJO 3MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,56	$	80.000,00	$ 44.800,00	0,00	$ 0,00
2.33	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	37,50	$	11.000,00	$ 412.500,00	37,50	$ 412.500,00
2.34	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$	50.000,00	$ 400.000,00	7,00	$ 350.000,00
2.35	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$	26.000,00	$ 26.000,00	1,00	$ 26.000,00
2.36	CORTES PLACA DE CONTRAPISO (CONCRETO E= 1 CM)	ML	7,00	$	5.000,00	$ 35.000,00	7,00	$ 35.000,00
2.37	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 500 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA PVC 1/2", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$	650.000,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00
2.38	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,44	$	1.180.000,00	$ 519.200,00	0,44	$ 519.200,00
2.39	PAÑETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	4,44	$	28.000,00	$ 124.320,00	4,44	$ 124.320,00
2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	2,80	$	600.000,00	$ 1.680.000,00	0,00	$ 0,00
2.41	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERIA EMT 3/4"	UN	2,00	$	120.000,00	$ 240.000,00	0,00	$ 0,00
2.42	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INC TUBO EMT 3/4" Y LED 60X60	UN	2,00	$	265.000,00	$ 530.000,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	**$ 13.875.460,00**		**$ 10.467.660,00**
3,0	**ARCHIVO 1 - MESÓN**							
3.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	1,08	$	54.000,00	$ 58.320,00	0,54	$ 29.160,00
3.2	Suministro e Instalación. Mesón auxiliar en granito pulido, el cual incluye salpicaderos de 7 cm y frenteros de 8 cm y. (el ancho del mesón es de 60 cm)	ML	4,00	$	630.000,00	$ 2.520.000,00	3,75	$ 2.362.500,00
3.3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,35	$	370.000,00	$ 129.500,00	0,35	$ 129.500,00
3.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,06	$	70.000,00	$ 74.200,00	1,06	$ 74.200,00
3.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	0,70	$	60.000,00	$ 42.000,00	0,70	$ 42.000,00
3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)	M3	0,35	$	800.000,00	$ 280.000,00	0,35	$ 280.000,00

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

	MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN						
3.7	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 10.000,00	$ 20.000,00	2,00	$ 20.000,00
3.8	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2,50	$ 27.000,00	$ 67.500,00	2,50	$ 67.500,00
3.9	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	$ 11.000,00	$ 66.000,00	6,00	$ 66.000,00
3.10	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 48.000,00	$ 144.000,00	0,00	$ 0,00
3.11	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 26.000,00	$ 26.000,00	1,00	$ 26.000,00
3.12	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2	UN	1,00	$ 75.000,00	$ 75.000,00	1,00	$ 75.000,00
3.13	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	2,00	$ 1.650,00	$ 3.300,00	2,00	$ 3.300,00
3.14	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	1,00	$ 240.000,00
3.15	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	3,36	$ 25.000,00	$ 84.000,00	3,36	$ 84.000,00
3.16	PISO Y PARED EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	1,20	$ 70.000,00	$ 84.000,00	0,00	$ 0,00
3.17	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERIA EMT 3/4"	UN	2,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	0,00	$ 0,00
				SUBTOTAL	**$ 4.153.820,00**		**$ 3.499.160,00**
4,0	**ARCHIVO 1 - MALLAS**						
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CORREDIZA <FIJA S-I 1X 3/16 INCLUYE DIAGONAL	M2	23,40	$ 120.000,00	$ 2.808.000,00	23,40	$ 2.808.000,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4"; (1.5 MM) MALLA ESLABONADA 2X2	M2	4,40	$ 215.000,00	$ 946.000,00	4,40	$ 946.000,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4"	UN	10,00	$ 52.000,00	$ 520.000,00	10,00	$ 520.000,00
				SUBTOTAL	**$ 4.274.000,00**		**$ 4.274.000,00**
5,0	**FACHADA**						
5.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	56,75	$ 6.500,00	$ 368.875,00	0,00	$ 0,00
5.2	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	10,00	$ 12.500,00	$ 125.000,00	10,00	$ 125.000,00
5.3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	10,00	$ 37.000,00	$ 370.000,00	10,00	$ 370.000,00
5.4	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	15,00	$ 1.600,00	$ 24.000,00	15,00	$ 24.000,00
5.5	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15,66	$ 20.000,00	$ 313.200,00	15,66	$ 313.200,00
5.6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,75	$ 14.000,00	$ 794.500,00	0,00	$ 0,00
				SUBTOTAL	**$ 1.995.575,00**		**$ 832.200,00**
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 72.960.890,00**		**$ 42.122.415,00**
				ADIMINISTRACION (25%)	**$ 18.240.222,50**		**$ 10.530.603,75**
				IMPREVISTOS (1%)	**$ 729.608,90**		**$ 421.224,15**
				UTILIDAD (5%)	**$ 3.648.044,50**		**$ 2.106.120,75**
				VALOR TOTAL CONSTOS INDIRECTOS	**$ 22.617.875,90**		**$ 13.057.948,65**

VALOR TOTAL (incluye AIU 31%) ajustado al peso	$ 95.578.766,00	$ 55.180.364,00

14. MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS:

Tipo	Cantidad
Cortadora de concreto	1
Equipo de soldadura	1
Pulidora	1
Equipo de demolición	1

15. AVANCE FISICO CON REGISTRO FOTOGRAFICO:

- **1.3 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS**



- **1.4 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA CAL 28 CON ANTICORROSIVO D=0.6 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN**



- **1.5 CORREA PERFIL C PHR NEGRO100x50x1.2 MM CALIBRE 18**




- **1.6 MANTENIMIENTO CARPINTERIA METAL(Puerta y ventana)**








- **1.7 DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**

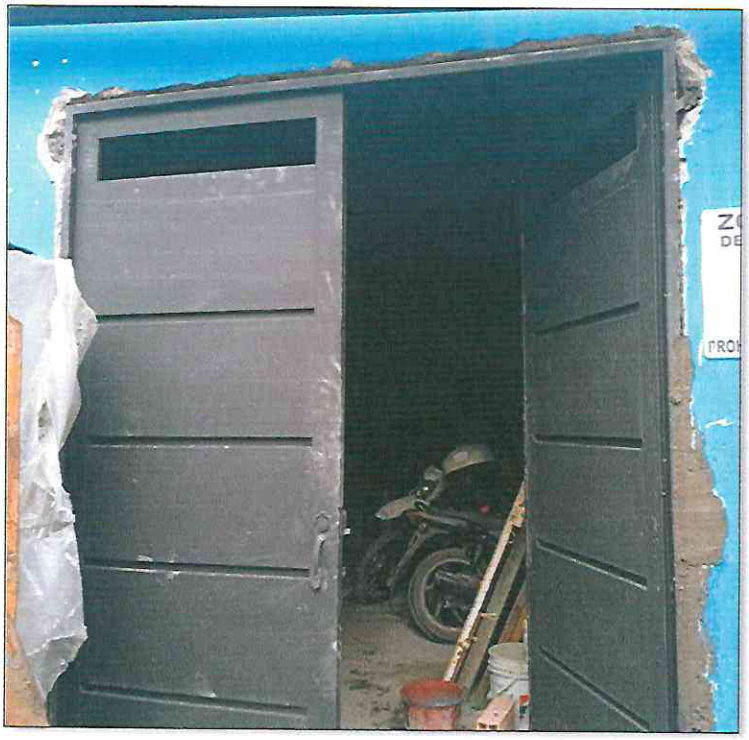

- **1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18**

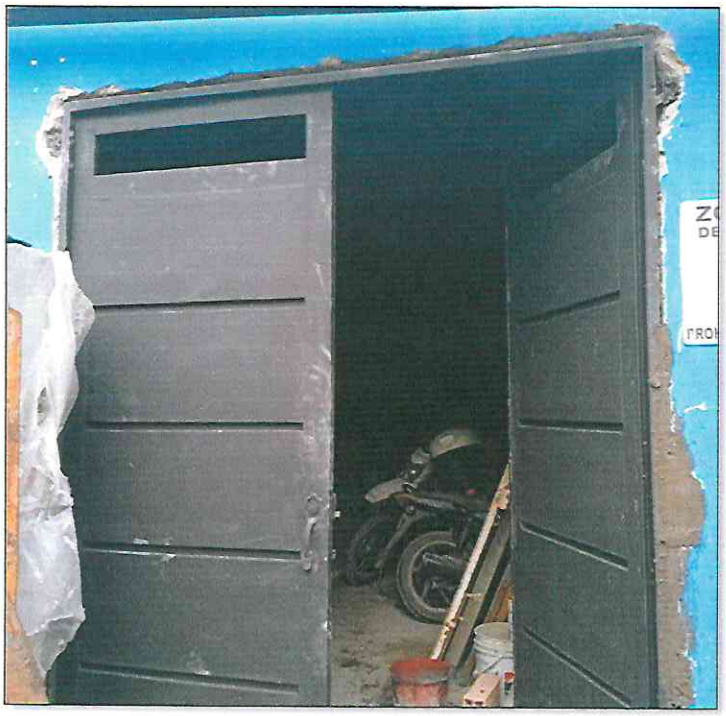

- **1.9 DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**



- **1.10 DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**



- **1.11 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN**



- **1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.70 M**



- **1.13 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD**




- **1.15 CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM**



- **1.17 SELLADOR DE DILATACIONES. SIKAFLEX 15 LM**



- **1.25 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN**






ARCHIVO 1 – BAÑOS


- **2.1 DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**





- **2.2 DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS Y PISOS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**

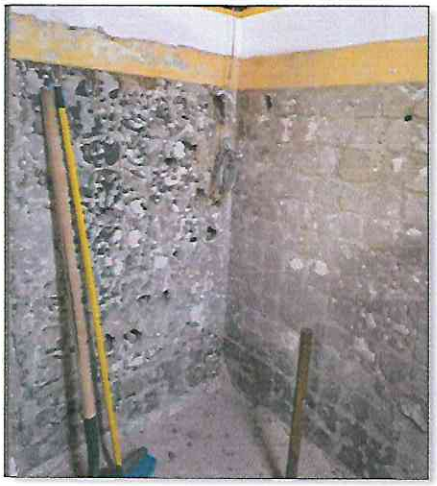

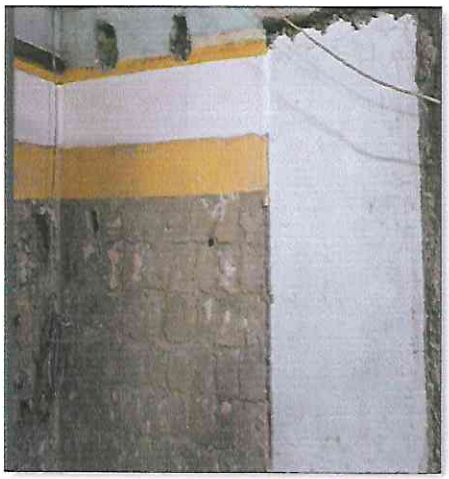

- **2.3 DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**





- **2.4 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE**





- **2.5 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**




- **2.6 RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO**





- **2.8 DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**

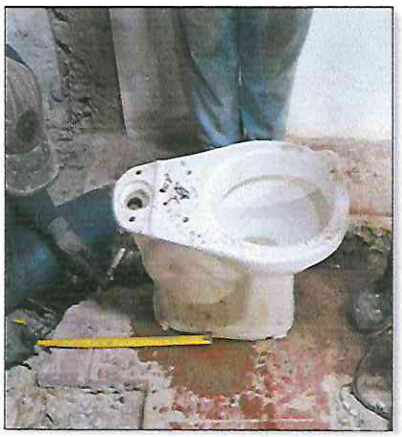

- **2.9 DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**



- **2.10 DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**



- **2.11 DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**



- **2.12 ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN**



860

- **2.13 ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN**



- **2.14 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"**



- **2.15 SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN**



861

- **2.16 TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION**



- **2.17 TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION**




- **2.18 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**



852

- **2.19 MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)**

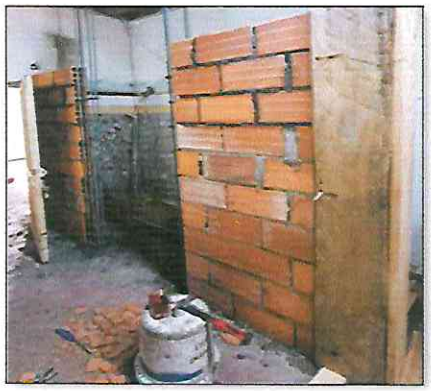


- **2.20 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**




- **2.21 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**





803

- **2.22 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE**




- **2.23 PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**

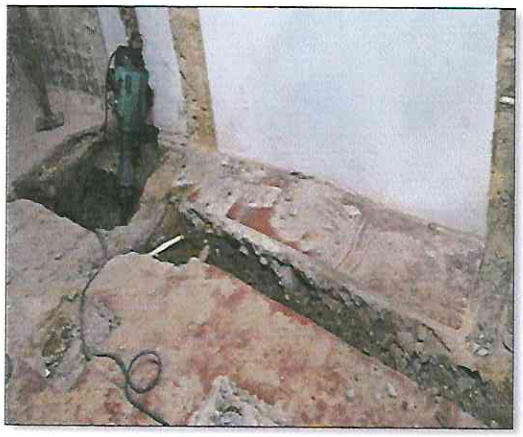

- **2.24 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN**



- **2.25 DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**



- **2.26 PISO Y PARED EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA**



- **2.27 DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**



- **2.28 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD**





- **2.29 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTAL**



- **2.30 LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS**



- **2.31 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA**



- **2.33 TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN**




- **2.34 PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN**




- **2.35 VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN**



- **2.36 CORTES PLACA DE CONTRAPISO (CONCRETO E= 1 CM)**

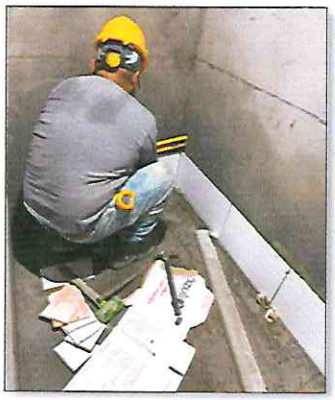

- **2.37 TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 500 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA PVC 1/2", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN**



- **2.38 PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**




- **2.39 PAÑETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN**



ARCHIVO 1 – MESÓN

- **3.1 MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)**



- **3.2 Suministro e Instalación. Mesón auxiliar en granito pulido, el cual incluye salpicaderos de 7 cm y frenteros de 8 cm y. (el ancho del mesón es de 60 cm)**



- **3.3 DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**




- **3.4 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE**



- **3.5 RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO**



- **3.6 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**

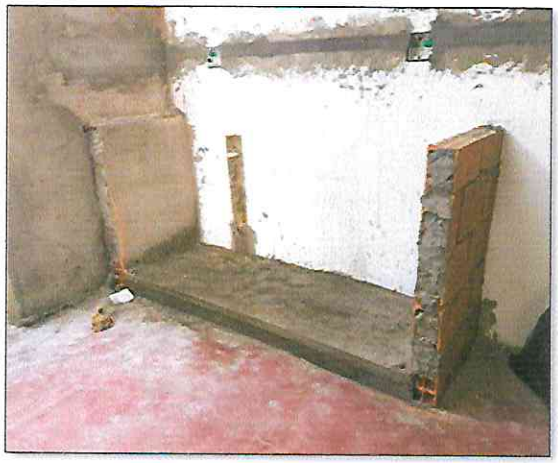

- **3.7 ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN**



- **3.8 TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN**



- **3.9 TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN**



- **3.12 SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2**



- **3.13 CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM**



- **3.15 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN**



ARCHIVO 1 – MALLAS

- **4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CORREDIZA <FIJA S-I 1X 3/16 INCLUYE DIAGONAL**



873

- **4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4"; (1.5 MM) MALLA ESLABONADA 2X2**



- **4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4"**



FACHADA

- **5.2 DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**



- **5.3 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN**



- **5.4 CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM**



- **5.5 SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN**



16. CONCLUSIONES:

- Durante el periodo comprendido del 26 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, se adelantaron actividades correspondientes al alcance del Contrato de Obra No. 3599 de 2025, orientadas al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física del Almacén Municipal ubicado en el barrio Jordán – Paraíso, Calle 37A No. 19C-26 del municipio de Villavicencio.
- En el componente civil y arquitectónico se ejecutaron frentes asociados a intervención de cubiertas y manejo de aguas lluvias, actividades de carpintería metálica (mantenimiento y/o reposición de elementos), demoliciones puntuales, pañetes/resanes, pintura, cortes en mampostería y placa, y sellado de juntas; acciones que permiten recuperar condiciones de servicio, funcionalidad y presentación de las áreas intervenidas.
- En el componente de instalaciones se desarrollaron actividades de adecuaciones eléctricas (puntos para iluminación y tomacorrientes) y trabajos complementarios, así como la instalación de equipos asociados al sistema de aire acondicionado, conforme a las necesidades operativas del inmueble.
- En zonas específicas (baños y áreas complementarias) se ejecutaron actividades de demolición de enchapes y muros, excavaciones, rellenos, instalación de tuberías y accesorios hidrosanitarios, y trabajos asociados a elementos de concreto y acabados; además de intervenciones puntuales en áreas complementarias como mesón y cerramientos, y trabajos de fachada (limpieza, pañete y pintura) según los frentes reportados.
- Durante el desarrollo de la obra se evidenciaron condiciones reales en sitio que difieren de los supuestos iniciales, lo cual sustenta técnica y constructivamente la necesidad de ajustar cantidades de obra e incorporar actividades adicionales (ítems no previstos/no contemplados), garantizando seguridad, funcionalidad y calidad de los espacios intervenidos, tal como se expone en la justificación técnica incluida en el informe.
- En concordancia con el análisis técnico y económico de la modificatoria, las variaciones de cantidades y la inclusión de ítems no previstos corresponden a una reevaluación del proyecto en sitio y a optimizaciones del alcance, sin que ello implique errores de planeación; por el contrario, estas medidas resultan determinantes para asegurar la correcta culminación del objeto contractual y el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad.
- Como novedad relevante del periodo, se registra la suspensión del contrato con fecha 30 de diciembre de 2025 por quince (15) días calendario, con reinicio el 14 de enero de 2026, lo cual impacta la programación general y exige la correspondiente gestión administrativa para el ajuste de plazos y la continuidad

ordenada de los frentes de obra.

- Se deja constancia de que el contratista anexa los soportes administrativos correspondientes al personal vinculado y al cumplimiento del sistema de seguridad social y parafiscales del periodo reportado, conforme a lo relacionado en el informe.

Atentamente,

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
C.C. No. 14.214.578 expedida en Ibagué
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS
Nit: 901.744.193-4

CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025
ALCALDIA MUNICIPAL DEVILLAVICENCIO

INFORME No.1 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO:
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"



INFORME No.1 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

26 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

1. INTRODUCCIÓN

La ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, mediante el Contrato de Obra No. 3599 de 2025, suscrito con MEGA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S., representada legalmente por el señor CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO, ejecuta el contrato cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

El presente INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) consolida la gestión preventiva y el seguimiento a las actividades implementadas durante el periodo comprendido del 26 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, en cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las obligaciones contractuales aplicables.

En este documento se registran y describen las acciones desarrolladas para la identificación y control de riesgos en obra, la divulgación de políticas y procedimientos de SST, la realización de inducciones y charlas de seguridad, la entrega y verificación del uso de Elementos de Protección Personal (EPP), las inspecciones y demás actividades de prevención y mejora continua; así como el balance de accidentalidad y las observaciones relevantes del periodo, con el fin de garantizar condiciones seguras de trabajo para el personal vinculado y contribuir a la correcta ejecución del mantenimiento del Almacén Municipal.

831

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901.744.193-4

R.L. CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO

SUPERVISOR:

ENITH RIATIVA SALINAS

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO	CONTRATISTA	CONTRATANTE	VALOR	PLAZO INICIAL	SUSPENSION
Mantenimiento de la infraestructura física del almacén municipal ubicado en el barrio Jordán - Paraíso calle 37a no. 19c-26 del municipio de Villavicencio.	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 95.578.766)	TREINTA Y SEIS (36) DÍAS	Quince (15) días

882

3. GENERALIDADES Y CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE OBRA:

Durante el desarrollo del contrato de obra No. 3599-2025, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" se identificaron variaciones sustanciales entre las condiciones iniciales proyectadas y las condiciones reales encontradas en el sitio de intervención.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N.º 3599 de 2025	
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"	
CONTRATISTA	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT. N°	901.744.193-4
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
PLAZO INICIAL	TREINTA Y SEIS (36) DÍAS
FECHA DEL CONTRATO	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION:	Quince (15) días calendario
FECHA DE REINICIO:	14 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN SUSPENSION No.1:	15 DE ENERO DE 2026

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

La zona del proyecto se encuentra localizada en área urbana del Municipio de Villavicencio, Como serelaciona a continuación en la imagen



Figura 2. Localización Regional del Proyecto.

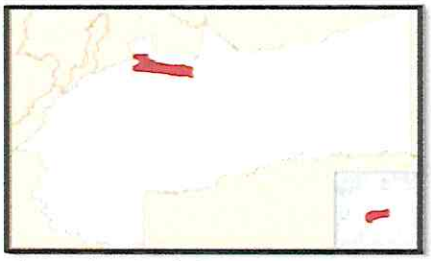


Figura 1. Localización Departamental del proyecto.



Figura 3. Localización específica del proyecto.

5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

A continuación, se relaciona el personal vinculado al desarrollo de las actividades:

Nombre	*Cédula*	*Cargo*	*N°. De Planilla*
BORNACHERA MARTIN	93435500	Oficial de Obra	9496195656
GOMEZ JAIRO	17334923	Residente de Obra	9496195656
LADINO JHORDAN	1121833941	Maestro de Obra	9496195656

6. ANÁLISIS GENERAL:

Durante el transcurso del periodo comprendido del 26 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, el balance de accidentalidad del personal vinculado a la ejecución del Contrato de Obra No. 3599 de 2025 (MEGA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.) es de cero (0) accidentes, correspondiente al 0%, por lo que seguiremos comprometidos con evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Verificaremos los estándares y normas establecidas por la Alcaldía del Municipio de Villavicencio y las exigidas para la ejecución del contrato, con el fin de obtener los resultados deseados, fomentando hábitos de trabajo seguro, la adecuada utilización

384

de equipos y herramientas, y el uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP), verificando que los procesos y estándares se estén llevando a cabalidad, mediante acompañamiento, supervisión y mejoramiento continuo con apoyo del componente SST.

Seguiremos comprometidos y abiertos a continuar fortaleciendo la cultura de seguridad, sensibilizando a nuestros colaboradores sobre actos inseguros, estándares de seguridad y responsabilidades que adquieren al desempeñar sus labores dentro de la obra.

7. REGISTRO DE PERSONAL E INDUCCIONES:

SEMANA 1 (del 26 de noviembre al 30 de noviembre)	***N°. DE TRABAJADORES***	***N°. DE HORAS DIARIAS TRABAJADAS***	***TOTAL HORAS TRABAJADAS POR SEMANA***	***N°. DE INDUCCIONES***
MIERCOLES-26	3	8	8	1
JUEVES-27	3	8	8	1
VIERNES-28	3	8	8	1
SABADO-29	3	8	8	1
DOMINGO-30	0	0	0	0
TOTAL			***32***	***4***

SEMANA 2 (del 01 de diciembre al 07 de diciembre)	***N°. DE TRABAJADORES***	***N°. DE HORAS DIARIAS TRABAJADAS***	***TOTAL HORAS TRABAJADAS POR SEMANA***	***N°. DE INDUCCIONES***
LUNES-01	3	8	8	1
MARTES-02	3	8	8	1
MIERCOLES-03	3	8	8	1
JUEVES-04	3	8	8	1
VIERNES-05	3	8	8	1
SABADO-06	3	8	8	1
DOMINGO-07	0	0	0	0
TOTAL			***48***	***6***

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

SEMANA 3 (del 08 de diciembre al 14 de diciembre)	N°. DE TRABAJADORES	N°. DE HORAS DIARIAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS TRABAJADAS POR SEMANA	N°. DE INDUCCIONES
LUNES-08	0	0	0	0
MARTES-09	3	8	8	1
MIERCOLES-10	3	8	8	1
JUEVES-11	3	8	8	1
VIERNES-12	3	8	8	1
SABADO-13	3	8	8	1
DOMINGO-14	0	0	0	0
TOTAL			40	5

SEMANA 4 (del 15 de diciembre al 21 de diciembre)	N°. DE TRABAJADORES	N°. DE HORAS DIARIAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS TRABAJADAS POR SEMANA	N°. DE INDUCCIONES
LUNES-15	3	8	8	1
MARTES-16	3	8	8	1
MIERCOLES-17	3	8	8	1
JUEVES-18	3	8	8	1
VIERNES-19	3	8	8	1
SABADO-20	3	8	8	1
DOMINGO-21	0	0	0	0
TOTAL			48	6

SEMANA 5 (del 22 de diciembre al 28 de diciembre)	N°. DE TRABAJADORES	N°. DE HORAS DIARIAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS TRABAJADAS POR SEMANA	N°. DE INDUCCIONES
LUNES-22	3	8	8	1
MARTES-23	3	8	8	1
MIERCOLES-24	3	8	8	1
JUEVES-25	0	0	0	0
VIERNES-26	3	8	8	1
SABADO-27	3	8	8	1
DOMINGO-28	0	0	0	0
TOTAL			40	0

SEMANA 6 (del 29 de diciembre al 31 de diciembre)	N°. DE TRABAJADORES	N°. DE HORAS DIARIAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS TRABAJADAS POR SEMANA	N°. DE INDUCCIONES
LUNES-29	3	8	8	1
MARTES-30	3	8	8	1
MIERCOLES-31	0	0	0	0
TOTAL			16	2

8. DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS DE SST:

REGISTRO DE CAPACITACIONES/ENTRENAMIENTOS/DIVULGACIONES/CHARLAS			
ITEM	TEMA	N°. DE TRABAJADORES Y ASISTENTES	CANTIDAD DE DIVULGACIONES POR SEMANA
1	Inicio de obra- Divulgación de actividades en obra	3	1
2	Inicio de obra – Charla de uso adecuado de EPP.	3	1
3	Manejo de las lesiones leves	3	1
4	Los efectos del consumo del alcohol	3	1
5	Uso de herramientas manuales	3	1
6	Inspecciones de EPP	3	1

7	Divulgación del protocolo de rescate	3	1
8	Riesgos Eléctricos	3	1
9	Inhalación pasiva de humo	3	1
10	Herramientas eléctricas y pequeños implementos	3	1
11	Seguridad con el teléfono celular	3	1

9. BALANCE DE ACCIDENTALIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2025:

NÚMERO DE TRABAJADORES	*NÚMERO DE ACCIDENTES*	*N°. DÍAS DE INCAPACIDAD*	*TASA DE ACCIDENTALIDAD*	*TASA DE SEVERIDAD POR AT*	*ÍNDICE DE FRECUENCIA POR AT*	*ÍNDICE DE SEVERIDAD POR AT*
3	0	0	0%	0%	0	0

El balance de accidentalidad para el mes de septiembre de 2025 es de cero (0) Accidentes correspondiente al 0%, por lo que seguiremos comprometidos con evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar en el área de seguridad y salud en el trabajo.

10. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EMPLEADOS:

Los elementos de protección personal que se utilizan para desarrollar las labores son los siguientes:

- ✓ Guantes de nitrilo: son utilizados para cargar herramientas, transporte de materiales y desarrollo de actividades.
- ✓ Gafas de seguridad: utilizada para evitar que el material particulado, residuos de losa entre otros, ingresen a los ojos.
- ✓ Protección respiratoria: se utiliza para mitigar la inhalación de material particulado.
- ✓ Tapabocas: se utiliza para evitar el contagio de enfermedades.
- ✓ Botas de seguridad: brindan una cobertura más extensa que los zapatos, protegiendo no solo los dedos, sino también el tobillo y la parte inferior de la pierna.

11. OBSERVACIONES GENERALES:

- ✓ Se realiza verificación de afiliaciones a seguridad social de cada uno del personal operativo para así dar cumplimiento a los requisitos SST.
- ✓ Se realiza charla diaria de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Se realizan pausas activas para mejorar la salud y el desempeño de cada uno del personal operativo.
- ✓ Cabe recalcar que, desde el 26 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, se da cumplimiento a todas las políticas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para obra.

Atentamente,



CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
C.C. No. 14.214.578 expedida en Ibagué
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS
Nit: 901.744.193-4

889

ANEXO – SOPORTE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

890

PLANILLA NOVIEMBRE 2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

891

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744193	4	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 47 a no 29 a 46	VILLAVICENCIO-META	6638252	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1994031652	9496195656	E	2025/12/22	2025/12/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$349,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (3 Afiliados)						$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	93435500	BORNACHERA MARTIN	230201	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF34	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$1,500	6	$0	$0
2	CC	17334923	GOMEZ JAIRO	25-14	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF34	18	$854,100	$34,200	14-23	18	$854,100	$4,500	18	$0	$0
3	CC	1121833941	LADINO JHORDAN	230301	6	$284,700	$45,600	CCFC55	6	$284,700	$11,400	CCF34	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$1,500	6	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/12/09 04:23 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

892

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744193	4	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 47 a no 29 a 46	VILLAVICENCIO-META	6638252	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1994031652	9496195656	E	2025/12/22	2025/12/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$349,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$227,900	$0	$0	$227,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$136,700	$0	$0	$136,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$45,600	$0	$0	$45,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$45,600	$0	$0	$45,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$57,000	$0	$0	$57,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$57,000	$0	$0	$57,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$11,400	$0	$0	$11,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$11,400	$0	$0	$11,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$34,200	$0	$0	$34,200
TOTAL				3	$349,400	$0	$0	$349,400

2025/12/09 04:23 PM

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

PLANILLA DICIEMBRE 2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744193	4	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 47 a no 29 a 46	VILLAVICENCIO-META	6638252	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2061603709	9497577279	E	2026/01/23	2026/01/06	BANCO AV VILLAS	0	$1,047,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$22,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$22,500		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$22,500		$0	$0
1	CC	93435500	BORNACHERA MARTIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	17334923	GOMEZ JAIRO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1121833941	LADINO JHORDAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$22,500		$0	$0

2026/01/05 07:23 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744193	4	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 47 a no 29 a 46	VILLAVICENCIO-META	6638252	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2061603709	9497577279	E	2026/01/23	2026/01/06	BANCO AV VILLAS	0	$1,047,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$22,500	$0	$0	$22,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$22,500	$0	$0	$22,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				3	$1,047,900	$0	$0	$1,047,900

2026/01/05 07:23 PM

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
Nit. 901744193-4

ANEXO – BITACORAS

26 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A 31 DE DICIEMBRE DEL2025

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	X
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Desmonte de sanitario. Incluye traslado hasta sitio de cargue o almacenamiento.
- Desmonte de lavamanos. Incluye traslado hasta sitio de cargue o almacenamiento.
- Desmonte de marco y puerta. Incluye traslado hasta sitio de cargue o almacenamiento.
- Desmonte de cielo raso en lámina liviana. Incluye traslado hasta sitio de cargue o almacenamiento.
- Demolición manual de enchape cerámico en muros y pisos. Incluye trasiego y cargue manual.
- Inicio de acopio de escombros generados para posterior disposición final.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	X
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Demolición manual de enchape cerámico en muros y pisos. Incluye trasiego y cargue manual.
- Demolición manual de pañete en muros E = 0.03 m. Incluye trasiego y cargue manual.
- Picada de piso. Incluye trasiego y cargue manual.
- Transporte y disposición final parcial de escombros y sobrantes.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Excavación manual en material común H = 0.00 – 2.00 m. Incluye cargue.
- Transporte y disposición final de escombros y sobrantes.
- Limpieza general del área intervenida y alistamiento para inicio de actividades constructivas (nuevos baños y cocina).

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño máx. 2", incluye suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano.
- Excavaciones y adecuaciones finales para instalación de redes sanitarias.
- Instalación de tubería PVCS 4" suministro e instalación.
- Instalación de tubería PVCS 2" suministro e instalación.
- Instalación de accesorios PVCS 4" suministro e instalación.
- Instalación de accesorios PVCS 2" suministro e instalación.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA



CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

901

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Construcción de caja de inspección de 0.60 x 0.60 x 0.60 m en concreto 3000 PSI, elaborada en sitio, incluye tapa en concreto reforzado y marco en ángulo metálico.
- Salida sanitaria sifón de piso 2".
- Salida sanitaria para sanitario 4" suministro e instalación.
- Salida sanitaria para lavamanos 2" suministro e instalación.
- Pruebas preliminares de alineación y pendientes de red sanitaria.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Instalación de tubería PVCP RDE 09 de 1/2" suministro e instalación.
- Ejecución de puntos hidráulicos en PVCP pared desde piso promedio 1/2" suministro e instalación.
- Instalación de válvulas de bola 1/2" suministro e instalación.
- Salida sanitaria lavaplatos 2".
- Ajustes y fijación de redes hidráulicas y sanitarias.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE	X	ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Suministro, figurado, armado, colocación y amarre de acero de refuerzo Fy = 420 MPa.
- Construcción de columnas en concreto 20.7 MPa (3000 PSI) mezcla en obra.
- Construcción de viga aérea en concreto 20.7 MPa (3000 PSI) mezcla en obra.
- Construcción de dinteles en concreto 17.2 MPa (2500 PSI) mezcla en obra.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

907

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE	X	TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE	X	ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Cortes en placa de contrapiso (concreto e = 1 cm) para paso y ajuste de redes.
- Corte vertical en mampostería con cortadora e = 1 cm.
- Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño máx. 2", incluye suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano.
- Construcción de placa de contrapiso en concreto 20.7 MPa (3000 PSI) mezcla en obra.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

905

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO	X	LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Construcción de placa de contrapiso en concreto 20.7 MPa (3000 PSI) mezcla en obra (áreas complementarias).
- Ajustes finales de redes sanitarias y redes hidráulicas.
- Verificación de niveles, pendientes y alineación.
- Limpieza general del área intervenida y alistamiento para actividades posteriores de mampostería y acabados.
- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

906

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE	X	TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Construcción de placa de contrapiso en concreto 20.7 MPa (3000 PSI) mezcla en obra (áreas complementarias).
- Ajustes finales de redes sanitarias y redes hidráulicas.
- Verificación de niveles, pendientes y alineación.
- Limpieza general del área intervenida y alistamiento para actividades posteriores de mampostería y acabados.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO	X	LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Construcción de muros en bloque flexa No. 4 (0.10 x 0.20 x 0.30 m), asentados con mortero tipo S (1:3), correspondientes a la conformación de divisiones internas de baños y cocina.
- Verificación de plomos, alineación y modulación de muros construidos.
- En la presente fecha se radica informe técnico correspondiente a la Solicitud de Adición No. 01 y Modificación No. 01 del contrato, derivado de las condiciones sanitarias no previstas encontradas durante la ejecución de la obra, durante las actividades desarrolladas se evidenció una fuga de aguas negras en uno de los muros del Archivo 2, situación que genera afectación directa a las condiciones sanitarias, estructurales y de salubridad del área intervenida.
- Dicha condición no fue identificada en la etapa de planeación, y requiere la evaluación técnica y definición de medidas correctivas para solventar el imprevisto, garantizar la adecuada ejecución de las actividades y asegurar la funcionalidad y durabilidad de las intervenciones.
- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	x	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Pañete de muros interiores en mortero 1:4, incluye ejecución de filos y dilataciones.
- Corrección de superficies, nivelación y preparación de muros para acabados posteriores.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO	X	LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Construcción de placa de entrepiso maciza en concreto impermeabilizado 20.7 MPa (3000 PSI), mezcla en obra, incluye suministro y construcción.
- Curado inicial de la placa.
- Pañete liso bajo placa en mortero 1:4, incluye filos y dilataciones, en áreas habilitadas.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

910

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO	X	LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Instalación de piso y pared en cerámica lisa 0.32 x 0.32 cm, línea Fortaleza, en zonas de baños y cocina.
- Instalación de tanque plástico para agua potable de 500 litros, incluye tubería y accesorios de conexión de entrada y salida en PVC 1/2", flotador, válvula cheque y válvulas de control.
- Verificación de funcionamiento hidráulico del sistema instalado.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

9M

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Continuación y finalización de pañete de muros interiores en mortero 1:4, incluye filos y dilataciones.
- Aplicación de pintura vinilo tipo 1 sobre muros interiores (alta calidad).
- Limpieza general del área intervenida y verificación de acabados ejecutados.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

9/12

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Desmonte de marco y puerta, incluye traslado hasta sitio de cargue o almacenamiento.
- Desmonte de rejas y ventanas metálicas, incluye traslado hasta sitio de cargue o almacenamiento.
- Demolición manual de muros en bloque de cemento en áreas intervenidas, incluye trasiego y cargue manual.
- Corte vertical en mampostería con cortadora, e = 1 cm, para adecuaciones de nuevos vanos y ajustes de obra.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO	X	LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Pañete de muros interiores en mortero 1:4, incluye filos y dilataciones, en Archivos 1 y 2.
- Aplicación de sellador de dilataciones Sikaflex 15 LM en juntas y encuentros de muros intervenidos.
- Alistamiento de superficies para actividades de pintura.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

914

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE	X	TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Mantenimiento de carpintería metálica en puertas y ventanas existentes (limpieza, ajustes, lubricación y pintura anticorrosiva donde aplica).
- Suministro e instalación de puerta ornamentada con marco de 0.08 m y hoja en tubo 3" x 1½" cal. 18.
- Verificación de funcionamiento, alineación y anclajes.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO	X	LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Suministro e instalación de puerta en tablero corrido, incluye marco y cerradura en lámina cold rolled cal. 20, dimensiones 2.00 x 0.70 m.
- Aplicación de pintura vinilo tipo 1 sobre muros interiores (alta calidad), en áreas con pañete terminado.
- Retoques y correcciones finales en superficies pintadas.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

916

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO	X	LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Instalación de lavamanos sobreponer marca Corona o similar, incluye grifería y accesorios.
- Instalación de sanitario Acuacer blanco marca Corona.
- Pruebas de funcionamiento hidráulico y sanitario.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO	X	LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Suministro e instalación de mesón auxiliar en granito pulido, incluye salpicaderos de 7 cm y frenteros de 8 cm, ancho del mesón 60 cm.
- Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable de 0.60 x 0.40 m, incluye grifería.
- Verificación de niveles, fijaciones y conexiones.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO	X	LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA	X	CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Ajustes finales en carpintería metálica y puertas instaladas.
- Limpieza general de áreas intervenidas en Archivos 1 y 2.
- Verificación general de actividades ejecutadas y alistamiento para etapas finales del contrato.
- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

919

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA	X	CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Suministro e instalación de correas en perfil C PHR negro 100 x 50 x 1.2 mm calibre 18, como soporte estructural para el sistema de recolección de aguas lluvias.
- Replanteo y verificación de alineación, pendientes y puntos de anclaje del sistema.
- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

920

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA	X	CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 16, LD = 1.22 m, incluye aplicación de pintura y recubrimientos anticorrosivos.
- Verificación de pendientes y continuidad del sistema de canales para correcto escurrimiento de aguas lluvias.
- Suministro e instalación de bajantes en lámina galvanizada calibre 28 con anticorrosivo, diámetro 0.6 m.
- Fijación y sellado de uniones del sistema de bajantes con las canales instaladas.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA	X	CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Suministro e instalación de anclajes en tubo redondo galvanizado de 1¼", para soporte del cerramiento interno.
- Suministro e instalación de malla eslabonada fija/corrediza S-I 1" x 3/16", incluye diagonal de refuerzo.
- Verificación de plomos, tensado y fijación del cerramiento instalado.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

9v2

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO	X	LLUVIOSO		LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA	X	CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Suministro e instalación de portón en tubo redondo galvanizado de 1¼" (1.5 mm), con malla eslabonada 2" x 2".
- Ajustes finales de funcionamiento del portón (apertura, cierre y alineación).
- Limpieza general del área intervenida y verificación final del sistema de cerramiento y recolección de aguas lluvias.

- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Nit. 901744193-4

BITACORA DE OBRA DIARIA

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCADIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LOCALIZACIÓN:	ALMACÉN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JORDÁN - PARAÍSO CALLE 37A NO. 19C-26
N°. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 3599 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
DOMICILIO:	CALLE 47ª #29ª-46 BARRIO CAUDAL
TELEFONOS:	3102451158

DATOS DIARIOS

CLIMA	SOLEADO		LLUVIOSO	X	LLUVIA FUERTE		TORMENTA	
HERRAMIENTA	MENOR	X	EQUIPO DE SOLDADURA		CORTE		ROTOMARTILLO	
PERSONAL	RESIDENTE	X	ELECTRICO		MAESTRO	X	AYUDANTES	X

ACTIVIDADES EN OBRA

- Pañete en muros exteriores y culatas en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye suministro y aplicación.
- Sellado de juntas de dilatación de 10 mm x 10 mm con poliuretano, incluye cordón en polietileno como fondo de junta.
- Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo Split, tecnología Inverter, capacidad 24.000 BTU, 220 V, incluye unidad interior, unidad exterior y kit completo de instalación.
- En la presente fecha se suspende el Contrato, de conformidad con lo establecido en la Minuta de Suspensión No. 01, quedando interrumpida la ejecución de las actividades a partir de esta fecha, hasta tanto se autorice el reinicio mediante el acto administrativo correspondiente.
- Se cuenta con el acompañamiento del apoyo a la supervisión.

RESPONSABLES EN OBRA

CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
R/L MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS

ENITH RIATIVA SALINAS - SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA
